San Juan de Pasto, 30 de mayo de 2025

UTPGT-073

Señores:
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
R/L JAVIER BARRETO MOSOS
INTERVENTOR CTO. No. 1867-2023
sotalicitaciones@gmail.com
int.putumayosota@gmail.com

Ref.: Contrato de obra No. 1837 del 23 de noviembre del 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA QUE COMUNICA PUERTO GUZMÁN CON LA VEREDA – LA ARGENTINA – LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Asunto: Solicitud de Suspensión al Contrato de obra No. 1837 del 23 de noviembre del 2023.

Cordial saludo

Nos dirigimos a usted para solicitar formalmente la aprobación de la Suspensión No. 3, por un término de veinte (20) días calendario, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas adversas, especialmente las lluvias persistentes que aún se presentan en la zona, han generado un deterioro considerable en las vías de acceso al proyecto, lo cual ha imposibilitado el ingreso de los vehículos de carga (volquetas) encargados del transporte del material seleccionado necesario para la conformación de los terraplenes de acceso al puente.

Asimismo, estas condiciones han impedido el ingreso y la operación de la maquinaria requerida para la ejecución de las actividades programadas, afectando de manera directa el cronograma establecido y comprometiendo la adecuada ejecución de las obras.

En razón de lo anterior, las condiciones meteorológicas y el estado actual de la vía representan una limitante significativa para continuar con los trabajos en campo bajo condiciones técnicas y de seguridad adecuadas. Por lo tanto, nos permitimos adjuntar un registro fotográfico y registro del tiempo climático en el departamento de la página METEORED https://www.meteored.com.ec/tiempo-en_Putumayo-America+Sur-Ecuador-Sucumbios--1-20112.html como método de evidencia y el cual respalda la situación expuesta, y que fundamenta de manera objetiva nuestra solicitud de aprobación para la Suspensión No. 3, por un término de veinte (20) días calendario.

ESTADO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución con fecha de terminación No. 5 en día 4 de junio de 2025, el proyecto lleva un porcentaje de ejecución del 80,29% a corte de 13/05/2025. A continuación, se relaciona una tabla con el estado del proyecto.

1	PRELIMINARES	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR	FALTA POR EJECUTAR
1,1	LOCALIZACION, RAPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	ML	25,00	25,00	0,00	100%	0,00%	
1,2	DESMONTAJE PUENTE EXISTENTE	UN	1,00	1,00	0,00	100%	0,00%	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**							
2,1	EXCAVACION MANUAL	M3	138,60	138,60	0,00	100%	0,00%	
2,2	TERRAPLEN	M3	676,43	420,00	256,43	62,09%	37,91%	CONFORMACIÓN TERRAPLENES
2,3	MATERIAL SELECCIONADO PARA TERRAPLEN	M3	676,43	518,00	158,43	76,58%	23,42%	MATERIAL PARA TERRAPLENES
2,4	AFIRMADO	M3	104,07	70,00	34,07	67,26%	32,74%	MATERIAL AFIRMADO
3	**PUENTE**							
3,1	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) CAISSONS	M3						
3,2	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) VIGAS Y TABLERO	M3	59,92	43,02	16,90	71,80%	28,20%	LOSAS DE APROXIMACIÓN
3,3	CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) ESTRIBOS Y ALETAS	M3						
3,4	CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (F)	M3	6,93	6,93	0,00	100%	0,00%	
3,5	APOYO ELASTOMERICO	UN	10,00	10,00	0,00	100%	0,00%	
3,6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	25205,88	22862,80	2343,08	90,70%	9,30%	ACERO DE LOSAS
3,7	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	13,68	13,68	0,00	100%	0,00%	
3,8	GEOTEXTIL	M2	100,80	100,80	0,00	100%	0,00%	
3,9	DRENES CON TUBERIA PVC 4"	ML	29,00	29,00	0,00	100%	0,00%	
	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD							
4,1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	UND	10,00	0,00	10,00	0,00%	100%	ACTIVIDAD COMPLETA
4,2	BARANDA METALICA EN ACERO A36 (60K/ML)	ML	42,00	36,00	6,00	85,71%	14,29%	BARANDAS EN ALETAS
4,3	PRUEBA DE CARGA	UN						
4,4	PROTECCION DE TALUDES	M2	234,00	0,00	234,00	0,00%		ACTIVIDAD COMPLETA
	ITEMS NO PREVISTOS							
INP-1	EXCAVACION MANUAL BAJO AGUA PARA CAISSON	M3	110,46	110,46	0,00	100%	0,00%	
INP-2	CONCRETO 3000 PSI PARA ANILLO DE CAISSON	M3	35,06	35,06	0,00	100%	0,00%	
INP-3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA N° 6 HUECO DE 15*15 PARA REFUERZO ANILLO CAISSON	M2	233,74	233,74	0,00	100%	0,00%	
INP-4	CAISSON DE CONCRETO DE 3500 PSI VACIADO IN SITU	M3	75,40	75,40	0,00	100%	0,00%	
INP-5	RETIRO DE SOBRANTES INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	249,06	158,60	90,46	63,68%	36,32%	MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y MADERA DEL PUENTE EXISTENTE
INP-6	CONCRETO 3500 PSI PARA ESTRIBOS Y ALETAS	M3	107,67	106,63	1,05	99,03%	0,97%	BORDILLOS DE LOSAS DE APROXIMACIÓN
INP-7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUNTA DE EXPANSIÓN TIPO AGFLEXJ140 O JUNTA DE DILATACION PLACA DENTADA.	ML	12,60	9,45	3,15	75,00%	25,00%	FUNDICIÓN CON LOSAS DE APROXIMACIÓN
INP-8	TUBERIA PERFORADA 4"	ML	20,00	20,00	0,00	100%	0,00%	
INP-9	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	72,00	0,00	72,00	0,00%	100%	ACTIVIDAD COMPLETA
INP-10	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MENOR O IGUAL A 10.00 METROS	ML	12,60	12,60	0,00	100%	0,00%	
	COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL							
	PREVISIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	UND	1,00	0,77	0,23	76,53%	23,47%	
	PREVISIÓN OBRAS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	UND	1,00	0,27	0,73	27,33%	72,67%	
	INVENTARIO VIAL PARA REPORTE DE INFORMACIÓN DE LA VÍA SEGÚN RESOLUCIÓN 0000412 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	KM	51,77	0,00	51,77	0,00%	100%	ACTIVIDAD COMPLETA
	PRUEBA DE CARGA	UN	1,00	0,00	1,00	0,00%	100%	ACTIVIDAD COMPLETA

% EJECUTADO ACUMULADO	**80,29%**
% POR EJECUTAR	**19,71%**

Tabla 1 - Relación de Estado actual del Proyecto

En la tabla No. 1 Relación del Estado Actual del Proyecto, se evidencia la ejecución de las actividades las cuales por las condiciones del clima no es posible realizarlas como han sido programadas por tal motivo solicitamos la aprobación de la presente solicitud de suspensión por un tiempo prudente en el cual esperamos el tiempo mejore las condiciones y que nos permita ejecutar las actividades de manera normal. A continuación, se relaciona un registro fotográfico de lo expuesto.



Fotografía 1 - 28/05/2025



Fotografía 2 - 28/05/2025




Fotografía 3 - 29/05/2025



Fotografía 4 - 30/05/2025

- **Anexo del Estado del Tiempo actual y Pronostico del Tiempo a más de 14 días**

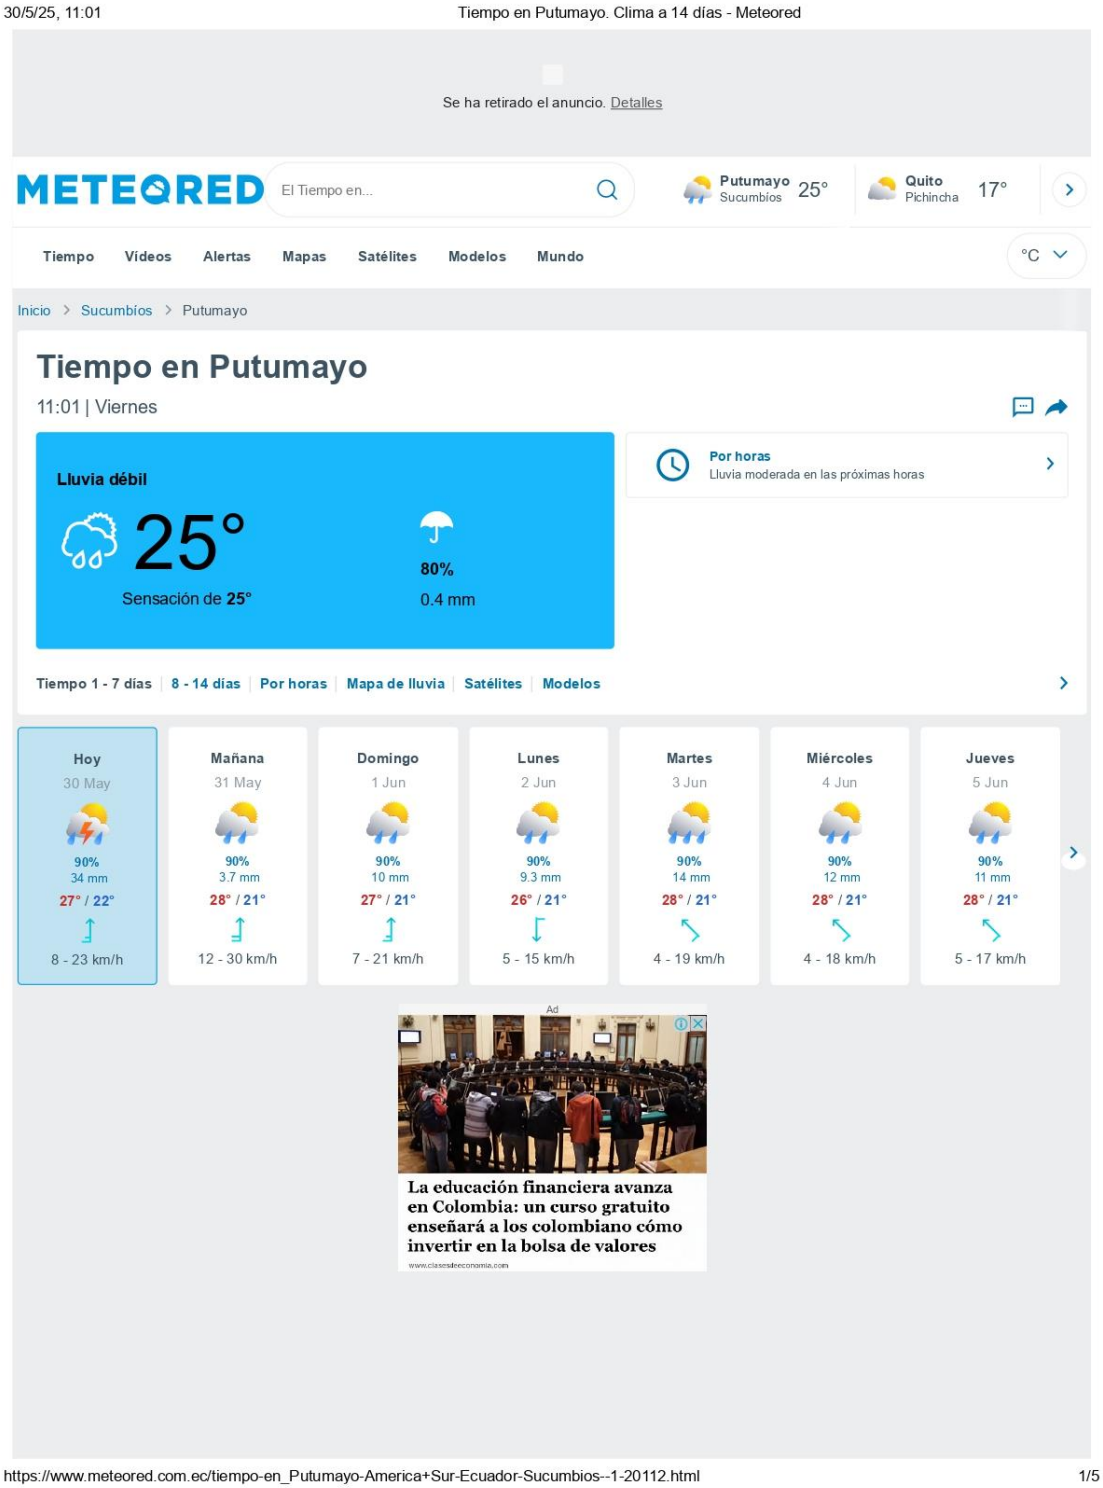

30/5/25, 11:01 Tiempo en Putumayo. Clima a 14 días - Meteored

Se ha retirado el anuncio. Detalles

METEORED El Tiempo en... Putumayo Sucumbíos 25° Quito Pichincha 17°

Tiempo Vídeos Alertas Mapas Satélites Modelos Mundo °C

Inicio > Sucumbíos > Putumayo

Tiempo en Putumayo

11:01 | Viernes

Lluvia débil

25°

Sensación de 25°

80%

0.4 mm

Por horas

Lluvia moderada en las próximas horas

Tiempo 1 - 7 días | 8 - 14 días | Por horas | Mapa de lluvia | Satélites | Modelos

Hoy	Mañana	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves
30 May	31 May	1 Jun	2 Jun	3 Jun	4 Jun	5 Jun
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
34 mm	3.7 mm	10 mm	9.3 mm	14 mm	12 mm	11 mm
27° / 22°	28° / 21°	27° / 21°	26° / 21°	28° / 21°	28° / 21°	28° / 21°
8 - 23 km/h	12 - 30 km/h	7 - 21 km/h	5 - 15 km/h	4 - 19 km/h	4 - 18 km/h	5 - 17 km/h

Ad

La educación financiera avanza en Colombia: un curso gratuito enseñará a los colombiano cómo invertir en la bolsa de valores

www.clasesdeeconomia.com

https://www.meteored.com.ec/tiempo-en_Putumayo-America+Sur-Ecuador-Sucumbios--1-20112.html 1/5

Ad



Los nacidos antes de 1998 podrán acceder a una capacitación gratuita para aprender a invertir en la bolsa de valores

www.clasesdeeconomia.com

Síguenos

Tiempo en Putumayo hoy, 30 de mayo

11:00	80% 0.4 mm	25°	Lluvia débil Sensación T. 25°	Sur 6 - 17 km/h	7 Alto FPS: 15-25	
12:00	90% 1.6 mm	25°	Lluvia débil Sensación T. 26°	Sur 8 - 22 km/h	9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50	
13:00	90% 1.9 mm	25°	Lluvia débil Sensación T. 27°	Suroeste 6 - 22 km/h	7 Alto FPS: 15-25	
14:00	90% 0.5 mm	26°	Lluvia débil Sensación T. 28°	Oeste 4 - 18 km/h	4 Medio FPS: 6-10	
15:00	90% 7.7 mm	25°	Tormenta Sensación T. 25°	Oeste 4 - 16 km/h	3 Medio FPS: 6-10	
17:00	90% 6.4 mm	23°	Lluvia moderada Sensación T. 22°	Este 4 - 11 km/h	0 Bajo FPS: no	
20:00	80% 1.8 mm	23°	Lluvia débil Sensación T. 22°	Sureste 1 - 3 km/h	0 Bajo FPS: no	
23:00	80% 2.6 mm	23°	Lluvia débil Sensación T. 20°	Sur 3 - 7 km/h	0 Bajo FPS: no	

Tiempo: PDF

Fotoprotección (FPS): Más información

Salida y Puesta del sol

Salida Sol **05:57**

Puesta Sol **18:04**



Primera luz **05:35**

Mediodía **12:01**

Última luz **18:27**

Duración del día **12h 8m**
Luz diurna restante **7h 26m**

CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIAS
Calle 21 Nº 28-50 - Barrió Las Cuadras – San Juan de Pasto
Cel: 3216417184 - Email: contalasso36@gmail.com

Calendario lunar

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12			

Calidad del aire en Putumayo hoy

Detalle >

15 Buena
$PM_{2.5}$ (7 µg/m³)


- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad

Gráficas del tiempo >

Vídeos

Más Vídeos >

CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIAS
Calle 21 Nº 28-50 - Barrió Las Cuadras – San Juan de Pasto
Cel: 3216417184 - Email: contalasso36@gmail.com

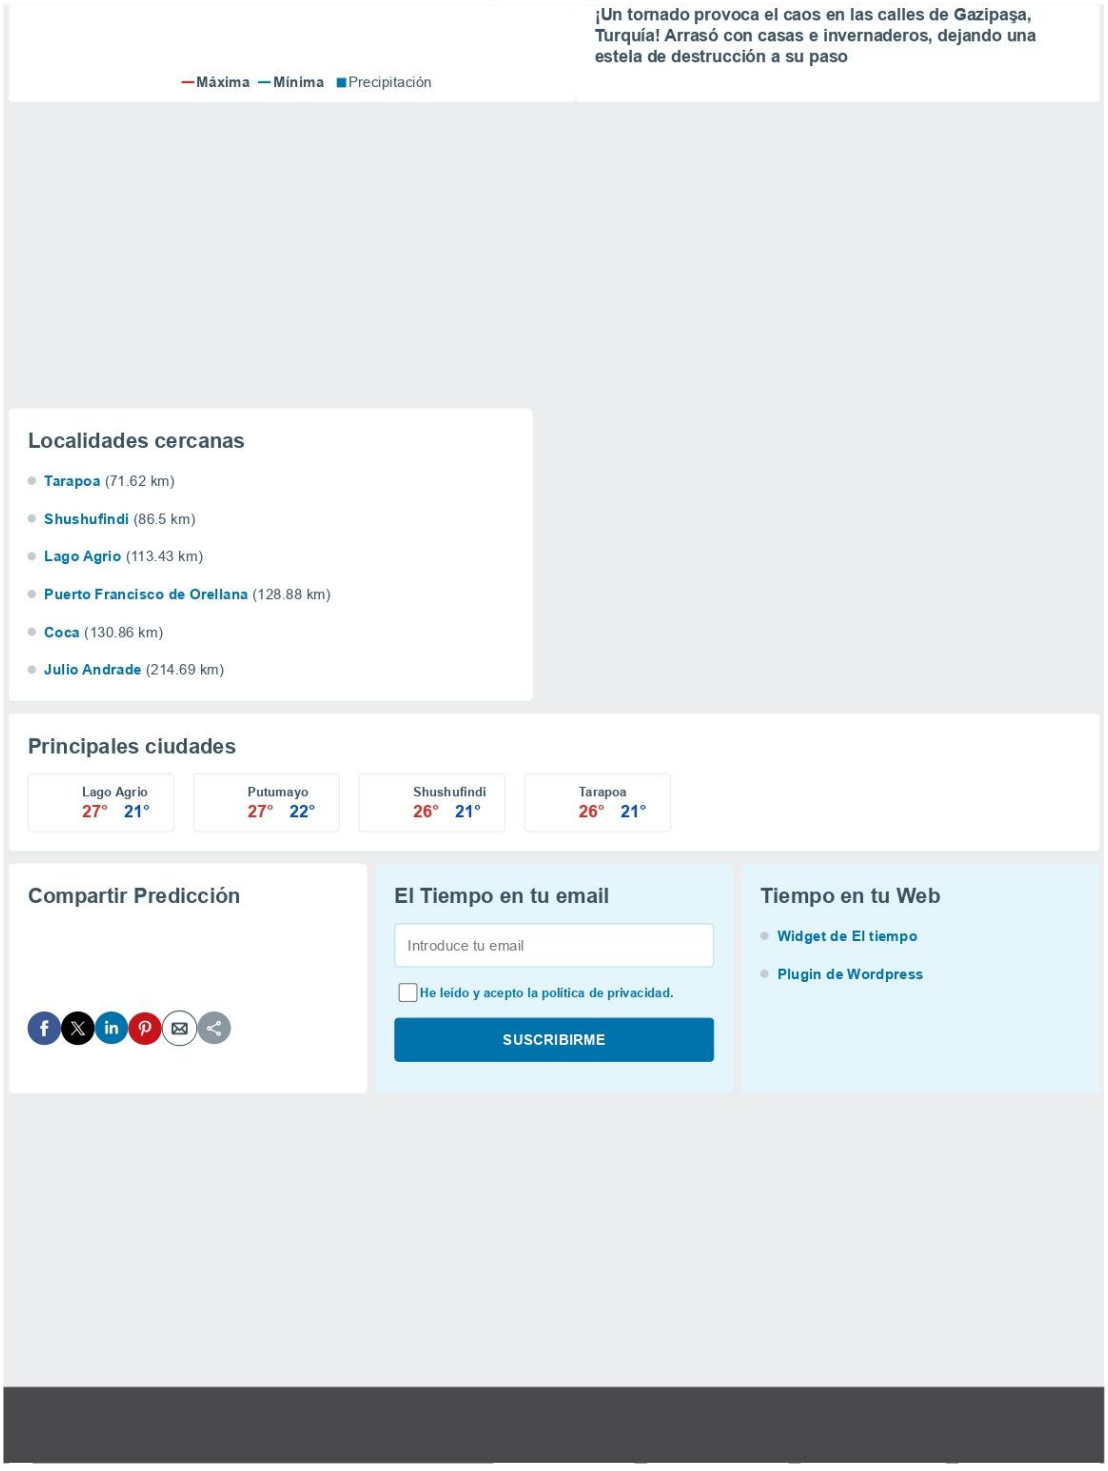

¡Un tornado provoca el caos en las calles de Gazipaşa, Turquía! Arrasó con casas e invernaderos, dejando una estela de destrucción a su paso
—Máxima —Mínima ■Precipitación
Localidades cercanas
Tarapoa (71.62 km)
Shushufindi (86.5 km)
Lago Agrio (113.43 km)
Puerto Francisco de Orellana (128.88 km)
Coca (130.86 km)
Julio Andrade (214.69 km)
Principales ciudades
Lago Agrio 27° 21°
Putumayo 27° 22°
Shushufindi 26° 21°
Tarapoa 26° 21°
Compartir Predicción
El Tiempo en tu email
Introduce tu email
He leído y acepto la política de privacidad.
SUSCRIBIRME
Tiempo en tu Web
Widget de El tiempo
Plugin de Wordpress

Descarga Gratis App Android meteored.com.ec
Descarga Gratis App iOS meteored.com.ec
Descarga Gratis App Huawei meteored.com.ec
Descarga Gratis App Windows 10 meteored.com.ec

Contacto | Sobre nosotros | FAQ | Nota Legal | Cookies | Política Privacidad | Configuración de privacidad

2025 Meteored. Todos los derechos reservados

- **Pronostico del Tiempo a más de 14 días**

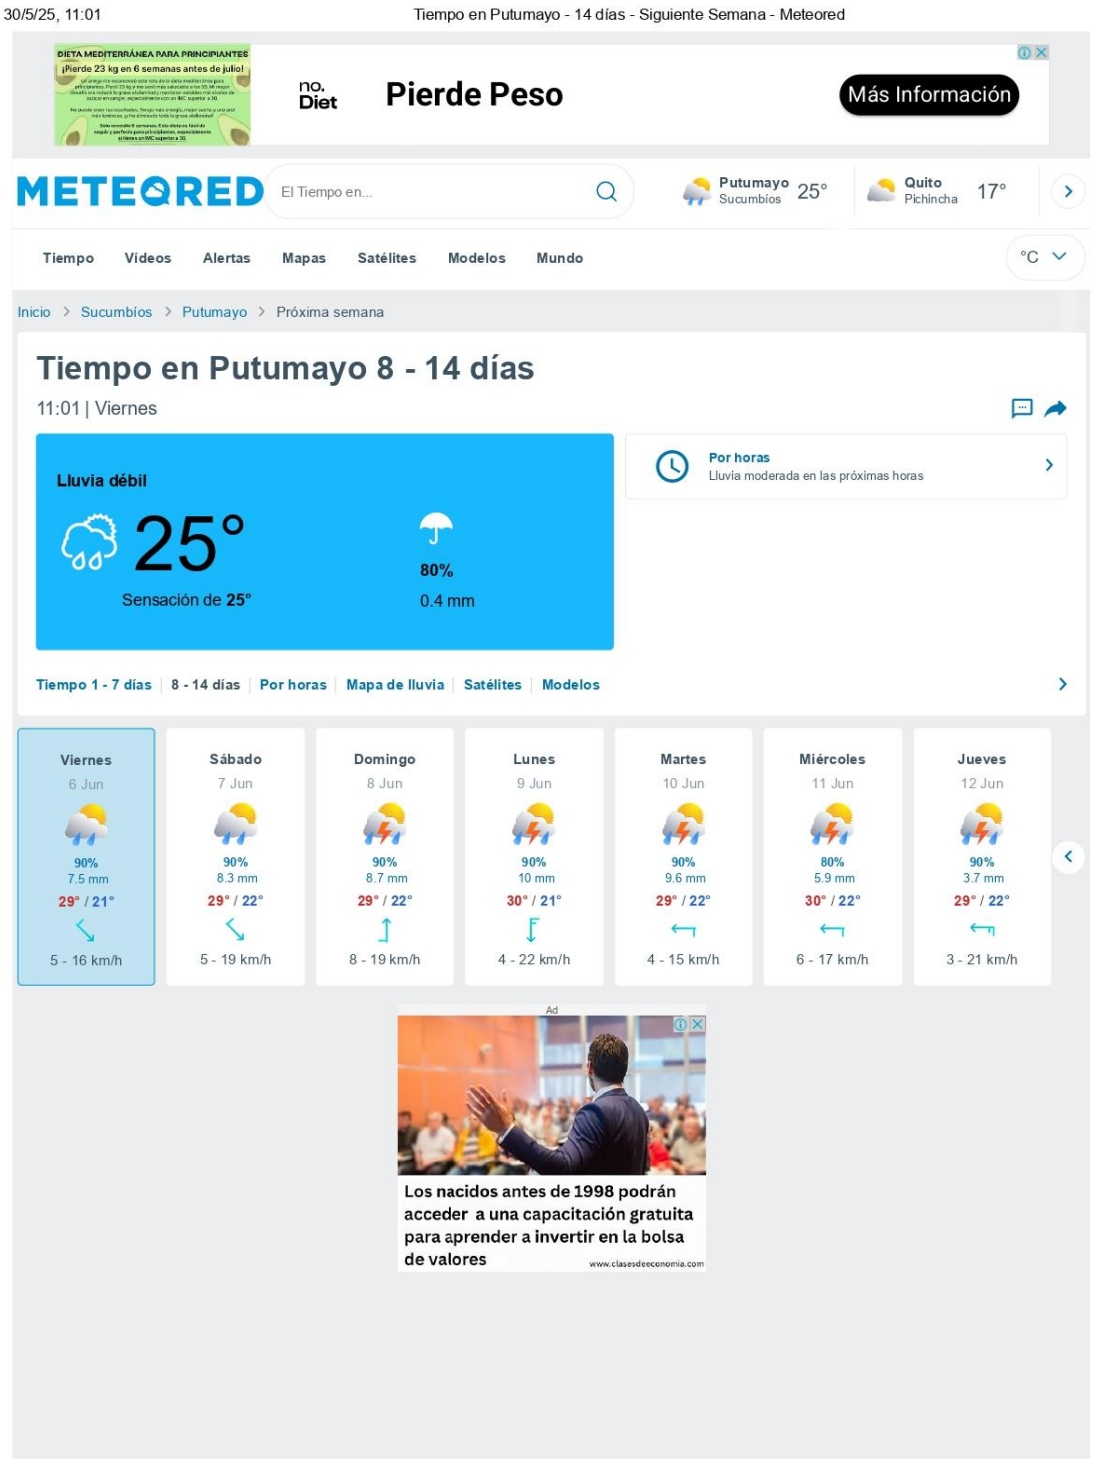

Ad



La educación financiera avanza en Colombia: un curso gratuito enseñará a los colombiano cómo invertir en la bolsa de valores

www.clasesdeeconomia.com

Síguenos

Viernes, 6 de junio

01:00	40% 0.3 mm	22°	Lluvia débil Sensación T. 19°	Norte 4 - 13 km/h	0 Bajo FPS: no	
04:00	50% 0.5 mm	22°	Lluvia débil Sensación T. 22°	Noroeste 5 - 11 km/h	0 Bajo FPS: no	
07:00	50% 0.6 mm	22°	Lluvia débil Sensación T. 19°	Noroeste 5 - 11 km/h	0 Bajo FPS: no	
10:00	70% 1.1 mm	25°	Lluvia débil Sensación T. 26°	Norte 3 - 13 km/h	5 Medio FPS: 6-10	
13:00	90% 1.5 mm	27°	Lluvia débil Sensación T. 30°	Noreste 3 - 15 km/h	8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50	
16:00	90% 1.4 mm	26°	Lluvia débil Sensación T. 28°	Sureste 3 - 16 km/h	5 Medio FPS: 6-10	
19:00	90% 1.3 mm	24°	Lluvia débil Sensación T. 23°	Sureste 4 - 15 km/h	0 Bajo FPS: no	
22:00	60% 0.8 mm	23°	Lluvia débil Sensación T. 21°	Sureste 2 - 12 km/h	0 Bajo FPS: no	

Tiempo: PDF

Fotoprotección (FPS): Más información

Salida y Puesta del sol

Salida Sol
05:57

Puesta Sol
18:04



Primera luz
05:35

Mediodía
12:01

Última luz
18:27

Duración del día **12h 8m**
Luz diurna restante **7h 25m**

CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIAS
Calle 21 Nº 28-50 - Barrió Las Cuadras – San Juan de Pasto
Cel: 3216417184 - Email: contalasso36@gmail.com

Calendario lunar

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12			

Calidad del aire en Putumayo hoy

Detalle

15 Buena
$PM_{2.5}$ (7 µg/m³)


- Sin riesgo para la salud.
- Disfrute de sus actividades con normalidad

Gráficas del tiempo

Vídeos

Más Vídeos

CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIAS
Calle 21 Nº 28-50 - Barrió Las Cuadras – San Juan de Pasto
Cel: 3216417184 - Email: contalasso36@gmail.com

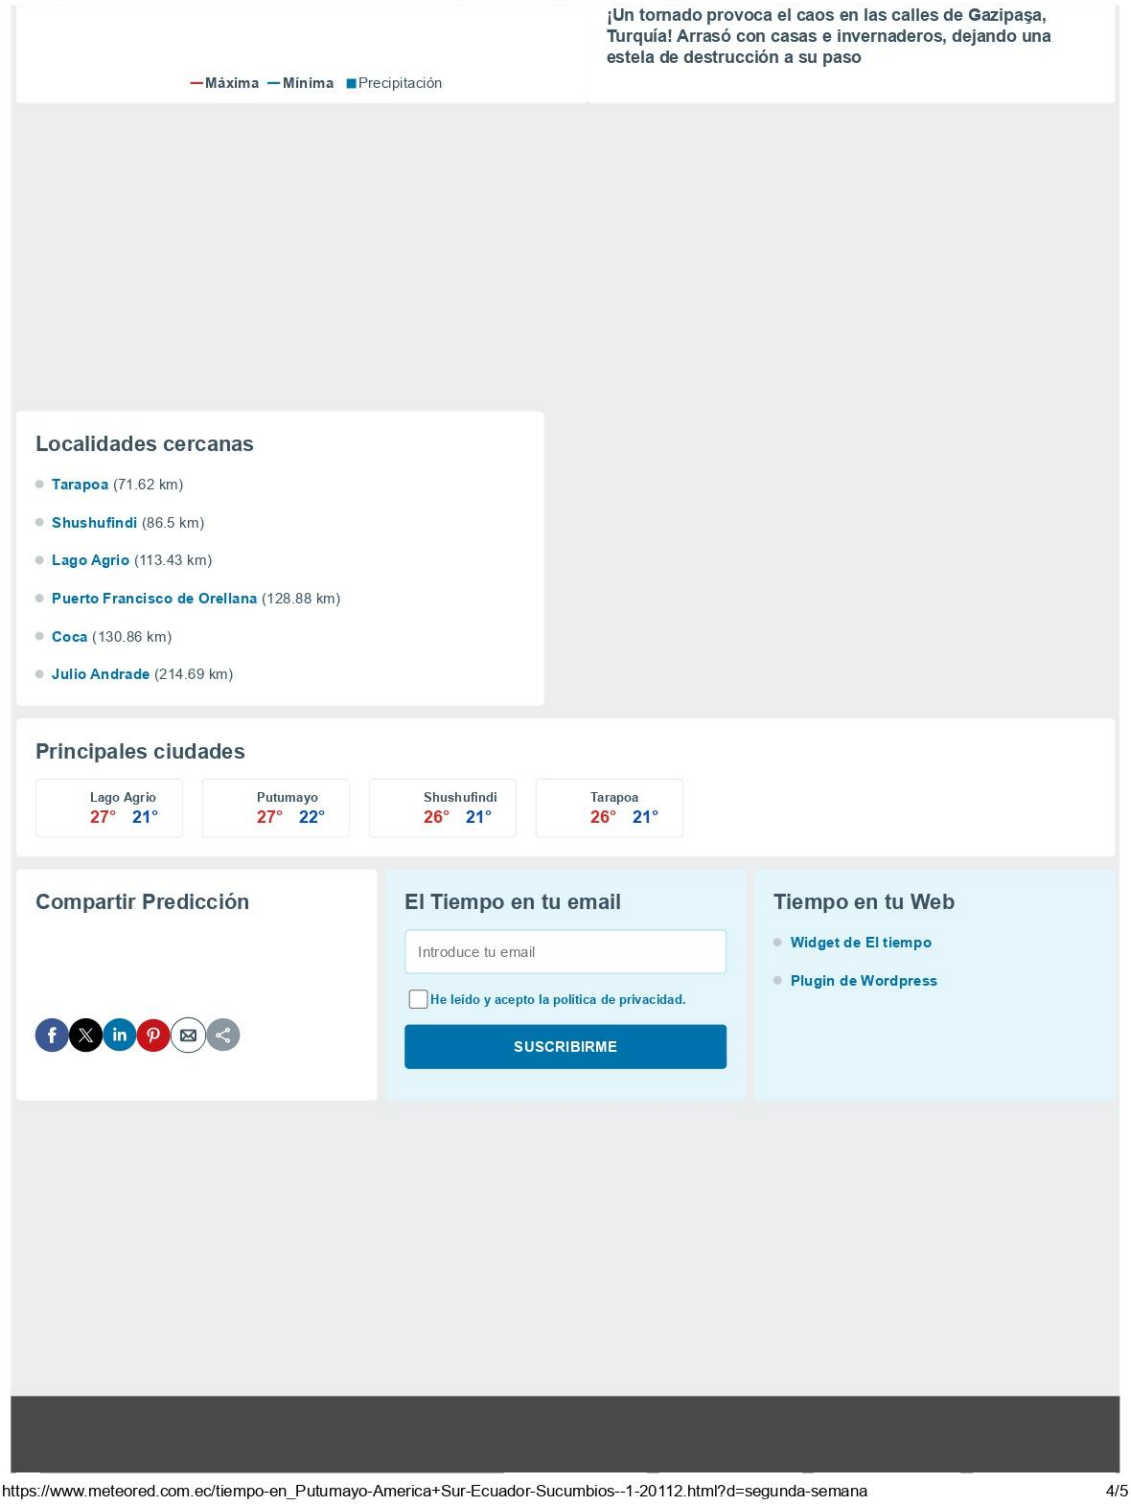
¡Un tornado provoca el caos en las calles de Gazipaşa, Turquía! Arrasó con casas e invernaderos, dejando una estela de destrucción a su paso
—Máxima —Mínima ■Precipitación
Localidades cercanas
Tarapoa (71.62 km)
Shushufindi (86.5 km)
Lago Agrio (113.43 km)
Puerto Francisco de Orellana (128.88 km)
Coca (130.86 km)
Julio Andrade (214.69 km)
Principales ciudades
Lago Agrio 27° 21°
Putumayo 27° 22°
Shushufindi 26° 21°
Tarapoa 26° 21°
Compartir Predicción
El Tiempo en tu email
Introduce tu email
He leído y acepto la política de privacidad.
SUSCRIBIRME
Tiempo en tu Web
Widget de El tiempo
Plugin de Wordpress

Descarga Gratis App Android meteored.com.ec
Descarga Gratis App iOS meteored.com.ec
Descarga Gratis App Huawei meteored.com.ec
Descarga Gratis App Windows 10 meteored.com.ec

Contacto | Sobre nosotros | FAQ | Nota Legal | Cookies | Política Privacidad | Configuración de privacidad

2025 Meteored. Todos los derechos reservados

Por lo anteriormente relacionado, le solicito a la Interventoría que apruebe la solicitud de suspensión realizada por un tiempo prudente mientras las condiciones climáticas en el departamento mejoran para continuar con la ejecución de las actividades y culminar la ejecución del 100% del proyecto y quedar en feliz término.

Atentamente agradecido;

ING. WILSON JAVIER LASSO DELGADO
R/L UNION TEMPORAL PUENTE GUZMÁN 2023
Contratista de Obra
