Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE EDUH-APARTADÓ

Nit: 901445176-0

COMPROBANTE DE EGRESO N. 000384

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00323	11/09/2024

Fecha de Expedición: 12/09/2024

Nit ò Cedula:	900.610.809
Beneficiario:	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Concepto de este Egreso

PAGP FACTURAS FEV 35.- FEV 36 "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N °4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**250.644.218,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	250.644.218,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	250.644.218,00
CCPET04 - TERCEROS	217205172	CHIGORODO	250.644.218,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	250.644.218,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402041	Via terciaria mejorada	250.644.218,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	250.644.218,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	250.644.218,00
CCPET85 - CONVENIOS	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	250.644.218,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	250.644.218,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	250.644.218,00
			TOTAL:	**250.644.218,00**

Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_eduh_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: pedro luis berrio serna, el día: jueves, 12 de septiembre de 2024 siendo las: 17:41:36

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE EDUH-APARTADÓ

Nit: 901445176-0

Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat

250.644.218,00	42.609.517,06	208.034.700,94

Valor en letras:

DOSCIENTOS OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
393700147191	CI 139-2024 Vias tercerias	0000EGR384	208.034.700,94

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	5.012.884,36
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	2.506.442,18
TASA PRO-DEPORTE	2,00	5.012.884,36
IMPUESTO DE SEGURIDAD	5,00	12.532.210,90
RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES	2,00	5.012.884,36
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	10.025.768,72
RETE ICA	1,00	2.506.442,18

GERENTE

Firma del Interesado(a)

Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_eduh_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: pedro luis berrio serna, el día: jueves, 12 de septiembre de 2024 siendo las: 17:41:36

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa
EMPRESA PARA EL DESAF

Administración

Compras por internet

Pagos
Pago a Proveedores
- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas
- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Inscripciones

Transferencias, Usos y Avances

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión
Cerrar Sesión



Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) PEDRO LUIS BERRIO SERNA**

26 de Septiembre del 2024 - 08:53

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO

Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	49464064	Nombre Proceso de Pago	PAGO FACT FEV35- FEV36 CI MEJORAM VIAS CHIGORODO
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 208.034.700,94
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	900610809
Nombres	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	549****1692
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 208.034.700,94
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.55.01
Pagos v6.55.01

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00323

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00232	29/07/2024

Fecha de Expedición: 11/09/2024

Nit ò Cedula:	900.610.809
Beneficiario:	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Por Concepto de:

PAGP FACTURAS FEV 35.- FEV 36 "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**250.644.218,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	250.644.218,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	250.644.218,00
CCPET04 - TERCEROS	217205172	CHIGORODO	250.644.218,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	250.644.218,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402041	Via terciaria mejorada	250.644.218,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	250.644.218,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	250.644.218,00
CCPET85 - CONVENIOS	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	250.644.218,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	250.644.218,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	250.644.218,00
			TOTAL:	**250.644.218,00**

Valor en letras:

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	5.012.884,36
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	2.506.442,18
TASA PRO-DEPORTE	2,00	5.012.884,36
IMPUESTO DE SEGURIDAD	5,00	12.532.210,90
RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES	2,00	5.012.884,36
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	10.025.768,72
RETE ICA	1,00	2.506.442,18

Total IVA
0,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
250.644.218,00	42.609.517,06	208.034.700,94

GERENTE

DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.

NIT: 900610809-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

DG 99 131 76, Apartadó, Antioquia, Colombia

Tel. 3106444148

Email. elianacamargo1972@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764059324940 válida desde 2023-11-03 hasta 2024-11-03 rango desde FEV16 hasta FEV1000.

Cliente: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT : 901445176
Dirección: CL 97 104 01, Apartadó, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3146858452
Email: financiera@eduha.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEV35**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:54:16-05:00**
FECHA FIRMADO: **04/09/2024 09:54:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	09	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDADA LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..	94	1,00	$139.248.386,27				0,00	$139.248.386,27
2	10	Administración 30%	EA	1,00	$41.774.515,88				0,00	$41.774.515,88

Notas:
CONTRATO EDUH-034 / 25 DE JULIO DE 2024

SON: (ciento ochenta y un millones veintidos mil novecientos dos pesos quince centavos)
CUFE: de35ac7f948a6a2cd17dbdc1bd8b70b1862014f219739e60dc21349deca2d734cd1a1e9d81d962df49c82098f39a0cc9

Subtotal:	$181.022.902,15
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$181.022.902,15

Firma Digital: IS79YBMvjChd/yterYAYwojKkBCABzeZxnf92/4JotiuoYsXTWxOzIrO3/6uk2PR uFm0WRDiN3gqdj+RBFCMamfHtlsfmqjZ:gGrC6Cknl2z77NRT c1iz9j/5iDU/ZX 1oV31KZEaglQ+lZa+8uPU9zfWZcAoQMYmSGw9bp7ShFm9amqXirJmiNFpv6CR4tZ SsQPICgkVc72gyw/sbShesDwL1A2eWZxNu E3fkQERWYFkJtO6cXXD+C/RsKf62D +s9NSqjdt/ZE81mF4TXhl8U/FI128YL8414pK6N5P4dslQbBCxqvGDkoL5W7I+EG 2SvVCj0ch7x0qHt27h50 1A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.

NIT: 900610809-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

DG 99 131 76, Apartad??, Anticquia, Colombia

Tel. 3106444148

Email. elianacamargo1972@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764059324940 válida desde 2023-11-03 hasta 2024-11-03 rango desde FEV16 hasta FEV1000.

Cliente: EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT : 901445176
Dirección: CL 97 104 01, Apartad??, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3146858452
Email: financiera@eduha.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEV36**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **05:00:08**
FECHA FIRMADO: **04/09/2024 10:00:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	09	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDADA LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..	94	1,00	$69.621.315,75				0,00	$69.621.315,75

Notas:
CONTRATO EDUH-034 / 25 DE JULIO DE 2024

SON: (sesenta y nueve millones seiscientos veintiun mil trescientos quince pesos setenta y cinco centavos)
CUFE: 6256592b6f698a6dde0d36943ac04983552e17b689421aec5617f4220118ea4830c4e89e0c4561c15631b227f3b94ab3

Subtotal:	$69.621.315,75
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$69.621.315,75

Firma Digital: h9AjWrRHdydEuYcoAejH556n+Oyqn+jqjRiG+u4Z51Nry5zKTdhIZM2KZne51Qrc 1/Miu6cU5p+7g/DGTkcPoRhtIOid8/YoxmlPQFO10JUk7Wd//i 9eXgPqM4QxlLih vGMeFbZHgDK4AJD59FxYglbpkHdGr4IwD1UBOEBpY33byyGMbLUUW2nrmb9bVab4 WUzIw3jiK83ICRUxYrjtW6NvqhuQ+2IGdrR eZRZdTCIxpER385KHqCAmlrfksQ+E Jv5n2ZQcQ21evmFnueHC1o9K4OcKZGkKhSa67CRWhg+pGveR+EE84axvGEW528sp aK8dyh1O7Akw63urf4FW Bg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.

NIT: 900610809-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

DG 99 131 76, Apartadó, Antioquia, Colombia

Tel. 3106444148

Email. elianacamargo1972@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764059324940 válida desde 2023-11-03 hasta 2024-11-03 rango desde FEV16 hasta FEV1000.

Cliente:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT :	901445176
Dirección:	CL 97 104 01, Apartadó, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3146858452
Email:	financiera@eduha.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV35**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:54:16-05:00**
FECHA FIRMADO:	**04/09/2024 09:54:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	09	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDADA LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..	94	1,00	$139.248.386,27				0,00	$139.248.386,27
2	10	Administración 30%	EA	1,00	$41.774.515,88				0,00	$41.774.515,88

Notas:
CONTRATO EDUH-034 / 25 DE JULIO DE 2024

SON: (ciento ochenta y un millones veintidos mil novecientos dos pesos quince centavos)
CUFE: de35ac7f948a6a2cd17dbdc1bd8b70b1862014f219739e60dc21349deca2d734cd1a1e9d81d962df49c82098f39a0cc9

Subtotal:	$181.022.902,15
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$181.022.902,15

Firma Digital: IS79YBMvjChd/yterYAYwojKkBCABzeZxnf92i4JotiuoYsXTWxOzIrO3/6uk2PR uFm0WRDiN3gqdj+RBFOMamfHitfsfmqjZcgGrC6Cknl2z77NRT c1iz9j/5iDU/ZX 1oV31KZEagIQ+IZa+8uPU9zfWZcAoQMYmSGw9bp7ShFm9amqXlrJmiNFpv6CR4tZ SsQPICgkVc72cyw/sbSbhe6DwL1A2eWZxNu E3fkQERWYFkJtO6cXXD+C/RsKf62D +s9NSqjdt/ZE81mF4TXhI8U/FI128YL8414pK6N5P4dslQbBCxqvGDkoL5W7l+EG 2SVVCj0dh7x0qHt27tF0 1A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.

NIT: 900610809-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

DG 99 131 76, Apartadó, Antioquia, Colombia

Tel. 3106444148

Email. elianacamargo1972@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764059324940 válida desde 2023-11-03 hasta 2024-11-03 rango desde FEV16 hasta FEV1000.

Cliente:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT :	901445176
Dirección:	CL 97 104 01, Apartadó, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3146858452
Email:	financiera@eduha.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV36**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:00:08-05:00**
FECHA FIRMADO:	**04/09/2024 10:00:11**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	09	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDADA LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..	94	1,00	$69.621.315,75				0,00	$69.621.315,75

Notas:
CONTRATO EDUH-034 / 25 DE JULIO DE 2024

SON: (sesenta y nueve millones seiscientos veintiun mil trescientos quince pesos setenta y cinco centavos)
CUFE: 6256592b6f698a6dde0d36943ac04983552e17b689421aec5617f4220118ea4830c4e89e0c4561c15631b227f3b94ab3

Subtotal:	$69.621.315,75
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$69.621.315,75

Firma Digital: h9AjWrRHdydEuYcoAejH556n+Oyqn+jqjRiG+u4Z51Nry5zKTdhIZM2KZne51Qrc 1/Miu6cU5p+7g/DGTkcPoRhtIOjd8/YoxmlPQFO10JUk7Wd//i 9eXgPqM4QxlLih vGMeFbZHgDK4AJD59FxYglbpkHdGr4lwD1UBOEBpY33byyGMbLUUW2nrmb9bVab4 WUzlw3jiK83lQRUxYrjtW6NvqhuQ+2IGdrR eZRZdTCIxpER385KHqCAmlrfksQ+E Jv5n2ZQcQ21evmFnueHC1o9K4OcKZGkKhSa67CRWhg+pGveR+EE84axvGEW528sp aK8dyh1O7Akw63url4FW Bg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

Certificado
Bancario

Jueves, 27 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISEÑOS,INGENIERIA Y CONSTRUCC identificado(a) con NIT 900610809, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	54997021692	2013/05/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

JHULIETT ALEXANDRA JIMENEZ FRANCO

CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, bajo gravedad de juramento:

CERTIFICO

Que **DISEÑOS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S**

NIT 900.610.809

Ha dado cumplimiento oportuno y completo durante los últimos seis (6) meses, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide a solicitud del interesado a los seis (6) días del mes de Septiembre del dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

Alexandra Jiménez
CONTADORA

Tp 324593-T

301 3105166 j.francoalexa@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

324593-T



JHULIETT ALEXANDRA
JIMENEZ FRANCO
C.C. 1088307333
RES. INSCRIPCION 189 DEL 10/04/2024
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

374886 384381

Powered by CamScanner

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

301 3105166 j.francoalexa@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHULIETT ALEXANDRA JIMÉNEZ FRANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088307333 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 324593-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	751971442	9469648650	E	2024/07/04	2024/07/04	BANCOLOMBIA	0	$5,253,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION															SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,728,600						$682,500	
																				$2,728,600						$682,500	
																				$2,728,600						$682,500	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$43,334	16%	SIN RIESGO	$7,000	$0	$0	$0	$0	$0	$7,000		NUEVA E.P.S.	1	$43,334	4%	$1,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$86,667	16%	SIN RIESGO	$13,900	$0	$0	$0	$0	$0	$13,900		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	2	$86,667	4%	$3,500	
						$1,755,470	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,755,470	16%	SIN RIESGO	$280,900	$0	$0	$0	$0	$0	$280,900		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,755,470	4%	$70,300	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	21	$910,000	16%	SIN RIESGO	$145,600	$0	$0	$0	$0	$0	$145,600		NUEVA E.P.S.	21	$910,000	4%	$36,400	
						$1,605,000	No	Fijo	COLFONDOS	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		COOSALUD MOVILIDAD	2	$107,000	4%	$4,300	
						$2,750,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$183,334	16%	SIN RIESGO	$29,400	$0	$0	$0	$0	$0	$29,400		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	2	$183,334	4%	$7,400	
						$1,605,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		SAVIA SALUD	2	$107,000	4%	$4,300	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$86,667	16%	SIN RIESGO	$13,900	$0	$0	$0	$0	$0	$13,900		COOSALUD MOVILIDAD	2	$86,667	4%	$3,500	
						$1,605,000	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		SAVIA SALUD	2	$107,000	4%	$4,300	
						$1,605,000	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		SAVIA SALUD	2	$107,000	4%	$4,300	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,213,334	16%	SIN RIESGO	$194,200	$0	$0	$0	$0	$0	$194,200		NUEVA E.P.S.	28	$1,213,334	4%	$48,600	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	24	$1,040,000	16%	SIN RIESGO	$166,400	$0	$0	$0	$0	$0	$166,400		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	24	$1,040,000	4%	$41,600	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	6	$260,000	16%	SIN RIESGO	$41,600	$0	$0	$0	$0	$0	$41,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	6	$260,000	4%	$10,400	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	27	$1,170,000	16%	SIN RIESGO	$187,200	$0	$0	$0	$0	$0	$187,200		SAVIA SALUD	27	$1,170,000	4%	$46,800	
						$1,605,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		SAVIA SALUD	2	$107,000	4%	$4,300	
						$1,605,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		SAVIA SALUD	2	$107,000	4%	$4,300	
						$1,605,000	No	Fijo	PROTECCION	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	2	$107,000	4%	$4,300	
						$2,100,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$140,000	16%	SIN RIESGO	$22,400	$0	$0	$0	$0	$0	$22,400		NUEVA EPS MOVILIDAD	2	$140,000	4%	$5,600	
						$1,605,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		SAVIA SALUD	2	$107,000	4%	$4,300	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	27	$1,170,000	16%	SIN RIESGO	$187,200	$0	$0	$0	$0	$0	$187,200		NUEVA E.P.S.	27	$1,170,000	4%	$46,800	
						$2,100,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$140,000	16%	SIN RIESGO	$22,400	$0	$0	$0	$0	$0	$22,400		SAVIA SALUD	2	$140,000	4%	$5,600	
						$1,605,000	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		NUEVA E.P.S.	2	$107,000	4%	$4,300	
						$1,605,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		COOSALUD MOVILIDAD	2	$107,000	4%	$4,300	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	27	$1,170,000	16%	SIN RIESGO	$187,200	$0	$0	$0	$0	$0	$187,200		NUEVA E.P.S.	27	$1,170,000	4%	$46,800	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$682,500						$672,100						$1,169,800				$0		$0		$0		$0	
	$682,500						$672,100						$1,169,800				$0		$0		$0		$0	
	$682,500						$672,100						$1,169,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$1,800		COMFENALCO ANTIOQUIA	1	$43,334	4%	$1,800	ARL SURA	1	$43,334	6.96%	5	$3,100	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$3,500		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$86,667	4%	$3,500	ARL SURA	2	$86,667	6.96%	5	$6,100	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,755,470	4%	$70,300	ARL SURA	30	$1,755,470	6.96%	5	$122,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$36,400		COMFENALCO ANTIOQUIA	21	$910,000	4%	$36,400	ARL SURA	21	$910,000	6.96%	5	$63,400	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,400		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$183,334	4%	$7,400	ARL SURA	2	$183,334	6.96%	5	$12,800	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$3,500		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$86,667	4%	$3,500	ARL SURA	2	$86,667	6.96%	5	$6,100	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$48,600		COMFENALCO ANTIOQUIA	28	$1,213,334	4%	$48,600	ARL SURA	28	$1,213,334	6.96%	5	$84,500	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,300,000	4%	$52,000	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$41,600		COMFENALCO ANTIOQUIA	24	$1,040,000	4%	$41,600	ARL SURA	24	$1,040,000	6.96%	5	$72,400	24	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$10,400		COMFENALCO ANTIOQUIA	0	$0	4%	$0	ARL SURA	6	$260,000	0%	5	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,800		COMFENALCO ANTIOQUIA	27	$1,170,000	4%	$46,800	ARL SURA	27	$1,170,000	6.96%	5	$81,500	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$5,600		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$140,000	4%	$5,600	ARL SURA	2	$140,000	6.96%	5	$9,800	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,300,000	4%	$52,000	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,300,000	4%	$52,000	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,800		COMFENALCO ANTIOQUIA	27	$1,170,000	4%	$46,800	ARL SURA	27	$1,170,000	6.96%	5	$81,500	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$5,600		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$140,000	4%	$5,600	ARL SURA	2	$140,000	6.96%	5	$9,800	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$52,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$1,300,000	4%	$52,000	ARL SURA	30	$1,300,000	6.96%	5	$90,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,800		COMFENALCO ANTIOQUIA	27	$1,170,000	4%	$46,800	ARL SURA	27	$1,170,000	6.96%	5	$81,500	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI

aportes en línea

Planilla Integrada

EMPLEADO									NOVEDADES																															
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
29	CC	1128024001	TORRES OCORO EIDYN YECID	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/16	X	2024/06/17																							
30	CC	71269788	VARGAS SALGADO DARIO MANUEL	Dependiente	0	No	No				X	2024/06/28																							
31	CC	1007524415	VILLALBA SERRANO LUIS FERNANDO	Dependiente	0	No	No		X	2024/06/21	X	2024/06/22																							

Total **Afiliados(30)**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	751971442	9469648650	E	2024/07/04	2024/07/04	BANCOLOMBIA	0	$5,253,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	$2,728,600	$0	$0	$2,728,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$17,200	$0	$0	$17,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$453,800	$0	$0	$453,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$2,240,400	$0	$0	$2,240,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$17,200	$0	$0	$17,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,169,800	$0	$0	$1,169,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$1,169,800	$0	$0	$1,169,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$672,100	$0	$0	$672,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	30	$672,100	$0	$0	$672,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				30	$682,500	$0	$0	$682,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$12,100	$0	$0	$12,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$186,100	$0	$0	$186,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$400,500	$0	$0	$400,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$5,600	$0	$0	$5,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$78,200	$0	$0	$78,200
TOTAL				30	$5,253,000	$0	$0	$5,253,000

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,605,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$107,000	16%	SIN RIESGO	$17,200	$0	$0	$0	$0	$0	$17,200		NUEVA E.P.S.	2	$107,000	4%	$4,300	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	28	$1,213,334	16%	SIN RIESGO	$194,200	$0	$0	$0	$0	$0	$194,200		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	28	$1,213,334	4%	$48,600	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$86,667	16%	SIN RIESGO	$13,900	$0	$0	$0	$0	$0	$13,900		NUEVA E.P.S.	2	$86,667	4%	$3,500	
																				$2,728,600						$682,500	

aportes en línea

Planilla Integrada

C	Total	EPS Destino	CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
			Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$4,300		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$107,000	4%	$4,300	ARL SURA	2	$107,000	6.96%	5	$7,500	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$48,600		COMFENALCO ANTIOQUIA	28	$1,213,334	4%	$48,600	ARL SURA	28	$1,213,334	6.96%	5	$84,500	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,500		COMFENALCO ANTIOQUIA	2	$86,667	4%	$3,500	ARL SURA	2	$86,667	6.96%	5	$6,100	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$682,500						$672,100						$1,169,800				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	718202366	9468773434	E	2024/06/06	2024/06/20	BANCOLOMBIA	14	$841,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																		
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct									
Sucursal: PRINCIPAL (12 Afiliados)																																												
Centro de Trabajo: 5(12 Afiliados)																																												
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA(12 Afiliados)																																												
1	CC	1028037768	BERRIO MARTINEZ YEIMER	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/27																																			
2	CC	1027941923	BUELVAS CADAVID KELLY JOHANA	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/23																																			
3	CC	1192800120	GRACIANO PORTILLO YIRLIANS ENRIQUE	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/27																																			
4	CC	98618588	HERNANDEZ JHON JAIRO	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/27																																			
5	CC	1001026602	HOYOS LOZANO ESNEIDER DAVID	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/27																																			
6	CC	1038805771	IBARGUEN ALVAREZ EVAN ALEXANDER	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/27																																			
7	CC	1192895766	MORALES PEÑAFIEL CRISTIAN DAVID	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/23																																			
8	CC	71988039	MUÑOZ FLOREZ JHON FREDY	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/23																																			
9	CC	1007446542	PALMERA HOYOS SAMIR YESID	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/27																																			
10	CC	1038805898	SANCHEZ MACHADO RAUL DAVID	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/27																																			
11	CC	8439586	SIERRA VELEZ ESNEIDER	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/27																																			
12	CC	71269788	VARGAS SALGADO DARIO MANUEL	Dependiente	0	No	No		X	2024/05/28																																			
Total		**Afiliados(12)**																																										

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$429,200						$107,800	
																				$429,200						$107,800	
																				$429,200						$107,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		NUEVA E.P.S.	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,755,470	No	Fijo	PORVENIR	8	$468,126	16%	SIN RIESGO	$75,000	$0	$0	$0	$0	$0	$75,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	8	$468,126	4%	$18,800	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		NUEVA E.P.S.	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		NUEVA E.P.S.	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		SAVIA SALUD	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	8	$346,667	16%	SIN RIESGO	$55,500	$0	$0	$0	$0	$0	$55,500		NUEVA E.P.S.	8	$346,667	4%	$13,900	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$346,667	16%	SIN RIESGO	$55,500	$0	$0	$0	$0	$0	$55,500		NUEVA E.P.S.	8	$346,667	4%	$13,900	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		NUEVA E.P.S.	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		NUEVA E.P.S.	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	4	$173,334	16%	SIN RIESGO	$27,800	$0	$0	$0	$0	$0	$27,800		NUEVA E.P.S.	4	$173,334	4%	$7,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	3	$130,000	16%	SIN RIESGO	$20,800	$0	$0	$0	$0	$0	$20,800		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	3	$130,000	4%	$5,200	
																				$429,200						$107,800	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$107,800						$107,800						$186,900				$0		$0		$0		$0	
	$107,800						$107,800						$186,900				$0		$0		$0		$0	
	$107,800						$107,800						$186,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$7,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$173,334	4%	$7,000	ARL SURA	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$18,800		COMFENALCO ANTIOQUIA	8	$468,126	4%	$18,800	ARL SURA	8	$468,126	6.96%	5	$32,600	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$173,334	4%	$7,000	ARL SURA	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$173,334	4%	$7,000	ARL SURA	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$173,334	4%	$7,000	ARL SURA	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$173,334	4%	$7,000	ARL SURA	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$13,900		COMFENALCO ANTIOQUIA	8	$346,667	4%	$13,900	ARL SURA	8	$346,667	6.96%	5	$24,200	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$13,900		COMFENALCO ANTIOQUIA	8	$346,667	4%	$13,900	ARL SURA	8	$346,667	6.96%	5	$24,200	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$173,334	4%	$7,000	ARL SURA	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$173,334	4%	$7,000	ARL SURA	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$7,000		COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$173,334	4%	$7,000	ARL SURA	4	$173,334	6.96%	5	$12,100	4	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$5,200		COMFENALCO ANTIOQUIA	3	$130,000	4%	$5,200	ARL SURA	3	$130,000	6.96%	5	$9,100	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$107,800						$107,800						$186,900				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	718202366	9468773434	E	2024/06/06	2024/06/20	BANCOLOMBIA	14	$841,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$429,200	$4,800	$0	$434,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$76,300	$900	$0	$77,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$352,900	$3,900	$0	$356,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$186,900	$2,100	$0	$189,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	$186,900	$2,100	$0	$189,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$107,800	$1,200	$0	$109,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	12	$107,800	$1,200	$0	$109,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$107,800	$1,300	$0	$109,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$31,000	$400	$0	$31,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$69,800	$800	$0	$70,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$7,000	$100	$0	$7,100
TOTAL				12	$831,700	$9,400	$0	$841,100

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71948267		CAMARGO ORTIZ JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 95A N.106-18	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	833928999	9471189358	I	2024/08/16	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$1,220,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION												SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 4.000.000	No		COLFONDOS	30	$ 4.000.000	16%	SIN RIESGO	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$ 4.000.000	12,5%	$ 500.000	$
																					$ 640.000						$ 500.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
.0	$ 500.000		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	$ 4.000.000	2%	$ 80.000		0	$ 0	0%	5	$ 0	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 500.000						$ 80.000						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

2024/08/21 09:04 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71948267		CAMARGO ORTIZ JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 95A N.106-18	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	833928999	9471189358	I	2024/08/16	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$1,220,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$0	$0	$640,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$640,000	$0	$0	$640,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				1	$1,220,000	$0	$0	$1,220,000

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	

No:	01 y Parcial	Fecha:	06	de	Septiembre	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato:	**CONTRATO DE OBRA**	**Nº:**	**EDUH-34 del 25 de julio de 2024**
Nº Compromiso Presupuestal	Nº 00232 del 29/07/2024	**Rubro Presupuestal:**	2.3.2.02.02.005
Objeto:	**CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**		
Interventor:	**N.A.**		
Supervisor:	**GIOVANY CORREA VALENCIA** PROFESIONAL UNIVERSITARIO - EDUH		
Contratista:	**DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** RL/ JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA		

Valor del contrato:	**SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)**
Duración del contrato:	**DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**

CONSIDERANDO:

- Que entre la **EICE-EDUH APARTADO** y **JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA**, identificado con la C. C. Nº 10.003.584, actuando como representante legal de **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S;** sociedad identificada tributariamente con el NIT 900.610.809 - 3 en calidad de contratista se celebró el CONTRATO DE OBRA Nº EDUH-34 de 2024, cuyo objeto es "***CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA***" por un valor de **SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)**.

- Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 29 de julio de 2024, quedando como fecha de terminación el día 13 de octubre de 2024.

- Que la **CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:**

  "...El valor del contrato se pagará mediante ACTAS PARCIALES conforme al avance porcentual de las actividades, pagaderos previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades realizadas por el contratista, autoliquidaciones del pago de salud, pensiones y riesgos laborales conforme a las disposiciones legales. Constancia de recibo a satisfacción del supervisor, acta de pago e informe del supervisor.

  Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. Para el pago final se debe presentar el acta de liquidación.

  Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Chigorodó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente la EICE – EDUH Apartadó y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

  Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los contratistas deberán acreditar el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

  Parágrafo 3: En el proceso de pagos se deberán tener en cuenta las Instrucciones dadas por la Subdirección Financiera y Contable del Municipio de Chigorodó, para la radicación de facturas o cuentas de cobro: La presentación de los documentos para inicio del trámite de pago se hará por medio del SECOP II y de forma física radicada al supervisor del contrato.

  Parágrafo 4: El contratista asumirá el costo de las retenciones a que tengan lugar en el Municipio de Chigorodó: 1. Estampilla procultura (2%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 194 y 200; 2. Estampilla bienestar adulto mayor (4%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 201 y 210; 3. Tasa prodeporte (2%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 211 y 214; 4. Estampilla prohospital (1%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 215 al 218; 5. Retención en la fuente: de acuerdo al Artículo 383 del Estatuto Tributario de Colombia. 6. Reteica: de conformidad al Artículo 93 del Acuerdo Municipal 008 de 2021; 7. Contribución obra pública (5%): de conformidad al Artículo 160 del Acuerdo Municipal 008 de 2021.

  Parágrafo 5: La periodicidad de los pagos se efectuará de conformidad con la certificación de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUH Apartadó.

  Parágrafo 6: La EICE EDUH - APARTADO no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte para el trámite y previa recepción de las obras a satisfacción por parte del contratante, o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato..."

- Que el interventor y/o supervisor recibe a satisfacción el servicio por parte del contratista.

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PAGADO	AMORTIZACION ANTICIPO (0%)	VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACIÓN	SALDO
1	Valor contrato	$619.016.362,00				$619.016.362,00
2	Acta Nº 1 y Parcial	$250.644.217,90	$0,00	$0,00	$250.644.217,90	$368.372.144,10

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.3.2.02.02.005	$619.016.362,00

ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M.L ($250.644.217,90)** correspondientes al Acta Nº 1 y Parcial, según tabla adjunta.

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EDUHA

JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
RL/ DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.
CONTRATISTA

Elaboró: Giovany Correa.
Reviso: Edgar Palacios.
Aprobó: Edgar Palacios.

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **MUNICIPIO DE CHIGORODO** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	eduh Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat APARTADÓ

Código: F-SIF-GB-25			
Versión: 0			
Fecha de Aprobación:			
Página: 1 de 1			
FECHA	21 (Día)	8 (Mes)	2024 (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: RURAL **BARRIO ó SECTOR:** BARRANQUILLITA **ACTA Nª** 1

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : EDUH- 034 / 25 DE JULIO DE 2024 **PLAZO INICIAL:** DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

OBJETO: CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 29/07/2024 (Indique día/mes/año) **FECHA TERMINACION DEL CONTRATO:** 13/10/2024

CONTRATISTA: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S., identificado con NIT. 900.610.809 – 3, representado legalmente por JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REINICIO:**

VALOR INICIAL $ 619.016.362 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) $ 619.016.362

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT.	VR TOTAL	ACTA 01		ACOMULADO	
1	**PRELIMINARES**								
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.399,00	$ 2.311	$ 10.166.089	1836,49	$ 4.244.128,39	1836,49	$ 4.244.128,39
	SUBTOTAL				**$ 10.166.089**		**$ 4.244.128,39**		**$ 4.244.128,39**
2	**ADECUACION DE TERRENO**								$ -
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	M3	659,85	$ 30.504	$ 20.128.064	642,770	$ 19.607.056,08	642,770	$ 19.607.056,08
2.2	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	320,00	$ 9.975	$ 3.192.000	183,65	$ 1.831.908,75	183,65	$ 1.831.908,75
2,3	RELLENO EN MATERIAL TIPO SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	439,90	$ 18.375	$ 8.083.163	275,47	$ 5.061.761,25	275,47	$ 5.061.761,25
	SUBTOTAL				**$ 31.403.227**		**$ 26.500.726,08**		**$ 26.500.726,08**
3	**PAVIMENTO**						$ 0,00		$ -
3.1	PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,18 (3.000 PSI), INCLUYE CURADO CON ANTISOL Y ACABADO TEXTURIZADO	M2	4.399,00	$ 50.400	$ 221.709.600	1836,49	$ 92.559.096,00	1836,49	$ 92.559.096,00
3.2	JUNTA DE DILATACIÓN CON PAVIFLEX	ML	2.296,33	$ 3.360	$ 7.715.680		$ 0,00	0,00	$ -
	SUBTOTAL				**$ 229.425.280**		**$ 92.559.096,00**		**$ 92.559.096,00**
4	**ACERO DE REFUERZO**						$ 0,00		$ -
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=5/8" CORRUGADO	KG	863,20	$ 1.260	$ 1.087.632	405,18	$ 510.526,80	405,18	$ 510.526,80
4.2	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1" LISA	KG	3.541,33	$ 1.260	$ 4.462.080	2.886,40	$ 3.636.864,00	2886,40	$ 3.636.864,00
	SUBTOTAL				**$ 5.549.712**		**$ 4.147.390,80**		**$ 4.147.390,80**
5	**BORDILLOS**						$ 0,00		$ -

5.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.660,00	$ 12.600	$ 20.916.000	326	$ 4.107.600,00	326,00	$ 4.107.600,00
					$ 20.916.000		**$ 4.107.600,00**		**$ 4.107.600,00**
6	OBRAS						$ 0,00		$ -
6,1	REALCE DE MH	UN	10,00	$ 500.000	$ 5.000.000	5	$ 2.500.000,00	5	$ 2.500.000,00
6,2	REUBICACIÓN DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	UN	78,00	$ 68.363	$ 5.332.314	15	$ 1.025.445,00	15	$ 1.025.445,00
6,3	REUBICACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UN	78,00	$ 277.600	$ 21.652.800	15	$ 4.164.000,00	15	$ 4.164.000,00
	SUBTOTAL				**$ 31.985.114**		**$ 7.689.445,00**		**$ 7.689.445,00**
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 329.445.422		$ 139.248.386,27		$ 139.248.386,27
	ADMINISTRACION			30%	$ 98.833.627		$ 41.774.515,88		$ 41.774.515,88
	COSTO TOTAL (CT)				**$ 428.279.048**		**$ 181.022.902,15**		**$ 181.022.902,15**

3. MATERIALES DE CONFORMIDAD AL CONVENIO N° 23AS111B1191 POR MUNICIPIO

MATERIAL	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M3 (INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES)	VALOR TOTAL				
SUMINISTRO TRITURADO ¾"	728,00	Mt3	$ 86.677	**$ 63.100.856**	277,68	$ 24.068.469,36	$ 277,680	$ 24.068.469,36
SUMINISTRO ARENA PARA CONCRETO	558,00	Mt3	$ 81.363	**$ 45.400.554**	185,12	$ 15.061.918,56	$ 185,120	$ 15.061.918,56
SUB-BASE	375,00	Mt3	$ 73.389	**$ 27.520.875**	275,47	$ 20.216.467,83	$ 275,470	$ 20.216.467,83
SUBTOTAL -MATERIALES				**$ 136.022.285**		**$ 59.346.855,75**		**$ 59.346.855,75**

4, MATERIALES DE ALGUNAS ACTIVIDADES PARA TERMINAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONVENIO N° 4600016202 POR MUNICIPIO

MATERIAL	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M3 (INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES)	VALOR TOTAL				
SUMINISTRO TRITURADO ¾"	236	Mt3	$ 86.677	**$ 20.455.772**				$ -
SUMINISTRO ARENA PARA CONCRETO	210	Mt3	$ 81.363	**$ 17.086.230**				$ -
SUB-BASE	234	Mt3	$ 73.389	**$ 17.173.026**	140	$ 10.274.460,00	140	$ 10.274.460,00
SUBTOTAL -MATERIALES				**$ 54.715.028**		**$ 10.274.460,00**		**$ 10.274.460,00**
TOTAL MATERIALES ENTREGADOS DEPARTAMENTO - MUNICIPIO				**$ 190.737.313**		**$ 69.621.315,75**		**$ 69.621.315,75**
TOTAL MANO DE OBRA + EQUIPOS - HERRAMIENTAS + MATERIALES				**$ 619.016.361,5**		**$ 250.644.217,90**		**$ 250.644.217,90**
				$ 619.016.362		$ 250.644.217,90		$ 250.644.217,90

Valor Anticipo Otorgado	$ -
Valor Amortizado Presenta Acta	
Valor Amortizado Acumulado	$ -
Valor neto a pagar	$ 250.644.217,90

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica

	VALOR ACTA 01
ACTA 01	$ 250.644.217,90
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	
VALOR ANTICIPO	$ -
AMORTIZACION ANTICIPO	$ -
VALOR TOTAL ACTA N° 1	**$ 250.644.217,90**

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas y en las memorias de calculo (Obra, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman en el municipio de Apartadó, a los veintiun (21) días del mes de agosto de 2024

JOHN JAMES CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL
DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.
Contratista

EDGAR PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL
EDUH APARTADO
Gerente

GIOVANNY CORREA VALENCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
EDUH
Supervision

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS


eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADO

CONTRATANTE		No	Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


ITEM	1,1	NOMBRE DEL ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	UNIDADAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		21/08/2024		CANTIDAD CONTRATADA	4399

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
	carrera 1 entrada principal tramo lateral izquierdo de ancho 3mt	1	99,3	3							297,90
	carrera 1 entrada principal tramo puente calle segunda	1	101,5	5,3							537,95
	tramo carrera 2 parque lado oriente	1	73,4	5,3							389,02
	tramo carrera 3 entre pincipal y cancha tramo sur	1	74,1	5,3							392,73
	tramo calle entre carrera 2 y parqte tipo oriente occidente	1	41,3	5,3							218,89
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1836,49
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1836,49
										CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	1836,49
										CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	2562,51


REGISTRO FOTOGRAFICO 1

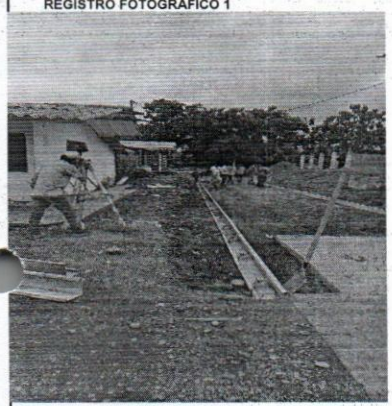

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

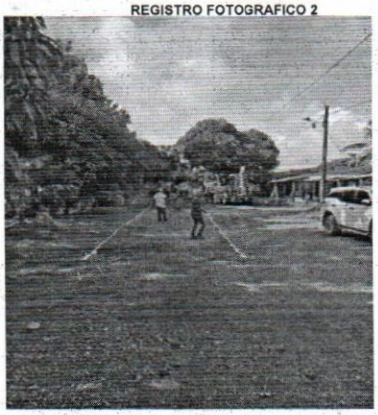

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

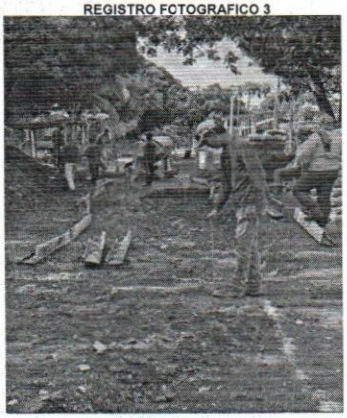

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5



NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADÓ

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


ITEM	2,1	NOMBRE DEL ITEM	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	UNIDADAD	699,85
FECHA DE ELABORACION:		21/08/2024		CANTIDAD CONTRATADA	M3

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3	Peso (kg)		SUBTOTAL
	carrera 1 entrada principal tramo lateral izquierdo de ancho 3mt	1	99,3	3	0,35						104,27
	carrera 1 entrada principal tramo puente calle segunda	1	101,6	5,3	0,35						188,28
	tramo carrera 2 parque lado oriente		73,4	5,3	0,35						136,16
	tramo carrera 3 entre pincipal y cancha tramo sur	1	74,1	5,3	0,35						137,46
	tramo calle entre carrera 2 y parqte tipo oriente occidente	1	41,3	5,3	0,35						76,61
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	642,77
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	642,77
										CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	642,77
										CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	57,08


REGISTRO FOTOGRAFICO 1




REGISTRO FOTOGRAFICO 2

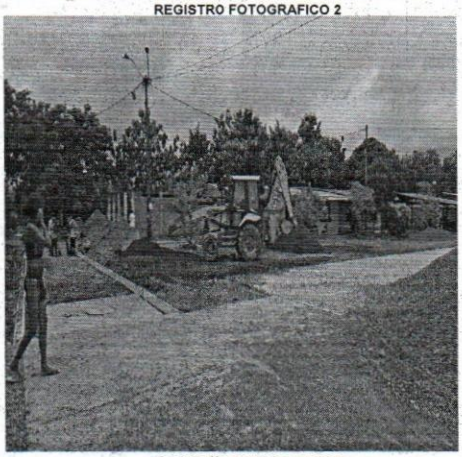

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

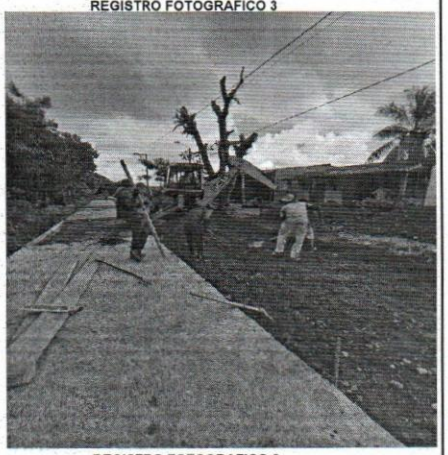


REGISTRO FOTOGRAFICO 4

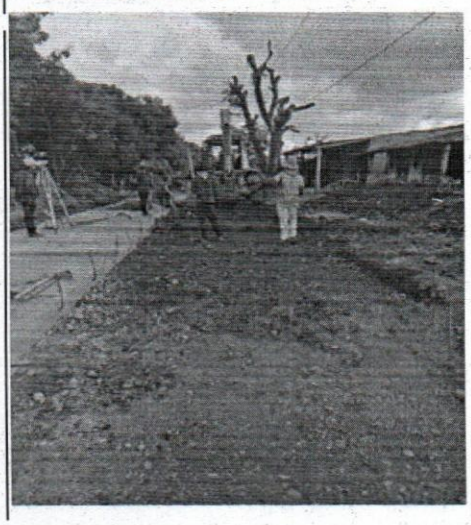

REGISTRO FOTOGRAFICO 5



REGISTRO FOTOGRAFICO 6

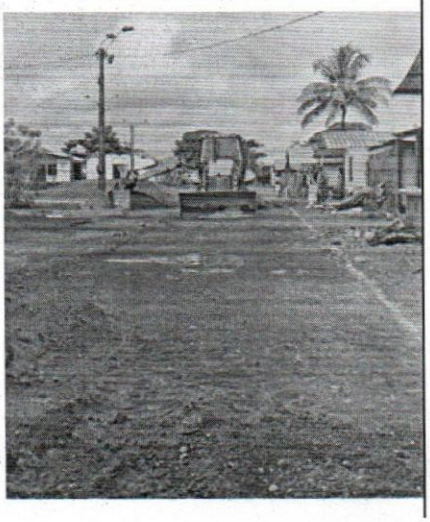


REGISTRO FOTOGRAFICO 7



REGISTRO FOTOGRAFICO 8



REGISTRO FOTOGRAFICO 9

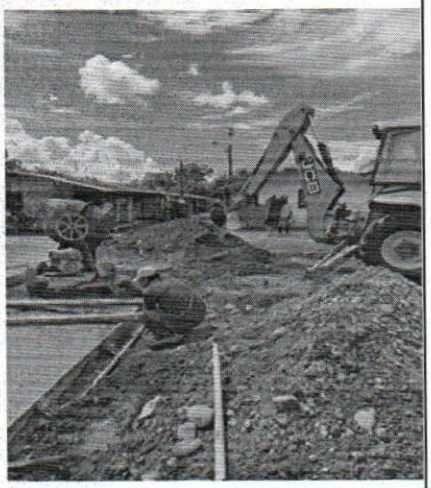

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADÓ

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	2,2	NOMBRE DEL ITEM	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	UNIDADAD	M3
FECHA DE ELABORACION:	21/08/2024			CANTIDAD CONTRATADA	320


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	h	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	cajas	SUBTOTAL
	carrera 1 entrada principal tramo lateral izquierdo de ancho 3mt	1	99,3	3	0,1						29,79
	carrera 1 entrada principal tramo puente calle segunda	1	101,5	5,3	0,1						53,80
	tramo carrera 2 parque lado oriente		73,4	5,3	0,1						38,90
	tramo carrera 3 entre pincipal y cancha tramo sur	1	74,1	5,3	0,1						39,27
	tramo calle entre carrera 2 y parqte tipo oriente occidente	1	41,3	5,3	0,1						21,89

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	183,65
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	183,65
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	183,65
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	136,35


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2

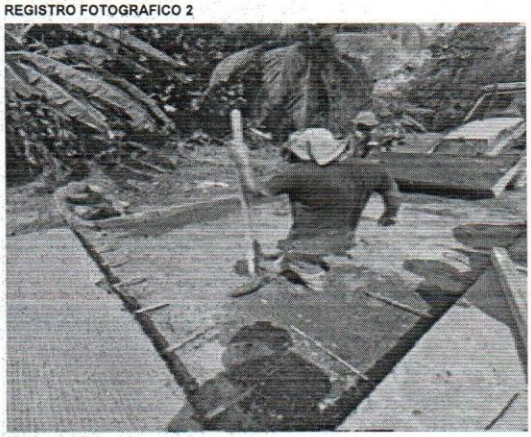

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

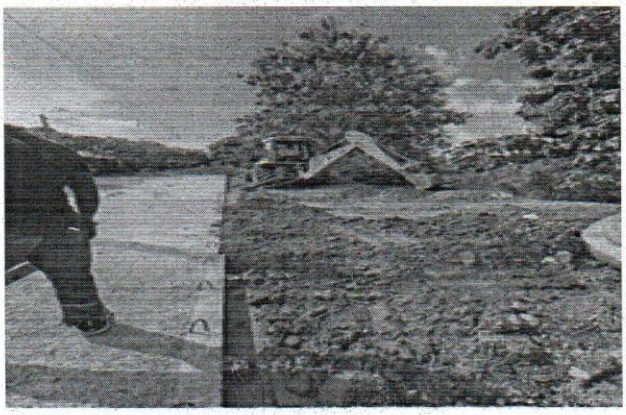

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADO

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA

ITEM	2,3	NOMBRE DEL ITEM	RELLENO EN MATERIAL TIPO SELECCIONADO Y COMPACTADO								UNIDADAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		21/08/2024									CANTIDAD CONTRATADA	439,9
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	h	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	cajas	SUBTOTAL
		carrera 1 entrada principal tramo lateral izquierdo de	1	99,3	3	0,15						44,69
		carrera 1 entrada principal tramo puente calle segunda	1	101,5	5,3	0,15						80,69
		tramo carrera 2 parque lado oriente		73,4	5,3	0,15						58,35
		tramo carrera 3 entre pincipal y cancha tramo sur	1	74,1	5,3	0,15						58,91
		tramo calle entre carrera 2 y parqte tipo oriente occidente	1	41,3	5,3	0,15						32,83
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		275,47
										CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		275,47
										CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO		164,43


REGISTRO FOTOGRAFICO 1




REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

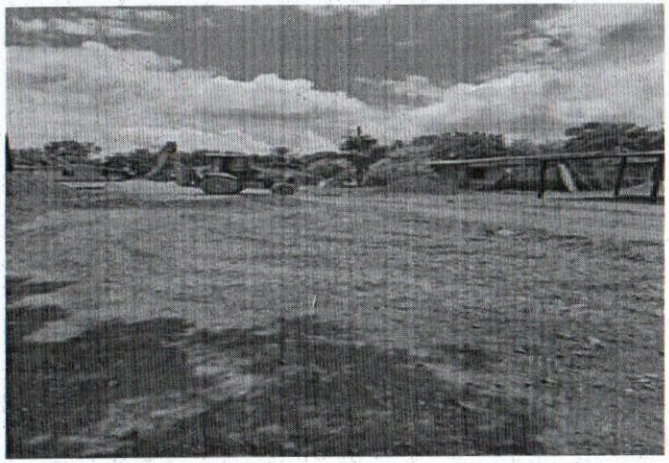

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

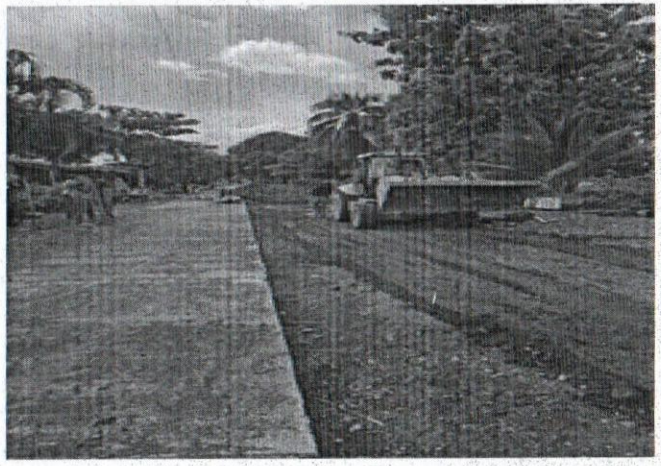

REGISTRO FOTOGRAFICO 5




REGISTRO FOTOGRAFICO 6



REGISTRO FOTOGRAFICO 9




REGISTRO FOTOGRAFICO 10

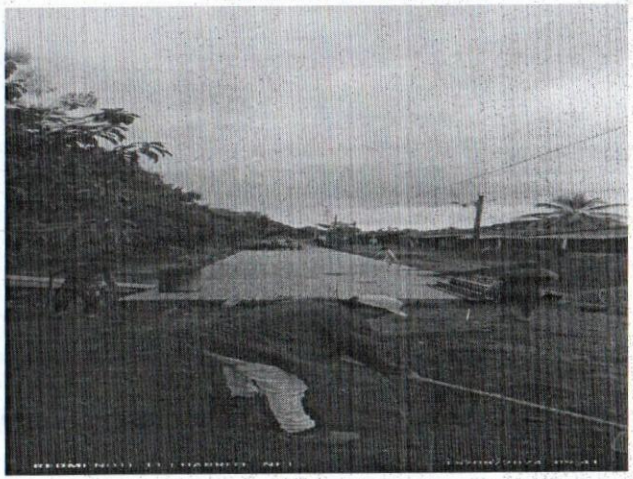

REGISTRO FOTOGRAFICO 11



REGISTRO FOTOGRAFICO 12

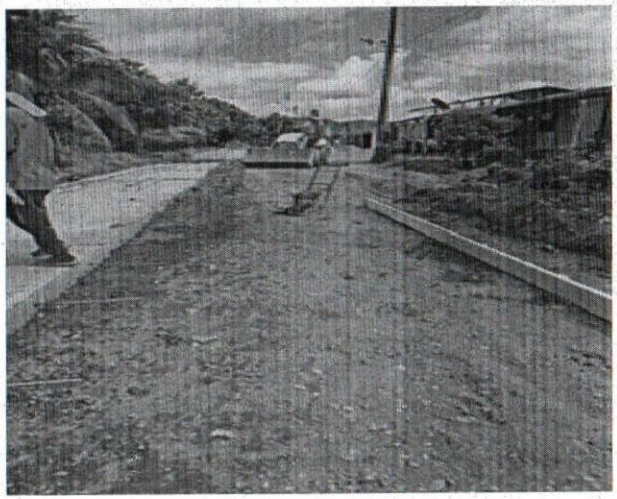

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS


eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADÓ

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS11181191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	3,1	NOMBRE DEL ITEM	PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,18 (3.000 PSI), INCLUYE CURADO CON ANTISOL Y ACABADO TEXTURIZADO	UNIDADAD	M2
FECHA DE ELABORACION:		21/08/2024		CANTIDAD CONTRATADA	4399

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
	carrera 1 entrada principal tramo lateral izquierdo de ancho 3mt	1	99,3	3							297,9
	carrera 1 entrada principal tramo puente calle segunda	1	101,5	5,3							537,95
	tramo carrera 2 parque lado oriente		73,4	5,3							389,02
	tramo carrera 3 entre pincipal y cancha tramo sur	1	74,1	5,3							392,73
	tramo calle entre carrera 2 y parqte tipo oriente occidente	1	41,3	5,3							218,89
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1836,49
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1836,49
										CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	1836,49
										CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	2562,51


REGISTRO FOTOGRAFICO 1

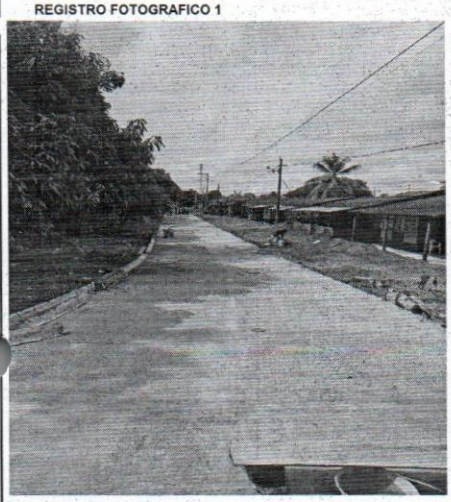


REGISTRO FOTOGRAFICO 2




REGISTRO FOTOGRAFICO 3

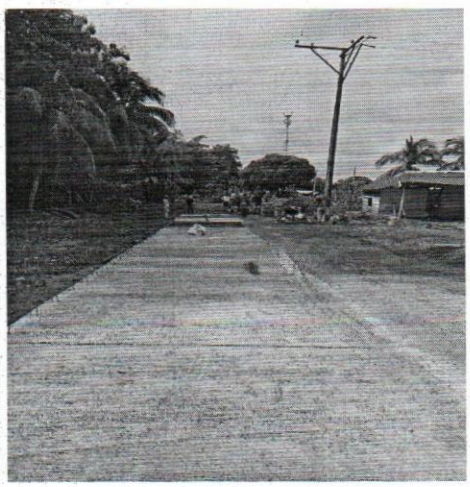


REGISTRO FOTOGRAFICO 4

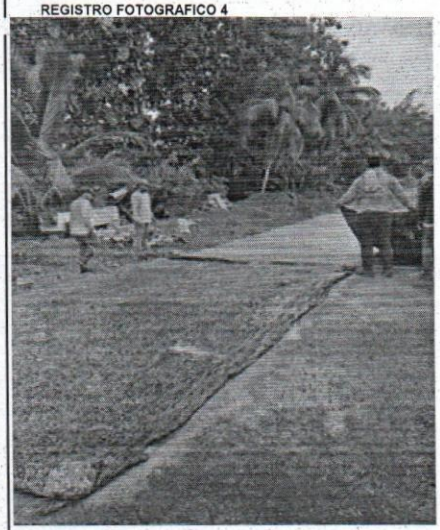


REGISTRO FOTOGRAFICO 5

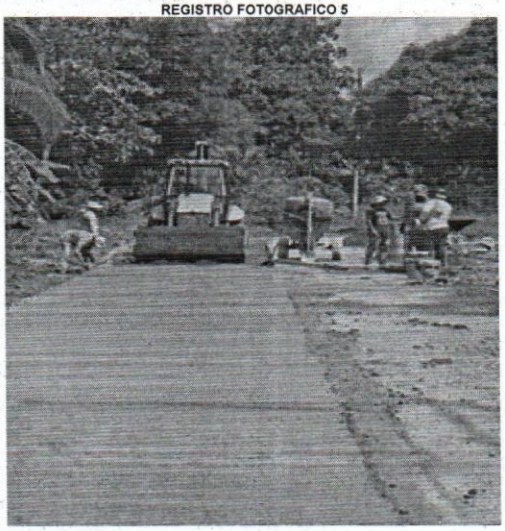

REGISTRO FOTOGRAFICO 6

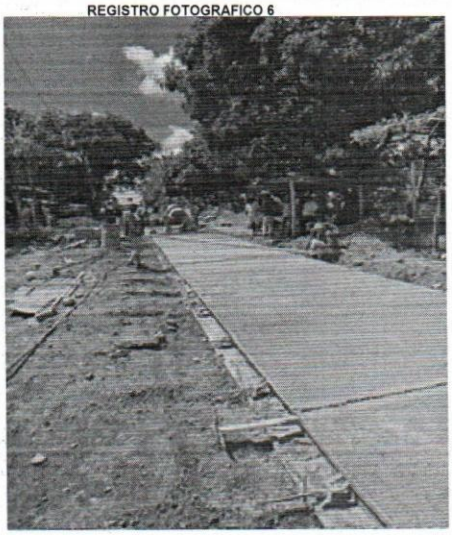


REGISTRO FOTOGRAFICO 7

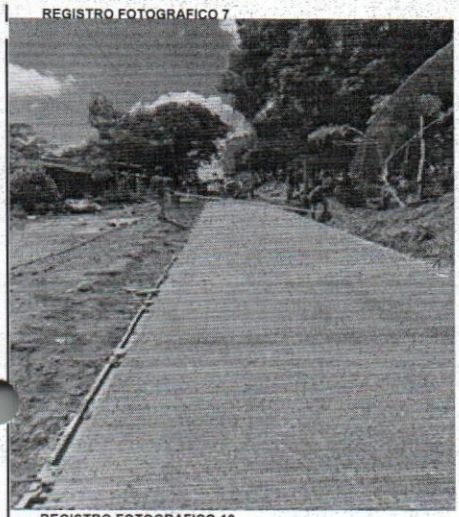


REGISTRO FOTOGRAFICO 8




REGISTRO FOTOGRAFICO 9

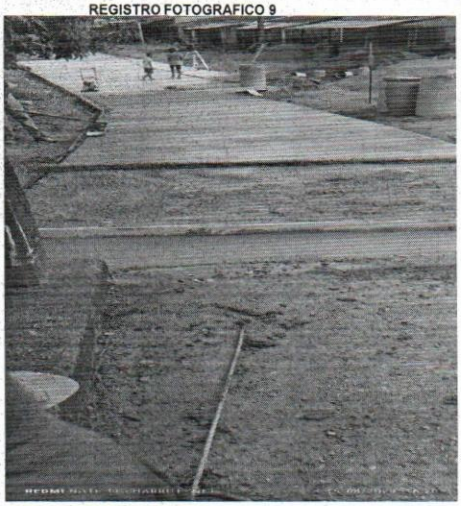


REGISTRO FOTOGRAFICO 10

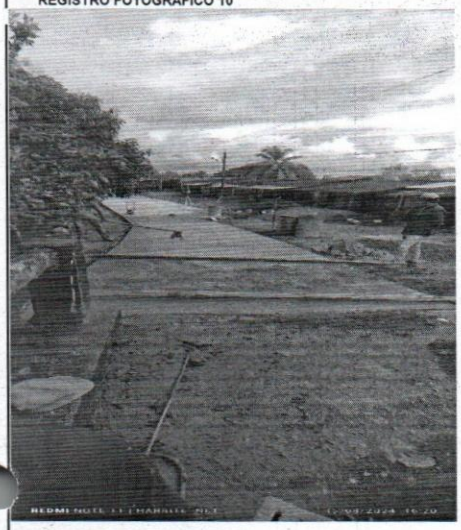


REGISTRO FOTOGRAFICO 11

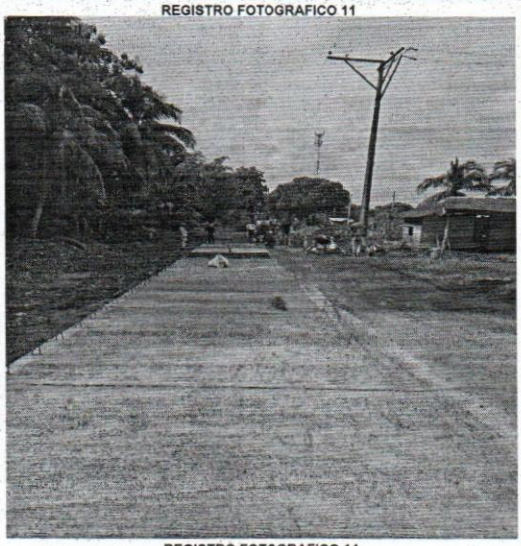


REGISTRO FOTOGRAFICO 12

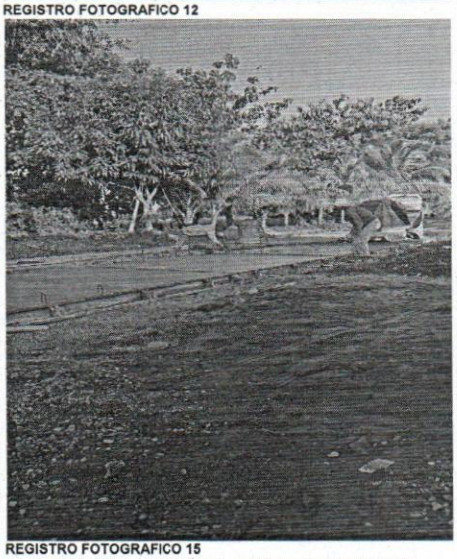


REGISTRO FOTOGRAFICO 13

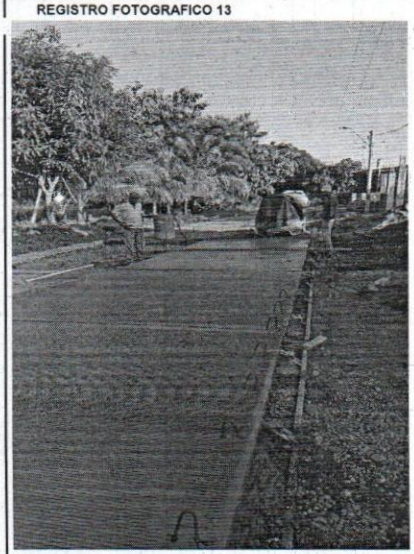


REGISTRO FOTOGRAFICO 14

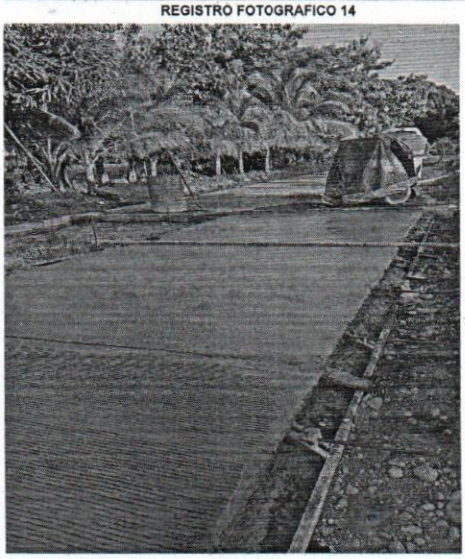


REGISTRO FOTOGRAFICO 15

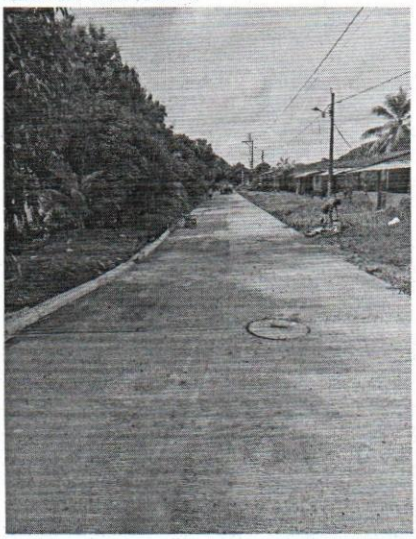


REGISTRO FOTOGRAFICO 16

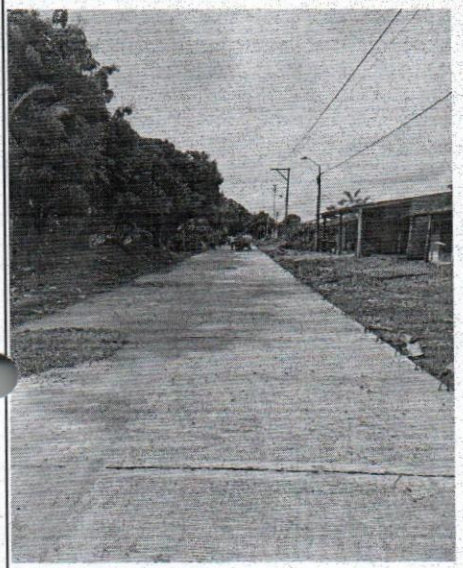

REGISTRO FOTOGRAFICO 17

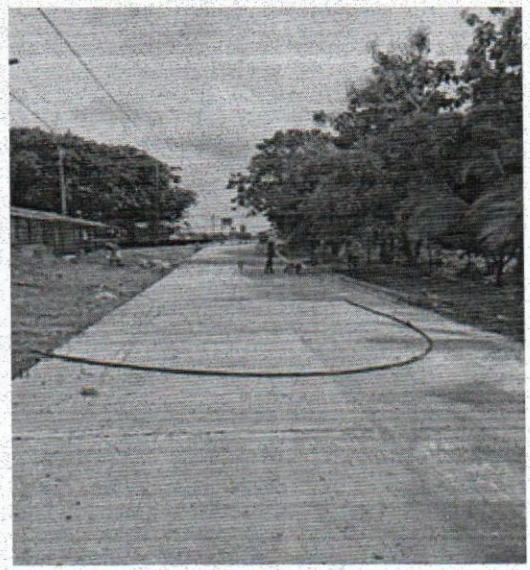

REGISTRO FOTOGRAFICO 18

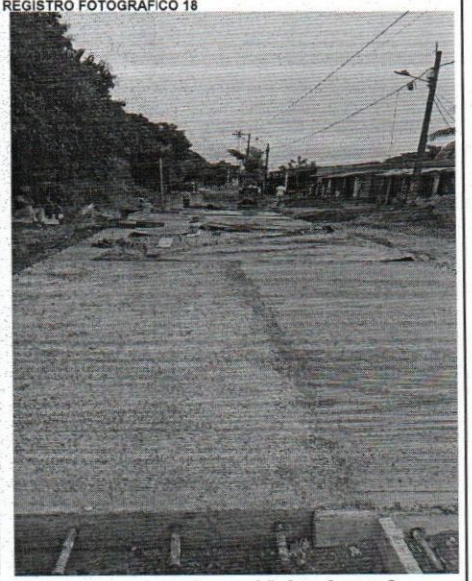

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADO

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA


ITEM	4,1	NOMBRE DEL ITEM	ACERO DE TRANSFERENCIA D=5/8" CORRUGADO	UNIDADAD	KG
FECHA DE ELABORACION:	21/08/2024			CANTIDAD CONTRATADA	863,2

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	separacion	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	SUBTOTAL
	carrera 1 entrada principal tramo lateral izquierdo de ancho 3mt	1	99,3	1,5		66,2			1,56	103,272
	carrera 1 entrada principal tramo puente calle segunda	1	101,5	1,5		67,7			1,56	105,56
	tramo carrera 2 parque lado oriente		73,4	1,5		48,9			1,56	76,336
	tramo carrera 3 entre pincipal y cancha tramo sur	1	74,1	1,5		49,4			1,56	77,064
	tramo calle entre carrera 2 y parqte tipo oriente occidente	1	41,3	1,5		27,5			1,56	42,952
									CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	405,18
									CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	405,18
									CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	405,18
									CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	458,02

REGISTRO FOTOGRAFICO 1




REGISTRO FOTOGRAFICO 2

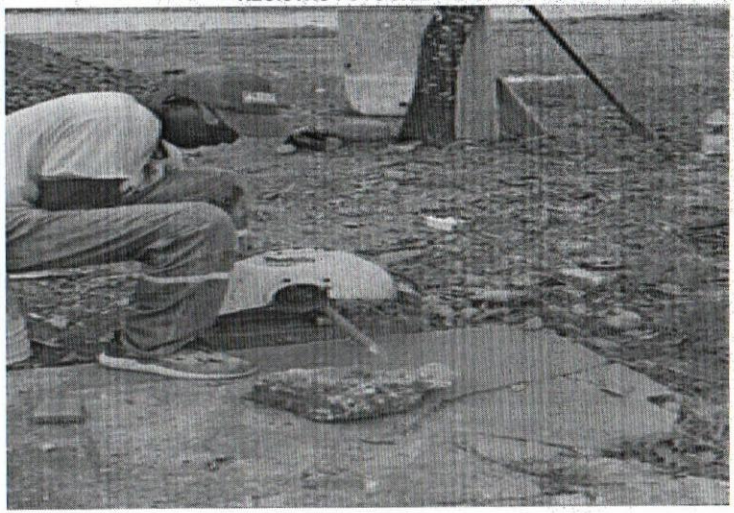

REGISTRO FOTOGRAFICO 3




REGISTRO FOTOGRAFICO 4

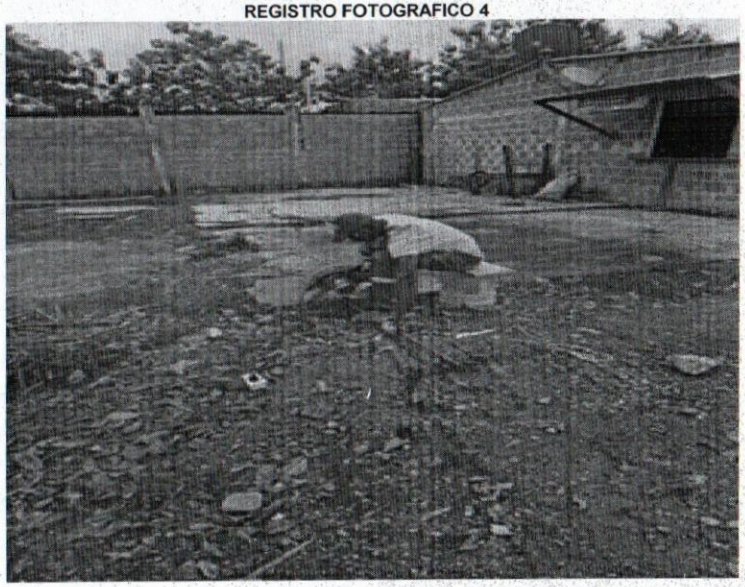

REGISTRO FOTOGRAFICO 5



REGISTRO FOTOGRAFICO 6

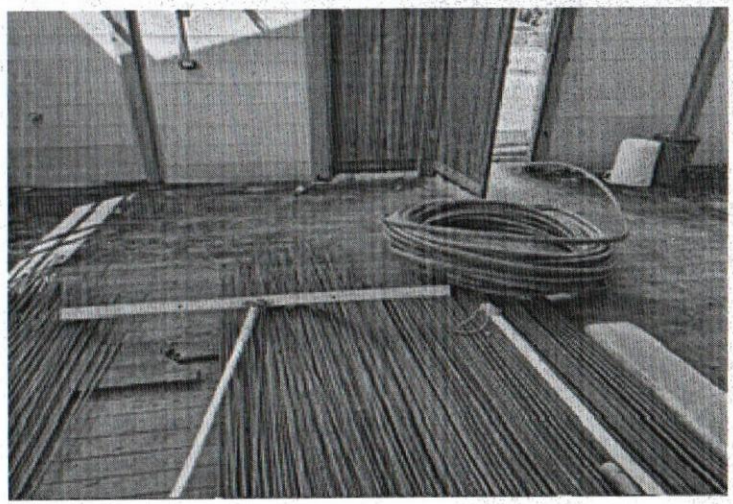

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	4.1	NOMBRE DEL ITEM	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1" LISA	UNIDADAD	KG
FECHA DE ELABORACION:		21/08/2024		CANTIDAD CONTRATADA	3541,33

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	separacion	Alto (m)	Cantidad	Numero de barras	largo barra	Peso (kg)		SUBTOTAL
	carrera 1 entrada principal tramo lateral izquierdo de	1	99,3	3		33,1	8	0,4	3,98		421,6
	carrera 1 entrada principal tramo puerte calle segunda	1	101,5	3		33,8	16	0,4	3,98		861,8
	tramo carrera 2 parque lado oriente		73,4	3		24,5	16	0,4	3,98		623,2
	tramo carrera 3 entre pincipal y cancha tramo sur	1	74,1	3		24,7	16	0,4	3,98		629,2
	tramo calle entre carrera 2 y parqte tipo oriente occidente	1	41,3	3		13,8	16	0,4	3,98		350,7

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		2886,40
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		2886,40
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		2886,40
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO		654,93

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5



NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADÓ


CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	5,1	NOMBRE DEL ITEM	BORDILLO DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UNIDADAD	ML
FECHA DE ELABORACION:		21/08/2024		CANTIDAD CONTRATADA	1660


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	SUBTOTAL
	calle entrada principal		216							216,00
	tramo calle parque lado oriente		110							110,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	326,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	326,00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	326,00
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	1334,00


REGISTRO FOTOGRAFICO 1

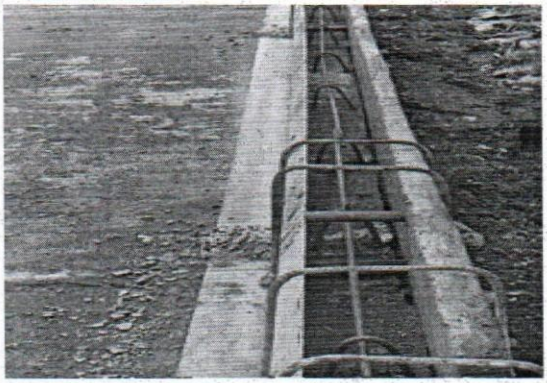

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

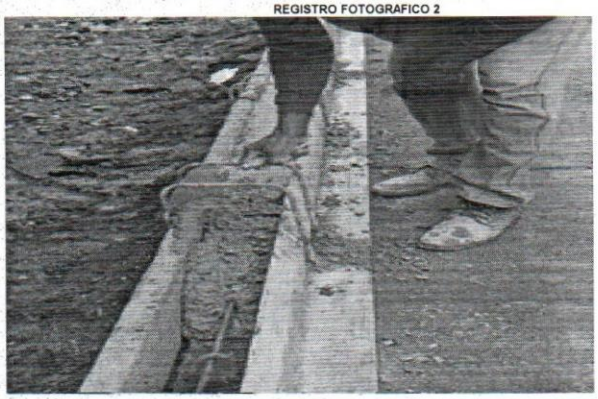

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

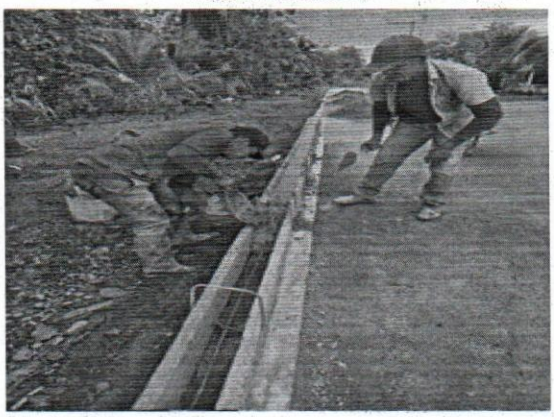


NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

REGISTRO FOTOGRAFICO 10

REGISTRO FOTOGRAFICO 7

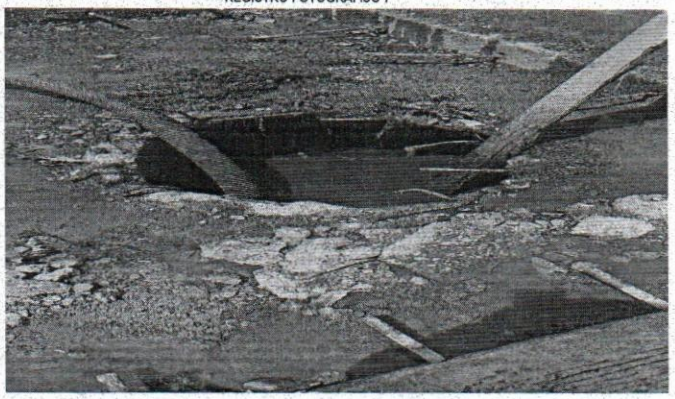

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA

ITEM	6.2	NOMBRE DEL ITEM	REUBICACIÓN DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	UNIDADAD	UN
FECHA DE ELABORACION:	21/08/2024			CANTIDAD CONTRATADA	78

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	SUBTOTAL
	calle parque					15				15,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	15,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	15,00
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	15,00
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	63,00

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



REGISTRO FOTOGRAFICO 4



NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA

ITEM	6.3	NOMBRE DEL ITEM	REUBICACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UNIDADAD	UN
FECHA DE ELABORACION:		21/08/2024		CANTIDAD CONTRATADA	78

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	SUBTOTAL
	calle parque					15				0,00
										15,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		15,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		15,00
								CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		15,00
								CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO		78,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termino	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS1118:191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA

ITEM		NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO TRITURADO ¾"	UNIDADAD	M3
FECHA DE ELABORACION:	21/08/2024			CANTIDAD CONTRATADA	728

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Volumen(m3)	volumen triturado	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
	carrera 1 entrada principal tramo lateral izquierdo de	1	99,3	3	0,18	53,622	0,84				45,04248
	carrera 1 entrada principal tramo puente calle segunda	1	101,5	5,3	0,18	96,831	0,84				81,33804
	tramo carrera 2 parque lado oriente		73,4	5,3	0,18	70,0236	0,84				58,819824
	tramo carrera 3 entre pincipal y cancha tramo sur	1	74,1	5,3	0,18	70,6914	0,84				59,380776
	tramo calle entre carrera 2 y parqie tipo oriente occidente	1	41,3	5,3	0,18	39,4002	0,84				33,096168
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				277,68
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA				277,68
							CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA				277,68
							CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO				450,32


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

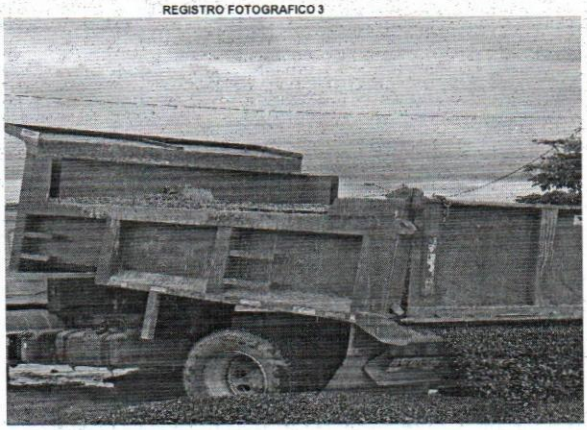

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS


MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADO

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 619.016.362	1	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 73AS111181191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA

ITEM		NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO ARENA PARA CONCRETO							UNIDADAD	M3
FECHA DE ELABORACION:		21/06/2024								CANTIDAD CONTRATADA	558
ESQUEMA ó DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Volumen(m3)	volumen arena	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
		carrera 1 entrada principal tramo lateral izquierdo de	1	99,3	3	0,18	53,62	0,56				30,0283
		carrera 1 entrada principal tramo puente calle segunda	1	101,5	5,3	0,18	96,83	0,56				54,2264
		tramo carrera 2 parque lado oriente		73,4	5,3	0,18	70,02	0,56				39,2132
		tramo carrera 3 entre pincipal y cancha tramo sur	1	74,1	5,3	0,18	70,69	0,56				39,5872
		tramo calle entre carrera 2 y parqte tipo oriente occidente	1	41,3	5,3	0,18	39,40	0,56				22,0641
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		185,12
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		185,12
										CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		185,12
										CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO		372,88

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

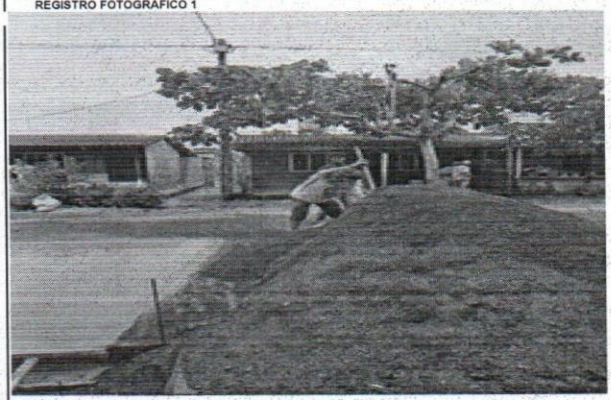

REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3



REGISTRO FOTOGRAFICO 4



NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

Seguimiento			X	Final	
Fecha:	06	de	SEPTIEMBRE	del	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	CONTRATO DE OBRA N° EDUH-34 DEL 25 DE JULIO DE 2024
Objeto:	**CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
Valor del contrato:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)
Plazo del contrato:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Interventor	N.A
Supervisor:	GIOVANY CORREA VALENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO EDUH
Por parte del contratista:	JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA RL/. DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina EICE-EDUH Apartadó

Hora de inicio (a.m./p.m.)	08:30 a.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	9:40 a.m.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
a) Asumir los costos ocasionados con el contrato de obra	40.49%	El contratista de obra asume los costos de obra inherentes a la ejecución del contrato (equipos, materiales, mano de obra, entre otros.)
b) Ejecutar las actividades de construcción con las características y especificaciones técnicas dentro del término, el sitio señalado y los requerimientos del municipio de Chigorodó.	40.49%	El contratista ejecuta las actividades conforme a las especificaciones técnicas y a las orientaciones de la Secretaria de Infraestructura Física y Valorización del municipio de Chigorodó y/o la EICE EDUH Apartadó.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

c) Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las dilataciones y obstáculos que se puedan presentar	40.49%	El contratista obra con lealtad y buena fe en las diferentes instancias contractuales.
d) Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las aéreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de la obra.	40.49%	El contratista cumple con la normatividad ambiental, y normas que regulan los trabajos en el marco de brindar seguridad social y salud ocupacional.
e) Garantizar los permisos y las licencias ambientales de las correspondientes entidades competentes, cuando la ejecución de las labores contractuales así lo exijan	40.49%	A la fecha no se han requerido permisos ni licencias ambientales
f) Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión designada por el MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y/o la EICE EDUH APARTADO, durante la ejecución del contrato de obra, para efectos de ejecutar en debida forma el objeto del contrato.	40.49%	El contratista asume, acata y ejecuta las actividades del contrato conforme a las indicaciones de la Secretaria de Infraestructura Física y Valorización del municipio de Chigorodó y/o la EICE EDUH Apartadó.
g) Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución de las obras	40.49%	El contratista viene informando a la supervisión del contrato sobre las anomalías y dificultades que se presentaron en la ejecución de las obras.
h) Subsanar las obligaciones realizadas por el supervisor, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la misma.	40.49%	El contratista subsana las obligaciones realizadas por la supervisión del contrato.
i) Asistir a las reuniones periódicas o extraordinarias de seguimiento, coordinación, que sean convocados por EL CONTRATANTE y/o por su Supervisor.	40.49%	El contratista asiste a las reuniones citadas por la supervisión.
j) Cumplir con la dotación para el personal de trabajo como uniformes e implementos de seguridad	40.49%	El contratista garantiza la dotación de implementos de seguridad para el personal de trabajo en obra.
k) Verificar técnicamente los sitios en que se ejecutará la obra, las cantidades de obra, presupuesto, programación y las actividades que le permitan establecer la logística para el inicio de las obras programadas.	40.49%	El contratista verifica técnicamente cada uno de los frentes de trabajo donde se ejecutan las actividades objeto de la obra.
l) Presentar a la supervisión para su aprobación el cronograma de Obra previo al inicio de la ejecución de obra.	100%	El contratista presentó a la supervisión del contrato el cronograma de obra.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

m) Mantener el personal ofrecido como equipo profesional durante el tiempo de ejecución del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el personal propuesto se deberá realizar considerando que el profesional que reemplazará al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación deberá realizarse con previa aprobación por parte de la supervisión. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato.	40.49%	El contratista ha mantenido el personal ofrecido como equipo profesional, durante la ejecución del contrato
n) Priorizar la vinculación de MANO DE OBRA NO CALIFICADA de población vulnerable perteneciente al Municipio de CHIGORODÓ.	40.49%	El contratista prioriza la mano de obra no calificada perteneciente al municipio de Chigorodó.
o) Iniciar labores una vez se cuente con el visto bueno de la supervisión del MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y/o la EICE EDUH APARTADO.	100%	El contratista dio inicio a la ejecución de la obra una vez fue firmada el acta de inicio de obra, aprobada por la supervisión.
p) Garantizar la calidad de las obras, consignado en las especificaciones técnicas del proyecto	40.49%	El contratista garantiza la calidad de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto
q) Colaborar con la EICE – EDUH Apartadó en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad	40.49%	El contratista colabora con la EICE EDUH Apartadó en lo necesario para cumplir con el desarrollo del proyecto
r) Desarrollar las obras a los precios contratados y realizar los informes de acuerdo a lo pactado con el supervisor del contrato, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto.	40.49%	El contratista desarrolla las actividades de conformidad con los precios contractuales
s) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra	40.49%	El contratista ejecuta las obras, llevando a cabo procesos de control de calidad durante el desarrollo de las actividades.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

t) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare: garantías de cumplimiento, calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, y para el caso, establecer como beneficiario de las mismas al **MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**	40.49%	El contratista constituyo las siguientes pólizas: Póliza de cumplimiento Nº 595-47-994000001857 de la Aseguradora Solidaria de Colombia. Póliza de responsabilidad civil extracontractual Nº 595-74 994000000417 de la Aseguradora Solidaria de Colombia Así mismo ha realizado las actualizaciones pertinentes por modificaciones y/o prorrogas al contrato
u) Garantizar que se cumplan con las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria	40.49%	El contratista viene garantizando las normas de seguridad industrial y de señalización de movimiento de maquinaria.
v) Permitir y facilitar el ejercicio de la supervisión seleccionada por el MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y/o la EICE EDUH APARTADO, así como acoger las recomendaciones que esta realice durante la ejecución y liquidación del proyecto	40.49%	El contratista permite el ejercicio de supervisión y/o interventoría, acogiendo las recomendaciones realizadas en la ejecución del objeto contractual.
w) Presentar informe semanal y mensual de avance de obra, el cual contenga: Descripción general del contrato de obra, estado y porcentaje de avance de la construcción, estado de la facturación y pago de la obra, situación crítica y acción correctiva, obras adicionales y/o modificaciones y conclusiones	40.49%	El contratista presentó los informes mensuales de avance de obra.
x) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato	50%	El contratista suscribió el Acta de Inicio con fecha del 29 de julio de 2024.
y) Tener una capacidad operativa básica para ejecutar el contrato con la celeridad, organización y comunicación que según la naturaleza del contrato se requiere. Para estos efectos debe garantizar durante la ejecución del contrato una sede de trabajo para el equipo de personas.	40.49%	El contratista cuenta con una sede de trabajo

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

z) Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuándo esté exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la ley 789 de 2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007	40.49%	El contratista acredita el pago de la seguridad social, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.
aa) Entregar la obra terminada con el recibo a satisfacción y la liquidación por parte de la EICE – EDUH Apartadó, alcaldía y con el aval del supervisor del contrato	40.49%	La obra se encuentra en un avance del 40.49%
bb) Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, debidamente valoradas y cuantificadas	0%	El contrato se encuentra en ejecución
cc) Solicitar al del supervisor del contrato, oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud	40.49%	El contratista ha solicitado las modificaciones que se requieren en el desarrollo de la obra

Datos Generales:

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 619.016.361,00**			
Valor Adiciones	**$0,00**			
Valor Total del Contrato	**$ 619.016.361,00**			
Valor pagado	**$ 0,00**			
Valor causado que no se ha pagado	**$ 250.644.217,90**			
Valor total ejecutado (Cantidad y porcentaje)	**$ 250.644.217,90 (40.49%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$ 368.372.143,10**			
Tiempo ejecutado corte al 31 de agosto de 2024 (Cantidad y porcentaje)	**Un (01) meses y dos (02) días (42.80%)**	**Total**		**$ 0,00**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
06 días	**del mes de**	**Septiembre**	**de**	**2024**

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EDUHA

JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
R/ DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.
CONTRATISTA

Elaboró: Giovany Correa.
Reviso: Edgar Palacios.
Aprobó: Edgar Palacios.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

INFORME DE OBRA ACTA N°1

CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA
DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S
NIT. 900610809-3
RL. JHON JAMES CASTAÑO PEREIRA C.C. 10.003.584

CONTRATANTE
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – "EICE-EDUH APARTADÓ" Nit: 901445176-6

eduh
Empresa para el Desarrollo
Urbano y Hábitat
APARTADÓ

MUNICIPIO DE CHIGORODO

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

AGOSTO 2024

CALLE 103A N° 100-27 – BARRIO LAS FLORES- TEL.: 82 85 650
e-mail: j.francoalexa@gmail.com. APARTADO – ANTIOQUIA

DATOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – "EICE-EDUH APARTADÓ" Nit: 901445176-6
CONTRATO DE OBRA:	EDUH- 034 DE 25 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S., identificado con NIT. 900.610.809 – 3, representado legalmente por JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
OBJETO DEL CONTRATO:	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTOS DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNCIIPIO DE CHIGORODO, ANTIQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS NO.23AS111B1191 Y NO. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISÉIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ML ($619.016.362,OO)
PLAZO:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO DE OBRAS:	29/7/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRAS:	13/10/2024

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INFORME DE OBRA ACTA N°1 Y FINAL 1
DATOS GENERALES CONTRATO DE OBRA 2
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 3
2. UBICACION DEL PROYECTO 3
3. CONTROL PLAZO DE EJECUCIÓN. 4
3.1. CONTRATO EDUH- 034 DEL 25 DE JULIO DE 2024 4
4. DESARROLLO DE LA OBRA 4
5. BALANCE FINANCIERO 5
5.1. CONTROL EJECUCIÓN 5
5.2. ACTA DE AVANCE DE OBRA N°1 5
6. MEMORIAS DE CÁLCULO 5
7. CONCLUSIONES 5
ANEXO 1. COPIA ACTA AVANCE Nº1 6
ANEXO 2. MEMORIAS DE CALCULO Y REGISTRO FOTOGRAFICO 7
ANEXO 3. COPIA BITACORA 8

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto consta de construcción de vías en concreto en la vereda barranquillita, las cuales tienen las siguientes características: excavación en material común, regado, nivelado y compactación de material de subbase, vaciado de placa concreto con espesor de 18 cm, con acabado texturizado y bordillos en concreto

2. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en el corregimiento de barranquillita del municipio de chigorodo; este se encuentra en la via panamericana – sector el tigre; en el kilometro 11

3. CONTROL PLAZO DE EJECUCIÓN.

3.1. CONTRATO EDUH- 034 DEL 17 DE MAYO DE 2024

DESCRIPCIÓN	FECHA
FECHA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA	25 DE JULIO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE JULIO DE 2024
PLAZO CONTRATO	DOS MESES Y 15 DIAS
FECHA DE TERMINACION	13 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA CORTE Nº1 Y FINAL	21 DE AGOSTO DE 2024
PORCENTAJE DE PLAZO EJECUTADO	24 DIAS , PARA UN (32%) DE EJECUCIÓN

El proyecto nos encontramos ejecutando actividades varias de preparación de terreno y pavimentación

4. DESARROLLO DE LA OBRA

Descripción de Actividades desarrolladas

Las actividades desarrolladas en este proyecto son las siguientes.

Localización y replanteo en todas las vías intervenidas; en las cuales se localiza y se nivela todo el terreno para iniciar las excavaciones, en esta se atenido en cuenta que este sector de barranquillera es muy bajo y sufre muchas inundaciones cada vez que el rio león se crece, por lo que se ha tenido muy presente el nivel de las viviendas; esto para que no queden enterradas con respeto al nivel de acabado de la placa de pavimento.

Excavaciones y botada de material; allí en las excavaciones se ha encontrado el nivel freático muy alto, por lo cual no se pueden realizar excavaciones de más de 50 cm, porque el terreno se inunda y se daña; además se realiza el sellado del terreno en el momento de la excavación y asi se puede impermeabilizar un poco más; y así cada vez que se excava se recicla una parte del material grueso para realizar jarillon en los bordes del caño, y el restante se bota.

Instalación de material de remplazo; este se instala en capas pequeñas compactas, hasta llegar a una capa de 15cm de espesor total y así llegar al nivel estimado, para iniciar la instalación del riel metálico de altura de 18cm que nos sirve para verificación de niveles e iniciar el vaciado de placas de concreto.

pavimento en concreto e=0,18 (3.000 psi), incluye curado con antisol y acabado texturizado, esta actividad la iniciamos después de tener verificado todos los niveles del terreno y los rieles modulados con las secciones de ancho de placas

de 3.00 mt x 2.65 mt, estas placas de concreto tienen un espesor de 18cm, con un concreto de resistencia de 210kg/cm2, su acabado es texturizado o rayado con rastrillos y además se realiza el curado con antisolar liquido rociado

bordillos en concreto vaciados en sitio, se realizan después de vaciada la placa de concreto en la cual se dejan instalado unos pelos de varilla de 3/8", en el cual se realiza la instalación de la formaleta, nivelándola y así respectivamente realizar el vaciado del concreto para bordillo.

5. BALANCE FINANCIERO

5.1. CONTROL EJECUCIÓN

VALOR CONTRACTUAL	$ 619.016.362
VALOR ANTICIPO	$ 0
VALOR CORTE DE OBRA N°1	$250.644.217,90
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ 0
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 0
VALOR A PAGAR ACTA N°1	$250.644.217,90
VALOR TOTAL EJECUTADO	$368.372.144,10
% DE EJECUCIÒN	**40.49%**

5.2. ACTA DE AVANCE DE OBRA N°1

Ver Documento Anexo (acta de Avance de Obra N°1)

6. MEMORIAS DE CÁLCULO

Ver Documento Anexo (memorias de cálculo Avance de Obra N°1)

7. CONCLUSIONES

Se están realizando una obra de buen impacto en la comunidad, por lo cual ayuda a mejorar la calidad de vida de todas las personas de este corregimiento.

Firma/

JHON JAMES CASTAÑO
RL. DISINCOVI S.A.S
NIT. 900610809-3

ANEXO 1. COPIA ACTA AVANCE Nº1

CALLE 103A N° 100-27 – BARRIO LAS FLORES- TEL.: 82 85 650
e-mail: j.francoalexa@gmail.com. APARTADO – ANTIOQUIA

ANEXO 2. MEMORIAS DE CALCULO Y REGISTRO FOTOGRAFICO

CALLE 103A N° 100-27 – BARRIO LAS FLORES- TEL.: 82 85 650
e-mail: j.francoalexa@gmail.com. APARTADO – ANTIOQUIA

ANEXO 3. COPIA BITACORA

CALLE 103A N° 100-27 – BARRIO LAS FLORES- TEL.: 82 85 650
e-mail: j.francoalexa@gmail.com. APARTADO – ANTIOQUIA

30/07/2024

Día: Domingo.
Llovizno en la mañana.
personal en obra

1 Residente de obra
1 topografo.
1 operador de maquina. (pajarita)
1 OFICIAL
10 AYUDANTES

Actividades

Corte y figuración de acero.
Vaceo de placas.
Se Vacearon 8 placas de 3x3.18.
se gastaron 100 sacos de cemento.
Cargo Rempleto por sub base granular
Fuertes Lloviznas desde las 3:40 pm hasta la noche

G. Montagano

Primavera

Powered by CamScanner

13/08/2024

Dia: Mañana humedo

personal en obra

1 Residente de obra
1 topografo
1 Operador de maquina.
2 oficiales
12 Ayudantes

Actividades

Secado del terreno
Cageo y Nivelacion terreno
Formaletas 9 pilas 101 sacos
Secado de agua en el alcantarillado

Jhonjairo

14/08/2024

Dia: Sabado

personal en obra.

1 Residente de obra
1 topografo
1 Operador de maquina. (pajarita)
2 oficiales
14 Ayudantes

Actividades

Llenado de MH
Corte y Figuracion de acero.
Cageo, Formaleta
Vaciado de 30 ml de bordillos
65 sacos de cemento
Vaciado 6 placas, 12 placas
132 Sacos de cemento.

Se cogen fallos y se Reemplazan
por Subbase granular

Jhonjairo

Powered by CamScanner

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CULMINACION DE PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA
DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S
NIT. 900610809-3
RL. JHON JAMES CASTAÑO PEREIRA C.C. 10.003.584

CONTRATANTE
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – "EICE-EDUH APARTADÓ" Nit: 901445176-6

KELLY JOHANA BUELVAS CADAVID C.C. 1.027.941.923
PROFESIONAL EN SST
LICENCIA 2016060080203

eduh
Empresa para el Desarrollo
Urbano y Hábitat
APARTADÓ

MUNICIPIO DE CHIGORODO

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

AGOSTO 2024

INDICE

PRESENTACION.....**3**

1. DATOS DE LA EMPRESA.....4

2. FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE OBRA.....4

3. SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES.....4

4. ELEMENTOS DE PROTECCION INDICIDUAL.....4

5. CAPACITACIONES.....6

6. PAUSAS ACTIVAS.....7

7. EJECUCION DE LABORES.....7

8. ORDEN Y ASEO.....9

PRESENTACIÓN

Se logrado los objetivos y metas trazadas, quedando en alto el cumplimiento de la prevención en la seguridad y normatividad potencializando la parte de la prevención y compromiso del autocuidado.

La prevención en el trabajo se toma como herramientas básicas e indispensables para mejorar las condiciones de nuestras actividades diarias, como la calidad de vida de todos los empleados de una organización.

Permite desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades ocupacionales y accidentes; de esta manera se elimina los factores de riesgo de la salud y seguridad en el trabajo.

El diseño e implementación del proceso de salud y seguridad laboral, permite incrementar la salud física, mental y social del trabajador; promoviendo y desarrollando la capacidad del trabajador, así como su desarrollo profesional y social de este.

Es por eso DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S es de gran importancia realizar actividades en pro de nuestros trabajadores.

1. DATOS DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
DIRECTOR DE OBRA	JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
SISO	KELLY JOHANA BUELVAS CADAVID

2. FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE OBRA

fecha de inicio de obras: 29/07/2024

fecha de terminación de obras: 13/10/2024

3. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES

Cantidad de trabajadores que se encuentran afiliados a seguridad social en el mes de JULIO 2024.

SEGURIDAD SOCIAL DE JULIO 2024	
ARL	17
AFP	17
EPS	17
CAJA DE COMPENSACIÓN	17

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Elemento de Protección Individual (EPI), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador; para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen, a partir del uso de los Elementos de Protección Individual (EPI), son las siguientes:

- ✓ Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
- ✓ Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.

- ✓ Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 09 de 1979, Art. 85, Lit. b; todos los trabajadores están obligados a usar y mantener adecuadamente, los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo. Sin embargo, el uso de los elementos de protección personal en tu puesto de trabajo; más que una obligación lo debes considerar, como un compromiso.

En el mes de JULIO DE 2024 se han entregado los elementos de protección individual entregados a los trabajadores de la obra son los siguientes.

ELEMENTOS DE POTECCIÓN INDIVIDUAL JULIO 2024
CASCO DE SEGURIDAD
GUANTES
PROTECTORES AUDITIVOS
GAFAS
BUSOS





Elementos de proteccion personal (EPP)


5. CAPACITACIONES

La capacitación en prevención de riesgos laborales tiene el objetivo de brindar conocimientos especializados que ayuden al trabajador a evitar accidentes en la empresa, contribuyendo de esta manera a crear una cultura de la seguridad preventiva.

Las empresas requieren empleados capacitados para realizar sus tareas y mejorar su competitividad y productividad. La capacitación especializada permite ampliar la formación académica de los trabajadores, además tiene por objeto obtener nuevos conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con rendimiento, responsabilidad y seguridad la tarea asignada.

los cambios permanentes, sumados a la situación actual del mundo laboral, incentivan a muchos profesionales y trabajadores a ampliar su formación a través de la capacitación. A su vez, las empresas se preocupan cada vez más por esto con el fin de que sus empleados aprendan las tareas que deben llevar a cabo.



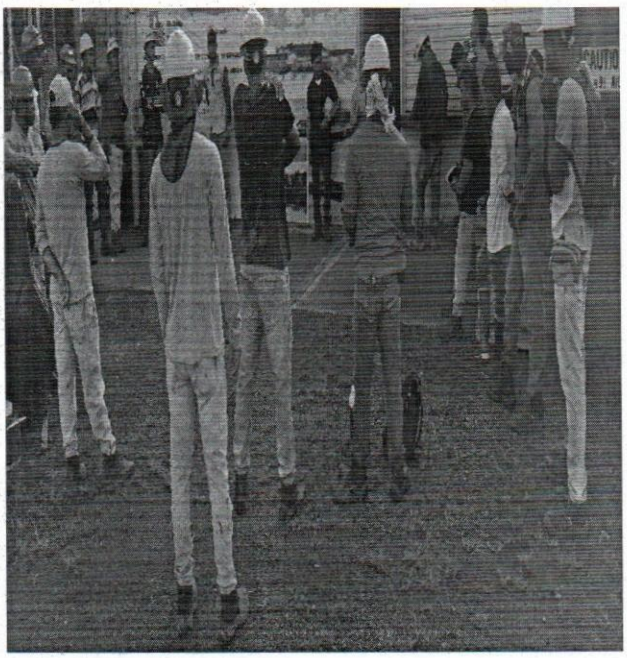


Capacitaciones


6. PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración continua mínima de 10 minutos que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobre uso asociados al desempeño laboral.

Las Pausas Activas serán una forma de promover la actividad física, como habito de vida saludable, por lo cual se deben desarrollar programas educativos sobre la importancia y los beneficios de la actividad física regular.

El entorno laboral representa un escenario ideal para la promoción de la actividad física y de los hábitos saludables.

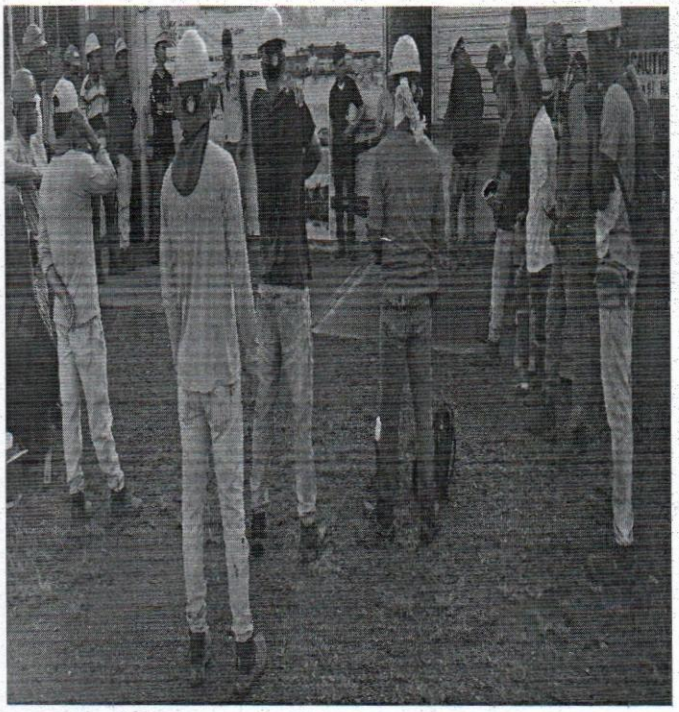

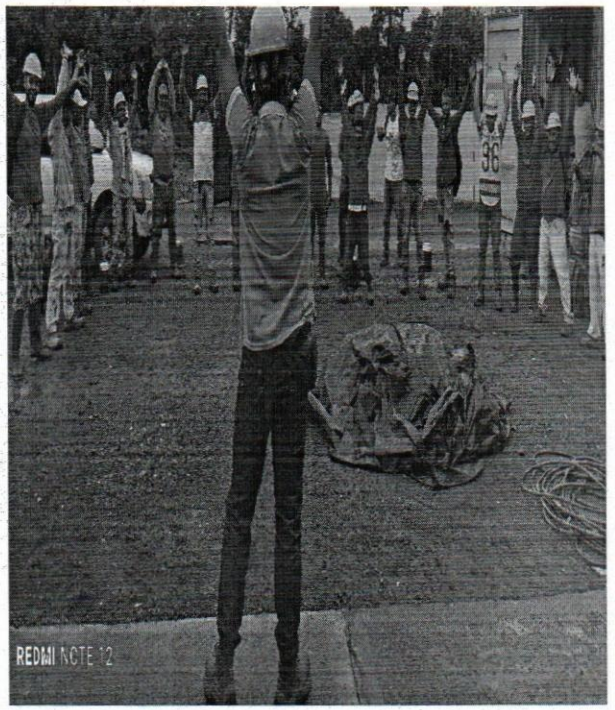


Pausas activas


7. EJECUCION DE LABORES

- El trabajador inicia su jornada laboral después de la previa indicación y autorización por parte de su supervisor.
- se hace inducción de su importancia y los riesgos de no ser utilizados.
- Los trabajos se hacen de forma manual y los trabajadores la efectúan utilizando su fuerza física, ayudados por herramientas de mano como palas, escobillones, pica,

carretas etc.

- Los trabajadores mantienen una distancia segura entre ellos.
- Al finalizar las labores, los trabajadores ubican sus herramientas en la bodega.
- Los equipos de protección personal y de seguridad, son guardados.

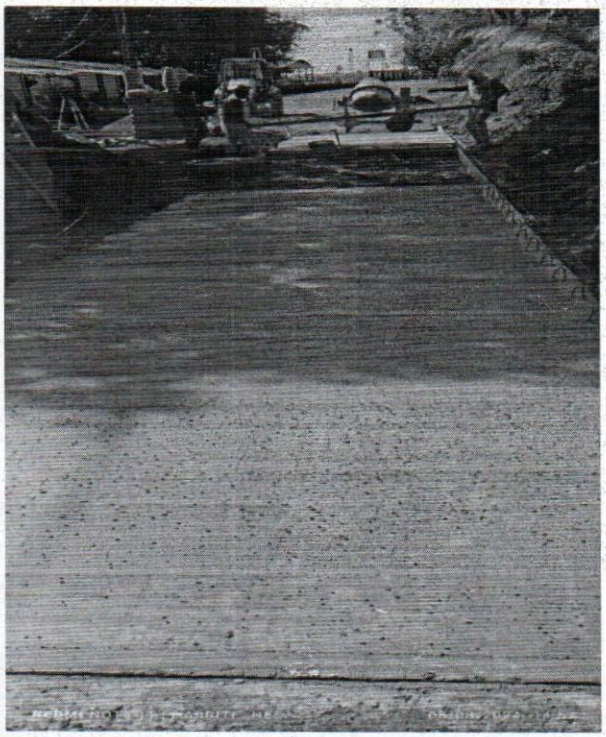

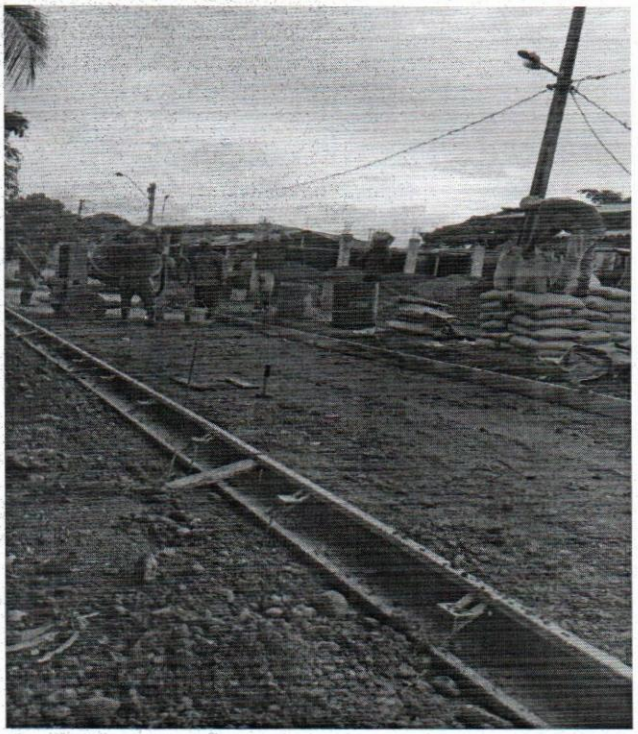



8. ORDEN Y ASEO:

El orden y el aseo en el trabajo, son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad y la eficiencia, por lo tanto, se maneja orden y aseo en:

- Almacenamiento correcto de materiales.
- Disposición correcta de desperdicios.
- Remoción rápida de derrames y de mantenimientos requeridos.
- Aseo del área de trabajo por parte del personal.

Esta implementación ayudo:

- evitar accidentes.
- Al trabajo seguro.
- Mayor provecho de los espacios.
- Al buen uso de los recursos disponibles.
- Aumentar en el rendimiento de trabajo.
- Ambiente de trabajo agradable.

Kelly Buelvas

KELLY JOHANA BUELVAS CADAVID
CC 1.027.941.923
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Licencia 2016060080203

ACTIVIDADES GENERALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT.	VR TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
						1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35	36 37 38 39 40 41 42	43 44 45 46 47 48 49	50 51 52 53 54 55 56	57 58 59 60 61 62 63	64 65 66 67 68 69 70
1	PRELIMINARES														
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.399,00	$ 2.311	$ 10.166.089										
	SUBTOTAL				$ 10.166.089	$ 1,129,564,00	$ 1,129,565,00	$ 1,129,566,00	$ 1,129,567,00	$ 1,129,568,00	$ 1,129,569,00	$ 1,129,570,00	$ 1,129,571,00	$ 1,129,572,00	
2	ADECUACION DE TERRENO														
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN	M3	659,85	$ 30.504	$ 20.128.064										
2.2	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	320,00	$ 9.975	$ 3.192.000										
2.3	RELLENO EN MATERIAL TIPO SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	439,90	$ 18.375	$ 8.083.163										
	SUBTOTAL				$ 31.403.227	$ 3,333,332,00	$ 3,333,333,00	$ 3,333,334,00	$ 3,333,335,00	$ 3,333,336,00	$ 3,333,337,00	$ 3,333,338,00	$ 3,333,339,00	$ 3,333,340,00	1403277
3	PAVIMENTO														
3.1	PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,18 (3.000 PSI), INCLUYE CURADO CON ANTISOL Y ACABADO TEXTURIZADO	M2	4.399,00	$ 50.400	$ 221.709.600										
3.2	JUNTA DE DILATACIÓN CON PAVIFLEX	ML	2.296,33	$ 3.360	$ 7.715.680										
	SUBTOTAL				$ 229.425.280	$ 22,222,221,22	$ 22,222,222,22	$ 22,222,223,22	$ 22,222,224,22	$ 22,222,225,22	$ 24,151,144,00	$ 24,151,144,00	$ 24,151,144,00	$ 24,151,144,00	$ 21,709,500,00
4	ACERO DE REFUERZO														
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=5/8" CORRUGADO	KG	863,20	$ 1.260	$ 1.087.632										
4.2	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1" LISA	KG	3.541,33	$ 1.260	$ 4.462.080										
	SUBTOTAL				$ 5.549.712	$ 308,316,33	$ 616,633,67	$ 616,634,67	$ 616,635,67	$ 616,636,67	$ 616,637,67	$ 616,638,67	$ 616,639,67	$ 616,640,67	$ 308,320,33
5	BORDILLOS														
5.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.660,00	$ 12.600	$ 20.916.000										
					$ 20.916.000			$ 2,614,500,00	$ 2,614,500,00	$ 2,614,500,00	$ 2,614,500,00	$ 2,614,500,00	$ 2,614,500,00	$ 2,614,500,00	$ 2,614,500,00
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
6,1	REALCE DE MH	UN	10,00	$ 500.000	$ 5.000.000										
6,2	REUBICACIÓN DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	UN	78,00	$ 68.363	$ 5.332.314										
6,3	REUBICACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS DE	UN	78,00	$ 277.600	$ 21.652.800						$ 2,614,500,00				
					$ 31.985.114			$ 5,330,851,33	$ 5,330,852,33	$ 5,330,853,33	$ 5,330,854,33	$ 5,330,855,33	$ 5,330,856,33		

3. MATERIALES DE CONFORMIDAD AL CONVENIO N° 23AS111B1191 POR MUNICIPIO

MATERIAL	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M3 (INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES)	VALOR TOTAL
SUMINISTRO TRITURADO ¾"	726,00	Mt3	$ 86.677	$ 63.100.856
SUMINISTRO ARENA PARA CONCRETO	558,00	Mt3	$ 81.363	$ 45.400.554
SUB-BASE	375,00	Mt3	$ 73.389	$ 27.520.875
SUBTOTAL MATERIALES				$ 136.022.285
				$ 13,888,887,89 $ 13,888,888,89 $ 13,888,889,89 $ 13,888,890,89 $ 13,888,891,89 $ 13,888,892,89 $ 13,888,893,89 $ 13,888,894,89 $ 13,888,895,89 $ 11,022,285,00

4, MATERIALES DE ALGUNAS ACTIVIDADES PARA TERMINAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONVENIO N° 4600016202 POR MUNICIPIO

MATERIAL	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M3 (INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES)	VALOR TOTAL
SUMINISTRO TRITURADO ¾"	236	Mt3	$ 86.677	$ 20.455.772
SUMINISTRO ARENA PARA CONCRETO	210	Mt3	$ 81.363	$ 17.086.230
SUB-BASE	234	Mt3	$ 73.389	$ 17.173.026
SUBTOTAL MATERIALES				$ 54.715.028
				$ 190.737.313
				$ 5,666,665,67 $ 5,666,666,67 $ 5,666,667,67 $ 5,666,668,67 $ 5,666,669,67 $ 5,666,670,67 $ 5,666,671,67 $ 5,666,672,67 $ 5,666,673,67 $ 139,737,313,00
SUB TOTAL COSTO SIN AU				$ 46,548,987,11 $ 46,857,309,44 $ 54,802,666,78 $ 54,802,673,78 $ 54,802,680,78 $ 56,731,605,56 $ 56,731,611,56 $ 56,731,617,56 $ 51,400,766,22 $ 176,795,195,33
