REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EICE EDUH-APARTADÓ

Nit: 901445176-0

COMPROBANTE DE EGRESO

N. 000542

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00438	26/11/2024

Fecha de Expedición: 26/11/2024

Nit ò Cedula:	900.610.809
Beneficiario:	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Concepto de este Egreso

PAGO DE FACTURAS FEV40, FEV41 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°139 2024, DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
SE TOMA RECURSOS DESTINADOS EN EL REGISTO 328 DE LA ADICION REALIZADA AL CONTRATO

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**314.593.882,55**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	314.593.882,55
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	314.593.882,55
CCPET04 - TERCEROS	217205172	CHIGORODO	314.593.882,55
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	314.593.882,55
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402041	Via terciaria mejorada	314.593.882,55
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	314.593.882,55
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	314.593.882,55
CCPET85 - CONVENIOS	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	314.593.882,55
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	314.593.882,55

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	314.593.882,55
			TOTAL:	**314.593.882,55**

Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar

314.593.882,55	53.480.960,04	261.112.922,51

Valor en letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS. PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
393700147191	CI 139-2024 Vias tercerias	0000EGR542	261.112.922,51

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	6.291.877,65
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	3.145.938,83
TASA PRO-DEPORTE	2,00	6.291.877,65
IMPUESTO DE SEGURIDAD	5,00	15.729.694,13
RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES	2,00	6.291.877,65
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	12.583.755,30
RETE ICA	1,00	3.145.938,83

GERENTE

Firma del Interesado(a)
Nit / C.C.

DAVIVIENDA

Solicitar productos

Empresa

EMPRESA PARA EL DESAF

Administración

Compras por internet

Pagos

Pago a Proveedores

- Crear Pagos
- Reutilizar Pagos
- Modificar Pagos
- Eliminar Pagos
- Validar Pagos
- Actualizar Pagos

Consultas

- Procesos de Pagos
- Estados de Pagos

Personalizar Plantillas

Inscripciones

Transferencias, Usos y Avances

Consulta de Productos

Consulta de Planes Institucionales

Certificaciones, Extractos y Paz y Salvos

Atención en línea

Sesión

Cerrar Sesión

CONOZCA AQUÍ
Todo sobre el Portal Empresarial

Línea Empresarial
-Bogotá (1) 3 27 83 60
-Bogotá (1) 7 42 59 80
-Desde otras ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Bienvenido: **Señor(a) PEDRO LUIS BERRIO SERNA**

3 de Diciembre del 2024 - 07:42

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADO

Pago a Proveedores

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	50079677	Nombre Proceso de Pago	FACTFEV4041 CONT1392024
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 261.112.922,51
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	900610809
Nombres	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	Numero Producto o Servicio Destino	549****1692
Entidad Destino	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 261.112.922,51
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v6.57.00
Pagos v6.57.00

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00438

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00232	29/07/2024
00328	31/10/2024

Fecha de Expedición: 26/11/2024

Nit ò Cedula:	900.610.809
Beneficiario:	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

Por Concepto de:

PAGO DE FACTURAS FEV40, FEV41 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°139 2024, DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**314.593.882,55**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	229.647.543,55
	54211	Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles	84.946.339,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	229.647.543,55
	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	84.946.339,00
CCPET04 - TERCEROS	217205172	CHIGORODO	229.647.543,55
	217205172	CHIGORODO	84.946.339,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	229.647.543,55
	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	84.946.339,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2402041	Via terciaria mejorada	229.647.543,55
	2402041	Via terciaria mejorada	84.946.339,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	229.647.543,55
	C	Con Situación de Fondos	84.946.339,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	229.647.543,55
	120101	100% de La Renta	84.946.339,00
CCPET85 - CONVENIOS	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	229.647.543,55

CCPET85 - CONVENIOS	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	84.946.339,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	229.647.543,55
	202405172C139	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 139-2024 DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORORDÓ ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N°23AS111B1191 Y N°4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	84.946.339,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	314.593.882,55
			TOTAL:	**314.593.882,55**

Valor en letras:

TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00	6.291.877,65
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	1,00	3.145.938,83
TASA PRO-DEPORTE	2,00	6.291.877,65
IMPUESTO DE SEGURIDAD	5,00	15.729.694,13
RETEFUENTE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES	2,00	6.291.877,65
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	12.583.755,30
RETE ICA	1,00	3.145.938,83

Total IVA
0,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
314.593.882,55	53.480.960,04	261.112.922,51

GERENTE

DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.

NIT: 900610809-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

DG 99 131 76, Apartadó, Antioquia, Colombia

Tel. 3106444148

Email. elianacamargo1972@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764082958997 válida desde 2024-11-06 hasta 2025-11-06 rango desde FEV39 hasta FEV1000.

Cliente:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT :	901445176
Dirección:	CL 97 104 01, Apartadó, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3146858452
Email:	financiera@eduha.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV40**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:14:19-05:00**
FECHA FIRMADO:	**13/11/2024 17:14:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	11	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDADA LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..	94	1,00	$149.226.961,83				0,00	$149.226.961,83
2	10	Administración 30%	EA	1,00	$44.768.088,55				0,00	$44.768.088,55

Notas:
CONTRATO EDUH-034 / 25 DE JULIO DE 2024 - ACTA N° 2

SON: (ciento noventa y tres millones novecientos noventa y cinco mil cincuenta pesos treinta y ocho centavos)
CUFE: b7f3df8bd6aaed48f166aa6da3dfe2a60ed3aa7db7e7c4ea83318a9220f717e003fcfcd70ec5e73f2b3bf45d2acdc923

Subtotal:	$193.995.050,38
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$193.995.050,38

Firma Digital: MAzuchgXT/DBTsyiW+eHPc+YvNclbPagjzMTg/KV1gbmPqsrWn276UIZo9GlwHq7
gaEBjr0hicTgFNI7Q7km2NyDGl8fKbvIbe1bPwPiYZz8UTxlqN
bAOrz3kL5BTq1D Q8kGznoPbsDKrZUS7kyrPErorzR3JMZngQE3OulAc3py8qwo+9t1davEGA228Fmm sYStP/K1ARRPj1OIDLEYoZVWT+gmP0kqioC
vUeOsyBAoTczKfR1iMR4wnLQlloKQ IhCwcmUEy/b93CzXuMRuqCm7ew58L1vaCdHruniAO2Zlaw5MMi0DjcGOVcaYoUk1 StmB61Kuv6pcPVciOLZV
mw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.

NIT: 900610809-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

DG 99 131 76, Apartadó, Antioquia, Colombia

Tel. 3106444148

Email. elianacamargo1972@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764082958997 válida desde 2024-11-06 hasta 2025-11-06 rango desde FEV39 hasta FEV1000.

Cliente:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
NIT :	901445176
Dirección:	CL 97 104 01, Apartadó, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3146858452
Email:	financiera@eduha.gov.co

Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV41**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:14:37-05:00**
FECHA FIRMADO:	**13/11/2024 17:14:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	11	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDADA LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA..	94	1,00	$120.598.832,17				0,00	$120.598.832,17

Notas:
CONTRATO EDUH-034 / 25 DE JULIO DE 2024 -ACTA N° 2

Subtotal:	$120.598.832,17
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$120.598.832,17

SON: (ciento veinte millones quinientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos diecisiete centavos)
CUFE: 2328d09791739768ef28c42395972248661eaecd00ccdb4854dbf942f19db05e73866c7c006bcf402de8feab3ab3350b

Firma Digital: brmz4lfAN4zHYOhouH+DP5Zwflu43H3gmHR6DxGkdMm1nC9OmV2dlJsqZOEQ/D47
RnRTjxDTFDjDNstzUeEkIPfPpEsUVc6xh9LL1RZNhEoV2Dai5q
LztMCKL2EFD6t0 yTiYQktamLsDhcsKL9irDxw/WqaaX5kFCC5X+loZG3P/wPoYzFfXND8145f3gQDP CbTv7ZO9kLLLP/9dZfk0eZFXmmvBqoWAHvb
cAJsQEMvLn+N3fVWcSuOJ4o7BnLhE svatqDkPze3BGybOl/lWwJ2BIXLUmzfXVo9HeakHMsfUloYYO9fp7PC2wxH4O8nK v3aAeV+gCEC3LtWLNJyo
OA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

JHULIETT ALEXANDRA JIMENEZ FRANCO

CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002, bajo gravedad de juramento:

CERTIFICO

Que **DISEÑOS, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S**
NIT 900.610.809

Ha dado cumplimiento oportuno y completo durante los últimos seis (6) meses, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide a solicitud del interesado a los seis (13) días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

Alexandra Jiménez
CONTADORA

Tp 324593-T

301 3105166 j.francoalexa@gmail.com

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

324593-T



JHULIETT ALEXANDRA
JIMENEZ FRANCO
C.C. 1088307333
RES. INSCRIPCION 189 DEL 10/04/2024
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

374886 384381

Powered by CamScanner

230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

301 3105166 j.francoalexa@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	919164885	9473398550	E	2024/09/04	2024/09/17	BANCOLOMBIA	13	$22,841,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (44 Afiliados)																							$50,418,808	$8,067,500			$51,718,808	$6,465,600			$50,678,808	$2,027,700			$51,718,808		$3,528,700		$50,678,808	$2,535,400		$22,624,900
Centro de Trabajo: 5 (44 Afiliados)																							**$50,418,808**	**$8,067,500**			**$51,718,808**	**$6,465,600**			**$50,678,808**	**$2,027,700**			**$51,718,808**		**$3,528,700**		**$50,678,808**	**$2,535,400**		**$22,624,900**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (44 Afiliados)																							$50,418,808	$8,067,500			$51,718,808	$6,465,600			$50,678,808	$2,027,700			$51,718,808		$3,528,700		$50,678,808	$2,535,400		$22,624,900
1	PT	1229705	ALVORNOZ MOLINA RAMON ANTONIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
2	CC	98591313	AREIZA ESPINOSA HENRY ALONSO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
3	CC	93119412	ARIAS PEDRO NOEL																			0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$370,000
4	CC	1000090293	BARRERA GIRALDO JOSE CAMILO	X																	23020 1	26	$1,126,667	$180,300	EPS010	26	$1,126,667	$140,900	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	6.960%	$78,500	26	$1,126,667	$56,500	No	$501,300
5	CC	8339150	BLANDON CELORIO GONZALO	X																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
6	CC	1027941923	BUELVAS CADAVID KELLY JOHANA																		23030 1	30	$1,755,470	$280,900	EPS010	30	$1,755,470	$219,500	CCF03	30	$1,755,470	$70,300	14-11	30	$1,755,470	6.960%	$122,200	30	$1,755,470	$87,900	No	$780,800
7	CC	1027948374	CARDONA GALLEGO CRISTIAN	X																	25-14	25	$1,083,334	$173,400	ESSC24	25	$1,083,334	$135,500	CCF03	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	6.960%	$75,500	25	$1,083,334	$54,300	No	$482,100
8	CC	8339871	CARET HERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
9	CC	10003584	CASTAÑO PEREIRA JOHN JAMES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
10	CC	71256363	CHAMORRO LOPEZ RONALD YASID																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
11	CC	1041262802	CONTRERAS NORIEGA ELVER SAMITH		X																23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$5,500	CCF03	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$43,334	$2,300	No	$19,700
12	CC	8339862	CUESTA QUEJADA CLEMENTE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
13	CC	1192911995	DIAZ RODRIGUEZ JULIAN DAVID																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
14	CC	1192920193	DIAZ ANGULO WALDIR AMADO	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
15	CC	1192747324	DIXON GIRALDO OVER SMITH	X																	23030 1	18	$780,000	$124,800	EPS010	18	$780,000	$97,500	CCF03	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	6.960%	$54,300	18	$780,000	$39,000	No	$346,800
16	CC	1007410197	FLOREZ OQUENDO DONOVAN ALBERTO	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
17	CC	1033816216	GARCES ARIAS DANIEL ENRIQUE	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
18	CC	71240591	GOMEZ CUESTA DEIVIS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
19	CC	1037119444	GONZALEZ FUENTES MICHAEL STIVEN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
20	CC	1038812096	GUERRA GUISAO CARLOS FABIAN	X																	23020 1	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$103,000	CCF03	19	$823,334	$33,000	14-11	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$823,334	$41,300	No	$366,500
21	CC	1001026602	HOYOS LOZANO ESNEIDER DAVID																		23030 1	6	$260,000	$41,600	EPS010	6	$260,000	$32,500	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	6.960%	$18,100	6	$260,000	$13,000	No	$115,600
22	CC	1001026602	HOYOS LOZANO ESNEIDER DAVID											X							23030 1	24	$1,040,000	$166,400	EPS010	24	$1,040,000	$130,000	CCF03	0	$0	$0	14-11	24	$1,040,000	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$296,400
23	CC	1192767592	HOYOS GONZALEZ JUAN CARLOS	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
24	CC	1038805771	IBARGUEN ALVAREZ EVAN ALEXANDER																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
25	CC	1038805746	JARAMILLO BARBAS JOSE MARIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
26	CC	1081808310	JULIO STAN JEINER JESSY																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	919164885	9473398550	E	2024/09/04	2024/09/17	BANCOLOMBIA	13	$22,841,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	$8,067,500	$77,200	$0	$8,144,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$624,000	$6,000	$0	$630,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,698,800	$16,300	$0	$1,715,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$5,224,600	$49,900	$0	$5,274,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$520,100	$5,000	$0	$525,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,528,700	$33,700	$0	$3,562,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	44	$3,528,700	$33,700	$0	$3,562,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$2,027,700	$19,400	$0	$2,047,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	44	$2,027,700	$19,400	$0	$2,047,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				44	$6,465,600	$62,000	$0	$6,527,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$373,900	$3,600	$0	$377,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$2,229,300	$21,300	$0	$2,250,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,408,500	$13,500	$0	$1,422,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$487,500	$4,700	$0	$492,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,600	$0	$164,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	12	$1,803,900	$17,300	$0	$1,821,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,521,300	$14,600	$0	$1,535,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	44	$1,521,300	$14,600	$0	$1,535,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,014,100	$9,700	$0	$1,023,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	44	$1,014,100	$9,700	$0	$1,023,800
TOTAL				44	$22,624,900	$216,600	$0	$22,841,500

2024/09/25 03:08 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	961576441	9474833703	E	2024/10/03	2024/10/07	BANCOLOMBIA	4	$15,703,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (40 Afiliados)																								$49,942,137	$7,990,800			$51,242,137	$2,049,800			$51,242,137	$2,049,800			$51,242,137		$3,567,300		$0	$0		$15,657,700
Centro de Trabajo: 5 (40 Afiliados)																								**$49,942,137**	**$7,990,800**			**$51,242,137**	**$2,049,800**			**$51,242,137**	**$2,049,800**			**$51,242,137**		**$3,567,300**		**$0**	**$0**		**$15,657,700**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (40 Afiliados)																								**$49,942,137**	**$7,990,800**			**$51,242,137**	**$2,049,800**			**$51,242,137**	**$2,049,800**			**$51,242,137**		**$3,567,300**		**$0**	**$0**		**$15,657,700**
1	PT	1229705	ALVORNOZ MOLINA RAMON ANTONIO																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	98591313	AREIZA ESPINOSA HENRY ALONSO																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC	93119412	ARIAS PEDRO NOEL																				0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
4	CC	1000090293	BARRERA GIRALDO JOSE CAMILO		X																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
5	CC	8339150	BLANDON CELORIO GONZALO																			23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	1027941923	BUELVAS CADAVID KELLY JOHANA																			23030 1	30	$1,755,470	$280,900	EPS010	30	$1,755,470	$70,300	CCF03	30	$1,755,470	$70,300	14-11	30	$1,755,470	6.960%	$122,200	30	$0	$0	SI	$543,700
7	CC	1027948374	CARDONA GALLEGO CRISTIAN																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	8339871	CARET HERNANDEZ FRANCISCO ANTONIO																			23100 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	10003584	CASTAÑO PEREIRA JOHN JAMES		X																	23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	6.960%	$6,100	2	$0	$0	SI	$27,000
10	CC	71256363	CHAMORRO LOPEZ RONALD YASID																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	CC	8339862	CUESTA QUEJADA CLEMENTE																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
12	CC	1192911995	DIAZ RODRIGUEZ JULIAN DAVID																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	1192920193	DIAZ ANGULO WALDIR AMADO																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	1192747324	DIXON GIRALDO OVER SMITH																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	1007410197	FLOREZ OQUENDO DONOVAN ALBERTO																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1033816216	GARCES ARIAS DANIEL ENRIQUE																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	71240591	GOMEZ CUESTA DEIVIS																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
18	CC	1037119444	GONZALEZ FUENTES MICHAEL STIVEN																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
19	CC	1038812096	GUERRA GUISAO CARLOS FABIAN																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
20	CC	1001026602	HOYOS LOZANO ESNEIDER DAVID																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
21	CC	1192767592	HOYOS GONZALEZ JUAN CARLOS																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
22	CC	1038805771	IBARGUEN ALVAREZ EVAN ALEXANDER																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
23	CC	1038805746	JARAMILLO BARBAS JOSE MARIA																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
24	CC	1081808310	JULIO STAN JEINER JESSY		X																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
25	CC	1001667268	LOPEZ VASQUEZ ANIBAL JOSE																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
26	CC	18491713	MARTINEZ NIETO FREDY ARLEY																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	961576441	9474833703	E	2024/10/03	2024/10/07	BANCOLOMBIA	4	$15,703,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$7,990,800	$23,000	$0	$8,013,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$624,000	$1,800	$0	$625,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,664,000	$4,800	$0	$1,668,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	25	$5,078,800	$14,600	$0	$5,093,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$624,000	$1,800	$0	$625,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,567,300	$10,300	$0	$3,577,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$3,567,300	$10,300	$0	$3,577,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$2,049,800	$5,900	$0	$2,055,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	40	$2,049,800	$5,900	$0	$2,055,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				40	$2,049,800	$6,100	$0	$2,055,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$300	$0	$104,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$697,800	$2,000	$0	$699,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$468,000	$1,400	$0	$469,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,000	$500	$0	$156,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$200	$0	$52,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	$572,000	$1,700	$0	$573,700
TOTAL				40	$15,657,700	$45,300	$0	$15,703,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1032085543	9476956764	E	2024/11/06	2024/11/06	BANCOLOMBIA	0	$13,028,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (36 Afiliados)																						$41,448,804	$6,631,900			$42,748,804	$1,710,100			$42,748,804	$1,710,100			$42,748,804		$2,976,300		$0	$0		$13,028,400
Centro de Trabajo: 5 (36 Afiliados)																						**$41,448,804**	**$6,631,900**			**$42,748,804**	**$1,710,100**			**$42,748,804**	**$1,710,100**			**$42,748,804**		**$2,976,300**		**$0**	**$0**		**$13,028,400**

2024/11/06 11:13 AM

| Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (36 Afiliados) | | |

Total Afiliados(36)		$41,448,804	$6,631,900		$42,748,804	$1,710,100		$42,748,804	$1,710,100		$42,748,804	$2,976,300	$0	$0	$13,028,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900610809	3	DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 103No 100a-29	APARTADO-ANTIOQUIA	8152174	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1032085543	9476956764	E	2024/11/06	2024/11/06	BANCOLOMBIA	0	$13,028,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$6,631,900	$0	$0	$6,631,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,352,000	$0	$0	$1,352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$4,551,900	$0	$0	$4,551,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$312,000	$0	$0	$312,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,976,300	$0	$0	$2,976,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$2,976,300	$0	$0	$2,976,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,710,100	$0	$0	$1,710,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	36	$1,710,100	$0	$0	$1,710,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				36	$1,710,100	$0	$0	$1,710,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$590,300	$0	$0	$590,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$390,000	$0	$0	$390,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$130,000	$0	$0	$130,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	$495,800	$0	$0	$495,800
TOTAL				36	$13,028,400	$0	$0	$13,028,400

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CHIGORODO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Municipio de Chigorodó

FECHA: 13 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

OBRA EN CASCO: RURAL | BARRIO ó SECTOR: BARRANQUILLITA | ACTA Nª: 2 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 314.593.882,55 | MES: SEPTIEMBRE-OCTUBRE

ACTA FINAL: SI [ ] [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : EDUH- 034 / 25 DE JULIO DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S., identificado con NIT. 900.610.809 – 3, representado legalmente por JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA

CONTRATO INTERVENTORÍA No : N.A | INTERVENTOR: N.A

PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29 DE JULIO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 6 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 06/09/2024 (Indique día/mes/año) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 16/09/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 619.016.362,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 84.946.338,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 703.962.700,00

ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación Nº 1			OBRA EJECUTADA					
									ACTA Nº 1		PRESENTE ACTA ACTA Nº 2		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+) / (-)	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**													$ -
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.399,00	$ 2.311,00	$ 10.166.089	85,50	4.484,50	10.363.679,50	1836,49	4.244.128,39	2125,89	4.912.931,79	3.962,38	$ 9.157.060,18
	SUBTOTAL				**$ 10.166.089**			**10.363.679,50**		**4.244.128,39**		**4.912.931,79**		**$ 9.157.060,18**
2	**ADECUACION DE TERRENO**													
2.1	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	M3	659,85	$ 30.504,00	$ 20.128.064	193,58	853,43	26.033.028,72	642,77	19.607.056,08	210,47	6.420.308,05	853,24	$ 26.027.364,13
2.2	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	M3	320	$ 9.975,00	$ 3.192.000	(92,50)	227,50	2.269.312,50	183,65	1.831.908,75	40,50	403.937,63	224,15	$ 2.235.846,38
2.3	RELLENO EN MATERIAL TIPO SELECCIONADO Y COMPACTADO	M3	439,9	$ 18.375,00	$ 8.083.163	7,04	446,94	8.212.522,50	275,47	5.061.761,25	165,13	3.034.190,25	440,60	$ 8.095.951,50
	SUBTOTAL				**$ 31.403.227**			**36.514.863,72**		**$ 26.500.726**		**$ 9.858.435,92**		**$ 36.359.162,00**
3	**PAVIMENTO**													
3.1	PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,18 (3.000 PSI), INCLUYE CURADO CON ANTISOL Y ACABADO TEXTURIZADO	M2	4399	$ 50.400,00	$ 221.709.600	85,10	4.484,10	225.998.640,00	1836,49	92.559.096,00	2125,89	107.144.856,00	3.962,38	$ 199.703.952,00
3.2	JUNTA DE DILATACIÓN CON PAVIFLEX	ML	2296,33	$ 3.360,00	$ 7.715.680	103,86	2.400,19	8.064.649,60						$ -
	SUBTOTAL				**$ 229.425.280**			**234.063.289,60**		**$ 92.559.096**		**$ 107.144.856,00**		**$ 199.703.952,00**
4	**ACERO DE REFUERZO**													
4.1	ACERO DE TRANSFERENCIA D=5/8" CORRUGADO	KG	863,2	$ 1.260,00	$ 1.087.632	327,00	1.190,20	1.499.652,00	405,18	510.526,80	456,12	574.708,68	861,30	$ 1.085.235,48
4.2	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1" LISA	KG	3541,33	$ 1.260,00	$ 4.462.080	3.484,00	7.025,33	8.851.920,00	2886,4	3.636.864,00	3234,94	4.076.029,44	6.121,34	$ 7.712.893,44
	SUBTOTAL				**$ 5.549.712**			**10.351.572,00**		**$ 4.147.391**		**$ 4.650.738,12**		**$ 8.798.128,92**
5	**BORDILLOS**													
5.1	BORDILLO DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1660	$ 12.600,00	$ 20.916.000	303,57	1.963,57	24.741.028,62	326	4.107.600,00	1600,00	20.160.000,00	1.926,00	$ 24.267.600,00
	SUBTOTAL				**$ 20.916.000**			**24.741.028,62**		**$ 4.107.600**		**$ 20.160.000,00**		**$ 24.267.600,00**
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**													
6.1	REALCE DE MH	UN	10	$ 500.000,00	$ 5.000.000	1,00	11,00	5.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	10,00	$ 5.000.000,00
6.2	REUBICACIÓN DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO	UN	78	$ 68.363,00	$ 5.332.314	1,00	79,00	5.400.677,00	15	1.025.445,00			15,00	$ 1.025.445,00
6.3	REUBICACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UN	78	$ 277.600,00	$ 21.652.800	1,00	79,00	21.930.400,00	15	4.164.000,00			15,00	$ 4.164.000,00
				SUBTOTAL	$ 31.985.114			32.831.077,00		$ 7.689.445		$ 2.500.000,00		$ 10.189.445,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CHIGORODO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Municipio de Chigorodó

FECHA 13 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

	VALOR COSTO DIRECTO			$ 329.445.422			348.865.510,00		$ 139.248.386		$ 149.226.961,83		$	288.475.348,10
	ADMINISTRACION	30%		$ 98.833.627			104.659.653,00		$ 41.774.516,00		$ 44.768.088,55		$	86.542.604,43
	COSTO TOTAL (CT)			$ 428.279.048			453.525.163,00		$ 181.022.902		$ 193.995.050,38		$	375.017.952,53
MATERIALES DE CONFORMIDAD AL CONVENIO N° 23AS111B1191 POR MUNICIPIO														
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M3 (INCLUYE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES)	VALOR TOTAL										
CEMENTO		BULTOS	$ 39.728,00		1.082,00	1.082,00	42.985.696,00						$	-
SUMINISTRO TRITURADO ¾"	728	M3	$ 86.677,00	$ 63.100.856	(78,00)	650,00	56.340.050,00	277,68	24.068.469,36	319,00	27.649.963,00	596,68	$	51.718.432,36
SUMINISTRO ARENA PARA CONCRETO	558	M3	$ 81.363,00	$ 45.400.554	76,00	634,00	51.584.142,00	185,12	15.061.918,56	398,00	32.382.474,00	583,12	$	47.444.392,56
SUB-BASE	375	M3	$ 73.389,00	$ 27.520.875	115,42	490,42	35.991.201,47	275,47	20.216.467,83	99,53	7.304.407,17	375,00	$	27.520.875,00
SUBTOTAL MATERIALES				$ 136.022.285			$ 186.901.089		$ 59.346.856		$ 67.336.844,17		$	126.683.699,92
MATERIALES DE ALGUNAS ACTIVIDADES PARA TERMINAR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONVENIO N° 4600016202 POR MUNICIPIO														
SUMINISTRO TRITURADO ¾"	236	M3	$ 86.677,00	$ 20.455.772	16,00	252,00	21.842.604,00			252,00	21.842.604,00	252,00	$	21.842.604,00
SUMINISTRO ARENA PARA CONCRETO	210	M3	$ 81.363,00	$ 17.086.230	12,00	222,00	18.062.586,00			222,00	18.062.586,00	222,00	$	18.062.586,00
SUB-BASE	234	M3	$ 73.389,00	$ 17.173.026	88,00	322,00	23.631.258,00	140,00	10.274.460,00	182,00	13.356.798,00	322,00	$	23.631.258,00
SUBTOTAL MATERIALES				$ 54.715.028			$ 63.536.448		$ 10.274.460		$ 53.261.988,00		$	63.536.448,00
									$ 69.621.316		$ 120.598.832,17			
VALOR TOTAL				$ 619.016.361			$ 703.962.700	35,60%	$ 250.644.218	44,69%	$ 314.593.882,55	80,29%	$	565.238.100,45
VALOR TOTAL ACTA N° 2 Y PARCIAL									$ 250.644.218	80,29%	$ 314.593.882,55		$	565.238.100,45

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

Valor Anticipo Otorgado	$ -		VALOR A PAGAR PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	ACTA N° 2	$ 314.593.882,55		$ 314.593.882,55
Valor Amortizado Acumulado	$ -	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		
Neto a Pagar	$ -				
Registro Presupuestal No.					

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/L**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas y en las memorias de calculo (Obra, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
EDGAR PALACIOS PANESSO
GERENTE
EDUH

Firma
JHON JAMES CASTAÑO PEREIRA
REPRESENTANTE LEGAL DISINCOVI
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADO

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS11181191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	1,1	NOMBRE DEL ITEM	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	UNIDADAD	M2
FECHA DE ELABORACION:				CANTIDAD CONTRATADA	4399


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	CANTIDAD PAGADA	SUBTOTAL
	carrera 50 tramo entre calle 50 y fin de la via	1	99,3	3						297,90	
	carrera 50 tramo entre calle 51 y calle 52	1	101,5	5,3						537,95	
	carrera 51 enytre calle 50 y calle 51	1	73,4	5,3						389,02	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	74,1	5,3						392,73	
	calle 51 entre carrera 50 y carrera 51	1	41,3	5,3						218,89	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	18,2	5,3							96,46
	carrera 51 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45							404,95
	carrera 51A entre calle 49 y colegio	1	55	5,3							291,50
	calle 49 entre carrera 51 y carrera 52	1	44,1	5,3							233,73
	calle 50 entre carrera 51 y carrera 52	1	14	5,3							74,20
	calle 52 entre carrera 50 y carrera 53	1	117	5,3							620,10
	carrera 52 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45							404,95

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1836,49	2125,89
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	436,62	


REGISTRO FOTOGRAFICO 1




REGISTRO FOTOGRAFICO 2

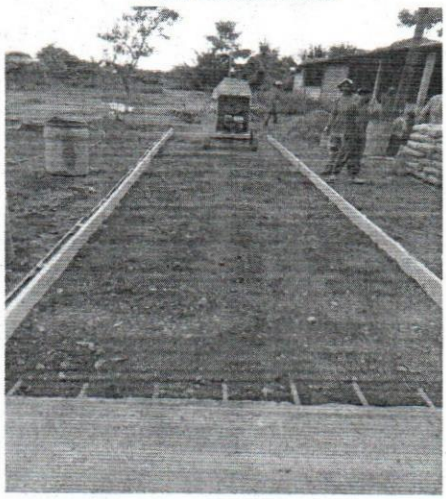

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

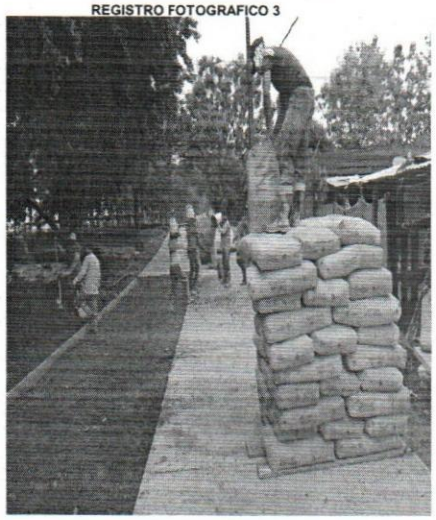

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

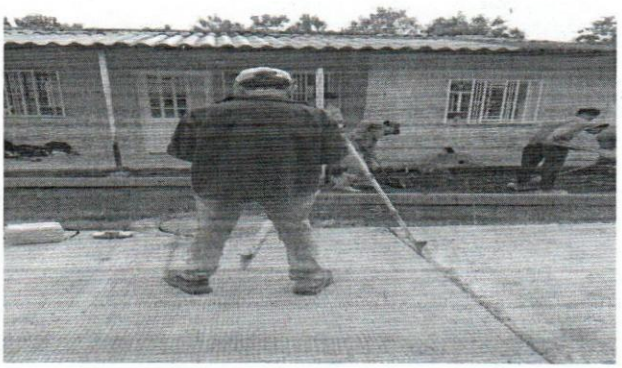

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADO

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	2.1	NOMBRE DEL ITEM	CORTE CON MOTONIVELADORA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR, NO INCLUYE RETIRO	UNIDADAD	699,85
FECHA DE ELABORACION:				CANTIDAD CONTRATADA	M3

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	olumen(m	Peso (kg)	CANTIDADES PAGADAS	SUBTOTAL
	carrera 50 tramo entre calle 50 y fin de la via	1	99,3	3	0,35					104,27	
	carrera 50 tramo entre calle 51 y calle 52	1	101,5	5,3	0,35					188,28	
	carrera 51 enytre calle 50 y calle 51		73,4	5,3	0,35					136,16	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	74,1	5,3	0,35					137,46	
	calle 51 entre carrera 50 y carrera 51	1	41,3	5,3	0,35					76,61	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	14,66	5,3	0,2						15,53
	carrera 51 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45	0,2						80,99
	carrera 51A entre calle 49 y colegio	1	55	5,3	0,18						52,47
	calle 49 entre carrera 51 y carrera 52	1	44	5,3	0,2						46,64
	calle 50 entre carrera 51 y carrera 52	1	14	5,3	0,2						14,84
	calle 52 entre carrera 50 y carrera 53	1	117	5,3							0,00
	carrera 52 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45							0,00
	carrera 52 entre calle 51 y calle 52 TRASLADO DE TUBERIA ACUEDUCTO	1	80	0,4							0,00
									CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	642,77	210,47
									CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		
									CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		
									CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	-153,40	


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2




REGISTRO FOTOGRAFICO 3

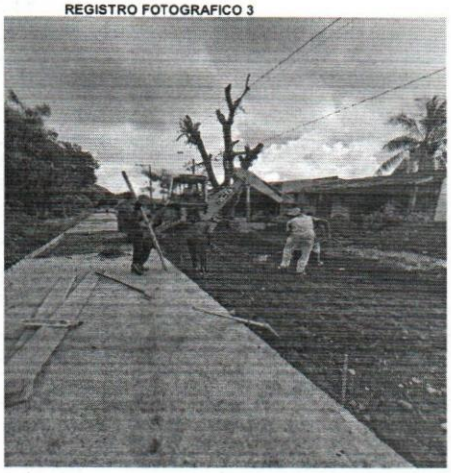

REGISTRO FOTOGRAFICO 4




REGISTRO FOTOGRAFICO 5

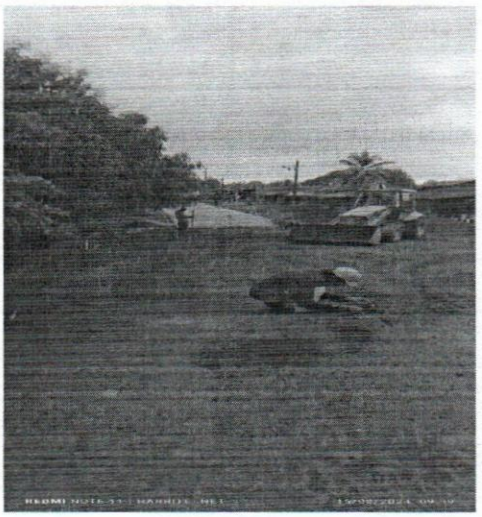

REGISTRO FOTOGRAFICO 6



REGISTRO FOTOGRAFICO 7

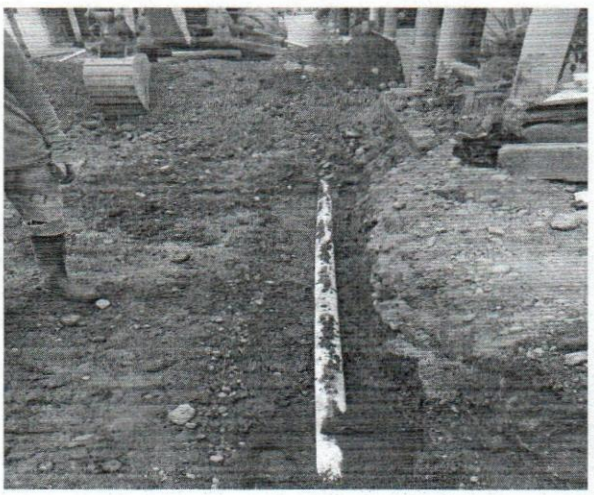

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADO

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	2,2	NOMBRE DEL ITEM	CARGUE MECANICO DE MATERIAL	UNIDADAD	M3
FECHA DE ELABORACION:				CANTIDAD CONTRATADA	320


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	h	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	pagado	SUBTOTAL
	carrera 50 tramo entre calle 50 y fin de la via	1	99,3	3	0,1					29,79	
	carrera 50 tramo entre calle 51 y calle 52	1	101,5	5,3	0,1					53,80	
	carrera 51 enytre calle 50 y calle 51		73,4	5,3	0,1					38,90	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	74,1	5,3	0,1					39,27	
	calle 51 entre carrera 50 y carrera 51	1	41,3	5,3	0,1					21,89	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	18,2	5,3							0,00
	carrera 51 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45	0,1						40,50
	carrera 51A entre calle 49 y colegio	1	55	5,3							0,00
	calle 49 entre carrera 51 y carrera 52	1	44,1	5,3							0,00
	calle 50 entre carrera 51 y carrera 52	1	14	5,3							0,00
	calle 52 entre carrera 50 y carrera 53	1	117	5,3							0,00
	carrera 52 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45							0,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	183,65	40,50
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		40,50
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		40,50
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	95,86	

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2

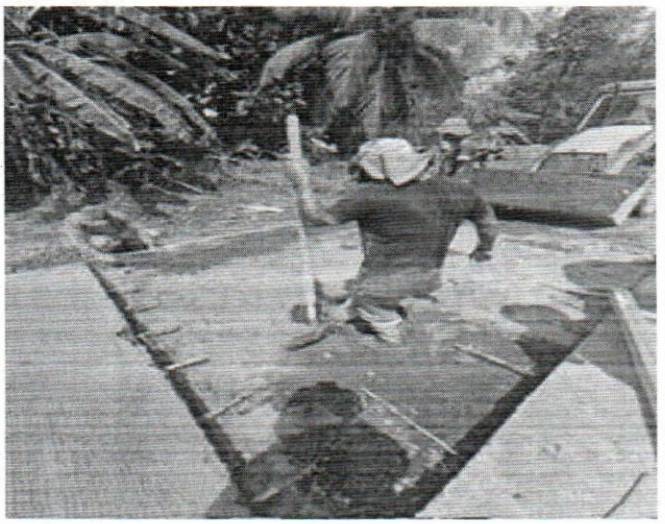

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS


ITEM	2.3	NOMBRE DEL ITEM	RELLENO EN MATERIAL TIPO SELECCIONADO Y COMPACTADO	UNIDADAD	M3
FECHA DE ELABORACION:				CANTIDAD CONTRATADA	439,9

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	h	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	CANT PAGADAS	SUBTOTAL
	carrera 50 tramo entre calle 50 y fin de la via	1	99,3	3	0,15					44,69	
	carrera 50 tramo entre calle 51 y calle 52	1	101,5	5,3	0,15					80,69	
	carrera 51 enytre calle 50 y calle 51		73,4	5,3	0,15					58,35	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	74,1	5,3	0,15					58,91	
	calle 51 entre carrera 50 y carrera 51	1	41,3	5,3	0,15					32,83	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	18,2	5,3	0,15						14,47
	carrera 51 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45	0,15						60,74
	carrera 51A entre calle 49 y colegio	1	55	5,3	0,15						43,73
	calle 49 entre carrera 51 y carrera 52	1	44,1	5,3	0,15						35,06
	calle 50 entre carrera 51 y carrera 52	1	14	5,3	0,15						11,13
	calle 52 entre carrera 50 y carrera 53	1	117	5,3							0,00
	carrera 52 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45							0,00
									CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	275,47	165,13
									CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		
									CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	-0,70	


REGISTRO FOTOGRAFICO 1




REGISTRO FOTOGRAFICO 2

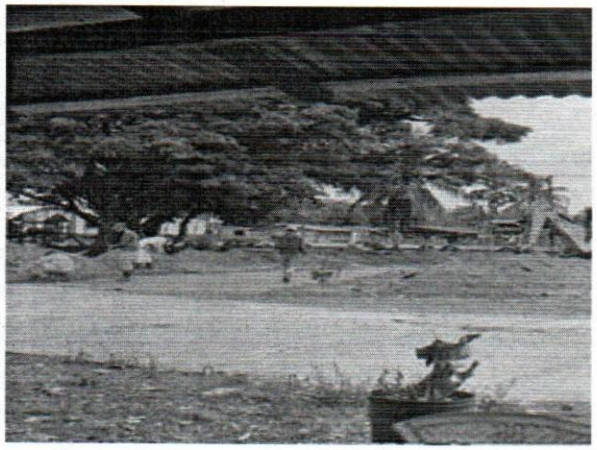

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

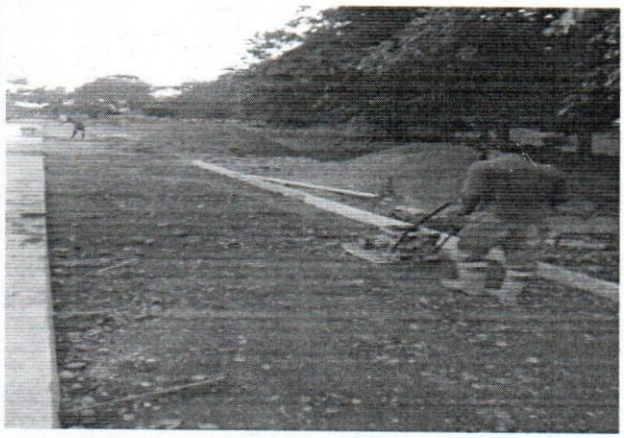

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

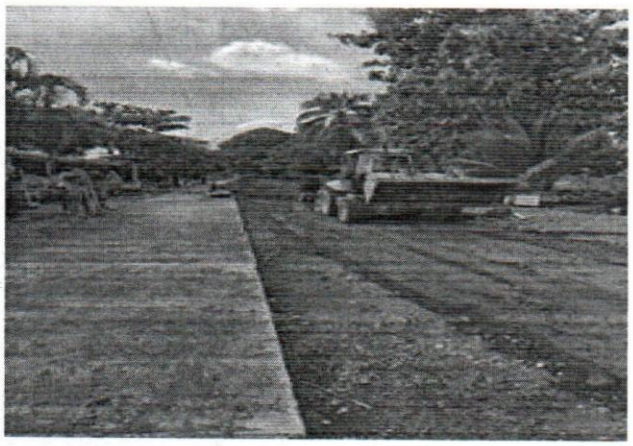

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADO


CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	3,1	NOMBRE DEL ITEM	PAVIMENTO EN CONCRETO E=0,18 (3.000 PSI), INCLUYE CURADO CON ANTISOL Y ACABADO TEXTURIZADO	UNIDADAD	M2
FECHA DE ELABORACION				CANTIDAD CONTRATADA	4399


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	CANT PAGADA	SUBTOTAL
	carrera 50 tramo entre calle 50 y fin de la via	1	99,3	3						297,9	
	carrera 50 tramo entre calle 51 y calle 52	1	101,5	5,3						537,95	
	carrera 51 enytre calle 50 y calle 51		73,4	5,3						389,02	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	74,1	5,3						392,73	
	calle 51 entre carrera 50 y carrera 51	1	41,3	5,3						218,89	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	18,2	5,3							96,46
	carrera 51 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45							404,95
	carrera 51A entre calle 49 y colegio	1	55	5,3							291,5
	calle 49 entre carrera 51 y carrera 52	1	44,1	5,3							233,73
	calle 50 entre carrera 51 y carrera 52	1	14	5,3							74,2
	calle 52 entre carrera 50 y carrera 53	1	117	5,3							620,1
	carrera 52 entre calle 51 y calle 52	1	91	4,45							404,95

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1836,49	2125,89
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	436,62	


REGISTRO FOTOGRAFICO 1

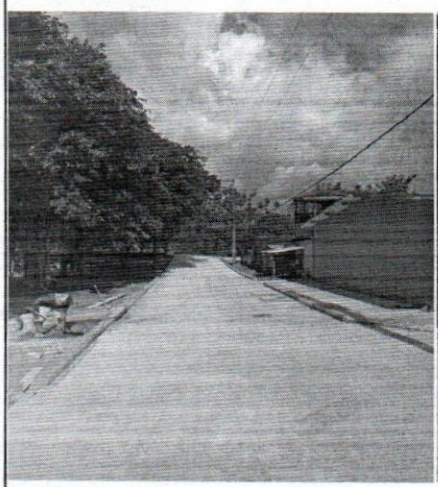


REGISTRO FOTOGRAFICO 2

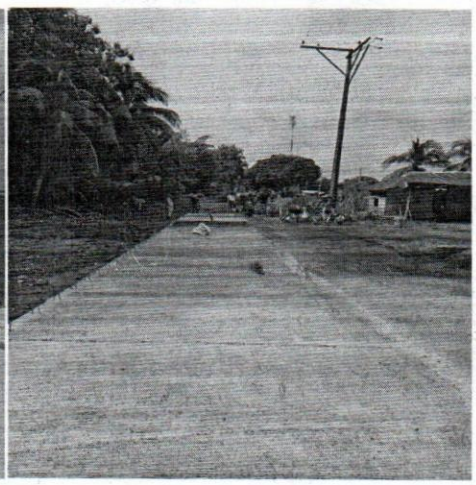


REGISTRO FOTOGRAFICO 3

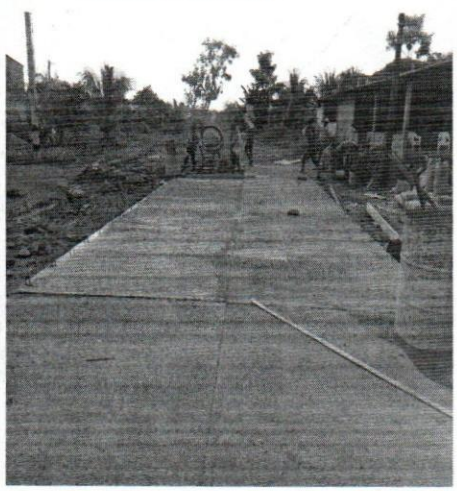


REGISTRO FOTOGRAFICO 13

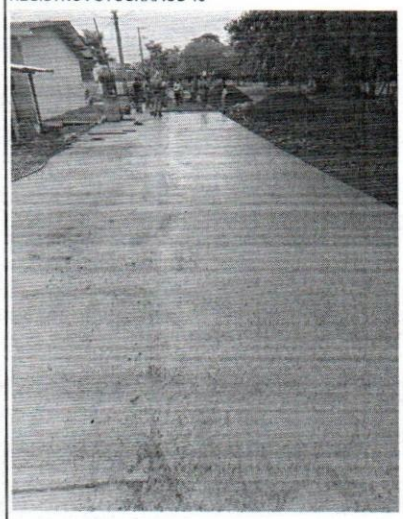

REGISTRO FOTOGRAFICO 14

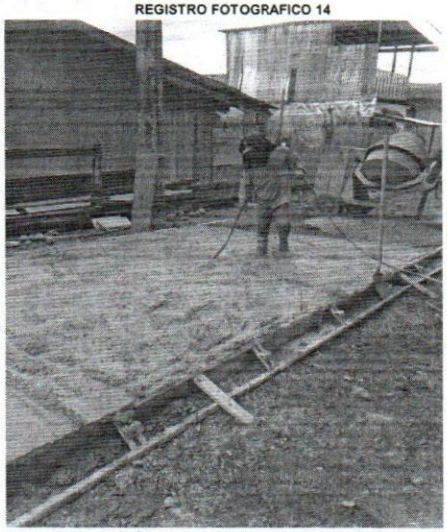

REGISTRO FOTOGRAFICO 15

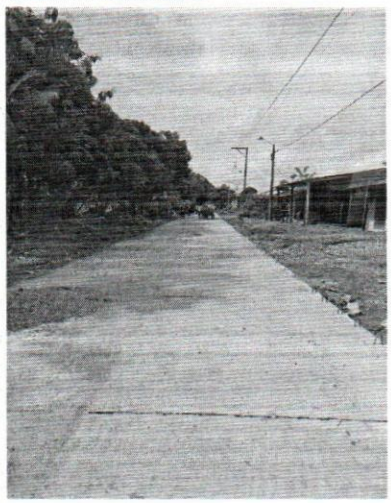

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
A N T I O Q U I A

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS

ITEM	4,1	NOMBRE DEL ITEM	ACERO DE TRANSFERENCIA D=5/8" CORRUGADO	UNIDADAD	KG
FECHA DE ELABORACION:				CANTIDAD CONTRATADA	863,2


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Largo(m)	separacion	ancho placa	largo barra	canti placas	No. Barras	Peso (kg)	CANT PAGADA	SUBTOTAL
	carrera 50 tramo entre calle 50 y fin de la via	99,3	1,5		1		66,2	1,56	103,272	-103,272
	carrera 50 tramo entre calle 51 y calle 52	101,5	1,5		1		67,7	1,56	105,612	
	carrera 51 enytre calle 50 y calle 51	73,4	1,5		1		48,9	1,56	76,284	
	carrera 51 entre calle 50 y calle 51	74,1	1,5		1		49,40	1,56	77,064	
	calle 51 entre carrera 50 y carrera 51	41,3	1,5		1		27,50	1,56	42,9	
	carrera 51 entre calle 50 y calle 51	18,2	1,2		1		15,17	1,56		23,66
	carrera 51 entre calle 51 y calle 52	91	1,2		1		75,83	1,56		118,3
	carrera 51A entre calle 49 y colegio	55	1,2		1		45,83	1,56		71,5
	calle 49 entre carrera 51 y carrera 52	44,1	1,2		1		36,75	1,56		57,33
	calle 50 entre carrera 51 y carrera 52	14	1,2		1		11,67	1,56		18,2
	calle 52 entre carrera 50 y carrera 53	117	1,2		1		97,50	1,56		152,1
	carrera 52 entre calle 51 y calle 52	91	1,2		1		75,83	1,56		118,3

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	405,13	456,12
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	1,95	

REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2

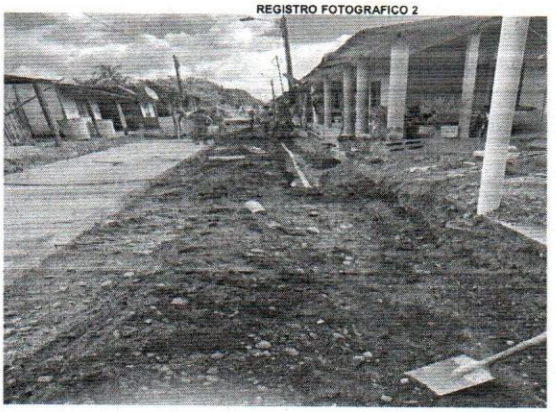

REGISTRO FOTOGRAFICO 3



REGISTRO FOTOGRAFICO 4



NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

MUNICIPIO DE CHIGORODO


eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
A P A R T A D O

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	13 DE OCTUBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.


ITEM	4,1	NOMBRE DEL ITEM	ACERO DE TRANSFERENCIA D=1" LISA	UNIDADAD	KG
FECHA DE ELABORACION:				CANTIDAD CONTRATADA	3541,33

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	separacion	ancho	Cantidad	Numero de barras	largo barra	Peso (kg)	cant pagadas	SUBTOTAL
	carrera 50 tramo entre calle 50 y fin de la via	1	99,3	3	3	33,1	8	0,4	3,98		
	carrera 50 tramo entre calle 51 y calle 52	1	101,5	3	5,3	33,8	16	0,4	3,98		
	carrera 51 enytre calle 50 y calle 51		73,4	3	5,3	24,5	16	0,4	3,98		
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	74,1	3	5,3	24,7	16	0,4	3,98		
	calle 51 entre carrera 50 y carrera 51	1	41,3	3	5,3	13,8	16	0,4	3,98		
	carrera 50 tramo entre calle 50 y fin de la via	1	99,3	3	3	33,1	8	0,4	3,98	421,56	
	carrera 50 tramo entre calle 51 y calle 52	1	101,5	3	5,3	33,8	16	0,4	3,98	861,80	
	carrera 51 enytre calle 50 y calle 51		73,4	3	5,3	24,5	16	0,4	3,98	623,21	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	74,1	3	5,3	24,7	16	0,4	3,98	629,16	
	calle 51 entre carrera 50 y carrera 51	1	41,3	3	5,3	13,8	16	0,4	3,98	350,66	
	carrera 51 entre calle 49 y calle 50	1	18,2	3	5,3	6,0	16	0,4	3,98		152,8
	carrera 51 entre calle 51 y calle 52	1	91	3	4,45	30,0	12	0,4	3,98		573,1
	carrera 51A entre calle 49 y colegio	1	55	3	5,3	18,0	16	0,4	3,98		458,5
	calle 49 entre carrera 51 y carrera 52	1	44,1	3	5,3	15,0	16	0,4	3,98		382,1
	calle 50 entre carrera 51 y carrera 52	1	14	3	5,3	4,0	16	0,4	3,98		101,9
	calle 52 entre carrera 50 y carrera 53	1	117	3	5,3	39,0	16	0,4	3,98		993,4
	carrera 52 entre calle 51 y calle 52	1	91	3	4,45	30,0	12	0,4	3,98		573,1
	correccion acta 1										
										2886,40	3234,94
									CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		
									CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		
									CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	-2580,02	

REGISTRO FOTOGRAFICO 1

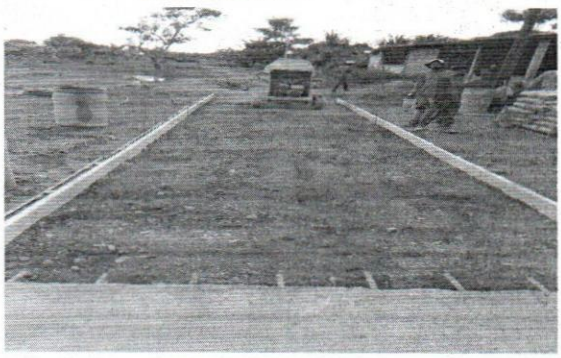


REGISTRO FOTOGRAFICO 2

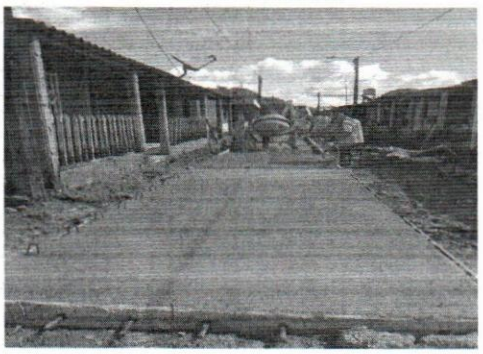

REGISTRO FOTOGRAFICO 3



REGISTRO FOTOGRAFICO 4

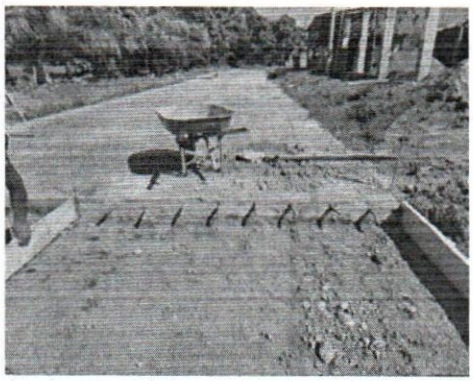

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	5,1	NOMBRE DEL ITEM	BORDILLO DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UNIDADAD	ML
FECHA DE ELABORACION:				CANTIDAD CONTRATADA	1660


ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)	SUBTOTAL
	BORDILLO GENERALES									1600,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1600,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	


REGISTRO FOTOGRAFICO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO 2

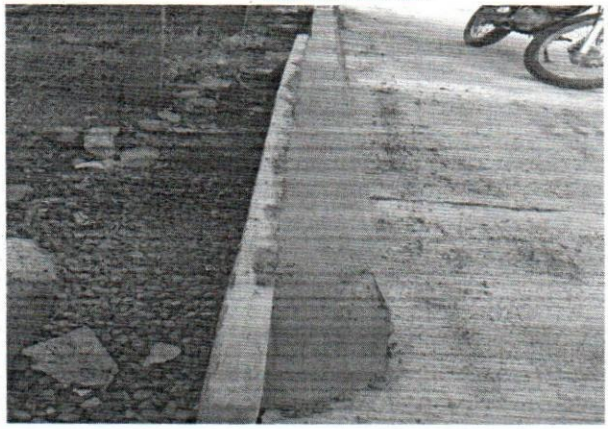

REGISTRO FOTOGRAFICO 5

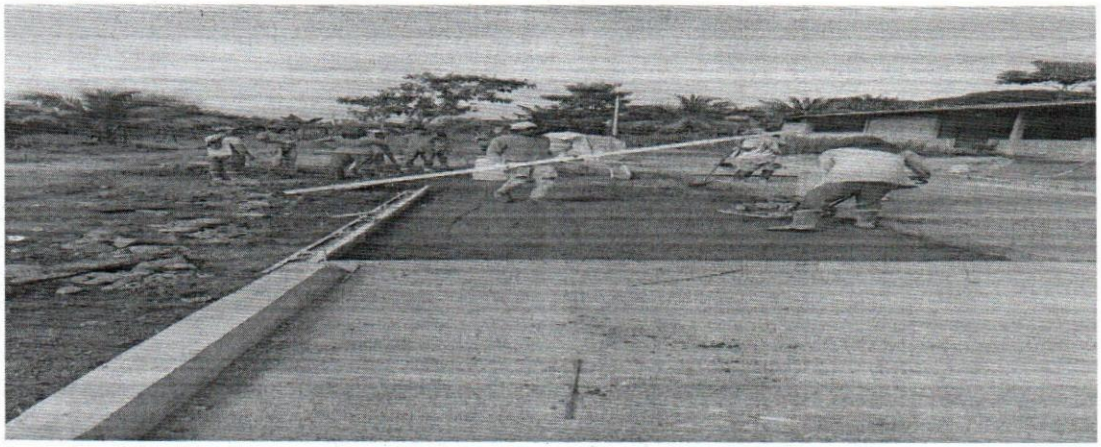

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

MUNICIPIO DE CHIGORODO

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
ANTIOQUIA

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM 6.1 NOMBRE DEL ITEM: REALCE DE MH

FECHA DE ELABORACION:


UNIDADAD: UN

CANTIDAD CONTRATADA: 10

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
	calle entrada principal					3				3,00	
	calle entrada principal tramo puente calle segunda					2				2,00	
	REALCES VARIOS					5					5,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5,00	5,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	0,00	


REGISTRO FOTOGRAFICO 1

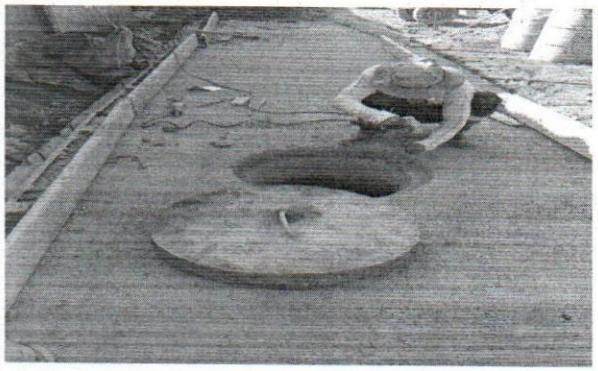


REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

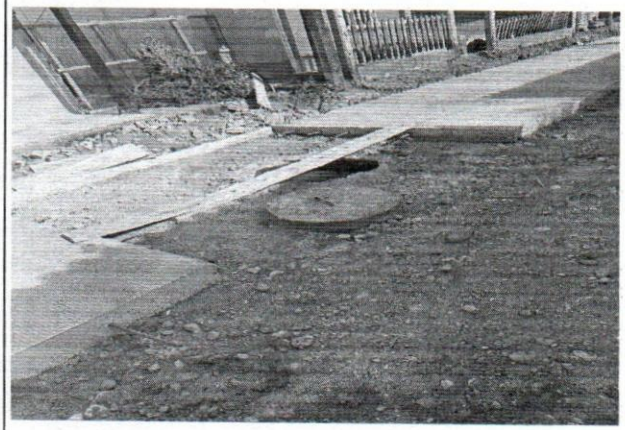

REGISTRO FOTOGRAFICO 4

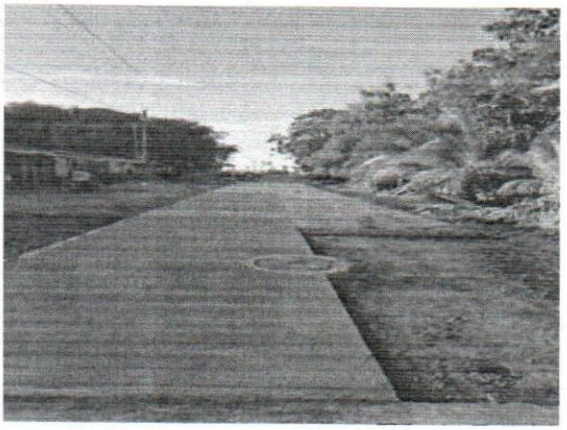

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

MUNICIPIO DE CHIGORODO


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

edu h
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
ANTIOQUIA

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700		CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	6.2	NOMBRE DEL ITEM	REUBICACIÓN DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO								UNIDADAD	UN
FECHA DE ELABORACION:											CANTIDAD CONTRATADA	78
ESQUEMA o DIBUJOS		Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
		calle parque					15					15,00
											CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	15,00
											CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	15,00
											CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	15,00
											CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	63,00


REGISTRO FOTOGRAFICO 1

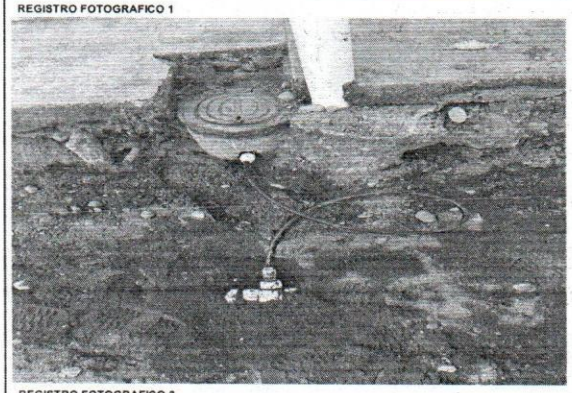

REGISTRO FOTOGRAFICO 2



REGISTRO FOTOGRAFICO 3

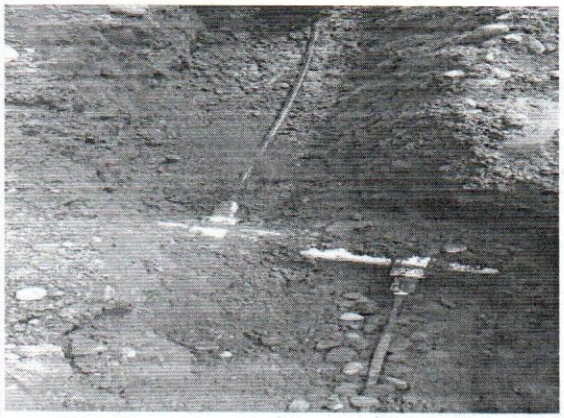

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



REGISTRO FOTOGRAFICO 5



REGISTRO FOTOGRAFICO 6



NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:


nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS


CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700,00	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM	6.3	NOMBRE DEL ITEM	REUBICACIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO							UNIDADAD	UN
FECHA DE ELABORACION:										CANTIDAD CONTRATADA	78
ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/		Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
	calle perque						15					0,00
												15,00
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		15,00
										CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		15,00
										CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		15,00
										CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO		78,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

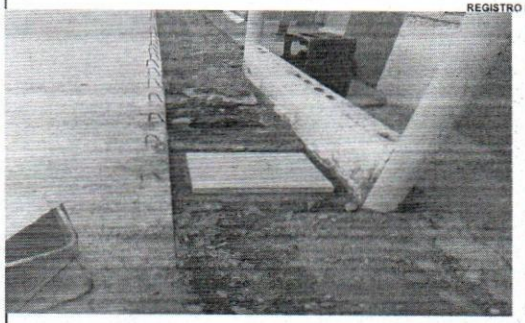




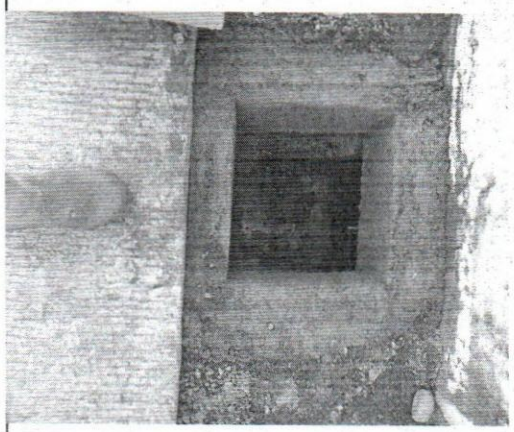





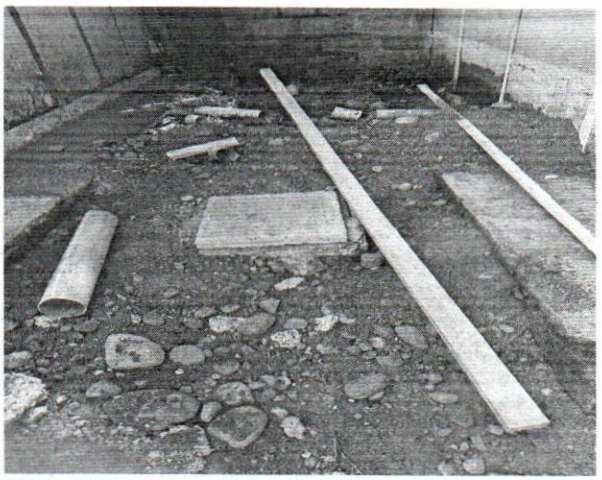

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:


nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS


CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACON DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM		NOMBRE DEL ITEM	SUMINISTRO ARENA PARA CONCRETO								UNIDADAD	M3
FECHA DE ELABORACION:											CANTIDAD CONTRATADA	558
ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/		Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Volumen(m3)	volumen arena	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
	suministro de arena											398,00
											CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	398,00
											CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	
											CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	


REGISTRO FOTOGRAFICO 1

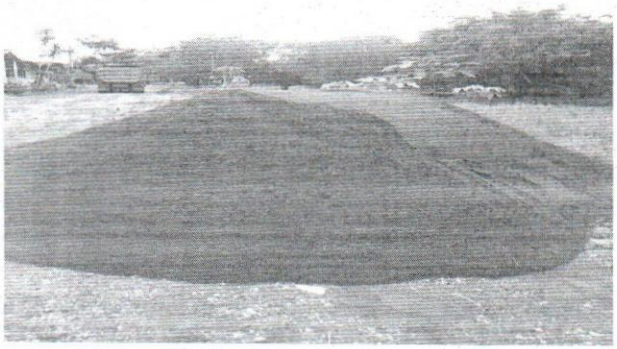

REGISTRO FOTOGRAFICO 2

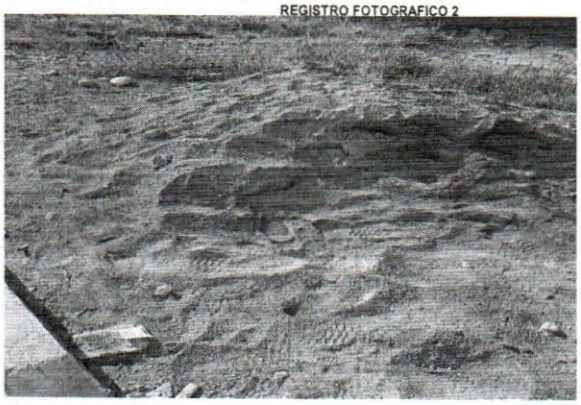

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

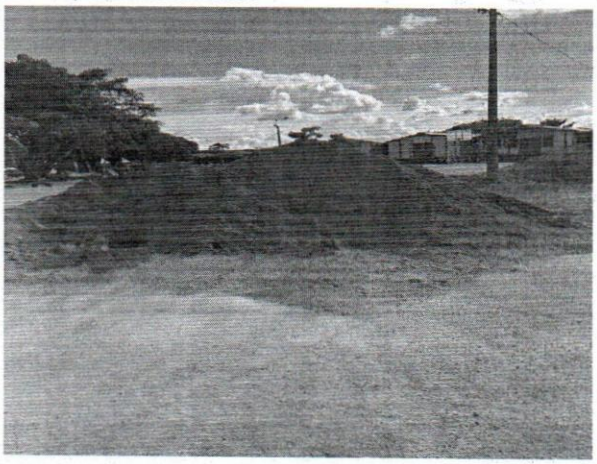

REGISTRO FOTOGRAFICO 4



NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388


DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


ITEM	NOMBRE DEL ITEM									UNIDADAD	M3
FECHA DE ELABORACION:										CANTIDAD CONTRATADA	375
ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Volumen(m3)	volumen	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
	suministro de subbase										99,53

CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	99,53
CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	
CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA	
CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO	


REGISTRO FOTOGRAFICO 1

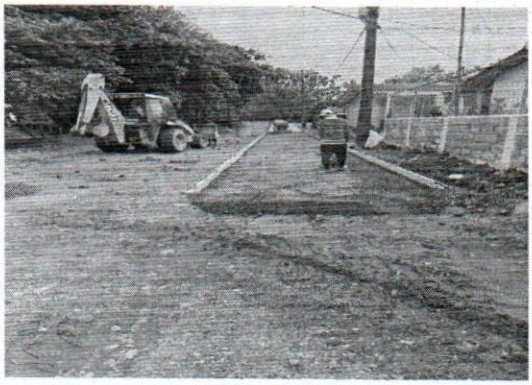


REGISTRO FOTOGRAFICO 2

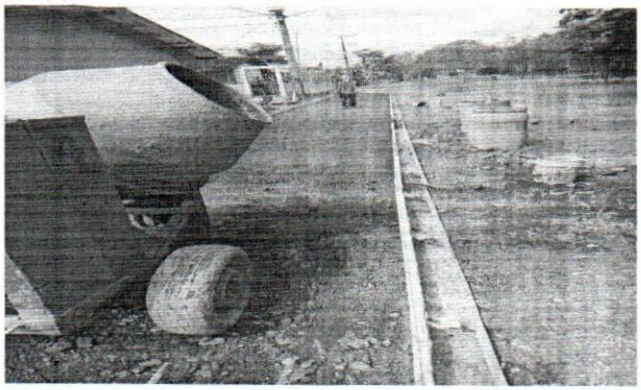

REGISTRO FOTOGRAFICO 3

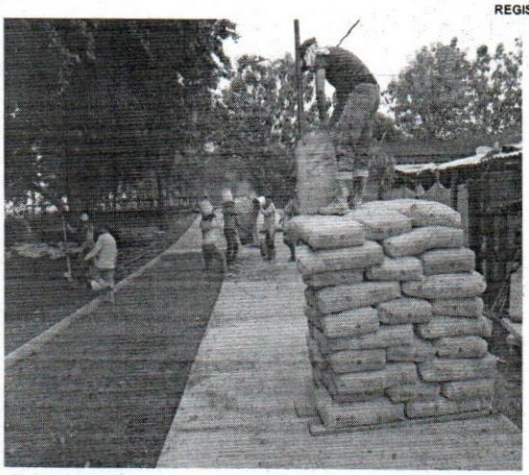

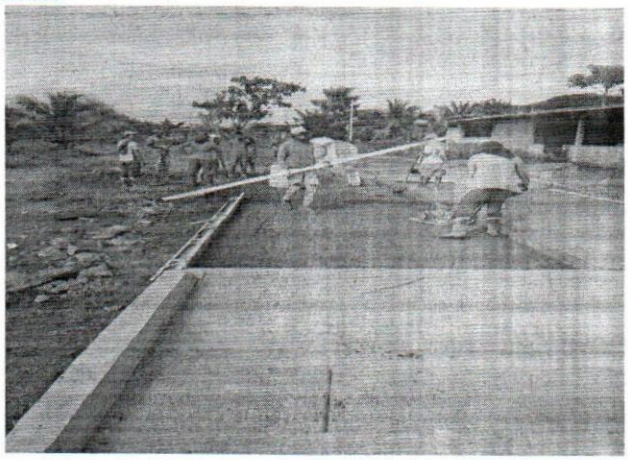

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CHIGORODO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

eduh
Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
A P A R T A D O

CONTRATANTE	No		Contratista	Plazo	F. Inicio	F. Termina	Valor	Soporte Acta No	OBJETO
MUNICIPIO DE CHIGORODO	CONTRATO OBRA	EDUH -034	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CUATRO (4) MESES	29 DE JULIO DE 2024	6 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 703.962.700	2	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ITEM		NOMBRE DEL ITEM	SUB-BASE	UNIDADAD	
FECHA DE ELABORACION:				CANTIDAD CONTRATADA	

ESQUEMA ó DIBUJOS	Elemeto/Ubicación/	Veces	Largo(m)	Ancho(m)	Alto (m)	Cantidad	Area (m2)	Volumen(m3)	Peso (kg)		SUBTOTAL
									CANTIDAD TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		
									CANTIDAD TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		
									CANTIDAD A PAGAR PRESENTE ACTA		
									CANTIDAD POR EJECUTAR DEL CONTRATO		

NOTA: Las dimensiones, calculos, cantidades y esquemas representados en esta memoria son responsabilidad exclusiva de la interventoria y el contratista y estaran sujeta a revision y aprobación por parte de la supervisión.

nombre:
Residete interventoria
Matricula No:

nombre: Julio Cesar Camargo O.
Residente Obra
Matricula No: 05202123388

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	

No:	02 y Parcial	Fecha:	15	de	Noviembre	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato:	**CONTRATO DE OBRA**	**Nº:**	**EDUH-34 del 25 de julio de 2024**
Nº Compromiso Presupuestal	Nº 00232 del 29/07/2024	**Rubro Presupuestal:**	2.3.2.02.02.005
Objeto:	**CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**		
Interventor:	**N.A.**		
Supervisor:	**GIOVANY CORREA VALENCIA** PROFESIONAL UNIVERSITARIO - EDUH		
Contratista:	**DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** RL/ JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA		

Valor del contrato:	**SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)**
Duración del contrato:	**DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**

CONSIDERANDO:

- Que entre la **EICE-EDUH APARTADO** y **JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA**, identificado con la C. C. Nº 10.003.584, actuando como representante legal de **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S;** sociedad identificada tributariamente con el NIT 900.610.809 - 3 en calidad de contratista se celebró el CONTRATO DE OBRA Nº EDUH-34 de 2024, cuyo objeto es "***CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA***

- DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" por un valor de **SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)**.

- Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 29 de julio de 2024, quedando como fecha de terminación el día 13 de octubre de 2024.

- Que la **CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:**

  "*...El valor del contrato se pagará mediante ACTAS PARCIALES conforme al avance porcentual de las actividades, pagaderos previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura, informe de actividades realizadas por el contratista, autoliquidaciones del pago de salud, pensiones y riesgos laborales conforme a las disposiciones legales. Constancia de recibo a satisfacción del supervisor, acta de pago e informe del supervisor.*

  Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. Para el pago final se debe presentar el acta de liquidación.

  Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Chigorodó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente la EICE – EDUH Apartadó y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

  Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los contratistas deberán acreditar el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente.

  Parágrafo 3: En el proceso de pagos se deberán tener en cuenta las Instrucciones dadas por la Subdirección Financiera y Contable del Municipio de Chigorodó, para la radicación de facturas o cuentas de cobro: La presentación de los documentos para inicio del trámite de pago se hará por medio del SECOP II y de forma física radicada al supervisor del contrato.

  Parágrafo 4: El contratista asumirá el costo de las retenciones a que tengan lugar en el Municipio de Chigorodó: 1. Estampilla procultura (2%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 194 y 200; 2. Estampilla bienestar adulto mayor (4%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 201 y 210; 3. Tasa prodeporte (2%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 211 y 214; 4. Estampilla prohospital (1%): conforme a las disposiciones del Acuerdo Municipal 008 de 2021, específicamente en el Articulo 215 al 218; 5. Retención en la fuente: de acuerdo al Artículo 383 del Estatuto Tributario de Colombia. 6. Reteica: de conformidad al Artículo 93 del Acuerdo Municipal 008 de 2021; 7. Contribución obra pública (5%): de conformidad al Artículo 160 del Acuerdo Municipal 008 de 2021.

  Parágrafo 5: La periodicidad de los pagos se efectuará de conformidad con la certificación de la disponibilidad de PAC programado por la Tesorera de la EICE - EDUH Apartadó.

  Parágrafo 6: La EICE EDUH - APARTADO no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirve de soporte para el trámite y previa recepción de las obras a satisfacción por parte del contratante, o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato..."

	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DE APARTADÓ	
	ACTA DE PAGO	

- Que el día 06 de septiembre de 2024 se firmó acta de suspensión Nº 1 Debido al estado de las vías nacionales que se encuentran bloqueadas por las manifestaciones de camioneros y transportadores de carga.
- Que el día 16 de septiembre de 2024 se firmó acta de reinicio Nº 1, quedando con nueva fecha de terminación del día 22 de octubre de 2024

- Que el día 21 de octubre de 2024 se firmó Otro Si Modificatorio Nº 1 donde se realiza Prórroga por cuarenta y cinco (45) días, quedando con nueva fecha de terminación del día 06 de diciembre de 2024

- Que el día 31 de octubre de 2024 se firmó Otro Si Modificatorio Nº 2 donde se realiza Adición por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SETE CENTAVOS ($84.946.339.57)**, para un valor total del contrato de **SETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M.L ($703.962.701,57)**

- Que el interventor y/o supervisor recibe a satisfacción el servicio por parte del contratista.

- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. (Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato)

- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR PAGADO	AMORTIZACION ANTICIPO (0%)	VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACIÓN	SALDO
1	Valor contrato	$619.016.362,00				$619.016.362,00
2	Acta Nº 1 y Parcial	$250.644.217,90	$0,00	$0,00	$250.644.217,90	$368.372.144,10
3	Adición Nº 1	$ 84.946.339,57				$ 453.318.483,67
4	Acta Nº 2 y Parcial	$314.593.882,55	$250.644.217,90	$0,00	$314.593.882,55	$ 138.724.601,12

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	2.3.2.02.02.005	$619.016.362,00

ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de **TRESCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M.L ($314.593.882,55)** correspondientes al Acta N° 2 y Parcial, según tabla adjunta.

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EDUHA

JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
RL/ DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.
CONTRATISTA

Elaboró: Giovany Correa.
Reviso: Edgar Palacios.
Aprobó: Edgar Palacios.

Seguimiento			X	Final	
Fecha:	15	de	NOVIEMBRE	del	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato número:	CONTRATO DE OBRA N° EDUH-34 DEL 25 DE JULIO DE 2024		
Objeto:	**CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**		
Valor del contrato:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($619.016.362,00)		
Plazo del contrato:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS		
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor	N.A		
Supervisor:	GIOVANY CORREA VALENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO EDUH		
Por parte del contratista:	JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA RL/. DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.		
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina EICE-EDUH Apartadó		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	09:30 a.m.	Hora de finalización (a.m./p.m.)	10:15 a.m.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
a) Asumir los costos ocasionados con el contrato de obra	80.29%	El contratista de obra asume los costos de obra inherentes a la ejecución del contrato (equipos, materiales, mano de obra, entre otros.)
b) Ejecutar las actividades de construcción con las características y especificaciones técnicas dentro del término, el sitio señalado y los requerimientos del municipio de Chigorodó.	80.29%	El contratista ejecuta las actividades conforme a las especificaciones técnicas y a las orientaciones de la Secretaria de Infraestructura Física y Valorización del municipio de Chigorodó y/o la EICE EDUH Apartadó.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

c) Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando las dilataciones y obstáculos que se puedan presentar	80.29%	El contratista obra con lealtad y buena fe en las diferentes instancias contractuales.
d) Cumplir con la normatividad vigente relacionadas con las aéreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de la obra.	80.29%	El contratista cumple con la normatividad ambiental, y normas que regulan los trabajos en el marco de brindar seguridad social y salud ocupacional.
e) Garantizar los permisos y las licencias ambientales de las correspondientes entidades competentes, cuando la ejecución de las labores contractuales así lo exijan	80.29%	A la fecha no se han requerido permisos ni licencias ambientales
f) Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión designada por el MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y/o la EICE EDUH APARTADO, durante la ejecución del contrato de obra, para efectos de ejecutar en debida forma el objeto del contrato.	80.29%	El contratista asume, acata y ejecuta las actividades del contrato conforme a las indicaciones de la Secretaria de Infraestructura Física y Valorización del municipio de Chigorodó y/o la EICE EDUH Apartadó.
g) Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución de las obras	80.29%	El contratista viene informando a la supervisión del contrato sobre las anomalías y dificultades que se presentaron en la ejecución de las obras.
h) Subsanar las obligaciones realizadas por el supervisor, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la misma.	80.29%	El contratista subsana las obligaciones realizadas por la supervisión del contrato.
i) Asistir a las reuniones periódicas o extraordinarias de seguimiento, coordinación, que sean convocados por EL CONTRATANTE y/o por su Supervisor.	80.29%	El contratista asiste a las reuniones citadas por la supervisión.
j) Cumplir con la dotación para el personal de trabajo como uniformes e implementos de seguridad	80.29%	El contratista garantiza la dotación de implementos de seguridad para el personal de trabajo en obra.
k) Verificar técnicamente los sitios en que se ejecutará la obra, las cantidades de obra, presupuesto, programación y las actividades que le permitan establecer la logística para el inicio de las obras programadas.	80.29%	El contratista verifica técnicamente cada uno de los frentes de trabajo donde se ejecutan las actividades objeto de la obra.
l) Presentar a la supervisión para su aprobación el cronograma de Obra previo al inicio de la ejecución de obra.	100%	El contratista presentó a la supervisión del contrato el cronograma de obra.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

m) Mantener el personal ofrecido como equipo profesional durante el tiempo de ejecución del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el personal propuesto se deberá realizar considerando que el profesional que reemplazará al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación deberá realizarse con previa aprobación por parte de la supervisión. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato.	80.29%	El contratista ha mantenido el personal ofrecido como equipo profesional, durante la ejecución del contrato
n) Priorizar la vinculación de MANO DE OBRA NO CALIFICADA de población vulnerable perteneciente al Municipio de CHIGORODÓ.	80.29%	El contratista prioriza la mano de obra no calificada perteneciente al municipio de Chigorodó.
o) Iniciar labores una vez se cuente con el visto bueno de la supervisión del MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y/o la EICE EDUH APARTADO.	100%	El contratista dio inicio a la ejecución de la obra una vez fue firmada el acta de inicio de obra, aprobada por la supervisión.
p) Garantizar la calidad de las obras, consignado en las especificaciones técnicas del proyecto	80.29%	El contratista garantiza la calidad de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto
q) Colaborar con la EICE – EDUH Apartadó en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la mejor calidad	80.29%	El contratista colabora con la EICE EDUH Apartadó en lo necesario para cumplir con el desarrollo del proyecto
r) Desarrollar las obras a los precios contratados y realizar los informes de acuerdo a lo pactado con el supervisor del contrato, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto.	80.29%	El contratista desarrolla las actividades de conformidad con los precios contractuales
s) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra	80.29%	El contratista ejecuta las obras, llevando a cabo procesos de control de calidad durante el desarrollo de las actividades.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

t) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare: garantías de cumplimiento, calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, y para el caso, establecer como beneficiario de las mismas al **MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y a la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**	80.29%	El contratista constituyo las siguientes pólizas: Póliza de cumplimiento Nº 595-47-994000001857 de la Aseguradora Solidaria de Colombia. Póliza de responsabilidad civil extracontractual Nº 595-74 994000000417 de la Aseguradora Solidaria de Colombia Así mismo ha realizado las actualizaciones pertinentes por modificaciones y/o prorrogas al contrato
u) Garantizar que se cumplan con las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de maquinaria	80.29%	El contratista viene garantizando las normas de seguridad industrial y de señalización de movimiento de maquinaria.
v) Permitir y facilitar el ejercicio de la supervisión seleccionada por el MUNICIPIO DE CHIGORODÓ y/o la EICE EDUH APARTADO, así como acoger las recomendaciones que esta realice durante la ejecución y liquidación del proyecto	80.29%	El contratista permite el ejercicio de supervisión y/o interventoría, acogiendo las recomendaciones realizadas en la ejecución del objeto contractual.
w) Presentar informe semanal y mensual de avance de obra, el cual contenga: Descripción general del contrato de obra, estado y porcentaje de avance de la construcción, estado de la facturación y pago de la obra, situación crítica y acción correctiva, obras adicionales y/o modificaciones y conclusiones	80.29%	El contratista presentó los informes mensuales de avance de obra.
x) Suscribir las correspondientes actas de inicio y liquidación del contrato	50%	El contratista suscribió el Acta de Inicio con fecha del 29 de julio de 2024.
y) Tener una capacidad operativa básica para ejecutar el contrato con la celeridad, organización y comunicación que según la naturaleza del contrato se requiere. Para estos efectos debe garantizar durante la ejecución del contrato una sede de trabajo para el equipo de personas.	80.29%	El contratista cuenta con una sede de trabajo

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
NIT: 901445176-6
Email: Contactenos@eduha.gov.co

z) Cumplir y Acreditar el pago de las obligaciones inherentes a los aportes con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuándo esté exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por parte del Art. 50 de la ley 789 de 2002, del Art. 2 de la ley 828 de 2003 y el Art. 23 de la ley 1150 de 2007	80.29%	El contratista acredita el pago de la seguridad social, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.
aa) Entregar la obra terminada con el recibo a satisfacción y la liquidación por parte de la EICE – EDUH Apartadó, alcaldía y con el aval del supervisor del contrato	80.29%	La obra se encuentra en un avance del 80.29%
bb) Presentar informe final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, debidamente valoradas y cuantificadas	0%	El contrato se encuentra en ejecución
cc) Solicitar al del supervisor del contrato, oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud	80.29%	El contratista ha solicitado las modificaciones que se requieren en el desarrollo de la obra. A la fecha se han realizado las siguientes modificaciones: - **Otro Si Modificatorio Nº 1,** del día 21 de octubre de 2024 donde se realiza Prórroga por cuarenta y cinco (45) días - **Otro Si Modificatorio Nº 2**, del día 31de octubre de 2024 donde se realiza Adición por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SETE CENTAVOS ($84.946.339.57),** para un valor total del contrato de **SETECIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M.L ($703.962.701,57)**

Datos Generales:

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 619.016.361,00**	Acta Nº 1 y Parcial Egreso 000384	12/09/2024	**$ 250.644.218,00**
Valor Adiciones	**$84.946.339,57**			
Valor Total del Contrato	**$703.962.701,57**			
Valor pagado	**$ 250.644.210,00**			
Valor causado que no se ha pagado	**$ 314.593.882,55**			
Valor total ejecutado (Cantidad y porcentaje)	**$ 565.238.100,57 (80.29%)**			
Valor saldo por ejecutar	**$ 138.724.599,43**			
Tiempo ejecutado corte al 09 de noviembre de 2024 (Cantidad y porcentaje)	**Tres (03) meses y Tres (3) días (77.5%)**	**Total**		**$ 250.644.217,90**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

15 días	**del mes de**	**Noviembre**	**de**	**2024**

GIOVANY CORREA VALENCIA
Supervisor
EDUHA

JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
RL DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.
CONTRATISTA

Elaboró: Giovany Correa.
Reviso: Edgar Palacios.
Aprobó: Edgar Palacios.

Carrera 103 No. 95A - 11 2do piso Barrio Nuevo Apartadó
Email: Contactenos@eduha.gov.co
NIT: 901445176-6

INFORME DE OBRA ACTA N°2

CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS No. 23AS111B1191 Y No. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CONTRATISTA
DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S
NIT. 900610809-3
RL. JHON JAMES CASTAÑO PEREIRA C.C. 10.003.584

CONTRATANTE
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE
APARTADÓ, ANTIOQUIA – "EICE-EDUH APARTADÓ" Nit: 901445176-6

eduh
Empresa para el Desarrollo
Urbano y Hábitat
APARTADÓ

MUNICIPIO DE CHIGORODO

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

NOVIEMBRE 2024

CALLE 103A N° 100-27 – BARRIO LAS FLORES- TEL.: 82 85 650
e-mail: j.francoalexa@gmail.com. APARTADO – ANTIOQUIA

DATOS GENERALES CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – "EICE-EDUH APARTADÓ" Nit: 901445176-6
CONTRATO DE OBRA:	EDUH- 034 DE 25 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S., identificado con NIT. 900.610.809 – 3, representado legalmente por JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
OBJETO DEL CONTRATO:	CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTOS DE VÍAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNCIIPIO DE CHIGORODO, ANTIQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS NO.23AS111B1191 Y NO. 46000016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO:	SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DIECISÉIS MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ML ($619.016.362, OO)
PLAZO:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIO DE OBRAS:	29/7/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRAS:	13/10/2024
FECHA DE SUSPENCION DE OBRAS:	06/09/2024
FECHA DE REINICIO DE OBRAS:	13/09/2024
OTROSI 01 X CUARENTA Y CINCO (45 DIAS)	21/10/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION DE OBRAS:	06/12/2024

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INFORME DE OBRA ACTA N°1 Y FINAL 1
DATOS GENERALES CONTRATO DE OBRA 2
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 3
2. UBICACION DEL PROYECTO 3
3. CONTROL PLAZO DE EJECUCIÓN. 4
3.1. CONTRATO EDUH- 034 DEL 25 DE JULIO DE 2024 4
4. DESARROLLO DE LA OBRA 4
5. BALANCE FINANCIERO 5
5.1. CONTROL EJECUCIÓN 5
5.2. ACTA DE AVANCE DE OBRA N°1 5
6. MEMORIAS DE CÁLCULO 6
7. CONCLUSIONES 6
ANEXO 1. COPIA ACTA AVANCE N°1 7
ANEXO 2. MEMORIAS DE CALCULO Y REGISTRO FOTOGRAFICO 8
ANEXO 3. COPIA BITACORA 9

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto consta de construcción de vías en concreto en la vereda barranquillita, las cuales tienen las siguientes características: excavación en material común, regado, nivelado y compactación de material de subbase, vaciado de placa concreto con espesor de 18 cm, con acabado texturizado y bordillos en concreto

2. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto está ubicado en el corregimiento de barranquillita del municipio de chigorodo; este se encuentra en la via panamericana – sector el tigre; en el kilometro 11

3. CONTROL PLAZO DE EJECUCIÓN.

3.1. CONTRATO EDUH- 020 DEL 17 DE MAYO DE 2024

DESCRIPCIÓN	FECHA
FECHA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA	25 DE JULIO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE JULIO DE 2024
PLAZO CONTRATO	DOS MESES Y 15 DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	23 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENCION	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTRO SI No.1 X CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	21 DE OCTUBRE DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO No 2	31 DE OCTUBRE DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	06 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA CORTE Nº2	13 DE OCTUBRE DE 2024
PORCENTAJE DE PLAZO EJECUTADO	99 DIAS , PARA UN (82.5%) DE EJECUCIÓN

El proyecto nos encontramos ejecutando actividades varias de preparación de terreno y pavimentación

4. DESARROLLO DE LA OBRA

Descripción de Actividades desarrolladas

Las actividades desarrolladas en este proyecto son las siguientes.

Nota: debemos tener en cuenta que en el proyecto; cuando se están realizando las excavaciones siempre encontramos tubería muy superficial, por lo que siempre ha habidos daños en estas. Esto aumentando mayores obras en actividades y materiales de construcción.

Localización y replanteo en todas las vías intervenidas; en las cuales se localiza y se nivela todo el terreno para iniciar las excavaciones, en esta se atenido en cuenta que este sector de barranquillera es muy bajo y sufre muchas inundaciones cada vez que el rio león se crece, por lo que se ha tenido muy presente el nivel de las viviendas; esto para que no queden enterradas con respeto al nivel de acabado de la placa de pavimento.

Excavaciones y botada de material; allí en las excavaciones se ha encontrado el nivel freático muy alto, por lo cual no se pueden realizar excavaciones de más de 50 cm, porque el terreno se inunda y se daña; además se realiza el sellado del

terreno en el momento de la excavación y asi se puede impermeabilizar un poco más; y así cada vez que se excava se recicla una parte del material grueso para realizar jarillon en los bordes del caño, y el restante se bota.

Instalación de material de remplazo; este se instala en capas pequeñas compactas, hasta llegar a una capa de 15cm de espesor total y así llegar al nivel estimado, para iniciar la instalación del riel metálico de altura de 18cm que nos sirve para verificación de niveles e iniciar el vaciado de placas de concreto.

pavimento en concreto e=0,18 (3.000 psi), incluye curado con antisol y acabado texturizado, esta actividad la iniciamos después de tener verificado todos los niveles del terreno y los rieles modulados con las secciones de ancho de placas de 3.00 mt x 2.65 mt, estas placas de concreto tienen un espesor de 18cm, con un concreto de resistencia de 210kg/cm2, su acabado es texturizado o rayado con rastrillos y además se realiza el curado con antisolar liquido rociado

bordillos en concreto vaciados en sitio, se realizan después de vaciada la placa de concreto en la cual se dejan instalado unos pelos de varilla de 3/8", en el cual se realiza la instalación de la formaleta, nivelándola y así respectivamente realizar el vaciado del concreto para bordillo.

5. BALANCE FINANCIERO

5.1. CONTROL EJECUCIÓN

VALOR CONTRACTUAL	**$ 619.016.362**
VALOR ADICIÒN 01	**$ 84.946.338,**
VALOR CONTRACTUAL	**$ 703.962.700**
VALOR ANTICIPO	**$ 0**
VALOR CORTE DE OBRA N°1	**$250.644.217,90**
VALOR CORTE DE OBRA N°2	**$ 314.593.882,55**
VALOR AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	**$ 0**
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR	**$ 0**
VALOR PAGADA ACTA N°1	**$250.644.217,90**
VALOR A PAGAR ACTA N°2	**$314.593.882,55**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$565.238.100,45**
% DE EJECUCIÒN	**80.29%**

5.2. ACTA DE AVANCE DE OBRA N°2

Ver Documento Anexo (acta de Avance de Obra N°2)

6. MEMORIAS DE CÁLCULO

Ver Documento Anexo (memorias de cálculo Avance de Obra N°2)

7. CONCLUSIONES

Las obras se encuentran próximas a terminar; por lo cual hemos solicitado al contratante; realizar una adición de tiempo de cuarenta y cinco (45) días; para culminar todo. Todo esto por que se realizó una suspensión del contrato de obras por paro camionero en todo el país; y los materiales que entrega la gobernación de Antioquia se retrasaban un poco.

Debido al alcance del proyecto, que se realizan mil doscientos (1200) metros lineales de pavimento; el municipio solicito realizar un análisis de la obra; sacando obras mayores y menores, para balancear el mismo, y así terminar la carrera 52 entre calles 49 y calle 50; esto porque el alcance del proyecto no da para terminar en totalidad esta carrera, quedando a mitad de cuadra. por eso la alcaldía quiere balancear el proyecto y así adicionar los recursos faltantes para terminar las obras y dejar calles completamente terminadas.

Firma/

JHON JAMES CASTAÑO
RL. DISINCOVI S.A.S
NIT. 900610809-3

ANEXO 1. COPIA ACTA AVANCE Nº1 Y FINAL

CALLE 103A N° 100-27 – BARRIO LAS FLORES- TEL.: 82 85 650
e-mail: j.francoalexa@gmail.com. APARTADO – ANTIOQUIA

ANEXO 2. MEMORIAS DE CALCULO Y REGISTRO FOTOGRAFICO

CALLE 103A N° 100-27 – BARRIO LAS FLORES- TEL.: 82 85 650
e-mail: j.francoalexa@gmail.com. APARTADO – ANTIOQUIA

ANEXO 3. COPIA BITACORA

CALLE 103A N° 100-27 – BARRIO LAS FLORES- TEL.: 82 85 650
e-mail: j.francoalexa@gmail.com. APARTADO – ANTIOQUIA

22/08/2024

Dia humedo.

personal en obra.

1 Residente de obra
1 topografo
1 Operador de maquina.
2 oficiales
14 Ayudantes

Actividades

corte y Figuracion de a cero.
topografia en vias
. cargeo y Remplazo por material de prestamo, sub base E: 15 cm
Vaceo bordillos

Vaceo placas 104/dia 772 sacos de cemento
Aseo placas

23/08/2024

Día soleado.

personal en obra

1 Residente de obra
1 topografo
1 Operador de maquina (pajarita)
2 Oficiales
14 Ayudantes

Actividades

corte y figuracion de acero.
topografia.
Vaciado vigas
Vaciado bordillos, 12 ml 4 sacos de cemento.

Vaciado placa 1 14 sacos de cemento.

24/08/2024

Dia: humedo

Personal en obra

1 Residente de obra
1 topografo
1 Operador de maquina
2 Oficiales
14 Ayudantes

Actividades

corte x pigmentación de acero.
topografia
Cargio vía
limpieza MH
levanta de MH
Vaceo bordillos 24 ml. → 6
Sacos de cemento.
Vaceo placas 9.5 → 98 sacos de cemento.

25/08/2024 → No se trabajo domingo

26/08/2024

Dia: soleado.

personal en obra

1 Residente de obra
1 topografo
1 Operador de maquina (pajarita)
2 Oficiales
14 Ayudantes

Actividades

corte y figuracion de acero.
topografia
Aseo placas.
Vaciado placas 6 u/ds
72 sacos de cemento.
Vaciado bordillos 13 ml 4 sacos de cemento.

27/08/2024

Día: Sabado.

Personal en obra.

1 Residente de obra
1 topografo
1 Operador de maquina. (pasarita)
2 Oficiales
14 Ayudantes

Actividades

topografia en vias
Aseo y placas
Corte y Figuracion de acero
Vaciado
cargeo
Vaciado de 7 placas 80 Sa Ca
de asenta.

Limpieza de MH

28/08/2024

Día: Soleado

Personal en obra

1 Residente de obra
1 Topógrafo
1 Operador de maquinaria (pala)
2 Oficiales
14 Ayudantes

Actividades

Corte y figuración de acero.
Cargeo en vigas

Vaciado placas 7 de 83 sacos de cemento

Vaciado bordillos 23.11 5 sacos de cemento

29/08/2024

Día: lunes.

personal en obra

1 Residente de obra.
1 topografo
1 Operador de maquina
2 Oficiales
14 Ayudantes

Actividades

Corte y figuración de acero.

Cargeo en vías, nivelación con Rana

Vaceo bordillos

Vaceo placas 6 días 72 sacos de cemento.

topografia en vía.

Vaceo de 30 ml de bordillos 6 sacos de cemento.

Primavera

Scanned with CamScanner

30/08/2024

Dia: Mañana humedo.

personal en obra

1 Residente de obra
1 topografo.
1 operador de maquina. (pajarita)
2 Oficiales
14 Ayudantes

Actividades

corte y nivelacion de a mano.
Nivelacion terreno y compactacion con Rana.
Vaciado placa 1 u/dia 72 sacos de cemento.
Vaciado bordillos 75 ml 4 sacos de cemento.
topografia
en geo.

31/08/2024

Día: Mañana Soleada

personal en obra.

1 Residente de obra.
1 topografo
1 operador de maquina. (pajarita)
2 Oficiales
14 Ayudantes

Actividades

Se corren 9 contadores de agua.
topografia en la via.
Cageo
Se acaba el cemento.
Aseo en la via.
Nivelación tercero.
compactación con Rana.

01/09/2024 -> No se trabajo festivo.

Primavera

Scanned with CamScanner

02/09/2024

Día: Mañana humedo

personal en obra.

1 Residente de obra.
1 topografo,
1 Operador de maquina (prohibido)
2 Oficiales
14 Ayudantes

Actividades

Corte y figuración de acero.

Aseo placas,

para a nivel nacional de Camioneros.

no hay cemento.

03/09/2024

Día: mañana (lluvioso)

Personal en obra

1 Residente de obra
1 topógrafo
1 operador de maquina (rajante)
2 Oficiales
14 ayudantes

Actividades

- Regado de material para que no se enchenfe en las vías
- Limpieza de obra
- No hay cemento en la obra

04/09/2024

Niv: mañana soleado

Personal en obra

1 Residente de obra
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
14 ayudantes

Actividades

- Limpieza de obra
- Demolición de cuellos de manholes
- No hay comedor en obra

05/09/2024

Dm: mañana con Lluvia

Personal en obra

1 Residente
1 topografo
1 Oficial
10 ayudantes

Actividad

- demolición de capas de concreto
- traslado de acometidas de agua
- no hay Cemento en obra

se realiza al contratante suspender obra, por paro camionero; por lo cual no han llegado material a la obra

06 09 2021 Suspensión obra

Nota: Se realiza la suspensión de la obra, esto por pero nacional de transportadora y no hay materiales en la obra.

Reinicio de obra

13/09/2024

Día: DM con leves lluvias

Personal en obra

1 residente
1 topógrafo
1 operador de maquina
2 oficiales
14 ayudantes

Actividades realizadas

- Llega cemento a la obra y se descarga
- Se realiza excavación manual en la obra
- Se hace instalación de termoleta para vaciado de pavimento
- Llueve en la tarde.
- Traslado de acometidas de agua.

Primavera

19/09/2024

Dia: mañana con Lluvias

Personal en obra

1 residente
1 topografo
20 Ficiales
1 Operador de maquina
14 ayudantes.

Actividades

- Secado de terreno por lluvias
- nivelación de terreno e instalación de Subbase
- instalación de formaleta
- vaciado de Placas en concreto
- vaciado de bordillos
- traslado de acometidas domiciliarias

16 09 24

Dia: mañana soleada

Personal en obra

1 Residente
1 topografo
2 Oficiales
1 operador de maquina
14 ayudantes

Actividades

- nivelacion de terreno e instalacion de subbase
- instalacion de formaleta
- vaciado de concreto de bordillos
- vaciado de placas en concreto
- traslado de material suberante
- reposo de material subrante

Primavera

Scanned with CamScanner

17/09/24

Dra: Mariana Salcedo

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
14 ayudantes

Actividades

- Excavación en terreno con maquina
- nivelación de terreno e instalación de cama en subbase
- instalación de formaleta metalica
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de bordillos en concreto
- vaciado de cajas domiciliarias en concreto
- traslado de domiciliarios de acueducto
- cortado y realce de cuello de MH
- regado de material de playa (material sobrante de excavación)

18 oct 24

Dra: mañana soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
2 oficiales
1 operador de maquina
14 ayudante

actividades

- nivelacion y regado de subbase
- instalacion de formaletas metalicas
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de bordillos
- regado de material proveniente de la excavacion

Primavera
Scanned with CamScanner

19/09/24

Dia: mañana Lluvosa

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 Operador de maquina
2 Oficiales

Actividades

- toda la mañana ~~tuvo~~ Hubo Lluvia por lo cual no se realizo actividades

- En la tarde se realizo actividad de secado de terreno

- Instalaron de formaletas metalicas

- vaciado de dos Placas en concreto.

20/09/24

Dia: mañana Humedo

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 Operador de maquina
2 oficiales
14 ayudante

Actividades

- se realiza el secado de terreno por lluvias
- vaciado de placas en concreto
- traslado de domiciliarias de acueducto y alcantarillados
- vaciado de bordillos en concreto

Primavera

21/09/24

Día: Día soleado

Personal en obra

1 residente
1 topógrafo
1 operador de maquinaria
2 oficiales
14 ayudantes

Actividades

- excavación en terreno no maquina
- traslado de material proveniente de la excavación
- riego de material proveniente de excavaciones, en zonas bajas
- nivelación de terreno e instalación y compactación de subbase
- instalación de formaleta metálica
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de bordillos en concreto
- traslado de domiciliarios de acueducto
- traslado de cajas inspección en concreto

23/09/24

Dra → mañana soleada — tarde lluvias

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
14 ayudante

Actividades

- excavación en terreno con maquina
- nivelación e instalación de subbase
- instalación de formaleta metalica
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de bordillos en concreto
- traslado de domiciliaria de concreto
- construcción de cajas domiciliarias
- demolición de cuellos de MH, y se realiza el relleno de MH

Primavera

24 de 24

Dia: Sabado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 Operador de maquina
2 Oficiales
12 ayudantes

Actividades

- Excavación con maquina en tramo
- nivelacion y estandido de subbase
- Instalación de formaleta metalica
- Vaciado de placas en concreto
- Vaciado de bordillos en concreto
- recolección de MH
- traslado de material sobrante
- regado de material sobrante en los sitios bajos del sector.

25/09/24

Dia Soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
14 ayudantes
2 oficiales

Actividades

- nivelación de terreno e instalación de sub base
- instalación de formaleta metalica
- vaciado de Placas en concreto
- vaciado de bordillos
- regado de material proveniente de la excavación en zonas bajas

Primavera

Scanned with CamScanner

26/09/24

Dia soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
13 ayudantes

Actividades

- se realiza excavación entorno con maquina
- se traslada material de excavación
- se riega material de excavación en zonas bajas
- se instala subbase con nivelacion
- Se instala formaleta metalica
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de bordillos
- traslado de cajas sanitarias
- traslado de acometida de acueducto
- Recorte y Relleno de M+I

27/09/24

Día soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 Operador de maquina
2 oficiales
14 ayudantes

Actividades

- vaciado de Placas en concreto
- vaciado de bordillos en concreto
- traslado de domiciliarios de acueducto
- traslado de acometidas en red
- vaciado de cajas sanitarias en concreto
- se riega material proveniente de la excavación.

28/09/24

DIA soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
14 ayudantes

Actividades

- Traslado de acometidas de acueducto
- vaciado de cajas de inspeccion sanitarias
- instalacion de formaleta metalica
- vaciado de placas en concreto
- traslado de material de estos en obra
- vaciado de bordillos en concreto

30 09 24

Dra Soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 Operador de maquina
2 oficiales
14 ayudante

Actividades

- se realiza excavación en terreno con maquina
- se hace nivelación e instalación de subbase en terreno
- Instalación de formaleta metalica
- vaciado de Placas en concreto
- vaciado bordillos en concreto
- traslado de domiciliarios de acueducto y reparaciones de fibra
- se riega material proveniente de la excavación.

Primavera
Scanned with CamScanner

01/10/24

Dia nublado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
14 ayudantes

Actividades

- Se realiza secado del terreno por lluvias en la noche
- Instalación de formaleta metalica
- vaciado de concreto en bordillos
- vaciado de Placas en concreto
- traslado de domiciliaria de acueducto
- vaciado de cajas de registro sanitario
- reparaciones de tuberia sanitaria

2/10/24

Diario de obra

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
14 ayudante

Actividades

- Excavacion en terreno con maquina
- traslado de material sobrante de la excavacion
- nivelación y regado de subbase
- instalación de formaleta metalica
- vaciado de placas en concreto
- vaciados de bordillos
- traslado de acometidas de acueducto
- Replanteo de MH

Primavera

3 10 24

Nivelado

Personal en obra

1 residente
1 topógrafo
1 Operador de maquina
2 oficiales
14 ayudantes

Actividades

- Excavación de terreno con maquina
- Traslado de material proveniente de la excavación
- nivelación y regado de subbase
- instalación de formaletas metálicas
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de bordillos
- traslado de cargas domiciliarias
- traslado de domiciliaria de acueducto
- redes de MT

4/10/24

Día: mañana con Llovizna tarde seca

Personal en obra

1 residente
1 topografo
2 Oficiales
1 Operador de malacate
14 ayudantes

Actividades

- Secado de terreno por Lluvias
- nivelacion e instacion de sobos
- instalacion de perfil o formaleta
- vaciado de Placas
- vaciado de Bordillos
- Realce de MH
- se dejan los Placas de concreto tapadas con plastico negro.

Primavera

5/10/24

Obra: soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
2 oficiales
1 operador de maquina
13 ayudantes

Actividades

- excavación con maquina
- Nivelación e instalación de sobase
- Instalación de formaletas
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de Bordillos
- traslado de material sobrante
- Riegodel de material sobrante

7 10 24

Dra: Diez Soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
2 oficiales
1 Operador de maquina
13 ayudantes

actividades

- Excavación con maquina en terreno
- Nivelacion e instalación de bombeo
- instalación de formaleta metalica
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de Bordillos en concreto
- realce de pozos
- traslado de domiciliarios de acueducto
- traslado de material
- regada de material en lotes y Jarillon

Primavera

8/10/21

Dia: Dia Lluvioso

Personal en obra

1 residente
1 topografo
2 oficiales
1 operador de maquina
13 ayudante

Actividades

- Secado de terreno por lluvia
- Instalacion de formaletas
- vaciado de Placas en concreto
- vaciado de Bordillos

9/10/24

Nra: Mañana oscura

Personal en obra

1 residente
1 topografo
2 oficiales
1 Operador de maquina
13 ayudantes

Actividades

- Excavación de terreno con maquina
- nivelacion e instalación de solado
- Instalacion de formaleta
- vaciado de concreto en Bordillo
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de cajas con concreto
- Realce de MH

Primavera
Scanned with CamScanner

11/10/24

Dia: mañana lluviosa _ tarde seca

Personal en obra

- 1 residente
- 1 topografo
- 2 oficiales
- 1 operador de maquina
- 2 ayudantes

Actividades

- secado de terreno por lluvias
- instalacion de formaletas
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de bordillos en concreto
- Las placas vaciadas fueron tapadas con plastico negro.

12/10/24

Día: mañana soleado

Personal en obra

1 residente
1 topógrafo
2 oficiales
1 operador de maquina
13 ayudantes

Actividades

- Excavaciones en terreno con maquina
- nivelación de terreno e instalación de subbase
- instalación de formaletas
- vaciado de placas
- vaciado de bordillo en concreto
- traslado de acometidas sanitarias

14 lo 24

Dia: mañana nublado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
2 oficiales
1 Operador de maquina
14 ayudantes

actividades

- excavacion en terreno con maquina
- nivelacion de terreno e instalacion de subbase
- instalacion de formaleta
- vaciado de placas en concreto
- vaciado de bordillo en concreto
- reubicacion de domiciliaria
- reciclo de MH existentes

15/10/24

Dia: mañana Lluviosa

·Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 Operador de maquina
2 oficiales
13 ayudantes

Actividades

- Excavación con maquina
- Botada de material a la alrededor
- instalación de formaletas
- nivelación e instalación de sublase
- vaciado de concretos en Bordillo
- vaciado de Placas en concreto

16/10/24

Dia: Soloado

Personal en obre

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
14 ayudante

actividades

- instalacion de formaleta y nivelacion de terreno con subbase
- vaciado de Placa en concreto
- vaciado de Bordillo en cemento
- traslado de acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado.

17/10/24

Nombre: Nicolas Soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
2 oficiales
1 operador de maquina
13 ayudantes

Actividades

- Excavaciones con maquina
- retiro de material sobrante de la excavación
- Demolición de cuellos de MH para realizar retiro de lo mismo
- nivelación y perfilado de terreno con material de subbase
- Instalación de formaleta y vaciado de concreto para placas
- vaciado de bordillos en concreto.

Primavera
Scanned with CamScanner

18/10/24

Sra: Mariana Salcedo

Personal en obra

1 residente de obra
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
12 ayudantes

actividades

- Excavación en terreno con maquinaria
- Se realiza la actividad de Profundizar la tubería del acueducto de la comunidad
- vaciado de bordillos
- traslado de domiciliaria de acueducto y alcantarillado.

19/10/21

Dra: mañana soleado

Personal en obra

1 residente de obra
1 topografo
2 oficiales
1 operador de maquinaria
1 ayudante

Actividades

- Excavacion en via,
- instalacion de perfiles o formaletas
- vaciado de bordillos en concreto
- traslado de domiciliarias de acueducto



Primavera

21/10/24

Dia: mañana soleada

Personal en obra

1 residente de obra
1 topografo
1 Operador de maquina
2 Oficiales
14 ayudantes

Actividades

- Traslado de acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado
- Vaciado de cajas de inspección en concreto
- Excavación con uso con maquina
- Profundización de tuberia del acueducto que estaba superficial
- instalación de formaleta y vaciado de placas en concreto

22/10/24

Dia: mañana soleado

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
2 oficiales
14 ayudantes

Actividades

- Vaciado de bordillos

- limpieza de obra

- excavación y arreglo de tuberia de acueducto

- Excavacion en via

- Botada de material en cunetones

- vaciado de bordillos

23/10/24

Dia: mañana soleada

Personal en obra

1 residente
1 topografo
1 operador de maquina
2 Oficiales
14 ayudantes

Actividades

- instalacion de formaleta
- Serrado de terreno con vesino en sublase
- vaciado de placas en concreto
- arreglo de tuberia central de acueducto esteban quintero
- fuerte lluvias en hora de la tarde

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CULMINACION DE PROYECTOS: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA"

CONTRATISTA
DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S
NIT. 900610809-3
RL. JHON JAMES CASTAÑO PEREIRA C.C. 10.003.584

CONTRATANTE
EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA – "EICE-EDUH APARTADÓ" Nit: 901445176-6

KELLY JOHANA BUELVAS CADAVID C.C. 1.027.941.923
PROFESIONAL EN SST
LICENCIA 2016060080203

Empresa para el Desarrollo Urbano y Hábitat
APARTADÓ

MUNICIPIO DE CHIGORODO

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ

OCTUBRE 2024

INDICE

PRESENTACION.....3

1. DATOS DE LA EMPRESA.....4

2. FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE OBRA.....4

3. SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES.....4

4. ELEMENTOS DE PROTECCION INDICIDUAL.....4

5. CAPACITACIONES.....6

6. PAUSAS ACTIVAS.....7

7. EJECUCION DE LABORES.....7

8. ORDEN Y ASEO.....9

PRESENTACIÓN

Se logrado los objetivos y metas trazadas, quedando en alto el cumplimiento de la prevención en la seguridad y normatividad potencializando la parte de la prevención y compromiso del autocuidado.

La prevención en el trabajo se toma como herramientas básicas e indispensables para mejorar las condiciones de nuestras actividades diarias, como la calidad de vida de todos los empleados de una organización.

Permite desarrollar y promover la salud de los trabajadores, previniendo y controlando enfermedades ocupacionales y accidentes; de esta manera se elimina los factores de riesgo de la salud y seguridad en el trabajo.

El diseño e implementación del proceso de salud y seguridad laboral, permite incrementar la salud física, mental y social del trabajador; promoviendo y desarrollando la capacidad del trabajador, así como su desarrollo profesional y social de este.

Es por eso DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S es de gran importancia realizar actividades en pro de nuestros trabajadores.

1. DATOS DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL	JOHN JAMES CASTAÑO PEREIRA
DIRECTOR DE OBRA	JULIO CESAR CAMARGO ORTIZ
SISO	KELLY JOHANA BUELVAS CADAVID

2. FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE OBRA

fecha de inicio de obras: 29/07/2024

fecha de terminación de obras: 6/12/2024

3. SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES

Cantidad de trabajadores que se encuentran afiliados a seguridad social en el mes de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024

SEGURIDAD SOCIAL DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024	
ARL	19
AFP	19
EPS	19
CAJA DE COMPENSACIÓN	19

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El Elemento de Protección Individual (EPI), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador; para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen, a partir del uso de los Elementos de Protección Individual (EPI), son las siguientes:

- ✓ Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.

- ✓ Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador.
- ✓ Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 09 de 1979, Art. 85, Lit. b; todos los trabajadores están obligados a usar y mantener adecuadamente, los dispositivos para control de riesgos y equipos de protección personal y conservar en orden y aseo los lugares de trabajo. Sin embargo, el uso de los elementos de protección personal en tu puesto de trabajo; más que una obligación lo debes considerar, como un compromiso.

En el mes de SEPTIEMBRE DE 2024 se han entregado los elementos de protección individual entregados a los trabajadores de la obra son los siguientes.

ELEMENTOS DE POTECCIÓN INDIVIDUAL SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024
CASCO DE SEGURIDAD
GUANTES
PROTECTORES AUDITIVOS
GAFAS
BUSOS

5. CAPACITACIONES

La capacitación en prevención de riesgos laborales tiene el objetivo de brindar conocimientos especializados que ayuden al trabajador a evitar accidentes en la empresa, contribuyendo de esta manera a crear una cultura de la seguridad preventiva.

Las empresas requieren empleados capacitados para realizar sus tareas y mejorar su competitividad y productividad. La capacitación especializada permite ampliar la formación académica de los trabajadores, además tiene por objeto obtener nuevos conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con rendimiento, responsabilidad y seguridad la tarea asignada.

los cambios permanentes, sumados a la situación actual del mundo laboral, incentivan a muchos profesionales y trabajadores a ampliar su formación a través de la capacitación. A su vez, las empresas se preocupan cada vez más por esto con el fin de que sus empleados aprendan las tareas que deben llevar a cabo.






Capacitaciones


6. PAUSAS ACTIVAS

Las pausas activas son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral, con una duración continua mínima de 10 minutos que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobre uso asociados al desempeño laboral.

Las Pausas Activas serán una forma de promover la actividad física, como habito de vida saludable, por lo cual se deben desarrollar programas educativos sobre la importancia y los beneficios de la actividad física regular.

El entorno laboral representa un escenario ideal para la promoción de la actividad física y de los hábitos saludables.

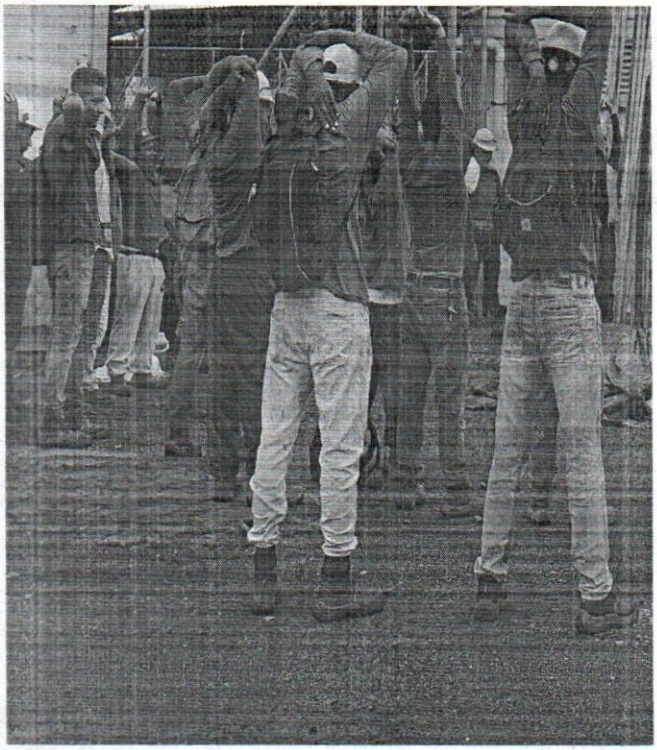

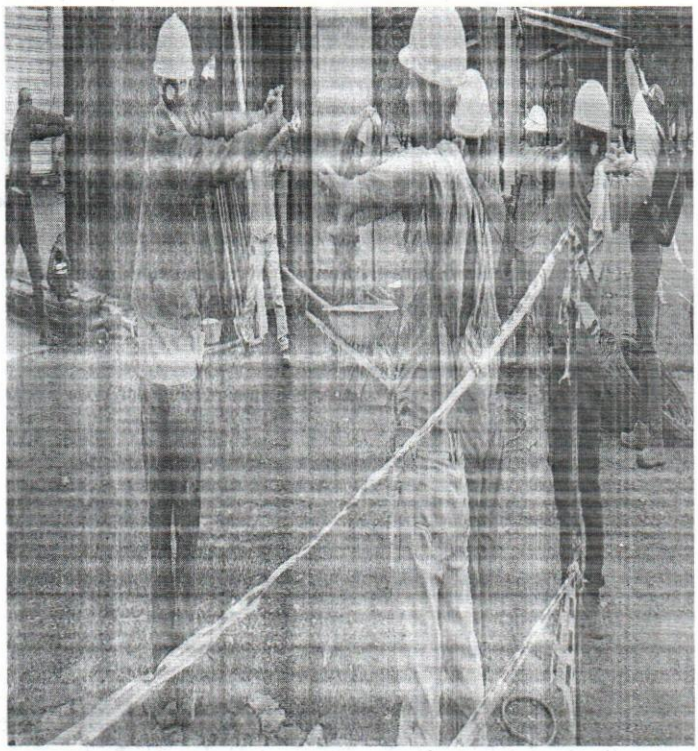


Pausas activas

7. EJECUCION DE LABORES

- El trabajador inicia su jornada laboral después de la previa indicación y autorización por parte de su supervisor.
- se hace inducción de su importancia y los riesgos de no ser utilizados.
- Los trabajos se hacen de forma manual y los trabajadores la efectúan utilizando su fuerza física, ayudados por herramientas de mano como palas, escobillones, pica, carretas etc.
- Los trabajadores mantienen una distancia segura entre ellos.
- Al finalizar las labores, los trabajadores ubican sus herramientas en la bodega.
- Los equipos de protección personal y de seguridad, son guardados.



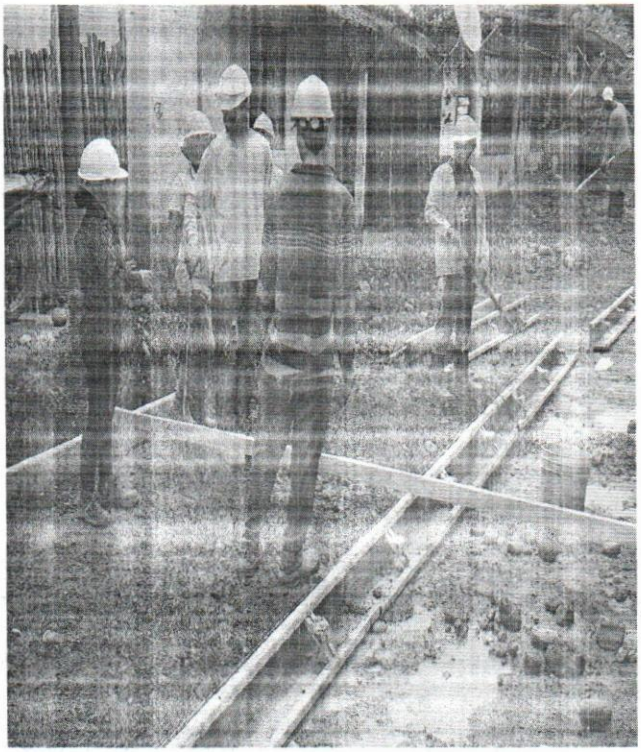



8. ORDEN Y ASEO:

El orden y el aseo en el trabajo, son factores de gran importancia para la salud, la seguridad, la calidad y la eficiencia, por lo tanto, se maneja orden y aseo en:

- Almacenamiento correcto de materiales.
- Disposición correcta de desperdicios.
- Remoción rápida de derrames y de mantenimientos requeridos.
- Aseo del área de trabajo por parte del personal.

Esta implementación ayudo:

- evitar accidentes.
- Al trabajo seguro.
- Mayor provecho de los espacios.
- Al buen uso de los recursos disponibles.
- Aumentar en el rendimiento de trabajo.
- Ambiente de trabajo agradable.

Kelly Buelvas

KELLY JOHANA BUELVAS CADAVID
CC 1.027.941.923
PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Licencia 2016060080203

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS

5950067156

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO. NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: **SEAS URABA SEGUROS**	VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN:	DIA	MES	AÑO
AG. RAM. POL.: 595 - 47 - 994000001857	$ 1,160,962.00	08	11	2024
		FECHA DE IMPRESIÓN		

NOMBRE:: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT 900.610.809-3

FORMA DE PAGO CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO

$

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006715

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta de Ahorros / Corriente - TC
TELÉFONO FIJO BOGOTÁ	(601) 3849444	Tarjeta de Crédito
BANCOS	Banco de Bogotá Banco de Occidente	Efectivo ó Cheque

* CORRESPONSALES DE RECAUDO (SOLO PAGO EN EFECTIVO)		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax y Almacenes Éxito	$9.999.999
2) SUPERGIROS	Convenio No. 6792 y número electrónico	$5.000.000
3) PUNTO DE PAGO	Convenio No. 6792 y número electrónico	$4.000.000
4) FULLCARGA	Convenio No. 6792 y número electrónico	$3.000.000
5) PUNTORED	Convenio No. 6792 y número electrónico	$ 800.000
6) EFECTY	Convenio No. 6792 y número electrónico	$ 500.000
7) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR	$ 500.000

IMPORTANTE

-Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.

-Para pagos por medio de línea telefónica o por Internet (PSE-TC),se requiere del número electrónico para pagos.

-Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:

www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Whatsapp business Cami a través de www.aseguradorasolidaria.com.co Línea Solidaria a través del #789 desde tu móvil Claro, Tigo, Movistar y Avantel 01 8000 512021 gratis desde cualquier lugar del país

Defensor del Consumidor Financiero - Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano
Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero - Suplente: Jorge Humberto Martinez Luna
Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 701, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/sha1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

*** LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.**

- Cliente -

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS

5950067156

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

NOMBRE:: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.610.809-3

DIA 08 MES 11 AÑO 2024 — FECHA DE IMPRESIÓN

FORMA DE PAGO CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO

$

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006715

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

- Banco -

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:#789 opción 4

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/11/2024
Ticket ID:	59500671561
Transacción/CUS:	1046908434
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	POLIZAS
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1001
Total:	1160962
Total Iva:	0
No. Pago:	59500671561

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950067156

PÓLIZA No: 595 - 47 - 994000001857 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	11	2024	15	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: APARTADÓ, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104278614

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	29/07/2024	14/04/2025	61,901,636.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	29/07/2024	14/10/2027	123,803,272.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	185,704,908.60

BENEFICIARIOS
NIT 901445176 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. EDUH-34, DE FECHA 25/07/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***371,409,817.20	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MARIA CAMILA MONSALVE VEGA	8913	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006715

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD125780F07FE795B

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000001857** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

TEXTO ITEM 1

CONDICIONADO GENERAL: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI
NOTA TÉCNICA: 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000

OBSERVACIONES:
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 29/07/2024, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE DESPLAZAN LAS VIGENCIAS PARA LAS GARANTÍAS EN ASUNTO A PARTIR DEL 29/07/2024. QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 13/10/204.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SE ACLARA EL SEGURADO/BENEFICIARIO.

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6 Y A LA GORBERNACION DE ANTIOQUIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950067156

PÓLIZA No: 595 - 47 - 994000001857 ANEXO: 3

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	11	2024	15	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: APARTADÓ, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104278614

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	29/07/2024	23/04/2025	61,901,636.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	29/07/2024	23/10/2027	123,803,272.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	185,704,908.60

BENEFICIARIOS
NIT 901445176 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. EDUH-34, DE FECHA 25/07/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***371,409,817.20	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MARIA CAMILA MONSALVE VEGA	8913	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006715

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD125780F07FF7858

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia le informa la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000001857** ANEXO: 3

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

TEXTO ITEM 1

CONDICIONADO GENERAL: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI
NOTA TÉCNICA: 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000

OBSERVACIONS:
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DE FECHA 06/09/2024 Y EL ACTA DE REINICIO No. 01 FECHA 16/09/2024, SE DESPLAZAN LAS VIGENCIAS PARA LAS GARANTÍAS EN ASUNTO. QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 23/10/2024.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SE ACLARA EL SEGURADO/BENEFICIARIO.

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6 Y A LA GORBERNACION DE ANTIOQUIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950067156

PÓLIZA No: 595 - 47 - 994000001857 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	11	2024	15	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: APARTADÓ, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104278614

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	29/07/2024	07/06/2025	61,901,636.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	29/07/2024	07/12/2027	123,803,272.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	185,704,908.60

BENEFICIARIOS
NIT 901445176 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. EDUH-34, DE FECHA 25/07/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***371,409,817.20	$ **********183,161	$*****5,000.00	$ *******35,751	$ **********223,912

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MARIA CAMILA MONSALVE VEGA	8913	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006715

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD125780F07FF7857

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia c... la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga e... ta que será contactado para realizar el procedimiento
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
Compañía de Seguros

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000001857** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

TEXTO ITEM 1

CONDICIONADO GENERAL: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI
NOTA TÉCNICA: 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000

OBSERVACIONES:
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL OTRO SI No. 01 DE FECHA 21/10/2024, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS PARA LAS GARANTIAS EN ASUNTO POR 45 DÍAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 06/12/2024.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SE ACLARA EL SEGURADO/BENEFICIARIO.

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6 Y A LA GORBERNACION DE ANTIOQUIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950067156

PÓLIZA No: 595-47-994000001857 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	11	2024	15	11	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: APARTADÓ, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104278614

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	29/07/2024	07/06/2025	70,396,270.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	29/07/2024	07/12/2027	140,792,540.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	211,188,810.60

BENEFICIARIOS
NIT 901445176 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. EDUH-34, DE FECHA 25/07/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****50,967,804.00	$ **********782,437	$*****5,000.00	$ ******149,613	$ **********937,050

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
MARIA CAMILA MONSALVE VEGA	8913	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006715

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CBD125780F07FF795A

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia cuida la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * **Celular:** 310 223 4304 * **Correo electrónico:** martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 791 91 80 * **Fax:** (601) 791 91 80 * **Horario:** Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS COD. AGENCIA: 595 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000001857** ANEXO: 5

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT D** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.445.176-6**

TEXTO ITEM 1

CONDICIONADO GENERAL: 21/03/2018-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-09-DOOI
NOTA TÉCNICA: 15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000

OBSERVACIONES:
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL OTRO SI No. 2 DE FECHA 31/10/2024, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $84.946.339,57, QUEDANDO COMO VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $703.962.701,57.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SE ACLARA EL SEGURADO/BENEFICIARIO.

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6 Y A LA GORBERNACION DE ANTIOQUIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR

CLIENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
5950067172

SEÑOR USUARIO: ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO ÚNICAMENTE CON EL TIMBRE DE LA CAJA DEL BANCO O SUPERMERCADO. NO ES UN RECIBO OFICIAL DE CAJA.

Agencia Exp: SEAS URABA SEGUROS AG. RAM. POL.: 595 - 74 - 994000000417	VALOR CARTERA A LA FECHA DE IMPRESIÓN: $ 152,581.00	DIA 08 MES 11 AÑO 2024 FECHA DE IMPRESIÓN

NOMBRE:: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.610.809-3

FORMA DE PAGO CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO
$

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006717

PUNTOS DE PAGO		MEDIOS DE PAGO
INTERNET (PSE-TC)	www.solidaria.com.co	Cuenta de Ahorros / Corriente - TC
TELÉFONO FIJO BOGOTÁ	(601) 3849444	Tarjeta de Crédito
BANCOS	Banco de Bogotá Banco de Occidente	Efectivo ó Cheque

* CORRESPONSALES DE RECAUDO (SOLO PAGO EN EFECTIVO)		MONTO MÁXIMO
1) GRUPO ÉXITO	Carulla, Surtimax y Almacenes Éxito	$9.999.999
2) SUPERGIROS	Convenio No. 6792 y número electrónico	$5.000.000
3) PUNTO DE PAGO	Convenio No. 6792 y número electrónico	$4.000.000
4) FULLCARGA	Convenio No. 6792 y número electrónico	$3.000.000
5) PUNTORED	Convenio No. 6792 y número electrónico	$ 800.000
6) EFECTY	Convenio No. 6792 y número electrónico	$ 500.000
7) COOPENESSA	ÚNICO CONVENIO PARA PAGOS PÓLIZAS ESTUDIANTILES EXCLUSIVO SANTANDER DEL SUR	$ 500.000

IMPORTANTE

-Este comprobante es indispensable para pagos en bancos y corresponsales de recaudo.

-Para pagos por medio de línea telefónica o por Internet (PSE-TC),se requiere del número electrónico para pagos.

-Para el pago de su póliza, tenga en cuenta las recomendaciones de seguridad de los canales dispuestos que pueden ser consultados en la página:

www.aseguradorasolidaria.com.co/servicios-en-linea/multipago.aspx

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

Whatsapp business Cami a través de www.aseguradorasolidaria.com.co Línea Solidaria a través del #789 desde tu móvil Claro, Tigo, Movistar y Avantel 01 8000 511021 gratis desde cualquier lugar del país

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano
Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martinez Luna
Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Telefono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

*** LOS CORRESPONSALES DE RECAUDO RECIBEN PAGOS PARCIALES.**

- Cliente -

COMPROBANTE DE PAGO INDIVIDUAL

NUMERO ELECTRONICO PARA PAGOS
5950067172

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

NOMBRE:: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S. IDENTIFICACIÓN: NIT 900.610.809-3

DIA 08 MES 11 AÑO 2024
FECHA DE IMPRESIÓN

FORMA DE PAGO CHEQUE ☐ EFECTIVO ☐

COD. BANCO _____ No. CHEQUE _____

VALOR PAGADO
$

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006717

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

- Banco -

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:#789 opción 4

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/11/2024
Ticket ID:	59500671721
Transacción/CUS:	1046897093
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	POLIZAS
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1001
Total:	152581
Total Iva:	0
No. Pago:	59500671721

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2022

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS

5950067172

PÓLIZA No: 595 -74 - 994000000417 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGE: 595 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
08	11	2024	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	10	10	2024	23:59		14	10	2024	23:59	4	15	11	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	10	10	2024	23:59		14	10	2024	23:59	4
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: APARTADÓ, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104278614

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: **APARTADÓ, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 3104278614

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISI NIT : 900610809

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: CHIGORODÓ

DIRECCION: MUNICIPIO DE CHIGORODO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBSERVACIONES
****

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DEL CONTRATO EDUH-34 CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBSERVACIONES:

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- LOS TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MARIA CAMILA MONSALVE VEGA	8913	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006717

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

ANGVARGAS 0

CBD125780F07FF7957 CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS COD. AGENCIA: 595 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000000417** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

ASEGURADO: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

- DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S NIT: 900.610.809-3
- EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6
- MUNICIPIO DE CHIGORODÓ NIT. 890.980.998

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS ASEGURADOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S NIT: 900.610.809-3
- EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6
- MUNICIPIO DE CHIGORODÓ NIT. 890.980.998

* SE ACLARA QUE LA PÓLIZA EN ASUNTO ES CORRELATIVA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 994000001857.

CONDICIONADO GENERAL: 20/10/2021-1502-P-06-PATRI-CL-SUSP-04-DR0I
NOTA TECNICA: 20/10/2021-1502-NT-P-06-P201021MPP6P6001

OBSERVACIONES:
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 29/07/2024, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE DESPLAZAN LAS VIGENCIAS PARA LAS GARANTÍAS EN ASUNTO A PARTIR DEL 29/07/2024. QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 13/10/204.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000417 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S. IDENTIFICACION: 900.610.809-3

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRU	900610809-3	MUNICIPIO DE CHIGORODO	CHIGORODÓ	260,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Somos la Décima Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. COLOMBIA 2023

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. AMÉRICA LATINA 2023

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950067172

PÓLIZA No: 595 -74 - 994000000417 ANEXO:3

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGE: 595 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
08	11	2024		14	10	2024	23:59	23	10	2024	23:59	9	15	11	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	14	10	2024	23:59	23	10	2024	23:59	9

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: APARTADÓ, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104278614

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: **APARTADÓ, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 3104278614

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISI NIT : 900610809

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: CHIGORODÓ

DIRECCION: MUNICIPIO DE CHIGORODO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBSERVACION:
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 DE FECHA 06/09/2024 Y EL ACTA DE REINICIO No. 01 FECHA 16/09/2024, SE DESPLAZAN LAS VIGENCIAS PARA LAS GARANTÍAS EN ASUNTO. QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 23/10/2024.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS ASEGURADOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S NIT: 900.610.809-3

- EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6

- MUNICIPIO DE CHIGORODÓ NIT. 890.980.998"

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MARIA CAMILA MONSALVE VEGA	8913	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006717

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBD125780F07FF7956 CLIENTE ANGVARGAS 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000417 ANEXO: 3 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 2

TOMADOR: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S. IDENTIFICACION: 900.610.809-3

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRU	900610809-3	MUNICIPIO DE CHIGORODO	CHIGORODÓ	260,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2022

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950067172

PÓLIZA No: 595 -74 - 994000000417 ANEXO:4

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGE: 595 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
08	11	2024		23	10	2024	23:59		07	12	2024	23:59		45	15	11	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
	23	10	2024	23:59		07	12	2024	23:59		45

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: APARTADÓ, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104278614

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: **APARTADÓ, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 3104278614

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISI NIT : 900610809

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: CHIGORODÓ

DIRECCION: MUNICIPIO DE CHIGORODO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBSERVACIONES
****

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DEL CONTRATO EDUH-34 CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBSERVACIONES:

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- LOS TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***260,000,000.00	$ **********128,219	$*********0.00	$ *******24,362	$ **********152,581

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MARIA CAMILA MONSALVE VEGA	8913	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006717

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CBD125780F07FF765F

CLIENTE

ANGVARGAS 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS COD. AGENCIA: 595 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000000417** ANEXO: 4

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

ASEGURADO: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

- DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S NIT: 900.610.809-3
- EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6
- MUNICIPIO DE CHIGORODÓ NIT. 890.980.998

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS ASEGURADOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S NIT: 900.610.809-3
- EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6
- MUNICIPIO DE CHIGORODÓ NIT. 890.980.998

* SE ACLARA QUE LA PÓLIZA EN ASUNTO ES CORRELATIVA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 994000001857.

CONDICIONADO GENERAL: 20/10/2021-1502-P-06-PATRI-CL-SUSP-04-DR0I
NOTA TECNICA: 20/10/2021-1502-NT-P-06-P201021MPP6P6001

OBSERVACIONES:
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL OTRO SI No. 01 DE FECHA 21/10/2024, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS PARA LAS GARANTIAS EN ASUNTO POR 45 DÍAS, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN EL 06/12/2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000417 ANEXO: 4 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S. IDENTIFICACION: 900.610.809-3

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRU	900610809-3	MUNICIPIO DE CHIGORODO	CHIGORODÓ	260,000,000.00	128,219	152,581

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
128,219	152,581

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT. 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2023 — Segunda Mejor Empresa para Trabajar en Colombia

Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMÉRICA LATINA 2021 — Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5950067172

PÓLIZA No: 595 -74 - 994000000417 ANEXO:5

AGENCIA EXPEDIDORA: **SEAS URABA SEGUROS** COD. AGE: 595 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
08	11	2024		08	11	2024	23:59 A LAS	07	12	2024	23:59 A LAS	29	15	11	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
08	11	2024	23:59 A LAS	07	12	2024	23:59 A LAS	29

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: APARTADÓ, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3104278614

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

DIRECCIÓN: CALLE 103 A #100 - 29 CIUDAD: **APARTADÓ, ANTIOQUIA** TELÉFONO: 3104278614

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISI NIT : 900610809

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA CIUDAD: CHIGORODÓ

DIRECCION: MUNICIPIO DE CHIGORODO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA: AV.-0

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBSERVACIONES
****

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DEL CONTRATO EDUH-34 CULMINACION DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS Y URBANAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO, ANTIOQUIA" DE CONFORMIDAD A LOS CONVENIOS N° 23AS111B1191 Y N° 4600016202 SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBSERVACIONES:

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS BENEFICIARIOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- LOS TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
MARIA CAMILA MONSALVE VEGA	8913	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000595006717

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

ANGVARGAS 0

CBD125780F07FF765D

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS URABA SEGUROS COD. AGENCIA: 595 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000000417** ANEXO: 5

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

ASEGURADO: **DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.610.809-3**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

- DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S NIT: 900.610.809-3
- EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6
- MUNICIPIO DE CHIGORODÓ NIT. 890.980.998

* SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS ASEGURADOS DEL CONTRATO EN ASUNTO SON:

- DISEÑOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S NIT: 900.610.809-3
- EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA - "EICE-EDUH APARTADÓ" NIT 901445176-6
- MUNICIPIO DE CHIGORODÓ NIT. 890.980.998

* SE ACLARA QUE LA PÓLIZA EN ASUNTO ES CORRELATIVA DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 994000001857.

CONDICIONADO GENERAL: 20/10/2021-1502-P-06-PATRI-CL-SUSP-04-DR0I
NOTA TECNICA: 20/10/2021-1502-NT-P-06-P201021MPP6P6001

OBSERVACIONES:
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON EL OTRO SI No. 2 DE FECHA 31/10/2024, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $84.946.339,57, QUEDANDO COMO VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE $703.962.701,57.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000000417 ANEXO: 5 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DISINCOVI S.A.S. IDENTIFICACION: 900.610.809-3

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	DISEÑOS INGENIERIA Y CONSTRU	900610809-3	MUNICIPIO DE CHIGORODO	CHIGORODÓ	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0
