Bogotá DC, diciembre 2 de 2024

Doctor
JORGE JULIAN QUINTERO POLO
Representante Legal Suplente
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO – DISPAC S. A. E.S.P
Ciudad**.**

Respetado Doctor:

En mi calidad de SUPERVISORA del contrato DG-070-2024 relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY, que se ha suscrito con KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ, me permito certificar que el desarrollo de actividades ha venido siendo atendido de conformidad, por lo tanto, emito mi visto bueno, para el trámite correspondiente al pago pactado.

Agradezco su atención,

MELISSA RODRIGUEZ
Supervisor contrato DG-070-2024

Proyectó	Elaboró	Revisó	No. de folios	Anexos
* MRODRIGUEZ *	*MRODRIGUEZ*	MRODRIGUEZ	1	1

Bogotá D.C., 02 de Diciembre de 2024

Cuenta de Cobro Nº 007

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P
DISPAC S.A. E.S.P
NIT 818.001.629-4

DEBE A:

KAREEN VANESSA PINZON RAMIREZ
C.C. 1.023.942.176 de Bogotá (Cund).

LA SUMA DE:

SIETE MILLONES DE PESOS M/c ($7.000.000)

Por concepto de:

- Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2024.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 200-763874-61

Cordialmente,



Kareen Vanessa Pinzón Ramírez
C.C. 1.023.942.176

Registro Presupuestal: 5100003039

CERTIFICADO - RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTAS DE TRABAJO

Bogotá D.C.

Señores:
DISPAC S.A. E.S.P
Bogotá D.C

Yo, Kareen Vanessa Pinzón Ramírez, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.023.942.176 expedida en Bogotá D.C, para efectos de disminuir la base de retención en la fuente por rentas de trabajo, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que la información señalada en este documento corresponde a la factura y/o documento equivalente aportado a la empresa DISPAC SA ESP.

		SI	NO
1.	Soy residente en Colombia	X	___
2.	Se tomará los costos y deducciones asociadas a dichas rentas	___	X

3. Ingresos No Constitutivos de Renta:

3.1. Valores aportados en la planilla de seguridad social atribuibles a la factura objeto de pago

Aportes obligatorios a salud	$ 352.500
Aportes obligatorios a pensión	$ 451.200
Aportes a ARL	$ 14.800

3.2. Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS $0.

Se adjunta:

☐ Planilla de seguridad social pagada

4. Deducciones:

3.1. Declaración de Dependientes

Certifico bajo la gravedad de juramento que la(s) siguiente(s) persona(s) depende(n) económicamente de mí, y que cumplen con los términos y requisitos establecidos en el artículo 387 del Estatuto Tributario y no han sido incluidas por otras personas para usar la deducción por dependientes que establece el mencionado artículo:

Nombre	Identificación	Parentesco	Edad
N/A	N/A	N/A	N/A

Teniendo en cuenta lo anterior, solicito que me sean aplicadas las deducciones por dependientes que se marcan a continuación como “Deducción a solicitar”, y adjunto los respectivos documentos soporte exigidos:

- ☐ Registro civil de nacimiento.
- ☐ Certificación de las instituciones de educación superior certificadas por el ICFES o autoridad oficial correspondiente.
- ☐ Certificación expedida por la entidad promotora de salud EPS o, por medicina legal.
- ☐ Certificación firmada por contador público de ausencia de ingresos.

3.2. Intereses de vivienda

El valor de los intereses pagados por concepto de vivienda deducibles de la base de retención en la fuente es de: $0. Este valor no ha sido ni será incluido por otras personas, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificación expedida por la entidad financiera de los intereses pagados durante el periodo 2024.

3.1. Pagos por salud

El valor de los pagos por salud (medicina prepagada y/o seguros) deducibles de la base de retención en la fuente es de: $0, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificación de los pagos realizados en el año 2024 expedido por las empresas de medicina prepagada o compañías de seguros.

4. Rentas exentas

4.1. El valor de los aportes AFC susceptibles de ser considerados como renta exenta para efectos de la retención en la fuente es de $0, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificado expedido por la entidad financiera correspondiente.

4.2. El valor de los aportes a fondos de pensiones voluntarios y/o seguros privados de pensiones susceptibles de ser considerados como renta exenta para efectos de la retención en la fuente es de $ 0, para lo cual adjunto:

- ☐ Certificado expedido por el Fondo de Pensiones.

Con el presente documento certifico que, en el momento de tener algún cambio en mi calidad tributaria, esta será informada oportunamente.

La presente certificación se expide a los 02 de Diciembre del año 2024, dirigida a DISPAC S.A. E.S.P quien la utilizará únicamente para los fines descritos al inicio de esta.

NOMBRE **KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ**

FIRMA 

IDENTIFICACIÓN **1.023.942176**

ING. VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

Bogotá D.C, 02 de Diciembre de 2024

Señores
EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICIO S.A. E.S.P.- DISPAC
Atn. **ING. MELISSA MARIA RODRIGUEZ**
Av. Calle 26 No 69 D- 91, Torre 1 Oficina 804, Centro Empresarial Arrecife
Tel: (571) 4672203
Bogotá D.C

Asunto: Informe número 007 de actividades correspondientes al contrato DG-070-2024.

Estimada ingeniera.

En el siguiente informe se describen las actividades realizadas en el periodo comprendido del 1 al 30 de Noviembre de 2024, en el marco del contrato DG-070-2024 relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY.

1. **ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. **Realizar el registro y actualización de la información en la plataforma GESPROY relacionada con los proyectos y los contratos derivados de este, en cumplimiento con el sistema de seguimiento, monitoreo y ejecución de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se realiza el cargue de información de los proyectos a cargo de DISPAC en la plataforma GESPROY, y se notifica vía correo electrónico a los supervisores y coordinadora de los proyectos para aprobación y posterior aprobación y envío en la plataforma, tal como se evidencia en el Anexo 1 del presente informe de actividades.

2. **Realizar la programación de los hitos de la contratación derivada de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   No se ejecuta la actividad por la etapa en la que se encuentran los proyectos.

3. Realizar el registro de la información de la supervisión de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.

4. **Proyectar los informes de ejecución y cargue de GESPROY, de acuerdo con la información suministrada por el responsable de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

   Se realizan los informes de ejecución y cargue del proyecto, los cuales son enviados a los supervisores y a la coordinadora de proyectos vía correo electrónico – Ver Anexo 1.

5. **Atender las consultas que se desprendan de los reportes, las alertas y novedades de la plataforma GESPROY:**

   Se atienden y contestan las inquietudes que surgen a raíz de los reportes previa aprobación y envío de la información en la plataforma.

6. **Verificar o registrar la marcación de los indicadores de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías.**

   No se ejecuta la actividad por la etapa en la que se encuentran los proyectos, sin embargo, se registra el avance en los indicadores y metas de productos de los proyectos que están en ejecución.

7. **Realizar la creación, modificación y eliminación de rubros, CDP, procesos precontractuales, contratos, registros presupuestales, pagos, e incorporación del presupuesto en el aplicativo GESPROY de los proyectos que se requieran:**

   Se realiza la revisión y actualización de los contratos que se encuentran en ejecución, suspendidos y terminados, así mismo, se registran las modificaciones (Otrosí, suspensiones o reinicios) de los contratos asociados a los proyectos.

8. **Realizar los ajustes a los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías dentro de las oportunidades establecidas:**

   Para este mes no se realiza ningún ajuste relevante en los proyectos.

9. **Realizar el cargue mensual de la ejecución de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías y reporte de la contratación:**

   Como se evidencia en los puntos anteriores, se realiza el cargue para el mes de Octubre de la información de ejecución de los proyectos. Ver Anexo 1.

10. **Verificar la creación y vinculación de terceros, tales como los contratistas y supervisores, en la plataforma GESPROY.**

    Se verifica la información en la plataforma y se corrobora que está completa.

11. **Realizar el reporte de ejecución de bienes y servicios de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías:**

    Se carga el reporte de ejecución de bienes y servicios de acuerdo con lo reportado en el mes por los supervisores de los proyectos, para los proyectos en los cuales aplica el reporte.


12. **Revisar y actualizar la información reportada para garantizar que se obtenga el adecuado desempeño en la medición del IGPR de la empresa:**

    Se reporta el avance de ejecución mensual conforme lo indicado y aprobado por los supervisores de los contratos en la reunión mensual para revisión y cargue de información de GESPROY.


13. **Realizar en términos generales los reportes y seguimiento en las diferentes plataformas del Sistema General de Regalías del proyecto y de los contratos derivados del mismo:**

    Como se evidencia en los puntos anteriores, se realiza el cargue para el mes de Junio de la información de ejecución de los proyectos, así mismo, se realiza el aprueba y envía de los proyectos de la siguiente manera:


- **PROYECTO BPIN 2021002440035 - GUAJIRA FASE 2**

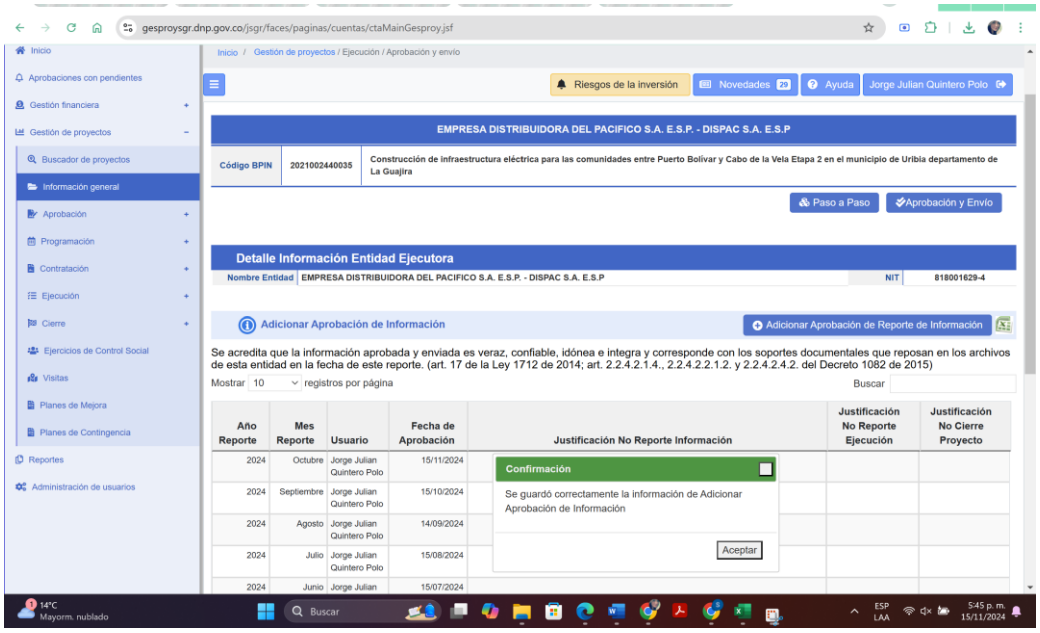


- **PROYECTO BPIN 2021005940004 – BARRANCOMINAS**

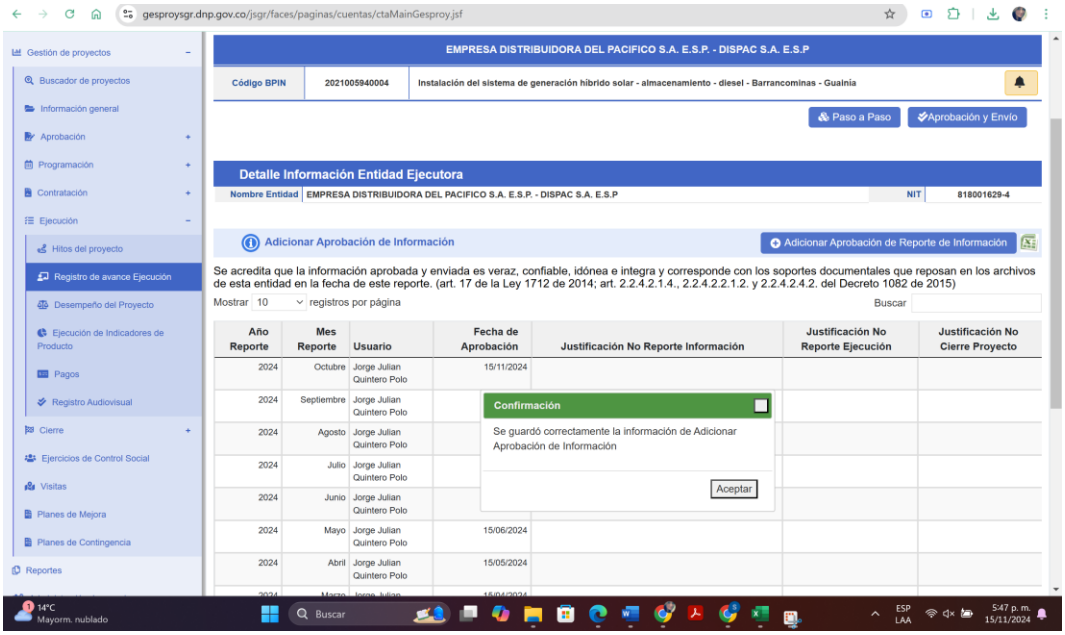


- **PROYECTO BPIN 20201301010353 – CAUCA NARIÑO**

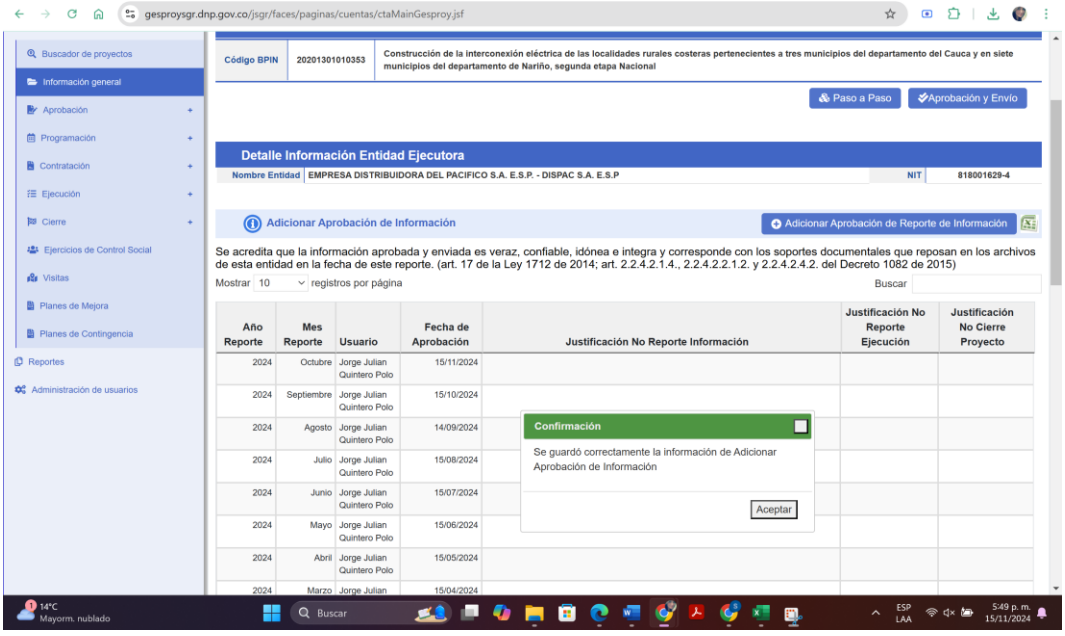


- **PROYECTO BPIN 20201301010463 – SIMITI**

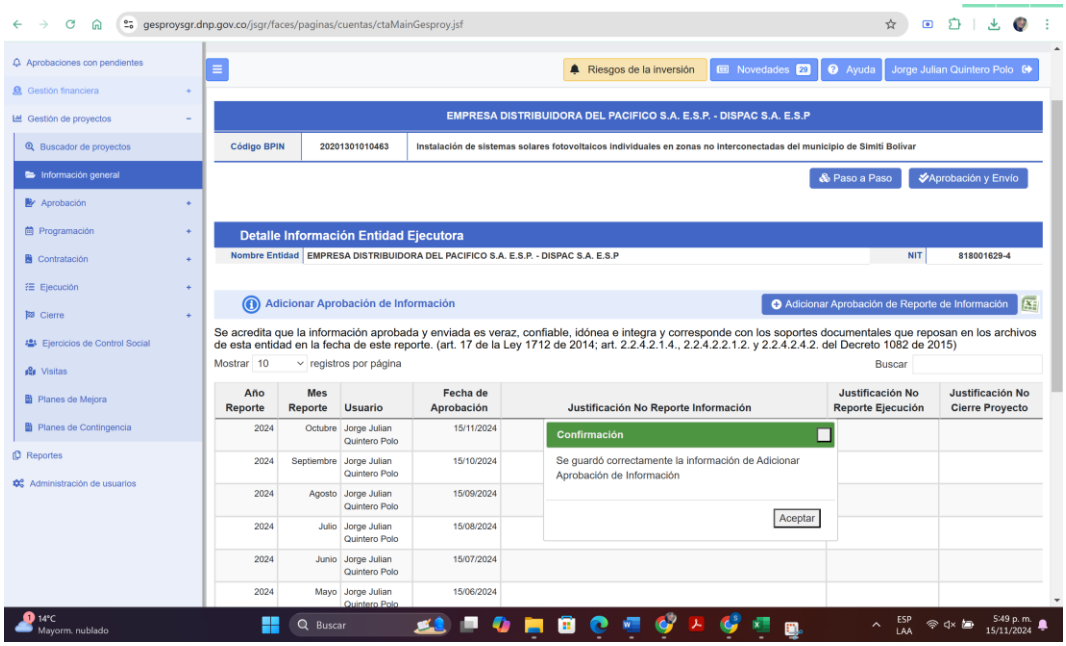


- **PROYECTO BPIN 20201301010558 - CARMEN DE BOLIVAR**

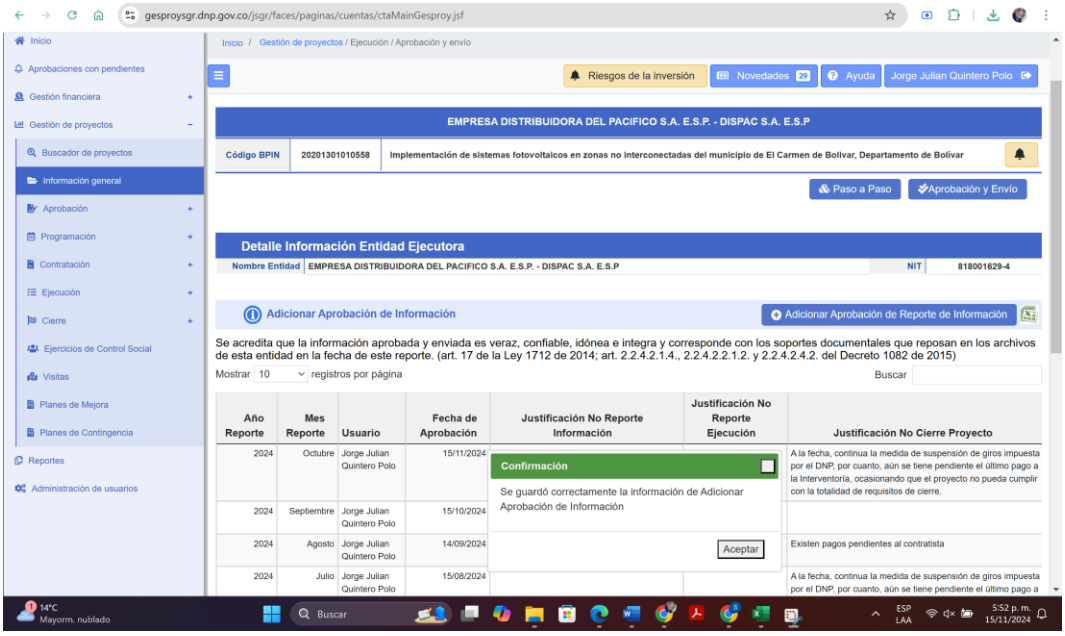


- **PROYECTO BPIN 20201301010861 - PUEBLO BELLO**

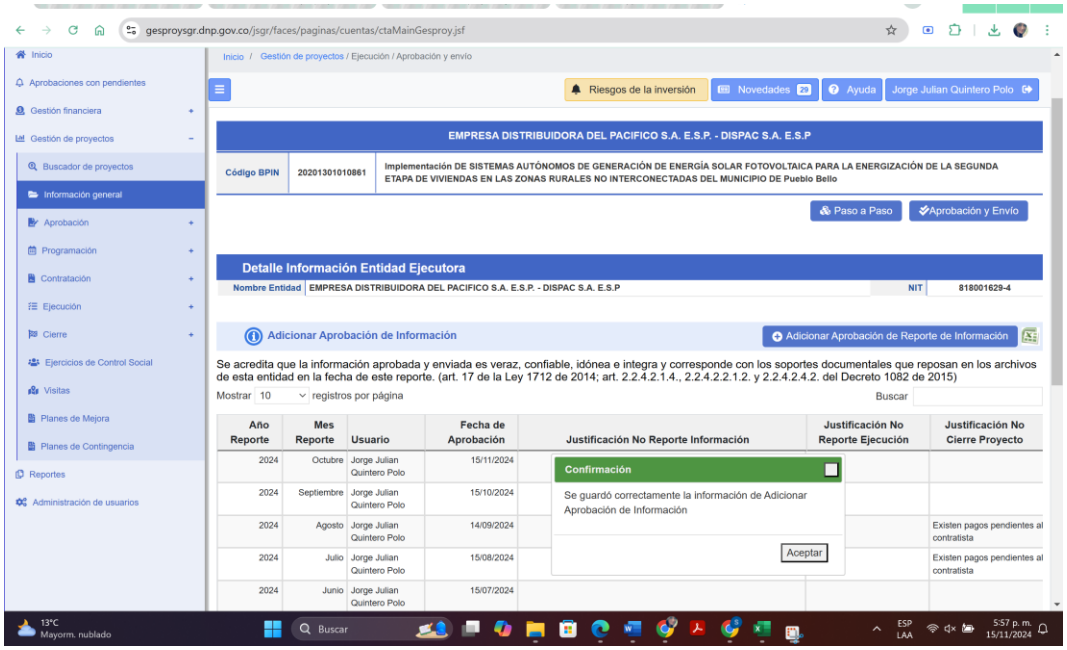


- **PROYECTO BPIN 20201301011070 – NOVITA**

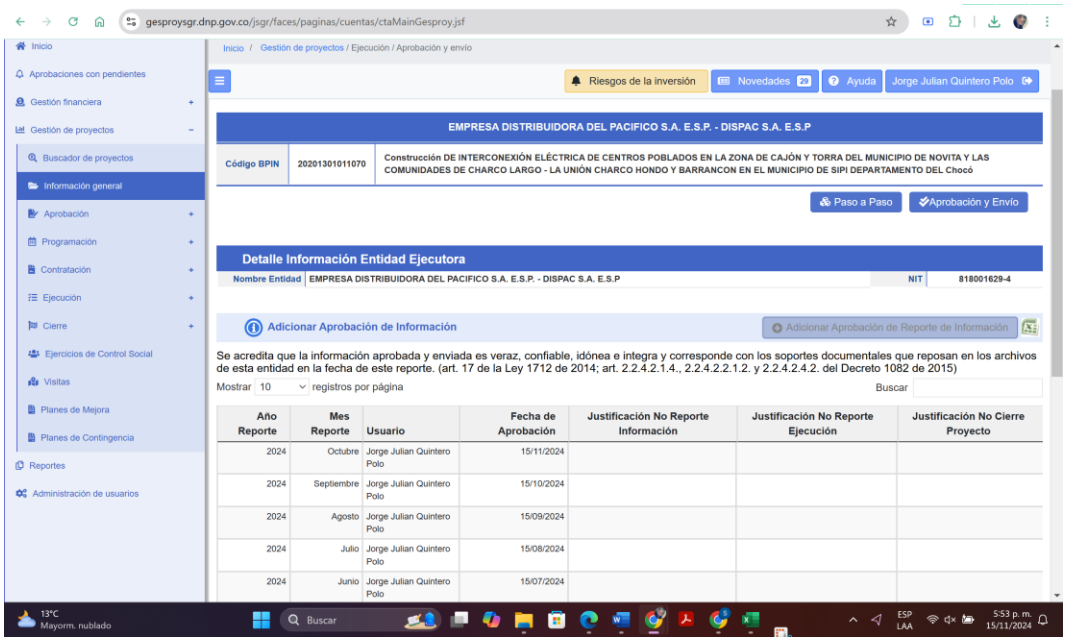

- **PROYECTO BPIN 20201301011744 – CIÉNAGA**

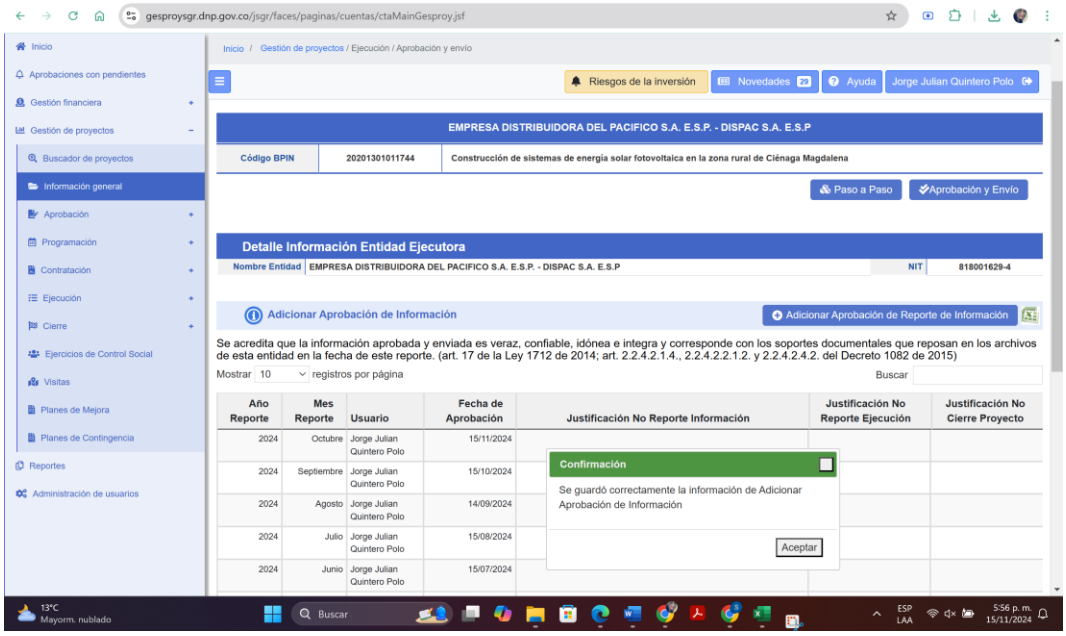

- **PROYECTO BPIN 20201301011863 – CIÉNAGA**

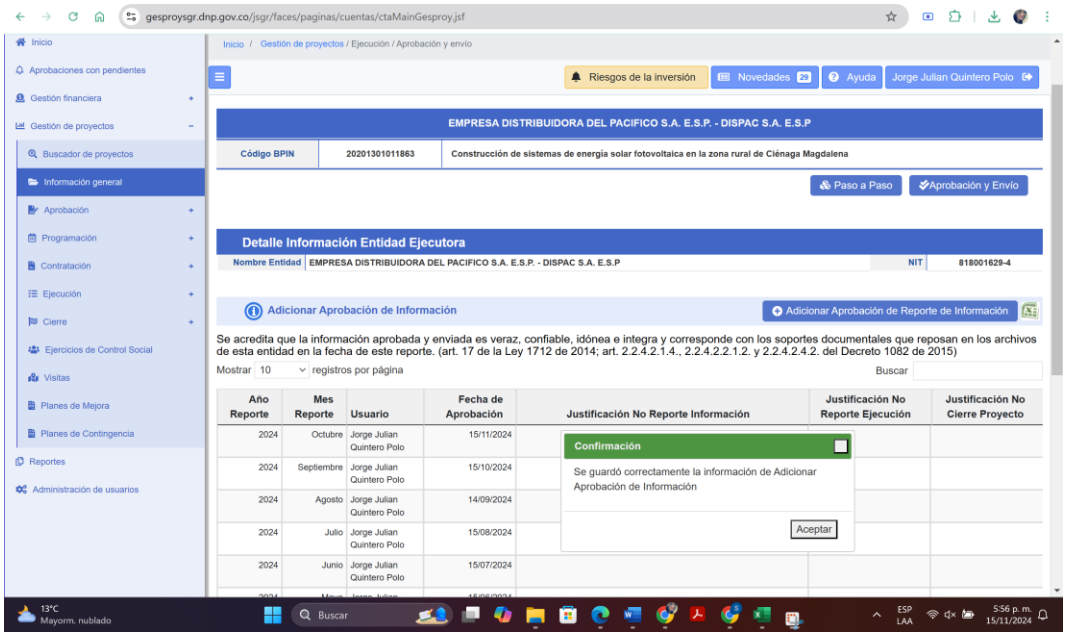

14. **Participar en las reuniones con el DNP, OCAD PAZ, y aquellas entidades en donde se requiera para tratar los asuntos relacionados con el manejo de la plataforma por parte de la empresa.**

    Se asiste reuniones programadas por el DNP y el OCADPAZ con respecto a la ejecución del proyecto BPIN 20201301010353 - Construcción de la interconexión eléctrica de las localidades rurales costeras pertenecientes a tres municipios del departamento del Cauca y en siete municipios del departamento de Nariño, segunda etapa Nacional.

Cordialmente,

ING. KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ
Ing. Civil
Magister en Gerencia de Proyectos

K V
A R

ING. VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

ANEXO 1 –

INFORMES DE CARGUE DE EJECUCIÓN

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACIÓN INFORMACIÓN GESPROY PROYECTO BPIN 20201301011863 - CIENAGA - OCTUBRE 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 15 de noviembre de 2024, 13:17
Para: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>, Ricardo Arturo Ribero Rojas <rribero@dispac.com.co>

Melissa, Ricardo, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301011863 - Ciénaga**, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día de ayer.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Octubre/2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Octubre de 2024**, se carga la siguiente información de ejecución, así:

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se genera el archivo de cargue ejecución del mes de Agosto para las siguientes actividades:

- **Interventoría:** Para la actividad de interventoría se carga lo equivalente a la ejecución de 1 mes, así:

Actividad MGA: Realizar la interventoria.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
							Inicial																															
1	1.6.1 Interventoria	und	5.17	99.6	No		Prog	1	884.349.452	884.349.452	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07												
							Eje	1	884.349.451,27	884.349.451,27	0,034	0,04	0,04	0,04	0,018	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,014	0,01	0,004

- **Proceso de liquidación de obra e interventoría:** Se cargan un avance del 1%, alcanzando un avance acumulado para esta actividad del 97%

Actividad MGA: Realizar el apoyo a la supervisión

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
							Inicial																															
1	1.7.1 Apoyo a la supervision	und	.31	100	No		Prog	1	52.500.000	52.500.000	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1											
							Eje	1	64.676.670	64.676.670			0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,1	0,06	0,06									
2	1.7.2 Proceso de liquidación obra e interventoria	und	.06	97	No		Inicial																															
							Prog	1	10.500.000	10.500.000																0,33	0,33	0,34									
							Eje	1	10.500.000	10.500.000																			0,33	0,14	0,14	0,14	0,14	0,035	0,035	0,01	0,03

De igual forma, se reporta en las observaciones a la ejecución, la siguiente información:

	* Finaliza el proceso de liquidación de interventoria, por cuanto se procede a hacer el cierre del proyecto en el aplicativo.	RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS	15/11/2024

A hoy el proyecto se encuentra contratado en ejecución, con **0 alertas.**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301011863	Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural de Ciénaga Magdalena

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance
CONSTRUCCIÓN DE 854 SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN 35 VEREDAS DE LA ZONA RURAL DE CIÉNAGA, MAGDALENA

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
20/09/2021	05/12/2023	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 17.092.291.380	$ 17.057.122.806	No


** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados

En su ejecución física se tiene un 99,98% y ejecución financiera 99,99%. **(Pendiente actualización con información a Octubre 2024)**



Desempeño del proyecto - Curva S. (Pendiente actualización con información a Octubre 2024)

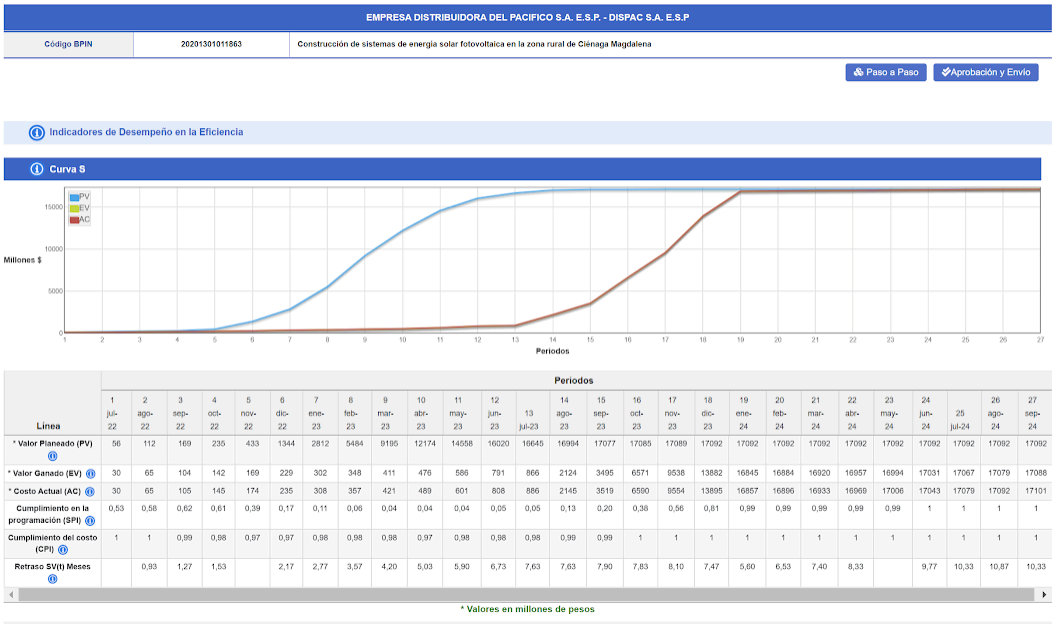

Línea	Periodos																									
	1 jul-22	2 ago-22	3 sep-22	4 oct-22	5 nov-22	6 dic-22	7 ene-23	8 feb-23	9 mar-23	10 abr-23	11 may-23	12 jun-23	13 jul-23	14 ago-23	15 sep-23	16 oct-23	17 nov-23	18 dic-23	19 ene-24	20 feb-24	21 mar-24	22 abr-24	23 may-24	24 jun-24	25 jul-24	26 ago-24	27 sep-24
* Valor Planeado (PV)	56	112	169	235	433	1344	2812	5484	9195	12174	14558	16020	16645	16994	17077	17085	17089	17092	17092	17092	17092	17092	17092	17092	17092	17092	17092
* Valor Ganado (EV)	30	65	104	142	169	229	302	348	411	476	586	791	866	2124	3495	6571	9538	13882	16845	16884	16920	16957	16994	17031	17067	17079	17088
* Costo Actual (AC)	30	65	105	145	174	235	308	357	421	489	601	808	886	2145	3519	6590	9554	13895	16857	16896	16933	16969	17006	17043	17079	17092	17101
Cumplimiento en la programación (SPI)	0,53	0,58	0,62	0,61	0,39	0,17	0,11	0,06	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,13	0,20	0,38	0,56	0,81	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1	1	1	1
Cumplimiento del costo (CPI)	1	1	0,99	0,98	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retraso SV(t) Meses		0,93	1,27	1,53		2,17	2,77	3,57	4,20	5,03	5,90	6,73	7,63	7,63	7,90	7,83	8,10	7,47	5,60	6,53	7,40	8,33		9,77	10,33	10,87	10,33

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

--

--

Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Ricardo Arturo Ribero Rojas <rribero@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 14:15
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

De acuerdo

Cordialmente,

RICARDO RIBERO ROJAS
CONTRATISTA PROYECTOS
rribero@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 15:48
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

favor proceder con el carque conforme a lo reportado por el supervisor

[El texto citado está oculto]

--

[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301011070 - NOVITA - OCTUBRE 2024

3 mensajes


GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 15 de noviembre de 2024, 12:55
Para: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>, Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301011070 - Novita**, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día 13 de Noviembre.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Octubre 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se carga avance así:

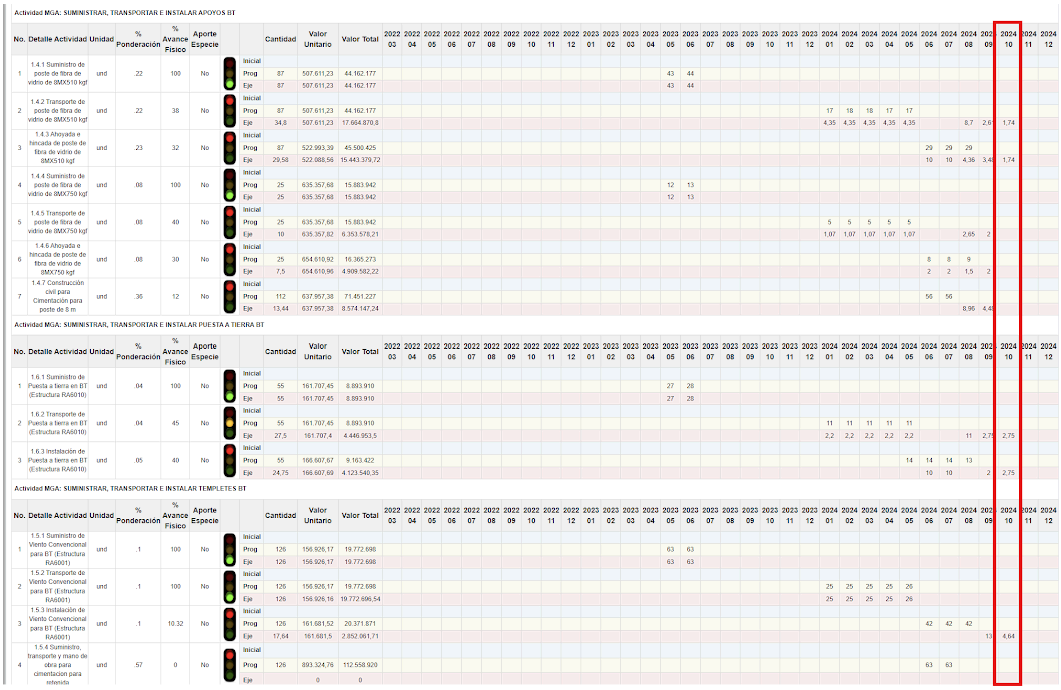

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR APOYOS BT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	2024 11	2024 12
1	1.4.1 Suministro de poste de fibra de vidrio de 9MX510 kgf	und	,22	100	No	Inicial																																						
						Prog	87	507.611,23	44.162.177															43	44																				
						Eje	87	507.611,23	44.162.177															43	44																				
2	1.4.2 Transporte de poste de fibra de vidrio de 9MX510 kgf	und	,22	38	No	Inicial																																						
						Prog	87	507.611,23	44.162.177																							17	18	18	17	17									
						Eje	34,8	507.611,23	17.664.870,8																							4,35	4,35	4,35	4,35	4,35			8,7	2,6	1,74				
3	1.4.3 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 8MX510 kgf	und	,23	32	No	Inicial																																						
						Prog	87	522.993,39	45.500.425																													29	29	29							
						Eje	29,58	522.088,56	15.443.379,72																													10	10	4,36	3,46	1,74				
4	1.4.4 Suministro de poste de fibra de vidrio de 9MX750 kgf	und	,08	100	No	Inicial																																						
						Prog	25	635.357,68	15.883.942															12	13																				
						Eje	25	635.357,68	15.883.942															12	13																				
5	1.4.5 Transporte de poste de fibra de vidrio de 9MX750 kgf	und	,08	40	No	Inicial																																						
						Prog	25	635.357,68	15.883.942																							5	5	5	5	5									
						Eje	10	635.357,82	6.353.578,21																							1,07	1,07	1,07	1,07	1,07			2,65	2					
6	1.4.6 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 8MX750 kgf	und	,08	30	No	Inicial																																						
						Prog	25	654.610,92	16.365.273																													8	8	9							
						Eje	7,5	654.610,96	4.909.582,22																													2	2	1,5	2						
7	1.4.7 Construcción civil para Cimentación para poste de 8 m	und	,36	12	No	Inicial																																						
						Prog	112	637.957,38	71.451.227																													56	56								
						Eje	13,44	637.957,38	8.574.147,24																															8,96	4,48						

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUESTA A TIERRA BT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	2024 11	2024 12
1	1.6.1 Suministro de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010)	und	,04	100	No	Inicial																																						
						Prog	55	161.707,45	8.893.910															27	28																				
						Eje	55	161.707,45	8.893.910															27	28																				
2	1.6.2 Transporte de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010)	und	,04	45	No	Inicial																																						
						Prog	55	161.707,45	8.893.910																							11	11	11	11	11									
						Eje	27,5	161.707,4	4.446.953,5																							2,2	2,2	2,2	2,2	2,2				11	2,75	2,75			
3	1.6.3 Instalación de Puesta a tierra en BT (Estructura RA6010)	und	,05	40	No	Inicial																																						
						Prog	55	166.607,67	9.163.422																													14	14	13							
						Eje	24,75	166.607,69	4.123.540,35																													10	10		2	2,75				

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TEMPLETES BT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	2024 11	2024 12
1	1.5.1 Suministro de Viento Convencional para BT (Estructura RA6001)	und	,1	100	No	Inicial																																						
						Prog	126	156.926,17	19.772.698															63	63																				
						Eje	126	156.926,17	19.772.698															63	63																				
2	1.5.2 Transporte de Viento Convencional para BT (Estructura RA6001)	und	,1	100	No	Inicial																																						
						Prog	126	156.926,17	19.772.698																							25	25	25	25	26									
						Eje	126	156.926,16	19.772.696,54																							25	25	25	25	26									
3	1.5.3 Instalación de Viento Convencional para BT (Estructura RA6001)	und	,1	10,32	No	Inicial																																						
						Prog	126	161.681,52	20.371.871																													42	42	42							
						Eje	17,64	161.681,5	2.852.061,71																																13	4,64				
4	1.5.4 Suministro, transporte y mano de obra para cimentacion para retenida	und	,57	0	No	Inicial																																						
						Prog	126	893.324,76	112.558.920																													63	63								
						Eje		0	0																																					

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	2024 11	2024 12
1	1.7.1 Suministro de Transformador Monofásico autoprotegido de 10 KVA	und	,01	100	No		Inicial																																				
							Prog	1	1.809.611	1.809.611																		0,25	0,25	0,25	0,25												
							Eje	1	1.809.612	1.809.612																		0,25	0,25	0,25	0,25												
2	1.7.2 Transporte de Transformador Monofásico autoprotegido de 10 KVA	und	,01	60	No		Inicial																																				
							Prog	1	1.809.611	1.809.611																								0,5	0,5									
							Eje	0,7	1.809.611,86	1.266.728,3																								0,15	0,15			0,2	0,1	0,1			
3	1.7.3 Instalación de Transformador Monofásico autoprotegido de 10 KVA	und	,01	40	No		Inicial																																				
							Prog	1	1.864.448	1.864.448																												0,33	0,33	0,34				
							Eje	0,5	1.864.449,2	932.224,6																												0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
4	1.7.4 Suministro de Transformador Monofásico autoprotegido de 25 KVA	und	,05	100	No		Inicial																																				
							Prog	4	2.564.897,75	10.259.591																		1	1	1	1												
							Eje	4	2.564.898	10.259.592																		1	1	1	1												
5	1.7.5 Transporte de Transformador Monofásico autoprotegido de 25 KVA	und	,05	60	No		Inicial																																				
							Prog	4	2.564.897,75	10.259.591																								2	2									
							Eje	2,5	2.564.898,12	6.412.245,3																								0,6	0,6			0,8	0,4	0,1			
6	1.7.6 Instalación de Transformador Monofásico autoprotegido de 25 KVA	und	,05	30	No		Inicial																																				
							Prog	4	2.642.621,75	10.570.487																												1	2	1				
							Eje	1,3	2.642.621,62	3.435.408,1																													0,8	0,4	0,1			
7	1.7.7 Suministro de Transformador Monofásico Autoprotegido de 37,5 KVA	und	,03	100	No		Inicial																																				
							Prog	2	2.999.273	5.998.546																		0,5	0,5	0,5	0,5												
							Eje	2	2.999.272,5	5.998.545																		0,5	0,5	0,5	0,5												
8	1.7.8 Transporte de Transformador Monofásico Autoprotegido de 37,5 KVA	und	,03	60	No		Inicial																																				
							Prog	2	2.999.273	5.998.546																										1	1								
							Eje	1,3	2.999.273,15	3.899.055,1																										0,3	0,3			0,4	0,2	0,1			
9	1.7.9 Instalación de Transformador Monofásico Autoprotegido de 37,5 KVA	und	,03	40	No		Inicial																																				
							Prog	2	3.090.160	6.180.320																												0,66	0,67	0,67				
							Eje	0,9	3.090.160	2.781.144																												0,2	0,2	0,2	0,2	0,1		
10	1.7.10 Suministro de Transformador Trifasico Autoprotegido 30 KVA 13200 220 V	und	,08	100	No		Inicial																																				
							Prog	5	3.298.406,4	16.492.032																		1,25	1,25	1,25	1,25												
							Eje	5	3.298.406,4	16.492.032																		1,25	1,25	1,25	1,25												
11	1.7.11 Transporte de Transformador Trifasico Autoprotegido 30 KVA 13200 220 V	und	,08	60	No		Inicial																																				
							Prog	5	3.298.406,4	16.492.032																								2	3									
							Eje	3,1	3.298.406,65	10.225.060,6																								0,75	0,75			1	0,5	0,1			
12	1.7.12 Instalación de Transformador Trifasico Autoprotegido 30 KVA 13200 220 V	und	,09	30	No		Inicial																																				
							Prog	5	3.398.358,2	16.991.791																												1	2	2				
							Eje	1,7	3.398.358,41	5.777.209,3																													1	0,5	0,2			
13	1.7.13 Suministro de Transformador Trifasico autoprotegido 45 KVA 13200 220 V	und	,09	100	No		Inicial																																				
							Prog	5	3.753.719,8	18.768.599																		1,25	1,25	1,25	1,25												
							Eje	5	3.753.719	18.768.595																		1,25	1,25	1,25	1,25												
14	1.7.14 Transporte de Transformador Trifasico autoprotegido 45 KVA 13200 220 V	und	,09	60	No		Inicial																																				
							Prog	5	3.753.719,8	18.768.599																								2	3									
							Eje	3,1	3.753.719,9	11.636.531,7																								0,75	0,75			1	0,5	0,1			
15	1.7.15 Instalación de Transformador Trifasico autoprotegido 45 KVA 13200 220 V	und	,1	30	No		Inicial																																				
							Prog	5	3.867.468,8	19.337.344																												1	2	2				
							Eje	2,5	3.867.468,8	9.668.672																													1	0,5	1			
16	1.7.16 Suministro de Transformador Trifasico autoprotegido 75 KVA 13200 220 V	und	,04	100	No		Inicial																																				
							Prog	2	4.327.681,5	8.655.363																		0,5	0,5	0,5	0,5												
							Eje	2	4.327.682	8.655.364																		0,5	0,5	0,5	0,5												
17	1.7.17 Transporte de Transformador Trifasico	und	,04	60	No		Inicial																																				
							Prog	2	4.327.681,5	8.655.363																										1	1								

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR TENDIDO RED BT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	2024 11	2024 12
1	1.3.1 Suministro de Cable triplex 2x2 1x2 AWG ACSR	m	,02	100	No		Inicial																																				
							Prog	371	8.149,36	3.023.414														185	186																			
							Eje	371	8.149,36	3.023.414														185	186																			
2	1.3.2 Transporte de Cable triplex 2x2 1x2 AWG ACSR	m	,02	44,97	No		Inicial																																				
							Prog	371	8.149,36	3.023.414																						74	74	74	74	75							
							Eje	166,85	8.149,36	1.359.720,07																						15	15	15	15	15			54,85	37			
3	1.3.3 Tendido y tensionado de Cable triplex 2x2 1x2 AWG ACSR	m	,02	15,09	No		Inicial																																				
							Prog	371	8.396,31	3.115.032																												123	124	124				
							Eje	92,75	8.396,31	778.757,62																													25,97	30	36,78		
4	1.3.4 Suministro de Cable triplex 2x10 1x10 AWG ACSR	m	,01	100	No		Inicial																																				
							Prog	185	10.140,52	1.875.996														92	93																			
							Eje	185	10.140,52	1.875.996														92	93																			
5	1.3.5 Transporte de Cable triplex 2x10 1x10 AWG ACSR	m	,01	30	No		Inicial																																				
							Prog	185	10.140,52	1.875.996																						37	37	37	37	37							
							Eje	83,25	10.140,54	844.199,64																						7	7	7	7	7				20,5	27,75		
6	1.3.6 Tendido y tensionado de Cable triplex 2x10 1x10 AWG ACSR	m	,01	65,95	No		Inicial																																				
							Prog	185	10.447,81	1.932.844																												61	62	62				
							Eje	122	10.447,8	1.274.632																												61	61					
7	1.3.7 Suministro de Cable triplex 2x20 1x20 AWG ACSR	m	,06	100	No		Inicial																																				
							Prog	906	12.498,14	11.323.311														453	453																			
							Eje	906	12.498,14	11.323.311														453	453																			
8	1.3.8 Transporte de Cable triplex 2x20 1x20 AWG ACSR	m	,06	30	No		Inicial																																				
							Prog	906	12.498,14	11.323.311																						181	181	181	181	182							
							Eje	453	12.498,14	5.661.655,86																						36	36	36	36	36				91,5	181,2		
9	1.3.9 Tendido y tensionado de Cable triplex 2x20 1x20 AWG ACSR	m	,06	33,11	No		Inicial																																				
							Prog	906	12.876,87	11.666.443																												302	302	302				
							Eje	317,1	12.876,87	4.083.254,45																												150	150				17,1	
10	1.3.10 Suministro de Cable cuadruplex 3xN 2 AWGXLPE 1xN 2 ACSR90600V	m	,06	100	No		Inicial																																				
							Prog	1.186	10.142,68	12.029.214														593	593																			
							Eje	1.186	10.142,68	12.029.214														593	593																			
11	1.3.11 Transporte de Cable cuadruplex 3xN 2 AWGXLPE 1xN 2 ACSR90600V	m	,06	30	No		Inicial																																				
							Prog	1.186	10.142,68	12.029.214																						237	237	237	237	238							
							Eje	1.185,5	10.142,68	12.024.143,75																						47	47	47	47	47				120	829,7		
12	1.3.12 Tendido y tensionado de Cable cuadruplex 3xN 2 AWGXLPE 1xN 2 ACSR90600V	m	,06	25,3	No		Inicial																																				
							Prog	1.186	10.450,03	12.393.737																												395	395	396				
							Eje	415,1	10.450,03	4.337.809																												150	150				115,1	
13	1.3.13 Suministro de Cable cuadruplex 3xN 10 AWGXLPE 1xN 10 ACSR90600V	m	,09	100	No		Inicial																																				
							Prog	1.403	13.288,9	18.644.328														701	702																			
							Eje	1.403	13.288,9	18.644.328														701	702																			
14	1.3.14 Transporte de Cable cuadruplex 3xN 10 AWGXLPE 1xN 10 ACSR90600V	m	,09	30,01	No		Inicial																																				
							Prog	1.403	13.288,9	18.644.328																						281	281	281	280	280							
							Eje	701,5	13.288,9	9.322.162,03																						56	56	56	56	56				147	280,5		
15	1.3.15 Tendido y tensionado de Cable cuadruplex 3xN 10 AWGXLPE 1xN 10 ACSR90600V	m	,1	28,51	No		Inicial																																				
							Prog	1.403	13.691,59	19.209.397																												468	468	467				
							Eje	491,05	13.691,6	6.723.258																												200	200				91,05	
16	1.3.16 Suministro de Cable cuadruplex 3xN 20 AWGXLPE 1xN 20 ACSR90600V	m	,03	100	No		Inicial																																				
							Prog	385	14.374,48	5.534.173														192	193																			
							Eje	385	14.374,48	5.534.173														192	193																			
17	1.3.17 Transporte de Cable cuadruplex 3xN 20 AWGXLPE 1xN 20 ACSR90600V	m	,03	29,87	No		Inicial																																				
							Prog	385	14.374,48	5.534.173																						77	77	77	77	77							
							Eje	192,5	14.374,47	2.767.086,01																						15	15	15	15	15				40	77,5		
18	1.3.18 Tendido y tensionado de Cable cuadruplex 3xN 20 AWGXLPE 1xN 20 ACSR90600V	m	,03	36,36	No		Inicial																																				
							Prog	385	14.810,06	5.701.875																												128	128	129				
							Eje	140	14.810,07	2.073.410																												70	70					

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR VESTIDA / ARMADA POSTES BT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	2024 11	2024 12
1	1.2.1 Suministro de estructura para postes	und	,04	100	No		Inicial																																				
							Prog	171	46.605,79	8.003.790															85	86																			
							Eje	171	46.605,79	8.003.790,01															85	86																			
2	1.2.2 Transporte de estructura para postes	und	,04	50	No		Inicial																																				
							Prog	171	46.605,79	8.003.790																						42	43	43	43								
							Eje	102,6	46.605,77	4.802.272,16																						6,8	6,8	6,8	6,8	6,8			42,95	8,5	17,1		
3	1.2.3 Instalación, vestida y armada de estructura para postes	und	,05	40	No		Inicial																																				
							Prog	171	53.046,56	9.070.962																										57	57	57						
							Eje	85,5	53.046,56	4.535.480,93																										25	25	9,85	8,5	17,1		
4	1.2.4 Construcción civil para cimentación	und	,01	0	No		Inicial																																				
							Prog	171	9.361,16	1.600.758																										57	57	57						
							Eje		0	0																																		


Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR APOYOS MT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	2024 11	2024 12
1	2.3.1 Suministro de poste de fibra de vidrio de 14MX750 kgf	und	3,74	100	No	Inicial																																					
						Prog	472	1.570.877,38	741.454.123															118	118	118	118																
						Eje	472	1.570.877,38	741.454.123,2															118	118	118	118																
2	2.3.2 Transporte de poste de fibra de vidrio de 14MX750 kgf	und	3,74	59,96	No	Inicial																																					
						Prog	472	1.570.877,38	741.454.123																			52	52	52	52	52	53	53	53								
						Eje	283	1.570.877,37	444.550.296,62																			22	22	22	22	22	21	21	21	21	21		47				
3	2.3.3 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 14MX750 kgf	und	3,85	39,96	No	Inicial																																					
						Prog	472	1.618.479,72	763.922.430																							67	67	67	67	67	67	70					
						Eje	212,4	1.618.479,72	343.765.093,26																							11	11	11	11	11	11	75,6	47	23,8			
4	2.3.4 Suministro de poste de fibra de vidrio de 14MX1050 kgf	und	7,4	100	No	Inicial																																					
						Prog	78	1.892.859,24	147.643.021															19	19	20	20																
						Eje	78	1.892.859,24	147.643.021															19	19	20	20																
5	2.3.5 Transporte de poste de fibra de vidrio de 14MX1050 kgf	und	7,4	60,26	No	Inicial																																					
						Prog	78	1.892.859,24	147.643.021																			8	8	8	9	9	9	9	9								
						Eje	47	1.892.859,21	88.964.382,87																			3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	12	8				
6	2.3.6 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 14MX1050 kgf	und	7,7	35,26	No	Inicial																																					
						Prog	78	1.950.218,62	152.117.052																							11	11	11	11	11	11	12					
						Eje	27,5	1.950.218,61	53.631.011,68																							3	3	3	2	2	2	4,5	8				
7	2.3.7 Suministro de poste de fibra de vidrio de 20MX1050 kgf	und	2,2	100	No	Inicial																																					
						Prog	12	3.643.117,08	43.717.405															3	3	3	3																
						Eje	12	3.643.117,08	43.717.405															3	3	3	3																
8	2.3.8 Transporte de poste de fibra de vidrio de 20MX1050 kgf	und	2,2	65	No	Inicial																																					
						Prog	12	3.643.117,17	43.717.406																			1	2	2	2	1	1	1	1								
						Eje	7,8	3.643.117,02	28.416.312,73																			1		1		1	1	1	1				0,8				
9	2.3.9 Ahoyada e hincada de poste de fibra de vidrio de 20MX1050 kgf	und	2,3	40	No	Inicial																																					
						Prog	12	3.753.514,67	45.042.176																							1	2	2	2	2	2	1					
						Eje	5,4	3.753.514,63	20.268.980,06																							1		1				1,6	1,2	0,6			
10	2.3.10 Suministro de torre de 26 m	und	7,2	100	No	Inicial																																					
						Prog	4	35.755.967,75	143.023.871															1	1	1	1																
						Eje	4	35.755.967,75	143.023.871															1	1	1	1																
11	2.3.11 Transporte de torre de 26 m	und	7,2	15	No	Inicial																																					
						Prog	4	35.755.968	143.023.872																			0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45								
						Eje	1	35.755.967,8	35.755.967,8																														0,6	0,4			
12	2.3.12 Ahoyada e hincada de torre de 26 m	und	7,4	0	No	Inicial																																					
						Prog	4	36.839.482,25	147.357.929																							0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5					
						Eje		0	0																																		
13	2.3.13 Construcción civil de cimentacion para poste de 14 mts	und	5,17	35	No	Inicial																																					
						Prog	550	1.864.840,45	1.025.662.249																							91	92	92	92	92	91						
						Eje	220	1.864.840,46	410.264.901,12																							21	21	21	21			53,5	55	27,5			
14	2.3.14 Construcción civil de cimentacion para poste de 20 mts	und	1,2	30	No	Inicial																																					
						Prog	12	1.921.412,75	23.056.953																							2	2	2	2	2	2						
						Eje	4,2	1.921.412,95	8.069.934,4																							1		1				0,4	1,2	0,6			
15	2.3.15 Construcción civil de cimentacion cimentacion 1 punto de apoyo torre de 26 m	und	1,4	35	No	Inicial																																					
						Prog	4	6.819.080	27.276.320																							0,66	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66						
						Eje	1,6	6.819.080,25	10.910.528,4																							0,66	0,66						0,08	0,2			

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR TENDIDO RED MT

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10	2024 11	2024 12
1	2.1.1 Suministro de red trifásica en Cable Ecologico 15 kV ACSR No. 20 (3 fases)	m	3,49	100	No	Inicial																																					
						Prog	31.489	21.961,41	691.542.889															7.872	7.872	7.872	7.873																
						Eje	31.489	21.961,41	691.542.889															7.872	7.872	7.872	7.873																
2	2.1.2 Transporte de red trifásica en Cable Ecologico 15 kV ACSR No. 20 (3 fases)	m	3,49	45	No	Inicial																																					
						Prog	31.489	21.961,41	691.542.889																			5.248	5.248	5.248	5.248	5.248	5.249								
						Eje	14.170,6	21.961,41	311.206.374,88																			1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	2.575,6	1.575					
3	2.1.3 Tendido y tensionado de red trifásica en Cable Ecologico 15 kV ACSR No. 20 (3 fases)	m	3,59	30	No	Inicial																																					
						Prog	31.489	22.626,91	712.498.734																					5.248	5.248	5.248	5.248	5.248	5.249							
						Eje	11.020,7	22.627,83	249.374.564,22																					716	716	716	716	716	716	716	716	2.144,25	1.574,4	1.574		
4	2.1.4 Suministro de red trifásica en Cable Ecologico 15 kv ACSR No. 40 (3 fases)	m	3,47	100	No	Inicial																																					
						Prog	2.311,29	297.474,04	687.548.778															578	578	578	577,29																
						Eje	2.311,29	297.474,04	687.548.777,9															578	578	578	577,29																
5	2.1.5 Transporte de red trifásica en Cable Ecologico 15 kv ACSR No. 40 (3 fases)	m	3,47	55,02	No	Inicial																																					
						Prog	2.311,29	297.474,04	687.548.778																					385	385	385	385	385	386,29							
						Eje	1.271,645	297.474,04	378.281.379,42																					92	92	92	92	92	92	92	92	235,645	116			
6	2.1.6 Tendido y tensionado de red trifásica en Cable Ecologico 15 kv ACSR No. 40 (3 fases)	m	3,57	40	No	Inicial																																					
						Prog	2.311,29	306.488,41	708.383.590																					385	385	385	385	385	386,29							
						Eje	1.040,0115	306.509,18	318.773.072,82																					72	72	72	72	72	72	72	72	232,9515	115,56	115,5		
7	2.1.7 Suministro de Cable de acero extraresistente super GX de 14	m	,53	100	No	Inicial																																					
						Prog	54.602,7	1.939,36	105.894.212															13.650	13.650	13.650	13.652,7																
						Eje	54.602,7	1.939,36	105.894.211,99															13.650	13.650	13.650	13.652,7																
8	2.1.8 Transporte de Cable de acero extraresistente super GX de 14	m	,53	60	No	Inicial																																					
						Prog	54.602,7	1.939,36	105.894.212																			9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.102,7								
						Eje	32.761,62	1.939,36	63.536.527,26																			3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	3.071	2.730	2.730		2.733,62				
9	2.1.9 Tendido y tensionado de Cable de acero extraresistente super GX de 14	m	,55	40	No	Inicial																																					
						Prog	54.602,7	1.998,13	109.103.127																							9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.102,7						
						Eje	24.571	1.998,14	49.096.410,69																							2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548	1.092		4.369	2.730		
10	2.1.10 Suministro de cable OPGW, norma IEEP1138 12 fibras ópticas monomodo estándar, ITUT. G652, C.C monofásicos: 1.5 KA, Línea de guarda	m	2,9	100	No	Inicial																																					
						Prog	54.602,7	10.538,49	575.430.041															13.650	13.650	13.650	13.652,7																
						Eje	54.602,7	10.538,49	575.430.041,1															13.650	13.650	13.650	13.652,7																
11	2.1.11 Transporte de cable OPGW, norma IEEP1138 12 fibras ópticas monomodo estándar, ITUT. G652, C.C monofásicos: 1.5 KA, Línea de guarda	m	2,9	40	No	Inicial																																					
						Prog	54.602,7	10.538,49	575.430.041																			9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.102,7								
						Eje	21.841	10.538,49	230.171.167,84																			1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911	1.911		2.731				
12	2.1.12 Tendido de cable OPGW, norma IEEP1138 12 fibras ópticas monomodo estándar, ITUT. G652, C.C monofásicos: 1.5 KA, Línea de guarda	m	2,99	30	No	Inicial																																					
						Prog	54.602,7	10.857,84	592.867.315																			9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.102,7								
						Eje	19.110,81	10.857,81	207.501.497,47																					1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	1.706	2.732,8	2.730			
13	2.1.13 Suministro de Empalme del cable OPGW en postes	und	,65	100	No	Inicial																																					
						Prog	90	1.427.658,8	128.489.292															22	22	23	23																
						Eje	90	1.427.658,8	128.489.292															22	22	23	23																
14	2.1.14 Transporte de Empalme del cable OPGW en postes	und	,65	49,56	No	Inicial																																					
						Prog	90	1.427.658,8	128.489.292																			15	15	15	15	15	15								
						Eje	44,6	1.450.939,05	64.711.881,6																			5	5	4	4	4	4	4	1,8	1,8		7				
15	2.1.15 Instalación de Empalme del cable OPGW en postes	und	,67	40	No	Inicial																																					
						Prog	90	1.470.921,19	132.382.907																					15	15	15	15	15	15							
						Eje	40,5	1.492.712,61	60.454.860,7																					4	4	4	15					9	4,5			
16	2.1.16 Suministro de Espaciador Cuadrangular Polimérico 15 KV	und	1,09	100	No	Inicial																																					
						Prog	6.066,97	35.670,73	216.413.246															1.517	1.517	1.517	1.515,97																
						Eje	6.066,97	35.670,73	216.413.245,96															1.517	1.517	1.517	1.515,97																
17	2.1.17 Transporte de Espaciador Cuadrangular Polimérico 15 KV	und	1,09	54,95	No	Inicial																																					
						Prog	6.066,97	35.670,73	216.413.246																			1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011,97								
						Eje	3.334	35.670,73	118.926.214																			341	341	341	341	341	341	341	303	303						
18	2.1.18 Instalación de Espaciador Cuadrangular Polimérico 15 KV	und	1,12	30	No	Inicial																																					
						Prog	6.066,97	36.751,66	222.971.223																					1.011	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011,97							
						Eje	2.123	36.751,66	78.023.775,61																					283	283	283	283	283	283				122	303			

Actividad MGA: SUMINISTRAR, TRANSPORTAR Y REALIZAR VESTIDA / ARMADA POSTES MT

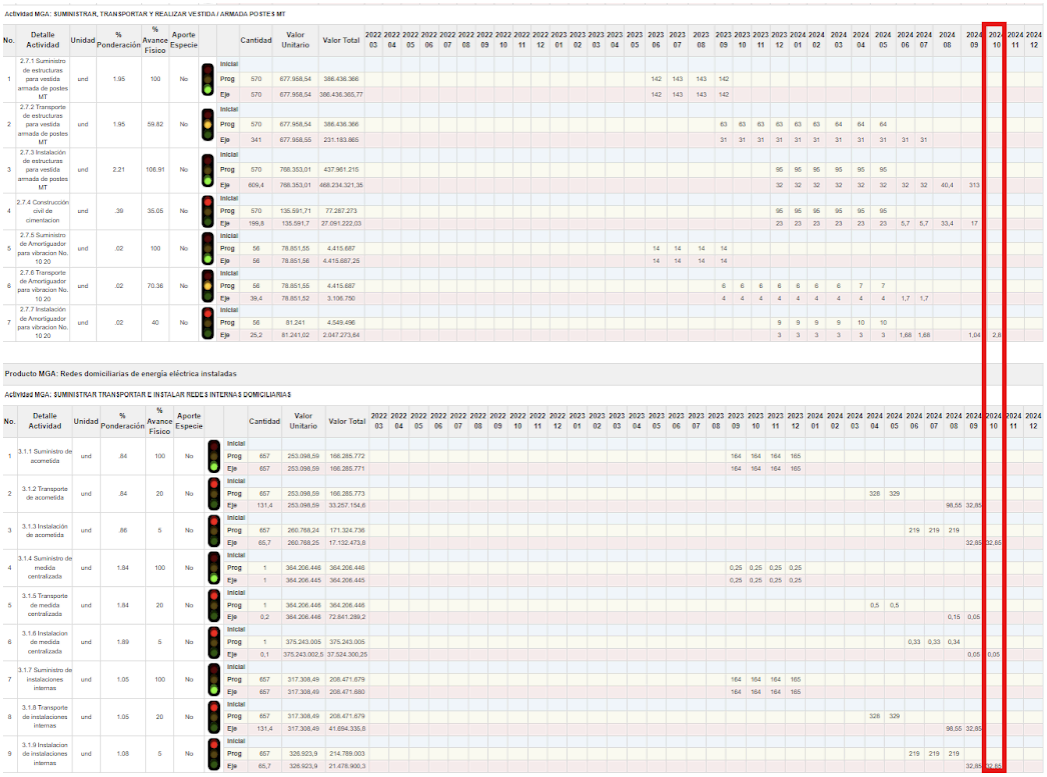

Se carga la siguiente información como observación a al ejecución:

	1. Se realizó visita no formalizada por parte del Departamento Nacional de Planeación – DNP el día 30 de agosto de 2024, y la cual fue acompañada por parte de los coordinadores del contratista de obra e interventoría. Al término del presente informe, no hubo novedad frente la visita realizada. 2. Se han realizado reuniones de seguimiento quincenales, en las cuales describe los avances de ejecución de obra desde el componente técnico, social, ambiental y de SST.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ	13/11/2024

A hoy el proyecto se encuentra contratado y en ejecución, con **0 alertas.**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301011070	Construcción DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE CENTROS POBLADOS EN LA ZONA DE CAJÓN Y TORRA DEL MUNICIPIO DE NOVITA Y LAS COMUNIDADES DE CHARCO LARGO - LA UNIÓN CHARCO HONDO Y BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL Chocó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

CONSTRUCCIÓN DE 54.6 km DE REDES DE MT Y 4.44 km DE REDES DE BT EN LOS CENTROS POBLADOS EN LA ZONA CAJÓN Y TORRA, DEL MUNICIPIO DE NOVITA Y LAS COMUNIDADES DE CHARCO LARGO - LA UNIÓN, CHARCO HONDO Y BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE SIPI, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ


Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
25/10/2021	31/12/2024	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 19.828.545.200	$ 19.828.545.200	No

** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados

En su ejecución física se tiene un 60,19 % y ejecución financiera 65,96% (Pendiente actualización a Octubre 2024)

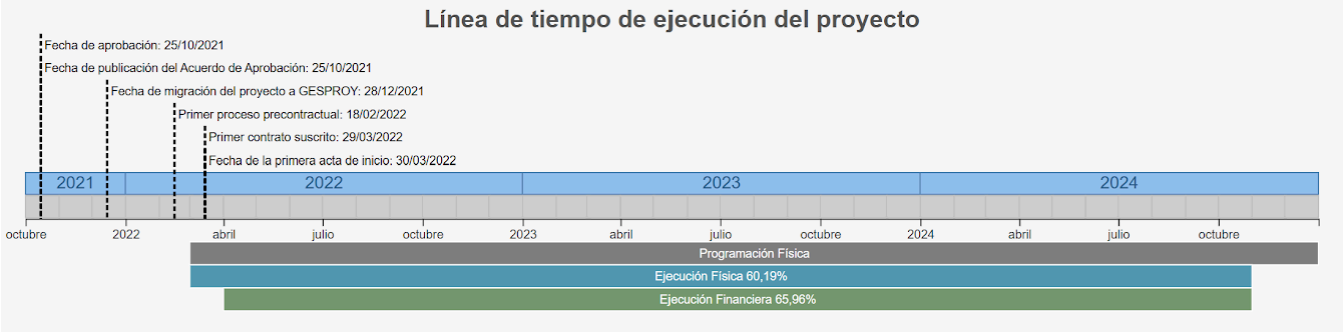

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EFICIENCIA - CURVA S (Pendiente actualización a Octubre 2024)


EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301011070	Construcción DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE CENTROS POBLADOS EN LA ZONA DE CAJÓN Y TORRA DEL MUNICIPIO DE NOVITA Y LAS COMUNIDADES DE CHARCO LARGO - LA UNIÓN CHARCO HONDO Y BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE SIPI DEPARTAMENTO DEL Chocó

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Línea	Periodos																															
	1 mar-22	2 abr-22	3 may-22	4 jun-22	5 jul-22	6 ago-22	7 sep-22	8 oct-22	9 nov-22	10 dic-22	11 ene-23	12 feb-23	13 mar-23	14 abr-23	15 may-23	16 jun-23	17 jul-23	18 ago-23	19 sep-23	20 oct-23	21 nov-23	22 dic-23	23 ene-24	24 feb-24	25 mar-24	26 abr-24	27 may-24	28 jun-24	29 jul-24	30 ago-24	31 sep-24	32 oct-24	33 nov-24	34 dic-24
* Valor Planeado (PV)	3	6	9	12	54	104	154	204	254	304	354	405	455	506	1573	2744	3848	4947	5530	6420	7311	8679	10017	11691	13375	15054	16746	17743	18770	19359	19575	19660	19744	19829
* Valor Ganado (EV)	3	6	9	12	54	104	154	204	254	304	354	405	455	506	1560	2716	3806	4891	5365	5832	6303	6850	7282	7783	8294	8784	9266	9644	10022	10889	11934			
* Costo Actual (AC)	3	6	9	12	54	104	154	204	254	305	355	405	455	506	1560	2717	3806	4892	5365	5832	6303	6851	7283	7784	8296	8786	9268	9646	10024	10894	11941			
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97	0,91	0,86	0,79	0,73	0,67	0,62	0,58	0,55	0,54	0,53	0,56	0,61			
Cumplimiento del costo (CPI)	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Retraso SV(t) Meses					0,07		0,10	0,07	0,10	0,07	0,10	0,10	0	0,10	0,07	0,10	0,10	0,13	0,37	0,70	1,20	1,60	2,13	2,77	3,37	4,03	4,67	5,43		6,63	7			

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,

Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 15:13
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 13 de noviembre de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su

sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 15:46
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Favor proceder con el cargue conforme a lo reportado por el supervisor

[El texto citado está oculto]

--

[El texto citado está oculto]

CARGUE GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010353 CAUCA NARIÑO - OCTUBRE 2024

2 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 14 de noviembre de 2024, 10:02
Para: Jorge Julian Quintero Polo <jquintero@dispac.com.co>
Cc: Andres Felipe Horta Rojas <ahorta@dispac.com.co>, Ulpiano Plaza Pastrana <ingulplapa@yahoo.com.ar>

Buenas tardes.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 20201301010353 - Cauca Nariño en la plataforma GESPROY.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Octubre de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Octubre de 2024** se carga la siguiente información de ejecución, así:


1. CARGUE DE EJECUCIÓN: No se presenta avance en la ejecución del proyecto, sin embargo, se cargan las siguientes observaciones a la ejecución:

	• Continúa la medida de protección – suspensión inmediata de pagos impuesta por el DNP. • Durante el mes de Octubre de 2024, se continua trabajando en el plan de trabajo a ser presentado al DNP con el propósito de lograr el levantamiento de la medida de suspensión. De igual forma, se avanza en la consolidación del otrosi n° 003 y acuerdo anexo al contrato. • Se radica el plan de trabajo, otrosi n° 003 y acuerdo anexo al contrato ante el DNP. • Se tenía como fecha de finalización de la programación el día 30 de Septiembre de 2024, sin embargo, a la fecha, esta no ha podido ser actualizada en el aplicativo ya que dependemos de la nueva programación que debe ser enviada por el contratista una vez se determine el alcance real del proyecto (N° de usuarios y veredas a intervenir).	FREDY HUMBERTO RODRIGUEZ HENAO	14/11/2024


A hoy el proyecto se encuentra contratado y ejecución, con **0 alertas** para DISPAC.



En su ejecución física se tiene un 1,55% y ejecución financiera un 1,55%.

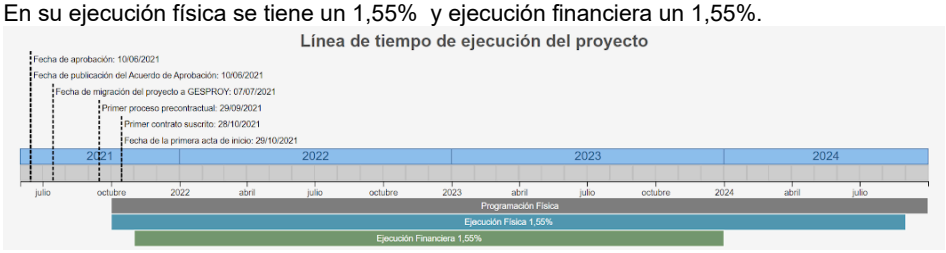

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA EFICIENCIA - CURVA S:

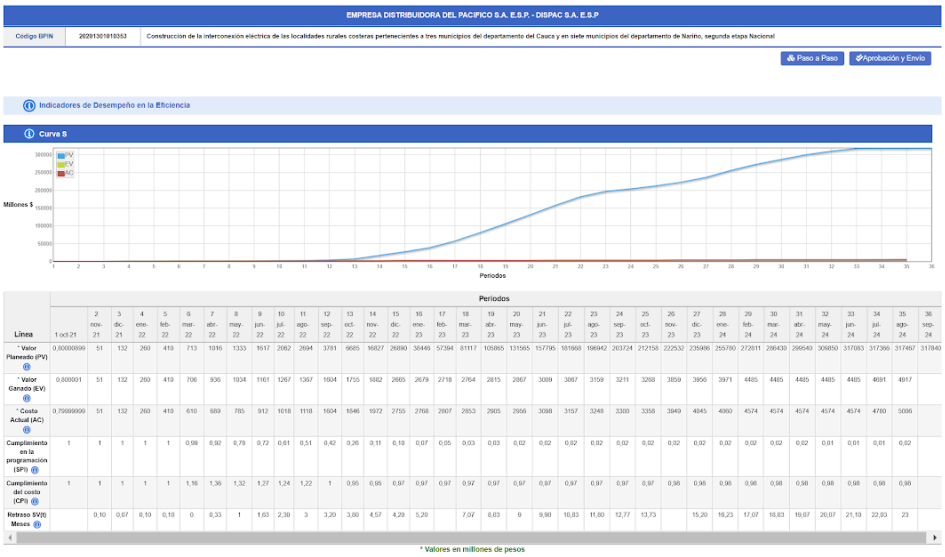

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,

Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Jorge Julian Quintero Polo <jquintero@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 17:51
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Andres Felipe Horta Rojas <ahorta@dispac.com.co>, Ulpiano Plaza Pastrana <ingulplapa@yahoo.com.ar>

ok

Cordialmente,

JORGE QUINTERO POLO
Gerente General (E)
jquintero@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 2021005940004 - BARRANCOMINAS - OCTUBRE 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 14 de noviembre de 2024, 9:42
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenos días.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 2021005940004 - Barrancominas, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día de ayer.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Octubre de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se carga la información de la liquidación de interventoría, llevándola al 10% de ejecución.

Actividad MGA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	1.1.1 INTERVENTORIA DE OBRA	und	4.91	100	No		Inicial																											
							Prog	1	401.486.520	401.486.520	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05				
							Eje	1	395.990.619,89	395.990.619,89	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05				
2	1.1.2 LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORIA	und	.55	0	No		Inicial																											
							Prog	1	44.609.613	44.609.613																					0,25	0,25	0,25	0,25
							Eje	0,1	44.609.610	4.460.961																								0,1

Se carga la siguiente información como observación al avance de ejecución, así:

1. Se suscribió el acta de energización y recepción técnica del contrato de obra DG-126-2022 mediante la cual se entrega y el Operador de Red recibe la infraestructura construida en lo siguientes términos: "(…) Se considera recibido a satisfacción por parte del operador de red EMELCE SA ESP. Dejando constancia que la operación del sistema de generación es óptima, confiable y constante por el periodo de 24 horas diarias sin ninguna salvedad. " 2. Se realizó reunión con participación de IPSE, Gobernación del Guainía, contratista de obra, interventoría y DISPAC, en la cual se presentó y evalúo el presupuesto final ejecutado del contrato interadministrativo IPSE 132 de 2021, y de igual forma, se revisó las observaciones presentadas por IPSE en la verificación en campo de la infraestructura. 3. Conforme a lo anterior, el proyecto se encuentra finalizado al 100%, y al término del presente informe se encuentra en recopilación de la documentación final, así como la suscripción del acta de recibo y entrega de infraestructura con el Operador de Red. 4. De igual manera, se encuentra en trámite de proyección el acta de recibo y entrega de infraestructura. 5. Se realizó reunión virtual con IPSE y Gobernación del Guainía, sobre el avance de ejecución del contrato interadministrativo.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ	13/11/2024	

A hoy el proyecto se encuentra contratado y en ejecución, con 0 alertas.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	2021005940004	Instalación del sistema de generación híbrido solar - almacenamiento - diesel - Barrancominas - Guainía

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance

Realizar la construcción de un campo generador constituido por 728 módulos fotovoltaicos, Instalación de dos (2) inversores de 175 kW nuevos, se incorporarán al sistema los 6 inversores existentes de 20 KW _SMA a la barra del tablero T_2 de salida, tres (3) plantas Diésel de potencia en uso continuo, una (1) G1 de 350 KW y dos (2) G_2 y G_3 de 175 KW a 440 V

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
10/09/2021	31/10/2024	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 8.176.898.568	$ 4.000.255.649	No


** Cifras en pesos*

Indicadores Principales de Producto | TERMINAR | Histórico Estados

En su ejecución física se tiene un 99,455% y ejecución financiera de 90,72% (Pendiente sincronización a mes de Octubre 2024)



Indicadores de desempeño de la eficiencia - curva S (Pendiente sincronización a mes de Octubre 2024)

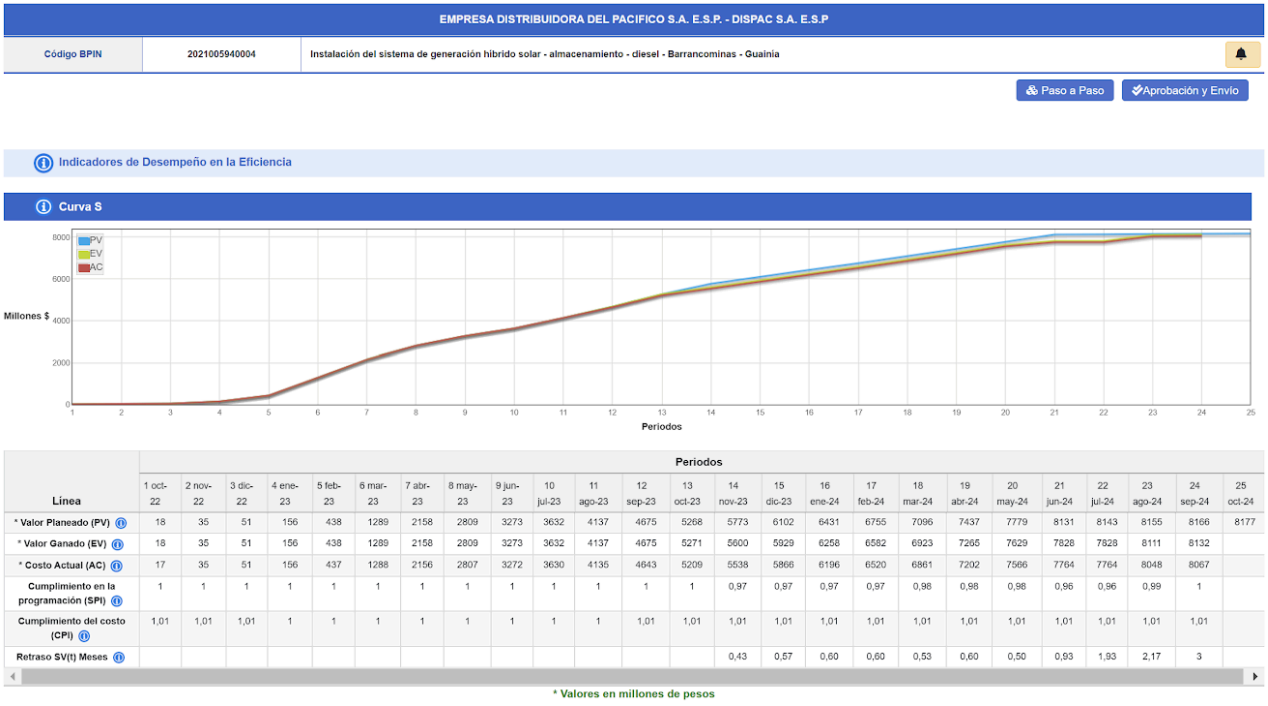

Línea	Periodos																							
	1 oct-22	2 nov-22	3 dic-22	4 ene-23	5 feb-23	6 mar-23	7 abr-23	8 may-23	9 jun-23	10 jul-23	11 ago-23	12 sep-23	13 oct-23	14 nov-23	15 dic-23	16 ene-24	17 feb-24	18 mar-24	19 abr-24	20 may-24	21 jun-24	22 jul-24	23 ago-24	24 sep-24	25 oct-24
* Valor Planeado (PV)	18	35	51	156	438	1289	2158	2809	3273	3632	4137	4675	5268	5773	6102	6431	6755	7096	7437	7779	8131	8143	8155	8166	8177
* Valor Ganado (EV)	18	35	51	156	438	1289	2158	2809	3273	3632	4137	4675	5271	5600	5929	6258	6582	6923	7265	7629	7828	7828	8111	8132	
* Costo Actual (AC)	17	35	51	156	437	1288	2156	2807	3272	3630	4135	4643	5209	5538	5866	6196	6520	6861	7202	7566	7764	7764	8048	8067	
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,96	0,96	0,99	1	
Cumplimiento del costo (CPI)	1,01	1,01	1,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	
Retraso SV(t) Meses														0,43	0,57	0,60	0,60	0,53	0,60	0,50	0,93	1,93	2,17	3	

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco tu colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

--

Cordialmente,

Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 11:30
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 13 de noviembre de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 11:32
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

proceder con el cargue conforme a lo reportado por el supervisor
[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACIÓN INFORMACIÓN GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010558 - CARMEN DE BOLIVAR - OCTUBRE 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 14 de noviembre de 2024, 0:00
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenas noches.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN 20201301010558 - Carmen de Bolívar en la plataforma GESPROY.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Octubre 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Octubre 2024**, se carga la siguiente información como observaciones a la ejecución:

• A la fecha, continua la medida de suspensión de giros impuesta por el DNP, por cuanto, aún se tiene pendiente el último pago a la Interventoría, ocasionando que el proyecto no pueda cumplir con la totalidad de requisitos de cierre.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ	13/11/2024	

A hoy, el proyecto se encuentra terminado, con **1 alerta asociada al cierre del proyecto.**

Alertas para el proyecto 20201301010558

Código	Descripción	Detalles	Valor	Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24	Proyecto terminado sin cerrar.	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 329	$329			6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 11:18
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 13 de noviembre de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez

Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 11:31
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

favor proceder con el cargue conforme a lo reportado por el supervisor

[El texto citado está oculto]

--

[El texto citado está oculto]

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 2021002440035 - GUAJIRA FASE 2 - OCTUBRE 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 13 de noviembre de 2024, 23:05
Para: Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Juan, buenas noches.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **2021002440035** - Guajira Fase 2, en la plataforma GESPROY, conforme a lo revisado en la reunión del día de hoy.
Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Octubre de 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para los meses de **Octubre de 2024,** se carga la siguiente información de ejecución, así:

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se carga el valor correspondiente a los procesos de liquidación de obra e interventoría,llevando ambos procesos a un 70% de ejecución, así:

Producto MGA: Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas (Producto principal del proyecto)

Actividad MGA: Apoyo a la supervisión

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	1.7.1 Apoyo a a la supervisión	und	2.47	100	No	Inicial				0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05														
						Prog	1	218.336.411	218.336.411	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03					
						Eje	1	220.328.954	220.328.954	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03					
2	1.7.2 Procesos de contratación obra e interventoría	und	0	100	No	Inicial				0,25	0,25	0,25	0,25																																
						Prog	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25																																
						Eje	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25																																
3	1.7.3 Ajuste presupuestal Gobernación guajira	und	0	100	No	Inicial							0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16																										
						Prog	1	1	1				0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16																										
						Eje	1	1	1				0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16																										
4	1.7.4 Procesos de contratación obra 2	und	0	100	No	Inicial													0,33	0,33	0,34																								
						Prog	1	1	1										0,33	0,33	0,34																								
						Eje	1	1	1										0,33	0,33	0,34																								
5	1.7.5 Procesos de contratación obra 3	und	0	100	No	Inicial															0,33	0,33	0,34																						
						Prog	1	1	1												0,33	0,33	0,34																						
						Eje	1	1	1												0,33	0,33	0,34																						
6	1.7.6 Proceso de liquidación obra e interventoría	und	.27	60	No	Inicial																																						
						Prog	1	24.259.601	24.259.601																																		0,25	0,25	0,25	0,25	
						Eje	0,7	6.931.317,14	4.851.922																																0,25		0,25	0,1	0,1

Actividad MGA: Interventoría integral

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	1.5.1 Interventoría Integral	und	4.16	100	No	Inicial																	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1														
						Prog	1	367.310.229	367.310.229															0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06					
						Eje	1	392.792.381	392.792.381															0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06					
2	1.5.2 Proceso de liquidación	und	1.04	60	No	Inicial																																						
						Prog	1	91.827.557	91.827.557																																		0,25	0,25	0,25	0,25	
						Eje	0,7	91.827.557,14	64.279.290																																0,25		0,25	0,1	0,1

Se reporta la siguiente información como observaciones a la ejecución:

1. Se dio respuesta a oficio de la Contraloría General de la República mediante el cual solicita se aclare la interconexión eléctrica del proyecto de Fase I al sistema interconectado nacional. En dicha respuesta se puede aclarar que DISPAC conforme a sus obligaciones contractuales cumplió con las actividades y responsabilidades establecidas en el contrato interadministrativo IPSE 124 de 2020. 2. Se realizó visita de verificación de ejecución de obra por parte del Departamento Nacional de Planeación al proyecto de interconexión Puerto Bolívar – Cabo de la Vela en su Fase II. 3. Según información por parte de la Gobernación de la Guajira no se suscribirá el acta de recibo y entrega de infraestructura, toda vez, que, según reporte jurídico, ellos no pueden asumir la responsabilidad de las labores de AOM de la infraestructura de Fase II. En tal sentido, se está evaluando al interior de DISPAC en conjunto con el área jurídica, la posibilidad de analizar otro prestador del servicio en virtud de lo establecido en los diseños iniciales (Estructuración del proyecto). 4. Se realizó reunión virtual con IPSE, sobre el avance de ejecución del contrato interadministrativo.	JUAN CAMILO GOMEZ SANCHEZ	13/11/2024	

A hoy, el proyecto se encuentra contratado en ejecución, con **0 alertas.**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P		
Código BPIN	2021002440035	Construcción de infraestructura eléctrica para las comunidades entre Puerto Bolívar y Cabo de la Vela Etapa 2 en el municipio de Uribia departamento de La Guajira

Paso a Paso | Aprobación y Envío


Alcance

Construcción de redes de 86 km de redes de media y baja tensión para 40 comunidades, ubicadas entre Puerto Bolívar y Cabo de la Vela, etapa 2, en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira para beneficiar 814 usuarios.


Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
03/06/2021	28/09/2024	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 8.827.466.301	$ 7.409.627.730	No

** Cifras en pesos*

En su ejecución física se tiene un 99,47% y ejecución financiera 76,31% **(Pendiente actualización con corte a Octubre 2024)**

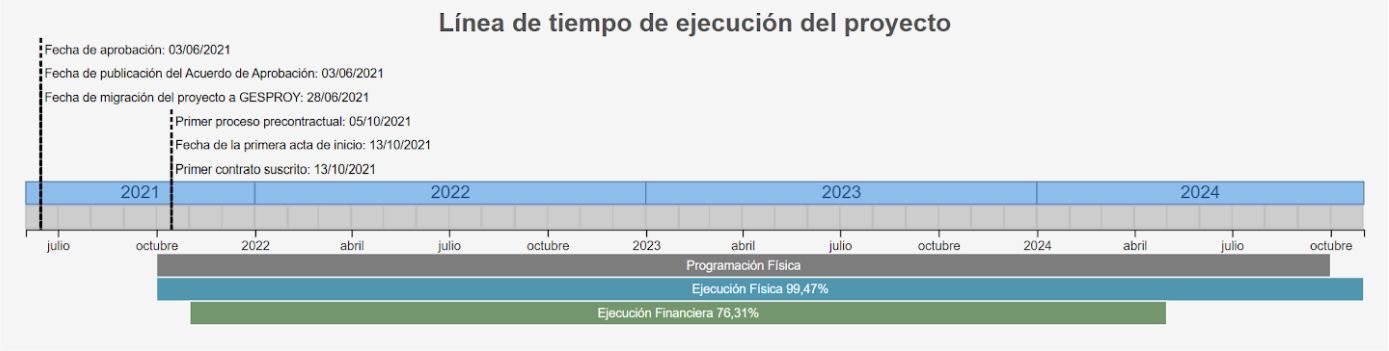

Indicadores de desempeño de la eficiencia - curva S (Pendiente actualización con corte a Octubre 2024)

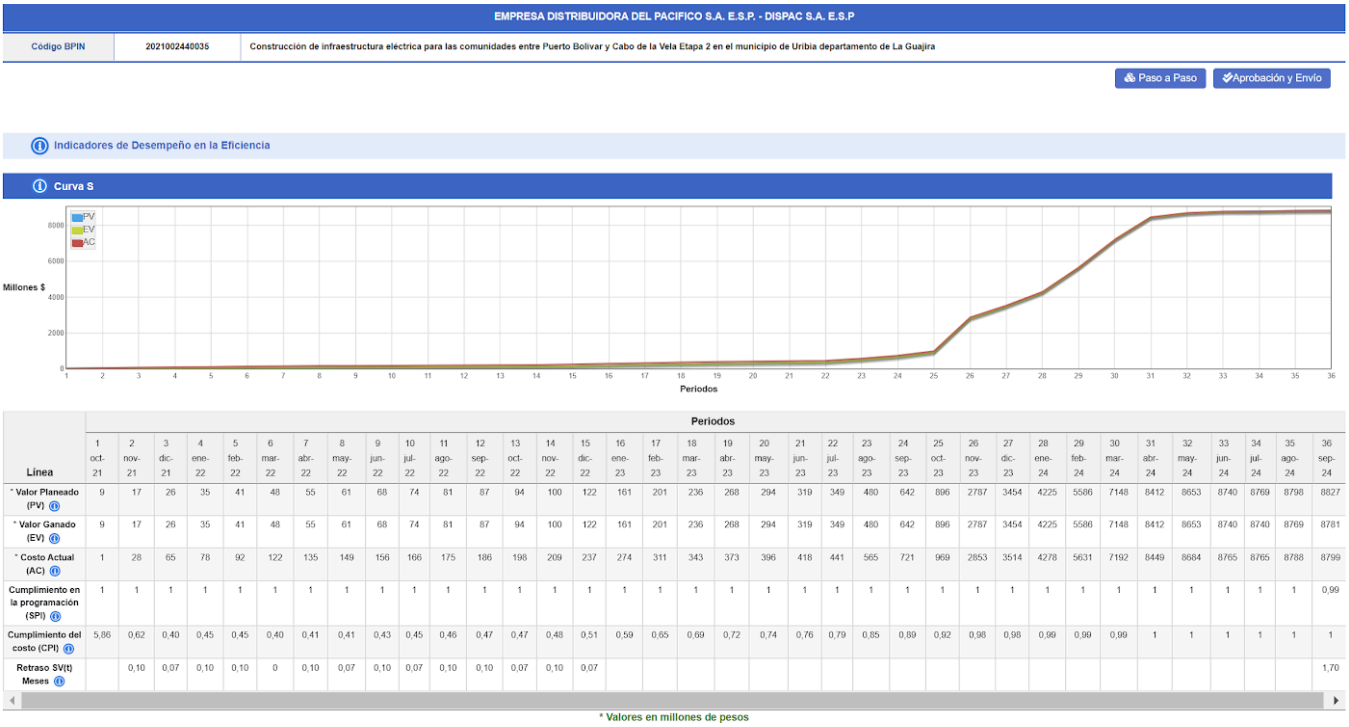

Línea	Periodos																																		
	1 oct-21	2 nov-21	3 dic-21	4 ene-22	5 feb-22	6 mar-22	7 abr-22	8 may-22	9 jun-22	10 jul-22	11 ago-22	12 sep-22	13 oct-22	14 nov-22	15 dic-22	16 ene-23	17 feb-23	18 mar-23	19 abr-23	20 may-23	21 jun-23	22 jul-23	23 ago-23	24 sep-23	25 oct-23	26 nov-23	27 dic-23	28 ene-24	29 feb-24	30 mar-24	31 abr-24	32 may-24	33 jun-24	34 jul-24	35 ago-24	36 sep-24
* Valor Planeado (PV)	9	17	26	35	41	48	55	61	68	74	81	87	94	100	122	161	201	236	268	294	319	349	480	642	896	2787	3454	4225	5586	7148	8412	8653	8740	8769	8798	8827
* Valor Ganado (EV)	9	17	26	35	41	48	55	61	68	74	81	87	94	100	122	161	201	236	268	294	319	349	480	642	896	2787	3454	4225	5586	7148	8412	8653	8740	8740	8769	8781
* Costo Actual (AC)	1	28	65	78	92	122	135	149	156	166	175	186	198	209	237	274	311	343	373	396	418	441	565	721	969	2853	3514	4278	5631	7192	8449	8684	8765	8765	8788	8799
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,99
Cumplimiento del costo (CPI)	5,86	0,62	0,40	0,45	0,45	0,40	0,41	0,41	0,43	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48	0,51	0,59	0,65	0,69	0,72	0,74	0,76	0,79	0,85	0,89	0,92	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	1	1	1	1	1	1
Retraso SV(t) Meses		0,10	0,07	0,10	0,10	0	0,10	0,07	0,10	0,07	0,10	0,10	0,07	0,10	0,07																					1,70

** Valores en millones de pesos*

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR

Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

Juan Camilo Gómez Sánchez <jgomez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 11:08
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Cordial saludo Vanessa,

Se aprueba el cargue del reporte, conforme a lo descrito previamente por esta supervisión en reunión realizada el día 13 de noviembre de los corrientes.

Agradeciendo su colaboración.

Juan Camilo Gómez Sánchez
Supervisor del proyecto

Cordialmente,

JUAN CAMILO GÓMEZ SÁNCHEZ
CONTRATISTA PROYECTOS
contratacion@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 11:10
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

Proceder con el cargue conforme a lo reportado por la supervision
[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

Gmail GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301010463 - SIMITI - OCTUBRE 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 13 de noviembre de 2024, 22:43
Para: jose leon <dispac.joseleon@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Jose, buenas noches.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301010463- Simití**, en la plataforma GESPROY.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Octubre 2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Octubre 2024**, se carga la siguiente información de ejecución, así:

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: No se genera cargue de ejecución teniendo en cuenta la suspensión, sin embargo, **se cargan las siguientes observaciones al avance de ejecución.**

* Persiste la medida de suspensión de giros del proyecto, impuesta por el DNP, nos encontramos a la espera de respuesta por parte del DNP para dar continuidad al proceso. * Se realiza prorroga a la suspensión N° 3 del contrato de obra, DG-098-2022, hasta el 19 de Diciembre de 2024, lo anterior, debido a las situaciones presentadas por la interventoría.	JOSE HERNANDO LEÓN GÓMEZ	13/11/2024	

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--
Cordialmente,
Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

---

jose leon <dispac.joseleon@gmail.com> 15 de noviembre de 2024, 14:18
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Buena tarde Vanessa, la información suministrada está acorde al estado del proyecto, por favor continuar con el proceso.

Gracias.

Att;

JLEON

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 15:47
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

favor proceder con el cargue conforme a lo reportado por el supervisor
[El texto citado está oculto]
--
Cordialmente,

MELISSA RODRÍGUEZ CHADID
CONTRATISTA PROYECTOS
mrodriguez@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones, conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

MIGRACION INFORMACION GESPROY PROYECTO BPIN 20201301011744 - CIENAGA - OCTUBRE 2024

3 mensajes

GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com> 13 de noviembre de 2024, 21:57
Para: jose leon <dispac.joseleon@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Melissa, Jose, buenas noches.

De manera atenta me permito informar que se realizó la actualización de la información del proyecto BPIN **20201301011744 - Ciénaga**, en la plataforma GESPROY.

Por lo anterior **se solicita que se realice la autorización del envío con corte a mes de Octubre/2024 por parte de ustedes y proceder con la aprobación y envío en la plataforma GESPROY.**

Para el mes de **Octubre/2024**, se carga la siguiente información de ejecución, de acuerdo a lo conversado el día de hoy.

1. CARGUE DE EJECUCIÓN: Se continúa el cargue de la actividad "ETAPA DE LIQUIDACIÓN", por lo anterior, la ejecución de esta actividad queda al 97%, así:

Actividad MGA: Realizar la interventoria.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	2022 11	2022 12	2023 01	2023 02	2023 03	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	2024 04	2024 05	2024 06	2024 07	2024 08	2024 09	2024 10
1	3.2.1 Interventoria general del proyecto	und	3.34	100	No		Inicial						0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12																			
							Prog	1	176.957.272	176.957.272				0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12																			
							Eje	1	176.957.272	176.957.272				0,011	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,099																		
2	3.2.2 Etapa de liquidación	und	.59	97	No		Inicial														0,33	0,33	0,34																		
							Prog	1	31.227.754	31.227.754											0,33	0,33	0,34																		
							Eje	0,98	31.227.748,98	30.603.194													0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,01	0,01

De igual forma, se reporta en las observaciones a la ejecución, la siguiente información:

	- Por parte del contratista de obra, se avanza en el cumplimiento de requisitos para la liquidación del proyecto, a la fecha se está revisando el acta de imprevistos del contratista.	JOSE HERNANDO LEÓN GÓMEZ	13/11/2024

A hoy el proyecto se encuentra contratado en ejecución, con **0 alertas.**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. - DISPAC S.A. E.S.P

Código BPIN	20201301011744	Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural de Ciénaga Magdalena

Paso a Paso | Aprobación y Envío


Alcance
Construcción, suministro e instalación de 172 sistemas de energía solar fotovoltaica en 11 veredas de la zona rural de Cienaga, Magdalena.

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
20/09/2021	22/05/2023	CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total	Valor SGR	Aprobado directamente
$ 5.303.286.143	$ 3.450.586.837	No

** Cifras en pesos*


En su ejecución física se tiene un 99,98% y ejecución financiera 93,96%. Pendiente actualización a Octubre 2024

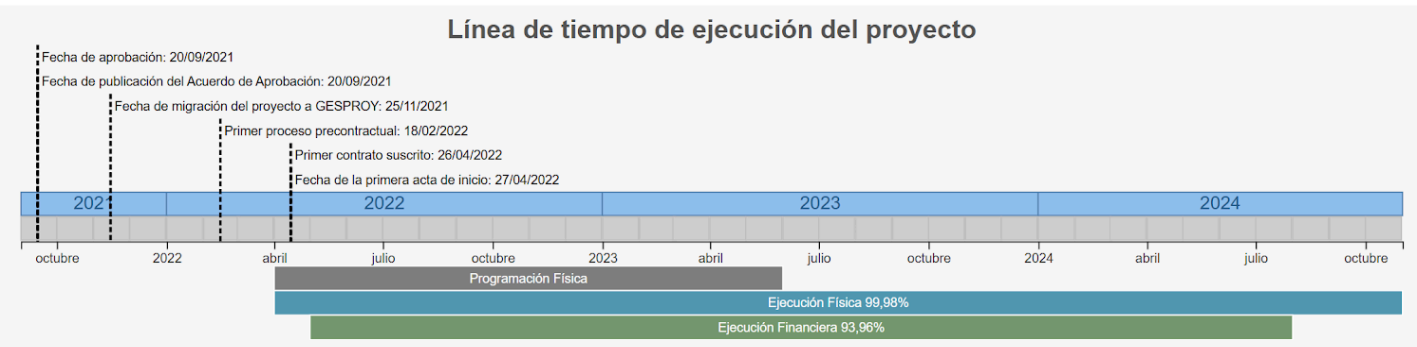

Desempeño del proyecto - Curva S - Pendiente actualización a Octubre 2024

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S



Línea	Periodos																												
	1 abr-22	2 may-22	3 jun-22	4 jul-22	5 ago-22	6 sep-22	7 oct-22	8 nov-22	9 dic-22	10 ene-23	11 feb-23	12 mar-23	13 abr-23	14 may-23	15 jun-23	16 jul-23	17 ago-23	18 sep-23	19 oct-23	20 nov-23	21 dic-23	22 ene-24	23 feb-24	24 mar-24	25 abr-24	26 may-24	27 jun-24	28 jul-24	29 ago-24	30 sep-24
* Valor Planeado (PV)	20	40	59	84	122	296	655	1114	1682	2288	2873	3409	4870	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303	5303
* Valor Ganado (EV)	20	40	59	66	90	137	161	218	342	528	1286	2489	4850	5274	5276	5278	5280	5281	5283	5285	5287	5289	5291	5293	5295	5296	5298	5300	5302	5302
* Costo Actual (AC)	17	38	58	65	90	137	161	217	342	524	1279	2478	4835	5260	5262	5264	5265	5267	5269	5271	5273	5275	5277	5279	5280	5282	5284	5286	5288	5288
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	0,79	0,74	0,46	0,25	0,20	0,20	0,23	0,45	0,73	1	0,99	0,99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cumplimiento del costo (CPI)	1,15	1,05	1,02	1,01	1,01	1	1	1	1	1,01	1,01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retraso SV(t) Meses		0,07	0,10	0,77	0,90	1	1,87	2,57	2,97	3,47	2,80	1,67	0,10	0,13	1,13	2,13	3,17	4,20	5,20	6,23	7,23	8,23	9,27	10,23	11,27	12,27	13,30	14,30	15,33	16,37

* Valores en millones de pesos

De antemano agradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta para aprobar y enviar la información del proyecto en la plataforma.

--

Cordialmente,

Ing. Vanessa Pinzón Ramírez
Contratista Apoyo aplicativos SGR
Magister en Gerencia de Proyectos
(+57) 320 418 0576
Bogotá, Colombia.

---

jose leon <dispac.joseleon@gmail.com> 15 de noviembre de 2024, 14:17
Para: GESPROY DISPAC <gesproy.dispac@gmail.com>
Cc: Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co>

Buena tarde Vanessa, de mi parte la info suministrada está bien. por favor proceder.

Att;

JLEON

[El texto citado está oculto]

Melissa Maria Rodríguez Chadid <mrodriguez@dispac.com.co> 15 de noviembre de 2024, 15:47
Para: Vanessa Pinzón <gesproy.dispac@gmail.com>

favor proceder con el cargue conforme a lo reportado por el supervisor

[El texto citado está oculto]

--

Cordialmente,

MELISSA RODRÍGUEZ CHADID
CONTRATISTA PROYECTOS
mrodriguez@dispac.com.co
(1) 467 2203 – 467 2204
Av. Calle 26 No 69 D 91 Torre 1 oficina 804
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP
dispac

Este correo y sus anexos pueden ser confidenciales y estar protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de el (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema. No debe copiar, ni distribuir este correo o sus anexos, ni usarlos para propósito alguno ni dar a conocer su contenido a persona alguna. Las opiniones,

conclusiones y otra información contenida en este correo no relacionadas con el negocio oficial de DISPAC, deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por la Compañía.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14886479644

(415)7707212489984(8020) 000001488647964 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 3 9 4 2 1 7 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 3 9 4 2 1 7 6	2 0 1 3 0 5 1 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PINZON	RAMIREZ	KAREEN	VANESSA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 27 49 07 AP 401

42. Correo electrónico: Vanessapinzonr@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 0 7 5 6 8	3 2 0 4 1 8 0 5 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 7 0 4 2 8	4 3 9 0	2 0 1 7 0 4 2 8			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 05 / 00 : 34: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PINZON RAMIREZ KAREEN VANESSA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023942176		PINZON RAMIREZ KAREEN VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 27 # 49 - 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1039842276	9477173376	I	2024/12/18	2024/11/12	BANCOLOMBIA	0	$818,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1023942176	PINZON KAREEN	25-14	30	$2,820,000	$451,200	EPS005	30	$2,820,000	$352,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,820,000	$14,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,820,000**	**$451,200**			**$2,820,000**	**$352,500**			**$0**	**$0**			**$2,820,000**	**$14,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$451,200	$0	$0	$451,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$451,200	$0	$0	$451,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,800	$0	$0	$14,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,800	$0	$0	$14,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$352,500	$0	$0	$352,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$352,500	$0	$0	$352,500
TOTAL				1	$818,500	$0	$0	$818,500

2024/12/02 05:53 PM

DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
NIT. 818.001.629-4

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5100003039

DATOS GENERALES

Fecha del documento:	14.05.2024		
Fecha de contabilización:	14.05.2024		
Creado por:	MAGUIRRE	Modificado por:	TBENITEZ
Creado el	14.05.2024	Ultima modificación:	15.05.2024

DATOS ADICIONALES

Objeto:	AMP.SERV.ASES.TECN.ADMIN.INFORM.PROY,SGR,GESPROY	Total :	49.000.000

POSICIÓN DE DOCUMENTO 001

Objeto:	VANESSA.PINZON.PREST.SERV.ASES.TEC.ADM.SGR.GESPROY		
Acreedor:	1023942176 - KAREEN VANESSA PINZO	Fecha de vencimiento:	31.12.2024
CDP No.:	3100002239 / 001		
Pos. presup.:	B05010100100701 -	Centro gestor:	CG10 - GER.GENERAL DISPAC
Fondos:	2024 - FONDO GENERAL	Prog. presupuestal:	C1000 - Gastos FUN, OC ,DEU
Importe:	49.000.000 pesos	Area funcional:	

Se expide a los 14 días del mes de mayo del año 2024.

Contabilizado presupuesto: TANIA AMARUC BENITEZ RODRÍGUEZ

	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	Código	F40-41-12
dispac La energía del Chocó		Versión	01
		Fecha	4/09/2020

CIUDAD			
FECHA DE OPERACIÓN	Día	Mes	Año

N°: DSB -

Autorizado del prefijo DSB 2001 al 3000, Vigencia 12 meses según Res. DIAN 18764017774450 del 08/09/2021

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
NIT: 818.001.629 - 4
Carrera 7 N° 24-76 Quibdó - Chocó
AV. Calle 26 N° 69D 91 Torre 1 of. 804 Bogotá D.C.
Teléfonos: (4) 6726172 - (1) 4672205

NOMBRE DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO: **KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ**

NIT/CC: **1023942176** **E-MAIL:** vanessapinzonr@gmail.com

DIRECCIÓN: **Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife T. Peatonal, Of. 804**

TELÉFONO: **467 2203 - 467 2204 - 467 2205** **CELULAR:** **3204180576**

DOCUMENTO SOPORTE PARA LA PROCEDENCIA DE COSTOS, DEDUCCIONES E IMPUESTOS DESCONTABLE en Compras de Bienes o Servicios a **Persona Natural,** no comerciantes o no responsables de IVA. según resolucion DIAN 0042 de 2020, artículo 771-2 del Estatuto Tributario, y los artículos 1.6.1.4.12. y 1.6.1.4.13. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Contrato DG-070-2024, relacionado con la Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica y administrativa en el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR a cargo de DISPAC a través de la plataforma GESPROY." por el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2024.	$ 7.000.000	$ 7.000.000
VALOR EN LETRAS:	**SIETE MILLONES DE PESOS MCTE**		

KAREEN VANESSA PINZÓN RAMÍREZ

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL VENDEDOR

ELABORADO POR

Declaro bajo la gravedad del juramento que no estoy obligado a expedir factura de venta y/o documento equivalente y no soy responsable de IVA
