TABLA DE CONTENIDO

Informe de calidad No. 5	423
Anexo A. Actividades del periodo	444
Anexo B. Control de actividades	449
a. Actas de entrega Parques	450
a.a. Puesta en servicio Villas del Madrigal	450
b. Ingreso de materiales	455
c. Instalación de materiales	460
Anexo C. Actas de comité	483
Anexo E. Control de documentos	500
Anexo F. Compras	503
a. Villas del Madrigal	504
b. Villa de los Sauces	508
c. Florencia Tronquitos	511
d. Normandia	514
e. Marsella	519
f. Lombardia	523
g. Hayuelos F8	527
h. Hayuelos F5	531
i. Gaitana	535
j. La Europa	538
k. Carmelo	542
l. Cafam Suba los Gavilanes	546
m. Alqueria	549
n. Campos Naturales	552
Anexo G. Certificados de calidad	555
a. Villas del Madrigal	556
b. Villa de los Sauces	578
c. Florencia Tronquitos	586
d. Normandia	608
e. Marsella	630
f. Lombardia	650
g. Hayuelos F8	668
h. Hayuelos F5	683
i. Gaitana	701
j. La Europa	702
k. Carmelo	724
l. Cafam Suba los Gavilanes	739
m. Pijaos	742
n. Campos naturales	785
o. Control de materiales con certificados de conformidad	788
Anexo H. Inspección y ensayos	791
Anexo I. Medición	803
Anexo J. Salidas no conformes	825
Anexo K. Auditoria	852

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2025.05.15 17:10:10 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

1. INFORME COMPONENTE DE CALIDAD No. 5 – MARZO 2025

INFORME DE CALIDAD Nro. 5

CONSORCIO INNOVAPARQUES

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

OBRA PUBLICA 4041 DE 2024 CON EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD DE BOGOTA

Bogotá D.C., abril de 2025

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ:
Fecha: 21/04/2025	Fecha: 28/04/2025	Fecha: 28/04/2025
Nombre: Ing. John Jairo Marín López Ing. QA-QC	Nombre: Ing. Brayan Stivens García Ing. Residente.	Nombre: Ing. Javier Linares Director de Obra

VERSIÓN NO.	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	7/04/2025	Se elabora el Documento
2	21/04/2025	Ajustes al documento con base a observaciones de la interventoría.

TABLA DE CONTENIDO

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 5
2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 5
3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO 6
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO 7
5. Seguimiento al cumplimiento de plan de calidad 8
5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto 8
6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 8
6.1 Actas de Comité 8
6.2 Correspondencia 9
Correspondencia enviada 9
6.3 Correspondencia recibida 10
6.4 Bitácora. 10
7. Seguimiento de la información documentada 11
8. PLAN DE ADQUISICIONES 11
9. INFRAESRUCTURA Y PRESERVACION 13
10. Control de calidad de materiales 14
10.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor .. 15
10.2 Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto 16
11. Control y seguimiento de los Equipos de Inspección, medición y ensayo 17
12. CONTROL DE LA GESTION 18
12.1 Control de Cambios 18
12.2 Salidas no conformes 18
13. Auditorías internas 19
14. Listado de Anexos 20

426

LISTADO DE TABLAS

Tabla Nro. 1 Estado del contrato 5
Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físicc y en tiempo 6
Tabla Nro. 3 Personal del contrato 7
Tabla Nro. 4 Correspondencia enviada 9
Tabla Nro. 5 Correspondencia recibida 10
Tabla Nro. 6 Tabla de adquisiciones 11
Tabla Nro. 7 Materiales certificados por proveedor 15
Tabla Nro. 8 Materiales controlados por inspección y ensayos 16
Tabla Nro.9 Equipos de medición utilizados en la ejecución del contrato 17
Tabla Nro.10 Consolidado de control de cambios 18
Tabla Nro. 11 Consolidado de salidas no conformes 19
Tabla Nro. 12 Consolidado de Auditorías realizadas 19

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Des compactación con equipos/ Campo Marsella 13
Ilustración 2. Fertilización con equipos-Campo Marsella 13
Ilustración 3. Corte de Césped con equipos - Alquería. 13
Ilustración 4. TOP DRESSSING con equipos – Villa de los Sauces 13
Ilustración 5. Corte – Parque Country 14
Ilustración 6. Normandía – Mto área Perimetral con Andamio. 14
Ilustración 7. Pegue de Grama - Normandía 14
Ilustración 8. Rotovo – Ciudad Montes 14

424

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

El contrato formalizado con el Instituto Distrital De Recreación y Deporte corresponde a la siguiente información:

Tabla Nro. 1 Estado del contrato

CONTRATO DE OBRA IDRD No.	*4041 - 2024*
CONTRATISTA	*CONSORCIO INNOVAPARQUES*
OBJETO	*"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".* *Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	***GRUPO 1. CAMPOS DEPORTIVOS.*** *Las obras por ejecutar se realizarán en los campos deportivos administrados por el IDRD en grama natural, sintética y de arena, los cuales se encuentran en un listado preliminar, sin perjuicio del ingreso de nuevos campos deportivos a cargo del IDRD, los cuales podrán ser sujeto de intervención conforme a las necesidades del Instituto, definidos en los comités de obra.*
FECHA DE INICIO	*Noviembre 20 de 2024*
FECHA FINAL INICIAL	*Julio 19 de 2025*
PLAZO INICIAL	*8 meses*
VALOR DE CONTRATO	*$ 5.200.000.000,00*
INTERVENTORÍA	*CONSORCIO SANTA TERESA 28*
SUPERVISOR	*RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO*

2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Durante la ejecución del contrato se realizó el seguimiento al porcentaje de avance que se fue presentando de acuerdo con el desarrollo y condiciones particulares detectadas, el cual fue reportado como parte del informe 5. El desempeño generado de los indicadores del contrato para el cierre de este son los siguientes:

- Avance físico y en tiempo:

Tabla Nro. 2 Ejecución de indicadores Avance físico y en tiempo

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	RESULTADOS	FRECUENCIA	META	EJECUTADO Periodo 5
Porcentaje de avance en el tiempo	Nro. De Meses de Ejecución Acumulado x 100 / Meses de ejecución contractual.	4.33 / 8 x 100 = **54.125%**	Mensual	100% en el tiempo de ejecución del proyecto	Del 100% del plazo de ejecución del proyecto, se lleva un **54.12** % de tiempo utilizado.
Porcentaje de avance Financiero	Valor ejecutado en el periodox100 / Valor total del Contrato	635.487.153x 100= **12.2** % / 5.200.000.000	Mensual	100% del presupuesto	Del 100% del presupuesto en el periodo se ejecutó un **12.2%** y un acumulado del **67.00%** **sobre el valor total del contrato**
Porcentaje de Avance Físico	Nro. De actividades ejecutadas acumulado periodo x100 / Nro. De actividades planeadas periodo.	21 / 21 x 100= 100%	Mensual	100% de las actividades de la programación	Del 100 % de las actividades planeadas en el periodo se ejecutó el **100%**.
Entrega de Productos	#Entrega de productos presentados aprobados /#Productos presentados) *100%	32 / 49 x 100= 65%	Inicio del Proyecto y mensualmente	Aprobación del 100% de los productos entregados.	De 49 productos proyectados para aprobación en el contrato se han aprobado el **65.%**. A corte de marzo de 2025

Nota: El indicador de entrega de productos, tiene como base 13 planes iniciales entregados y aprobados. Para cada periodo va sumando 4 informes que corresponden al técnico, calidad, SST y ambiental. Los datos serán con base a las aprobaciones del informe anterior. De noviembre de 2024 a julio de 2025 se tienen proyectado entregar 49 productos

3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO

Durante la ejecución del contrato, el Consorcio INNOVAPARQUES dio cumplimiento con el personal mínimo requerido en los requisitos contractuales obteniendo de las respectivas aprobaciones para el área de calidad del contrato por parte de la interventoría. No se registra novedades de personal en el periodo.

A continuación, se relaciona el personal contractual de obra que estuvo durante el periodo, el cual contó con la respectiva aprobación por parte de la interventoría:

Tabla Nro. 3 Personal del contrato

No.	DATOS DEL PROFESIONAL CONTRACTUAL						APROBACION INTERVENTORIA
	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	PROFESION	DEDICACION	CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA PARA APROBACION	
1	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	1.013.623.379	DIRECTOR DE OBRA	Ing. Civil	22.4%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
2	JAVIER GUTIERREZ PINEDA	79.455.166	AGRONOMO	Ing. Agrónomo	60%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
3	ANDREA MARCELA LOPEZ ECHEVERRY	1.018.422.772	PROFESIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL	Ing. Ambiental	34%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
4	JHONY FERNEY DIAZ DAZA	1.013.632.556	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
5	OSCAR MAURICIO ACEVEDO BERNAL	1.115.913.000	INSPECTOR	Tecnólogo en obras civiles	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
6	CAROL GISELLE LOPEZ FIGUEROA	**1.022.443.543**	INSPECTOR	Ing. Civil	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-093**	**IDRD-4080-G1-2024-132**
7	ALEANDRO STEVE SARAY HERNANDEZ	80.050.329	TOPOGRAFO	Tecnólogo en topografía	12%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
8	JUAN CARLOS SANABRIA NUNZABA	79.698.876	CADENERO	NA	12%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
9	DEASSI MAGALY VELASQUEZ QUEVEDO	1.023.865.830	SECRETARIA	Técnico en gestión de aerolíneas y agencias de viajes	5%	**CINNOVAPARQUES-CE-001**	IDRD-4080-G1-2024-030
10	BRAYAN STIVENS GARCIA GARCIA	1.024.488.768	RESIENTE DE OBRA	Ing. Civil	100%	**CINNOVAPARQUES-CE-061**	**IDRD-4080-G1-2024-081**

Fuente: Elaboración Consorcio Innova parques

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

Dentro de las actividades realizadas por el CONSORCIO en las diferentes canchas, alcance del contrato, se encuentran las siguientes:

- *Demarcación*
- *Bordeo*
- *Cepillado*
- *Corte césped*
- *Aireación*
- *Top-pressing*
- *Poda zonas verdes*
- *Fumigación*
- *Suministro y reparación malla nylon*
- *Imprimación asfáltica*

El consolidado de las actividades realizadas se encuentran registradas en el ***anexo A***

430

5. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE CALIDAD

Dentro de las actividades de cumplimiento del plan de calidad las cuales se describen en el presente documento se encuentran entre otras la siguiente:

- Seguimiento a los indicadores del proyecto en el periodo.
- Seguimiento a las comunicaciones
- Control de ensayos de materiales
- Control y medición de equipos
- Control de los cambios existente en el proyecto.
- Auditorías internas las cuales se realizarán según la programación aprobada.
- Mejora continua.

5.1 Control a las actividades ejecutadas en el proyecto

Dentro de las actividades que se realizan para el control del proyecto se encuentran las siguientes las cuales y se pueden observar en el ***anexo B***:

- PS-F-11 Formato de verificación instalaciones v3.
- PS-F-08 Formato de control de llegada de materiales semanal
- Acta de entrega para puesta en servicio del parque en formato IDRD.
- Supervisión y control de las actividades realizadas

Para el periodo se cuenta con el acta de entrega de Puesta en Servicio de la cancha sintética Villas de Madrigal, quedando pendiente las actas de entrega de los parques La Europa, Normandía, Florencia Tronquitos, El Carmelo, San Andrés, los cuales no han sido entregado al consorcio INNOVAPARQUES.

6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

6.1 Actas de Comité

Teniendo en cuenta los temas tratados en los comités de obra los cuales se realizan cada 8 días, se establecen compromisos de dichos temas a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos del contrato. El resumen y seguimiento de los temas tratados se encuentran registrados en el ***anexo C***. Para el presente informe se anexan y registra el seguimiento de las actas 15,16 y 17; el acta 18 no ha sido copiada al Consorcio INNOVAPARQUES.

6.2 Correspondencia

A continuación, se relacionan las comunicaciones que fueron enviadas entre el 1 de marzo al 31 de marzo de 2025, tiempo que comprende el 5to informe de la siguiente manera:

Correspondencia enviada

Tabla Nro. 4 Correspondencia enviada

CONSECUTIVO No	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CINNOVAPARQUES-CE-133	5/03/2025	Entrega acta de pago No. 4	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-134	5/03/2025	Subsanación informe técnico mensual No. 3 - enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-135	6/03/2025	envió programación ejecución marzo	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-136	6/03/2025	Respuesta IDRD-4080-G1-2024-171 Subsanación plan de inspección y ensayos V5.0	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-137	10/03/2025	Radicación informe técnico No. 3 - enero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-138	10/03/2025	Entrega registro de cantidad de materiales	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-139	13/03/2025	Solicitud de adición contrato de obra No. 4041 de 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-140	13/03/2025	Entrega informe técnico No. 4 - febrero 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-141	14/03/2025	Radicación informe SST No. 4 - febrero del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-142	14/03/2025	Radicación informe ambiental No. 4 - febrero del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-143	14/03/2025	Entrega informe de calidad No. 4 - febrero del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-144	14/03/2025	Respuesta comunicado IDRD-4080-G1-2024-136 - Actualización plan de adquisiciones	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-145	17/03/2025	Entrega ensayos de laboratorio arena sílice y caucho granulado	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-146	20/03/2025	Aceptación de solicitud de adición de valor y plazo de ejecución al contrato de obra No. 4041 de 2024	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-147	18/03/2025	Balance del contrato de obra No. 4041 del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28

432

CONSECUTIVO No	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO
CINNOVAPARQUES-CE-148	20/03/2025	Respuesta oficio IDRD-4080-G1-2024-186	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-149	25/03/2025	Presupuestos campos deportivos - Respuesta IDRD-4080-G1-2024-189	CONSORCIO SANTA TERESA 28
CINNOVAPARQUES-CE-150	28/03/2025	Subsanación informe técnico No. 4 - Febrero del 2025	CONSORCIO SANTA TERESA 28

6.3 Correspondencia recibida

Tabla Nro. 5 Correspondencia recibida

FECHA	CONSECUTIVO No	ASUNTO	REMITENTE
4/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-175	Devolución y remisión de observaciones acta de recibo parcial No. 4	CONSORCIO SANTA TERESA 28
4/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-176	Respuesta comunicado CINNOVAPARQUES-CE-133 entrega acta parcial No. 4	CONSORCIO SANTA TERESA 28
5/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-177	Observaciones informe mensual No. 3 VS2 componente técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28
7/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-180	Aprobación informe SST No. 4	CONSORCIO SANTA TERESA 28
10/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-181	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-136 Aprobación plan de inspección y ensayos V5.0	CONSORCIO SANTA TERESA 28
17/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-186	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-139 Solicitud de adición y prorroga	CONSORCIO SANTA TERESA 28
19/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-189	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-147 Balances del contrato de obra	CONSORCIO SANTA TERESA 28
19/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-190	Remisión solicitud aceptación de adición al contrato de obra pública 4041/24	CONSORCIO SANTA TERESA 28
21/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-193	Observaciones informe mensual No. 4 componente técnico	CONSORCIO SANTA TERESA 28
21/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-194	Respuesta CINNOVAPARQUES-CE-143 informe de calidad No. 4 V.1	CONSORCIO SANTA TERESA 28
26/03/2025	IDRD-4080-G1-2024-195	Solicitud entrega programación de obra frentes priorizados	CONSORCIO SANTA TERESA 28

6.4 Bitácora.

La bitácora se constituyó como el instrumento para el registro del control y supervisión de obra se usa para ir haciendo las anotaciones en el libro o libreta que contiene el formato

433

con las especificaciones necesarias requeridas en el Consorcio Innovaparques la cual contó con las siguientes características:

Fechado: Todas las notas de bitácora deben estar fechadas en el día en que se efectúa el registro.

Escritura de la bitácora: Los asientos deben efectuarse con tinta indeleble, nunca con tinta que pueda borrarse, mucho menos con lápiz. Es importante además tener cuidado en escribir con letra fácilmente legible y sin abreviaturas. Cualquier persona debe ser capaz de leer todo lo escrito.

Errores en la escritura de la bitácora: Cuando se comete un error de redacción, de intención o de ortografía, la nota debe anularse acompañada de una leyenda que diga "Esta nota se anula por tener error". De inmediato se abre la siguiente nota repitiendo lo asentado, esta vez sin errores. En lo posible se debe evitar el tener que proceder como se indica, pero llegado el caso es imprescindible hacerlo.

7. SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada del Consorcio Innova parques durante la ejecución del contrato corresponde a los siguientes documentos:

- Informe técnico
- Informe de Seguridad y Salud en el trabajo
- Informe de Calidad
- Actas de reuniones y comités de seguimiento

Las firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación corresponden a los profesionales aprobados por la interventoría para la elaboración, en algunos casos la revisión y para la probación corresponde al director y /o representante legal del contratista e interventoría. En el periodo se actualiza el listado maestro de documentos 20250328 HSEQ-F-38 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS donde se incluye el Plan de inspección y ensayo que cambia a V5, la programación V4 y el balance v3 los cuales están descritos en el proceso de Prestación del Servicio, registrado en el ***anexo E.***

8. PLAN DE ADQUISICIONES

Esta actividad nos permite verificar el control de compra de los materiales necesarios para la ejecución del contrato, a fin de identificación los tiempos, el consecutivo de órdenes de compra y proveedor o aleados estratégicos. A continuación, se **actualiza** el plan de adquisiciones, realizándose un resumen de las ordenes de servicio del periodo, donde algunas las cuales se pueden también visualizar, en el ***anexo F***, así como los materiales utilizados en los siguientes parques:

Tabla Nro. 6 Tabla de adquisiciones

PARQUE	MATERIALES	REMISION NRO.	PROVEEDOR
CARMELO F-11	GRAMA SINTETICA	4140-0325-001	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0325-001	SELLECO
	CINTA	4140-0325-001	MALLAS Y GRAMAS
	MALLAS ARCOS CALIBRE 4	4140-0325-001	MALLAS NM
	MALLAS CERRAMIENTOS	4140-0325-001	MALLAS NM
	MALLAS ARCOS CALIBRE 8	4140-0325-001	MALLAS NM
	MALLA ARCO CAL 4	4140-0325-001	MALLAS NM
MARSELLA	ARENA	JM664	INVERSIONES LOS J SAS
	GRAMA SINTETICA	4140-0325-12	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0325-12	SELLECO
	CINTA	4140-0325-12	MALLAS Y GRAMAS
	MALLA CERRAMIENTO	4140-0325-12	MALLAS NM
	MALLA ARCOS CAL 4	4140-0325-12	MALLAS NM
	CAUCHO	4140-0325-13	ECO TIRE GREEN SAS
CARMELO F5-F11	ARENA CILICE	4140-0325-002	BEPE
	CAUCHO	4140-0325-002	ECO TIRE GREEN SAS
	CAUCHO	4140-0325-002	ECO TIRE GREEN SAS
CAMPOS NATURALES	PINTURA VINILO T2	4140-0325-003	TITO PABON
SUBA GAVILANES	MALLA ARCO CAL 8	4140-0325-003	MALLAS NM
VILLAS DE MADRIGAL	ARENA CILICE	4140-0325-04	BEPE
	CAUCHO	4140-03-25-04	ECO TIRE GREEN SAS
	CAUCHO	4140-03-25-04	ECO TIRE GREEN SAS
	GRAMA SINTETICA	4140-0325-05	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0325-05	SELECO
	CINTA	4140-0325-05	MALLAS Y GRAMAS
	MALLA CERRAMIENTO	4140-0325-05	MALLAS NM
	MALLA ARCOS CAL 4	4140-0325-05	MALLAS NM
FLORENCIA TRONQUITOS	CAUCHO	4140-0325-06	ECO TIRE GREEN SAS
	CAUCHO	4140-0325-06	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA CILICE	4140-0325-06	BEPE
	CINTA	4140-0325-07	MALLAS Y GRAMAS
	PEGANTE	4140-0325-07	SELLECO
	GRAMA SINTETICA	4140-0325-07	CUPERZ
	MALLA CERRAMIENTO	4140-0325-07	MALLAS NM
	MALLA ARCOS CAL 4	4140-0325-07	MALLAS NM
EUROPA	CAUCHO	4140-0325-08	ECO TIRE GREEN SAS
	CAUCHO	4140-0325-08	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA CILICE	4140-0325-08	BEPE
	GRAMA SINTETICA	4140-0325-09	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0325-09	SELECO
	CINTA	4140-0325-09	MALLAS Y GRAMAS
	MALLA CERRAMIENTO	4140-0325-09	MALLAS NM
	MALLA ARCOS CAL 4	4140-0325-09	MALLAS NM
ALQUERIA	ARENA	JM762	INVERSIONES LOS J SAS
	FERTILIZANTE	4140-0325-16	ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA
	FERTILIZANTE	4140-0325-16	ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA
GAITANA	ARENA	JM 854	INVERSIONES LOS J SAS
	FERTILIZANTE	4140-0325-22	ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA
	FERTILIZANTE	4140-0325-22	ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA
NORMANDIA	GRAMA SINTETICA	4140-0325-10	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0325-10	SELLECO
	CINTA	4140-0325-10	MALLAS Y GRAMAS
	CAUCHO	4140-0325-11	ECO TIRE GREEN SAS
	CAUCHO	4140-0325-11	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA CILICE	4140-0325-11	BEPE
	MALLA CERRAMIENTO	4140-0325-13	MALLAS NM
	MALLA ARCOS CAL 8	4140-0325-13	MALLAS NM
VILLA DE LOS SAUCES	CAUCHO	4140-0325-14	ECO TIRE GREEN SAS
HAYUELOS F5	CAUCHO	4140-0325-15	ECO TIRE GREEN SAS
	ARENA	4140-0325-15	BEPE
	CAUCHO	4140-0325-15	ECO TIRE GREEN SAS
	GRAMA SINTETICA	4140-0325-17	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0325-17	SELLECO
	CINTA	4140-0325-17	MALLAS Y GRAMAS
HAYUELOS F8	CINTA	4140-0325-18	MALLAS Y GRAMAS
	PEGANTE	4140-0325-18	SELLECO
	CAUCHO	4140-0325-19	ECO TIRE GREEN SAS
LOMBARDIA	CAUCHO	4140-0325-20	ECO TIRE GREEN SAS
	GRAMA SINTETICA	4140-0325-21	CUPERZ
	PEGANTE	4140-0325-21	SELLECO
	CINTA	4140-0325-21	MALLAS Y GRAMAS

9. INFRAESRUCTURA Y PRESERVACION

Para la ejecución del proyecto se hizo uso de los siguientes recursos de infraestructura:

- ✓ Oficina de control de proyecto: Calle 51 Nro. 71ª-18
- ✓ Baños fijos en oficina y parques.
- ✓ Equipos y maquinaria como Vibro compactadores, minicargadores, Sopladoras de pasto.
- ✓ Herramientas manuales.
- ✓ Vallas móviles.
- ✓ Suministro de agua potable.
- ✓ Energía eléctrica
- ✓ Equipos de comunicación.



Ilustración 1. Des compactación con equipos/ Campo Marsella



Ilustración 2. Fertilización con equipos-Campo Marsella

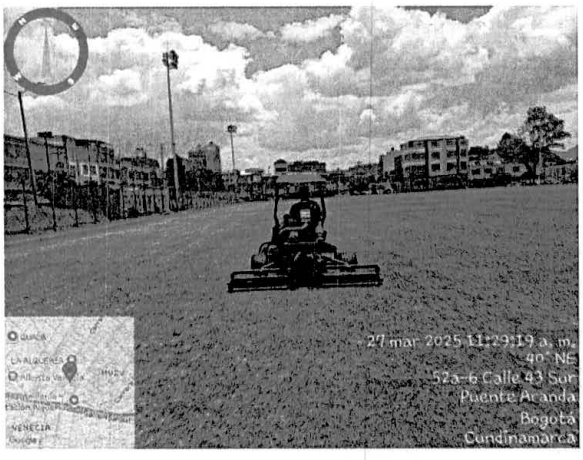


Ilustración 3. Corte de Césped con equipos - Alquería.



Ilustración 4. TOP DRESSSING con equipos – Villa de los Sauces

486



Ilustración 5. Corte – Parque Country



Ilustración 6. Normandía – Mto área Perimetral con Andamio



Ilustración 7. Pegue de Grama - Normandía



Ilustración 8. Rotovo – Ciudad Montes

10. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

Durante la ejecución del contrato, el Consorcio Innovaparques estableció e implementó las medidas necesarias para controlar la calidad de las actividades de obra ejecutadas y los equipos de medición utilizados así como los materiales utilizados en cada una de estas, para lo cual, de conformidad con el plan de calidad aprobado por la interventoría, realizó el control a los materiales certificados por los proveedores, verificando que los mismos cumplieran con las características requeridas por el contrato .

10.1 Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales certificados por proveedor

Los controles implementados por el Consorcio Innovaparques permitieron tener la trazabilidad de los materiales utilizados en obra, asegurando que los proveedores proveedor han proporcionado bajo los estándares de calidad requerido permitiendo identificar la conformidad de los productos bajo parámetros establecidos por normas nacionales o internacionales de acuerdo con las particularidades de cada material y cuyos resultados se muestran en los certificados de calidad emitidos por el mismo proveedor los cuales no varían en el periodo de febrero dado que la compra de estos materiales es en grandes cantidades ***ver anexo G.***

En la ejecución del contrato, se recibieron materiales con certificado de conformidad como se listan en la siguiente tabla resumen por mes de ejecución:

Tabla Nro. 7 Materiales certificados por proveedor

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
Caucho	NTC 5176	EN 933-1 EN 1097-3 EN 14955	N. E	CAUCHOS DINAMICOS
Vinilo Basico Tipo 2 Blanco	MNI 125,0- MAX 130,0	NTC 559	1561	TITO PABON
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr /Palermo SUR 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-E020B, 24N526-E581B, 24N526AE581B	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ
ULTRACORROSIVO	N. E	N. E	95468	ULTRA PINTURAS
ESMALTE SINTETICO	N. E	N. E	95742	ULTRA PINTURAS
CINTA DE UNION DE CESPED	IDRD	N. E	CGQ-0345	MALLAS Y GRAMAS
MALLA DE CERRAMIENTO	IDRD	N.E.	1224-032	TRENZACOL
NYLON #4	IDRD	N.E.	1224-023	TRENZACOL
NYLON #8	IDRD	N.E.	1224-017	TRENZACOL
Grama / FLASHBLADE 1.409 gr / Pijaos Lotes 24N530-E581B, 24N530AE581B, 24N531-E581B,	FIFA	ASTM 3776	N. E	CUPERZ

488

MATERIAL	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	NORMA A CUMPLIR	# CERTIFICADO PRESENTADO	ENTDAD CERTIFICADORA
24N531AE581B, 24N532-E581B, 24N532AE581B, 24N529-E581B, 24N529AE581B, 24N528-E020B, 24N533-E581B, 24N533AE581B, 24N534-E581B, 24N534AE581B, 24N538-E581B, 24N538AE581B, 24N536-E581B, 24N536AE581B, 24N535-E581B, 24N535AE581B, 24N546-E581B, 24N546AE581B, 24N537-E581B, 24N537AE581B, 24N545-E581B				

Fuente: Informes mensuales Consorcio Innovaparques

10.2 Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto

Durante el desarrollo del contrato se hace necesario hacer uso de materiales pétreos a los cuales para verificación del cumplimiento de los parámetros requeridos de calidad se les realiza algún tipo de ensayo de laboratorio.

Lo que permite evaluar la conformidad del grupo de materiales que son entregados como parte de la obra ejecutada, correspondiendo a las actividades técnicas, tipos de inspección, frecuencia, criterios de aceptación, lo que permite asegurar la calidad y el cumplimiento de los requisitos de calidad, y que en caso de que alguno de estos no cumpla con los parámetros establecidos, se realizara el tratamiento de producto no conforme por calidad en los materiales proporcionados.

Los puntos de control y verificación son realizados de manera constante en obra al recibo de los materiales y documentados como parte de los informes mensuales dejando la trazabilidad registrada en el anexo del plan de inspección y ensayos de cada informe, los cuales son aprobados por la interventoría. En el **periodo 5** se entrega mediante comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio el resultado de la arena de peña y del caucho en informe de Geotecnia-25607-DGP 1086-25 (OV 144829 - OT 75304) atendiendo las observaciones del cliente. ***Ver anexo H.***

Tabla Nro. 8 Materiales controlados por inspección y ensayos

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD DE MATERIAL	LABORATORIO	ENSAYO A REALIZAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ANALISIS DE RESULTADOS		
						CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
21/11/2024	ARENA CILICE	N/A	Centro desarrollo Tecnológico	análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos para agregados	NTC - 77	X		NO

439

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD DE MATERIAL	LABORATORIO	ENSAYO A REALIZAR	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ANALISIS DE RESULTADOS		
						CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
			Minero ENERGETICO SAS					
8/07/2024	CAUCHO	N/A	ACOUSTO SCAN LATAM	CURVA DE CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DE RELLENO DE RENDIMIENTO*TAMAÑO DE PARTÍCULA*DENSIDAD*FORMA	IDRD	X		NO
5/03/2025	ARENA DE PEÑA	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
		N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN.	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio
	CAUCHO	N/A	CONCRELAB	DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE LOS SUELOS. (ANÁLISIS POR TAMIZADO)	IDRD	X		Ver comunicado 145-CE-CINNOVAPARQUES Ensayos de laboratorio

11. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Durante el presente periodo, se realizó el control para el aseguramiento de las óptimas condiciones y confiabilidad de las lecturas tomadas por los equipos de topografía para las actividades de obra permitiendo la conformidad del producto y/o revisión con respecto a los requisitos de cliente y según fue el caso, los cuales fueron calibrados y verificados con el formato de control de equipos de topografía del IDRD garantizando que los datos obtenidos fueran conformes. ***VER ANEXO I***

Durante el periodo se contó con los siguientes equipos:

Tabla Nro.9 Equipos de medición utilizados en la ejecución del contrato

INFORME	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	NRO. DE CERTIFICADO	FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE VENCIMIENTO
3	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	15/01/2025 27/01/2025	9/06/2025
4	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	11/02/2025 26/02/2025	9/06/2025

440

INFORME	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	NRO. DE CERTIFICADO	FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE VENCIMIENTO
5	NIVEL	Top con	AT – B4	JZ40615	C5798	13/03/2025 28/03/2025	9/06/2025
5	Tamiz	Sin especificar	Sin especificar	Ver certificado 14-LAC-055 /	Ver certificado 14-LAC-055 / CONCRELAB	16/02/2024	29/09/2027

12. CONTROL DE LA GESTION

12.1 Control de Cambios

Durante el periodo el proyecto no presento cambios que hayan afectado el alcance del contrato. Esta actividad asegura cualquier cambio del proceso constructivo de manera efectiva y con las partes interesadas desde el punto de vista técnico y legal en el alcance del contrato.
Cuando se suscitan estos cambios se llevan a cabo de la siguiente manera planificada:

a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
b) la integridad del proyecto;
c) la disponibilidad de recursos.
d) la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
e) La concertación con la interventoría y con el cliente.

Tabla Nro.10 Consolidado de control de cambios

COMPILADO DE CAMBIOS DEL PROYECTO		
1	ACTIVIDAD DEL CAMBIO	
No	DESCRIPCIÓN	OBSERVACION
1	Cambio de la programación v4	Inclusión de nuevos parques con base a la información suministrada por el cliente. San Andrés F11 y F5, Florencia tronquitos, la Europa, Normandía, villas del madrigal y Marsella F5
2	Plan de inspección y ensayo cambia a V5	Se remite en comunicado 136-CE-CINNOVAPARQUES Respuesta IDRD-4080-G1-2024-171 Plan de inspección y ensayos

12.2 Salidas no conformes

El consorcio durante el contrato realizó seguimiento a la conformidad del cliente, con relación a los productos suministrados establecidos donde se presenta una salida no conforme, relacionada con el cumplimiento del indicador, la cual se documenta, estableciendo la acción de mejora respectiva, buscando la calidad en la implementación de las actividades constructivas con base a los lineamientos de los manuales técnicos del IDRD, como se muestra a continuación:

449

Tabla Nro. 11 Consolidado de salidas no conformes

Informe No.	Fuente	Descripción	Estado
2	Requisitos de Cliente	No se ha realizado la presentación de las caracterizaciones iniciales de los materiales pétreos correspondientes con base a las especificaciones TECNICAS del Contrato.	Cerrada
3	Requisitos de Cliente	No se encuentra evidencia objetiva de la aprobación de los informes mensuales afectando el indicador de entrega de productos.	Cerrada
4	Auditoría Interna / Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores.	Cerrada

Para el presente informe se cierra las salidas no conformes relacionada con los ensayos del material pétreo del periodo 2 y la auditoría interna al componente SG SST del periodo 4 las cuales quedan registradas en el **anexo J**.

13. AUDITORÍAS INTERNAS

En cumplimiento del plan de calidad presentado por el consorcio, se podrán adelantar Auditorías Internas por parte de un profesional asignado por una de las empresas consorciadas cuyo propósito es evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes a los componentes: ambiental, de salud y seguridad en el trabajo, calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos. En el periodo se programa la auditoria correspondiente al 70% del contrato donde se hará énfasis al proceso de prestación del Servicio. En el anexo ***K*** se registra el 20250331 HSEQ-F-08 PROGRAMA DE AUDITORIAS y 20250331 HSEQ-F-30 PLAN DE AUDITORIAS CI

Tabla Nro. 12 Consolidado de Auditorías realizadas

Mes de reporte	No. Informe	No. Auditoría Interna	Hallazgos (No conformidades u observaciones)
4	4	1	No se encuentra evidencia objetiva de la inspección pre Operacional del camión Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores en concordancia del Numeral 4.3.3.3 Inspecciones de Seguridad / informe diario y revisión preoperacional de vehículos y equipos mayores. ***Cerrada.***
5	5	2	Programada para el 29 de abril de 2025

Según el resultado de las auditorias se implementarán los controles y acciones de mejora que permitan la optimización de la gestión del Consorcio y el mejoramiento continuo en las actividades desarrolladas, y estas serán entregadas en los informes respectivo-mensuales permitiendo cerrar los hallazgos identificados.

442

14. LISTADO DE ANEXOS

AA Actividades Periodo
AB Control actividades
AC Actas de Comité
AD Bitácora
AE Control de Documentos
AF Compras
AG Certificados de Calidad
AH Inspección y Ensayos
AI Medición
AJ Salidas no conformes.
AK Auditoria.

2. ANEXO A
ACTIVIDADES DEL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS POR PARQUE

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

N°		DEMARCACIÓN	BORDEO	CEPILLADO	CORTE CAMPO POLO	CORTE CESPED	TRANSPORTE	AIREACIÓN	TOP-DRESSING	FUMIGACIÓN	PODA ZONAS VERDES	SUMINISTRO ARCOS + MALLA	MTO ARCOS	SUMINISTRO MALLAS	CORDON SOLDADURA	SUMINISTRO Y REPARACIÓN MALLA NYLON	SUMINSTRO E INSTALACIÓN CAUCHO	SUMINISTRO GRAMA	DESMONTE GRAMA	IMPRIMACION ASFÁLTICA	VIBROCOMPACTADOR	ROTOVACTOR	RELLENO EN ARENA DE RIO	VERTICUTTER	APLICACION DE FERTILIZANTE
1	PRD ALTERNA 3	3	3			3																			
2	PRD ESTADIO																								
3	TABORA																								
4	EL CAJON ATAHUALPA	4	4			4																			
5	TIMIZA ESTADIO																								
6	TUNAL FUTBOL	3	3			3																			
7	SAN CRISTOBAL	2	2			2																			
8	SERENA	2	2			2																			
9	PARQUE NACIONAL	2	2			2																			
10	COUNTRY				8																				
11	UDS BEISBOL	3	3			3	1			6413,68												6			
12	UDS SOFTBOL	3	3			3				3174,4												5			
13	UDS ATLETISMO		3			3																			
14	MILENTA TEJAR	2	2			2																			
15	CIUDAD MONTES FUTBOL	2	2			2																			
16	CIUDAD MONTES VOLEY		2																			4			
17	TUNAL SOFTBOL	2	2			2																5			
18	PAVCO NATURAL		2			2																			
19	PRD PLAYA		4							159,6												8			
20	UDS VOLEY PLAYA		3							83,2												5			
21	COMPLEJO ACUÁTICO		3							84,2												4			
22	BOCHICA	2	2	2																					
23	MARSELLA	1	4	4																					
24	JUAN AMARILLO NATURAL	4	4	4																					
25	FLORIDA 1		4	4																					
26	FLORIDA 2		4	4																					
27	FLORIDA 3		4	4																					
28	FLORIDA 4	4	4	4																					
29	FLORIDA 5	4	4	4																					
30	ESTADIO ALQUERIA		4	4			1	8000	8000	8000	8000												36	8000	200
31	CIUDAD MONTES SOFTBOL	2	2	2			1															5			
32	NUEVO MUZU NATURAL	2	2	2																					
33	LA GAITAINA NATURAL	2	3	3			1	7523	7523	7523	7523												36	7523	300
34	LA GAITANA PLAYA																								
35	SERVITA F11			2						112,8															
36	SERVITA F5			2						27															
37	CABRERA JAPON			2						30															
38	CANTALEJO			2						25,8															
39	PRADO PINZON		2	2						51	154,56														
40	MAZUREN			2						39															
41	VILANOVA			2						30															
42	VERBENAL			2						33															
43	UDS SINT		2	2						48	552,89														
44	EDUARDO SANTOS			2						40,2															
45	GUSTAVO RESTREPO			2						30															
46	VENECIA 1			2						31,8															
47	VENECIA 2			2						31,8															
48	LAGUNETA			2						52,8															
49	SAN JOSE CENTRO			2						24,6															

50	PARQUE OLAYA HERRERA			2					102,36																	
51	PIJAOS																									
52	SAN ANDRES F5			2					48,18																	
53	SAN ANDRES F11			2					102,6																	
54	EL CARMELO F5			5			1433,71	1433,71	46,32			1	1		82,5	2000										
55	EL CARMELO F11		2	4		1	8750	8750	117	798,4		1	1		215,25	5000	39,96	39,96								
56	VILLA LUZ F5			2					48																	
57	VILLA LUZ F11			2					92,94																	
58	VILLAS DEL MADRIGAL			5		1	1200	1200	42			1	1		101	2000	5	4								
59	FLORENCIA LOS TRONQUITOS			5		1	1008	1008	38,4			1	1		199,5	2000										
60	PAVCO		2	2					40	517																
61	JAZMIN			2					97,2																	
62	PEPITA			2					30,22																	
63	CIUDAD MONTES 1			2					21																	
64	CIUDAD MONTES 2			2					21																	
65	SIERRA MORENA 1			2					30																	
66	SIERRA MORENA 2			2					30																	
67	CASA BLANCA			2					54,6																	
68	FONTANAR DEL RIO F11			2					90,6																	
69	FONTANAR DEL RIO F5			2					30																	
70	FONTANAR MINI BEISBOL			2					69,96																	
71	LA GAITANA			2					68,4																	
72	URB LOMBARDIA			5		1	600	600	30							1000										
73	CIUDADELA CAFAM			2					43,2																	
74	DESARROLLO BILBAO			2					20,64																	
75	BERLIN			2					38,4																	
76	TIBABUYES 1			2					50,4																	
77	TIBABUYES 2			2					60																	
78	CAFAM LOS GAVILANES			4		1	5000	5000	90			1	1			6000										
79	LA ESPERANZA			2					46,8																	
80	CLARELANDIA F11		2	2					87																	
81	CLARELANDIA MINI		2	2					40,2																	
82	TEJAR			2					91,2																	
83	CHICALA			2					78,6																	
84	ATALAYAS			2					55,74																	
85	PORTAL DEL SOL			2					84																	
86	CAMPO VERDE 1			2					58,8																	
87	CAMPO VERDE 2			2					56,4																	
88	CAMPO VERDE 3			2					29,4																	
89	SANTA CLARA			2					55,32																	
90	HAYUELOS F8			5		1	2947,58	2947,58	68,1			3				5000										
91	HAYUELOS F5			5		1	1121,87	1121,87	41,4			1				2000										
92	NORMANDIA			4		1	5000	5000	88,8			1	1		95	4800										
93	VILLEMAR		2	2					91,2	570																
94	PRADERA SUR		2	2					34,59	102																
95	PARQUE INDUSTRIAL LOS EJIDOS			2					86,4																	
96	PARQUE INDUSTRIAL EL NECTAR POLIDEPORTIVO			2					36,6																	
97	CEDRITOS		2	2					58,74	553,65																
98	TOBERIN		2	2					80,46	472,3																
99	CALLE 170		2	2					39,6	145,26																
100	ESTRELLA NORTE		2	2					47,32	139,42																
101	BURGOS BRITALIA 1		3	3					40,2	376,4																
102	BURGOS BRITALIA 2		3	3					40,2	461,36																
103	LINDARAJA			2					30																	
104	COMETAS			2					48																	
105	PTAR			2					104,4																	
106	PRD 1		2	2					104,4	414,4																

9hh

107	PRD 2		2	2						105,6																
108	GIMNASIO DEL NORTE		2	2						41,4	62,37															
109	BACHUE			2						103,8																
110	FRAGUA		2	2						97,2	704															
111	VILLA MAYOR			2						93																
112	AURORA		2	2						84	951,8															
113	VALLES DEL CAFAM			2						40,2																
114	VILLA ALEMANA			2						31,8																
115	MIRAVALLE F8-1		2	2						47,4	83,99															
116	MIRAVALLE F8-2			2						35,6																
117	MIRAVALLE F5			2						30																
118	ALFONSO LOPEZ			2						35,24																
119	NUEVO USME			2						30																
120	MOLINOS		2	2						70,06	799,2															
121	PALERMO SUR			2						33,22																
122	MARRUECOS			2						46,2																
123	EL TUNAL 1			2						64,62																
124	EL TUNAL 2			2						64,62																
125	EL TUNAL 3			2						55,62																
126	EL TUNAL ALTERNA			2						86,4																
127	NUEVO MUZU		2	2						67,2	990															
128	SANTA LUCIA 1			2						55,5																
129	SANTA LUCIA 2			2						66,3																
130	URB TUNJUELITO			2						81																
131	NUEVO MILENIO 1			2						29,4																
132	NUEVO MILENIO 2			2						25,8																
133	ALTOS DE LA ESTANCIA 1			2						27,6																
134	ALTOS DE LA ESTANCIA 2			2						27,6																
135	ILLIMANI F11		2	2						88,44	623,1															
136	ILLIMANI F5			2						30																
137	ILLIMANI EL MIRADOR			2						30																
138	TALLER EL ENSUEÑO			2						45,9																
139	ESTANCIA			2						42,6																
140	PARAISO			2						21,6																
141	LA JOYA			2						36																
142	DOMINGO LAIN			2						21,6																
143	ARBORIZADORA ALTA			2						21,6																
144	CARACOLI			2						31,5																
145	BALMORAL GUADALUPE			2						37,2																
146	LA VICTORIA 1			2						26,4																
147	LA VICTORIA 2			2						26,4																
148	SAN CRISTOBAL 1			2						85,68																
149	SAN CRISTOBAL 2			2						97,62																
150	ANTIOQUIA			2						24																
151	GAITAN CORTES		2	2						93	610															
152	NARANJOS		2	2						89,4																
153	VILLA DEL RIO			2						111,6																
154	EL RECREO			2						78																
155	LA TINGUA TIBANICA			2						78																
156	EL PORVENIR 1			2						48																
157	EL PORVENIR 2			2						48																
158	EL PORVENIR 3			2						48																
159	EL PORVENIR 4			2						38,04																
160	EL PORVENIR 5			2						38,04																
161	EL PORVENIR MINI			2						10,8																
162	SAN JOSE DE MARYLAND			2						62,68																
163	LUCES VILLA RICA			2						72,3																
164	LA ALEJANDRA			2						41,4																
165	AMERICAS OCCIDENTAL			2						66																

166	VILLA DE LOS SAUCES			5			1	1500	1500	48							3000								
167	CARVAJAL			2						91,2															
168	TIMIZA F8			2						48															
169	TIMIZA F11			2						103,8															
170	LA IGUALDAD			2						97,5															
171	CASTILLA		2	2						55,8															
172	VILLA ALSACIA			2						96															
173	LAGO TIMIZA			2						46,2															
174	LAS CRUCES			2						42															
175	LACHES			2						66															
176	TERCER MILENIO 1 F5			2						32,4															
177	TERCER MILENIO 2 F5			2						32,4															
178	TERCER MILENIO 3 F5			2						99,6															
179	LOURDES			2						21															
180	DINDALITO			2						68,4															
181	CAYETANO CAÑIZARES		2	2						99	898,2														
182	GILMA F11			2						93															
183	GILMA F8			2						48,6															
184	GILMA F5 1			2						35,4															
185	GILMA F5 2			2						35,4															
186	GILMA MINI			2						9,6															
187	GORGONZOLA			2						45,12															
188	MARSELLA F11			2						84															
189	MARSELLA F5			5			1	1309	1309	46,42			1	1		194	2000								
190	SANTA ISABEL 1			2						48															
191	SANTA ISABEL 2			2						30															
192	JUAN AMARILLO F5 1			2						28,2															
193	JUAN AMARILLO F5 2			2						28,2															
194	JUAN AMARILLO F5 3			2						28,2															
195	JUAN AMARILLO F5 4			2						28,2															
196	JUAN AMARILLO F8 1			2						48															
197	JUAN AMARILLO F8 2			2						48															
198	LA EUROPA			4			1	840	840				1	1		122,5	1500								
199	LA EUROPA MINI			1																					
200	METROPOLIS			2						36															
201	BONANZA			2						106,94															
202	CIUDAD HONDA		2	2						25,44	176,12														

TOTAL	**49**	**144**	**408**	**8**	**33**	**15**	**46233,2**	**46233,2**	**34389,37**	**26679,42**	**0**	**12**	**8**	**0**	**1009,75**	**36300**	**44,96**	**43,96**	**0**	**0**	**42**	**72**	**15523**	**500**

3. ANEXO B
CONTROL DE ACTIVIDADES

3.1. PUESTA EN SERVICIO VILLAS DEL MADRIGAL

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE ENTREGA PARA PUESTA EN SERVICIO

En Bogotá, a los _31_ días del mes de _Marzo_ de _2025_, se reunieron, los profesionales del Área de Administración de Escenarios, Subdirección Técnica de Parques y los PROFESIONALES/FUNCIONARIOS O TERCERO delegados por _INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD_, con el fin de efectuar la ENTREGAR Y RECIBIR PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PUESTA EN SERVICIO de la infraestructura que se describe a continuación.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO PARQUE O ESCENARIO: 10-002

NOMBRE DEL PARQUE / ESCENARIO: Cancha sintética Villas del Madrigal

DIRECCIÓN: Calle 75 C Carrera 99 B **LOCALIDAD:** Engativá

1.1. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

El detalle de la infraestructura objeto de la presente entrega, hace parte del alcance de los contratos a continuación relacionados:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Desmonte parcial y reemplazo de grama sintética, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, mantenimiento y pintura a arcos de fútbol, suministro e instalación de mallas para arcos de fútbol y mantenimiento de la malla de protección en Nylon.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 - "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**20** *(Dia)*	**DE**	**Noviembre** *(Mes)*	**DE**	**2024** *(Año)*		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**19** *(Dia)*	**DE**	**Julio** *(Mes)*	**DE**	**2025** *(Año)*		
FECHA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	**19** *(Dia)*	**DE**	**Julio** *(Mes)*	**DE**	**2025** *(Año)*		
CONTRATISTA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	**4041** *(Número Contrato)*	**DE**	**2024** *(Año)*
INTERVENTOR	**CONSORCIO SANTA TERESA 28** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*			**CONTRATO No**	**4080** *(Número de Contrato)*	**DE**	**2024** *(Año)*
PROFESIONAL QUIEN ENTREGA	**CONSORCIO INNOVAPARQUES** *(Escriba el nombre o razón social del contratista)*						

1.2. CONSIDERACIONES GENERALES

La entidad que entrega informa sobre las condiciones actuales del proyecto, las cuales se describen a continuación:

1. CANCHA DE FÚTBOL: Reemplazo de grama sintética en zona afectada, mantenimiento correctivo a gránulo de caucho SBR, arcos de fútbol pintados, mallas para arcos de fútbol nuevas, mantenimiento a malla de protección en Nylon y suministro de arcos de microfutbol.

La entidad que entrega está a cargo de hacer seguimiento al plazo de la garantía de estabilidad de obra, toda novedad derivada del proceso de construcción se notificara a la Subdirección Técnica de Parques y esta a su vez informara lo respectivo.

2. CONDICIONES DE LA ENTREGA


2.2. ALCANCE GENERAL DE LA INTERVENCIÓN


2.2.1. CANCHA DE FÚTBOL


ZONA DE LA CANCHA





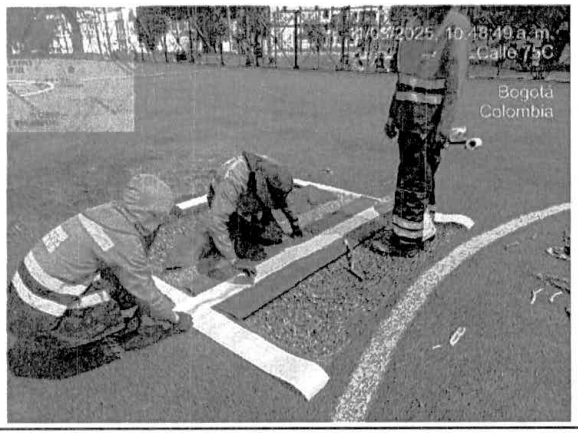

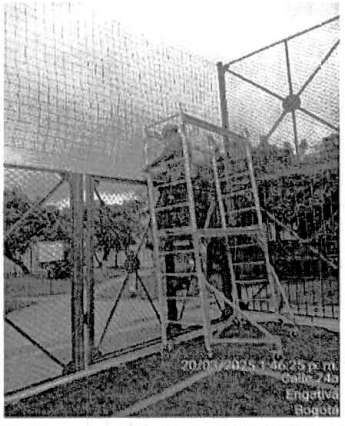

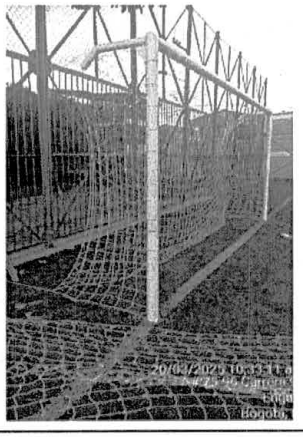











2.2.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS Y/O ZONAS CONSTRUIDOS

ZONAS	DESCRIPCIÓN	TIPO DE ACABADO DE PISO	ÁREA	%
1	CANCHA DE FÚTBOL (área total 1200 m2): Desmonte parcial de grama sintética, suministro e instalación de grama sintética, descompactación caucho SBR, mantenimiento correctivo caucho granulado SBR, suministro e instalación de mallas semiprofesionales para arcos de fútbol, mantenimiento de arcos y mantenimiento de malla de protección en Nylon.	GRAMA SINTÉTICA	5,00 m2	0,42%
		TOTAL, ÁREA INTERVENIDA	**5,00 m2**	**0,42%**

2.2.3. INVENTARIO DE DOTACIÓN Y/O MOBILIARIO GENERAL

Código CIO	DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN	UND	CANTIDAD	OBSERVACIONES DE ENTREGA
16812	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	M2	5	Nueva
13548	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	JGO	1	Nueva
15237	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	M2	101	Mantenimiento
12480	02 Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **	JGO	1	Mantenimiento y pintura

2.2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN COMPLETAR EL ACTA

N.A. INVENTARIO DE ALMACEN IDRD (Si aplica) Folios:

Comentarios: No Aplica

N.A. ENTREGA DE RECIBOS Y PAZ Y SALVOS SERVICIOS PUBLICOS (Anexar un documento por entidad)

E.A.A.B **ENEL** **VANTI**

UAESP ALUMBRADO **UAESP PODA CESPED**

Comentarios: No Aplica

N.A. MANUAL DE MANTENIMIENTO:

Comentarios: No aplica

N.A. OTROS (indicar cuales)

Comentarios: No aplica

3. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD	CONTACTO	FIRMA
Liliana Barbosa - Apoyo a la supervisión del IDRD	IDRD	3203409620	
Oscar Renan Velásquez - Representante legal	Consorcio Innovaparques	3183545567	
Director de obra - Javier Linares García	Consorcio Innovaparques	3142513079	
Brayan Garcia - Residente de obra	Consorcio Innovaparques	3107181601	
Raúl Orlando Delgado - Representante legal/Director de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 30	3213980386	
María Claudia Mahecha - Residente de Interventoría	Consorcio Santa Teresa 31	3102623167	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Bogotá D.C., a los:

Treinta y uno	(31)	días del mes de	Marzo	de	2025
(día en letras)	*(día en números)*		*(mes en letras)*		*(Año)*

Entrega:

(Firma)

(Nombre) Raúl Orlando Delgado

CARGO Director de interventoría

Área Técnica

Entidad Consorcio Santa Teresa 28

Recibe:

(Firma)

(Nombre) Liliana Paola Barbosa Barrera

CARGO Apoyo a la Supervisión

Área Subdirección Técnica de Parques

Entidad IDRD

3.2. INGRESO DE MATERIALES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	7 de Marzo de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 3 al 7 de Marzo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	3/03/2025	INVERSIONES LOS J SAS	ARENA DE RIO	36	M3	MARSELLA NATURAL
2	4/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO 60MM	40	M2	CARMELO F11
3	4/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	2	CANECA	CARMELO F11
4	4/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	40	ML	CARMELO F11
5	4/03/2025	MALLAS NM	MALLA CERRAMIENTO	215,25	M2	CARMELO F11
6	4/03/2025	MALLAS NM	MALLA CERRAMIENTO	82,5	M2	CARMELO F5
7	4/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	CARMELO F11
8	4/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	CARMELO F5
9	5/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5000	KILOS	CARMELO F11 top dresing
10	5/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	CARMELO F5 top dresing
11	5/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	720	KILOS	CARMELO F11 correctivo
12	5/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	720	KILOS	CARMELO F11 correctivo
13	5/03/2025	TITO PABON	VINILO TIPO 2	50	CANECAS	CAMPOS NATURALES
14	7/03/2025	MALLAS NM	MALLA ARCOS CAL 8	1	JUEGO	SUBA GAVILANES

III. OBSERVACIONES

IV. FIRMA APROBACIÓN


JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 28


EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES


V. REGISTRO FOTOGRÁFICO



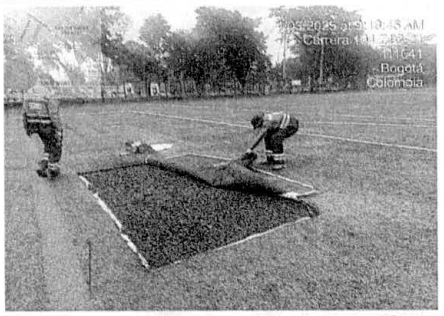



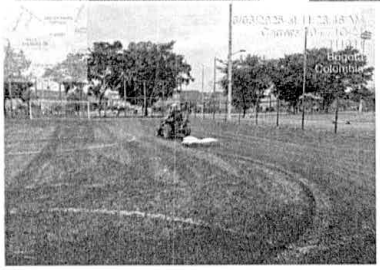

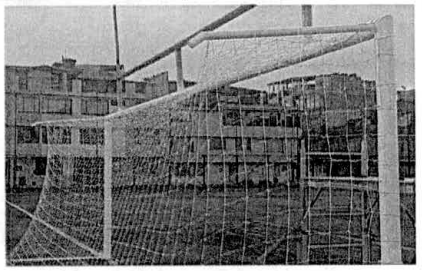

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	14 de Marzo de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 10 al 14 de Marzo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	VILLAS DE MADRIGAL top d.
2	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	72	KILOS	VILLAS DE MADRIGALCorr.
3	11/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	72	KILOS	VILLAS DE MADRIGALCorr.
4	11/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	4	M2	VILLAS DE MADRIGAL
5	11/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	VILLAS DE MADRIGAL
6	11/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	20	ML	VILLAS DE MADRIGAL
7	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMNIENTO	101	M2	VILLAS DE MADRIGAL
8	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	VILLAS DE MADRIGAL
9	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	FLORENCIA TRONQUITOS Top
10	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	50	KILOS	TRONQUITOS correctivo
11	11/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	50	KILOS	TRONQUITOS correctivo
12	11/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	1,6	ML	TRONQUITOS
13	11/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	TRONQUITOS
14	11/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	1,6	ML	TRONQUITOS
15	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMNIENTO	199,5	M2	TRONQUITOS
16	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	TRONQUITOS
17	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1500	KILOS	EUROPA Top Dressing
18	11/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	50	KILOS	EUROPA correctivo
19	11/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	50	KILOS	EUROPA correctivo
20	11/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	1,6	ML	EUROPA
21	11/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	EUROPA
22	11/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	1,6	ML	EUROPA
23	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMNIENTO	122,5	M2	EUROPA
24	11/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	EUROPA
25	11/03/2025	INVERSIONES LOS J SAS	ARENA DE RIO	36	M3	ALQUERIA NATURAL

III. OBSERVACIONES


IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 28

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

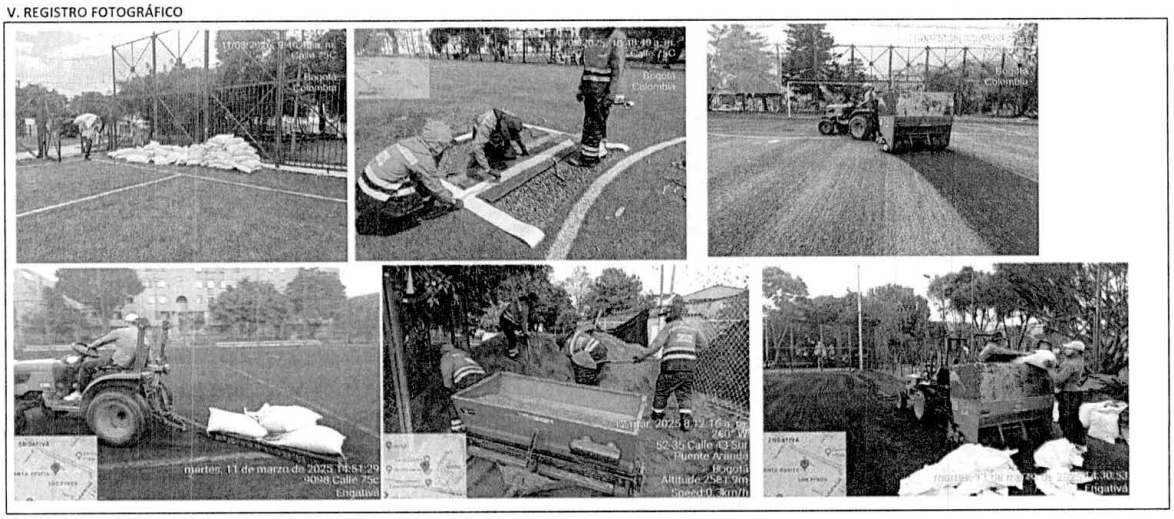

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	21 de Marzo de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 17 al 21 de Marzo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	19/03/2025	INVERSIONES LOS J SAS	ARENA DE RIO	36	M3	GAITANA NATURAL
2	20/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	50	KILOS	NORMANDIA Corr.
3	20/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	50	KILOS	NORMANDIA Corr.
4	20/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	3000	KILOS	NORMANDIA Top dresing
5	20/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	3	ML	NORMANDIA
6	20/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	NORMANDIA
7	20/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	3	ML	NORMANDIA
8	20/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	MARSELLA F5
9	20/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	1	ML	MARSELLA F5
10	20/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	MARSELLA F5
11	20/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	1	ML	MARSELLA F5
12	20/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMNIENTO	194	M2	MARSELLA F5
13	20/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 4	1	JUEGO	MARSELLA F5
14	21/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE CERRAMNIENTO	95	M2	NORMANDIA
15	21/03/2025	MALLAS NM	MALLA DE ARCOS CAL 8	1	JUEGO	NORMANDIA
16	21/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	3000	KILOS	VILLA DE LOS SAUCES
17	21/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	50	KILOS	HAYUELOS F5
18	21/03/2025	BEPE	ARENA SILICE	50	KILOS	HAYUELOS F5
19	21/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	2000	KILOS	HAYUELOS F6
20	21/03/2025	ACEN AGROPECUARIO DE LA SAB	FERTILIZANTE 151515	100	KILOS	ALQUERIA NATURAL
21	21/03/2025	ACEN AGROPECUARIO DE LA SAB	FERTILIZANTE 181818	100	KILOS	ALQUERIA NATURAL

III. OBSERVACIONES


IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 28

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

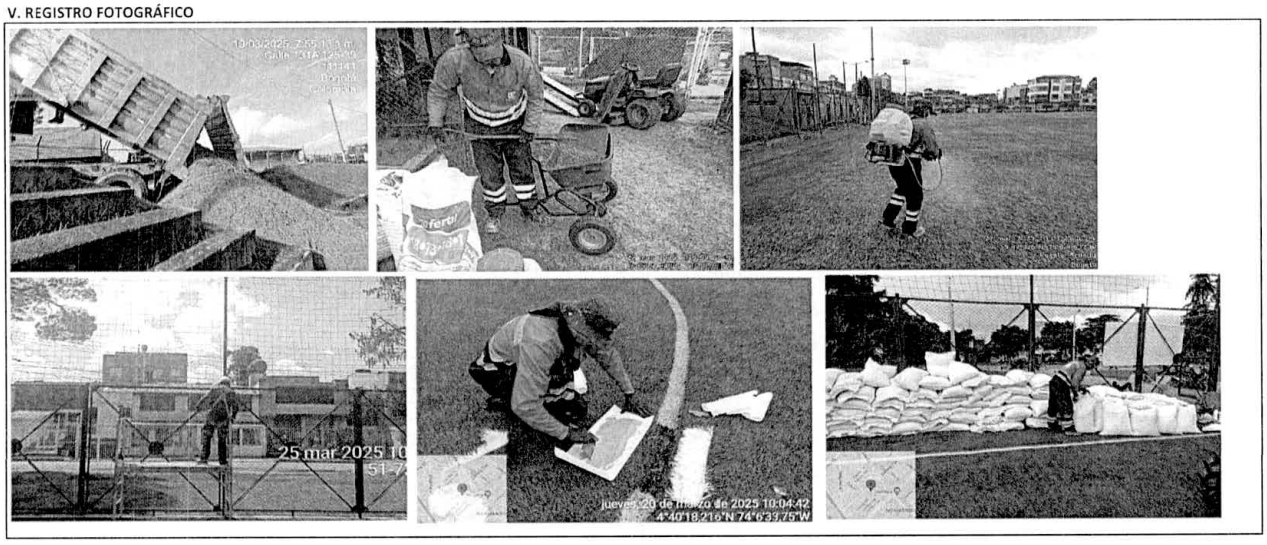

CONSORCIO INNOVAPARQUES	REPORTE SEMANAL INGRESO DE MATERIALES A CAMPOS DEPORTIVOS	Codigo:	PS-F-08
		Version:	1
		Fecha:	20/11/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DEL REGISTRO	28 de Marzo de 2025
RESPONSABLE	Daniel Sabogal
PERIODO	Del 24 al 28 de Marzo de 2025

II. DETALLE DEL MATERIAL

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CAMPO DEPORTIVO
1	26/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	2	ML	HAYUELOS F5
2	26/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	HAYUELOS F5
3	26/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	2	ML	HAYUELOS F5
4	26/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	HAYUELOS F8
5	26/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	3	ML	HAYUELOS F8
6	26/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	5000	KILOS	HAYUELOS F8
7	27/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	CAUCHO GRANULAR	1000	KILOS	LOMBARDIA
8	27/03/2025	CUPERZ	GRAMA MONOFILAMENTO	6	ML	LOMBARDIA
9	27/03/2025	SELLECO	PEGANTE BICOMPONENTE	1	CANECA	LOMBARDIA
10	27/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	CINTA DE UNION	6	ML	LOMBARDIA
11	28/03/2025	ACEN AGROPECUARIO DE LA SAB	FERTILIZANTE 151515	150	KILOS	GAITANA NATURAL
12	28/03/2025	ACEN AGROPECUARIO DE LA SAB	FERTILIZANTE 181818	150	KILOS	GAITANA NATURAL

III. OBSERVACIONES


IV. FIRMA APROBACIÓN

JUAN MANUEL SABOGAL
CONTRATISTA - CMC

RAUL ORLANDO DELGADO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA TERESA 28

EDWIN JAVIER LINARES GARCIA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INNOVAPARQUES

V. REGISTRO FOTOGRÁFICO

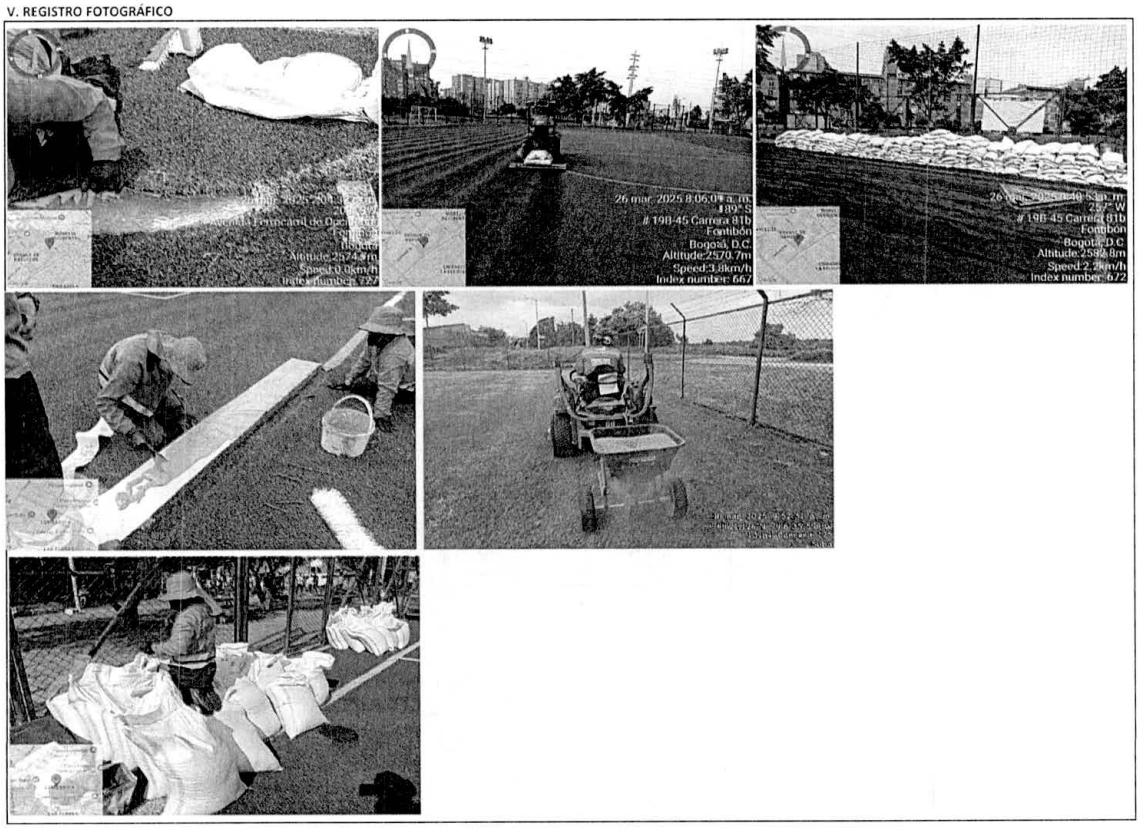

3.3. INSTALACION DE MATERIALES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.	
Fecha de Verificación:	06/03/2025
Ubicación:	PARQUE El Carmelo F11
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	DEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL
Nro de Lote Instalado	24M32L-E81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	LUPERZ	Material del Cesped	Monofilamento Polietileno
Color del Césped:	VERDE/BLANCO	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		SI	
Compactación de la Base:		SI	
Pendientes para Drenaje:		SI	
Verificación de Drenaje Adecuado:		SI	
Tipo de Base Utilizada:		SI	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		SI	
Unión de Paños (Costuras):		SI	
Pegado de Costuras:		SI	
Fijación a la Base:		SI	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		SI	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		SI	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Lineas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	06/03/2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO MIO PARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.	
Fecha de Verificación:	11-03-2025
Ubicación:	PARQUE VILLAS DE MADRIGAL
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Berral
Tipo de uso del césped:	DEPORTIVO /AMPO DE FUTBOL
Nro de Lote instalado	24N322 - E87AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	CUPERZ	Material del Cesped	MONOFILAMENTO POLIETILENO
Color del Césped:	VERDE/BLANCO	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		SI	
Compactación de la Base:		SI	
Pendientes para Drenaje:		SI	
Verificación de Drenaje Adecuado:		SI	
Tipo de Base Utilizada:		SI	

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		SI	
Unión de Paños (Costuras):		SI	
Pegado de Costuras:		SI	
Fijación a la Base:		SI	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		SI	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:			

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Berral
Fecha de Aprobación: [Fecha]	11/03/2025
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	11/03/2025
Ubicación:	PARQUE FLORENCIA TRONQUITOS
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	DEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL
Nro de Lote instalado	24N32L - C81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	CUPED2	Material del Cesped	MONOFILAMENTO POLIETILENO
Color del Césped:	Blanca	Altura de las fibras: [Medida en cm)	

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		SI	
Compactación de la Base:		SI	
Pendientes para Drenaje:		SI	
Verificación de Drenaje Adecuado:		SI	
Tipo de Base Utilizada:		SI	
4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		SI	
Unión de Paños (Costuras):		SI	
Pegado de Costuras:		SI	
Fijación a la Base:		SI	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		SI	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:			

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	11/03/25
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO PARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	11/03/2025
Ubicación:	PARQUE EUROPA F5
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportivo campo de Futbol
Nro de Lote instalado	24N32L - E81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca		**Material del Cesped**	Monofilamento Polietileno
Color del Césped:	Blanco	**Altura de las fibras:** [Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	**Adecuada Si/No**	**Observaciones**
Nivelación del Terreno:		SI	
Compactación de la Base:		SI	
Pendientes para Drenaje:		SI	
Verificación de Drenaje Adecuado:		SI	
Tipo de Base Utilizada:		SI	
4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	**Correcto Si/No**	**Observaciones**
Colocación del Césped:		SI	Pegue Grama demarcación
Unión de Paños (Costuras):		SI	
Pegado de Costuras:		SI	
Fijación a la Base:		SI	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		SI	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		SI	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	**Si/No**	**Observaciones**
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Lineas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario): Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	11/03/25
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO NUEVOSPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	22/03/2025
Ubicación:	Parque Villa de las Rocas
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportivo campo de futbol
Nro de Lote instalado	24N322 - E51AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cuperz	Material del Cesped	Monofilamento-Polietileno
Color del Césped:	Blanco/verde	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:	X		

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:	X		Pegue de grama existente
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:	X		
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:	X		Pegue de grama existente

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)			
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)			
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)			
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)			

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Si, no]			
Líneas de Marcado: (correcta)			
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)			
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)			
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada			

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	22/03/25
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO NUEVO PARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto.	
Fecha de Verificación:	26-03/2025
Ubicación:	Parque Hayuelos F5
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportivo Campo de futbol
Nro de Lote instalado	24 N 326 - E5 + A3

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Luperz	Material del Cesped	Monofilamento Polietileno
Color del Césped:	Blanco	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:			

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:		Si	
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:		Si	
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:		Si	

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		OK	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		OK	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		OK	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		OK	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		OK	
Líneas de Marcado: (correcta)		OK	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		OK	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		OK	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		OK	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	26/03/25
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO TINTO ZARAGUEY	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	3
		Fecha:	17/02/2025

1. Información General del Proyecto:	
Fecha de Verificación:	26-03-2025
Ubicación:	Parque Huyuelos F8
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Tipo de uso del césped:	Deportivo Campo de futbol
Nro de Lote instalado	24N32L - E81AB

2. Detalles del Césped Sintético:			
Marca	Cupiz	Material del Cesped	Monofilamento Polietileno
Color del Césped:	Verde/Blanco	Altura de las fibras: [Medida en cm)	6.

3. Condiciones de la Superficie Base:			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Nivelación del Terreno:		Si	
Compactación de la Base:		Si	
Pendientes para Drenaje:		Si	
Verificación de Drenaje Adecuado:		Si	
Tipo de Base Utilizada:	X		

4. Proceso de Instalación del Césped:			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Colocación del Césped:	X		Pegue grama verde existente
Unión de Paños (Costuras):		Si	
Pegado de Costuras:		Si	
Fijación a la Base:	X		
Nivel de Tensión del Césped (sin arrugas o pliegues):		Si	
Alineación y Corte Preciso en los Bordes:	X		Pegue grama verde existente

5. Instalación de Relleno (si aplica):			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Tipo de Relleno Utilizado: [Caucho)		Ok	
Cantidad de Relleno Aplicado: [Suficiente)		Ok	
Distribución Uniforme del Relleno: [Uniforme)		Ok	
Altura del Relleno Respecto a las Fibras: [Adecuado)		Ok	

6. Verificación de Seguridad y Calidad:			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Superficie Segura y Nivelada (sin hundimientos o bultos):[Sí, no]		Ok	
Líneas de Marcado: (correcta)		Ok	
Verificación de Costuras (sin bordes levantados): (correcta)		Ok	
Libre de Objetos Extraños o Residuos: (correcta)		Ok	
Verificación de Impacto/Absorción (si es necesario):Adecuada		Ok	

7. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	26/03/25
8. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	07-03-25			
Ubicación:	Suba Cafam Gaviotas			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7.70 x 2,4 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		07/03/25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	08-03-25			
Ubicación:	Carmelo F11			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetro			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	~	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Integral	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	215.25 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	X		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		08-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	20-03-25			
Ubicación:	Carmelo FII			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Norte - Sur			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224 - 027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Ldg

2. Detalles de las redes			
Marca	Inventario	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	7.30 x 2.50 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si.	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si.	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		20-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	20-03-25			
Ubicación:	Carmelo F8			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Penmetro			
Nro de certificado de calidad del Hilo	12741-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzado	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	02.50 m2

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si.	
Estado de cuerdas o amarres		Si.	
Presencia de Roturas en la malla		No.	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si.	
Estado de sistema de fijacion		Si.	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	x		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	x		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		20-08-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-03-25			
Ubicación:	Carmelo F8			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Norte- Sur			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Jug

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzado	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	5 x 2.10 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Ok
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		24-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	20-03-25			
Ubicación:	Villas del Madrigal			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occ. - Occi - N - S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Inazcco	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	NA	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	101 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		20-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVADARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	20-03-25			
Ubicación:	Villas del Madrigal			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occ - Ont			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	X

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	5 x 2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		20-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	21-03-25			
Ubicación:	Florencia Tranquilos			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Nort - Sur			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1724-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	x	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzado	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medica en m.) Alto por Ancho	199,50 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	x		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	x		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		21-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-03-25			
Ubicación:	Florencia, Tranquilos			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occ - Occ			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	Ny.

2. Detalles de las redes			
Marca	Irenaceda	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	5 x 2 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		24-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-03-25			
Ubicación:	La Europa FS			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Perimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	ok	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Inertaco	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	122.50 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		OK	
Estado de cuerdas o amarres		OK	
Presencia de Roturas en la malla		NO	
Tension de la Red		OK	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		OK	
Estado de sistema de fijacion		OK	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	X		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	X		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	24-03-25
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO UNIOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	24-03-25			
Ubicación:	La europa F5			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Nor - Sur			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1 Jg

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenzacc	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3x 2m F5

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	OK
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		24-08-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	25-03-25			
Ubicación:	Normandia			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-027			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	1 Jgo

2. Detalles de las redes			
Marca	Tenaco	Material de la Red	Nylon #8
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	7 x 2.50 mts

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		25-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	25-03-25			
Ubicación:	Barranquilla			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	Occ - Occ			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1224-037			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.) Alto por Ancho	95 m²

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		

6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	Oscar Mauricio Acevedo Bernal
Fecha de Aprobación: [Fecha]	25-03-25
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:	
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]	
Fecha de Aprobación: [Fecha]	

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	26-03-25			
Ubicación:	Marsella FS			
Inspector que verifica	Oscar. Mauricio Acevedo Bernal			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	N-S			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1724-023			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO		ARCOS PORTERIA	2 Jg.

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #4
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: [Medida en m.] Alto por Ancho	3x2 mts.

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.		No	
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?		Si	Cumple
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Bernal	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		26-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

CONSORCIO INNOVAPARQUES	VERIFICACION INSTALACION MATERIALES	Codigo	PS-F-11-M
		Version	1
		Fecha:	20/11/2024

1. Información General del Proyecto:				
Fecha de Verificación:	26-03-25			
Ubicación:	Marsella FS			
Inspector que verifica	Oscar Mauricio Acevedo Beltral			
ubicación Porteria : (Norte , Sur , Occ, Occi)	1274-037 Pesimetral			
Nro de certificado de calidad del Hilo	1274-032			
Uso de la malla (marque una x)	CERRAMIENTO	X	ARCOS PORTERIA	

2. Detalles de las redes			
Marca	Trenzacol	Material de la Red	Nylon #2
Tamaño de la malla	N/A	Dimensiones de la red: (Medida en m.) Alto por Ancho	194, m^2

3. Condicion de la Red instalada			
	No aplica	Adecuada Si/No	Observaciones
Condicion General:		Si	
Estado de cuerdas o amarres		Si	
Presencia de Roturas en la malla		No	
Tension de la Red		Si	
4. Fijacion de la Red a la Porteria			
	No aplica	Correcto Si/No	Observaciones
Sistema de Fijacion		Si	
Estado de sistema de fijacion		Si	
Presencia de espacios libres o zonas sueltas en la union a la porteria.	N/A		
5. Seguridad y Funcionalidad			
	No aplica	Si/No	Observaciones
Posibles Riesgos (enganches, roturas peligrosas, etc.)		No	
Altura y Cobertura Completa de la Red (sin espacios por donde pase el balón) cumple?	N/A		
6. Aprobación y Firma CONTRATISTA:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]		[signature]	
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]		Oscar Mauricio Acevedo Beltral	
Fecha de Aprobación: [Fecha]		26-03-25	
6. Aprobación y Firma INTERVENTOR:			
Firma del Inspector o Ing Residente:[Firma]			
Nombre del Inspector o Ing Residente: [Nombre]			
Fecha de Aprobación: [Fecha]			

4. ANEXO C
ACTAS DE COMITÉ

ACTA DE COMITÉ NRO.	FECHA DE REUNIÓN	COMPROMISOS	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
15	6/03/2025	Subsanación informe de improviso	Abierto	12/03/2025
		Subsanación NP´S	Compromiso cumplido	
		Entrega imprevistos de enero	Abierto	
		Actualización del plan de adquisiciones	Abierto	
		Subsanacion del plan de inspeccion y equipos	Compromiso cumplido	
		Realizar el reporte de ingreso de material	Compromiso cumplido	
		Presentar enayos de arena y calidad-febrero	Compromiso cumplido	
		Subsanación informe SST	Abierto	
		Entrega programación definitiva de las canchas priorizadas	Abierto	
		Entrega cronogramas de marzo	Compromiso cumplido	
ACTA DE COMITÉ NRO.	FECHA DE REUNIÓN	COMPROMISOS	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
16	12/03/2025	Subsanación de informe de imprevistos	Abierto	20/03/2025
		Subsanación de NP´S	Compromiso cumplido	
		Entrega de imprevistos de enero	Abierto	
		Actualización del plan de adquisiciones	Compromiso cumplido	
		Entrega informe de calidad febrero	Compromiso cumplido	
		Presentar ensayos de arena y silice según especificaciones	Compromiso cumplido	
		Entrega de la programación definitiva de canchas priorizadas	Abierto	
		Remision informe tecnico febrero	Compromiso cumplido	
ACTA DE COMITÉ NRO.	FECHA DE REUNIÓN	COMPROMISOS	SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUIMIENTO
17	20/03/2025	Subsanación de informe de imprevistos		
		Entrega de imprevistos de enero		
		Entrega de programación definitiva de campos priorizados		

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN:	COP 4041/24 CIN 4080/24	DD	MM	AA
ACTA No. 15	Comite de Seguimiento #15		06	03	2025

LUGAR: Recorrido - Varios Parques HORA DE INICIO: 8:30 am HORA FIN: 1:30pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia.		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos	4.
2.	5.
3.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados:
   1.1. Subsanación de informes de imprevistos
   - No se cumplió.
   1.2 Subsanación NP's:
   - Se va a realizar mesa de trabajo
   1.3 Entrega del informe de imprevisto de enero
   - No se cumplió.
   1.4. Subsanación del plan de adquisiciones
   - No se cumplió.
   1.5. Subsanación del plan de inspección y ensayos.
   - No se cumplió.
   1.6 Realizar el reporte de ingreso del material.
   - No se cumplió.
   1.7 Presentar resultados de ensayos de arena y caucho que muestra el cumplimiento de las especificaciones IDRD
   - No se cumplió

TEMAS TRATADOS

1.8. Entrega del informe de Calidad de febrero.
- No se cumplió.

2. Componente tecnico.
- Avance:
  - Programado: 58,75%
  - Ejecutado: 55,60%
  - Diferencia: 3,15%

- Se realiza recorrido en las diferentes canchas intervenidas

- Alqueria: Sin novedades, el contratista manifiesta que tiene proyectado terminar la intervención en dos semanas.

- Marsella: Sin novedades, el contratista inicia actividades el viernes 7 de marzo.
  - El Presupuesto del agrotambo está bien y se requiere tamizar la arena para aprobación.
- El Carmelo: - El contratista se encuentra realizando colocación y conformación de capa de caucho sbr.
  - Se realizó la pintada de los arcos, adicionalmente se solicita evaluar la pintura de los parales para el arco de rugby.

- San Andres: - Se realiza inspección de las canchas intervenidas.

- Burgos - Britalia: Se realiza visita y el contratista indica que ya finalizaron actividades.
  - El IDRD indica que la cancha se le realizará entrega formal a la comunidad la proxima semana.

- Se solicita al contratista remitir la entrega de la programación definitiva de las canchas priorizadas a fecha del 06 de marzo.

TEMAS TRATADOS

- La entidad solicita que se incluya dentro de las canchas a intervenir, la cancha de voley playa del Parque La Gaitana, realizando actividades de retovo.
- Se recuerda al contratista que deben remitir la solicitud de la adición lo más pronto posible para iniciar el tramite.

3. Componente ambiental:

- Durante el periodo del reporte el contratista avanza en la ejecución de actividades, teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental como la segregación de residuos, disposición con gestores autorizados, manejo de materiales, entre otras. Con base en lo anterior, se evidencia que el contratista cumple con lo establecido en el plan de manejo ambiental sin presentar novedades.
- Esta semana se han revisado dos versiones del informe mensual, las ultimas observaciones están relacionadas con ajustes en cantidades de materiales, ya que se presentó modificación por parte del contratista por lo que se solicitó aclaración
- Se recibió el informe en versión 3 y entra a revisión.

4. Componente SST:

- Se recibió informe SST N°4, el cual ya fue revisado por la interventoria y se enviaron subsanaciones.

5. Componente Calidad:

- Se solicita atender las observaciones del plan de inspección y ensayos.
- No se ha realizado la actualización del plan de adquisiciones
- Se solicita realizar el reporte semanal de ingreso de materiales.
- Presentar los ensayos de arena y caucho que demuestren el cumplimiento de las especificaciones del IDRD.
- Establecer fecha de entrega del informe de febrero.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación informes de imprevistos	Contratista	12-03-2025
Subsanación NP's	Contratista	Por definir
Entrega imprevistos de Enero	Contratista	12-03-2025
Actualización del Plan de adquisiciones	Contratista	07-03-2025
Subsanación del Plan de inspección y ensayos	Contratista	06-03-2025
Realizar el reporte de ingreso de material	Contratista	06-03-2025
Presentar ensayos de arena y caucho segun especificaciones IDRD	- Contratista	06-03-2025
Entrega del informe de calidad-febrero	Contratista	07-03-2025
Subsanación informe SST	Contratista	06-03-2025
Entrega programación definitiva de las canchas priorizadas	- Contratista	10-03-2025
Entrega Cronograma de marzo	Contratista	06-03-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria.	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Recorrido - Comite de seguimiento #15 COP 4041-24 CIN 4080-24 RESPONSABLE DEL EVENTO

FECHA 06 03 2025 HORA INICIAL 8:30 HORA FINAL LUGAR Varias canchas.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Margarita Herrera Galvis	52539792	Coordinadora proyectos	Interventoria		CST 28	proyectos2@sdiun.com	3143376020
2	Mara Claudia Nahecha Martinez	1121934579	Residente	Interventoria		CST 28	Proyecto12@sdiunsas.com	3102623167
3	ANTONIO ROJAS L.	1010020390	APOYO SUPERV.	STP		IDRD	—	—
4	Sergio Ivan Pedreros G.	1010161283.	Insp. Interv.	Interventoria.		CST 28	proyectos2@sdiunsas.	3162393759.
5	Jhony Forney Diaz Daza	1013632556	Inspector Obra	C. Innovaparques		C Innovaparques	consorcioinnovaparques@gm	3047586215
6	Carol Giselle Lopez	1022443543	Inspector obra	C. Innovaparques	Carol Lopez	C Innovaparques	—	3108018211
7	Oscar Mauricio Acevedo	1154713000	Inspector obra	C. Innovaparques		C. Innovaparques	oacevedo645@gm.com	3112296601
8	Keidy Mayeli Cortés Roto	1192725099	Apoyo contratista	C. Innovaparques	Keidy Cortés	C. Innovaparques	consorcioinnovaparques34@gmail.com	3112542461
9	Edwin Javier Linares Garcia	1093623379	director obra	C. Innovaparques		C. Innovaparq.	consorcio innova parques 34 @ gmail. com	3142513089
10	Brayan S. Garcia	1022488588	RESIDENTE	C. INNOVAP		C. INNOVAPAR	CONSORCIOINNOVAPARQUES@gmail.com	3147181601.
11	Cristhian Correa Noriega	1020737915	Agronomo	STP		IDRD	cristhian.correa@idrd.gov.co	3017387474
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

GESTION DOCUMENTAL- V.5

b3n

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comite de seguimiento #16 CIN 4080/24 COP 4041/24	DD	MM	AA
ACTA No. 16		12	03	2025

LUGAR: Administración de escenarios HORA DE INICIO: 9:00 HORA FIN: 10:00

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revisión de compromisos	4. Componente Calidad
2. Componente Tecnico	5. Componente SST
3. Componente Ambiental	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados:
   - 1.1 Subsanación de informes de imprevistos.
     - No se cumplió.
   - 1.2 Subsanación NP's
     - Por definir reunion entre interventoría y contratista.
   - 1.3 Entrega de imprevistos de enero
     - No se cumplió.
   - 1.4 Actualización del plan de adquisiciones.
     - No se cumplió.
   - 1.5 Subsanación del plan de inspección y ensayos.
     - Se cumplió.
   - 1.6 Realizar el reporte de ingreso del material
     - Se cumplió
   - 1.7. Presentar ensayos de arena y silice segun especificaciones.
     - En revisión
   - 1.8. Entrega del informe de calidad de febrero
     - No se cumplió.

TEMAS TRATADOS

1.9 Subsanación informe SST
- Se cumplió
1.10 Entrega programación definitiva de las canchas priorizadas.
- No se cumplió.
1.11 Cronograma de marzo.
- Se cumplió.

2. Componente Tecnico:
- El contratista realiza presentación de las priorizaciones y el balance de las canchas intervenidas y presentes para intervenir, al igual que el balance presupuestal.
- Avance de obra:
  - Programado: 61,74%
  - Ejecutado: 58,31%

- El Contratista realiza socialización de la necesidad de la adición del contrato, para lograr ampliar la cantidad de cancha, intervenidas, teniendo en cuenta las canchas que no se alcanzarian a incluir en el contrato a la fecha.

- Se solicita al contratista ajustar la programación, conforme los escenarios que se están interviniendo a la fecha.

3. Componente ambiental:
- El contratista indica que en la cancha de Marsella hizo presencia unos alcaravanes y pusieron huevos, razon por la cual se puso cerramiento para protegerlos y se informó al veterinario del IDRD, para verificar el manejo que se debe dar con acompañamiento de la secretaria de ambiente.
- Durante el periodo del reporte se realiza la revisión del informe ambiental 4 en su versión 2, el cual se devuelve al contratista con observaciones, especificamente por el cambio en

TEMAS TRATADOS

las cantidades de materiales consolidados para los meses de ejecución.
- Respecto a la implementación de medidas de manejo ambiental, se verifica que el contratista avanza con normalidad en el desarrollo de las medidas de segregación en la fuente de residuos, manejo de sustancias químicas, acopio de materiales, entre otras.
- A la fecha de corte ya se encuentra aprobado el informe del contratista

4. Componente Calidad:
- Se da aprobación a plan de inspección y ensayos V.5 para implementarlo en obra.
- No se ha realizado entrega del informe de febrero.
- No se han presentado ensayos de gránulo de caucho y arena de silice que presente cumplimiento de especificación.
- No se ha presentado la actualización del plan de adquisiciones.

5. Componente SST:
- Se recibió y aprobó el informe SST # 4 por parte del contratista
- Se recibió documento de ingreso del personal operativo.

2. Componente Técnico:
- Para los arcos de la cancha de tronquitos, se va a realizar reconstrucción de los existentes.
- Para la arena de los campos naturales, la aprobación se dará con los agrónomos.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación de informe de imprevistos	Contratista	11/03/2025
Subsanación de NP's	Contratista	11/03/2025
Entrega de imprevistos de enero	Contratista	11/03/2025
Actualización del plan de adquisiciones	Contratista	12/03/2025
Entrega informe de calidad febrero	Contratista	12/03/2025
Presentar ensayos de arena y silice segun especificaciones	Contratista	En revisión.
Entrega de la programación definitiva de cuadras priorizadas	Contratista	13/Marzo/2025
Remisión informe técnico Febrero	Contratista	12/Marzo/2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de seguimiento No. 16 COP 4041/24 CIN 4060/24 RESPONSABLE DEL EVENTO

FECHA 12 03 2025 HORA INICIAL 9:00am HORA FINAL LUGAR IDRD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Mana Claudia Mahecha Martinez	1121934579	Residente	interventoria		CST28	proyectos2@soluciones	3102623167
2	Jesús Alberto Gonzalez Olmos	1043029752	Apoyo a Res.	Interventoría		CST28	"	3103483207
3	Brayan Stiven García García	1094383768	RESIDENTE	INTERVENTORÍA		CONSORCIO INNOVAPAISAJES	consorcioinnovapaisajes	3173181601
4	Keidy Mayerli Cortés Roto	1192725099	Apoyo contratista	Contratista		consorcio innovapaisajes	consorcio innovapaisajes 24@gmail.com	3112542461
5	Oscar Velasquez	79909768	Rep legal	Contratista		C		3172513679
6	Javier Zimbra G.	1013623379	Director	Contratista		C. innovapaisajes	C. innovapaisajes	3172513679
7	JORGE MADERO G.	PAA7228	INTERVENTOR	STP				
8	Margarita Ferrera Galvis	52539792	Coordinadora proyectos.	INTERVENTORIA		CST 28	proyectos2@sdom.sas	3143396020
9	Liliana Paola Barbosa	52690947	Apoy Supervi	Contratista		IDRD	liliana.barbosa@idrd.gov.co	3203409620
10	Sergio Ivan Pedreros G.	1010161283	Insp. Interv.	Interventoria.		CST028	proyectos2@soluciones.com	3162393759
11	Diego Andres Gale F.	1019049949	Insp. Interv.	Interventoria	Diego Gale	CST 28	proyectos2@soluciones.com	—
12	ANTONIO ROJAS L.	1010020390	CONTRATISTA	STP		IDRD	—	—
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

404

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comite de seguimiento #17 COP 1021-24 CINACEO-24	DD	MM	AA
ACTA No.		20	03	2025

LUGAR: IDRD - Administración escenarios HORA DE INICIO: 9:00 am HORA FIN: 9:30 am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Se anexa listado de asistencia		

ORDEN DEL DIA

1. Revision de compromisos pactados.	4. Componente ambiental.
2. Componente técnico.	5. Componente SST.
3. Componente Calidad.	6.

TEMAS TRATADOS

1. Revisión de compromisos pactados.

1.1 Subsanación informes de imprevistos:

- No se cumplió.

1.2 Subsanación NP's.

- Se llevó a cabo reunión entre Contratista e Interventoría.

1.3. Entrega de imprevistos de enero:

- No se cumplió.

1.4. Actualización del plan de adquisiciones.

- Se cumplió.

1.5 Entrega de informe de calidad de febrero.

- Se cumplió.

1.6 Presentar ensayos de arena y silice segun especificaciones IDRD.

- Se cumplió.

1.7 Entrega programación definitiva de campos priorizados.

- No se cumplió.

1.8. Remisión del informe técnico de febrero.

- Se cumplió.

TEMAS TRATADOS

2. Componente Técnico:
- Avance de obra:
  Programado: 66,02 %
  Ejecutado: 62,10 %

- El contratista debe remitir carta de compromiso, donde indique q' una vez sea firmada la adición del contrato y se realicen las priorizaciones, hará entrega del cronograma.

- Se avanzó en Florencia - Tronquitos, Europa y Villas de Madrigal. Pendiente arcos y mallas de los arcos, que se harán esta semana

- La entidad solicita que durante las actividades de mantenimiento en las canchas, estas permanezcan cerradas hasta que se terminen las intervenciones y el campo no se habilite, y solo se abre hasta que se reciba por parte de la interventoría. Para informar a la comunidad, se debe instalar letrero indicando que se encuentra en mantenimiento.

- Se avanzó en rotovo de la UDS: Softbol, beisbol, voleibol y complejo acuatico y PRD.
- Se avanzó en Alqueria y Gaitana.

3. Componente Calidad:
- El contratista remite documentación de los compromisos y se encuentra en revisión.
- Se solicita entrega de listado de ingreso de materiales semanal para trazabilidad.

4. Componente Ambiental:
- Durante el periodo de reporte se lleva a cabo la revisión del informe ambiental 4 remitido por el contratista, evidenciando que se dio alcance a la totalidad de observaciones realizadas,

TEMAS TRATADOS

Finalmente aprobado.

- Se verificó que el contratista mantiene las medidas de manejo relacionadas con el manejo de residuos, acopio de materiales y aseo de la obra.
- Adicionalmente durante el periodo se recibió reporte del contratista, informando la presencia de un nido activo de la especie Vanellus chilensis (Alcaraván), a partir de lo cual se le recomendó dejar el nido en el lugar para evitar interrumpir el proceso, permitiendo así la eclosión y el desarrollo de los polluelos en el lugar hasta el inicio de vuelo de los parentales.

5. Componente SST:

- Durante la semana se valida personal operativo aprobado por la interventoría.

COMPROMISOS		
TEMA	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE** PARA SU REALIZACIÓN
Subsanación informes de imprevistos	Contratista	20-Marzo-2025
Entrega de imprevistos de enero	Contratista	20-Marzo-2025
Entrega de programación definitiva de campos priorizados	Contratista	20-Marzo-2025

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA	Diego Gale	
NOMBRE		NOMBRE	Diego Andres Gale	
CARGO		CARGO	Inspector Interventoria	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Diego Andres Gale.

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA

EVENTO: Comite de seguimiento # 17 COP 4041-24 CIN 4080-24 RESPONSABLE DEL EVENTO

FECHA 20 03 2025 HORA INICIAL 9:00 HORA FINAL LUGAR IDRD - Administración de Escenarios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
						ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Maria Claudia Mahecha Martinez	1121434579	Residente	interventoria		CST 28	proyectos2@solunsas.com	3107623167
2	Sergio Ivan Pedreros G.	1010161283	Inspector	Interventoria		CST 28	proyectos2@sdiunsas	3162393759
3	Margarita Herrera Galvis	52539792	Coordinador proyectos	Interventoria		CST 28	proyectos2@solunsas	3143396020.
4	Keidy Mayerli Cortés Roto	1192725099	APOYO contratista	Contratista		consorcio innovaparques	consorcioinnovaparques24@gmail.com	3112542461
5	Brayan Stiven García	1024488858	Residente	CONTRATISTA		CONSORCIO INNOVAPARQUES	" " "	3117181601
6	Javier Andres Parra	1013603371	Director.	Contratista		C. Innovaparques	" " "	3142513079.
7	Liliana F. Barbosa B	52690947	Arq. Apoyo Sup	STP - IDRD		IDRD	liliana.barbosa@idrd	3203409620
8	Antonio Rojas	1010020390	Contratista	STP - IDRD		IDRD	—	—
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/normativa/politicas-lineamientos-manuales

bbh

5. ANEXO D
CONTROL DE DOCUMENTOS

CONSORCIO INNOVAPARQUES	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS	CÓDIGO	HSEQ-F-38
		VERSIÓN	1
		FECHA	26/11/2024
	Fecha de actualización del contenido del registro:		25/04/2025

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS						CONTROL DE REGISTROS			
ID	Documento	Código	Versión	Fecha de Revisión	Entregado a:	Almacenamiento protección	Recuperación	Retención	Disposición
	GESTIÓN SG SST								
1	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	C-CA-SGSST	0	7/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
2	Política Integral de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad	PL-SST-01	2	24/5/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
3	Cronograma actividades ambientales	F AMB-1	0	12/12/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
4	Matriz Legal MA	M AMB-12	1	11/12/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
5	Matriz de Aspectos e Impactos ambientales	M AMB-13	1	12/12/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
6	Lista de asistencia	FT-SST-03	1	25/11/2022	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
7	Inspeccion ambiental de obra	AMB-FO.001	0	12/12/2022	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
8	Bitacora de residuos peligrosos y electrónicos	F AMB-8	1	15/9/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
9	Procedimiento para atencion de derrames	PR-MA-03	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
10	Plan de manejo ambiental	PR-MA-02	1	12/12/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
11	Informe ambiental	IN-MA-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
12	Politica prevencion de acoso laboral	PL-SST-03	2	27/5/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
13	Politica de prevencion del consumo de alcohol, drogas y tabaco	PL-SST-02	2	24/5/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
14	Matriz legal SST	MT-SST-03	1	15/6/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
15	Plan de trabajo anual SG-SST	FT-SST-05	1	10/5/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
16	Formato inspección y control de extintores	FT-SST-21	1	17/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
17	Inspección y control botequines	FT-SST-24	1	17/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
18	Matriz de peligros y riesgos SST	MT-SST-01	1	15/7/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
19	Matriz de elementos de protección individual	MT-SST-13	1	2/9/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
20	Conformación de COPASST	FT-SST-04	1	24/11/2020	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
21	Conformación del comité de convivencia laboral	FT-SST-06	1	25/11/2020	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
22	Reglamento H&S	DG-SG-06	1	9/6/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
23	Matriz de capacitaciones	FT-TH-14	1	20/8/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
24	Perfiles de cargo	FO-TH-004	3	4/6/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
25	Objetivos y metas SST	SG-SST-01	2	27/5/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
24	Formanto de inducción y reinducción	FT-SST-07	1	24/7/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
25	Perfil socio demográfico	MT-SST-16	1	10/5/2022	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
26	Programa de estilo de vida saludable	PG-SST-01	1	5/10/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
27	Profesiograma	MT-SST-21	1	16/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
28	Procedimiento para la atención, reporte e investigación de accidentes de trabajo	PR-SST-02	1	23/7/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
29	Reporte de investigación de acodente e insidentes de trabajo	FT-SST36	1	27/9/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
30	Indicadores del SG-SST	MT-SG-08	0	1/8/2020	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
31	Procedimiento trabajo seguro de alturas	PR-SST-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
32	Permiso de alturas	SG-FO-24	2	25/3/2020	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
33	Programa de auditoria interna y externa	PR-SST-15	01	17/9/2021	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
34	Informe mensual SST	IN-SST-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL SG SST	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	20 años	Destruccion
	GESTION AMBIENTAL								
1	Plan de Manejo Ambiental	PR-MA-02	1	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES	F AMB-1	0	12/12/2022	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
3	LISTA DE ASISTENCIA	FT-SST-03	1	25/11/2021	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
4	MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	F -AMB-2	0	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
5	MATRIZ LEGAL AMBIENTAL	F -AMB-3	0	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
6	BITACORA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ELECTRICOS	F -AMB-4	0	12/12/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
7	INSPECCION AMBIENTAL	F -AMB-5	0	12/12/2022	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
8	Procadimiento en Caso de Derrame	PR-MA-03	1	11/11/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
9	Programa de Manejo Ambiental RCD	PR-SST-01	1	11/11/2024	PROFESIONAL AMBIENTAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
	GESTION SOCIAL								
1	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	GS-M-01	2	10/12/2024	PROFESIONAL SOCIAL	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion

SO1

CONSORCIO INNOVAPARQUES	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS	CÓDIGO	HSEQ-F-38
		VERSIÓN	1
		FECHA	26/11/2024
	Fecha de actualización del contenido del registro:		25/04/2025

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS						CONTROL DE REGISTROS			
ID	Documento	Código	Versión	Fecha de Revisión	Entregado a:	Almacenamiento protección	Recuperación	Retención	Disposición
PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
1	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	TR-M-01	2	9/01/2025	ESPECIALISTA DE TRANSITO	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
2	CONTROL DE CORRESPONDENCIA	RH-F-16-E	1	13/10/2021	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
3	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	PS-F-06	5	3/03/2025	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
4	MATRIZ DE ADQUISICIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
5	Control de materiales con Certif. Conformidad	PS-F-05	1	28/04/2021	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
6	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS	CO-P-01	1	15/11/2024	COMPRAS	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
7	CONTROL PROPIEDAD DEL CLIENTE	PS-F-07	1	19/12/2012	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
8	REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA	HSEQ-F-06	3	16/02/2022	CALIDAD	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
9	PROGRAMA DE AUDITORIAS	HSEQ-F-08	1	10/04/2027	CALIDAD	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
10	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS Y EXTERNOS	HSEQ-F-38	1	26/11/2024	CALIDAD	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
11	PLAN DE CALIDAD	HSEQ-P-01	2	27/11/2024	CALIDAD	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
12	PLAN DE TOPOGRAFIA	TR-M-02	1	16/12/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
13	PLAN DE GEOTECNIA	TR-M-03	1	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
14	PLAN DE SERVISICIOS PUBLICOS	TR-M-04	1	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
15	PLAN ESTRUCTURAL	TR-M-05	2	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
16	PLAN HIDROSANITARIO	TR-M-06	2	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
17	PLAN SUDS - Grupo 1, Gramas	TR-M-07	2	11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
18	Plan de construccion y coordinación logistica	TR-M-08	2	12/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
19	Registros de cantidad de Materiales	PS-F-09	3	17/02/2025	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
20	Formato de verificacion instalaciones	PS-F-11	1	20/11/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por version	5 años	Destruccion
21	Oferta economica	LP-SG-IDRD-017-2024	0	17/09/2024	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por fecha y Version	5 años	Destruccion
22	Programacion	N/A	4	5/02/2025	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por fecha y Version	6 años	Destruccion
23	Balance	N/A	3	18/03/2025	ING. RESIDENTE	consorcioinnovaparques24@gmail.com	Por fecha y Version	6 años	Destruccion
DOCUMENTACIÓN EXTERNA									
1	Matriz 2 - Riesgos / IDRD	CCE-EICP-FM-118	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	REVISIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PLAN DE GESTIÓN RCD / DRD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA / IDRD	N/A	N/A	N/A	TOPOGRAFO	consorcioinnovaparques24@gmail.com	N/A	N/A	N/A

502

6. ANEXO E
COMPRAS

6.1. VILLAS DEL MADRIGAL

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINIS"RADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTC CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	VILLAS DE MADRIGAL

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		7/01/2025	7/06/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena Blanca Fina	compra	4/03/2025	29/03/2025	BEPE	4140-0325-04
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS NM	
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS NM	
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manquera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manquera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manquera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manquera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manquera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manquera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Trípode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.6ox.6ox.6o) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat./Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra	4/03/2025	29/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	4140-0325-04
	PEGANTE	compra	4/03/2025	29/03/2025	SELECO	4140-0325-2025
	Cinta de union	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	4140-0325-05
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra	4/03/2025	29/03/2025	CUPERZ	4140-0325-05
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en canchas deportivas

REM_4140_INN: 0325-04

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Villas de Madrigal.

FECHA: 11/03/25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Arena Silice.	72	Kilo.	Correctivo
2	Caucho SBR	72	Kilo.	Correctivo.
3	Caucho SBR.	2000	Kilo.	Top dressing.

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____ Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-05.

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Villas de Madrigal

FECHA: 11/03/25.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Grama.	4	M2.	Correc.
2	Pegante Bicomp.	1	Canecu	Correc
3.	Cinta Unión.	20	ML.	Correc
4	Malla Cerramiento.	101	M2	Correc.
5	Malla Arcos C14	1	Juego.	Correc

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____ Recibe: _____

6.2. VILLA DE LOS SAUCES

CONSORCIO INNOVAPARQUES	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	VILLA DE LOS SAUCES

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2026		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrmta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra				
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra	4/03/2025	29/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	REMISION 4140-0325-14
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-14

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Villa de los Sauces

FECHA: 21/03/2025

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	3000.	Kilos	Top dressing

OBSERVACIONES: _____

Entrega: 1.

Recibe: 2.

6.3. TRONQUITOS

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-06.

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Florencia Tronquitos

FECHA: 11/03/25.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	2000	Kilos	Top Dresing
2	Caucho SBR	50	Kilos	Correctivo
3	Arena Silice.	50	Kilos.	Correctivo

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe: x2.

512

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-07.

CLIENTE: INNOVAPARQUES
FECHA: 11/03/25.
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Florencio Tranquitos

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Cinta Unión.	2.60	ML.	
2.	Pegante.	1	Caneca.	
3	Grama Monofilamento	2.60	ML.	Demarcación.
4	Malla Cerramiento	199,5.	M2.	
5.	Mallas Arcos col. 4	1.	Juego.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____ Recibe: _____

513

6.4. NORMANDIA

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	NORMANDIA

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra	4/03/2025	29/03/2025	BEPE	REMISION 4140-0325-11
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS NM	REMISION 4140-0325-13
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS NM	REMISION 4140-0325-13
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/03/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/03/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra	4/03/2025	29/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	REMISION 4140-0325-11
	PEGANTE	compra	4/03/2025	29/03/2025	SELLECO	REMISION 4140-0325-10
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra	4/03/2025	29/03/2025	CUPERZ	REMISION 4140-0325-10
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	REMISION 4140-0325-10
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-10

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 20/03/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Normandia.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama monofilamento	3	ML.	Demarcación
2	Pegante Bicomponente	1	Caroca	
3	Cinta Union.	3	ML	

OBSERVACIONES:

Entrega:

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-11.

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 20/03/2025.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Normandia.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Caucho SBR.	3000	Kilos	Top Dressing
2	Caucho SBR	50	Kilos	Corrección
3	Arena Silice.	50	Kilos	Corrección

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

617

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-13.

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 21/03/2025.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Normadia

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla cerramiento	95	M2.	
2	Mallas Arcos cal 8	1	Juego.	

OBSERVACIONES:_____

Entrega:

Recibe:

6.5. MARSELLA

	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	MARCSELLA

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		7/01/2025	7/06/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena Blanca Fina	compra	04/03/202/	29/03/2025	INVERSIONES LOS J SAS	JM664
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped, sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUIMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra	4/03/2025	29/03/2025		
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra	4/03/2025	29/03/2025		
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra	4/03/2025	29/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	4140-0325-13
	PEGANTE	compra	4/03/2025	29/03/2025	SELLECO	4140-0325-12
	CINTA DE UNION	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	4140-0325-12
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra	4/03/2025	29/03/2025	CUPERZ	4140-0325-12
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-12

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Marsella F5.

FECHA: 20-03-2025

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama Monofilamen	1.	M2.	
2	Pegante Bicomponente	1	Caneca	
3	Cinta Union	1	ML.	
4	Malla Cerramiento	194	M.	
5	Malla Arcos cal 4.	1.	Juego.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____ Recibe: _____

521

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325 - 13.

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 20/03/2025.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Marsella. F 5.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	2000	Kilos	Top Dressing

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

522

6.6. LOMBARDIA

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matríz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	LOMBARDIA

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra				
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/03/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/03/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra	4/03/2025	29/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	REMISION 4140-0325-20
	PEGANTE	compra	4/03/2025	29/03/2025	SELLECO	REMISION 4140-0325-21
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra	4/03/2025	29/03/2025	CUPEFZ	REMISION 4140-0325-21
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	REMISION 4140-0325-21
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-21

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 27/03/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Lombardia.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Grama monofilamento	6	ML.	Demarcación
2	Pegante Bicomponente	1	Caneca.	
3.	Cinta Union.	6.	ML.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

525

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 03-25-20

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 27/03/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Lombardia Doba.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SB.	1000	Kilos	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

6.7. HAYUELOS F8

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	HAYUELOS F8

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra				
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra	4/03/2025	29/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	REMISION 4140-0325-19
	PEGANTE	compra	4/03/2025	29/03/2025	SELLECO	REMISION 4140-0325-18
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	REMISION 4140-0325-18
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-19

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Hayuelos F8

FECHA: 26/03/2025.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	5000	Kilos	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____ Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-18

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 26/03/2025

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Hayuelos F8

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Cinta Unión.	3	ML.	
1	Pegante Bicompon.	1	Caneca	

OBSERVACIONES: Se realizan solo peques sin suministro de grama

Entrega:

Recibe:

530

6.8. HAYUELOS F5

CONSORCIO INNOVAPARQUES	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	HAYUELOS FS

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra	4/03/2025	29/03/2025	BEPE	REMISION 4140-0325-15
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Funqicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra				
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra	4/03/2025	29/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	REMISION 4140-0325-15
	PEGANTE	compra	4/03/2025	29/03/2025	SELLECO	REMISION 4140-0325-17
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra	4/03/2025	29/03/2025	CUPERZ	REMISION 4140-0325-17
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS Y GRAMA	REMISION 4140-0325-17
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-17

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 26/03/2025

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Hayuelos F5.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Grama Monofilamento	2.	ML.	Demarcación
2	Pegante Bicomponente.	1	Caneca	
3	Cinta unión	2	ml.	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: Emilio M.

Recibe: David Sx2.

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-15

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 21/03/25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Hayuelos F5

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Caucho SBR.	2000	Kilos.	Top dressing
2	Arena silice.	50	Kilos	Correctivo
3	Caucho SBR	50.	Kilos	Correctivo

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe:

534

6.9. GAITANA

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	GAITANA

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra	4/03/2025	29/03/2025	INVERSIONES LOS J SAS	REMISION JM854
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra	4/03/2025	29/03/2025	ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA	REMISION 4140-0325-22
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra	4/03/2025	29/03/2025	ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA	REMISION 4140-0325-22
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra				
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra				
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-22

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Gaitana.

FECHA: 28/03/25

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Fertilizante 15 15 15.	150	K/los.	
2	Fertilizante. 18 18 18	150	Kilos	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

6.10. LA EUROPA

CONSORCIO INNOVAPARQUES	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	EUROPA

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra	4/03/2025	29/03/2025	BEPE	REMISION 4140-0325-08
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Funqicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS NM	REMISION 4140-0325-09
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS NM	REMISION 4140-0325-09
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra	4/03/2025	29/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	REMISION 4140-0325-09
	PEGANTE	compra	4/03/2025	29/03/2025	SELECO	REMISION 4140-0325-09
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra	04/03/202/	29/03/2025	CUPERZ	REMISION 4140-0325-03
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	REMISION 4140-0325-09
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-08.

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 11/03/25.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Europa.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Caucho SBR	1500	Kilos.	Top Dressing
2.	Caucho SBR	50	Kilos.	correctivo
3	Arena Silice.	50	Kilos	Correctivo.

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-09

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Europa.

FECHA: 11/03/2025.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Grama monofilamento	1.60	Rl.	Demarcación.
2	Pegante Bicomponente	1	Caneca	
3	Cinta Unión	1.60	Ml	
4	Malla Cerramiento	122.5	Mz.	
5	Malla Arcos cal 4	1	Juego	

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____ Recibe: _____

6.11. CARMELO

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	CARMELO F 11 F 5

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra	4/03/2025	29/03/2025	BEPE	4140-0325-002
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS NM	4140-0325-001
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS NM	4140-0325-001
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra	4/03/2025	29/03/2025	MALLAS NM	4140-0325-001
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra	4/03/2025	29/03/2025	ECO TIRE GREEN SAS	REMISION 4140-0325-002
	PEGANTE	compra	4/03/2025	29/03/2025	SELLECO	REMISION 4140-0325-001
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra	10/03/2025	29/03/2025	CUPERZ	REMISION 4140-0325-001
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra	10/03/2025	29/03/2025	MALLAS Y GRAMAS	REMISION 4140-0325-001
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-002

CLIENTE: INNOVAPARQUES
CONTRATO: 4041-2024
CAMPO DESTINO Carmelo F5 - F11.

FECHA: 05 Marzo / 25.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Arena Silice.	720	Kilos	Correctivo.
2	Caucho SBR.	720	Kilos	Correctivo.
3	Caucho SBR.	7000	Kilos	Top Dressing

OBSERVACIONES: Se entregan. 2000 Kilos de Caucho para cancha F5. y 5000. para la cancha F11 Adicional 720 Kilos para el Correctivo de Grama repuesta.

Entrega: 1015 398839

Recibe:

INGENIERIA CMC S.A.S
Especialistas en campos deportivos

REM_4140_INN: 0325-001

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 04/Marzo/25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Parque el Carmelo.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Grama 60 MM	40	M2.	F11
2.	Pegante Bicomponente.	2.	Canecas.	F11
3.	Cinta Unión.	40	ML.	F11
4.	Malla Cerramiento	215,25	M2	F11
5	Malla Cerramiento	82,5	M2.	F5
6	Mallas de Fulbol 8	1	Juego	F11
7	Malla de Arcos 7 4	1	Juego	F5.

OBSERVACIONES: _____

Entrega: _____

Recibe: _____

6.12. CAFAM SUBA LOS GAVILANES

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	CAFAM GAVILANES

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		7/01/2025	7/06/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena Blanca Fina	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra	4/03/2025	29/03/2025	TITO PABON	4140-0325-003
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guayá+Acc)	compra				
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra				
	PEGANTE	compra				
	Cinta de union	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-003A

CLIENTE: INNOVAPARQUES FECHA: 07-03-25

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Suba Cafam Gaviotas

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1	Malla Arco Cal 8	1	Jgo	Suba Gaviotas

OBSERVACIONES: _____

Entrega: Recibe:

548

6.13. ALQUERIA

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	ALQUERIA

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra	4/03/2025	29/03/2025	INVERSIONES LOS J SAS	REMISION JM762
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra	4/03/2025	29/03/2025	ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA	REMISON 4140-0325-16
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra	4/03/2025	29/03/2025	ALMACEN AGROPECUARIO DE LA SABANA	REMISON 4140-0325-16
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra				
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra				
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra				
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-16

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 22/03/2025

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Alqueria.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Fertilizante 151515.	100	Kilo	
2.	Fertilizante. 181818	100	Kilo	

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe: Jhon Acevedo

551

6.14. CAMPOS NATURALES

CONSORCIO INNOVAPARQUES

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"

Matriz de Adquisiciones

CONTRATISTA	CONSORCO IMNOVAPARQUES
CONTRATANTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD
ALCANCE DEL CONTRATO	"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". Lote 1/grupo 1 CAMPOS DEPORTIVOS, tiene el siguiente alcance: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"
NRO DEL	CONTRATO DE OBRA IDRD CTO / Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024
PERIODO	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
PARQUE	CAMPOS NATURALES

Código EDT	Estructura de la EDT	Tipo de Adquisición	Fechas Estimadas		PROVEEDOR	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL SEGUIMIENTO
			Inicio	Fin		
1	BASES Y RELLENOS		1/12/2024	31/01/2025		
	Grava Trituradas 1" -3/4	compra				
	Arena	compra				
2	MANTENIMIENTO CESPED NATURAL		7/06/2025	7/08/2025		
	Empradización (Cesped,sacapantas, M.O, Herrnta)	compra				
	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	compra				
	FERTILIZANTE ORGANICO TIPO HUMUS (aplicacion)	compra				
	FERTILIZANTE QUÍMICO GRANULADO, FOLIAR Y ORGANICO	compra				
3	DOTACION Y MANTENIMIENTOS		7/05/2025	7/08/2025		
	Estruc. minifutbol con malla (Sum+Inst)	compra				
	Mallas Semiprofes.Cal.4 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Mallas profesionales Cal.8 Futbol (Sumin e Instal)	compra				
	Banderines Estaca+banderin Futbol(Sum+Inst)	compra				
	MallaProtecc.Nylon Imperm.(Andamios+Guaya+Acc)	compra				
4	RED DE RIEGO MANUAL		7/03/2025	7/07/2025		
	Manguera Riego Manual d=3"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=11/2"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=3/4"(Sum+Inst.)	compra				
	Manguera Riego Manual d=1/2"(Sum+Inst.)	compra				
	REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	compra				
	REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	compra				
	REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	compra				
	REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	compra				
	Sumin e Instal Tripode Metalic.para Aspersor H=1.5	compra				
	Aspersor Metalico Bronce Ø=1"(Sum+Instal)"	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø=3/4"(Sum+Instal)	compra				
	Aspersor Metálico Bronce Ø= 1/2"(Sum+Instal)	compra				
	CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	compra				
5	RED DE RIEGO AUTOMATICO		7/03/2025	7/07/2025		
	Tuberia PVCP 3 " RDE 21	compra				
	Tuberia PVC.P d=2"(RDE-21)	compra				
	Tuberia PVC.P d=1.1/2"	compra				
	Tuberia PVCP 1 " RDE 21 excav mec. relleno tie	compra				
	Aspersor Rotor Turbina (Sum+Instal)r=21m**	compra				
	Valvula Selenoide 2" (Sum+Inst)**	compra				
	Controlador Electrón.SistemaRiego Automat.(Sum+Ins	compra				
6	RED DRENAJES		7/01/2025	7/06/2025		
	01 Tuberia drenaje d=200mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	02 Tuberia drenaje d=160mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	03 Tuberia drenaje 4" d=100mm Exca+ relleno Tierr+Geot.	compra				
	04 Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0**	compra				
	05 CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	compra				
	06 TUBERIA NOVAFORT D= 250MM	compra				
7	CAMPOS GRAMA SINTETICA		7/01/2025	7/06/2025		
	05 CAUCHO GRANULADO SBR 0,8 a 2,0mm (Sum+trasiego) Mantenimiento correctivo	compra				
	PEGANTE	compra				
	PINTURA VINILO	compra	4/03/2025	29/03/2025	TITO PABON	4140-0325-003
	02 GRAMA SINT MONOFIL.60MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	03 GRAMA SINT MONOFIL.50MM-FIFAPRinc arena+caucho+ins	compra				
	CINTA	compra				
	04 Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	compra				

INGENIERIA CMC S.A.S

REM_4140_INN: 0325-003

CLIENTE: INNOVAPARQUES

FECHA: 05 /Marzo/2025.

CONTRATO: 4041-2024

CAMPO DESTINO Campos Naturales.

ITEM	DECRIPCION	CANTIDAD	UND	OBSERVACIONES
1.	Pintura Verde T-2	50	Canecas	Canchas naturales

OBSERVACIONES: _____

Entrega:

Recibe: Wilber Jimenez

8. ANEXO F
CERTIFICADOS DE CALIDAD

7.1. VILLAS DEL MADRIGAL

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp, 6):.....111.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s

FIRMA: María Murcia Caracena

557

Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN

Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 2964B.

Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.

Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	200-600 g/m^2 (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A





PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.

Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 2964B, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.

Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.

El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.

Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.

La temperatura mínima para el reticulado es de 5°C. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.

Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.

Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20°C
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s /20°C
Densidad	1.70 g/mL (25°C)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25°C)
Endurecedor	Adiflex 2964B
Proporción mezcla Neopur 2964 : Adiflex 2964B	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25°C; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22°C

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción, pequeñas variaciones scn posibles.
[2] 25°C; 50% hr. Métodc interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30°C.

El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el apl cador sino como referencias orientativas y con valor informativo.

Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

558

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

559

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 95105

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 228 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

560

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3003 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

562

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

FIFA PREFERRED PROVIDER FOOTBALL TURF

EDELGRASS
› edelgrass.com

PREFERRED PROVIDER DE CÉSPED ARTIFICIAL

CERTIFICADO

La FIFA confirma que

Edel Grass B.V.

está catalogado como PREFERRED PROVIDER de césped artificial

Validez :

de 09/01/2023 a 08/01/2025

Queda garantizado el servicio de máxima calidad mediante

- conocimientos complementarios en ingeniería civil (subcapa) y gestión de proyectos (contratista general)
- responsabilidad absoluta en producción, instalación y mantenimiento desde la concepción hasta la finalización
- gran nivel de servicio y desarrollo continuo de productos relacionados con el césped artificial
- experiencia como licenciatario del concepto de calidad de la FIFA con terrenos FIFA recomendad

Gianni Infantino
Presidente de la Fédération Internationale de Football Association

www.FIFA.com/footballturf

565

cuperz
Alfombras Gramas & Pisos

CERTIFICADO DE CALIDAD
FLASHBLADE 1.409 gr

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA FLASHBLADE 1.409 gr			
CRITERIOS	**CARACTERISTICAS**	**NORMA**	**CUMPLIMIENTO**
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO		CUMPLE
TIPO DE FIBRA	RECORTADA	DIN 61151 RECORTADA	CUMPLE
COLOR	VERDE / BLANCO		CUMPLE
GALGA	5/8"		CUMPLE
ALTURA DE FIBRA EN mm.	60		CUMPLE
PESO DE FIBRA g/m2	1409	ASTM 3776	CUMPLE
PESO TOTAL g/M2	2.661	ASTM 3776	CUMPLE
RECUBRIMIENTO SECUNDARIO	LATEX SBR RESISTENTE A LA HUMEDAD		CUMPLE
TELA BASE PRIMARIA	100% POLIPROPILENO TEJIDO	DIN 61151	CUMPLE
COLOR TELA BASE	NEGRO		CUMPLE
ANCHO TOTAL	4 m		CUMPLE
LONGITUD TOTAL	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE		CUMPLE
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO		CUMPLE
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	5 AÑOS		CUMPLE
PERFORACIONES DE DRENAJE POR M2	100		CUMPLE
APLICA A LOS SIGUIENTES LOTES DEL PROYECTO DE INGENIERIA CMC SAS: 24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB			

APROBADO	KATERINE SANTIAGO DE LA HOZ GERENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN		16/08/2024

cuperz
Alfombras Gramas & Pisos

CERTIFICADO DE CALIDAD
FLASHBLADE 1.409 gr

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA FLASHBLADE 1.409 gr			
CRITERIOS	**CARACTERISTICAS**	**NORMA**	**CUMPLIMIENTO**
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO		CUMPLE
TIPO DE FIBRA	RECORTADA	DIN 61151 RECORTADA	CUMPLE
COLOR	VERDE / BLANCO		CUMPLE
GALGA	5/8"		CUMPLE
ALTURA DE FIBRA EN mm.	60		CUMPLE
PESO DE FIBRA g/m2	1409	ASTM 3776	CUMPLE
PESO TOTAL g/M2	2.661	ASTM 3776	CUMPLE
RECUBRIMIENTO SECUNDARIO	LATEX SBR RESISTENTE A LA HUMEDAD		CUMPLE
TELA BASE PRIMARIA	100% POLIPROPILENO TEJIDO	DIN 61151	CUMPLE
COLOR TELA BASE	NEGRO		CUMPLE
ANCHO TOTAL	4 m		CUMPLE
LONGITUD TOTAL	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE		CUMPLE
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO		CUMPLE
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	5 AÑOS		CUMPLE
PERFORACIONES DE DRENAJE POR M2	100		CUMPLE
APLICA A LOS SIGUIENTES LOTES DEL PROYECTO DE PALERMO SUR: 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-EC20B, 24N526-E581B, 24N526AE581B			


APROBADO	KATERINE SANTIAGO DE LA HOZ GERENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN		23/12/2024

Revisado 11/2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CINTA DE UNIÓN CESPED ARTIFICIAL

1. FOTOS DEL PRODUCTO






2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

3. CARACTERÍSTICAS

- **Cinta de Polipropileno (PP):** Alta capacidad de adhesión, diseñada para mantener el volumen del adhesivo aplicado y evitar filtraciones, lo que mejora el rendimiento en las uniones de alfombra artificial.
- **Tela No Tejida:** Material resistente al agua, al moho y a la humedad. Soporta temperaturas de hasta 130°C, y tiene una alta resistencia a condiciones climáticas extremas, incluyendo lluvias intensas y calor excesivo.
- **Propiedades Físicas:** La cinta presenta una elongación moderada tanto en dirección longitudinal como transversal. Es permeable al vapor, no tóxica, de secado rápido, duradera y reciclable.
- **Instrucciones de Almacenaje:** Se recomienda almacenar en lugares cubiertos, en un rango de temperatura entre **–20°C y 130°C**, para mantener sus propiedades intactas.

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Preparación:** Una vez alineadas y conectadas las juntas de los tapetes de césped artificial, ábralos para instalar la cinta de unión en la base de la cancha.
- **Aplicación del Adhesivo:** Vierta el adhesivo sobre la cinta de unión y, utilizando una llana o espátula dentada, esparza de manera uniforme.
- **Cierre de Juntas:** Cierre las juntas y presione firmemente durante unos minutos para asegurar una correcta unión.
- **Uso Recomendado:** Esta cinta de unión está diseñada para la unión interna de tapetes de césped artificial en aplicaciones como canchas sintéticas, parques recreativos, campos deportivos, terrazas y jardines.

5. DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Ancha: 15 /30 cm
Larga: 50 /100 metros

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Unidade	Valore
Densidad	g/m^2	150
Resistencia a la tensión longitudinal	N	228.6
Resistencia a la tensión transversal	N	162.3
Elongación de ruptura longitudinal	%	126.4
Elongación de ruptura transversal	%	137.3

Revisado 12/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD No. CGQ-0345

CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

PRUEBAS Y ENSAYOS

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	EVALUACIÓN			
ELONGACIÓN	< 12 µm/m	10 µm/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
COLOR BLANCO	BLANCO	N/A	OPTIMO	X	RECHAZADO	
TORSIÓN	Min 10 N/m	12,4 N/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
PERMEABILIDAD	>3.6e+7 mm/hr	4,8 e+7 mm/hr	OPTIMO	X	RECHAZADO	

El producto CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL Marca MG se le han realizado pruebas físicas en espacios designados por la compañía, dando como resultado Buena resistencia: al rasgado, a la tensión, a la humedad, al lodo, altas temperaturas, por lo cual damos constancia de ser un producto confiable para ser utilizado en la unión interna de tapetes de césped artificial.

Expedido el 02 de diciembre de 2024.


Héctor Hernán Naranjo Noreña
Gerente

Mallas y Gramas / Teléfonos: (6)8899130 - 3175670640 - 3138706125/ Correo: mallasygramasmzls@gmail.com – mallasygramasusa@gmail.com / Dirección: Manizales: Sede Campestre la Uribe, Kilometro 2, Vía Panamericana – Bogotá: Carrera 58 # 119 A 49

570

ACOUSTOSCAN

NUMERO DE REPORTE
24060ASA-A1

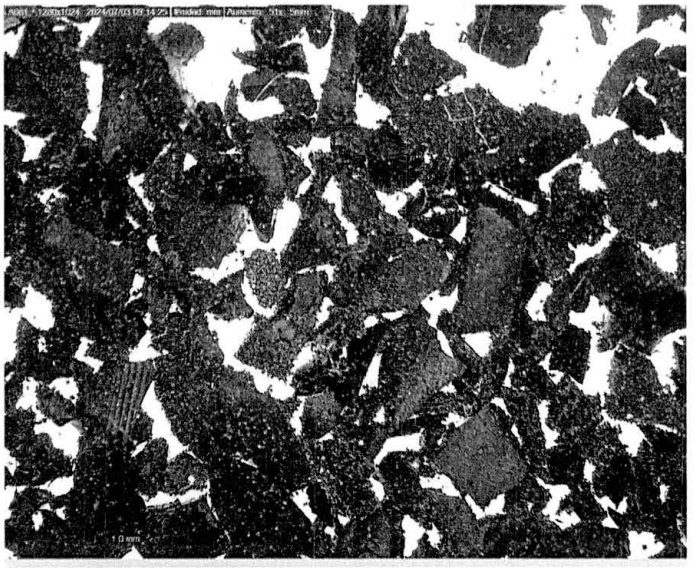

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RELLENOS

Los ensayos han sido realizados según los requerimientos para futbol.

IDENTIFICACIÓN DE CAUCHO

Este informe se compone de 4 páginas en su totalidad. Los resultados son válidos solo para la muestra evaluada sometida a pruebas. Para declarar la conformidad (o no), no fue considerado la incertidumbre asociada a los resultados.

Cali, 11 de julio de 2024.

ACOUSTOSCAN LATAM ha sido encargado para realizar el proceso de identificación de relleno: Caucho.

Estas pruebas se llevaron a cabo bajo las condiciones especificadas en laboratorio y en el estado que prevalecían el día de las pruebas. En consecuencia, no se debe considerar que los resultados tengan una reproducibilidad comparable a las pruebas realizadas en laboratorio.

REPORTADO POR:



Jhon Cajiao
Operations Manager LATAM
AcoustoScan LATAM
jhon.cajiao@acousto.co

REVISADO POR:



David Rengifo
Director LATAM
AcoustoScan LATAM
david.rengifo@acousto.co


592

DESCRIPCIÓN

INGENIERO EN LABORATORIO	JHON CAJIAO
CLIENTE	CAUCHOS DINÁMICOS S.A.S
TIPO DE SUPERFICIE	CAMPO DE FUTBOL
FECHA DE PRUEBA	JULIO 08 DE 2024


RESULTADOS

PARÁMETROS	UNIDADES	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS
TAMAÑO DE PARTÍCULA	MM	EN 933-1	**0.8 – 3.15**
DENSIDAD	KG/M^3	EN 1097-3	**0.49**
FORMA	-	EN 14955	**ANGULAR**

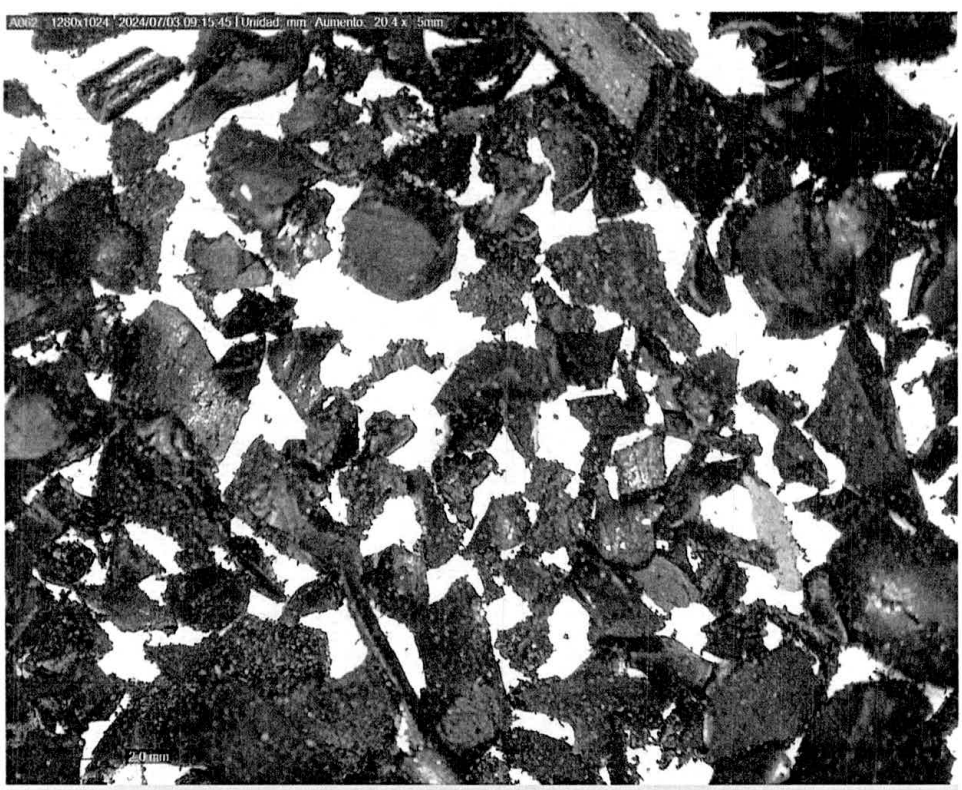

573

CURVA DE CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DE RELLENO DE RENDIMIENTO

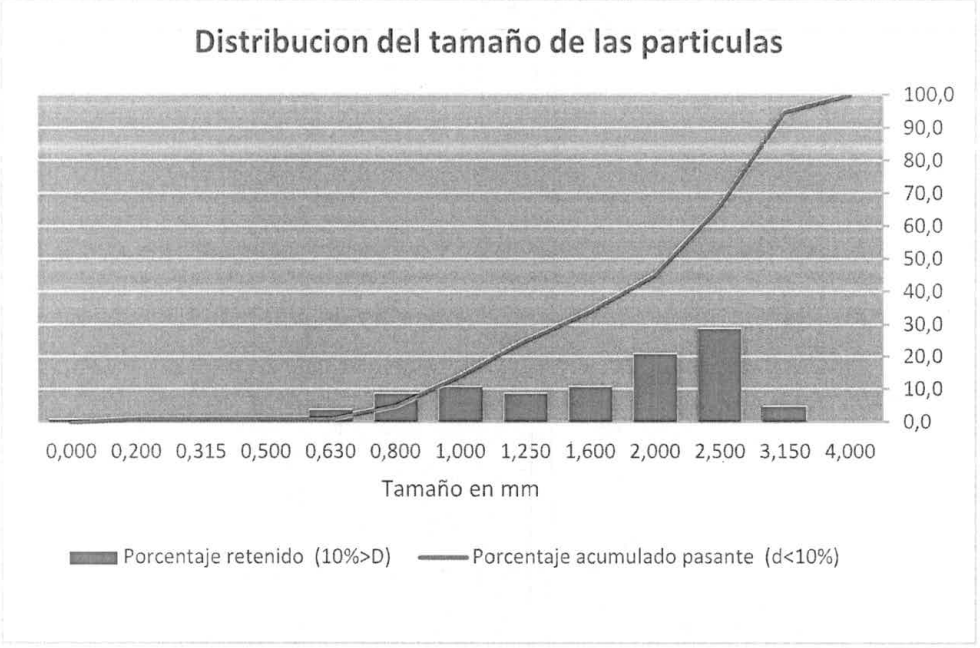

Tamiz	0	0.2	0.315	0.5	0.63	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0
% pasante	0%	1%	1%	1%	1%	5%	14%	25%	34%	45%	66%	95%	100%

--- END OF THE REPORT ---

----- THERE IS NOT TEXT BELOW THIS LINE. -----

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

CAR 13/11/2019 08:46
Al Contestar cite este No.: **20192179166**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino:JAIRO ALBERTO CHINCHILLA VALERO
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Señor
JAIRO ALBERTO CHINCHILLA VALERO
Tel: 7812898
Cr 4 No 5-13 El Altico Soacha
cauchosdinamicos@hotmail.com
Soacha (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20191152769: DOCUMENTAN PARA INSCRIPCIÓN

Cordial saludo,

En atención al oficio Radicado No 20191152769 del 30 de octubre de 2019, mediante el cual solicita la inscripción en el Registro de Gestores de Llantas Usadas del establecimiento Cauchos Dinámicos SAS identificada con Nit 900.776.838-1, localizado en Carrera 4 # 5 – 13 del Barrio El Altico del Municipio de Soacha - Cundinamarca; cuya actividad principal se relaciona con Recuperación de materiales, código 3830 (CIIU 3,0 A.C, adaptada para Colombia por el DANE). Se remiten los datos correspondientes a la inscripción.

IDENTIFICACION	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	MUNICIPIO	REGISTRO
900.776.838-1	Cauchos Dinámicos SAS	Soacha	RLL.009

Con el presente registro se confirma el cumplimiento en relación con el Arítculo 16 de la Resolución 1326 de 2017, así mismo se recuerda que como gestor de llantas usadas debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicha Resolución. Le recordamos que la inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro.

En caso de requerir información adicional, comunicarse al teléfono (1) 580 11 11 ext.2213

Atentamente,

CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Respuesta a: 20191152769 del 30/10/2019

Elaboró: Jennifer Lizeth Romero Perez / DESCA
Revisó: Yineth Karina Torres Valbuena / DESCA

CAUCHOS DINAMICOS
SBR Y EPDM PARA CANCHAS Y PARQUES

CAUCHOS DINAMICOS
NIT 900.776.838-1

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CERTIFICADO DE CALIDAD

DESTINO: CONSORCIO INNOVAPARQUES

PRODUCTO: CAUCHO GRANULADO SBR TIPO FIFA

FABRICANTE: CAUCHOS DINAMICOS S.A.S

CANTIDAD ANALIZADA: 1.000 Kg

ANALISIS

En nuestros procesos en los resultados son los siguientes:

PROPIEDADES	
COMPOSICION:	ESTIRENO - BUTADIENO
COLOR:	NEGRO 100%
TAMAÑO DE PARTICULA:	(0,8 – 2,0mm Ø sum + trasiego) EN 933 - 1
DENSIDAD:	(0,52) Kg/cm³ ± 5% EN 1097 - 3
FORMA:	ANGULOSO EN 14955
DUREZA:	70 ± 5 SHORE A
FISICO QUIMICAS	
% PRESENCIA DE FERROSOS	0,00%
% PRESENCIA DE LONA	0,01%
OLOR	LIBRE DE OLORES
EMPAQUE Y PRESENTACION:	Lonas 40 Kg debidamente cosidas

Este producto está avalado por el laboratorio // ACOUSTOSCAN // Cali – Colombia

Cordialmente,

JAIRO CHINCHILLA
INGENIERO INDUSTRIAL


CARRERA 17 No 30 – 112 CIUDAD LATINA / SOACHA CUNDINAMARCA - COLOMBIA
CEL: 313 318 16 57 o 317 641 35 23
PÁGINA WEB: www.cauchosdinamicos.com EMAIL: cauchosdinamicos@hotmail.com

577

7.2. VILLA DE LOS SAUCES

ACOUSTOSCAN

NUMERO DE REPORTE
24060ASA-A1

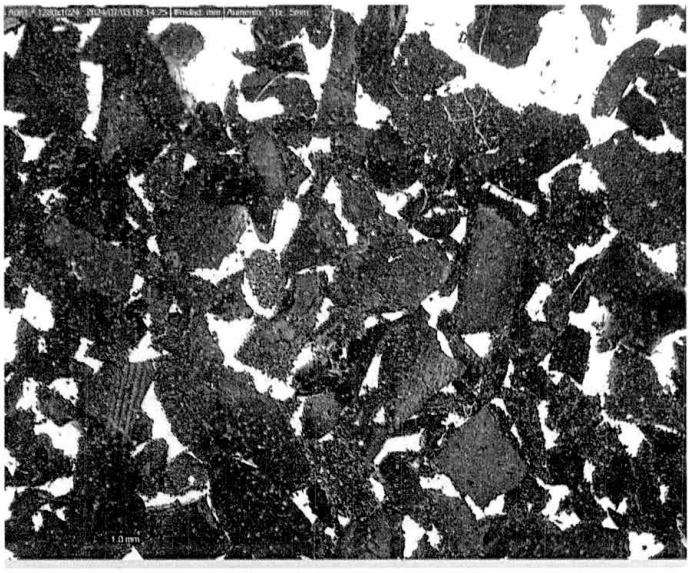

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RELLENOS

Los ensayos han sido realizados según los requerimientos para futbol.

IDENTIFICACIÓN DE CAUCHO


Este informe se compone de 4 páginas en su totalidad. Los resultados son válidos solo para la muestra evaluada sometida a pruebas. Para declarar la conformidad (o no), no fue considerado la incertidumbre asociada a los resultados.

Cali, 11 de julio de 2024.

ACOUSTOSCAN LATAM ha sido encargado para realizar el proceso de identificación de relleno: Caucho.

Estas pruebas se llevaron a cabo bajo las condiciones especificadas en laboratorio y en el estado que prevalecían el día de las pruebas. En consecuencia, no se debe considerar que los resultados tengan una reproducibilidad comparable a las pruebas realizadas en laboratorio.

REPORTADO POR:



Jhon Cajiao
Operations Manager LATAM
AcoustoScan LATAM
jhon.cajiao@acousto.co

REVISADO POR:




David Rengifo
Director LATAM
AcoustoScan LATAM
david.rengifo@acousto.co

DESCRIPCIÓN

INGENIERO EN LABORATORIO	JHON CAJIAO
CLIENTE	CAUCHOS DINÁMICOS S.A.S
TIPO DE SUPERFICIE	CAMPO DE FUTBOL
FECHA DE PRUEBA	JULIO 08 DE 2024


RESULTADOS

PARÁMETROS	UNIDADES	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS
TAMAÑO DE PARTÍCULA	MM	EN 933-1	**0.8 – 3.15**
DENSIDAD	KG/M^3	EN 1097-3	**0.49**
FORMA	-	EN 14955	**ANGULAR**

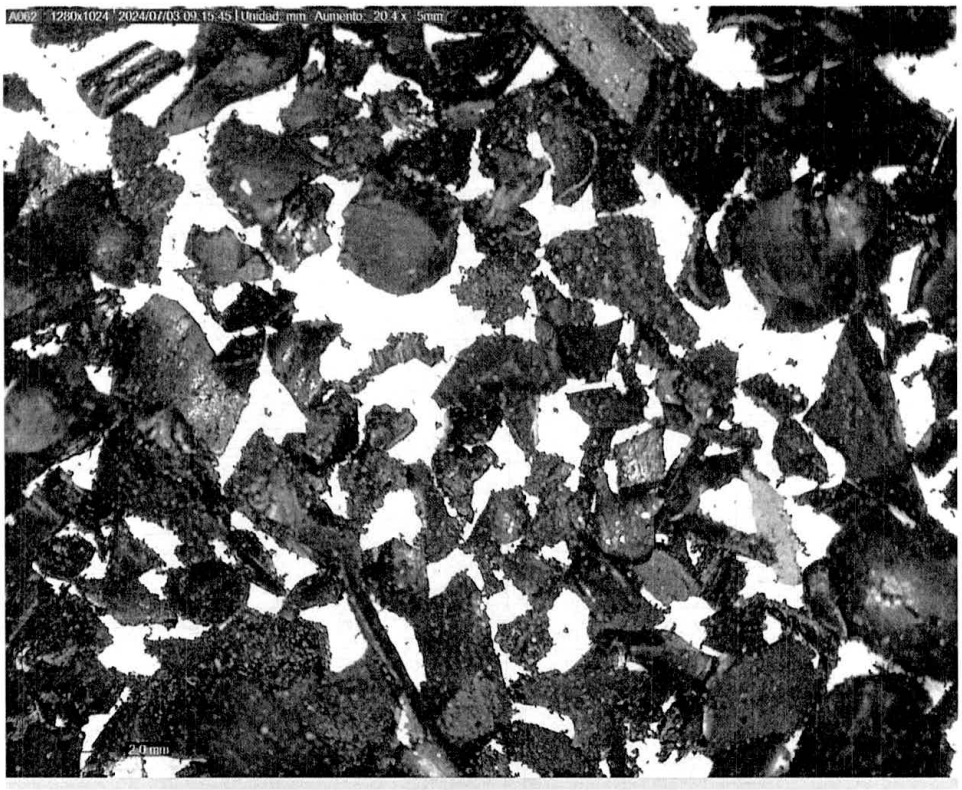

581

CURVA DE CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DE RELLENO DE RENDIMIENTO

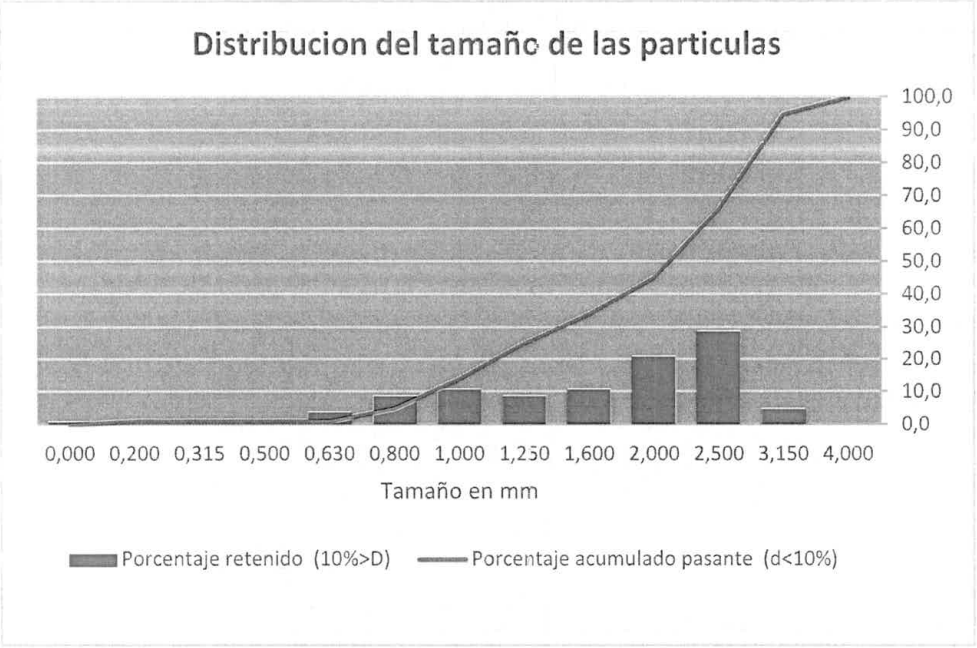

Tamiz	0	0.2	0.315	0.5	0.63	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0
% pasante	0%	1%	1%	1%	1%	5%	14%	25%	34%	45%	66%	95%	100%

--- END OF THE REPORT ---

----- THERE IS NOT TEXT BELOW THIS LINE. -----

582

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

CAR 13/11/2019 08:46
Al Contestar cite este No.: **20192179166**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino:JAIRO ALBERTO CHINCHILLA VALERO
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Señor
JAIRO ALBERTO CHINCHILLA VALERO
Tel: 7812898
Cr 4 No 5-13 El Altico Soacha
cauchosdinamicos@hotmail.com
Soacha (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20191152769: DOCUMENTAN PARA INSCRIPCIÓN

Cordial saludo,

En atención al oficio Radicado No 20191152769 del 30 de octubre de 2019, mediante el cual solicita la inscripción en el Registro de Gestores de Llantas Usadas del establecimiento Cauchos Dinámicos SAS identificada con Nit 900.776.838-1, localizado en Carrera 4 # 5 – 13 del Barrio El Altico del Municipio de Soacha - Cundinamarca; cuya actividad principal se relaciona con Recuperación de materiales, código 3830 (CIIU 3,0 A.C, adaptada para Colombia por el DANE). Se remiten los datos correspondientes a la inscripción.

IDENTIFICACION	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	MUNICIPIO	REGISTRO
900.776.838-1	Cauchos Dinámicos SAS	Soacha	RLL.009

Con el presente registro se confirma el cumplimiento en relación con el Arítculo 16 de la Resolución 1326 de 2017, así mismo se recuerda que como gestor de llantas usadas debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicha Resolución. Le recordamos que la inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro.

En caso de requerir información adicional, comunicarse al teléfono (1) 580 11 11 ext.2213

Atentamente,

CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Respuesta a: 20191152769 del 30/10/2019

Elaboró: Jennifer Lizeth Romero Perez / DESCA
Revisó: Yineth Karina Torres Valbuena / DESCA

CAUCHOS DINAMICOS
SBR Y EPDM PARA CANCHAS Y PARQUES

CAUCHOS DINAMICOS
NIT 900.776.838-1

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CERTIFICADO DE CALIDAD

DESTINO: CONSORCIO INNOVAPARQUES

PRODUCTO: CAUCHO GRANULADO SBR TIPO FIFA

FABRICANTE: CAUCHOS DINAMICOS S.A.S

CANTIDAD ANALIZADA: 1.000 Kg

ANALISIS

En nuestros procesos en los resultados son los siguientes:

PROPIEDADES	
COMPOSICION:	ESTIRENO - BUTADIENO
COLOR:	NEGRO 100%
TAMAÑO DE PARTICULA:	(0,8 – 2,0mm Ø sum + trasiego) EN 933 - 1
DENSIDAD:	(0,52) Kg/cm³ ± 5% EN 1097 - 3
FORMA:	ANGULOSO EN 14955
DUREZA:	70 ± 5 SHORE A
FISICO QUIMICAS	
% PRESENCIA DE FERROSOS	0,00%
% PRESENCIA DE LONA	0,01%
OLOR	LIBRE DE OLORES
EMPAQUE Y PRESENTACION:	Lonas 40 Kg debidamente cosidas

Este producto está avalado por el laboratorio // ACOUSTOSCAN // Cali – Colombia

Cordialmente,

JAIRO CHINCHILLA
INGENIERO INDUSTRIAL

CARRERA 17 No 30 – 112 CIUDAD LATINA / SOACHA CUNDINAMARCA - COLOMBIA
CEL: 313 318 16 57 o 317 641 35 23
PÁGINA WEB: www.cauchosdinamicos.com EMAIL: cauchosdinamicos@hotmail.com

585

7.3. FLORENCIA TRONQUITOS

neoflex ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp, 6):.....111.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s

FIRMA: María Murcia Caracena



Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

589

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN

Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 2964B.
Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.
Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	200-600 g/m^2 (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A





PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.
Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 2964B, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.
Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.
El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.
Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.
La temperatura mínima para el reticulado es de 5°C. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.
Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.
Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20°C
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s /20°C
Densidad	1.70 g/mL (25°C)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25°C)
Endurecedor	Adiflex 2964B
Proporción mezcla Neopur 2964 : Adiflex 2964B	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25°C; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22°C

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción, pequeñas variaciones son posibles.
[2] 25°C; 50% hr. Método interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30°C.
El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el aplicador sino como referencias orientativas y con valor informativo.
Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

588

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... .. 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena



The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

589

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 95105

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 228 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena



The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

590

TRENZACOL
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	4 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-023

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 4	**CALIBRE** 4 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 63064	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 50 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 1199612-1124

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	4 mm (+/- 0,5 mm)	4,1 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	24 (g/m) (+/-2.5%)	23,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,2%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,8%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bcgotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

593

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

FIFA PREFERRED PROVIDER FOOTBALL TURF

EDELGRASS
edelgrass.com

PREFERRED PROVIDER DE CÉSPED ARTIFICIAL

CERTIFICADO

La FIFA confirma que

Edel Grass B.V.

está catalogado como PREFERRED PROVIDER de césped artificial

Validez :

de 09/01/2023 a 08/01/2025

Queda garantizado el servicio de máxima calidad mediante

- conocimientos complementarios en ingeniería civil (subcapa) y gestión de proyectos (contratista general)
- responsabilidad absoluta en producción, instalación y mantenimiento desde la concepción hasta la finalización
- gran nivel de servicio y desarrollo continuo de productos relacionados con el césped artificial
- experiencia como licenciatario del concepto de calidad de la FIFA con terrenos FIFA recomendad

Gianni Infantino
Presidente de la Fédération Internationale de Football Association

www.FIFA.com/footballturf

Sbs

cuperz
Alfombras Gramas & Pisos

CERTIFICADO DE CALIDAD
FLASHBLADE 1.409 gr

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA FLASHBLADE 1.409 gr			
CRITERIOS	**CARACTERISTICAS**	**NORMA**	**CUMPLIMIENTO**
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO		CUMPLE
TIPO DE FIBRA	RECORTADA	DIN 61151 RECORTADA	CUMPLE
COLOR	VERDE / BLANCO		CUMPLE
GALGA	5/8"		CUMPLE
ALTURA DE FIBRA EN mm.	60		CUMPLE
PESO DE FIBRA g/m2	1409	ASTM 3776	CUMPLE
PESO TOTAL g/M2	2.661	ASTM 3776	CUMPLE
RECUBRIMIENTO SECUNDARIO	LATEX SBR RESISTENTE A LA HUMEDAD		CUMPLE
TELA BASE PRIMARIA	100% POLIPROPILENO TEJIDO	DIN 61151	CUMPLE
COLOR TELA BASE	NEGRO		CUMPLE
ANCHO TOTAL	4 m		CUMPLE
LONGITUD TOTAL	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE		CUMPLE
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO		CUMPLE
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	5 AÑOS		CUMPLE
PERFORACIONES DE DRENAJE POR M2	100		CUMPLE
APLICA A LOS SIGUIENTES LOTES DEL PROYECTO DE INGENIERIA CMC SAS: 24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB			

APROBADO	KATERINE SANTIAGO DE LA HOZ GERENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN		16/08/2024

cuperz
Alfombras Gramas & Pisos

CERTIFICADO DE CALIDAD
FLASHBLADE 1.409 gr

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA FLASHBLADE 1.409 gr			
CRITERIOS	**CARACTERISTICAS**	**NORMA**	**CUMPLIMIENTO**
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO		CUMPLE
TIPO DE FIBRA	RECORTADA	DIN 61151 RECORTADA	CUMPLE
COLOR	VERDE / BLANCO		CUMPLE
GALGA	5/8"		CUMPLE
ALTURA DE FIBRA EN mm.	60		CUMPLE
PESO DE FIBRA g/m2	1409	ASTM 3776	CUMPLE
PESO TOTAL g/M2	2.661	ASTM 3776	CUMPLE
RECUBRIMIENTO SECUNDARIO	LATEX SBR RESISTENTE A LA HUMEDAD		CUMPLE
TELA BASE PRIMARIA	100% POLIPROPILENO TEJIDO	DIN 61151	CUMPLE
COLOR TELA BASE	NEGRO		CUMPLE
ANCHO TOTAL	4 m		CUMPLE
LONGITUD TOTAL	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE		CUMPLE
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO		CUMPLE
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	5 AÑOS		CUMPLE
PERFORACIONES DE DRENAJE POR M2	100		CUMPLE
APLICA A LOS SIGUIENTES LOTES DEL PROYECTO DE PALERMO SUR: 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-E020B, 24N526-E581B, 24N526AE581B			


APROBADO	KATERINE SANTIAGO DE LA HOZ GERENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN		23/12/2024

Revisado 11/2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CINTA DE UNIÓN CESPED ARTIFICIAL

1. FOTOS DEL PRODUCTO






2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

3. CARACTERÍSTICAS

- **Cinta de Polipropileno (PP):** Alta capacidad de adhesión, diseñada para mantener el volumen del adhesivo aplicado y evitar filtraciones, lo que mejora el rendimiento en las uniones de alfombra artificial.
- **Tela No Tejida:** Material resistente al agua, al moho y a la humedad. Soporta temperaturas de hasta 130°C, y tiene una alta resistencia a condiciones climáticas extremas, incluyendo lluvias intensas y calor excesivo.
- **Propiedades Físicas:** La cinta presenta una elongación moderada tanto en dirección longitudinal como transversal. Es permeable al vapor, no tóxica, de secado rápido, duradera y reciclable.
- **Instrucciones de Almacenaje:** Se recomienda almacenar en lugares cubiertos, en un rango de temperatura entre **–20°C y 130°C**, para mantener sus propiedades intactas.

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Preparación:** Una vez alineadas y conectadas las juntas de los tapetes de césped artificial, ábralos para instalar la cinta de unión en la base de la cancha.
- **Aplicación del Adhesivo:** Vierta el adhesivo sobre la cinta de unión y, utilizando una llana o espátula dentada, esparza de manera uniforme.
- **Cierre de Juntas:** Cierre las juntas y presione firmemente durante unos minutos para asegurar una correcta unión.
- **Uso Recomendado:** Esta cinta de unión está diseñada para la unión interna de tapetes de césped artificial en aplicaciones como canchas sintéticas, parques recreativos, campos deportivos, terrazas y jardines.

5. DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Ancha: 15 /30 cm
Larga: 50 /100 metros

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Unidade	Valore
Densidad	g/m²	150
Resistencia a la tensión longitudinal	N	228.6
Resistencia a la tensión transversal	N	162.3
Elongación de ruptura longitudinal	%	126.4
Elongación de ruptura transversal	%	137.3

Revisado 12/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD No. CGQ-0345

CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

PRUEBAS Y ENSAYOS

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	EVALUACIÓN			
ELONGACIÓN	< 12 µm/m	10 µm/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
COLOR BLANCO	BLANCO	N/A	OPTIMO	X	RECHAZADO	
TORSIÓN	Min 10 N/m	12,4 N/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
PERMEABILIDAD	>3.6e+7 mm/hr	4,8 e+7 mm/hr	OPTIMO	X	RECHAZADO	

El producto CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL Marca MG se le han realizado pruebas físicas en espacios designados por la compañía, dando como resultado Buena resistencia: al rasgado, a la tensión, a la humedad, al lodo, altas temperaturas, por lo cual damos constancia de ser un producto confiable para ser utilizado en la unión interna de tapetes de césped artificial.


Expedido el 02 de diciembre de 2024.

Héctor Hernán Naranjo Noreña
Gerente

Mallas y Gramas / Teléfonos: (6)8899130 - 3175670640 - 3138706125/ Correo: mallasygramasmzls@gmail.com – mallasygramasusa@gmail.com / Dirección: Manizales: Sede Campestre la Uribe, Kilometro 2, Vía Panamericana – Bogotá: Carrera 53 # 119 A 49

ACOUSTOSCAN

NUMERO DE REPORTE
24060ASA-A1

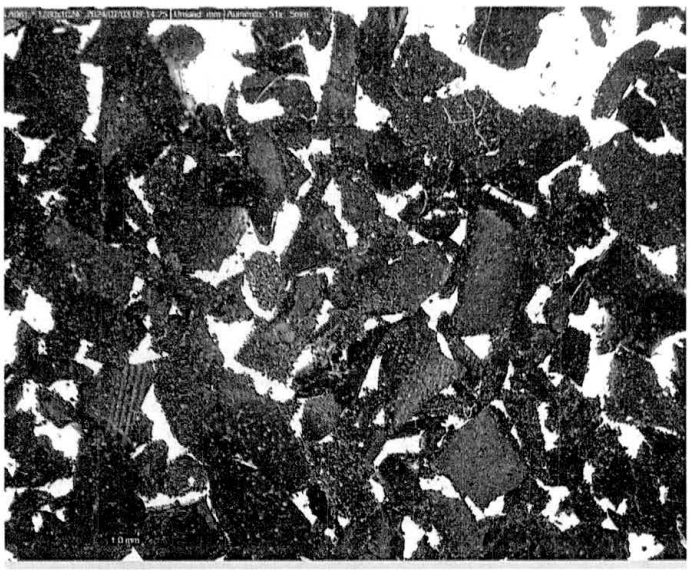

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE RELLENOS

Los ensayos han sido realizados según los requerimientos para futbol.

IDENTIFICACIÓN DE CAUCHO

Este informe se compone de 4 páginas en su totalidad. Los resultados son válidos solo para la muestra evaluada sometida a pruebas. Para declarar la conformidad (o no), no fue considerado la incertidumbre asociada a los resultados.

Cali, 11 de julio de 2024.

ACOUSTOSCAN LATAM ha sido encargado para realizar el proceso de identificación de relleno: Caucho.

Estas pruebas se llevaron a cabo bajo las condiciones especificadas en laboratorio y en el estado que prevalecían el día de las pruebas. En consecuencia, no se debe considerar que los resultados tengan una reproducibilidad comparable a las pruebas realizadas en laboratorio.

REPORTADO POR:



Jhon Cajiao
Operations Manager LATAM
AcoustoScan LATAM
jhon.cajiao@acousto.co

REVISADO POR:



David Rengifo
Director LATAM
AcoustoScan LATAM
david.rengifo@acousto.co


602

DESCRIPCIÓN

INGENIERO EN LABORATORIO	JHON CAJIAO
CLIENTE	CAUCHOS DINÁMICOS S.A.S
TIPO DE SUPERFICIE	CAMPO DE FUTBOL
FECHA DE PRUEBA	JULIO 08 DE 2024


RESULTADOS

PARÁMETROS	UNIDADES	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS
TAMAÑO DE PARTÍCULA	MM	EN 933-1	**0.8 – 3.15**
DENSIDAD	KG/M^3	EN 1097-3	**0.49**
FORMA	-	EN 14955	**ANGULAR**

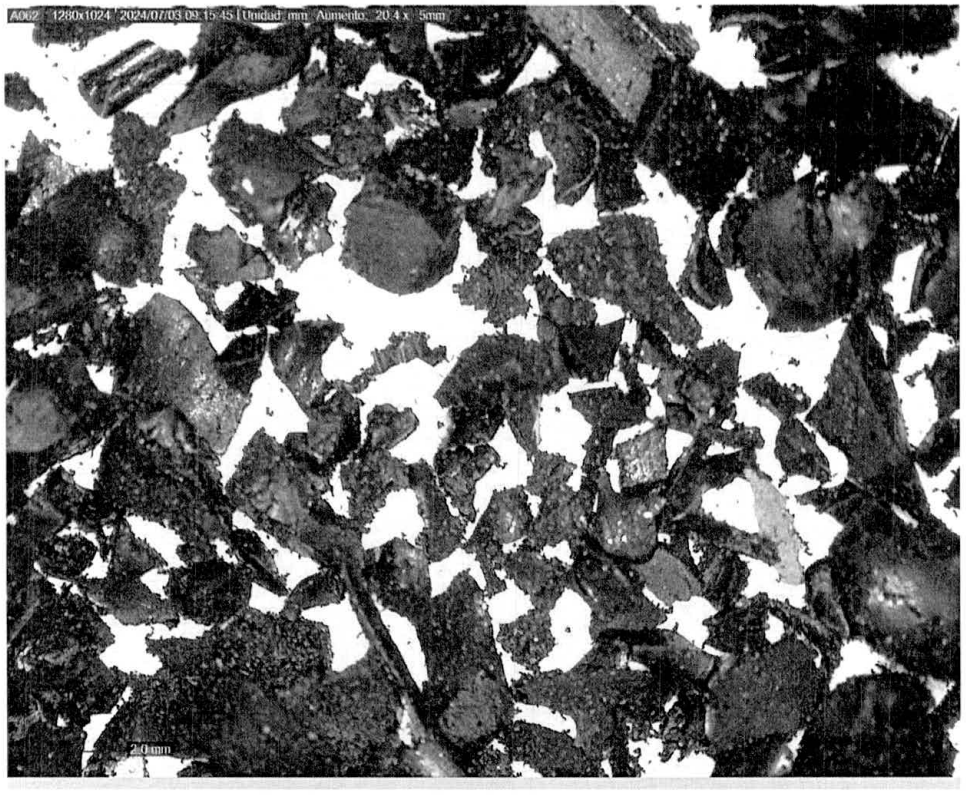

603

CURVA DE CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DE RELLENO DE RENDIMIENTO

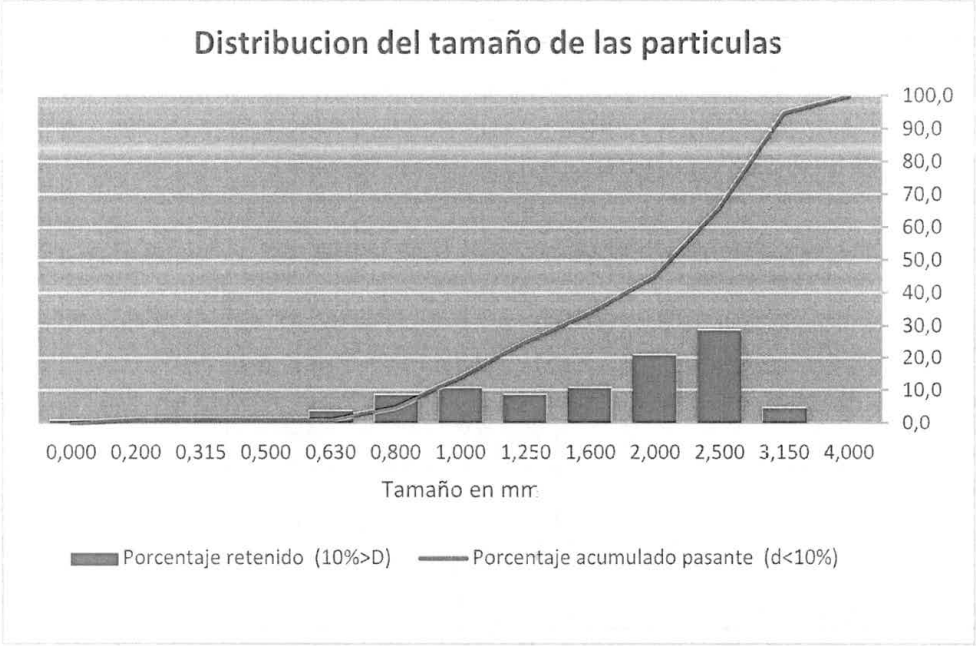

Tamiz	0	0.2	0.315	0.5	0.63	0.8	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0
% pasante	0%	1%	1%	1%	1%	5%	14%	25%	34%	45%	66%	95%	100%

--- END OF THE REPORT ---

----- THERE IS NOT TEXT BELOW THIS LINE. -----

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental
República de Colombia

CAR 13/11/2019 08:46
Al Contestar cite este No.: **20192179166**
Origen: Dirección de Evaluación, Seguimi
Destino:JAIRO ALBERTO CHINCHILLA VALERO
Anexos: Fol: 2

Bogotá,

Señor
JAIRO ALBERTO CHINCHILLA VALERO
Tel: 7812898
Cr 4 No 5-13 El Altico Soacha
cauchosdinamicos@hotmail.com
Soacha (Cundinamarca)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20191152769: DOCUMENTAN PARA INSCRIPCIÓN

Cordial saludo,

En atención al oficio Radicado No 20191152769 del 30 de octubre de 2019, mediante el cual solicita la inscripción en el Registro de Gestores de Llantas Usadas del establecimiento Cauchos Dinámicos SAS identificada con Nit 900.776.838-1, localizado en Carrera 4 # 5 – 13 del Barrio El Altico del Municipio de Soacha - Cundinamarca; cuya actividad principal se relaciona con Recuperación de materiales, código 3830 (CIIU 3,0 A.C, adaptada para Colombia por el DANE). Se remiten los datos correspondientes a la inscripción.

IDENTIFICACION	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	MUNICIPIO	REGISTRO
900.776.838-1	Cauchos Dinámicos SAS	Soacha	RLL.009

Con el presente registro se confirma el cumplimiento en relación con el Arítculo 16 de la Resolución 1326 de 2017, así mismo se recuerda que como gestor de llantas usadas debe dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicha Resolución. Le recordamos que la inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro.

En caso de requerir información adicional, comunicarse al teléfono (1) 580 11 11 ext.2213

Atentamente,

CARLOS ANTONIO BELLO QUINTERO
Director de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental

Respuesta a: 20191152769 del 30/10/2019

Elaboró: Jennifer Lizeth Romero Perez / DESCA
Revisó: Yineth Karina Torres Valbuena / DESCA

CAUCHOS DINAMICOS
SBR Y EPDM PARA CANCHAS Y PARQUES

CAUCHOS DINAMICOS
NIT 900.776.838-1

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CERTIFICADO DE CALIDAD

DESTINO: CONSORCIO INNOVAPARQUES

PRODUCTO: CAUCHO GRANULADO SBR TIPO FIFA

FABRICANTE: CAUCHOS DINAMICOS S.A.S

CANTIDAD ANALIZADA: 1.000 Kg

ANALISIS

En nuestros procesos en los resultados son los siguientes:

PROPIEDADES	
COMPOSICION:	ESTIRENO - BUTADIENO
COLOR:	NEGRO 100%
TAMAÑO DE PARTICULA:	(0,8 – 2,0mm Ø sum + trasiego) EN 933 - 1
DENSIDAD:	(0,52) Kg/cm³ ± 5% EN 1097 - 3
FORMA:	ANGULOSO EN 14955
DUREZA:	70 ± 5 SHORE A
FISICO QUIMICAS	
% PRESENCIA DE FERROSOS	0,00%
% PRESENCIA DE LONA	0,01%
OLOR	LIBRE DE OLORES
EMPAQUE Y PRESENTACION:	Lonas 40 Kg debidamente cosidas

Este producto está avalado por el laboratorio // ACOUSTOSCAN // Cali – Colombia

Cordialmente,

JAIRO CHINCHILLA
INGENIERO INDUSTRIAL

CARRERA 17 No 30 – 112 CIUDAD LATINA / SOACHA CUNDINAMARCA - COLOMBIA
CEL: 313 318 16 57 o 317 641 35 23
PÁGINA WEB: www.cauchosdinamicos.com EMAIL: cauchosdinamicos@hotmail.com

669

7.4. NORMANDIA

neoflex ADHESIVES coim

AENOR ER Empresa Registrada ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

HOJA DE ANÁLISIS

Producto: **NEOPUR 2964 VERDE**

N.º de Lote: 97001

RESULTADO DEL ANÁLISIS

Viscosidad de mezcla (100 gr NEOPUR 2964 Verde + 9,5 gr COMPONENTE B)

(Brookfield, 20º C, 6 r.p.m, Sp, 6):.....111.500 c.p.s.

Límites: 80.000-150.000 c.p.s

FIRMA: María Murcia Caracena

Los datos de esta hoja se facilitan únicamente a título informativo y no eximen al receptor de la necesidad del preceptivo examen/comprobación para su aceptación a la entrega.

609

NEOPUR 2964

FICHA TÉCNICA


DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano de dos componentes libre de disolventes.

APLICACIÓN

Neopur 2964 se ha de mezclar con Adiflex 2964B.
Este adhesivo se usa para el pegado de parquet, pavimentos de goma, césped artificial y recubrimientos de PVC en exteriores.
Se presenta envasado en forma de kit con las cantidades preparadas para su mezcla.

Sistema de aplicación	Espátula dentada.
Consumo	200-600 g/m^2 (en función de los materiales)
Sistema de limpieza	Disolvente A





PROCESO APLICACIÓN

Las superficies a pegar deben estar secas, libres de polvo, suciedad u otros materiales extraños. Un lijado superficial es recomendable en muchas aplicaciones.
Neopur 2964 se ha de mezclar a fondo con Adiflex 2964B, para cantidades grandes se recomienda un agitador mecánico. Una vez mezclado, la viscosidad aumenta, consiguiéndose una pasta ideal para aplicación con espátula dentada.
Aplicar la mezcla sobre las superficies a pegar con una espátula dentada. Durante el wet life, superponer las superficies a unir y mantenerlas en contacto.
El tiempo de fraguado disminuye con la temperatura aplicada en la película de adhesivo. En caso de materiales gruesos y aislantes del calor, se requiere un tiempo extra para que el calor penetre en la junta adhesiva. No es recomendable endurecer por encima de 60ºC materiales con grandes diferencias en los coeficientes de dilatación térmica.
Neopur 2964 endurece muy bien incluso a bajas temperaturas, aunque el tiempo de fraguado aumenta considerablemente.
La temperatura mínima para el reticulado es de 5°C. Por debajo de esta temperatura, la mezcla difícilmente reticula.
Los residuos de adhesivo, herramientas y maquinaria deben ser limpiados, antes de que el adhesivo endurezca, con Disolvente A.
Los usuarios deben realizar sus propios test para determinar la adecuación de nuestros productos a sus necesidades concretas. Consulte con nuestro servicio técnico para mayor información al respecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto (Dos opciones)	Pasta de color verde Pasta de color beige
Viscosidad[1]	400.000 ± 100.000 mPa·s /20°C
Viscosidad mezcla[1]	115.000 ± 35.000 mPa·s /20°C
Densidad	1.70 g/mL (25°C)
Densidad mezcla	1.65 g/mL (25°C)
Endurecedor	Adiflex 2964B
Proporción mezcla Neopur 2964 : Adiflex 29E4B	En peso 100 : 9,5
Pot life[2]	40min
Wet life[2]	70min
Tiempo fraguado	Aprox. 24h (25°C; 50% hr)
Tiempo de endurecimiento	Aprox. 5-8h a 20-22°C

- **No inflamable.**
- **Sin disolventes.**

[1] Los valores de viscosidad se controlan en el momento de la producción, pequeñas variaciones son posibles.
[2] 25°C; 50% hr. Método interno.

ALMACENAMIENTO

Debe almacenarse en recipientes originales herméticamente cerrados a temperaturas de 15-30°C.
El tiempo máximo de almacenamiento en las condiciones anteriormente descritas es de 12 meses.

SEGURIDAD

Seguir las instrucciones que contiene la **Ficha de Seguridad** de este producto, adoptando las medidas necesarias para su uso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información que contiene esta hoja técnica está basada en nuestro conocimiento de los productos, mediante ensayos realizados en nuestro laboratorio. No deben tomarse como garantía para el aplicador sino como referencias orientativas y con valor informativo.
Cada aplicador debe realizar sus correspondientes test para comprobar la idoneidad del producto en las condiciones y proceso usado en cada caso particular.
La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y por tanto quedan bajo la responsabilidad del instalador.

www.neoflex.es
Camino de Castilla, km. 5 - P.O.Box 3004 (03207) Elche, (Alicante) Spain. (+34) 966 611 101

Versión 1-28/10/21

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 97336

Order number: 317

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... ..... 232 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

611

neoflex
ADHESIVES coim

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER - 1085/2/00

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product: ADIFLEX 2964 B

Charge: 95105

Brookfield viscosity (25°C , 30 r.p.m., Sp.2) :..... 228 mPa.s

Limits: 160-240

SIGNATURE: María Murcia Caracena

The information on this sheet is provided for information only and does not exempt the recipient from the need for the mandatory examination / verification for acceptance on delivery.

612

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	8 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 8	**CALIBRE** 8 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 52622	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 40 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 4126985-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	8 mm (+/- 0,5 mm)	8,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	42 (g/m) (+/-2.5%)	41,7 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	31,8%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	68,2%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

614

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon #2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN
Diámetro	2 mm (+/- 0.5 mm)
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) +/-2.5%
Masa De La Funda	32.5 %
Masa Del Alma	67.5 %
Materiales que la Constituyen	Nylon

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

KM 37 Autopista Medellín Bogotá, Parque Empresarial
Fabricato, Bodega 2A Rionegro, Antioquia - Colombia
PBX: (574) + 444 3000 | 310 835 92 00
www.trenzacol.com

TRENZACOL®
¡Productos por Siempre!

CERTIFICADO TÉCNICO DE CALIDAD 1224-032

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
PRODUCTO Nylon # 2	**CALIBRE** 2 mm	**PRESENTACIÓN** 500 m / Rollo
MATERIAL Nylon	**REFERENCIA** 49687	**FECHA** Diciembre de 2024
CLIENTE Consorcio Innova parques	**CANTIDAD** 100 Rollos	**LOTE DE TEJIDO** 6536755-1224

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE
Diámetro	2 mm (+/- 0,5 mm)	2,2 mm	OK	-
Gramos por metro. Aprox.	12 (g/m) (+/-2.5%)	11,9 g/m	OK	-
Masa De La Funda	32,5 % (+/- 2.5%)	32,1%	OK	-
Masa Del Alma	67.5 % (+/- 2.5%)	67,9%	OK	-
Materiales que la Constituyen	Nylon	N/A	OK	-

RAUL ANIBAL ARANGO ARBELAEZ
LIDER SGC

FIFA PREFERRED PROVIDER FOOTBALL TURF

EDELGRASS
edelgrass.com

PREFERRED PROVIDER DE CÉSPED ARTIFICIAL

CERTIFICADO

La FIFA confirma que

Edel Grass B.V.

está catalogado como PREFERRED PROVIDER de césped artificial

Validez :

de 09/01/2023 a 08/01/2025

Queda garantizado el servicio de máxima calidad mediante

- conocimientos complementarios en ingeniería civil (subcapa) y gestión de proyectos (contratista general)
- responsabilidad absoluta en producción, instalación y mantenimiento desde la concepción hasta la finalización
- gran nivel de servicio y desarrollo continuo de productos relacionados con el césped artificial
- experiencia como licenciatario del concepto de calidad de la FIFA con terrenos FIFA recomendad

Gianni Infantino
Presidente de la Fédération Internationale de Football Association

www.FIFA.com/footballturf

619

cuperz
Alfombras Gramas & Pisos

CERTIFICADO DE CALIDAD
FLASHBLADE 1.409 gr

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA FLASHBLADE 1.409 gr			
CRITERIOS	**CARACTERISTICAS**	**NORMA**	**CUMPLIMIENTO**
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO		CUMPLE
TIPO DE FIBRA	RECORTADA	DIN 61151 RECORTADA	CUMPLE
COLOR	VERDE / BLANCO		CUMPLE
GALGA	5/8"		CUMPLE
ALTURA DE FIBRA EN mm.	60		CUMPLE
PESO DE FIBRA g/m2	1409	ASTM 3776	CUMPLE
PESO TOTAL g/M2	2.661	ASTM 3776	CUMPLE
RECUBRIMIENTO SECUNDARIO	LATEX SBR RESISTENTE A LA HUMEDAD		CUMPLE
TELA BASE PRIMARIA	100% POLIPROPILENO TEJIDO	DIN 61151	CUMPLE
COLOR TELA BASE	NEGRO		CUMPLE
ANCHO TOTAL	4 m		CUMPLE
LONGITUD TOTAL	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE		CUMPLE
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO		CUMPLE
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	5 AÑOS		CUMPLE
PERFORACIONES DE DRENAJE POR M2	100		CUMPLE
APLICA A LOS SIGUIENTES LOTES DEL PROYECTO DE INGENIERIA CMC SAS: 24N321-E81AB, 24N321A-E81AB, 24N321B-E81AB, 24N322-E81AB, 24N322A-E81AB, 24N322B-E81AB			

APROBADO	KATERINE SANTIAGO DE LA HOZ GERENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN		16/08/2024

cuperz
Alfombras Gramas & Pisos

CERTIFICADO DE CALIDAD
FLASHBLADE 1.409 gr

CERTIFICADO CONTRA FICHA TECNICA FLASHBLADE 1.409 gr			
CRITERIOS	**CARACTERISTICAS**	**NORMA**	**CUMPLIMIENTO**
COMPONENTE DE FIBRA	MONOFILAMENTO DE POLIETILENO		CUMPLE
TIPO DE FIBRA	RECORTADA	DIN 61151 RECORTADA	CUMPLE
COLOR	VERDE / BLANCO		CUMPLE
GALGA	5/8"		CUMPLE
ALTURA DE FIBRA EN mm.	60		CUMPLE
PESO DE FIBRA g/m2	1409	ASTM 3776	CUMPLE
PESO TOTAL g/M2	2.661	ASTM 3776	CUMPLE
RECUBRIMIENTO SECUNDARIO	LATEX SBR RESISTENTE A LA HUMEDAD		CUMPLE
TELA BASE PRIMARIA	100% POLIPROPILENO TEJIDO	DIN 61151	CUMPLE
COLOR TELA BASE	NEGRO		CUMPLE
ANCHO TOTAL	4 m		CUMPLE
LONGITUD TOTAL	SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE		CUMPLE
GARANTIA DE INSTALACIÓN	1 AÑO		CUMPLE
GARANTÍA DE RESISTENCIA RAYOS UV	5 AÑOS		CUMPLE
PERFORACIONES DE DRENAJE POR M2	100		CUMPLE
APLICA A LOS SIGUIENTES LOTES DEL PROYECTO DE PALERMO SUR: 24N525-E581B, 24N525AE581B, 24N525BE581B, 24N524-E020B, 24N526-E581B, 24N526AE581B			


APROBADO	KATERINE SANTIAGO DE LA HOZ GERENTE DE SISTEMAS DE GESTIÓN		23/12/2024

Revisado 11/2024

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CINTA DE UNIÓN CESPED ARTIFICIAL

1. **FOTOS DEL PRODUCTO**






2. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO**

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

3. **CARACTERÍSTICAS**

- **Cinta de Polipropileno (PP):** Alta capacidad de adhesión, diseñada para mantener el volumen del adhesivo aplicado y evitar filtraciones, lo que mejora el rendimiento en las uniones de alfombra artificial.
- **Tela No Tejida:** Material resistente al agua, al moho y a la humedad. Soporta temperaturas de hasta 130°C, y tiene una alta resistencia a condiciones climáticas extremas, incluyendo lluvias intensas y calor excesivo.
- **Propiedades Físicas:** La cinta presenta una elongación moderada tanto en dirección longitudinal como transversal. Es permeable al vapor, no tóxica, de secado rápido, duradera y reciclable.
- **Instrucciones de Almacenaje:** Se recomienda almacenar en lugares cubiertos, en un rango de temperatura entre **–20°C y 130°C**, para mantener sus propiedades intactas.

4. INSTRUCCIONES DE USO

- **Preparación:** Una vez alineadas y conectadas las juntas de los tapetes de césped artificial, ábralos para instalar la cinta de unión en la base de la cancha.
- **Aplicación del Adhesivo:** Vierta el adhesivo sobre la cinta de unión y, utilizando una llana o espátula dentada, esparza de manera uniforme.
- **Cierre de Juntas:** Cierre las juntas y presione firmemente durante unos minutos para asegurar una correcta unión.
- **Uso Recomendado:** Esta cinta de unión está diseñada para la unión interna de tapetes de césped artificial en aplicaciones como canchas sintéticas, parques recreativos, campos deportivos, terrazas y jardines.

5. DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Ancha: 15 /30 cm
Larga: 50 /100 metros

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades	Unidade	Valore
Densidad	g/m^2	150
Resistencia a la tensión longitudinal	N	228.6
Resistencia a la tensión transversal	N	162.3
Elongación de ruptura longitudinal	%	126.4
Elongación de ruptura transversal	%	137.3

Revisado 12/2024

CERTIFICADO DE CALIDAD No. CGQ-0345

CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Nombre:	Cinta de unión de césped artificial
Marca:	MG
Componentes:	Polipropileno
Concentración:	100 %
Color:	Blanco
Código de barras:	7709599238155

PRUEBAS Y ENSAYOS

ÍTEM	PARÁMETRO	MEDICIÓN	EVALUACIÓN			
ELONGACIÓN	< 12 µm/m	10 µm/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
COLOR BLANCO	BLANCO	N/A	OPTIMO	X	RECHAZADO	
TORSIÓN	Min 10 N/m	12,4 N/m	OPTIMO	X	RECHAZADO	
PERMEABILIDAD	>3.6e+7 mm/hr	4,8 e+7 mm/hr	OPTIMO	X	RECHAZADO	

El producto CINTA DE UNIÓN CÉSPED ARTIFICIAL Marca MG se le han realizado pruebas físicas en espacios designados por la compañía, dando como resultado Buena resistencia: al rasgado, a la tensión, a la humedad, al lodo, altas temperaturas, por lo cual damos constancia de ser un producto confiable para ser utilizado en la unión interna de tapetes de césped artificial.

Expedido el 02 de diciembre de 2024.

Héctor Hernán Naranjo Noreña
Gerente

Mallas y Gramas / Teléfonos: (6)8899130 - 3175670640 - 3138706125/ Correo: mallasygramasmzls@gmail.com – mallasygramasusa@gmail.com / Dirección: Manizales: Sede Campestre la Uribe, Kilometro 2, Vía Panamericana – Bogotá: Carrera 58 # 119 A 49

622
