MINUTA ACTA DE PRÓRROGA No. 1
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1040 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S"

CONTRATISTA:	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. SERVIMACONS S.A.S. Identificado con NIT No 900.788.754-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL:	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($799.585.990) M/CTE.
TÉRMINO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	CUATRO (04) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	OCHO (08) DE ABRIL DE 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACION DE CONTRATO:	SIETE (07) DE JUNIO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDÓS (22) DE JUNIO 2025

Entre los suscritos, **LUZ NELLY MONZÓN DÍAZ**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villavicencio, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.376.611 de Villavicencio, en calidad de Directora Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, nombrada mediante Decreto 583 del 11 de diciembre de 2024 y posesionada según consta en acta 140 de fecha 12 de diciembre de 2024; facultada para contratar en nombre y representación del Departamento del Meta, mediante Decreto 275 del 22 de mayo de 2020, quien en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte, y de otra **SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. SERVIMACONS S.A.S**, identificado con NIT. 900.788.754-1, representado legalmente por **LUIS MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ROMERO,** identificado con Cédula De Ciudadanía Número 17.336.809 expedida en Villavicencio-Meta, quien para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar la presente acta de prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios N° 1040 de 2025, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día cuatro (04) de abril de 2025 el Departamento del Meta **SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. SERVIMACONS S.A.S**, identificado con NIT. 900.788.754-1, representado legalmente por **LUIS MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ROMERO,** identificado con Cédula De Ciudadanía Número 17.336.809 expedida en Villavicencio-Meta, suscribieron el contrato de prestación de servicios N° 1040 de 2025, cuyo objeto corresponde a: **"SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".**

2. Que el contrato de prestación de servicios N° 1040 de 2025 se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyecto de Inversión Departamental BPPID bajo el número 2024005500085 según certificado expedido el cuatro (04) de marzo de 2025.

3. Que el contrato de prestación de servicios N° 1040 de 2025 se suscribió por un término de dos (02) meses y por un valor de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($799.585.990) M/CTE.**

MINUTA ACTA DE PRÓRROGA No. 1
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1040 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S"

soportado en los registros presupuestales:

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS	RP	FECHA
030701- 2.3.45.4503.1000.001.2.3.3.02.009-20	$ 165.852.024,00	3587	5 de abril de 2025
030701- 2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.008-20	$383.846.973,12	3589	5 de abril de 2025
0300701- 2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.008-20F	$249.886.992,88	3589	5 de abril de 2025
TOTALES	**$ 799.585.990,00**		

4. Que el día ocho (08) de abril de 2025 se suscribió el acta de inicio al contrato de prestación de servicios N° 1040 de 2025, por lo que la fecha de terminación del contrato es el día siete (07) de junio de 2025.

5. que existe oficio de fecha veintisiete (27) de mayo de 2025, donde el contratista expresa lo siguiente:

"(...) es importante resaltar que la presente prórroga, fue requerida por solicitud del contratista y es necesaria debido a que, si bien es cierto que el contratista ha avanzado eficientemente en la ejecución contractual y de los tres (3) puntos que se encuentran en proceso de intervención se espera finalizar el punto Puerto Esperanza ubicado en el Municipio de El Castillo dentro del término inicial de dos (2) meses, sin embargo, no ha sido posible finalizar los puntos ubicados en Parcelas del Progreso en Villavicencio y en la vía a Monfort en el Calvario.

En el punto Parcelas del Progreso debido a las condiciones hidrometeorológicas, el rio Guatiquia, ha tenido crecientes constantes, lo que no ha permitido el ingreso de las volquetas sencillas del banco de maquinaria, ya que el nivel elevado del rio impiden el acceso de las volquetas al punto de cargue de material, por lo anterior las volquetas no han logrado finalizar la ejecución de las 150 horas proyectadas y se encuentran a la espera de que el nivel del rio disminuya y permita el acceso al punto de cargue. Teniendo en cuenta que desde el día 19 de mayo de 2025 las volquetas no han podido ingresar al rio, se presenta el estado del clima, del periodo del 19 de mayo de 2025 hasta el corte del presente informe, donde se evidencia que el rio Guatiquia ha permanecido constantemente en alerta roja y naranja

Por otro lado, en el punto de intervención vía Villavicencio - Montfort ubicado en el municipio de El Calvario, no ha sido posible finalizar la ejecución de horas de retroexcavadora sobre llantas debido a que en un tramo de la vía ubicado antes del tramo intervenido con el presente contrato, se está construyendo una placa huella por lo que no hay acceso para llevar el combustible que requiere la máquina para finalizar las horas restantes, y además, no es posible el paso de la máquina para llegar al punto de embarque de la cama baja; así las cosas, se debe esperar a que se finalice la placa huella para poder continuar y terminar.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que, en el municipio de Villavicencio, Rio Guatiquia – Parcelas del Progreso y en la vía Villavicencio – Montfort, se requiere adelantar acciones de mitigación del riesgo, y que a la fecha está en ejecución pero que, debido a lo expuesto anteriormente, no se ha logrado finalizar.

MINUTA ACTA DE PRÓRROGA No. 1
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1040 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S"

La contratista anexa al informe de solicitud de prórroga los siguientes boletines del IDEAM que soportan las condiciones hidrológicas en la cuenca del rio Guatiquia:

Boletín No. 0139 Alertas hidrológicas Fecha: 19/05/2025
Boletín No. 0140 Alertas hidrológicas Fecha: 20/05/2025
Boletín No. 0141 Alertas hidrológicas Fecha: 21/05/2025
Boletín No. 0142 Alertas hidrológicas Fecha: 22/05/2025
Boletín No. 0143 Alertas hidrológicas Fecha: 23/05/2025
Boletín No. 0144 Alertas hidrológicas Fecha: 24/05/2025
Boletín No. 0145 Alertas hidrológicas Fecha: 25/05/2025
Boletín No. 0146 Alertas hidrológicas Fecha: 26/05/2025
Boletín No. 0147 Alertas hidrológicas Fecha: 27/05/2025

Como soporte de la imposibilidad de terminar las horas máquinas de retroexcavadora sobre llantas en la vía a Monfort, el contratista en el informe presenta registro fotográfico.

Por lo sustentado anteriormente es necesario y viable realizar la prórroga No.1 del contrato 1040 de 2025. Y de este modo, obedeciendo a las necesidades que aquejan las comunidades afectadas, lograr reducir y mitigar los riesgos en sectores vulnerables.

De acuerdo a la situación expuesta anteriormente se hace necesaria la solicitud de una de prórroga No. 1 para el Contrato de prestación de servicios No. 1040 de 2025 por un periodo de quince (15) días, con el fin de seguir dándole cumplimiento al objeto del contrato". (sic)

7. Que la supervisora suscribió informe de supervisión a través del cual avaló la suscripción del acata de prórroga No 1 del Contrato de Prestación de Servicios No 1040 de 2025.

8. Que se hace necesario previa solicitud del contratista, avalado y aprobado por el ordenador del gasto prorrogar el contrato de prestación de servicios N° 1040 de 2025 en un término de quince (15) días, por lo que la nueva fecha de terminación sería el día veintidós (22) de junio de 2025.

9. Que la presente prórroga se encuentra debidamente sustentada, y se celebra de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios y se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: PRÓRROGA. Prorróguese el contrato de prestación de servicios N° 1040 de 2025 en un término de quince (15) días, por lo que la nueva fecha de terminación será el día veintidós (22) de junio de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las demás estipulaciones del contrato de prestación de servicios N° 1040 de 2025, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

MINUTA ACTA DE PRÓRROGA No. 1
AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 1040 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL META Y SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S"

CLÁUSULA TERCERA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral de la presente acta 1) oficio de solicitud del CONTRATISTA. 2) Informe de supervisión. 3) Acta de Comité. 4) Documentos que se generen durante el desarrollo del contrato.

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta de prórroga No. 1 se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes, la actualización de pólizas y su publicación en la plataforma SECOP II.

CLÁUSULA QUINTA: CONTROL DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL. Este control se ejercerá conforme lo establece la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

En constancia se firma el presente documento por los intervinientes en Villavicencio (Meta) en la fecha 05 JUN 2025

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **SERVIMACONS S.A.S.** NIT 900.788.754-1, R/L LUIS MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ROMERO C.C. No 17.336.809 expedida en Villavicencio-Meta.	**LUZ NELLY MONZÓN DIAZ** Directora Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
Contratista	**Ordenador del Gasto**

V.B. PARA PUBLICAR EN SECOP II

JUAN PABLO REYES GONZÁLEZ
Vo. Bo. para la publicidad en SECOP
Gerente de Asuntos Contractuales

Firma:		Firma:	
Nombre:	**ALICIA MUÑOZ CERÓN**	Nombre:	**MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ**
Cargo	Abogada Especializada CPS - 220 de 2025	Cargo:	Profesional Especializado
Proyectó		**Revisó**	

Villavicencio, 30//05/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe
Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	1040 DE 2025		
Clase de Contrato:	Prestación de Servicios		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	3587 y 3589 del 05/04/2025		
Contratista:	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. SERVIMACONS S.A.S	Nit./c.c.	900.788.754-1
Representante Legal:	LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ	c.c.	17.336.809
Supervisor: (Insertar filas cuando en el periodo de pago se presenten varios supervisores)	LUZ NELLY MONZÓN DÍAZ	c.c.	40.373.611
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	N/A		
Objeto:			
SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	SETECIENTOS NOVENTA NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 799.585.990,00) M/CTE		
Término Inicial de Ejecución:	DOS MESES		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	08 DE ABRIL DE 2025	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	07 DE JUNIO DE 2025

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios, Reducciones y Otras)			
Tipo de Modificación	**Valor de la Modificación** (Cuando Aplique)	**Fecha de expedición del documento**	**Tiempo de Modificación** (Cuando Aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A **Inserte filas si requiere			

Término Total de Ejecución: (Solo cuando existan modificaciones)	N/A	**Fecha Finalización:** (Solo cuando existan modificaciones)	N/A
Valor total del contrato +/- las modificaciones: (Solo cuando existan modificaciones) (Letras y Números)	SETECIENTOS NOVENTA NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 799.585.990,00) M/CTE		
*Si no existen modificaciones diligencie casillas con N/A			

Periodo de Pago:	Del	N/A		Al	N/A			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final		No. de Pago	

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	N/A

En el contrato objeto de este informe ejerzo funciones de supervisor, así para dar cumplimiento al Decreto No. 075 de 2021 "Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta", me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de 08/04/2025 al 30/05/2025 en los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro Presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley			X
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)			X
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL	X		
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de Asuntos Contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones especificas en el periodo del informe:

Descripción de las actividades ejecutadas

INTRODUCCION

La Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres debe garantizar una atención efectiva y eficaz a las emergencias, así como ejecutar labores de mitigación y otras acciones inherentes a su propósito público. No obstante, la Gobernación del Meta carece del personal idóneo y la logística necesaria para asegurar la operación del banco de maquinaria amarilla, indispensable para cubrir estas necesidades. En consecuencia, se ha procedido a la contratación de una persona jurídica especializada en la prestación del servicio de operación del banco de maquinaria del Departamento. Este servicio se enfoco en los municipios del Meta priorizados por la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, particularmente aquellos afectados por desbordamientos de ríos, quebradas y/o fuentes hídricas, y por deslizamientos o remociones en masa en sus vías durante la temporada de lluvias. Por lo tanto, la Entidad estableció la necesidad de formalizar esta contratación, cuyo objeto es el "SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META". Dicho contrato se enmarca en el desarrollo de actividades directamente vinculadas con la operación de la maquinaria adscrita a la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

En el periodo del 08 de abril de 2025 al 30 de mayo de 2025, en el desarrollo del contrato 1040 de 2025, con la operación y funcionamiento del banco de maquinaria amarilla del departamento del Meta se intervino el municipio de Villavicencio, Guamal, El Calvario, El Dorado y El Castillo con una inversión en el periodo del presente informe de $ 730.869.297,02 para un acumulado ejecutado a corte del 30 de mayo de 2025 de $ 730.869.297,02.

Durante el lapso abarcado en este informe, se deja constancia que los equipos utilizados en las diferentes actividades pertenecen al Departamento del Meta.

ÍTEM	TIPO DE EQUIPO	MARCA	LINEA	SERIAL	AÑO DESIGNACIÓN	PLACA
1	CAMABAJA	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA 6X4	3HSWYAHT8EN014421	2014	OJT-166
2	VOLQUETA	CHEVROLET	FTR	9GDFTR341EB032856	2014	OJT-162
3	VOLQUETA	CHEVROLET	FTR	9GDFTR346EB032125	2014	OJT-163
4	VOLQUETA	CHEVROLET	FTR	9GDFTR340EB032124	2014	OJT-164
5	VOLQUETA	CHEVROLET	FTR	9GDFTR340EB032122	2014	OJT-165
6	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	LINK BELT	210X2	LBX210Q5NDHEX2179	2014	N/A
7	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	LINK BELT	210X2	LBX210Q5NDHEX2180	2014	N/A
8	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	LINK BELT	210X2	LBX210Q5NDHEX2181	2014	N/A
9	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	LINK BELT	210X2	LBX210Q5NDHEX2182	2014	N/A
10	BULLDOZER	CATERPILLAR	D6K XL	CAT00D6KHFBH02764	2014	N/A
12	BULLDOZER	CATERPILLAR	D6K XL	CAT00D6KHFBH02765	2014	N/A
12	BULLDOZER	CATERPILLAR	D6K XL	CAT00D6KHFBH02766	2014	N/A
13	RETROEXCAVADOR A SOBRE LLANTAS	CATERPILLAR	416E	CAT0416EPMFG08585	2014	N/A
14	CAMIONETA 4X4	MAZDA	BT-50	9FJUN84W0F0207097	2014	OJT-172

Y estas son las múltiples acciones de mitigación llevadas a cabo en los lugares atendidos por la maquinaria amarilla del departamento del Meta:

Municipio de El Calvario:

- Vereda El Carmen (73°43'48.51"O) Donde se están rehabilitando puntos críticos en las vías terciarias, con un bulldozer sobre oruga Caterpillar D6K XL.
- Vereda San Fernando (4°20'41.81"N) Donde se están rehabilitando puntos críticos en las vías terciarias, con un bulldozer sobre oruga Caterpillar D6K XL.

Monfort, vía Villavicencio (73°38'26.11"O y 4°19'17.70"N) Donde se están descolmatando, encauzando o conformando jarillones con retroexcavadora Caterpillar 416 E.

Municipio de Guamal:

- Vereda Pio XII (73°48'9.28"O y 3°54'14.01"N) Donde se realizo un cierre, se canalizo el rio Guamal y se hizo un dique para protección de unos gaviones que se encuentran en mal estado y necesitan reparación. Con una Excavadora sobre oruga link-belt 210 X2.
- Vereda La Isla (73°48'54.35"O 3°54'18.38"N 73°49'38.21"O 3°54'34.58"N) Donde se construye un espolón de 200 mts y se hace un canal en rio Guamal 500 mts y se construye un enrocado de 300 mts para evitar el transvase del rio Guamal al caño Camelia. Con una Excavadora sobre oruga link-belt 210 X2.

Municipio de Villavicencio:

- Vereda Palmarito y Arrayanes (73°19'6.96"O y 3°57'54.72"N) Donde se realizo un cierre, se canalizo el rio Guayuriba y se hizo un dique para mitigar el riesgo de inundación de la margen izquierda. Con dos Excavadoras sobre oruga link-belt 210 X2.
- Sector Parcelas del Progreso. Donde se trabaja conjuntamente con la oficina de Riesgos (municipio) en la construcción de dos espolones en a margen derecha del rio Guatiquia ara mitigar el riesgo de inundación de esta comunidad. Se utilizan 3 Volquetas sencillas Chevrolet FTR.

Municipio de El Dorado:

- Rio Ariari, Trasvase Rio Ariari a Rio Viejo. Donde se trabaja conjuntamente con la UNGRD realizando canalización y descolmatacion del rio en el centro y haciendo unos cierres para evitar trasvase del rio en múltiples sectores. Con tres Excavadoras sobre oruga link-belt 210 X2.

Municipio de El Castillo:

- Vereda Puerto Esperanza, Rio La Cal. Se realizan varios cierres y protecciones para mitigar inundaciones la población, también se realiza descolmatacion y conformación de jarillones. Con una Excavadora sobre oruga link-belt 210 X2.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 799.585.990,00	04 DE ABRIL DE 2025		N/A
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 799.585.990,00	N/A	N/A	
PAGO PARCIAL NO. 1	$ 0,00	N/A	0,00%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(-) AMORTIZACION ANTICIPO 40%	$ 0,00			
VALOR NETO ACTA 1	$ 0,00			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 799.585.990,00	08 DE ABRIL DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025	100,00%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO
POR AMORTIZAR	N/A		N/A	N/A

Presupuesto general según condiciones iniciales del contrato

PRESUPUESTO OFICIAL OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL
1.1.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA	HR	62	$ 450.000,00	$ 27.900.000,00
1.2.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	HR	100	$ 443.300,00	$ 44.330.000,00
1.3.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	HR	990	$ 460.400,00	$ 455.796.000,00
1.4.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3	HR	150	$ 278.400,00	$ 41.760.000,00

1.5.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	HR	81	$ 325.000,00	$ 26.325.000,00
1.6.	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	DIA	30	$ 287.000,00	$ 8.610.000,00
				SUB-TOTAL	**$ 604.721.000,00**
				IVA 19%	**$ 114.896.990,00**
1.7.	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	MES	2	$ 33.600.000,00	$ 67.200.000,00
				IVA 19%	**$ 12.768.000,00**
TOTAL OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARÍA =					**$ 799.585.990,00**

Presupuesto ejecutado del 08 de Abril al 30 de Mayo de 2025.

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO						POR EJECUTAR	
						MESES ANTERIORES		PRESENTE INFORME		ACUMULADO			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL
1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN	HR	62	$ 450.000,00	$ 27.900.000,00	0	$ 0,00	57,00	$ 25.650.000,00	57,00	$ 25.650.000,00	5,00	$ 2.250.000,00
2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL	HR	100	$ 443.300,00	$ 44.330.000,00	0	$ 0,00	100,00	$ 44.330.000,00	100,00	$ 44.330.000,00	0,00	$ 0,00
3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	HR	990	$ 460.400,00	$ 455.796.000,00	0	$ 0,00	948,10	$ 436.505.240,00	948,10	$ 436.505.240,00	41,90	$ 19.290.760,00
4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	HR	150	$ 278.400,00	$ 41.760.000,00	0	$ 0,00	130,20	$ 36.247.680,00	130,20	$ 36.247.680,00	19,80	$ 5.512.320,00
5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	HR	81	$ 325.000,00	$ 26.325.000,00	0	$ 0,00	67,6	$ 21.970.000,00	67,6	$ 21.970.000,00	13,40	$ 4.355.000,00
6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	DIA	30	$ 287.000,00	$ 8.610.000,00	0	$ 0,00	30,00	$ 8.610.000,00	30,00	$ 8.610.000,00	0,00	$ 0,00
7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	MES	2	$ 33.600.000,00	$ 67.200.000,00	0	$ 0,00	1,22	$ 40.862.959,85	1,22	$ 40.862.959,85	0,78	$ 26.337.040,15
				SUBTOTAL	$ 671.921.000,00		$ 0,00		$ 614.175.879,85		$ 614.175.879,85		$ 57.745.120,15
				IVA	$ 127.664.990,00	0,00%	$ 0,00	91,41%	$ 116.693.417,17	91,41%	$ 116.693.417,17	8,,59%	$ 10.971.572,83
				TOTAL	$ 799.585.990,00		$ 0,00		$ 730.869.297,02		$ 730.869.297,02		$ 68.716.692,98

JUSTIFICACIÓN A LA SOLICITUD DE LA PRÓRROGA

La presente solicitud de prórroga contractual se fundamenta en los siguientes aspectos técnicos y operacionales que han impactado la finalización de los trabajos en curso, a pesar del avance significativo del 91.41% de ejecución física, equivalente a **Setecientos treinta millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos con dos centavos** ($730,869,297.02) COP. De los ocho puntos de intervención específicos y verificados, cinco se encuentran completamente terminados, mientras que tres aún están en proceso.

Si bien el punto de Puerto Esperanza en El Castillo se estima concluir dentro del plazo inicial de dos meses, persisten desafíos para la culminación de los proyectos en Parcelas del Progreso, Villavicencio, y en la vía a Montfort, El Calvario.

En Parcelas del Progreso, la inestabilidad hidrometeorológica y las crecidas constantes del río Guatiquía han impedido el acceso de la maquinaria de transporte (volquetas sencillas) al punto de carga de material. Desde el 19 de mayo de 2025, el río ha mantenido niveles de alerta roja y naranja, tal como lo corroboran los reportes climáticos adjuntos, imposibilitando la finalización de las 150 horas de operación proyectadas para las volquetas. La interrupción de estas operaciones esenciales ha afectado directamente la programación de la obra.

En el punto de intervención de la vía Villavicencio - Montfort en El Calvario, la ejecución de horas de retroexcavadora sobre llantas se ha visto obstaculizada debido a la construcción de una placa huella en un tramo previo al área de intervención contractual. Esta obra en curso ha bloqueado el acceso para el suministro de combustible necesario para la maquinaria, así como el paso para el embarque de la misma en cama baja. La culminación de la placa huella es un requisito previo indispensable para reanudar las operaciones de la retroexcavadora y completar las horas programadas.

Considerando las circunstancias atenuantes detalladas, que corresponden a situaciones ajenas al control directo del contratista e impactan directamente la mitigación del riesgo en los puntos de Villavicencio (Río Guatiquía – Parcelas del Progreso) y en la vía Villavicencio – Montfort, se solicita una prórroga contractual por un término de quince (15) días calendario. Esta extensión permitirá la finalización de los trabajos pendientes, estableciendo como nueva fecha de terminación el 22 de junio de 2025. Esta prórroga es fundamental para asegurar la completitud y calidad de las obras de mitigación de riesgo, optimizando los recursos invertidos y garantizando la seguridad de la infraestructura.

CONCLUSIÓN

A la fecha de este informe, se registra un progreso del 91.41% en la ejecución contractual, lo que representa un valor de **Setecientos treinta millones ochocientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y siete pesos con dos centavos** ($730,869,297.02) . Gracias a este avance, se ha logrado intervenir los ocho (8) puntos definidos en el plan de intervención actualizado, de acuerdo con las indicaciones de la supervisión. De estos, cinco (5) puntos se encuentran completamente finalizados y tres (3) están actualmente en proceso de intervención.

Si bien se ha logrado un progreso considerable dentro de lo previsto contractualmente, la finalización de tres (3) puntos ha presentado desafíos. Aunque se prevé culminar el punto Puerto Esperanza en el municipio de El Castillo dentro del término inicial de dos meses, no ha sido posible finalizar los trabajos en los puntos de Parcelas del Progreso y en la vía Villavicencio-Montfort.

Específicamente, en el punto Parcelas del Progreso, ubicado en el río Guatiquía en Villavicencio, la imposibilidad de finalizar los trabajos en el plazo contractual se debe a las condiciones hidrometeorológicas adversas. Las crecientes constantes del río Guatiquía han impedido el acceso de las volquetas sencillas del banco de maquinaria al punto de cargue de material, lo que ha retrasado la culminación de las 150 horas de operación proyectadas. La reanudación de las labores depende de la disminución del nivel del río.

Considerando la necesidad de adelantar acciones de mitigación del riesgo en el río Guatiquía - Parcelas del Progreso en Villavicencio y en la vía Villavicencio-Montfort, y que, si bien están en ejecución, no han podido finalizarse por las razones previamente expuestas, se considera viable realizar una prórroga contractual por un término de quince (15) días. Esta extensión contaría a partir del vencimiento del contrato, estableciendo como nueva fecha de terminación el 22 de junio de 2025.

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	**Calificación**
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Excelente
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Excelente
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Excelente
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Excelente

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el F-BS-16 Certificado del Supervisor Autorizando el Pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por la suscrita

Cordialmente;

Firma:	
Nombre:	**LUZ NELLY MONZÓN DÍAZ**
Cargo:	Directora Departamental Para La Gestión Del Riesgo De Desastres
Supervisor	

SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

Villavicencio, 28 de mayo de 2025

Pl Katherine V.
29/05/2025
3:37 pm

Arquitecta
LUZ NELLY MONZON DIAZ
Directora Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres / Supervisora.
Gobernación del Departamento del Meta
Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1040 de 2025 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Solicitud de Prorroga No.1

Por medio del presente solicitamos la prórroga No.1 por un termino de quince (15) días del contrato en referencia por las siguientes razones:

A la fecha de la presente solicitud se reporta un porcentaje de ejecución del 91.41% que corresponde a un valor de $ 730.869.297,02. Con esta ejecución se ha logrado ingresar a los ocho (8) puntos establecidos en el plan de intervención específico, actualizado de acuerdo con lo indicado por la supervisión, de estos ocho (8) puntos, cinco (59 están totalmente finalizados y tres (3) se encuentran en proceso de intervención.

Si bien es cierto hemos avanzado dentro de lo establecido, en la ejecución contractual y de los tres (3) puntos que se encuentran en proceso de intervención se espera finalizar el punto Puerto Esperanza ubicado en el Municipio de El Castillo dentro del término inicial de dos meses, sin embargo, no ha sido posible finalizar los puntos ubicados en Parcelas del Progreso y en la vía Monfort.

En el punto Parcelas del Progreso en el río Guatiquía no es posible culminar trabajos en el plazo contractual debido a que las condiciones hidrometeorológicas del rio Guatiquia que ha tenido crecientes constantes, no ha permitido el ingreso de las volquetas sencillas del banco de maquinaria, ya que el nivel elevado del rio impiden el acceso de las volquetas al punto de cargue de material; por lo anterior las volquetas no han logrado finalizar la ejecución de las 150 horas proyectadas y se encuentran a la espera de que el nivel del rio disminuya y permita el acceso al punto de cargue.

Por otro lado, en el punto vía Villavicencio - Montfort ubicado en el municipio de El Calvario no ha sido posible finalizar la ejecución de horas de retroexcavadoras asignadas debido a que en un tramo de la vía ubicado antes del tramo intervenido con el presente contrato se está construyendo una placa huella por lo que no hay acceso para llevar el combustible que requiere la máquina para finalizar las horas restantes, y además, no es posible el paso de la máquina para llegar al punto de embarque de la cama baja. Por tanto, se debe esperar a que se finalice la placa huella para poder continuar y terminar con las horas proyectadas.

Teniendo en cuenta que, en el municipio de Villavicencio, Rio Guatiquia – Parcelas del Progreso y en la vía Villavicencio – Montfort, se requiere adelantar acciones de mitigación del riesgo, y que a la fecha está en ejecución pero que debido a lo expuesto anteriormente no ha logrado finalizar; solicitamos se nos otorgue una prórroga al contrato por un término de quince (15) días contados a partir del vencimiento de este, dando como fecha de terminación final el 22 de junio de 2025.

Cordialmente,

LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
Representante Legal
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S"
NIT: 900.788.754-1

CONTRATO No: 1040 DE 2025

OBJETO: "SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

CONTRATISTA: SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."

INFORME PRORROGA No.1

VILLAVICENCIO

CONTENIDO

1. Antecedentes 4
1.1 Información Básica 4
1.2 Antecedentes 5
1.3 Objetivos Del Contrato 6
2. Introducción 6
3. Localización Puntos De Ejecución 7
4. Modificaciones En El Tiempo-Prórrogas Y Suspensiones 15
5. Modificatorias Y/O Aclaratorios Realizados Al Contrato 15
6. Informacion Financiera 16
7. Verificación De Pólizas 16
8. Balance Financiero Del Contrato Y Ejecución Fisica 18
Balance Financiero 18
9. Presupuesto General Según Condiciones Iniciales Del Contrato 19
10. Presupuesto Ejecutado Del 08 De Abril Al 26 De Mayo De 2025. 20
11. Ejecucion Del 08 De Abril Al 26 De Mayo De 2025 21
Reporte De Maquinaria 25
Resumen General De Horas Ejecutadas 25
12. Justificación De La Solicitud De Prorroga No.1 31
13. Conclusiones 37
14. Anexos 38

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información basica del contrato. 4
Tabla 2.Modificaciones En El Tiempo-Prórrogas y Suspensiones 15
Tabla 3.Modificatorias y/o Aclaratorios Realizados al Contrato 15
Tabla 4. Información financiera 16
Tabla 5. Amparos del contrato 16
Tabla 6. Póliza Iniciales – Anexo 0 17
Tabla 7. Póliza según Acta de inicio – Anexo 2 17
Tabla 18. Balance financiero 18
Tabla 20. Presupuesto general según condiciones iniciales del contrato 19
Tabla 21. Presupuesto ejecutado del 01 de Abril al 30 de abril de 2025. 20
Tabla 22. Maquinaria utilizada en el mes de abril de 2025 21
Tabla 36. Resumen general de horas ejecutadas 25

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del departamento del Meta. 7
Ilustración 2. Localización municipio de El Calvario 8
Ilustración 3. Localización del punto, vía Villavicencio - El Calvario, en la Vereda El Carmen 8
Ilustración 4. Localización del punto, vía Villavicencio - El Calvario, en la Vereda San Bernardo 9
Ilustración 5. Localización del punto, vía Villavicencio -Inspección de Montfort municipio de El Calvario. 9
Ilustración 6. Localización municipio de Guamal 10
Ilustración 7 . Localización Del Punto, Guamal, Rio Guamal – Sector La Isla 10
Ilustración 8 . Localización Del Punto, Guamal, Rio Guamal – Sector Pio XII 11
Ilustración 9 . Localización del Municipio de Villavicencio 11
Ilustración 10. Ubicación del punto Villavicencio, Palmarito – Rio Guayuriba 12
Ilustración 10. Ubicación del punto Villavicencio, Parcelas del Progreso – Rio Guatiquia 12
Ilustración 9 . Localización del Municipio de El Castillo 13
Ilustración 10. Ubicación del punto El Castillo/ El Dorado, Trasvase rio Ariari a Rio Viejo 13
Ilustración 9 . Localización del Municipio de El Castillo 14
Ilustración 10. Ubicación del punto El Castillo, Puerto Esperanza – Rio La Cal 15
Ilustración 10. Boletín No. 0139 Alertas hidrológicas Fecha: 19/05/2025 31
Ilustración 10. Boletín No. 0140 Alertas hidrológicas Fecha: 20/05/2025 32
Ilustración 10. Boletín No. 0141 Alertas hidrológicas Fecha: 21/05/2025 32
Ilustración 10. Boletín No. 0142 Alertas hidrológicas Fecha: 22/05/2025 33
Ilustración 10. Boletín No. 0143 Alertas hidrológicas Fecha: 23/05/2025 33
Ilustración 10. Boletín No. 0144 Alertas hidrológicas Fecha: 24/05/2025 34
Ilustración 10. Boletín No. 0145 Alertas hidrológicas Fecha: 25/05/2025 34
Ilustración 10. Boletín No. 0146 Alertas hidrológicas Fecha: 26/05/2025 35
Ilustración 10. Boletín No. 0147 Alertas hidrológicas Fecha: 27/05/2025 35
Ilustración 10. Placa huella en construcción via Villavicencio - Montfort 36

1. ANTECEDENTES

1.1 Información Básica

Tabla 1. Información basica del contrato.

CONTRATO No.	1040 DE 2025
OBJETO:	SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. SERVIMACONS S.A.S
NIT:	900.788.754-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ
CONTRATANTE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – DEPARTAMENTO DEL META
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	04 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO:	08 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	07 DE JUNIO DE 2025
TÉRMINO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
VALOR CONTRATO:	$ 799.585.990,00

Fuente: Propia, 2025

1.2 Antecedentes

El artículo 7 de la Ordenanza 0995 del 2018, hace mención a las funciones de la Dirección Departamental Para la Gestión de Riesgos de Desastres numeral 7 "Realizar actividades de prevención, mitigación, atención y rehabilitación en situaciones de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres, sin perjuicio de las responsabilidades de cada una de las dependencias y entidades departamentales" y numeral 17 "Administrar el banco de maquinaria asignado al Departamento, a través de la supervisión de la operación, mantenimiento, distribución y ejecución de obras concertadas en los planes de acción."

La Dirección Departamental Para la Gestión de Riesgos de Desastres pretende implementar acciones de atención y reducción de desastres que se generen por la Primera Temporada de más Lluvias del año 2025, teniendo en cuenta que el reporte del IDEAM determinó que en el oriente del país, mas específicamente en la región de la Orinoquia, no se descarta la probabilidad de lluvia entre el 10% al 40%, pues particularmente en esta zona del país, febrero suele ser un mes de poca lluvia; para el mes de marzo el promedio mensual es de 30%, mientras que el mes de abril es el mes con mayor precipitación en la región de la Orinoquía. Así mismo se indica que la Amazonía entre el 10 y 40%, mientras que la mayor lluviosidad se da entre mayo y junio y la Orinoquía tendrá mayores precipitaciones en la mayor parte de la región.

Desde la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, se adelantaron visitas técnicas donde se verificaron las afectaciones realizadas por la primera y segunda temporadas de lluvias del año 2024 y se determinaron los puntos de afectación con mayor relevancia para el departamento del Meta.

Las actuaciones previas realizadas por la DIGERD han logrado identificar plenamente la necesidad de contar con el servicio de la maquinaria de propiedad de la Gobernación del Meta, a fin de mitigar de manera directa y eficaz los efectos de las lluvias y la atención de afectaciones en los principales puntos críticos del Departamento, en especial, en aquellos lugares en los que se cuenta con el histórico de la afectación en la Entidad; la atención se ha determinado en razón a las solicitudes de los municipios a través de comunicación escrita a la Dirección, una vez realizadas diferentes visitas a los puntos críticos y en atención al histórico que reposa en esta Dependencia.

La Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres obrando conforme al principio de planeación y por el comportamiento histórico de la temporada de lluvias en el Departamento del Meta, la cual conlleva como consecuencia que las fuertes precipitaciones, aumenten los caudales de las fuentes hídricas, generando dinámicos procesos de avalanchas y desbordamientos en los diferentes ríos del departamento del Meta, afectando gravemente a algunas veredas y zonas urbanas de los municipios, arrasando viviendas, dejando otras afectadas, presentándose pérdida de la bancada en las vías, deslizamientos, inundaciones, crecientes súbitas de ríos y sus afluentes; poniendo en riesgo la vida de los habitantes y afectando igualmente el patrimonio de las familias; destinó recursos de manera previa para atender y mitigar las emergencias ocasionadas por los fenómenos y hechos mencionados.

Las lluvias también han afectado de forma notable las carreteras que comunican algunos de los municipios del departamento del Meta, dificultando el desplazamiento; razones por las cuales, desde la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, se contrató a una persona jurídica que por su

idoneidad presta el servicio de operación del banco de maquinaria del Departamento, es por ello que surge el presente contrato cuyo objeto es "SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."

1.3 Objetivo del Contrato

Mediante la prestación del servicio a través del SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META, se pretende atender y mitigar puntos priorizados que han sido afectados como consecuencia de la inundaciones de ríos y quebradas y remociones en masa en vías terciarias, que ponen en riesgo la vida de los habitantes y afectan el patrimonio de las familias.

2. INTRODUCCIÓN

Se debe realizar una efectiva y eficaz atención a las emergencias, labores de mitigación y todas las acciones requeridas para lograr cumplir el propósito público que enmarca las funciones de la Dirección Departamental para la Gestión de Riesgos de Desastres de Desastres, pero debido a que la Gobernación del Meta no cuenta con el personal idóneo y la logística suficiente para cubrir las necesidades mencionadas, que garanticen la operación de la maquinaria amarilla, se adelantó la contratación de una persona natural o jurídica para prestar el servicio de operación del banco de maquinaria del Departamento, el cual se realiza en Municipios del Departamento del Meta, priorizados por la Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, afectados en la temporada de lluvia por los desbordamiento de ríos, quebradas y/o fuentes hídricas y vías afectadas por deslizamiento o remociones en masa; es por ello que la Entidad establece la necesidad de llevar a cabo la contratación cuyo objeto corresponde a "SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META". El contrato obedece al desarrollo de actividades directamente relacionadas con la operación de la maquinaria adscrita a la Dirección Departamental para la Gestión de Riesgos de Desastres de Desastres.

El presente Informe contempla la descripción del alcance del contrato 1040 de 2025, suscrito entre el DEPARTAMENTO DEL META y SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S". Reporta la ejecución del contrato en el periodo del 08 de abril al 26 de mayo de 2025, lo anterior con el fin de solicitar prórroga del contrato.

3. LOCALIZACIÓN PUNTOS DE EJECUCIÓN

- **LIMITES DEL DEPARTAMENTO DEL META**

Este: Departamento del Vichada
Oeste: Departamento del Huila
Norte: Departamento de Cundinamarca
S u r: Departamento del Guaviare

Ilustración 1. Localización del departamento del Meta.



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Meta_%28Colombia%29#/media/Archivo:Meta_in_Colombia_(mainland)

El departamento del meta se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas

3°27'47" latitud norte
73°42'32"latitud oeste
Tiene una superficie de 82805 km2

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO**

Este: Municipio de Restrepo
Oeste: Municipio de Quetame (Cundinamarca)
Norte: Municipio de San Juanito
S u r: Municipio de Villavicencio

Ilustración 2. Localización municipio de El Calvario



Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Calvario_%28Meta%29#/media/Archivo:Colombia_-_Meta_-_El_Calvario.

El Calvario se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:
4° 21' 06'' Latitud Norte
73° 42' 48''Latitud Oeste
Tiene una **superficie** de 286 Kilómetros cuadrados

Ilustración 3. Localización del punto, vía Villavicencio - El Calvario, en la Vereda El Carmen



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto vía Villavicencio - El Calvario en las coordenadas Latitud: 4°20'41.81"N Longitud: 73°43'48.51"O

Ilustración 4. Localización del punto, vía Villavicencio - El Calvario, en la Vereda San Bernardo



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto vía Villavicencio - El Calvario en las coordenadas Latitud: 4°19'32.16"N Longitud: 73°45'37.74"O

Ilustración 5. Localización del punto, vía Villavicencio -Inspección de Montfort municipio de El Calvario.




Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa las ubicaciones del punto vía Villavicencio – Inspección de Montfort municipio de El Calvario en las coordenadas Deslizamiento No.1 Latitud: 4°16'40.17"N Longitud: 73°38'6.27"O - Deslizamiento No.2 Latitud: 4°18'44.39"N Longitud: 73°38'33.07"O – Excavación para alcantarillas Latitud: 4°19'6.79"N Longitud: 73°38'37.29"O.

LÍMITES DEL MUNICIPIO DE GUAMAL

Este: Municipio de Acacias, Castilla La Nueva y San Martin.
Oeste; Municipio Cubarral, Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C.
Norte: Municipio de Acacias, Departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C.
S u r: Municipios de Acacias y San Martin.

Ilustración 6. Localización municipio de Guamal

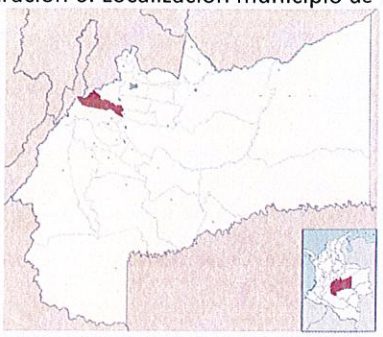

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Guamal_(Meta)

Guamal se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas:
3°52'40" Latitud Norte
73°46'07" Latitud Oeste
Tiene una superficie de 638 Kilómetros cuadrados.

Ilustración 7 . Localización Del Punto, Guamal, Rio Guamal – Sector La Isla



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación de los puntos del Sector La Isla – Rio Guamal
En las coordenadas: Coordenadas= Latitud: 3°54'18.38"N Longitud: 73°48'54.35"O y
Latitud: 3°54'34.58"N Longitud: 73°49'38.21"O

Ilustración 8 . Localización Del Punto, Guamal, Rio Guamal – Sector Pio XII




Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto del Sector Pio XII – Rio Guamal
En las coordenadas: Coordenadas= Latitud: 3°54'14.01"N Longitud: 73°48'9.28"O

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**

Este: Municipio Puerto López
Oeste; Municipio El Calvario, San Juanito y Villavicencio
Norte: Municipio de El Calvario y Restrepo
S u r: Municipios de Acacias y San Carlos de Guaroa.

Ilustración 9 . Localización del Municipio de Villavicencio

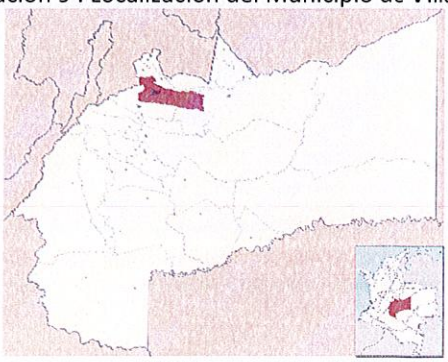

Fuente: https://historico.villavicencio.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx#lg=1&slide=1

Villavicencio se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas:
4°08'33" Latitud Norte
73°37'46" Latitud Oeste
Tiene una superficie de 1338 Kilómetros cuadrados.


Ilustración 10. Ubicación del punto Villavicencio, Palmarito – Rio Guayuriba



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto Villavicencio, Palmarito – Rio Guayuriba que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 3°57'54.72"N Longitud: 73°19'6.96"O.

Ilustración 11. Ubicación del punto Villavicencio, Parcelas del Progreso – Rio Guatiquia

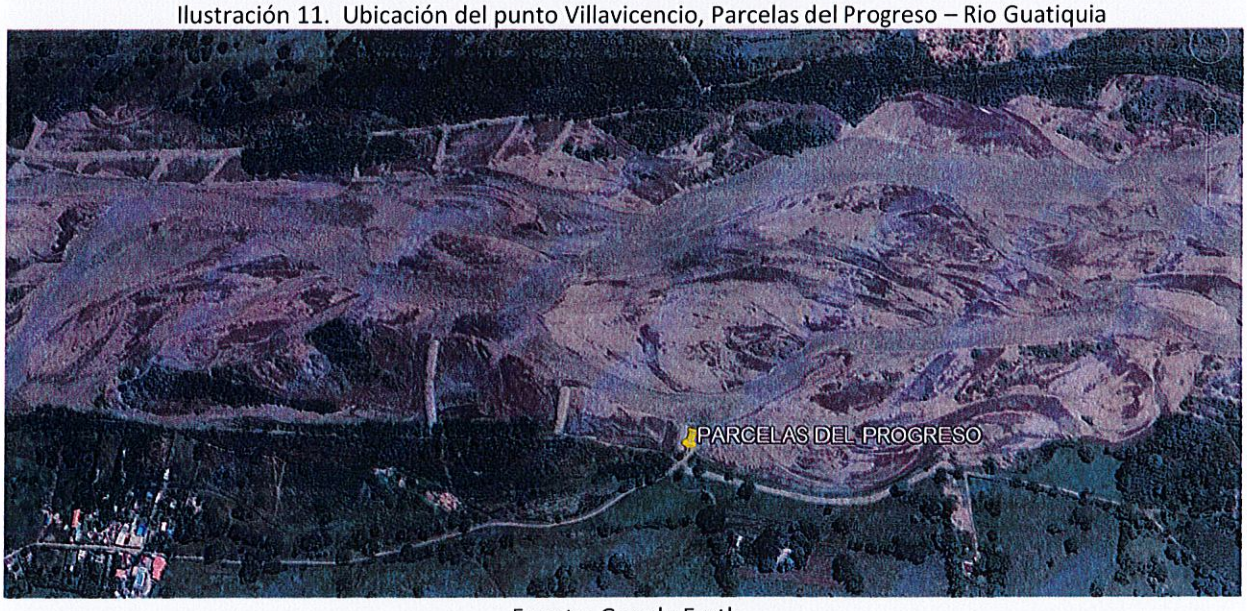


Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto Villavicencio, Parcelas del Progreso – Rio Guatiquia que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 4° 9'25.20"N Longitud: 73°33'48.83"O.

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DE EL DORADO**

Este: Municipio de San Martin, Cubarral, El Castillo
Oeste; Municipio de Cubarral, El Castillo
Norte: Municipio de Cubarral
S u r: Municipios de El Castillo

Ilustración 12 . Localización del Municipio de El Castillo

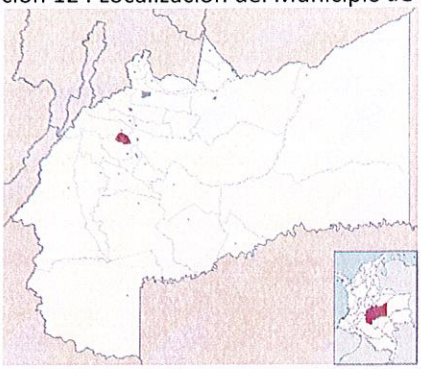

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Dorado_(Meta)

El Dorado se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas:
3°44'21" Latitud Norte
73°50'07" Latitud Oeste
Tiene una superficie de 117 Kilómetros cuadrados.

Ilustración 13. Ubicación del punto El Castillo/ El Dorado, Trasvase rio Ariari a Rio Viejo



Fuente: Google Earth


En la ilustración anterior se observa la ubicación de los puntos intervenidos debido a las afectaciones provocadas por el trasvase del rio Ariari a rio Viejo, los cuales tienen las siguientes coordenadas:

Punto 1 Latitud: 3°46'7.14"N Longitud: 73°50'42.16"O
Punto 2 Latitud: 3°44'37.43"N Longitud: 73°49'11.28"O
Punto 3 Latitud: 3°43'44.48"N Longitud: 73°48'29.87"O

- **LÍMITES DEL MUNICIPIO DE EL CASTILLO**

Este: Municipio de San Martin, Granada, El Dorado
Oeste; Municipio de Lejanías, Cubarral
Norte: Municipio de Cubarral, El Dorado
S u r: Municipios de Lejanías, Granada

Ilustración 14 . Localización del Municipio de El Castillo

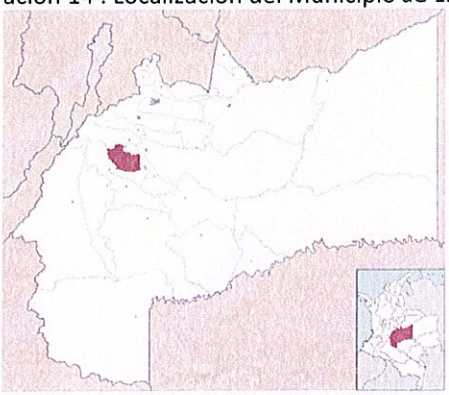

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_Castillo_(Meta)#/media/Archivo:Colombia_-_Meta_-_El_Castillo.svg/2

El Castillo se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas:
3°33'53" Latitud Norte
73°47'40" Latitud Oeste
Tiene una superficie de 573 Kilómetros cuadrados.

Ilustración 15. Ubicación del punto El Castillo, Puerto Esperanza – Rio La Cal



Fuente: Google Earth

En la ilustración anterior se observa la ubicación del punto El Castillo, Puerto Esperanza – Rio La Cal que tiene las siguientes coordenadas: Latitud: 3°37'29.10"N Longitud: 73°52'24.19"O

4. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO-PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Tabla 2.Modificaciones En el Tiempo-Prórrogas y Suspensiones

TIPO DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	DESDE	HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Propia, 2025

5. MODIFICATORIAS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

Tabla 3.Modificatorias y/o Aclaratorios Realizados al Contrato

CONTRATO ADICIONAL No.	CLAUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
N/A	N/A

Fuente: Propia, 2025

6. INFORMACION FINANCIERA

Tabla 4. Información financiera

RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSOS	FECHA	No. RP
030701-2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.009-20	$165.852.024,00	05/04/2025	3587
030701-2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.008-20	$383.846.973,12	05/04/2025	3589
030701-2.3.45.4503.1000.001.2.3.2.02.02.008-20F	$249.886.992,88	05/04/2025	3589
TOTALES	**$799.585.990,00**		

Fuente: Propia, 2025

7. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

El presente contrato constituyo garantía única con la compañía de Seguros Mundial. que contó con los siguientes amparos:

Tabla 5. Amparos del contrato

AMPARO	SUFICIENCIA	TÉRMINO
Cumplimiento del contrato	Por el Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Por un término igual a la de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Por el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato	Por un término igual a la de ejecución del contrato y tres (3) años más.
Calidad del Servicio	Por el Diez por ciento (10%) del valor total del contrato	Por un término igual a la de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	Igual a plazo de ejecución.

Fuente: Estudios previos del contrato 1040-2025.

Que se encuentran debidamente acatados con la expedición de las pólizas así: Póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales No. CV-100050038 y póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada cumplimiento No. CV-100013592, expedida por la aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Póliza Iniciales – Anexo 0

Tabla 6. Póliza Iniciales – Anexo 0

Póliza de Cumplimiento No.:	CV-100050038	**FECHA:**	04/04/2025
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	04/04/2025	04/10/2025	$79.958.599,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	04/04/2025	04/06/2028	$39.979.299,50
Calidad del servicio	04/04/2025	04/10/2025	$79.958.599,00

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	CV-100013592	**FECHA:**	04/04/2025
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predio Labores y Operaciones. Patronal Contratistas y subcontratista Vehículos propios y no propios.	04/04/2025	04/06/2025	$284.700.000,00

Fuente: Propia, 2025

Póliza según Acta de inicio – Anexo 2

Tabla 7. Póliza según Acta de inicio – Anexo 2

Póliza de Cumplimiento No.:	CV-100050038	**FECHA:**	15/04/2025
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	08/04/2025	08/10/2025	$79.958.599,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	08/04/2025	08/06/2028	$39.979.299,50
Calidad del servicio	08/04/2025	08/10/2025	$79.958.599,00

Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No.:	CV-100013592	**FECHA:**	15/04/2025
AMPAROS	**VIGENCIA**		**Valor Asegurado**
	DESDE	**HASTA**	
Predio Labores y Operaciones. Patronal Contratistas y subcontratista Vehículos propios y no propios.	08/04/2025	08/06/2025	$284.700.000,00

Fuente: Propia, 2025

8. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN FISICA

BALANCE FINANCIERO

Tabla 8. Balance financiero

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 799.585.990,00	04 DE ABRIL DE 2025		N/A
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 799.585.990,00	N/A	N/A	
PAGO PARCIAL NO. 1	$ 0,00	N/A	0,00%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(-) AMORTIZACION ANTICIPO 40%	$ 0,00			
VALOR NETO ACTA 1	$ 0,00			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 799.585.990,00	08 DE ABRIL DE 2025 AL 07 DE JUNIO DE 2025	100,00%	EL PORCENTAJE SE CALCULA RESPECTO AL VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO
POR AMORTIZAR	N/A		N/A	N/A

Fuente: Propia, 2025

9. PRESUPUESTO GENERAL SEGÚN CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

Tabla 9. Presupuesto general según condiciones iniciales del contrato

PRESUPUESTO OFICIAL OPERACIÓN DE MAQUINARIA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR SUB-TOTAL**
1.1.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA	HR	62	$ 450.000,00	$ 27.900.000,00
1.2.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	HR	100	$ 443.300,00	$ 44.330.000,00
1.3.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	HR	990	$ 460.400,00	$ 455.796.000,00
1.4.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3	HR	150	$ 278.400,00	$ 41.760.000,00
1.5.	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	HR	81	$ 325.000,00	$ 26.325.000,00
1.6.	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	DIA	30	$ 287.000,00	$ 8.610.000,00
				SUB-TOTAL	**$ 604.721.000,00**
				IVA 19%	**$ 114.896.990,00**
1.7.	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	MES	2	$ 33.600.000,00	$ 67.200.000,00
				IVA 19%	**$ 12.768.000,00**
TOTAL OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARÍA =					**$ 799.585.990,00**

Fuente: Propia, 2025

10. PRESUPUESTO EJECUTADO DEL 08 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025.

Tabla 10. Presupuesto ejecutado del 08 de Abril al 26 de Mayo de 2025.

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO						POR EJECUTAR	
						MESES ANTERIORES		PRESENTE INFORME		ACUMULADO			
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL	CANT	VALOR SUB-TOTAL
1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN	HR	62	$ 450.000,00	$ 27.900.000,00	0	$ 0,00	57,00	$ 25.650.000,00	57,00	$ 25.650.000,00	5,00	$ 2.250.000,00
2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL	HR	100	$ 443.300,00	$ 44.330.000,00	0	$ 0,00	100,00	$ 44.330.000,00	100,00	$ 44.330.000,00	0,00	$ 0,00
3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	HR	990	$ 460.400,00	$ 455.796.000,00	0	$ 0,00	948,10	$ 436.505.240,00	948,10	$ 436.505.240,00	41,90	$ 19.290.760,00
4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	HR	150	$ 278.400,00	$ 41.760.000,00	0	$ 0,00	130,20	$ 36.247.680,00	130,20	$ 36.247.680,00	19,80	$ 5.512.320,00
5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	HR	81	$ 325.000,00	$ 26.325.000,00	0	$ 0,00	67,6	$ 21.970.000,00	67,6	$ 21.970.000,00	13,40	$ 4.355.000,00
6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	DIA	30	$ 287.000,00	$ 8.610.000,00	0	$ 0,00	30,00	$ 8.610.000,00	30,00	$ 8.610.000,00	0,00	$ 0,00
7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	MES	2	$ 33.600.000,00	$ 67.200.000,00	0	$ 0,00	1,22	$ 40.862.959,85	1,22	$ 40.862.959,85	0,78	$ 26.337.040,15
				SUBTOTAL	**$ 671.921.000,00**		**$ 0,00**		**$ 614.175.879,85**		**$ 614.175.879,85**		**$ 57.745.120,15**
				IVA	**$ 127.664.990,00**	**0,00%**	**$ 0,00**	**91,41%**	**$ 116.693.417,17**	**91,41%**	**$ 116.693.417,17**	**8.,59%**	**$ 10.971.572,83**
				TOTAL	**$ 799.585.990,00**		**$ 0,00**		**$ 730.869.297,02**		**$ 730.869.297,02**		**$ 68.716.692,98**

Fuente: Propia, 2025

11. EJECUCION DEL 08 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DE 2025

En el periodo del 08 de abril de 2025 al 26 de mayo de 2025, en el desarrollo del contrato 1040 de 2025, con la operación y funcionamiento del banco de maquinaria amarilla del departamento del Meta se intervino el municipio de Villavicencio, Guamal, El Calvario, El Dorado y El Castillo con una inversión en el periodo del presente informe de $ 730.869.297,02 para un acumulado ejecutado a corte del 26 de mayo de 2025 de $ 730.869.297,02.

Los equipos utilizados en el periodo del presente informe son los siguientes:

Tabla 11. Maquinaria utilizada en el mes de abril de 2025

ÍTEM	TIPO DE EQUIPO	MARCA	LINEA	SERIAL	AÑO DESIGNACIÓN	PLACA
1	CAMABAJA	INTERNATIONAL	WORKSTAR 7600 SBA 6X4	3HSWYAHT8EN014421	2014	OJT-166
2	BULLDOZER	CATERPILLAR	D6K XL	CAT00D6KHFBH02765	2014	N/A
3	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	LINK BELT	210X2	LBX210Q5NDHEX2179	2014	N/A
4	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	LINK BELT	210X2	LBX210Q5NDHEX2180	2014	N/A
5	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	LINK BELT	210X2	LBX210Q5NDHEX2181	2014	N/A
8	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	LINK BELT	210X2	LBX210Q5NDHEX2183	2014	N/A
9	VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	FTR	9GDFTR341EB032856	2014	OJT 162
10	VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	FTR	9GDFTR346EB032125	2014	OJT 163
11	VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET	FTR	9GDFTR340EB032122	2014	OJT 165
12	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	416 E	CAT0416EPMFG08585	2014	N/A
13	CAMIONETA 4X4	MAZDA	BT-50	9FJUN84W0F0207097	2014	OJT-172

Fuente: Propia, 2025

A continuación, se presenta el plan de intervención especifico donde se refleja la ejecución en los puntos establecidos:

CONTRATO INICIAL												
N° PUNTO	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	HORAS PROYECTADAS				HORAS EJECUTADAS		HORAS POR EJECUTAR	
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR ($)	CANT. HORAS	VALOR ($)	CANT. HORAS	VALOR ($)
1	EL CALVARIO	***VEREDA EL CARMEN Y VEREDA SAN BERNARDO 73°43'48.51"O 4°20'41.81"N***	REHABILITACION PUNTOS CRÍTICOS VIA TERCIARIA.	DERRUMBES, AFECTACIÓN DE LA VIA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL	100,00	$ 443.300,00	$ 44.330.000,00	100,00	$ 44.330.000,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	0,00	$ 460.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	0,00	$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	0,00	$ 325.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							SUBTOTAL	**$ 44.330.000,00**		**$ 44.330.000,00**		**$ 0,00**
2		***VIA VILLAVICENCIO - MONFORTH 73°38'26.11"O 4°19'17.70"N***	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		$ 443.300,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		$ 460.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	81,00	$ 325.000,00	$ 26.325.000,00	67,60	$ 21.970.000,00	13,40	$ 4.355.000,00
							SUBTOTAL	**$ 26.325.000,00**		**$ 21.970.000,00**		**$ 4.355.000,00**
3	GUAMAL	***PIO XII 73°48'9.28"O 3°54'14.01"N***	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL	0,00	$ 443.300,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	130,00	$ 460.400,00	$ 59.852.000,00	130,00	$ 59.852.000,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	0,00	$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	0,00	$ 325.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							SUBTOTAL	**$ 59.852.000,00**		**$ 59.852.000,00**		**$ 0,00**

CONTRATO INICIAL													
N° PUNTO	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	HORAS PROYECTADAS				HORAS EJECUTADAS		HORAS POR EJECUTAR	
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR ($)	CANT. HORAS	VALOR ($)	CANT. HORAS	VALOR ($)
1	EL CALVARIO	***VEREDA EL CARMEN Y VEREDA SAN BERNARDO 73°43'48.51"O 4°20'41.81"N***	REHABILITACION PUNTOS CRÍTICOS VIA TERCIARIA.	DERRUMBES, AFECTACIÓN DE LA VIA	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL	100,00	$ 443.300,00	$ 44.330.000,00	100,00	$ 44.330.000,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	0,00	$ 460.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	0,00	$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	0,00	$ 325.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							SUBTOTAL	**$ 44.330.000,00**		**$ 44.330.000,00**		**$ 0,00**
2		***VIA VILLAVICENCIO - MONFORTH 73°38'26.11"O 4°19'17.70"N***	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		$ 443.300,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		$ 460.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	81,00	$ 325.000,00	$ 26.325.000,00	67,60	$ 21.970.000,00	13,40	$ 4.355.000,00
							SUBTOTAL	**$ 26.325.000,00**		**$ 21.970.000,00**		**$ 4.355.000,00**
3	GUAMAL	***PIO XII 73°48'9.28"O 3°54'14.01"N***	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL	0,00	$ 443.300,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	130,00	$ 460.400,00	$ 59.852.000,00	130,00	$ 59.852.000,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	0,00	$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	0,00	$ 325.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							SUBTOTAL	**$ 59.852.000,00**		**$ 59.852.000,00**		**$ 0,00**

CONTRATO INICIAL												
N° PUNTO	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	HORAS PROYECTADAS				HORAS EJECUTADAS		HORAS POR EJECUTAR	
					TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR ($)	CANT. HORAS	VALOR ($)	CANT. HORAS	VALOR ($)
4	VILLAVICENCIO	*SECTOR LA ISLA 73°48'54.35"O 3°54'18.38"N 73°49'38.21"O 3°54'34.58"N*	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL	0,00	$ 443.300,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	270,00	$ 460.400,00	$ 124.308.000,00	270,00	$ 124.308.000,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	0,00	$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	0,00	$ 325.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							SUBTOTAL	$ 124.308.000,00		$ 124.308.000,00		$ 0,00
6		*PALMARITO ARRAYANES 73°19'6.96"O 3°57'54.72"N*	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL	0,00	$ 443.300,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	250,00	$ 460.400,00	$ 115.100.000,00	250,00	$ 115.100.000,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	0,00	$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	0,00	$ 325.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							SUBTOTAL	$ 115.100.000,00		$ 115.100.000,00		$ 0,00
7		*PARCELAS DEL PROGRESO 73°33'48.83"O 4° 9'25.20"N*	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		$ 443.300,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2		$ 460.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET	150,00	$ 278.400,00	$ 41.760.000,00	130,20	$ 36.247.680,00	19,80	$ 5.512.320,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		$ 325.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							SUBTOTAL	$ 41.760.000,00		$ 36.247.680,00		$ 5.512.320,00

CONTRATO INICIAL												
					HORAS PROYECTADAS				HORAS EJECUTADAS		HORAS POR EJECUTAR	
N° PUNTO	MUNICIPIO	ZONA ESPECIFICA	ACCIONES A REALIZAR	RIESGO DE UN POSIBLE DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA	TIPO DE MAQUINA	CANT. HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR ($)	CANT. HORAS	VALOR ($)	CANT. HORAS	VALOR ($)
8	EL CASTILLO, EL DORADO	*TRASVASE DE RIO ARIARI A RIO VIEJO* *73°50'42.16"O 3°46'7.14"N* *73°49'11.28"O 3°44'37.43"N* *73°48'29.87"O 3°43'44.48"N*	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		$ 443.300,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	223,00	$ 460.400,00	$ 102.669.200,00	222,40	$ 102.392.960,00	0,60	$ 276.240,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		$ 325.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							SUBTOTAL	$ 102.669.200,00		$ 102.392.960,00		$ 276.240,00
9	EL CASTILLO	*PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL* *73°52'24.19"O 3°37'29.10"N*	DESCOLMATACIÓN, ENCAUZAMIENTO O CONFORMACIÓN DE JARILLONES	DESBORDAMIENTO E INUNDACIÓN	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL		$ 443.300,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2	117,00	$ 460.400,00	$ 53.866.800,00	75,70	$ 34.852.280,00	41,30	$ 19.014.520,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET		$ 278.400,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E		$ 325.000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							SUBTOTAL	$ 53.866.800,00		$ 34.852.280,00		$ 19.014.520,00
					FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN	62,00	$ 450.000,00	$ 27.900.000,00	57,00	$ 25.650.000,00	5,00	$ 2.250.000,00
					FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	30,00	$ 287.000,00	$ 8.610.000,00	30,00	$ 8.610.000,00	0,00	$ 0,00
					IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	2,00	$ 33.600.000,00	$ 67.200.000,00	1,22	$ 40.862.959,85	0,78	$ 26.337.040,15
							SUBTOTAL	$ 103.710.000,00		$ 75.122.959,85		$ 28.587.040,15
					SUBTOTAL			$ 671.921.000,00	SUBTOTAL	$ 614.175.879,85	SUBTOTAL	$ 57.745.120,15
					TOTAL INCLUYE IVA			$ 799.585.990,00	TOTAL INCLUYE IVA	$ 730.869.297,02	TOTAL INCLUYE IVA	$ 68.716.692,98
					PORCENTAJE			100,00%	PORCENTAJE EJECUTADO	91,41%	PORCENTAJE POR EJECUTAR	8,59%

REPORTE DE MAQUINARIA

RESUMEN GENERAL DE HORAS EJECUTADAS

Tabla 12. Resumen general de horas ejecutadas

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA							
	CAMABAJA INTERNATIONAL OJT166	VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS	BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA	8/04/2025	8/04/2025	4	$ 1.800.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS	BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA	8/04/2025	8/04/2025	4	$ 1.800.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
		GUAMAL	SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL	9/04/2025	9/04/2025	8	$ 3.600.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
								PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
		GUAMAL	SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL	10/04/2025	10/04/2025	4	$ 1.800.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO SECTOR PIO XII RIO GUAMAL Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
		EL CALVARIO	VIA MONFORTH	23/04/2025	23/04/2025	3	$ 1.350.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA LA VIA MONFORTH Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
		BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA	VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS	30/04/2025	30/04/2025	4	$ 1.800.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS
		BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA	VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS	30/04/2025	30/04/2025	4	$ 1.800.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO BAJO POMPEYA PARA EL PATIO GALICIA SERVIMACONS

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
		VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS	EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI	1/05/2025	1/05/2025	5	$ 2.250.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1 DEL PATIO SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO PUENTE LA AMISTAD Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
		VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS	EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI	7/05/2025	7/05/2025	4	$ 1.800.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PATIO GALICIA SERVIMACONS PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS DIRIJIMOS AL MUNICIPIO DE GUAMAL
		VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS	EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI	7/05/2025	7/05/2025	4	$ 1.800.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO PIO XII PARA EL PUNTO DE TRABAJO EL DORARO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
		EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI	SECTOR PUERTO ESPERANZA	17/05/2025	17/05/2025	4	$ 1.800.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4 DEL PUNTO DE TRABAJO SECTOR LA ISLA RIO ARIARI PARA EL PUNTO PUERTO ESPERANZA Y NOS

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
								REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
		GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO GUAMAL	VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS	23/05/2025	23/05/2025	4	$ 1.800.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3 DEL PUNTO DE TRABAJO GUAMAL, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
		EL DORADO, SECTOR LA ISLA RIO ARIARI	VILLAVICENCIO - PATIO GALICIA SERVIMACONS	24/05/2025	24/05/2025	5	$ 2.250.000,00	NOS DIRIJIMOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA TRANSPORTAR LA EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5 DEL PUNTO DE TRABAJO EL DORADO, SECTOR LA ISLA Y NOS REGRESAMOS AL PATIO SERVIMACONS
					TOTAL	**57**	**$ 25.650.000,00**	
2	**FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL**							
	BULLDOZER CATERPILLAR 2765 #2	EL CALVARIO	VEREDA EL CARMEN - VEREDA SAN BERNARDO	22/04/2025	6/05/2025	100	$ 44.330.000,00	SE REALIZA REHABILITACIÓN DE VIA EN EL PUNTO LA PAILA, RECORRIDO DE LA MAQUINA DEL PUNTO LA PAILA PARA EL DERRUMBE EN LA VEREDA EL CARMEN
					TOTAL	**100,00**	**$ 44.330.000,00**	
3	**FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS**							
	EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1	VILLAVICENCIO	BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA	8/04/2025	30/04/2025	127,2	$ 58.562.880,00	SE REALIZA EXCAVACIÓN EN EL CANAL PARA CONSTRUCIÓN DEL JARILLON Y PODER DESVIAR EL RIO
	EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5	VILLAVICENCIO	BAJO POMPEYA SECTOR PALMARITO, RIO GUAYURIBA	8/04/2025	30/04/2025	122,8	$ 56.537.120,00	SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA DESVIAR UN BRAZO DEL RIO QUE ESTA RECOSTADO EN LA MARGEN IZQUIERDA

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
	EXCAVADORA LINK BELT 2183 #3	GUAMAL	SECTOR LA ISLA, RIO GUAMAL	10/04/2025	23/05/2025	270	$ 124.308.000,00	SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE UN JARILLON DE PROTECCIÓN
	EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4	GUAMAL	SECTOR PIO XII, RIO GUAMAL	10/04/2025	7/05/2025	130	$ 59.852.000,00	SE REALIZA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON PARA QUITAR PRESION DE LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO Y SE CENTRA PARTE DEL RIO
	EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1	EL CASTILLO	TRASVASE RIO ARIARI A RIO VIEJO	2/05/2025	16/05/2025	106,5	$ 49.032.600,00	SE TRANSPALEA MATERIAL PARA AMPLIACIÓN DE CANAL EN EL RIO ARIARI
	EXCAVADORA LINK BELT 2180 #5	EL CASTILLO	TRASVASE RIO ARIARI A RIO VIEJO	7/05/2025	25/05/2025	107,8	$ 49.631.120,00	SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
	EXCAVADORA LINK BELT 2179 #4	EL CASTILLO	TRASVASE RIO ARIARI A RIO VIEJO	7/05/2025	26/05/2025	8,1	$ 3.729.240,00	SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PARA DESVIO DEL CAUCE DEL RIO
	EXCAVADORA LINK BELT 2181 #1	EL CASTILLO	PUERTO ESPERANZA, RIO LA CAL	17/05/2025	26/05/2025	75,7	$ 34.852.280,00	EXCAVACIÓN PARA CANAL Y SE CONFORMA JARILLON DE PROTECCIÓN
					TOTAL	**948,10**	**$ 436.505.240,00**	
4	**FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET**							
	VOLQUETA CHEVROLET OJT163 #3	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	$ 45.789,00	$ 45.796,00	55,5	$ 15.451.200,00	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
	VOLQUETA CHEVROLET OJT165 #5	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	$ 45.789,00	$ 45.796,00	55,1	$ 15.339.840,00	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
	VOLQUETA CHEVROLET OJT162 #2	VILLAVICENCIO	PARCELAS DEL PROGRESO	$ 45.790,00	$ 45.793,00	19,6	$ 5.456.640,00	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL RIO GUATIQUIA PARA CONSTRUCCIÓN DEL JARILLON
					TOTAL	**130,20**	**$ 36.247.680,00**	
5	**FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E**							
	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 8585 416E	EL CALVARIO	VIA MONFORTH	28/04/2025	6/05/2025	67,6	$ 21.970.000,00	REHABILITAVIÓN DE VIA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS
					TOTAL	**67,60**	**$ 21.970.000,00**	

ITEM	DESCRIPCIÓN / MAQUINA	MUNICIPIO	PUNTO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	HORAS EJECUTADAS	VALOR EJECUTADO	ACTIVIDAD REALIZADA
6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50							
						30	$ 8.610.000,00	
					TOTAL	30,00	$ 8.610.000,00	
7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES							
						1,22	$ 40.862.959,85	
					TOTAL	1,22	$ 40.862.959,85	
						SUBTOTAL	$ 614.175.879,85	
						IVA 19%	$ 116.693.417,17	
						TOTAL	$ 730.869.297,02	

Fuente: Propia, 2025


12.JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRORROGA NO.1

A la fecha del presente informe se reporta un porcentaje de ejecución del 91.41% que corresponde a un valor de $ 730.869.297,02. Con esta ejecución se ha ingresado a los ocho (8) puntos establecidos en el plan de intervención específico, actualizado y verificado semanalmente de acuerdo con lo indicado por la supervisión, de estos ocho (8) puntos, cinco (5) están totalmente finalizados y tres (3) se encuentran en proceso de intervención.

Si bien es cierto hemos avanzado eficientemente en la ejecución contractual y de los tres (3) puntos que se encuentran en proceso de intervención se espera finalizar el punto Puerto Esperanza ubicado en el Municipio de El Castillo dentro del término inicial de dos (2) meses, sin embargo, no ha sido posible finalizar los puntos ubicados en Parcelas del Progreso en Villavicencio y en la vía a Monfort en el Calvario.

En el punto Parcelas del Progreso debido a las condiciones hidrometeorológicas, el rio Guatiquia, ha tenido crecientes constantes, lo que no ha permitido el ingreso de las volquetas sencillas del banco de maquinaria, ya que el nivel elevado del rio impiden el acceso de las volquetas al punto de cargue de material, por lo anterior las volquetas no han logrado finalizar la ejecución de las 150 horas proyectadas y se encuentran a la espera de que el nivel del rio disminuya y permita el acceso al punto de cargue. Teniendo en cuenta que desde el día 19 de mayo de 2025 las volquetas no han podido ingresar al rio, se presenta el estado del clima, del periodo del 19 de mayo de 2025 hasta el corte del presente informe, donde se evidencia que el rio Guatiquia ha permanecido constantemente en alerta roja y naranja:

Ilustración 16. Boletín No. 0139 Alertas hidrológicas Fecha: 19/05/2025

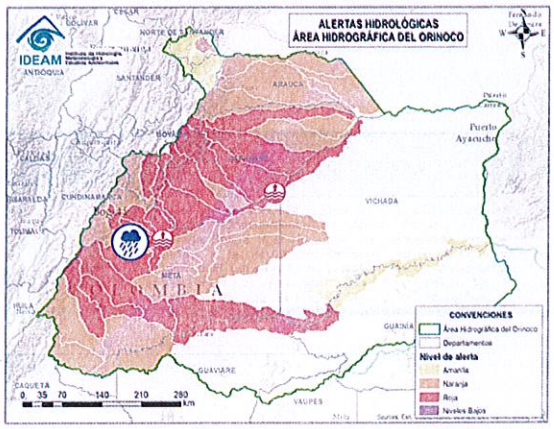

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Se presentaron inundaciones con afectaciones en el barrio Divino Niño y en la vereda Las Brisas de Apiay, del municipio de Villavicencio (7/05/2025). **2)** Inundación en el barrio El Brillante del municipio de Villavicencio, Meta (06/05/2025).

Fuente: IDEAM, Boletín de Alertas Hidrológicas (BAH)

Ilustración 17. Boletín No. 0140 Alertas hidrológicas Fecha: 20/05/2025



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Se presentaron inundaciones con afectaciones en el barrio Divino Niño y en la vereda Las Brisas de Aplay, del municipio de Villavicencio (7/05/2025). **2)** Inundación en el barrio El Brillante del municipio de Villavicencio, Meta (06/05/2025).

Fuente: IDEAM, Boletín de Alertas Hidrológicas (BAH)


Ilustración 18. Boletín No. 0141 Alertas hidrológicas Fecha: 21/05/2025



Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Se presentaron inundaciones con afectaciones en el barrio Divino Niño y en la vereda Las Brisas de Aplay, del municipio de Villavicencio (7/05/2025). **2)** Inundación en el barrio El Brillante del municipio de Villavicencio, Meta (06/05/2025).

Fuente: IDEAM, Boletín de Alertas Hidrológicas (BAH)


Ilustración 19. Boletín No. 0142 Alertas hidrológicas Fecha: 22/05/2025

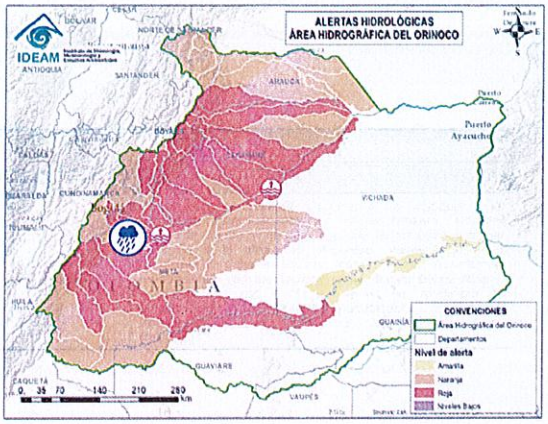

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Se presentaron inundaciones con afectaciones en el barrio Divino Niño y en la vereda Las Brisas de Apiay, del municipio de Villavicencio (7/05/2025). **2)** Inundación en el barrio El Brillante del municipio de Villavicencio, Meta (06/05/2025).

Fuente: IDEAM, Boletín de Alertas Hidrológicas (BAH)


Ilustración 20. Boletín No. 0143 Alertas hidrológicas Fecha: 23/05/2025

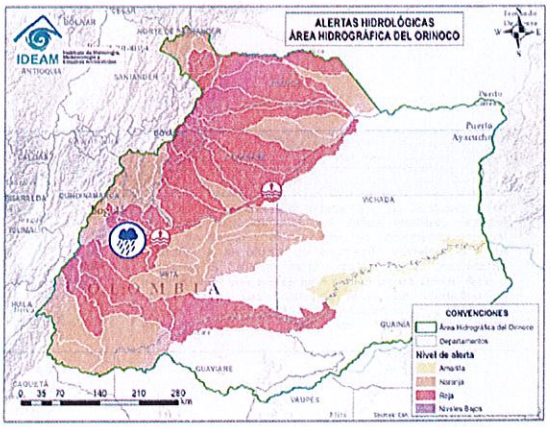

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Se presentaron inundaciones con afectaciones en el barrio Divino Niño y en la vereda Las Brisas de Apiay, del municipio de Villavicencio (7/05/2025). **2)** Inundación en el barrio El Brillante del municipio de Villavicencio, Meta (06/05/2025).

Fuente: IDEAM, Boletín de Alertas Hidrológicas (BAH)


Ilustración 21. Boletín No. 0144 Alertas hidrológicas Fecha: 24/05/2025

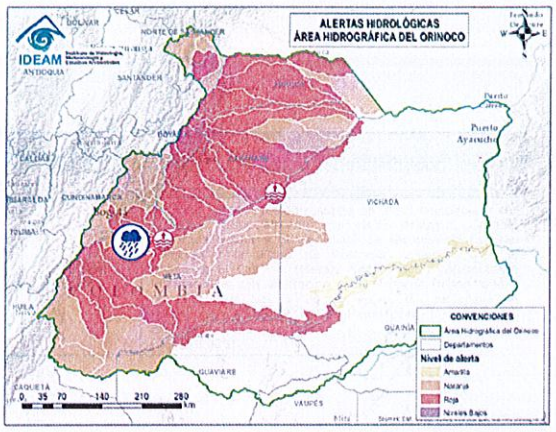

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Se presentaron inundaciones con afectaciones en el barrio Divino Niño y en la vereda Las Brisas de Aplay, del municipio de Villavicencio (7/05/2025). **2)** Inundación en el barrio El Brillante del municipio de Villavicencio, Meta (06/05/2025).

Fuente: IDEAM, Boletín de Alertas Hidrológicas (BAH)


Ilustración 22. Boletín No. 0145 Alertas hidrológicas Fecha: 25/05/2025

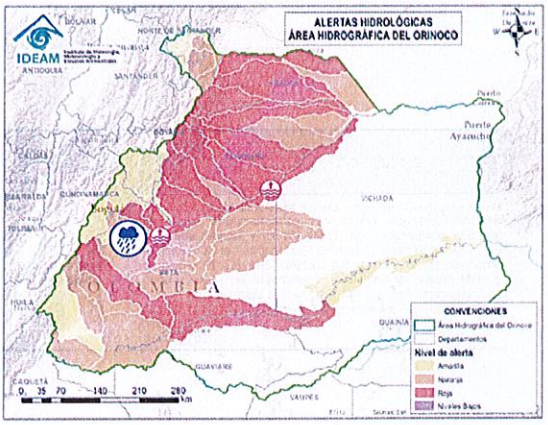

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Se presentaron inundaciones con afectaciones en el barrio Divino Niño y en la vereda Las Brisas de Aplay, del municipio de Villavicencio (7/05/2025). **2)** Inundación en el barrio El Brillante del municipio de Villavicencio, Meta (06/05/2025).

Fuente: IDEAM, Boletín de Alertas Hidrológicas (BAH)


Ilustración 23. Boletín No. 0146 Alertas hidrológicas Fecha: 26/05/2025

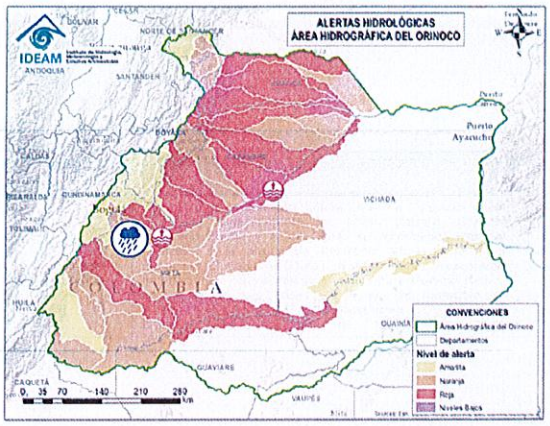

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Se presentaron inundaciones con afectaciones en el barrio Divino Niño y en la vereda Las Brisas de Apiay, del municipio de Villavicencio (7/05/2025). **2)** Inundación en el barrio El Brillante del municipio de Villavicencio, Meta (06/05/2025).

Fuente: IDEAM, Boletín de Alertas Hidrológicas (BAH)

Ilustración 24. Boletín No. 0147 Alertas hidrológicas Fecha: 27/05/2025

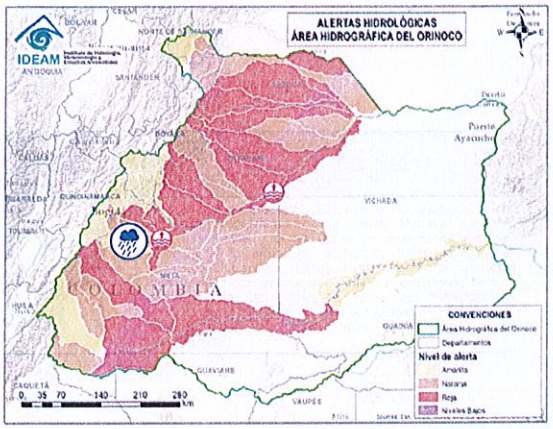

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Se presentaron inundaciones con afectaciones en el barrio Divino Niño y en la vereda Las Brisas de Apiay, del municipio de Villavicencio (7/05/2025). **2)** Inundación en el barrio El Brillante del municipio de Villavicencio, Meta (06/05/2025).

Fuente: IDEAM, Boletín de Alertas Hidrológicas (BAH)

Por otro lado, en el punto de intervención vía Villavicencio - Montfort ubicado en el municipio de El Calvario, no ha sido posible finalizar la ejecución de horas de retroexcavadora sobre llantas debido a que en un tramo de la vía ubicado antes del tramo intervenido con el presente contrato, se está construyendo una placa huella por lo que no hay acceso para llevar el combustible que requiere la máquina para finalizar las horas restantes, y además, no es posible el paso de la máquina para llegar al punto de embarque de la cama baja; así las cosas, se debe esperar a que se finalice la placa huella para poder continuar y terminar

con las horas proyectadas. A continuación, se adjunta registro fotográfico de la placa huella en construcción:

Ilustración 25. Placa huella en construcción via Villavicencio - Montfort



Fuente: Propia, 2025

Por lo anterior, teniendo en cuenta que, en el municipio de Villavicencio, Rio Guatiquia – Parcelas del Progreso y en la vía Villavicencio – Montfort, se requiere adelantar acciones de mitigación del riesgo, y que a la fecha está en ejecución pero que, debido a lo expuesto anteriormente, no se ha logrado finalizar, solicitamos se nos otorgue una prórroga al contrato por un término de quince (15) días contado a partir del vencimiento del mismo, dando como fecha de terminación final el 22 de junio de 2025.

13. CONCLUSIONES

A la fecha del presente informe se reporta un porcentaje de ejecución del 91.41% que corresponde a un valor de $ 730.869.297,02. Con esta ejecución se ha logrado ingresar a los ocho (8) puntos establecidos en el plan de intervención específico, actualizado de acuerdo con lo indicado por la supervisión, de estos ocho (8) puntos, cinco (59 están totalmente finalizados y tres (3) se encuentran en proceso de intervención.

Si bien es cierto hemos avanzado dentro de lo establecido, en la ejecución contractual y de los tres (3) puntos que se encuentran en proceso de intervención se espera finalizar el punto Puerto Esperanza ubicado en el Municipio de El Castillo dentro del término inicial de dos meses, sin embargo, no ha sido posible finalizar los puntos ubicados en Parcelas del Progreso y en la vía Monfort.

En el punto Parcelas del Progreso en el río Guatiquía no es posible culminar trabajos en el plazo contractual debido a que las condiciones hidrometeorológicas del rio Guatiquia que ha tenido crecientes constantes, no ha permitido el ingreso de las volquetas sencillas del banco de maquinaria, ya que el nivel elevado del rio impiden el acceso de las volquetas al punto de cargue de material; por lo anterior las volquetas no han logrado finalizar la ejecución de las 150 horas proyectadas y se encuentran a la espera de que el nivel del rio disminuya y permita el acceso al punto de cargue.

Por otro lado, en el punto vía Villavicencio - Montfort ubicado en el municipio de El Calvario no ha sido posible finalizar la ejecución de horas de retroexcavadoras asignadas debido a que en un tramo de la vía ubicado antes del tramo intervenido con el presente contrato se está construyendo una placa huella por lo que no hay acceso para llevar el combustible que requiere la máquina para finalizar las horas restantes, y además, no es posible el paso de la máquina para llegar al punto de embarque de la cama baja. Por tanto, se debe esperar a que se finalice la placa huella para poder continuar y terminar con las horas proyectadas.

Teniendo en cuenta que, en el municipio de Villavicencio, Rio Guatiquia – Parcelas del Progreso y en la vía Villavicencio – Montfort, se requiere adelantar acciones de mitigación del riesgo, y que a la fecha está en ejecución pero que debido a lo expuesto anteriormente no ha logrado finalizar; solicitamos se nos otorgue una prórroga al contrato por un término de quince (15) días contados a partir del vencimiento del mismo, dando como fecha de terminación final el 22 de junio de 2025.

14.**ANEXOS**

- Reporte del IDEAM
- Programación y flujo de caja
- Acta de comité

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
Directora Del Proyecto
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SERVIMACONS S.A.S.
CONTRATISTA


LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ
Representante Legal
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SERVIMACONS S.A.S.
CONTRATISTA

FLUJO DE CAJA CONTRATO 1040-2025 - SEGÚN PRORROGA No.1														
ACTIVIDAD		ABRIL 2025				MAYO 2025					JUNIO 2025			TOTAL GENERAL
OBJETO: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.		08 ABRIL 13 ABRIL	14 ABRIL 20 ABRIL	21 ABRIL 27 ABRIL	28 ABRIL 30 ABRIL	01 MAYO 04 MAYO	05 MAYO 11 MAYO	12 MAYO 18 MAYO	19 MAYO 25 MAYO	26 MAYO 31 MAYO	01 JUNIO 08 JUNIO	09 JUNIO 15 JUNIO	16 JUNIO 22 JUNIO	
		$ 77.587.858,85	$ 45.259.584,28	$ 99.571.085,51	$ 45.259.584,28	$ 45.259.584,58	$ 99.571.085,51	$ 99.571.085,51	$ 99.571.085,41	$ 99.571.085,76	$ 29.454.650,10	$ 29.454.650,10	$ 29.454.650,10	$ 799.585.990,00
1,1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA	$ 3.221.660,37	$ 1.879.301,88	$ 4.134.464,14	$ 1.879.301,88	$ 1.879.301,88	$ 4.134.464,14	$ 4.134.464,14	$ 4.134.464,14	$ 4.134.464,24	$ 1.223.037,73	$ 1.223.037,73	$ 1.223.037,73	$ 33.201.000,00
1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	$ 5.118.860,37	$ 2.986.001,88	$ 6.569.204,14	$ 2.986.001,88	$ 2.986.001,88	$ 6.569.204,14	$ 6.569.204,14	$ 6.569.204,14	$ 6.569.204,24	$ 1.943.271,06	$ 1.943.271,06	$ 1.943.271,06	$ 52.752.700,00
1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	$ 52.631.538,12	$ 30.701.730,57	$ 67.543.807,25	$ 30.701.730,57	$ 30.701.730,57	$ 67.543.807,25	$ 67.543.807,25	$ 67.543.807,25	$ 67.543.807,25	$ 19.980.491,31	$ 19.980.491,31	$ 19.980.491,31	$ 542.397.240,00
1,4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3	$ 4.822.098,12	$ 2.812.890,57	$ 6.188.359,25	$ 2.812.890,57	$ 2.812.890,57	$ 6.188.359,25	$ 6.188.359,25	$ 6.188.359,25	$ 6.188.359,25	$ 1.830.611,31	$ 1.830.611,31	$ 1.830.611,31	$ 49.694.400,00
1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	$ 3.039.792,43	$ 1.773.212,20	$ 3.901.066,94	$ 1.773.212,20	$ 1.773.212,50	$ 3.901.066,94	$ 3.901.066,94	$ 3.901.066,99	$ 3.901.066,99	$ 1.153.995,29	$ 1.153.995,29	$ 1.153.995,29	$ 31.326.750,00
1,6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	$ 994.211,33	$ 579.956,61	$ 1.275.904,54	$ 579.956,61	$ 579.956,61	$ 1.275.904,54	$ 1.275.904,54	$ 1.275.904,44	$ 1.275.904,54	$ 377.432,08	$ 377.432,08	$ 377.432,08	$ 10.245.900,00
1,7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	$ 7.759.698,12	$ 4.526.490,57	$ 9.958.279,25	$ 4.526.490,57	$ 4.526.490,57	$ 9.958.279,25	$ 9.958.279,25	$ 9.958.279,20	$ 9.958.279,25	$ 2.945.811,32	$ 2.945.811,32	$ 2.945.811,32	$ 79.968.000,00

LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATO 1040 DE 2025

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo	Tiempo de Ejecución	Dias Calendario	Comienzo	Fin	Predecesor
0	**0**	**PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO 1040-2025**	**$ 799.585.990**	**65 días**	**74,42 días**	**mar 8/04/25**	**sáb 21/06/25**	
1	1,1	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE TRACTO-CAMIÓN INTERNACIONAL 7600 CAPACIDAD CARGA 35 TONELADAS CON ACCESORIO CAMABAJA	$ 33.201.000	65 días	74,42 días	mar 8/04/25	sáb 21/06/25	
2	1,2	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE BULLDOZER SOBRE ORUGA CATERPILLAR D6K XL, CAPACIDAD DE ARRASTRE 5 TONELADAS	$ 52.752.700	53 días	60,42 días	mar 8/04/25	sáb 7/06/25	1CC
3	1,3	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA LINK-BELT 210 X2, CAPACIDAD BALDE 1 M3 21 TONELADAS	$ 542.397.240	53 días	60,42 días	mar 8/04/25	sáb 7/06/25	1CC
4	1,4	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE VOLQUETA SENCILLA FTR CHEVROLET CAPACIDAD DE CARGUE DE 6 M3	$ 49.694.400	65 días	74,42 días	mar 8/04/25	sáb 21/06/25	1CC
5	1,5	FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E	$ 31.326.750	65 días	74,42 días	mar 8/04/25	sáb 21/06/25	1CC
6	1,6	FUNCIONAMIENTO DE CAMIONETA BT50	$ 10.245.900	53 días	60,42 días	mar 8/04/25	sáb 7/06/25	1CC
7	1,7	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	$ 79.968.000	53 días	60,42 días	mar 8/04/25	sáb 7/06/25	1CC

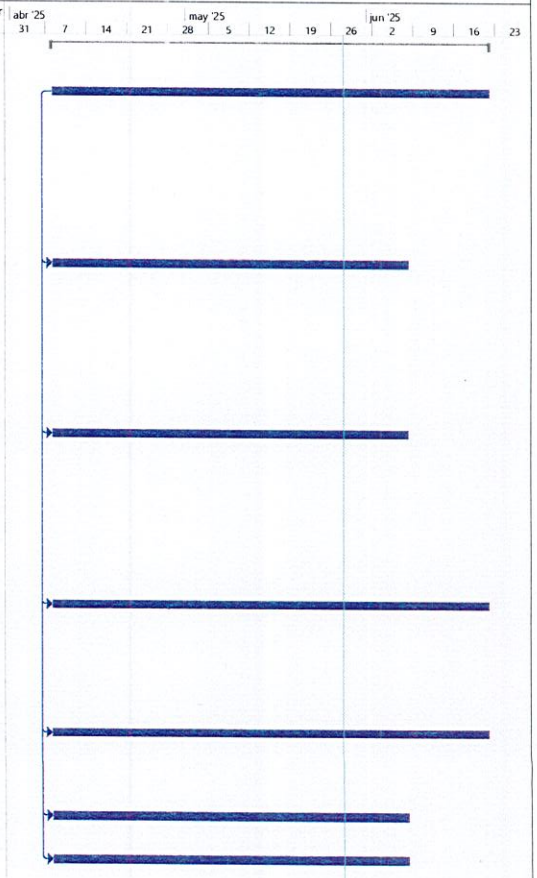

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Progreso
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · Progreso manual
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo

LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO
RL SERVIMACONS SAS
FECHA: MAYO 2025

DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO:	F-TH-38
		VERSIÓN:	02

ACTA N° 007

CONTRATO No.:	1040 DEL 2025		
OBJETO:	"SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS VEINTINUEVE (29) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.".		
CONTRATISTA:	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."		
FECHA DE REUNIÓN:	27 de mayo del 2025		
LUGAR DE REUNIÓN:	Dirección Departamental Para La Gestión Del Riesgo De Desastres – Departamento Del Meta		
HORA DE INICIO:	11:30 A.M.	**HORA FINAL:**	12:30 P.M.
CONVOCA:	Luz Nelly Monzon Diaz		
DEPENDENCIA:	Dirección para Gestión del Riesgo de Desastres del Meta		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

- Seguimiento a la ejecución del Plan de Intervención del Contrato 1040 de 2025.
- Solicitud de prorroga No.1 del contrato 1040 de 2025.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	LA ACCIÓN FUE			EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
			EFICAZ	EFICIENTE	EFECTIVA	
	NA	NA				NA

EFICAZ: Cumplimiento del compromiso. **EFICIENTE:** Uso racional de recursos (Tiempo, Dinero y/o Personal) **EFECTIVA:** Contribuyó al cumplimiento del objetivo del proceso (Impacto).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- El contratista socializa a la supervisión el avance de ejecución del contrato, que a corte del 26 de mayo de 2025 tiene un porcentaje ejecutado del 91.41%, respecto al 81.83% programado.

- El contratista informa que hay tres (03) puntos en ejecución y que si bien se ha avanzado dentro de lo establecido contractualmente y se espera finalizar el punto Puerto Esperanza ubicado en el municipio de El Castillo dentro del termino inicial de dos meses, los puntos Parcelas del Progreso y vía Monfort no han logrado finalizar la intervención debido a que:

  En el punto Parcelas del Progreso en el río Guatiquía las condiciones hidrometeorológicas del rio Guatiquia que ha tenido crecientes constantes, no ha permitido el ingreso de las volquetas sencillas del banco de maquinaria, ya que el nivel elevado del rio impiden el acceso de las volquetas al punto de

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

cargue de material; por lo anterior las volquetas no han logrado finalizar la ejecución de las 150 horas proyectadas y se encuentran a la espera de que el nivel del rio disminuya y permita el acceso al punto de cargue.

Por otro lado, en el punto vía Villavicencio - Montfort ubicado en el municipio de El Calvario, en un tramo de la vía ubicado antes del tramo intervenido con el presente contrato, se está construyendo una placa huella, por lo que no hay acceso para llevar el combustible que requiere la máquina para finalizar las horas restantes, y además, no es posible el paso de la máquina para llegar al punto de embarque de la cama baja. Por tanto, se debe esperar a que se finalice la placa huella para poder continuar y terminar con las horas proyectadas.

- Por lo anterior, el contratista solicita una prorroga por un termino de quince (15) días que permita finalizar la intervención en los puntos mencionados, la supervisión está de acuerdo y le indica al contratista que debe realizar la solicitud por medio de oficio soportado con un informe.

- El contratista se compromete a entregar la solicitud el día 28 de mayo de 2025 y se da por finalizado el comité.

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Solicitud de prorroga No.1 del contrato 1040 de 2025.	Se requiere un término adicional de quince (15) días para finalizar las actividades de mitigación en los puntos Parcelas del Progreso y vía Villavicencio- Montfort.	Servicios, Maquinaria y Construcciones Sas "Servimacons Sas"	28/05/2025

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN

NOMBRES / APELLIDOS	CÉDULA	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
LUZ NELLY MONZON DIAZ	40.373.611	Supervisor del contrato	gestiondelriesgoydesastres@meta.gov.co	
JOAN MANUEL RUIZ MORA	86.046.739	Apoyo tecnico	gestiondelriesgoydesastres@meta.gov.co	
LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ	17.336.809	Representante Legal Servicios, Maquinaria y Construcciones S.A.S "SERVIMACONS S.A.S"	gerencia@servimacons.com	
CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ	51.753.503	Directora de Proyecto	ingenieria@servimacons.com	
ALIX CAROLINA ROMERO AYA	1.121.946.214	Ingeniera de Campo	ingenieria@servimacons.com	

En el caso de superar 10 asistentes, se debe adjuntar el Formato Control de Asistencia Servidores Públicos F-TH-42.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
