CONVENIO No.3253-2023:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16

PERIODO: 01/12/2024 AL 31/01/2025

San Juan de Pasto, febrero 2025

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	3/02/2025	CON CORTE :	31/01/2025

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO CONTRACTUAL:	GN3253-2023		
CDP No.:	2023050069	FECHA:	4/05/2023
REGISTRO No:	2023061065	FECHA:	26/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VÍAS 25NR19 (CRUCE TRAMO 2501A) ROSA FLORIDA – BERRUECOS – SAN LORENZO – (CRUCE TAMINANGO) – LA HONDA, 25NR19-1 SAN LORENZO – LA LAGUNA Y 25NR05 PANOYA (CRUCE RUTA 2502) – TAMINANGO – SANTA CECILIA – LA UNIÓN. EN LOS TRAMOS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.		
MODIFICACIÓN No.:	1 DEL 8 de agosto de 2023	Detalle: Ajuste de clausulas, sin afectar alcance, valor o plazo de ejecución.	
MODIFICACION No.:	2 DEL 28 de noviembre de 2023	Detalle: Prórroga hasta el 31 de julio de 2024	
MODIFICACION No.:	3 DEL 31 de julio de 2024	Detalle: Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024	
CONTRATISTA DE OBRA:	CAMINAR INGENIERIA S.A.S		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	AMANDA ISABEL PANTOJA QUIROZ		
SUPERVISOR	Secretario de Infraestructura y Minas		
APOYO A LA SUPERVISION	Lorena Elixa Arturo Delgado		
META FISICA	20 alcantarillas		
VALOR DEL CONVENIO:	657.016.814,72		
APORTE DEPARTAMENTO	655.016.814,72		
APORTE MUNICIPIO	2.000.000,00		
FECHA DE INICIACION:	miércoles, 19 de julio de 2023		
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	jueves, 18 de enero de 2024		
SUSPENSION	N/A		
REINICIO	N/A		
MODIFICACION 2	martes, 28 de noviembre de 2023		
MODIFICACION 3	miércoles, 31 de julio de 2024		
FECHA DE TERMINACION SEGUN MOD 3:	martes, 31 de diciembre de 2024		
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	martes, 31 de diciembre de 2024		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$	262.006.725,89	
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$	262.006.725,89	
GARANTÍAS:	CUMPLIMIENTO Y MANEJO DE ANTICIPO		
POLIZA No.:	436-47-994000059011		
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	100,00%	% EJECUTADO: 100%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	100,00%	% EJECUTADO 67,99%
META FISICA A LA FECHA	ALCANTARILLAS	20	

2. DESCRIPCIÓN AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TÉCNICOS: El convenio se suscribe con el municipio de San Lorenzo (N), quien es de acuerdo al anexo contractual el ente encargado de contratar tanto obra como interventoría.

La meta física es la construcción de 22 alcantarillas en las vías jurisdicción del Departamento de Nariño que atraviesan el municipio de San Lorenzo y presentan deficiencias en su sistema de drenaje.

El convenio inicia suscribe acta de inicio el día 19 de julio de 2023,teniendo un plazo inicial de ejecución hasta el día 18 de enero de 2024.

El día 8 de agosto, se suscribe el modificatorio 1, el cual realiza un ajuste a las cláusulas contractuales, sin que el mismo afecte el alcance, plazo o valor del presente convenio.

Actualmente el municipio cuenta con los contratos derivados de obra e interventoría adjudicados.

El contrato de obra por medio de la LP003-2023 es adjudicado el día 24 de noviembre de 2023.

El contrato de interventoría por medio del CMA003-2023 es adjudicado el día 28 de noviembre de 2023.

de acuerdo a solicitud del municipio, el cual manifiesta requerir el plazo para la ejecución física de la obra una vez se establezca orden de inicio. el día 28 de noviembre de se suscribe modificatorio 2, el cual prorroga el plazo de ejecución hasta el día 31 de julio de 2024.

El contrato de obra actualmente ha detenido su ejecución física a espera de aprobación del balance de cantidades contractuales, obra de mas, obra de menos e ítems no previstos correspondientes a disipadores y mejoramiento de cimentación en concreto ciclópeo.

El proyecto presenta una ejecución física del 64%, según información del Municipio.

Los contratos derivados se encuentran suspendidos hasta definir la aprobación del balance de obra sin afectar el valor del contrato.

Se suscribe acta de modificación 3 el día 31 de julio de 2024 prorrogando el convenio hasta el 31 de diciembre de 2024. Se solicita al municipio actualización de póliza y cargue a secop 2.

Una vez solucionado los motivos que llevaron a suscribir el acta de suspensión, se programa el reinicio para el 2 de septiembre de 2024.

Se realiza comité técnico con participación del municipio, contratista de obra, interventoría y supervisión del convenio.

El municipio hace la reposición de los recursos embargados de la cuenta bancaria, asegurando los recursos del anticipo desembolsados por el departamento.

El municipio actualiza la póliza según modificatorio 3 de 31 de julio de 2024
Continúan las actividades de construcción de alcantarillas, estructuras de entrada, estructuras de salida, aletas, instalación de tubería, revoque y los respectivos rellenos.

La obra llega a su 100% de ejecución, una vez finalizada la obra se programará entrega y recibo por parte de la supervisión y el trámite del correspondiente pago.

ASPECTOS FINANCIEROS : El Departamento hace el desembolso del anticipo el día 15 de abril de 2024 mediante comprobante de egreso Número 2024001841. Se hace el pago del acta parcial 1 según comprobante de egreso No. 2024014819 del 23 de diciembre de 2024. El municipio inicia trámite para desembolso deacta final para hacer el correspondiente pago a los contratistas de los contratos derivados.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :

Fecha de suscripción convenio: 23 de junio de 2023.
Fecha de inicio del convenio 19 de julio de 2023.
Fecha de suscripción modificatorio 1: 8 de agosto de 2023.
Fecha de suscripción modificatorio 2: 28 de noviembre de 2023.
Fecha de suscripción modificatorio 3: 31 de julio de 2024.

ASPECTOS LEGALES :

Convenio legalizado 24 de julio de 2023.
Modificatorio 1 legalizado 7 de septiembre de 2023.
Modificatorio 2 legalizado 19 de febrero de 2024.
Modificatorio 3 legalizado 10 de septiembre de 2024.

3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ejecuta el 100 % del contrato para un total de 20 alcantarillas. El Municipio entrega documentación para presentar cuenta de cobro. Se suscribe por las partes el acta de desembolso parcial 2 y Certificado de Cumplimiento parcial 2 por parte de La Secretaría de Infraestructura y Minas.

Proyectó: Lorena Elixa Arturo Delgado
Contratista de apoyo a la Supervisión- SIMD

Revisó: Luis Alberto Castillo Jojoa
Subsecretario de Infraestructura y Vías
Gobernación de Nariño

Revisó: Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto1: Estructura de alcantarilla terminada



Foto2: Estructura de alcantarilla terminada



Foto3: Estructura de alcantarilla terminada

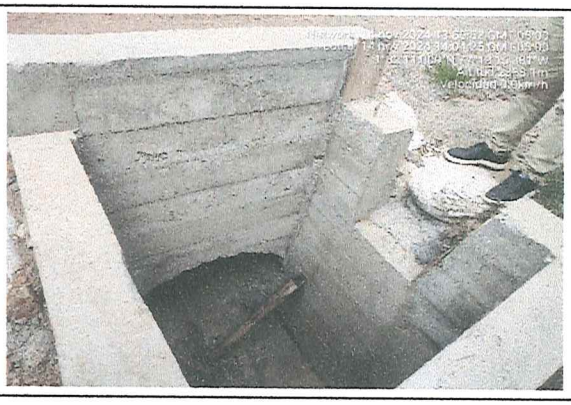


Foto4: Estructura de alcantarilla terminada

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	GN 3253-2023

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/04/2024	$ 262.006.725,89	$ 262.006.725,89	0	$ 262.006.725,89	$ 262.006.725,89	$ 0,00	2024001841	15/04/2024
ACTA PARCIAL 1	15/11/2024	$ 307.839.173,00	$ 569.845.898,89	$ 123.135.669,20	$ 184.703.503,80	$ 184.703.503,80	$ 0,00	202414819	23/12/2024
ACTA PARCIAL 2	3/12/2024	$ 281.965.583,00	$ 851.811.481,89	$ 112.786.233,20	$ 169.179.349,80				
TOTAL		$ 851.811.481,89		$ 235.921.902,40	$ 615.889.579,49	$ 446.710.229,69	$ 0,00		

% AVANCE FÍSICO EN OBRA	100%
% AVANCE FINANCIERO	68%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL PÓLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO.35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL PÓLIZAS

CONTRATO No	GN 3253-2023

GARANTIAS:	Aseguradora solidaria de Colombia
Póliza No.:	436-47-994000059011

ANEXO 0 -CONVENIO			FECHA APROBACIÓN		FECHA EXPEDICIÓN	7/07/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 196.505.044	30%	25-jun-23	25-jun-24		(246)
Buen manejo de Anticipo	$ 262.806.726	40%	25-jun-23	25-jun-24		(246)

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO			FECHA APROBACIÓN		FECHA EXPEDICIÓN	26/07/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 196.505.044	30%	19-jul-23	19-jul-24	Incio	(222)
Buen manejo de Anticipo	$ 262.806.726	40%	19-jul-23	19-jul-24	Incio	(222)

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ANEXO 2 - MODIFICATORIO 2			FECHA APROBACIÓN	22/01/2024	FECHA EXPEDICIÓN	28/12/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 197.105.044,20	30%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificatorio 2	(26)
Buen manejo de Anticipo	$ 262.806.726,00	40%	19-jul-23	31-ene-25	de acuerdo a modificatorio 2	(26)

ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ANEXO 3 - MODIFICATORIO 3			FECHA APROBACIÓN	5/09/2024	FECHA EXPEDICIÓN	21/08/2024
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 197.105.044,20	30%	19-jul-23	30-jun-25	de acuerdo a modificatorio 3	124
Buen manejo de Anticipo	$ 262.806.726,00	40%	19-jul-23	30-jun-25	de acuerdo a modificatorio 3	124

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - BALANCE CONTRATACIÓN VS EJECUCIÓN**	Código.: SIVEYC.FTO.35-7 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACIÓN VS EJECUCIÓN

CONTRATO No.:	**GN 3253-2023**

CAP.	ACT	DETALLE - ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	1,1	Excavaciones a máquina incluye retiro de material a una distancia max de 5 km.	$ 32.763.852,00	$ 32.763.852,00	$ -	0%
1	1,2	Relleno con material de adición	$ 58.327.376,24	$ 58.327.376,24	$ -	0%
1	1,3	Acero de refuerzo fy 420 Mpa	$ 131.503.680,00	$ 131.503.680,00	$ -	0%
1	1,4	Concreto Clase F(2000 PSI)	$ 20.424.497,28	$ 20.424.497,28	$ -	0%
1	1,5	Tubería Concreto Reforzado 900 mm Diámetro interior	$ 119.404.560,00	$ 119.404.560,00	$ -	0%
1	1,6	Concreto Clase D(3000 PSI)	$ 162.222.390,00	$ 162.222.390,00	$ -	0%
NP	NP1	Concreto ciclópeo para mejoramiento de suelo de cimentación	$ 13.174.606,37	$ 13.174.606,37	$ -	0%
NP	NP2	Demolición estructuras de concreto	$ 829.600,20	$ 829.600,20	$ -	0%
NP	NP3	Disipador de energía	12807327,72	$ 12.807.327,72	$ -	0%
NP	NP4	Excavación a mano material húmedo	$ 3.636.887,10	$ 3.636.887,10	$ -	0%
NP	NP5	Excavación a mano material común	$ 1.171.980,48	$ 1.171.980,48	$ -	0%
NP	NP6	Suministro e instalación tubería alcantarillado PVC D=30"	$ 9.369.428,32	$ 9.369.428,32	$ -	0%
2	2,1	PMA	$ 12.657.672,67	$ 12.657.672,67	$ -	0%
2	2,2	PMT	$ 22.429.483,10	$ 22.429.483,10	$ -	0%
		COSTO TOTAL	$ 600.723.341,48	$ 600.723.341,48	$ -	0%

