INFORME DE ACTIVIDADES
No. 4

Aguazul, 06 de junio del 2025.

Doctor(a)
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 4 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0224 - MA-CD-SI-220-2025 de 2025-02-12.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO	:	0224
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	:	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR QUE SE ENMARQUEN DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA GESPROY 3.0, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
VALOR	:	$20.400.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 MCTE.
VALOR FINAL	:	$20.400.000,00 MCTE.
PLAZO	:	CUATRO (4) MESES
PRORROGA	:	
FECHA INICIO	:	2025-02-13
FECHA TERMINACIÓN	:	2025-06-12

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el periodo comprendido desde el 01/05/2025 hasta el 31/05/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Generar un (1) informe mensual del estado de cada uno de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías SGR de la Secretaría de Infraestructura"	Este informe proporciona una actualización sobre el estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaría de Infraestructura. Esta actualización se realiza de acuerdo con lo establecido en la actividad No. 1 del Contrato CPS No. 0224-2025, que requiere la generación de un informe mensual sobre el estado de cada proyecto financiado con recursos del SGR. Actualmente en la secretaria de infraestructura se evidencia en el sistema GESPROY registra un total de 10 proyectos, que se encuentran en diferentes estados: en ejecución,terminados y para cierre. A continuación, se detallan los proyectos en cuestión: Evidencia:Informe estado de proyectos Medio: Medio físico: 9 folios Medio digital: Anexo 1
Generar un (1) informe mensual con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión que se encuentran en los estados: sin contratar, en ejecución y terminados sin acto administrativo de cierre, financiados con recursos del sistema general de regalizas SGR de la secretaria de infraestructura"	En Atención al cumplimiento de esta actividad y según las instrucciones del supervisor, se preparó un informe que proporciona una actualización detallada del estado de las alertas identificadas en los proyectos de inversión gestionados por la Secretaría de Infraestructura, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) Evidencia:Informe de alertas Medio: Medio físico: 3 folios Medio digital: Anexo 2
Brindar asistencia profesional a los profesionales de los proyectos de inversión relacionadas con el uso de la plataforma, reprogramaciones y/o la carga de información.	En atención al cumplimiento de esta actividad de asistencia profesional y de acuerdo con la designación dada por el supervisor,se realizó cargue de ejecución del mes de abril-2025 del proyecto de inversión BPIN 2019850100004, "Adecuación y construcción de obras complementarias

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 4

	del equipamiento institucional denominado Plaza de Toros en el municipio de Aguazul., nuevo porcentaje de ejecución fisica es de 91,07% Se registro avance de ejecución con recibo final del proyecto denominado **BPIN 2021005850074 Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare** Evidencia: Asistencia profesional Medio: Medio físico: 1 folio Medio digital: Anexo 3
Registrar la información derivada de la ejecución de los proyectos de Inversión en la plataforma GESPROY 3.0, y actualizar el avance físico de los mismos.	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor,se registró actas de reinicio a los contratos 585-2023 (obra) y contrato N. 667-2023 (interventoría) al proyecto **BPIN 2022850100009 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE** Se registro actas de ampliación a la suspensión al contrato N, 333-2022 (obra) y al con 335-2022 (interventoría) **BPIN 2022005850010 CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARe** Se actualizaron las metas e indicadores del proyecto **BPIN 2021005850074 denominado "Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare"** Evidencia: Cargue de informacion Medio: Medio físico: 3 folios Medio digital: Anexo 4
Otras Actividades Inherentes al Objeto Contractual Ejecutar las demás actividades que sean designadas por el supervisor del contrato, siempre y cuando estén relacionadas con el objeto contractual.	En atención al cumplimiento de esta actividadse proyectaron las resoluciones de cierre, de los siguientes proyectos, una vez se realice el cargue al aplicartivo GESPROY el proyecto pasa a estado CERRADO. **BPIN 2021850100006 MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS LEDS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE** BPIN 2021850100024 Mejoramiento y construcción de obras complementarias en los equipamientos institucionales deportivos del municipio de Aguazul departamento de Casanare Se reitero el caso del proyecto **BPIN 2019850100004**, Por otra parte, se evidencia que los CDP N° 3321 y 1221, relacionados con el contrato 220-2020 en el módulo de GESTIÓN PRECONTRACTUAL, aparecen con un valor de RP igual a cero (0), lo cual significa que no está afectado el RP (anexo pantallazo 1). Sin embargo, en el módulo CONTRATOS – REGISTROS PRESUPUESTALES sí se evidencia el valor comprometido; por lo tanto, existe una inconsistencia al observarse un valor cero en un módulo y el valor correspondiente en el otro (anexo pantallazo 2) Evidencia: Otras actividades Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 5

Para una ejecución acumulada del contrato 0224 - MA-CD-SI-220-2025 de 2025-02-12 es del 90%

OBSERVACIONES:

.

ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N. 7967319680 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025

Atentamente,

GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
Contratista

ANEXOS

CONTRATO N. 0224 2025-02-12

ACTA No. 5 PARCIAL 4

Yopal, 06 de junio de 2025

Ingeniero
Juan Miguel Sandoval Gutierrez
Secretario de Infraestructura
Municipio de Aguazul

ASUNTO: INFORME ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: 01 de mayo al 31 de mayo de 2025

Este informe proporciona una actualización sobre el estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaría de Infraestructura. Esta actualización se realiza de acuerdo con lo establecido en la actividad No. 1 del Contrato CPS No. 0224-2025, que requiere la generación de un informe mensual sobre el estado de cada proyecto financiado con recursos del SGR.

Actualmente en la secretaria de infraestructura se evidencia en el sistema GESPROY registra un total de 10 proyectos, que se encuentran en diferentes estados: en ejecución y terminados. A continuación, se detallan los proyectos en cuestión:

Proyectos en Estado en Ejecución:

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100004	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
2	2020850100007	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
3	2021005850074	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
4	2022005850010	CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
5	2022850100009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Proyectos en Estado Terminado

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2018850100001	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
2	2019850100002	CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
3	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE


Proyectos en Estado Para Cierre

1	2021850100024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
2	2021850100006	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS LEDS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

PROYECTOS EN EJECUCION


Proyecto 1.

BPIN: 2019850100004
PROYECTO: Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 91,89% a abril de 2025
AVANCE FINANCIERO: 87,91% a julio de 2024**OBSERVACIÓN:** Se remitió oficio al Departamento Nacional de Planeación (DNP) solicitando el levantamiento de la medida de suspensión de giros, dado que el proyecto se encuentra actualmente en ejecución y ha sido reprogramado, tal como se evidencia en el sistema GESPROY.
ALERTA: No presenta alertas
IGPR CUARTO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

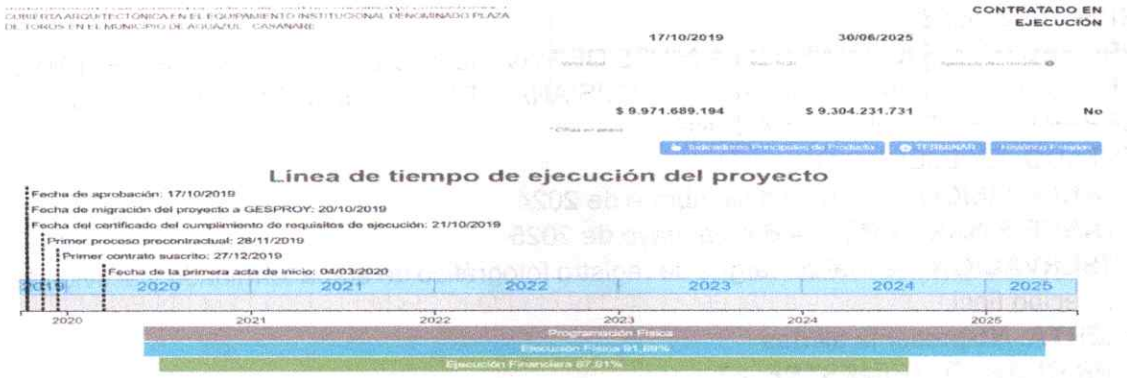


Proyecto 2.

BPIN: 2020850100007
PROYECTO: Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 77,23% a marzo 2024
AVANCE FINANCIERO: 72,51% a agosto de 2024
OBSERVACIÓN: La programación registrada esta de julio de 2021 a marzo de 2024, Presenta dos Planes administrativos de control por parte del Departamento nacional de planeación:
PAC 2581-24: "c) No ejecutar el proyecto de inversión en los términos de su aprobación sin justificación técnica o jurídica."
PAC 1142-24: se registra programación vencida, siendo necesario que la entidad ejecutora rinda explicaciones al respecto, toda vez, que lo anterior configura una presunta situación irregular, que se enmarca en la causal c) del Artículo 174 de la Ley 2056 de 2020
ALERTA: No presenta alertas
IGPR CUARTO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

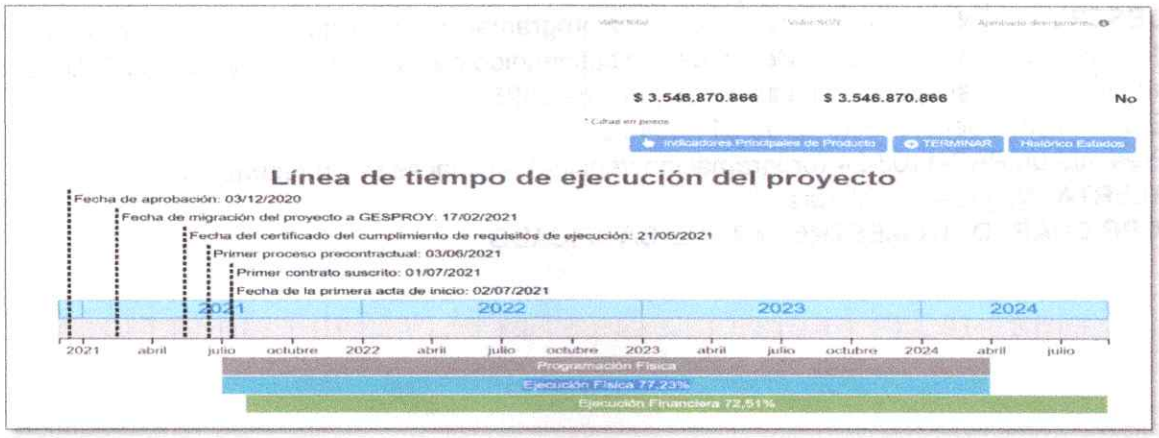


Proyecto 3.

BPIN: 2021005850074
PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 99,09% a diciembre e de 2024
AVANCE FINANCIERO: 84,65% a mayo de 2025
OBSERVACIÓN: Se realizo cargue de registro fotográfico de etapa terminado y actividades con recibo final.
ALERTA: No presenta alertas
IGPR CUARTO TRIMESTRE: 87

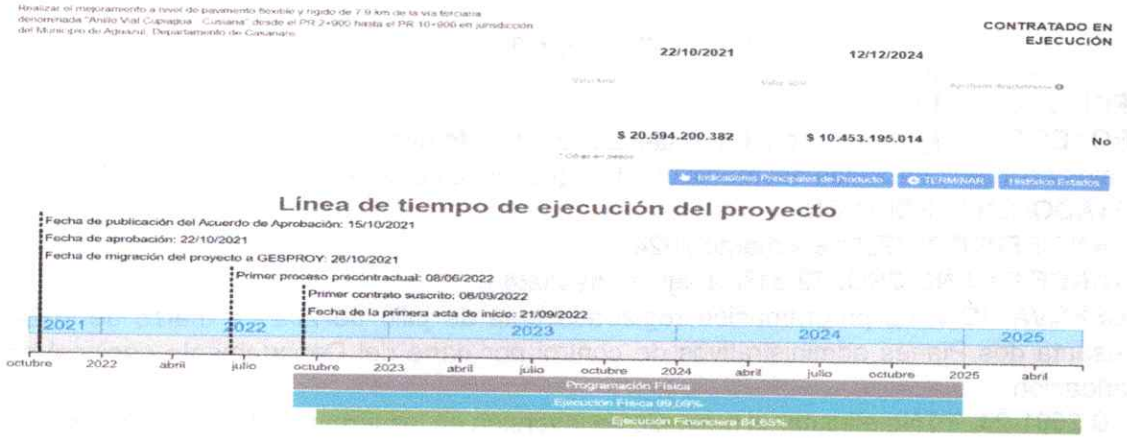


Proyecto 4.

BPIN: 2022005850010
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: EN EJECUCIÓN (Contratos suspendidos)
AVANCE FISICO: 86,15 a octubre de 2024
AVANCE FINANCIERO: 87,88 a julio de 2024
OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con una programación oficial que abarca desde agosto de 2022 hasta junio de 2024. Se encuentra suspendido hasta el 01 de mayo de 2025, tiene ampliación a la suspensión hasta 15 de junio de 2025.
El valor actual del proyecto es de $11.354.926.038
Presenta un PAC-1163-24 (programación vencida), al cual se le dio respuesta.
ALERTA: No presenta alertas
IGPR CUARTO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

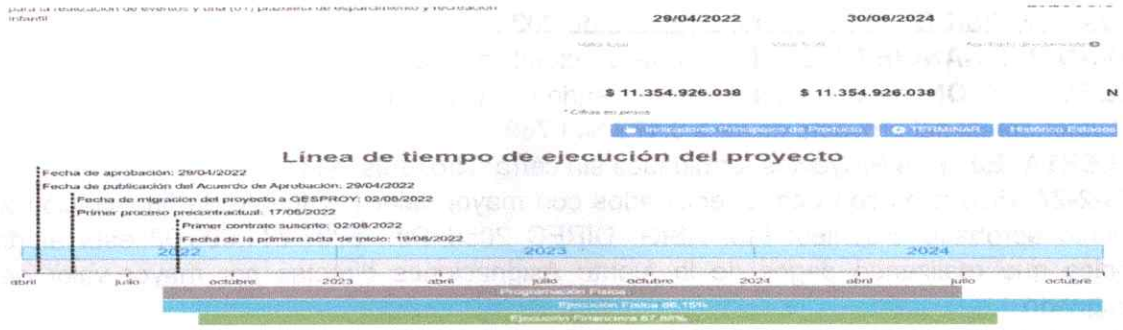

Proyecto 5.

BPIN: 2022850100009
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
ESTADO: EN EJECUCIÓN (contratos suspendidos)
AVANCE FISICO: 54,23 a diciembre de 2024
AVANCE FINANCIERO: 45,35 a abril de 2024
OBSERVACIÓN: El proyecto tiene una programación oficial que se extiende desde septiembre de 2023 hasta abril de 2025.
Los contratos reiniciaron el 14 de mayo de 2025
El valor actual del proyecto es de **$ 1.150.418.293**
Presenta un PAC-1144-24 (Programación vencida) – tiene suspensión de giros
ALERTA: No presenta alertas
IGPR CUARTO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

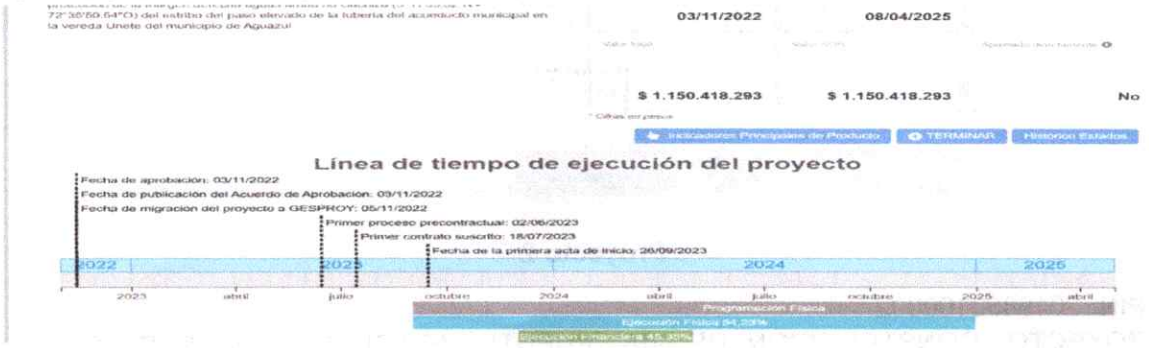


PROYECTOS TERMINADOS
Proyecto 1.

BPIN: 2018850100001
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANAR
ESTADO: TERMINADO

AVANCE FISICO: 99,30 reporte a febrero de 2022
AVANCE FINANCIERO: 99,90 Reporte a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN: hacer un cuadro resumiendo los rp y las fuentes
El valor actual del proyecto es de **$ 9.179.844.769**
ALERTA: EJ -1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 411
EJ-2-27: Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. DIREC_2056 Dif: -$237,741,006.02;,esta alerta indica que realizando pagos de la fuente Asignaciones directas por mayor valor del asignado
IGPR CUARTO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

Alertas para el proyecto 2018850100001

Código	Descripción	Detalles	Valor Radicado	Fecha Radicado	Plazo para ajuste	Consecuencia
EJ-1-24 ⚠	Proyecto terminado sin cerrar	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 411	$411		6 meses desde la terminación	Reporte a órganos de control
EJ-2-27 ⚠	Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado	Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiaci¿n al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. DIREC_2056 Dif: -$237,741,006.02;	$0			

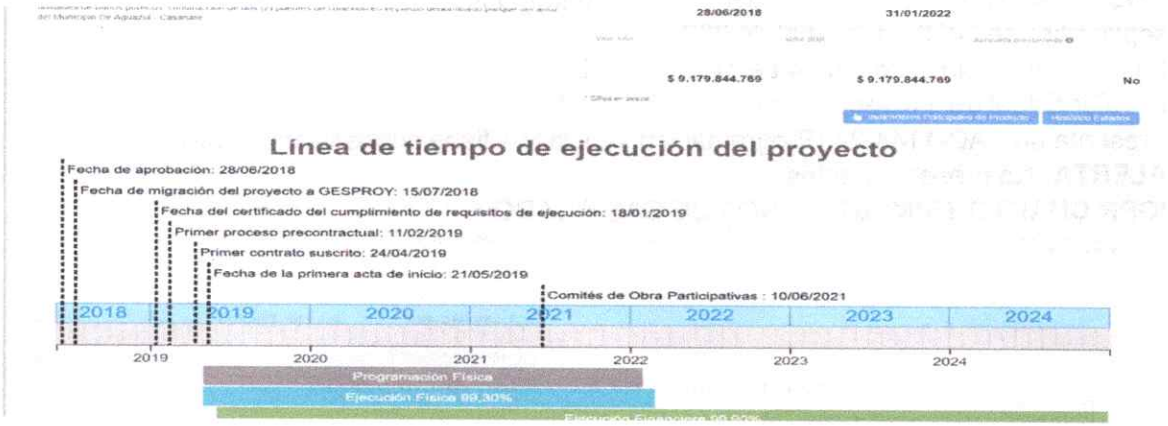


Proyecto 2

BPIN: 2019850100002
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,94 registrada a diciembre de 2022
AVANCE FINANCIERO: 99,94 registrada a septiembre de 2024
OBSERVACIÓN: Se evidencia en el aplicativo GESPROY la duplicidad del contrato principal N. 699-2019 de fecha 31 de diciembre de 2019 el cual fue registrado por aplicación, y el contrato N. 20190699 del 14 de octubre de 2020 creado por SPGR., (adjunto pantallazo).


Se procedió a eliminar la información registrada en el contrato N. 699-2019 registrado por aplicación, para dejar la información que migro del SPGR, sin embargo al realizar el proceso de eliminación de los RP muestra un error, lo cual no ha permitido registrar el acta de liquidación.

Verificar los pagos por mayor valor
El valor actual del proyecto es de **$ 4.541.149.572**
ALERTA: EJ -1-24 proyectos terminados sin cerrar N. días 629
IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

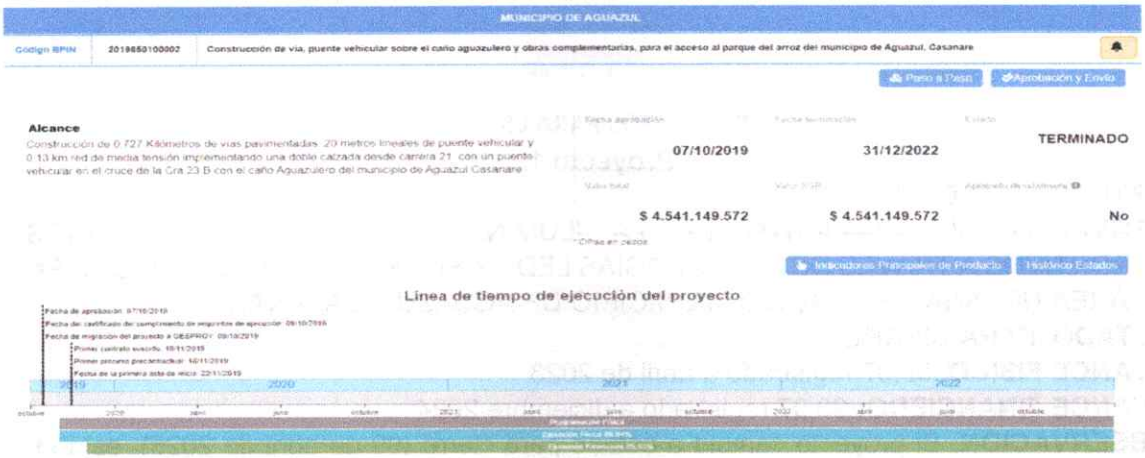

Proyecto 3.

BPIN: 2022850100011
PROYECTO: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 100% Registrada a octubre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 98,81 a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN:
El contrato de Interventoría N. 321-2022, no está liquidado. (le faltan pagos)
El contrato de obra N. 341-2022, esta liquidado
ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 414
IGPR CUARTO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

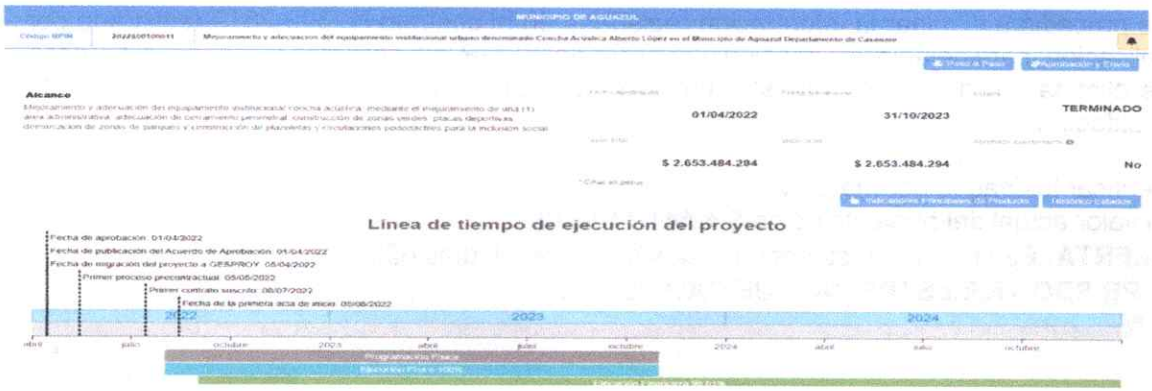

PROYECTOS PARA CIERRE

Proyecto 1.

BPIN: 2021850100006

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS LEDS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ESTADO: PARA CIERRE


AVANCE FISICO: 99,97 registrado a abril de 2023


AVANCE FINANCIERO: 99,97 registrado a diciembre 2024

OBSERVACIÓN: El proyecto cambio a estado para cierre (09 de abril de 2025), esta en trámite de firmas la resolución de cierre.

El valor actual del proyecto es de **$ 1.823.834.445**


IGPR CUARTO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

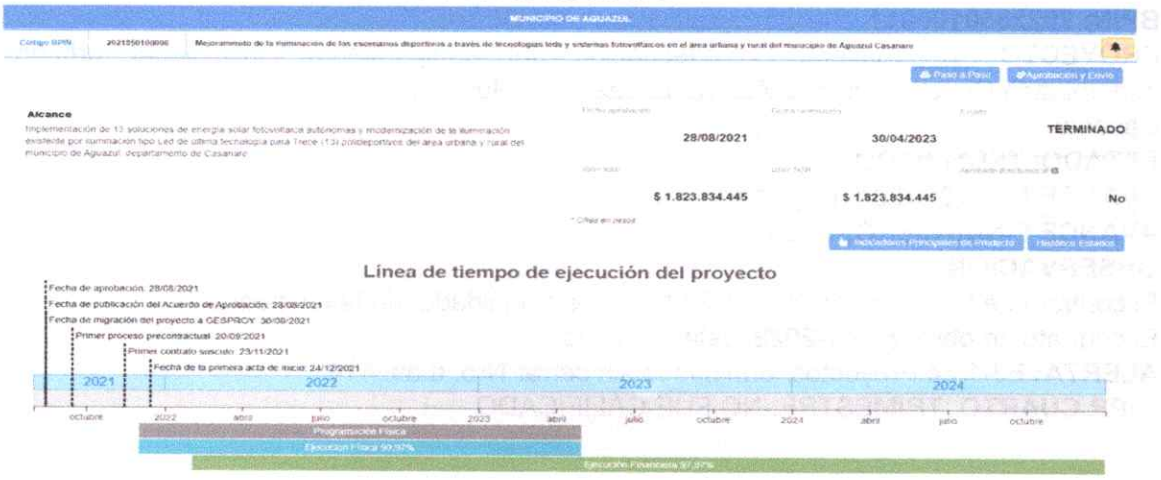

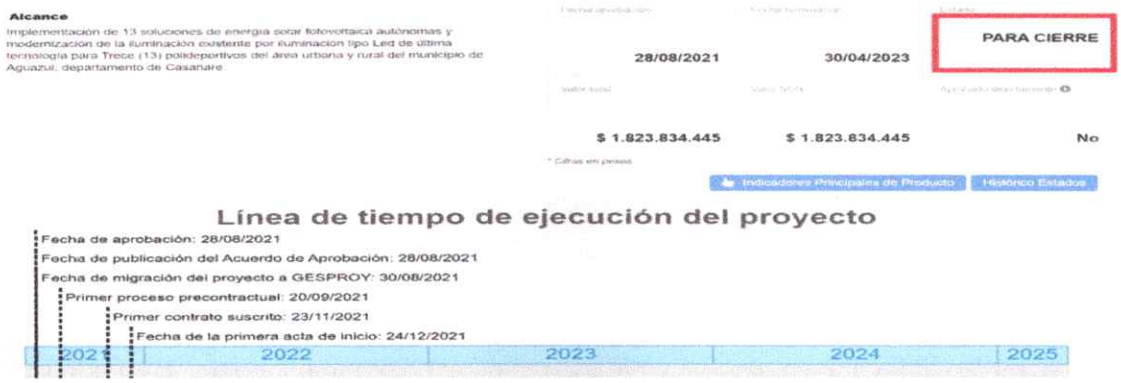

Proyecto 2.

BPIN: 2021850100024
PROYECTO: Mejoramiento y construcción de obras complementarias en los equipamientos institucionales deportivos del municipio de Aguazul departamento de Casanare
ESTADO: PARA CIERRE
AVANCE FISICO: 100 registrado a octubre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 99,97 a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN: El proyecto cambio de estado de Terminado a Para cierre (20 de febrero de 2025), esta en tramite de firmas la resolución de cierre
IGPR CUARTO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

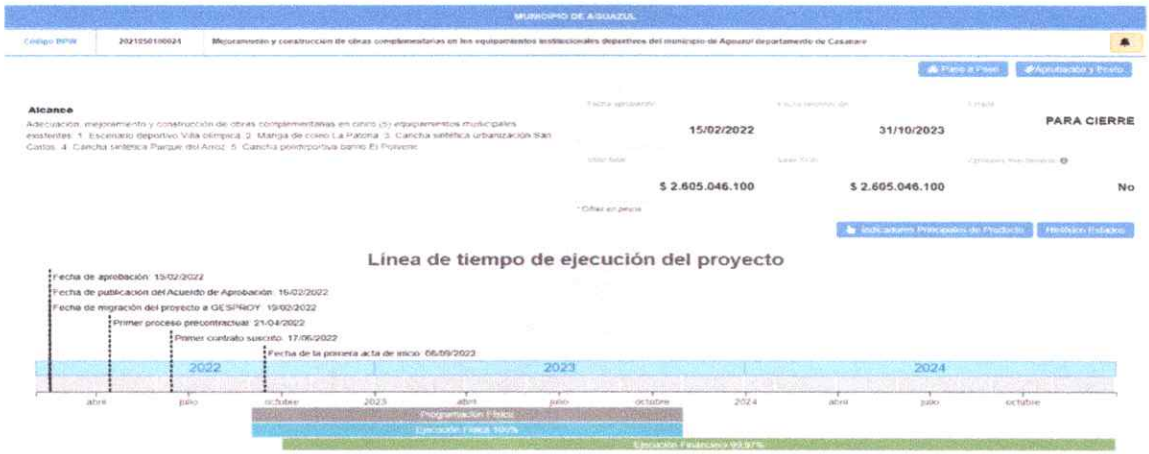

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0224 del 12 de febrero de 2025

ACTIVIDAD 2. -INFORME DE ALERTAS

Generar un informe Mensual sobre Alertas en Proyectos de Inversión Elaborar un informe mensual que actualice el estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fase sin TERMINAR financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y según las instrucciones del supervisor, se preparó un informe que proporciona una actualización detallada del estado de las alertas identificadas en los proyectos de inversión gestionados por la Secretaría de Infraestructura, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR)

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE ESTADO DE ALERTAS.


PERIODO: 01 de mayo al 30 de mayo de 2025

Este informe presenta una actualización del estado de alertas de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 2 del Contrato CPS No. 0224-2025 de "Generar un (1) informe mensual con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión que se encuentran en los estados: sin contratar, en ejecución y terminados sin acto administrativo de cierre, financiados con recursos del sistema general de regalizas SGR de la secretaria de infraestructura"


ALERTAS SIN SUBSANAR

A continuación, se describe la alerta de ***tipo "EJ-1-24"*** Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.


ALERTA EJ-1-24
BPIN: 2022850100011
NOMBRE: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare
ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO
DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 414

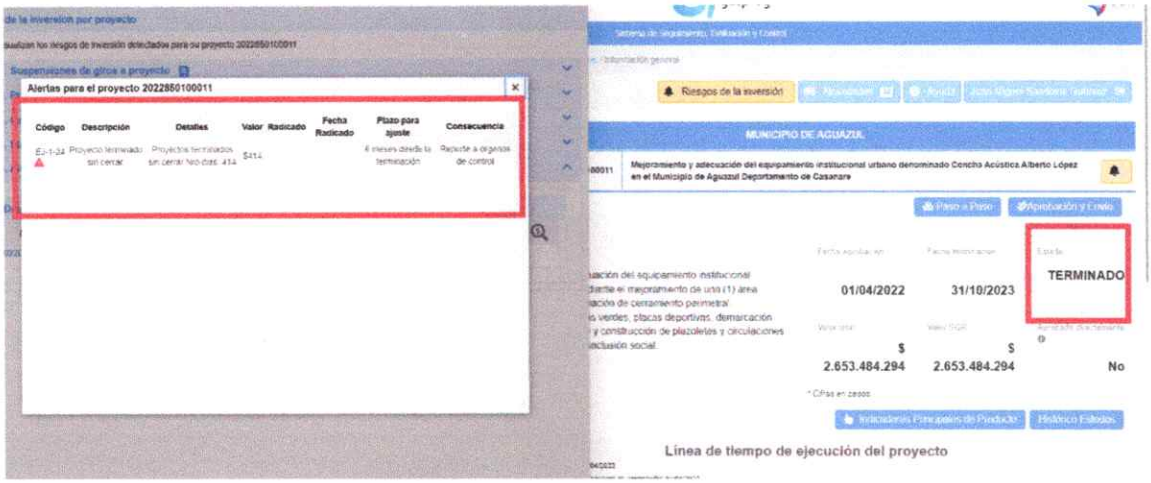

BPIN: 2018850100001
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO
DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 411

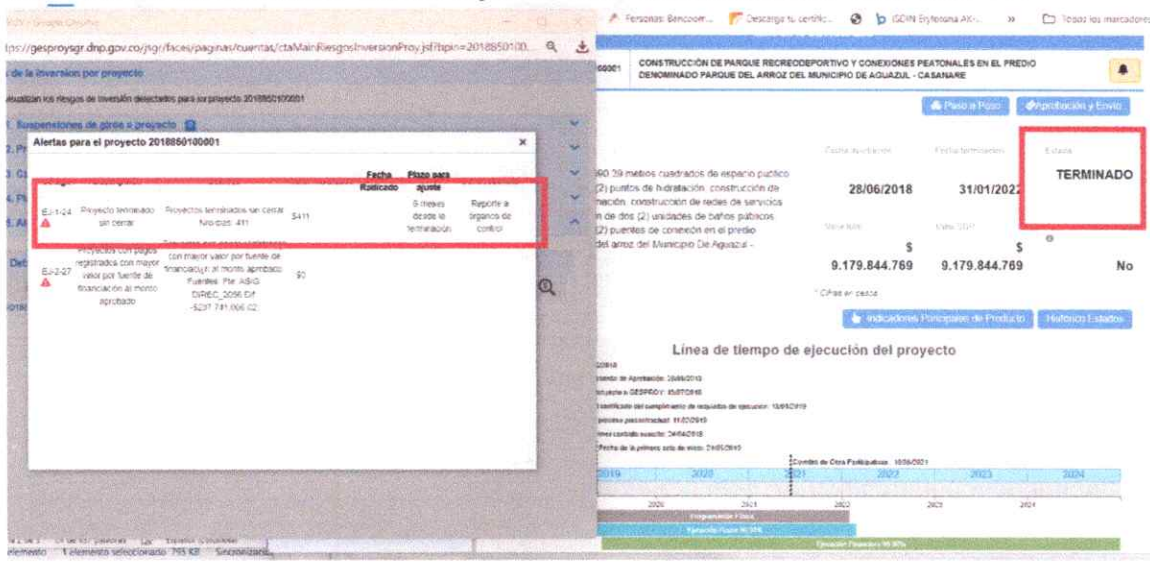

BPIN: 2019850100002
NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO
DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 410

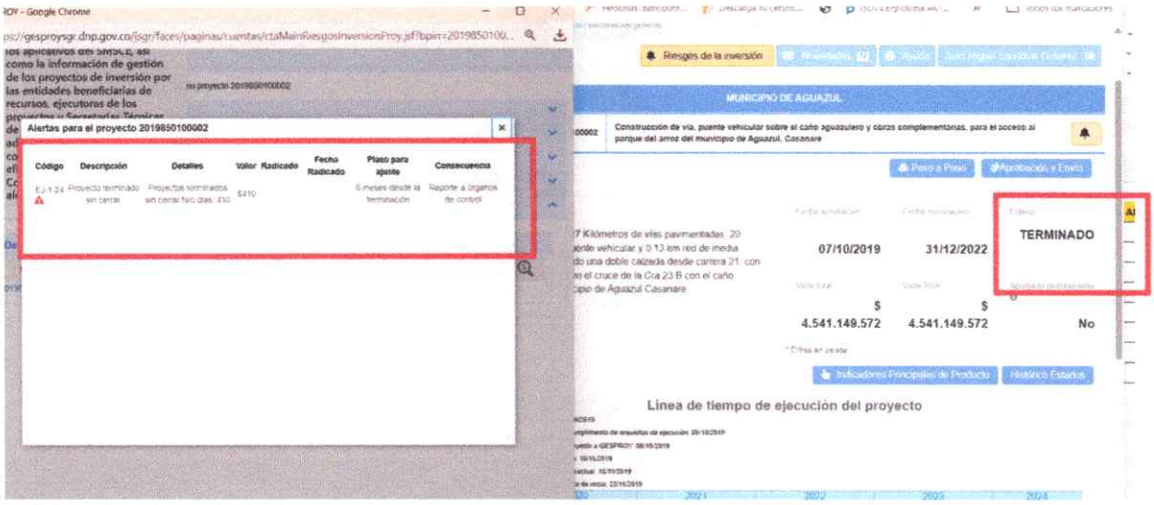

NOTA: Las alertas se visualizan en el aplicativo GESPROY, en el menú izquierdo, en la sección de *"Reportes" -Alertas SMSCE*



ELABORÓ:


ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO

CONTRATO 0224 del 12 de febrero de 2025

ACTIVIDAD 3.

Brindar asistencia profesional a los profesionales de los proyectos de inversión relacionadas con el uso de la plataforma, reprogramaciones y/o la carga de información.

En atención al cumplimiento de esta actividad de asistencia profesional y de acuerdo con la designación otorgada por el supervisor, se realizó el cargue de ejecución en el aplicativo GESPROY correspondiente al mes de abril de 2025 del proyecto **BPIB 2019850100004, denominado "Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado Plaza de Toros en el municipio de Aguazul".**

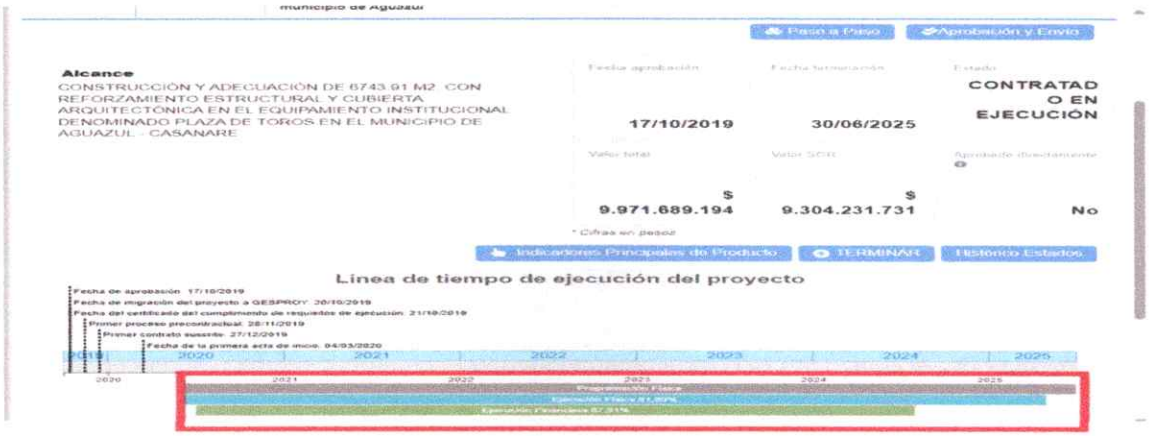

Se registro avance de ejecución con recibo final del proyecto denominado BPIN 2021005850074 Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare




ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0224 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDAD 4.- CARGUE DE INFORMACIÓN GESPROY

Registrar la información derivada de la ejecución de los proyectos de inversión en la plataforma GESPROY 3.0, y actualizar el avance físico de los mismos.

D/A: En atención al cumplimiento de esta actividad y conforme a la designación otorgada por el supervisor, se registró actas de reinicio a los contratos 585-2023 (obra) y contrato N. 667-2023 (interventoría) al proyecto **BPIN 2022850100009 Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de aguazul Casanare**

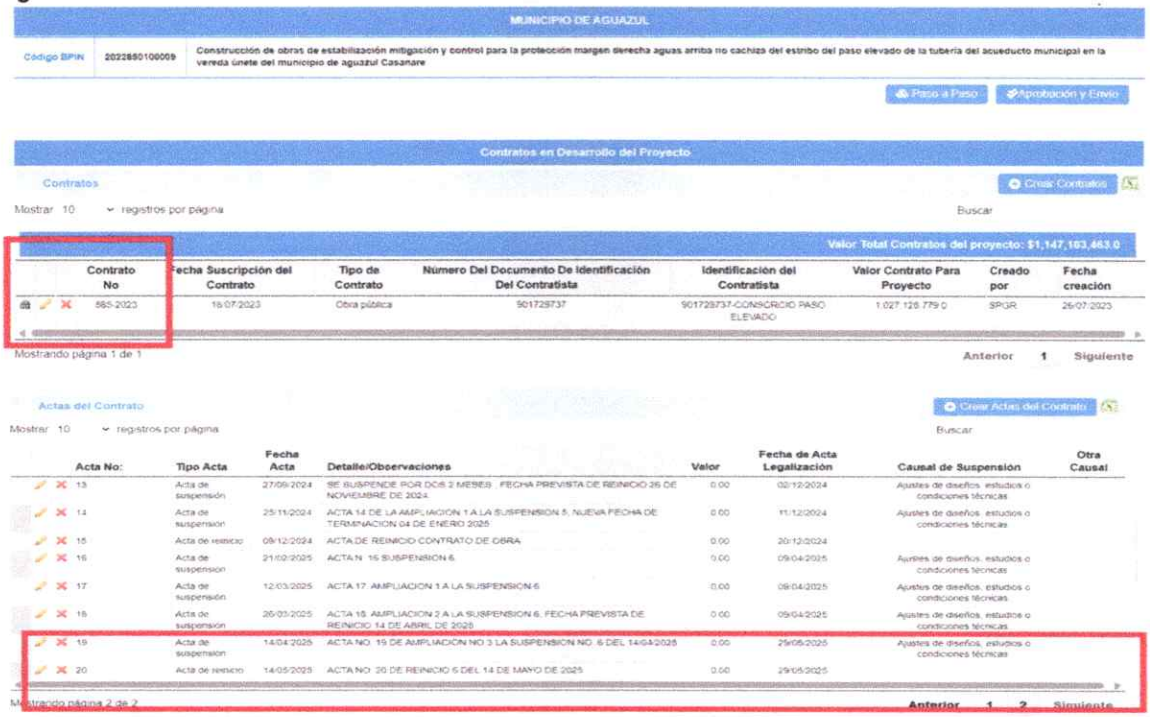

MUNICIPIO DE AGUAZUL

Código BPIN 2022850100009 — Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de aguazul Casanare

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Contratos en Desarrollo del Proyecto

Contratos — Crear Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Valor Total Contratos del proyecto: $1,147,183,463.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
585-2023	18/07/2023	Obra pública	901729737	901729737-CONSORCIO PASO ELEVADO	1.027.128.779 0	SPGR	26/07/2023

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
13	Acta de suspensión	27/09/2024	SE SUSPENDE POR DOS 2 MESES . FECHA PREVISTA DE REINICIO 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	02/12/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
14	Acta de suspensión	25/11/2024	ACTA 14 DE LA AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 5, NUEVA FECHA DE TERMINACION 04 DE ENERO 2025	0.00	11/12/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
15	Acta de reinicio	09/12/2024	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA	0.00	20/12/2024		
16	Acta de suspensión	21/02/2025	ACTA N 16 SUSPENSION 6	0.00	09/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
17	Acta de suspensión	12/03/2025	ACTA 17 AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 6	0.00	09/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
18	Acta de suspensión	26/03/2025	ACTA 18 AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 6, FECHA PREVISTA DE REINICIO 14 DE ABRIL DE 2025	0.00	09/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
19	Acta de suspensión	14/04/2025	ACTA NO. 19 DE AMPLIACION NO 3 LA SUSPENSION NO. 6 DEL 14/04/2025	0.00	29/05/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
20	Acta de reinicio	14/05/2025	ACTA NO. 20 DE REINICIO 6 DEL 14 DE MAYO DE 2025	0.00	29/05/2025		

Mostrando página 2 de 2 — Anterior 1 2 Siguiente

Se registro actas de ampliación a la suspensión al contrato N, 333-2022 (obra) y al con 335-2022 (interventoría) BPIN 2022005850010 Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare

MUNICIPIO DE AGUAZUL

Código BPIN	2022005850010	Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Listado de contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle Información Contratos

Contrato No	333-2022	Tipo de Contrato	Obra pública	Modalidad de Contratación	Licitación pública
Identificación del Contratista	901610514-CONSORCIO PARQUE DEL ARROZ	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901610514	Tipo Contratista	Consorcio
Objeto	CONSTRUCCION PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE			Valor Contrato Para Proyecto	10.432.838.015,00
Fecha de Inicio	06/09/2022	Fecha Final Contractual	06/06/2025	Fecha Final Real	10/09/2025
Fecha Suscripción del Contrato	02/08/2022	Plazo Contractual	973,00 Días	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	MA-SI-LP-005-2022	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	10.432.838.015,00
Estado Contrato	Suspendido	Nuevo Multiproyecto	No		

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
1	Acta de inicio	06/09/2022	Acta No. 1 de Inicio	0.00	15/09/2022		
4	Acta menores y mayores cantidades de obra	15/08/2023	Acta No. 4 de mayores y menores cantidades	0.00	15/08/2023		
6	Acta de suspensión	22/11/2023	Acta No. de Suspension	0.00	12/12/2023	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
7	Acta de reinicio	22/02/2024	acta de reinicio del contrato de obra	0.00	12/03/2024		
09	Acta de suspension	04/06/2024	Se suspende por un (1) mes y diez (10) dias	0.00	04/09/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
10	Acta de reinicio	09/07/2024	Acta de reinicio a la suspension del acta 09	0.00	04/09/2024		
12	Acta de suspension	05/11/2024	ACTA N. 12 SUSPENSIÓN N. 3 DEL (1 MES)	0.00	04/12/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
14	Acta de suspension	13/01/2025	NO 14 ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION NO 3 DEL 12 DE ENERO DEL 2025. FECHA PREVISTA DE REINICIO 01 DE MARZO DE 2025	0.00	14/02/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
15	Acta de suspension	28/02/2025	ACTA N 15 AMPLIACION N. 3 DE SUSPENSION 3	0.00	12/03/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	
16	Acta de suspension	02/05/2025	ACTA NO. 16 AMPLIACION NO. 4 DE SUSPENSION NO 3 DEL 02 DE MAYO DEL 2025 . FECHA PREVISTA REINICIO 15 DE JUNIO	0.00	16/05/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas	


Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Cuestionario Actas

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Tipo Acta | Acta No: | Pregunta | Respuesta

Se actualizaron las metas e indicadores del proyecto BPIN 2021005850074 denominado "Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare"

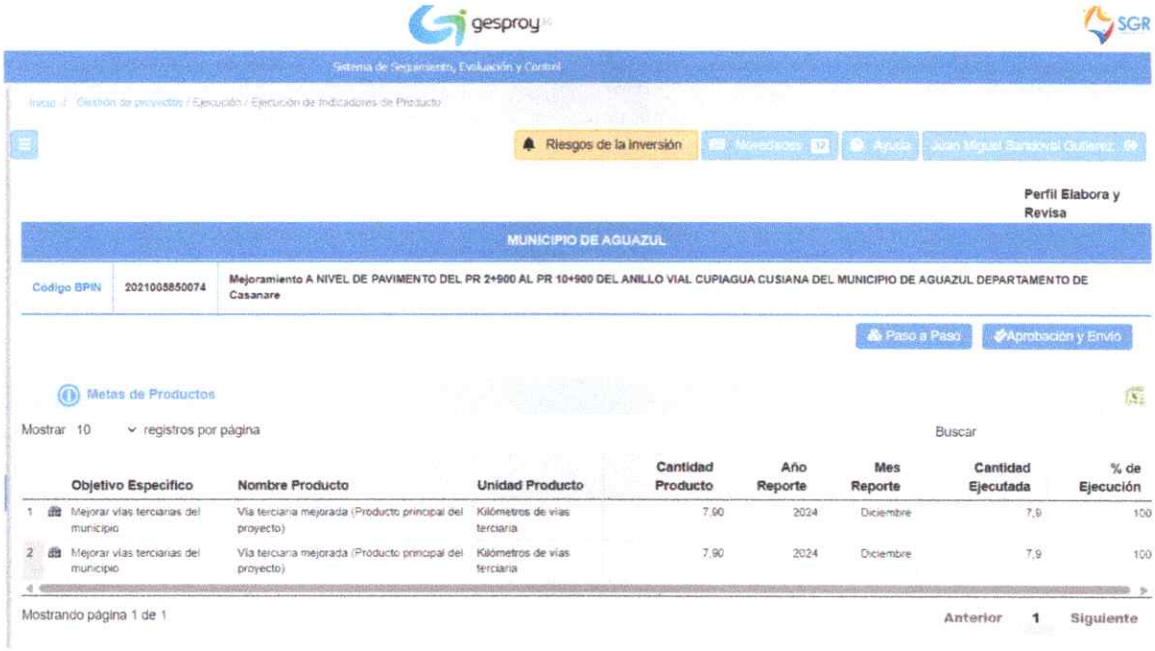

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO

CONTRATO 0224 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVIDAD 5.

Las demás designadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual

D/A: En atención al cumplimiento de esta actividad, se proyectaron las resoluciones de cierre, de los siguientes proyectos, una vez se realice el cargue al aplicartivo GESPROY el proyecto pasa a estado CERRADO.

BPIN	NOMBRE PROYECTO
2021850100006	Mejoramiento de la iluminación de los escenarios deportivos a través de tecnologías leds y sistemas fotovoltaicos en el área urbana y rural del municipio de Aguazul Casanare
2021850100024	Mejoramiento y construcción de obras complementarias en los equipamientos institucionales deportivos del municipio de Aguazul departamento de Casanare

Se reitero el caso del proyecto BPIN 2019850100004, Por otra parte, se evidencia que los CDP N° 3321 y 1221, relacionados con el contrato 220-2020 en el módulo de GESTIÓN PRECONTRACTUAL, aparecen con un valor de RP igual a cero (0), lo cual significa que no está afectado el RP (anexo pantallazo 1).

Sin embargo, en el módulo CONTRATOS – REGISTROS PRESUPUESTALES sí se evidencia el valor comprometido; por lo tanto, existe una inconsistencia al observarse un valor cero en un módulo y el valor correspondiente en el otro (anexo pantallazo 2)



ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0224 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025

SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO N. 0620 2024-09-16

PLANILLA

ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N. 7967319680 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	47442426
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 31B 43 21	TELÉFONO:	3212900
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de sistemas informático
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7967319680	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO 2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1477805943

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.400	$ 0	$ 326.400
SUBTOTALES:										**$ 326.400**	**$ 0**	**$ 326.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 255.000
SUBTOTALES:													**$ 255.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 255.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.700	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700
SUBTOTALES:									**$ 10.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	FSP COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 47442426	SERRANO DELGADO GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	2.040.000	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	2.040.000	$ 255.000	$ 0	$ 255.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.040.000	$ 47442426	$ 10.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 592.100

21
