
FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
29	11	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Piso 7 balcon interno cra 32		



ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes



3. Actividades Ejecutadas

Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (203 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (260 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (81,69 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (81,69 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega

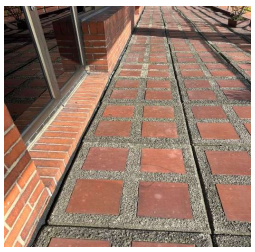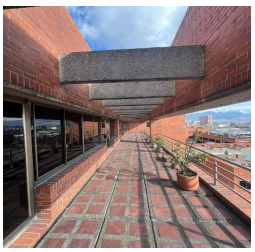
FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
29	11	11	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Piso 7 balcon interno cra 33		


ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes

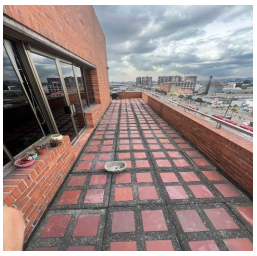

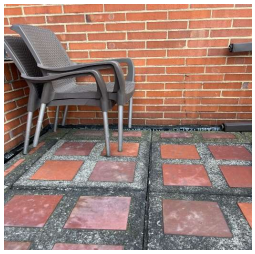

3. Actividades Ejecutadas


Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (108 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (145 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (37,54 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (37,54 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega

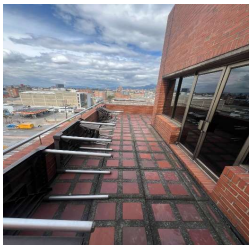

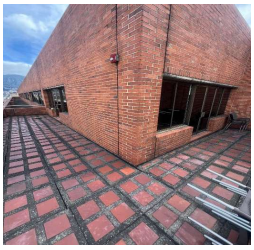

FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
27	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Piso 6 balcon despacho		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes












3. Actividades Ejecutadas

Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (380 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (485 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (129,89 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (129,89 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega

FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
27	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Terraza 5to piso hemocentro		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes

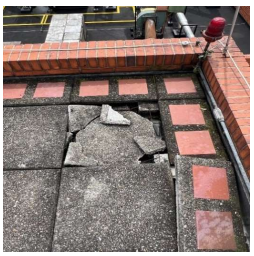



3. Actividades Ejecutadas


Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (324 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (400 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (123,29 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (123,29 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega





FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
27	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Balcon GYM		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes









3. Actividades Ejecutadas

Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (280 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (355 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (99,96 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (99,96 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega

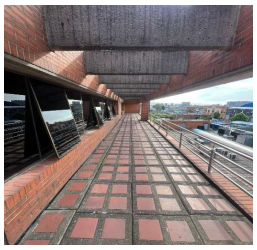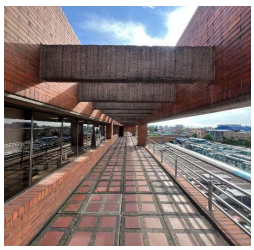FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Balcon 4to piso labs		


ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes

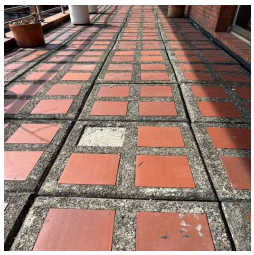

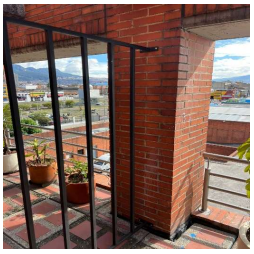
3. Actividades Ejecutadas

Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (204 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (360 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (99,96 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (99,96 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega





FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD



FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Teraza torre labs		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes







3. Actividades Ejecutadas

Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (334 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (415 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (116,13 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (116,13 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega


FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	BALCON 4TO PISO HEMOCENTRO AUDITORIO ENTRADA 1		


ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes

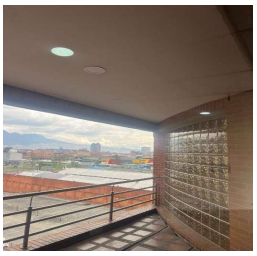

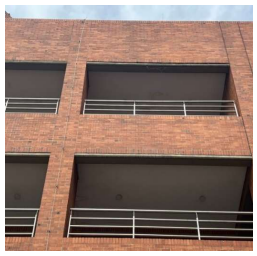
3. Actividades Ejecutadas

Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (36 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (46 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (13 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (13 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega

FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	BALCON 4TO PISO HEMOCENTRO AUDITORIO ENTRADA 2		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes

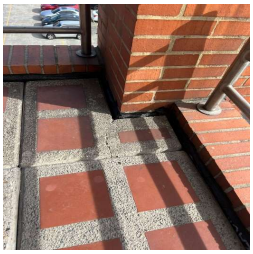




3. Actividades Ejecutadas

Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (56 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (86 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (19,52 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (19,52 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega


FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Porteria principal		


ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes

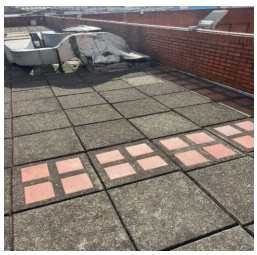

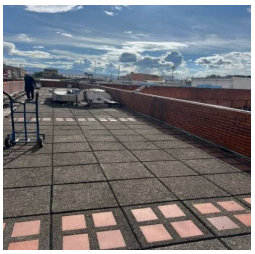
3. Actividades Ejecutadas

Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (540 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (650 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (192,06 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (192,06 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega






FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Porteria trasera		

,

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes





3. Actividades Ejecutadas


Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (148 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (205 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (62,75 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (62,75 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega

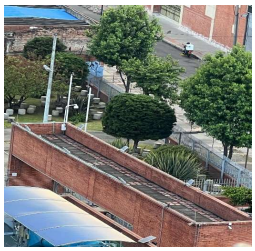

FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Medialuna tercer piso admin		



ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes

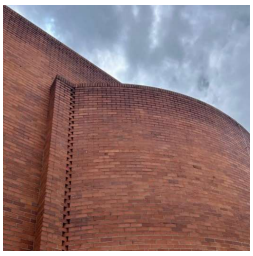
3. Actividades Ejecutadas

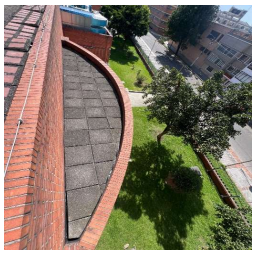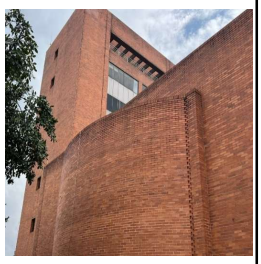
Item 1.1.26 Retiro y colocación de losetas: (46 unidades)
Item 1.1.30 Retiro y colocación de dados en concreto: (62 unidades)
Item 1.1.31 Retiro de manto asfáltico existente: (13 m2)
Item 1.9.5Sum e instalación de manto asfáltico (13 m2)

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega





FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	OFICINA 5TO PISO admin		

,

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes






3. Actividades Ejecutadas

Suministro e instalación de pintura: 34,25 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega


FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	RECEPCIÓN OFICINA 5TO PISO		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes





3. Actividades Ejecutadas

Suministro e instalación de pintura: 12,51 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega





FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	RECEPCIÓN PASILLO 5TO PISO		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes






3. Actividades Ejecutadas

Suministro e instalación de pintura: 8,47 m2


4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega







FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	PASILLO HEMOCENTRO 3ER PISO		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes







3. Actividades Ejecutadas

Suministro e instalación de pintura: 58,38 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega

FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	OFICINAS DE SEGURIDAD Y CONTROL (CAMARAS +OFICINA PORTERIA)		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes






3. Actividades Ejecutadas

Suministro e instalación de pintura: 141,49 m2


4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega







FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	OFICINA EXTERIOR 4TO PISO		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes





3. Actividades Ejecutadas

Suministro e instalación de pintura: 51,45 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega









FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	PORTERIAS (PRINCIPAL Y TRASERA)		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes





3. Actividades Ejecutadas

Suministro e instalación de pintura: 109,5 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega







FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	OFICINA COMUNICACIONES 6TO PISO		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes





3. Actividades Ejecutadas

Suministro e instalación de pintura: 25,34 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega






FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	PASILLO HEMOCENTRO TERCER PISO 2DA PARTE		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes





3. Actividades Ejecutadas


Suministro e instalación de pintura: 69,43 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega





FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	OFICINA 7MO PISO SALA DE JUNTAS NUEVA Y ENTRADA RECURSOS HUMANOS		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes



3. Actividades Ejecutadas


Suministro e instalación de pintura: 39,04 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega



FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	TERCER PISO OFICINA CONTADURIA		


ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes



3. Actividades Ejecutadas


Suministro e instalación de pintura: 105,24 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega



FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	AUDITORIO HEMOCENTRO Y PASILLO HEMOCENTRO		

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio


Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes









3. Actividades Ejecutadas


Suministro e instalación de pintura: 588,98 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda limpiar periodicamente los espacios intervenidos

5. Registro forografico Entrega



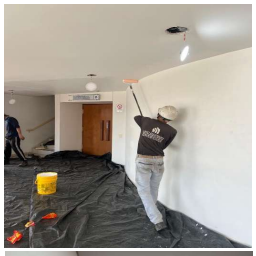




FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Cuarto de maquinas torre admin		


ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes

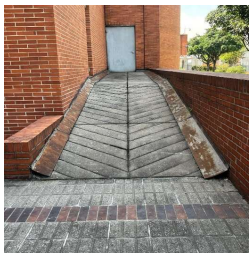

3. Actividades Ejecutadas

Mantenimiento de flanches: 302 ml

4. Observaciones adicionales

Se recomienda asear periodicamente

5. Registro forografico Entrega







FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD


FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Cuarto de maquinas torre admin		


ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes





3. Actividades Ejecutadas

Retiro de cielo raso exstente, y monte e instalación de cielo raso en superboard terminado y pintado: 9,35 m2

4. Observaciones adicionales

Se recomienda cambiar las losas que se encuentran dañadas y/o deterioradas.

5. Registro forografico Entrega











FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO INICIAL
23	diciembre	2024	OBJETO: ENTREGA DE ÁREA INTERVENIDA
DD	MM	AA	
ACTA No:	1		
SECTOR:	Cuarto de maquinas torre admin		



ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
ENTIDAD INTERVENTORA: CONIMASTER SAS
ENTIDAD EJECUTORA DE LA OBRA: CONSORCIO OBRAS DICO

1. Datos del predio

Nombre del responsable del predio:	Secretaria distrital de Salud
Dirección:	Cra 32 #12-81, Bogotá
Teléfono:	(1) 364 9090

2. Registro fotografico antes

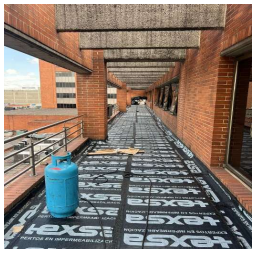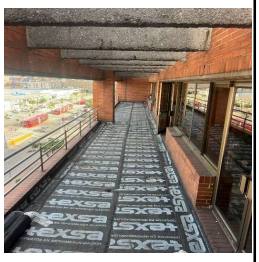

3. Actividades Ejecutadas


Instalación de puntos de anclajes en la sede principal de la secretaria distrital de salud: 148 puntos instalaldos

4. Observaciones adicionales

Se recomienda realizar inspecciones periodicas donde se realicen trabajos de limpieza y seguir los lineamientos del manual de mantenimiento

5. Registro forografico Entrega







FIRMAS

GILBERT ANDREY MIRANDA OSPINA
RESIDENTE DE OBRA
CONSORCIO OBRAS DICO

ADOLFO ECHEVERRY
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONIMASTER SAS

CARLOS FABIAN GALEANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**25/12/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/ATENCION AL CIUDADANO
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO TOMAS UPS		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LEGRAND		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	205	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	03.2	
Tensión R-T	205	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	04.8	
Tensión S-T	205	Tensión T-N	119	CORRIENTE T	06.1	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.04			N/A	N/A	NO LEGIBLE
2	0.05			1X20	10	NO LEGIBLE
3		0.02		1X20	10	NO LEGIBLE
4		0.04		1X20	10	NO LEGIBLE
5			0.01	1X20	10	NO LEGIBLE
6			0.03	1X20	10	NO LEGIBLE
7	0.05			1X20	10	NO LEGIBLE
8	0.06			1X20	10	NO LEGIBLE
9		0.04		1X20	10	NO LEGIBLE
10		0.02		1X20	10	NO LEGIBLE
11			0.02	1X20	10	NO LEGIBLE
12			0.02	1X20	10	NO LEGIBLE
13	LIIBRE			N/A	N/A	NO LEGIBLE
14	LIIBRE			1X20	N/A	NO LEGIBLE
15		0.06		1X20	10	NO LEGIBLE
16		LIIBRE		N/A	N/A	NO LEGIBLE
17			0.05	1X20	10	NO LEGIBLE
18			LIIBRE	N/A	N/A	NO LEGIBLE
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**19.8**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO TOMAS UPS, DESCRIPCION DE CIRCUITOS NO LEGIBLE

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA
Edison Giovanny Garcia

MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO
Fabio Alberto Rodriguez

M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Estefania Alzate

Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**25/12/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/ATENCION AL CIUDADANO
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO DE ILUMINACION		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEZ		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	212	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	01.2	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	1,8	
Tensión S-T	212	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	00.6	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.03			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
2	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3		0.03		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.03	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.03	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
9		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		LIBRE		N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
11			00.2	1X20	N/A	NO SE EVIDENCIA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**20.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO DE ILUMINACION

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**25/12/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/ATENCION AL CIUDADANO
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO TOMAS NORMALES		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LEGRAND		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	00.3	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	00.4	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	00.5	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.02			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
2	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.01	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.05	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.05			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	0.04			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			00.5	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
12			00.3	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
13	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
14	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
15		00.5		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
16		00.4		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
17			00.4	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
18			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
19	00.6			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
20	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
21		LIBRE		N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
22		LIBRE		N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
23			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
24			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**20.6**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO TOMAS NORMALES

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**25/12/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/sotano almacen
Piso	-1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	ABLERO REGULADO ALMACE		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LEGRAND		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	00.4	
Tensión R-T	209	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.3	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	119	CORRIENTE T	00.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO LEGIBLE
2	LIBRE			1X20	10	NO LEGIBLE
3		LIBRE		1X20	10	NO LEGIBLE
4		LIBRE		1X20	10	NO LEGIBLE
5			0.02	1X20	10	NO LEGIBLE
6			LIBRE	1X20	10	NO LEGIBLE
7	0.03			1X20	10	NO LEGIBLE
8	LIBRE			1X20	10	NO LEGIBLE
9		0.03		1X20	10	NO LEGIBLE
10		LIBRE		1X20	10	NO LEGIBLE
11			00.3	1X20	10	NO LEGIBLE
12			LIBRE	1X20	10	NO LEGIBLE
TERMOGRAFÍA	**20.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO TOMAS UPS, DESCRIPCION DE CIRCUITOS NO LEGIBLE

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA
Edison Giovanny Garcia
MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO
Fabio Alberto Rodriguez
M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Estefania Alzate
Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**25/12/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/sotano almacen
Piso	-1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TBALERO NORMAL ALMACEN		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEZ		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	00.5	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	00.8	
Tensión S-T	207	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	00.4	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
2	LIBRE			1X20	N/A	NO SE EVIDENCIA
3		0.05		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.04	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.02	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	00.4			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		00.3		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			00.2	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**20.1**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO DE ILUMINACION, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**25/12/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/sotano almacen
Piso	-1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	BLERO ILUMINACION ALMAC		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LEGRAND		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	00.7	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	00.5	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	00.5	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	Libre			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
2	0.04			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3		Libre		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.05		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			Libre	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.05	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.03			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	0.05			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		0.04		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			00.6	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
12			00.3	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**21.2**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO TOMAS NORMALES, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa Auditorio
Piso	2
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO DE TOMAS NORMALES AUDIT		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	122	CORRIENTE R	00.1	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.2	
Tensión S-T	211	Tensión T-N	122	CORRIENTE T	00.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	000.1			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
2	LIBRE			N/A	10	NO SE EVIDENCIA
3		LIBRE		N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
4		0.09		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
6			0.02	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	LIBRE			N/A	10	NO SE EVIDENCIA
8	0.05			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		LIBRE		N/A	10	NO SE EVIDENCIA
10		000.4		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			LIBRE	N/A	10	NO SE EVIDENCIA
12			000.1	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
13	LIBRE			N/A	10	NO SE EVIDENCIA
14	000.2			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
15		000.1		N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
16		000.1		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
17			000.2	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
18			LIBRE	N/A	10	NO SE EVIDENCIA
TERMOGRAFÍA	**18.6**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO NORMAL AUDITORIO, NO SE EVIDENCIA DESCRPCION DE CIRCUITOS

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa Auditorio
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	tablero alumbrado auditorio		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	luminex		Número de circuitos	24		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	No se evidencia la tapa del tablero	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI		NO	x		
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO		REGULAR	x	MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.010	
Tensión R-T	209	Tensión S-N	122	CORRIENTE S	0.004	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.006	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
2	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3	0.01	0.01		N/A	10	NO SE EVIDENCIA
4	0.01	0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.08	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.05	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.06		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		0.07		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			0.08	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
13	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
14	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
15	LIBRE	LIBRE		N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TERMOGRAFÍA	**19.8**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO ALUMBRADO AUDITORIO SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON LA TAPA, NO SE EVIDENCIA LA DESCRIPCION DE LOS CIRCUITOS, ADEMAS SE

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa AUDITORIO
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	ABLERO REGULADO AUDITOR		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	123	Tensión R-N	123	CORRIENTE R	01.9	
Tensión R-T	N/A	Tensión S-N	N/A	CORRIENTE S	N/A	
Tensión S-T	N/A	Tensión T-N	N/A	CORRIENTE T	N/A	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	CAMATA IP
2	0.07	N/A	N/A	1X20	10	TOMAS
3	0.04	N/A	N/A	N/A	10	RESERVA OCUPADA
4	0.04	N/A	N/A	1X20	10	EQUIPOS
5	0.01	N/A	N/A	N/A	10	RESERVA OCUPADA
6	0.05	N/A	N/A	1X20	10	EQUIPOS
7	0.05	N/A	N/A	1X20	10	PARLANTES
8	0.07	N/A	N/A	1X20	10	COMPUTADOR
9	0.01	N/A	N/A	1X20	10	TOMAS DE PISO
10	0.02	N/A	N/A	1X20	10	TOMAS
11	0.01	N/A	N/A	1X20	10	TELON
12	0.02	N/A	N/A	1X20	10	TOMAS
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**18.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO REGULADO MONOFASICO AUDITORIO

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA
Edison Giovanny Garcia
MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO
Fabio Alberto Rodriguez
M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Estefania Alzate
Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/COCINA
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO CORRIENTE REGULADA		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	129	CORRIENTE R	00.9	
Tensión R-T	212	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.7	
Tensión S-T	212	Tensión T-N	122	CORRIENTE T	00.9	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	00.1			N/A	N/A	NO REGISTRA
2	0.12			1X20	10	NO REGISTRA
3		00.1		N/A	N/A	NO REGISTRA
4		0.09		1X20	10	NO REGISTRA
5			00.1	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.03			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.05		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.03	1X20	10	NO REGISTRA
12			00.1	N/A	N/A	NO REGISTRA
13	00.1			1X20	10	NO REGISTRA
14	00.1			1X20	10	NO REGISTRA
15		00.2		N/A	N/A	NO REGISTRA
16		00.2		1X20	10	NO REGISTRA
17			00.4	N/A	N/A	NO REGISTRA
18			00.2	1X20	10	NO REGISTRA
TERMOGRAFÍA	**25.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO CORRIENTE REGULADA UBICADA EN EL AREA DE CAFETERIA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/COCINA
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO CORRIENTE NORMAL		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	8		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 10 AWG		Neutro: 10 AWG	Tierra: 12 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	211	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	0.013	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	118	CORRIENTE S	0.004	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.005	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE			N/A	N/A	N/A
2	0.06			1X30	10	N/A
3		00.9		1X30	10	N/A
4		0.01		1X30	10	N/A
5			4	1X30	10	N/A
6			LIBRE	N/A	N/A	N/A
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**19.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO CORRIENTE NORMAL/COCINA PISO 1, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/COCINA
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	ABLERO REGULADO CAFETERI		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	BLERO HIBRIDO DE DISTRIBUCION NORM		Número de circuitos	15		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	01.0	
Tensión R-T	209	Tensión S-N	122	CORRIENTE S	04.0	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	06.0	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
2	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3		0.01		N/A	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.01	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.03	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	0.02			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.03		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		0.03		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			0.15	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
12			00.3	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
13	00.2			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
14	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
15		LIBRE		N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO UBICADO EN EL AREA DE LA COCINA, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa/COCINA
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO ELECTRICO NORMA		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	TABLERO NORMAL CAFETERIA		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	00.8	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.7	
Tensión S-T	206	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.09	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.04			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
2	0.07			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3		00.3		N/A	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.01	N/A	10	NO SE EVIDENCIA
6			00.3	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	00.3			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			0.01	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
12			0.02	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
13	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
14	0.06			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
15		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
16		LIBRE	00.3	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
17			00.3	N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
18				N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**23.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO NORMAL UBICADO EN E AREA DE LA COCINA PISO 1, DESCRIPCION DE CIRCUITOS SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa sala de videovigilancia
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO REGULADO		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	213	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	01.6	
Tensión R-T	212	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	04.9	
Tensión S-T	212	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	0.5.5	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.04			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
2	0.07			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3		0.04		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.04		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.01	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.05	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.05			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	0.07			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11			0.01	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
12			0.02	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
13	0.01			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
14	0.06			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
15		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
16		0.01		1X20	N/A	NO SE EVIDENCIA
17			0.02	1X20	N/A	NO SE EVIDENCIA
18			0.01	1X20	N/A	NO SE EVIDENCIA
19	0.06			1X20	N/A	NO SE EVIDENCIA
20	0.07			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
21		0.04		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
22		LIBRE		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
23			0.01	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
24			LIBRE	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
25	0.05			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
26	LIBRE			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
27		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
28		LIBRE		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
29			LIBRE	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
30			LIBRE	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
31	LIBRE			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
32	LIBRE			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
33	LIBRE			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
34	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
35	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
36	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**19.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO REGULADO DE CONTROL Y MONITORES, NO SE EVIDENCIA DISTRIBUCION DE BREAKERS

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa sala de videovigilancia
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO NORMAL		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	212	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	01.2	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	119	CORRIENTE S	1,8	
Tensión S-T	212	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	00.6	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.05			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
2	0.07			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
3		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
4		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
5			0.01	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
6			0.05	1X20	10	NO SE EVIDENCIA
7	0.05			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
8	0.07			1X20	10	NO SE EVIDENCIA
9		0.01		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
10		0.02		1X20	10	NO SE EVIDENCIA
11	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
12	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
13	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
14	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
15	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
16	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
17	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
18	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
19	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
20	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
21	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
22	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
23	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
24	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
25	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
26	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
27	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
28	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
29	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
30	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
31	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
32	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
33	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
34	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
35	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
36	LIBRE			N/A	N/A	NO SE EVIDENCIA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**19.8**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO NORMAL CONTROL Y MONITORES

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre Administrativa
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edison Giovanni Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO GENERAL		Tensión de tablero	220 V		
Tipo de tablero	TABLECEL TRIFASICO		Número de circuitos	N/A		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 3/0 AWG		Neutro: 3/0 AWG	Tierra: 2/0 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI	X	NO			
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI	X	NO			
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	212	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	0.08	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.02	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.01	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	00.3	N/A	N/A	1X20	12	NO REGISTRA
2	00.7	00.5	00.5	3X63	10	NO REGISTRA
3	00.1	00.2	00.2	3X63	8	ALUM SER CIU
4	00.2	00.1	00.2	3X63		ALUM RECEP
5	01.2	00.8	01.4	NO LEGIBLE	6	AA SERVI CIU
6	00.9	00.9	00.6	NO LEGIBLE	6	TNCC1
7	00.2	00.3	00.3	NO LEGIBLE	6	NOR SER CIU
8	00.3	00.3	00.3	3X63	8	REG B SERV
9	00.5	00.5	00.6	3X63	8	TRB1
10	00.5	00.3	00.6	3X63	8	REG A SERV
11	00.1	00.2	00.1	3X63	8	AES CAF
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 1 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA

Edison Giovanny Garcia
MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO

Fabio Alberto Rodriguez
M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Estefania Alzate
Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**2/12/2024**
Sede/Ubicación	TORRE DUES
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia


VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	A1 TABLERO ALUMBRADO		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	210	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	00.6	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	120	CORRIENTE S	00.4	
Tensión S-T	210	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	00.3	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	00.4			1X50	8	ACOMETIDA
2	0.04			1X20	10	NO REGISTRA
3		00.3		1X50	8	ACOMETIDA
4		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
5			00.1	1X50	8	ACOMETIDA
6			LIBRE	N/A	10	NO REGISTRA
7	00.3			1X20	10	NO REGISTRA
8	LIBRE			N/A	N/A	NO REGISTRA
9		00.3		1X20	10	NO REGISTRA
10		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
11			00.2	1X20	10	NO REGISTRA
12			LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**20.7**	NOTA:				

OBSERVACIONES
A1 TABLERO ALUMBRADO PISO 1 DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA

Edison Giovanny Garcia
MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO

Fabio Alberto Rodriguez
M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Estefania Alzate
Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**2/12/2024**
Sede/Ubicación	TORRE DUES
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	B1 TABLERO NORMAL		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEZ TRIFASICO		Número de circuitos	18		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	120	CORRIENTE R	00.5	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.3	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	00.3	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	00.8			1X50	8	ACOMETIDA
2	00.3			1X20	10	NO REGISTRA
3		00.2		1X50	8	ACOMETIDA
4		00.2		1X20	10	NO REGISTRA
5			00.5	1X50	8	ACOMETIDA
6			00.5	1X20	10	NO REGISTRA
7	00.2			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
9		LIBRE		1X20	10	NO REGISTRA
10		00.4		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.05	1X20	10	NO REGISTRA
12			00.3	1X20	10	NO REGISTRA
13	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
14	LIBRE			1X20	10	NO REGISTRA
15		LIBRE		1X20	10	NO REGISTRA
16		LIBRE		1X20	10	NO REGISTRA
17			LIBRE	1X20	10	NO REGISTRA
18			LIBRE	1X20	10	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**22.2**	NOTA:				

OBSERVACIONES
B1 TABLERO NORMAL, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**2/12/2024**
Sede/Ubicación	TORRE DUES
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	C1 TABLERO REGULADO PISO		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 8 AWG		Neutro: 8 AWG	Tierra: 10 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	00.5	
Tensión R-T	211	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.4	
Tensión S-T	208	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	00.5	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	00.6			1X50	10	ACOMETIDA
2	0.01			1X20	10	NO REGISTRA
3		00.1		1X50	10	ACOMETIDA
4		00.3		1X20	10	NO REGISTRA
5			00.2	1X50	10	ACOMETIDA
6			00.2	N/A	N/A	NO REGISTRA
7	00.2			N/A	N/A	NO REGISTRA
8	LIBRE			N/A	10	NO REGISTRA
9		00.5		1X20	10	NO REGISTRA
10		LIBRE		N/A	N/A	NO REGISTRA
11			00.5	1X20	10	NO REGISTRA
12			00.2	1X20	N/A	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**22.5**	NOTA:				

OBSERVACIONES
C1 TABLERO REGULADO PISO 1, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA

Edison Giovanny Garcia
MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO

Fabio Alberto Rodriguez
M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Estefania Alzate
Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre HEMOCENTRO
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	TABLERO GENERAL		Tensión de tablero	220 V		
Tipo de tablero	TABLECEL TRIFASICO		Número de circuitos	10		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 3/0 AWG		Neutro: 3/0 AWG	Tierra: 2/0 AWG		
DPS?	SI		NO	X		
FRENTE MUERTO?	SI	X	NO			
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI	X	NO			
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	208	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	0.18	
Tensión R-T	210	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.12	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.15	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	000.9	001.8	000.6	2X20	10	EVAPOR 7
2	N/A	N/A	001.1	1X20	10	ILUMINACION ESCALE
3	000.3	N/A	N/A	1X20	10	ILUMINACION ESCALE
4	000.3	000.4	000.9	3X20	10	NO REGISTRA
5	000.1	000.4	000.4	3X20	10	NO REGISTRA
6	001.8	002.1	001.1	3X20	10	CTV
7	000.7	000.5	000.1	3X20	10	TOMAS BUFFY
8	000.4	000.1	000.3	3X20	10	TOMAS RECIB
9	002.4	001.6	002.1	3X60	8	SYSTEM
10	000.9	001.8	001.5	3X60	8	TN A1
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**19.4**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 1 HOMOCENTRO, NO SE EVIDENCIA DESCRIPCION DE CIRCUITOS

FIRMAS



TECNICO ELECTRICISTA

Edison Giovanny Garcia
MTE 1029759445-121277
CONSORCIO OBAS DICO



INGENIERO ELECTRICO

Fabio Alberto Rodriguez
M.P. CN-205-139716
CONIMASTER SDS

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Estefania Alzate
Apoyo a la supervisión
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre HEMOCENTRO
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	C1 TRNA1		Tensión de tablero	240/110		
Tipo de tablero	LUMINEX TRIFASICO		Número de circuitos	12		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	215	Tensión R-N	121	CORRIENTE R	00.2	
Tensión R-T	214	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	00.2	
Tensión S-T	215	Tensión T-N	121	CORRIENTE T	00.2	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	0.01			1X20	N/A	NO REGISTRA
2	0.05			1X20	10	NO REGISTRA
3		0.09		1X20	10	NO REGISTRA
4		0.03		1X20	10	NO REGISTRA
5	LIBRE	LIBRE	LIBRE	N/A	N/A	NO REGISTRA
6			0.01	1X20	10	NO REGISTRA
7	0.07			1X20	10	NO REGISTRA
8	0.02			1X20	10	NO REGISTRA
9		0.05		1X20	10	NO REGISTRA
10		0.01		1X20	10	NO REGISTRA
11			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
12			0.02	1X20	10	NO REGISTRA
TOTAL						
TERMOGRAFÍA	**18.0**	NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO REGULADO PISO 1 TORRE HEMOCENTRO

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

FORMATO PARA ENTREGA DE MANTENIMIENTO RED ELECTRICA	
Fecha	**18/11/2024**
Sede/Ubicación	Torre HEMOCENTRO
Piso	1
Motivo del servicio	Mantenimiento
Responsable interventoria	Fabio Rodriguez
Responsable contratista	Edinson Giovanny Garcia

VERIFICACIÓN FÍSICA DE COMPONENTES						
Nombre del tablero	B1 TNHA1		Tensión de tablero	240/120		
Tipo de tablero	LUMINEZ TRIFASICO		Número de circuitos	36		
Medidas de Tablero						
Calibre conductores de entrada fases neutro tierra (AWG)	Fases: 6 AWG		Neutro: 6 AWG	Tierra: 8 AWG		
DPS?	SI		NO	X	NO APLICA EL FRENTE MUERTO EN ESTE TIPO DE TABLEROS	
FRENTE MUERTO?	SI		NO	X		
CERRADURA?	SI	X	NO			
LLAVE?	SI		NO	X		
ESTADO	BUENO	X	REGULAR		MALO	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
Tensión R-S	209	Tensión R-N	119	CORRIENTE R	0.18	
Tensión R-T	208	Tensión S-N	121	CORRIENTE S	0.41	
Tensión S-T	209	Tensión T-N	120	CORRIENTE T	0.12	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN TOTALIZADOR Y/O ENTRADA DE ENERGÍA						
No. CIRCUITO	R AMP	S AMP	T AMP	CAPACIDAD BREAKER (A)	CALIBRE CONDUCTOR (AWG)	DESCRIPCIÓN CIRCUITO
1	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
2	0.02				10	TOMAS CONTRATACION OCCIDENTAL
3		0.01		N/A	N/A	N/A
4		0.01		1X20	10	TOMAS CONTRATACION OCCIDENTAL
5			0.02	N/A	N/A	N/A
6			0.02	1X20	10	INFRATESTRUCTURA
7	0.04			1X20	10	ALMACEN
8	0.04			1X20	10	TOMAS SUBDIRECCION
9		0.01		1X20	10	RECURSOS FISICOS
10		0.01		1X20	10	TOMAS SUBDIRECCION
11			0.02	1X20	10	TOMAS CONTRATACION
12			0.04	1X20	10	TOMAS SUBDIRECCION
13	0.01			1X20	10	ALMACEN ARCHIVO
14	0.04			1X20	10	TOMAS SUBDIRECCION
15		0.01		1X20	10	TOMAS INVENTARIOS
16		0.02		1X20	10	CONTRATACION OCC
17			0.06	1X20	10	TOMAS 4/72
18			0.04	1X20	10	SEC SERVICIOS
19	0.01			1X20	10	CONTRATACION ORIENTAL
20	0.07			1X20	10	LICITACIONES
21		0.02		1X20	10	CONTRATACION ORIENTAL
22		0.02		1X20	10	TOMAS RADICACION
23			0.03	1X20	10	INVENTARIOS
24			0.04	1X20	10	SUBDIREECCION
25	0.03			1X20	10	TOMAS 4/72
26	01.9			N/A	N/A	N/A
27		0.02		1X20	10	SUBDIREECCION
28		01.2		N/A	N/A	N/A

29			0.02	1X20	10	SUBDIREECCION
30			00.6	N/A	N/A	N/A
31	0.04			N/A	N/A	N/A
32	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
33		0.04		N/A	N/A	N/A
34		0.02		1X20	10	SUBDIREECCION
35			0.04	N/A	N/A	N/A
36			0.03	N/A	N/A	N/A
TOTAL						
TERMOGRAFÍA		NOTA:				

OBSERVACIONES
TABLERO NORMAL PISO 1 TORRE HOMOCENTRO, DESCRIPCION DE CIRCUITOS DESACTUALIZADA

FIRMAS

TECNICO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICO	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
Edison Giovanny Garcia	Fabio Alberto Rodriguez	Estefania Alzate
MTE 1029759445-121277	M.P. CN-205-139716	Apoyo a la supervisión
CONSORCIO OBAS DICO	CONIMASTER SDS	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
