REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 5.

Consorcio Inter Eco

INFORME MENSUAL N° 6

PERÍODO:

01 AL 31 DE MARZO DE 2025

Contrato de Interventoría N°: 3697 de 2024.

CONVENIOS 2139 DE 2024
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Contenido

INTRODUCCIÓN ***3***

INFORMACION CONVENIOS ***6***

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 2139 DE 2024, JAC VEREDA LA TROJA **6**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6

1.1.1 Localización 6

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de laejecución del proyecto 7

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 7

1.1.4 Características técnicas del proyecto 8

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 9

1.2.1 Información general del contrato 9

1.2.2 Descripción de las actividades 9

Etapa obras de mejoramiento 9

1.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 10

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de laInterventoría 10

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 10

1.3.1 Informe semanal 10

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 10

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contratode obra 10

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 10

1.3.5 Estado general del tiempo 11

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 11

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 11

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 12

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 12

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **12**

2.1 Información general del contrato 12

2.1.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 13

2.1.2 Informes Especialistas y Profesionales 14

2.1.3 Componente ambiental 14

Zona Norte 15

- **Apoyo y seguimiento en la ejecución obra** 15

Durante este periodo, se realiza apoyo y seguimiento en la ejecución de los siguientes convenios: 15

- **Solicitud NO PROCESOS EN CURSO – CAM** 15

Durante el presente periodo se envió solicitud y reiteración de la solicitud a la CAM para obtención certificado NO PROCESOS EN CURSO de los siguientes convenios: 15

- **OBTENCIÓN CERTIFICADO NO PROCESOS EN CURSO CAM** 15

Durante el presente periodo, se obtuvo los siguientes certificados de NO PROCESOS EN CURSO por parte de la CAM 15

Zona Sur 15

2.1.4 Componente Social 19

Zona Norte 19

Zona Sur 19

2.1.5 Componente SST 22

2.2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 25

2.2.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría 25

2.2.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría 26

2.2.3 Información financiera y presupuestal contrato de Interventoría 27

2.2.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría 27

2.2.5 Otros documentos seguimiento mensual 28

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 28

4. ANEXOS.....31

4.1 Relación de correspondencia 31

4.2 Registro Fotográfico 43

4.3 Bitácora 43

4.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios 43

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de

infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad de los usuarios, con tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernización de la infraestructura del país.

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, se profundiza en la comprensión desde el territorio sobre las dinámicas económicas, sociales y culturales, donde se pone en primer plano la interacción entre el campo y la ciudad. Gracias a los diálogos regionales, los objetivos del PND se han definido de manera colectiva, respetando las diversidades territoriales, étnicas y culturales.

Que en el documento bases del Plan Nacional de Desarrollo, numeral 5. Convergencia Regional: se destaca como objetivo la construcción y mejoramiento de vías regionales que generen interconexión para el intercambio de productos agrícolas.

Que con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado *“**CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**”* a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Por tal razón, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes Convenios Solidarios con los Organismos de Acción Comunal del Departamento del Huila:

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN- VEREDA	N° CONVENIO
COLOMBIA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VERSALLES	2708-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL HORIZONTE	2190-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTANA	2752-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL PARAISO	2269-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL ESPERANZA	2433-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA UNION	2138-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL ANTILLAS	2151-2024
BARAYA	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA TROJA	2139-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL HOTEL	2150-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA SIRIA	2110-2024

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN- VEREDA	N° CONVENIO
	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO	2423-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PARADA	2105-2024
AIPE	JUNTA DE ACCION COMUNAL CALLE REAL	3609-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL PRAGA	3768-2024
HOBO	JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA FRIA	2060-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL BATAN	2108-2024
TELLO	JUNTA DE ACCION COMUNAL PUERTA DEL SOL	2318-2024
ALGECIRAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL PARAISO PUEBLO VIEJO	2234-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL COLON	2692-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL NARANJOS BAJOS	2130-2024
ISNOS	JUNTA DE ACCION COMUNAL SALTOS DE BORDONES	2087-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL SINAI	2170-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA MURALLLA	2084-2024
ACEVEDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PRIMAVERA	2788-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSE DE RIECITO	2639-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL VERSALLES	2338-2024
SALADOBLANCO	JUNTA DE ACCION COMUNAL MORELIA	2109-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CABAÑA	2280-2024
GARZÓN	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MESÓN	2063-2024
AGRADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GALDA	3776-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CAÑADA	4020-2024
LA PLATA	JUNTA DE ACCION COMUNAL GALLEGO	2799-2024
NÁTAGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL YARUMAL	2064-2024
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNA CASCAJOSA	2111-2024

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024 efectuó el contrato No. 3697 de 2023 con orden de inicio 2024S-VBOG-071700 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORÍA

TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ing. José Miguel Ortega Ortiz.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenidode la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con laconstrucción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

INFORMACION CONVENIOS

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 2139 DE 2024, JAC VEREDA LA TROJA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 Localización

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Baraya del departamento de Huila en la vereda La Troja, en el corredor vial denominado Hotel – La Troja con una longitud de atención de 200 Mts, tiene punto de inicio en el PR 00+000 Segundo cruce a mano derecha desde la vía que de Baraya conduce a la vereda Tutumito y como punto de referencia final el PR 00+200 a partir del punto de inicio de referencia y en dirección a la vereda la Troja, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Huila del Instituto Nacional de Vías.

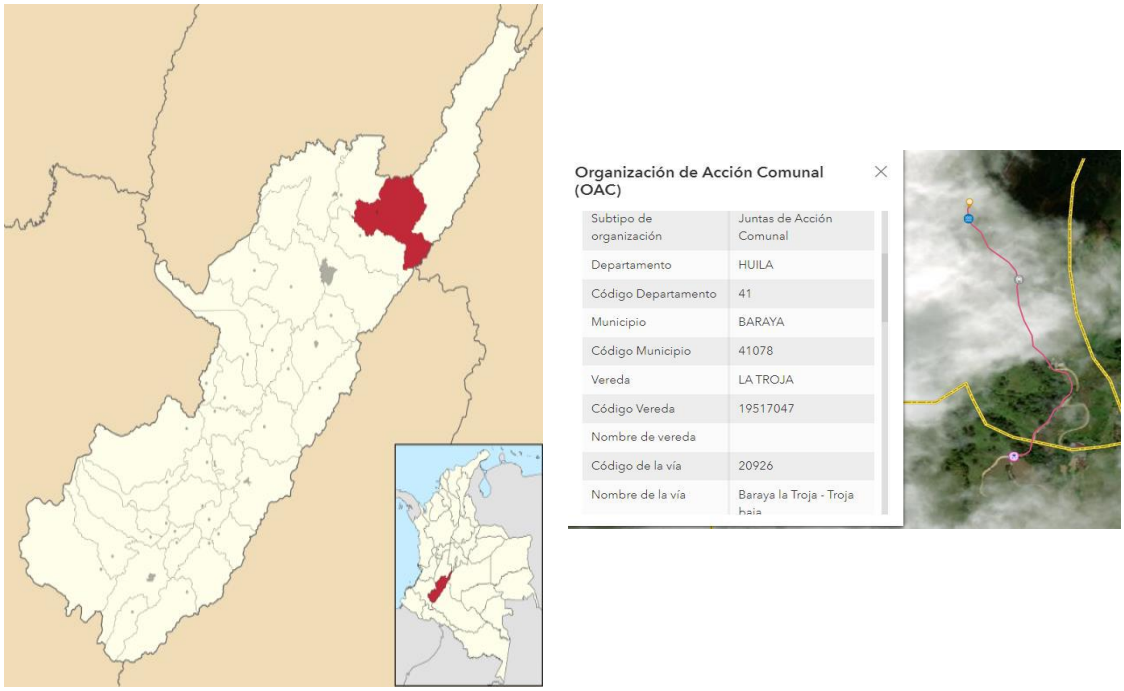


Ilustración 8. Localización General Municipio de Baraya – Vereda La Troja Sitio de obra del Convenio 2139 de 2024

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de laejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto, la población de las Veredas ubicadas en la zona de influencia y que se verán beneficiadas por el mejoramiento del corredor vial son Begonia, Totumito, San Pablo, Manzanares, Miaramar, Montellano y San Juan, Veredas productoras y comercializadoras de café, productos agrícolas, lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al Municipio de Baraya.

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 138 m de material de afirmado en regular estado, puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que a lo largo del corredor existe presencia de baches.

	
Foto 7. Estado inicial de la vía Vereda La Troja	**Foto 8. Estado inicial de la vía Vereda La Troja**

1.1.4 Características técnicas del proyecto

Las actividades u obras a ejecutar consisten en el mejoramiento vial mediante la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta el levantamiento de la información realizada por los profesionales de la Dirección Territorial Huila, permitiendo priorizar las necesidades básicas de la comunidad para mejorar las condiciones la transitabilidad en el tramo de área de influencia del Organismo de Acción Comunal de la vereda La Troja las cuales se relacionan a continuación:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR DE INTERVENCIÓN	UBICACIÓN	OBRA PREVISTA DE MEJORAMIENTO	
				PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
Huila	Baraya	Hotel – La Troja	PR 00+000 PR 00+138	138	-
Huila	Baraya	Hotel – La Troja	PR 00+200	-	1
TOTAL DE INTERVENCIÓN				**138**	**1**

El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERISTICAS
VEREDA LA TROJA – MUNICIPIO DE BARAYA	Construcción de Placa Huella	• Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) – Placa, VR, Cuneta y Bordillos • Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 Mpa 60% concreto – 40% agregado ciclópeo) • Subbase Granular Clase C • Espesor de Subbase Granular = 0,15 m • Longitud de Placa Huella = 138 m • Longitud Huella = 3,0 m • Ancho de Placa Huella = 5,0 m • Espesor de Placa Huella = 0,15 m • Longitud Viga Riostra = 5,0 m • Ancho de Viga Riostra = 0,20 m • Alto de Viga Riostra = 0,25 m • Sobreancho Promedio Ciclopeo = 0,90 m • Longitud de Cuneta = 276 m • Ancho de Cuneta = 0,55 m • Espesor de Cuneta = 0,15 m

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERISTICAS
		• Longitud de Bordillo = 276 m • Ancho de Bordillo = 0,15 m • Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa
	Construcción de alcantarillas	• Cantidad de Alcantarillas = 1 Und • Longitud de Alcantarilla = 5,0 m • Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa – Mezcla in situ • Concreto reforzado de resistencia 14 Mpa – Mezcla in situ • Tubería de concreto Ø = 36"= 5 Und • Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	2139 DE 2024
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA
RUT	891.102.335-3
VALOR INICIAL	$201.320.555
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$201.320.555
ORDEN DE INICIO	02/09/2024
PLAZO INICIAL	31/12/2024
PRÓRROGA N°1	31/03/2025

1.2.2 Descripción de las actividades

Etapa obras de mejoramiento

- Mediante oficio 211-1-744 de fecha 06 de marzo de 2025, la Interventoría remite al Ing. JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ – Supervisor Contrato de Interventoría INVIAS, soporte de los traslados vía sebra de los rendimientos financieros generados en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia donde se manejan los recursos del convenio 2139-2024 con la JAC de la Vereda La Troja, correspondiente al mes de enero de 2025.
- En total se construyeron 103.9 metros de pavimento rígido y 1 alcantarilla.
- El convenio se encuentra en proceso de liquidación
- El porcentaje total de avance ejecutado del proyecto fue de 100%.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BASICO DE OBRA	$ 155,911,165.00	N/A	$ 116,850,936.83	$ 155,911,165.63	$ 0.00

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4,548,682.00	N/A	$ 3,884,148.00	$ 3,884,148.00	$ 664,534.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 39,860,707.00	N/A	$ 11,912,243.00	$ 20,956,069.00	$ 18,904,638.00

1.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de laInterventoría

Mediante oficio 211-1-744 de fecha 06 de marzo de 2025, la Interventoría remite al Ing. JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ – Supervisor Contrato de Interventoría INVIAS, soporte de los traslados vía sebra de los rendimientos financieros generados en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia donde se manejan los recursos del convenio 2139-2024 con la JAC de la Vereda La Troja, correspondiente al mes de enero de 2025.

La interventoría realiza el proceso de liquidación del convenio.

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

1.3.1 Informe semanal

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexa el formato “MAQUINARIA Y EQUIPO”.

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contratode obra

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexa el formato “PERSONAL, CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”.

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 2139 de 2024, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2024”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 86124 de fecha 2024-05-07 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-51102ª-2402041-02 por valor $ 200,320,555.00.

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

1.3.5 Estado general del tiempo

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexa el formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”.

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”.

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el Convenio inicial y prórroga No.1:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100330951 – Anexo 0 de fecha 05/07/2024 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083419 – Anexo 0 de fecha 05/07/2024.

AMPARO	%AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 20,182,056.00	2/7/2024	31/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5%	$ 40,264,111.00	31/12/2024	31/12/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 10,066,028.00	2/7/2024	31/12/2027
TOTAL	20%	$ 70,512,195.00	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260,000,000	2/7/2024	31/12/2024

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100330951 – Anexo 1 de fecha 27/09/2024 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083419 – Anexo 1 de fecha 27/09/2024.

AMPARO	%AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 20,182,056.00	2/9/2024	31/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5%	$ 40,264,111.00	31/12/2024	31/12/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 10,066,028.00	2/9/2024	31/12/2027
TOTAL	20%	$ 70,512,195.00	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260,000,000	2/7/2024	31/12/2024

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100330951 – Anexo 2 de fecha 02/01/2025 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083419 – Anexo 2 de fecha 02/01/2025.

AMPARO	%AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 20,182,056.00	2/7/2024	31/3/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5%	$ 40,264,111.00	31/3/2025	31/3/2030
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 10,066,028.00	2/7/2024	31/3/2028
TOTAL	20%	$ 70,512,195.00	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260,000,000	2/7/2024	31/3/2025

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”.

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías – Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

- Actas de reunión y comités de obra: El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 Información general del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024
FECHA DE PUBLICACIÓN	7/06/2024
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.6698942
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	3697 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/09/2024

OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER ECO
NIT	901.865.515-1
VALOR INICIAL	$ 1.546.789.418,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.546.789.418,00
ORDEN DE INICIO	02/10/2024
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	-
REANUDACIÓN No. 1	-
PRÓRROGA No. 1	Hasta el 31/03/2025
PRÓRROGA No. 2	Hasta el 30/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2025
DIRECCIÓN	Calle 17 # 7a-37, Neiva – Huila
NÚMERO DE TELÉFONO	3108827068
SUPERVISOR	JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ

2.1.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones de la JAC de cada convenio.
- Revisión de cotizaciones
- Realización de comités operativos para la aprobación de cotizaciones de materiales, maquinaria, transporte, plan de compras.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por la JAC de cada convenio
- Realización y entrega para su debido trámite del acta de costo del mes de febrero de 2025.
- Elaboración y trámites de prórroga No.2 para la interventoría y los convenios con plazo hasta el 30/04/2025.
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato
- Archivo actualizado de la Interventoría
- Comunicados dirigidos al contratista
- Comunicados dirigidos al INVIAS
- Reuniones con las JAC
- Asistir a las reuniones y comités de seguimiento programados por el INVIAS
- Visitas técnicas a los sitios de ejecución de las obras
- Elaboración de informes semanales

- Elaboración de informes mensuales
- Apoyo y acompañamiento técnico en la construcción de obras
- Revisión y aprobación de diseños por parte del Especialista en Geotecnia y pavimentos de la Interventoría

Lo anterior, mediante la realización de comités operativos para aprobación de cotización de materiales, suministros, transporte y maquinaria, plan de compras con el fin de evaluar costo/beneficio y trámite de transferencia de recursos que permite la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Por otra parte, se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños de las obras ejecutadas en los convenios solidarios en ejecución.

2.1.2 Informes Especialistas y Profesionales

Durante el mes de marzo de 2025, las labores del Director y Residentes de interventoría, consistieron en requerir a los presidentes de las JAC que no han iniciado obras, las cotizaciones de materiales, maquinaria, equipos, transporte de material, revisarlas y realizar los comités técnicos para su respectiva aprobación, la entrega de los diseños de pavimento para la respectiva revisión y aprobación por parte del Especialista y el apoyo y acompañamiento técnico y administrativo en la construcción de las obras y entrega de informes.

Igualmente, se acompañaron las labores administrativas que permitieron la revisión y aprobación de proveedores de suministros y servicios requeridos.

Así mismo, se requiere al residente del proyecto, atender los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales, como también atender las observaciones realizadas por el Especialista en Geotecnia y pavimentos de la Interventoría.

Se requiere al residente y contador el diligenciamiento de los formatos entregados por el INVIAS adoptados a los convenios solidarios, los cuales permiten llevar un seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, jurídico del convenio.

Se informa al INVIAS el reintegro de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de los recursos que fueron girados en desarrollo de los convenios y a la fecha no se han allegado copia y soporte de los traslados vía sebra de los meses en mora.

Se realizan la prórroga No.2 para los Convenios No.2138, 2151, 2190, 2433, 2752, 2639, 2799, 2064, 2111, y 27 88 de 2024 y la del contrato de interventoría, con plazo vigente hasta el 30 de abril de 2025..

2.1.3 Componente ambiental

Zona Norte

- **Apoyo y seguimiento en la ejecución obra**
  Durante este periodo, se realiza apoyo y seguimiento en la ejecución de los siguientes convenios:
  - Vereda EL HOTEL
  - Vereda LA TROJA
  - Vereda EL PROGRESO

- **Solicitud NO PROCESOS EN CURSO – CAM**
  Durante el presente periodo se envió solicitud y reiteración de la solicitud a la CAM para obtención certificado NO PROCESOS EN CURSO de los siguientes convenios:
  - 2060 de 2024
  - 2105 de 2024

- **OBTENCIÓN CERTIFICADO NO PROCESOS EN CURSO CAM**
  Durante el presente periodo, se obtuvo los siguientes certificados de NO PROCESOS EN CURSO por parte de la CAM
  - 2110 de 2024
  - 2150 de 2024

- **VISITAS A CAMPO CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGA** de los convenios 2139 de 2024, 2150 de 2024, 2110 de 2024, 2318 de 2024, 2423 de 2024 y 2105 de 2024.

- Recepción documentación ambiental final por parte del convenio 2108 de 2024, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

- Envío oficio solicitando entrega documentación ambiental final de los convenios:
  - 2105 de 2024
  - 2110 de 2024
  - 2150 de 2024
  - 2139 de 2024
  - 2423 de 2024
  - 2060 de 2024

- Envío informe ambiental final de los siguientes convenios:
  - 2139 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-027834
  - 2150 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-031026
  - 2108 de 2024, radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-024372

Zona Sur

- **Municipio Algeciras:**

Convenio 2234 – 2024: Paraíso Pueblo Viejo

Se llevó a cabo comité operativo, en el cual se reporta que la JAC ya culmino la Obra de Participación Comunitaria, y que la obra civil está próxima a terminar, teniendo en cuenta que ya se encuentran en la ejecución de los últimos ml de placa huella. Por lo tanto, se solicitó hacer entrega de la documentación de cierre ambiental, la cual consiste en los formatos MAPS, las actas de paz y salvos con proveedores.

Se envió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre.

Se realizó visita de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el estado para la entrega de la misma.

La CAM hizo entrega del certificado donde ratifica que el convenio no tiene procesos sancionatorios con la Corporación.

Convenio 2692 – 2024: Colon

Se realizó comité operativo, en el cual se verificó avance de obra, la cual esta en proceso de culminación. Por ende, se solicitó la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación del convenio, el cual corresponde a formatos MASP y actas de paz y salvo de los proveedores.

Se envió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre.

Se llevó a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, la JAC comunica que han ido avanzando con esta obra y que esperan la próxima semana culminarla, así mismo se indica que una vez finalizada la obra, se debe programar la socialización de cierre, en la cual se hace entrega de la obra civil y obra social. Y también se debe entregar la documentación de cierre ambiental.

Se realizó visita de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el estado para la entrega de la misma.

Convenio 2130 – 2024: Naranjos Bajos

Se envió oficio a la CAM solicitando información de procesos ambientales que pueda tener el convenio por malas prácticas ambientales.

Se envió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre.

Se realizó visita de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el estado para la entrega de la misma.

La CAM hizo entrega del certificado donde ratifica que el convenio no tiene procesos sancionatorios con la Corporación.

- **Municipio de Isnos:**

Convenio 2087-2024: Salto de Bordones

Se solicitó al residente de obra la entrega de la documentación ambiental de cierre, para el proceso de liquidación del convenio, teniendo en cuenta que desde hace días atrás se les solicito por escrito y a la fecha no se ha recibido respuesta.

- **Convenio 2170-2024: Sinaí**

Se solicitó al residente de obra la entrega de la documentación ambiental de cierre, para el proceso de liquidación del convenio, teniendo en cuenta que desde hace días atrás se les solicitó por escrito y a la fecha no se había recibido respuesta.

Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.

Se emitió concepto de No pasivos ambientales por parte de la Interventoría a la JAC. Lo anterior, como parte del proceso del cierre ambiental. Si embargo, no fue posible hacer el cierre definitivo debido a que la documentación solicitada fue entregada de manera incompleta.

- **Convenio 2084-2024: La Muralla**

Se solicitó al residente de obra la entrega de la documentación ambiental de cierre, para el proceso de liquidación del convenio, teniendo en cuenta que desde hace días atrás se les solicitó por escrito y a la fecha no se ha recibido respuesta.

- **Municipio de Acevedo:**

Convenio 2788-2024: La Primavera

Se llevó a cabo el comité operativo 7 del convenio, en el cual se aprueba el cambio de algunos proveedores y de pagos del plan de compras.

Se llevó a cabo el comité operativo 8 del convenio, en el cual se aprueba el cambio de algunos proveedores y de pagos del plan de compras.

- **Convenio 2639-2024: San José de Riecito**

Se llevó a cabo comité operativo, en el cual se aprobó el plan de compras. Se verificó los elementos requeridos para la implementación del PGA dentro de las aprobaciones.

- **Convenio 2338-2024: Versalles**

Se llevó a cabo el comité operativo 3 del convenio, en el cual se hizo la aprobación de los proveedores conforme a la presentación de las cotizaciones requeridas para el plan de compras.

- **Municipio de Saladoblanco:**

- **Convenio 2109-2024: Morelia**

Se realiza seguimiento a la obra, se realiza recorrido y verificación en obra de la implementación del PGA, así mismo se hizo charla socio ambiental al personal de obra. Por otra parte, se hizo seguimiento a la OPC, quienes ya dieron inicio a la construcción y mejoramiento del sendero peatonal y esperan culminar este mes con la obra de participación comunitaria.

Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación.

- **Convenio 2280-2024: La Cabaña**

Se realiza seguimiento a la obra, se realiza recorrido y verificación en obra de la implementación del PGA, así mismo se hizo charla socio ambiental al personal de obra. Por otra parte, se hizo seguimiento a la OPC, quienes ya dieron inicio a la construcción y mejoramiento del sendero peatonal y esperan culminar este mes con la obra de participación comunitaria.

Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación.

- **Municipio de Garzón:**

- **Convenio 2063-2024: El Mesón**

Se remitió la documentación ambiental de cierre del convenio a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS.

Se llevó a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.

- **Municipio La Plata:**

- **Convenio 2799-2024: Gallego**

Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación.

Se participó en los diferentes comités celebrados en el periodo, para hacer seguimiento a la implementación de medidas del PGA.

- **Municipio Nátaga:**

- **Convenio 2064-2024: Yarumal**

Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la implementación de las medidas del PGA, así mismo, de la Obra de Participación Comunitaria.

Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación.

- **Convenio 2111-2024: Cascajosa**

Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la implementación de las medidas del PGA, así mismo, de la Obra de Participación Comunitaria.

Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación.

2.1.4 Componente Social

Zona Norte

- Se realizó cargue de información de convenios faltantes en el drive del INVIAS
- Se realizó oficio dirigido al supervisor de la interventoría para reporte de información radicada ante subdirección de sostenibilidad de las cuales no se ha obtenido respuesta.
- Se realizó radicación del plan de inversión social de la vereda Antillas de Colombia
- Se realizó oficio dirigido a subdirección de sostenibilidad para obtener respuesta de las No
- objeciones de los planes de inversión social radicados desde el mes de diciembre a la fecha.
- Se realizó visita social conjunto con la parte técnica para hacer seguimiento en la ejecución de las obras en la vereda la siria.
- Se realizó visita social conjunto con la parte técnica para hacer seguimiento en la ejecución de las obras en la vereda el progreso.
- Se realizó reunión de cierre con la comunidad de la vereda Troja de Baraya, para realizar entrega de las obras social y técnicas contempladas en el convenio.
- Se realizó reunión de cierre con la comunidad de la vereda Puertas del Sol de Tello, para realizar entrega de las obras social y técnicas contempladas en el convenio.
- Se realizó reunión de cierre con la comunidad de la vereda Hotel de Baraya, para realizar entrega de las obras social y técnicas contempladas en el convenio.
- Se realizó realizo apoyo en la recolección de la documentación de los presidentes para el proceso de prorrogas que adelanto la parte administrativa.

Zona Sur

- **Asistencia a Comités Operativos de Seguimiento.**

Durante este periodo, se asistió a los comités operativos desarrollados para los siguientes convenios:

2692 – 2024 Colón – Algeciras (03/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, el presidente de la JAC manifiesta que ya iniciaron con las actividades preliminares que se requieren para poder realizar la construcción y la instalación de la cubierta.

2234 – 2024 Pueblo Viejo – Algeciras (03/03/2025): Se llevo a cabo comité operativo, en el cual se reporta que la JAC ya culmino la Obra de Participación Comunitaria, que una vez se termine la obra civil, se debe realizar la reunión de cierre en la cual se hará entrega a la comunidad de ambas obras y así mismo dar un informe de la ejecución del convenio.

2111- 2024 La Cascajosa – Nátaga (04/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, preguntando a la JAC que gestiones han adelantado en cuanto a la compra de los materiales, ya que el Plan de Inversión Social fue aprobado, JAC refiere que este fin de semana del 08 de marzo del 2025 se espera que lleguen los materiales a la vereda.

06/03/2025: 2639 – 2024 San José de Riecito – Acevedo: Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a las correcciones del Plan de Inversión Social, en cuanto a las cotizaciones que se deben cambiar, para poder llevar a cabo la aprobación de este plan y así puedan iniciar con la Obra de Participación Comunitaria.

2064 – 2024 Yarumal – Nátaga (12/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, ya que hasta el momento no se ha recibido registro fotográfico de los avances. La JAC refiere que aún no han podido iniciar con el cambio de cubierta, ya que deben construir unas columnas, ya solicitaron el material están a la espera que llegue en el transcurso de la semana. Se realiza la solicitud que se inicie lo más pronto posible con la OPC, ya que el contrato está llegando a la etapa final y se espera que ambas obras estén culminadas para así poder realizar el respectivo cierre.

2111- 2024 La Cascajosa – Nátaga (14/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, indagando a la JAC, si los materiales para la OPC, ya llegaron; quienes refieren que aún no, sin embargo, ya han estado realizando las gestiones pertinentes con el proveedor para la entrega de los materiales y se espera que el fin de semana ya cuenten con estos. Se realiza la solicitud que se inicie lo más pronto posible con la OPC, ya que el contrato está llegando a la etapa final y se espera que ambas obras estén culminadas para así poder realizar el respectivo cierre.

14/03/2025: 2639 – 2024 San José de Riecito – Acevedo: Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a las correcciones del Plan de Inversión Social, ya que a la fecha no han enviado las nuevas cotizaciones, y no se ha podido seguir con el trámite para radicar la documentación a la Subdirección de Sostenibilidad y así poder realizar la respectiva aprobación.

2130 – 2024 Los Naranjos Bajos – Algeciras (20/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la OPC, el ingeniero residente comunica que ya se ejecutó en su totalidad la obra social.

2111- 2024 La Cascajosa – Nátaga (20/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, indagando a la JAC sobre el inicio

de la OPC, manifiestan que los materiales ya se encuentran en la vereda y están organizando con la comunidad la logística para iniciar con la ejecución de dicha obra. Se reitera nuevamente que se inicie lo más pronto posible con la OPC, ya que el contrato está llegando a la etapa final y se espera que ambas obras estén culminadas para así poder realizar el respectivo cierre.

2692 – 2024 Colon – Algeciras (25/03/2025): Se llevó a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, la JAC comunica que han ido avanzando con esta obra y que esperan la próxima semana culminarla, así mismo se indica que una vez finalizada la obra, se debe programar la socialización de cierre, en la cual se hace entrega de la obra civil y obra social.

2338 – 2024 Versalles – Acevedo (31/03/2025): Se llevó a cabo comité operativo de aprobación de cotizaciones; también se realiza seguimiento al Plan de Inversión Social, en el cual la JAC, ya tiene definido la Obra de Participación Comunitaria que van a realizar y realizarán el envió de la documentación en el transcurso de la semana.

- **Recepción y evaluación de Plan de Inversión Social:**

Durante el presente periodo se realiza la respectiva recepción y evaluación de la documentación del Plan de Inversión Social:

- 2639 - 2024: San José de Riecito – Acevedo: Este plan de inversión social aún se encuentra en ajustes por parte de la JAC y el residente de obra.

- **Remisión documentación social inicial enviada a la SS del INVIAS:**

Una vez se revisó y se realizaron los ajustes correspondientes a los documentos entregados por parte de los contratistas de obra, se realizaron los respectivos oficios de radicación para la entrega de la documentación social inicial a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS:

- Oficio 211-1-781 Entrega Documentación de Cierre PGS 2084 de 2024 La Muralla – Isnos, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-028470.
- Oficio 211-1-796 Entrega Documentación de Cierre PGS 2087 de 2024 Salto de Bordones – Isnos, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-030181.

- **Otras actividades:**

Durante el presente periodo realicé las siguientes actividades:

- 2109 – 2024 Morelia – Saladoblanco (17/03/2025): Se realiza seguimiento a la OPC, quienes ya dieron inicio a la construcción y mejoramiento del sendero peatonal y esperan culminar este mes con la obra de participación comunitaria.

- 2280 – 2024 La Cabaña – Saladoblanco (17/03/2025): Se realiza seguimiento a la OPC, quienes ya dieron inicio a la construcción de la cocina comunitaria de la vereda La Cabaña y esperan culminar este mes con la obra de participación comunitaria.

- 2170 – 2024 Sinaí – Isnos (21/03/2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria. cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.

2.1.5 Componente SST

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PARAISO – COLOMBIA – CONVENIO 2269-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda EL PARAISO, convenio número 2269 realizó las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato
- Listado de personal

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VERSALLES – COLOMBIA – CONVENIO 2708-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda VERSALLES, convenio número 2708 realizó las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTA DEL SOL – TELLO – CONVENIO 2318-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA SIRIA – BARAYA – CONVENIO 2150-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PROGRESO – BARAYA – CONVENIO 2423-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PARADA – BARAYA – CONVENIO 2105-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUEBLO VIEJO – ALGECIRAS – CONVENIO 2234-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLON – ALGECIRAS – CONVENIO 2692-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GALLEGO – LA PLATA – CONVENIO 2799-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CASCAJOSA –

NÁTAGA – CONVENIO 2111-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA YARUMAL – NÁTAGA – CONVENIO 2111-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA AGUA FRIA – HOBO – CONVENIO 2060-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA NARANJOS BAJOS – ALGECIRAS – CONVENIO 2130-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA – ACEVEDO – CONVENIO 2788-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MORELIA – SLADOBLANCO – CONVENIO 2109-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CABAÑA – SALADOBLANCO – CONVENIO 2280-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA HORIZONTE – COLOMBIA – CONVENIO 2190-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

2.2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.2.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría

Durante el periodo reportado se contó con dos (2) camionetas para el Director de interventoría, residentes de interventoría, profesionales ambientales, sociales, SST y financieros, permitiendo realizar las visitas técnicas; también, con equipos de cómputo y dotación de oficina, que son requeridos para la efectuar las actividades de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

2.2.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría

Durante el mes de marzo de 2025 se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

N°	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	GULLIERMO ALBERTO ROJAS	ING AMBIENTAL	10/10/2024	OBRA O LABOR
2	WENDY TATIANA IBAÑEZ ALFONZO	ING AMBIENTAL	10/10/2024	OBRA O LABOR
3	NATALIA ANDREA MELENDEZ MONTENEGRO	PROFESIONAL SOCIAL	3/10/2024	OBRA O LABOR
4	DANER FERNEY MALES GOLONDRINO	INSPECTOR DE OBRA	30/10/2024	OBRA O LABOR
5	KELLY JOHANA HENAO	INSPECTOR DE OBRA	31/10/2024	OBRA O LABOR
6	PAULA XIMENA RAMIREZ MONJE	PROFESIONAL SOCIAL NORTE	3/10/2024	OBRA O LABOR
7	JULIAN DAVID ORTIZ HENAO	ING RESIDENTE	9/10/2024	OBRA O LABOR
8	MARIA CAROLINA SALAZAR PLAZA	INGENIERA AUXILIAR	16/10/2024	OBRA O LABOR
9	ANDRES FELIPE BENAVIDEZ POLANIA	TECNICO ADMINISTRATIVO	7/10/2024	OBRA O LABOR
10	DIEGO ANDRES PLAZAS CABRERA	FINANCIERO	7/11/2024	OBRA O LABOR
11	CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS	DIRECTOR INTERVENTORIA	16/10/2024	OBRA O LABOR
12	DIANA MARCELA RAMIREZ DIAZ	INSPECTOR SST	13/11/2024	OBRA O LABOR
13	MAGALY YULIETH LASSO CERON	INSPECTOR	19/11/2024	OBRA O LABOR
14	MARIA JOSE PEÑA BUYUCUE	INSPECTORA	19/11/2024	OBRA O LABOR
15	EDWIN FERNEY IQUIRA RAMOS	INSPECTOR	6/12/2024	OBRA O LABOR
16	LAURA VALENTINA PERDOMO FIERRO	INSPECTORA	11/12/2024	OBRA O LABOR
17	YONATHAN GAITAN GOMEZ	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
18	JOSE MANUEL GASCA CUELLAR	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
19	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MONJE	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
20	DARWIN ANDRES MORALES	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
21	JHON ALEX TAMAYO MONTEALEGRE	INSPECTOR	17/12/2024	OBRA O LABOR
22	CRISTIAN CAMILO CHALA	FINANCIERO	9/1/2025	OBRA O LABOR
23	MARIO FERNANDO CASTILLO	ING RESIDENTE	9/1/2025	OBRA O LABOR
24	JESÚS DAVID JIMÉNEZ TIERRADENTRO	CONDUCTOR	13/1/2025	OBRA O LABOR
25	FREDY MEDINA RAMÍREZ	CONDUCTOR	22/1/2025	OBRA O LABOR
26	HAMINCE ORTIZ	CONDUCTOR	10/2/2025	OBRA O LABOR

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

2.2.3 Información financiera y presupuestal contrato de Interventoría

Con base en el CDP No. 125424 de fecha 2024-05-22. Se hizo el registro presupuestal No. 956924 con vigencia fiscal 2024 por valor 1.546.789.418,00 para el contrato principal. Lo anterior, sin adiciones a la fecha.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

2.2.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

• Contrato inicial: PÓLIZA Nº 21-44-101451460 ANEXO 0

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 154.678.941,80	16/9/2024	30/6/2025
MANEJO ANTICIPO	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	30/6/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 464.036.825,40	31/12/2024	31/12/2029

Contrato inicial: PÓLIZA Nº 21-44-101451460 ANEXO 1

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 154.678.941,80	16/9/2024	30/6/2025
MANEJO ANTICIPO	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	30/6/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 464.036.825,40	31/12/2024	31/12/2029

Contrato inicial: PÓLIZA Nº 21-44-101451460 ANEXO 2

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 154.678.941,80	16/9/2024	30/6/2025

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
MANEJO ANTICIPO	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	30/6/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 464.036.825,40	31/12/2024	31/12/2029

Contrato inicial: PÓLIZA Nº 21-44-101451460 ANEXO 3

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 154.678.941,80	16/9/2024	30/6/2025
MANEJO ANTICIPO	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	30/6/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 464.036.825,40	31/12/2024	31/12/2029

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

2.2.5 Otros documentos seguimiento mensual

- El seguimiento a la inversión del anticipo no aplica formato ya que hasta el momento no se ha realizado desembolso del mismo por parte de INVIAS.
- Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de cargas: De acuerdo a la prórroga otorgada al contrato de interventoría para el mes de marzo con plazo de vencimiento actual a 30 de abril de 2025, el plan de cargas fue aprobado hasta el 30 de abril de 2025.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTADO DE TRÁMITE DE ACTAS DE COSTOS

Solicitud de anticipo tramitada mediante radicado 2024E-VUVRAZ- 113508 el 12 de noviembre de 2024; es de resaltar que el Consorcio Inter Eco mediante comunicado 211-0-002 del 19 de septiembre de 2024 presento el desistimiento del anticipo. Sin embargo, no se nos quiso aprobar la póliza de cumplimiento del contrato si no se incluía este, viéndonos obligados a solicitar entonces el mismo. A la fecha no se nos ha realizado el desembolso, ni se nos ha dado información alguna al respecto sobre el estado de este. De otro lado, el anticipo fue nuevamente solicitado mediante oficio 211-0-059 radicado 2025E-VUVRAZ-011266 del 03 de febrero de 2025.

Acta de costos 1 del mes de octubre de 2024 radicado 2024E-VUVRAZ-112398; se tiene conocimiento de que las observaciones al informe y acta corregidas en el mes de diciembre

fueron subsanadas desde la supervisión de la Territorial Huila al Gestor Técnico Ingeniero

Alonso Salinas, quien dio finalmente su aval y traslado a la Subgerencia del Programa Caminos Comunitarios el 23 de diciembre de 2024. Se tuvo conocimiento de una glosa por falta de la factura el 12 de febrero de 2025. Mediante oficio 211-1-621 radicado 2025E-VUVRAZ-015203 fue enviada para subsanar.

Acta de costos 2 del mes de noviembre de 2024 radicado 2024E-VUVRAZ-126478; se tiene conocimiento de que las observaciones al informe y acta corregidas en el mes de diciembre fueron subsanadas desde la supervisión de la Territorial Huila al Gestor Técnico Ingeniero Alonso Salinas, quien dio finalmente su aval y traslado a la Subgerencia del Programa Caminos Comunitarios el 23 de diciembre de 2024. Se tuvo conocimiento de una glosa por falta de la factura el 12 de febrero mediante oficio 211-1-622 radicado 2025E-VUVRAZ-015214 fue enviado para subsanar.

Solicitud de anticipo tramitada mediante oficio 211-0-48 radicado 2024E-VUVRAZ- 113508 el 12 de noviembre de 2024, a la fecha no se nos ha realizado el desembolso, ni se nos ha dado información alguna al respecto. En nueva gestión o actualización de dicha solicitud, se entregó nuevamente la información para trámite de anticipo mediante oficio 211-0-059 radicado 2025E-VUVRAZ-011266 del 3 de febrero de 2025.

Acta de costos 3 del mes de diciembre de 2024. Se dio trámite por parte de la supervisión de la Territorial Huila a la Subgerencia del Programa Caminos Comunitarios a través del memorando individual 2025I-VHUI-003043 del 23 de enero de 2025. A la fecha no se tiene información alguna del trámite de esta. No se ha indicado por parte de la entidad el requerimiento de emitir factura.

Acta de costos 4 del mes de enero de 2025. Fue radicada a la Territorial Huila mediante oficio 211-1-613 radicado 2025E-VUVRAZ-013769 del 07 de febrero de 2025. No se ha indicado por parte de la entidad el requerimiento de emitir factura.

Acta de costos 5 del mes de febrero de 2025. Fue radicada al supervisor del contrato mediante oficio 211-1-757 radicado 2025E-VUVRAZ-025302 del 10 de marzo de 2025. No se ha indicado por parte de la entidad el requerimiento de emitir factura.

Hasta la fecha, no se ha recibido confirmación de que ninguna de las actas anteriores hayan quedado obligadas para pago.

Me permito reiterar que el no pago del anticipo y de las actas en mención le genera al Consorcio Inter Eco un desequilibrio económico en el flujo financiero ya que se requieren recursos para el pago del personal y gastos de funcionamiento del contrato para su normal funcionamiento. A la fecha se han completado seis meses de ejecución sin recibir anticipo ni pago alguno, viéndose obligado el Consorcio a financiación externa para cumplir con el objetivo de su contratación.

REQUERIMIENTOS EFECTUADOS A LA ENTIDAD

Queremos hacer un resumen de los requerimientos no contestados por el Instituto dada la situación del contrato de interventoría en cuanto al posible desequilibrio económico generado por la falta de pago de las actas y anticipo:

En oficio 211-0-057 del 17 de enero de 2025 se requiere a la Subgerencia del Programa

Caminos Comunitarios la información sobre el trámite del acta de costos 1 y 2 de los meses de octubre y noviembre de 2024.

Así mismo, mediante oficio 211-0-058 el 27 de enero de 2025 se hace una solicitud de información para conocer el estado de trámite de las actas de costos 1 y 2 y del anticipo.

Mediante comunicado 211-0-060 radicado 2025E-VUVRAZ-012701 del 06 de febrero de 2025 se presentó reiteración sobre el trámite de actas donde se encontraban tramitadas las actas 1, 2 y 3 de octubre, noviembre y diciembre de 2024.

Estos requerimientos han tenido el objeto de manifestar el estado financiero de la interventoría, que en resumen indica que, hasta el mes de febrero se ha podido facturar apenas el 41% de los costos variables por avance de los convenios, dada la complejidad y el traumatismo del inicio de los mismos por su misma modalidad de ejecución. La situación ha perjudicado a la interventoría que para el acta 5 tiene una ejecución acumulada de tan solo el 62%.

La interventoría manifiesta su preocupación por el posible perjuicio ya que es probable que de la bolsa de costos variables de la interventoría exista un porcentaje que se deje de cobrar, además de la situación de recibo definitivo y liquidación de dichos convenios que no pueda completarse dadas las demoras en la entrega de información por parte de los profesionales de los convenios principalmente para dar cierre a la parte financiera.

El compromiso de las diferentes reuniones sostenidas con el gestor técnico del proyecto para realizar la prórroga tanto de los convenios y por ende de la interventoría, era la gestión de recursos adicionales para nuestro contrato, en el entendido que los convenios que iniciaron su etapa de ejecución en el mes de marzo, tampoco alcanzan a finalizar en el mes de abril requiriendo personal y logística para su atención durante dos meses. El enfoque de este plazo adicional y solicitud de recursos es concentrarse en la liquidación de los convenios terminados que a la fecha son veinte.

Una de las dificultades o demoras que puede tener el proceso de recibo definitivo y liquidación de los convenios está sujeto a la entrega de información financiera por parte de los profesionales de las OAC. Esta situación además de las gestiones de traslado de rendimientos financieros, devolución de recursos no ejecutados al tesoro nacional y cierre de cuentas, es parte de la problemática para la liquidación.

Así mismo, para la liquidación se ha realizado el trámite o radicación ambiental y social de los proyectos ante la Subdirección de Sostenibilidad. En ese sentido tenemos el siguiente resumen:

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL
NO OBJECIÓN EMITIDA POR INVIAS SS: 20
EN ESPERA DE APROB. INVIAS: 8
NO PRESENTADOS 6

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
NO OBJECIÓN EMITIDA POR INVIAS SS: 16
EN ESPERA DE APROB. INVIAS: 13
NO PRESENTADOS 5
RADICADO AMBIENTAL FINAL 3

Considera la interventoría que ha habido retraso en la entrega de información por las JAC. Sin embargo, debido a la falta de personal en la planta del Instituto, no se ha podido obtener

respuesta de la documentación radicada a la Subdirección de Sostenibilidad, como lo demuestra el siguiente ejemplo: el convenio 2084 de la JAC MURALLA fue radicado el 19 de noviembre y a la fecha no ha obtenido respuesta o no objeción por la SS.

En la solicitud de adición y prórroga presentada mediante oficio N°211-0-063 radicado N°2025E-VUVRAZ-030334 del 21 de marzo, se requirió un valor total de adición para la interventoría de $215.730.482,40 que incluye personal y logística de las actividades contempladas en la bolsa variable. Estos están asociados con arrendamiento de oficina y servicios públicos, alquiler de vehículo con conductor, papelería, viáticos de personal para visitas de campo y comunicaciones entre otros.

A pesar de ser conscientes del requisito de recursos adicionales, se aceptó considerar una prórroga para extender la interventoría hasta el 30 de abril. Con esta decisión, se hizo redistribución de recursos disminuyendo el número de inspectores hasta tener una dedicación de 7,22 en el mes, lo cual es una situación que no garantiza el cubrimiento de los convenios que estarán en ejecución durante el mes de abril que son diez.

Al respecto de los convenios 3609 JAC Calle Real – Aipe, 3776 JAC La Galda - Agrado, 3768 JAC Praga – Aipe, que recientemente fueron reiniciados al obtener desembolso por el gobierno nacional, es claro que no tienen tiempo suficiente para su terminación en el plazo de la interventoría. Se recuerda que la etapa de alistamiento con la presentación de los profesionales de la junta puede llevar más de 15 días. Así que, en la responsabilidad que nos asiste y dada la imposibilidad del recibo en las condiciones de exigencia de la entidad, respetuosamente se debe considerar no tener a cargo de la interventoría estos convenios. Adicionalmente, a la fecha tampoco se tiene información de los estudios topográficos y de suelos que disponga la territorial para la ejecución de estos convenios, motivo por el cual reiteramos que estos convenios ya no se podrán ejecutar en el plazo restante del contrato.

4. ANEXOS

4.1 Relación de correspondencia

Durante el mes de febrero de 2025 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

- Interventoría – correspondencia enviada

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-725	3-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2138 de 2024 Periodo Julio a diciembre de 2024.
211-1-726	3-mar-24	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA-HUILA	Bernando Peraza	Presidente de la JAC vereda Antillas Colombia-Huila	Reiteración Entrega Obligatoria del plan de gestión social inicial del convenio Solidario N°2151 de 2024 JAC Antillas – Colombia
211-1-727	3-mar-24	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Suspensión Convenio 2338 de 2024 Versalles-Acevedo

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-728	4-mar-24	JAC VEREDA EL HOTEL BARAYA-HUILA	Efrain Diver Cortes Gonzales	Presidente de la JAC vereda El Hotel Baraya-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2150 de 2024.
211-1-729	4-mar-24	JAC VEREDA LA TROJA BARAYA-HUILA	Arbey Trochez Macias	Presidente de la JAC vereda La Troja Baraya-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2139 de 2024.
211-1-730	4-mar-24	JAC VEREDA LA PARADA BARAYA-HUILA	Oliver Trujillo Esquiivel	Presidenete de la JAC vereda La Parada Baraya-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2105 de 2024.
211-1-731	4-mar-24	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Siria Baraya-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2110 de 2024.
211-1-732	4-mar-24	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Blanca Aurora Calderon Fierro	Presidente de la JAC vereda El Progreso Baraya-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2423 de 2024.
211-1-733	4-mar-24	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 21
211-1-734	5-mar-24	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 21_CORREGIDO
211-1-735	6-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2752 de 2024 Periodo Septiembre a diciembre de 2024.
211-1-736	6-mar-24	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	211-1-736 Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2060 de 2024, vereda Agua Fría, Hobo
211-1-737	6-mar-24	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-738	6-mar-24	JAC VEREDA LA TROJA BARAYA-HUILA	Arbey Trochez Macias	Presidente de la JAC vereda La Troja Baraya-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-739	6-mar-24	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2108 DE 2024
211-1-740	6-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2105 de 2024 Periodo diciembre 2024 a enero de 2025.
211-1-741	6-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2423 de 2024 Periodo enero de 2025.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-742	6-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2110 de 2024 Periodo enero de 2025.
211-1-743	6-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2150 de 2024 Periodo enero de 2025.
211-1-744	6-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2139 de 2024 Periodo enero de 2025.
211-1-745	7-mar-24	JAC VEREDA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE POLICÍA DE LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Fabio Bolaños Urbano	Presidente de la JAC vereda Inspeccion Departamental de Policia de la Cabaña Saladoblanco-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 2280 de 2024
211-1-746	7-mar-24	JAC VEREDA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE POLICÍA DE LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Fabio Bolaños Urbano	Presidente de la JAC vereda Inspeccion Departamental de Policia de la Cabaña Saladoblanco-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 2280 de 2024.
211-1-747	7-mar-24	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 2280 de 2024 – NO PAGA.
211-1-748	7-mar-24	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 2280 de 2024.
211-1-749	7-mar-24	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Wilfred Trujillo Motta	Presidente de la JAC vereda San Jose de Riecito Acevedo-Huila	Respuesta a oficio "Solicitar aclaración y aprobación convenio 2639"
211-1-750	7-mar-24	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	Nohemi Cardenas Benavides	Presidente de la JAC vereda La Primavera Acevedo-Huila	Respuesta a oficio "Solicitar aclaración y Aprobación CONVENIO 2788"
211-1-751	7-mar-24	JAC VEREDA HORIZONTE COLOMBIA-HUILA	Ana Belen Rodriguez	Presidente de la JAC vereda Horizonte Colombia-Huila	Aval para la compra de materiales a la JAC de Versalles.
211-1-752	7-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Reporte de información radicada ante subdirección de sostenibilidad de las cuales no se ha obtenido respuesta.
211-1-753	8-mar-24	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°21
211-1-754	10-mar-24	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2190 de 2024 Periodo enero de 2025.
211-1-755	10-mar-24	JAC VEREDA HORIZONTE	Ana Belen Rodriguez	Presidente de la JAC vereda	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
		COLOMBIA-HUILA		Horizonte Colombia-Huila	SOLIDARIO NÚMERO 2190 DE 2024
211-1-756	10-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2063 de 2024 Periodo (Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero).
211-1-757	7-mar-24	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Entrega acta de costos No 5 de interventoría mes de febrero de 2025.
211-1-758	10-mar-24	JAC MORELIA SALADOBLANCO -HUILA	Orlando Hiles Hoyos	Presidente de la JAC vereda Morelia Saladoblanco-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 2109 de 2024
211-1-759	10-mar-24	JAC MORELIA SALADOBLANCO -HUILA	Orlando Hiles Hoyos	Presidente de la JAC vereda Morelia Saladoblanco-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 2109 de 2024.
211-1-760	10-mar-24	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 2109 de 2024 – NO PAGA.
211-1-761	10-mar-24	INVIAS	Ing. Jairo Fernando Arguello Urrego	Subdirector de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 2109 de 2024.
211-1-762	10-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2318 de 2024 Periodo Diciembre 2024.
211-1-763	11-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2060 de 2024 Periodo FEBRERO 2025.
211-1-764	11-mar-24	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2108 de 2024 Periodo FEBRERO 2025.
211-1-765	12-mar-24	JAC VEREDA SINAI ISNOS-HUILA	Franxo Muñoz	Presidente de la JAC vereda Sinai Isnos-Huila	NO OBJECIÓN al DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA VEREDA SINAI, convenio 2170 de 2024
211-1-766	12-mar-24	JAC VERERDA GALLEGO LA PLATA-HUILA	Maria Aleida Arias Sanchez	Presidente de la JAC vereda Gallego La Plata-Huila	Notificación bajo rendimiento y plazo de entrega de obra
211-1-767	13-mar-24	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Reiteración solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N° 2105 de 2024.
211-1-768	13-mar-24	INVIAS	Jhonny Alexander Lopez Martin	Gerente Caminos Comunitarios de la Paz Total	Información estado de pólizas - solicitud de pólizas y aprobaciones de pólizas.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-769	13-mar-24	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-770	13-mar-24	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega documentación de cierre del plan de gestión social del convenio solidario N°2108 de 2024 JAC Batan – Baraya
211-1-771	13-mar-24	JAC VEREDA PUERTA DEL SOL TELLO-HUILA	Freddy Mendez Corredor	Presidente de la JAC vereda Puerta del sol Tello-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-772	13-mar-24	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 22
211-1-773	14-mar-24	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2139 DE 2024
211-1-774	14-mar-24	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°22
211-1-775	14-mar-24	JAC VEREDA EL MESON GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrera	Presidenten de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-776	14-mar-24	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-777	14-mar-24	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2063 DE 2024
211-1-778	16-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe mensual de actividades de contrato 3697 de 2024_FEBRERO
211-1-779	17-mar-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2433 de 2024 Periodo SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
211-1-780	17-mar-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2190 de 2024 Periodo FEBRERO DE 2024.
211-1-781	17-mar-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2084 de 2024 JAC La Muralla – Isnos.
211-1-782	17-mar-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega del plan de gestión social inicial del convenio solidario N°2151 de 2024 JAC Antillas – Colombia

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-783	18-mar-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Reiteración solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N° 2060 de 2024.
211-1-784	18-mar-25	JAC VEREDA EL MESON GARZÓN-HUILA	Alix Ordoñez Barrera	Presidenten de la JAC vereda El Mesón Garzón-Huila	NO OBJECIÓN al DISEÑO PLACA HUELLA, CONVENIO 2063 DE 2024
211-1-785	18-mar-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-786	18-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2338 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-787	18-mar-25	JAC VEREDA EL HOTEL BARAYA-HUILA	Efrain Diver Cortes Gonzales	Presidente de la JAC vereda El Hotel Baraya-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-788	18-mar-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Luis Alberto Ortiz	Presidente de la JAC vereda Agua Fria Hobo-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2060 de 2024.
211-1-789	18-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 23
211-1-790	20-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°23
211-1-791	20-mar-25	JAC VEREDA VERSALLES ACEVEDO-HUILA	Jhon Jairo Moreno Gaviria	Presidente de la JAC vereda Versalles Acevedo-Huila	Llamado de atención convenio 2338 de 2024
211-1-792	20-mar-25	JAC VEREDA VERSALLES ACEVEDO-HUILA	Jhon Jairo Moreno Gaviria	Presidente de la JAC vereda Versalles Acevedo-Huila	NO OBJECIÓN al diseño de PAVIMENTO RIGIDO Convenio 2338 de 2024
211-1-793	20-mar-25	JAC VEREDA SALTO DE BORDONES ISNOS-HUILA	Robeiro Salazar Muñoz	Presidente de la JAC vereda Saltos de Bordones Isnos-Huila	Reiteración solicitud de documentos financieros para el proceso de Liquidación
211-1-794	20-mar-25	JAC VEREDA SINAI ISNOS-HUILA	Franxo Muñoz	Presidente de la JAC vereda Sinai Isnos-Huila	Reiteración solicitud de documentos financieros para el proceso de Liquidación.
211-1-795	20-mar-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Oliver Rada	Presidente de la JAC vereda Calle Real Aipe-Huila	Información estado del convenio 3609 de 2024
211-1-796	20-mar-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2087 de 2024 JAC Salto de Bordones – Isnos.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-797	20-mar-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA-HUILA	Bernando Peraza	Presidente de la JAC vereda Antillas Colombia-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2151 DE 2024
211-1-798	20-mar-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N° 2130 de 2024 JAC Naranjos Bajos – Algeciras.
211-1-799	21-mar-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2151 de 2024 Periodo FEBRERO DE 2024.
211-1-800	21-mar-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Reporte de información radicada ante subdirección de sostenibilidad de las cuales no se ha obtenido respuesta.
211-1-801	21-mar-25	JAC VEREDA SECTOR PUEBLO VIEJO ALGECIRAS-HUILA	Wuldarico Hoyos Chavarro	Presidente de la JAC vereda Sector Pueblo Viejo Algeciras-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2234 de 2024.
211-1-802	21-mar-25	JAC VEREDA COLON ALGECIRAS-HUILA	Jaime Guillermo Cotrino Suarez	Presidente de la JAC vereda Colon Algeciras-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2692 de 2024.
211-1-803	21-mar-25	JAC VEREDA NARANJOS BAJOS ALGECIRAS-HUILA	Maria Deyi Zamora Ramirez	Presidente de la JAC vereda Naranjos Bajos Algeciras-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2130 de 2024.
211-1-804	21-mar-25	JAC VEREDA MORELIA SALADOBLANCO-HUILA	Orlando Hiles Hoyos	Presidente de la JAC vereda Morelia Saladoblanco-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2109 de 2024.
211-1-805	21-mar-25	JAC VEREDA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE POLICÍA DE LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Fabio Bolaños Urbano	Presidente de la JAC vereda Inspeccion Departamental de Policia de la Cabaña Saladoblanco-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2280 de 2024.
211-1-806	21-mar-25	JAC VERERDA GALLEGO LA PLATA-HUILA	Maria Aleida Arias Sanchez	Presidente de la JAC vereda Gallego La Plata-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2799 de 2024.
211-1-807	21-mar-25	JAC VEREDA YARUMAL NATAGA-HUILA	John Helbert Gonzalez Gonzalez	Presidente de la JAC vereda Yarumal Nataga-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2064 de 2024.
211-1-808	21-mar-25	JAC VEREDA LA CASCAJOSA NATAGA-HUILA	Luz Lucero Mondragon Lozada	Presidente de la JAC vereda La Cascajosa Nataga-Huila	Solicitud entrega documentación para cierre ambiental convenio No. 2111 de 2024.
211-1-809	25-mar-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
					CONVENIO 2150 DE 2024
211-1-810	25-mar-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-811	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2138 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-812	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2639 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-813	25-mar-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA-HUILA	Bernando Peraza	Presidente de la JAC vereda Antillas Colombia-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2151 DE 2024
211-1-814	26-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 3609 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-815	27-mar-25	JAC VEREDA PUERTA DEL SOL TELLO-HUILA	Freddy Mendez Corredor	Presidente de la JAC vereda Puerta del Sol Tello-Huila	Entrega documentación faltante para iniciar proceso de liquidación del convenio No. 2318 de 2024
211-1-816	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2788 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-817	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2799 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-818	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2064 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-819	27-mar-25	JAC VEREDA LA TROJA BARAYA-HUILA	Arbey Trochez Macias	Presidente de la JAC vereda La Troja Baraya-Huila	Entrega documentación faltante para iniciar proceso de liquidación del convenio No. 2139 de 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-820	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2151 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-821	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2190 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-822	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2433 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-823	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2752 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-824	27-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 24
211-1-825	25-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2111 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-826	27-mar-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra SALDO NO EJECUTADO convenio No. 2108 de 2024
211-1-827	27-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2060 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-828	27-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2269 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-829	28-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°24
211-1-830	28-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2338 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
211-1-831	31-mar-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega documentación de cierre del plan de gestión social del convenio solidario N°2139 de 2024 JAC Troja – Baraya
211-1-832	31-mar-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 25

- Interventoría – correspondencia recibida

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
211-3-169	1-mar-25	3-mar-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta a petición con radicado CAM No. 2025-E 3142 de 2025	5229 2025-S
211-3-170	2-mar-25	3-mar-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta a petición con radicado CAM No. 2025-E 3094 de 2025	5231 2025-S
211-3-171	3-mar-25	3-mar-25	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitar aclaración y Aprobación CONVENIO 2788	N/A
211-3-172	3-mar-25	3-mar-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitar aclaración y aprobación convenio 2639	N/A
211-3-173	5-mar-25	5-mar-25	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	Consorcio Inter Eco	Respuesta a su solicitud No. 13531.25	N/A
211-3-174	6-mar-25	6-mar-25	JAC VEREDA CALLE REAL	Consorcio Inter Eco	Solicitud ampliación prórroga convenio en refrencia 3609-2024	N/A
211-3-175	10-mar-25	10-mar-25	CONSORCIO INTER ECO	Consorcio Inter Eco	Reporte de avance de obra del Convenio No. 2799 – 2024.	N/A
211-3-176	10-mar-25	11-mar-25	JAC VEREDA CASCAJOSA NATAGA	INVIAS	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2111-2024	N/A
211-3-177	10-mar-25	11-mar-25	JAC VEREDA GALLEGO LA PLATA	INVIAS	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2799-2024	N/A
211-3-178	11-mar-25	11-mar-25	JAC VEREDA HORIZONTE COLOMBIA	INVIAS	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2190-2024	N/A
211-3-179	11-mar-25	11-mar-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA	INVIAS	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2151-2024	N/A

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
211-3-180	10-mar-25	10-mar-25	JAC VEREDA CALLE REAL	Consorcio Inter Eco	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 3609-2024-2024	N/A
211-3-181	10-mar-25	11-mar-25	JAC VEREDA PARAISO COLOMBIA	INVIAS	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2269-2024	N/A
211-3-182	10-mar-25	11-mar-25	JAC VEREDA SANTANA COLOMBIA	INVIAS	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2752-2024	N/A
211-3-183	11-mar-25	11-mar-25	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	INVIAS	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2788-2024	N/A
211-3-184	11-mar-25	12-mar-25	JAC VEREDA LA ESPERANZA COLOMBIA	INVIAS	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2433-2024	N/A
211-3-185	13-feb-25	12-mar-25	JAC VEREDA MORELIA SALADOBLANCO	INVIAS	Solicitud cambio de meta fisica	N/A
211-3-186	13-feb-25	12-mar-25	JAC VEREDA LA CABAÑA SALADOBLANCO	INVIAS	Solicitud cambio de meta fisica	N/A
211-3-187	10-mar-25	12-mar-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO	INVIAS	Solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2060 de 2024	N/A
211-3-188	6-mar-25	18-mar-25	JAC VEREDA VERSALLES ACEVEDO	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2338 de 2024	N/A
211-3-189	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA LA UNIIÓN COLOMBIA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2138 de 2024	N/A
211-3-190	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2639 de 2024	N/A
211-3-191	10-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA	Consorcio Inter Eco	Solicitud cambio de maestro de obra	N/A
211-3-192	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2788 de 2024	N/A
211-3-193	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA GALLEGO LA PLATA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2799 de 2024	N/A
211-3-194	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA YARUMAL NATAGA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2064 de 2024	N/A

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
211-3-195	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2151 de 2024	N/A
211-3-196	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA HORIZONTE COLOMBIA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2190 de 2024	N/A
211-3-197	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA LA ESPERANZA COLOMBIA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2433 de 2024	N/A
211-3-198	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA SANTANA COLOMBIA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2752 de 2024	N/A
211-3-199	6-mar-25	25-mar-25	JAC VEREDA CASCAJOSA NATAGA	Consorcio Inter Eco	Solicitud prórroga del convenio solidario No. 2111 de 2024	N/A
211-3-200	26-mar-25	26-mar-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta oficio con radicado CAM No. 2025-E 7438 de NARANJOS BAJOS	8094 2025-S
211-3-201	26-mar-25	26-mar-25	JAC VEREDA LA CABAÑA SALADOBLANCO	Consorcio Inter Eco	Solicitud de ampliación para la Etapa de Liquidacción de Convenios 2280-2024	N/A
211-3-202	26-mar-25	26-mar-25	JAC VEREDA MORELIA SALADOBLANCO	Consorcio Inter Eco	Solicitud de ampliación para la Etapa de Liquidacción de Convenios 2109-2024	N/A
211-3-203	28-mar-25	28-mar-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta a solicitud con radicado CAM No. 2025-E 4663 PUEBLO VIEJO	8395 2025-S
211-3-204	28-mar-25	28-mar-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-032831 CONVENIO 2269 PARAISO COLOMBIA".	2025S-VHUI-018967
211-3-205	28-mar-25	28-mar-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-032491 CONVENIO 2151 ANTILLAS COLOMBIA	2025S-VHUI-018969
211-3-206	28-mar-25	28-mar-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-032468 CONVENIO 2151 ANTILLAS COLOMBIA	2025S-VHUI-018971

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
211-3-207	28-mar-25	28-mar-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-032013 PRORROGA INTERVENTORIA	2025S-VHUI-018972
211-3-208	28-mar-25	28-mar-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-031772 convenio 3609 JAC CALLER	2025S-VHUI-018976
211-3-209	28-mar-25	28-mar-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-031018 convenio 2639 JAC RIECITO"	2025S-VHUI-018978
211-3-210	28-mar-25	28-mar-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-028738 convenio 2338 2024 JAC VERSALLES ACEVEDO".	2025S-VHUI-018984
211-3-211	28-mar-25	28-mar-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-031005 convenio 2138 JAC LA UNION"	2025S-VHUI-018985

4.2 Registro Fotográfico

El convenio se encuentra en proceso de liquidación.

4.3 Bitácora

Teniendo en cuenta que la interventoría se ejecuta en simultaneo para los proyectos activos, se presentan las bitácoras de obra de los proyectos que se encuentran en ejecución de obras.

4.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios

En el desarrollo de los convenios se entregan formatos de maquinaria y equipos, estado general del tiempo, garantías del convenio, resumen mensual estado general del convenio, personal control aportes legales y seguridad social, información financiera y presupuestal, garantías y seguro de obra, acta mensual de pagos convenio, informe inversión buen manejo de desembolso, plan inversión desembolso mensual.

Cordialmente;

CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Director de Interventoría
CONSORCIO INTER ECO

ANEXOS INTERVENTORÍA

- Informes especialistas y profesionales
- Planillas pago seguridad social mes marzo

Neiva, 4 de abril de 2025

INFORME ACTIVIDADES DIRECTOR INTERVENTORÍA
PERIODO: MARZO DE 2025

El presente informe tiene como propósito documentar las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2025 del Ing. CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS –Director de Interventoría en el marco del CONTRATO NÚMERO 3697 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

ENTREGA DE INFORMES

Remisión de informe de avance semanal según modelo de la matriz de seguimiento técnico mediante oficio numerado con las siguientes fechas:

- 211-1-832 del 31 de marzo, informe 25
- 211-1-824 del 24 de marzo. Informe 24
- 211-1-789 del 18 de marzo. Informe 23
- 211-1-772 del 13 de marzo. Informe 22
- 211-1-733 del 04 de marzo. Informe 21

Igualmente, se presentaron los informes semanales de interventoría para los convenios en ejecución.

TRÁMITE DE ACTAS Y SOLICITUDES

Supervisión y seguimiento de los procesos relacionados con la ejecución de los convenios establecidos.

Realización y entrega para su debido trámite del acta de costos del mes de febrero de 2025.

En el entendido que para el mes de marzo se presentaba el vencimiento de la mayoría de los convenios en plazo, se evaluó la necesidad de prorrogar varios según su condición de atraso por lo cual se realizó su gestión y trámite hasta el 30 de abril, para los siguientes convenios:

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

Convenio 2111 de 2024 Vereda Cascajosa Nátaga
Convenio 2799 de 2024 Vereda Gallego La Plata.
Convenio 2639 de 2024 Vereda San José de Riecito Acevedo
Convenio 2788 de 2024 Vereda Primavera Acevedo.
Convenio 2151 de 2024 Vereda Antillas Colombia
Convenio 2190 de 2024 Vereda Horizonte Colombia.
Convenio 2433 de 2024 Vereda La Esperanza Colombia.
Convenio 2138 de 2024 Vereda La Unión Colombia.
Convenio 2752 de 2024 Vereda Santa Ana Colombia.
Convenio 3609 de 2024 Vereda Calle Real Aipe.

Y la suspensión de:
Convenio 2338 de 2024 Vereda Versalles Acevedo.

DIFERENTES ASPECTOS DE LOS CONVENIOS

En el mes de marzo se presentó la finalización de las obras de los siguientes convenios:

Convenio 2139 de 2024 Vereda La Troja Baraya
Convenio 2318 de 2024 Vereda Puertas del Sol Tello.
Convenio 2708 de 2024 Vereda Versalles Colombia.
Convenio 2269 de 2024 Vereda Paraíso Colombia
Convenio 2109 de 2024 Vereda Morelia Saladoblanco.
Convenio 2280 de 2024 Vereda La Cabaña Saladoblanco
Convenio 2234 de 2024 Vereda Pueblo Viejo Algeciras
Convenio 2692 de 2024 Vereda Colon Algeciras
Convenio 2130 de 2024 Vereda Naranjos Bajos Algeciras.
Convenio 2150 de 2024 Vereda El Hotel Baraya
Convenio 2060 de 2024 Vereda Agua Fría Hobo
Convenio 2105 de 2024 Vereda La Parada Baraya
Convenio 2423 de 2024 Vereda El Progreso Baraya
Convenio 2110 de 2024 Vereda La Siria Baraya
Convenio 2064 de 2024 Vereda Yarumal Nátaga

Se indica que al respecto de la información requerida para el cierre de los convenios y liquidación de los mismos que ya finalizaron la etapa de obras de mejoramiento, aún se presenta falta de entrega de información conforme con los lineamientos expuestos por la interventoría principalmente de los soportes contables. Se encuentra en revisión de la interventoría los siguientes convenios que ya finalizaron obra y han entregado soportes:

Convenio 2087 de 2024 Vereda Salto de Bordones de Isnos.
Convenio 2170 de 2024 Vereda Sinaí De Isnos.
Convenio 2054 de 2024 Vereda La Muralla Isnos.

Por otra parte, se ha realizado el cierre de las cuentas bancarias de dos convenios que todavía están en revisión financiera para su debida liquidación:

Convenio 2063 de 2024 Vereda el Mesón de Garzón.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

Convenio 2108 de 2024 Vereda Batan de Hobo.

En cuanto al desarrollo de los convenios en 2025, el invierno del departamento del Huila continúo causando atrasos e imprevistos que han dilatado la entrega de las obras principalmente en el mes de febrero y marzo.

Ante la inoperancia en de algunos convenios, en particular el convenio 2338 de 2024 de la JAC VERSALLES – ACEVEDO, se efectuó un llamado de atención mediante oficio 211-1-791 del 20 de marzo, con el fin de que se diera celeridad en la entrega de cotizaciones, realización de plan de compras manifestando la preocupación por la manera que se están gestionando el avance administrativo previo a validar y aprobar los pagos. Esto es fundamental para pasar a la etapa de inicio de las obras de mejoramiento, con lo que el plazo no va a ser suficiente y estaría en incumplimiento de las obligaciones del convenio.

Así mismo, para el convenio 2799 de 2024 de la JAC GALLEGO – LA PLATA, también se realizó una notificación por el bajo rendimiento en obra originado por falta de dirección de la misma, así como evidente desinterés por parte de la JAC en el envío de documentos para reclamar chequera lo cual ha impedido el pago oportuno de los gastos asociados al convenio, aspectos que son preocupantes para la interventoría que manifestó mediante oficio 211-1-766 del 12 de marzo la necesidad de implementar un plan de choque dando cumplimiento en el plazo del convenio.

En cuanto al desarrollo del convenio 2708 de 2024 de JAC VERSALLES – COLOMBIA, se presentaron diversos imprevistos que impidieron la finalización plena de la meta física proyectada de la obra que inicialmente indicaba la realización de siete alcantarillas de 36”, reduciendo para su entrega a seis alcantarillas. Los sobrecostos en algunas actividades más la compra anticipada de materiales como cemento, acero, materiales pétreos y tubería, produjo un desbalance financiero. Con el fin de sacar a flote el proyecto y sanear financieramente el convenio, se dio un visto bueno para la transacción entre dos juntas: la JAC Versalles vende los materiales sobrantes y la JAC HORIZONTE convenio 2190 de 2024 los compra, por un valor de $13.931.140. El aval indicado por la interventoría se realizó mediante oficio 211-1-656 del 7 de marzo de 2025. Al respecto del recibo de las obras del convenio de JAC VERSALLES – COLOMBIA, la personería ha manifestado su interés de conocer los antecedentes de la problemática dada una solicitud de la veeduría del proyecto, por lo cual se realizó una reunión en la sede de la Personería del municipio de Colombia, el día 1 de marzo, asistiendo la interventoría para exponer su posición y posibles alternativas para su solución, no sin antes exponer la situación financiera del convenio que requiere de recursos para pagar los gastos generados principalmente por los imprevistos de la obra.

Mediante oficio 211-1-795 del 20 de marzo se le presenta un informe del estado del convenio 3609 de 2024 de la JAC CALLE REAL - AIPE, que se encontraba suspendido por falta de giro de recursos del gobierno nacional. Se indica que ha recibido desembolso conforme al comprobante de pago N° 43221725 del 2025-02-21, proyecto que levantó su suspensión el 30 de marzo contando con plazo hasta el 17 de abril, plazo que, sin embargo, no será suficiente ya que en promedio y sin mayores imprevistos, la ejecución de un convenio entre su etapa de alistamiento y su etapa de ejecución de obra, requiere de al menos dos meses. En función de la obligación de la interventoría, fueron aprobados el contador y el residente de la obra.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

Así mismo, para el mes de marzo se tuvo conocimiento del giro de recursos para los convenios No. 3776-2024 de JAC Vereda La Galda – Agrado comprobante de pago No. 28724, No. 3768-2024 de JAC Vereda Praga – Aipe, comprobante de pago No. 928524. Se recuerda que la etapa de alistamiento con la presentación de los profesionales de la junta puede llevar más de 15 días. Así que, en la responsabilidad que nos asiste y dada la imposibilidad del recibo en las condiciones de exigencia de la entidad, respetuosamente se debe considerar no tener a cargo de la interventoría estos convenios. Adicionalmente, se ha requerido la información de los estudios topográficos y de suelos que disponga la territorial que hasta el momento no cuenta la interventoría y son requeridos para hacer la revisión y diseño de las obras por la JAC, aprobación por la interventoría y posterior proyección de cantidades y costos.

CONVENIOS EN VERIFICACIÓN DE PAGO DE PÓLIZAS

Se indica nuevamente que debido a la falta de actualización de la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual conforme a la prórroga No. 1 de algunos convenios, hechos informados mediante oficio 211-1-768 radicado 2025E-VUVRAZ-027071 del 13 de marzo, reiterado mediante oficio 211-0-064 radicado 2025E-VUVRAZ-030365 del 21 de marzo; los siguientes no podrán ser recibidos ni liquidados hasta tanto no sea resuelta su situación:

Convenio 3609 de 2024 Vereda Calle Real Aipe.
Convenio 2111 de 2024 Vereda Cascajosa Nátaga
Convenio 2788 de 2024 Vereda Primavera Acevedo.
Convenio 2151 de 2024 Vereda Antillas Colombia
Convenio 2190 de 2024 Vereda Horizonte Colombia.
Convenio 2433 de 2024 Vereda La Esperanza Colombia.
Convenio 2799 de 2024 Vereda Gallego La Plata.
Convenio 2752 de 2024 Vereda Santa Ana Colombia.
Convenio 2060 de 2024 Vereda Agua Fría Hobo
Convenio 2269 de 2024 Vereda Paraíso Colombia

Como requisito fundamental para la liquidación de los convenios, la interventoría requiere paz y salvos de los proveedores por todos los conceptos durante su ejecución.

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

En otros aspectos, para finales del mes de marzo el estado de trámite de documentación del plan de inversión social y documentación ambiental se encuentra de la siguiente manera:

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

NO OBJECIÓN EMITIDA POR INVIAS SS:	20
EN ESPERA DE APROB. INVIAS:	8
NO PRESENTADOS	6

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

NO OBJECIÓN EMITIDA POR INVIAS SS:	16
EN ESPERA DE APROB. INVIAS:	13
NO PRESENTADOS	5
RADICADO AMBIENTAL FINAL	3

Considera la interventoría que ha habido retraso en la entrega de información por las JAC. Sin embargo, debido a la falta de personal en la planta del Instituto, no se ha podido obtener respuesta de la documentación radicada a la Subdirección de Sostenibilidad, como lo demuestra el siguiente ejemplo: el convenio 2084 de la JAC MURALLA fue radicado el 19 de noviembre y a la fecha no ha obtenido respuesta o no objeción por la SS.

VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS

En cuanto a los recorridos o visitas a los sitios de las obras de los convenios se presenta el siguiente informe:

1 de marzo: visita a La Plata para firma de cheques JAC Cascajosa de Nátaga y firma de cheques de nómina de JAC Gallego de La Plata.

3 de marzo: Pitalito para firma de transferencias en Av Villas por Primavera de Acevedo.

5 de marzo: Colombia para atención de cita en la Personería en tema de Versalles con presencia de un grupo de profesionales de la Interventoría (residente, social y financiero e inspector), presidente y tesorera de la JAC y reclamación de chequera en Banco Agrario de la JAC de SANTANA en compañía de la Presidenta.

6 de marzo: Se realizó comité en Neiva firma de cheques Cascajosa.

8 de marzo: La Plata para firma de cheques Cascajosa.

11 de marzo: Se realizó visita a Pitalito para trámites de transferencias de JAC CABAÑA Y MORELIA de Saladoblanco en banco Av Villas.

15 de marzo: se realizó firma de cheques en La Plata para la JAC GALLEGO y se efectuó trámite en banco Agrario del municipio para reclamar chequera, situación que fue fallida debido a error en el formulario.

17 de marzo: Se efectuó trámite en banco Av Villas de Pitalito para transferencias de la JAC PRIMAVERA.

21 de marzo: se practicó visita para el recibo final de la obra social y en general del convenio de la JAC SINAI del municipio de Isnos con presencia de habitantes de la vereda, en presencia del presidente y tesorero de la JAC, alcalde del municipio de Isnos con delegación de funcionarios de la alcaldía municipal, el Director Territorial de Invias Huila Ingeniero Jesús Rincón S. y por parte de la interventoría el director, residente y profesional social. De la JAC también los profesionales contratados presentan informe de la obra el residente de obra y la contadora.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

29 de marzo: visita a La Plata para firma de cheques de Cascajosa y reclamación de chequera de Gallego.

OTROS

Asistencia a comités de seguimiento convocados por el INVIAS.

Igualmente; se hace acompañamiento a los comités operativos que se realizan conjuntamente con los miembros de las JAC, ingenieros residentes de obra y contadores; programados por cada uno de los ingenieros residentes, personal social y ambiental de la interventoría.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una de las dificultades o demoras que puede tener el proceso de recibo definitivo y liquidación de los convenios está sujeto a la entrega de información por parte de los profesionales de las OAC principalmente de la parte financiera. Esta situación además de las gestiones de traslado de rendimientos financieros, devolución de recursos no ejecutados al tesoro nacional y cierre de cuentas, presenta una necesidad de ampliación del plazo de la interventoría, que en consecuencia requiere recursos adicionales al menos hasta el mes de mayo de 2025, lo cual fue requerido mediante oficio 211-0-063 del 20 de marzo. En dicha comunicación se informa que el valor total de adición para la interventoría está calculado en $215.730.482,40 que incluyen el personal y logística de las actividades contempladas en la bolsa variable de gastos fijos mensuales de abril y mayo. Estos están asociados con arrendamiento de oficina y servicios públicos, alquiler de vehículo con conductor, papelería, viáticos de personal para visitas de campo y comunicaciones entre otros.

A pesar de ser conscientes del requisito de recursos adicionales, se presentó la solicitud de prórroga mediante oficio 211-0-065 del 26 de marzo, para extender la interventoría hasta el 30 de abril, realizando distribución de recursos con lo cual se disminuyó el número de inspectores para una dedicación de 7,22 en el mes, lo cual es una situación que no garantiza el cubrimiento de los convenios que estarán en ejecución durante el mes de abril.

Se argumentó como justificación para la prórroga de interventoría que, para el presente año, el arranque estuvo supeditado a la realización de nuevas cotizaciones conforme al reinicio de la actividad económica de la mayoría de proveedores. En ese sentido, con el cronograma de actividades de las que lograron dar inicio a la obra en el mes de enero, suponía dos meses aproximadamente para la ejecución. El invierno imperante en el departamento del Huila durante el mes de febrero y lo corrido de marzo, produjo atrasos e imprevistos que atrasaron la entrega de las obras.

Se reitera que el no pago del anticipo y de las cinco actas tramitadas, situación objeto del oficio N°211-0-061, donde aparecen los radicados de las actas y anticipo, le ha ocasionado al Consorcio Inter Eco un desequilibrio económico en el flujo financiero para el

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

pago del personal y gastos de funcionamiento asumidos de recursos propios. También se manifiesta la preocupación por el posible perjuicio ya que, ante la inminente finalización del contrato, exista un porcentaje de la bolsa de costos variables que se deje de cobrar por la no terminación en el plazo de varios convenios. La dilación en la etapa de liquidación de los convenios, puede generar un mayor costo y desequilibrio financiero para la interventoría, ya que transcurridos cinco de los seis meses, se ha podido cobrar apenas el 41% de la bolsa de costos indirectos en una ejecución acumulada total del 62% del contrato.



CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER ECO

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

Neiva, 1 de abril de 2025

INFORME ACTIVIDADES ESPECIALISTA INTERVENTORÍA

ING. DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA – ESP. EN GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

PERIODO: MARZO DE 2025

El presente informe tiene como propósito documentar las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2025 del Ing. DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA – Esp. En Geotecnia y Pavimentos de la Interventoría, en el marco del CONTRATO NÚMERO 3697 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

Mediante oficio DRAV-039-211-2025 de fecha 10 de marzo de 2025, el Ing. Dani Ricardo Acevedo Vergara – Esp. En Geotecnia y pavimentos de la Interventoría, emitió el concepto técnico tras la revisión de la versión 2 del documento DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO EN UN TRAMO DE LA VÍA VERSALLES - COPALITO / VEREDA: VERSALLES MUNICIPIO DE ACEVEDO – DEPARTAMENTO DEL HUILA, entregado el 05 de febrero de 2025, el cual menciona “que después de ser atendidas todas las observaciones emitidas por la Interventoría, se observa que el documento presentado y sus documentos anexos CUMPLEN con las consideraciones y exigencias de la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES del INVIAS, por tal motivo se emite No Objeción a su implementación”.

Mediante oficio DRAV-040-211-2025 de fecha 10 de marzo de 2025, el Ing. Dani Ricardo Acevedo Vergara –Esp. En Geotecnia y Pavimentos entrega el concepto técnico tras la revisión de la versión 3 del documento DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA GARZÓN – VEREDA EL MESÓN, TRAMO PR 0+000 AL PR 0+154, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA, el cual le realiza los comentarios y recomendaciones para subsanar en el diseño mencionado.

Mediante oficio DRAV-041-211-2025 de fecha 18 de marzo de 2025, el Ing. Dani Ricardo Acevedo Vergara –Esp. En Geotecnia y Pavimentos entrega el concepto técnico tras la revisión de la versión 3 del documento DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA GARZÓN – VEREDA EL MESÓN, TRAMO PR 0+000 AL PR 0+154, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA, el cual menciona “que después de ser atendidas todas las observaciones emitidas por la Interventoría, se observa que el documento presentado y sus documentos anexos CUMPLEN con las consideraciones y exigencias de la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES del INVIAS, por tal motivo se emite No Objeción a su implementación”.

Mediante oficio DRAV-042-211-2025 de fecha 31 de marzo de 2025, el Ing. Dani Ricardo Acevedo Vergara –Esp. En Geotecnia y Pavimentos entrega el concepto técnico tras la revisión de la versión 3 del documento DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LA

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

VÍA LA MURALLA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ISNOS, el cual menciona “que después de ser atendidas todas las observaciones emitidas por la Interventoría, se observa que el documento presentado y sus documentos anexos CUMPLEN con las consideraciones y exigencias de la CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES del INVIAS, por tal motivo se emite No Objeción a su implementación”.

Cordialmente,



Ing. DANI RICARDO ACEVEDO VERGARA
Especialista en Geotecnia y Pavimentos

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

Neiva, 5 de Abril de 2025

Informe del Ingeniero Residente de Interventoría – Zona Norte (Mes de Marzo)

Contrato N. º 3697 de 2024 – Consorcio Inter Eco

Programa: Caminos Comunitarios para la Paz Total en el Departamento del Huila

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito detallar las actividades de supervisión e interventoría realizadas en el marco del Programa **Caminos Comunitarios para la Paz Total** en el departamento del Huila, correspondientes a la zona norte, durante el mes de marzo de 2025. Se describen las visitas técnicas efectuadas en los diferentes municipios y veredas, incluyendo el seguimiento a la calidad de los trabajos, avances de ejecución y reuniones con las Juntas de Acción Comunal (JAC).

CUERPO DEL DOCUMENTO

Visitas Técnicas de Inspección de Obra

Municipio de Baraya – Vereda La Troja (Convenio No. 2139) – *4 de marzo de-2025*.

Se realizó visita previa a la entrega de la obra. Se inspeccionaron los paños de pavimento rígido fundidos, sin presencia de fisuras o defectos de calidad. Se tomaron medidas definitivas utilizando cinta y odómetro. Se dieron recomendaciones al ingeniero residente y al maestro de obra relacionadas con acabados, limpieza general de la obra, instalación de la valla, sellado de

juntas de pavimento y entrega de documentación para el cierre del convenio. Se inspeccionó también la obra social (sitio de velación en el cementerio de la vereda), constatando su adecuada ejecución.

Municipio de Colombia – Vereda Versalles – *5 de marzo de 2025*
Se atendió una citación de la Personería Municipal. En la reunión participaron el presidente y la tesorera de la JAC, la veeduría, la interventoría (director, residente, contador y trabajadora social de zona norte).
La veeduría manifestó que el proyecto quedaría inconcluso por falta de recursos. Se explicó que el convenio enfrentó sobrecostos debido al transporte hasta la vereda, al tipo de terreno (rocoso) y al incremento en horas-máquina, además de la baja colaboración de la comunidad. De las 7 alcantarillas proyectadas, solo se construyeron 6. Se aclaró que los materiales sobrantes serían vendidos al convenio de **Colombia Horizonte**, al mismo precio de adquisición. Como compromiso, se acordó realizar la entrega oficial de la obra con la comunidad el **22 de marzo**, sujeta a que se subsanaran observaciones pendientes.

Municipio de Tello – Vereda Puertas del Sol (Convenio No. 2318) – *11 de marzo-2025*

Se inspeccionaron paños de pavimento rígido fundidos, sin fisuras o fallas de tipo estructural. Se brindaron recomendaciones sobre acabados, se levantaron medidas del pavimento y filtro francés construido. Ser recomendó la limpieza general de la obra. La obra social incluyó mano de obra para la construcción de la caseta comunal, obra ejecutada a satisfacción.

Municipio de Baraya – Vereda La Troja (Convenio No. 2139) – *12 de marzo 2025*

Se verificó el cumplimiento de recomendaciones realizadas a la JAC. Se realizó la reunión en el polideportivo y se entregaron formalmente la obra social y el pavimento rígido con alcantarilla. La comunidad manifestó su agrado y satisfacción por la obra ejecutada.

Municipio de Baraya – Vereda El Hotel (Convenio No. 2150) – *17 de marzo 2025.*

Se hizo visita preliminar, se inspeccionaron paños de pavimento rígido, tubos de concreto, fundición del encole y cabezal. Se tomaron medidas y se recomendaron labores finales para la entrega de la obra (limpieza general, sellado de juntas y valla del proyecto).

Municipio de Tello – Vereda Puertas del Sol (Convenio No. 2318) – *19 de marzo-2025*

Se efectuó entrega oficial de la obra. Todas las recomendaciones fueron atendidas. La reunión tuvo lugar en la caseta comunal beneficiada por la obra social, y la comunidad expresó su conformidad con el proyecto.

Municipio de Colombia – Vereda Versalles – *21 de marzo de 2025*
Se revisaron las 6 alcantarillas construidas y se entregaron observaciones técnicas al presidente de la JAC. Se informó que la entrega oficial no podría realizarse el 22 de marzo hasta subsanar todas las observaciones realizadas por la interventoría y convocar nuevo comité.

Municipio de Colombia – Vereda Paraíso – *26 de marzo de 2025*
Se inspeccionaron paños de pavimento rígido, sin fisuras.
Se fundieron bordillos, funcionales pero con reparos en acabados.
Las dos alcantarillas presentan fisuras en los tubos, por lo que se instruyó a la JAC a realizar excavación, retiro e instalación de nuevos tubos.
Falta construcción del filtro francés. Estas observaciones deben ser atendidas para realizar el recibo de obra por parte de la interventoría.

Municipio de Hobo – Vereda Agua Fría – *27 de marzo de 2025*
Se revisó la placa huella construida, sin fisuras ni defectos.
Se tomaron medidas y se recomendó limpieza, barrido y colocación de la valla para entrega oficial. La obra social (mesón, batería sanitaria y cielo raso) no presentó observaciones.

Municipio de Baraya – Vereda La Siria (Convenio No. 2110) – *28 de marzo 2025*

Se hicieron observaciones técnicas a terminados de alcantarillas y reparación de batea existente. Se requiere su atención para proceder con el recibo final.

Municipio de Baraya – Vereda El Progreso (Convenio No. 2423 de 2024) *28-marzo-2025*

Se revisaron paños de pavimento rígido, se recomendaron actividades de limpieza para la entrega, y se recogieron viguetas para análisis de laboratorio.

Municipio de Baraya – Vereda El Hotel (Convenio No. 2150 de 2024) – *28 marzo-2025*
Se verificó cumplimiento de observaciones previas. Se realizó reunión con la comunidad, revisión de obra social y entrega formal del proyecto.
La comunidad expresó satisfacción y gratitud por la obra ejecutada.

CONCLUSIONES

- Las obras visitadas presentan en general una buena calidad constructiva, sin presencia de fisuras estructurales en la mayoría de los paños de pavimento ni fallas en elementos funcionales.
- La participación de las Juntas de Acción Comunal ha sido clave en el desarrollo de los convenios, aunque algunas presentan deficiencias en el cumplimiento de compromisos y atención de observaciones.
- Las reuniones comunitarias han permitido fortalecer la transparencia, la apropiación social de los proyectos y aclarar situaciones relacionadas con sobrecostos y gestión de recursos.
- Las obras sociales complementarias fueron ejecutadas en la mayoría de los casos sin observaciones relevantes por parte de la interventoría.

RECOMENDACIONES

- Asegurar que las JAC atiendan oportunamente todas las observaciones técnicas antes de la programación de comités de entrega o reuniones con la comunidad.
- Reforzar la socialización de los compromisos adquiridos en los convenios con las comunidades para mitigar conflictos o malentendidos.
- Documentar mediante actas todas las decisiones tomadas en reuniones con entes de control y veedurías para fortalecer el seguimiento contractual.
- Hacer seguimiento a las correcciones pendientes en obras con fisuras o detalles constructivos que afectan la funcionalidad, como en la vereda Paraíso.

REGISTRO FOTOGRAFICO

BARAYA- LATROJA









TELLO – PUERTAS DEL SOL









COLOMBIA – PARAISO







COLOMBIA – VERSALLES







COLOMBIA – VERSALLES







Neiva, 02 de Abril de 2025

INFORME ACTIVIDADES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ZONA SUR

PERIODO: MARZO DE 2025

El presente informe tiene como propósito documentar las actividades realizadas durante el mes de Marzo de 2025 del Ing. Mario Fernando Castillo Rojas Residente de Interventoría de la zona sur en el marco del CONTRATO NÚMERO 3697 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

Durante el presente periodo se realizó comité operativo con las siguientes juntas de acción comunal:

Comité operativo Vereda colon Algeciras 03/03/2025

Comité operativo Vereda Primavera Acevedo 06/03/2025

Comité operativo Vereda San José de Riecito Acevedo 06/03/2025

Comité operativo Vereda Naranjos bajos Acevedo 11/03/2025

Comité operativo Vereda Yarumal Nataga 12/03/2025

Comité operativo Vereda Morelia Salado Blanco 13/03/2025

Comité operativo Vereda La Cabaña Salado Blanco 13/03/2025

Comité operativo Vereda San José de Riecito 14/03/2025

Comité operativo cascajosa Vereda Cascajosa Nátaga 14/03/2025

Comité operativo Vereda Morelia Salado Blanco 17/03/2025

Comité operativo Vereda La Cabaña Salado Blanco 17/03/2025

Comité operativo Vereda colon Algeciras 25/03/2025

Comité operativo Vereda Primavera Acevedo 27/03/2025

Comité operativo cascajosa Vereda Cascajosa Nátaga 28/03/2025

Comité operativo Vereda Versalles Acevedo 31/03/2025

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS

En cuanto a los recorridos o visitas a los sitios de las obras de los convenios se presenta el siguiente informe:

El 17 de marzo se realiza visita a de obra a la vereda La cabaña en salado blanco, con el fin de evidenciar avance de obra en la construcción de pavimento rígido, verificar avance de obra social, a la fecha se evidencia la construcción de 80 ml de pavimento en la margen izquierda, según lo manifestado por el residente de obra se han presentado lluvias durante los primeros días del mes lo que han generado retrasos en la ejecución, se le informo la necesidad de llevar al día la bitácora, formatos técnicos y financieros, memorias de cálculo, entrega de paz y salvo de todos los proveedores.

El 17 de marzo se realiza visita a de obra a la vereda Morelia en salado blanco, con el fin de evidenciar avance de obra en la construcción de pavimento rígido, verificar avance de obra social, a la fecha se evidencia la construcción de 70 ml de pavimento en la margen Derecha, según lo manifestado por el residente de obra se han presentado lluvias que han dificultado la entrega de material generando retrasos en la ejecución, se le informo la necesidad de llevar al día la bitácora, formatos técnicos y financieros, memorias de cálculo, entrega de paz y salvo de todos los proveedores.

El 19 marzo se realizo visita a la vereda gallego en La plata Huila, evidenciando la construcción de 80 ml de placa huella, se evidencia un retraso en las actividades de acuerdo con la programación de obra, no se había realizado el filtro lateral, que, de acuerdo con lo establecido en los comités anteriores, se debió realizar durante la semana del 10 al 14 de marzo. Se le solito a la JAC realizar la excavación del filtro con maquinaria. Para que de esta manera se reinicie la construcción de la placa huella.

El 19 marzo se realizó visita a la vereda La Cascajosa de Nátaga, con el fin de verificar el avance de obra Donde se logró evidenciar un avance del 80%, faltando la construcción de cunetas y bordillos en la totalidad del tramo de placa huella construido, se le informo al residente de obra nuevamente la necesidad de hacer entrega de toda la documentación necesaria para la liquidación del convenio, acta de recibo, bitácora, memorias de cálculo, formatos financieros, entrega de paz y salvo de todos los proveedores. SE le indico al Residente la necesidad de hacer relleno en la parte posterior de los bordillos.

21 de marzo se realiza vista a la verda Sinai del municipio de Isnos con el fin de hacer

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

entrega a la comunidad la obra social y la entrega del 184 ml de placa huella de los cuales: 161 ml de placa huella construidos en su totalidad con recursos del convenio, 10 ml en donde los materiales fueron comprados con recursos del convenio y la mano de obra puesta por la comunidad. 13 ml en donde los materiales y mano de obra fueron netamente adquiridos por la comunidad.

El 26 de marzo se realiza visa de obra a la vereda naranjos Bajos del municipio de Algeciras, se realizo visita a la obra social, se realizo recorrido por toda la placa huella, se socializo con la presidenta de la JAC la fecha y hora para hacer socialización de entrega, acordando el día 04 de abril. En la vereda pueblo Viejo se evidencio la construcción de 10 ml sobre la margen izquierda con materiales comparados con recursos del convenio y mano de obra aportada por la comunidad. En la Vereda Colon se realizo visita a la obra social evidenciando avance en la construcción de las zapatas e hincado de las columnas en tubería cuadrada de 4", en la construcción del pavimento rígido se realiza recorrido verificando el sello de juntas a lo largo de los 89 ml.

El 28 de marzo se realiza socialización con la comunidad de la vereda el mesón de garzón para hacer entrega de la obra social y la construcción 189.4 ml de placa huella de los cuales 166.9 ml construidos con recursos del convenio, 22.5 ml construidos con 100 bultos de cementos aportados con recursos del convenio y materiales, mano de obra aportado por la comunidad.

Atentamente,

MARIO FERNANDO CASTILLO ROJAS
Residente De Interventoría Zona Sur
CONSORCIO INTER ECO

Registro fotográfico





Visita vereda Gallego – Garzón

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Pavimento rígido vereda Colon Algeciras.





Pavimento rígido Vereda Pueblo Viejo – Algeciras.





Socialización para entrega de obra social Vereda Sinaí - Isnos.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Placa huella Vereda LA Cascajosa – Nátaga





Placa huella vereda Gallego – La Plata





Pavimento rígido Morelia – Salado Blanco

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES ZONA NORTE

Fecha: 1 al 31 de marzo de 2025
Entidad: Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Territorial Huila.
Convenios: Zona Norte

- **Apoyo y seguimiento en la ejecución obra.**

Durante este periodo, se realiza apoyo y seguimiento en la ejecución de los siguientes convenios:

- Vereda EL HOTEL
- Vereda LA TROJA
- Vereda EL PROGRESO

- **Solicitud NO PROCESOS EN CURSO – CAM**

Durante el presente periodo se envió solicitud y reiteración de la solicitud a la CAM para obtención certificado NO PROCESOS EN CURSO de los siguientes convenios:

- 2060 de 2024
- 2105 de 2024

- **OBTENCIÓN CERTIFICADO NO PROCESOS EN CURSO CAM**

Durante el presente periodo, se obtuvo los siguientes certificados de NO PROCESOS EN CURSO por parte de la CAM

- 2110 de 2024
- 2150 de 2024

- **VISITAS A CAMPO CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGA** de los convenios 2139 de 2024, 2150 de 2024, 2110 de 2024, 2318 de 2024, 2423 de 2024 y 2105 de 2024.

- Recepción documentación ambiental final por parte del convenio 2108 de 2024, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

- Envío oficio solicitando entrega documentación ambiental final de los convenios:

- 2105 de 2024
- 2110 de 2024
- 2150 de 2024
- 2139 de 2024
- 2423 de 2024
- 2060 de 2024

- Envío informe ambiental final de los siguientes convenios:

- 2139 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-027834
- 2150 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-031026
- 2108 de 2024, radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-024372



GUILLERMO ALBERTO ROJAS SANCHEZ
CC. 1.075.216.697
PROFESIONAL AMBIENTAL ZONA NORTE
CONSORCIO INTER ECO
CEL. 3104421539


INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES ZONA SUR

Fecha: 1 al 31 de marzo de 2025
Entidad: Instituto Nacional de Vías (Invias), Territorial Huila.
Convenios: Zona Sur

- **Municipio Algeciras**:

- ✓ **<u>Convenio 2234 – 2024: Paraíso Pueblo Viejo</u>**

(03/03/2025): Se llevo a cabo comité operativo, en el cual se reporta que la JAC ya culmino la Obra de Participación Comunitaria, y que la obra civil está próxima a terminar, teniendo en cuenta que ya se encuentran en la ejecución de los últimos ml de placa huella. Por lo tanto, se solicitó hacer entrega de la documentación de cierre ambiental, la cual consiste en los formatos MAPS, las actas de paz y salvos con proveedores. (**Anexo 1**. Comité operativo 8 - Pueblo Viejo)

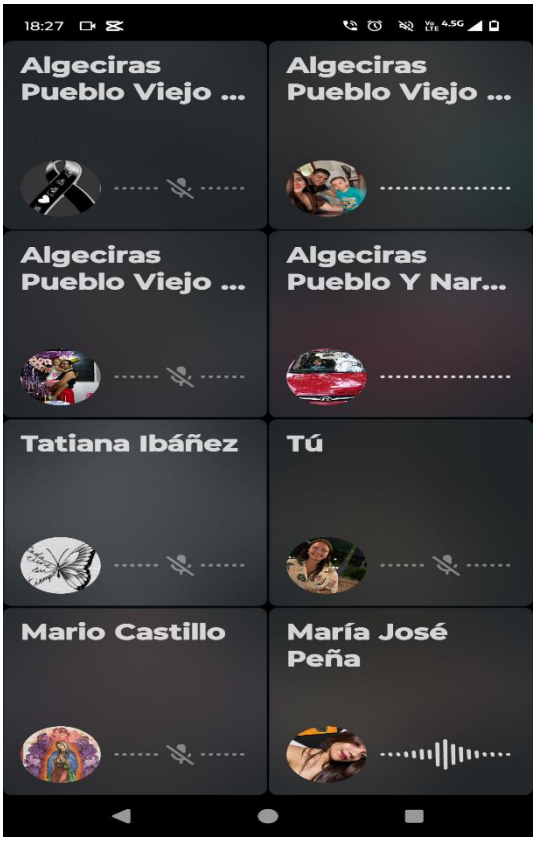

(21-03-2025): Se envío oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre. (**Anexo 2.** 211-1-801 Pueblo Viejo)

(26-03-2025): Se realizó visita de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el estado para la entrega de la misma.








(28-03-2025): la CAM hizo entrega del certificado donde ratifica que el convenio no tiene procesos sancionatorios con la Corporación. (**Anexo 3**. Respuesta RAD_8395_2025S - CAM - Pueblo Viejo)


- ✓ **<u>Convenio 2692 – 2024: Colon</u>**

(03-03-2025): Se realizó comité operativo, en el cual se verificó avance de obra, la cual esta en proceso de culminación. Por ende, se solicitó la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación del convenio, el cual corresponde a formatos MASP y actas de paz y salvo de los proveedores. (**Anexo 4.** Comité operativo 7– Colon)

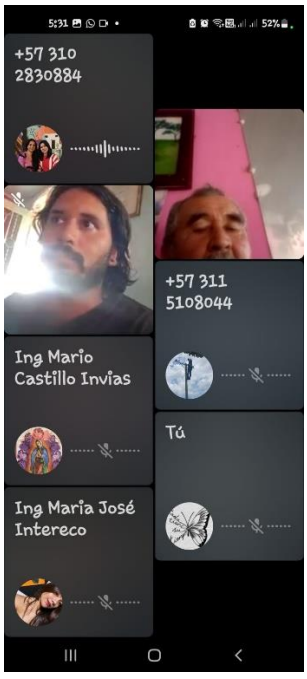

(21/03/2025): Se envío oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre. (**Anexo 5**. 211-1-802 Colon)

(25/03/2025): Se llevó a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, la JAC comunica que han ido avanzando con esta obra y que esperan la próxima semana culminarla, así mismo se indica que una vez finalizada la obra, se debe programar la socialización de cierre, en la cual se hace entrega de la obra civil y obra social. Y también se debe entregar la documentación de cierre ambiental. (**Anexo 6.** Comité operativo 8 – Colon)

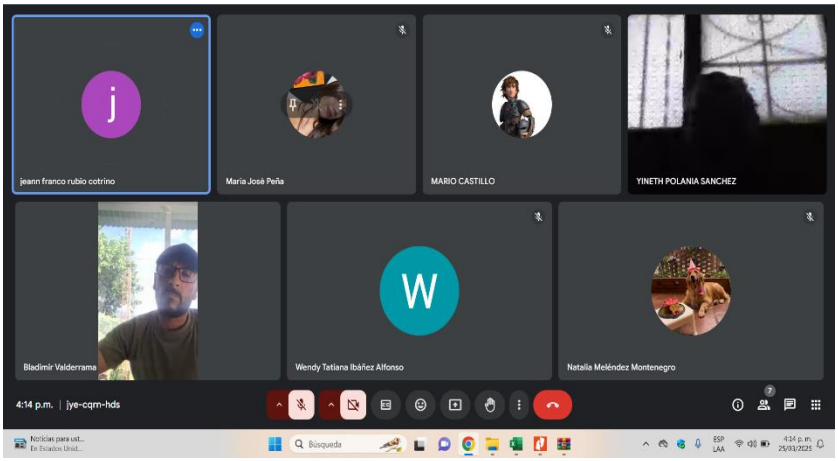

(26-03-2025): Se realizó visita de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el estado para la entrega de la misma.







- ✓ **<u>Convenio 2130 – 2024: Naranjos Bajos</u>**

(20/03/2025): Se envío oficio a la CAM solicitando información de procesos ambientales que pueda tener el convenio por malas prácticas ambientales. (**Anexo 7.** 211-1-798 Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO NARANJOS)

(21/03/2025): Se envío oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre. (**Anexo 8.** 211-1-803 Naranjos)

(26-03-2025): Se realizó visita de seguimiento a la obra, con el fin de verificar el estado para la entrega de la misma.








(26-03-2025): la CAM hizo entrega del certificado donde ratifica que el convenio no tiene procesos sancionatorios con la Corporación. (**Anexo 9**. Respuesta RAD_8094_2025S - CAM Naranjos)

- ❖ **Municipio de Isnos:**


- ✓ Convenio 2087-2024: Salto de Bordones

Se solicitó al residente de obra la entrega de la documentación ambiental de cierre, para el proceso de liquidación del convenio, teniendo en cuenta que desde hace días atrás se les solicito por escrito y a la fecha no se ha recibido respuesta.

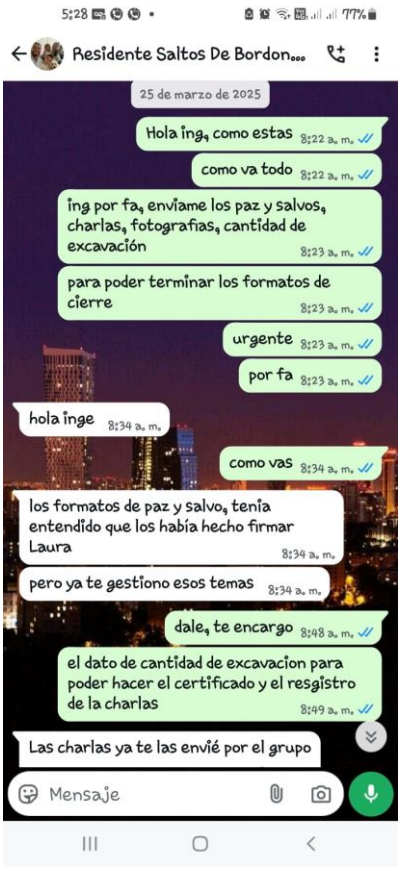

- ✓ Convenio 2170-2024: Sinaí

Se solicitó al residente de obra la entrega de la documentación ambiental de cierre, para el proceso de liquidación del convenio, teniendo en cuenta que desde hace días atrás se les solicitó por escrito y a la fecha no se había recibido respuesta.



(21-03-2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.






(25-03-2025): Se emitió concepto de No pasivos ambientales por parte de la Interventoría a la JAC. Lo anterior, como parte del proceso del cierre ambiental. Si embargo, no fue posible hacer el cierre definitivo debido a que la documentación solicitada fue entregada de manera incompleta. (**Anexo 10.** 211-1-810 Certificado No pasivos ambientales Sinaí)

- ✓ Convenio 2084-2024: La Muralla

Se solicitó al residente de obra la entrega de la documentación ambiental de cierre, para el proceso de liquidación del convenio, teniendo en cuenta que desde hace días atrás se les solicitó por escrito y a la fecha no se ha recibido respuesta.



❖ **Municipio de Acevedo:**


✓ Convenio 2788-2024: La Primavera

(6-03-2025): se llevó a cabo el comité operativo 7 del convenio, en el cual se aprueba el cambio de algunos proveedores y de pagos del plan de compras. (**Anexo 11.** Comité operativo 7 Primavera)

(26-03-2025): se llevó a cabo el comité operativo 8 del convenio, en el cual se aprueba el cambio de algunos proveedores y de pagos del plan de compras. (**Anexo 12.** Comité operativo 8 Primavera)


✓ Convenio 2639-2024: San José de Riecito

(14-03-2025): Se llevó a cabo comité operativo, en el cual se aprobó el plan de compras. Se verificó los elementos requeridos para la implementación del PGA dentro de las aprobaciones.

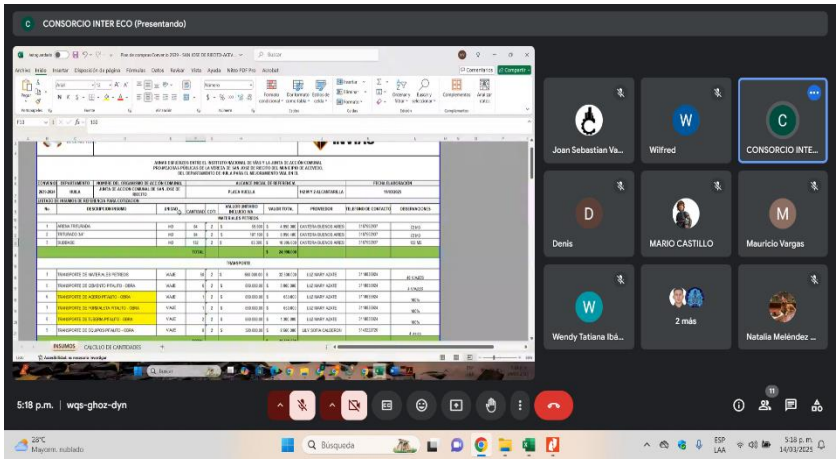

✓ Convenio 2338-2024: Versalles

(31-03-2025): Se llevo a cabo el comité operativo 3 del convenio, en el cual se hizo la aprobación de los proveedores conforme a la presentación de las cotizaciones requeridas para el plan de compras.

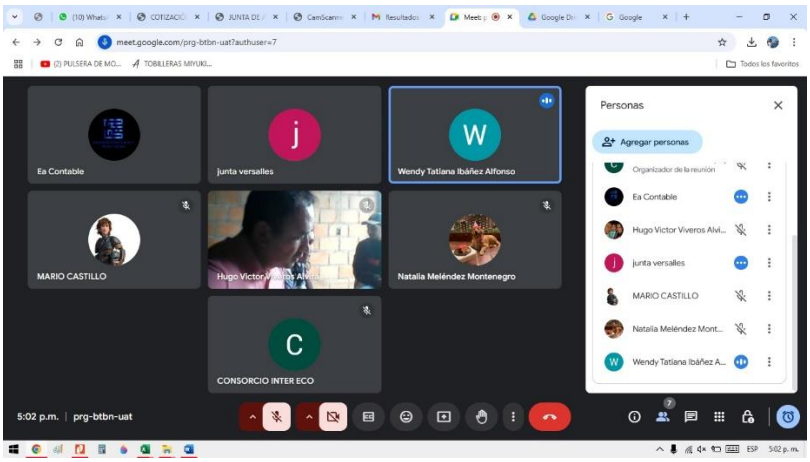

- **Municipio de Saladoblanco:**

✓ Convenio 2109-2024: Morelia

(17-03-2025): Se realiza seguimiento a la obra, se realiza recorrido y verificación en obra de la implementación del PGA, así mismo se hizo charla socio ambiental al personal de obra. Por otra parte, se hizo seguimiento a la OPC, quienes ya dieron inicio a la construcción y mejoramiento del sendero peatonal y esperan culminar este mes con la obra de participación comunitaria.











(21-03-2025): Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación. (**Anexo 13.** 211-1-804 Solicitud entrega documentación amb final Morelia)

- ✓ Convenio 2280-2024: La Cabaña

(17-03-2025): Se realiza seguimiento a la obra, se realiza recorrido y verificación en obra de la implementación del PGA, así mismo se hizo charla socio ambiental al personal de obra. Por otra parte, se hizo seguimiento a la OPC, quienes ya dieron inicio a la construcción y mejoramiento del sendero peatonal y esperan culminar este mes con la obra de participación comunitaria.



(21-03-2025): Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación. (**Anexo 14.** 211-1-805 Solicitud entrega documentación amb final La Cabaña)

- **Municipio de Garzón:**

- ✓ Convenio 2063-2024: El Mesón

(14-03-2025): Se remitió la documentación ambiental de cierre del convenio a la subdirección de sostenibilidad del INVIAS. (**Anexo 15.** 211-1-777 Entrega doc Amb Final El Meson)

(28-03-2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.


CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL
28 mar 2025 13:25:21
2.17254137N 75.56882833W
Vía Sin Nombre
Garzón 414027
Consorcio Inter Eco 3697-2024


CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL
28 mar 2025 14:57:54
2.1695515N 75.56661375W
Vía Sin Nombre
Garzón 414027
Consorcio Inter Eco 3697-2024


CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL
28 mar. 2025 12:39:59 p. m.
Vía Sin Nombre
Garzón
Huila
Consorcio Inter Eco Cto. 3697/24
2.17321149073541l6N 75.56947116740048W


CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL
28 mar. 2025 1:33:07 p. m.
Consorcio Inter Eco Cto. 3697/24
2.17253402341157?N 75.56899985688031W


CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL
28 mar. 2025 2:04:49 p. m.
Consorcio Inter Eco Cto. 3697/24
2.1694841N 75.5665698W


CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL
VEREDA EL MESÓN
Mantenimiento y mejoramiento de caminos comunitarios
28 mar. 2025 12:23:59 p. m.
Vía Sin Nombre
Garzón
Huila
Consorcio Inter Eco Cto. 3697/24
2.17288233339786?3N 75.56914234533906W

❖ **Municipio La Plata:**

✓ Convenio 2799-2024: Gallego


(21-03-2025): Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación. (**Anexo 16.** 211-1-806 Solicitud entrega documentación amb final Gallego)

Se participó en los diferentes comités celebrados en el periodo, para hacer seguimiento a la implementación de medidas del PGA.

❖ **Municipio Nátaga:**

✓ Convenio 2064-2024: Yarumal


(12-03-2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la implementación de las medidas del PGA, así mismo, de la Obra de Participación Comunitaria.

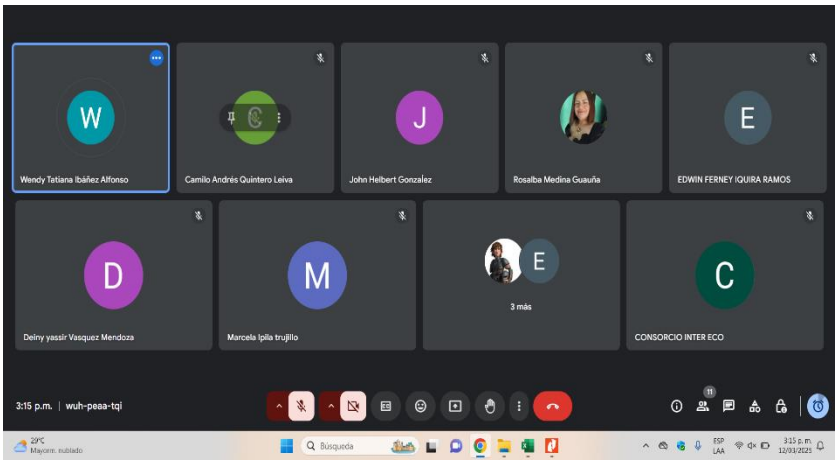

(21-03-2025): Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación. (**Anexo 17**. 211-1-807 Solicitud entrega doc amb final Yarumal)

✓ Convenio 2111-2024: Cascajosa

(14/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la implementación de las medidas del PGA, así mismo, de la Obra de Participación Comunitaria.

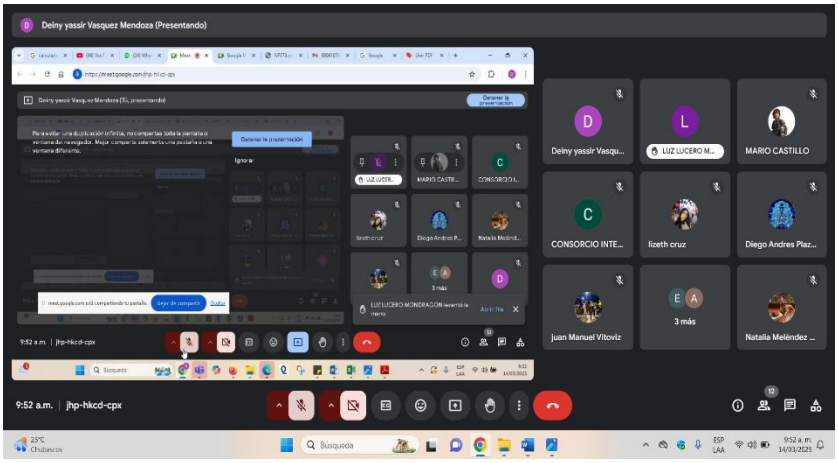

(21-03-2025): Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación. (**Anexo 18.** 211-1-808 Solicitud entrega doc amb final cascajosa)

WENDY TATIANA IBAÑEZ ALFONSO
CC.: 1.075.227.174 de Neiva
PROFESIONAL AMBIENTAL ZONA SUR
CONSORCIO INTERECO
CEL: 3162410580

Informe de Actividades Sociales Zona Norte

Fecha: 1 de febrero al 31 de Marzo
Entidad: Instituto Nacional de Vías (Invías), Territorial Huila.
Convenios: Zona Norte

- Se realizó cargue de información de convenios faltantes en el drive del INVIAS
- Se realizó oficio dirigido al supervisor de la interventoría para reporte de información radicada ante subdirección de sostenibilidad de las cuales no se ha obtenido respuesta.



- Se realizó radicación del plan de inversión social de la vereda Antillas de Colombia

INVIAS

Remite: CONSORCIO INTER ECO <c.intereco@gmail.com>

Fecha: 2025-03-17 17:36:33

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: 211 1 782 Entrega Plan Gestion Social Convenio 2151 de 2024 ANTILLAS

Adjuntos: 02


Radicado: 2025E-VUVRAZ-028821

Fecha Radicación: 2025-03-19 09:47:21

Cc:



- Se realizó oficio dirigido a subdirección de sostenibilidad para obtener respuesta de las No objeciones de los planes de inversión social radicados desde el mes de Diciembre a la fecha.

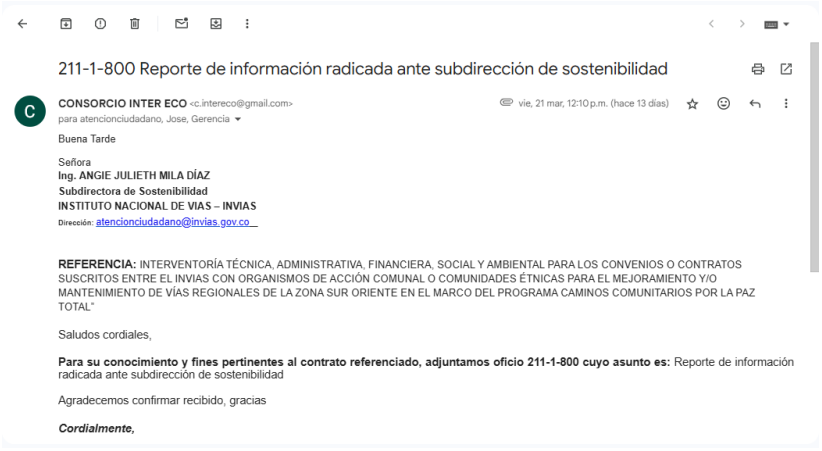

211-1-800 Reporte de información radicada ante subdirección de sostenibilidad

CONSORCIO INTER ECO <c.intereco@gmail.com> vie, 21 mar, 12:10 p.m. (hace 13 días)
para atencionciudadano, Jose, Gerencia

Buena Tarde

Señora
Ing. ANGIE JULIETH MILA DÍAZ
Subdirectora de Sostenibilidad
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Dirección: atencionciudadano@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL"

Saludos cordiales,

Para su conocimiento y fines pertinentes al contrato referenciado, adjuntamos oficio 211-1-800 cuyo asunto es: Reporte de información radicada ante subdirección de sostenibilidad

Agradecemos confirmar recibido, gracias

Cordialmente,

- Se realizó visita social conjunto con la parte técnica para hacer seguimiento en la ejecución de las obras en la vereda la siria.



- Se realizó visita social conjunto con la parte técnica para hacer seguimiento en la ejecución de las obras en la vereda el progreso.



- Se realizó reunión de cierre con la comunidad de la vereda Troja de Baraya, para realizar entrega de las obras social y técnicas contempladas en el convenio.



- Se realizó reunión de cierre con la comunidad de la vereda Puertas del Sol de Tello, para realizar entrega de las obras social y técnicas contempladas en el convenio.



- Se realizó reunión de cierre con la comunidad de la vereda Hotel de Baraya, para realizar entrega de las obras social y técnicas contempladas en el convenio.



- Se realizó realizo apoyo en la recolección de la documentación de los presidentes para el proceso de prorrogas que adelanto la parte administrativa.

Paula Ximena Ramirez Monje

PAULA XIMENA RAMIREZ MONJE
Profesional Social
T.P. 212367


Informe de Actividades Sociales Zona Sur:

Fecha: 1 al 31 de marzo de 2025
Entidad: Instituto Nacional de Vías (Invias), Territorial Huila.
Convenios: Zona Sur

- **Asistencia a Comités Operativos de Seguimiento.**

Durante este periodo, se asistió a los comités operativos desarrollados para los siguientes convenios:


- ✓ 2692 – 2024 Colón – Algeciras (03/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, el presidente de la JAC manifiesta que ya iniciaron con las actividades preliminares que se requieren para poder realizar la construcción y la instalación de la cubierta.

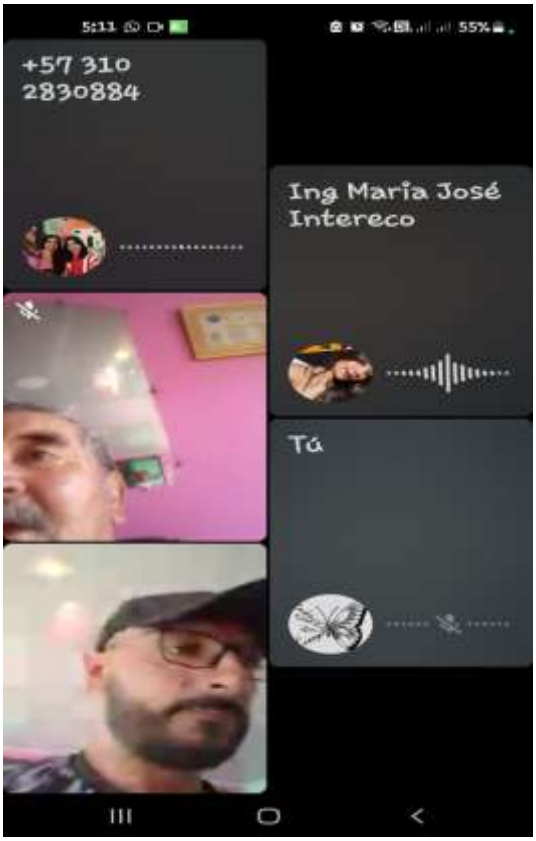

- ✓ 2234 – 2024 Pueblo Viejo – Algeciras (03/03/2025): Se llevo a cabo comité operativo, en el cual se reporta que la JAC ya culmino la Obra de Participación Comunitaria, que una vez se termine la obra civil, se debe realizar la reunión de cierre en la cual se hará entrega a la comunidad de ambas obras y así mismo dar un informe de la ejecución del convenio.




- ✓ 2111- 2024 La Cascajosa – Nátaga (04/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, preguntando a la JAC que gestiones han adelantado en cuanto a la compra de los materiales, ya que el Plan de Inversión Social fue aprobado, JAC refiere que este fin de semana del 08 de marzo del 2025 se espera que lleguen los materiales a la vereda.

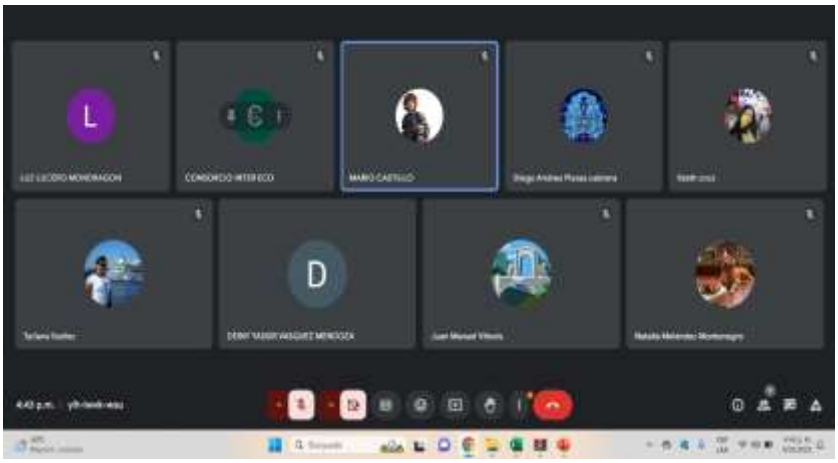


- ✓ 06/03/2025: 2639 – 2024 San José de Riecito – Acevedo: Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a las correcciones del Plan de Inversión Social, en cuanto a las cotizaciones que se deben cambiar, para poder llevar a cabo la aprobación de este plan y así puedan iniciar con la Obra de Participación Comunitaria.




- ✓ 2064 – 2024 Yarumal – Nátaga (12/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, ya que hasta el momento no se ha recibido registro fotográfico de los avances. La JAC refiere que aún no han podido iniciar con el cambio de cubierta, ya que deben construir unas columnas, ya solicitaron el material están a la espera que llegue en el transcurso de la semana. Se realiza la solicitud que se inicie lo más pronto posible con la OPC, ya que el contrato está llegando a la etapa final y se espera que ambas obras estén culminadas para así poder realizar el respectivo cierre.

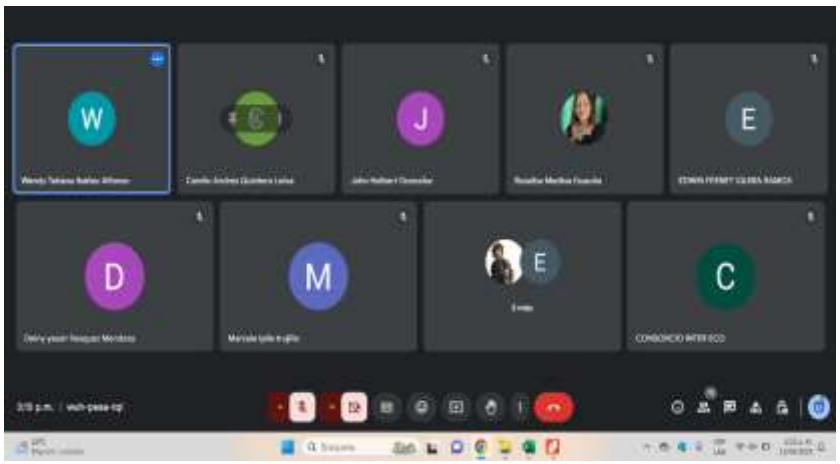

- ✓ 2111- 2024 La Cascajosa – Nátaga (14/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, indagando a la JAC, si los materiales para la OPC, ya llegaron; quienes refieren que aún no, sin embargo, ya han estado realizando las gestiones pertinentes con el proveedor para la entrega de los materiales y se espera que el fin de semana ya cuenten con estos. Se realiza la solicitud que se inicie lo más pronto posible con la OPC, ya que el contrato está llegando a la etapa final y se espera que ambas obras estén culminadas para así poder realizar el respectivo cierre.

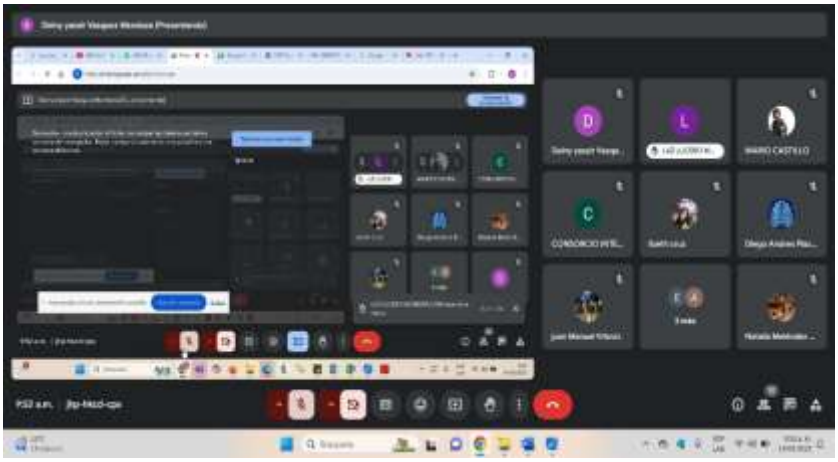


- ✓ 14/03/2025: 2639 – 2024 San José de Riecito – Acevedo: Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a las correcciones del Plan de Inversión Social, ya que a la fecha no han enviado las nuevas cotizaciones, y no se ha podido seguir con el trámite para radicar la documentación a la Subdirección de Sostenibilidad y así poder realizar la respectiva aprobación.

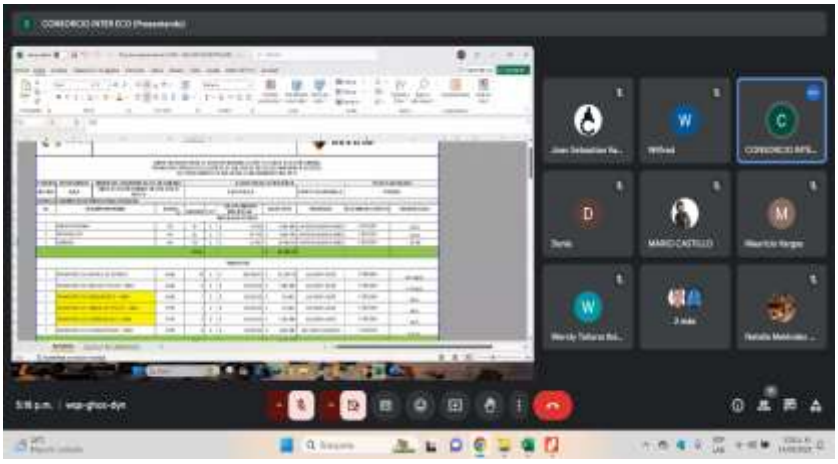


- ✓ 2130 – 2024 Los Naranjos Bajos – Algeciras (20/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la OPC, el ingeniero residente comunica que ya se ejecutó en su totalidad la obra social.




- ✓ 2111- 2024 La Cascajosa – Nátaga (20/03/2025): Se lleva a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, indagando a la JAC sobre el inicio de la OPC, manifiestan que los materiales ya se encuentran en la vereda y están organizando con la comunidad la logística para iniciar con la ejecución de dicha obra. Se reitera nuevamente que se inicie lo más pronto posible con la OPC, ya que el contrato está llegando a la etapa final y se espera que ambas obras estén culminadas para así poder realizar el respectivo cierre.

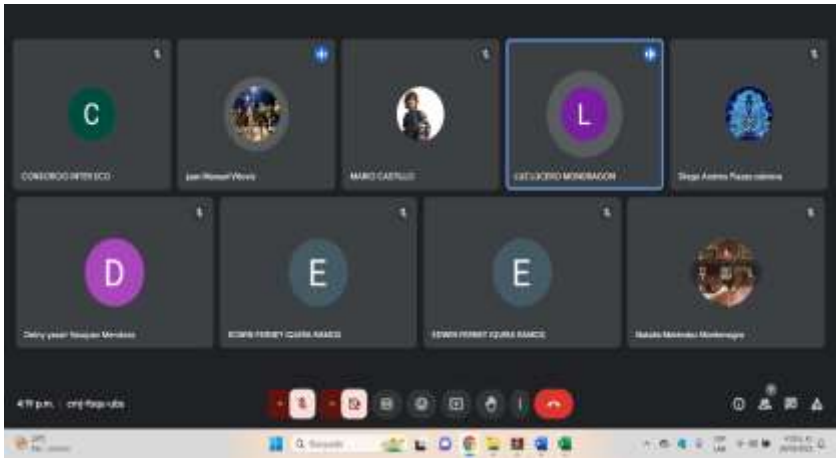

- ✓ 2692 – 2024 Colon – Algeciras (25/03/2025): Se llevó a cabo comité operativo, en el cual se realiza seguimiento a la Obra de Participación Comunitaria, la JAC comunica que han ido avanzando con esta obra y que esperan la próxima semana culminarla, así mismo se indica que una vez finalizada la obra, se debe programar la socialización de cierre, en la cual se hace entrega de la obra civil y obra social.

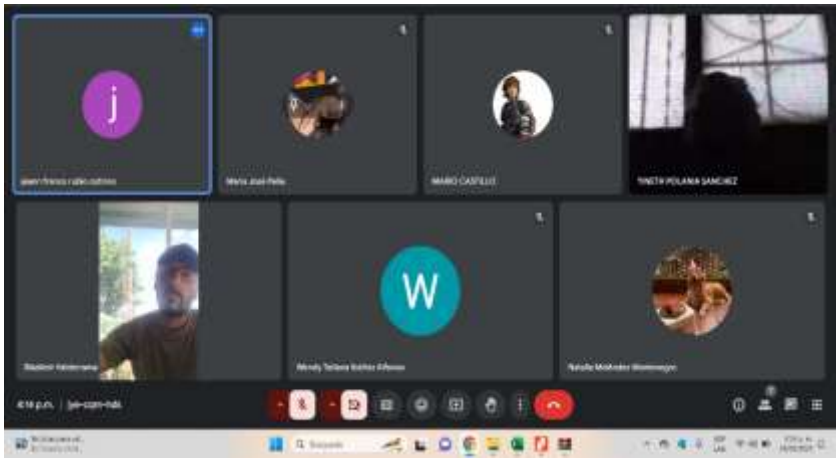

- ✓ 2338 – 2024 Versalles – Acevedo (31/03/2025): Se llevó a cabo comité operativo de aprobación de cotizaciones; también se realiza seguimiento al Plan de Inversión Social, en el cual la JAC, ya tiene definido la Obra de Participación Comunitaria que van a realizar y realizarán el envió de la documentación en el transcurso de la semana.

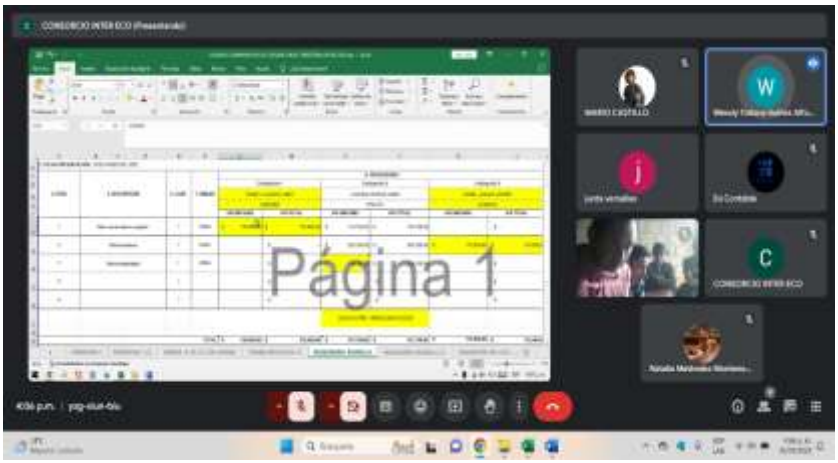

- **Recepción y evaluación de Plan de Inversión Social:**

Durante el presente periodo se realiza la respectiva recepción y evaluación de la documentación del Plan de Inversión Social:

- 2639 - 2024: San José de Riecito – Acevedo: Este plan de inversión social aún se encuentra en ajustes por parte de la JAC y el residente de obra.

- **Remisión documentación social final enviada a la SS del INVIAS:**

Una vez diligenciada la documentación final se realizaron los respectivos oficios de radicación para la entrega de la documentación social final a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS:

- Oficio 211-1-781 Entrega Documentación de Cierre PGS 2084 de 2024 La Muralla – Isnos, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-028470.
- Oficio 211-1-796 Entrega Documentación de Cierre PGS 2087 de 2024 Salto de Bordones – Isnos, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-030181.

- **Otras actividades:**

Durante el presente periodo realicé las siguientes actividades:

- 2109 – 2024 Morelia – Saladoblanco (17/03/2025): Se realiza seguimiento a la OPC, quienes ya dieron inicio a la construcción y mejoramiento del sendero peatonal y esperan culminar este mes con la obra de participación comunitaria.



- 2280 – 2024 La Cabaña – Saladoblanco (17/03/2025): Se realiza seguimiento a la OPC, quienes ya dieron inicio a la construcción de la cocina comunitaria de la vereda La Cabaña y esperan culminar este mes con la obra de participación comunitaria.



- 2170 – 2024 Sinaí – Isnos (21/03/2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.





- 2063 – 2024 El Mesón – Garzón (28/03/2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.





Natalia Andrea Meléndez Montenegro
Residente Social

INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ECO

CONTRATO No. 3697 DE 2024

INFORME NÚMERO 5 MARZO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

Versión 1

Neiva, (31 de marzo del 2025)

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	FOLIOS
1	31 de marzo de 2025	Elaboración del informe número 5 de SST	37

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado	Revisado	Aprobado
		
Diana Marcela Ramírez	Ing. Julián David Ortiz	Ing. Carlos Fallas
Inspector de SST de interventoría	Residente de interventoría	Director Interventoría

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL PARAISO CONVENIO NÚMERO 2269 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda EL PARAISO, convenio número 2269 realizó las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato MEPI MN1-IN-15-FR-4
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
CRISTIAN PERALTA CANGREJO	OBRERO	05/12/2024
DIEGO ARMANDO TIQUE GARZÓN	OBRERO	05/12/2024
HUGO FERNANDO CASTRO RINCON	OBRERO	05/12/2024
JUAN GABRIEL PERDOMO CASTAÑEDA	OBRERO	05/12/2024
YONATAN MEDINA CARDENAS	OBRERO	05/12/2024
WILFREDO ARIAS CIFUENTES	OFICIAL	05/12/2024
JUAN CARLOS SILVA	RESIDENTE	05/12/2024
SANDRA PATRICIA SILVA	CONTADORA	05/12/2024
ERINSON SANCHEZ MORA	MAESTRO	05/12/2024

Tabla 4. PERSONAL NUEVO JAC – PARAISO

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VERSALLES CONVENIO NÚMERO 2708 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda VERSALLES, convenio número 2708 realizó las siguientes actividades:

- Planilla de seguridad social
- Listado de maquinaria y equipos de obra se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
ERNESTO CASTRO QUIZA	MAESTRO	16/12/2024
LUIS ERNESTO CASTRO AUDOR	AYUDANTE	16/12/2024
LUIS FERNANDO CRUZ VARGAS	AYUDANTE	16/12/2024
JUAN CASTRO QUIZA	AYUDANTE	16/12/2024
FERNANDO ARIAS CASTELLANO	AYUDANTE	16/12/2024
MARCO FIDEL VIDAL	AYUDANTE DE OBRA	16/12/2024
JHON FREDY CASTELLANOS GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	16/12/2024
JHAN CARLOS RODRIGUEZ MILLAN	AYUDANTE DE OBRA	16/12/2024
FREDY YOBANY TRUJILLO DIAZ	OFICAL	16/12/2024
JUAN DIEGO HERRERA	RESIDENTE	16/12/2024
JHON MARCE CAMERO	CONTADOR	16/12/2024

Tabla 5. PERSONAL NUEVO JAC – VERSALLES

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTA DEL SOL CONVENIO NÚMERO 2318-2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizó las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
- Desistimiento de exámenes de egreso – paz y salvos.

Ver anexo: (carpeta 3. Puertas del sol)

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
ORLANDO OLIVEROS OTALORA	MAESTRO	13/01/2025
ARNOL DAVID OCAMPO	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
BRAYAN ALEXCIS CRUZ SUNCE	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
DUBERNEY CRUZ SUNCE	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
JOSE YAMEL MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
DAVID ARNOL TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
CRISTIAN CABRERA	RESIDENTE OBRA	13/01/2025
YORYANI GARZON	CONTADOR	13/01/2025

Tabla 6. personal nuevo JAC - puertas del sol

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SIRIA CONVENIO NÚMERO 2150 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

- Desistimiento de exámenes de egreso – paz y salvos

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
CARLOS ALFREDO TRIANA	AYUDANTE DEOBRA	08/01/2025
ELISEOQUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	08/01/2025
JOSE VICENTE TOVAR	AYUDANTE DE OBRA	08/01/2025
JUAN JOSE MARTINEZ	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
WILMER IBAN AVILES	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
BRAYAN STEVEN SECUE	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
NICOLAS CUMBE ARAGONEZ	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
WULIAN SECUE YUCUMA	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
JUAN ESTEBAN MANRIQUE	RESIDENTE	08/01/2025
LUIS FERNADO CASTRO	CONTADOR	08/01/2025

Tabla 7. Personal nuevo JAC – siria

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PROGRESO CONVENIO NÚMERO 2423 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

- Desistimiento de exámenes de egreso – paz y salvos.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
JULIO PASCUAS RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2025
CARLOS HUMBERTO DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2025
EDINSON FARIT LOSADA	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2025
FARIT LOSADA DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2025
FERNEY MANRIQUE CALDERON	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2025
YEKINSON MARTINEZ CHARRY	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2025
JUAN RUIZ MANRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2025
JOHN AMAYA GAVIRIA	AYUDANTE DE OBRA	10/01/2025
JUAN ESTEBAN MANRIQUE	RESIDENTE	10/01/2025
LUIS FERNANDO CASTRO	CONTADOR	10/01/2025

Tabla 8. personal nuevo JAC - PROGRESO

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PARADA CONVENIO NÚMERO 2105 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

- Desistimiento de exámenes de egreso y paz y salvo.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
YEISON PASCUAS QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2025
LEONARDO JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2025
OBDULIO GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2025
EVELIO LLANOS TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2025
FERNANDO AGUILAR	AYUDANTE DE OBRA	22/01/2025
JHON ANZOLA	MAESTRO	22/01/2025
JUAN DAVID MENDEZ	RESIDENTE	22/01/2025
YORYANI GARZON	CONTADOR	22/01/2025

Tabla 9. personal nuevo JAC - PARADA BARAYA

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUEBLO VIEJO CONVENIO NÚMERO 2234 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
- Desistimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
LUIS ALEJANDRO QUINTERO	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
MAICK ANDERSON TAMAYO	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
NARCISO RIVERA PERDOMO	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
EDILBERTO HOYOS GARCIA	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
ROBINSON DAMIAN MARIN	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
ANDRES FELIPE QUINTERO	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
DIEGO FERNANDO MARIN	AYUDANTE OBRA	08/01/2025
LUIS FERNANDO CALDERON	RESIDENTE	08/01/2025
DANIEL BERNAL	MAESTRO	08/01/2025
RAMIRO PASTRANA	CONTADOR	08/01/2025

Tabla 10. personal nuevo JAC - PUEBLO VIEJO.

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL COLON CONVENIO NÚMERO 2692 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
- Desistimiento de examen de egreso y paz y salvo.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL

YOHAM CAMILO FIERRO	AYUDANTE DE OBRA	26/01/2025
EINER SANCHES BOLIVAR	AYUDANTE DE OBRA	26/01/2025
FERNANDO OSORIO	AYUDANTE DE OBRA	26/01/2025
FRANKLIN ESTRADA MEDINA	AYUDANTE DE OBRA	26/01/2025
JOSE FABIAN SARMIENTO	AYUDANTE DE OBRA	26/01/2025
YESID VARGAS FRANCO	AYUDANTE DE OBRA	26/01/2025
JEAN FRANCO COTRINO	RESIDENTE OBRA	26/01/2025
RAMIRO PASTRANA	CONTADOR	26/01/2025

Tabla 11. personal nuevo JAC - COLON

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GALLEGO LA PLATA CONVENIO NÚMERO 2799 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
CARLOS MARIO GARCIA	AYUDANTE OBRA	24/12/24
CRISTIAN ANDRES ARIAS	AYUDANTE OBRA	24/12/2024
JAIDER AUDIVER PERDOMO	AYUDANTE OBRA	24/12/2024
JOSE DAVID VALENCIA	AYUDANTE OBRA	24/12/2024
JOSE YESID ARIAS	AYUDANTE DE OBRA	24/12/2024
NORBERTO LOPEZ RIASCOS	AYUDANTE DE OBRA	24/12/2024

ULTENGO ROJAS TOBIAS	AYUDANTE DE OBRA	24/12/2024
JESUS ARQUIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	24/12/2024
MONICA PATRICIA MONJE	CONTADORA	24/01/2024
NAYIBE RAMOS	RESIDENTE	24/12/2024

Tabla 12. Personal nuevo JAC- GALLEGO.

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CASCAJOSA CONVENIO NÚMERO 2111 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
- Desistimiento de examen de egreso y paz y salvos.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
JESUS ANTONIO GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	24/01/2025
ANDRES PERDOMO PEREZ	AYUDANTE DE OBRA	24/01/2025
ARNED GARCIA GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	24/01/2025
EDWIN ALFONSO ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2025
JOHN EDUAR CUCHUMBE	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2025
MAURO FERNANDO CHIMBACO	AYUDANTE DE OBRA	24/01/2025
HERNANDO GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	24/01/2025
JUAN MANUEL VITOVIS	RESIDENTE	24/01/2025

DEINY VASQUEZ	CONTADOR	24/01/2025
ANAYA MERA JOSE GUIOMAR	MAESTRO	24/01/2025

Tabla 13. Personal nuevo JAC – CASCAJOSA.

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL YARUMAL CONVENIO NÚMERO 2111 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
- Desistimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
MARINO GUALY	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2025
JUAN LEANDRO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2025
YOFREDY PEREZ YUCUMA	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2025
WILLIAN FABIAN QUEBRADA	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2025
BREINER ANDRES GORDO	AYUDANTE DE OBRA	10/02/2025
GILDARDO MOSQUERA	MAESTRO OBRA	10/02/2025
CAMILO ANDRES QUINTERO	RESIDENTE	10/02/2025
DEINY VASQUEZ	CONTADORA	10/02/2025

Tabla 14. personal nuevo - JAC YARUMAL

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL AGUA FRIA CONVENIO NÚMERO 2060 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
DUVAN ANDRES USMA	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2025
MAICOL ESTIBEN BOHORQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2025
FELIPE TRIVIÑO RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2025
JUAN JOSE POLANIA	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2025
JOSE ELVER RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2025
ANTONIO ANGEL RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	12/02/2025
WILFREN RAMIREZ	MAESTRO	12/02/2025
JULIAN CAMILO MELENDEZ	RESIDENTE	12/02/2025
STERLY CHAVEZ	CONTADOR	12/02/2025

Tabla 15. Personal nuevo -JAC - AGUA FRIA

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL NARANJOS BAJOS CONVENIO NÚMERO 2130 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

- Desistimiento de examen de egreso y paz y salvo.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
DIEGO ZAMORA VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	12/12/2024
HAMILTON GARCIA GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	12/12/2024
NOEL TRUJILLO PERDOMO	AYUDANTE OBRA	12/12/2024
NEIDER ARLEY PARRA	AYUDANTE DE OBRA	12/12/2024
ELKIN STIVEN TRUJILLO	AYUDANTE DE OBTRA	12/12/2024
KEDWIN JANEY CORONADO	AYUDANTE DE OBRA	12/12/2024
RAFAEL CERQUERA	RESIDENTE	12/12/2024
RAMIRO PASTRANA	CONTADOR	12/12/2024
OMAR SOLANO PIMENTEL	MAESTRO	12/12/2024

Tabla 16. Personal nuevo JAC - NARANJOS BAJOS

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PRIMAVERA CONVENIO NÚMERO 2788 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
YILMER MARTINEZ USECHE	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
CAMILO ANDRES MORALES	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
BLADIMIR MONTEALGRE GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
CRISTIAN MARTINEZ USECHE	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
WILSON JAVIER USECHE	MAESTRO	17/03/2025
JAVIER HUMBERTO GIRALDO	RESIDENTE	17/03/2025
MAURICIO VARGAS	CONTADOR	17/03/2025

Tabla 17. Personal nuevo JAC – la primavera

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MORELIA CONVENIO NÚMERO 2109 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra

- Soporte de entrega de dotación y EPP.

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
DANIEL ESTIVEN MAGON	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
ESTIBENSON VARGAS ANACONA	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
ERMILSON MURCIA ZUÑIGA	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
JUAN CARLOS CESPEDES	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
DIEGO ARNULFO CESPEDES	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
JHON JAIRO RUIZ	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
ROBINSON ANDRADE POLANIA	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
RAFAEL GUACA	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
JOSE ERMINSON ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
CARLOS WILMER PLAZAS	RESIDENTE	04/03/2025
OBSENOVER MONTES VARGAS	MAESTRO	04/03/2025
DIANA SEPULPEDA	CONTADORA	04/03/2025

Tabla 18. Personal nuevo JAC - Morelia

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CABAÑA CONVENIO NÚMERO 2280 -2024.

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
ANDRES FERNANDO BOLAÑOS	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
DIEGO ARMANDO SANCHES	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
FREDY LEANDRO HERMIDA	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
HUBER ISMAEL ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
JESUS MARIA SEPULPEDA	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
JOHAN SEBASTIAN CHAPARRO	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
JOSE FREDY MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
LUIS ALEXANDER MORALES	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
NORBEY ANTONIO ORTIZ	AYUDANTE DE OBRA	04/03/2025
CARLOS WILMER PLAZAS	RESIDENTE	04/03/2025
DIANA SEPULPEDA	CONTADORA	04/03/2025
NOE CLAROS	MAESTRO	04/03/2025

Tabla 19. Personal nuevo JAC – la cabaña.

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HORIZONTE CONVENIO NÚMERO 2190 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra

- Soporte de entrega de dotación y EPP.

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
JANIER ALBERTO CANTILLO	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
LUIS ALFREDO SANCHES	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
ROBY SERRATO SERRATO	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
JOSE DANIEL RAMIREZ	MAESTRO	17/03/2025
JORGE CONTA ESCOBAR	RESIDENTE	17/03/2025
MONICA SOFIA CASTAÑEDA	CONTADORA	17/03/2025

Tabla 20. Personal nuevo JAC – Horizonte.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE SST DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ECO.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENTORÍA

	
Descripción de la foto	**Descripción de la foto**
Reuniones con todo el personal de obra.	Pausas activas.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – PARAISO Y JAC - VERSALLES.

	
Descripción de la foto: trabajos sobre la placa huella.	**Descripción de la foto:** Versalles alcantarillado.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – PUERTAS DEL SOL Y JAC- SIRIA.

	
Descripción de la foto: concreto placa huella. señalización	**Descripción de la foto:** siria terminación de placa huella.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – PROGRESO Y JAC - PARADA.



Descripción de la foto: terminación de cunetas**.**



Descripción de la foto: Parada placa huella.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – PUEBLO VIEJO Y JAC – COLON.



Descripción de la foto: señalización de obra pueblo viejo.



Descripción de la foto: señalización de obra, colon.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – NARANJOS BAJOS Y JAC – PRIMAVERA.



Descripción de la foto: placa huella naranjos bajos.



Descripción de la foto: la primavera personal con dotación y EPP.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – GALLEGO Y JAC – CASCAJOSA.



Descripción de la foto: Trabajadores con su dotación obra -gallego



Descripción de la foto: cascajosa trabajadores en obra con dotación y EPP.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL YARUMAL Y JAC – AGUA FRIA.

	
Descripción de la foto: yarumal - trabajadores con dotación Y EPP.	**Descripción de la foto:** trabajadores con dotación y EPP.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MORELIA Y JAC - CABAÑA.

	
Descripción de la foto: charla inducción y notificación del riesgo y peligros en obra.	**Descripción de la foto:** trabajadores con dotación y EPP_ Morelia.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HORIZONTE.

	
Descripción de la foto: maquinaria en la obra para intervención.	**Descripción de la foto:** vía a intervenir.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo el CONSORCIO INTER ECO, da cumplimiento de las normas de seguridad en pro de prevenir los accidentes laborales y crear una cultura de prevención y autocuidado en los trabajadores, de igual manera se realiza acompañamiento control y seguimiento a las juntas de los convenios para dar mejora en los procesos de seguridad identificación de peligros y riesgos que atenten a los trabajadores y la comunidad, y poder solventar cualquier hallazgos y dar un avance significativo en la construcción de las frentes de obra.

Así mismo, reiteramos nuestro compromiso con el seguimiento diario al cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente, para que se mantengan los índices y se dé cumplimiento al 100% durante la ejecución de las obras.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1115184235
NOMBRE EMPLEADO	JULIAN DAVID ORTIZ HENAO
EPS	EPS SURA
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	5.100.000	0,1600000	$ 816.000	$ 0	$ 0	$ 816.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	5.100.000	0,0400000	$ 204.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	5.100.000	0,0696000	$ 355.000	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	5.100.000	0,0400000	$ 204.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 816.000	$ 204.000	$ 355.000	$ 204.000	$ 1.579.000

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1080264332
NOMBRE EMPLEADO	KELLY JOHANA HENAO GARCIA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1003815656
NOMBRE EMPLEADO	LAURA VALENTINA PERDOMO FIERRO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075313576
NOMBRE EMPLEADO	MAGALY YULIETH LASSO CERON
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-36308886
NOMBRE EMPLEADO	MARIA CAROLINA SALAZAR PARRA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.000.000	0,1600000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.000.000	0,0400000	$ 120.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.000.000	0,0696000	$ 208.800	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.000.000	0,0400000	$ 120.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 480.000	$ 120.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 928.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1084869769
NOMBRE EMPLEADO	MARIA JOSE PEÑA BUYUCUE
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-7714733
NOMBRE EMPLEADO	MARIO FERNANDO CASTILLO ROJAS
EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	5.100.000	0,1600000	$ 816.000	$ 0	$ 0	$ 816.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	5.100.000	0,0400000	$ 204.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	5.100.000	0,0696000	$ 355.000	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	5.100.000	0,0400000	$ 204.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 816.000	$ 204.000	$ 355.000	$ 204.000	$ 1.579.000

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1018460313
NOMBRE EMPLEADO	NATALIA ANDREA MELENDEZ MONTENEGRO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0696000	$ 264.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 264.500	$ 152.000	$ 1.176.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1081415710
NOMBRE EMPLEADO	PAULA XIMENA RAMIREZ MONJE
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0696000	$ 264.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 264.500	$ 152.000	$ 1.176.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075227174
NOMBRE EMPLEADO	WENDY TATIANA IBAÑEZ ALFONSO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0696000	$ 264.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 264.500	$ 152.000	$ 1.176.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1003808423
NOMBRE EMPLEADO	ANDRES FELIPE BENAVIDEZ POLANIA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 7.500	$ 57.000	$ 349.300

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-76317796
NOMBRE EMPLEADO	CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.900.000	0,1600000	$ 1.104.000	$ 0	$ 0	$ 1.104.000	$ 34.500	$ 34.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.900.000	0,0400000	$ 276.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.900.000	0,0696000	$ 480.300	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	6.900.000	0,0400000	$ 276.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 1.173.000	$ 276.000	$ 480.300	$ 276.000	$ 2.205.300

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1084577334
NOMBRE EMPLEADO	CRISTHIAN CAMILO CHALA RIVERA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0052200	$ 19.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 19.900	$ 152.000	$ 931.900

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1083870948
NOMBRE EMPLEADO	DANER FERNEY MALES GOLONDRINO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1006955712
NOMBRE EMPLEADO	DARWIN ANDRES MORALES PATIÑO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075260559
NOMBRE EMPLEADO	DIANA MARCELA RAMIREZ DIAZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.300.000	0,1600000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.300.000	0,0400000	$ 92.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.300.000	0,0696000	$ 160.100	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.300.000	0,0400000	$ 92.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 368.000	$ 92.000	$ 160.100	$ 92.000	$ 712.100

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1080290198
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ANDRES PLAZAS CABRERA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0052200	$ 19.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 19.900	$ 152.000	$ 931.900

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1004473633
NOMBRE EMPLEADO	EDWIN FERNEY IQUIRA RAMOS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1083838836
NOMBRE EMPLEADO	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ MONJE
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-03-31

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	31/03/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.305.556	0,0400000	$ 92.300	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 92.300	$ 631.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-7697064
NOMBRE EMPLEADO	FREDY MEDINA RAMIREZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 440.900

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075216697
NOMBRE EMPLEADO	GUILLERMO ALBERTO ROJAS SANCHEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0696000	$ 264.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 264.500	$ 152.000	$ 1.176.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-83220857
NOMBRE EMPLEADO	HAMINCE ORTIZ ROCHA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 440.900

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1082217044
NOMBRE EMPLEADO	JHON ALEX TAMAYO MONTEALEGRE
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075601000
NOMBRE EMPLEADO	JONATHAN GAITAN GOMEZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-03-31

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	31/03/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.305.556	0,0400000	$ 92.300	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 92.300	$ 631.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-04-03
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1078246979
NOMBRE EMPLEADO	JOSE MANUEL GASCA CUELLAR
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	32997370
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-03
PERÍODO SALUD	2025-04
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200
