	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	07/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	09/06/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	15/05/2025	**AL:**	31/05/2025

CONTRATO Nº	**020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025**	**CONTRATISTA**	**CONSORCIO RIO YIVAL**
OBJETO	**LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.**		
FECHA DE INICIO	**15/05/2025**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**15/10/2025**

VALOR INICIAL	**$ 1.353.020.053,90**	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	**$ 1.353.020.053,90**

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 30 DE MAYO DE 2025, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 05 DE MAYO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO. CV-100050530 Y CV-100013887 DE ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL, LOS ASPECTOS TÉCNICOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN SON LA ELABORACION DEL CAMPAMENTO, REPLANTEO DE LA REMODELACION DE LOS TALLERES GRUAL PARA CONSTRUCCION DE LA CABINA DE PINTURA, LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS MÁS RELEVANTES DURANTE EL PERIODO DE SUPERVISIÓN SON ELABORACION DE ESP DEL PERSONAL Y CHARLA DE INDUCCION POR PARTE DEL GRUIA, GRUSE, SESAT Y SEGEA

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCION DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		CEMENTO	1000 Kg	ANDAMIOS CERTIFICADOS	4 CUERPOS	DIRECTOR DE OBRA	1	5	5	SI	Cumple con la dedicacion asistiendo el dia 26 de mayo
		ARENA	12 M3	MEZCLADORA	1	RESIDENTE DE OBRA	1	100	100	SI	
		GRAVA	9 M3	VIBRADOR CONCRETO	1	INSPECTOR E DE OBRA	1	100	100	SI	
		ACERO CORRUGADO Fy 4200	460 Kg	DEMOLEDOR	1	RESIDENTE SST	1	100	100	SI	
		CIELO RASO PVC	30 M2	TALADRO DEMOLEDOR	3	MAESTRO DE OBRA	2		100	SI	
		PINTURA KORAZA	11 CUÑET	TALADRO INALAMBRICO	2	OFICIAL DE CONSTRUCCION	6		100	SI	
		GRANIPLAST	12 CUÑET	PULIDORA	4	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	4		100	SI	
		PINTURA ACEITE (3 EN 1)	4 GAL.	RADIAL DE CORTE	1						
						TOTAL	16				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES DE MAYO)				
Semana 1 (16/05/2025)	0,00%	**4,54%**	**4,63%**	**-0,09%**
Semana 2 (23/05/2025)	3,05%			
Semana 3 (30/05/2025)	1,49%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO















GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**12,80%**
	EJECUTADO		**2,70%**
2. CIMENTACION	PROGRAMADO		**16,00%**
	EJECUTADO		**1,30%**
3. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**9,20%**
	EJECUTADO		**4,60%**
4. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
7. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
8. PAÑETES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**2,30%**
10. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

11. ACABADOS DE MUROS, PINTURAS Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		7,90%
12. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		39,90%
15. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. CUBIERTAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
N/A	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
N/A	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
N/A	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	154	17	137

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

ANEXO NUMERAL 15

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1. Construccion del Campamento
2. Descapote del Area Nueva Cabina de Pintura GRUAL
3. Localizacion y replanteo de zapatas y vigas de cimentacion Cabina de Pintura GRUAL
4. Excavacion de zapatas y vigas de cimentacion Cabina de Pintura GRUAL
5. Armado de Acero de zapatas, arranque de columnas y vigas de cimentacion Cabina de Pintura GRUAL
6. Fundicion de zapatas y arranque de columnas Cabina de Pintura GRUAL
7. Demolicion de Anden area a intervenir en la Area Nueva Cabina de Pintura GRUAL
8. Escarificado de fachada del Bloque H, empastado y suministro de Graniplast en las areas afectadas de la fachada del Bloque H
9. Acabado en Koraza de la fachada del Bloque H
10. Reparacion y mantenimiento de canales metalicas y bajantes de aguas lluvias en el Bloque H de Apartamentos.
11. Inicio de los trabajos a realizar en la casa No 20 de Suboficiales.
12. Limpieza y Descolmatacion de cajas de inspección de aguas lluvias contiguas a la nueva Cabina de Pintura GRUAL

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Preliminares en Cubierta del Comando Aereo	SI		NO	x
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES:
Se evidencia un atraso en el inicio de las actividades preliminares de la cubierta del comando debido a la logistica para dicho mantenimiento debido a que las oficinas se deben encontrar despejadas en su interior

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.353.020.053,90	$ 1.353.020.053,90	$ 61.427.110,45	4,54%	$ 1.291.592.943,46	95%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.353.020.053,90	$ 1.353.020.053,90				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.353.020.053,90	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.353.020.053,90	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	si		SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA	si		SI	SI	SI	
PRESENTACION SISTEMA DE GESTION	si		SI	SI	SI	
PRESENTACION ORGANIGRAMA	si		SI	SI	SI	
PRESENTACION ANALISIS AIU	si		SI	SI	SI	
PRESENTACION ANALISIS APUS	si		SI	SI	SI	
PRESENTACION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL CONSORCIO RIO YIVAL	si		SI	SI	SI	
PRESENTACION CERTIFICADOS DE AFILIACION EPS Y ARL DEL PERSONAL CONSORCIO RIO YIVAL	si		SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda adelantar las gestiones pertinentes para el inicio del frente del comando con el fin del cumplimiento previo al inicio de la F-AIR 2025

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

CLIMA MAYORMENTE SOLEADO, SE PRESENTARON LLUVIAS QUE IMPIDIERON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EL DIA MARTES 27 DE MAYO, LA LLUVIAS SE EXTENDIERON DESDE LAS 7:00 AM HASTA LAS 10:00 AM

ELABORO:

CT. VANEGAS JAVIER
Supervisor Cto
Firma y Posfirma

REVISO:

ING. MAICOL VALENCIA
R/L CONSORCIO RIO YIVAL

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

	 		
Demolicion Anden Area Nueva Cabina de Pintura GRUAL	Construccion Campamento Contratista	Demolicion Anden Area Nueva Cabina de Pintura GRUAL	molicion Anden Area Nueva Cabina de Pintura GRU
	 		
Descapote Area Nueva Cabina de Pintura GRUAL	Localizacion y Replanteo, Excavacion y Suministro Zanja Filtrante	Excavacion Vigas de Cimentacion Nueva Cabina de Pintura	Armado de Acero y Formaleta de Pedestales
			
Escarificacion y Empastado Reposicion Graniplast Bloque H	Mantenimiento de Canales y Bajantes Aguas lluvias Bloque H	Escarificacion y Empastado Reposicion Graniplast Bloque H	Pintura Koraza Fachada Bloque H

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

LUGAR Y FECHA	RIONEGRO, ANTIOQUIA - 26 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.353.020.054,90
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO YIVAL - NIT. 901.941.761-2
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	CT. WILSON JAVIER VANEGAS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 (CACOM 5) RIONEGRO, ANTIOQUIA - APARTAMENTOS BLOQ. E
PLAZO DE ENTREGA	5 MESES

El día 26 del mes de mayo del 2025 a las 9.00 a.m. se reunieron: CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo MAICOL ANDRES VALENCIA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Al Norte del Bloque E linda con zonas verdes en cesped limpio y en buen estado, la estructura presenta deterioro en agunas zonas, como desprendimiento del graniplast y humedades principalmente en las zonas bajas.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	**Registro fotografico**
Al Sur del Bloque E linda con zonas verdes en cesped limpio y en buen estado, la estructura presenta deterioro en agunas zonas, como desprendimiento del graniplast y humedades principalmente en las zonas bajas.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Este	**Registro fotografico**
Al Sur del Bloque E linda con zonas verdes en cesped limpio y en buen estado, la estructura presenta deterioro en agunas zonas, como desprendimiento del graniplast y humedades principalmente en las zonas bajas.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	**Registro fotografico**
Al Oeste del Bloque E se encuentra el ingreso al bloque, zonas verdes en cesped limpio y en buen estado, adicionalmente en algunos sectores del costado se encuentran arbustos tipo guardaparques, la estructura presenta deterioro en agunas zonas, como desprendimiento del graniplast y humedades principalmente en las zonas bajas.	

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

CT. VANEGAS JAVIER
Supervisor

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

LUGAR Y FECHA	RIONEGRO, ANTIOQUIA - 22 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.353.020.054,90
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO YIVAL - NIT. 901.941.761-2
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 (CACOM 5) RIONEGRO, ANTIOQUIA - APARTAMENTOS BLOQ. H
PLAZO DE ENTREGA	5 MESES

El día 26 del mes de mayo del 2025 a las 9.00 a.m. se reunieron: CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo MAICOL ANDRES VALENCIA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Al Norte del Bloque H linda con un anden perimetral en buen estado, zonas verdes en cesped limpio y en buen estado, adicionalmente en algunos sectores del costado se encuentran arbustos tipo guardaparques, la estructura presenta deterioro en agunas zonas, como desprendimiento del graniplast y humedades principalmente en las areas bajas.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	**Registro fotografico**
Al Sur del Bloque H linda con un anden perimetral en buen estado, zonas verdes en cesped limpio y en buen estado, adicionalmente en algunos sectores del costado se encuentran arbustos tipo guardaparques, la estructura presenta deterioro en agunas zonas, como desprendimiento del graniplast y humedades principalmente en las areas bajas; adicionalmente existen unos parquederos de bicicletas en estructura metalica que no estan fijados al suelo por tanto se podran retirar para la ejecucion de las actividades	
Edificios y zonas exteriores presentes al Este	**Registro fotografico**
Al Este del Bloque H linda con un anden perimetral en buen estado, zonas verdes en cesped limpio y en buen estado, adicionalmente en algunos sectores del costado se encuentran arbustos tipo guardaparques, la estructura presenta deterioro en agunas zonas, como desprendimiento del graniplast y humedades principalmente en las areas bajas.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	**Registro fotografico**
Al Oeste del Bloque H se encuentra el ingreso al bloque, zonas verdes en cesped limpio y en buen estado, adicionalmente en algunos sectores del costado se encuentran arbustos tipo guardaparques, la estructura presenta deterioro en agunas zonas, como desprendimiento del graniplast y humedades principalmente en las areas bajas.	

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

CT. VANEGAS JAVIER
Supervisor

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

LUGAR Y FECHA	RIONEGRO, ANTIOQUIA - 29 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.353.020.054,90
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO YIVAL - NIT. 901.941.761-2
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 (CACOM 5) RIONEGRO, ANTIOQUIA - APARTAMENTOS BLOQUE H AREAS INTERNAS (ESCALERAS)
PLAZO DE ENTREGA	5 MESES

El día 26 del mes de mayo del 2025 a las 9.00 a.m. se reunieron: CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo MAICOL ANDRES VALENCIA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Al Norte las areas a intervenir lindan con los muros internos que dividen de los apartamentos y las zonas exteriores del edificio, los muros y cielo razos en las areas cercanas a las ventanas muestran evidentes deterioros por humedad.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	**Registro fotografico**
Al Sur las areas a intervenir lindan con los muros internos que dividen de los apartamentos y las zonas exteriores del edificio, los muros y cielo razos en las areas cercanas a las ventanas muestran evidentes deterioros por humedad.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Este	**Registro fotografico**
Al Este las areas a intervenir lindan con los muros internos que dividen de los apartamentos y las zonas exteriores del edificio, los muros y cielo razos en las areas cercanas a las ventanas muestran evidentes deterioros por humedad.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	**Registro fotografico**
Al Oeste las areas a intervenir lindan con los muros internos que dividen de los apartamentos y las zonas exteriores del edificio, los muros y cielo razos en las areas cercanas a las ventanas muestran evidentes deterioros por humedad.	

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:


Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

CT. VANEGAS JAVIER
Supervisor

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

LUGAR Y FECHA	RIONEGRO, ANTIOQUIA - 21 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.353.020.054,90
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO YIVAL - NIT. 901.941.761-2
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 (CACOM 5) RIONEGRO, ANTIOQUIA - GRUAL
PLAZO DE ENTREGA	5 MESES

El día 26 del mes de mayo del 2025 a las 9.00 a.m. se reunieron: CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo MAICOL ANDRES VALENCIA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

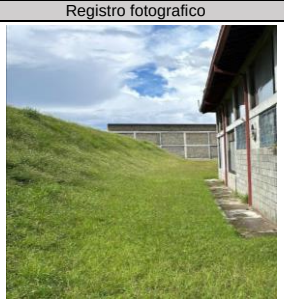Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Al Norte la area a intervenir colinda con el actual edifcio de GRUAL, especificamente con la pared posterior del taller de metalmecanica, adicionalmente con un anden de 90 cm de ancho que se encuentra en buen estado.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	**Registro fotografico**
Al Sur del area a intervenir se encuentra una ladera que conlinda con la pista de aterrizaje del CACOM No 5.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Este	**Registro fotografico**
Al Este del area a intervenir se encuentra una ladera que conlinda con la pista de aterrizaje del CACOM No 5.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	**Registro fotografico**
Al Oeste la area a intervenir colinda con el actual edifcio de GRUAL, especificamente con la pared posterior del taller de carpinteria, adicionalmente con un anden de 90 cm de ancho que se encuentra en buen estado.	

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

CT. VANEGAS JAVIER
Supervisor

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

LUGAR Y FECHA	RIONEGRO, ANTIOQUIA - 19 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.353.020.054,90
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO YIVAL - NIT. 901.941.761-2
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 (CACOM 5) RIONEGRO, ANTIOQUIA
PLAZO DE ENTREGA	5 MESES

El día 26 del mes de mayo del 2025 a las 9.00 a.m. se reunieron: CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo MAICOL ANDRES VALENCIA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Al norte de la ubicación del nuevo campamento se encuentra una zona verde, sin construcciones, esta area presenta encharcamiento y algunas marcas de vehiculos	
Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	**Registro fotografico**
Al Sur se encuentra la via de acceso a GRUAL y una zona de parqueo de vehiculos, la estructura de esta area se encuentra en buen estado, sin embago la carpa se encuentra bastante deteriorado	
Edificios y zonas exteriores presentes al Este	**Registro fotografico**
Al Este se encuentran carpas de servicio, en buen estado aparente y zonas verdes intermedias con notable encharcamiento y deterioro por el paso peatonal y con marcas de vehiculos.	
Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	**Registro fotografico**
Al Oeste se ubica una estructura de parquedaero de vehiculos grandes, la estructura principal en cercha metalica aparentemente se encuentra en buen estado, sin embargo la lona que cubre el parquedero si se encuentra bastate deteriorada y con rasgada en las partes bajas.	

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

CT. VANEGAS JAVIER
Supervisor

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

LUGAR Y FECHA	RIONEGRO, ANTIOQUIA - 26 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.353.020.054,90
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO YIVAL - NIT. 901.941.761-2
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	CT. WILSON JAVIER VANEGAS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 (CACOM 5) RIONEGRO, ANTIOQUIA - CASA FISCAL SUB OFICIALES No. 20
PLAZO DE ENTREGA	5 MESES

El día 26 del mes de mayo del 2025 a las 9.00 a.m. se reunieron: CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo MAICOL ANDRES VALENCIA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Al Norte se linda con la casa fiscal de sub oficiales No. 19, internamente los baños linda con los muros que separan de la habitacion principal.	 

Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	Registro fotografico
Al Sur la Casa Fiscal No. 20 linda con las zonas verdes internamente los baños lindan con los muros que separan de la cocina	 

Edificios y zonas exteriores presentes al Este	Registro fotografico
Al Este la vivienda linda con el anden de ingreso, zonas verdes en buen estado, arbustos tipo guardaparques, internamente los baños y cocina coinciden con las puertas de acceso y muros divisorios	 

Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico
Al Oeste, la vivienda linda con la parte trasera de la misma, en cesped verde en buen estado, internamente la cocina linda con el patio de la vivienda y los baños con los muros divisorios internos.	 

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

CT. VANEGAS JAVIER
Supervisor

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-055
	FORMATO ACTA DE VECINDAD	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

LUGAR Y FECHA	RIONEGRO, ANTIOQUIA - 28 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No.	020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.353.020.054,90
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO YIVAL - NIT. 901.941.761-2
INTERVENTOR ó SUPERVISOR	CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 (CACOM 5) RIONEGRO, ANTIOQUIA - OFICINAS COMANDO AEREO DE COMBATE No 5
PLAZO DE ENTREGA	5 MESES

El día 26 del mes de mayo del 2025 a las 9.00 a.m. se reunieron: CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA, en sus calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, asi mismo MAICOL ANDRES VALENCIA, en calidad de contratista con el fin de REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PUNTOS CARDINALES DEL LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, ADJUNTANDO DESCRIPCIÓN ESCRITA Y FOTOGRÁFICA ACTUAL DE LAS OBRAS EN SU ALREDEDOR.

Edificios y zonas exteriores presentes al Norte	Registro fotografico
Al Norte la estructra a intervenir linda con zonas verdes, con cesped en buen estado, la estructura no presenta daños notorios, sin embargo muestra desgaste por humedad en los extremos del cielo raso en madera machimbrada.	 

Edificios y zonas exteriores presentes al Sur	Registro fotografico
Al Sur la estructra a intervenir linda con otra parte de la estructura (oficinas), con cubierta en buen estado, sin aparentes daños, por tanto y teniendo en cuenta que esta area no se va a intervenir se debera tener especial cuidado.	

Edificios y zonas exteriores presentes al Este	Registro fotografico
Al Este la estrutura a intervenir linda con amplias zonas verdes, andenes peatonales y sardineles, en buen estado, sin daños importantes a resaltar.	 

Edificios y zonas exteriores presentes al Oeste	Registro fotografico
Al Oeste la cubierta a intervenir linda con amplias con zonas verdes, con cesped en buen estado, la estructura no presenta daños notorios, sin embargo muestra desgaste por humedad en los extremos del cielo raso en madera machimbrada.	 

ANEXOS

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Representante Legal Contratista
Firma y posfirma

CT VANEGAS JAVIER
Supervisor

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-02-2025

Acta Consecutivo No.	0001	**Lugar y Fecha**	Rionegro, 28 de mayo de 2025
Asunto	Inducción, Socialización de Políticas del SG-SST, Sustancias psicoactivas, ambiental, Reglamento de higiene. Decálogo SST, Plan de Emergencias, Normas de Seguridad, Normas de carácter administrativo. Prohibiciones.		
Oficina Productora	Seguridad y Salud en el Trabajo		
Hora Inicio	8:00	**Hora Finalización**	10;30 am
Ausentes			

Orden del día: Firma de lista de asistencia. Presentación del personal expositor

Desarrollo: 1. Inducción en SST. 2. Normas de Seguridad. 3. Normas de Seguridad. 4. Normas de carácter administrativo

1. **Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo:**
   a. Política en SST: Para promover y generar la cultura de autocuidado y conocimientos básicos de peligros y riesgos. Establecer controles para buscar, mitigar y/o eliminar los efectos adversos por exposición a riesgos a través de la jerarquía de controles.
   b. Política Medio Ambiental: Promueve la conservación de un ambiente más limpio y sano. La recolección está prevista de la siguiente manera: Lunes, Miércoles y Viernes bolsa negra para residuos no aprovechables, bolsa verde para residuos orgánicos, Martes en bolsa blanca los residuos aprovechables o reciclables.
   c. Para la disposición final de residuos peligrosos y escombros se debe solicitar certificado de disposición final de residuos.
   d. Programa plan ahorro de agua y energía: Gastar el agua que necesitemos y procurar mantener cerrada la llave para evitar desperdicios innecesarios
   e. Para compra de madera se debe pedir certificación y así evitar apoyar a la tala y comercialización ilegal de la misma.
   f. Conservar los jardines al momento de realizar los diferentes trabajos y si por algún motivo se tuviera que mover algunas plantas se debe avisar a las personas en cargadas.
   g. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: Socializar los riesgos a los que están expuestos en los diferentes puestos de trabajo. Entrega de dotación y Elementos de Protección Personal. Tener presente tres aspectos claves: 1. Qué es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Qué es EPP, uso adecuado y acorde a la tarea. 3. Autocuidado en todo momento.
   h. Plan de Emergencias CACOM5: Tener siempre presente en que lugar estamos para ubicar el punto de encuentro más cercano, teniendo en cuenta que son ocho (8) puntos de encuentro dentro de la institución. Se cuenta con sirenas, pitos, a viva voz, sirenas de vehículos y bomberos para una posible evacuación por desastre natural. La Alarma Sonora dará tres (3) toques intermitentes de 15 segundos cada uno lo cual será activada por el comandante de guardia.
2. **Normas de Seguridad:**
   a. La velocidad dentro del área debe ser a 20km para automóviles, motos, volquetas y las bicicletas deben portar luces.
   b. Existen unas políticas de privacidad: Un registro de inicio que tiene como objetivo verificar y controlar el ingreso y salida del personal de contratistas, sus empleados, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la labor contratada. Para el ingreso se debe recibir en recepción el carnet, pasar por el Garret donde se hace el registro de maletas, recibir y entregar, desplazamiento y salida con acompañamiento de un PMA.
   c. Estudio de seguridad es obligatorio
   d. Instrucciones de ingreso para contratistas, autorización y validación de personal. Registro: Todas las personas deben pasar por el arco detector y por la inspección de caninos.
   e. Prohibiciones: Ingresar cualquier sustancia psicoactiva. Prohibida tomar fotografías, ingresos a zonas restringidas, apropiarse de cualquier elemento de la institución.

f. En caso de ataque a la base de la fuerza aérea se protegerá a los civiles contratista.

3. **Normas de carácter administrativo:**
   - **a.** Todo contratista deberá portar carnet en lugar visible. Éste deberá contener los datos de EPS, ARL Y FP. El contratista hará base de datos con soporte de afiliaciones e igualmente reportar las diferentes novedades del personal ocurrida en el área de trabajo.
   - **b.** Los colaboradores deberán portar el uniforme reglamentario e identificación del contrato en el chaleco de la empresa. El chaleco debe portarse para transitar dentro de la institución.
   - **c.** No al consumo de sustancias psicoactivas y alcohol
   - **d.** En los trabajos de alto riesgo durante su ejecución debe estar la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, persona responsable, con la formación y capacitación certificable. El área debe estar acordonada, señalizada o demarcada.
   - **e.** Respeto y cortesía
   - **f.** Devolución del fichero.
   - **g.** Estudio de seguridad es obligatorio.
   - **h.** El contratista no hará uso de maquinaria, herramientas, materiales y elementos de protección personal de propiedad de la FAC.
   - **i.** No realizar actividades para las que no han sido contratado.
   - **j.** Las actividades que generen ruido, vapor y materiales particulado debe notificarse.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Inspección de EPP y dotación	Teniente Lina Castro	28/05/2025

Convocatoria Próxima Reunión

Tema			
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMA



Claudia Cecilia Linares
Residente SST
Secretario de la Reunión



Ing. Maicol Andrés Valencia Molina
Residente de Obra
Quien Preside la Reunión



Ing. Hugo Alejandro Liévano Aragón
Ing. Inspector

GRADO-NOMBRES Y APELLIDOS O ANEXAR FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA
Firma Asistentes a la Reunión

N°	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FIRMA
1	Bernardo Betancur Perez	Maestro	11261520	
2	Harol Esneyder GómezR	Oficial	1037627905	
3	Miguel Angel Muñoz Martinez	Ayudante	1064706953	
4	Ildealonso Rivero Vargas	Ayudante	15402152	
5	Carlos Heleco Coba H	Oficial	86045926	
6	Ever Murillo Rivas	Ayudante	15370709	
7	Fabián Andrés Parrado	Oficial	1121839604	
8	Pablo Segundo Martinez	Maestro	17328159	
9	Félix Pérez Ladino	Ayudante	17345032	
10	Gerley Abreu Moreno	Ayudante	71255664	
11	Juan David Rojas Osso	Oficial	1035916745	
12	Hugo Alejandro Liévano	Ing. Residente	4097035370	
13	Maicol Andrés Valencia M	Ing. Residente	1094939665	
14	Miguel Angel Amaya Muzo	Ayudante	1152707642	
15				
16				

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941761	2	CONSORCIO RIO YIVAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CACOMCINCO	BASE AEREA	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3135952184	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	9487224991	9487224991	Y	2025/06/16	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	0	$79,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CACOMCINCO (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,138,800		$79,400		$0	$0		$79,400
Centro de Trabajo: CACOMCINCO (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,138,800		$79,400		$0	$0		$79,400
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,138,800		$79,400		$0	$0		$79,400
1	CC	86045926	COBA CARLOS	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	0	$0	$0	No	$39,700
2	CC	86086308	GARCIA LUIS	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	0	$0	$0	No	$39,700
Total			**Afiliados(2)**																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,138,800		$79,400		$0	$0		$79,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941761	2	CONSORCIO RIO YIVAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CACOMCINCO	BASE AEREA	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3135952184	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	9487224991	9487224991	Y	2025/06/16	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	0	$79,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$79,400	$0	$0	$79,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$79,400	$0	$0	$79,400
TOTAL				2	$79,400	$0	$0	$79,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941761	2	CONSORCIO RIO YIVAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CACOMCINCO	BASE AEREA	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3135952184	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9487293492	9487293492	E	2025/06/16	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	0	$3,860,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CACOMCINCO (18 Afiliados)																							$8,522,200	$1,364,800			$8,759,450	$1,095,400			$8,759,450	$350,700			$8,759,450		$611,000		$8,759,450	$438,900		$3,860,800
Centro de Trabajo: CACOMCINCO (18 Afiliados)																							$8,522,200	$1,364,800			$8,759,450	$1,095,400			$8,759,450	$350,700			$8,759,450		$611,000		$8,759,450	$438,900		$3,860,800
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (18 Afiliados)																							$8,522,200	$1,364,800			$8,759,450	$1,095,400			$8,759,450	$350,700			$8,759,450		$611,000		$8,759,450	$438,900		$3,860,800
1	CC	71255664	ABREU GERLEY	X	X																23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
2	CC	1152707642	AMAYA MIGUEL	X																	23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$17,800	CCF04	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$142,350	$7,200	No	$63,500
3	CC	80037996	BALLEN JOSE	X	X																23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
4	CC	71261520	BETANCUR BERNARDO	X	X																23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
5	CC	93375909	CAMPOS EVER	X	X																23020 1	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
6	CC	17345032	FLOREZ FELIX	X																	23030 1	12	$569,400	$91,200	EPSC34	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
7	CC	1037627905	GOMEZ HAROL	X																	23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS010	5	$237,250	$29,700	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$237,250	$12,000	No	$105,800
8	CC	1097035370	LIEVANO HUGO	X																	23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
9	CC	56088625	LINARES CLAUDIA	X																	23030 1	12	$1,120,000	$179,200	EPS010	12	$1,120,000	$140,000	CCF04	12	$1,120,000	$44,800	14-11	12	$1,120,000	6.960%	$78,000	12	$1,120,000	$56,000	No	$498,000
10	CC	17328159	MARTINEZ PABLO	X																	23020 1	12	$569,400	$91,200	EPS005	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
11	CC	1064706953	MUÑOZ MIGUEL	X																	25-14	5	$237,250	$38,000	EPS041	5	$237,250	$29,700	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$237,250	$12,000	No	$105,800
12	CC	15370709	MURILLO EVER	X	X																25-14	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
13	CC	1121839604	PARRADO FABIAN	X																	23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS017	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
14	CC	15402152	RIVERA ILDEALONSO	X																	23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
15	CC	1035916745	ROJAS JUAN	X																	23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$17,800	CCF04	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	6.960%	$10,000	3	$142,350	$7,200	No	$63,500
16	CC	17324464	TRONCOSO ELIECER	X	X																	0	$0	$0	EPS041	5	$237,250	$29,700	CCF04	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$237,250	$12,000	No	$67,800
17	CC	1094939665	VALENCIA MAICOL	X																	23030 1	12	$569,400	$91,200	EPS010	12	$569,400	$71,200	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$569,400	$28,500	No	$253,400
18	CC	1040494856	VILORIA JAROL	X	X																23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$47,500	CCF04	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$379,600	$19,000	No	$169,000
Total			**Afiliados(18)**																				$8,522,200	$1,364,800			$8,759,450	$1,095,400			$8,759,450	$350,700			$8,759,450		$611,000		$8,759,450	$438,900		$3,860,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901941761	2	CONSORCIO RIO YIVAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CACOMCINCO	BASE AEREA	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3135952184	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	9487293492	9487293492	E	2025/06/16	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	0	$3,860,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$1,364,800	$0	$0	$1,364,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$129,200	$0	$0	$129,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,053,200	$0	$0	$1,053,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$182,400	$0	$0	$182,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$611,000	$0	$0	$611,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$611,000	$0	$0	$611,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$350,700	$0	$0	$350,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$350,700	$0	$0	$350,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$1,095,400	$0	$0	$1,095,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$71,200	$0	$0	$71,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$258,700	$0	$0	$258,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$71,200	$0	$0	$71,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$231,400	$0	$0	$231,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$59,400	$0	$0	$59,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$189,900	$0	$0	$189,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$213,600	$0	$0	$213,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$263,300	$0	$0	$263,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$263,300	$0	$0	$263,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$175,600	$0	$0	$175,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$175,600	$0	$0	$175,600
TOTAL				18	$3,860,800	$0	$0	$3,860,800

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86045926		COBA HERNANDEZ CARLOS MELECIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera13 25 48 popular	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3138565289	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	9487291500	9487291500	I	2025/06/09	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	1	$162,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$569,400	$91,200			$569,400	$71,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$569,400	$91,200			$569,400	$71,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$569,400	$91,200			$569,400	$71,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	86045926	COBA CARLOS	25-14	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$71,200		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$569,400	$91,200			$569,400	$71,200			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86045926		COBA HERNANDEZ CARLOS MELECIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera13 25 48 popular	RIONEGRO-ANTIOQUIA	3138565289	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	9487291500	9487291500	I	2025/06/09	2025/06/10	BANCO DE BOGOTA	1	$162,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$91,200	$100	$0	$91,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$91,200	$100	$0	$91,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$71,200	$100	$0	$71,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$71,200	$100	$0	$71,300
TOTAL				1	$162,400	$200	$0	$162,600
