CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH 435 de 2023

INFORME DE OBRA No. 02

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA



MUNICIPIO: **CAMPOALEGRE - ISNOS**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE (OBRA) No. CSAMCIH 435 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO DANES - HC

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CSAMCIH 435 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO DEL INFORME	Entre 05 al 30 de junio de 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO DANES – HC	NIT:	901.774.192 - 5
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	C.C:	1.079.182.594

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	22/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	30/11/2023		
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):			
PLAZO TOTAL:	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR INICIAL:	$ 283.493.254,00		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):			
VALOR TOTAL:	$ 283.493.254,00		
INTERVENTOR:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	NIT:	7.711.430-0
REPRESENTANTE LEGAL:		C.C:	7.711.430
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	28/12/2023		
FEHCA DE REINICIO No. 1	05/06/2024		

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Construcción y adecuación de parques infantiles" se desarrollará en la vereda Vega de Oriente del municipio de Campoalegre y la vereda Hornitos del municipio de Isnos, dichos municipios ubicados en el departamento del Huila.

No.	MUNICIPIO	LUGAR	DIRECCIÓN
1	Campoalegre	Vereda Vega de Oriente	En la caseta comunal

2	Isnos	Vereda Hornitos	En la escuela de la vereda

1. **VEREDA VEGA DE ORIENTE – MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE**

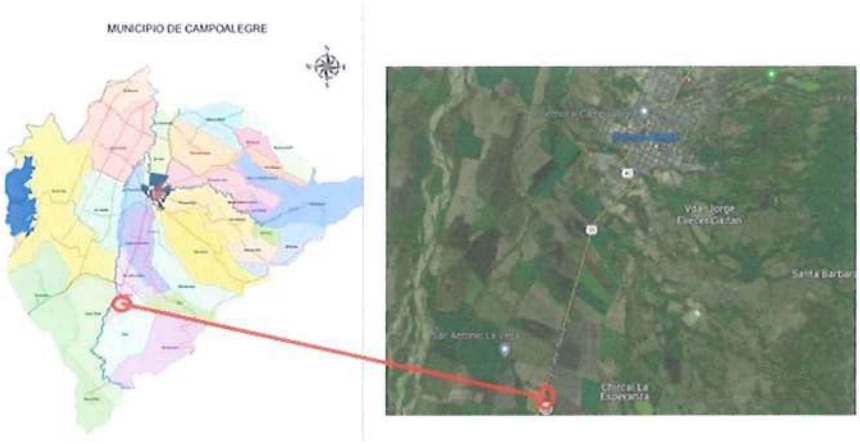


Ilustración No. 1 – Localización de Vereda Vega de Oriente – Campoalegre

2. **VEREDA HORNITOS – MUNICIPIO DE ISNOS**



Ilustración No. 2 – Localización de Vereda Hornitos – Isnos

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de dos (2) parques infantiles, los cuales contarán con la placa de contrapiso con acabado en pintura de acrílico y modulares de juegos infantiles que garanticen el esparcimiento en la utilización de los parques en su totalidad del escenario sin que se vea afectado por el horario o condiciones climáticas del sector para la práctica deportiva en los municipios de Campoalegre e Isnos – departamento del Huila. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Se llevará a cabo un proceso de mejoramiento en el recebo compactado mecánicamente, con el objetivo de lograr un suelo firme y estable capaz de soportar adecuadamente las cargas. En la parte inferior, se construirá un muro de concreto ciclópeo que brindará soporte a las vigas laterales del parque.

El parque contará con una placa de acceso diseñada para facilitar la entrada de personas con discapacidad. A los costados del parque se ubicarán cunetas para la evacuación de aguas lluvias, y se instalarán barandas alrededor del parque para proteger las zonas verdes.

En el interior, se habilitarán diversas áreas de juegos infantiles, destacando un módulo recreativo, un carrusel, un columpio inclusivo, un módulo triqui inclusivo, circuito, modulo ábaco y modulo piano.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 126,8 m2 por cada parque infantil y un Total de 253,60 m2 para el Proyecto, los PARQUES INFANTILES están ubicados en VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1. PRELIMINARES
2. MOVIMIENTO DE TIERRA
3. CIMENTACIÓN
4. ZONA VERDE
5. PLACA DE CONTRAPISO
6. INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES
7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Una vez por semana, se realiza una reunión con la comunidad, el comité de veeduría, el presidente de la junta de acción comunal y los directores de la obra para supervisar los avances y la calidad del proceso de la obra. Durante estas reuniones, el director de la obra informa sobre la gestión del control de esta y presenta los resultados alcanzados en relación con los objetivos establecidos.

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	30 de noviembre de 2023	28 días		28 de febrero de 2024

Suspensión No. 1	28 de diciembre de 2023		157 días	
Reiniciación No. 1	05 de junio de 2024			06 de agosto de 2024
TOTAL, DIAS		**28 días**	**157 días**	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Adjudicación del contrato	1	9 de noviembre de 2023
Suscripción del contrato	2	22 de noviembre de 2023
Acta de reunión	3	28 de noviembre de 2023
Acta de inicio	4	30 de noviembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Campoalegre	5	01 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Campoalegre	6	01 de diciembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Isnos	7	12 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Isnos	8	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 1 modificación clausula 6 Anticipo	9	07 de diciembre de 2023
Acta de reunión	10	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 2 para suspensión No. 1	11	28 de diciembre de 2023
Acta de Reunión de obra – citación contratistas parques.	12	19 de abril de 2024
Acta de Justificación No. 3 para Reinicio No. 1	13	05 de junio de 2024
Acta de Justificación No. 4 modificar la Cláusula 4 Plazo de ejecución - ajustando el cambio de vigencia del contrato-	14	12 de junio de 2024

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**	En el presente lapso del informe, establecido desde el 05 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades administrativas: • El día 23 de mayo de 2024, Se realizo solicitud para reinicio no. 1 del contrato de obra, una vez superados los motivos por el cual se generó la suspensión del contrato • El día 05 de junio de 2024, Se suscribió acta de justificación No. 3 para reinicio No. 1 del contrato de obra, el cual se deja plasmado los argumentos expuestos anteriormente en la solicitud y socializados a la interventoría. • El día 05 de junio de 2024 se recibe oficio de la interventoría con asunto "CITACIÓN COMITE TECNICO". • Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento al equipo de trabajo aprobado y descrito en el anexo técnico 1, director de obra, Residente de obra para los frentes del parque de la Vereda Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre

	• Durante el periodo del presente informe se cumplió a cabalidad con las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). • Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento con sus obligaciones laborales respecto del personal a cargo • Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra • Durante el periodo se realizó control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobre pase el presupuesto pactado por parte y total del contrato. • Durante el periodo se realizó retiro de los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. • Durante el periodo se realizó la presentación de informes mensuales, aprobados por la Interventoría, el avance de cada uno de los frentes de trabajo, de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal empleado en la ejecución de la obra, informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, actualización del programa de ejecución de obra, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
b) Actividades operativas	En el presente lapso del informe, establecido desde el 05 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades operativas: • Durante el periodo del presente informe se ejecutó la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. • Durante el periodo del presente informe se da cumplimiento con respecto a la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, aportando los certificados de calidad y fichas técnicas.

- Durante el periodo se realizó seguimiento, supervisión, y control de cada una de las actividades contratadas y programadas, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas en los documentos contractuales, anexo técnico, estudio previos y demás documentos que indican las buenas prácticas en sus procesos constructivos.


- Durante el periodo del presente informe se ejecutaron las siguientes cantidades de obra:

ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	27,50 m3	Campoalegre
Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	3,75 m2	Campoalegre
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	326,00 kg	Campoalegre
Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	2,57 m3	Campoalegre

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Hasta el momento el estado del tiempo en la vereda Vega de Oriente del municipio de Campoalegre, en el mes de junio la probabilidad de un día mojado durante el mes de junio disminuye muy rápidamente, comenzando el mes en 34 % y terminando el mes en 24 %.



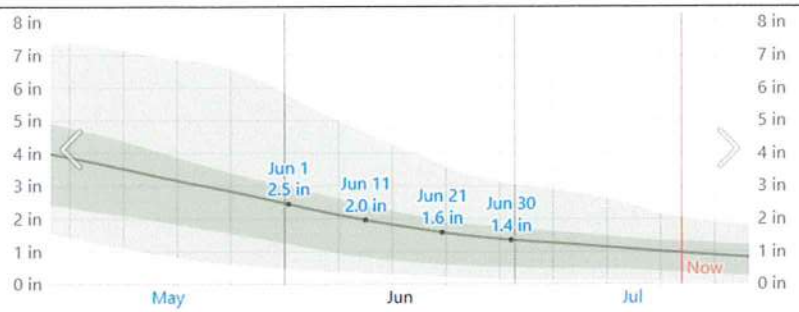

Fuente: *Web Wheather Spark*

El promedio de lluvia durante 31 días móviles en junio en Campoalegre disminuye rápidamente, comenzando el mes con 64 milímetros, cuando rara vez excede 140 milímetros o baja a menos de 13 milímetros, y termina el mes con 38 milímetros, cuando rara vez excede 80 milímetros o baja. por debajo de 0,1 pulgadas.

RESUMEN CLIMATOLOGICO DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2024 VEREDA VEGA - CAMPOALEGRE	
DIA	ESTADO DEL TIEMPO
05/06/2024	NUBLADO
06/06/2024	SECO
07/06/2024	SECO
08/06/2024	SECO
09/06/2024	NUBLADO
10/06/2024	SECO
11/06/2024	NUBLADO
12/06/2024	LLUVIA INTENSA
13/06/2024	SECO
14/06/2024	SECO
15/06/2024	SECO
16/06/2024	NUBLADO
17/06/2024	SECO
18/06/2024	SECO
19/06/2024	NUBLADO
20/06/2024	NUBLADO
21/06/2024	LLUVIA INTENSA
22/06/2024	NUBLADO
23/06/2024	SECO
24/06/2024	SECO
25/06/2024	NUBLADO
26/06/2024	NUBLADO
27/06/2024	SECO
28/06/2024	SECO
29/06/2024	SECO
30/06/2024	SECO

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	No aplica – para el presente periodo	
Diseños de mezcla para base.		
Compresión simple al concreto.		
Ensayo de compactación de campo		

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

ESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado

Valor Anticipo (25%)	17 de junio de 2024	$ 70.873.313,5	$0,00	$ 70.873.313,5
Acta Parcial No. 1		$0,00	$0,00	$0,00
Acta Parcial No. 2		$0,00	$0,00	$0,00
Acta Parcial No. 3		$0,00	$0,00	$0,00
Acta Recibo Final No.4		$0,00	$0,00	$0,00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 283.493.254,00	$ 0,00	$ 283.493.254,00	$0,00	$0,00

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	**Lugar**	**Resultado del Comité** (Describir)
06/06/2024	VEREDA LA VEGA - CAMPOALEGRE	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIAL DE RELLENO E ISNPECCION DE COMPACTACION.
12/06/2024	INDERHUILA	VIABILIDAD DE ITEMS NO PREVISTOS DE CUNETAS Y PEDESTALES
19/06/2024	VEREDA LA VEGA - CAMPOALEGRE	CUMPLIMIENTO DE LAS LONGITUDES ESPECIFICAS DE DESPIECE DE ACEROS
25/06/2024	VEREDA LA VEGA - CAMPOALEGRE	CUMPLIMIENTO DE LA FUNDICION DE MURO EN CONCRETO CICLOPEO

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	**FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD** (dd/mm/aaaa)	**No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)**	**FORMATO (Físico/Digital)**
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.61-44-101051955))	**07/06/2024**	**N/A**	**Digital - Plataforma secop II**
Pólizas R.C (Endoso (No. 61-40-101019855))	**07/06/2024**	**N/A**	**Digital - Plataforma secop II**
Copia bitácora de obra (periodo del (05/06/2024) al (30/06/2024)	**30/06/2024**	**N/A**	**Digital**
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (30/11/2023) al (28/12/2023)	**30/06/2024**	**N/A**	**Digital**

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE YAPELLIDOS	**No. IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**MODALIDAD DE CONTRATACION**
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	1.079.182.594	DIRECTOR DE OBRA	Contrato indefinido

STEPHANY CASTRO SIERRA	7.720.885	RESIDENTE DE OBRA	Por obra o labor contratada
RODOLFO HURTADO CAMPOS	4.891.143	MAESTRO DE OBRA	Por obra o labor contratada
JULIAN ANDRES GONZALES SANDOVAL	1.098.616.066	OFICIAL DE OBRA	Por obra o labor contratada
JAIRO ANDRES INCISO RAMIREZ	1.016.096999	AYUDANTE DE OBRA	Por obra o labor contratada
OMAR GARCIA GARZON	1.079.183.819	AYUDANTE DE OBRA	Por obra o labor contratada

14. RELACIÓN DE PAGOS

RELACIÓN DE PAGOS	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	30239071	2024-07-10

15. PERSONAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
DIRECTOR OBRA DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	$ 368.000	$ 92.000	$ 160.100	$ 92.000	$ 0,00	30239071	2024-07-10
MAESTRO DE OBRA RODOLFO HURTADO CAMPOS	$ 208.000	52.000	$ 90.500	$52.000	$ 0,00	30239071	2024-07-10
DIRECTOR OBRA DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0,00	30689600	2024-08-21
RESIDENTE OBRA JAIME MAURICIO SOTO ANDRADE	$ 152.600	$ 38.200	$ 66.400	$ 38.200	$ 0,00	30689600	2024-08-21
MAESTRO DE OBRA RODOLFO HURTADO CAMPOS	$ 0,00	$52.000	$ 90.500	$52.000	$ 0,00	30689600	2024-08-21
OFICIAL DE OBRA JULIAN ANDRES GONZALES SANDOVAL	$ 184.200	$ 48.600	$ 84.500	$ 48.600	$ 0,00	30689600	2024-08-21
AYUDANTE DE OBRA JAIRO ANDRES INCISO RAMIREZ	$ 152.600	$ 38.200	66.400	38.200	$ 0,00	30769508	2024-08-21
AYUDANTE DE OBRA OMAR GARCIA GARZON	$ 152.600	$ 38.200	66.400	38.200	$ 0,00	30769508	2024-08-21
NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA	$ 208.000	$ 52.000	$ 6.800	$ 52.000	$ 0,00	946948130	2024-07-04

RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

16. Póliza legalización del CONTRATO:

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
POLIZAS INICIALES						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	61-44-101051955	0	23/11/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0	61-40-101018914	0	23/11/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2024
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS- ANULACIÓN						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1 ANULACIÓN	61-44-101051955	1	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 1 - ANULACIÓN	61-40-101018914	1	07/12/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2024
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-44-101051955	2	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	30/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	02/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 2 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-40-101018914	2	07/12/2023	Predios labores y operaciones	30/11/2023	01/03/2024
				Contratistas y Subcontratistas	30/11/2023	01/03/2024

				Responsabilidad civil patronal	30/11/2023	01/03/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO	61-44-101051955	3	07/06/2024	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	10/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	10/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	10/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO	61-40-101019855	0	07/06/2024	Predios labores y operaciones	07/05/2023	10/08/2024
				Contratistas y Subcontratistas	07/05/2023	10/08/2024
				Responsabilidad civil patronal	07/05/2023	10/08/2024

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO




Ilustración No. 3 - vista del perfil de la actividad de rellano en recebo seleccionado en obra en el periodo del 05 al 30de junio de 2024.

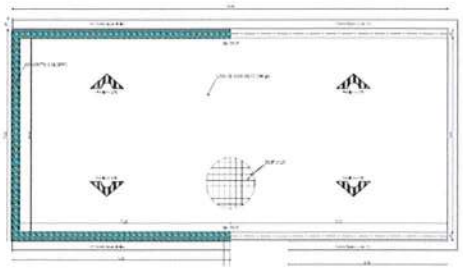


Ilustración No.4 - Vista en planta del concreto ciclópeo ejecutado en el costado izquierdo de la plaza y parte frontal y posterior de la placa, con el fin de que confinar el recebo seleccionado.




Ilustración No.5 - Vista detalle del concreto ciclópeo.

18.1. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS – PARQUE DE LA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION
1	PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	126,80	$ 3.584,00	$ 454.451,00	0,00	$ 0,00	0,00%	126,80	$ 454.451,00	100,00%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA										
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	43,40	$ 46.338,00	$ 2.011.069,00	0,00	$ 0,00	0,00%	43,40	$ 2.011.069,00	100,00%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	27,50	$ 84.460,00	$ 2.322.650,00	27,50	$ 2.322.650,00	100,00%	27,50	$ 2.322.650,00	100,00%
3	CIMENTACIÓN										
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	110,00	$ 34.260,00	$ 3.768.600,00	3,75	$ 128.475,00	3,41%	3,75	$ 128.475,00	3,41%
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	4,05	$ 636.912,00	$ 2.579.494,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	3316,00	$ 7.782,00	$ 25.805.112,00	326,00	$ 2.536.932,00	9,83%	659,00	$ 5.128.338,00	19,87%
4	ZONA VERDE										
4.01	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 89.591,00	$ 2.508.548,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5	PLACA DE CONTRAPISO										
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 84.639,00	$ 9.310.290,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.055,00	$ 2.646.050,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 84.463,00	$ 2.364.964,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6	INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES										
6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 7.566.326,00	$ 7.566.326,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 12.887.901,00	$ 12.887.901,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 11.835.634,00	$ 11.835.634,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 13.150.968,00	$ 13.150.968,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.05	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 1.970.630,00	$ 1.970.630,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.06	Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 4.075.165,00	$ 4.075.165,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.07	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 3.515.621,00	$ 3.515.621,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
7.01	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	10,00	$ 320.614,00	$ 3.206.140,00	2,57	$ 823.978,00	25,70%	2,57	$ 823.978,00	25,70%
7.02	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	9,00	$ 157.521,00	$ 1.417.689,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTAL, COSTO DIRECTO				**$ 113.397.302,00**		**$ 5.812.035,00**			**$ 10.868.961,00**	
	Administración	%	20%		$ 22.679.460,00		$ 1.162.407,00			$ 2.173.792,00	1,53%
	Imprevistos	%	1%		$ 1.133.973,00		$ 58.120,00			$ 108.690,00	0,08%
	Utilidad	%	4%		$ 4.535.892,00		$ 232.481,00			$ 434.758,00	0,31%
	TOTAL, COSTO				$ 141.746.627,00		$ 7.265.043,00			$ 13.586.201,00	
% AVANCE DE OBRA								**5,13%**			**9,58%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

18.2. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS – PARQUE DE LA VEREDA HORNITOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION
1	PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	126,80	$ 3.584,00	$ 454.451,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA										
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	43,40	$ 46.338,00	$ 2.011.069,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	27,50	$ 84.460,00	$ 2.322.650,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3	CIMENTACIÓN										
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	110,00	$ 34.260,00	$ 3.768.600,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	4,05	$ 636.912,00	$ 2.579.494,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	3316,00	$ 7.782,00	$ 25.805.112,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
4	ZONA VERDE										
4.01	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 89.591,00	$ 2.508.548,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5	PLACA DE CONTRAPISO										
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 84.639,00	$ 9.310.290,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.055,00	$ 2.646.050,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 84.463,00	$ 2.364.964,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6	INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES										
6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 7.566.326,00	$ 7.566.326,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 12.887.901,00	$ 12.887.901,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 11.835.634,00	$ 11.835.634,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 13.150.968,00	$ 13.150.968,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.05	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 1.970.630,00	$ 1.970.630,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.06	Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 4.075.165,00	$ 4.075.165,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.07	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 3.515.621,00	$ 3.515.621,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
7.01	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	10,00	$ 320.614,00	$ 3.206.140,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7.02	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	9,00	$ 157.521,00	$ 1.417.689,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTAL, COSTO DIRECTO				**$ 113.397.302,00**						
	Administración	%	20%		$ 22.679.460,00						
	Imprevistos	%	1%		$ 1.133.973,00						
	Utilidad	%	4%		$ 4.535.892,00						
	TOTAL, COSTO				$ 141.746.627,00						
% AVANCE DE OBRA PARQUE INFANTIL ISNOS								**0,00%**			**0,00%**
VALOR TOTAL PARQUE INFANTIL ISNOS + PARQUE INFANTIL CAMPOALEGRE					**$ 283.493.254,00**		**$ 7.265.043,00**			**$ 13.586.201,00**	
% AVANCE DE OBRA TOTAL PARQUE INFANTIL ISNOS + PARQUE INFANTIL CAMPOALEGRE								**2,56%**			**4,79%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
DIRECTOR DE OBRA

ING. DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

19 REGISTRO FOTOGRAFICO

- **MOVIMIENTO DE TIERRA**

.2. Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.



Ilustración No. 6 – Acopio recebo seleccionado (06/06/2024)



Ilustración No. 7 – Relleno recebo seleccionado zona de placa (07/06/2024)



Ilustración No. 8 – Compactación mecánica placa (10/12/2024)



Ilustración No. 9 – Compactación mecánica de rampa (11/06/2024)

- **CIMENTACIÓN**

3.1. Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts.



Ilustración No. 10 – Solado de limpieza zona Frontal (13/06/2024)



Ilustración No. 11 – Solado de limpieza zona Posterior (18/06/2024)

3.1. Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I



Ilustración No. 12 – Figurado estribos (19/06/2024)



Ilustración No. 13 – Instalación de acero figurado para placa (24/06/2024)

7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

7.1. Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi.



Ilustración No. 14 – Transporte de concreto ciclópeo (25/06/2024)



Ilustración No. 15 – Selección de materiales para muro de contención en concreto ciclópeo (25/06/2024)



Ilustración No. 16 – Preparación del concreto ciclópeo (26/06/2024)



Ilustración No. 17 – Fundición de muro de concreto ciclópeo (28/06/2024)

20 ANEXOS

- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- BITACORA DE OBRA
- ACTAS DE COMITÉS.

ING. DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	(30/06/2024)	ING. DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900949029	1	HC INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 76C NO 1AW 71		8660138			INCOINTEGRAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30239071	E	2024-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.083.100	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	30239071	2024-07-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 4891143	HURTADO CAMPOS RODOLFO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439001
2	CC 1075276718	CASTRO SIERRA STEPHANY	2.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.300.000	368.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.300.000	92.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.300.000	92.000	2.300.000	12.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	564.100	S	5439001
3	CC 1079182594	HERNANDEZ LEIVA DIEGO ARMANDO	2.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.300.000	368.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.300.000	92.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.300.000	92.000	2.300.000	160.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	712.100	S	5439001
4	CC 1080930650	CANACUE MOTTA LILIA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5439001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900949029	1	HC INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 76C NO 1AW 71		8660136			INCOINTEGRAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30239071	E	2024-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.083.100	1.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	30239071	2024-07-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	1.152.000	0	1.000	0	1.153.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	416.000	0	400	0	416.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	736.000	0	600	0	736.600
EPS(Administradoras: 1)				4	288.000	0	300	0	288.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	288.000	0	300	0	288.300
ARP(Administradoras: 1)				4	353.200	0	300	0	353.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	353.200	0	300	0	353.500
CCF(Administradoras: 1)				4	288.000	0	300	0	288.300
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	4	288.000	0	300	0	288.300
Gran Total					2.081.200	0	1.900	0	2.083.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900949029	1	HC INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 76C NO 1AW 71		8660138			INCOINTEGRAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30582985	E	2024-08-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	109.000	2.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	30582985	2024-08-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5645538	OVIEDO ARAQUE JOSE REYES	1.300.000	F	X														0			0	2	2	2	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	86.667	3.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	86.667	3.500	86.667	6.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	13.100	S	5439001
2	CC 73563397	SERPA OSPINA ROBERT	1.300.000	F	X														0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	130.000	20.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	130.000	5.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	130.000	5.200	130.000	9.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	40.300	S	5439001
3	CC 91202349	CARREÑO GOMEZ ROSENDO	1.300.000	F	X														0			0	2	2	2	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	86.667	3.500	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	86.667	3.500	86.667	6.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	13.100	S	5439001
4	CC 91230888	BARRIOS CARDENAS JAIRO	1.300.000	F	X														0			3	3	3	3	COLPENSION ES-25-14	130.000	20.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	130.000	5.200	COMFENALCO SANTANDER-CCF40	130.000	5.200	130.000	9.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	40.300	S	5439001

s.a.

PAGADO

CSJ

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900949029	1	HC INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 76C NO 1AW 71		8660138		INCOINTEGRAL@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30582985	E	2024-08-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	109.000	2.200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	30582985	2024-08-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
260.000	433.334	433.334	433.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	41.600	0	800	0	42.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	20.800	0	400	0	21.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	20.800	0	400	0	21.200
EPS(Administradoras: 2)				4	17.400	0	400	0	17.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	13.900	0	300	0	14.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	3.500	0	100	0	3.600
ARP(Administradoras: 1)				4	30.400	0	600	0	31.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	30.400	0	600	0	31.000
CCF(Administradoras: 1)				4	17.400	0	400	0	17.800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	4	17.400	0	400	0	17.800
Gran Total					106.800	0	2.200	0	109.000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	99559576	9469648130	E	2024/07/05	2024/07/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,624,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: NEIVA (10 Afiliados)					$9,013,335	$1,442,300			$9,013,335	$360,700			$9,013,335	$360,700			$9,013,335	$460,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	7719364	FIERRO NESTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	36067241	MEDINA SANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (8 Afiliados)					$6,413,335	$1,026,300			$6,413,335	$256,700			$6,413,335	$256,700			$6,413,335	$446,700		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (8 Afiliados)					$6,413,335	$1,026,300			$6,413,335	$256,700			$6,413,335	$256,700			$6,413,335	$446,700		$0	$0
3	CC	1080187924	AVILA NICOLAS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	4883020	BELTRAN RAMIRO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	2986668	CAMELO LUIS	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF32	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
6	CC	1061221966	CUELLAR HUGO	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
7	CC	12277231	GUTIERREZ AURELIO	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
8	CC	12209408	JIMENEZ JHON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1075306422	TRUJILLO NICOLAS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	76006590	ZULUAGA OSCAR	230201	5	$216,667	$34,700	EPSIC3	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
Total		**Afiliados(10)**				$9,013,335	$1,442,300			$9,013,335	$360,700			$9,013,335	$360,700			$9,013,335	$460,300		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/07/04 01:24 PM

252

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	99559576	9469648130	E	2024/07/05	2024/07/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,624,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,442,300	$0	$0	$1,442,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,199,600	$0	$0	$1,199,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$460,300	$0	$0	$460,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$460,300	$0	$0	$460,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$360,700	$0	$0	$360,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$360,700	$0	$0	$360,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$360,700	$0	$0	$360,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$8,700	$0	$0	$8,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$284,400	$0	$0	$284,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$67,600	$0	$0	$67,600
TOTAL				10	$2,624,000	$0	$0	$2,624,000

2024/07/04 01:24 PM

27 Diciembre 2023
Clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Herramienta menor
Actividades: Se continua con el figurado de aceros

28 Diciembre 2023
Se firma acta de suspensión

05 Junio 2024
Se firma acta de reinicio

06 Junio 2024
clima: Seco
personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Vibrocompactador y herramienta menor
Actividades: Inicio de relleno con recebo seleccionado y compactacion mecanicamente

07 Junio 2024
clima: seco
personal: Ingeniero residente, Interventoria, maestro y ayudante de obra
Equipos: Vibrocompactador y herramienta menor
Actividades: continua con relleno y compatacion

08 Junio 2024
No se realizaron labores porque no hay actividades programadas

09 Junio 2024
No se realizaron labores por dia dominical

10 Junio 2024
clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, maestro y ayudante de obra
Equipos: vibrocompactador y herramienta menor
Actividades: se continua con relleno en recebo seleccionado y compactacion mecanicamente

11 Junio 2024
clima: Nublado
personal: Ingeniero residente, ingeniero director, Interventoria, Maestro y ayudantes de obra
Equipos: Vibrocompactador y herramienta menor
Actividades: se continua con relleno y compactacion mecanicamente.
Se recibio la visita de la veeduria de la comunidad, durante la cual se informaron y demostraron los avances de la obra

12 Junio 2024
Clima: Lluvia intensa
No se realizaron labores por lluvia intensa

13 Junio 2024
Clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: delimitacion de zonas en las que van el solado de concreto de viga de cimentacion

14 Junio 2024
clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: se continua con la actividad de solado de concreto de viga de cimentacion

15 Junio 2024
No se realizaron labores porque no hay actividades programadas

16 Junio 2024
No se realizaron labores por dia dominical

17 Junio 2024
Clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de solado de concreto de viga de cimentacion

18 Junio 2024
clima: seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de solado de concreto de viga de cimentacion

19 Junio 2024
clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestro y ayudante de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se inicia con la respediva ubicacion de los aceros de refuerzo.
Se recibio la visita de la veeduria de la comunidad, durante la cual se informaron y demostraron los avances de la obra

20 Junio 2024
clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: herramienta menor
Actividades: Se continua con la ubicacion y separacion de los aceros de refuerzo

21 Junio 2024
clima: Lluvia intensa
No se realizaron labores por lluvia inten

22 Junio 2024
No se realizaron labores porque no hay actividades programadas

Director obra RES OBRA DEPTO INT.

23 Junio 2024
No se realizaron labores por dia dominical

Director obra RES OBRA DEPTO INT.

24 Junio 2024
clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, maestro y ayudantes de obra
Actividades: Se continua con la ubicacion y separacion de los aceros de refuerzo
Equipos: herramienta menor

Director obra RES OBRA DEPTO INT.

25 Junio 2024
clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se inicia con la ubicacion y delimitacion de la zona donde se haga el muro de contencion en concreto ciclopeo

Director obra RES OBRA DEPTO INT.

26 Junio 2024
clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de muro de contencion en concreto ciclopeo.

Director obra RES OBRA DEPTO INT.

27 Junio 2024
clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestros y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de muro de contencion en concreto ciclopeo

Director obra RES OBRA DEPTO INT.

28 Junio 2024
clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de muro de contencion en concreto ciclopeo

Director obra RES OBRA DEPTO INT.

29 Junio 2023
No se realizaron labores por día feriado

Director obra | Res. Obra | Supervisor HT.

30 Junio 2023
No se realizaron labores por día dominical

Director obra | Res. Obra | Supervisor HT.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y				
Nombre Proyecto	**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA**			**Acta No.**	002 - 0
No. De Contrato obra	CSAMCIH 435 DE2023	**Lugar:**	VEREDA VEGA - CAMPOALEGRE		
No. De Contrato Interventoría	CSAMCIH 414 DE2023		SITIO DE OBRA		
Fecha	06 DE JUNIO DE 2024	**Hora Inicio**	8:00 am	**Hora Final**	10:00 am

OBJETO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE OBRA

	AGENDA
	1- SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA
	2- PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES.
	3- PRESENTACIÓN ORDEN DEL DÍA.
	4- SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA
	5- CIERRE DEL COMITÉ DE OBRA.

DESARROLLO

Siendo las 09:00 AM se da apertura al comité de obra no. 002-0, donde están presentes el personal técnico del contratista de obra Consorcio DANES-HC, el personal técnico del contratista de interventoría.

Se realiza acta de comité a fin de validar el avance de obra a la fecha:

- Inspección de calidad del material de relleno certificado, asegurando que cumpla con las especificaciones técnicas y normativas para su uso en la construcción del parque, el cual se suministrara de la recebera magenta de la ciudad de Neiva, y cuanta con licencia minera y el material cumple como recebo seleccionado.

- Control y verificación de las dimensiones y volúmenes de material de relleno en las zonas correspondientes placa, la rampa y las cunetas, para asegurar que se cumplan las cotas de diseño y los volúmenes establecidos en los planos.

- Revisión de la compactación mecánica del material de relleno en las áreas previamente delimitadas, con el fin de garantizar la estabilidad adecuada del terreno para soportar la infraestructura proyectada.

- Por parte de la interventoría, manifiesta ceñirnos a los lineamientos y especificaciones técnicas para realizar la actividad de relleno compactado, donde el material de recebo tenga la humedad optima para lograr la compactación requerida, como también

DESARROLLO
realizarlo por capas de 10 cm hasta llegar a la cota deseada y especificada. Siendo las 10:00 AM se da por terminado el Comité de Obra no. 002-0

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	COMITÉ PROXIMO EL DIA 19 DE JUNIO DE 2024, PARA SOCIALIZAR Y PROPONER EL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	19/06/2024

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	DIRECTOR DE OBRA	
STEPHANY CASTRO SIERRA	RESIDENTE DE OBRA	
DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	INTERVENTOR	

DATOS GENERALES

ASUNTO :	BALANCE DE OBRA	**No. ACTA:**	002
FECHA:	12 DE JUNIO DE 2024	**HORA INICIO**	9:00 AM
RESPONSABLE:	CONTRATISTA	**HORA FINAL**	11:00 AM

ORDEN DEL DÍA:

1) Presentación de supervisores de apoyo, contratista de obra, Interventoría: Arq. **YOVANY PEÑA FIERRO**, quien actúa en calidad de apoyo a la **Supervisión** del área de infraestructura INDERHUILA; el ingeniero **CESAR JOAQUIN VELASQUEZ** quien actúa en calidad de asesor estructural del INDERHUILA; el Ingeniero **DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA**, Representante legal del CONSORCIO DANES-HC, en calidad de **Contratista de Obra, el ingeniero FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**, en calidad de **Interventor**

2) Solicitud por parte del contratista CONSORCIO DANES-HC, el cual propone incluir en el balance de obra de mayores y menores cantidades para los parques Vereda la Vega de Oriente Municipio de Campoalegre y Vereda Hornitos Municipio de Isnos los siguientes aspectos:

   i. Muro en concreto ciclópeo de 0.30x0.40 localizada en el costado lateral izquierdo de la placa, en la parte frontal y posterior de la placa iniciando desde al eje hasta el costado izquierdo, lo anterior debido a la inclinación del terreno tomamos nivel 0 en el eje intermedio de la placa, como resultado presenciamos al costado izquierdo, la actividad de relleno su nivel será mayor a la del terreno externo, por ende, se debe construir muro base en concreto ciclópeo como soporte de las vigas. Se anexa esquema

ii) Solicitud por parte del contratista CONSORCIO DANES-HC, en incluir en el balance de obra de mayores y menores cantidades viga de 0.25x0.25 localizada en el costado lateral izquierdo de la placa, como soporte y confinamiento del recebo, lo anterior debido a la inclinación del terreno tomamos nivel 0 en el eje intermedio de la placa, como resultado presenciamos al costado derecho mas excavaciones y al costado izquierdo mayor relleno, por ende en el costado de mayor relleno se requiere de viga para confinar el recebo.

iii) Solicitud por parte del contratista CONSORCIO DANES-HC, en incluir en el balance de obra de mayores y menores cantidades cuneta en v de 0.40x0.10 localizada en el costado lateral derecho de la placa, lo anterior debido a la inclinación del terreno, en el costado derecho el nivel es inferior al nivel de la vía, en consecuencia, las aguas lluvias de escorrentía se direccionan hacia la placa, para solventar dicho aspecto de propone cuneta para la recolección de las aguas provenientes de la vía

iv) Solicitud por parte del contratista CONSORCIO DANES-HC, que la dilatación de juntas en la placa de concreto se maneje de 4 mm de ancho, debido a que, en el sector no es posible conseguir Discos diamantados cuyo ancho de disco sea de 6 mm, los discos comerciales en el mercado van de 3mm a 4 mm de ancho, por ende se solicita se ajuste la especificación del ancho de juntas a 4 mm

v) Solicitud por parte del contratista CONSORCIO DANES-HC, no ejecutar el ítem de baranda metálica, debido a que, dentro de su análisis unitario, no cumple con las características y especificaciones requeridas, por lo tanto, el contratista propone la creación de ítem nuevo para baranda que cumpla con las especificaciones técnicas

vi) Solicitud por parte del contratista CONSORCIO DANES-HC, la creación de ítem nuevo de pedestal en concreto para soportar las barandas perimetrales

vii) Solicitud por parte del contratista CONSORCIO DANES-HC, la creación de ítem nuevo, de transporte de materiales pétreos, toda vez que una vez revisado el análisis de precios unitarios, no se ve reflejado el transporte de dichos materiales.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	REPRESENTANTE LEGAL ISTA CONSORCIO DANES-HC	
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	INTERVENTOR	
YOVANY PEÑA FIERRO	APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA	
CESAR JOAQUIN VELASQUEZ	ESTRUCTURAL - INDERHUILA	

DESARROLLO:

1) Se realiza la presentación por parte del arquitecto YOVANY PEÑA FIERRO, en calidad de apoyo a la supervisión del contrato de interventoría No. CMCIH414 DE 2023, el ingeniero CESAR JOAQUIN VELASQUEZ, en calidad de asesor estructural del INDERHUILA, el ingeniero DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA, representante legal de CONSORCIO DANES-HC, em calidad de contratista del contrato de obra No. CSAMCIH435 de 2023, el ingeniero FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA en calidad de Interventor, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMCIH414 DE 2023

2) El ingeniero estructural CESAR JOAQUIN VELASQUEZ considera viable la propuesta del contratista CONSORCIO DANES HC, para la fundición de muro base en concreto ciclópeo como soporte de viga de confinamiento, como también la adición de la viga en el costado izquierdo para confinar el recebo que se encuentra a una altura mayor a la de terreno

El ingeniero estructural CESAR JOAQUIN VELASQUEZ, aprueba la dilatación de 4 mm, considerando que se realizara cumplimiento a la profundidad del corte siendo H/3 (12 cm / 3= 4cm) como también teniendo en cuenta que las dilataciones están proyectados a cada 3 metros los cortes transversalmente y 3,5 metros el corte longitudinal, teniendo en cuenta lo anterior, las juntas de 4 mm de ancho controlan los esfuerzos que se presentan en el concreto como consecuencia de los movimientos de contracción y de dilatación del material y a los cambios de temperatura y humedad, entre la cara superficial y la de soporte de las losas de concreto.

3) El arquitecto YOVANY PEÑA FIERRO, considera viable la construcción de la cuneta en el costado lateral derecho, con el fin de garantizar la correcta conducción de las aguas lluvias y que dichas aguas no escurran sobre la placa a construir

   El arquitecto YOVANY PEÑA FIERRO, considera viable los ítems no previstos tales como los pedestales para soportar las barandas perimetrales, el ítem de baranda perimetral en donde se de cumplimiento a las especificaciones técnicas, y el transporte para materiales pétreos, teniendo en cuenta que son actividades indispensables para la continuidad y culminación del proyecto y llegar al cumplimiento de las metas trazadas contractualmente.


4) El ingeniero FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA, en calidad de interventor, manifiesta su compromiso de trabajar junto al contratista en la elaboración del balance de mayores y menores cantidades e ítems nuevos, de acuerdo con las necesidades reales del terreno, y avala las solicitudes del contratista debido a la importancia para la culminación del proyecto, como también garantizar la estabilidad y correcta ejecución de la obra.

5) El ingeniero DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA, en calidad de contratista solicita que los planos con las respectivas modificados plasmadas en este documento, sean realizados por parte de la entidad contratante.


COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Entrega de planos con las respectivas modificaciones	INDERHUILA	19	06	24
Entrega de balance de mayores y menores cantidades y creación de ítems nuevos	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	05	07	24


Siendo las 11:00 AM se dio por finalizada la sesión de esta reunión

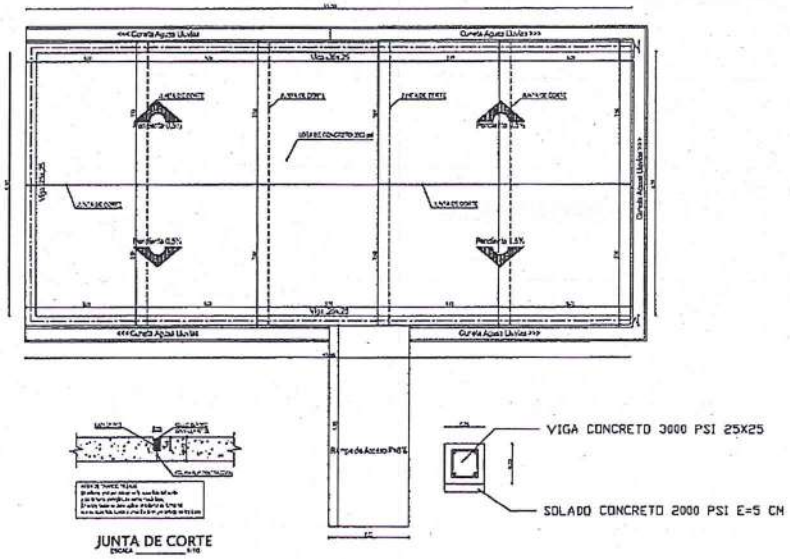


PLANTA VIGAS DE CIMENTACIÓN

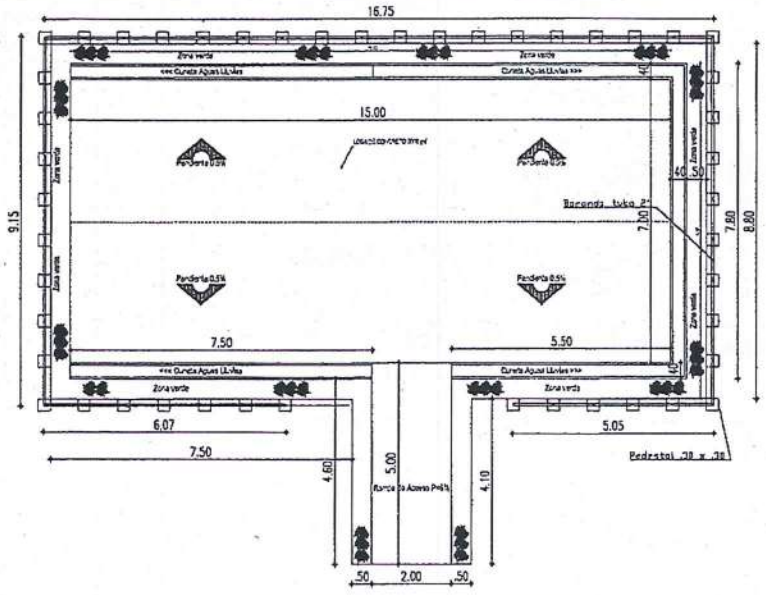

PLANTA PEDESTALES Y BARANDA PERIMETRAL

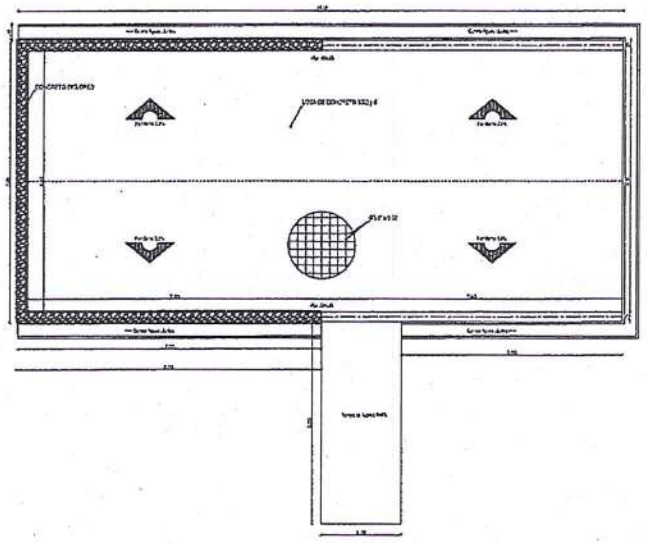

PLANTA CONCRETO CICLOPEO

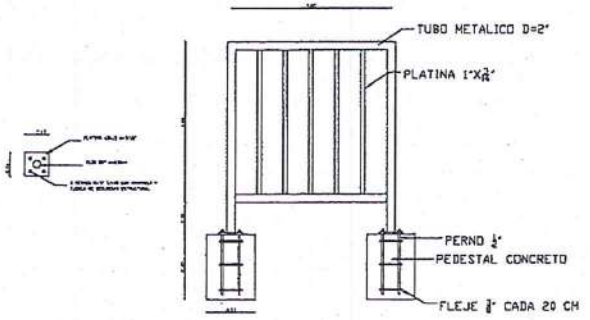

DETALLE DE PEDESAL Y BARANDA

Gobernación del Huila

INDERHUILA

CONSTRUCCION Y ADECUACION PARQUES DE JUEGOS INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

YOVANY PEÑA FIERRO

Ing. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ


-PLANTA VIGAS DE CIMENTACION
-PLANTA LOCALIZACION PEDESTALES Y BARANDA PERIMETRAL
-DETALLE DE CORTE DE JUNTAS
-PLANTA CONCRETO CICLOPEO

LOCALIZADO: MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA VEGA DE ORIENTE


ESCALA: 1 : 50

FECHA: JULIO 2024


A-2

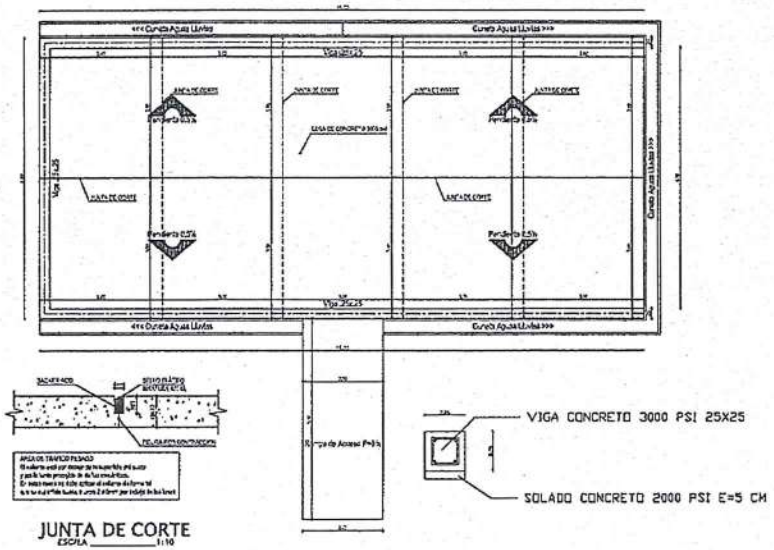


PLANTA VIGAS DE CIMENTACIÓN

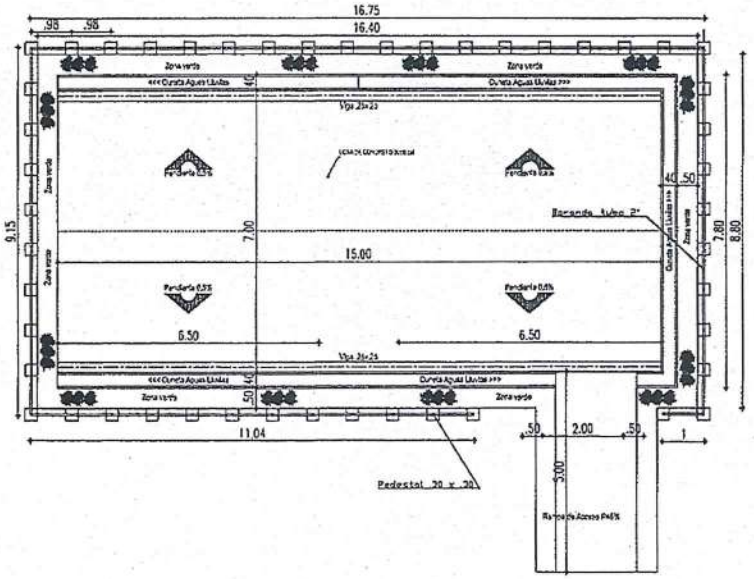

PLANTA PEDESTALES Y BARANDA PERIMETRAL

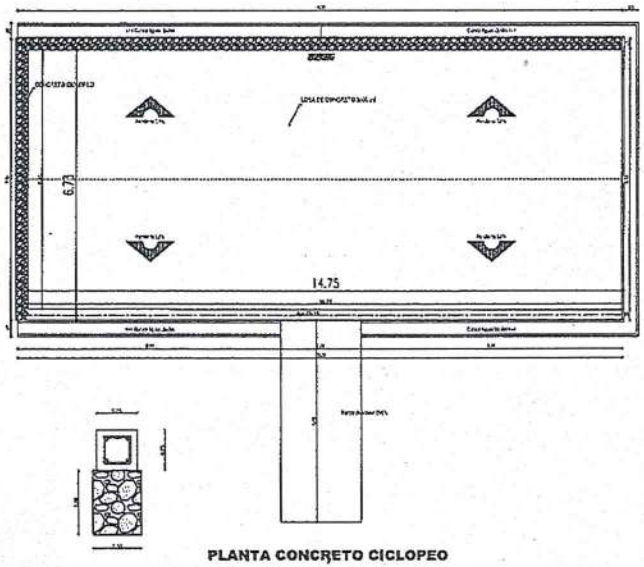

PLANTA CONCRETO CICLOPEO

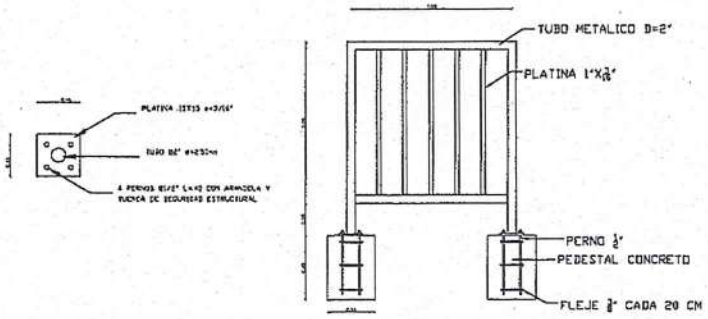

DETALLE DE PEDESAL Y BARANDA

Gobernación del Huila

INDERHUILA

CONSTRUCCION Y ADECUACION PARQUES DE JUEGOS INFANTILES PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

YOVANY PEÑA FIERROS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ing. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ
ASESOR ESTRUCTURAL

-PLANTA VIGAS DE CIMENTACION
-PLANTA LOCALIZACION PEDESTALES Y BARANDA PERIMETRAL
-DETALLE DE CORTE DE JUNTAS
-PLANTA CONCRETO CICLOPEO

LOCALIZADO: MUNICIPIO DE ISNOS VEREDA HORNITOS

YOVANY PEÑA FIERRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

1 : 50

JULIO 2024

A-1

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	

Nombre Proyecto	**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA**			**Acta No.**	002 - 1
No. De Contrato obra	CSAMCIH 435 DE2023	**Lugar:**	VEREDA VEGA - CAMPOALEGRE		
No. De Contrato Interventoría	CSAMCIH 414 DE2023		SITIO DE OBRA		
Fecha	19 DE JUNIO DE 2024	**Hora Inicio**	2:00 pm	**Hora Final**	3:00 pm

OBJETO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE OBRA

AGENDA	
	1- SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA
	2- PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES.
	3- PRESENTACIÓN ORDEN DEL DÍA.
	4- SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA
	5- CIERRE DEL COMITÉ DE OBRA.

DESARROLLO

Siendo las 2:00 PM se da apertura al comité de obra no. 002-1, donde están presentes el personal técnico del contratista de obra Consorcio DANES-HC, el personal técnico del contratista de interventoría.


- Se realiza acta de comité a fin de validar el avance de obra a la fecha el cual el Contratista de Obra, inicia a exponer como se está llevando a cabo la figuración del acero de refuerzo cumplimiento de las especificaciones técnicas para los aceros de refuerzo estipulados en los planos, tanto para la placa como para las vigas, verificando las características del acero (tipo, resistencia, entre otros).

- Inspección y verificación de las longitudes de traslape y los flejes de refuerzo, lo cual es crucial para la correcta transferencia de esfuerzos y la integridad estructural de la cimentación.

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	COMITÉ PROXIMO EL DIA 25 DE JUNIO DE 2024, PÁRA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRA EN ACTIVIDADES DE MURO EN CONCRETO CICLOPEO	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	25/06/2024

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	DIRECTOR DE OBRA	
STEPHANY CASTRO SIERRA	RESIDENTE DE OBRA	
DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	INTERVENTOR	

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	

Nombre Proyecto	**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA**			**Acta No.**	002 - 2
No. De Contrato obra	CSAMCIH 435 DE2023	**Lugar:**	VEREDA VEGA - CAMPOALEGRE		
No. De Contrato Interventoría	CSAMCIH 414 DE2023		SITIO DE OBRA		
Fecha	25 DE JUNIO DE 2024	**Hora Inicio**	8:30 am	**Hora Final**	10:30 am

OBJETO DE LA REUNION
SEGUIMIENTO DE OBRA


AGENDA	
	1- APERTURA DE COMITÉ DE OBRA.
	2- PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES.
	3- PRESENTACIÓN ORDEN DEL DÍA.
	4- PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 2.
	5- CIERRE DEL COMITÉ DE OBRA.

DESARROLLO

Se realiza acta de comité a fin de validar el avance de obra a la fecha:

- Medición y cuantificación del muro de contención en concreto ciclópeo, conforme a las especificaciones técnicas previamente revisadas, asegurando la correcta identificación de los volúmenes, dimensiones y espesores establecidos en los planos
- Ejecución de la fundición del muro de contención en concreto ciclópeo, garantizando la correcta dosificación del concreto, incluyendo las proporciones de cemento, agregados y agua, asegurando el adecuado transporte.

TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	**Tarea**	**Responsable**	**Fecha de Control**
1	COMITÉ PROXIMO EL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024, PARA SEGUIUMIENTO Y AVANCE DE OBRA EN ACTIVIDADES DE VIGAS DE CIMENTACION	CONTRATISTA E INTERVENTORIA	09/08/2024

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	DIRECTOR DE OBRA	
STEPHANY CASTRO SIERRA	RESIDENTE DE OBRA	
DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	INTERVENTOR	

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	junio 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH414 DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH 435 DE 2023

INFORME MENSUAL No. 2 DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por el Contratista y la Interventoría desde el **05 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

MENSUAL 2

FINAL ☐ **PARCIAL** ☐

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA" E "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".**



MUNICIPIO: **CAMPOALEGRE – ISNOS**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el 05 AL 30 DE JUNIO DE 2024, en cumplimiento del contrato general de **"INTERVENTORIA No. CIHCM341 DE 2023"** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA;** y el cumplimiento del contrato general **de "OBRA No. CSAMCIH 435 DE 2023"** cuyo objeto es **"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Para lo cual se efectuará en Campoalegre e Isnos: **"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados por la interventoría hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

El espacio público es un lugar de uso colectivo y de convivencia social, donde se convierte en un elemento estructurante de la calidad de vida, en un dinamizador de la ciudad y en un elemento que da soporte a los diferentes procesos y dinámicas del espacio urbano. La estructura ambiental, los parques, las zonas verdes, las calles, las ciclo ruta, hacen parte de esta estructura que soporta la movilidad, la recreación, el deporte y servicios ecosistémicos que son de vital importancia para la ciudad y el bienestar de sus habitantes. Por lo que las ciudades tienen el compromiso de crear espacios de libre acceso donde sus habitantes se integren espontáneamente sin importar su condición social o económica. Esta dinámica de integración social genera un significado especial del espacio para los ciudadanos a la vez que hace ciudades más amables, más alegres y sobre todo más dignas. El activar los espacios deportivos de fácil acceso, desarrolla comportamientos saludables que reducen la inactividad física, estos están equipados para el acondicionamiento y desarrollo del bienestar humano. Por consiguiente, el crear una cultura de fomento que permita el desarrollo de actividades no cotidianas, da apertura al diseño de hábitos participativos que fomenten los programas que el mismo gobierno viene desarrollando, lo que motivaría al disfrute y participación de ciudadanos que no se encuentran familiarizados con dichos espacios. El esfuerzo físico no va ligado solamente al desarrollo de un deporte de alta competencia, si no a la dedicación que se proyecte el individuo para el logro de un objetivo, que domine ante cualquier adversidad, esa sensación de satisfacción y conlleve al mejoramiento del estado psicológico del mismo La disponibilidad del espacio público en las ciudades es un reconocido indicador de calidad de vida para sus habitantes. Distintos análisis en salud urbana han propuesto que la presencia del espacio 10 público peatonal, las ciclo rutas y los parques en las ciudades, son un motor para la promoción de la actividad física. El desarrollo urbano de estos espacios de esparcimiento, así como el de otros equipamientos recreativos y

culturales, fomenta nuevos comportamientos sociales y promueve la actividad física en los habitantes, al tener acceso a todos los espacios. Es así como ciudades modelo a nivel mundial, son reconocidas por la cantidad y calidad de su espacio público. Además, las áreas verdes urbanas generan una serie de beneficios sociales y ambientales que van más allá del uso recreativo. Entre dichos beneficios se encuentran mejoras en la sanidad básica, reducción de contaminación del aire y enriquecimiento de la biodiversidad entre otros. (Walker Francisco, 2006, p.98). El espacio público al aire libre como los parques públicos y/o zonas verdes guardan una relación sobre la cantidad de habitantes que se vinculan a ella y no sobre la superficie que ocupan, a mayor cantidad de habitantes mayores requerimientos de espacio público, con relación a lo anterior la legislación colombiana a través del Decreto 1504 de 1998 y el documento Conpes 3718 de la Política Nacional de Espacio Público, propone para efectos de su medición un indicador de espacio público por habitante de 15m2; Lo anterior deja reflejado la necesidad de crear espacios públicos, pensado en proporcionar comodidad, acercamiento de los habitantes logrando el sentimiento de afecto hacia su territorio, protagonistas del escenario, actores felices y con disposición de ayudar a conservar y usar racionalmente la infraestructura y escenarios públicos, permitiendo así mejorar la calidad de vida.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de la construcción de dos (2) parques infantiles, uno en la Vereda la Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre, y el segundo parque ubicado en la Vereda Hornitos del Municipio de Isnos, los parques infantiles contemplan actividades de localización y replanteo, excavaciones para la conformación de vigas de cimentación, para mejoramiento del terreno con recebo seleccionado para cunetas, zonas verdes y pedestales para juegos infantiles también dentro de su alcance contempla el relleno en recebo seleccionado compactado en capas horizontales de 15 cm

Dentro del proyecto encontramos solado de limpieza en áreas de vigas de cimentación y áreas de placa, también el parque contempla actividades de acero en varilla 3/8 para vigas de cimentación, placa de contrapiso, pedestales para mobiliario de juegos infantiles.

Otras de las actividades del proyecto, se encuentra vigas de cimentación de 0.25m x 0.25 m de sección ubicadas en los extremos de la placa de contrapiso en sentido longitudinal, también encontramos una placa de contrapiso en un área de 7 metros de ancho por 15 metros de largo, dicha placa contempla acabado en pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie cuyos colores van según diseño y figuras.

Contemplamos unas cunetas en forma de V cubriendo el área de la placa para recoger las aguas lluvia, estas cunetas se caracterizan por tener una dimensión de 0.40 m ancho x 0,10 de alto

Las zonas verdes están ubicadas al rededor del parque infantil en las cuales se plantarán en tierra negra tipos de plantas como lo son: Ornamentales durantas, plantas Ixoras y Bismarckia.

En el parque infantil está ubicada una rampa en concreto de 3.000 PSI, esta rampa esta reforzada con malla electrosoldada y nos dará acceso a 7 juegos infantiles que constan de: circuito de juego, modulo recreativo, carrusel, columpio inclusivo, triqui inclusivo, ábaco inclusivo y módulo de piano inclusivo.

3.1. LOCALIZACIÓN

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto "Construcción y adecuación de parques infantiles" se desarrollará en la vereda Vega de Oriente del municipio de Campoalegre y la vereda Hornitos del municipio de Isnos, dichos municipios ubicados en el departamento del Huila.

No.	MUNICIPIO	LUGAR	DIRECCIÓN
1	Campoalegre	Vereda Vega de Oriente	En la caseta comunal
2	Isnos	Vereda Hornitos	En la escuela de la vereda

1. VEREDA VEGA DE ORIENTE – MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

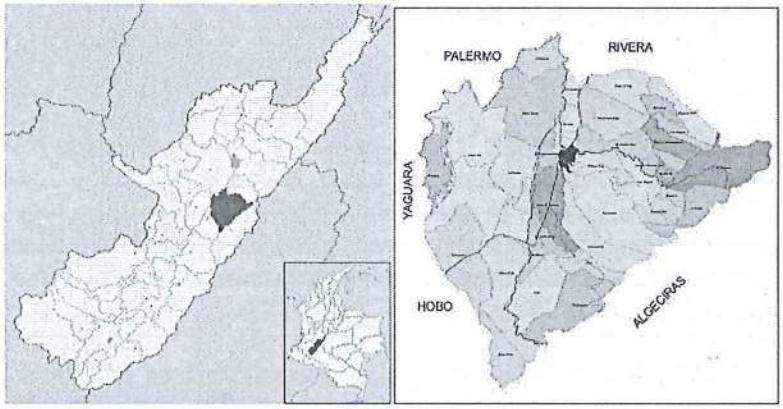


Ilustración No. 1 – Localización de Vereda Vega de Oriente – Campoalegre

2. VEREDA HORNITOS – MUNICIPIO DE ISNOS

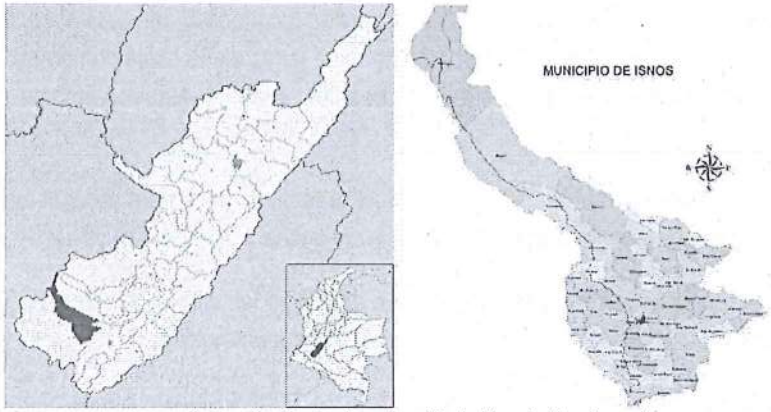


Ilustración No. 2 – Localización de Vereda Hornitos – Isnos

Las obras contemplan la construcción y adecuación de parques infantiles, en donde tiene por objeto contractual las siguientes actividades de ejecución:

- PRELIMINARES
- MOVIMIENTO DE TIERRA
- CIMENTACIÓN
- ZONA VERDE
- PLACA DE CONTRAPISO
- INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES
- OBRAS COMPLEMENTARIAS

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que, mediante el 10 de octubre de 2023, la entidad dio apertura al procedimiento de selección Mínima cuantía número IPMCIH008-2023 y que mediante Resolución No. 419 del 9 de noviembre de 2023, la entidad adjudico el contrato al señor FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA.

CONTRATO No.	CMCIH414 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA:	ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA NIT: 7.711.430-0 C.C: 7.711.430 DE NEIVA (H)
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($17.343.270,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($17.343.270,00) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17/11/2023

PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL No. 01:	N/A
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO No. 01	05 de junio de 2024

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			**CMCIH414 DE 2023**	
Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Valor Acta**	**Amortización 30%**	**Valor pagado**
Valor Anticipo	N/A			
Acta Parcial No. 1				
Acta Parcial No. 2				
Acta Recibo Final No.4				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 17.343.270,00	**$ 0**	**$ 17.343.270,00**	**$ 0**	**$ 17.343.270,00**

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aaaa)**	**DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
Iniciación	30 de noviembre de 2023			28 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	28 de diciembre de 2023	28 días	159 dias	
Reinicio No. 1	05 de junio de 2024			06 de agosto de 2024
TOTAL DIAS		**28 días**	**159 días**	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
Adjudicación del contrato	*1*	9 de noviembre de 2023
Suscripción del contrato	*2*	22 de noviembre de 2023
Acta de reunión	*3*	28 de noviembre de 2023
Acta de inicio	*4*	30 de noviembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Campoalegre	*5*	01 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Campoalegre	*6*	01 de diciembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Isnos	*7*	12 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Isnos	*8*	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 1 modificación clausula 6 Anticipo	*9*	07 de diciembre de 2023
Acta de reunión	*10*	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 2 para suspensión No. 1	*11*	28 de diciembre de 2023
Acta de Reunión de obra – citación contratistas parques.	*12*	19 de abril de 2024
Acta de Justificación No. 3 para Reinicio No. 1	*13*	05 de junio de 2024
Acta de Justificación No. 4 modificar la Cláusula 4 Plazo de ejecución -ajustando el cambio de vigencia del contrato-	*14*	12 de junio de 2024

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000722	VALOR	VIGENCIA
Rubro 2.3.2.02.02.005 denominado Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA:4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreacion y deporte PRODUCTO: 4301010-Parques recreativos construidos y dotados CPC:5327-instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META:9-Construccion y Dotación de 2 parques Recreativos ACTIV:91-Contruir y Dotar Gimnasios Recreativos Infantiles – PROYECTO 2023004410123- construcción y adecuación de parques infantiles Tutaina tuturu Huila- mi pesebre huilense Crece en unión familiar – Vereda Vega de Oriente -Municipio de Campoalegre Departamento del Huila: Fuente 1-50103- RB RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F 2022		$ 8.671.635,00	2023

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000722	VALOR	VIGENCIA
Rubro 2.3.2.02.02.005 denominado Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA:4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreacion y deporte PRODUCTO: 4301010-Parques recreativos construidos y dotados CPC:5327-instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META:9-Construccion y Dotación de 2 parques Recreativos ACTIV:91PROYECTO 2023004410136- construcción y adecuación de parques infantiles Tutaina tuturu		$ 8.671.635,00	2023

Huila- mi pesebre huilense Crece en unión familiar – Vereda Hornitos - Municipio de Isnos Departamento del Huila: Fuente 1-50103-RB RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F 2022		

4.1.2. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	0	20-11-2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/08/2024
				Prestaciones sociales	17/11/2023	17/02/2027
				Calidad del servicio	17/02/2024	17/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	0	20-11-2023		17-11-2023	17-02-2024
Póliza actualizada x anulación certificado anexo 0 para actualización de ACTA DE INICIO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	1	05/12/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/08/2024
				Prestaciones sociales	17/11/2023	17/02/2027
				Calidad del servicio	17/02/2024	17/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	1	05-12-2023		17/11/2023	17/02/2024
Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	2	05-12-2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024
				Prestaciones sociales	30/11/2023	02/03/2027
				Calidad del servicio	01/03/2024	02/03/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA		VIGENCIA	

			DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	2	05-12-2023	30/11/2023	01/03/2024
Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) / DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	3	07-06-2024	Cumplimiento del contrato	05/06/2024 / 11/02/2025
				Prestaciones sociales	05/06/2024 / 11/08/2027
				Calidad del servicio	11/08/2024 / 11/08/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa) / DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	3	07-06-2024		30/11/2024 / 11/08/2024

4.2. CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución 302 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 la Entidad abrió el PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMCIH007-2023, Que por medio de la Resolución 419 del 09 de noviembre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **CONSORCIO DANS-HC.**

CONTRATO No.	CSAMCIH 435 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DANES – HC NIT: 901.774.192 - 5 Representante Legal: DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (283.493.254,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (283.493.254,00) M/CTE.

FECHA SUSCRIPCIÓN:	22/11/2023
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA ENECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL No. 01:	N/A
PLAZO TOTAL:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA ENECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	05 de junio de 2024

Estado Financiero del Contrato de Obra			**CSAMCIH 435 DE 2023**	
Objeto: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Valor Acta**	**Amortización 25%**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)	17 de junio de 2024	$ 70.873.313,50	$0,00	$ 70.873.313,50
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 283.493.254,00	**$ 0**	**$ 283.493.254,00**	**$ 0.00**	**$ 283.493.254,00**

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aaaa)**	**DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
Iniciación	30 de noviembre de 2023			28 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	28 de diciembre de 2023	28 días	159 días	
Reinicio No. 1	05 de junio de 2024			06 de agosto de 2024
TOTAL DIAS		**28 días**	**159 días**	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
Adjudicación del contrato	1	9 de noviembre de 2023
Suscripción del contrato	2	22 de noviembre de 2023
Acta de reunión	3	28 de noviembre de 2023
Acta de inicio	4	30 de noviembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Campoalegre	5	01 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Campoalegre	6	01 de diciembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Isnos	7	12 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Isnos	8	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 1 modificación clausula 6 Anticipo	9	07 de diciembre de 2023
Acta de reunión	10	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 2 para suspensión No. 1	11	28 de diciembre de 2023
Acta de Reunión de obra – citación contratistas parques.	12	19 de abril de 2024
Acta de Justificación No. 3 para Reinicio No. 1	13	05 de junio de 2024
Acta de Justificación No. 4 modificar la Cláusula 4 Plazo de ejecución -ajustando el cambio de vigencia del contrato-	14	12 de junio de 2024

4.3. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000710	VALOR	VIGENCIA
Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA:4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreacion y deporte PRODUCTO: 4301010-Parques recreativos construidos y dotados CPC:5327-instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META:9-Construccion y Dotación de 2 parques Recreativos ACTIV:91-Contruir y Dotar Gimnasios Recreativos Infantiles PROYECTO: 2023004410136-CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA-MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNIÓN FAMILIAR- VEREDA HORNITOS- MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1-50103-rb recursos propios PROPIOS-EXCEDENTES F 2022		$ 141.746.627,00	2023

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000711	VALOR	VIGENCIA
Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA:4301-Fomento a la		$ 141.746.627,00	2023

recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreacion y deporte PRODUCTO: 4301010-Parques recreativos construidos y dotados CPC:5327-instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META:9-Construccion y Dotación de 2 parques Recreativos ACTIV:91-Contruir y Dotar Gimnasios Recreativos Infantiles PROYECTO: 2023004410123-CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA-MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNIÓN FAMILIAR- VEREDA VEGA DE ORIENTE-MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1-50103-rb recursos propios PROPIOS-EXCEDENTES F 2022		

4.4. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

ASEGURADORA						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	61-44-101051955	0	23/11/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0	61-40-101018914	0	23/11/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2028
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS- ANULACIÓN CERTIFICADO PARA ACTUALIZACION ACTA DE INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1 ANULACIÓN	61-44-101051955	1	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 1 - ANULACIÓN	61-40-101018914	1	07/12/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2024
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE INICIO						
		2	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-44-101051955			Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	30/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	02/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 2 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-40-101018914	2	07/12/2023	Predios labores y operaciones	30/11/2023	01/03/2024
				Contratistas y Subcontratistas	30/11/2023	01/03/2024
				Responsabilidad civil patronal	30/11/2023	01/03/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO	61-44-101051955	3	07/06/2024	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	10/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	10/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	10/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO	61-40-101019855	0	07/06/2024	Predios labores y operaciones	07/05/2023	10/08/2024
				Contratistas y Subcontratistas	07/05/2023	10/08/2024
				Responsabilidad civil patronal	07/05/2023	10/08/2024

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El día 22 de noviembre del 2023, la ingeniera **NATALIA BUSTOS BOTERO** es designado mediante oficio por la Director del INDERHUILA **MIGDONIA PATIÑO ARIAS**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH414 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de selección de Contratación mínima cuantía No. IPMCIH008-2023.

- El día 10 de julio del 2024, el arquitecto **YOVANY PEÑA FIERRO** es designado mediante oficio por la Director del INDERHUILA **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH414 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI

PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de selección de Contratación mínima cuantía No. IPMCIH008-2023.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las actividades desarrolladas se tiene las siguientes:

- ✓ Acta de comité de obra el 06 de junio de 2024 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRA, relleno, dimensiones y volúmenes
- ✓ Acta de comité de obra el 12 de junio de 2024 – socialización de obras no previstas para ser incluidas en el balance de obra
- ✓ Acta de comité de obra el 19 de junio de 2024 – AVANCE DE OBRA, actividades de acero de refuerzo
- ✓ Acta de comité de obra el 25 de junio de 2024 – AVANCE DE OBRA, actividad de concreto ciclópeo

7. DECRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA / INTERVENTORIA

- Por el momento se tiene avance de ejecución del parque de la Vereda la Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre – Huila es del 5,13% y avance acumulado es del 9,58%
- Por el momento se tiene avance de ejecución del parque de la Vereda Hornitos del Municipio de Isnos – Huila es del 0,00%.
- Por el momento se tiene avance de ejecución general es del mes de junio es del 2,56% y el avance acumulado general es del 4,79%


7.1 AVANCE DE OBRAS Y TRABAJOS

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"

En el presente lapso del informe, establecido desde el 05 AL 30 DE JUNIO DE 2024, de ejecutaron las siguientes obras:

- Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.
- Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts
- Figurado de acero de refuerzo
- Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi

8. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

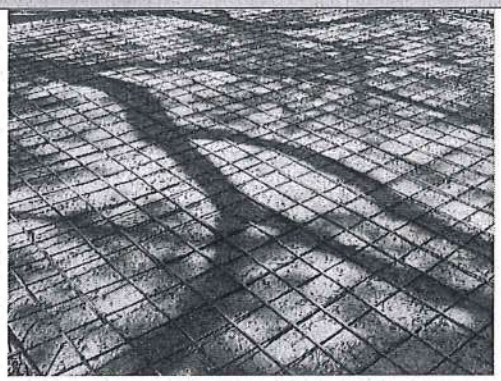"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
Relleno compactado	Solado en vigas
	
Acero de refuerzo	Fundicion de concreto ciclópeo
	

Arq. YOVANY PEÑA FIERRO	(3/07/2024)	Ing. KAROLL LISETH BUITRAGO HERNADEZ
FIRMA ORIGINAL APOYO A LA SUPERVISIÓN	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo CONTRATISTA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH414 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 2

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA.



MUNICIPIO: CAMPOALEGRE - ISNOS

DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE (INTERVENTORIA) No. CMCIH414 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CMCIH414 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**PERIODO DEL INFORME**	Del 05 al 30 junio del 2024
CONTRATISTA	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**NIT:**	7.711.430-0
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430


FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	17 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	30 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 (D/M/A):	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO N°1 (D/M/A):	05 de junio de 2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL:	Tres (3) meses
VALOR INICIAL:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($17.343.270,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	
VALOR TOTAL:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($17.343.270,00) M/CTE
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	

CONTRATO DE OBRA No.	CSAMCIH435 de 2023		
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA	CONSORCIO DANES – HC	NIT:	901.774.192 - 5
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	C.C:	1.079.182.594
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	22 de noviembre de 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	30 de noviembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 (D/M/A):	28 de diciembre de 2023		
FECHA DE REINICIO N°1 (D/M/A):	05 de junio de 2024		
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):			
PLAZO TOTAL:	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR INICIAL:	$ 283.493.254,00		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):			
VALOR TOTAL:	$ 283.493.254,00		


3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en dos Municipios del Departamento del Huila

1. Ubicación: VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
   Campoalegre ubicado en el centro del Departamento del Huila
   Vereda la Vega de Oriente ubicado al sur km 5 del casco urbano del Municipio de Campoalegre

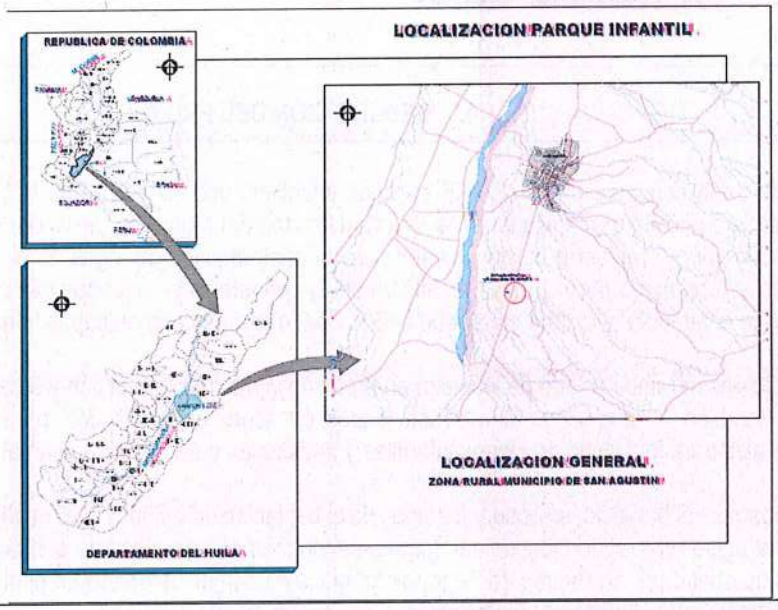

2. Ubicación: VEREDA HORNITOS DE MUNICIPIO DE ISNOS
   Isnos ubicado en el sur del Departamento del Huila
   Vereda hornitos ubicado al sur Huila a 10 km del casco urbano del Municipio de Isnos.

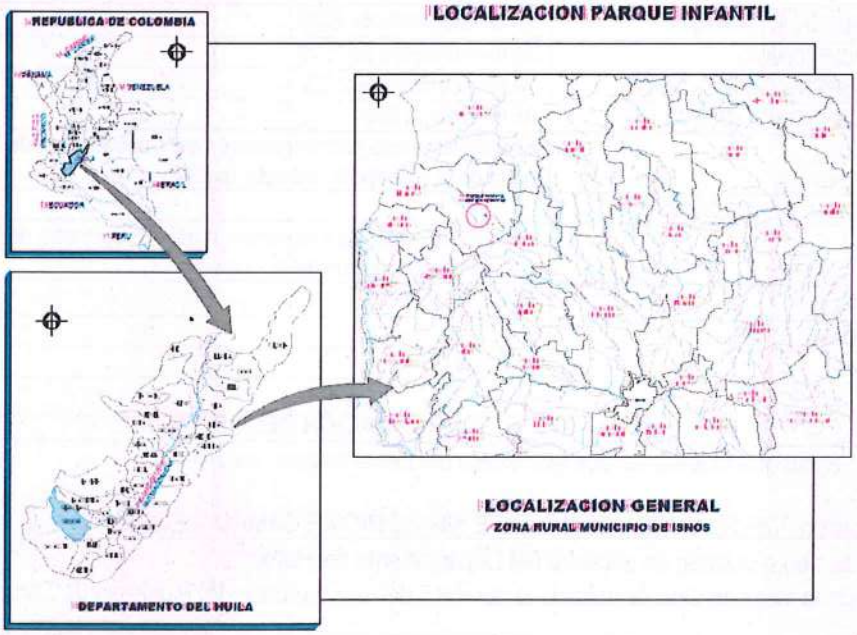

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de la construcción de dos (2) parques infantiles, uno en la Vereda la Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre, y el segundo parque ubicado en la Vereda Hornitos del Municipio de Isnos, los parques infantiles contemplan actividades de localización y replanteo, excavaciones para la conformación de vigas de cimentación, para mejoramiento del terreno con recebo seleccionado para cunetas, zonas verdes y pedestales para juegos infantiles y baranda perimetral también dentro de su alcance contempla el relleno en recebo seleccionado compactado en capas horizontales de 15 cm

Dentro del proyecto encontramos solado de limpieza en áreas de vigas de cimentación y áreas de los pedestales de anclaje de juegos infantiles, también el parque contempla actividades de acero en varilla 3/8" para vigas de cimentación, placa de contrapiso, pedestales para mobiliario de juegos infantiles y pedestales para baranda perimetral

Otras de las actividades del proyecto, se encuentra vigas de cimentación de 0.25m x 0.25 m de sección ubicadas en los extremos de la placa de contrapiso en sentido longitudinal, también encontramos una placa de contrapiso con espesor de 12 cm en un área de 7 metros de ancho por 15 metros de largo, dicha placa contempla acabado en pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie cuyos colores van según diseño y figuras.

Contemplamos unas cunetas en forma de V cubriendo el área de la placa para recoger las aguas lluvia, estas cunetas se caracterizan por tener una dimensión de 0.40 m x 15 m y otra en el lateral derecho de dimensión de 0.40 m x 15 m.

Para proteger las zonas verdes se tendrá una baranda metálica en tubo de 2" que incluye anticorrosivo y pintura con una longitud de 46,17 ml.

Las zonas verdes están ubicadas al rededor del parque infantil en las cuales se plantarán en tierra negra tipos de plantas como lo son: Ornamentales durantas, plantas Ixoras y Bismarckia.

En el parque infantil está ubicada una rampa en concreto de 3.000 PSI con una longitud de 2.00 m x 5.00 m y un espesor de 0.10 m, esta rampa esta reforzada con malla electrosoldada y nos dará acceso a 7 juegos infantiles que constan de: circuito de juego, modulo recreativo, carrusel, columpio inclusivo, triqui inclusivo, ábaco inclusivo y módulo de piano inclusivo.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

En el presente lapso del informe, establecido desde el 05 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades administrativas:

- El día 05 de junio del 2024 se suscribió el acta de justificación Nª2 y reinicio de obra N°1 para el contrato de obra e interventoría.
- El día 05 de junio de 2024 se recibe oficio de la interventoría con asunto "CITACIÓN COMITE TECNICO"

ACTIVIDADES OPERATIVAS

En el presente lapso del informe, establecido desde el 05 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades operativas:

ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	27,50 m3	Campoalegre
Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	3,75 m2	Campoalegre
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	326,00 kg	Campoalegre
Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	2,57 m3	Campoalegre

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	30/11/2023	28 días		
Suspensión No. 1	28/12/2023		157 días	
Reiniciación No. 1	05/06/2024	25 días		
TERMINACIÓN Cto.				
TOTAL DIAS		**53 días**	**157 días**	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Suscripción del contrato	1	17 de noviembre de 2023
Acta de inicio	1	30 de noviembre de 2023
Acta de justificación	1	28 de diciembre de 2023
Acta de suspensión	1	28 de diciembre de 2023
Acta de Justificación	2	05 de junio de 2024
Acta de reinicio No. 1	1	05 de junio de 2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	1. Se conoce los diseños y especificaciones con los ajustes realizados por la entidad el día 19 de abril del 2024. 2. Se presentó al InderHuila el personal técnico de interventoría director. 3. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado. 4. Se realizó los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales y se dio cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos), que corresponden de acuerdo con el personal que se empleó. 5. Se verificó y aprobó el personal del contratista de obra mediante formato DIH-CFLD-F12. 6. La interventoría cuenta con oficina en la carrera 4# 9-25 oficina 507 7. Se suscribió con el contratista de obra el acta de suspensión y reinicio. 8. Se realizo la revisión de las pólizas según acta de reinicio.
b). **Actividades Administrativas.**	1. Se verifica el personal del contratista de obra, tiempo de dedicación y se solicita al contratista los pagos de seguridad social los cuales se presentaran en el informe de cobro de acta parcial de interventoría.

Se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
Diego Armando Hernández Leiva	Director de Obra
Stephany Castro Sierra	Residente de Obra 1
Rodolfo Hurtado Sierra	Maestro
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE QUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la cha. Solo excavaciones manuales.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ATERIALES	Solo se han realizado actividades preliminares eplanteos y excavaciones)
CONTROL Y SEGUIMIENTO A PORTES DE SEGURIDAD SOCIAL NTEGRAL	**PLANILLA RELACIONADA- HC INGENIERIA Y ONSTRUCCIÓN INTEGRAL SAS (Consorciado)** **NRO. DE PLANILLA 30582985** PENSION: $ 42.400 SALUD: $ 17.800 ARL: $31.000 CCF: $ 17.800 Periodo pagado: 2024-06 Fecha de pago: 2024/08/02 **NRO. DE PLANILLA 30239071** PENSION: $ 1.153.000 SALUD: $ 288.300 ARL: $ 353.500 CCF: $ 288.300 Periodo pagado: 2024-06 Fecha de pago: 2024/07/10 **PLANILLA RELACIONADA- DANES INGENIEROS SAS Consorciado)** **NRO. DE PLANILLA 9469648130** PENSION: $ 1.442.300 SALUD: $ 360.700 ARL: $460.300 CCF: $ 360.700 Periodo pagado: 2024-06 Fecha de pago: 2024/07/04

	2. Se realizó la revisión de las vigencias de las pólizas del contrato de obra las cuales fueron remitidas a la entidad. 3. Se revisó y aprobó las hojas de vida y demás documentos soporte de los profesionales que intervendrán en el contrato de obra. 4. Se reviso y aprobó la reprogramación de obra según acta de reinicio.
c). **Actividades Operativas.**	En el presente lapso del informe, establecido desde el 05 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades operativas:

ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	27,50 m3	Campoalegre
Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	3,75 m2	Campoalegre
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	326,00 kg	Campoalegre
Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	2,57 m3	Campoalegre

d). **Actividades Logísticos.**	1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 2. Se midieron los ítems ejecutados por el contratista como (relleno, el área del solado y longitud del acero) según especificaciones técnicas entregadas por el INDERHUILA. 3. Se realizaron los debidos comités de obra. 4. Se vigilo las actividades realizadas por el contratista. 5. Se ha presentado los informes mensuales con sus debidos soportes.
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	Se solicito al contratista el plan de manejo ambiental.
f). **Actividades Financieras.**	Se realizo el control y seguimiento a la inversión del anticipo realizada el 17 de junio de 2024.
g). **Actividades Jurídicos.**	1. Se realiza seguimiento a pólizas y garantías


POLIZAS INICIALES

ASEGURADORA

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	61-44-101051955		23/11/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0	61-40-101018914		23/11/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2028
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS- ANULACIÓN CERTIFICADO PARA ACTUALIZACION ACTA DE INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1 ANULACIÓN	61-44-101051955		07/12/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 1 - ANULACIÓN	61-40-101018914		07/12/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2024
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-44-101051955		07/12/2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	30/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	02/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 2 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-40-101018914		07/12/2023	Predios labores y operaciones	30/11/2023	01/03/2024
				Contratistas y Subcontratistas	30/11/2023	01/03/2024
				Responsabilidad civil patronal	30/11/2023	01/03/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO	61-44-101051955		12/08/2024	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	10/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	10/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	10/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO	61-40-101019855		12/08/2024	Predios labores y operaciones	07/05/2023	10/08/2024
				Contratistas y Subcontratistas	07/05/2023	10/08/2024
				Responsabilidad civil patronal	07/05/2023	10/08/2024

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante este periodo el estado del tiempo en la vereda Vega de Oriente del municipio de Campoalegre, en el mes de junio la probabilidad de un día mojado durante el mes de junio disminuye muy rápidamente, comenzando el mes en 34 % y terminando el mes en 24 %.

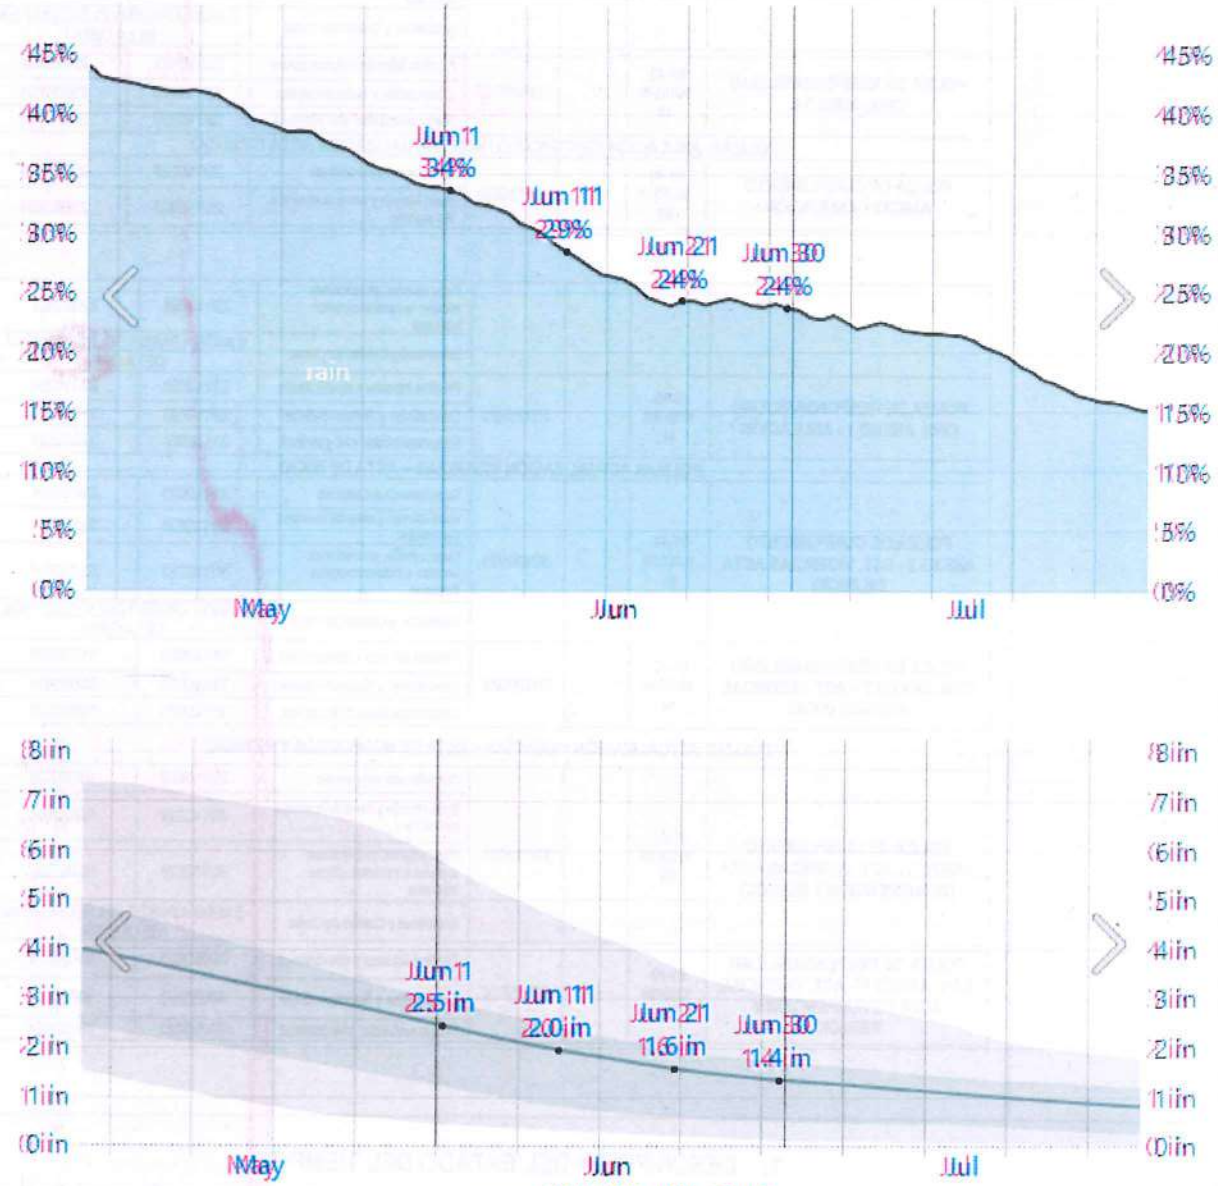

Fuente: Web Wheather Spark

28)

La precipitación media móvil de 31 días durante junio en Campoalegre está disminuyendo rápidamente, comenzando el mes con 2,5 pulgadas, cuando rara vez excede 5,8 pulgadas o cae por debajo de 0,5 pulgadas, y terminando el mes con 1,4 pulgadas, cuando rara vez excede 3,1 pulgadas o cae por debajo de 0,1 pulgadas.

2. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.		
Diseños de mezcla para base.	N/A	N/A
Compresión simple al concreto.	N/A	N/A
Ensayo de compactación de campo		

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			

Control Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			

3. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	N/A	$		$
Acta Parcial No. 1	N/A	$	$	$
Acta Parcial No. 2	N/A	$	$	$
Acta Parcial No. 3	N/A	$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$	$	$	$	$

4. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)

12/12/2023	INDERHUILA	Presentación de observaciones iniciales del proyecto por parte del contratista
19/04/2024	INDERHUILA	La entidad hace entrega de la modificación del plano estructural
06/06/2024	INDERHUILA	La entidad hace aclaraciones con respecto a inconsistencias en los planos arquitectónicos, discrepan de las especificaciones técnicas de los juegos infantiles.
12/06/2024	INDERHUILA	Presentación de propuesta por parte del contratista de obras no contemplas ajustados al terreno real del municipio de Campoalegre Vereda la Vega y Municipio de Isnos Vereda Hornitos.

5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso 3 (No.100010832))	07/06/2024	N/A	Digital - Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso 3 (No100002178.))	07/06/2024	N/A	Digital - Plataforma secop II
Actas de socialización e inicio de obra	01/12/2023	N/A	Físico
Actas de conformación de veeduría ciudadana	01/12/2023	N/A	Físico
Acta de vecindad	01/12/2023	N/A	Físico
Actas de comités (periodo del (05/06/2024) al (30/06/2024))	01/08/2024	N/A	Digital
Registros de ensayos de laboratorio (periodo del (05/06/2024) al (30/06/2024))	No se realizaron en este periodo	N/A	N/A
Registros de ensayos de calidad (periodo del (05/06/2024) al (30/06/2024))	No se realizaron en este periodo	N/A	N/A
Copia bitácora de obra (periodo del (05/06/2024) al (30/06/2024))	01/08/2024	N/A	Digital
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (05/06/2024) al (30/06/2024))	01/08/2024	N/A	Digital
Registro fotográfico de valla	01/12/2023	N/A	Digital

6. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO (R.L)	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	1.075.227.937	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO

7. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
FAIVER EDUARDO PERDOMO	$572.700	$447.400	$87.200	$	$	7936016329
DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	$208.000	$162.500	$90.500	$	$	9469021880

9. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	0 1	20-11-2023 05-12-2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/02/2024	17/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	N/A	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	0 1	20-11-2023 05-12-2023	17-11-2023	17-02-2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	2	05-12-2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	02/03/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/03/2024	02/03/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	N/A	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	2	05-12-2023	30/11/2023	01/03/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	3	07-06-2024	Cumplimiento del contrato	05/06/2024	11/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	05/06/2024	11/08/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/08/2024	11/08/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	N/A	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	3	07-06-2024	30/11/2023	11/08/2024

10. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(Describir el contenido del plano)




Ilustración No. 3 - vista del perfil de la actividad de rellano en recebo seleccionado en obra en el periodo del 05 al 30de junio de 2024.

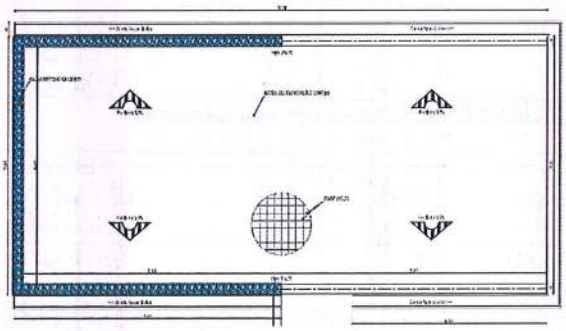


Ilustración No.4 - Vista en planta del concreto ciclópeo ejecutado en el costado izquierdo de la plaza y parte frontal y posterior de la placa, con el fin de que confinar el recebo seleccionado.




Ilustración No.5 - Vista detalle del concreto ciclópeo.

11.1 DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS – PARQUE DE LA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION
1	PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	126,80	$ 3.584,00	$ 454.451,00	0,00	$ 0,00	0,00%	126,80	$ 454.451,20	100,00%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA										
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	43,40	$ 46.338,00	$ 2.011.069,00	0,00	$ 0,00	0,00%	43,40	$ 2.011.069,20	100,00%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	27,50	$ 84.460,00	$ 2.322.650,00	27,50	$ 2.322.650,00	100,00%	27,50	$ 2.322.650,00	100,00%
3	CIMENTACIÓN										
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	110,00	$ 34.260,00	$ 3.768.600,00	3,75	$ 128.475,00	3,41%	3,75	$ 128.475,00	3,41%
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	4,05	$ 636.912,00	$ 2.579.494,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	3316,00	$ 7.782,00	$ 25.805.112,00	326,00	$ 2.536.932,00	10,00%	659,00	$ 5.128.338,00	19,87%
4	ZONA VERDE										
4.01	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 89.591,00	$ 2.508.548,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5	PLACA DE CONTRAPISO										
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 84.639,00	$ 9.310.290,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.055,00	$ 2.646.050,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 84.463,00	$ 2.364.964,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6	INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES										
6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 7.566.326,00	$ 7.566.326,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 12.887.901,00	$ 12.887.901,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 11.835.634,00	$ 11.835.634,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 13.150.968,00	$ 13.150.968,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.05	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 1.970.630,00	$ 1.970.630,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.06	Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 4.075.165,00	$ 4.075.165,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.07	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 3.515.621,00	$ 3.515.621,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
7.01	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	10,00	$ 320.614,00	$ 3.206.140,00	2,57	$ 823.978,00	25,70%	2,57	$ 823.978,00	25,70%
7.02	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	9,00	$ 157.521,00	$ 1.417.689,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTAL, COSTO DIRECTO				**$ 113.397.302,00**		**$ 5.812.035,00**			**$ 10.868.961,00**	
	Administración	%	20%		$ 22.679.460,00		$ 1.162.407,00			$ 2.173.792,00	
	Imprevistos	%	1%		$ 1.133.973,00		$ 58.120,00			$ 108.690,00	
	Utilidad	%	4%		$ 4.535.892,00		$ 232.481,00			$ 434.758,00	
	TOTAL, COSTO				$ 141.746.627,00		$ 7.265.043,00			$ 13.586.201,00	
% AVANCE DE OBRA								**5,13%**			**9,58%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

18.1. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS – PARQUE DE LA VEREDA HORNITOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION
1	PRELIMINARES										
1.01	Localización y replanteo.	M2	126,80	$ 3.584,00	$ 454.451,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA										
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	43,40	$ 46.338,00	$ 2.011.069,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	27,50	$ 84.460,00	$ 2.322.650,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3	CIMENTACIÓN										
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	110,00	$ 34.260,00	$ 3.768.600,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	4,05	$ 636.912,00	$ 2.579.494,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	3316,00	$ 7.782,00	$ 25.805.112,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
4	ZONA VERDE										
4.01	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 89.591,00	$ 2.508.548,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5	PLACA DE CONTRAPISO										
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 84.639,00	$ 9.310.290,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.055,00	$ 2.646.050,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 84.463,00	$ 2.364.964,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6	INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES										
6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 7.566.326,00	$ 7.566.326,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 12.887.901,00	$ 12.887.901,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

282

6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 11.835.634,00	$ 11.835.634,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 13.150.968,00	$ 13.150.968,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.05	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 1.970.630,00	$ 1.970.630,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.06	Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 4.075.165,00	$ 4.075.165,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
6.07	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 3.515.621,00	$ 3.515.621,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
7.01	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	10,00	$ 320.614,00	$ 3.206.140,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
7.02	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	9,00	$ 157.521,00	$ 1.417.689,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	TOTAL, COSTO DIRECTO				**$ 113.397.302,00**						
	Administración	%	20%		$ 22.679.460,00						
	Imprevistos	%	1%		$ 1.133.973,00		-				
	Utilidad	%	4%		$ 4.535.892,00						
	TOTAL, COSTO				$ 141.746.627,00						
% AVANCE DE OBRA PARQUE INFANTIL ISNOS								0,00%			0,00%
VALOR TOTAL PARQUE INFANTIL ISNOS + PARQUE INFANTIL CAMPOALEGRE					$ 283.493.254,00		$ 7.265.043,00			$ 13.586.201,00	
% AVANCE DE OBRA TOTAL PARQUE INFANTIL ISNOS + PARQUE INFANTIL CAMPOALEGRE								2,56%			4,79%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

ING. DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
DIRECTOR DE OBRA

DIEGO MAURICIO POLANIA A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

11. REGISTRO FOTOGRAFICO

RELLENO










EXCAVACIÓN MANUAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN

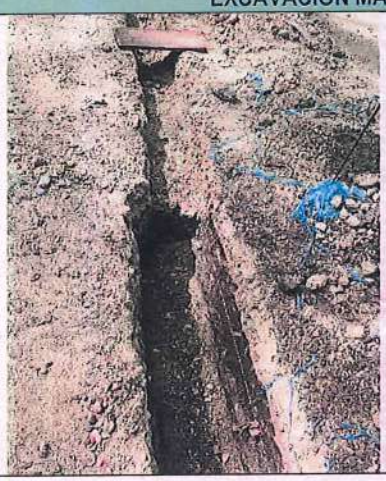







SOLADO DE LIMPIEZA





MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CICLOPEO



12. ANEXOS

- ACTAS DE COMITÉS.
- BITACORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA.

ING. DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	(01/08/2024)	ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075227937		DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	INDEPENDIENTE	Principal	calle 70 n 2w 02	NEIVA-HUILA	8710179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	752500968	9469021880	I	2024/07/10	2024/07/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000
1	CC	1075227937 POLANIA DIEGO																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$461,000
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$461,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075227937		DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	INDEPENDIENTE	Principal	calle 70 n 2w 02	NEIVA-HUILA	8710179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	752500968	9469021880	I	2024/07/10	2024/07/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000

282

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7936016329	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			23				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			813434685

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.800	$ 0	$ 562.900	$ 9.800	$ 572.700
SUBTOTALES:										$ 562.900	$ 9.800	$ 572.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439.800	$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 439.800	$ 7.600	$ 0	$ 447.400
SUBTOTALES:													$ 439.800	$ 7.600	$ 0	$ 447.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85.700	$ 85.700	$ 1.500	$ 0	$ 87.200
SUBTOTALES:									$ 85.700	$ 1.500	$ 0	$ 87.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 3.517.650				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3.517.650	$ 562.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.517.650	$ 439.800	$ 0	$ 439.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.517.650	7711430	$ 85.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.107.300

Planilla Pagada

27 Diciembre 2023
Clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Herramienta menor
Actividades: Se continua con el figurado de aceros

Director obra RES OBRA Director INT.

28 Diciembre 2023
Se firma acta de suspensión

Director obra RES OBRA Director INT.

05 Junio 2024
Se firma acta de reinicio

Director obra RES OBRA Director INT.

06 Junio 2024
clima: Seco
personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos:: Vibrocompactador y herramienta menor
Actividades: Inicio de relleno con recebo seleccionado y compactacion meganicamente

Director obra RES OBRA Director INT.

07 Junio 2024
clima: seco
personal: Ingeniero residente, Interventoria, maestro y ayudante de obra
Equipos: Vibrocompactador y herramienta menor
Actividades: continua con relleno y compactacion

Director obra RES OBRA Director INT.

22 Diciembre 2023
Clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Herramienta menor
Actividades: Inicio de figurado de aceros para flejes

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

23 Diciembre 2023
No se realizaron labores porque no hay actividades programadas

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

24 Diciembre 2023
No se realizaron labores porque no hay actividades programadas

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

25 Diciembre 2023
No se realizaron labores por dia feriado

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

26 Diciembre 2023
Clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Herramienta menor
Actividades: Se continua con el figurado de aceros

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

Scanned with CamScanner

08 Junio 2024
No se realizaron labores porque no hay actividades programadas

Director de obra | RES OBRA | DIRECTOR INT.

09 Junio 2024
No se realizaron labores por dia dominical

Director de obra | RES OBRA | DIRECTOR INT.

10 Junio 2024
clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, maestro y ayudante de obra
Equipos: vibrocompactador y herramienta menor
Actividades: se continua con relleno en recebo seleccionado y compactacion mecanicamente

Director obra | RES OBRA | DIRECTOR INT.

11 Junio 2024
clima: Nublado
personal: Ingeniero residente, ingeniero director, Interventoria, Maestro y ayudantes de obra
Equipos: Vibrocompactador y herramienta menor
Actividades: se continua con relleno y compactacion mecanicamente.
Se recibio la visita de la veeduria de la comunidad, durante la cual se informaron y demostraron los avances de la obra

Director obra | RES OBRA | DIRECTOR INT.

12 Junio 2024
Clima: Lluvia intensa
No se realizaron labores por lluvia intensa

Director obra | RES OBRA | DIRECTOR INT.

Scanned with CamScanner

13 Junio 2024
Clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: delimitacion de zonas en las que van el solado de concreto de viga de cimentacion

Director obra | RES OBRA | DIRECTOR INT.

14 Junio 2024
Clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: se continua con la actividad de solado de concreto de viga de cimentacion

Director obra | RES OBRA | DIRECTOR INT.

15 Junio 2024
No se realizaron labores porque ya hay actividades programadas

Director obra | RES OBRA | DIRECTOR INT.

16 Junio 2024
No se realizaron labores por dia dominical

Director obra | RES. OBRA | DIRECTOR INT.

17 Junio 2024
Clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de solado de concreto de viga de cimentacion

Director obra | RES OBRA. | DIRECTOR INT.

18 Junio 2024
clima: seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, maestro y ayudantes de obra.
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de solado de concreto de viga de cimentacion

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

19 Junio 2024
clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestro y ayudante de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se inicia con la respectiva ubicacion de los aceros de refuerzo.
Se recibio la visita de la veeduria de la comunidad, durante la cual se informaron y demostraron los avances de la obra

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

20 Junio 2024
clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: herramienta menor
Actividades: Se continua con la ubicacion y separacion de los aceros de refuerzo

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

21 Junio 2024
clima: Lluvia intensa
No se realizaron labores por Lluvia intensa

Director obra. RES OBRA DIRECTOR INT.

Scanned with CamScanner

22 Junio 2024
No se realizaron labores porque no hay actividades programadas

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

23 Junio 2024
No se realizaron labores por dia dominical

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

24 Junio 2024
clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, maestro y ayudantes de obra
Actividades: se continua con la ubicacion y separacion de los aceros de refuerzo
Equipos: herramienta menor

Director obra RES OBRA DIRECTOR INTER

25 Junio 2024
clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se inicia con la ubicacion y delimitacion de la zona donde se hara el muro de contencion en concreto ciclopeo

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

26 Junio 2024
clima: Nublado
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de muro de contencion en concreto ciclopeo.

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

27 Junio 2024
clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestros y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de muro de contencion en concreto ciclopeo

Director obra RES OBRA Director INT.

28 Junio 2024
clima: Seco
Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director, Interventoria, maestro y ayudantes de obra
Equipos: Mezcladora de concreto y herramienta menor
Actividades: Se continua con la actividad de muro de contencion en concreto ciclopeo

Director obra RES OBRA DIRECTOR INT.

Scanned with CamScanner

29 Junio 2023
No se realizaron labores por día feriado

Director obra — RES OBRA — Director INT.

30 Junio 2023
No se realizaron labores por día dominical

Director obra. — RES OBRA — Director INT.

DEL 01 - Julio AL 30 Julio 2024

No se Realizaron Labores de obra en el Frente de la vega de oriente del Municipio de Campoalegre - Huila, debido a que Se en los meses. Diciembre y Junio, se realizaron las Actividades contractuales de localizacion y replanteo, Excavaciones, relleno en recebo seleccionado, Figurado Acero de refuerzo, y concreto. Ciclopeo. y solado, actividades que se realizaron sin sobrepasar las cantidades contratadas, asi las cosas a la fecha en el mes de Julio, no hay Nada Aprobado ha Modificaciones de mayores y menores cantidades Items no previstos, razon por la cual no se Logra Avanzar Actividades en este periodo de Julio,

Director obra — RES OBRA — Director INT.

295

Neiva, 05 de junio de 2024

Señor
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
INTERVENTORÍA
Neiva Huila

Referencia: Contrato de Obra No. CSAMCIH435 DE 2023.

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Asunto: Reprogramación a partir del acta de reinicio

Cordial Saludo,

Respetada entidad, el suscrito Diego Armando Hernández Leiva, identificado con cedula No. 1.079.182.594 expedida en Campoalegre – Huila, representante legal del CONSORCIO DANES-HC, en calidad de Contratista, presento reprogramación a partir de fecha del acta de reinicio 05 de junio de 2024

Agradezco su atención prestad.


Atentamente,

DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
CONSORCIO DANES-HC
NIT. 901.774.192-5
REPRESENTANTE LEGAL

Recibo 5/06/2024

Dirección: Calle 77 No. 1e – 20 / Barrio Combeima / Neiva Huila
Correo: consorciodanes.hc@gmail.com
Teléfono: 315 374 6456

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		1	INICIO DE OBRA-PARQUE CAMPOALEGRE	0 días	mié 5/06/24	mié 5/06/24	
2		2	**PRELIMINARES**	**1 día**	**mié 5/06/24**	**mié 5/06/24**	
3		2.1	Localización y replanteo.	1 día	mié 5/06/24	mié 5/06/24	
4		3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**7 días**	**jue 6/06/24**	**vie 14/06/24**	
5		3.1	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	2 días	jue 6/06/24	vie 7/06/24	2
6		3.2	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	2 días	mié 12/06/24	vie 14/06/24	26
7		4	**CIMENTACIÓN**	**7 días**	**vie 14/06/24**	**lun 24/06/24**	
8		4.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	2 días	vie 14/06/24	lun 17/06/24	6
9		4.2	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	3 días	jue 20/06/24	lun 24/06/24	10
10		4.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	2 días	mar 18/06/24	mié 19/06/24	8
11		5	**ZONA VERDE**	**1 día**	**mié 17/07/24**	**mié 17/07/24**	
12		5.1	Jardines perimetrales	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/24	15
13		6	**PLACA DE CONTRAPISO**	**17 días**	**lun 24/06/24**	**mar 16/07/24**	
14		6.1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	4 días	lun 24/06/24	vie 28/06/24	9
15		6.2	Pintura en acrilico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	3 días	vie 12/07/24	mar 16/07/24	27
16		6.3	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	3 días	vie 28/06/24	mié 3/07/24	14
17		7	**INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**	**5 días**	**jue 4/07/24**	**mié 10/07/24**	
18		7.1	suministro, transporte e instalacion de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	jue 4/07/24	mié 10/07/24	16
19		7.2	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	jue 4/07/24	mié 10/07/24	16
20		7.3	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	jue 4/07/24	mié 10/07/24	16
21		7.4	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	jue 4/07/24	mié 10/07/24	16
22		7.5	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	jue 4/07/24	mié 10/07/24	16
23		7.6	Suministro, transporte e instalación de modulo abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	jue 4/07/24	mié 10/07/24	16
24		7.7	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	jue 4/07/24	mié 10/07/24	16
25		8	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**30 días**	**sáb 8/06/24**	**mié 17/07/24**	
26		8.1	Muro de contención en concreto ciclopeo - 3000 psi	3 días	sáb 8/06/24	mié 12/06/24	5
27		8.2	Baranda metalica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	2 días	mié 10/07/24	vie 12/07/24	24
28		8.3	FIN DE OBRA-PARQUE CAMPOALEGRE	0 días	mié 17/07/24	mié 17/07/24	12
29							
30		1	INCIO DE OBRA-PARQUE ISNOS.	0 días	lun 24/06/24	lun 24/06/24	
31		2	**PRELIMINARES**	**1 día**	**lun 24/06/24**	**lun 24/06/24**	
32		2.1	Localización y replanteo.	1 día	lun 24/06/24	lun 24/06/24	30
33		3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**7 días**	**mar 25/06/24**	**jue 4/07/24**	

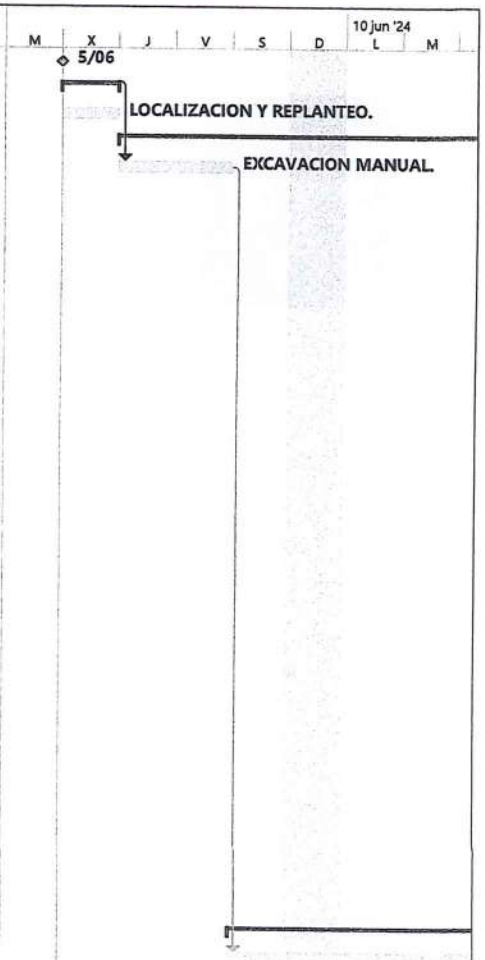

Proyecto: CONSORCIO DANES-HC
Fecha: mie 05/06/24


Tarea | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Hito externo
División | Hito inactivo | Resumen manual | Fecha límite
Hito | Resumen inactivo | solo el comienzo | Progreso
Resumen | Tarea manual | solo fin | Progreso manual
Resumen del proyecto | solo duración | Tareas externas


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
34		3.1	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	2 días	mar 25/06/24	mié 26/06/24	32
35		3.2	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	2 días	mar 2/07/24	jue 4/07/24	55
36		4	**CIMENTACIÓN**	**7 días**	**jue 4/07/24**	**vie 12/07/24**	
37		4.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	2 días	jue 4/07/24	sáb 6/07/24	35
38		4.2	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	3 días	mié 10/07/24	vie 12/07/24	39
39		4.3	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	2 días	lun 8/07/24	mar 9/07/24	37
40		5	**ZONA VERDE**	**1 día**	**lun 5/08/24**	**mar 6/08/24**	
41		5.1	Jardines perimetrales	1 día	lun 5/08/24	mar 6/08/24	44
42		6	**PLACA DE CONTRAPISO**	**17 días**	**sáb 13/07/24**	**lun 5/08/24**	
43		6.1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	4 días	sáb 13/07/24	jue 18/07/24	38
44		6.2	Pintura en acrilico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	3 días	jue 1/08/24	lun 5/08/24	56
45		6.3	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	3 días	jue 18/07/24	mar 23/07/24	43
46		7	**INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**	**5 días**	**mar 23/07/24**	**lun 29/07/24**	
47		7.1	suministro, transporte e instalacion de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24	45
48		7.2	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24	45
49		7.3	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24	45
50		7.4	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24	45
51		7.5	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24	45
52		7.6	Suministro, transporte e instalación de modulo abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24	45
53		7.7	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	5 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24	45
54		8	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**30 días**	**jue 27/06/24**	**mar 6/08/24**	
55		8.1	Muro de contención en concreto ciclopeo - 3000 psi	3 días	jue 27/06/24	mar 2/07/24	34
56		8.2	Baranda metalica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	2 días	mar 30/07/24	mié 31/07/24	53
57		8.3	FIN DE OBRA-PARQUE ISNOS	0 días	mar 6/08/24	mar 6/08/24	41

10 jun '24
M X J V S D L M

Proyecto: CONSORCIO DANES-HC
Fecha: mie 05/06/24


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

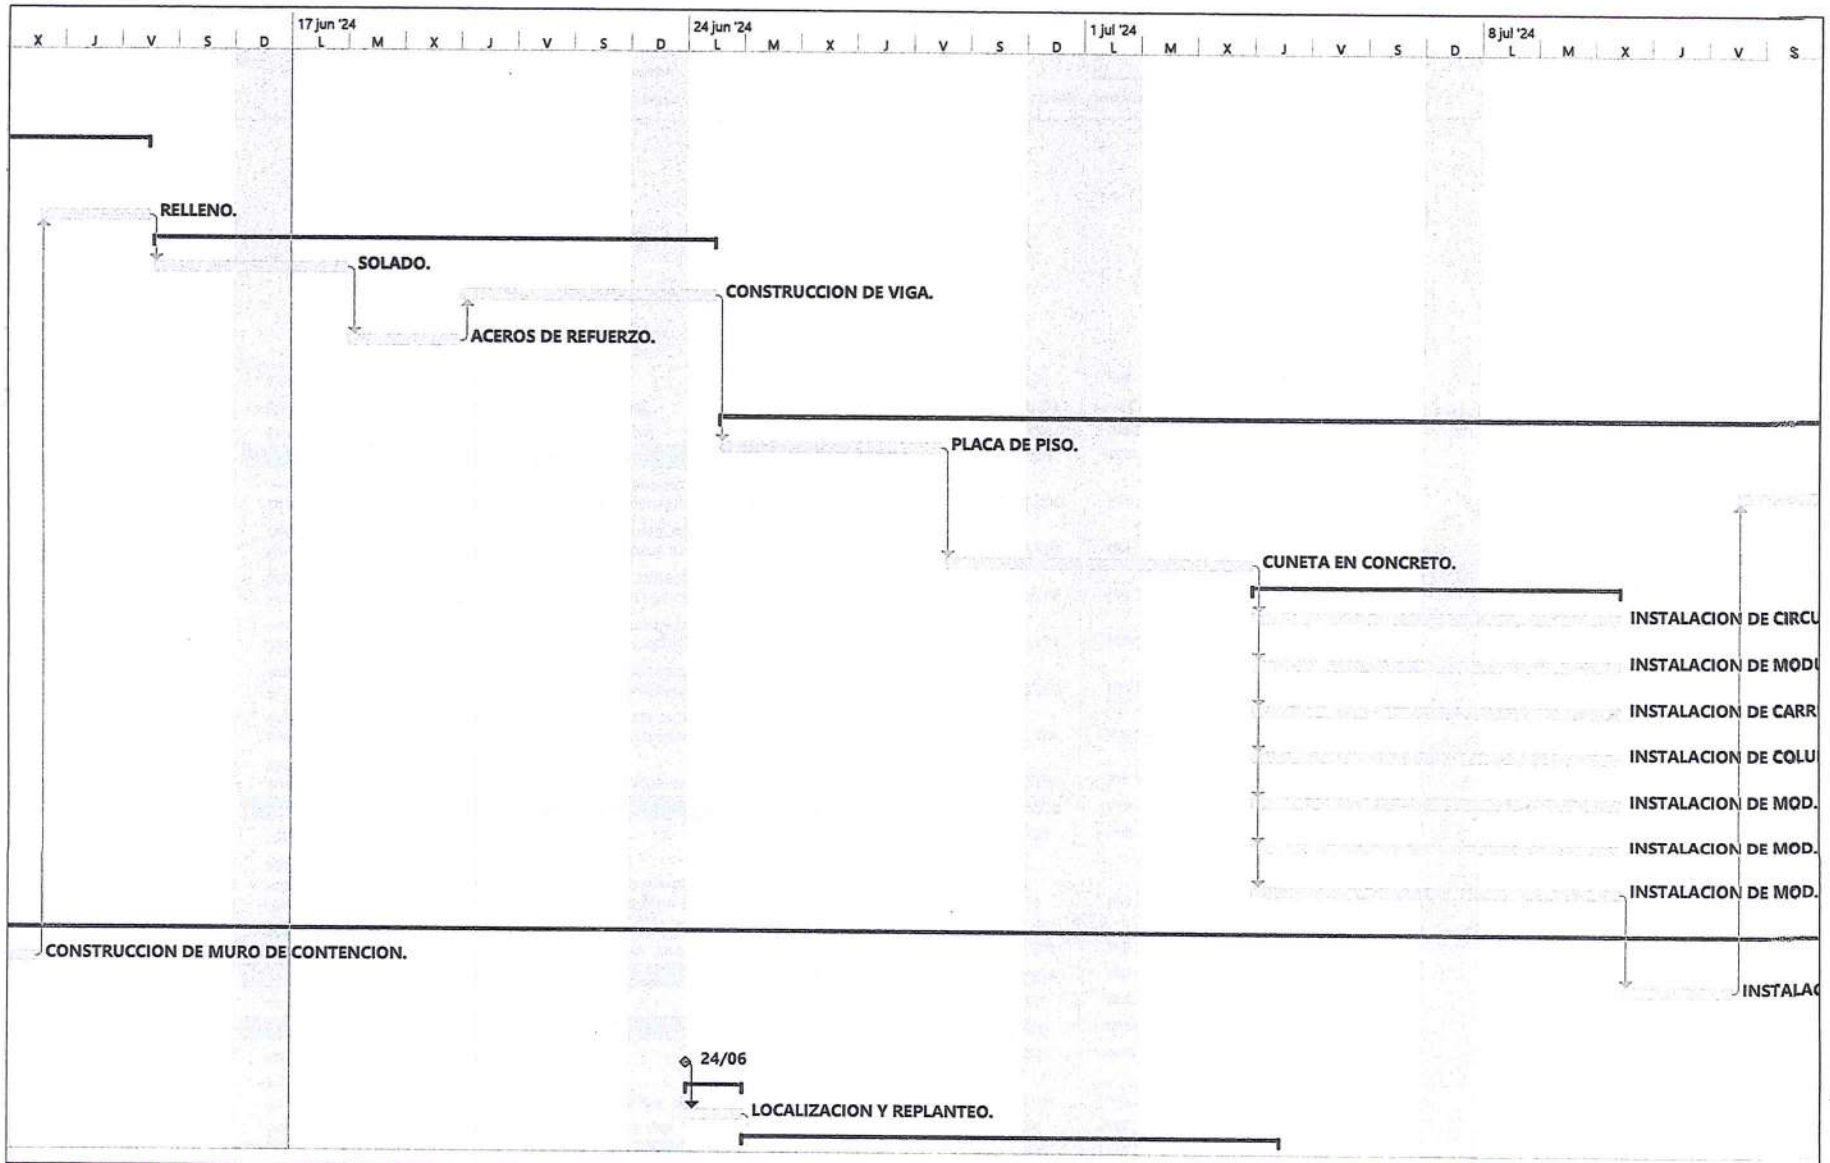
17 jun '24
24 jun '24
1 jul '24
8 jul '24
X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S
RELLENO.
SOLADO.
CONSTRUCCION DE VIGA.
ACEROS DE REFUERZO.
PLACA DE PISO.
CUNETA EN CONCRETO.
INSTALACION DE CIRCU
INSTALACION DE MODU
INSTALACION DE CARR
INSTALACION DE COLU
INSTALACION DE MOD.
INSTALACION DE MOD.
INSTALACION DE MOD.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION.
INSTALAC
24/06
LOCALIZACION Y REPLANTEO.
Proyecto: CONSORCIO DANES-HC
Fecha: mie 05/06/24
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

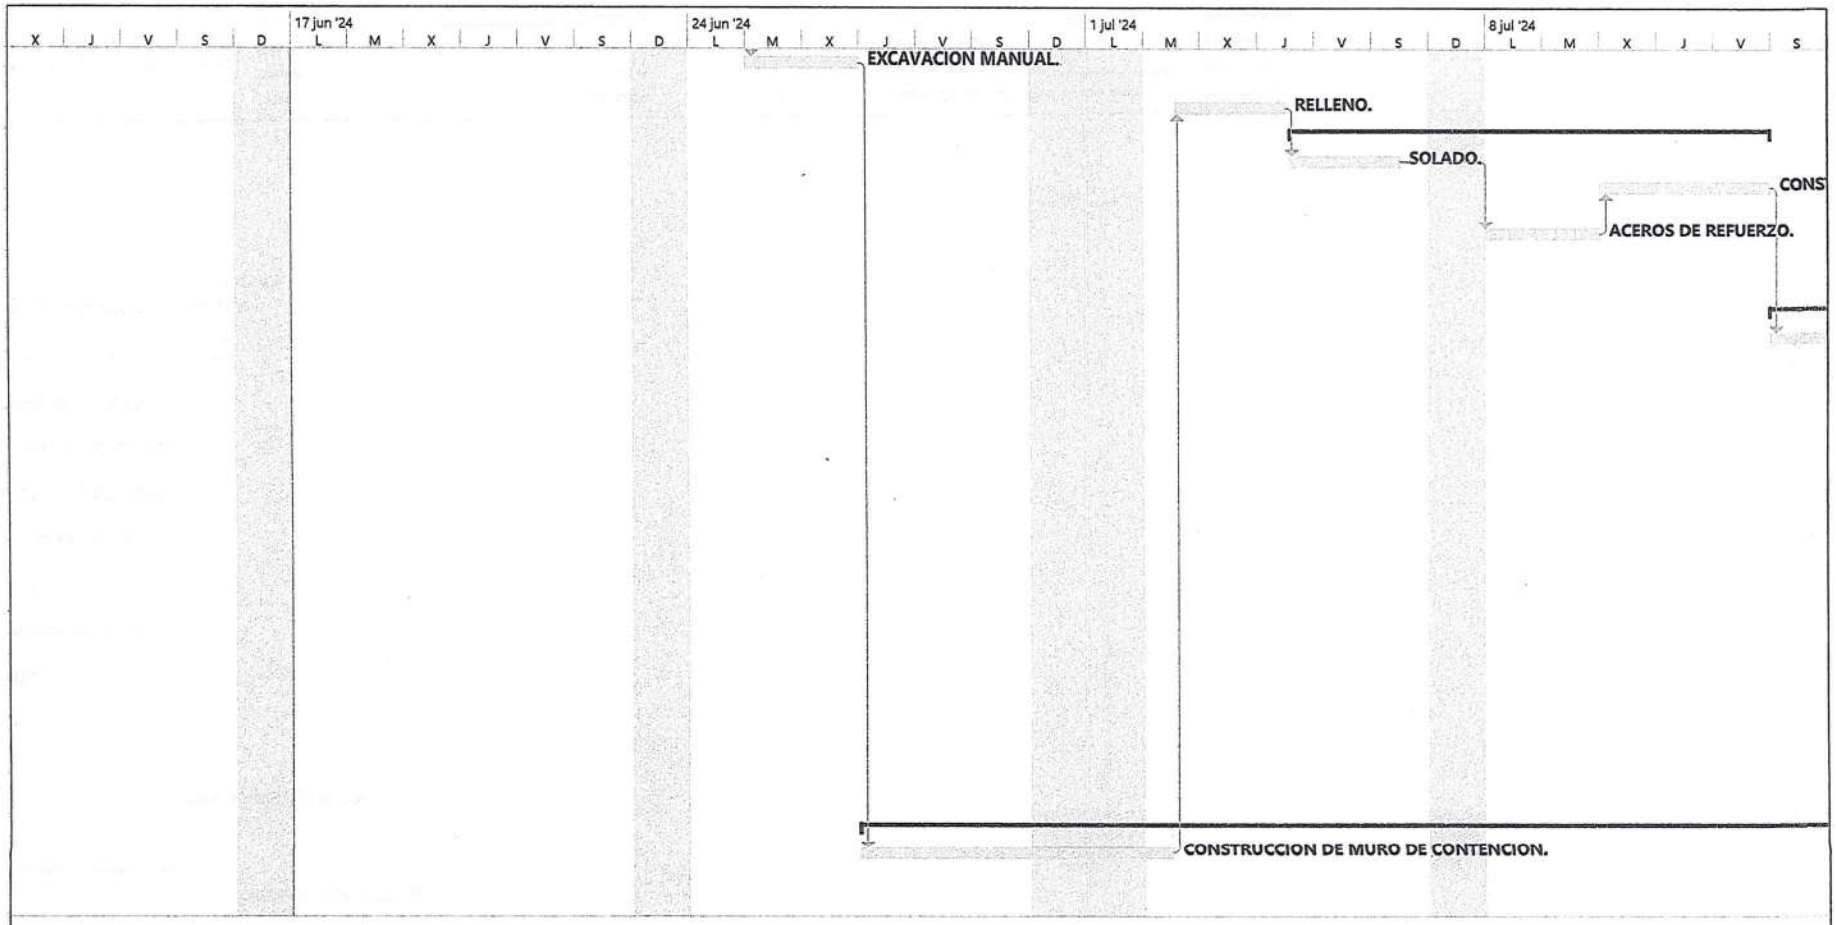


Proyecto: CONSORCIO DANES-HC
Fecha: mie 05/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

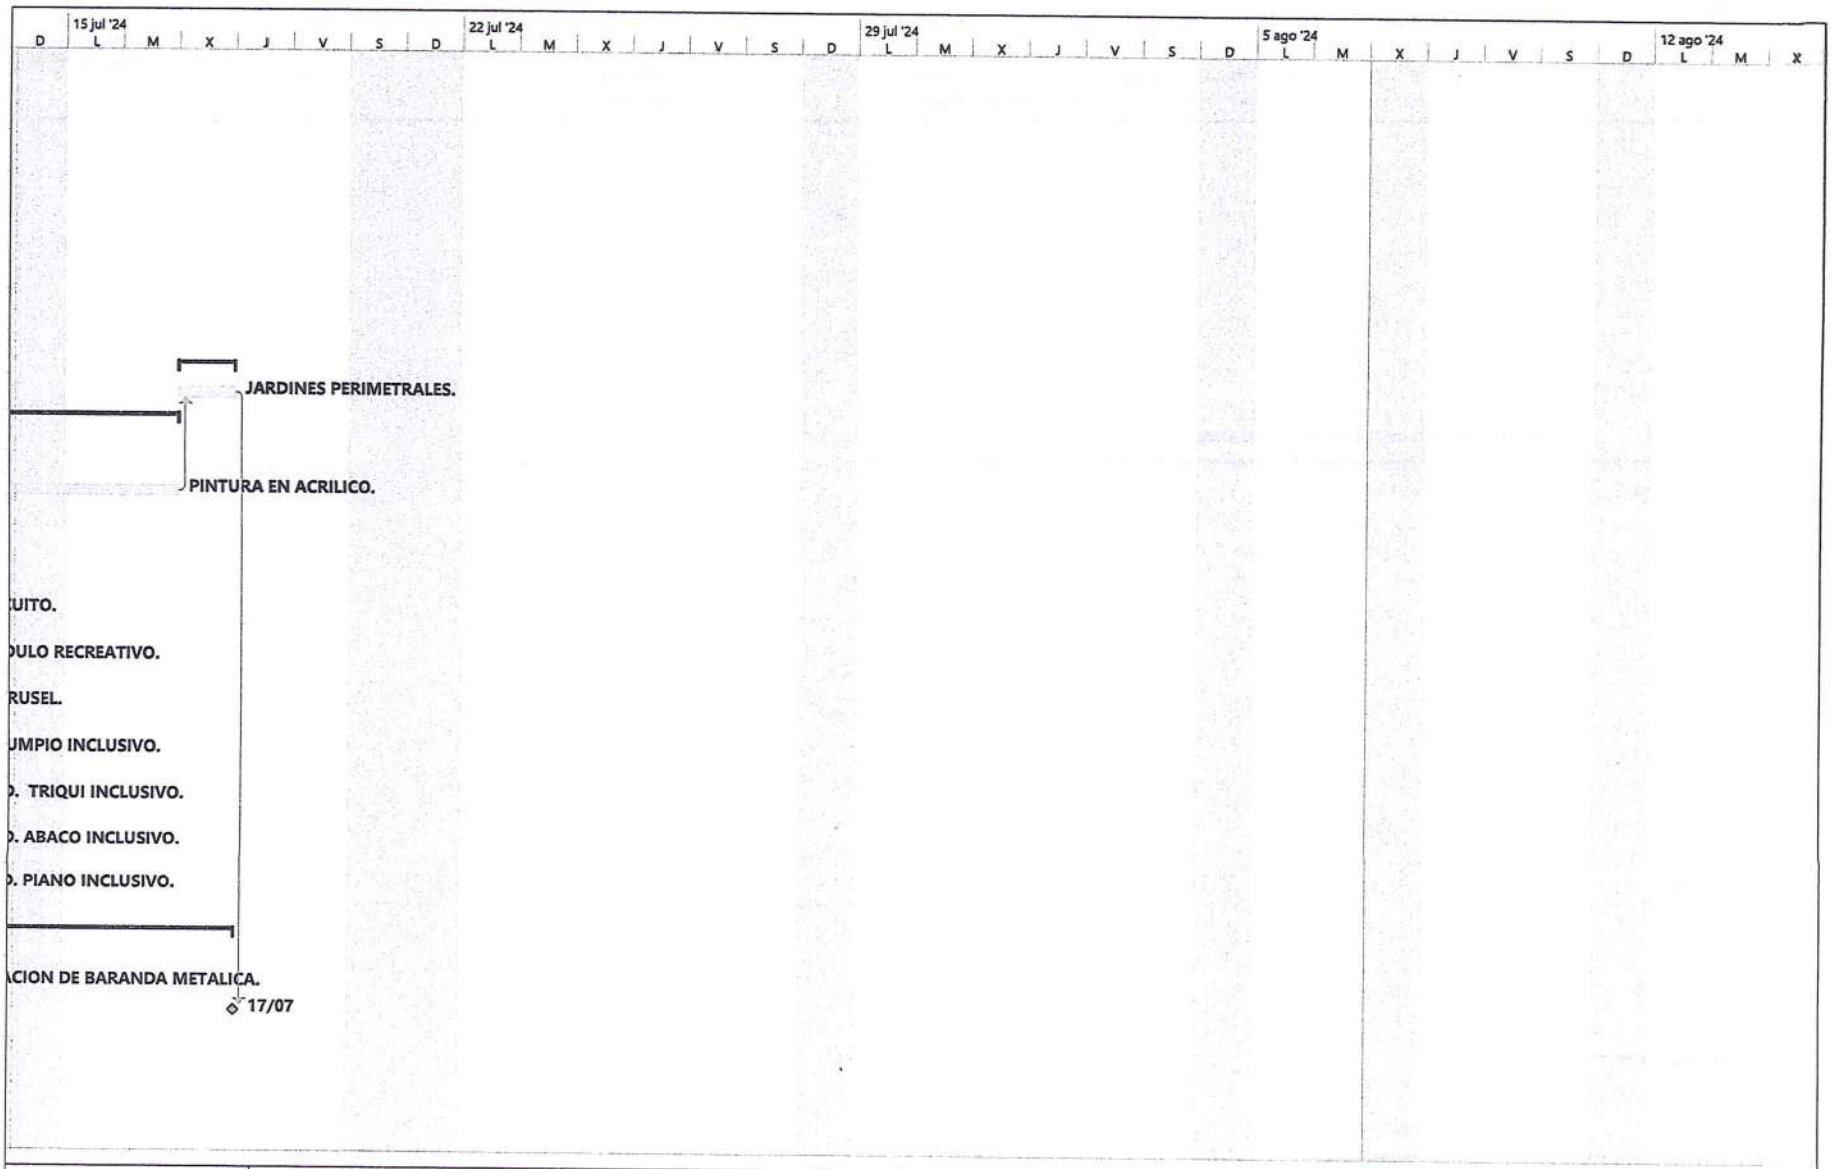

Proyecto: CONSORCIO DANES-HC
Fecha: mie 05/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			

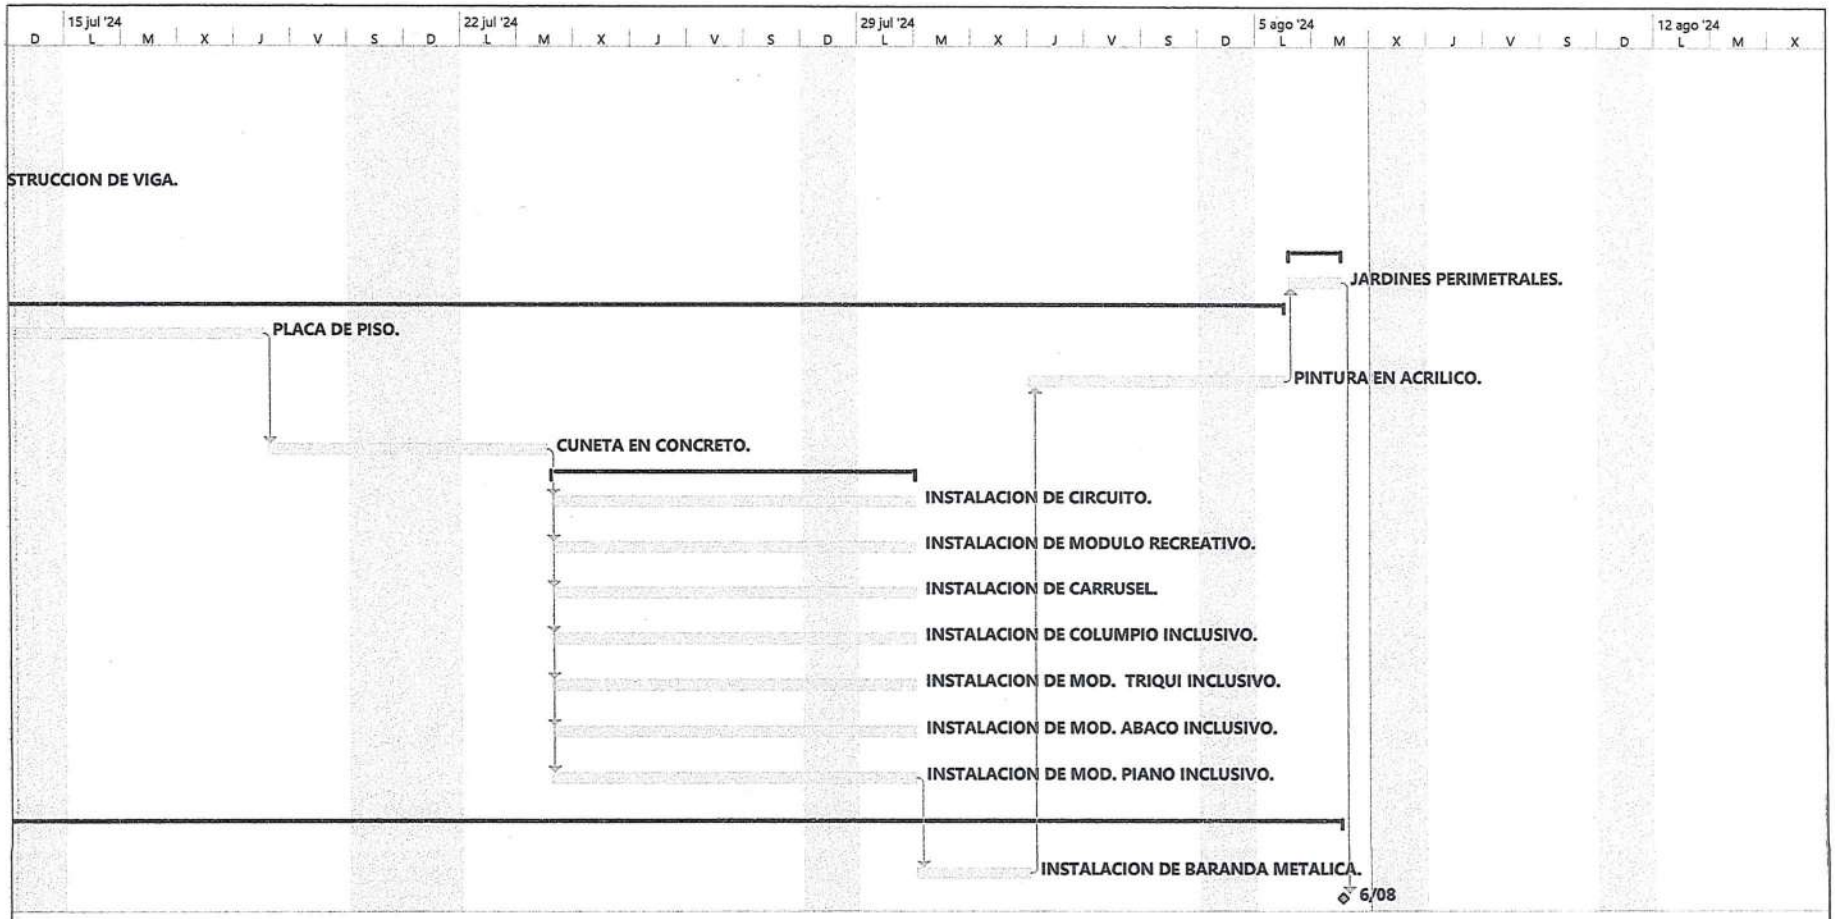

Proyecto: CONSORCIO DANES-HC
Fecha: mie 05/06/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			

Neiva, 10 de Julio de 2024

Arquitecto
YOVANY PEÑA FIERRO
Gestión de Infraestructura deportiva
Ciudad

ASUNTO: Designación Apoyo a Supervisión Contrato.

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera del Anexo de condiciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Electrónico No. CDIH143 de 2024, de manera atenta le informo que ha sido designado para brindar Apoyo a la Supervisión del siguiente contrato:

ITEM	CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
1	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH414 DE 2023	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA -CC: 7.711.430	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Es importante tener en cuenta, que quienes ejercen el apoyo a la supervisión de contratos, deberán efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del contrato citado, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato en los términos, condiciones y especificaciones pactadas. Esto como garantía del buen uso, manejo e inversión de los dineros públicos y demás recursos del Estado que se han puesto a disposición del contratista.

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Por lo antèrior, es necesario que, al momento de asumir las actividades de apoyo a la supervisión, conozca y consulte de manera permanente los documentos que hacen parte del contrato mencionado, que se encuentran publicados en el SECOP II proceso No. **IPMCIH008-2023**, los demás los ubicará en el expediente físico del contrato y que se encuentran en el archivo de la entidad de igual manera se debe presentar informe mensual de dicha supervisión al INDERHUILA.

La entidad, estará atenta al apoyo que requiera para el ejercicio de la actividad de supervisión.

Atentamente,

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
Director

Vo. Bo. JAIME ENRIQUE JIMENEZ LÓPEZ
Asesor Jurídico Externo

Acepto:
YOVANY PEÑA FIERRO
Contratista Inderhuila

Neiva,10 de Julio de 2024

Arquitecto
YOVANY PEÑA FIERRO
Gestión de Infraestructura deportiva
Ciudad

ASUNTO: Designación Apoyo a Supervisión Contrato.

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera del Anexo de condiciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Electrónico No. CDIH143 de 2024, de manera atenta le informo que ha sido designado para brindar Apoyo a la Supervisión del siguiente contrato:

ITEM	CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
1	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM416 DE 2023	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA -RL. JAVIER BARRERO MOSSOS -NIT: 891.101.100-5	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN 1 CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA."

Es importante tener en cuenta, que quienes ejercen el apoyo a la supervisión de contratos, deberán efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del contrato citado, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato en los términos, condiciones y especificaciones pactadas. Esto como garantía del buen uso, manejo e inversión de los dineros públicos y demás recursos del Estado que se han puesto a disposición del contratista.

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Por lo anterior, es necesario que, al momento de asumir las actividades de apoyo a la supervisión, conozca y consulte de manera permanente los documentos que hacen parte del contrato mencionado, que se encuentran publicados en el SECOP II proceso No. **IHCM018-2023**, los demás los ubicará en el expediente físico del contrato y que se encuentran en el archivo de la entidad de igual manera se debe presentar informe mensual de dicha supervisión al INDERHUILA.

La entidad, estará atenta al apoyo que requiera para el ejercicio de la actividad de supervisión.

Atentamente,

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
Director

Vo. Bo. JAIME ENRIQUE JIMENEZ LÓPEZ
Asesor Jurídico Externo

Acepto:
YOVANY PEÑA FIERRO
Contratista Inderhuila
