INFORME DE SUPERVISION N°1

CONVENIO	
No.	
ENTIDAD EJECUTORA	
OBJETO DEL CONVENIO	
VALOR CONVENIO	
VALOR ADICIONAL	
PLAZO INICIAL	
PLAZO ADICIONAL	
ACTA DE INICIO	
ACTA DE SUSPENSIÓN	
ACTA DE REINICIACIÓN	
FECHA DE VENCIMIENTO	
CONTRATO DE OBRA	
No.	CONTRATO DE OBRA No. SS-067-2020
CONTRATISTA	GERPRO INGENIERIA S.A.S
OBJETO	"ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MONTERÍA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA, COMO HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR CONTRATO	TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCT ($3.837.225.133,00)
VALOR ADICIONAL	-
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	-
ACTA DE SOCIALIZACIÓN	-
FECHA DE ACTA DE INICIO SEGÚN ORDEN DE AUTORIZACION	24 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:(Según acta de inicio):	24 DE JUNIO DE 2020

INFORME DE SUPERVISION N°1

CONTRATO DE OBRA	
No.	CONTRATO DE OBRA No. SS-078-2020
CONTRATISTA	KATHLEEN DIAZ HOYOS
OBJETO	"EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACION DE AREAS NECESARIAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL ANALISIS DE LAS PRUEBAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 936.783.885,00)
VALOR ADICIONAL	-
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	-
ACTA DE SOCIALIZACIÓN	-
FECHA DE ACTA DE INICIO SEGÚN ORDEN DE AUTORIZACION	24 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:(Según acta de inicio):	24 DE JUNIO DE 2020

INFORME DE SUPERVISION N°1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
No.	CONTRATO DE CONSULTORIA No. SS-095-2020
CONTRATISTA	BUSERCO SAS
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID -19) A TRAVÉS DE: "LA ADECUACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MONTERÍA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA, COMO HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 "EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACION DE AREAS NECESARIAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL ANALISIS DE LAS PRUEBAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."
VALOR CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.461.376.592)
VALOR ADICIONAL	-
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIONAL	-
FECHA DE ACTA DE INICIO SEGÚN ORDEN DE AUTORIZACION	24 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:(Según acta de inicio):	24 DE JUNIO DE 2020

INFORME DE SUPERVISION N°1

SUPERVISIÓN	
SUPERVISOR	CILIA TOBIAS CARRASCAL Y WALTER HERNAN GOMEZ REYES
PERIODO DEL INFORME	DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2020
FECHA DEL INFORME	24 DE MAYO DE 2020

INFORME DE SUPERVISION N°1

1. ANTECEDENTES

El presente proyecto de inversión tiene como propósito la adecuación del centro de convenciones de la ciudad de montería - departamento de cordoba, como hospital de campaña para atención de pacientes con covid-19 y la ejecución de obras civiles y arquitectónicas de adecuación y rehabilitación de áreas necesarias del laboratorio de salud pública del departamento de córdoba, para el análisis de las pruebas en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19 en el departamento de córdoba."

La pandemia de coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Desde que su aparición en hacía a finales del año pasado, el virus ha llegado a cada continente, excepto a la Antártida. Los casos aumentan a diario en África, las Américas, y Europa. Los países se encuentran en una carrera contra la propagación del virus, haciendo pruebas y dando tratamiento a los pacientes, rastreando los que tuvieron contacto, limitando los viajes, poniendo en cuarentena a los ciudadanos y cancelando grandes reuniones como los eventos deportivos, los conciertos y las escuelas. Debido a lo anterior el Gobierno colombiano ha destinado recursos para hacer frente a esta pandemia a través de la construcción, instalación, adecuación, de hospitales de campaña para la atención y mitigación del virus covid-19.
De la mano con lo dicho anteriormente y, de conformidad con las necesidades identificadas por medio de la modalidad de contratación directa (proyecto de urgencia manifiesta) se adjudicó **a GERPRO INGENERIA S.A.S** el contrato de obra Nº SS-067-2020 cuyo objeto es: "ADECUACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MONTERÍA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA, COMO HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", el cual tiene como representante legal al ingeniero ANDRES FELIPE VILLA CESPEDES, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.269.135, con un valor de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCT ($3.837.225.133,00) y con un plazo de dos (2) meses contados a partir del acta de Inicio según orden de autorización.

De igual manera se adjudicó a **KATHLEEN DIAZ HOYOS** el contrato de obra Nº SS-078-2020 cuyo objeto es: "EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACION DE AREAS NECESARIAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL ANALISIS DE LAS PRUEBAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.", el cual tiene como representante legal a la KATHLEEN DIAZ HOYOS, con un valor de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 936.783.885,00) y con un plazo de dos (2) meses contados a partir del acta de Inicio según orden de autorización.

INFORME DE SUPERVISION N°1

Para realizarle la vigilancia a las obras Secretaría de Infraestructura y la Secretaria de Desarrollo de la Salud por medio de la modalidad de contratación directa ADJUDICO a BUSERCO S.A.S el contrato de interventoría Nº SS-078-2020 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID -19) A TRAVÉS DE: "LA ADECUACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE MONTERÍA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA, COMO HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 "EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACION DE AREAS NECESARIAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL ANALISIS DE LAS PRUEBAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA." Y con un plazo de dos (2) meses.

INFORME DE SUPERVISION N°1

CONTRATO DE OBRA SS-067-2020

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO DE CONTRATO DE OBRA SS-067-2020

La localización del proyecto para la adecuación de las instalaciones del centro de convenciones es el municipio de Montería, capital del departamento de Córdoba, ubicado al noroccidente del país en la Región Caribe colombiana. Al norte limita con el municipio de Cereté, Puerto Escondido y San Pelayo; al este con San Carlos y Planeta Rica; al sur con Tierralta y Valencia; al oeste con el departamento de Antioquia y los municipios de Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas.

El sitio a intervenir se encuentra ubicado al norte de la ciudad específicamente en la carrera 6 con calle 77. En longitud 75°51'25.06" W latitud: 8°47'23.80"

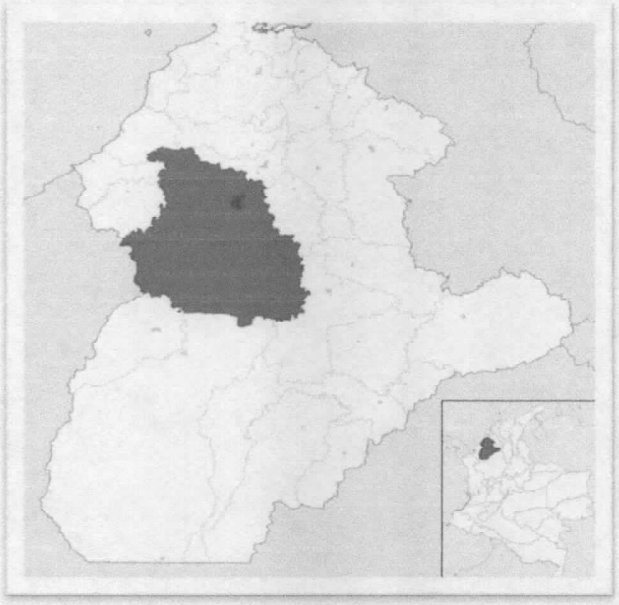


Ilustración 1. Localización general del proyecto

INFORME DE SUPERVISION N°1



Ilustración 2. Localización especifica del proyecto

3. DESARROLLO DE LOS CONTRATOS

- En fecha 24 de abril se realizó acta de inicio según orden de autorización de los contratos de obra e interventoría.
- En fecha 11 de mayo el contratista de obra GERPRO INGENIERIA S.A.S realizó acta de mayores y menores cantidades teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al presupuesto manteniendo y conservando el valor total del proyecto.

INFORME DE SUPERVISION N°1

4. PÓLIZAS: CONTRATO DE INTERVENTORIA

En la siguiente tabla se presentan los amparos y montos que cubren las garantías de las Pólizas del contrato de interventoría:

POLIZAS DE CONTRATO DE INTERVENTORIA						
					VIGENCIAS	
PÓLIZA No.	AMPAROS	%	CONDICIONES	VALORES ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
Pólizas de Cumplimiento M-100118640 de fecha 17/07/2020 expedida por la Aseguradora SEGUROS MUNDIAL la cual se encuentran ajustada al Contrato inicial de Interventoria No.SS-095-2020	Cumplimiento General Del Contrato	10	Cláusula sexta	$ 222.266.509,20	09/07/2020	24/03/2021
	Salario, Prestaciones E Indemnizaciones	10	Cláusula Sexta	$ 222.266.509,20	09/07/2020	24/09/2023
	Calidad Del Servicio.	10	Cláusula Sexta	$ 222.266.509,20	24/09/2020	24/09/2025

5. INFORMACION FINANCIERA:


A la fecha la Gobernación de Córdoba no ha realizado pagos al contratista de interventoría.

6. PORCENTAJE DE AVANCE DE CONTRATO DE OBRA SS-0067-2020

INFORME DE SUPERVISION N°1

PERIODO	% PROGRAMADO	% ACUMULADO EJECUTADO
24 de abril al 24 de mayo de 2020	44.20	55.20

Este informe se presenta dentro del marco del Contrato de Obra Nº **SS-067-2020,** el cual a la fecha presenta el siguiente porcentaje de avance y actividades ejecutadas.

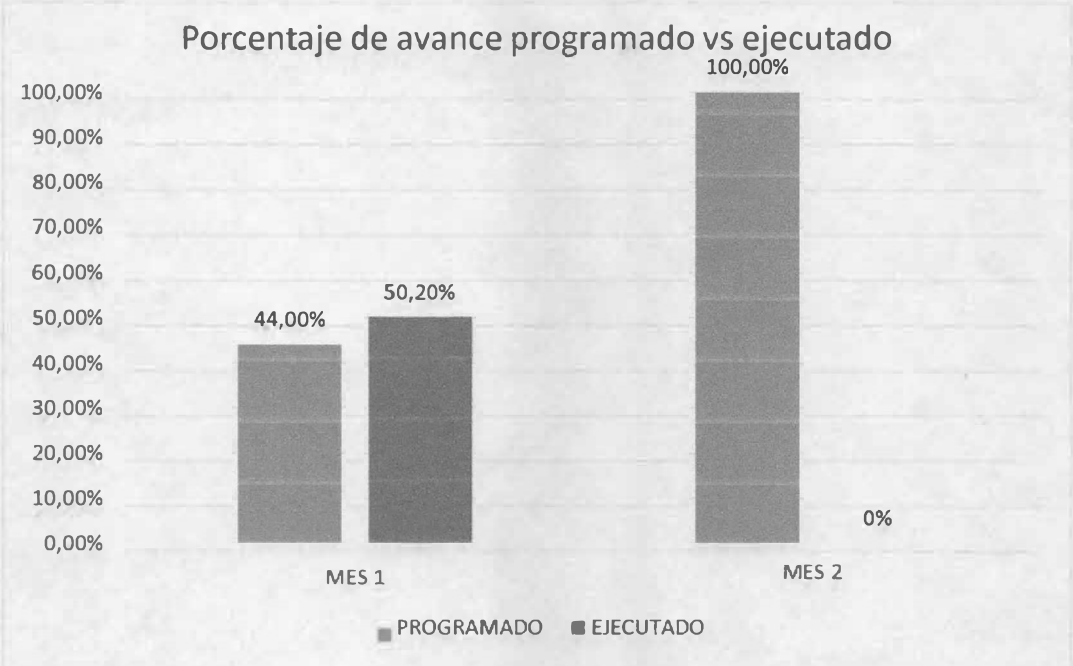

Grafica 1. Porcentaje de avance programado vs ejecutado

INFORME DE SUPERVISION N°1



Grafica 2. Comparativo de avance programado vs ejecutado financiero.

De acuerdo a esto podemos verificar que a corte realizado el 24 de mayo, estableciendo porcentaje completado de 44.20% según la programación inicial y el porcentaje físico completado (porcentaje ejecutado) de 55.20%, podemos verificar que las actividades que más han presentado ejecución son las actividades de mampostería y revoques, carpintería metálica y en madera y las actividades de instalaciones eléctricas.

INFORME DE SUPERVISION N°1

7. ACTAS SUSCRITAS Y OTROS DOCUMENTOS.

ACTAS Y OTROS DOCUMENTOS	FECHA SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO SEGÚN ORDEN DE AUTORIZACION	24 DE ABRIL DE 2020
ACTA DE REUNIÓN NO.1 VISITA DE OBRA N°1	01 DE MAYO DE 2020
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA	11 DE MAYO DE 2020

8. ANEXOS

Toda la documentación mencionada en este informe se encuentra en las respectivas carpetas de los contratos de obra e interventoría.


9. OBSERVACIONES:

- Porcentaje de avance es de 44.20% según la programación inicial y el porcentaje físico completado (porcentaje ejecutado) de 55.20%, podemos verificar que las actividades que más han presentado ejecución son las actividades de mampostería y revoques, carpintería metálica y en madera y las actividades de instalaciones eléctricas De acuerdo a las planillas presentadas por el contratista y avaladas por la interventoría, el primero se encuentra a Paz Y salvo con los parafiscales.
- Los materiales utilizados son de buena calidad y cumplen con las normas de salud vigentes.
- Todos los trabajadores cumplen con los elementos de seguridad industrial, mientras están laborando (cascos, guantes, gafas, pasa bocas y botas).
- Tanto el contratista de obra como de interventoría cumplen con el protocolo de bioseguridad.
- La interventoría durante la ejecución de las obras se ha encargado de cumplió con sus Obligaciones de carácter técnico, Obligaciones de carácter Administrativo de la interventoría frente al contratista de obra, Obligaciones de Control Contable y financiero y Obligaciones Jurídicas enmarcadas dentro del contrato de interventoría SS-095-2020
- En obra permanecen siempre los residentes de obra e interventoría.


INFORME DE SUPERVISION N°1

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO




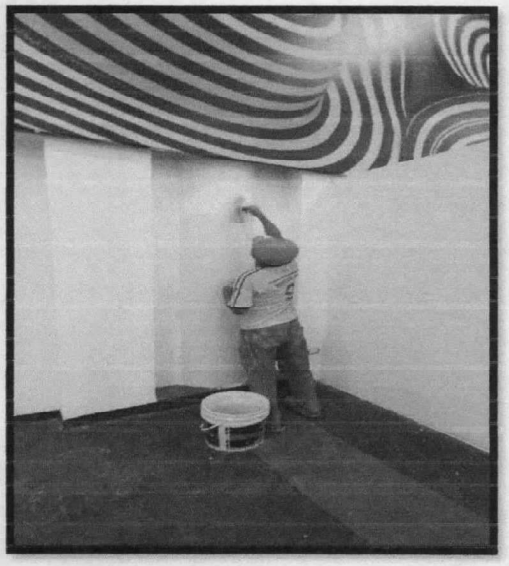





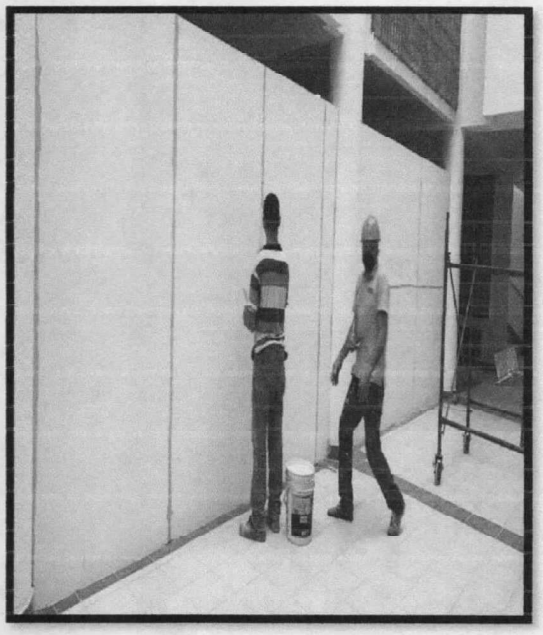


INFORME DE SUPERVISION N°1

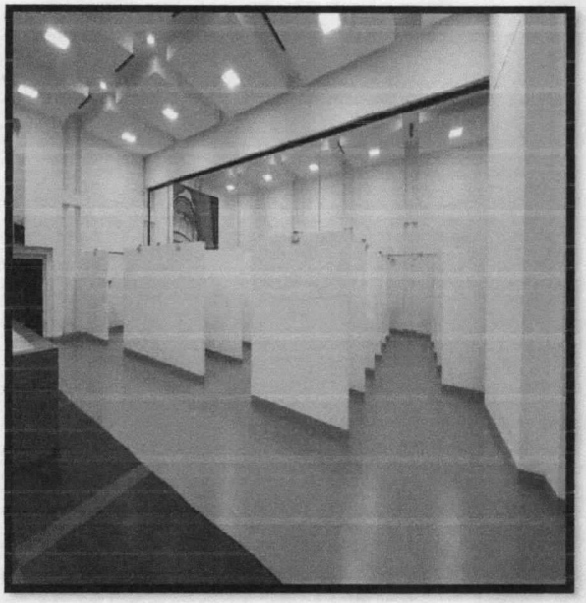


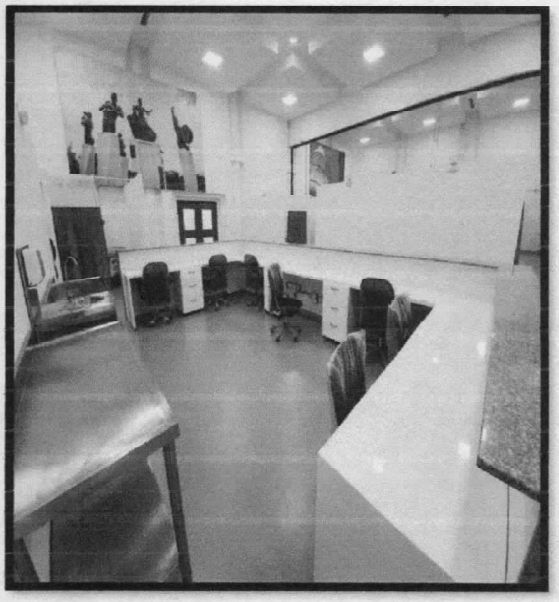


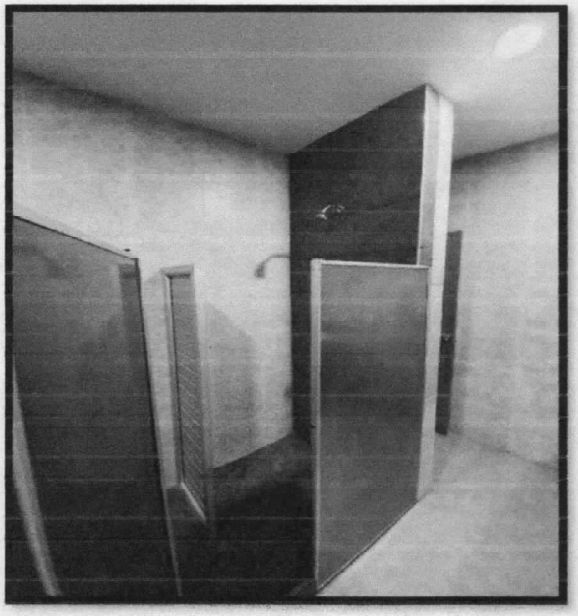

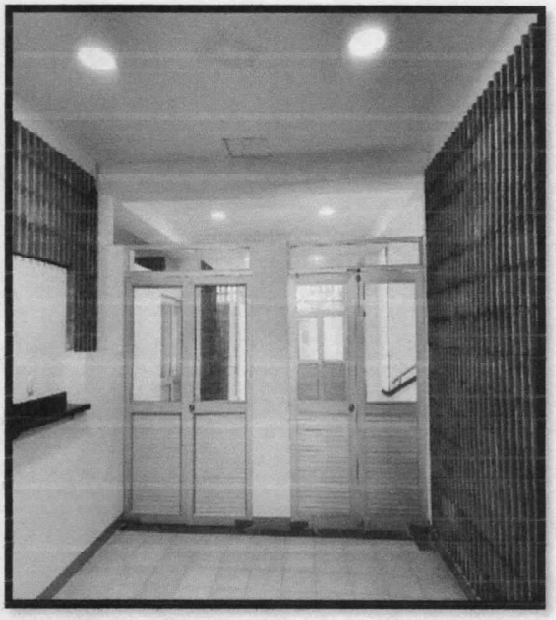


INFORME DE SUPERVISION N°1

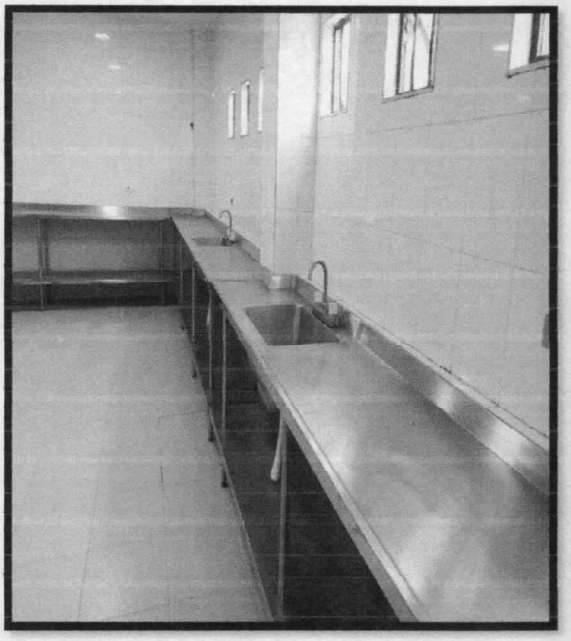


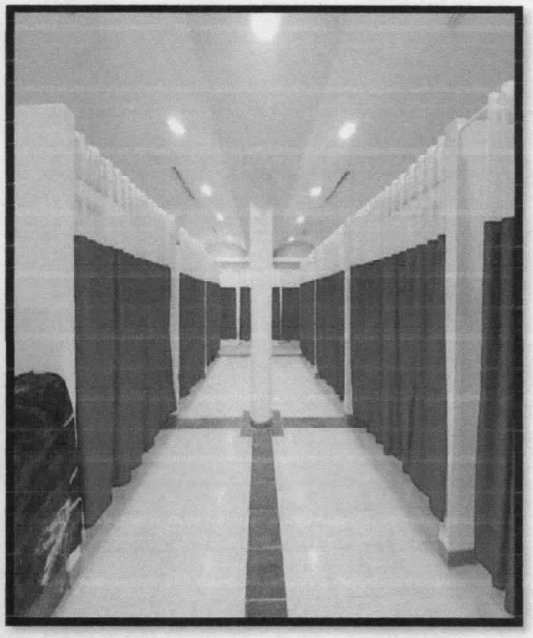



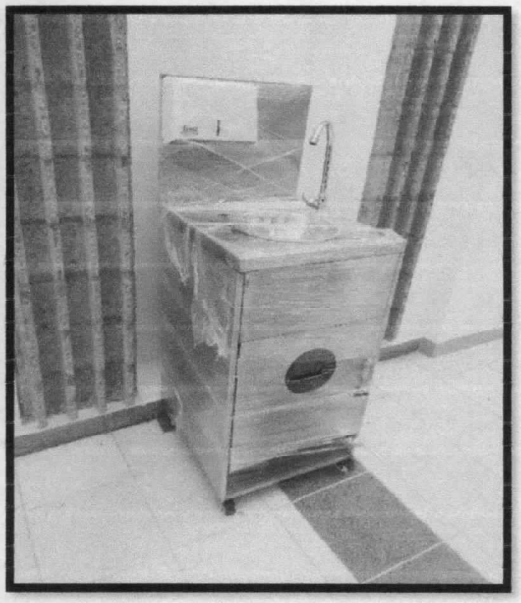


INFORME DE SUPERVISION N°1

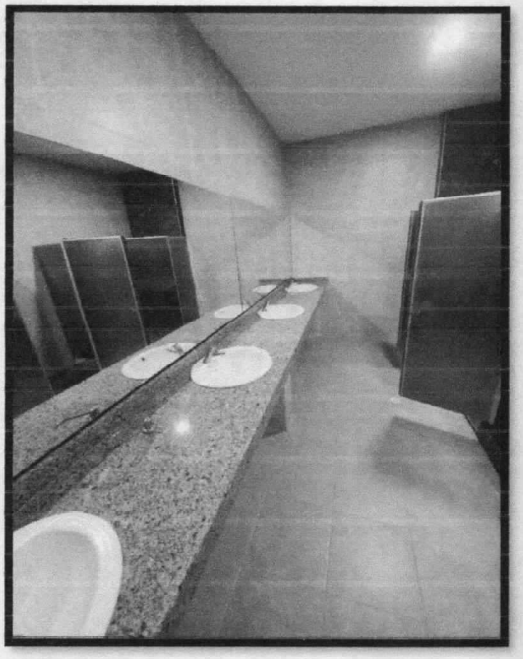





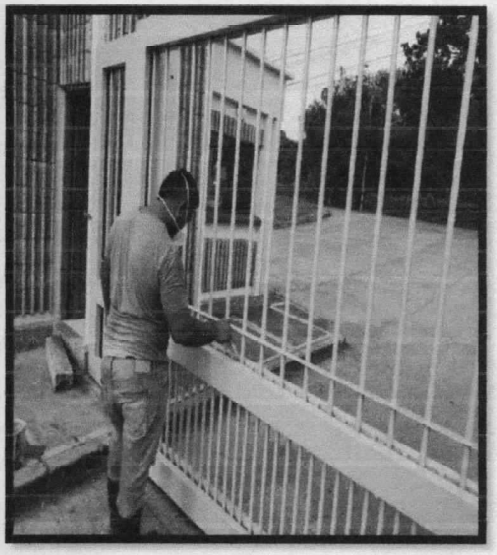

INFORME DE SUPERVISION N°1

CONTRATO DE OBRA SS-078-2020

11. LOCALIZACION DEL PROYECTO DE CONTRATO DE OBRA SS-078-2020

El proyecto "EJECUCION DE OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACION DE AREAS NECESARIAS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL ANALISIS DE LAS PRUEBAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR COVID-19". Se ejecuta en el municipio de Montería, Departamento de Córdoba, específicamente en el centro de la ciudad, sobre la carrera 15 entre calles 22 y 24, al frente de la Secretaria de Educación Departamental.



Ilustración 3. Localización general del proyecto.

INFORME DE SUPERVISION N°1

12. DESARROLLO DE LOS CONTRATOS

- En fecha 24 de abril se realizó acta de inicio según orden de autorización de los contratos de obra e interventoría.


13. INFORMACION FINANCIERA:

A la fecha la Gobernación de Córdoba no ha realizado pagos al contratista de interventoría.

14. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PORCENTAJE DE AVANCE DE CONTRATO DE OBRA SS-078-2020

Dentro de las actividades que se desarrollaran dentro de la ejecución del proyecto se encuentran las siguientes:

INFORME DE SUPERVISION N°1

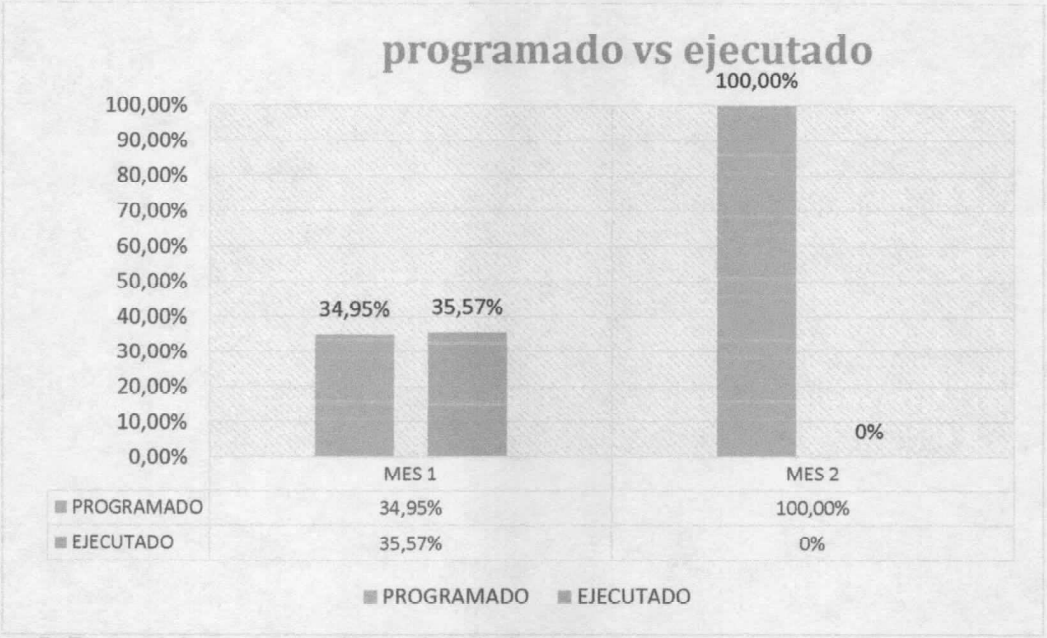

Grafica 3. Porcentaje programado vs ejecutado.

En el siguiente gráfico se puede observar que el avance de ejecución de la obra para el primer mes de ejecución es del 35.57% que corresponde en pesos a $ 333.175.315,00 contra un porcentaje programado del 34.9% que corresponde a $ 327.379.336.95lo que indica que, al primer mes de ejecución de la obra, se tiene un porcentaje de avance superior al programado.

INFORME DE SUPERVISION N°1

15. ACTAS SUSCRITAS Y OTROS DOCUMENTOS.

ACTAS Y OTROS DOCUMENTOS	FECHA SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO SEGÚN ORDEN DE AUTORIZACION	24 DE ABRIL DE 2020

16. ANEXOS


Toda la documentación mencionada en este informe se encuentra en las respectivas carpetas de los contratos de obra e interventoría.

17. OBSERVACIONES:


- Porcentaje de avance es de 34.95% según la programación inicial y el porcentaje físico completado (porcentaje ejecutado) de 35.57%, podemos verificar que las actividades que más han presentado ejecución son las actividades de mamposteria y revoques, carpinteria metálica y en madera y las actividades de instalaciones eléctricas De acuerdo a las planillas presentadas por el contratista y avaladas por la interventoría, el primero se encuentra a Paz Y salvo con los parafiscales.
- Los materiales utilizados son de buena calidad y cumplen con las normas de salud vigentes.
- Todos los trabajadores cumplen con los elementos de seguridad industrial, mientras están laborando (cascos, guantes, gafas, pasa bocas y botas).
- Tanto el contratista de obra como de interventoría cumplen con el protocolo de bioseguridad.
- La interventoría durante la ejecución de las obras se ha encargado de cumplió con sus Obligaciones de carácter técnico, Obligaciones de carácter Administrativo de la interventoría frente al contratista de obra, Obligaciones de Control Contable y financiero y Obligaciones Jurídicas enmarcadas dentro del contrato de interventoría SS-095-2020
- En obra permanecen siempre los residentes de obra e interventoría.

INFORME DE SUPERVISION N°1

18. REGISTRO FOTOGRÁFICO

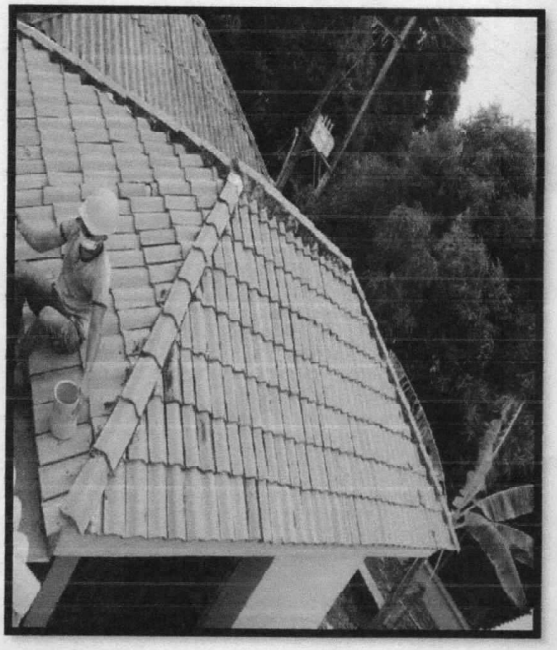





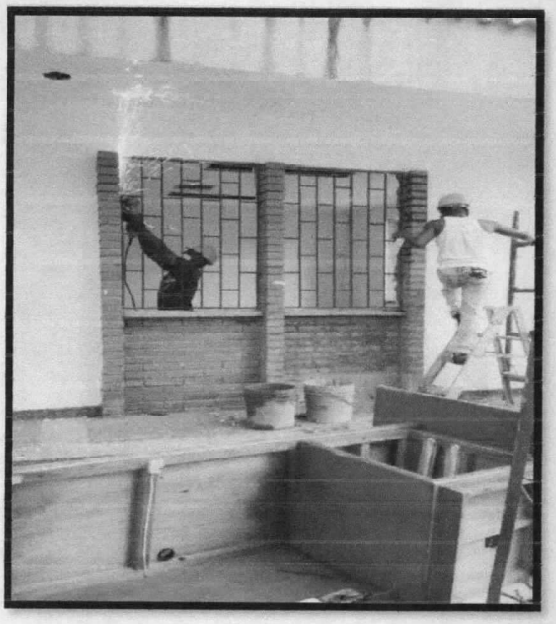




INFORME DE SUPERVISION N°1

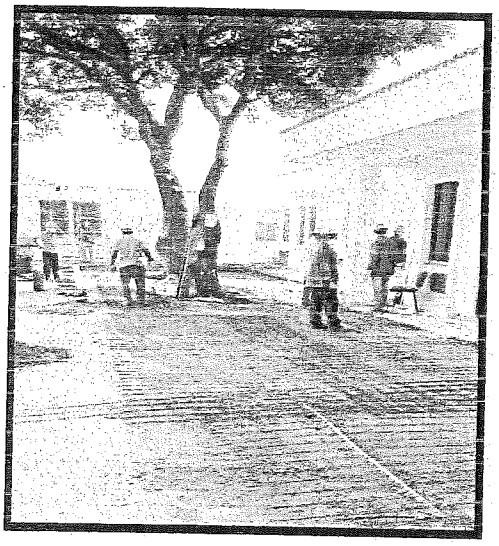

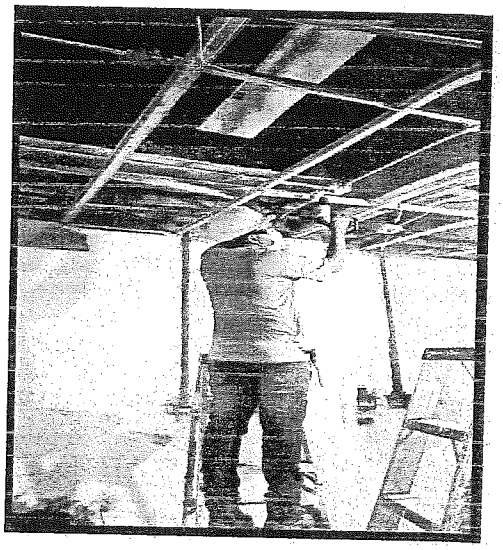



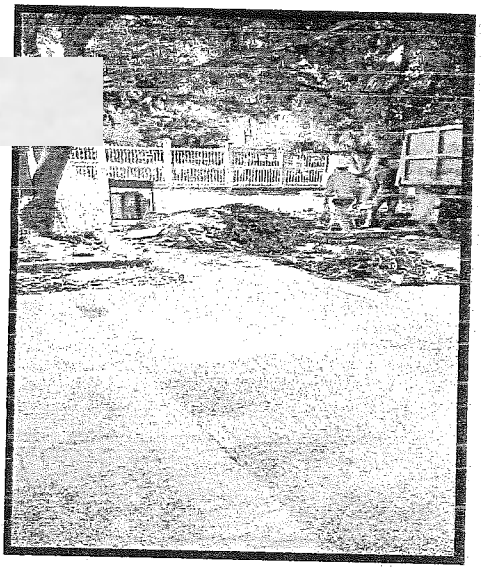

Supervisor: Secretaria de Infraestructura
Nombre: Isidro Villalba
Firma: Alia Ibis Bermudez

Supervisor Secretaria de Desarrollo de la Salud
Nombre: Walter Jorgan Cruz Reyes
Firma:
