
# CRONOGRAMA DE OBRA


| Id | | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predeceso | Demora permisible | Costo | Costo de línea base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **1** | | **Proyecto Palacio de Justicia Colosó** | **93 días** | **mar 3/06/25** | **vie 3/10/25** | | **0 días** | **$ 327,407,277.00** | **$ 327,407,277.00** |
| 2 | | **1.1** | | **PRELIMINARES** | **10 días** | **mar 3/06/25** | **sáb 14/06/25** | | **0 días** | **$ 3,209,735.00** | **$ 3,209,735.00** |
| 3 | | 1.1.1 | | LOCALIZACION Y REPLANTEO | 5 días | mar 3/06/25 | lun 9/06/25 | | 0 días | $ 1,957,212.00 | $ 1,957,212.00 |
| 4 | | 1.1.2 | | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLIPROPILENO VERDE H=2.1 M | 5 días | lun 9/06/25 | sáb 14/06/25 | 3 | 0 días | $ 1,252,523.00 | $ 1,252,523.00 |
| 5 | | **1.2** | | **DESMONTES Y DEMOLICIONES** | **16 días** | **lun 16/06/25** | **mar 8/07/25** | **2** | **0 días** | **$ 72,668,023.00** | **$ 72,668,023.00** |
| 6 | | 1.2.1 | | DEMOLICION DE ENCHAPE PISO | 4 días | lun 16/06/25 | jue 19/06/25 | | 0 días | $ 9,678,677.00 | $ 9,678,677.00 |
| 7 | | 1.2.2 | | DEMOLICION LOSA DE CONTRAPISO | 7 días | vie 20/06/25 | mar 1/07/25 | 6 | 0 días | $ 9,977,267.00 | $ 9,977,267.00 |
| 8 | | 1.2.3 | | DEMOLICION DE CIELORRASO | 5 días | mié 2/07/25 | mar 8/07/25 | 7 | 0 días | $ 9,871,332.00 | $ 9,871,332.00 |
| 9 | | 1.2.4 | | CAJAS PERFORADORAS | 5 días | vie 20/06/25 | vie 27/06/25 | 6 | 0 días | $ 24,179.00 | $ 24,179.00 |
| 10 | | 1.2.5 | | DEMOLICION DE PAÑETE DE MURO | 3 días | vie 20/06/25 | mié 25/06/25 | 6 | 0 días | $ 36,177,563.00 | $ 36,177,563.00 |
| 11 | | 1.2.6 | | DEMOLICION DE OBRAS EN CONCRETO | 5 días | vie 20/06/25 | vie 27/06/25 | 6 | 7 días | $ 847,001.00 | $ 847,001.00 |
| 12 | | 1.2.7 | | DEMOLICION DE ZÓCALO (INCLUYE | 3 días | vie 27/06/25 | mié 2/07/25 | 9 | 4 días | $ 6,092,004.00 | $ 6,092,004.00 |
| 13 | | **1.3** | | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | **18 días** | **mar 8/07/25** | **mié 30/07/25** | **5** | **0 días** | **$ 15,064,362.00** | **$ 15,064,362.00** |
| 14 | | 1.3.1 | | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA | 10 días | mar 8/07/25 | lun 21/07/25 | 7 | 0 días | $ 5,893,063.00 | $ 5,893,063.00 |
| 15 | | 1.3.2 | | MEJORAMIENTO CON GEOTEXTIL NT-1800 | 3 días | lun 21/07/25 | jue 24/07/25 | 14 | 0 días | $ 631,150.00 | $ 631,150.00 |
| 16 | | 1.3.3 | | RELLENO PARA ESTRUCTURAS (TIPO | 3 días | jue 24/07/25 | lun 28/07/25 | 15 | 0 días | $ 1,139,283.00 | $ 1,139,283.00 |
| 17 | | 1.3.4 | | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO | 3 días | lun 21/07/25 | jue 24/07/25 | 14 | 54 días | $ 1,601,415.00 | $ 1,601,415.00 |
| 18 | | 1.3.5 | | RELLENO CON ARENA LAVADA | 3 días | jue 24/07/25 | lun 28/07/25 | 15 | 0 días | $ 281,642.00 | $ 281,642.00 |
| 19 | | 1.3.6 | | RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE INV E 673-22 | 2 días | mar 29/07/25 | mié 30/07/25 | 18 | 49 días | $ 1,379,101.00 | $ 1,379,101.00 |
| 20 | | 1.3.7 | | CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) | 3 días | jue 24/07/25 | lun 28/07/25 | 15 | 51 días | $ 4,138,708.00 | $ 4,138,708.00 |
| 21 | | **1.4** | | **ESTRUCTURAS EN CONCR** | **8 días** | **vie 1/08/25** | **mar 12/08/25** | | **0 días** | **$ 40,840,353.00** | **$ 40,840,353.00** |
| 22 | | 1.4.1 | | ZAPATAS 3000 PSI (21 MPA) | 3 días | vie 1/08/25 | mar 5/08/25 | 26 | 0 días | $ 4,461,778.00 | $ 4,461,778.00 |
| 23 | | 1.4.2 | | VIGAS CIMENTACION 3000 PSI (21 MPA) | 3 días | vie 1/08/25 | mar 5/08/25 | 26 | 0 días | $ 17,404,511.00 | $ 17,404,511.00 |
| 24 | | 1.4.3 | | PLACA DE CONTRAPISO EN | 5 días | mar 5/08/25 | mar 12/08/25 | 23;22 | 0 días | $ 18,974,064.00 | $ 18,974,064.00 |
| 25 | | **1.5** | | **ESTRUCTURAS EN ACERO** | **35 días** | **mar 8/07/25** | **sáb 23/08/25** | | **16 días** | **$ 49,529,534.00** | **$ 49,529,534.00** |
| 26 | | 1.5.1 | | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI | 3 días | mar 29/07/25 | jue 31/07/25 | 16 | 0 días | $ 21,333,735.00 | $ 21,333,735.00 |
| 27 | | 1.5.2 | | ANCLAJES | 3 días | mar 8/07/25 | vie 11/07/25 | 8 | 64 días | $ 1,328,878.00 | $ 1,328,878.00 |
| 28 | | 1.5.3 | | ANGULOS 1/8"X2" | 3 días | mar 5/08/25 | sáb 9/08/25 | 23 | 0 días | $ 851,289.00 | $ 851,289.00 |

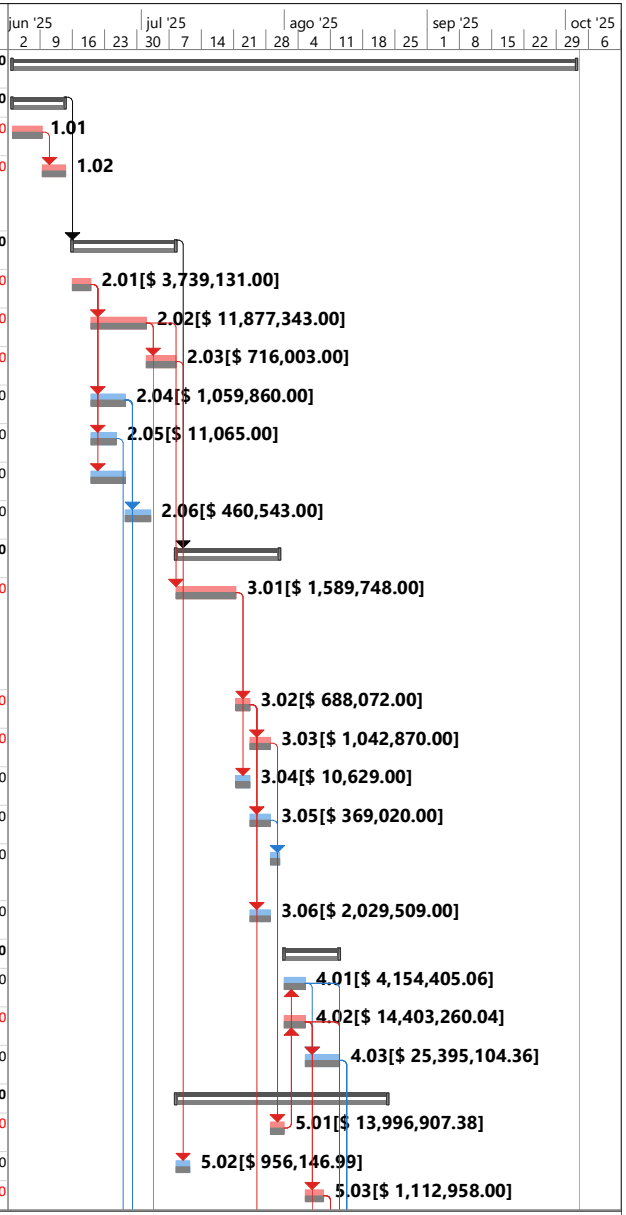


Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Línea base |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Hito de línea base |
| Resumen | solo duración | Hito externo | Resumen de línea base |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | Progreso |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | Progreso manual |


| Id | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predeceso | Demora permisible | Costo | Costo de línea base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1.5.4 | | TUBOS PTE 40X40X2,5 | 3 días | mar 5/08/25 | sáb 9/08/25 | 23 | 42 días | $ 10,788,884.00 | $ 10,788,884.00 |
| 30 | 1.5.5 | | MALLA ELECTROSOLDADA | 10 días | lun 11/08/25 | sáb 23/08/25 | 28 | 32 días | $ 15,226,748.00 | $ 15,226,748.00 |
| 31 | **1.6** | | **TUBERIA** | **5 días** | **jue 24/07/25** | **mié 30/07/25** | | **49 días** | **$ 1,909,165.00** | **$ 1,909,165.00** |
| 32 | 1.6.1 | | TUBERIA PERFORADA PVC 4" | 5 días | jue 24/07/25 | mié 30/07/25 | 15 | 49 días | $ 1,909,165.00 | $ 1,909,165.00 |
| 33 | **1.7** | | **INSTALACIONES AGUA POTABLE, DESAGÜE Y** | **46 días** | **mié 2/07/25** | **lun 1/09/25** | | **0 días** | **$ 18,644,842.00** | **$ 18,644,842.00** |
| 34 | 1.7.1 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" PVC -P Incluye tubería (Promedio | 3 días | lun 11/08/25 | mié 13/08/25 | 28 | 13 días | $ 308,165.00 | $ 308,165.00 |
| 35 | 1.7.2 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2", por afinado de placa, Agua fría (Red de suministro). | 3 días | lun 11/08/25 | mié 13/08/25 | 28 | 0 días | $ 981,401.00 | $ 981,401.00 |
| 36 | 1.7.3 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fría (Red de suministro). Por afinado de piso, | 2 días | jue 14/08/25 | vie 15/08/25 | 35 | 11 días | $ 85,546.00 | $ 85,546.00 |
| 37 | 1.7.4 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua fría (Red de suministro). Por afinado de piso, | 3 días | jue 14/08/25 | mar 19/08/25 | 35 | 0 días | $ 683,294.00 | $ 683,294.00 |
| 38 | 1.7.5 | | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE BOLA 1/2" LISA SOLDABLE. Grival o similar. Incluye accesorios (adaptadores), universal, tapa | 3 días | mar 19/08/25 | vie 22/08/25 | 37 | 0 días | $ 203,054.00 | $ 203,054.00 |
| 39 | 1.7.6 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1/2" PARA AGUA FRÍA, VALIDADO Y HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD. Incluye derechos de conexión, | 3 días | mar 19/08/25 | vie 22/08/25 | 37 | 7 días | $ 464,305.00 | $ 464,305.00 |
| 40 | 1.7.7 | | Suministro e instalación de cajilla en lámina Cal. 18 para 1 medidor, homologada por la empresa prestadora. | 4 días | vie 22/08/25 | mié 27/08/25 | 38 | 0 días | $ 496,790.00 | $ 496,790.00 |
| 41 | 1.7.8 | | CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P Diámetro variable. Incluye instalación, accesorios, collarin y | 3 días | jue 28/08/25 | lun 1/09/25 | 40 | 0 días | $ 492,410.00 | $ 492,410.00 |

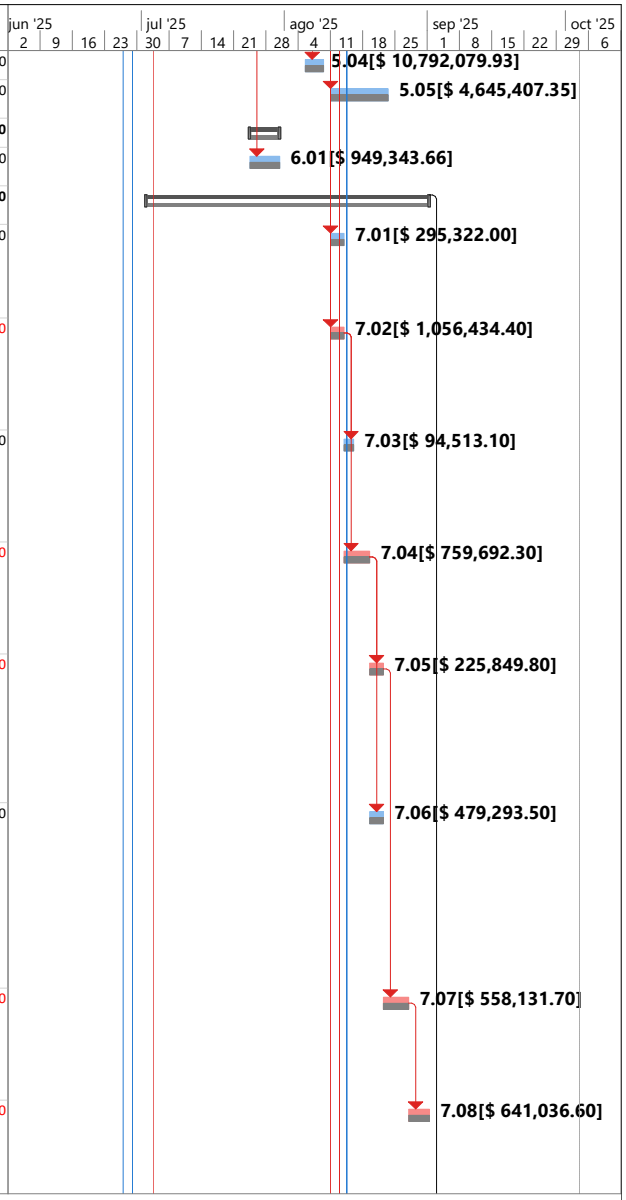


Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Línea base |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Hito de línea base |
| Resumen | solo duración | Hito externo | Resumen de línea base |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | Progreso |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | Progreso manual |


| Id | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predeceso | Demora permisible | Costo | Costo de línea base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1.7.9 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC 2" . Incluye tubería | 4 días | mié 2/07/25 | lun 7/07/25 | 7 | 0 días | $ 402,365.00 | $ 402,365.00 |
| 43 | 1.7.10 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 2" SIFONES. Incluye tubería (Prom. | 3 días | lun 7/07/25 | jue 10/07/25 | 42 | 0 días | $ 440,879.00 | $ 440,879.00 |
| 44 | 1.7.11 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 3" SIFONES. Incluye tubería | 3 días | lun 7/07/25 | jue 10/07/25 | 42 | 39 días | $ 121,307.00 | $ 121,307.00 |
| 45 | 1.7.12 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC-S 4". Sanitarios. Incluye tubería | 3 días | lun 7/07/25 | jue 10/07/25 | 42 | 0 días | $ 798,865.00 | $ 798,865.00 |
| 46 | 1.7.13 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHAS | 3 días | jue 10/07/25 | lun 14/07/25 | 45 | 36 días | $ 186,373.00 | $ 186,373.00 |
| 47 | 1.7.14 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 2" . Afinado piso, Incl | 5 días | jue 10/07/25 | mié 16/07/25 | 43 | 34 días | $ 782,838.00 | $ 782,838.00 |
| 48 | 1.7.15 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 3" . Afinado piso, Incl | 5 días | jue 10/07/25 | mié 16/07/25 | 43 | 0 días | $ 220,391.00 | $ 220,391.00 |
| 49 | 1.7.16 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" . Afinado piso, Incl | 6 días | jue 17/07/25 | jue 24/07/25 | 48 | 28 días | $ 5,943,956.00 | $ 5,943,956.00 |
| 50 | 1.7.17 | | SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-L 2" (Ventil). Incl acces y | 2 días | jue 10/07/25 | sáb 12/07/25 | 45 | 37 días | $ 1,001,776.00 | $ 1,001,776.00 |
| 51 | 1.7.18 | | SUM. E INST. DE TUBERIA ALCANTARILLADO 6" Tipo Novafort o similar. Incluye relleno inicial (0,15m), relleno lateral y relleno final con base granular fina | 1 día | mié 13/08/25 | mié 13/08/25 | 24;22;23 | 0 días | $ 1,878,077.00 | $ 1,878,077.00 |
| 52 | 1.7.19 | | CAJA DE INSPECCION 0,8x0,8x1m. Incl. Exc.,recebo común compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,mec caña,marco en ángulo | 3 días | jue 14/08/25 | mar 19/08/25 | 51 | 0 días | $ 1,544,649.00 | $ 1,544,649.00 |
| 53 | 1.7.20 | | CONEXIÓN A CAJA O POZO EXISTENTE. Incluye demolición de muro (contempla cargue y ret. De esc. A | 4 días | mar 19/08/25 | sáb 23/08/25 | 52 | 6 días | $ 1,608,401.00 | $ 1,608,401.00 |

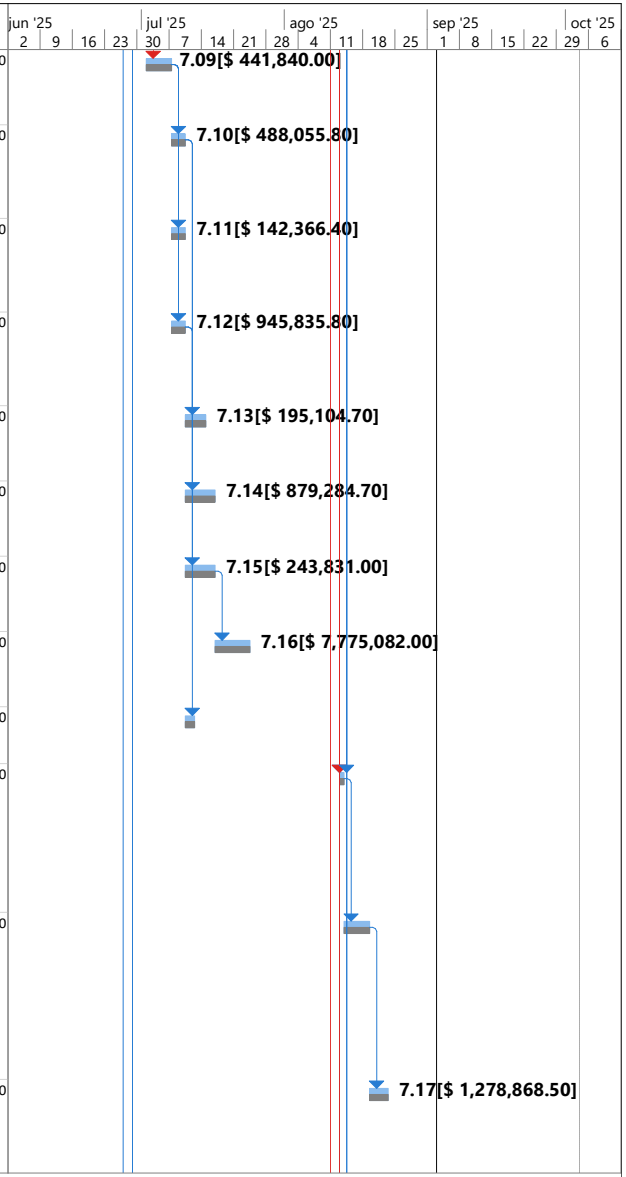


Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Línea base |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Hito de línea base |
| Resumen | solo duración | Hito externo | Resumen de línea base |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | Progreso |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | Progreso manual |


| Id | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predeceso | Demora permisible | Costo | Costo de línea base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | **1.8** | | **INSTALACIONES VOZ Y DATOS** | **61 días** | **mar 3/06/25** | **sáb 23/08/25** | | **32 días** | **$ 65,886,497.00** | **$ 65,886,497.00** |
| 55 | 1.8.1 | | SUM. E INST. CAJA INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo | 8 días | mié 13/08/25 | sáb 23/08/25 | 24;22;23 | 32 días | $ 1,489,863.00 | $ 1,489,863.00 |
| 56 | 1.8.2 | | SUM. E INST. ACOMETIDA 3H Cu THWN/THHN EN CABLE 2X8AWG + | 1 día | vie 27/06/25 | sáb 28/06/25 | 9 | 73 días | $ 636,048.00 | $ 636,048.00 |
| 57 | 1.8.3 | | SUM. E INST. ACOMETIDA 3H Cu THWN/THHN EN CABLE 2X2AWG + | 1 día | vie 27/06/25 | sáb 28/06/25 | 9 | 0 días | $ 1,355,697.00 | $ 1,355,697.00 |
| 58 | 1.8.4 | | SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT PVC 2". | 1 día | vie 27/06/25 | sáb 28/06/25 | 9 | 0 días | $ 716,247.00 | $ 716,247.00 |
| 59 | 1.8.5 | | SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 1". | 1 día | vie 27/06/25 | sáb 28/06/25 | 9 | 0 días | $ 954,072.00 | $ 954,072.00 |
| 60 | 1.8.6 | | SUM. E INST. TABLERO 24 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y | 1 día | vie 27/06/25 | sáb 28/06/25 | 9 | 73 días | $ 623,408.00 | $ 623,408.00 |
| 61 | 1.8.7 | | SUM. E INST. TABLERO 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y | 1 día | vie 27/06/25 | sáb 28/06/25 | 9 | 73 días | $ 1,004,791.00 | $ 1,004,791.00 |
| 62 | 1.8.8 | | SUM. E INST. INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o | 1 día | mar 1/07/25 | mar 1/07/25 | 57 | 72 días | $ 138,212.00 | $ 138,212.00 |
| 63 | 1.8.9 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o | 1 día | mar 1/07/25 | mar 1/07/25 | 57 | 72 días | $ 94,082.00 | $ 94,082.00 |
| 64 | 1.8.10 | | SUM. E INST. INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o | 1 día | mar 1/07/25 | mar 1/07/25 | 57 | 72 días | $ 227,531.00 | $ 227,531.00 |
| 65 | 1.8.11 | | SUM. E INST. INTERRUPTOR BIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA + UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 40A, 25 Ka CALIDAD LEGRAND, | 1 día | mar 1/07/25 | mar 1/07/25 | 57 | 72 días | $ 443,239.00 | $ 443,239.00 |

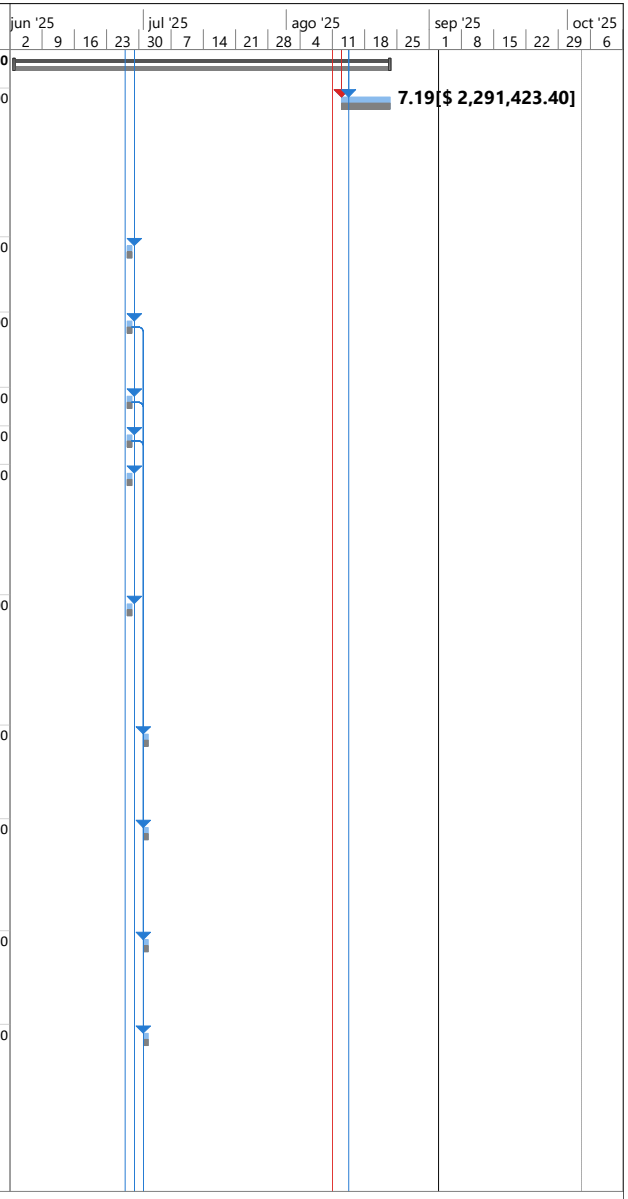


Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Línea base |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Hito de línea base |
| Resumen | solo duración | Hito externo | Resumen de línea base |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | Progreso |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | Progreso manual |


| Id | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predeceso | Demora permisible | Costo | Costo de línea base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1.8.12 | | SUM. E INST. INTERRUPTOR BIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 100A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, | 1 día | mar 1/07/25 | mar 1/07/25 | 57 | 0 días | $ 493,954.00 | $ 493,954.00 |
| 67 | 1.8.13 | | MEDIDOR BIFASICO Electromagnético de 5 a 100 AMP, calibrado | 1 día | mié 2/07/25 | mié 2/07/25 | 66 | 0 días | $ 261,324.00 | $ 261,324.00 |
| 68 | 1.8.14 | | SUM. E INST. CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO NORMA CODENSA AE303 | 1 día | mié 2/07/25 | mié 2/07/25 | 66 | 71 días | $ 323,327.00 | $ 323,327.00 |
| 69 | 1.8.15 | | TRAM. DE ING. ELECT. ANTE OPER. RED LOCAL (O.R). INCL. TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES REQUERIDOS Y/O | 2 días | mar 3/06/25 | mié 4/06/25 | | 91 días | $ 8,000,000.00 | $ 8,000,000.00 |
| 70 | 1.8.16 | | SUM. INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 8. INCL. LO NECESARIO PARA SU CORRECTO | 2 días | jue 3/07/25 | vie 4/07/25 | 67 | 69 días | $ 576,513.00 | $ 576,513.00 |
| 71 | 1.8.17 | | SUM. E INST. VARILLA CW 5/8" X 2.40 MTS. INCL. PUNTO SOLDADURA CON RESPECTIVO MOLDE Y | 2 días | vie 27/06/25 | mar 1/07/25 | 9 | 0 días | $ 524,178.00 | $ 524,178.00 |
| 72 | 1.8.18 | | SUM. E INST. CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCL. ACCESORIOS DE | 2 días | vie 27/06/25 | mar 1/07/25 | 9 | 72 días | $ 331,701.00 | $ 331,701.00 |
| 73 | 1.8.19 | | SAL. TOMAC. DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 15 A,127 V TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 282,151.00 | $ 282,151.00 |
| 74 | 1.8.20 | | SAL. TOMAC. NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 2,338,439.00 | $ 2,338,439.00 |
| 75 | 1.8.21 | | SAL. TOMAC. REGULADA DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 1,201,993.00 | $ 1,201,993.00 |
| 76 | 1.8.22 | | SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 4,209,248.00 | $ 4,209,248.00 |

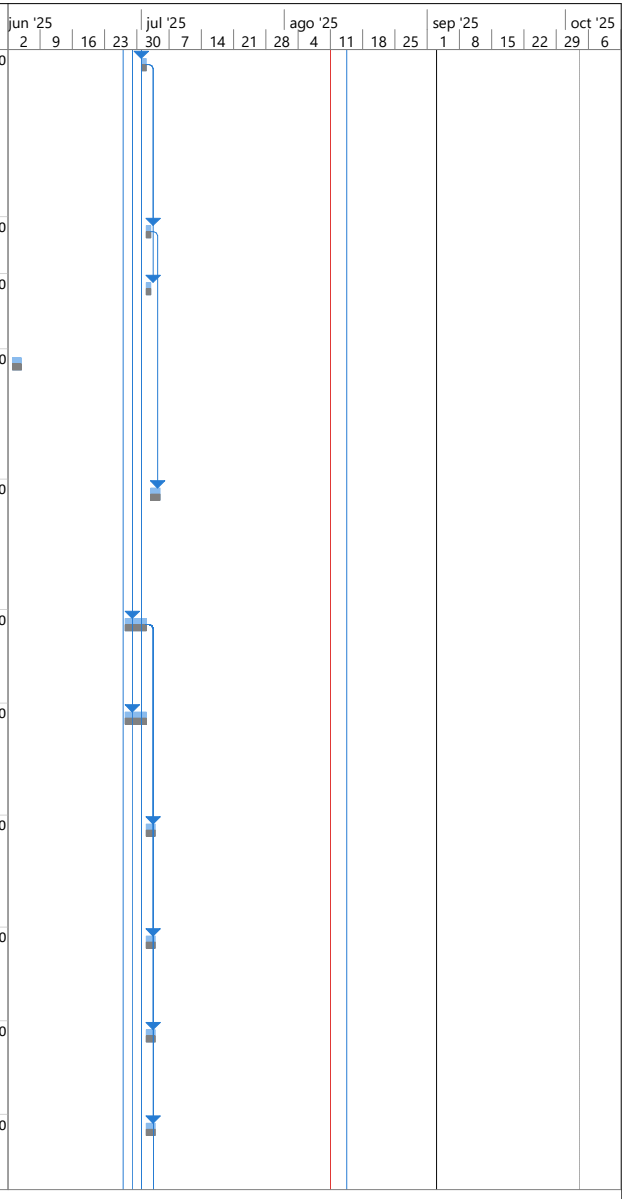


Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Línea base |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Hito de línea base |
| Resumen | solo duración | Hito externo | Resumen de línea base |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | Progreso |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | Progreso manual |


| Id | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predeceso | Demora permisible | Costo | Costo de línea base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1.8.23 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPEC. TÉCN. SIMIL. DE 2W, FP>0.95, | 2 días | mar 1/07/25 | mié 2/07/25 | 58;59 | 71 días | $ 563,012.00 | $ 563,012.00 |
| 78 | 1.8.24 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 40 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, | 2 días | mar 1/07/25 | mié 2/07/25 | 58;59 | 71 días | $ 639,503.00 | $ 639,503.00 |
| 79 | 1.8.25 | | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 6-8" DE 18 W, Multivoltaje, Temperatura de color | 2 días | mar 1/07/25 | mié 2/07/25 | 58;59 | 71 días | $ 282,441.00 | $ 282,441.00 |
| 80 | 1.8.26 | | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG | 2 días | mar 1/07/25 | mié 2/07/25 | 58;59 | 71 días | $ 1,630,049.00 | $ 1,630,049.00 |
| 81 | 1.8.27 | | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO conmutable EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE | 2 días | mar 1/07/25 | mié 2/07/25 | 58;59 | 71 días | $ 313,776.00 | $ 313,776.00 |
| 82 | 1.8.28 | | SUM. E INST. DE TUBERIA CONDUIT | 2 días | vie 27/06/25 | mar 1/07/25 | 9 | 72 días | $ 3,176,544.00 | $ 3,176,544.00 |
| 83 | 1.8.29 | | SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, POLO A | 2 días | mar 1/07/25 | mié 2/07/25 | 58;59 | 71 días | $ 981,914.00 | $ 981,914.00 |
| 84 | 1.8.30 | | SUM. E INST. ACOMETIDA 3H Cu HFFRLS EN CABLE 2X10AWG + 12TAWG. | 2 días | mar 1/07/25 | mié 2/07/25 | 58;59 | 71 días | $ 1,680,588.00 | $ 1,680,588.00 |
| 85 | 1.8.31 | | SUM. E INST. CORAZA AMERICANA 3/4" | 3 días | mié 2/07/25 | vie 4/07/25 | 71 | 69 días | $ 369,212.00 | $ 369,212.00 |
| 86 | 1.8.32 | | SUM. INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 24.000 | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 3,589,145.00 | $ 3,589,145.00 |
| 87 | 1.8.33 | | SUM., INST. Y PUESTA FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 18.000 BTU NIIVEL DE | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 4,784,289.00 | $ 4,784,289.00 |

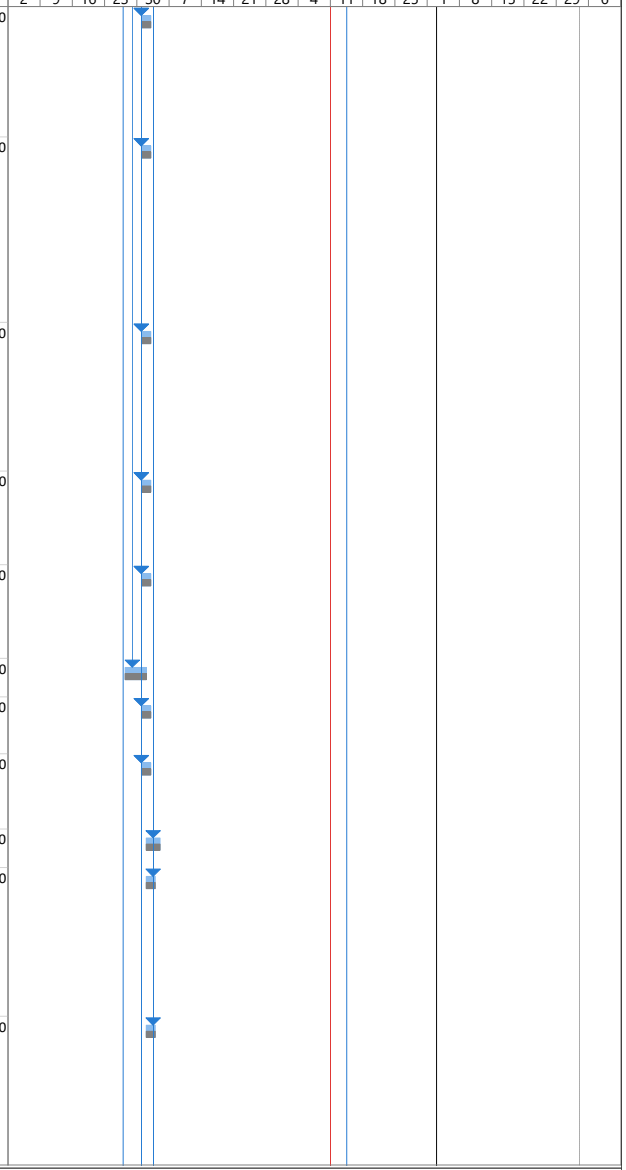


Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Línea base |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Hito de línea base |
| Resumen | solo duración | Hito externo | Resumen de línea base |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | Progreso |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | Progreso manual |


| Id | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predeceso | Demora permisible | Costo | Costo de línea base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1.8.34 | | SUM. INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA 12.000 | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 1,741,145.00 | $ 1,741,145.00 |
| 89 | 1.8.35 | | SUM. E INST. PUNTO DOBLE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal Moldeado) RJ45 10Gb, Accesorios de amarre y | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 371,782.00 | $ 371,782.00 |
| 90 | 1.8.36 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 1.5 mtrs, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 417,577.00 | $ 417,577.00 |
| 91 | 1.8.37 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR o LSZH, Longitud 3 mtrs, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 1,089,879.00 | $ 1,089,879.00 |
| 92 | 1.8.38 | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 19", 15 UR, Capacidad de carga para 36 kg o +, Ranuras de | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 1,440,166.00 | $ 1,440,166.00 |
| 93 | 1.8.39 | | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH 24 x 10/100/1000T POE+, 4 x 10G SFP+ ports US Power Cord, Soporte técnico cada uno de | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 4,568,080.00 | $ 4,568,080.00 |
| 94 | 1.8.40 | | SUM., INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, Categoría 6A UTP, | 1 día | mié 2/07/25 | mié 2/07/25 | 71 | 71 días | $ 529,206.00 | $ 529,206.00 |

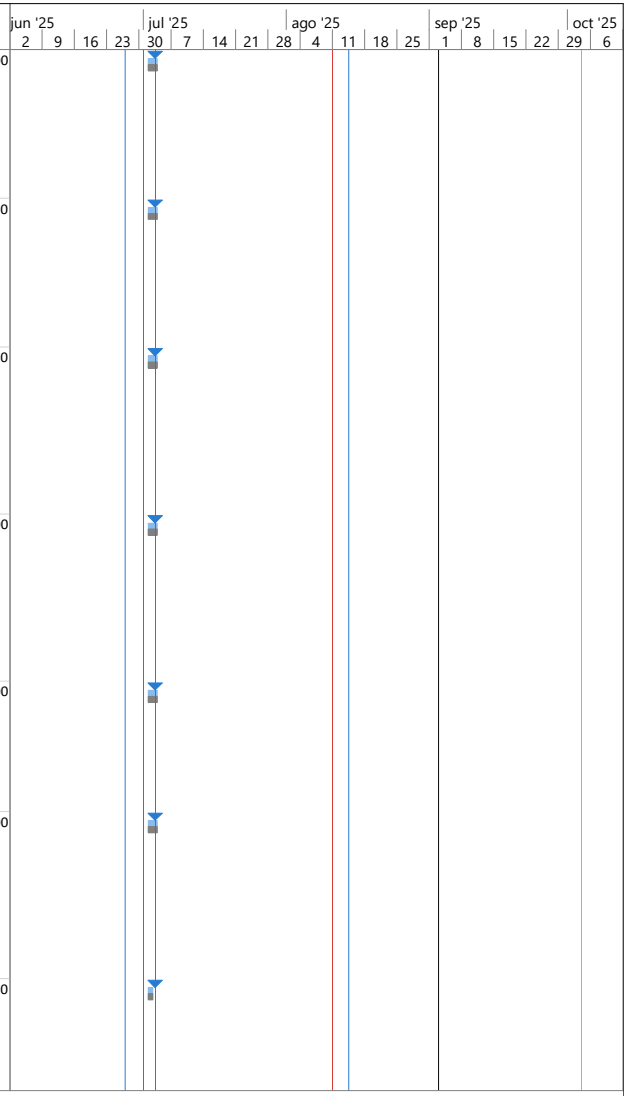


Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Línea base |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Hito de línea base |
| Resumen | solo duración | Hito externo | Resumen de línea base |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | Progreso |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | Progreso manual |


| Id | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predeceso | Demora permisible | Costo | Costo de línea base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1.8.41 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE TAPA DE 19", En calidad Ortronics o superior. INCLUYE | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 70 días | $ 128,138.00 | $ 128,138.00 |
| 96 | 1.8.42 | | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CAT6A LSZH, 4 PARES, 23 AWG mínimo, Cumplimiento con las normas TIA-568-c.2 o | 4 días | mié 2/07/25 | lun 7/07/25 | 71 | 68 días | $ 4,545,807.00 | $ 4,545,807.00 |
| 97 | 1.8.43 | | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACCESS POINT, Frequencia de 2.4GHz y 5GHz, Fuente de Alimentación PoE, Dos (2) puertos | 3 días | mié 2/07/25 | vie 4/07/25 | 71 | 69 días | $ 850,422.00 | $ 850,422.00 |
| 98 | 1.8.44 | | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLUG RJ-45 CAT 6ª, Para Cable Blindado Conocido Como MPTL (Modular Plug Terminated Link), | 2 días | mié 2/07/25 | jue 3/07/25 | 71 | 0 días | $ 1,586,886.00 | $ 1,586,886.00 |
| 99 | 1.8.45 | | SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". | 2 días | mar 1/07/25 | mié 2/07/25 | 58;59 | 71 días | $ 813,829.00 | $ 813,829.00 |
| 100 | 1.8.46 | | SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 1-1/2". | 2 días | mar 1/07/25 | mié 2/07/25 | 58;59 | 71 días | $ 97,650.00 | $ 97,650.00 |
| 101 | 1.8.47 | | SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 2". | 5 días | lun 11/08/25 | vie 15/08/25 | 28 | 37 días | $ 645,855.00 | $ 645,855.00 |
| 102 | 1.8.48 | | SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 2-1/2". | 3 días | vie 4/07/25 | mar 8/07/25 | 98 | 67 días | $ 288,622.00 | $ 288,622.00 |
| 103 | 1.8.49 | | SUM. INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CÁMARA FLEXIDOMO IP 2MP, Resolución Full HD (1080p), IP66, Alcance del iluminador IR | 3 días | vie 4/07/25 | mar 8/07/25 | 98 | 67 días | $ 1,661,411.00 | $ 1,661,411.00 |
| 104 | 1.8.50 | | SUM., INST. Y CONFIG. NVR DE 2U DE 1TB, 8 canales IP mínimo, 320 Mbps de ancho de banda entrante mínimo, | 2 días | vie 4/07/25 | lun 7/07/25 | 98 | 68 días | $ 873,551.00 | $ 873,551.00 |
| **105** | **1.9** | | **CONEXIÓN A RED EXISTEN** | **2 días** | **mié 25/06/25** | **vie 27/06/25** | | **74 días** | **$ 2,604,546.00** | **$ 2,604,546.00** |
| 106 | 1.9.1 | | CAJA DE INSPECCION SANITARIA 1.2M X | 2 días | mié 25/06/25 | vie 27/06/25 | 10 | 74 días | $ 2,604,546.00 | $ 2,604,546.00 |
| **107** | **1.10** | | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS** | **11 días** | **lun 1/09/25** | **lun 15/09/25** | | **0 días** | **$ 21,421,971.00** | **$ 21,421,971.00** |

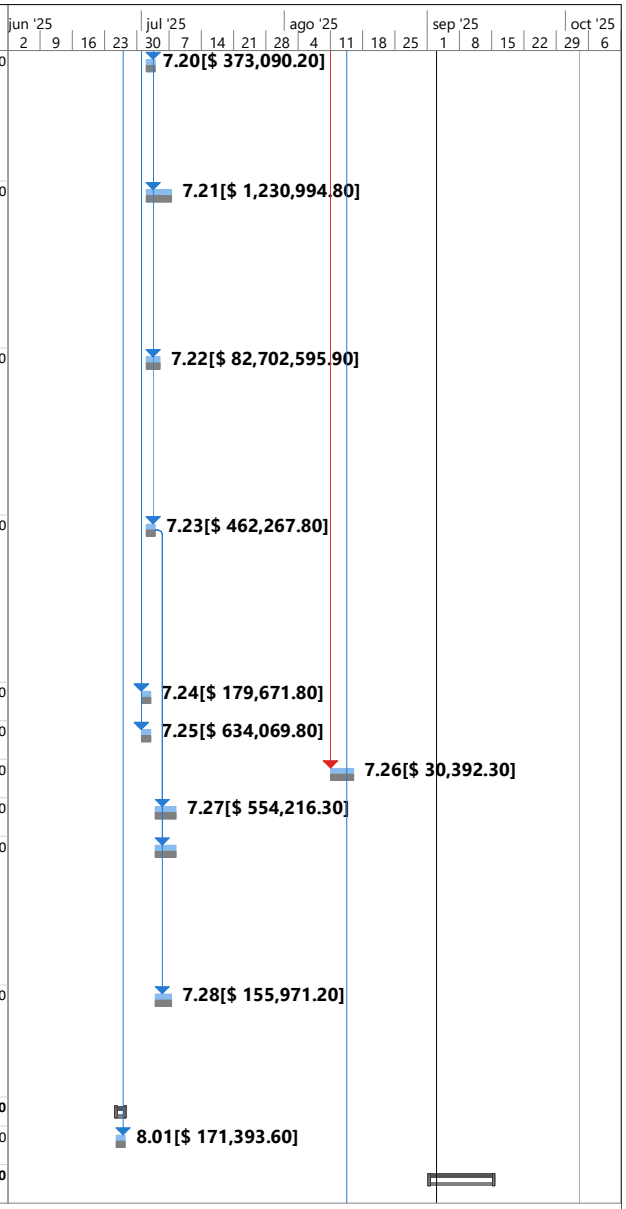


Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Línea base |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Hito de línea base |
| Resumen | solo duración | Hito externo | Resumen de línea base |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | Progreso |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | Progreso manual |

| Id | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predeceso | Demora permisible | Costo | Costo de línea base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1.10.1 | | PAÑETE DE MURO, MORTERO DE PEGA 1:4 INCLUYE TEXTURA EXISTENTE INCLUYE FILOS Y | 7 días | lun 1/09/25 | mar 9/09/25 | 33 | 0 días | $ 18,136,049.00 | $ 18,136,049.00 |
| 109 | 1.10.2 | | PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE 3 | 4 días | mié 10/09/25 | lun 15/09/25 | 108 | 0 días | $ 3,285,922.00 | $ 3,285,922.00 |
| 110 | **1.11** | | **PISOS** | **27 días** | **mié 13/08/25** | **mié 17/09/25** | | **13 días** | **$ 23,428,052.00** | **$ 23,428,052.00** |
| 111 | 1.11.1 | | ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 | 1 día | mié 13/08/25 | mié 13/08/25 | 24 | 39 días | $ 4,366,981.00 | $ 4,366,981.00 |
| 112 | 1.11.2 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 90x90 INCLUYE | 1 día | lun 15/09/25 | mar 16/09/25 | 109 | 0 días | $ 14,611,215.00 | $ 14,611,215.00 |
| 113 | 1.11.3 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PORCELANATO ANTIDESLIZANTE O SIMILAR H=7 a 10 cm | 1 día | mar 16/09/25 | mié 17/09/25 | 112 | 0 días | $ 4,449,856.00 | $ 4,449,856.00 |
| 114 | **1.12** | | **CUBIERTA** | **10 días** | **mié 17/09/25** | **mar 30/09/25** | | **0 días** | **$ 10,429,999.00** | **$ 10,429,999.00** |
| 115 | 1.12.1 | | INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN | 10 días | mié 17/09/25 | mar 30/09/25 | 113 | 0 días | $ 10,429,999.00 | $ 10,429,999.00 |
| 116 | **1.13** | | **VARIOS** | **3 días** | **mar 30/09/25** | **vie 3/10/25** | | **0 días** | **$ 1,770,198.00** | **$ 1,770,198.00** |
| 117 | 1.13.1 | | ASEO GENERAL DE OBI | 3 días | mar 30/09/25 | vie 3/10/25 | 115 | 0 días | $ 1,770,198.00 | $ 1,770,198.00 |

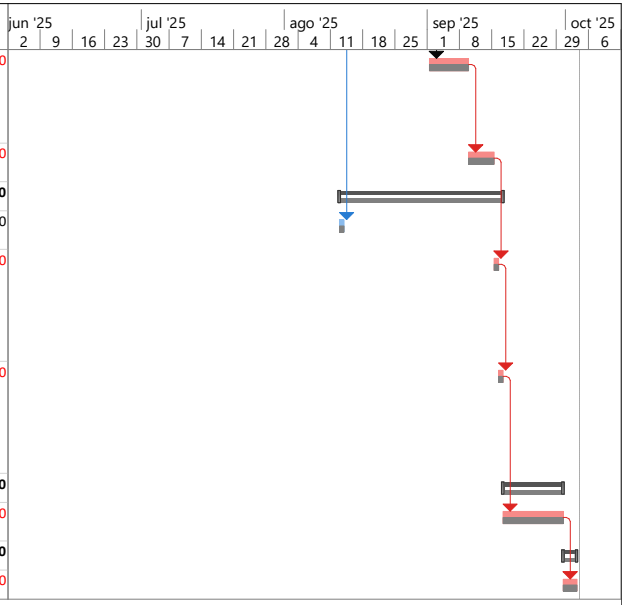


Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tarea | Hito inactivo | solo el comienzo | División crítica |
| División | Resumen inactivo | solo fin | Línea base |
| Hito | Tarea manual | Tareas externas | Hito de línea base |
| Resumen | solo duración | Hito externo | Resumen de línea base |
| Resumen del proyecto | Informe de resumen manual | Fecha límite | Progreso |
| Tarea inactiva | Resumen manual | Tareas críticas | Progreso manual |

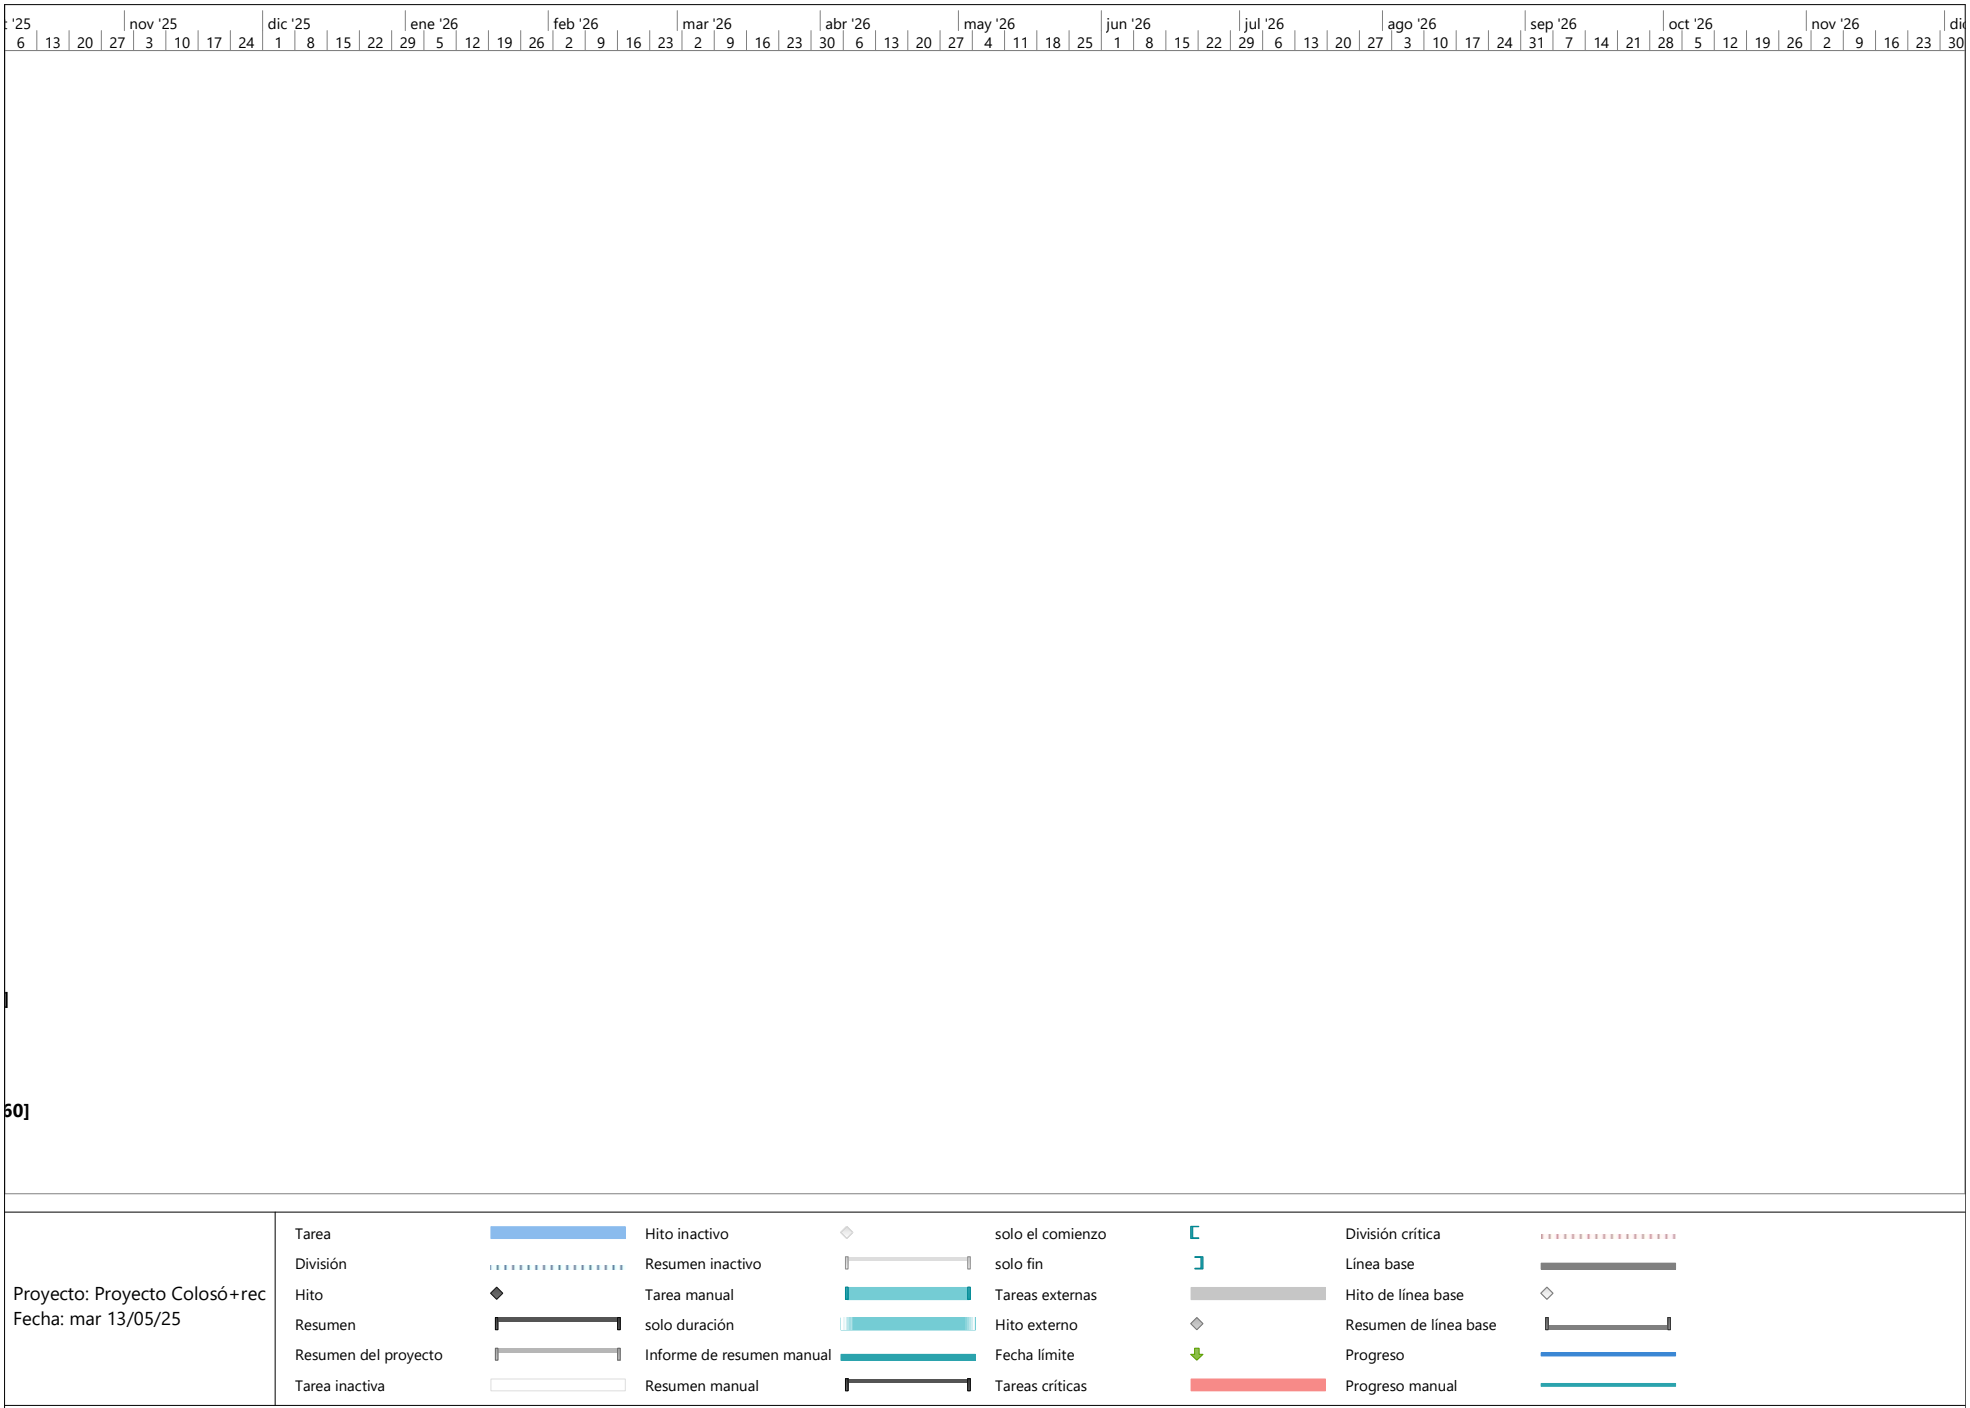
'25
nov '25
dic '25
ene '26
feb '26
mar '26
abr '26
may '26
jun '26
jul '26
ago '26
sep '26
oct '26
nov '26
6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
]
60]
Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: mar 13/05/25
Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base
Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual
