

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Demora permisible	Costo
1	1		**Proyecto Palacio de Justicia Colosó**	**91 días**	**mar 3/06/25**	**vie 3/10/25**		**0 días**	**$ 327.607.177,00**
2	1.1		**PRELIMINARES**	**10 días**	**mar 3/06/25**	**sáb 14/06/25**		**0 días**	**$ 3.209.775,00**
3	1.1.1		LOCALIZACION Y REPLANTEO	5 días	mar 3/06/25	lun 9/06/25		0 días	$ 1.957.232,00
4	1.1.2		CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC CALIBRE 26 H=2.5 M	5 días	lun 9/06/25	sáb 14/06/25	3	0 días	$ 1.252.523,00
5	1.2		**DEMOLICIONES Y DEMOLICIONES**	**16 días**	**lun 16/06/25**	**mar 8/07/25**	**2**	**0 días**	**$ 72.668.023,00**
6	1.2.1		DEMOLICION DE ENCHAPE PISO	4 días	lun 16/06/25	jue 19/06/25		0 días	$ 9.678.672,00
7	1.2.2		DEMOLICION LOSA DE CONTRAPISO	7 días	vie 20/06/25	mar 1/07/25	6	0 días	$ 9.977.267,00
8	1.2.3		DEMOLICION DE CIELORRASO	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	7	0 días	$ 9.871.532,00
9	1.2.4		CAJAS PERDIDAS/OBRAS	5 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	6	0 días	$ 24.179,00
10	1.2.5		DEMOLICION DE PARTE DE MURO	3 días	vie 20/06/25	mié 25/06/25	6	0 días	$ 36.177.563,00
11	1.2.6		DEMOLICION DE OBRAS EN CONCRETO	5 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	6	7 días	$ 847.001,00
12	1.2.7		DEMOLICION DE ESCALON COMUN	3 días	vie 27/06/25	mié 2/07/25	9	4 días	$ 6.092.814,00
13	1.3		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**28 días**	**mar 8/07/25**	**mié 30/07/25**	**5**	**0 días**	**$ 15.064.162,00**
14	1.3.1		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA	10 días	mar 8/07/25	lun 21/07/25	7	0 días	$ 5.893.864,00
15	1.3.2		MEJORAMIENTO CON GEOTEXTIL NT-1800	5 días	lun 21/07/25	jue 24/07/25	14	0 días	$ 631.350,00
16	1.3.3		RELLENO PARA ESTRUCTURAS (TIPO	5 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25	15	0 días	$ 1.339.283,00
17	1.3.4		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	5 días	lun 21/07/25	jue 24/07/25	14	54 días	$ 3.603.435,00
18	1.3.5		RELLENO CON ARENA	5 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25	15	0 días	$ 283.642,00
19	1.3.6		RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE INV E 673-22	2 días	vie 25/07/25	mié 30/07/25	18	49 días	$ 1.379.105,00
20	1.3.7		CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI	5 días	jue 24/07/25	lun 28/07/25	15	51 días	$ 4.338.708,00
21	1.4		**ESTRUCTURAS EN CONCR R días**		**vie 1/08/25**	**mar 12/08/25**		**0 días**	**$ 60.860.353,00**
22	1.4.1		ZAPATAS 3000 PSI (21 MPA)	5 días	vie 1/08/25	mar 5/08/25	26	0 días	$ 4.861.778,00
23	1.4.2		VIGAS CIMENTACION 3000 PSI (21 MPA)	5 días	vie 1/08/25	mar 5/08/25	26	0 días	$ 17.404.513,00
24	1.4.3		PLACA DE CONTRAPISO 13L	5 días	mar 5/08/25	mar 12/08/25	23,22	0 días	$ 18.974.064,00
25	1.5		**ESTRUCTURAS EN ACERO 35**		**mar 8/07/25**	**sáb 23/08/25**		**16 días**	**$ 69.529.534,00**
26	1.5.1		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI	5 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25	16	0 días	$ 21.333.735,00
27	1.5.2		ANCLAJES	3 días	mar 8/07/25	vie 11/07/25	8	64 días	$ 1.120.870,00
28	1.5.3		ANGULOS 3/8"X2"	5 días	mar 5/08/25	sáb 9/08/25	23	0 días	$ 853.288,00
29	1.5.4		TUBOS PTE 40X40X2,5	5 días	mar 5/08/25	sáb 9/08/25	23	42 días	$ 10.788.884,00
30	1.5.5		VARILLA 8 (1") TROQUELADA	10 días	lun 11/08/25	sáb 23/08/25	28	32 días	$ 15.226.788,00
31	1.6		**TUBERIA**	**5 días**	**jue 24/07/25**	**mié 30/07/25**		**49 días**	**$ 1.009.165,00**
32	1.6.1		TUBERIA PERFORADA PVC 4"	5 días	jue 24/07/25	mié 30/07/25	15	49 días	$ 1.909.165,00
33	1.7		**INSTALACIONES AGUA POTABLE, DESAGÜE Y**	**46 días**	**lun 1/09/25**	**lun 1/12/25**		**0 días**	**$ 18.041.125,00**
34	1.7.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA 1/2" PVC -P Incluye tubería (Promedio	3 días	lun 11/08/25	mié 13/08/25	28	13 días	$ 598.165,00
35	1.7.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" , por alimedio de placa, Agua fria (Red de suministro).	3 días	lun 11/08/25	mié 13/08/25	28	0 días	$ 981.405,00
36	1.7.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua fria (Red de suministro). Por	2 días	jue 14/08/25	vie 15/08/25	35	11 días	$ 85.546,00
37	1.7.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua fria (Red de suministro). Por	3 días	jue 14/08/25	mar 19/08/25	35	0 días	$ 685.294,00
38	1.7.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA 1/2" USA SOLDABLE. Grival o similar. Incluye accesorios (adaptadores), universal, tapa	3 días	mar 19/08/25	vie 22/08/25	37	0 días	$ 203.054,00
39	1.7.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR 1/2" PARA AGUA FRÍA, VALIDADO Y HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS DE LA URIBE. Incluye derechos de conexión,	3 días	mar 19/08/25	vie 22/08/25	37	7 días	$ 464.305,00
40	1.7.7		Suministro e instalación de cajilla en lámina Cal. 18 para 1 medidor, homologada por la empresa prestadora.	4 días	vie 22/08/25	mié 27/08/25	38	0 días	$ 496.790,00
41	1.7.8		CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA PVC (P Diámetro variable, incluye instalación, accesorios, collarín y	3 días	jue 28/08/25	lun 1/09/25	40	0 días	$ 492.410,00
42	1.7.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC 2" . Incluye tubería	4 días	mié 2/07/25	mié 2/07/25	7	0 días	$ 402.365,00
43	1.7.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC 3 -2" SIFONES. Incluye tubería (Pvsm,	3 días	lun 7/07/25	jue 10/07/25	42	0 días	$ 440.859,00
44	1.7.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC 3 -3" SIFONES. Incluye tubería	3 días	lun 7/07/25	jue 10/07/25	43	30 días	$ 131.107,00
45	1.7.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DESAGÜE PVC 3 -4" . Sanitarios. Incluye tubería	3 días	lun 7/07/25	jue 10/07/25	42	0 días	$ 198.865,00
46	1.7.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA ALUMINIO ANTICUCARACHAS	3 días	jue 10/07/25	lun 14/07/25	45	36 días	$ 186.373,00
47	1.7.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 2" . Alfinado piso, Incl	5 días	jue 10/07/25	mié 16/07/25	43	34 días	$ 782.858,00
48	1.7.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 3" . Alfinado piso, Incl	5 días	jue 10/07/25	mié 16/07/25	43	0 días	$ 220.181,00
49	1.7.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-S 4" . Alfinado piso, Incl	6 días	jue 17/07/25	jue 24/07/25	48	28 días	$ 5.943.956,00
50	1.7.17		SUM. E INST. DE TUBERIA PVC-L 2" (Ventil). Incl.accesy	2 días	jue 10/07/25	sáb 12/07/25	45	37 días	$ 1.001.776,00
51	1.7.18		SUM. E INST. DE TUBERIA AGUANTARILLADO 6" Tipo Novafort o similar. Incluye relleno inicial(0.15m), relleno lateral y relleno final con base granular fina	1 día	mié 13/08/25	mié 13/08/25	24,22,23	0 días	$ 1.870.677,00
52	1.7.19		CAJA DE INSPECCION 0,8x0,8x1m. Incl Exc.,recubr.cemto compactado,placa y tapa en concreto reforzado,ladrillo común,pañete impermeabilizado,mat sello,mano de obra	3 días	jue 14/08/25	mar 19/08/25	51	0 días	$ 1.544.648,00
53	1.7.20		CONEXIÓN A CAJA O POZO EXISTENTE. Incluye demolición de muro,contrapis cargue y ret. De mat. A	4 días	mar 19/08/25	sáb 23/08/25	52	6 días	$ 1.608.601,00
54	1.8		**INSTALACIONES VOZ Y DATOS**	**61 días**	**mar 3/06/25**	**sáb 23/08/25**		**32 días**	**$ 65.886.497,00**
55	1.8.1		SUM. E INST. CAJA DE INSPECCIÓN NUMERO 0,4 PARA CANALIZACIÓN DE MT. Y B.T. NORMA COLSWA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recubo	8 días	mié 13/08/25	sáb 23/08/25	24,22,23	32 días	$ 1.489.863,00
56	1.8.2		SUM. E INST. ACOMETIDA 3ø Cu THWN/THWN/1X CABLE 2/0AWG + CABLE 2/0AWG +	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	9	73 días	$ 636.048,00
57	1.8.3		SUM. E INST. ACOMETIDA 3ø Cu THWN/THWN/1X CABLE 2/0AWG + CABLE 2/0AWG +	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	9	0 días	$ 1.355.697,00
58	1.8.4		SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT PVC 2" .	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	9	0 días	$ 736.247,00
59	1.8.5		SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 1" .	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	9	0 días	$ 954.072,00
60	1.8.6		SUM. E INST. TABLERO 24 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA Y CHAFLAN PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	9	73 días	$ 625.408,00
61	1.8.7		SUM. E INST. TABLERO 32 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA Y CHAFLAN PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	9	73 días	$ 1.004.795,00
62	1.8.8		SUM. E INST. INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A. Cobbial Ingrand, Siemens, Square D o	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	57	72 días	$ 138.212,00
63	1.8.9		SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X40A. Cobbial Ingrand, Siemens, Square D o	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	57	72 días	$ 94.082,00
64	1.8.10		SUM. E INST. INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X50A. Cobbial Ingrand, Siemens, Square D o	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	57	72 días	$ 227.531,00
65	1.8.11		SUM. E INST. INTERRUPTOR BIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA + UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 Ka CALIDAD (LEGRAND,	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	57	72 días	$ 443.239,00

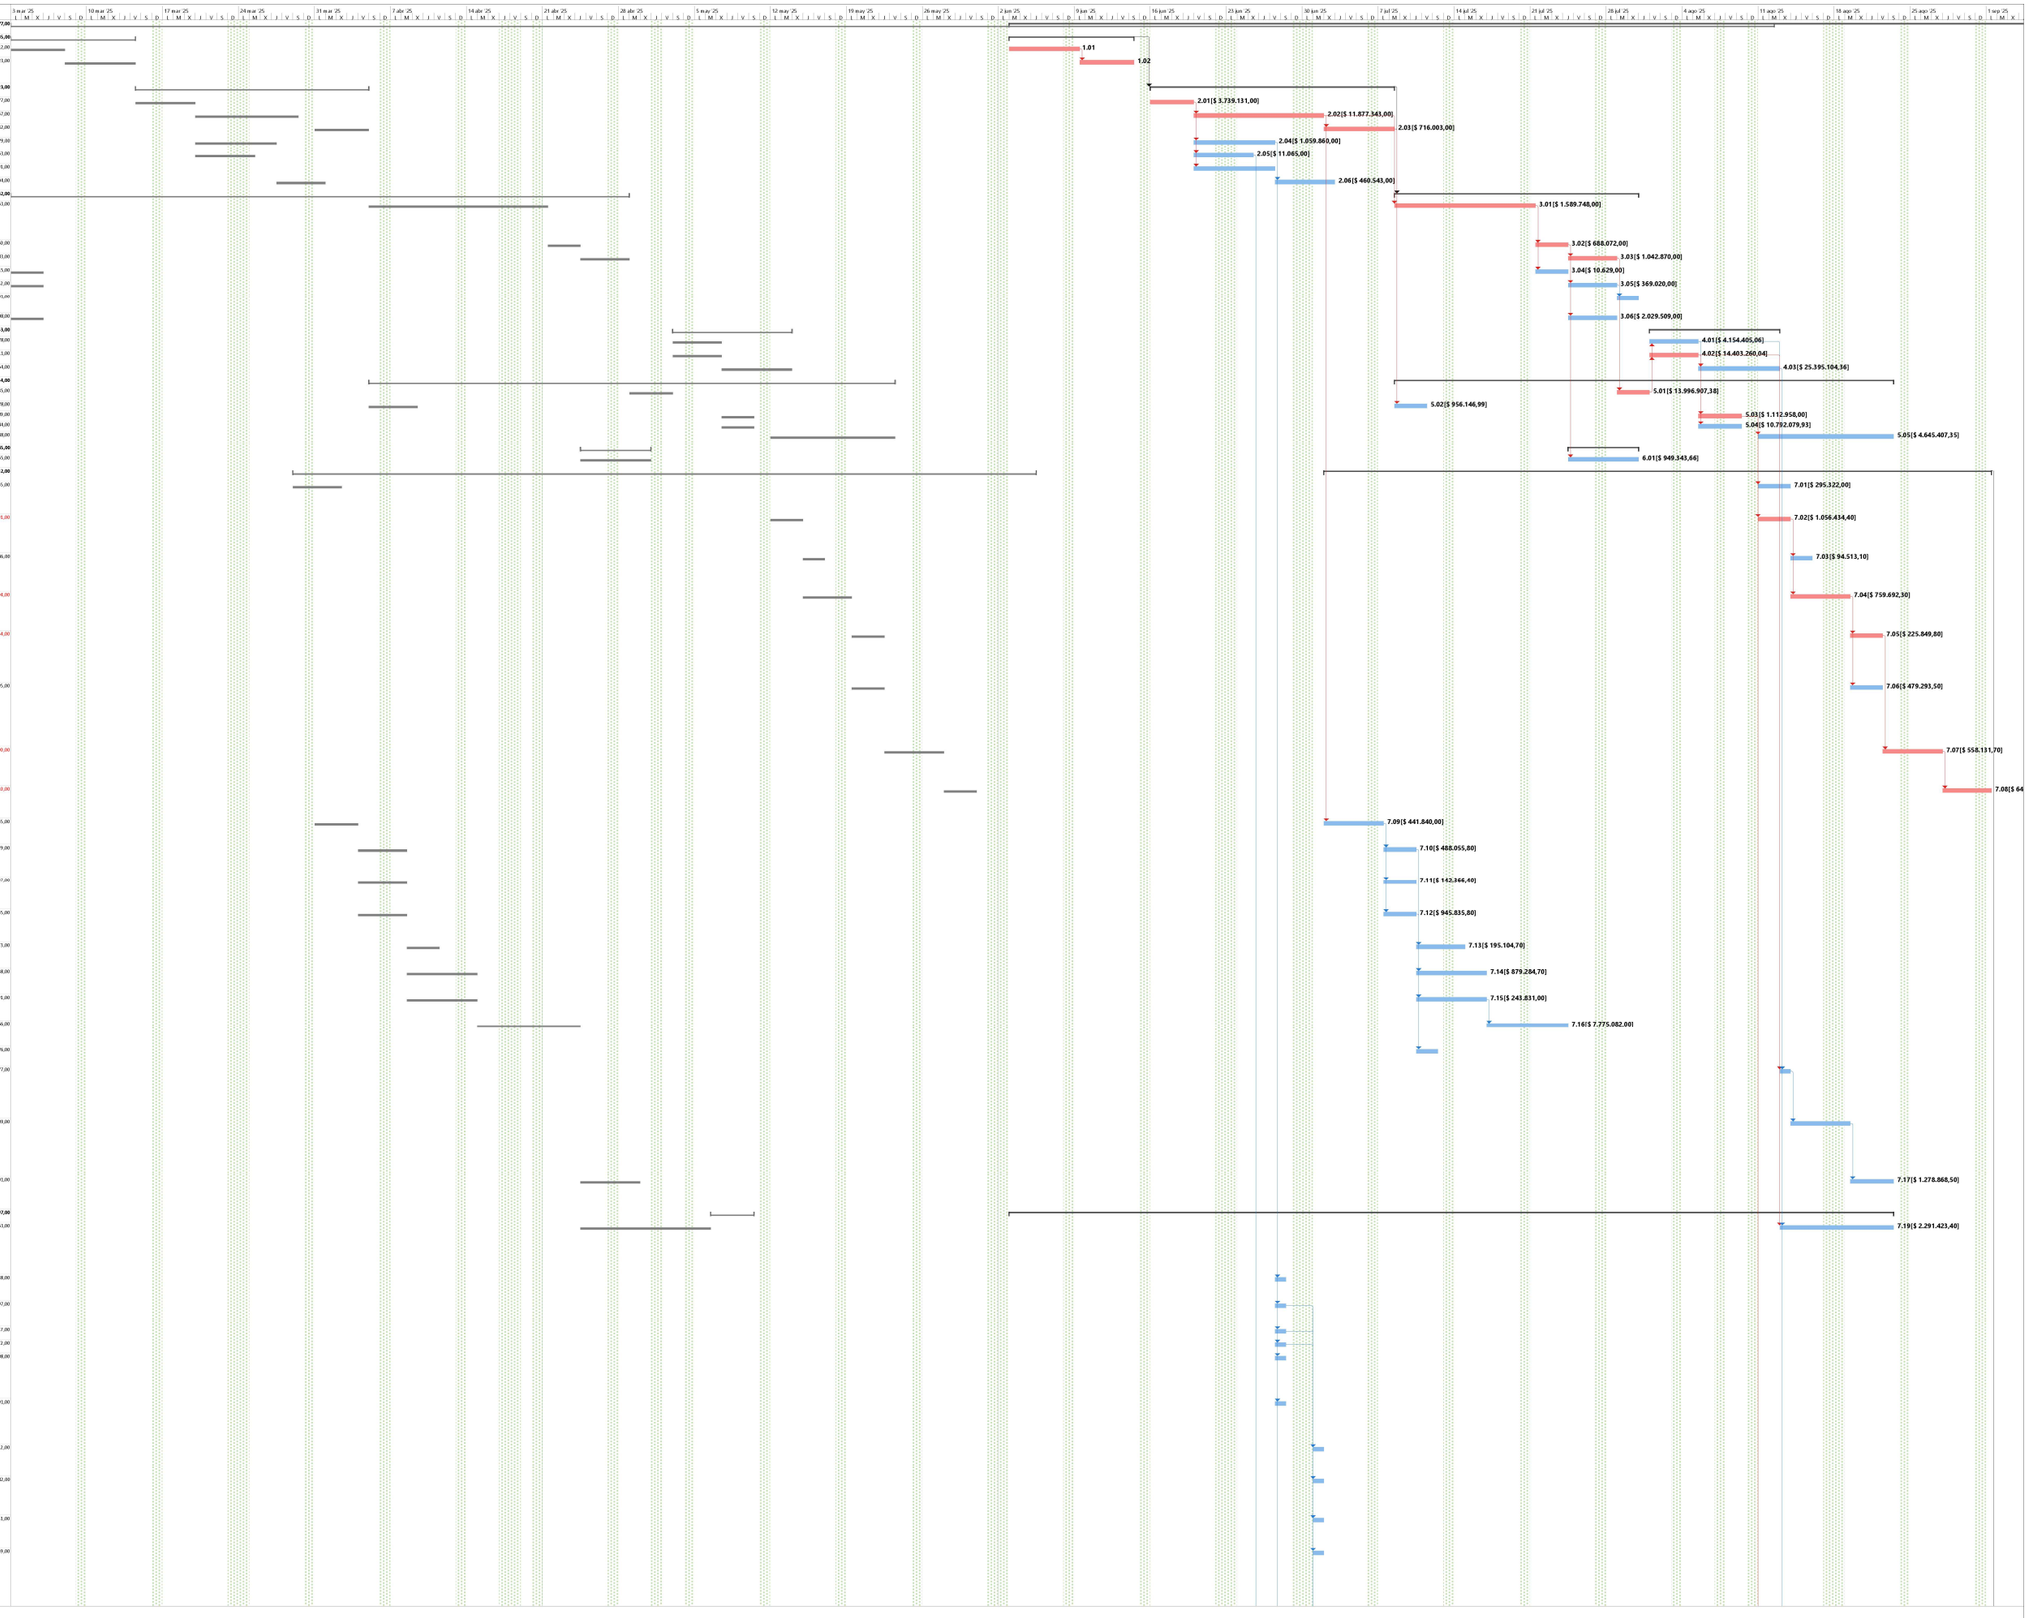

Proyecto: Proyecto Colosó+rec
Fecha: lun 21/04/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Línea base · Hito de línea base · Resumen de línea base · Progreso · Progreso manual

Id	EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Demora laborable	Costo
66	1.8.12		SUM. E INST. INTERRUPTOR BIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON LINEADO DE DISPARO TERMOMAGNETICA F3A 100A, 25 kA CALIDAD LEGRAND,	1 día	mar 1/07/25	mar 1/07/25	57	0 días	$ 493.954,00
67	1.8.13		MEDIDOR BIFASICO Electromagnetico de 5 a 100 AMP, calibrado	1 día	mié 2/07/25	mié 2/07/25	66	0 días	$ 261.324,00
68	1.8.14		SUM. MEDIDOR A BIFASICO NORMA CODENSA AE303	1 día	mié 2/07/25	mié 2/07/25	66	71 días	$ 323.327,00
69	1.8.15		TRAM. DE ING. ELECT. ANTE OPER. RED LOCAL (O.R). INCL. TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES REQUERIDOS Y/O	2 días	mar 3/06/25	mié 4/06/25		91 días	$ 8.000.000,00
70	1.8.16		SUM. INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE CALIBRE CALIBRE AWG No. 8 - INCL. LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	2 días	jue 3/07/25	vie 4/07/25	67	69 días	$ 576.513,00
71	1.8.17		SUM. E INST. VARILLA CW 5/8" X 2.40 MTS. INCL. PUNTO SOLDADURA CON RESPECTIVO MOLDE Y	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	9	0 días	$ 524.178,00
72	1.8.18		SUM. E INST. CAJA DE INSPECCION DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP28D. INCL. ACCESORIOS DE	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	9	72 días	$ 331.701,00
73	1.8.19		SAL. TOMAC. DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI 15 A,127 V TUBERIA CONDUIT PVC 3/4"	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 282.151,00
74	1.8.20		SAL. TOMAC. NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 2.338.459,00
75	1.8.21		SAL. TOMAC. REGULADA DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERIA	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 1.201.991,00
76	1.8.22		SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 4.209.248,00
77	1.8.23		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBELL O ESPEC. TECN. SIMIL. DE 2W, FP>0.95,	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	58;59	71 días	$ 563.012,00
78	1.8.24		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 40 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°,	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	58;59	71 días	$ 619.503,00
79	1.8.25		SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED 0.6-8" DE 18 W, Multivoltaje, Temperatura de color	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	58;59	71 días	$ 282.441,00
80	1.8.26		SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	58;59	71 días	$ 1.630.049,00
81	1.8.27		SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO conmutable EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	58;59	71 días	$ 313.776,00
82	1.8.28		SUM. E INST. DE TUBERIA CONDUIT	2 días	vie 27/06/25	mar 1/07/25	9	72 días	$ 3.176.544,00
83	1.8.29		SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICA, POLO A	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	58;59	71 días	$ 981.914,00
84	1.8.30		SUM. E INST. ACOMETIDA 3H Cu HFFR,0.5% CABLE 2X10AWG + 12TAWG,	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	58;59	71 días	$ 1.680.588,00
85	1.8.31		SUM. E INST. CONLA 3/4 AMERICANA 3/4"	3 días	mié 2/07/25	vie 4/07/25	71	69 días	$ 369.212,00
86	1.8.32		SUM. INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 12.000	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 3.589.145,00
87	1.8.33		SUM., INST. Y PUESTA FUNCIONAMIENTO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 18.000 BTU NIVEL DE	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 4.784.289,00
88	1.8.34		SUM. INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT POTENCIA FRIGORIFICA 12.000	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 1.761.145,00
89	1.8.35		SUM. E INST. PUNTO DOBLE DATOS CATEGORIA 6A U-UTP, (1) FACEPLATE RJ45, (2) JACK TWIST (Metal/Moldeado) RJ45 110Gb, Accesorios de amarre y	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 371.782,00
90	1.8.36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR-n LSZH, Longitud 1.5 mts, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 417.577,00
91	1.8.37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD UTP CAT 6A CMR-n LSZH, Longitud 3 mts, Cuatro (4) pares, Diametro 7.6 mm máximo, Conector plug RJ45, Frecuencia	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 1.089.879,00
92	1.8.38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE PARED DE 19", 15 UR, Capacidad de carga para 30 kg o +, Ranuras de	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 1.460.166,00
93	1.8.39		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWITCH 24 x 10/100/1000T POE+, 4 x 10G SFP+ ports US Power Cord, Soporte técnico cada uno de	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 4.568.080,00
94	1.8.40		SUM., INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, Categoria 6A UTP, Incluye Modulos	1 día	mié 2/07/25	mié 2/07/25	71	71 días	$ 529.206,00
95	1.8.41		SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR HORIZONTAL DOBLE TAPA DE 19", En calidad Ortovinco o superior. INCLUYE	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	70 días	$ 128.138,00
96	1.8.42		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE U/UTP CAT6A LSZH, 4 PAREJS, 23 AWG, Cumplimiento con las normas TIA-568-c.2 o	4 días	mié 2/07/25	lun 7/07/25	71	68 días	$ 4.545.807,00
97	1.8.43		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACCESS POINT, Frequencia de 2.4GHz y 5GHz, Fuente de Alimentación PoE, Dos (2) puertos	3 días	mié 2/07/25	vie 4/07/25	71	69 días	$ 850.422,00
98	1.8.44		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLUG RJ-45 CAT 6P, Para Cable Blindado Conectiz Como NPTL (Modular Plug Terminated Link),	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	71	0 días	$ 1.586.886,00
99	1.8.45		SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	58;59	71 días	$ 813.829,00
100	1.8.46		SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 1-1/2",	2 días	mar 1/07/25	mié 2/07/25	58;59	71 días	$ 97.650,00
101	1.8.47		SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 2",	5 días	lun 11/08/25	vie 15/08/25	28	37 días	$ 645.855,00
102	1.8.48		SUM. E INST. TUBERIA CONDUIT EMT 2-1/2",	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25	98	67 días	$ 288.622,00
103	1.8.49		SUM. INST. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CÁMARA FLEXIDOMO IP 2MP, Resolución Full HD (1080p), IP66, Alcance del iluminador IR	3 días	vie 4/07/25	mar 8/07/25	98	67 días	$ 1.661.411,00
104	1.8.50		SUM., INST. Y CONFIG. NVR DE 2U DE 1TB, 8 canales IP mínimo, 320 Mbps de ancho de banda entrante mínimo,	2 días	vie 4/07/25	lun 7/07/25	98	68 días	$ 873.551,00
105	**1.9**		**CONEXION A RED EXISTE**	**12 días**	**mié 25/06/25**	**vie 27/06/25**		**74 días**	**$ 2.604.546,00**
106	1.9.1		CAJA DE INSPECCION SANITARIA 1.20x.9	2 días	mié 25/06/25	vie 27/06/25	10	74 días	$ 2.604.546,00
107	**1.10**		**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**	**11 días**	**lun 1/09/25**	**lun 15/09/25**		**0 días**	**$ 21.421.971,00**
108	1.10.1		PAÑETE DE MURO, MORTERO DE PEGA 1:4 INCLUYE TEXTURA EXISTENTE INCLUYE	7 días	lun 1/09/25	mar 9/09/25	33	0 días	$ 18.136.046,00
109	1.10.2		PINTURA EN VINILO SOBRE MUROS 1	4 días	mié 10/09/25	lun 15/09/25	108	0 días	$ 3.285.922,00

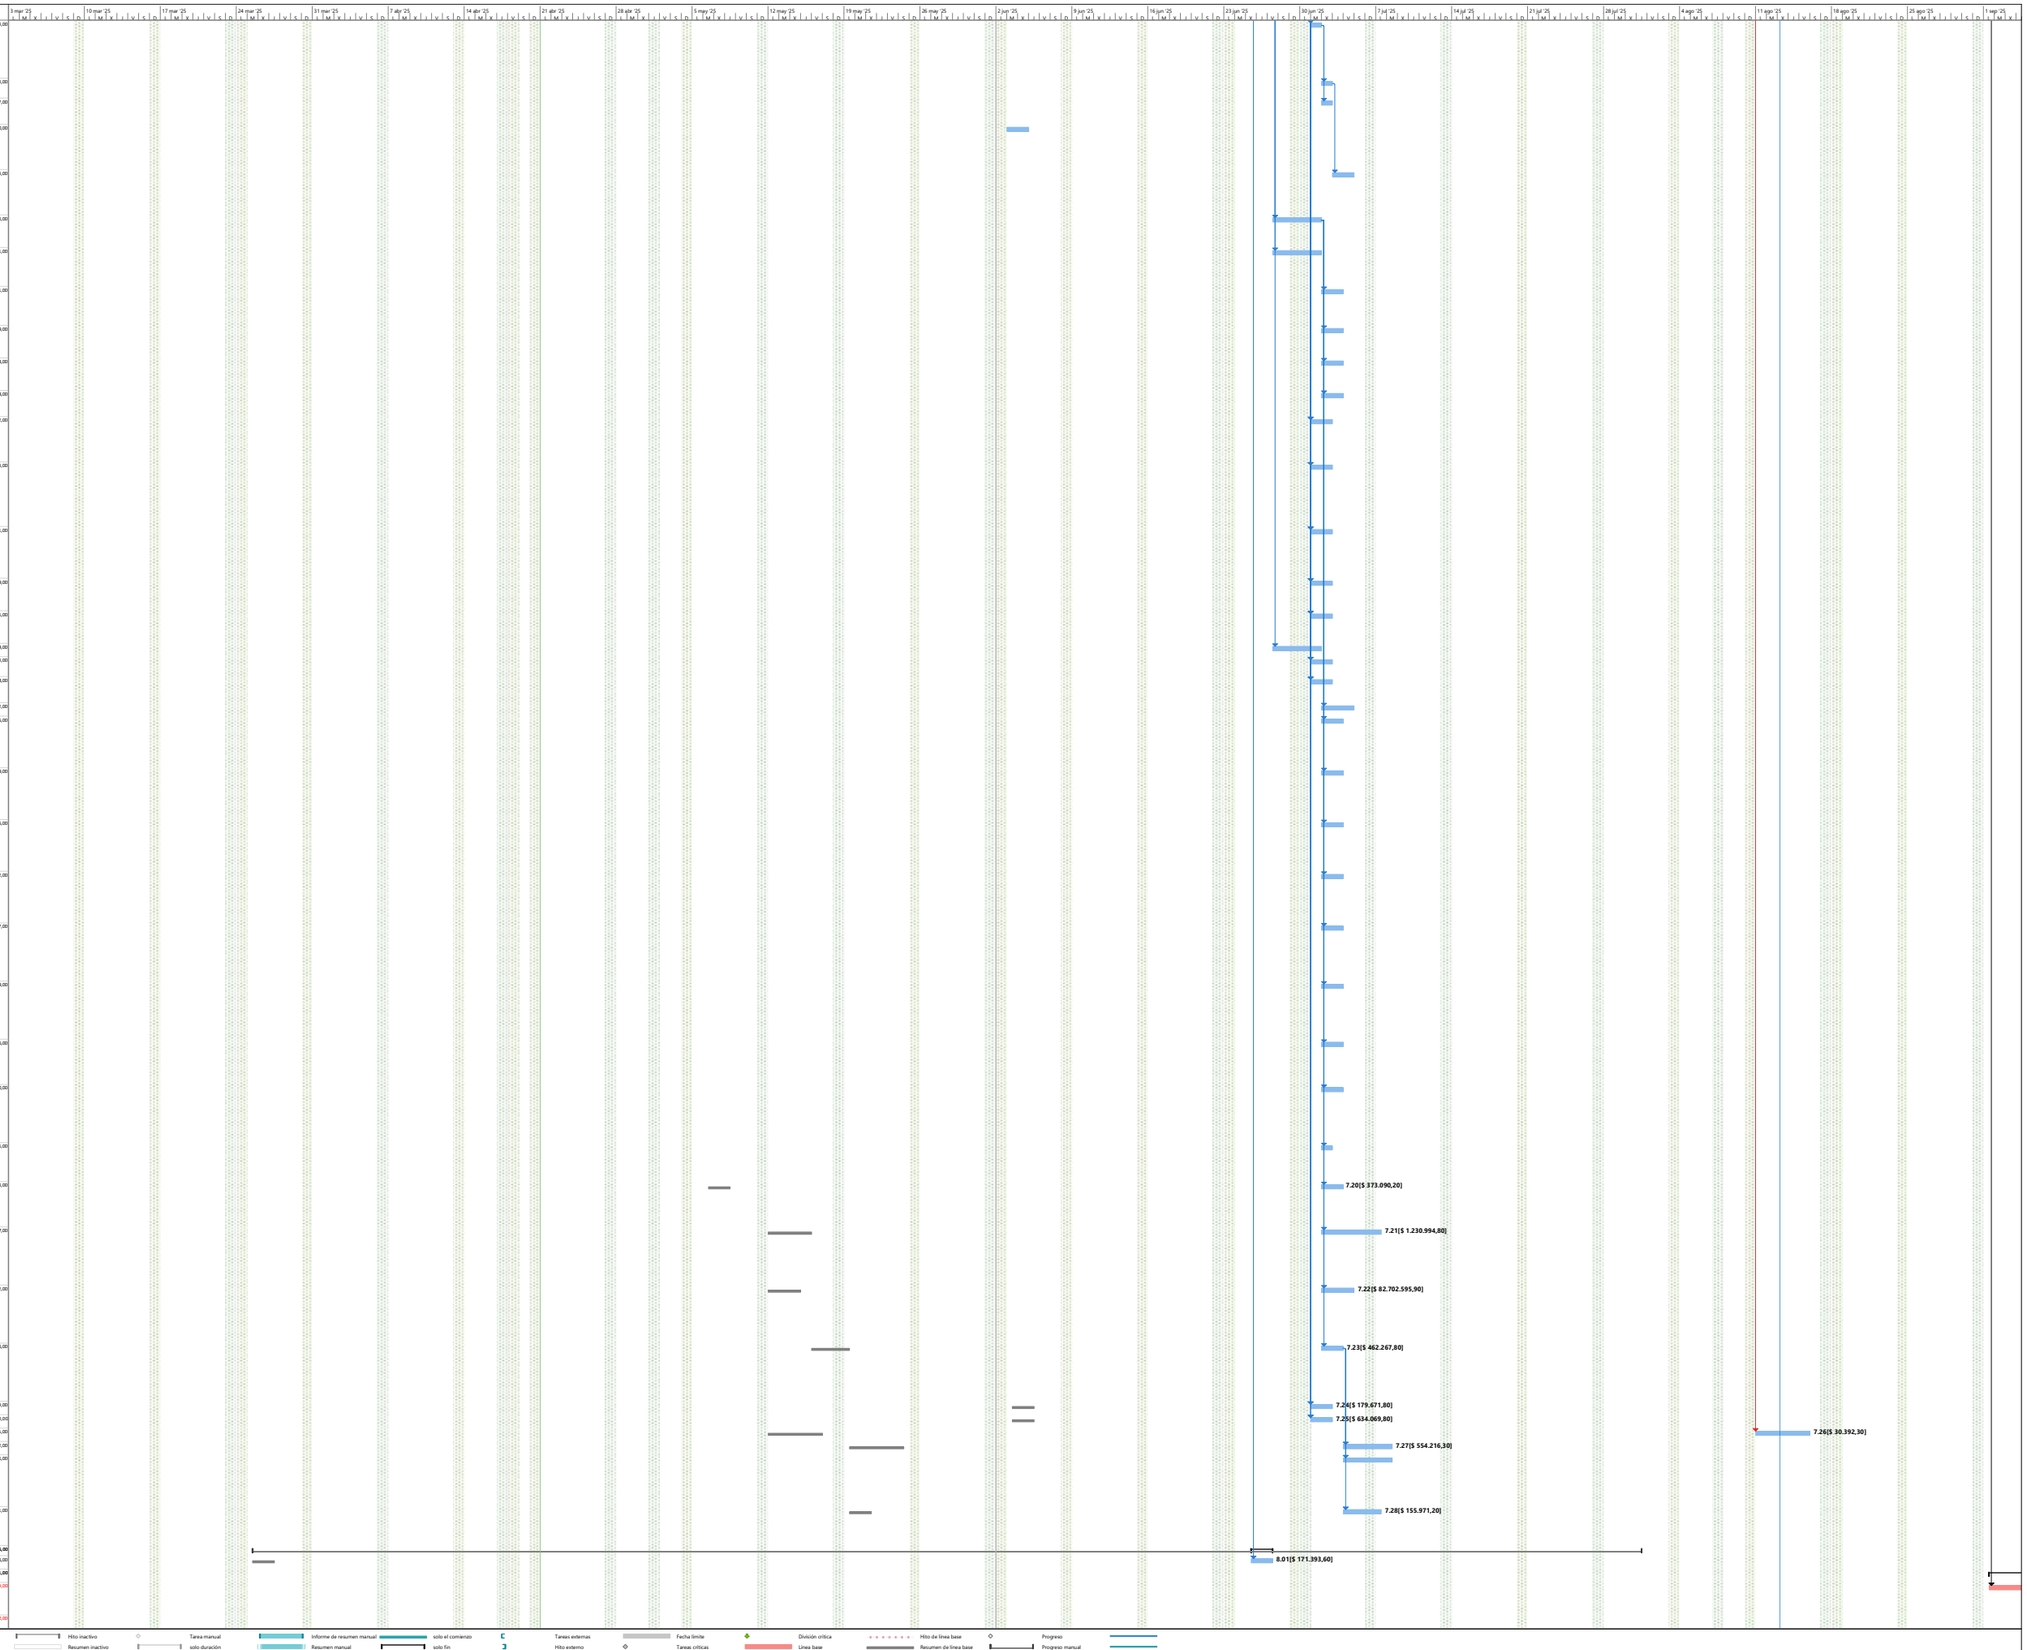

Proyecto: Proyecto Colosió+rec
Fecha: lun 21/04/25

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Hito de línea base · Progreso
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Línea base · Resumen de línea base · Progreso manual

Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Demora	Costo
110		**1.11**		**PISOS**	**27 días**	**mié 13/08/25**	**mié 17/09/25**		**13 días**	**$ 23.428.052,00**
111		1.11.1		ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3	1 día	mié 13/08/25	mié 13/08/25	24	39 días	$ 4.366.98 0,00
112		1.11.2		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISO EN PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 30x60 INCLUYE	1 día	lun 15/09/25	mar 16/09/25	109	0 días	$ 14.611.215,00
113		1.11.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA PORCELANATO ANTIDESLIZANTE O SIMILAR H=7 a 10 cm	1 día	mar 16/09/25	mié 17/09/25	112	0 días	$ 4.449.856,00
114		**1.12**		**CUBIERTA**	**10 días**	**mié 17/05/25**	**mar 30/05/25**		**0 días**	**$ 10.429.999,00**
115		1.12.1		INSTALACIÓN DE CELOSÍMICO EN	10 días	mié 17/05/25	mar 30/05/25	113	0 días	$ 10.429.999,00
116		**1.13**		**VARIOS**	**3 días**	**mar 30/09/25**	**vie 3/10/25**		**0 días**	**$ 1.770.198,00**
117		1.13.1		ASEO GENERAL DE OBR	3 días	mar 30/09/25	vie 3/10/25	115	0 días	$ 1.770.198,00

