	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Código: GP-F093 Versión: 3 Fecha: 31/07/2018

FECHA	6/02/2024	PERIODO No.	9	DEL	29/01/2024	AL	4/02/2024

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.:	EPC-PDA-I-501-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
LOCALIZACIÓN:	CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO JUNIN

CONTRATO DE OBRA				VIGENCIA DE LAS POLIZAS		
PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES			**AMPARO**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE INICIACIÓN:	27/11/2023			CUMPLIMIENTO	27/11/2023	27/12/2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			SALARIOS Y PRESTACIONES	27/11/2023	27/08/2027
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/08/2024			BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO ACTUALIZADO:	273			RESPONSABILIDAD CIVIL	27/11/2023	27/08/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	69	EQUIVALE AL	25,27%	**AVANCE DEL CONTRATO**		
				AVANCE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
VALOR INICIAL :	$ 3.045.916.515,00			**TIEMPO %**	25,27%	25,27%
VALOR ADICION(ES):	N/A					
VALOR FINAL:	$ 3.045.916.515,00			**OBRA FISICA %**	6,24%	6,24%
VALOR PAGADO:	N/A					
VALOR POR PAGAR:	$ 3.045.916.515,00			**FINANCIERO%**	6,24%	6,24%

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN POR COLMATACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	29/01/2024	30/01/2024	2	29/01/2024	30/01/2024	2	0	0
1	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO NO SE REALIZAN SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA (EPC) , POR LO TANTO DURANTE ESTE PERIODO NO SE REGISTRA AVANCE DE OBRA FISICA Y FINANCIERA							no iniciado	no iniciado
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VEHÍCULO CARRO TANQUE DE 10 M3 EN EL MUNICIPIO DE NEMOCON	2/02/2024	4/02/2024	3	2/02/2024	4/02/2024	3	0	0
Plazo del proyecto en días		**204**							

.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 190.044.847,30	6,24%	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 190.044.847,30	6,24%	


3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA REPORTADA

No.	Descripción de actividades (Alcance viabilizado del proyecto)	DESCRIPCION	Programado a la fecha(%)	Ejecutado acumulo anterior (%)	Ejecutado Actual (%)	Ejecucion total actual(%)
1	ATENCIÓN CON EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN	Se da atención con equipos de succión presión por colmatación de las redes de alcantarillado en el municipio de Soacha	**0,28%**	**4,25%**	**0,28%**	**4,53%**
1	ATENCION CON EQUIPO CARRO TANQUE DE 10 M³	Se da atención con carrotanque en el municipio de Nemocon	**0,24%**	**1,47%**	**0,24%**	**1,71%**

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha logrado un cumplimiento total de todas las metas y objetivos establecidos en la programación. A pesar del cumplimiento satisfactorio, se sugiere una revisión continua de los procesos para identificar posibles eficiencias adicionales.

REGISTRO FOTOGRAFICO

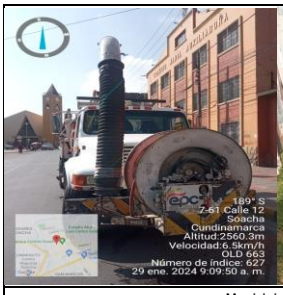



Municipio: Soacha	
Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**





Municipio: Nemocon	
Fotografía Nº 1	**Fotografía Nº 2**

Elaboro:

RAMON LIZARAZO
Director de interventoria
