ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

BOGOTÁ

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR ORIENTE

CTO SDM 2024-3653

INFORME MENSUAL No. 3

24 DE MARZO A 23 DE ABRIL

UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

ABRIL 2025

ICOVÍAS
INGENIERÍA VIAL S.A.S.
UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL ECOSEÑALIZACIÓN 2024

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	Luis Fernando Rubiano Barrero	Director De Proyecto MSc. Planeación de Transporte e Ingeniería	
REALIZÓ	Alba Avendaño Cipagauta	Coordinadora	

INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Ing. Sergio Valderrama Camargo	Director de interventoría	
APROBÓ	Ing. Julián Álvarez	Residente de interventoría	

MODIFICACIONES		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3. PERIODO DE REPORTE 9
4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN) 10
5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 11
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 13
7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 39
8. ASPECTOS TÉCNICOS 54
9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES 56
10. PLAN DE CALIDAD 58
11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS 59
12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES 60
13. REPORTE ESTADISTICO 62
14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS 64
15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN 65
16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN 73
17. ASPECTOS VARIOS 74
18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA 75
18.1 PERSONAL 75
18.2 EQUIPO 75
18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD 75
19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE. 77
20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES. 78

21. FACTOR SOCIAL 79

22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 80

23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 81

24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO 82

25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS 83

26. LISTADO DE PROVEEDORES 84

27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES 85

28. ESTADO PRESUPUESTAL 86

29. PUNTAJE 89

30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 90

31. ANEXOS 91

Gráfica 1 Gráfica Curva S 86

Ilustración 1 Localización Zona 7 8
Ilustración 2 Precipitación mes de abril 55

Tabla de contenido (Tablas)

Tabla 1 Datos generales del Contrato 7
Tabla 2 UPZ localidades asignadas 8
Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563 10
Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación 11
Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 1 39
Tabla 6 Inspecciones realizadas 54
Tabla 7 Actividades por componente 62
Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas 63
Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados 65
Tabla 11 Estado Georeferenciación 74
Tabla 12 Personal mínimo 75

Tabla 13 Equipos empleados para la ejecución de las actividades 75
Tabla 14 Cantidades ejecutadas por ID 86
Tabla 15 Balance presupuestal 88

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de atender las necesidades de señalización de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, como autoridad de tránsito y en cumplimiento de sus funciones establecidas por el Decreto 672 del 22 de ENERO de 2018[1], se encarga de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito en la ciudad.

Es así que la SDM generó un programa para implementar las medidas necesarias y realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización de la ciudad, que incluye la señalización de ciclorrutas, medidas de gestión, carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, proyectos de urbanismo táctico, plazas, corredores verdes, distritos verdes, barrios vitales y mantener en condiciones óptimas de señalización para todos los usuarios de la vía; integrando por grupos las veinte (20) localidades y dividiendo el perímetro urbano y rural en siete (7) zonas y en catorce (14) corredores principales.

En marco de este programa la SDM celebro el contrato SDM-2024-3653 con la firma Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, el cual tiene por objeto "*Realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. Zona Sur Oriente*", para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical de pedestal, la aplicación de señalización horizontal y la implementación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidad de Usme, San Cristóbal y Ciudad Bolívar y y en los corredores de la Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano), o en las zonas diferentes a la asignada en la ciudad, de acuerdo a la definición de puntos o actividades a desarrollarse que establezca el comité técnico.

En el siguiente informe mensual No 03, se presenta un resumen sobre las principales actividades de señalización vertical, horizontal e implementación y/o suministro de dispositivos viales, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024, durante el periodo 24 de marzo al 23 de abril de 2025, en cumplimiento de los compromisos contractuales del contrato de obra SDM-2024-3653.

[1] "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital, de Movilidad y se dictan otras disposiciones"

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Datos generales del Contrato

Número de Contrato de Obra	SDM 2024-3653
Objeto del Contrato	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. – ZONA SUR ORIENTE"
Contratante:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista	UT ECOSEÑALIZACION 2024
Plazo de ejecución:	34 meses
Fecha de acta de Inicio:	24 de enero 2025
Fecha de Terminación:	23 de noviembre del 2027
Valor Inicial:	$18.771.473.428
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C., Localidades: San Cristobal, Usme y Sumapaz, Corredores de Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano)
Interventoría:	JOYCO S.A.S BIC
Número de Contrato de Interventoría	SDM 2024-3668

Fuente: Elaboración propia

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la Zona 7 Sur Oriente , conformada por las localidades : San Cristobal, Usme y Sumapaz , también se ejecutarán actividades en los corredores asignados Av Boyacá (entre Rio Tunjuelito y KR 9 Bis) y La Via al Llano (CL 86 SUR CON KR 11 hasta Concesión Autopista al Llano) como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 1 Localización Zona 7



Fuente: Elaboración propia a partir de imagen en internet

Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 2 UPZ localidades asignadas

4. San Cristóbal	5. Usme	20. Sumapaz
32 San Blas 33 Sosiego 34. 20 de Julio 50. La Gloria 51 Los Libertadores	52 La Flora 56 Danubio 57 Gran Yomasa 58 Comuneros 59 Alfonso Lopez 60 Parque Entre Nubes	Rio Blanco Río Sumapaz

Fuente: Elaboración propia

3. PERIODO DE REPORTE

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por la Unión Temporal Ecoseñalizacion 2024 en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3653, para el periodo del 24 de marzo al 23 de abril de 2025.

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN)

Una vez firmada el Acta de Inicio No. SDM 2024-3653 (del 24 de enero de 2025), entre la Unión Temporal Ecoseñalización 2024 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía de seguros Mundial de Seguros a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.

La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo 1. Pólizas) que cubren los respectivos riesgos.:

Tabla 3 Vigencia Pólizas CTO 2024-3563

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	24-1-2025	25-05-2030
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	(__% sobre el valor del anticipo)			
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	24-1-2025	25-05-2030
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	24-1-2025	25-05-2030
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$3.754.294.686	24-1-2025	25-05-2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(30% sobre el valor del contrato)	$5.631.442.029	24-1-2025	24-11-2027

Fuente: Elaboración propia

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 4 Diseños Asignados para Implementación

No	ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
1	MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
2	MV_05_122_1867_12	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
3	EX_05_119_1867_12	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
4	EX_05_93_1244_11	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
5	EX_05_110_1867_12	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
6	EX_05_053_1744_10	29/01/2025	USME	EJECUTADO
7	EX_05_108_1867_12	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
8	EX_05_003_1073_24	29/01/2025	USME	EN EJECUCIÓN
9	EX_05_113_1867_12	29/01/2025	USME	INSPECCIONADO
10	EX_05_005_1073_24	29/01/2025	USME	INSPECCIONADO
11	EX_05_004_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
12	EX_04_261_1561_10	29/01/2025	SAN CRISTOBAL	ASIGNADO
13	EX_05_352_1561_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
14	EX_05_101_1244_11	29/01/2025	USME	ASIGNADO
15	EX_05_002_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
16	EX_05_006_1744_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
17	EX_05_001_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
18	EX_05_280_1561_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
19	EX_05_007_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
20	EX_05_007_1445_14	29/01/2025	USME	ASIGNADO
21	EX_05_310_1561_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
22	EX_05_307_1561_10	29/01/2025	USME	ASIGNADO
23	EX_05_008_1073_24	29/01/2025	USME	ASIGNADO
24	MV_20_526_943_10	29/01/2025	SUMAPAZ	ASIGNADO
25	MV_20_025_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	ASIGNADO
26	MV_20_021_670_11	29/01/2025	SUMAPAZ	ASIGNADO
27	SH_SV_PUNTO4_TMSA_V1	10/02/2025	USME	EJECUTADO
28	SDM-202461204315912 Y SDM-202461204636702	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
29	SDM-202461204158462	14/02/2025	USME	EJECUTADO
30	SDM- 202461203879272	14/02/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
31	SDM- 202461204426482	14/02/2025	SUMAPAZ	EJECUTADO
32	SDM-202561200270682	14/02/2025	USME	EJECUTADO
33	SUMINISTRO 1	18/02/2025	NA	EJECUTADO
34	SDM-202461204137592	20/02/2025	USME	EJECUTADO
35	ASIGNACIÓN CP Reposición de Hitos Ciclorrutas	21/03/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
37	CP 202561200744162 RETIRO DE SEÑAL	8/04/2025	USME	EJECUTADO

38	CP-202561200703942	8/04/2025	USME	EN EJECUCIÓN
39	CP ZONAS ESCOLARES	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
40	IMPLEMENTACION PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	EJECUTADO
41	CP Carrera 6 entre Calle 24 Sur y Av. Primero de Mayo.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
42	CP Carrera 4 entre Av. Primero de Mayo y Calle 19A Sur Calle 19A Sur entre Carrera 6 y Carrera 5A.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN
43	CP Av. Primero de Mayo entre Carrera 9A y Carrera 1B	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	EN EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO


6.1 HORIZONTAL


MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	
ANTES	**DESPUÉS**
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14BIS	
	
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14BIS	
	

AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) CL 71 SUR	
	
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 14BIS	
	

MV_05_122_1867_12	
ANTES	**DESPUÉS**
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) CL 90A SUR	
	
AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 8	
	

AUTO AL LLANO (KR 1) KR 9	
	
AUTO AL LLANO (KR 1) CALLE 91 SUR	
	

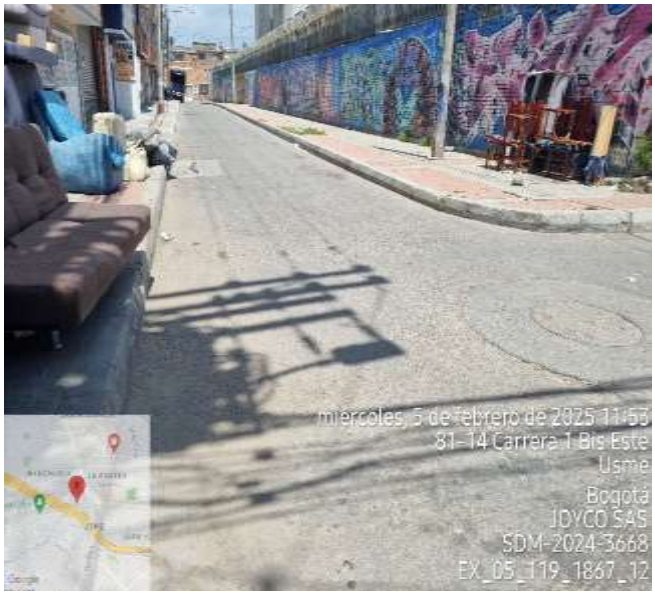EX_05_93_1867_12	
ANTES	**DESPUÉS**
CARRERA 1BIS ESTE CALLE CL 81	
	
CARRERA 1BIS ESTE CALLE CL 81	
	

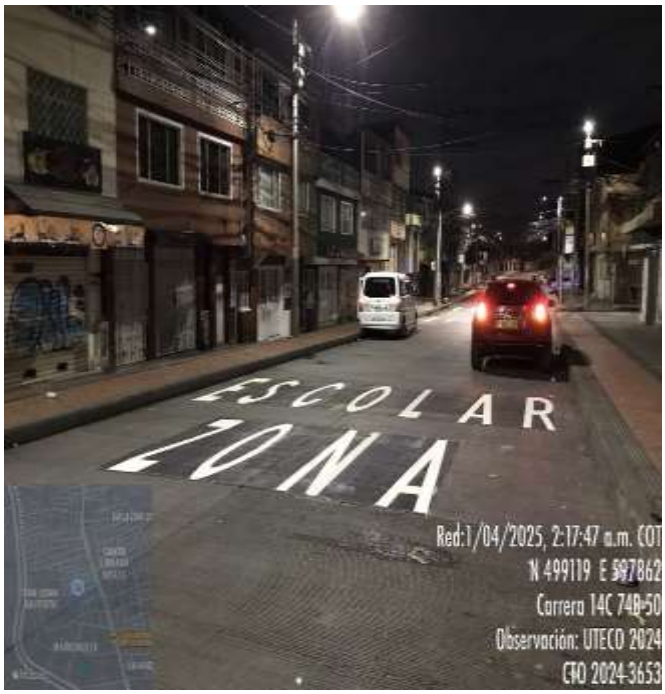CARRERA 1BIS ESTE CALLE CL 81	
	
CARRERA 14 CALLE 74C SUR	
	

EX_05_110_1867_12	
ANTES	**DESPUÉS**
CARRERA 11 CALLE 65C	
	
CARRERA 11 CALLE 65C SUR	
	

CARRERA 1C ESTE TV 9A	
	
CARRERA 1C CALLE 68A SUR	
	

EX_05_53_1744_10	
ANTES	**DESPUÉS**
CALLE 81 SUR CARRERA 5A ESTE	
	
TV 6DBIS ESTE CARRERA 10A ESTE	
	

CALLE 81 SUR CARRERA 5B ESTE	
	
TV 6DBIS ESTE CARRERA 10A ESTE	
	

EX_04_241_1561	
ANTES	**DESPUÉS**
CARRERA 3B CALLE 30A SUR	
	
CL 30A SUR KR 2A	
	

EX_04_262_1561	
ANTES	**DESPUÉS**
CALLE 30A SUR CARRERA 5A	
	
CALLE 30A SUR CARRERA 2B	
	

6.2 VERTICAL

EX_05_119_1867_12	
USME	
	
	


14 abr 2025 1:37:42 p. m.
75D-32 Carrera
Usm
30
14 abr 2025 4:10:21 p. m.
75D-10 Carrera
Usm
Bogotá, D.C
PARE
14 abr 2025 1:34:11 p. m.
76A-3 Carrera 8
Usme
PARE
14 abr 2025 4:20:49 p. m.
75D-22 Carrera 8
Usme
Bogotá, D.C

MV_05_122_1867_12	
AV AL LLANO	
	
	




30


26 mar 2025 8:50:52 a. m.
257° W
0-12 Calle 97A Sur
Usme
Bogotá, D.C.
Altitud:2844.9m
Velocidad:0.0km/h
Número de índice:


DESPACIO
CURVA
PELIGROSA
26 mar 2025 9:31:22 a. m.
255° W
0-24 Calle 97A Sur
Usme
Bogotá, D.C.
Altitud:2847.5m
Velocidad:3.6km/h
Número de índice: 6

EX_05_93_1244_11	
USME	
	
	




30









CP DETECCIÓN ELECTRÓNICA

SAN CRISTÓBAL








INICIO




A 100 m




A 100 m




A 100 m


EX_04_262_1561_10 CP ZONAS ESCOLARES	
SAN CRISTÓBAL	
	




30





30

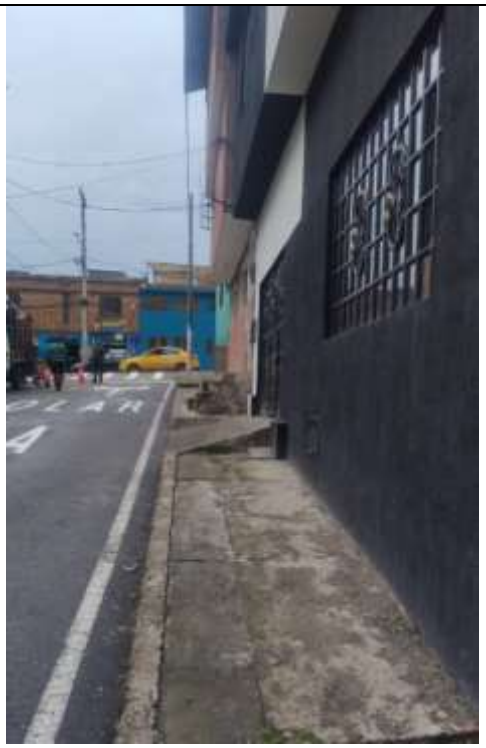



EX_04_241_1561_10

SAN CRISTÓBAL

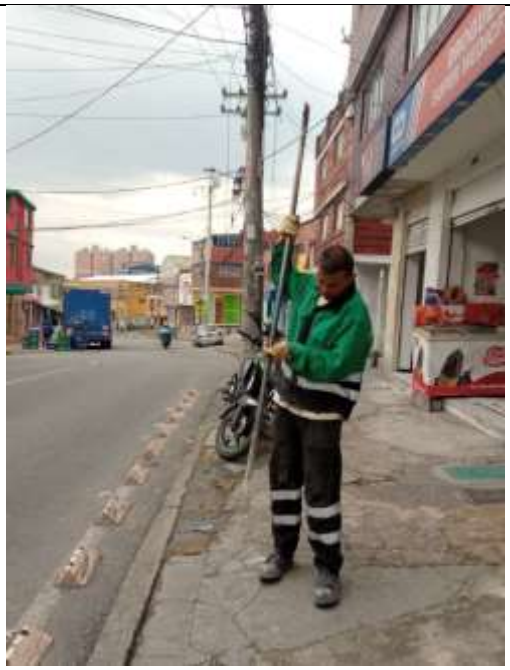












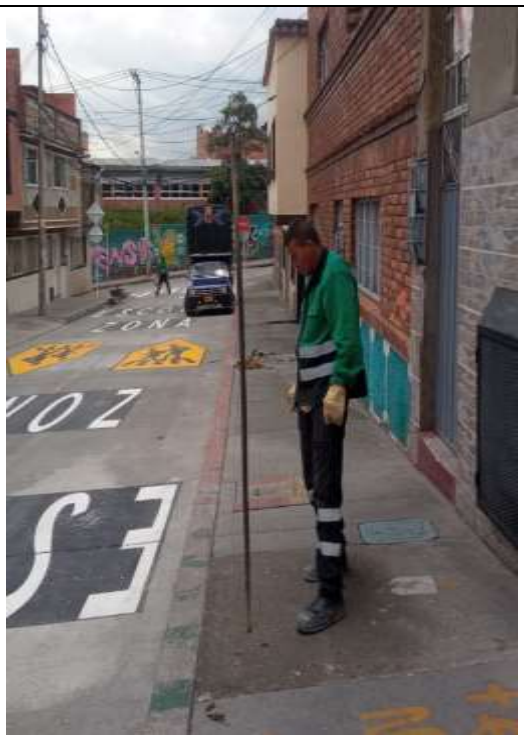



7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

Respecto al Plan de Manejo (PMT) General, se radico en la interventoría el 17 de enero de 2025, a su vez la Interventoría remitió a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito SPMT de la Secretaría Distrital de Movilidad con radicado SDM 202561200352442. Posteriormente la SPMT con oficio SPTM 202531200443941 del 04 de febrero de 2025, informo que "…una vez revisado el documento técnico y los esquemas típicos propuestos para el manejo de tráfico durante las actividades de demarcación e instalación de señalización vertical de la zona 7 localidades de Usme, San Cristóbal y Sumapaz,, mediante el contrato del asunto, se emite autorización a la propuesta…" e indica que la vigencia de la autorización es desde la fecha del comunicado hasta el 03 de febrero de 2026.

En el periodo de este informe del 24 de marzo al 23 de abril de 2025, se solicitaron y tramitaron los siguientes PMTs:

Tabla 5 PMTs solicitados cuenta 1

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
EMERGENCIAS	3/04/2025	764	5003438	5007936	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	3/04/2025	15/04/2025
EMERGENCIAS	3/04/2025	765	5005454	5000530 2	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	3/04/2025	15/04/2025
EMERGENCIAS	3/04/2025	766	5007736	5007737	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) 270m AL SUR DE LA TV 8 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	3/04/2025	15/04/2025
EMERGENCIAS	3/04/2025	767	5003438	5007936	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	3/04/2025	15/04/2025
EMERGENCIAS	3/04/2025	768	5005454	5000530 2	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	3/04/2025	15/04/2025
EMERGENCIAS	3/04/2025	769	5007736	5007737	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) 270m AL SUR DE LA TV 8 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	3/04/2025	15/04/2025
14	3/04/2025	9082	5005318	5004833	CL 91 SUR KR 2	CL 91 SUR KR 4A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9083	5004896	5005669	CL 92B SUR KR 4ABIS	CL 92B SUR KR 1D	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9084	5003125	5002819	KR 14I DG 92 SUR	KR 14I AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9085	5003125	5002819	KR 14I DG 92 SUR	KR 14I AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	3/04/2025	9531	5004655	5005583	DG 99 SUR AV CARACAS (KR 14)	DG 99 SUR KR 6BIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9532	5005683	N/A	KR 6 CL 99 SUR	KR 6 CL 100 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9533	5004945	5005735	CL 97 SUR DG 99 SUR	CL 97 SUR KR 2A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9534	5005657	5005033	KR 5 CL 99 SUR	KR 5 CL 94 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9535	5004764	N/A	KR 4C CL 94 SUR	KR 4C CL 93A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9537	5005456	5004949	KR 4 CL 97 SUR	KR 4 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9540	5004773	N/A	CL 92B SUR KR 5	CL 92B SUR KR 4C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9541	5004862	N/A	CL 92B SUR KR 4C	CL 92B SUR KR 4ABIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9542	5004870	5005214	CL 94 SUR KR 5	CL 94 SUR KR 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9543	5005756	5005613	KR 2 CL 97 SUR	KR 2 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9544	5007944	N/A	KR 4A CL 90B SUR	KR 4A 50m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9545	5004585	N/A	KR 4 CL 90 SUR	KR 4 20m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9546	5004397	5004553	CL 89C SUR KR 4	CL 89C SUR 30m AL ORIENTE DE LA KR 2	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9547	5003723	5003673	CL 87B SUR TV 3A	CL 87B SUR TV 2C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9548	5003181	5002765	KR 14L DG 92 SUR	KR 14L AUTO AL LLANO (CL 84 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9549	5003278	5003132	DG 92 SUR KR 14P	DG 92 SUR KR 14I	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9550	5003194	5003313	CL 92 SUR DG 92 SUR	CL 92 SUR KR 14D	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9551	5003293	5003582	CL 91A SUR KR 14D	CL 91A SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9552	5003921	5004080	CL 93B SUR KR 14BBIS	CL 93B SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9553	5003527	N/A	KR 14B CL 92 SUR	KR 14B CL 92A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	3/04/2025	9554	5003567	5003712	KR 14B CL 92A SUR	KR 14B CL 93A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9555	5003563	5004007	KR 14A CL 91A SUR	KR 14A CL 94 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9556	5004373	5004517	CL 96 SUR KR 14BBIS	CL 96 SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9557	5004599	N/A	CL 97 SUR KR 14A	CL 97 SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9558	5004442	5004372	KR 14A CL 97 SUR	KR 14A CL 95A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9559	5004279	5004109	KR 14A CL 95A SUR	KR 14A CL 94 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9560	5004443	5003780	KR 14BBIS CL 97 SUR	KR 14BBIS CL 93B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9561	5003734	5003900	KR 14C CL 93B SUR	KR 14C CL 94A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9562	5003752	5004123	KR 14G CL 94 SUR	KR 14G CL 95B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9563	5004269	5004171	CL 95B SUR KR 14BBIS	CL 95B SUR KR 14G	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9564	5004124	5003973	CL 95B SUR KR 14G	CL 95B SUR 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 14R	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9565	5003901	5003870	CL 94A SUR KR 14C	CL 94A SUR KR 14G	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9566	5003841	N/A	CL 93BBIS SUR KR 14C	CL 93BBIS SUR KR 14BBIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9567	5005128	N/A	TV 13 AV CARACAS (KR 14)	TV 13 KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9568	5004918	5005482	CL 943A SUR KR 4C	CL 943A SUR KR 3A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9569	5005741	5005409	KR 2ABIS CL 97BIS SUR	KR 2ABIS CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9570	5005734	N/A	KR 2A CL 97 SUR	KR 2A CL 92B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9572	5005485	5005364	KR 7B 50m AL SUR DE LA CL 100B SUR	KR 7B DG 99 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9573	5005414	N/A	KR 7A CL 100B SUR	KR 7A DG 99 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9574	5005477	N/A	KR 7 CL 100B SUR	KR 7 CL DG 99 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	3/04/2025	9575	5005506	N/A	KR 6B DG 99 SUR	KR 6B CL 100 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9576	5005575	N/A	CL 100 SUR KR 6B	CL 100 SUR 30m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9577	5005764	N/A	CL 97BIS SUR KR 2ABIS	CL 97BIS SUR KR 2A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9578	5005519	N/A	CL 97A SUR KR 5	CL 97A SUR KR 5A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9580	5005079	5005205	CL 96A SUR KR 5	CL 96A SUR KR 4A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9581	5005291	5005330	CL 96B SUR KR 4B	CL 96B SUR KR 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9582	5005393	N/A	CL 96C SUR KR 4B	CL 96C SUR KR 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9583	5005433	5005557	CL 96C SUR KR 4	CL 96C SUR KR 3B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9584	5005432	N/A	KR 3D CL 94 SUR	KR 3D CL 96C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9585	5005290	5005204	KR 4A CL 96B SUR	KR 4A CL 94 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9586	5005124	N/A	CL 96 SUR KR 4B	CL 96 SUR 30m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9587	5005390	5005370	KR 3BBIS CL 93A SUR	KR 3BBIS CL 92B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9588	5005331	N/A	KR 3C CL 93A SUR	KR 3C CL 92B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9589	5005259	N/A	KR 3D CL 93A SUR	KR 3D CL 92B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9590	5005374	N/A	CL 92 SUR KR 4	CL 92 SUR KR 3	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9591	5005298	N/A	CL 91B SUR KR 4	CL 91B SUR KR 3	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9592	5005196	N/A	CL 91A SUR KR 4	CL 91A SUR KR 3	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9593	50000690	N/A	CL 92 SUR KR 4	CL 92 SUR KR 4A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9594	50000689	N/A	CL 91B SUR KR 4	CL 91B SUR KR 4A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9595	50000688	N/A	CL 91A SUR KR 4A	CL 91A SUR KR 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9596	5004860	N/A	KR 4A CL 91 SUR	KR 4A CL 91A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	3/04/2025	9597	5005372	5005410	CL 91C SUR KR 3	CL 91C SUR KR 2ABIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9598	5005371	N/A	KR 2B CL 91 SUR	KR 2B CL 91C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9599	5005646	N/A	KR 1F CL 92B SUR	KR 1F 20m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9600	5005781	N/A	KR 1F CL 92B SUR	KR 1F 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9601	5004989	N/A	KR 2B CL 90B SUR	KR 2B 100m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9602	5004883	N/A	KR 4 CL 90B SUR	KR 4 100m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9603	5004795	5004646	KR 2B CL 90BIS SUR	KR 2B CL 89C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9604	5004812	5004449	KR 2A CL 90BIS SUR	KR 2A DG 89A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9605	5004875	5004487	KR 2 CL 90BIS SUR	KR 2 DG 89A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9606	5004614	5004801	CL 90 SUR KR 4	CL 90 SUR AUTO AL LLANO (KR1)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9607	5004353	5009312	KR 4 DG 89A SUR	KR 4 CL 89C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9608	5009640	N/A	KR 4 CL 89CSUR	KR 4 50m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9609	5000521	N/A	KR 2B CL 87C SUR	KR 2B TV 2C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9611	5009314	N/A	TV 4C CL 89 SUR	TV 4C DG 88 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9612	5004352	5004255	DG 89A SUR KR 4	DG 89A AUTO AL LLANO (KR1)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9613	5004352	5004255	DG 89A SUR KR 4	DG 89A AUTO AL LLANO (KR1)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9614	5004118	5004158	CL 89 SUR KR 4	CL 89 SUR KR 2A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9615	5004296	5003924	KR 2A DG 89A SUR	KR 2A CL 87C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9616	5004256	5003880	KR 2 DG 89A SUR	KR 2 CL 87C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9617	5003942	5004029	CL 88 SUR DG 87D SUR	CL 88 SUR 20m AL ORIENTE DE LA KR 2	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9618	5000062 1	N/A	CL 87C SUR KR 2B	CL87C SUR 10m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	3/04/2025	9619	5002954	N/A	DG 91A SUR KR 14Q	DG 91A SUR KR 14L	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9620	5003286	N/A	DG 92 SUR KR 14P	DG 92 30m AL OCCIDENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9621	50005084	5009271	KR 14P DG 92 SUR	KR 14P DG 91C SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9622	50005082	50005083	KR 14P DG 92C SUR	KR 14P DG 92 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9623	5003336	5003328	DG 92C SUR KR 14P	DG 92C SUR KR 14L	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9624	5003493	N/A	KR 14L DG 92C SUR	KR 14L 40m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9625	5003270	5003306	CL 91 SUR KR 14C	CL 91 SUR KR 14ABIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9626	5003315	5003384	CL 91BIS SUR KR 14C	CL 91BIS SUR KR 14ABIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9627	5003344	5003606	CL 92 SUR KR 14D	CL 92 SUR KR 14BIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9628	5003528	5003722	CL 92A SUR KR 14C	CL 92A SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9629	5003568	N/A	CL 92B SUR KR 14C	CL 92B SUR KR 14B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9630	5003679	5003817	CL 92B SUR KR 14B	CL 92B SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9631	5003761	5003903	CL 93 SUR KR 14B	CL 93 SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9632	5003839	5003994	CL 93A SUR KR 14B	CL 93A SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9633	5003314	5003483	KR 14B CL 91 SUR	KR 14B CL 92 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9634	5003675	N/A	KR 14BIS CL 92A SUR	KR 14BIS CL 92 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9635	5004008	5004151	CL 94 SUR KR 14BBIS	CL 94 SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9636	5004110	5004258	CL 94A SUR KR 14BBIS	CL 94A SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9637	5004167	5004363	CL 95 SUR KR 14BBIS	CL 95 SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9638	5004280	5004422	CL 95A SUR KR 14BBIS	CL 95A SUR AV CARACAS (KR 14)	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9639	50000687	N/A	CL 93B SUR KR 14BBIS	CL 93B SUR KR 14C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
14	3/04/2025	9640	5003655	N/A	CL 93B SUR KR 14C	CL 93B SUR KR 14G	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9641	5009278	N/A	KR 14C CL 93B SUR	KR 14C 30m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9642	5004104	5004299	KR 14C CL 95 SUR	KR 14C CL 96A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9643	5003706	5004146	KR 14J CL 94 SUR	KR 14J CL 96A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9644	5003751	5004102	KR 14Q CL 94BIS SUR	KR 14Q CL 96A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9645	5003972	5007889	KR 14R CL 95A SUR	KR 14R CL 96A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9646	5004393	50007838	CL 96A SUR KR 14BBIS	CL 96A 97m AL OCCIDENTE DE LA KR 14R	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9647	5004169	5003871	CL 95A SUR KR 14BBIS	CL 95A SUR 28m AL OCCIDENTE DE LA KR 14R	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9648	5004086	5003849	CL 95 SUR KR 14BBIS	CL 95 SUR 30m AL OCCIDENTE DE LA KR 14Q	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9649	5003867	5003809	CL 94A SUR KR 14G	CL 94A SUR KR 14Q	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9650	5003753	5003707	CL 94BIS SUR KR 14G	CL 94BIS SUR KR 14Q	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
14	3/04/2025	9651	5003884	5003667	CL 94 SUR KR 14BBIS	CL 94 SUR KR 14J	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	4/04/2025	19/06/2025
15	10/04/2025	9994	5003604	30000741	CL 91 SUR KR 12	CL 91 SUR KR 5	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10453	4000569	4000497	KR 6 AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 SUR)	KR 6 CL 17A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10454	50005480	4000416	KR 6 CL 17A SUR	KR 6 CL 15 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10455	50005471	4000283	KR 6 CL 15 SUR	KR 6 CL 11 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10457	5004006	5004619	CL 93 SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 93 SUR KR 5	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10458	5004611	5004542	KR 5 CL 93 SUR	KR 5 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10459	5004564	5003613	KR 8 CL 94A SUR	KR 8 CL 87A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
15	10/04/2025	10460	5003756	5004045	CL 89 SUR KR 8	CL 89 SUR TV 4C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10461	5004012	5003822	DG 88 SUR TV 4C	DG 88 SUR TV 4	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10462	5003743	N/A	CL 87B SUR TV 4	CL 87B SUR TV 3A	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10463	5003742	5004064	KR 10 CL 91 SUR	KR 10 CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10464	5004140	N/A	KR 8C CL 93 SUR	KR 8C CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10465	5003971	N/A	CL 92ABIS SUR KR 10	CL 92ABIS SUR KR 9B	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10466	5004121	5004149	CL 92ABIS SUR KR 8B	CL 92ABIS SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10467	5003890	5004033	CL 91B SUR KR 10	CL 91B SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10468	5003895	N/A	KR 8A CL 91 SUR	KR 8A 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10469	5004152	5004711	KR 10 CL 93A SUR	KR 10 CL 96BIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10470	5003581	N/A	KR 13 CL 91A SUR	KR 13 20m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10471	5003902	N/A	KR 13 CL 93 SUR	KR 13 15m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10472	5003908	5003749	KR 12 CL 92B SUR	KR 12 CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10473	5003946	N/A	CL 92C SUR KR 12	CL 92C SUR KR 13	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10474	5000040 0	N/A	KR 12 CL 91A SUR	KR 12 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10475	5000062 4	5000062 5	KR 11 CL 91 SUR	KR 11 CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10476	3000074 2	3000132 6	CL 91A SUR KR 13	CL 91A SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10477	5003685	N/A	CL 91B SUR KR 13	CL 91B SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10478	5003772	N/A	CL 91B SUR KR 10	CL 91B SUR KR 11	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10479	5003750	5003819	CL 92 SUR KR 13	CL 92 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10480	5003794	5003875	CL 92A SUR KR 13	CL 92A SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
15	10/04/2025	10481	5003851	5003927	CL 92ABIS SUR KR 13	CL 92ABIS SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10482	5004114	5004343	CL 93A SUR KR 13	CL 93A SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10483	5004153	5004385	CL 93ABIS SUR KR 13	CL 93ABIS SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10484	5004341	5004427	CL 93B SUR KR 10	CL 93B SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10485	5004387	5004506	CL 94 SUR KR 10	CL 94 SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10486	5004436	5004565	CL 94A SUR KR 10	CL 94A SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10487	5004435	5004206	KR 8C CL 94A SUR	KR 8C CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10488	5004188	N/A	CL 93B SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 93B SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10489	5004249	N/A	CL 94 SUR KR 13	CL 94 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10490	5004321	N/A	CL 94BIS SUR AV CARACAS (KR 14)	CL 94BIS SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10491	5004376	N/A	CL 94A SUR KR 13	CL 94A SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10492	5004432	N/A	CL 95 SUR KR 13	CL 95 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10493	5004509	N/A	CL 95BIS SUR KR 13	CL 95BIS SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10494	5004577	N/A	CL 95A SUR KR 13	CL 95A SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10495	5004645	N/A	CL 96 SUR KR 13	CL 96 SUR KR 10	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10496	5004666	N/A	CL 96BIS SUR KR 13	CL 96BIS SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10497	5004749	N/A	KR 12 CL 96BIS SUR	KR 12 CL 96ASUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10498	5004750	N/A	CL 96A SUR KR 13	CL 96A SUR KR 12	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10499	5004088	N/A	KR 9B CL 93 SUR	KR 9B CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10500	5004183	N/A	KR 8B CL 93 SUR	KR 8B CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
15	10/04/2025	10501	5004223	N/A	KR 8A CL 93 SUR	KR 8A CL 92ABIS SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10502	5004483	N/A	KR 7B CL 93B SUR	KR 7B CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10503	5004534	N/A	KR 7A CL 93B SUR	KR 7A CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10504	5004578	N/A	KR 7 CL 93B SUR	KR 7 CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10505	5004624	N/A	KR 6A CL 93 SUR	KR 6A 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10506	5004661	N/A	KR 7B CL 93B SUR	KR 7B 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10507	5000521 3	N/A	KR 7A CL 93B SUR	KR 7A 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10508	5004610	N/A	KR 7 CL 93B SUR	KR 7 20m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10509	5003981	N/A	CL 92A SUR KR 10	CL 92A SUR KR 9	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10510	5003931	N/A	CL 92 SUR KR 10	CL 92 SUR 25m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10511	5003768	5003837	CL 91A SUR KR 10	CL 91A SUR KR 9	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10512	5003802	N/A	KR 9A CL 91A SUR	KR 9A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10513	5003917	N/A	KR 8C CL 91B SUR	KR 8C CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10514	5003949	N/A	KR 8B CL 91B SUR	KR 8B CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10515	5003990	N/A	KR 8A CL 91B SUR	KR 8A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10516	5004388	5004106	KR 7 CL 93 SUR	KR 7 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10517	5004423	5004275	KR 6A CL 93 SUR	KR 6A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10518	5004526	5004367	KR 5C CL 93 SUR	KR 5C CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10519	5004566	5004404	KR 5B CL 93 SUR	KR 5B CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10520	5004620	5004437	KR 5A CL 93 SUR	KR 5A CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10521	5004276	5004492	CL 92A SUR KR 7	CL 92A SUR KR 5BIS	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
15	10/04/2025	10522	5004337	N/A	CL 92B SUR KR 8	CL 92B SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10523	5004285	N/A	CL 92ABIS SUR KR 8	CL 92ABIS SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10524	5004173	N/A	CL 92 SUR KR 8	CL 92 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10525	5004139	N/A	CL 91B SUR KR 8	CL 91B SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10526	5004107	N/A	CL 91A SUR KR 8	CL 91A SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10527	5004038	N/A	KR 7A CL 91 SUR	KR 7A 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10528	5003995	N/A	KR 7B CL 91 SUR	KR 7B 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10529	5003587	N/A	KR 12 CL 91 SUR	KR 12 15m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10530	5003603	N/A	KR 11 CL 91 SUR	KR 11 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10531	5003698	N/A	CL 89 SUR KR 8	CL 89 SUR 30m AL OCCIDENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10532	5003741	N/A	CL 88B SUR KR 8	CL 88B 25m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10533	5003687	N/A	CL 88A SUR KR 8	CL 88A 25m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10534	5003646	N/A	CL 88 SUR KR 8	CL 88 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10535	5004113	N/A	KR 10 CL 93 SUR	KR 10 CL 93A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10536	5003778	5003633	KR 9 CL 91 SUR	KR 9 60m AL NORTE DE LA CL 90 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10537	5004680	5004324	KR 6 CL 93B SUR	KR 6 CL 91 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10538	5004484	5004681	CL 93B SUR KR 8	CL 93B SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10539	5000067 5	N/A	KR 5BIS CL 91 SUR	KR 5BIS 25m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
15	10/04/2025	10540	5003653	N/A	KR 10 CL 91 SUR	KR 10 25m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	11/04/2025	10/07/2025
16	16/04/2025	10837	4000365	4000203	KR 8 CL 17 SUR	KR 8 AV FUCHA (CL 11 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	10839	4000366	4000379	CL 17 SUR KR 8A	CL 17 SUR KR 7B	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
16	16/04/2025	10840	5003438	5007936	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	3/04/2025	15/04/2025
16	16/04/2025	10841	5005454	5000530 2	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	3/04/2025	15/04/2025
16	16/04/2025	10842	5007736	5007737	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) 270m AL SUR DE LA TV 8 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	3/04/2025	15/04/2025
16	16/04/2025	10843	5003438	5007936	AUTO AL LLANO (CL 84 SUR) KR 9BIS	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	3/04/2025	15/04/2025
16	16/04/2025	10844	5005454	5000530 2	AUTO AL LLANO (KR 1) CL 90D SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	3/04/2025	15/04/2025
16	16/04/2025	10845	5007736	5007737	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) CL 114 SUR	AUTO AL LLANO (KR 8 ESTE) 270m AL SUR DE LA TV 8 ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	3/04/2025	15/04/2025
16	16/04/2025	11176	4000284	N/A	KR 6 CL 12 SUR	KR 6 AV FUCHA (CL 11 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11177	4000475	N/A	CL 17A SUR KR 6	CL 17A SUR KR 5BIS	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11178	4000446	N/A	CL 17 SUR KR 6	CL 17 SUR KR 5A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11179	4000445	N/A	KR 5A CL 17 SUR	KR 5A CL 15 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11180	4000417	N/A	CL 15 SUR KR 5A	CL 15 SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11181	4000329	4000242	CL 13 SUR KR 6	CL 13 SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11182	4000221	N/A	CL 13 SUR AV FERNANDO MAZUERA (KR 10)	CL 13 SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11183	4000483	4000543	CL 19 SUR KR 8A	CL 19 SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11184	4000526	N/A	KR 7B CL 19 SUR	KR 7B 70m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11185	4000546	N/A	KR 7 CL 19 SUR	KR 7 70m AL SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11186	4000425	N/A	CL 18 SUR KR 8A	CL 18 SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11187	4000378	N/A	KR 7B CL 17 SUR	KR 7B CL 15 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
16	16/04/2025	11188	4000347	4000358	CL 15 SUR KR 7B	CL 15 SUR KR 7	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11189	4000390	N/A	KR 7A CL 17 SUR	KR 7A CL 15 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11190	4000409	N/A	KR 7 CL 17 SUR	KR 7 CL 15 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11191	4007671	N/A	CL 18 SUR KR 6	CL 18 SUR 60m AL OCCIDENTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11192	4000349	4000297	CL 13A SUR KR 6	CL 13A SUR KR 7B	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11193	4000373	N/A	CL 13BIS SUR KR 6	CL 13BIS SUR KR 5A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11194	4007405	N/A	CL 12 SUR KR 6	CL 12 SUR KR 5A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11195	4000302	4000253	CL 12 SUR KR 6	CL 12 SUR KR 8	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11196	4000296	N/A	KR 7A CL 13A SUR	KR 7A CL 13 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11197	4000272	4000252	KR 7A CL 13 SUR	KR 7A AV FUCHA (CL 11 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11198	4000322	N/A	KR 9A CL 17 SUR	KR 9A CL 15 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11199	4000338	N/A	KR 9 CL 17 SUR	KR 9 CL 15 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11200	4000352	N/A	KR 8A CL 17 SUR	KR 8A CL 15 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11201	4000278	4000295	CL 15 SUR KR 9A	CL 15 SUR KR 8A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11202	5003731	5003708	KR 14F CL 94 SUR	KR 14F 10m AL NORTE DE LA CL 93D SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11203	5009387	5009388	KR 4C CL 94 SUR	KR 4C CL 93 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/04/2025	17/07/2025
16	16/04/2025	11204	5003844	N/A	DG 87D SUR KR 2B	DG 87D SUR TV 2C	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	18/04/2025	17/07/2025
17	24/04/2025	11461	4000682	4000618	KR 6 CL 24 SUR	KR 6 CL 22A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11462	4000590	N/A	KR 6 CL 22A SUR	KR 6 AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 SUR)	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	18/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11463	4000485	4000570	AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 SUR) KR 9A	AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 SUR) KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	18/04/2025	24/07/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
17	24/04/2025	11464	4000585	4000782	AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 SUR) KR 6	AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 SUR) 40m AL ORIENTE DE LA CL 19 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	CORREDOR	SI	18/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11465	4001050	4001436	CL 30A SUR KR 7	CL 30A SUR KR 3	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11466	4001478	4001253	KR 5A CL 31 SUR	KR 5A CL 30A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11467	4001540	4007312	KR 3 CL 30C SUR	KR 3 CL 29 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11468	4001520	4001604	CL 30A SUR KR 3	CL 30A SUR KR 2	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11734	4001108	N/A	CL 30B SUR KR 7A	CL 30B SUR KR 6	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11735	4001167	4001254	CL 30C SUR KR 7A	CL 30C SUR KR 5A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11736	4001235	4001107	KR 6 CL 30D SUR	KR 6 CL 30A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11737	4001407	N/A	KR 3B CL 30B SUR	KR 3B CL 30A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11738	4001465	4001498	CL 30B SUR KR 3B	CL 30B SUR KR 3	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11739	4001464	N/A	KR 3A CL 30B SUR	KR 3A CL 30A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11740	4001570	N/A	KR 2B CL 30B SUR	KR 2B CL 30A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11741	4001543	4001476	KR 2A CL 30A SUR	KR 2A CL 28B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11742	4001477	N/A	CL 29 SUR KR 3	CL 29 SUR KR 2A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11743	4001507	N/A	CL 28BBIS SUR KR 2A	CL 28BBIS SUR KR 2	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11744	4001550	N/A	CL 29A SUR KR 2A	CL 29A SUR KR 2	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	15/04/2025	29/04/2025
17	24/04/2025	11745	4000630	4000608	KR 4 AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 SUR)	KR 4 CL 19A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11746	4000609	N/A	CL 19ABIS SUR KR 4	CL 19ABIS SUR 30m AL OCCIDENTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11747	4000566	N/A	CL 19A SUR KR 6	CL 19A SUR KR 5A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11748	4000566	N/A	CL 19A SUR KR 6	CL 19A SUR KR 5A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	25/04/2025	24/07/2025

COI			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		Dirección de la Obra		Autorización				
No	FECHA	REGISTRO	INICIO	FIN	INICIO	FIN	CARACTERISTICAS	LOCALIDAD	ESTADO	Fecha Inicio	Fecha Fin
17	24/04/2025	11749	4000711	N/A	CL 23 SUR KR 6	CL 23 SUR 60m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11750	4000660	N/A	CL 22C SUR KR 6	CL 22C 60m AL ORIENTE	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11751	4000591	4000623	CL 22A SUR KR 6A	CL 22A SUR KR 5A	ANDÉNES Y CALZADA	SAN CRISTOBAL	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11752	5003957	5003909	CL 92B SUR KR 10	CL 92B SUR KR 13	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11754	5003836	5003889	KR 9 CL 91 SUR	KR 9 CL 91B SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11755	5000045	N/A	KR 4P CL56 SUR	KR 4P 40m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11756	5000050	N/A	KR 4P CL56 SUR	KR 4P DG 56A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11757	5000058	N/A	KR 4M CL 56 SUR	KR 4M DG 56A SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11758	5000066	N/A	KR 4L CL 56 SUR	KR 4L CL 57 SUR	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11759	5000121	N/A	KR 3D CL 54G SUR	KR 3D 50m AL NORTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/04/2025	24/07/2025
17	24/04/2025	11760	5005299	N/A	CL 91B SUR KR 14D ESTE	CL 91B SUR KR 14F ESTE	ANDÉNES Y CALZADA	USME	SI	25/04/2025	24/07/2025

Fuente: elaboración propia

Igualmente, en el Anexo 2. se adjuntan los COI mencionados en la tabla anterior, donde se encuentra la información detallada de cada autorización.

8. ASPECTOS TÉCNICOS

8.1 MODIFICACIONES REALIZADAS

- En el periodo al que pertenece el presente informe no se realizaron modificaciones.

8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen las ejecutadas a la fecha:

- Revisión en plataforma SIGIDU
- Se realiza la solicitud de los planes de manejo de tránsito PMT para los puntos a intervenir.
- Socialización de actividades de implementación en colegios y zonas de alto flujo peatonal.
- Implementación de señalización horizontal y vertical de acuerdo a los planos inspeccionados e instalación de dispositivos según diseños.

8.3 INSPECCIONES

- A continuación se relacionan los diseños inspeccionados en el periodo al que hace referencia este informe (24 de marzo a 23 de abril de 2025)

Tabla 6 Inspecciones realizadas

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
EX_05_005_1073_24	29/01/2025	USME	INSPECCIONADO
CP ZONAS ESCOLARES	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
IMPLEMENTACION PMT de EMERGENCIA AV LOS CERROS	14/04/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
CP Carrera 6 entre Calle 24 Sur y Av. Primero de Mayo.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
CP Carrera 4 entre Av. Primero de Mayo y Calle 19A Sur Calle 19A Sur entre Carrera 6 y Carrera 5A.	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO
CP Av. Primero de Mayo entre Carrera 9A y Carrera 1B	15/04/2025	SAN CRISTOBAL	INSPECCIONADO


Fuente: Elaboracion propia

En el Anexo 3 (3.1 Inspecciones) se encuentran los formatos de inspecciones.

8.4 ESTADO DEL TIEMPO

En el periodo al que hace referencia este informe (24 de marzo a 23 de abril de 2025) se presentaron 15 días de lluvias.

Ilustración 2 Precipitación mes de abril

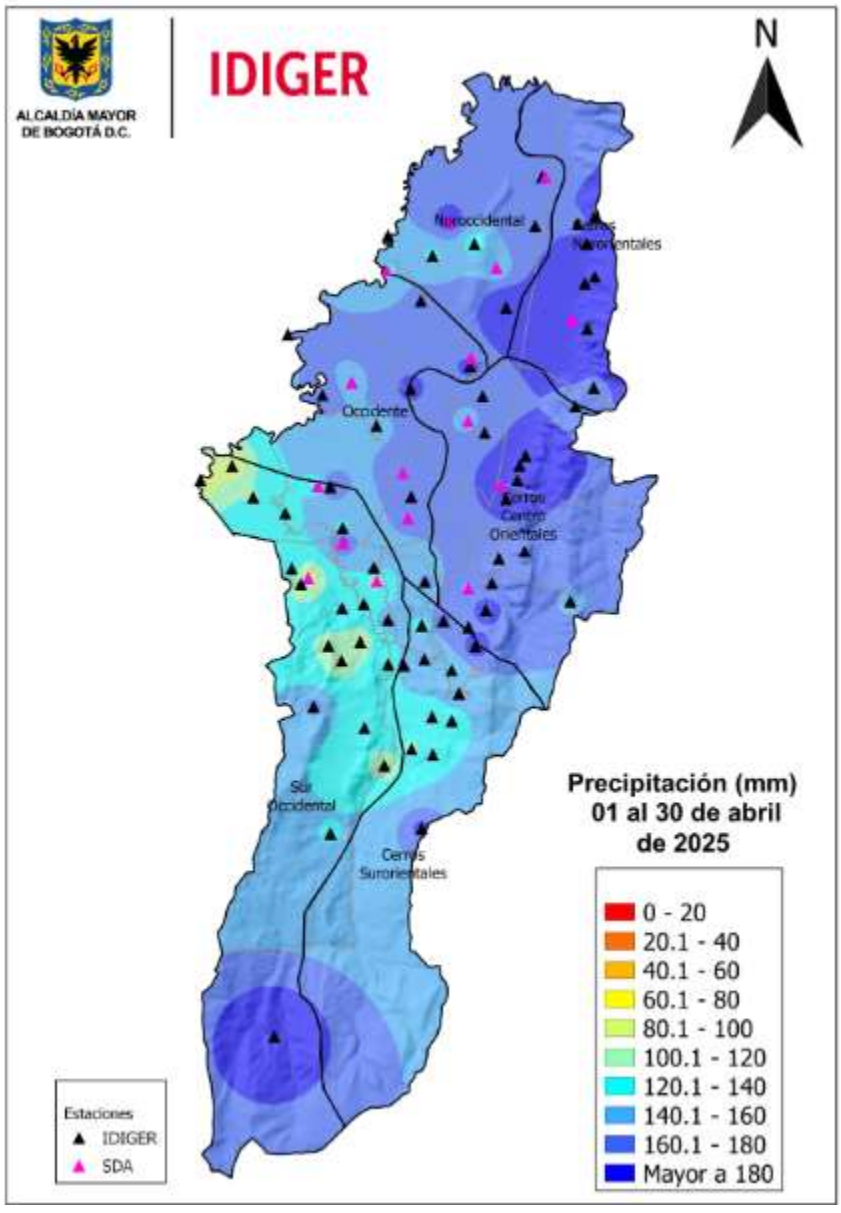

9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

A continuación, se relacionas las actividades de consulta por diseño, en los visores y entidades correspondientes.

DISEÑO	Geoportales		ENTIDADES CONSULTADAS
	https://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=219e91e4397f4f8d99c4c1aaa66ba2c4	https://webidu.idu.gov.co/sigidu/	
EX_05_005_1073_24	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_05_004_1073_24	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_04_261_1561_10	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_05_005_1073_24	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de

DISEÑO	Geoportales		ENTIDADES CONSULTADAS
	https://movilidadbogota.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=219e91e4397f4f8d99c4c1aaa66ba2c4	https://webidu.idu.gov.co/sigidu/	
			Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_05_004_1073_24	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU
EX_04_261_1561_10	Validación de Reserva Sub dirección de planes de manejo de Tránsito	Validación de reserva SIGIDU	-Alcaldía local -UAERM (Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial) -EAB (Empresa de Acueducto de Bogotá) -ENEL-CODENSA -IDU

En el Anexo 4, se encuentran las cartas radicadas a las diferentes entidades..

10. PLAN DE CALIDAD

La información referente al Plan de Calidad se encuentra en el Anexo 5.

11. PROTOCOLO DE MANEJOS DE RESIDUOS

La información respecto al protocolo de manejos de residuos se encuentra en el Anexo 6

12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES

En el periodo al que se hace referencia en este informe se ejecutaron actividades en los siguientes corredores:

12.1 AV BOYACÁ

- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.
- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen.
- Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744.
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.
- Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).

12.2 VIA AL LLANO

- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
- Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.
- Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).

- Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.
- Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)
- Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.
- Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.
- Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.
- Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.
- Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.
- Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.
- Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)

13. REPORTE ESTADISTICO

13.1 EJECUCIÓN POR COMPONENTE

De acuerdo con la ejecución de las obras durante el periodo se tienen subdividido por componente (señalización vertical y horizontal) de la siguiente forma:

Tabla 7 Actividades por componente

Corredor / Diseños	Localidad	Señalización Vertical	% Ejecutado en el ID en Señalización vertical del periodo	Señalización Horizontal	% Ejecutado en el ID en Señalización Horizontal del periodo	Total, ejecutado en el periodo de informe
EX_05_053_1744_10	Usme	$ 0,00	0,00%	$ 29.154.785,88	100,00%	$ 29.154.785,88
EX_05_110_1867_12	Usme	$ 0,00	0,00%	$ 179.804.424,93	100,00%	$ 179.804.424,93
EX_05_093_1244	Usme	$ 80.880.799,95	24,82%	$ 244.991.465,46	75,18%	$ 325.872.265,41
MV_05_122_1867_12	Usme	$ 11.907.169,57	2,87%	$ 402.337.546,37	97,13%	$ 414.244.715,94
EX_05_108_1867_12_V6	Usme	$ 0,00	0,00%	$ 9.740.978,64	100,00%	$ 9.740.978,64
EX_04_241_1561_10 CP ZONAS ESCOLARES	San Cristobal	$ 6.026.042,00	12,37%	$ 42.684.112,22	87,63%	$ 48.710.154,22
EX_04_262_1561_10 CP ZONAS ESCOLARES	San Cristobal	$ 8.784.144,00	10,65%	$ 73.708.763,44	89,35%	$ 82.492.907,44
MV_AV_BOYACA_941_09	Usme	$ 0,00	0,00%	$ 114.866.070,57	100,00%	$ 114.866.070,57
MV_04_511_676_09 DETECCIÓN ELECTRÓNICA	San Cristobal	$ 6.399.712,55	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 6.399.712,55
EX_04_001_1073_24 DETECCIÓN ELECTRÓNICA	San Cristobal	$ 883.104,94	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 883.104,94
EX_04_262_1561_10_ DETECCIÓN ELECTRÓNICA	San Cristobal	$ 5.544.744,84	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 5.544.744,84
EX_05_119_1867_12	Usme	$ 75.778.182,56	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 75.778.182,56
CP 202561200744162	Usme	$ 28.089,00	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 28.089,00
TOTAL		**$ 196.231.989,41**		**$ 1.097.288.147,51**		**$ 1.293.520.137**

Fuente: Elaboración propia

El valor total ejecutado en el periodo al que hace referencia este informe es de **$1.293.520.137**, en la localidad de Usme se ejecutó un valor de $ 1.149.489.113 lo que corresponde al 88,87% de la ejecución total, en la localidad de San Cristóbal se ejecutó un valor de $ 144.030.624 lo que corresponde a un 11,13% de la ejecución total. La implementación vertical representa un 15,2% y la demarcación horizontal un 84,8%.

13.2 ZONAS ESCOLARES

A continuación, se relacionan las instituciones beneficiadas con la intervención:

Tabla 8 Zonas Escolares Intervenidas

NÙMERO DE CUENTA	CIV	ID DISEÑO	INSTITUCION BENEFICIADA	POBLACION BENEFICIADA
3	5007874	EX_05_93_1244_11	COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES	600
	5001805			
	5001282			
3	5002420	EX_05_93_1244_11	COLEGIO MIRAVALLE	1500
	5002726			
	5002709			
3	5007842	EX_05_110_1867_12	COLEGIO DISTRITAL PAULO FREIRE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA ACTICULADO EDUCACIÓN SUPERIOR	3000
	5001893			
	5001856			
3	5002441	EX_05_93_1244_11	COLEGIO CIUDAD BOLIVAR	210
3	5001360	EX_05_93_1244_11	JARDÍN INFANTIL ICBF	30
	5001353			
3	5001804	EX_05_93_1244_11	JARDIN INFANTIL MI TRIGAL	13
	5001788			
3	50009087	EX_04_262_1561_10	CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL FLORENTINO GONZALEZ	POR CONFIRMAR
3	4001167	EX_04_262_1561_10	I.E.D FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE B	POR CONFIRMAR
	4001407			
	4001465			
	4001464			
	4001464			
3	4001497	EX_04_241_1561_10	I.E.D FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A	POR CONFIRMAR
	4001570			
	4001570			
	4001543			

Fuente: Elaboración propia

14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS

En el Anexo 7 se encuentra la información respecto a los certificados de calibración.

15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN

Para el periodo del presente informe, a continuación, se presenta el detalle de la señalización vertical implementada, dispositivos de control al tránsito implementados y entregada al almacén de la SDM.

En el Anexo 8. Acta de entrega de señalización, se presenta el comprobante de ingreso de elementos emitido por la subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se relaciona la señalización vertical y los dispositivos viales instalados en el periodo del 24 de marzo al 23 de abril de 2025:

Tabla 9 Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	15,57	$ 364.850,76	$ 116.752,24	N/A	$ 481.603,00	$ 7.498.558,71
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en ángulo para señales SP-SR-SI (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	29	$ 116.052,27	$ 37.136,73	29,00	$ 153.189,00	$ 4.442.481,00
3	UND	Fabricación y suministro de pedestal doble en ángulo para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales o menores a 75*100 cm) cumpliendo normatividad vigente.	5	$ 145.683,33	$ 46.618,67	5,00	$ 192.302,00	$ 961.510,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en ángulo SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	140	$ 283.821,21	$ 90.822,79	140,00	$ 374.644,00	$ 52.450.160,00
6	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en ángulo SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	69	$ 449.300,00	$ 143.776,00	69,00	$ 593.076,00	$ 40.922.244,00
7	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	48	$ 550.444,70	$ 176.142,30	48,00	$ 726.587,00	$ 34.876.176,00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e	2,7	$ 348.364,39	$ 111.476,61	N/A	$ 459.841,00	$ 1.241.570,70

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		instalación para señal SR - SP - SI (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.						
9	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	14	$ 453.201,52	$ 145.024,48	14,00	$ 598.226,00	$ 8.375.164,00
10	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente	50	$ 356.399,24	$ 114.047,76	50	$ 470.447,00	$ 23.522.350

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	UND	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	3	$ 213.422,73	$ 68.295,27	3,00	$ 281.718,00	$ 845.154,00
17	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	12	$ 264.873,48	$ 84.759,52	12,00	$ 349.633,00	$ 4.195.596,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	14	$ 351.642,42	$ 112.525,58	14,00	$ 464.168,00	$ 6.498.352,00
19	UND	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	8	$ 201.992,42	$ 64.637,58	8,00	$ 266.630,00	$ 2.133.040,00
22	UND	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	13	$ 141.362,88	$ 45.236,12	13,00	$ 186.599,00	$ 2.425.787,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	UND	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	44	$ 39.680,30	$ 12.697,70	N/A	$ 52.378,00	$ 2.304.632,00
28	UND	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	126	$ 21.279,55	$ 6.809,45	N/A	$ 28.089,00	$ 3.539.214,00
69	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	694	$ 8.650,00	$ 2.768,00	694,00	$ 11.418,00	$ 7.924.092,00
70	UND	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	98	$ 12.064,39	$ 3.860,61	98,00	$ 15.925,00	$ 1.560.650,00
73	UND	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de	404	$ 12.179,55	$ 3.897,45	404,00	$ 16.077,00	$ 6.495.108,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 32%	UNIDADES A INGRESAR ALMACEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		septiembre de 2024						
75	UND	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	148	$ 76.252,27	$ 24.400,73	148,00	$ 100.653,00	$ 14.896.644,00
80	UND	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	379	$ 12.179,55	$ 3.897,45	379,00	$ 63.342,00	$ 24.006.618
TOTAL								**$ 251.115.101**

Fuente: Acta de Recibo a Satisfacción 3

VALOR EN LETRAS	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO UN PESOS

N°	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
1	EX_05_53_1744_10	Horizontal	Usme	DESDE KR 2 HASTA KR 8BIS ENTRE CL 81 S Y CL 84S
2	EX_05_110_1867	Horizontal	Usme	KR 7 ENTRE CL 65 SUR Y CL 68B SUR
3	EX_05_93_1244_11	Horizontal Vertical	Usme	CL 71F sur hasta CL 81 BISA sur entre Av. Boyaca y AK 14
4	MV_05_122_1867_12	Horizontal Vertical	Usme	CL 86 SUR KR 11 HASTA CONCESIÓN AUTOPISTA AL LLANO
5	EX_04_241_1561_10	Vertical Horizontal	San Cristobal	KR 3A HASTA KR 2 ENTRE CL 30B SUR Y CL 28B SUR
6	EX_04_262_1561_10	Vertical Horizontal	San Cristobal	KR 7A HASTA KR 5A ENTRE CL 30D SUR Y CL 30A SUR
7	MV_AVBOYACA_940	Vertical	Usme	AV BOYACA ENTRE RIO TUNJUELITO Y KR 9BIS
8	MV_04_511_676	Vertical	San Cristobal	Av. Primero de Mayo entre Carrera 9A y Carrera 1B, Carrera 6 entre Calle 24 Sur y Av. Primero de Mayo, Carrera 4 entre Av. Primero de Mayo y Calle 19A Sur, Calle 19A Sur entre Carrera 6 y Carrera 5A.
9	EX_04_001_1073_24	Vertical	San Cristobal	Av. Primero de Mayo entre Carrera 9A y Carrera 1B, Carrera 6 entre Calle 24 Sur y Av. Primero de Mayo, Carrera 4 entre Av. Primero de Mayo y Calle 19A Sur, Calle 19A Sur entre Carrera 6 y Carrera 5A.
10	EX_05_119_1867_12	Horizontal	Usme	KR 14 HASTA CL 79 SUR ENTRE CL 84 SUR Y CL 76A SUR

16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN

En el periodo al que hace referencia este informe no se realizó entrega de señales retiradas en vía, sin embargo, cuando se realicen entregas, la información se encontrará en el Anexo 9.

17. ASPECTOS VARIOS

17.1 GEOREFERENCIACIÓN

Durante el periodo de presentación del informe se realizó la entrega de Georreferenciación perteneciente a la implementación del Obra, lo siguiente es el listado de ID's entregados a fecha de corte 23 de abril de 2025.

Tabla 10 Estado Georeferenciación

CUENTA	ID	FECHA ESTADO	ESTADO
1	EX_05_93_1244_11	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_119_1867_12	6-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_05_122_1867_12	20-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_AV_BOYACA_941_09	21-mar-25	APROBADO SDM
1	MV_04_230_1561_10	17-mar-24	APROBADO SDM
1	EX_04_044_1561_10	6-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_04_211_1561_10	17-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_320_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
1	EX_05_341_1561_10	11-mar-25	APROBADO SDM
2	MV_05_052_1744_10 SDM-202561200270682	24-mar-25	APROBADO SDM
2	MV_AV_BOYACA_941_09	24-mar-25	APROBADO SDM
2	EX_05_119_1867_12	24-mar-25	APROBADO SDM
2	MV_05_122_1867_12	24-mar-25	EN REVISION SDM
2	EX_05_053_1744_10	24-mar-25	APROBADO SDM
2	EX_04_211_1561_10	24-mar-25	APROBADO SDM
3	EX_04_001_1073_24_V2		EN DESARROLLO
3	EX_04_262_1561_10_		EN DESARROLLO
3	EX_05_119_1867_12		EN DESARROLLO
3	CP 202561200744162		EN DESARROLLO
3	EX_05_108_1867_12		EN DESARROLLO
3	EX_04_241_1561_10		EN DESARROLLO
3	EX_04_262_1561_10		EN DESARROLLO
3	MV_04_511		EN DESARROLLO
3	EX_05_053_1744_10		EN DESARROLLO
3	EX_05_110_1867_12		EN DESARROLLO
3	EX_05_93_1244_11_V5		EN DESARROLLO
3	MV_05_122_1867_12		EN DESARROLLO
3	MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3		EN DESARROLLO

Elaboración: Fuente propia

18. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA

18.1 PERSONAL

Tabla 11 Personal mínimo

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DEL PROYECTO	LUIS FERNANDO RUBIANO BARRERO
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO	DIANA PAOLA PARADA SIERRA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA DIURNO	VICTOR ANDRES MORENO CRISTANCHO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA NOCTURNO	DIEGO GUALTEROS CHAVEZ
TRABAJADOR SOCIAL	ELIANA JULIETH FAJARDO BORBÓN
PROFESIONAL STT	YULID LILIANA GELVES HERRERA
TECNÓLOGO EN GEORREFERENCIACIÓN	GIOVANNY ALEXANDER BRITO NÚÑEZ
CONDUCTOR DIURNO	WILMER SIERRA
CONDUCTOR NOCTURNO	HUGO ALEJANDRO MORENO CRISTANCHO
SECRETARIA	YOLIMA PATIÑO LOBATON
ESPECIALISTA GERENCIA DE PROYECTOS	ALBA ZULEIDY AVENDAÑO CIPAGAUTA

Fuente: Elaboración propia

18.2 EQUIPO

Tabla 12 Equipos empleados para la ejecución de las actividades

Maquina	Serie	Tipo de Vehículo	Placa	Marca
Aplicación de pintura liquida	-	Camión	VFB357	Chevrolet
Maquina autopropulsable TITAN 1000	TAPT002	Camión	WEP027	Jac
Aplicación de plástico en frio	IAPT001	Camión	WNN061	Jac
Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN Powrliner 8950, 2GUN	1. 1439800069 2. 1439800007 3. 1439800083	N/A	N/A	Titan
Featherlite	2001-454	N/A	N/A	ThermoMark II
Hydra M 4000, W FILTE/ (433- 801)	120700042	N/A	N/A	Titan

Fuente: Elaboración propia

18.3 INSTRUMENTOS USADOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

A continuación, se listan los instrumentos usados en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Lupa con aumento de 80X	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir velocidad del viento	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración propia

19. VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

20. VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES.

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

21. FACTOR SOCIAL

Esta información se encuentra en el Anexo 10. Gestión social.

22. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La información referente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el Anexo 11.

23. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

24.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

En el tercer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de marzo al 23 de abril del 2025 se realizaron actividades administrativas como:

- Revisión de documentación contractual.
- Revisión de Anexo técnico.
- Requerimientos mediante oficios.
- Respuestas a requerimientos de Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría,
- Asistencia a comités técnicos y mesas de trabajo y revisión de acta de comité.
- Asistencia comités de representantes legales.
- Entrega y firma de planillas de implementación señalización horizontal y vertical.
- Atención a las solicitudes de Interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad, en desarrollo del objeto del contrato vigilado.
- Entrega financiera del contrato de obra

24.2 ASPECTO JURIDICO

En el primer mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 24 de marzo al 23 de abril del 2025 se realizaron actividades s jurídicas como
:

- Ejecución del Contrato de Obra dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos para el mismo.
- Solicitudes de reclamaciones por parte de la interventoría.
- No se generaron reclamaciones por parte del contratista .
- No se generaron requerimientos de suspensión o prórroga del contrato de obra.

24. PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

Estas planillas se encuentran en el Anexo 11, Gestión SST, anexos, anexo A Seguridad Social.

25. CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS

Esta certificación se encuentra en el Anexo 12 Certificación salarios y honorarios.

26. LISTADO DE PROVEEDORES

La Unión Temporal cuenta con los siguientes proveedores:

- Pintuflex :Pintura en plástico en frio metilmetacrilato (spray) :
- Ecotraffic: Pintura de plástico en frio metilmetacrilato (llana)
- Ecotraffic: Imprimante acrílico negro

27. CERTIFICACIÓN PAGOS PROVEEDORES

Esta certificación se encuentra en el Anexo 13 Certificación pago proveedores.

28. ESTADO PRESUPUESTAL

29.1 RESUMEN CUENTA 1

Tabla 13 Cantidades ejecutadas por ID

No	Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Valor Ejecutado	% Ejecutado
1	EX_05_053_1744_10	Usme	$ 175.617.572,00	$ 29.154.785,88	16,60%
2	EX_05_110_1867_12	Usme	$ 413.896.516,00	$ 179.804.424,93	43,44%
3	EX_05_093_1244	Usme	$ 699.289.833,00	$ 325.872.265,41	46,60%
4	MV_05_122_1867_12	Usme	$ 1.079.073.835,00	$ 414.244.715,94	38,39%
5	EX_05_108_1867_12_V6	Usme	$ 221.236.644,00	$ 9.740.978,64	4,40%
6	EX_04_241_1561_10 CP ZONAS ESCOLARES	San Cristobal	$ 80.101.278,00	$ 48.710.154,22	60,81%
7	EX_04_262_1561_10 CP ZONAS ESCOLARES	San Cristobal	$ 124.721.669,00	$ 82.492.907,44	66,14%
8	MV_AV_BOYACA_941_09	Usme	$ 723.774.810,00	$ 114.866.070,57	15,87%
9	MV_04_511_676_09 DETECCIÓN ELECTRÓNICA	San Cristobal	$ 53.007.570,55	$ 6.399.712,55	12,07%
10	EX_04_001_1073_24 DETECCIÓN ELECTRÓNICA	San Cristobal	$ 6.104.950,94	$ 883.104,94	14,47%
11	EX_04_262_1561_10_ DETECCIÓN ELECTRÓNICA	San Cristobal	$ 56.357.205,84	$ 5.544.744,84	9,84%
12	EX_05_119_1867_12	Usme	$ 922.913.984,00	$ 75.778.182,56	8,21%
13	CP 202561200744162	Usme	$ 28.089,00	$ 28.089,00	100,00%
TOTAL			**$ 4.556.123.957**	**$ 1.293.520.137**	


GEO APROBADA C2	$	134.727.644
GEO SIN APROBAR C3	$	194.028.021
VALOR X COBRAR	**$**	**1.234.219.760**

En el Anexo 14 se encuentran las planillas de obra, acta parcial de obra y suministro.

29.2 AVANCE PARCIAL

A continuación , se presenta el avance parcial y acumulado respecto al mes de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar de acuerdo con lo estipulado por la interventoría, el cual representa un valor de **2,76%** del valor total del contrato, lo ejecutado en este periodo equivale al **6,57%** lo que representa un atraso del **2,10%.**

Gráfica 1 Gráfica Curva S

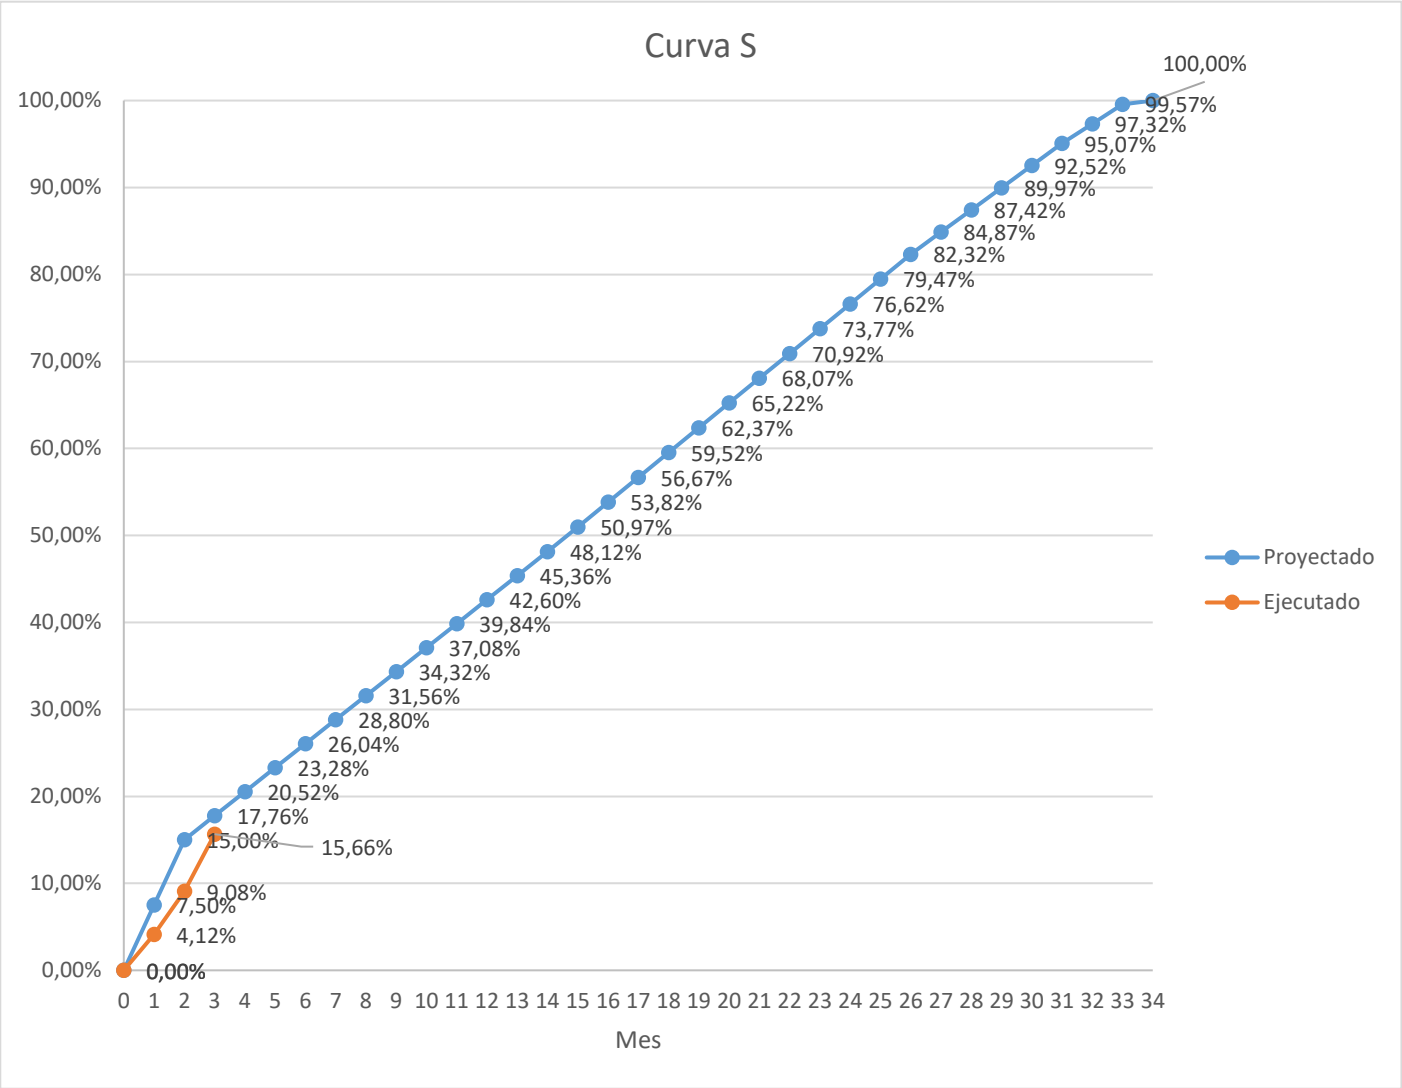
Curva S
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Mes
Proyectado
Ejecutado
0,00%
4,12%
7,50%
9,08%
15,00%
15,66%
17,76%
20,52%
23,28%
26,04%
28,80%
31,56%
34,32%
37,08%
39,84%
42,60%
45,36%
48,12%
50,97%
53,82%
56,67%
59,52%
62,37%
65,22%
68,07%
70,92%
73,77%
76,62%
79,47%
82,32%
84,87%
87,42%
89,97%
92,52%
95,07%
97,32%
99,57%
100,00%

29.3 BALANCE PRESUPUESTAL

Tabla 14 Balance presupuestal

VALOR VIGENCIA 2024	$	2.815.721.000,00
VALOR VIGENCIA 2025	$	6.209.487.857,00
VALOR VIGENCIA 2026	$	6.423.895.143,00
VALOR VIGENCIA 2027	$	3.322.369.428,00
VALOR TOTAL	**$**	**18.771.473.428,00**

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministro	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 518.247.080,00	$ 165.839.066,00	$ 88.935.514,00	$ 773.021.660,00	$ 38.651.083,00	$ 734.370.577,00	PAGO
Cuenta 1	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 669.831.615,05	$ 214.346.116,81	$ 47.682.975,00	$ 931.860.707	$ 46.593.035,00	$ 885.267.671,86	PAGO
Cuenta 3	24 de febrero 23 de marzo de 2025	$ 935.014.969,90	$ 299.204.790,37		$ 1.234.219.760	$ 61.710.988,00	$ 1.172.508.772,26	EN TRAMITE
TOTAL		**$ 1.188.078.695,05**	**$ 380.185.182,81**		**$ 1.704.882.366,86**	**$ 85.244.118,00**	**$ 1.619.638.248,86**	

TOTAL, FACTURADO ACTA No 3	$	1.234.219.760
TOTAL FACTURADO , ACUMULADO	$	1.704.882.366,86
SALDO POR FACTURAR	**$**	**17.066.591.061,14**

29. PUNTAJE

Esta información se encuentra en el Anexo 15. Puntaje.

30. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presenta un atraso del 2,10% en la ejecución respecto a lo solicitado en el anexo técnico, sin embargo, se informa que en este tercer mes las condiciones climáticas no fueron favorables lo cual tiene una incidencia directa en la ejecución de actividades.

- Se entregan avancen parciales de Georeferenciacion a interventoría de los diseños ejecutados en la cuenta 3.

- Se aprueba la Georeferenciacion de cuenta 2.

- Con el fin de tener varios frentes activos se realizaron inspecciones en varios diseños.

- Se realiza la entrega de dotación y los respectivos elementos de protección personal para el inicio de actividades.

31. ANEXOS

ANEXO 1. Pólizas

ANEXO 2. Plan de Manejo de Tránsito

ANEXO 3. Aspectos Técnicos

ANEXO 4. Consultas Reservas

ANEXO 5. Plan de Calidad

ANEXO 6. Protocolo de Manejos y Residuos

ANEXO 7. Acta de entrega a almacén

ANEXO 8. Certificados de calibración

ANEXO 9. Señales retiradas en vía

ANEXO 10. Gestión social

ANEXO 11. Gestión seguridad y salud en el trabajo

ANEXO 12. Certificación honorarios y parafiscales

ANEXO 13. Certificación pago de proveedores

ANEXO 14. Balance presupuestal

ANEXO 15. Puntaje
