CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
TRUJILLO
De La Fuente

INFORME DE OBRA

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE
Nit 901.878.498
ofitrujillodelafuentes@gmail.com
Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31
Saravena Arauca

INFORME No. 01 PARA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

Contrato de Obra Pública No. LP-007-2024

"CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CUBUGON, DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ."

Contratista

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.
NIT. 901.878.498-0
R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA

Supervisión

ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

Interventoría

INTERVENTORIA E INGENIERIA LJ S.A.S.
NIT. 901.109.930-3
R/L: ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ
CONTRATO DE CONSULTORIA MC-113-2024

MAYO DE 2025
CUBARA – BOYACA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÒN 4
2. ASPECTOS PRECONTRACTUALES 6
2.1 PROCESO DE SELECCIÓN 6
2.2 CELEBRACION DEL CONTRATO 6
3. DESCRIPCIÒN DEL CONTRATO 7
3.1 DESCRIPCION GENERAL 7
3.2 FINALIDAD DEL PROYECTO 8
3.3 LOCALIZACION 8
3.4 ALCANCE 9
4. ACTOS ADMINISTRATIVOS 9
4.1 Modificaciones y/o adiciones al contrato 11
5. ACTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS 14
6. RELACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 15
6.1 Pólizas de Legalización 15
6.2 Pólizas según acta de inicio 15
6.3 Pólizas según acta de Suspensión No. 01 y Reinicio No. 01 16
6.4 Pólizas según acta de Suspensión No. 02, Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 02 y Reinicio 02 16
6.5 Pólizas según acta Suspensión No. 03 y Reinicio No. 03 17
6.6 Pólizas según acta de modificatorio en valor Adición No. 01 17
7. ACTAS DE COMITÉ TECNICOS 17
8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 18
9. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA 18
9.1 Socialización del proyecto 18
9.2 Conformación de la veeduría ciudadana 19
10. RELACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 19

10.1 Personal Administrativo 19
10.2 Personal Operativo 20
10.3 Pagos salariales y liquidación del personal 21
11. BITACORA DIARIA DE OBRA 21
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 22
12.1 Dotación del personal 22
12.2 Accidentalidad en la obra 22
12.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 23
13. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES 23
14. PERMISOS Y LICENCIAS 23
14.1 Licencias y permisos para explotación de materiales de construcción 23
14.2 Otros Permisos requeridos 24
15. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 24
Tabla 18. Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. LP-007-2024. 24
16. ASPECTOS TECNICOS 24
16.1 CONDICIONES CONTRACTUALES 24
17. CANTIDADES AJUSTADAS MEDIANTE ACTA ADICIONAL No. 01 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025 27
Tabla 20. Cantidades adicional No. 01 del Contrato de Obra No. LP-007-2024 29
18. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA PARA ACTA PARCIAL 30
19. AVANCE DE LA OBRA 33
19.1 Avance Físico de la obra 33
19.2 Avance del plazo contractual 33
20. PROGRAMACION DE LA OBRA 34
22. CONCLUSIONES 47

1. INTRODUCCIÒN

En el siguiente informe de ejecución parcial de obra, se evidencia las actividades ejecutadas en cumplimiento a la minuta contractual por el contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.** Durante el periodo del 17 de diciembre del 2024 al 20 de mayo del 2025, un tiempo transcurrido de cuarenta y cinco (45) días de ejecución, teniendo en cuenta los ítems y cantidades referenciadas en el Contrato de Obra Pública No. LP-007-2024 cuyo objeto es **"CONSTRUCION DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CUBUGON, MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA".** Y las especificaciones técnicas, planos y diseños que hacen parte integral del mismo, con el fin de garantizar el buen desarrollo y ejecución del objeto contractual.

El alcance del proyecto contempla la construcción de las siguientes estructuras que conforman el sistema de acueducto veredal:

Bocatoma: Este capítulo aborda el diseño y construcción de la bocatoma, estructura encargada de captar el agua desde una fuente natural (como ríos, quebradas o nacimientos), para su posterior conducción. Se detalla la justificación de la ubicación seleccionada, considerando factores como la calidad del agua, su disponibilidad y la accesibilidad al sitio. Asimismo, se describen las actividades desarrolladas en esta fase, incluyendo la planificación, excavación, construcción de la estructura de captación, y la implementación de medidas ambientales y de seguridad orientadas a garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico.

Desarenador: Se presenta la construcción y operación del desarenador, componente esencial para mejorar la calidad del agua al remover partículas sólidas y sedimentos en suspensión. Se justifica su implementación como mecanismo preventivo para evitar obstrucciones en la red de conducción y asegurar un suministro adecuado para la comunidad. El capítulo incluye las actividades de diseño, construcción y puesta en marcha, junto con los criterios técnicos y ambientales aplicados para su localización y funcionamiento eficiente.

Tanque de Almacenamiento: Se describe la construcción del tanque de almacenamiento de agua, cuya principal función es garantizar un suministro continuo y regular, especialmente en periodos de baja disponibilidad o alta demanda. Se resalta la relevancia de esta infraestructura en la gestión eficiente del recurso hídrico, detallando las etapas de diseño, selección del sitio, construcción y pruebas de funcionamiento, asegurando su durabilidad y protección frente a posibles fuentes de contaminación.

Red de Conducción y Accesorios: En este capítulo se expone la instalación de la red de conducción, encargada de transportar el agua desde el desarenador hasta el tanque de almacenamiento, y de allí hacia los usuarios. Se incluyen aspectos del diseño hidráulico, elección de materiales, excavaciones, instalación de tuberías y accesorios (como válvulas, uniones y elementos de control). Además, se explica la fundamentación técnica de las decisiones adoptadas, así como su importancia para garantizar un flujo eficiente, seguro y sostenible. También se contemplan criterios de mantenimiento y accesibilidad para futuras intervenciones.

El informe contiene la ejecución técnica, administrativa, financiera del contrato de obra mencionado, en el marco del sistema de calidad y las exigencias de la Entidad Contratante contenidas en las especificaciones técnicas, referidas en los siguientes aspectos:

- Trabajos ejecutados: descripción general de las obras ejecutadas evaluadas técnicamente de acuerdo a las especificaciones y diseños para el cumplimiento de los objetivos.

- Aspectos Administrativos: Manejo administrativo de todos los documentos y trámites legales correspondientes, legalización, pólizas, actas, personal y equipo empleado para la ejecución de las obras.

- Aspectos Técnicos: Control sobre la ejecución diaria de las actividades de obra dentro de los parámetros técnicos establecidos, utilizando el equipo y personal idóneo en la realización de los trabajos.

- Aspecto Financiero: Control sobre la ejecución financiera del Contrato de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo.

- Control de Calidad: control diario ejecución de obras, utilizando materiales de calidad y el personal idóneo en la ejecución de los trabajos.

2. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

2.1 PROCESO DE SELECCIÓN

El municipio de Cubara adelantó el proceso de licitación pública LP-007-2024 de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, ley 1150 de 2007, y demás normas aplicables para suscribir contratos, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato a la firma contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S** representada legamente por **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** mediante Resolución No. 0548 de fecha 06 de diciembre de 2024.

2.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación, Resolución ***No. 0548*** **de fecha 06 de diciembre de 2024** se procedió a la suscripción del contrato de obra (No. LP-007-2024 el día 11 de diciembre de 2024) entre el municipio de Cubara y la firma contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S** representada por **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**, el cual tiene por objeto **"CONSTRUCION DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CUBUGON, MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA."**, con un plazo de ejecución de **QUINCE (15) DIAS** y un valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 384.919.055,00) M/CTE.**

3. DESCRIPCIÒN DEL CONTRATO

3.1 DESCRIPCION GENERAL

Que una de las obligaciones del Estado es el garantizar el acceso al agua, que se *considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como "el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico". El agua se erige como una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser humano. El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.* (Corte Constitucional, Sentencia T-740-2011).

Que la Ley 1551 de 2012 en su artículo 6 refiere las funciones de los municipios, que en su numeral 1° refiere: "1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley" y en su numeral 19° añade "Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios". Que dentro de los servicios de saneamiento básico se encuentra el servicio de alcantarillado, el cual cumple un papel fundamental en el desarrollo de un país, ya que hacen parte de la infraestructura necesaria para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población y de esta manera contribuyen con el progreso sostenible y con el crecimiento económico y social a través de la inversión y la eficiente ejecución y utilización de los proyectos (DANE, 2014). De lo anterior se entiende que es responsabilidad del municipio de Cubará garantizar el acceso a servicios públicos, en especial en lo que respecta al acueducto. En cumplimiento de dicho mandato Constitucional, la Secretaria de Planeación y Obras Públicas adelanto diferentes visitas en el sector rural del municipio e identificó que el sector vereda el Cubugon requiere de atención inmediata. A continuación, se describe la situación encontrada.

El sistema de abastecimiento de agua es precario. A pesar de que la cobertura del servicio alcanza el 85%, la red presenta fallas recurrentes y pérdidas de agua que no regresan a las fuentes hídricas. Aunque la vereda cuenta con una fuente hídrica con caudal suficiente para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población, además de garantizar el caudal ecológico exigido por las autoridades ambientales, el sistema actual no logra optimizar el uso de este recurso.

Las condiciones deficientes de abastecimiento en las comunidades rurales dispersas del municipio resultan en un acceso limitado al agua, que no siempre cumple con los estándares de cantidad y calidad para el consumo diario, la higiene personal y la preparación de alimentos. Esta situación expone a la comunidad a enfermedades asociadas con el consumo de agua de mala calidad, incrementando las tasas de morbimortalidad. Además, limita el acceso al mínimo vital de agua, lo que no solo compromete el derecho fundamental al agua, sino que también incrementa los índices de necesidades básicas insatisfechas en la población.

El sistema de abastecimiento actual está compuesto por una bocatoma de fondo, un desarenador, dos tanques de almacenamiento, uno de los cuales funciona como cámara de quiebre, pero no garantiza la disponibilidad de agua en periodos de escasez y una red de distribución de 2 pulgadas que presenta obstrucciones frecuentes. En términos generales, el sistema es obsoleto, con una

infraestructura precaria que no cumple con los requisitos mínimos de diseño establecidos en el RAS 2000.

Es urgente intervenir el sistema de abastecimiento de agua para asegurar un suministro continuo, de calidad adecuada, y que garantice cobertura para toda la población de la vereda. Esta intervención es esencial para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y garantizar el acceso al agua potable como un derecho fundamental.

Evidenciándose la necesidad de intervenir este acueducto, dentro del Plan de Desarrollo Municipal se implementó el programa "acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico" "construcción de acueductos" con el que se busca lograr la construcción del acueducto en el área rural, teniendo como meta para el cuatrienio beneficiar a 2 acueductos (aproximadamente). Considerando lo mencionado, es necesario adelantar un proceso de obra pública con el que se realice la construcción de este acueducto veredal para poder solucionar esta problemática, con lo que se busca beneficiar a más de 100 familias en la vereda Cubugon, equivalentes a 350 personas aproximadamente de acuerdo a la densidad poblacional del municipio, mejorando así significativamente la capacidad del acueducto y satisfaciendo las necesidades actuales y futuras de la comunidad. Estas acciones son cruciales para fortalecer y garantizar un suministro de agua confiable en ambas veredas.

3.2 FINALIDAD DEL PROYECTO

De acuerdo con el objeto del contrato de obra pública LP-007-2024, la finalidad de la obra en ejecución es realizar la **"CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDAL DEL CUBUGON, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**.

3.3 LOCALIZACION

El contrato de obra pública LP-007-2024 se localiza en la zona rural en la vereda Cubugon del municipio de Cubara.



Ilustración 1. Localización del proyecto, Recorte de Google Earth.

3.4 ALCANCE

El municipio de Cubará por medio de este proyecto busca la construcción de este acueducto veredal para poder solucionar esta problemática, con lo que se busca beneficiar a más de 100 familias en la vereda Cubugon, equivalentes a 350 personas aproximadamente de acuerdo a la densidad poblacional del municipio, mejorando así significativamente la capacidad del acueducto y satisfaciendo las necesidades actuales y futuras de la comunidad. Estas acciones son cruciales para fortalecer y garantizar un suministro de agua confiable de la vereda.

Dado lo anterior, la entidad estatal estima necesario realizar un proceso contractual que tiene por objeto la **"CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDAL DEL CUBUGON, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ."** esta intervención es esencial para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental.

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S, inicio labores el día 17 de diciembre de 2024, una vez suministrada, revisada y aprobada la documentación requerida para suscribir acta de inicio. Al acto se presentó, la firma contratista de obra la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DE LA FUENTE S.A.S** representada legalmente por **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** El señor **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ**, representante legal del **INTERVENTORIA E INGENIERIA LJ S.A.S** como interventor.

Tabla 1. Actos Administrativos Contrato de Obra No. LP-007-2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
11 de diciembre de 2024	Suscripción De Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
17 de diciembre de 2024	Suscripción De Acta De Inicio Del Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
27 de diciembre de 2024	Suscripción Del Acta De Suspensión No. 01 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por Un (01) Mes	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** Interventor
27 de enero de 2025	Suscripción De Acta De Reinicio Del Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
30 de enero de 2025	Suscripción Del Acta De Suspensión No. 02 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por Un (01) Mes	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** Interventor
28 de febrero de 2025	Suscripción Del Acta De Prorroga No. 01 A La Suspensión No. 02 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por Diecisiete (17) Días	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** Interventor
17 de marzo de 2025	Suscripción De Acta De Reinicio Del Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
18 de marzo de 2025	Suscripción De Acta De Adicional De Plazo Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por dos (02) Meses	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** Interventor
24 de marzo de 2025	Suscripción Del Acta De Suspensión No. 03 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por Treinta (30) Días	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** Interventor
24 de abril de 2025	Suscripción De Acta De Reinicio Del Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
25 de abril de 2025	Suscripción Del Acta De Adición No. 01 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**GILDARDO MURCIA BUITRAGO** Alcalde Municipal **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario Planeación y Obras Públicas, Supervisor **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista **ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ** Interventor

4.1 Modificaciones y/o adiciones al contrato

Durante el periodo comprendido del 17 de diciembre del 2024 al 20 de mayo del 2025, un tiempo transcurrido de cuarenta y cinco (45) días de ejecución, se presentó la necesidad de modificar en tiempo y valor el contrato principal de obra No. LP-007-2024.

"donde como firma contratista se solicitó a la interventoría y supervisión mediante oficio la necesidad de modificar el tiempo inicial contractual y adicionar en valor de acuerdo a las necesidades propuestas mediante la siguiente comunicación:
Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar formalmente la aprobación del modificatorio N° 01 al contrato de obra mencionado, con el propósito de ajustar y ampliar las cantidades de obra inicialmente establecidas, en atención a los imprevistos surgidos durante la ejecución del proyecto, así como a las condiciones adversas que afectaron la vialidad y el acceso a los puntos de intervención. La necesidad de este modificatorio surge a partir de un análisis exhaustivo realizado por la interventoría externa, que evidenció la omisión de ciertas actividades esenciales para garantizar la correcta ejecución del proyecto, así como la aparición de daños considerables en las vías de acceso que imposibilitaron la utilización de los medios de transporte convencionales previstos inicialmente en el presupuesto original.

El presente documento detalla de manera técnica y fundamentada las causas que motivan esta solicitud, describiendo en profundidad los ítems 5.1 y 5.2, los cuales corresponden a la incorporación de actividades nuevas relacionadas con el transporte mular, en trayectos largos y cortos, debido a los daños en la infraestructura vial y a la necesidad imperante de mantener la continuidad del proceso constructivo, sin alterar las cantidades contractuales previamente establecidas.

Contexto general de la situación y antecedentes
Durante los meses de febrero y marzo del presente año, se presentaron condiciones climáticas anómalas, con precipitaciones superiores a los promedios históricos registrados por el IDEAM. Estas lluvias intensas provocaron la saturación del suelo, deslizamientos y daños en las vías de acceso a los puntos de intervención del proyecto en el municipio de Cubará, Boyacá. Los registros fotográficos y las inspecciones in situ evidencian claramente la gravedad de las afectaciones en la infraestructura vial, que en algunos tramos se tradujeron en la destrucción total del camino, dejando los accesos intransitables para cualquier tipo de vehículo mecánico.

Este escenario dificultó de manera significativa la movilización de maquinaria, material y personal especializado hacia los sitios de trabajo, afectando la planificación inicial y generando retrasos en la ejecución de las actividades. Además, la imposibilidad de acceder en vehículos convencionales a los puntos de intervención impacta directamente en la gestión logística, elevando los costos y tiempo necesarios para el transporte de materiales y equipos.

Diagnóstico técnico y justificación del modificatorio
El análisis técnico realizado por la interventoría y la supervisión del proyecto concluye que, ante la imposibilidad de transitar por las vías dañadas, es imprescindible adoptar un sistema de transporte alternativo que garantice la continuidad de las actividades programadas, sin que ello implique modificar las cantidades contratadas. La solución encontrada consiste en la utilización de transporte mular, una práctica ancestral y efectiva en zonas de difícil acceso, que permite movilizar cargas de

menor peso en trayectos cortos y largos, adaptándose a las condiciones del terreno y a las limitaciones que imponen las afectaciones viales.

Este método de transporte, aunque incrementa los costos logísticos, resulta ser la única opción viable para garantizar la llegada de materiales y el traslado del personal, sin afectar las cantidades contractuales previamente pactadas. La incorporación de estos ítems requiere de una adecuada planificación, cotizaciones específicas y ajuste en los costos de transporte, que se detallan a continuación.

Descripción técnica y justificación de los ítems 5.1 y 5.2

5.1. TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS SUPERIORES A 500 M

El ítem 5.1 hace referencia a la utilización de mulas para el transporte de materiales en trayectos que superan los 500 metros desde los puntos de carga o almacenamiento temporales hasta los sitios de intervención en las obras de construcción del acueducto veredal del Cubugon. La necesidad de incluir este ítem surge a raíz del deterioro severo de las vías de acceso, que ha dejado los caminos en un estado de destrucción tal, que impide la circulación de vehículos motorizados de cualquier tipo, ya sean camiones, cargadores, o vehículos de apoyo logístico.

El uso de mulas en trayectos largos es una solución técnica que ha sido implementada en zonas rurales y montañosas, donde las condiciones del terreno son extremadamente adversas y la infraestructura vial no ha sido diseñada para soportar el tránsito de maquinaria pesada. La elección de este método responde a las siguientes consideraciones técnicas:

- ***Capacidad de carga:*** *Una mula puede transportar cargas de aproximadamente 80 a 90 kg en condiciones de terreno difícil, permitiendo distribuir cargas en varias jornadas o viajes según sea necesario.*
- ***Adaptabilidad al terreno:*** *Su paso por caminos estrechos, empinados, con pendientes pronunciadas y superficies irregulares, es mucho mayor que la de vehículos motorizados, lo cual es esencial en zonas afectadas por deslizamientos y daños viales.*
- ***Flexibilidad operativa:*** *Las mulas pueden operarse con menor infraestructura de apoyo, no requieren caminos pavimentados ni accesos en buen estado, lo que garantiza la continuidad de las actividades en condiciones adversas.*
- ***Seguridad y protección del medio ambiente:*** *Al no utilizar maquinaria pesada ni combustibles fósiles de manera constante, se reduce el impacto ambiental y se minimizan riesgos de accidentes asociados a la circulación por vías deterioradas.*

El transporte muscular en trayectos largos implica la movilización de las mulas desde las áreas de almacenamiento o puntos de carga hasta los sitios de trabajo, cubriendo distancias superiores a los 500 metros, con un costo aproximado de 21.000 pesos por trayecto. Este valor incluye el pago por viaje, la alimentación y el cuidado del animal, así como la mano de obra del cargador. La cantidad de viajes necesarios dependerá del volumen de material a transportar y de las condiciones específicas del terreno, ajustándose en cada caso mediante cotizaciones previas con los habitantes locales que ofrecen este servicio.

5.2. TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS INFERIORES A 500 M

El ítem 5.2 corresponde a la utilización de mulas para el transporte en trayectos que no superan los 500 metros, en condiciones donde la accesibilidad en vehículo motorizado es todavía inviable o altamente costosa, debido a la fragilidad de los caminos o a la presencia de obstáculos naturales. La elección de este método en trayectos cortos responde a las mismas consideraciones técnicas descritas anteriormente, adaptándose a las limitaciones del terreno y asegurando la continuidad del proceso constructivo sin recurrir a métodos más costosos o invasivos.

El costo por trayecto corto se calcula en aproximadamente 13.000 pesos, incluyendo los gastos de alimentación, cuidado y mano de obra del cargador, así como el uso de la mula para el transporte de cargas que, en estos casos, suelen ser menores, en torno a los 80-90 kg por viaje, debido a las limitaciones físicas del animal y las condiciones del camino. La cantidad de viajes en cada trayecto será determinada en función del volumen de materiales y los requerimientos específicos de cada punto de trabajo.

El uso de mulas en trayectos cortos es una estrategia eficaz para sortear obstáculos naturales, evitar deterioros adicionales en las vías existentes y reducir los tiempos de espera, permitiendo que las actividades de construcción puedan continuar sin mayores interrupciones. Además, esta práctica favorece la sostenibilidad del proyecto, al minimizar el impacto ambiental y preservar la integridad de las rutas alternativas.

Impacto en costos y planificación

La incorporación de estos ítems de transporte mular implica un incremento en los costos logísticos del proyecto, atribuible exclusivamente a las condiciones adversas del terreno y la infraestructura vial dañada, sin modificar las cantidades contractuales de obra. La inversión adicional es necesaria para garantizar la continuidad y calidad de la ejecución, evitando retrasos mayores y costos indirectos asociados a la inacción.

Se adjuntan las cotizaciones recibidas de los habitantes locales, que respaldan los valores indicados, así como un plan de trabajo detallado que contempla la logística, el cronograma y los recursos humanos y animales requeridos para la implementación efectiva de estos ítems.

En conclusión, la inclusión de los ítems 5.1 y 5.2 en este modificatorio resulta ser una solución técnica, económica y operacionalmente viable, que responde a las condiciones específicas del proyecto y a la necesidad imperante de mantener el ritmo de las actividades, asegurando la calidad y sostenibilidad de la obra en el tiempo previsto.

Por lo tanto, solicitamos su aprobación para proceder con la incorporación de estos elementos en el contrato, con la correspondiente asignación de recursos y ajustes en los presupuestos, en aras de garantizar la correcta ejecución del proyecto de construcción del acueducto veredal de Cubugón, en condiciones de seguridad, eficiencia y sostenibilidad."

5. ACTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARA
CONTRATO No:	LP-007-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCION DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CUBUGON, MUNICIPIO DE CUBARA BOYACA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
NIT. No:	901.878.498-0
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 384.919.055,00) M/CTE
PLAZO CONTRACTUAL:	QUINCE (15) DIAS O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCION:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA INICIO:	17 DE DICIEMBRE DE 2024
SUSPENSION Nº 01:	UN (01) MES – 27 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO Nº 01:	27 DE ENERO DE 2025
SUSPENSION Nº 02:	UN (01) MES – 30 DE ENERO DE 2025
MDIFICACION No. 03 PRORROGA A LA SUSPENSION Nº 02:	DIECISIETE (17) DIAS – 28 DE FEBRERO DE 2025
REINICIO Nº 02:	18 DE MARZO DE 2025
MODIFICACION No. 04 PRORROGA Nº 01:	DOS (02) MESES – 19 DE MARZO DE 2025
MODIFICACION No. 05 SUSPENSION Nº 03:	UN (01) MES – 24 DE MARZO DE 2025
REINICIO Nº 03:	24 DE ABRIL DE 2025
MODIFICACION No. 06 ADICIONAL No. 01:	CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 106.529.282,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JUNIO DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024000606 – DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024000909 – DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIONAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025000264 – DEL 24 DE ABRIL DE 2025.
ADICIONALREGISTRO PRESUPUESTAL:	2025000347 – DEL 26 DE ABRIL DE 2025
VALOR TOTAL CON ADICIONAL No. 01:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 491.448.337,00) M/CTE
SUPERVISOR:	ARQ. JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Tabla 2. Ficha técnica del contrato

6. RELACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de cubara en el Contrato de Obra No. LP-007 de 2024, se suscribe con la compañía de **SEGURADORA SOLIDARIA** las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA GARANTIAS del Contrato así:

6.1 Pólizas de Legalización

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora ***SOLIDARIA DE COLOMBIA,*** tomada por la ***CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S***, y con beneficiario el municipio de Cubará.

Tabla 3. Pólizas Anexo 0

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
11/12/2024	CUMPLIMIENTO	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*	475 47 994000068882	$ 38,941,906.00	11/12/2024	11/05/2025
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 153,967,622.00	11/12/2024	11/05/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			$ 19,245,953.00	11/12/2024	11/01/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 76,983,811.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*	475 74 994000011966	$ 260.000.000,00	11/12/2024	12/01/2025
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA			$ 260.000.000,00	11/12/2024	12/01/2025
	RCE PATRONAL			$ 260.000.000,00	11/12/2024	12/01/2025
	VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS			$ 260.000.000,00	11/12/2024	12/01/2025

6.2 Pólizas según acta de inicio

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora ***SOLIDARIA DE COLOMBIA,*** tomada por la ***CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S***, y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 4. Pólizas Anexo 1

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
27/01/2025	CUMPLIMIENTO	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*	475 47 994000068882	$ 38,941,908.00	17/12/2024	17/05/2025
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 153,967,622.00	17/12/2024	17/05/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			$ 19,245,953.00	17/12/2024	17/01/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 76,983,811.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*	475 74 994000011966	$ 284.700.000,00	12/01/2025	18/01/2025
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA			$ 284.700.000,00	12/02/2025	18/01/2025
	RCE PATRONAL			$ 284.700.000,00	12/01/2025	18/01/2025
	VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS			$ 284.700.000,00	12/01/2025	18/01/2025

6.3 Pólizas según acta de Suspensión No. 01 y Reinicio No. 01

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA,** tomada por la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S**, y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 5. Pólizas Anexo 2

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
28/01/2025	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 994000068882	$ 38,941,906.00	17/12/2024	17/06/2025
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 153,967,622.00	17/12/2024	17/06/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			$ 19,245,953.00	17/12/2024	17/02/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 76,983,811.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 74 994000011966	$ 284.700.000,00	18/01/2025	18/02/2025
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA			$ 284.700.000,00	18/01/2025	18/02/2025
	RCE PATRONAL			$ 284.700.000,00	18/01/2025	18/02/2025
	VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS			$ 284.700.000,00	18/01/2025	18/02/2025

6.4 Pólizas según acta de Suspensión No. 02, Prorroga No. 01 a la Suspensión No. 02 y Reinicio 02

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA,** tomada por la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S**, y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 6. Pólizas Anexo 3

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
08/04/2025	CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 994000068882	$ 38,941,906.00	17/12/2024	05/08/2025
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 153,967,622.00	17/12/2024	05/08/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			$ 19,245,953.00	17/12/2024	05/04/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 76,983,811.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 74 994000011966	$ 284.700.000,00	18/02/2025	06/04/2025
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA			$ 284.700.000,00	18/02/2025	06/04/2025
	RCE PATRONAL			$ 284.700.000,00	18/02/2025	06/04/2025
	VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS			$ 284.700.000,00	18/02/2025	06/04/2025

6.5 Pólizas según acta Suspensión No. 03 y Reinicio No. 03

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA,** tomada por la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S**, y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 7. Pólizas Anexo 4

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
29/04/2025	CUMPLIMIENTO	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*	475 47 994000068882	$ 38,941,906.00	17/12/2024	06/09/2025
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 153,967,622.00	17/12/2024	06/09/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			$ 19,245,953.00	17/12/2024	06/05/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 76,983,811.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*	475 74 994000011966	$ 284.700.000,00	06/04/2025	07/05/2025
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA			$ 284.700.000,00	06/04/2025	07/05/2025
	RCE PATRONAL			$ 284.700.000,00	06/04/2025	07/05/2025
	VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS			$ 284.700.000,00	06/04/2025	07/05/2025

6.6 Pólizas según acta de modificatorio en valor Adición No. 01

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA,** tomada por la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S**, y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 8. Pólizas Anexo 5

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
29/04/2025	CUMPLIMIENTO	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*	475 47 994000068882	$ 49,144,834.00	17/12/2024	06/11/2025
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			$ 196,579,335.00	17/12/2024	06/11/2025
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND			$ 24,572,417.00	17/12/2024	06/07/2028
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			$ 98,289,668.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	*ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*	475 74 994000011966	$ 284.700.000,00	07/05/2025	07/07/2025
	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA			$ 284.700.000,00	07/05/2025	07/07/2025
	RCE PATRONAL			$ 284.700.000,00	07/05/2025	07/07/2025
	VEHICULO PROPIO Y NO PROPIOS			$ 284.700.000,00	07/05/2025	07/07/2025

7. ACTAS DE COMITÉ TECNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del informe parcial, se han suscrito actas de comités técnicos desarrollados entre las partes.

Tabla 9. Actas del comité técnico del contrato

FECHA	ACTO DE COMITÉ TECNICOS	MOTIVO DEL ACTO DE COMITÉ TECNICOS	SUSCRITA POR
17 de marzo de 2025	Modificatorio No. 04 prorroga No. 01	Suscripción de acta de adicional de plazo del contrato de obra No. LP-007-2024. Por dos (02) meses	- JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretaria Planeación y obras publicas, Supervisor - DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA Contratista - ADRIAN FERLEY PEREZ VELASQUEZ Interventoría

8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido correspondencia entre la Interventoría, el contratista y la alcaldía municipal de cubara.

Tabla 10. Correspondencia enviada

FECHA	MOTIVO DE CORRESPONDENCIA	ENVIADA POR
27 de diciembre de 2024	Suscripción Del Acta De Suspensión No. 01 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por Un (01) Mes	**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
27 de enero de 2025	Suscripción De Acta De Reinicio Del Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
30 de enero de 2025	Suscripción Del Acta De Suspensión No. 02 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por Un (01) Mes	**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
28 de febrero de 2025	Suscripción Del Acta De Prorroga No. 01 A La Suspensión No. 02 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por Diecisiete (17) Días	**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
17 de marzo de 2025	Suscripción De Acta De Reinicio Del Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
18 de marzo de 2025	Suscripción De Acta De Adicional De Plazo Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por dos (02) Mes	**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
24 de marzo de 2025	Suscripción Del Acta De Suspensión No. 03 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024. Por Treinta (30) Días	**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
24 de abril de 2025	Suscripción De Acta De Reinicio Del Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista
25 de abril de 2025	Suscripción Del Acta De Adición No. 01 Del Contrato De Obra No. LP-007-2024.	**DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** Contratista

9. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

9.1 Socialización del proyecto

El 12/12/2024, se realizó la socialización del proyecto para la **CONSTRUCION DEL ACUEDUCTO VEREDAL DEL CUBUGON, MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACA**, en las instalaciones de la sala de juntas municipal del Municipio de Cubará, con previa convocatoria realizada por el Municipio de Cubará a través de la Secretaría de Planeación y Obras públicas.

Se le socializa a la comunidad presente, donde se le muestra el alcance del proyecto e intervención en la construcción de este acueducto veredal para poder solucionar esta problemática, con lo que se busca beneficiar a más de 100 familias en la vereda Cubugon, equivalentes a 350 personas aproximadamente de acuerdo a la densidad poblacional del municipio, mejorando así

significativamente la capacidad del acueducto y satisfaciendo las necesidades actuales y futuras de la comunidad.





Ilustración 2. Socialización del contrato

7.2 Conformación de la veeduría ciudadana

Para el presente contrato de obra no se realizó la conformación de la veeduría de obra ante la personería.

10. RELACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Se vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregada.

8.1 Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe es el mismo que fue ofertado en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe parcial:

Tabla 11. Personal administrativo del contrato de obra No. LP-007-2024 periodo de abril 2025.

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA
1	HENRY BORRERO MERCHAN	88255608	Director de obra	$ 3.000.000	23/04/2025		Nueva EPS	Porvenir	ARL SURA	COMFABOY	36644600
2	LUZ STELLA SOSA MOJICA	1013590049	Inspectora siso	$ 1.423.500	01/04/ 2025	30/04/2025	Nueva EPS	Protección	ARL SURA	COMFABOY	9485558178
3	GARCIA MONTAÑEZ SHIRLEY PAULIN	1090393926	Residente de obra	$ 3.000.000	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600

Tabla 12. Personal administrativo del contrato de obra No. LP-007-2024 periodo de mayo 2025.

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA

1	HENRY BORRERO MERCHAN	88255608	Director de obra	$ 3.000.000			Nueva EPS	Porvenir	ARL SURA	COMFABOY	33658261
2	DIANA CAROLINA FUENTE MOJICA	63544298	Inspectora siso	$ 1.423.500	01/05/2025		Nueva EPS	Porvenir	ARL SURA	COMFABOY	33685184
3	GARCIA MONTAÑEZ SHIRLEY PAULIN	1090393926	Residente de obra	$ 3.000.000			COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600

8.2 Personal Operativo

Se utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo con los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe parcial:

Tabla 13. Personal operativo del contrato de obra No LP-007-2024 en el mes de abril 2025.

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA
1	ANAYA DELGADO CRISTIAN CAMILO	1063718008	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
2	DUARTE VEGA FABIAN FRANCISCO	1115723027	Oficial	$ 2.918.010	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
3	GARCIA VALENCIA JOSE LUIS	1094274321	Oficial	$ 2.918.010	23/04/2025		CONFAORIENTE	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
4	JURADO ANGARITA RIGOBERTO	9466558	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	COMFABOY	36644600
5	MENDOZA QUIÑONEZ JHON ARVEY	1049396161	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
6	MENDOZA VALENCIA EMERSON	1002300191	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
7	MENDOZA VALENCIA YEFERSON	1090252037	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
8	MENDOZA VERA LIGIA AMPARO	33516401	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
9	PARADA VILLAMIZAR EMERSON ARBEY	1115744319	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	COMFABOY	36644600
10	PEÑA CASTELLANOS VICTOR FERNANDO	1049393107	Oficial	$ 2.918.010	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
11	QUIÑONES VILLAMIZAR ADELSO	1091059636	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
12	QUIÑONEZ VILLAMIZAR AURORA	33516019	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		COOSALUD	COLPENSIONES	ARL SURA	COMFABOY	36644600
13	REYES VALENCIA JAIME ALBERTO	1090252090	Arriero	$ 2.172.840	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
14	VALENCIA MORENO FIGER ALDAIR	1193509740	Arriero	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PROTECCION	ARL SURA	COMFABOY	36644600

Tabla 14. Personal operativo del contrato de obra No LP-007-2024 en el mes de mayo 2025.

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA
1	ANAYA DELGADO CRISTIAN CAMILO	1063718008	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
2	DUARTE VEGA FABIAN FRANCISCO	1115723027	Oficial	$ 2.918.010	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
3	GARCIA VALENCIA JOSE LUIS	1094274321	Oficial	$ 2.918.010	23/04/2025		CONFAORIENTE	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
4	JURADO ANGARITA RIGOBERTO	9466558	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	COMFABOY	36644600
5	MENDOZA QUIÑONEZ JHON ARVEY	1049396161	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
6	MENDOZA VALENCIA EMERSON	1002300191	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
7	MENDOZA VALENCIA YEFERSON	1090252037	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA
8	MENDOZA VERA LIGIA AMPARO	33516401	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
9	PARADA VILLAMIZAR EMERSON ARBEY	1115744319	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL SURA	COMFABOY	36644600
10	PEÑA CASTELLANOS VICTOR FERNANDO	1049393107	Oficial	$ 2.918.010	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
11	QUIÑONES VILLAMIZAR ADELSO	1091059636	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
12	QUIÑONEZ VILLAMIZAR AURORA	33516019	Ayudante	$ 2.172.840	23/04/2025		COOSALUD	COLPENSIONES	ARL SURA	COMFABOY	36644600
13	REYES VALENCIA JAIME ALBERTO	1090252090	Arriero	$ 2.172.840	23/04/2025		COOSALUD	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	36644600
14	VALENCIA MORENO FIGER ALDAIR	1193509740	Arriero	$ 2.172.840	23/04/2025		NUEVA EPS	PROTECCION	ARL SURA	COMFABOY	36644600

El pago de las planillas de seguridad social integral del periodo del acta parcial realizados, se presentan en el **ANEXO** con las respectivas planillas de la nómina firmadas por el personal.

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene con respecto al personal vinculado a la obra, la interventoría externa realiza seguimiento a los compromisos laborales verificando los siguientes aspectos:

8.3 Pagos salariales y liquidación del personal

Se realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) para que se relacionan en el presente informe.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		
	SI	NO	SI	NO	
Se tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		
Se ha entregado a la interventoría copia de las afiliaciones del personal.	X		X		
Se presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		X		
Se tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		

Tabla 15. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- Contrato de Obra No. LP-007-2024

11. BITACORA DIARIA DE OBRA

La bitácora de obra se comienza a llenar los formatos con las actividades que se van ejecutando desde el acta de inicio de la obra que tiene por fecha el día 25 de abril de 2025 hasta el 20 de mayo de 2025, se presenta copia de la Bitácora Diaria de Obra para el periodo del acta parcial.

12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

10.1 Dotación del personal

La firma contratista llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, ayudantes y oficiales.
GUANTES	X		X			Ayudantes y oficiales
BOTAS DE CAUCHO	X		X			Ayudantes y oficiales
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ayudantes y oficiales
TAPA BOCAS	X		X			Ayudantes y oficiales

Tabla 16. Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. LP-007-2024



Ilustración 3. Dotación del personal en obra de elementos de protección personal.

La Interventoría verificó diariamente en campo la utilización de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo los respectivos requerimientos a los trabajadores que en determinado momento no los estaban usando.

10.2 Accidentalidad en la obra

La Interventoría estuvo atenta al registro y atención de los accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el periodo del presente informe no se presentaron accidentes laborales en la ejecución del contrato No. LP-007-2024.

Por otro lado, la Interventoría también estuvo pendiente de cualquier accidente que se hubiese podido ocasionar a terceros en razón de la ejecución de la obra. Para el periodo del presente informe *(no)* se presentaron accidentes a terceros en la ejecución del contrato No. LP-007-2024.

10.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales."

11. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del presente contrato de consultoría no se aplicaron multas ni sanciones.

12. PERMISOS Y LICENCIAS

12.1 Licencias y permisos para explotación de materiales de construcción

Se realizó la adquisición de los materiales de construcción como (arena y triturado), en canteras autorizadas por la Agencia Nacional de Minería que cuentan con los respectivos permisos y licencias de CORPORINOQUIA, vigentes a la fecha de adquisición de los materiales.

Para la ejecución del contrato de obra No. LP-007-2024, el contratista adquirió los materiales de construcción en las siguientes canteras (arena y triturado).

TIPO DE MATERIAL	CANTERA	LOCALIZACION DE LA CANTERA	PERMISOS Y LICENCIAS		RESOLUCION DE CORPORINOQUIA	VIGENTE	
			Minero	Ambiental		SI	NO
Arena Y Triturado	LUIS HERNANDO VALENCIA MORA	CUBARA	Concesión Minera Nº CRM-202412041807-662038 del 04 de diciembre de 2024.		Corporinoquia Resolución Nº 500.41.15.1867 del 29 de diciembre de 2015	X	

Tabla 17. Proveedores de materiales de cantera para la obra objeto del contrato No. LP-007-2024

En el **ANEXO 4** se presenta copia de las Resoluciones otorgadas por la Autoridad Ambiental competente para la explotación de materiales de construcción de las canteras.

12.2 Otros Permisos requeridos

No se requieren ningún otro tipo de permisos para la ejecución del contrato de obra LP-007-2024.

13. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La interventoría verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

Por otro lado, la interventoría realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.		X		X	
Los operadores de la maquinaria y equipos se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral y ARL.	X		X		
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Seguro contra todo riesgo • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	X		X		

Tabla 18. Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. LP-007-2024.

14. ASPECTOS TECNICOS

14.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre la alcaldía del municipio de Cubara y la firma contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S** contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de cuarenta y cinco (45) días.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		BOCATOMA				

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	18,00	$ 5.867,00	$ 105.606,00
	1.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	9,00	$ 125.412,00	$ 1.128.708,00
	1.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	6,87	$ 781.529,00	$ 5.365.822,00
	1.4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	352,21	$ 9.899,00	$ 3.486.491,00
	1.5	MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM	M2	25,32	$ 36.459,00	$ 923.142,00
	1.6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA	M2	38,42	$ 91.842,00	$ 3.528.827,00
	1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=4"	ML	14,00	$ 74.230,00	$ 1.039.220,00
	1.8	CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=4"	UND	1,00	$ 198.973,00	$ 198.973,00
	1.9	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1" Y BARRAS DE 1/2" (0,88x0.25 M) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 717.697,00	$ 717.697,00
					Subtotal	**$ 16.494.486,00**
		DESARENADOR				
2.	2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	24,50	$ 5.867,00	$ 143.742,00
	2.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	21,00	$ 125.412,00	$ 2.633.652,00
	2.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	3,80	$ 781.529,00	$ 2.972.702,00
	2.4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	408,40	$ 9.899,00	$ 4.042.798,00
	2.5	MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM	M2	35,85	$ 36.459,00	$ 1.307.055,00
	2.6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA	M2	30,49	$ 91.842,00	$ 2.800.263,00
	2.7	MAMPOSTERIA PARA CONSTRUCCION DE CAJA EN LADRILLO TOLETE COMUN	M2	1,65	$ 93.811,00	$ 154.788,00
	2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI PARA DESAGÜE Y REBOSE D=4"	ML	12,00	$ 74.230,00	$ 890.760,00
	2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=4"	UND	2,00	$ 198.973,00	$ 397.946,00
	2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=4"	UND	1,00	$ 280.924,00	$ 280.924,00
	2.11	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 3"	UND	1,00	$ 612.297,00	$ 612.297,00
	2.12	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 4"	UND	2,00	$ 763.144,00	$ 1.526.288,00
					Subtotal	**$ 17.763.215,00**
		TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
3.	3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	52,00	$ 5.867,00	$ 305.084,00
	3.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	41,40	$ 125.412,00	$ 5.192.057,00
	3.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	39,18	$ 781.529,00	$ 30.616.735,00
	3.4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	4.591,89	$ 9.899,00	$ 45.455.121,00

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	3.5	MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM	M2	90,48	$ 36.459,00	$ 3.298.810,00
	3.6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA	M2	117,52	$ 91.842,00	$ 10.793.272,00
	3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO PARA VENTILACIÓN, DESAGÜE Y REBOSE D=3"	ML	24,00	$ 59.487,00	$ 1.427.688,00
	3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=3"	UND	8,00	$ 717.697,00	$ 5.741.576,00
	3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI D=3"	UND	1,00	$ 181.711,00	$ 181.711,00
	3.10	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 3"	UND	2,00	$ 612.297,00	$ 1.224.594,00
					Subtotal	**$ 104.236.648,00**
		RED DE CONDUCCIÓN Y ACCESORIOS				
4.	4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	ML	813,00	$ 5.053,00	$ 4.108.089,00
	4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=3"	ML	813,00	$ 59.487,00	$ 48.362.931,00
	4.3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	390,24	$ 125.412,00	$ 48.940.779,00
	4.4	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	243,90	$ 151.347,00	$ 36.913.533,00
	4.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	146,34	$ 86.054,00	$ 12.593.142,00
					Subtotal	**$ 150.918.474,00**
					SUBTOTAL OBRAS	**$ 289.412.823,00**
					COSTO DIRECTO DE OBRA	$ 289.412.823,00
					COSTO INDIRECTO DE OBRA (33%)	$ 95.506.232,00
					VALOR TOTAL	**$ 384.919.055,00**

Tabla 19. Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. LP-007-2024.

11. CANTIDADES AJUSTADAS MEDIANTE ACTA ADICIONAL No. 01 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ADICIONAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	(+/-)	VALOR TOTAL ($)
1,00	**BOCATOMA**							
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	18,00	$ 5.867,00	$ 105.606,00	18,00	=	$ 105.606,00
1,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	9,00	$ 125.412,00	$ 1.128.708,00	9,00	=	$ 1.128.708,00
1,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	6,87	$ 781.529,00	$ 5.365.822,00	6,87	=	$ 5.365.822,00
1,4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	352,21	$ 9.899,00	$ 3.486.491,00	352,21	=	$ 3.486.491,00
1,5	MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM	M2	25,32	$ 36.459,00	$ 923.142,00	25,32	=	$ 923.142,00
1,6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA	M2	38,42	$ 91.842,00	$ 3.528.827,00	38,42	=	$ 3.528.827,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=4"	ML	14,00	$ 74.230,00	$ 1.039.220,00	14,00	=	$ 1.039.220,00
1,8	CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=4"	UND	1,00	$ 198.973,00	$ 198.973,00	1,00	=	$ 198.973,00
1,9	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1" Y BARRAS DE 1/2" (0,88x0.25 M) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 717.697,00	$ 717.697,00	1,00	=	$ 717.697,00
Subtotal					**$ 16.494.486,00**			**$ 16.494.486,00**
2	**DESARENADOR**							
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	24,50	$ 5.867,00	$ 143.742,00	24,50	=	$ 143.742,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	21,00	$ 125.412,00	$ 2.633.652,00	21,00	=	$ 2.633.652,00
2,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	3,80	$ 781.529,00	$ 2.972.702,00	3,80	=	$ 2.972.702,00
2,4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	408,40	$ 9.899,00	$ 4.042.798,00	408,40	=	$ 4.042.798,00
2,5	MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM	M2	35,85	$ 36.459,00	$ 1.307.055,00	35,85	=	$ 1.307.055,00
2,6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA	M2	30,49	$ 91.842,00	$ 2.800.263,00	30,49	=	$ 2.800.263,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	ADICIONAL CANTIDAD	(+/-)	VALOR TOTAL ($)
2,7	MAMPOSTERIA PARA CONSTRUCCION DE CAJA EN LADRILLO TOLETE COMUN	M2	1,65	$ 93.811,00	$ 154.788,00	1,65	=	$ 154.788,00
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI PARA DESAGÜE Y REBOSE D=4"	ML	12,00	$ 74.230,00	$ 890.760,00	12,00	=	$ 890.760,00
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=4"	UND	2,00	$ 198.973,00	$ 397.946,00	2,00	=	$ 397.946,00
2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=4"	UND	1,00	$ 280.924,00	$ 280.924,00	1,00	=	$ 280.924,00
2,11	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 3"	UND	1,00	$ 612.297,00	$ 612.297,00	1,00	=	$ 612.297,00
2,12	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 4"	UND	2,00	$ 763.144,00	$ 1.526.288,00	2,00	=	$ 1.526.288,00
Subtotal					**$ 17.763.215,00**			**$ 17.763.215,00**
3	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**							
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	52,00	$ 5.867,00	$ 305.084,00	52,00	=	$ 305.084,00
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	41,40	$ 125.412,00	$ 5.192.057,00	41,40	=	$ 5.192.057,00
3,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	39,18	$ 781.529,00	$ 30.616.735,00	39,18	=	$ 30.616.735,00
3,4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	4.591,89	$ 9.899,00	$ 45.455.121,00	4591,89	=	$ 45.455.121,00
3,5	MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM	M2	90,48	$ 36.459,00	$ 3.298.810,00	90,48	=	$ 3.298.810,00
3,6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA	M2	117,52	$ 91.842,00	$ 10.793.272,00	117,52	=	$ 10.793.272,00
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO PARA VENTILACIÓN, DESAGÜE Y REBOSE D=3"	ML	24,00	$ 59.487,00	$ 1.427.688,00	24,00	=	$ 1.427.688,00
3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=3"	UND	8,00	$ 717.697,00	$ 5.741.576,00	8,00	=	$ 5.741.576,00
3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI D=3"	UND	1,00	$ 181.711,00	$ 181.711,00	1,00	=	$ 181.711,00
3,10	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 3"	UND	2,00	$ 612.297,00	$ 1.224.594,00	2,00	=	$ 1.224.594,00
Subtotal					**$ 104.236.648,00**			**$ 104.236.648,00**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	ADICIONAL (+/-)	VALOR TOTAL ($)
4	**RED DE CONDUCCION Y ACCESORIOS**							
4,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	ML	813,00	$ 5.053,00	$ 4.108.089,00	813,00	=	$ 4.108.089,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=3"	ML	813,00	$ 59.487,00	$ 48.362.931,00	813,00	=	$ 48.362.931,00
4,3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	390,24	$ 125.412,00	$ 48.940.779,00	390,24	=	$ 48.940.779,00
4,4	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	243,90	$ 151.347,00	$ 36.913.533,00	243,90	=	$ 36.913.533,00
4,5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	146,34	$ 86.054,00	$ 12.593.142,00	146,34	=	$ 12.593.142,00
Subtotal					**$ 150.918.474,00**			**$ 150.918.474,00**
5	**ÍTEMS NO PREVISTOS (TRANSPORTE MULAR)**							
5,1	TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS SUPERIORES A 500 M	CARGAS		$ 21.000,00		354,18	+	$ 7.437.780,00
5,2	TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS INFERIORES A 500 M	CARGAS		$ 13.000,00		5589,19	+	$ 72.659.470,00
Subtotal								**$ 80.097.250,00**
	TOTAL COSTO DEL PROYECTO				**$289.412.823,00**			
	COSTO INDIRECTO DE OBRA (33%)				**$ 95.506.232,00**			**$ 26.432.077,00**
	VALOR TOTAL DE OBRA				**$384.919.055,00**			**$106.529.282,00**

Tabla 20. Cantidades adicional No. 01 del Contrato de Obra No. LP-007-2024

12. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA PARA ACTA PARCIAL

Para el periodo de corte acta parcial de obra, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ADICIONAL			CANTIDADES PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01		TOTAL ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	(+/-)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
1,00	**BOCATOMA**											
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	18,00	$ 5.867,00	$ 105.606,00	18,00	=	$ 105.606,00		$ 0,00		$ 0,00
1,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	9,00	$ 125.412,00	$ 1.128.708,00	9,00	=	$ 1.128.708,00		$ 0,00		$ 0,00
1,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	6,87	$ 781.529,00	$ 5.365.822,00	6,87	=	$ 5.365.822,00		$ 0,00		$ 0,00
1,4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	352,21	$ 9.899,00	$ 3.486.491,00	352,21	=	$ 3.486.491,00		$ 0,00		$ 0,00
1,5	MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM	M2	25,32	$ 36.459,00	$ 923.142,00	25,32	=	$ 923.142,00		$ 0,00		$ 0,00
1,6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA	M2	38,42	$ 91.842,00	$ 3.528.827,00	38,42	=	$ 3.528.827,00		$ 0,00		$ 0,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=4"	ML	14,00	$ 74.230,00	$ 1.039.220,00	14,00	=	$ 1.039.220,00		$ 0,00		$ 0,00
1,8	CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=4"	UND	1,00	$ 198.973,00	$ 198.973,00	1,00	=	$ 198.973,00		$ 0,00		$ 0,00
1,9	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1" Y BARRAS DE 1/2" (0,88x0.25 M) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00	$ 717.697,00	$ 717.697,00	1,00	=	$ 717.697,00		$ 0,00		$ 0,00
Subtotal					**$16.494.486,00**			**$16.494.486,00**				
2	**DESARENADOR**											
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	24,50	$ 5.867,00	$ 143.742,00	24,50	=	$ 143.742,00		$ 0,00		$ 0,00
2,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	21,00	$ 125.412,00	$ 2.633.652,00	21,00	=	$ 2.633.652,00		$ 0,00		$ 0,00
2,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	3,80	$ 781.529,00	$ 2.972.702,00	3,80	=	$ 2.972.702,00		$ 0,00		$ 0,00
2,4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	408,40	$ 9.899,00	$ 4.042.798,00	408,40	=	$ 4.042.798,00		$ 0,00		$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ADICIONAL			CANTIDADES PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01		TOTAL ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	(+/-)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
2,5	MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM	M2	35,85	$ 36.459,00	$ 1.307.055,00	35,85	=	$ 1.307.055,00		$ 0,00		$ 0,00
2,6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA	M2	30,49	$ 91.842,00	$ 2.800.263,00	30,49	=	$ 2.800.263,00		$ 0,00		$ 0,00
2,7	MAMPOSTERIA PARA CONSTRUCCION DE CAJA EN LADRILLO TOLETE COMUN	M2	1,65	$ 93.811,00	$ 154.788,00	1,65	=	$ 154.788,00		$ 0,00		$ 0,00
2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI PARA DESAGÜE Y REBOSE D=4"	ML	12,00	$ 74.230,00	$ 890.760,00	12,00	=	$ 890.760,00		$ 0,00		$ 0,00
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=4"	UND	2,00	$ 198.973,00	$ 397.946,00	2,00	=	$ 397.946,00		$ 0,00		$ 0,00
2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=4"	UND	1,00	$ 280.924,00	$ 280.924,00	1,00	=	$ 280.924,00		$ 0,00		$ 0,00
2,11	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 3"	UND	1,00	$ 612.297,00	$ 612.297,00	1,00	=	$ 612.297,00		$ 0,00		$ 0,00
2,12	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 4"	UND	2,00	$ 763.144,00	$ 1.526.288,00	2,00	=	$ 1.526.288,00		$ 0,00		$ 0,00
Subtotal					**$17.763.215,00**			**$17.763.215,00**				
3	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**											
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	52,00	$ 5.867,00	$ 305.084,00	52,00	=	$ 305.084,00	52,00	$ 305.084,00	52,00	$ 305.084,00
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	41,40	$ 125.412,00	$ 5.192.057,00	41,40	=	$ 5.192.057,00	41,40	$ 5.192.057,00	41,40	$ 5.192.057,00
3,3	CONCRETO 3000 PSI	M3	39,18	$ 781.529,00	$ 30.616.735,00	39,18	=	$ 30.616.735,00	39,18	$ 30.616.735,00	39,18	$ 30.616.735,00
3,4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	4.591,89	$ 9.899,00	$ 45.455.121,00	4591,89	=	$ 45.455.121,00	4591,89	$ 45.455.121,00	4.591,89	$ 45.455.121,00
3,5	MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM	M2	90,48	$ 36.459,00	$ 3.298.810,00	90,48	=	$ 3.298.810,00	90,48	$ 3.298.810,00	90,48	$ 3.298.810,00
3,6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA	M2	117,52	$ 91.842,00	$ 10.793.272,00	117,52	=	$ 10.793.272,00	117,52	$ 10.793.272,00	117,52	$ 10.793.272,00
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO PARA VENTILACIÓN, DESAGÜE Y REBOSE D=3"	ML	24,00	$ 59.487,00	$ 1.427.688,00	24,00	=	$ 1.427.688,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=3"	UND	8,00	$ 717.697,00	$ 5.741.576,00	8,00	=	$ 5.741.576,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI D=3"	UND	1,00	$ 181.711,00	$ 181.711,00	1,00	=	$ 181.711,00		$ 0,00		$ 0,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	ADICIONAL CANTIDAD	(+/-)	VALOR TOTAL ($)	CANTIDADES PRESENTE ACTA PARCIAL N° 01 CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)	TOTAL ACUMULADO CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
3,10	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 3"	UND	2,00	$ 612.297,00	$ 1.224.594,00	2,00	=	$ 1.224.594,00		$ 0,00		$ 0,00
Subtotal					**$104.236.648,00**			**$104.236.648,00**		**$95.661.079,00**		**$95.661.079,00**
4	**RED DE CONDUCCION Y ACCESORIOS**											
4,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	ML	813,00	$ 5.053,00	$ 4.108.089,00	813,00	=	$ 4.108.089,00	813,00	$ 4.108.089,00	813,00	$ 4.108.089,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=3"	ML	813,00	$ 59.487,00	$ 48.362.931,00	813,00	=	$ 48.362.931,00	813,00	$ 48.362.931,00	813,00	$ 48.362.931,00
4,3	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	390,24	$ 125.412,00	$ 48.940.779,00	390,24	=	$ 48.940.779,00	390,24	$ 48.940.779,00	390,24	$ 48.940.779,00
4,4	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	243,90	$ 151.347,00	$ 36.913.533,00	243,90	=	$ 36.913.533,00	243,90	$ 36.913.533,00	243,90	$ 36.913.533,00
4,5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	146,34	$ 86.054,00	$ 12.593.142,00	146,34	=	$ 12.593.142,00	146,34	$ 12.593.142,00	146,34	$ 12.593.142,00
Subtotal					**$150.918.474,00**			**$150.918.474,00**		**$150.918.474,00**		**$150.918.474,00**
5	**ÍTEMS NO PREVISTOS (TRANSPORTE MULAR)**											
5,1	TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS SUPERIORES A 500 M	CARGAS		$ 21.000,00		354,18	+	$7.437.735,40	354,18	$ 7.437.735,00	354,18	$ 7.437.735,00
5,2	TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS INFERIORES A 500 M	CARGAS		$ 13.000,00		5589,19	+	$72.659.470,00	5589,19	$ 72.659.470,00	5.589,19	$ 72.659.470,00
Subtotal								**$ 80.097.205,40**		**$ 80.097.205,00**		**$ 80.097.205,00**
	TOTAL COSTO DEL PROYECTO				**$289.412.823,00**					**$326.676.758,00**		**$326.676.758,00**
	COSTO INDIRECTO DE OBRA (33%)				**$95.506.232,00**					**$107.803.330,00**		**$107.803.330,00**
	VALOR TOTAL DE OBRA				**$384.919.055,00**					**$434.480.088,00**		**$434.480.088,00**

Tabla 21. Cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. LP-007-2024 en Acta parcial

13. AVANCE DE LA OBRA

16.1 Avance Físico de la obra

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo del acta parcial, se presenta un avance de obra acumulado del 88.41%, equivalente a la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.



Gráfico 1. Avance Físico del contrato de obra No. LP-007-2024

16.2 Avance del plazo contractual

Con respecto al plazo contractual inicial, de quince (15) días establecidos en la minuta del contrato y un adicional de dos (02) meses, han transcurrido un (01) mes y quince (15) días desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 60.00% del total del plazo ejecutado, finalizando las actividades del contrato antes del tiempo estipulado para dicha ejecución y proceder a entregar las obras al municipio de Cubara.

En cuanto al estado del tiempo para el periodo del presente informe el clima presentado durante la ejecución de las actividades fue variable para el desarrollo de las actividades del contrato permitiendo cumplir con la programación establecida.

PLAZO CONTRACTUAL	QUINCE (15) DIAS
TIEMPO SUSPENDIDO	DOS (02) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS
PLAZO ADICIONADO	DOS (02) MESES
PLAZO EJECUTADO	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO POR EJECUTAR	VEINTIOCHO (28) DIAS
% PLAZO EJECUTADO	60.00%

Tabla 22. Plazo Contractual

14. PROGRAMACION DE LA OBRA

Para el control de la programación, se presentó a la Interventoría el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual la interventoría hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general constatando que se realiza la obra con anticipación de la fecha propuesta por la administración, a continuación, se evidencian las actividades ejecutadas para el presente informe parcial.

15. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO

3,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

La etapa inicial consistió en la determinación precisa de la ubicación del tanque de almacenamiento, mediante levantamientos topográficos realizados con equipos GPS de alta precisión. Se eligió el sitio óptimo considerando las características del terreno, la cercanía a las redes existentes y las pendientes naturales para facilitar la conducción del agua. Posteriormente, se procedió al replanteo topográfico, donde se marcaron en el terreno las coordenadas exactas del área del tanque, incluyendo los puntos de referencia para los cimientos y las paredes. Se utilizaron estacas y cordeles para delimitar la zona de excavación y se verificó la nivelación para garantizar la correcta ejecución de las actividades subsiguientes.





Tabla 23. LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M2	52,00	52,00	52,00	100.00%

3,2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO

Se realizó la excavación manual en el área delimitada, empleando herramientas manuales como picos, palas y azadones. La excavación se llevó a cabo con precisión siguiendo las coordenadas replanteadas, asegurando la profundidad y dimensiones requeridas según los planos estructurales. Se removieron los materiales de relleno y conglomerado, clasificándolos para su disposición o reutilización. La excavación fue controlada en profundidad y dimensiones, verificando que las paredes tuvieran la inclinación y ángulo adecuados para soportar las estructuras posteriores. Se tomaron medidas para evitar el colapso de las paredes, mediante la colocación de soportes temporales si fue necesario, y se aseguraron de que el fondo de la excavación estuviera nivelado y libre de material suelto.



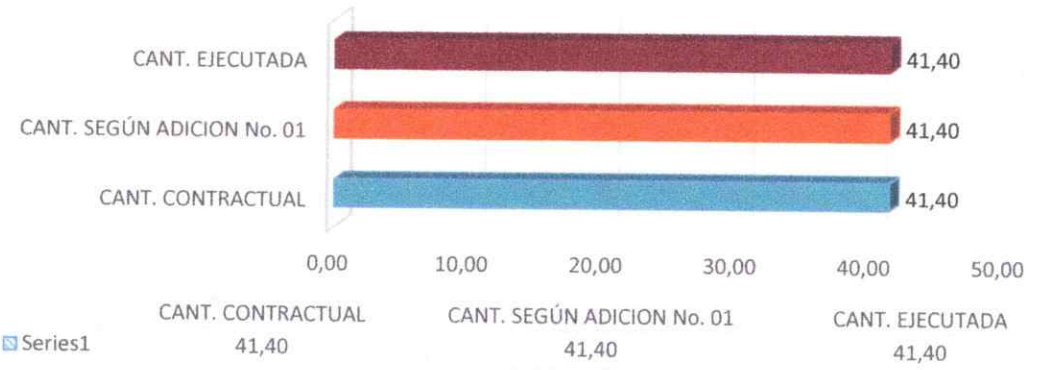


Tabla 24. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M3	41,40	41,40	41,40	100.00%

3,3 CONCRETO 3000 PSI

El proceso de vaciado del concreto se realizó con concreto premezclado de resistencia 3000 psi, siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto. Se prepararon encofrados de madera o metálicos, ajustados firmemente para definir las formas del tanque y sus componentes. Antes del vertido, se realizó la limpieza y humectación de las superficies de contacto para garantizar la adherencia del concreto. El vertido fue realizado en capas, empleando vibradores internos para eliminar bolsas de aire y asegurar la compactación del material. Posteriormente, se alisaron y nivelaron las superficies, se colocaron juntas de expansión según las especificaciones y se cubrieron con mantas húmedas o plásticos para evitar la pérdida de humedad durante el fraguado, logrando así una resistencia homogénea y duradera.



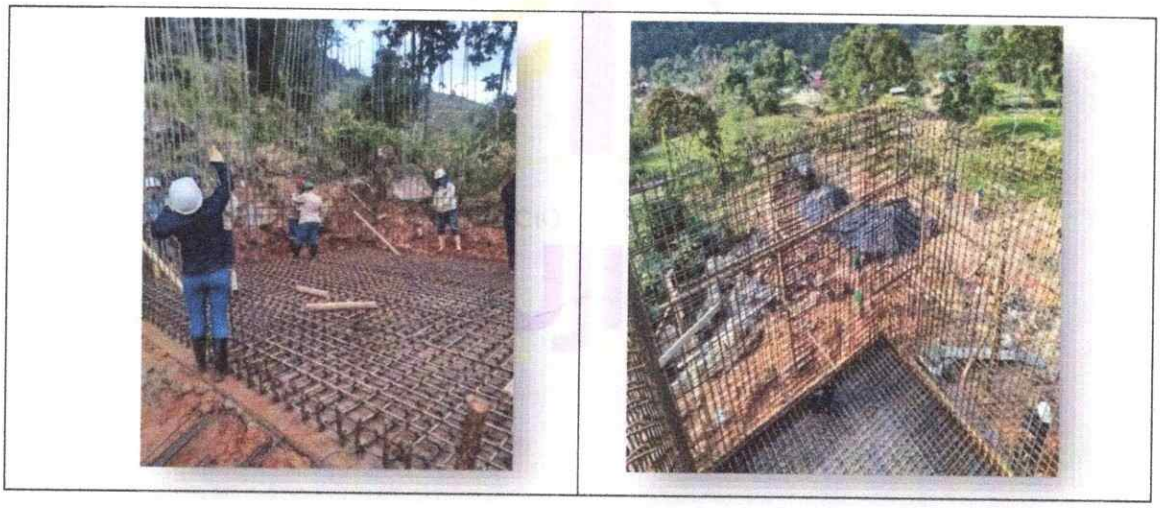


Tabla 25. CONCRETO 3000 PSI.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M3	39,18	39,18	39,18	100.00%

3,4 SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI

Se suministró y preparó el acero de refuerzo de alta resistencia, de especificación 60000 psi, cortándolo a las dimensiones requeridas y doblándolo según el diseño estructural. Se realizó la figurada, es decir, se colocaron las varillas en las posiciones indicadas en los planos, respetando las distancias y anclajes especificados. Posteriormente, se procedió al amarre de las diferentes varillas mediante alambre de acero, asegurando la estabilidad de la armadura durante el proceso de vaciado de concreto. Se cuidó que las varillas estuvieran libres de oxidación o impurezas antes de su colocación, garantizando la adherencia y la resistencia estructural. La correcta colocación y amarre de las armaduras fue supervisada por personal técnico calificado, verificando las especificaciones de separación, cobertura y anclaje.



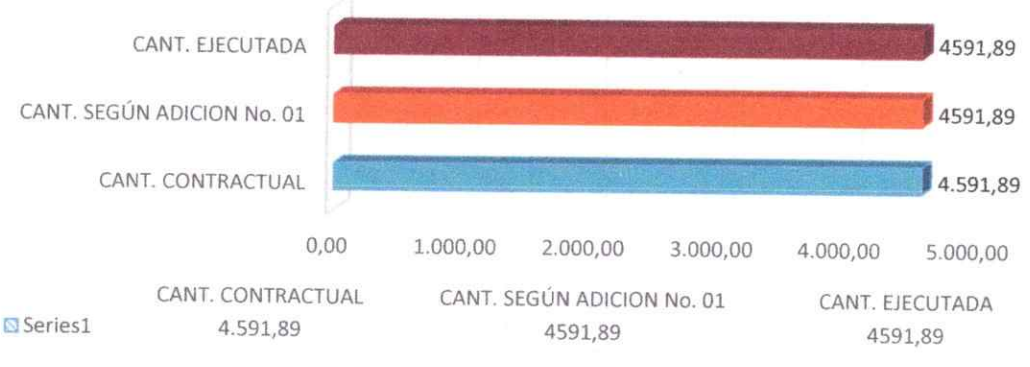
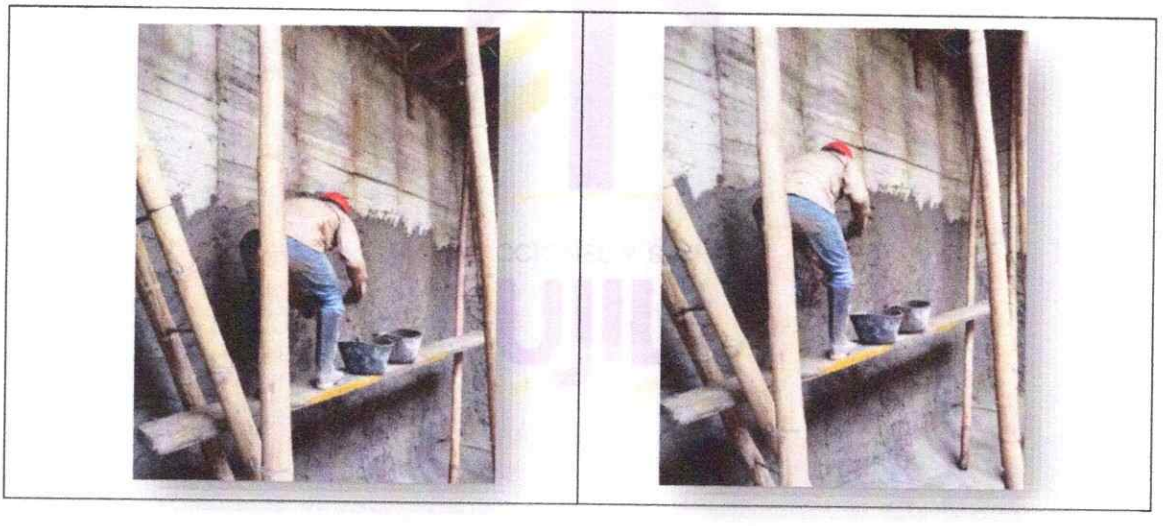


Tabla 26. SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
KG	4.591,89	4.591,89	4.591,89	100.00%

3,5 MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM

Se elaboró un mortero de resistencia 3000 psi, mezclado con aditivos impermeabilizantes que mejoraron la resistencia a la humedad y la durabilidad del elemento. Este mortero fue aplicado en los muros y en las placas de fondo, formando un recubrimiento de aproximadamente 1.5 cm de espesor, con el fin de impermeabilizar las superficies y prevenir filtraciones. La aplicación fue realizada en capas uniformes, extendiendo el mortero con paleta o llana metálica, asegurando un acabado liso y compacto. Se respetaron los tiempos de secado y curado recomendados para obtener las propiedades impermeabilizantes del material.



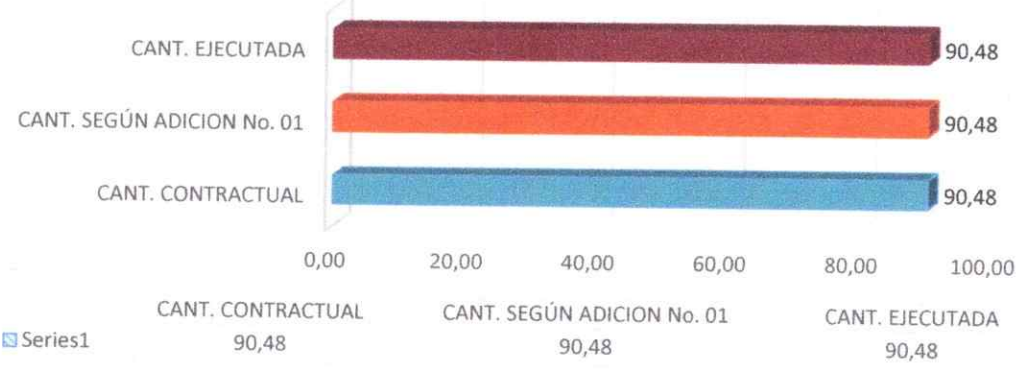


Tabla 27. MORTERO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA MUROS e=1.5CM.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M2	90,48	90,48	90,48	100.00%

3,6 ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA

Luego del fraguado y secado del mortero impermeabilizado, se procedió al enchape de los muros y las placas de fondo con cerámica lisa de dimensiones 20x20 cm, color blanco. Se prepararon las superficies, asegurando su limpieza y nivelación. Se aplicó un adhesivo de alta calidad, siguiendo las instrucciones técnicas, sobre la superficie a enchapar. La cerámica fue colocada cuidadosamente, alineando las piezas y colocando espaciadores para mantener uniformidad en las juntas. Se verificó la nivelación y el correcto asentamiento de cada pieza. Finalmente, se realizó el acabado de las juntas, limpiando el exceso de adhesivo y asegurando un acabado estético y resistente.

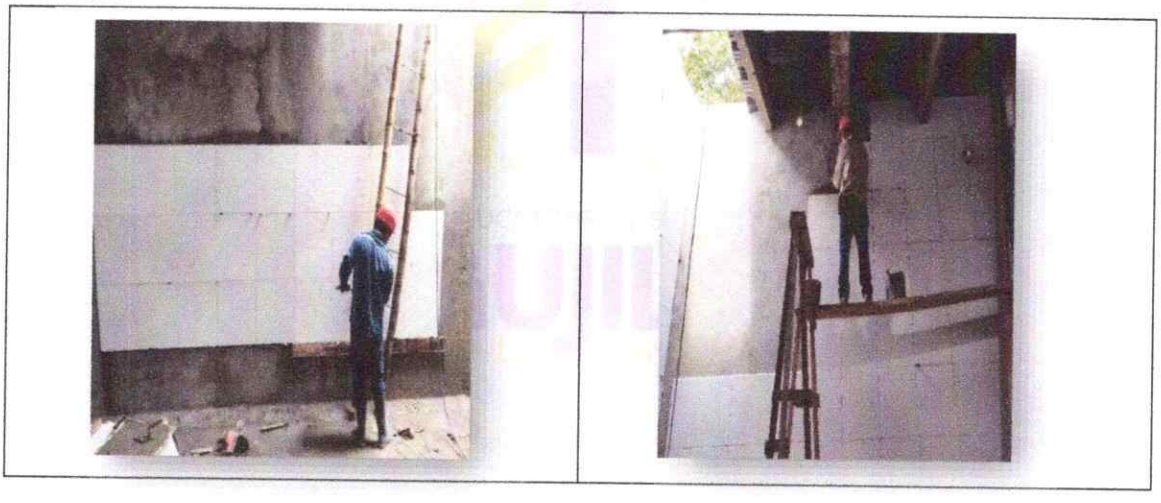




Tabla 28. ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA TIPO LISA 20x20 BLANCA.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M2	117,52	117,52	117,52	100.00%

4 RED DE CONDUCCIÓN Y ACCESORIOS

4,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

Se realizó la localización y replanteo topográfico de la red de conducción siguiendo las coordenadas y esquemas previamente establecidos en los planos de diseño. Primero, se verificó la precisión de las coordenadas mediante la utilización de instrumentos de topografía, como teodolitos y estaciones totales, asegurando la correcta alineación del trazado. Posteriormente, se marcaron en campo los puntos clave, incluyendo las ubicaciones de las tuberías, accesorios y conexiones, mediante estacas y líneas de tiza, garantizando la visibilidad y precisión en la ejecución. Se tomó especial cuidado en definir las pendientes y niveles de acuerdo con los cálculos hidráulicos, asegurando la correcta dirección del flujo de agua. Este proceso permitió establecer claramente los límites de excavación y evitar interferencias con servicios existentes, además de facilitar la posterior ejecución de las actividades de excavación y montaje de la red de conducción.





Tabla 33. LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
ML	813,00	813,00	813,00	100.00%

4,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=3"

Se suministraron y colocaron tuberías de PVC tipo RDE, con capacidad de presión de 21-200 PSI, de diámetro nominal de 3 pulgadas, con conexiones tipo unión platino, idóneas para conducciones de agua potable en sistemas rurales. La instalación inició con el transporte y almacenamiento adecuado de las tuberías, asegurando su protección contra impactos y contaminantes. Posteriormente, se realizó la preparación de las conexiones, verificando que las superficies de unión estuvieran limpias y libres de residuos. La colocación se efectuó mediante excavaciones manuales, respetando las pendientes establecidas, y asegurando la alineación y nivelación de las tuberías. Se conectaron las secciones mediante las uniones platino, aplicando las técnicas recomendadas por el fabricante, garantizando la estanqueidad y resistencia mecánica de las mismas. En cada unión, se verificó la correcta inserción y ajuste, y se realizaron pruebas de presión para detectar posibles fugas. La instalación culminó con la protección de las tuberías mediante rellenos adecuados y compactados, asegurando la durabilidad y funcionamiento óptimo del sistema.



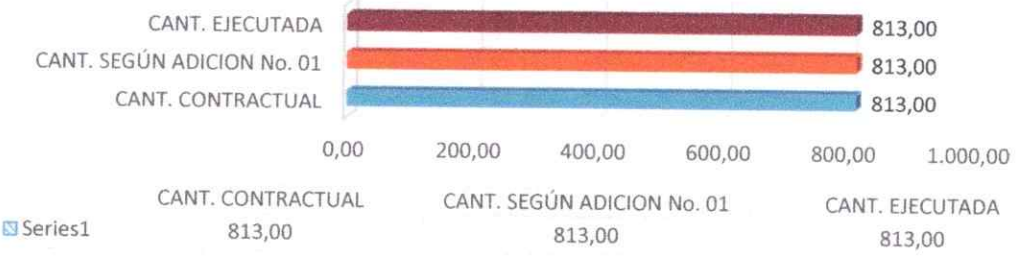


Tabla 34. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=3"

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
ML	813,00	813,00	813,00	100.00%

4,3 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO

La actividad de excavación manual en conglomerado se llevó a cabo mediante técnicas tradicionales, empleando picos, palas, azadones y herramientas similares, con el objetivo de abrir zanjas precisas para la colocación de la tubería. Se seleccionaron los puntos de excavación conforme a los planos topográficos, respetando las pendientes y alineaciones predefinidas. Durante la excavación, se controló la profundidad y la inclinación, garantizando que las zanjas cumplieran con las especificaciones técnicas para la correcta instalación de las tuberías y accesorios. Se removió el material conglomerado en capas, clasificándolo en base a sus características físicas, y se almacenó en zonas designadas para su posible reutilización o disposición final. Se tomó especial cuidado en evitar derrumbes o desplazamientos de las paredes de la excavación, empleando medidas de seguridad adecuadas. La excavación concluyó con la preparación de las zanjas para el posterior relleno y protección de las tuberías, asegurando la estabilidad del trazado y facilitando la manipulación de los elementos a instalar.

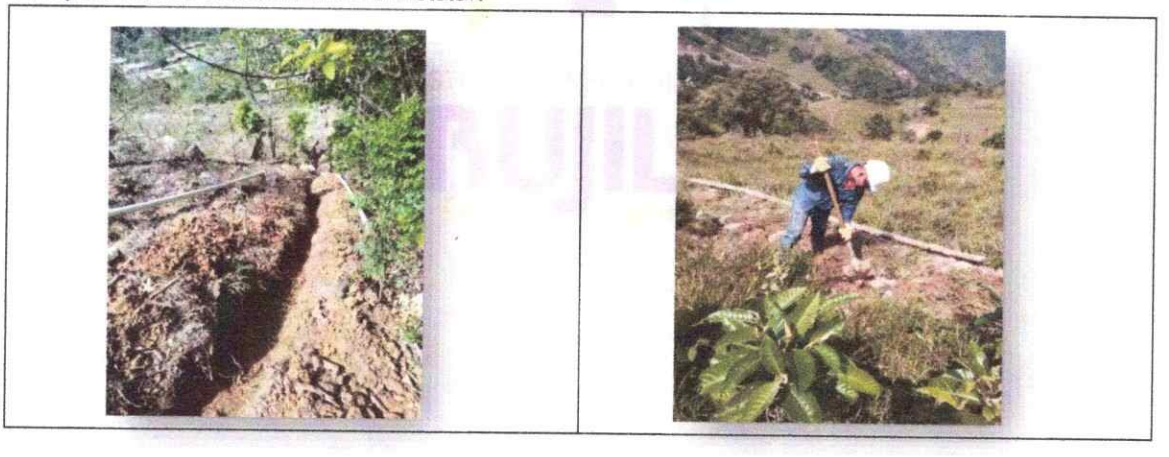




Tabla 35. EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M3	390,24	390,24	390,24	100.00%

4,4 ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)

Se utilizó arena de calidad controlada para la protección de las tuberías, extendiéndola en la base de las zanjas previamente excavadas. La arena fue depositada en capas uniformes, con espesores adecuados, y posteriormente extendida de manera manual o con herramientas ligeras, asegurando una cobertura homogénea en toda la longitud de la tubería. Cada capa fue extendida en un espesor no mayor a 15 cm y compactada cuidadosamente mediante técnicas manuales, como pisones o compactadores manuales, para evitar vacíos y garantizar la protección mecánica. La arena sirvió como elemento amortiguador y protección contra posibles impactos, movimientos o presiones externas que pudieran afectar la integridad de las tuberías. Se verificó que la cobertura de arena cumpliera con los espesores requeridos, asegurando un contacto uniforme y estable que contribuyó a la durabilidad del sistema hidráulico instalado.





Tabla 36. ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M3	243,90	243,90	243,90	100.00%

4,5 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECIONADO DE LA MISMA EXCAVACION

Finalmente, se realizó el relleno y compactación de las zanjas utilizando material seleccionado extraído de la misma excavación, preferentemente tierra fina, libre de restos vegetales, rocas o materiales que pudieran comprometer la estabilidad del sistema. El material fue depositado en capas no mayores a 20 cm, distribuyéndolo de manera uniforme a lo largo de toda la zanja. Cada capa fue compactada manual o mecánicamente, mediante pisones o compactadores portátiles, hasta alcanzar niveles de densidad que garantizaran la resistencia y estabilidad del relleno. Se controló la humedad del material para facilitar la compactación y evitar asentamientos futuros. La compactación se verificó mediante pruebas de proctor o con instrumentos de humedad y densidad, asegurando que el relleno cumpliera con las especificaciones técnicas para un correcto soporte y protección de la tubería. La culminación de esta actividad dejó el sistema de conducción completamente cubierto, estable y preparado para la operación del acueducto.



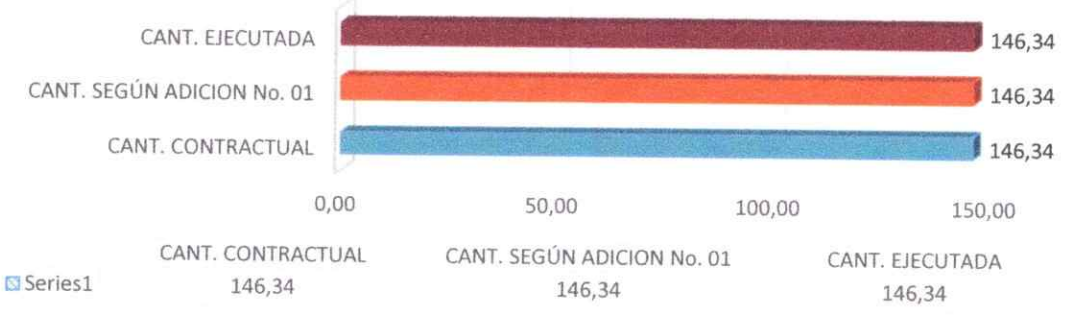


Tabla 37. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECIONADO DE LA MISMA EXCAVACION.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M3	146,34	146,34	146,34	100.00%

5 ÍTEMS NO PREVISTOS (TRANSPORTE MULAR)

5,1 TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS SUPERIORES A 500 M

En esta actividad, se realizó el transporte de materiales, herramientas y pequeños equipos mediante mulas, considerando una carga máxima de 90 kg por unidad. La operación empezó con la planificación del recorrido, seleccionando rutas que evitaran obstáculos y facilitaban el desplazamiento de las mulas. Se verificó el estado de las mulas, asegurando que estuvieran en buenas condiciones físicas y de salud, y se les proporcionó una carga adecuada, distribuyendo el peso de manera uniforme para evitar lesiones o desequilibrios. Se cargaron los materiales en sacos, cajas o directamente sobre la estructura de carga de la mula, usando cuerdas, cinchas o redes de amarre para asegurar que los objetos no se desplazaran durante el traslado. Se verificó la estabilidad de la carga antes de iniciar el recorrido.





Tabla 38. TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS SUPERIORES A 500 M.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
CARGAS	354,18	354,18	354,18	100.00%

5,2 TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS INFERIORES A 500 M

La actividad se desarrolló con el objetivo de garantizar una eficiente transferencia de insumos en zonas de difícil acceso y en distancias inferiores a 500 metros, en condiciones de seguridad, eficiencia y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el diseño y planificación del proyecto. Para ello, se organizaron jornadas de trabajo en las que se emplearon mulas entrenadas y adecuadamente acondicionadas para soportar cargas máximas de 90 kg. La selección de los animales se realizó previa evaluación veterinaria, asegurando que estuvieran en óptimas condiciones físicas y libres de enfermedades que pudieran afectar su rendimiento y bienestar..





Tabla 39. TRANSPORTE MULAR PARA CARGA DE 90 KG MÁXIMO EN RECORRIDOS SUPERIORES A 500 M.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL No. 01	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
CARGAS	**5.589,19**	**5.589,19**	**5.589,19**	**100.00%**

22. CONCLUSIONES

Desde la posición de obra, y tras haber alcanzado un avance físico del 88,41%, podemos concluir de manera satisfactoria que el desarrollo del proyecto ha mantenido una ejecución eficiente y ajustada al cronograma, a pesar de las múltiples afectaciones derivadas de la ola invernal que ha impactado significativamente la región en los últimos meses. La planificación estratégica, sumada a la capacidad técnica del equipo ejecutor, ha permitido la implementación de medidas correctivas y preventivas en tiempo real, lo que evitó retrasos acumulativos en el desarrollo de las actividades programadas.

Es importante destacar que las condiciones climáticas no solo representaron un riesgo potencial para la estabilidad física del terreno y el rendimiento de las actividades, sino también un desafío logístico y operativo. Aun así, se logró mantener una continuidad operativa gracias a la toma oportuna de decisiones como la redistribución de recursos, la priorización de frentes de trabajo, y el uso de técnicas constructivas adaptadas a suelos con alta humedad o en zonas de difícil acceso temporal.

Se establecieron protocolos claros de prevención, evaluación de riesgos y respuesta ante emergencias, los cuales fueron socializados y aplicados en todos los niveles de operación. El cumplimiento estricto de las normas técnicas colombianas y de las disposiciones del Reglamento de Seguridad Industrial ha sido una constante durante toda la ejecución. Este enfoque no solo protegió al personal, sino que también optimizó los tiempos de ejecución al evitar interrupciones imprevistas asociadas a incidentes.

Desde el punto de vista técnico, cada una de las actividades fue ejecutada conforme a los diseños, especificaciones técnicas y metodologías aprobadas, sin contratiempos mayores. La verificación continua por parte de la interventoría y los equipos de calidad permitió asegurar que los trabajos cumplieran con los parámetros exigidos, y que se corrigieran oportunamente las observaciones menores que surgieron, sin repercusiones sobre los plazos ni sobre los costos del contrato.

Cabe resaltar que durante la ola invernal se mantuvo un control riguroso de los accesos, de los materiales almacenados en sitio, y de las condiciones del entorno de trabajo, lo que evitó incidentes que pudieran haber surgido por deslizamientos, inundaciones o colapsos de estructuras temporales. Esto refleja una planeación de obra robusta, con un enfoque preventivo en todos los aspectos críticos del proyecto.

Aprobó:	Elaboró:
DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S** **Representante Legal**	**SHIRLEY PAULIN GARCIA MONTAÑEZ** **MP. 54202 267371 NTS** **RESIDENTE DE OBRA**

ANEXO

SEGURIDAD SOCIAL

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO	CUBARA-BOYACA	3144916416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1153607297	9479417595	E	2025/01/24	2024/12/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$445,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$146,300			$1,170,000	$46,800			$1,170,000		$6,200		$1,170,000	$58,500		$445,000
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 4 (1 Afiliados)																					$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$146,300			$1,170,000	$46,800			$1,170,000		$6,200		$1,170,000	$58,500		$445,000
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$146,300			$1,170,000	$46,800			$1,170,000		$6,200		$1,170,000	$58,500		$445,000
1	CC	63544298	FUENTES MOJICA DIANA CAROLINA			X														23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$146,300	CCF10	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	0.522%	$6,200	27	$1,170,000	$58,500	No	$445,000
Total Afiliados(1)																					$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$146,300			$1,170,000	$46,800			$1,170,000		$6,200		$1,170,000	$58,500		$445,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO	CUBARA-BOYACA	3144916416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1153607297	9479417595	E	2025/01/24	2024/12/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$445,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$187,200	$0	$0	$187,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$187,200	$0	$0	$187,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,200	$0	$0	$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,200	$0	$0	$6,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,800	$0	$0	$46,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$46,800	$0	$0	$46,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$146,300	$0	$0	$146,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$146,300	$0	$0	$146,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$35,100	$0	$0	$35,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,400	$0	$0	$23,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,400	$0	$0	$23,400
TOTAL				1	$445,000	$0	$0	$445,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO	CUBARA-BOYACA	3144916416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1307040636	9482577895	E	2025/02/24	2025/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	$636,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
1	CC 63544298	FUENTES MOJICA DIANA CAROLINA	X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO	CUBARA-BOYACA	3144916416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1307040636	9482577895	E	2025/02/24	2025/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	7	$636,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,100	$0	$228,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$500	$0	$99,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$500	$0	$99,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$900	$0	$178,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$900	$0	$178,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$200	$0	$43,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$200	$0	$43,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$200	$0	$28,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$200	$0	$28,700
TOTAL				1	$633,200	$3,200	$0	$636,400

2025/03/03 10:16 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO	CUBARA-BOYACA	3144916416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1307056760	9482578114	E	2025/03/25	2025/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$633,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
1	CC 6354298	FUENTES MOJICA DIANA CAROLINA		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO	CUBARA-BOYACA	3144916416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1307056760	9482578114	E	2025/03/25	2025/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$633,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$633,200	$0	$0	$633,200

2025/03/03 10:18 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO	CUBARA-BOYACA	3144916416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1307070252	9482578225	E	2025/04/24	2025/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$633,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
1 CC	63544298	FUENTES MOJICA DIANA CAROLINA		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO	CUBARA-BOYACA	3144916416	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1307070252	9482578225	E	2025/04/24	2025/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$633,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$633,200	$0	$0	$633,200

2025/03/03 10:19 AM

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	A	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-104	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO		3115894460			OFITRUJILLODELAFUENTE@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33363746	E	2025-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	445.200	4.300	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33363746	2025-05-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total
1	CC 63544298	FUENTES MOJICA DIANA CAROLINA	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	440.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	A	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-104	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO		3115894460			OFITRUJILLODELAFUENTE@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-04	2025-05	33363746	E	2025-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	445.200	4.300	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33363746	2025-05-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	2.100	0	229.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	2.100	0	229.900
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	600	0	57.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	600	0	57.600
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	1.000	0	100.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	1.000	0	100.100
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	600	0	57.600
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	57.000	0	600	0	57.600
Gran Total					440.900	0	4.300	0	445.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	A	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-104	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO		3115894460			OFITRUJILLODELAFUENTE@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33685184	E	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33685184	2025-06-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 63544298	FUENTES MOJICA DIANA CAROLINA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFABOY-CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901878498	0	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	A	001	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-104	CR 5 # 7 - 40 BRR EL PROGRESO		3115894460			OFITRUJILLODELAFUENTE@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33685184	E	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	440.900	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33685184	2025-06-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	1.423.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				1	99.100	0	0	0	99.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	99.100	0	0	0	99.100
CCF(Administradoras: 1)				1	57.000	0	0	0	57.000
COMFABOY	CCF10	891800213	8	1	57.000	0	0	0	57.000
Gran Total					440.900	0	0	0	440.900

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33644600
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901878498	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 5 7 - 40 BRR EL PROGRESO	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	BOYACA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	OFITRUJILLODELAFUENTE@GMAIL.COM	TELÉFONO	3115894460
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	CUBUGON
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63544298	PRIMER APELLIDO	FUENTES	SEGUNDO APELLIDO	MOJICA
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO NOMBRE	CAROLINA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$11.596.581		33644600

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1063718008	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	ANAYA DELGADO CRISTIAN CAMILO	$2.172.840
CC-88255608	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	BORRERO MERCHAN HENRY	$3.000.000
CC-1115723027	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	DUARTE VEGA FABIAN FRANCISCO	$2.918.010
CC-1090393926	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	GARCIA MONTAÑEZ SHIRLEY PAULIN	$3.000.000
CC-1094274321	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	GARCIA VALENCIA JOSE LUIS	$2.918.010
CC-9466558	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	JURADO ANGARITA RIGOBERTO	$2.172.840
CC-1049396161	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MENDOZA QUIÑONEZ JHON ARVEY	$2.172.840
CC-1002300191	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MENDOZA VALENCIA EMERSON	$2.172.840
CC-1090252037	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MENDOZA VALENCIA YEFERSON	$2.172.840
CC-33516401	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MENDOZA VERA LIGIA AMPARO	$2.172.840
CC-1115744319	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PARADA VILLAMIZAR EMERSON ARBEY	$2.172.840
CC-1049393107	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PEÑA CASTELLANOS VICTOR FERNANDO	$2.918.010
CC-1091059636	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	QUIÑONES VILLAMIZAR ADELSO	$2.172.840
CC-33516019	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	QUIÑONEZ VILLAMIZAR AURORA	$2.172.840
CC-1090252090	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	REYES VALENCIA JAIME ALBERTO	$2.172.840
CC-1193509740	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	VALENCIA MORENO FIGER ALDAIR	$2.172.840

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1063718008			X	2025-04-01																									0		
CC - 1063718008	X	2025-04-23																											0		
CC - 88255608			X	2025-04-01																									0		
CC - 88255608	X	2025-04-23																											0		
CC - 1115723027			X	2025-04-01																									0		
CC - 1115723027	X	2025-04-23																											0		
CC - 1090393926			X	2025-04-01																									0		
CC - 1090393926	X	2025-04-23																											0		
CC - 1094274321			X	2025-04-01																									0		
CC - 1094274321	X	2025-04-23																											0		
CC - 9466558			X	2025-04-01																									0		
CC - 9466558	X	2025-04-23																											0		
CC - 1049396161			X	2025-04-01																									0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1049396161	X	2025-04-23																											0		
CC - 1002300191			X	2025-04-01																									0		
CC - 1002300191	X	2025-04-23																											0		
CC - 1090252037			X	2025-04-01																									0		
CC - 1090252037	X	2025-04-23																											0		
CC - 33516401			X	2025-04-01																									0		
CC - 33516401	X	2025-04-23																											0		
CC - 1115744319			X	2025-04-01																									0		
CC - 1115744319	X	2025-04-23																											0		
CC - 1049393107			X	2025-04-01																									0		
CC - 1049393107	X	2025-04-23																											0		
CC - 1091059636			X	2025-04-01																									0		
CC - 1091059636	X	2025-04-23																											0		
CC - 33516019			X	2025-04-01																									0		
CC - 33516019	X	2025-04-23																											0		
CC - 1090252090			X	2025-04-01																									0		
CC - 1090252090	X	2025-04-23																											0		
CC - 1193509740			X	2025-04-01																									0		
CC - 1193509740	X	2025-04-23																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1063718008	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1063718008	PORVENIR	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 88255608	PORVENIR	1	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
CC - 88255608	PORVENIR	8	$800.000	0.1600000	$128.000	$0	$0	$128.000	$0	$0	$0
CC - 1115723027	PORVENIR	1	$97.267	0.1600000	$15.600	$0	$0	$15.600	$0	$0	$0
CC - 1115723027	PORVENIR	8	$778.136	0.1600000	$124.600	$0	$0	$124.600	$0	$0	$0
CC - 1090393926	PORVENIR	1	$100.000	0.1600000	$16.000	$0	$0	$16.000	$0	$0	$0
CC - 1090393926	PORVENIR	8	$800.000	0.1600000	$128.000	$0	$0	$128.000	$0	$0	$0
CC - 1094274321	PORVENIR	1	$97.267	0.1600000	$15.600	$0	$0	$15.600	$0	$0	$0
CC - 1094274321	PORVENIR	8	$778.136	0.1600000	$124.600	$0	$0	$124.600	$0	$0	$0
CC - 9466558	COLPENSIONES	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9466558	COLPENSIONES	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1049396161	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1049396161	PORVENIR	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1002300191	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1002300191	PORVENIR	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1090252037	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1090252037	PORVENIR	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 33516401	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 33516401	PORVENIR	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1115744319	COLPENSIONES	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1115744319	COLPENSIONES	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1049393107	PORVENIR	1	$97.267	0.1600000	$15.600	$0	$0	$15.600	$0	$0	$0
CC - 1049393107	PORVENIR	8	$778.136	0.1600000	$124.600	$0	$0	$124.600	$0	$0	$0
CC - 1091059636	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1091059636	PORVENIR	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 33516019	COLPENSIONES	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 33516019	COLPENSIONES	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1090252090	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1090252090	PORVENIR	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0
CC - 1193509740	PROTECCION	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1193509740	PROTECCION	8	$579.424	0.1600000	$92.800	$0	$0	$92.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1063718008	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1063718008	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400
CC - 88255608	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	1	$100.000	4	0.0696000	$7.000
CC - 88255608	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$800.000	0.0400000	$32.000	$0	0	$0	0	$0	8	$800.000	4	0.0696000	$55.700
CC - 1115723027	EPS-S COOSALUD	1	$97.267	0.0400000	$3.900	$0	0	$0	0	$0	1	$97.267	1	0.0696000	$6.800

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1115723027	EPS-S COOSALUD	8	$778.136	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	8	$778.136	1	0.0696000	$54.200
CC - 1090393926	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$100.000	0.0400000	$4.000	$0	0	$0	0	$0	1	$100.000	4	0.0696000	$7.000
CC - 1090393926	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$800.000	0.0400000	$32.000	$0	0	$0	0	$0	8	$800.000	4	0.0696000	$55.700
CC - 1094274321	COMFAORIENTE	1	$97.267	0.0400000	$3.900	$0	0	$0	0	$0	1	$97.267	3	0.0696000	$6.800
CC - 1094274321	COMFAORIENTE	8	$778.136	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	8	$778.136	3	0.0696000	$54.200
CC - 9466558	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	3	0.0696000	$5.100
CC - 9466558	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	3	0.0696000	$40.400
CC - 1049396161	EPS-S COOSALUD	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1049396161	EPS-S COOSALUD	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400
CC - 1002300191	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1002300191	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400
CC - 1090252037	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1090252037	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400
CC - 33516401	EPS-S COOSALUD	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 33516401	EPS-S COOSALUD	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400
CC - 1115744319	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1115744319	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400
CC - 1049393107	EPS-S COOSALUD	1	$97.267	0.0400000	$3.900	$0	0	$0	0	$0	1	$97.267	3	0.0696000	$6.800
CC - 1049393107	EPS-S COOSALUD	8	$778.136	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	8	$778.136	3	0.0696000	$54.200
CC - 1091059636	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1091059636	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400
CC - 33516019	EPS-S COOSALUD	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 33516019	EPS-S COOSALUD	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400
CC - 1090252090	EPS-S COOSALUD	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1090252090	EPS-S COOSALUD	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1193509740	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1193509740	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$579.424	0.0400000	$23.200	$0	0	$0	0	$0	8	$579.424	2	0.0696000	$40.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1063718008	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1063718008	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88255608	COMFABOY	1	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88255608	COMFABOY	8	$800.000	0.0400000	$32.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115723027	COMFABOY	1	$97.267	0.0400000	$3.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115723027	COMFABOY	8	$778.136	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090393926	COMFABOY	1	$100.000	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090393926	COMFABOY	8	$800.000	0.0400000	$32.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094274321	COMFABOY	1	$97.267	0.0400000	$3.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094274321	COMFABOY	8	$778.136	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466558	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466558	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049396161	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049396161	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002300191	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002300191	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090252037	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090252037	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-33516401	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-33516401	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115744319	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115744319	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049393107	COMFABOY	1	$97.267	0.0400000	$3.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049393107	COMFABOY	8	$778.136	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091059636	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091059636	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-33516019	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-33516019	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090252090	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090252090	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193509740	COMFABOY	1	$72.428	0.0400000	$2.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193509740	COMFABOY	8	$579.424	0.0400000	$23.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	12	$1.439.400	$0	$0	$0	$0	12	$11.300	$0	$0	$1.450.700
COLPENSIONES	3	$313.200	$0	$0	$0	$0	12	$2.500	$0	$0	$315.700
PROTECCION	1	$104.400	$0	$0	$0	$0	12	$900	$0	$0	$105.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$176.400	$0	0	$0	0	$0	$176.400	12	$1.400	$0	$177.800	$0	0	$0	$0	$177.800	$0	$0	$177.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$78.300	$0	0	$0	0	$0	$78.300	12	$700	$0	$79.000	$0	0	$0	$0	$79.000	$0	$0	$79.000
EPS-S COOSALUD	6	$174.600	$0	0	$0	0	$0	$174.600	12	$1.400	$0	$176.000	$0	0	$0	$0	$176.000	$0	$0	$176.000
COMFAORIENTE	1	$35.100	$0	0	$0	0	$0	$35.100	12	$300	$0	$35.400	$0	0	$0	$0	$35.400	$0	$0	$35.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	16	$808.900	0	$0	$0	$808.900	12	$6.400	$815.300	0	$0	$0	$815.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	16	$464.400	12	$3.700	$468.100
SENA	0	$0	12	$0	$0
ICBF	0	$0	12	$0	$0
ESAP	0	$0	12	$0	$0
MinEdu	0	$0	12	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$468.200
PENSIONES	3	$1.871.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$815.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$468.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.623.300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33658261
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901878498	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 5 7 - 40 BRR EL PROGRESO	DEPARTAMENTO	BOYACA	MUNICIPIO	BOYACA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	OFITRUJILLODELAFUENTE@GMAIL.COM	TELÉFONO	3115894460
FAX	0	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	CUBUGON
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63544298	PRIMER APELLIDO	FUENTES	SEGUNDO APELLIDO	MOJICA
PRIMER NOMBRE	DIANA	SEGUNDO NOMBRE	CAROLINA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
16		$26.714.293		33658261

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1063718008	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	ANAYA DELGADO CRISTIAN CAMILO	$2.172.840
CC-88255608	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	BORRERO MERCHAN HENRY	$3.000.000
CC-1115723027	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	DUARTE VEGA FABIAN FRANCISCO	$2.918.010
CC-1090393926	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	GARCIA MONTAÑEZ SHIRLEY PAULIN	$3.000.000
CC-1094274321	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	GARCIA VALENCIA JOSE LUIS	$2.918.010
CC-9466558	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	JURADO ANGARITA RIGOBERTO	$2.172.840
CC-1049396161	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MENDOZA QUIÑONEZ JHON ARVEY	$2.172.840
CC-1002300191	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MENDOZA VALENCIA EMERSON	$2.172.840
CC-1090252037	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MENDOZA VALENCIA YEFERSON	$2.172.840
CC-33516401	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	MENDOZA VERA LIGIA AMPARO	$2.172.840
CC-1115744319	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PARADA VILLAMIZAR EMERSON ARBEY	$2.172.840
CC-1049393107	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	PEÑA CASTELLANOS VICTOR FERNANDO	$2.918.010
CC-1091059636	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	QUIÑONES VILLAMIZAR ADELSO	$2.172.840
CC-33516019	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	QUIÑONEZ VILLAMIZAR AURORA	$2.172.840
CC-1090252090	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	REYES VALENCIA JAIME ALBERTO	$2.172.840
CC-1193509740	01	No	No	No	15	223	5422001	Fijo	VALENCIA MORENO FIGER ALDAIR	$2.172.840

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1063718008			X	2025-05-01																									0		
CC - 88255608			X	2025-05-30																									0		
CC - 1115723027			X	2025-05-30																									0		
CC - 1090393926			X	2025-05-30																									0		
CC - 1094274321			X	2025-05-01																									0		
CC - 9466558			X	2025-05-30																									0		
CC - 1049396161			X	2025-05-01																									0		
CC - 1002300191			X	2025-05-30																									0		
CC - 1090252037			X	2025-05-30																									0		
CC - 33516401			X	2025-05-01																									0		
CC - 1115744319			X	2025-05-01																									0		
CC - 1049393107			X	2025-05-30																									0		
CC - 1091059636			X	2025-05-30																									0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 33516019			X	2025-05-30																									0		
CC - 1090252090			X	2025-05-01																									0		
CC - 1193509740			X	2025-05-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1063718008	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 88255608	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1115723027	PORVENIR	30	$2.918.010	0.1600000	$466.900	$0	$0	$466.900	$0	$0	$0
CC - 1090393926	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1094274321	PORVENIR	1	$97.267	0.1600000	$15.600	$0	$0	$15.600	$0	$0	$0
CC - 9466558	COLPENSIONES	30	$2.172.840	0.1600000	$347.700	$0	$0	$347.700	$0	$0	$0
CC - 1049396161	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1002300191	PORVENIR	30	$2.172.840	0.1600000	$347.700	$0	$0	$347.700	$0	$0	$0
CC - 1090252037	PORVENIR	30	$2.172.840	0.1600000	$347.700	$0	$0	$347.700	$0	$0	$0
CC - 33516401	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1115744319	COLPENSIONES	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1049393107	PORVENIR	30	$2.918.010	0.1600000	$466.900	$0	$0	$466.900	$0	$0	$0
CC - 1091059636	PORVENIR	30	$2.172.840	0.1600000	$347.700	$0	$0	$347.700	$0	$0	$0
CC - 33516019	COLPENSIONES	30	$2.172.840	0.1600000	$347.700	$0	$0	$347.700	$0	$0	$0
CC - 1090252090	PORVENIR	1	$72.428	0.1600000	$11.600	$0	$0	$11.600	$0	$0	$0
CC - 1193509740	PROTECCION	30	$2.172.840	0.1600000	$347.700	$0	$0	$347.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1063718008	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 88255608	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	4	0.0696000	$208.800
CC - 1115723027	EPS-S COOSALUD	30	$2.918.010	0.0400000	$116.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.918.010	1	0.0696000	$203.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1090393926	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	4	0.0696000	$208.800
CC - 1094274321	COMFAORIENTE	1	$97.267	0.0400000	$3.900	$0	0	$0	0	$0	1	$97.267	3	0.0696000	$6.800
CC - 9466558	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.172.840	0.0400000	$87.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.172.840	3	0.0696000	$151.300
CC - 1049396161	EPS-S COOSALUD	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1002300191	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$2.172.840	0.0400000	$87.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.172.840	2	0.0696000	$151.300
CC - 1090252037	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$2.172.840	0.0400000	$87.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.172.840	2	0.0696000	$151.300
CC - 33516401	EPS-S COOSALUD	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1115744319	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1049393107	EPS-S COOSALUD	30	$2.918.010	0.0400000	$116.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.918.010	3	0.0696000	$203.100
CC - 1091059636	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.172.840	0.0400000	$87.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.172.840	2	0.0696000	$151.300
CC - 33516019	EPS-S COOSALUD	30	$2.172.840	0.0400000	$87.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.172.840	2	0.0696000	$151.300
CC - 1090252090	EPS-S COOSALUD	1	$72.428	0.0400000	$2.900	$0	0	$0	0	$0	1	$72.428	2	0.0696000	$5.100
CC - 1193509740	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.172.840	0.0400000	$87.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.172.840	2	0.0696000	$151.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1063718008	COMFABOY	1	$99.589	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88255608	COMFABOY	30	$3.158.333	0.0400000	$126.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115723027	COMFABOY	30	$3.072.016	0.0400000	$122.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090393926	COMFABOY	30	$3.158.333	0.0400000	$126.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094274321	COMFABOY	1	$133.742	0.0400000	$5.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9466558	COMFABOY	30	$2.287.518	0.0400000	$91.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049396161	COMFABOY	1	$99.589	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1002300191	COMFABOY	30	$2.287.518	0.0400000	$91.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090252037	COMFABOY	30	$2.184.318	0.0400000	$87.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-33516401	COMFABOY	1	$99.589	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1115744319	COMFABOY	1	$99.589	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049393107	COMFABOY	30	$3.072.016	0.0400000	$122.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091059636	COMFABOY	30	$2.287.518	0.0400000	$91.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-33516019	COMFABOY	30	$2.287.518	0.0400000	$91.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090252090	COMFABOY	1	$99.589	0.0400000	$4.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1193509740	COMFABOY	30	$2.287.518	0.0400000	$91.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$347.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$347.700
PORVENIR	12	$2.998.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.998.900
COLPENSIONES	3	$707.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$707.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	6	$329.300	$0	0	$0	0	$0	$329.300	0	$0	$0	$329.300	$0	0	$0	$0	$329.300	$0	$0	$329.300
COMFAORIENTE	1	$3.900	$0	0	$0	0	$0	$3.900	0	$0	$0	$3.900	$0	0	$0	$0	$3.900	$0	$0	$3.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$503.900	$0	0	$0	0	$0	$503.900	0	$0	$0	$503.900	$0	0	$0	$0	$503.900	$0	$0	$503.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$176.900	$0	0	$0	0	$0	$176.900	0	$0	$0	$176.900	$0	0	$0	$0	$176.900	$0	$0	$176.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	16	$1.763.900	0	$0	$0	$1.763.900	0	$0	$1.763.900	0	$0	$0	$1.763.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFABOY	16	$1.069.400	0	$0	$1.069.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.014.000
PENSIONES	3	$4.053.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.763.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.069.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	$7.900.900

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUZ STELLA SOSA MOJICA identificado(a) con CC 1013590049 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SOSA MOJICA LUZ STELLA CC 1013590049

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-04	2025-04	1000000181	9485558178	I	2025-05-02		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,423,500	$227,800
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,423,500	$99,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	12.5%	$1,423,500	$178,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-03	1000000188	9485558142	I	2025-05-02	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	21	16%	$996,450	$159,500
ARL	ARL SURA	21	6.96%	$996,450	$69,400
EPS	NUEVA E.P.S.	21	12.5%	$996,450	$124,600

Este certificado se expide el día 2025-06-05 a las 10:49.
