FECHA DE LA ASISTENCIA: **06/12/2024**

INFORMACIÓN GENERAL

Medio de Asistencia Técnica:

☒Campo ☐Virtual ☐Oficina

DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE BRINDA LA ASISTENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN O AREA RESPONSABLE: DIRECTOR DE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

FUNCIONARIO O CONTRATISTA FACILITADOR

Nombres y apellidos: Carlos Alberdi Velásquez	Cargo: Director de Seguridad y Orden Público-Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Correo electrónico institucional: carlos.velasquez@cundinamarca.gov.co	Teléfono: 3152037371

DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO (Solicitante o uno de los beneficiarios)

SECRETARIA DE GOBIERNO DE CUNDINARMARCA- CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL SERVICIO DEL MENOR INFRACTOR DE LA LEY PENAL (CAE)".

Nombre del beneficiario: CAE Girardot-Cundinamarca	Correo electrónico:

Municipio donde se realizó la Asistencia Técnica: Girardot - Cundinamarca

Número total de beneficiarios: 1

TEMA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Interventoria bajo la dirección de la supervisión del Dr. Carlos Velásquez del contrato SGO-CPS-431-2024 denominado "mantenimiento, aseo general y adecuaciones necesarias a las instalaciones del Centro de Atención especializada al servicio del menor infractor de la ley penal (CAE)".

OBJETIVO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

- Visita de inspección ocular a las instalaciones del centro de atención especializada, para verificar el inicio de obra, reconocimiento del área y sus respectivos avances de ítem.
- Recomendaciones de seguridad y rendimiento de actividades por parte de la supervisión para el cumplimiento idóneo de la ejecución de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo al contrato en referencia se evidencia el inicio de obra el día 04/12/2024 de los siguientes ITEM:

PRELIMINARES:

1.1 desmonte y limpieza en zona no boscosa, incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km, **PERIMETRO.**
1.2 desmonte y limpieza en zona no boscosa, incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km, **ZONA INTERNA.**
1.3 tala y desenraice de árboles existente H=2 a 10 M (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 10 KM.

ASEO:

2.2 lavado de andenes y **placas** (Hidrolavadora) Guardia.
2.18 limpieza de canales y bajantes incluye retiro de corteza vegetal.

PINTURA:

3.2 vinilo sobre pañete 2 manos (guardia).
3.3 vinilo sobre pañete 2 manos (administración).
3.14 estuco.

CUBIERTAS:

5.4 demolición cielo raso falso.
5.5 cielo raso plano drywall (incluye pintura).

CARPINTERIA METALICA:


8.1 mantenimiento de ventanearía proyectante en aluminio, desmonte, cambio de brazos escualizables y armado.
8.3 desmonte y ajustes de puertas en aluminio.


CONCERTINA:

11.1 concertina importada tipo rizzor de 0,45 M de diámetro en lámina de acero inoxidable endurecido en espirales con grupo de cuatro cuchillas separación de 100 MM entre si las cuales miden 60 MM y espirales espaciados cada 24 cm y soporte en doble cable de acero galvanizado amarrado a la concertina, con soportes cada 2,5 metros en ángulo de 1 1/2" x 1/8", alturas de

ASEO: LAVADO



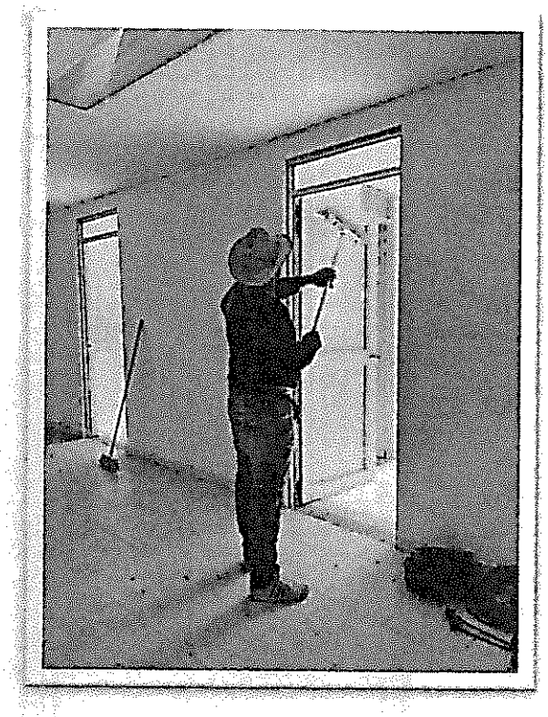


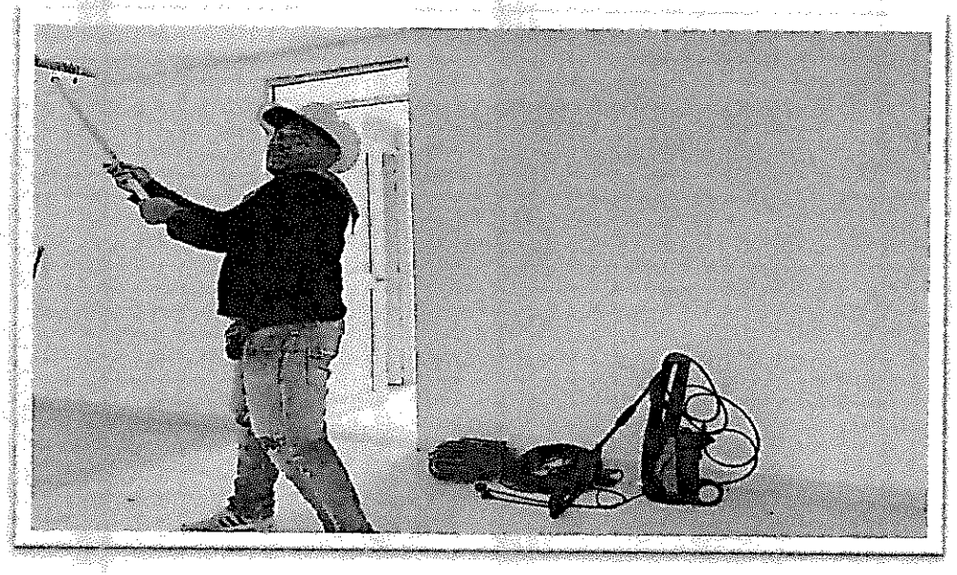



cada soporte ,45 M. pintado con pintura acrílica al polisiloxano color gris. anclado al muro con chazo expansivo 1/4 x 3/8 P.

REGISTRO FOTOGRAFICO


PRELIMINARES:

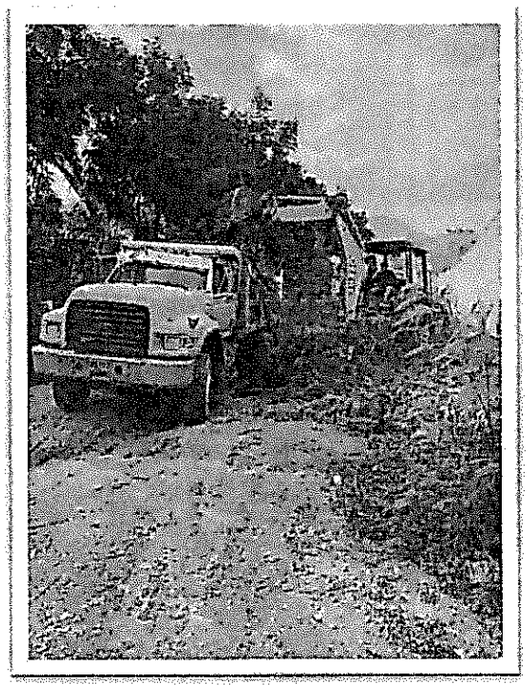


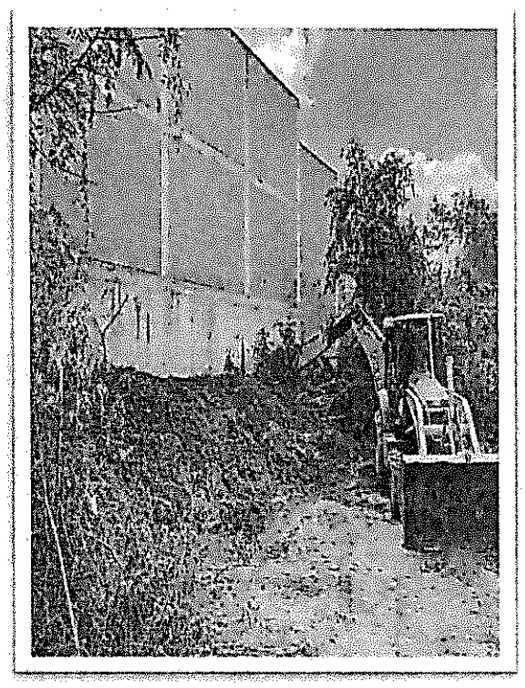


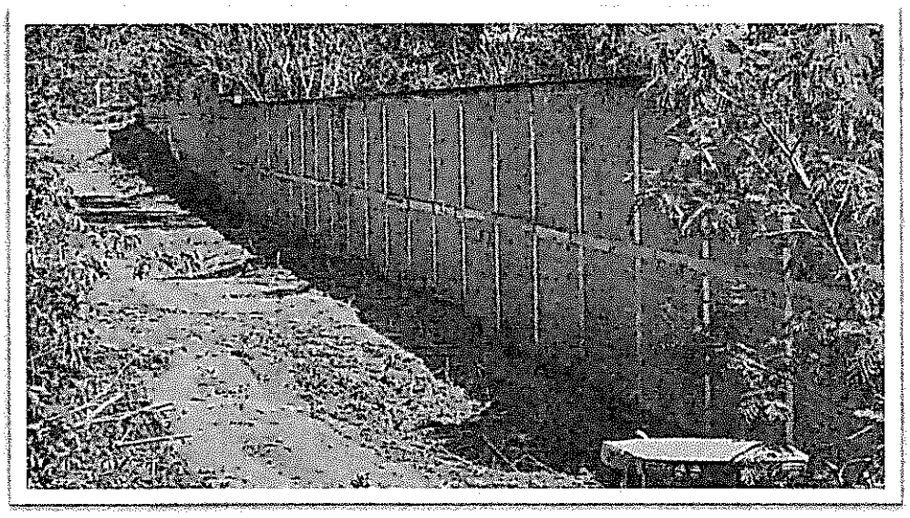


PINTURA:

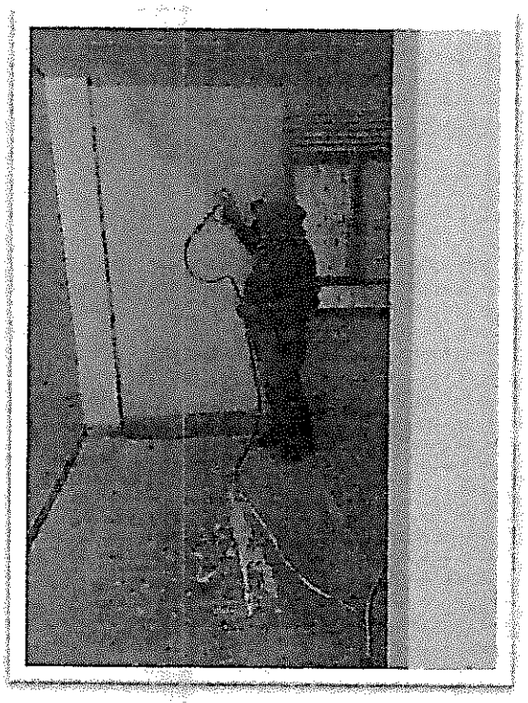


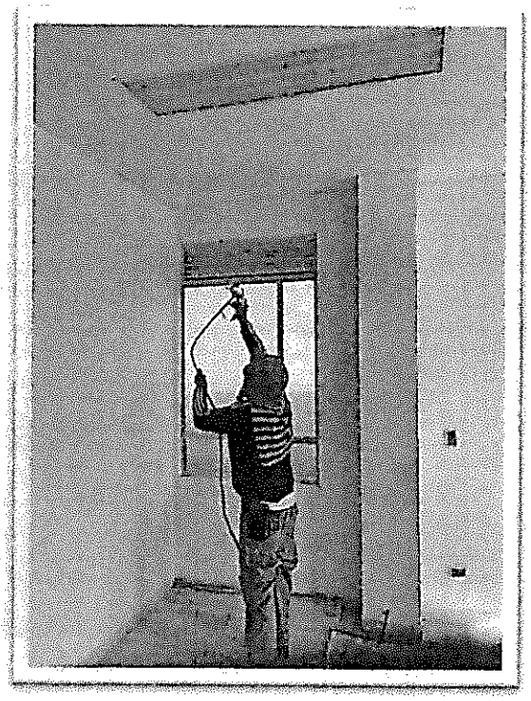


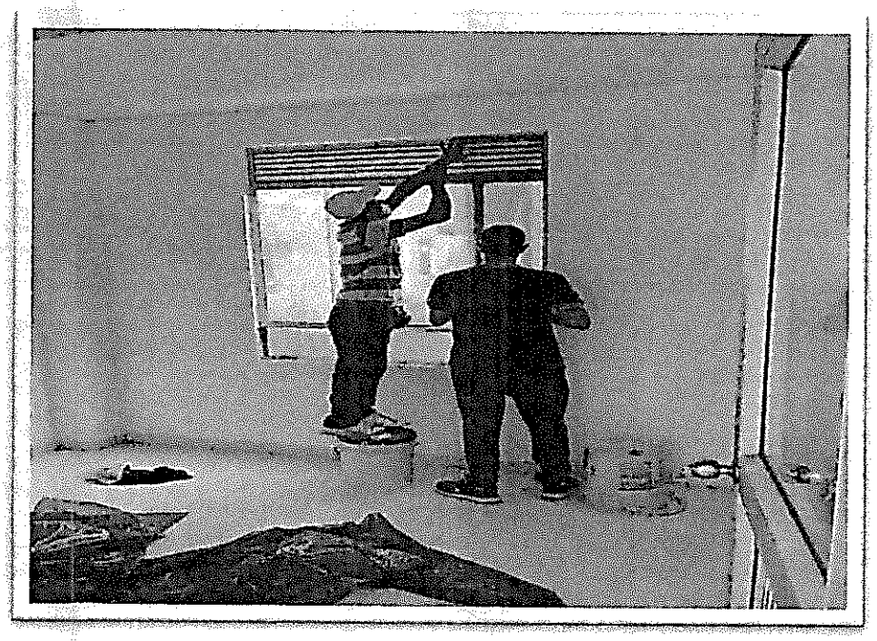


ASEO: CANALES Y BAJANTES

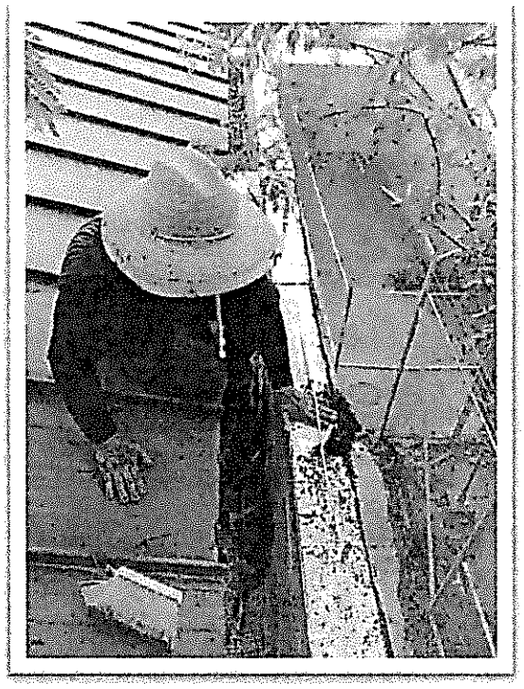


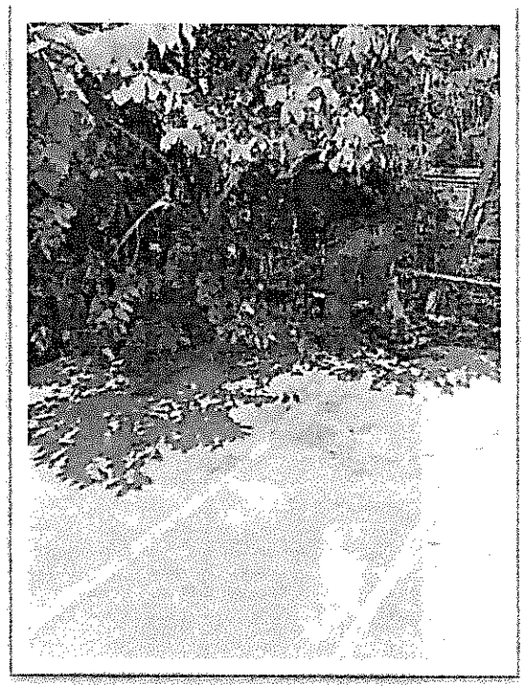


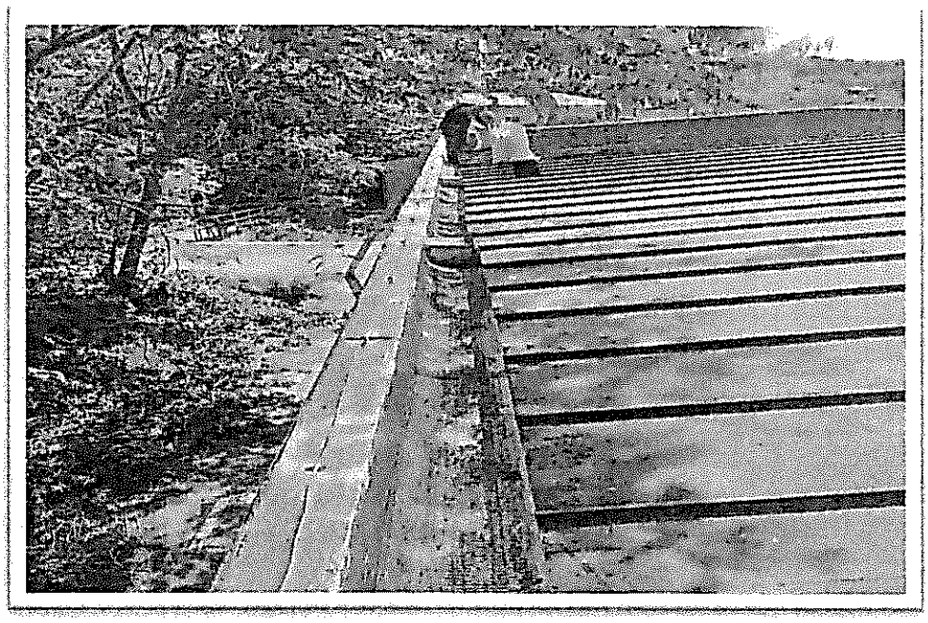

CARPINTERIA METALICA:

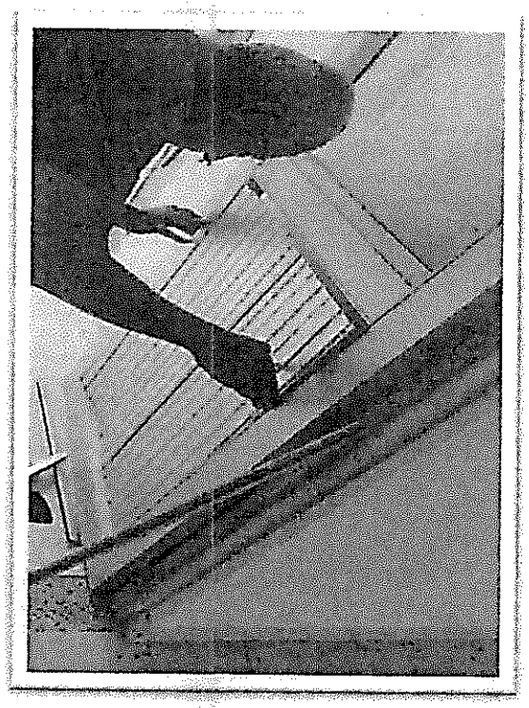


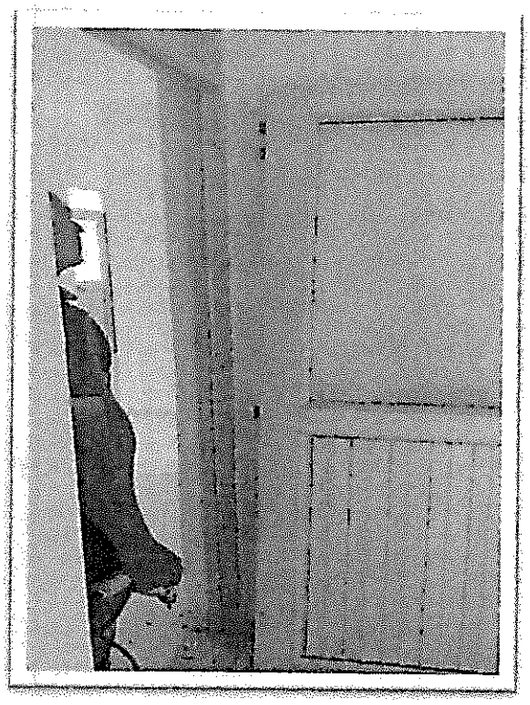


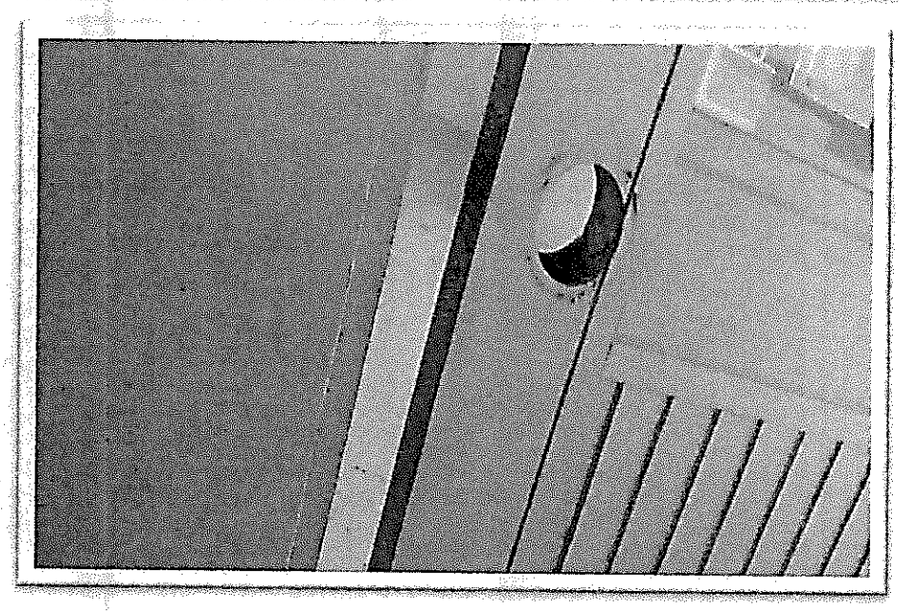


CUBIERTAS:




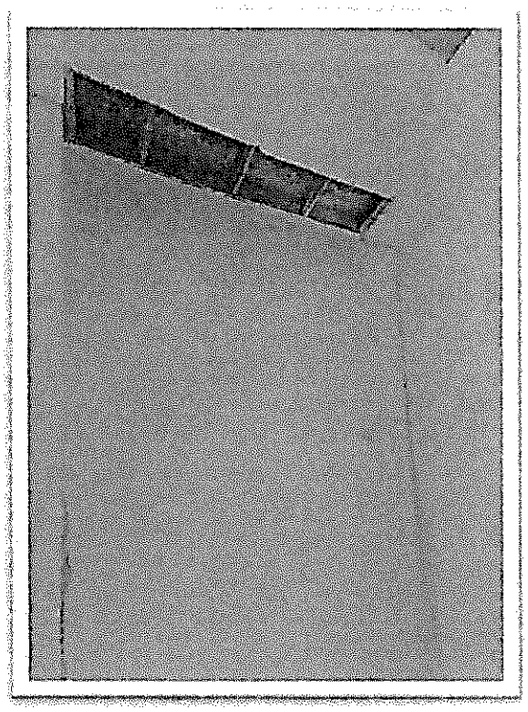

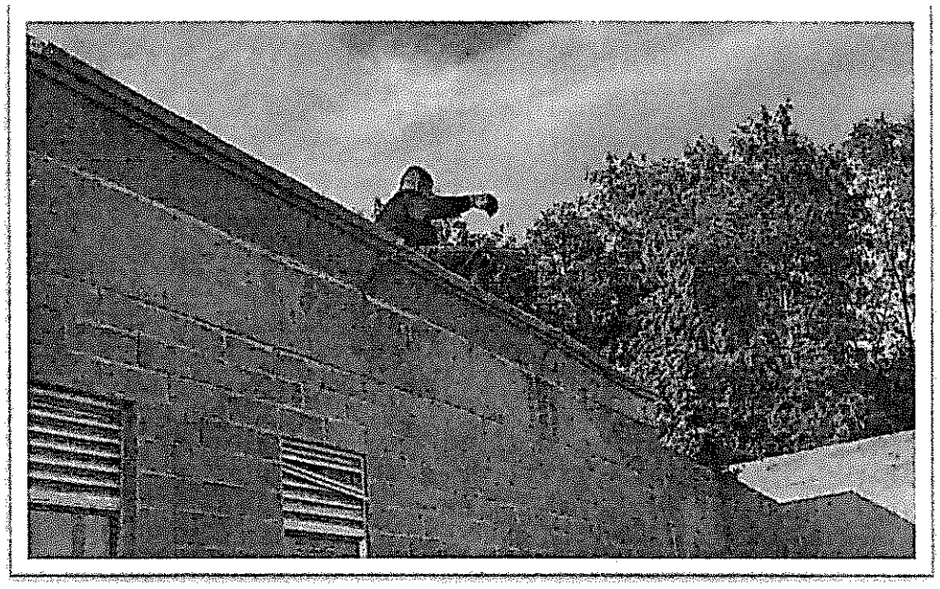

CONCERTINA:

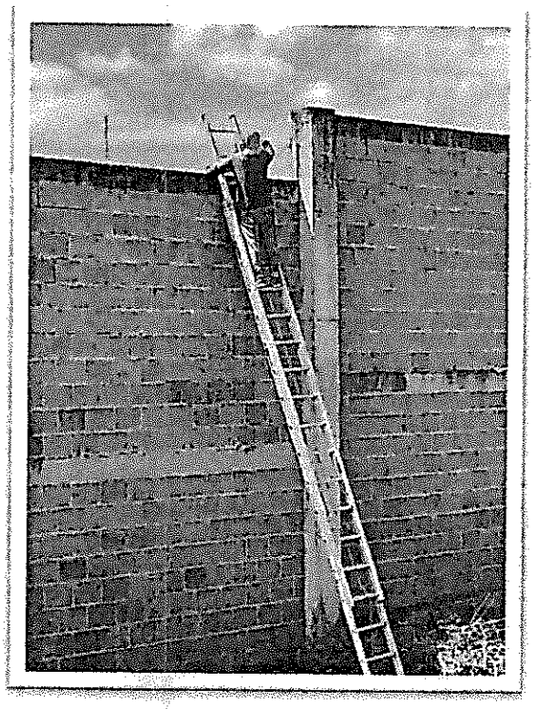

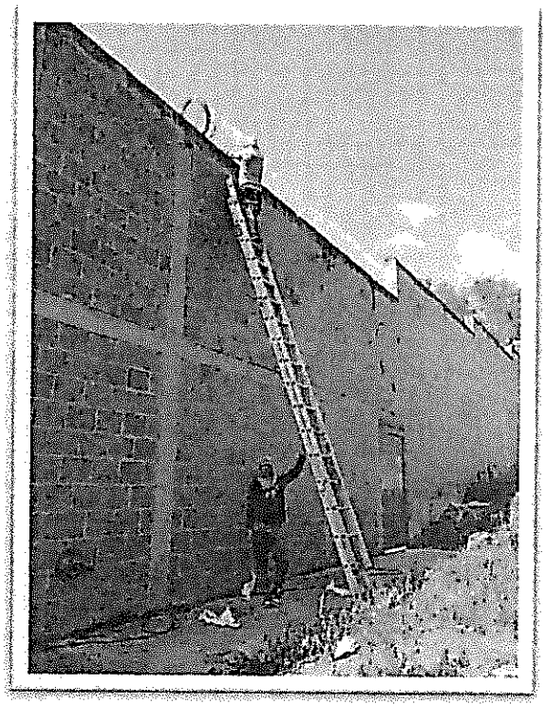

CONCLUSIONES

Se cumplió con el objetivo de la Asistencia Técnica: ☒SI ☐NO

Observaciones: Se contemplan las observaciones del Director de Seguridad y Orden Público de la Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana Dr. Carlos Velásquez, se socializa el inicio de obra con el contratista, observando actividades para ejecutar teniendo en cuenta el cronograma de trabajo presentado por el mismo, revisión de personal para ejecución de obras con buena asistencia in situ, maquinaria idónea y suficiente para las tareas asignadas.

