Valle del Guamuez, Putumayo, 04 de Junio del 2025.

Recibido
4/06/25
Mario Ojeda

ING.
HERNANDO BLADIMIR CABRERA O.
Secretario De Planeación Y Obras Públicas
Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo
Supervisor

REFERENCIA: Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 del 08 de mayo del 2025, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA MIRAVALLE MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.

ASUNTO: Solicitud de Prorroga en tiempo y proyección del Otro Si No. 1 necesarios para solucionar los inconvenientes presentados en la ejecución del presente contrato de la referencia.

Cordial Saludo:

Yo **RICARDO ROMERO LOPEZ,** en mi calidad de representante legal, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de contratista, Solicito muy comedidamente dar viabilidad a la presente solicitud de prórroga al Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 del 08 de mayo del 2025, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA MIRAVALLE MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ. por las razones que se exponen a continuación:

OBJETO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA MIRAVALLE, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.
ACEPTACION DE OFERTA	SPOPM-CO-IMC-308-2025 DEL 08 DE MAYO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
CONTRATISTA	RICARDO ROMERO LOPEZ
C.C.	12.992.771 expedida en (Pasto)
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($36.398.681,07)
CDP	2025000324 DEL 01 DE ABRIL DE 2025
RP	2025000386 DEL 08 DE MAYO DE 2025
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE INICIO	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	13 DE JUNIO DE 2025

Teniendo en cuenta lo anterior y que durante la ejecución de las actividades del Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025, La fecha de terminación del contrato está programada para el día 13 de junio de 2025, tiempo insuficiente para la culminación y cumplimiento del alcance contractual, lo que conlleva a la necesidad de realizar y presentar una reprogramación de obra acorde a los tiempos necesarios para culminar el total de actividades contractuales, de acuerdo a lo pactado en el presupuesto contractual, especificaciones técnicas y obligaciones contenidas en la minuta contractual de la obra.

Es necesario mencionar que se ha presentado limitaciones para la logística de la ejecución de la obra y restricción que no han permitido ejecutar con normalidad dicho contrato como lo es: las malas condiciones climáticas, que han retrasado considerablemente la ejecución de la obra para el cumplimiento del objeto contractual en el plazo acordado, donde es una situaciones no prevista y no han sido responsabilidad en la ejecución de la obra por parte del contratista, y tampoco pudo ser planificada por parte del ente contratante.

En el mes pasado y lo que va transcurrido del presente, se vienen registrando periodos de lluvias prolongados, los cuales afectan de manera considerable el rendimiento de las actividades en campo; dentro de algunas de las actividades, entre las cuales están se clasifican de la siguiente manera:

Localización Y Replanteo y Excavación Mecánica En Material Común, estas actividades no se han empezado a ejecutar debido a que su proceso requiere intervenir el área asignada en los planos, y teniendo en cuenta que este tanque sedimentador que se realizara dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Rural Miravalle Sede Principal, al realizar esta excavación en sitio en este periodo de lluvias intensas presentadas desde el mes de mayo y teniendo en cuenta que es una excavación mecánica con una profundidad total de 2.8 mt sería un riesgo tanto para los obreros que se encuentre dentro de la excavación, como también para la población estudiantil que se encuentre alrededor, y que posiblemente se puedan presentar deslizamientos de los taludes, aun teniendo previsto que la excavación se hará en forma trapezoidal, que conllevara un sobreancho en la parte superficial con una correspondiente pendiente, así mismo se desea evitar que por el tiempo que ha transcurrido por las lluvias intensas hasta el dia de hoy en el sitio de la obra, ha impedido laborar normalmente, adicionalmente y de acuerdo a la topografía del terreno donde se construirá, es una zona baja que se ha estado inundando constantemente por las aguas de escorrentía provenientes de las lluvias.

En cuanto al *Suministro E Instalación De Concreto Ciclópeo y el Suministro E Instalación De Concreto 3000 Psi Para Construcción De Tanque Sedimentador*, no se han logrado empezar debido a que se deben hacer en el sitio indicado en planos y no se ha podido realizar una previa construcción o armada de la formaleta en madera tanto para el concreto ciclópeo, como también para la estructura del tanque sedimentador y que posteriormente se pueda aplicar la mezcla de los concretos, con su tiempo de fragüe y se obtenga la resistencia requerida que es de 3000 PSI.

Se Anexa el *Boletín de predicción climática y recomendación sectorial del IDEAM*, así mismo se anexan los estados del tiempo en el mes de mayo y del pronóstico del mes de

junio en la página de internet *The Waether Channel*, información que se puede confirmar en el siguiente link.

https://weather.com/esHN/tiempo/mensual/l/d34d05da0b50d5a5ac4954f85e587f87217d5eaf201720f188d7a6cfbb1b7e54

Y se anexa el pronóstico del mes de junio y julio en la página de internet *Accuweather* información que se puede confirmar en los siguientes links.

https://www.accuweather.com/es/co/valle-del-guamuez/1863641/june-weather/1863641

https://www.accuweather.com/es/co/valle-del-guamuez/1863641/daily-weather forecast/1863641


Por otra parte, lo que corresponde a las actividades del El Acero De Refuerzo De 60000 Psi y del Suministro E Instalación Malla Electrosoldada 5mm 2.35 X 6.00 M, estas ya SE adquirieron, pero no se ha llevado a obra porque no se ha dispuesto al personal para empezar, a condicionar el área precisamente por el mal estado del tiempo o malas condiciones climáticas presentadas, desde el 14 de mayo del 2025 fecha de inicio de labores, y teniendo en cuenta que la totalidad del acero de refuerzo y de la malla se tiene que armar dentro de la Excavación que no se podido realizar por lo expuesto anteriormente

Es de esta manera que muy formalmente solicitamos a usted que sea pertinente conceder una prórroga en tiempo de 45 días calendario para la terminación a satisfacción de las actividades contractuales de la obra, recordando las actividades contractuales contenidas en el presupuesto del contrato, debe cumplirse las recomendaciones y procedimiento a ejecutar en cada estos ítems que están determinadas en el anexo de las especificaciones técnicas y obligaciones contenidas no solo en el proyecto, sino también basado, en el estudio previo, pliegos e condiciones para la Contratación de Mínima Cuantía No. IMC-020-2025 y minuta contractual del Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025.

No siendo mas el motivo de la presente les agradezco por la atención y colaboración prestada.

Atentamente,

RICARDO ROMERO LOPEZ
Identificado con C.C. No. 12.992.771 de Pasto (N)

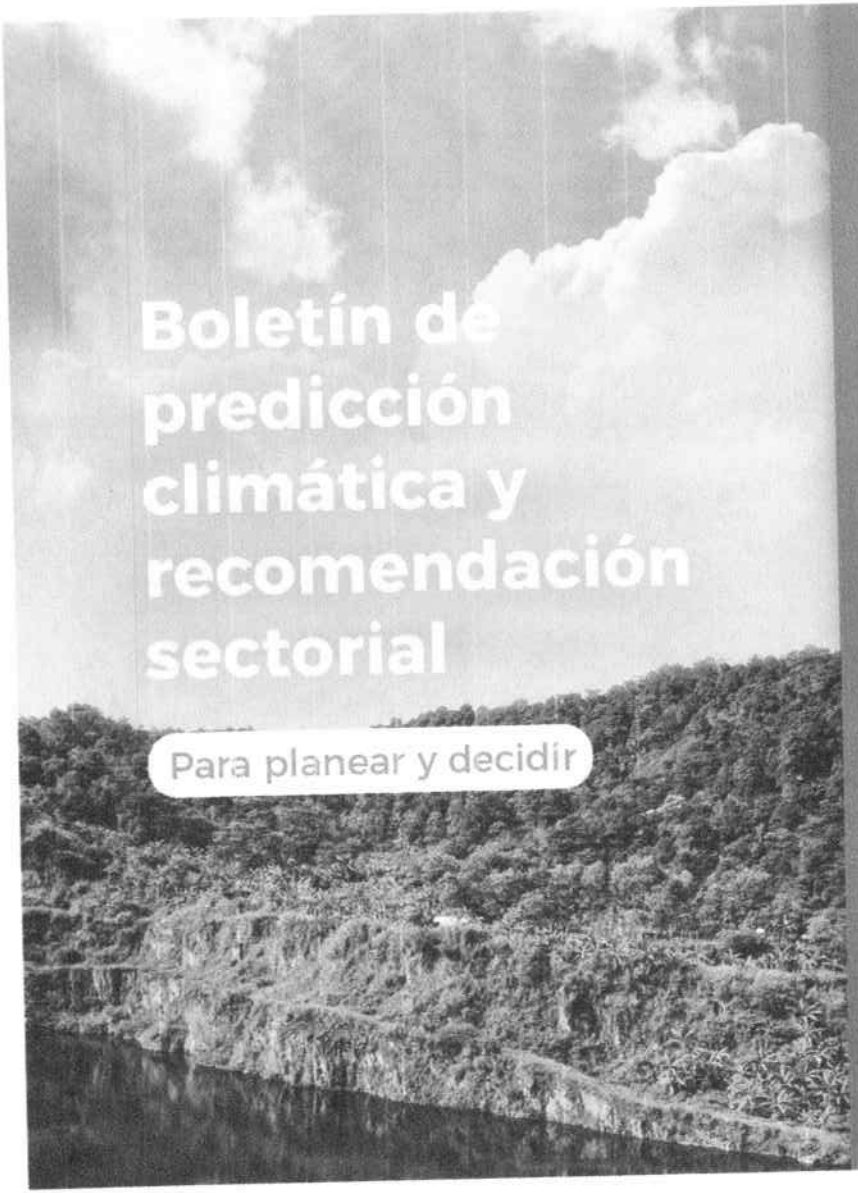

Boletín de predicción climática y recomendación sectorial

Para planear y decidir

CONTENIDO

ABRIL 2025

- Seguimiento al sistema océano – atmósfera.

MAYO – JULIO | 2025


- Predicción climática de escala global.
- Predicción climática de la precipitación.
- Predicción climática de las temperaturas extremas.
- Predicción hidrológica, estado de los suelos y probabilidad de amenaza por deslizamientos e incendios de la cobertura vegetal.
- Recomendaciones.

La Predicción Climática generada por el IDEAM se basa en el análisis de modelos procedentes de los centros internacionales y de la discusión nacional del Comité de Predicción Climática.

Este producto es útil para tener una referencia de corto y mediano plazo en la escala climática, por lo que es necesario aclarar que no considera eventos extremos puntuales y de corta duración.

Publicación N° 363
Mayo de 2025

IDEAM

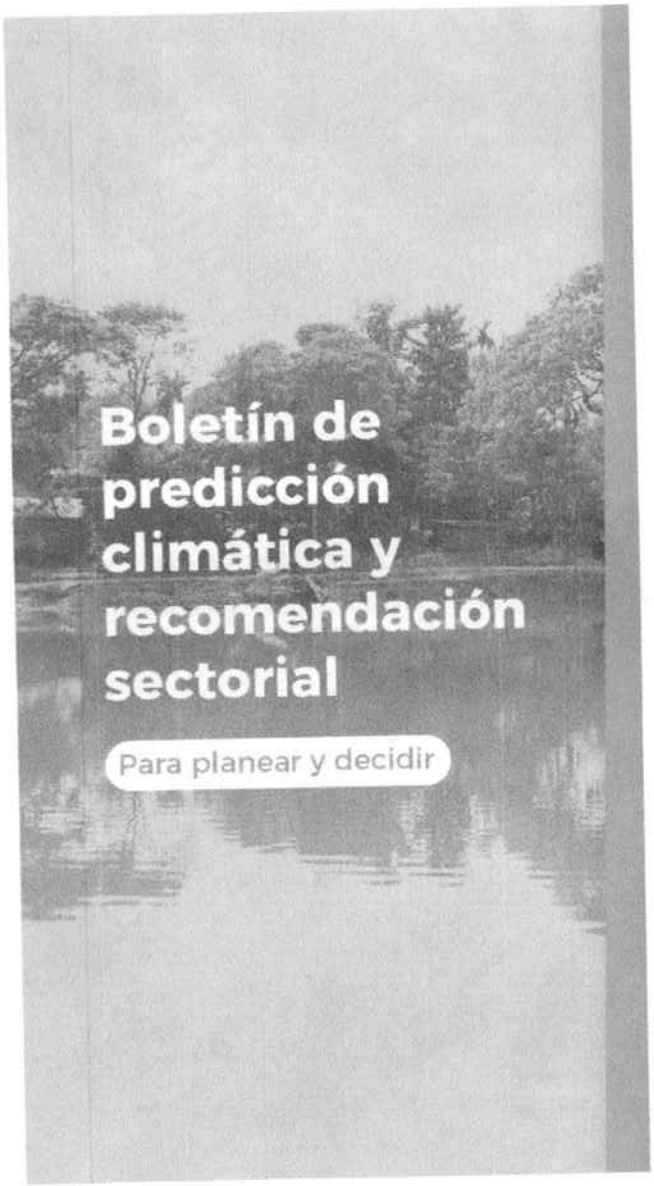

Seguimiento – abril de 2025

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y anomalías negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4. En subsuperficie se debilitó el enfriamiento que permaneció concentrado entre la cuenca central y oriental durante varios meses, al tiempo que, se destacó el núcleo de agua cálida desde el flanco occidental hasta los 145°W. En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron cerca a su comportamiento medio entre al cuenca central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el oriente. En altura (200 hPa) las anomalías del oeste y este dominaron la primera y segunda mitad del mes, respectivamente. La convección se observó entre normal y suprimida alrededor de los 180°W.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores normales y con anomalías de hasta +/- 1.0 °C

Predicción Climática


El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reflejó condiciones características de la fase neutral. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán moduladas en gran medida por las oscilaciones intraestacionales, el ciclo estacional típico de la época del año y el inicio del tránsito de ondas por el Atlántico.

Las salidas de los modelos indican que los acumulados de lluvia se mantendrán dentro de valores normales y por debajo de esta condición en amplias extensiones del territorio nacional durante el trimestre mayo-junio-julio. Las temperaturas extremas se estiman entre valores normales y anomalías positivas/negativas alcanzando +/- 2.0 °C aproximadamente.

El Ideam hace un llamado a la comunidad para atender recomendaciones sectoriales derivadas de la predicción climática, de tal manera que puedan tomar decisiones climáticamente inteligentes.

PRECIPITACIÓN

Mapa 1

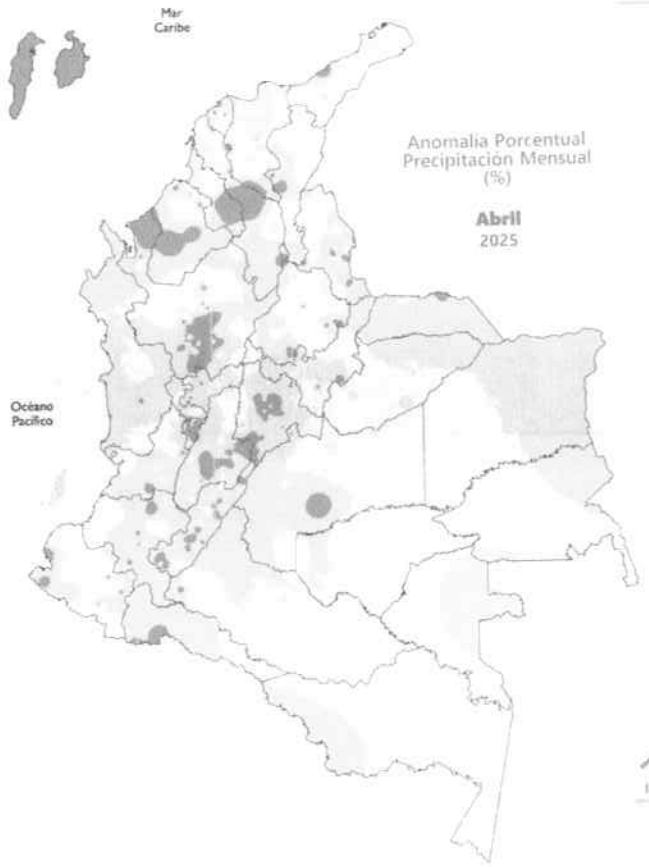


La categoría por debajo del promedio se destacaron en sectores de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Meta,

En contraste, las lluvias por encima y muy por encima de lo normal se registraron en la mayor parte de las regiones Pacífica y Andina, así como en el sur de la región Caribe y su área insular, el norte de la Orinoquia y el occidente de la región Amazónica.

En áreas restantes las lluvias se mantuvieron dentro de los valores normales.

TEMPERATURA

Mapa 2

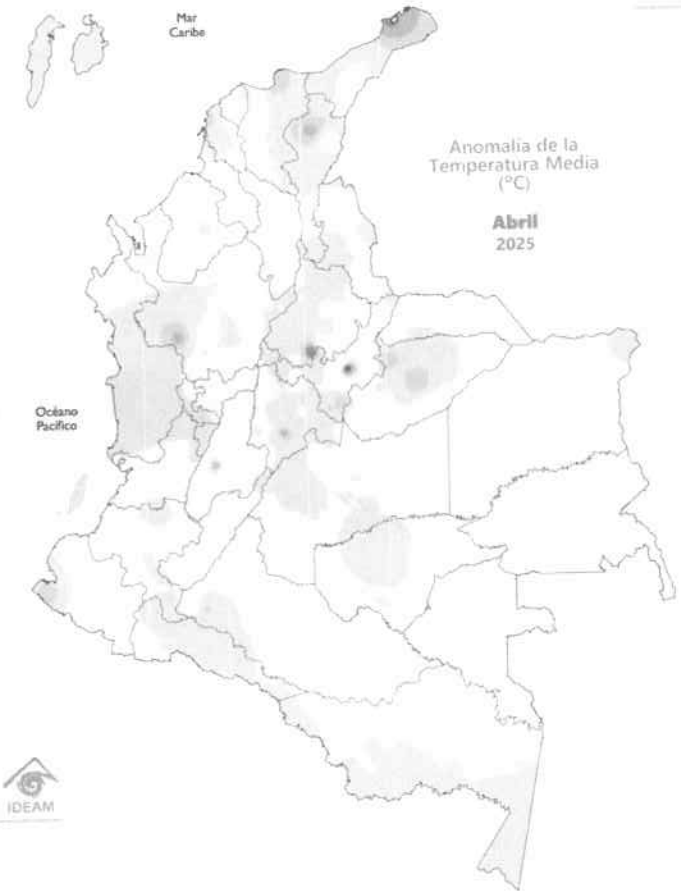

En el territorio nacional, las temperaturas registradas se mantuvieron en general dentro de los valores normales y por encima de esta condición.

Las anomalías positivas más altas se en áreas puntuales de La Guajira, Cesar, Antioquia, Santander, Cundinamarca y Casanare; mientras que anomalías negativas se reportaron en áreas de menor extensión ubicadas en Boyacá y Tolima.

La condición **normal** predominó en amplias extensiones de los departamentos de la Orinoquia y Amazonía, tanto como el occidente de la región Caribe y, sectores del sur en las regiones Andina y Pacífica.

SEGUIMIENTO | OCÉANO – ATMÓSFERA

El Ideam informa que la dinámica oceánica y atmosférica reflejó condiciones características de la fase neutral. En este contexto, las variaciones climáticas del país serán moduladas en gran medida por las oscilaciones intraestacionales, el ciclo estacional típico de la época del año y el inicio del tránsito de ondas por el Atlántico.

OMM
Organización Meteorológica Mundial

NOAA
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos

CPC
Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos

NCEP
Centros Nacionales para la Predicción Ambiental

BOM
Servicio Meteorológico de Australia

IRI
Instituto Internacional de Investigación del Clima y la Sociedad

JMA
Agencia Meteorológica del Japón

CIIFEN
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño

ESCALA INTERANUAL

Durante *abril* se destacó el siguiente comportamiento asociado a la variabilidad climática:

OCÉANO

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y anomalías negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4.

Durante la última semana las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en las regiones de seguimiento reportadas por la NOAA fueron:

| EN 4 -0.1 °C | EN 3.4 0.1 °C | EN 3 -0.1 °C | EN 1+2 0.0 °C |

Los indicadores de seguimiento al ciclo ENOS, reportaron:

- MEIv2 (**-0.4**) promedio móvil del periodo (**marzo-abril**). Indicativo de una condición **Neutral.**
- ONI (**-0.2**) promedio móvil del trimestre (**febrero-marzo-abril**). Indicativo de condiciones **Neutrales**.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores normales y con anomalías de hasta +/- 1.5 °C.

En subsuperficie permaneció el enfriamiento entre la cuenca central y oriental desde la superficie hasta los 200 m de profundidad, al tiempo que, se destacaron las aguas cálidas en el flanco occidental.

ATMÓSFERA

En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron cerca a su comportamiento medio entre al cuenca central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el oriente. En altura (200 hPa) Las anomalías del oeste y este dominaron la primera y segunda mitad del mes, respectivamente.

CICLO ENOS

Las condiciones oceánicas y atmosféricas reportaron características típicas de la fase neutral.

Nota: En Ideam, la declaración oficial del fenómeno se realiza con base en el ONI.

ESCALA INTRAESTACIONAL

La oscilación Madden & Julian (MJO) transitó en las fases convectiva y subsidente sobre el territorio nacional.

PREDICCIÓN

En la discusión oficial del CPC/IRI se indicó que predomina el ENOS neutral y que se extendería entre junio-agosto y agosto-octubre (**74%** y **50%** de probabilidad).

De acuerdo con la JMA, las condiciones neutrales persistieron en abril y proyecta que esta fase predomine hasta el otoño boreal. Por su parte, el BOM considera que el fenómeno ENOS está neutral y permanecería así hasta septiembre. Por su parte, el CIIFEN destacó las condiciones neutrales para el periodo mayo-julio de 2025.

La **OMM** informa que, a mediados de febrero de 2025, la zona ecuatorial del Pacífico presentaba condiciones características de un episodio débil de La Niña. Desde diciembre de 2024 se han observado en la región centro-oriental temperaturas de la superficie del mar ligeramente inferiores a la media. Según los últimos pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones Estacionales de la OMM, la TSM en el Pacífico ecuatorial se acercarán a la media. Para el periodo de marzo a mayo de 2025 se cifra en un 60% la probabilidad de que se instauren condiciones neutras y la probabilidad de que persistan las condiciones típicas de La Niña se estima en un 40%. La probabilidad de que evolucione El Niño durante el periodo de pronóstico comprendido entre marzo y junio es ínfima. A la luz de la "barrera de predictibilidad de la primavera", un fenómeno bien conocido que limita el grado de acierto de las actuales predicciones del ENOS, es especialmente importante interpretar con cautela los pronósticos del ENOS a largo plazo en esta época del año.



La predicción climática mensual preparada por el **IDEAM** se presenta desde la página 6.

ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró dentro del rango neutral, con anomalías positivas en las regiones EN 1+2 y EN 3, y anomalías negativas en las regiones EN 3.4 y EN 4. Las temperaturas oscilaron con anomalías entre 0.49 °C y -0.16 °C.

En la región EN 3.4 se observó una anomalía de -0.6 °C.

Fuente ATSM: NOAA/OISSTv2/Weekly.
Rango de la normalidad (+/- 0.5°C)

Figura 1

Promedio de las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (°C) entre el 13 de abril y el 10 de mayo de 2025. Fuente: NOAA


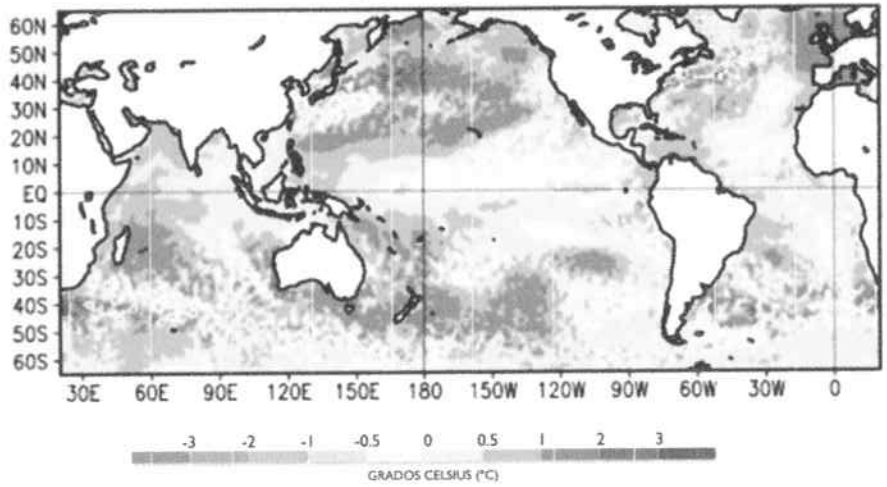


Figura 2

Anomalías de la Temperatura Subsuperficial del Mar (°C), pentada centrada en el 28 de abril 2025. Fuente: NOAA

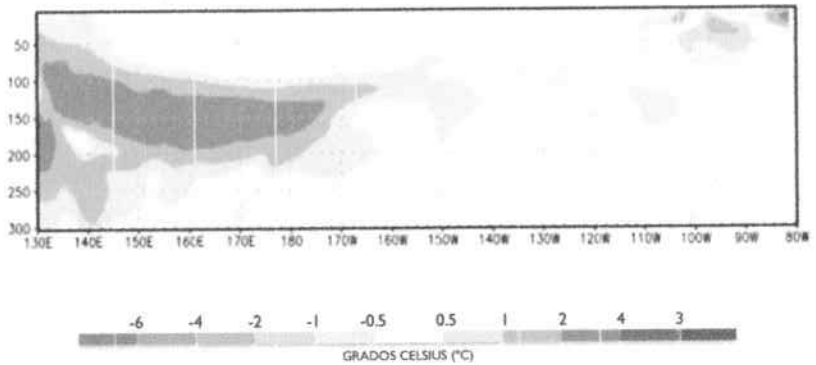


ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUBSUPERFICIAL DEL MAR

En subsuperficie se debilitó el enfriamiento que permaneció concentrado entre la cuenca central y oriental durante varios meses, al tiempo que, se destacó el núcleo de agua cálida desde el flanco occidental hasta los 145°W.

Figura 3


Campo de viento en el nivel de 200 hPa, entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

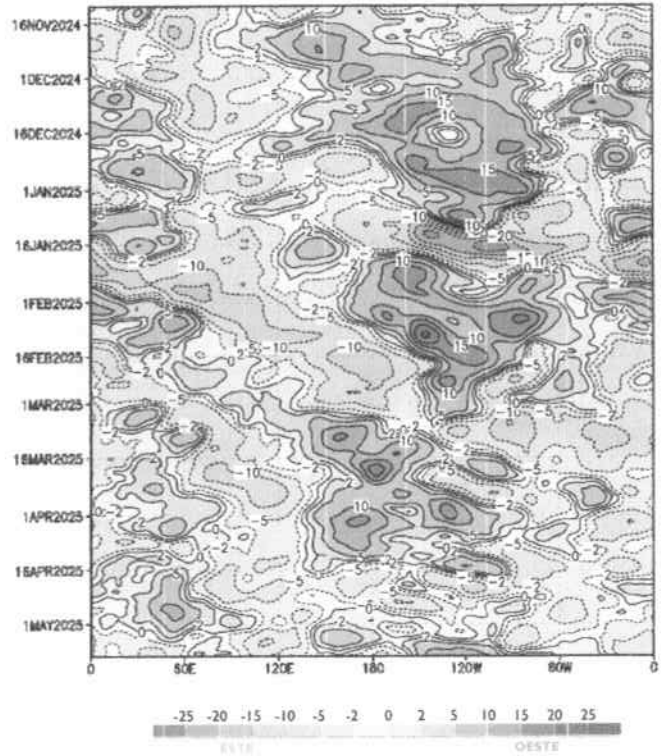

Las anomalías del oeste y este dominaron la primera y segunda mitad del mes, respectivamente.

Figura 4

Anomalía del campo de viento en el nivel de 850 hPa, entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

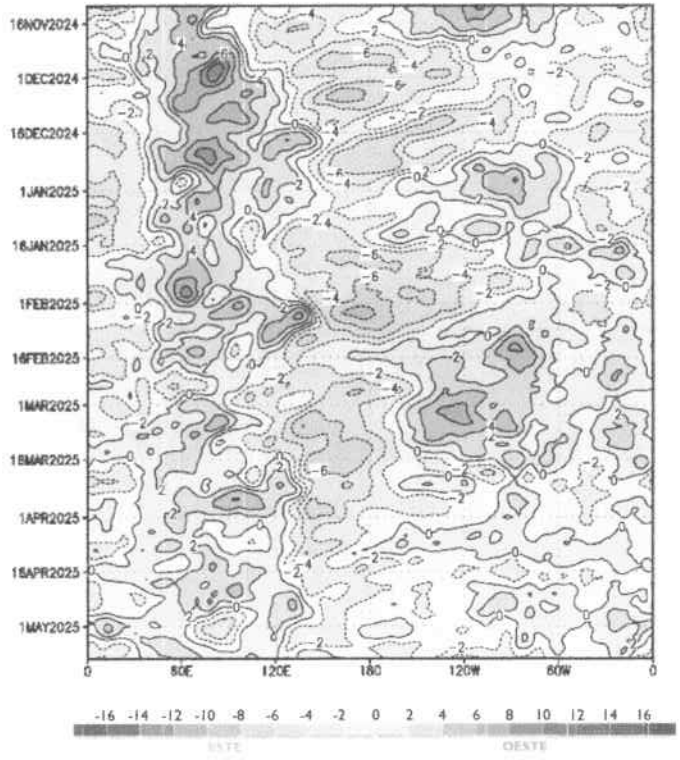


Los alisios fluyeron cerca a su comportamiento medio entre al cuenca central y occidental, con periodo ligeramente más débil hacia el oriente.

SEGUIMIENTO | OCÉANO – ATMÓSFERA
PREDICCIÓN ANOMALÍA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

NOAA

Figura 5

Predicción probabilística oficial del ENOS del CPC basado en la TSM de la región EN 3.4. Fuente: NOAA.

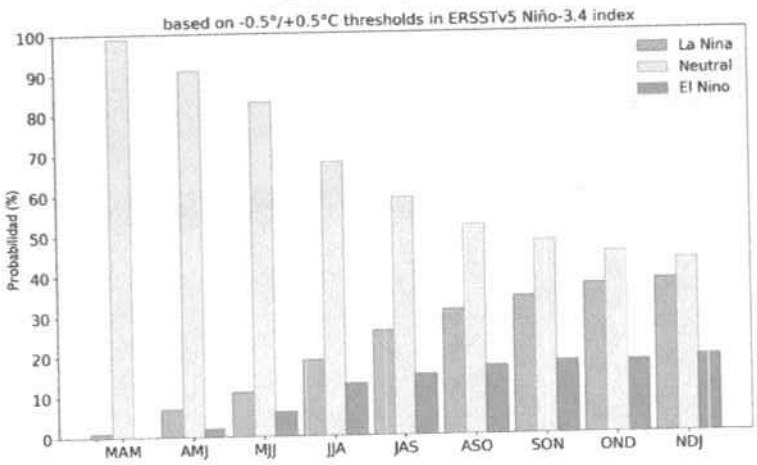

CPC
Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos


IRI
Instituto Internacional de Investigación del Clima y la Sociedad

ECMWF
Centro Europeo de Predicción de Mediano Plazo

CENTRO EUROPEO

Figura 6

Predicción estacional del ECMWF
Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar – Ensamble. Fuente: ECMWF

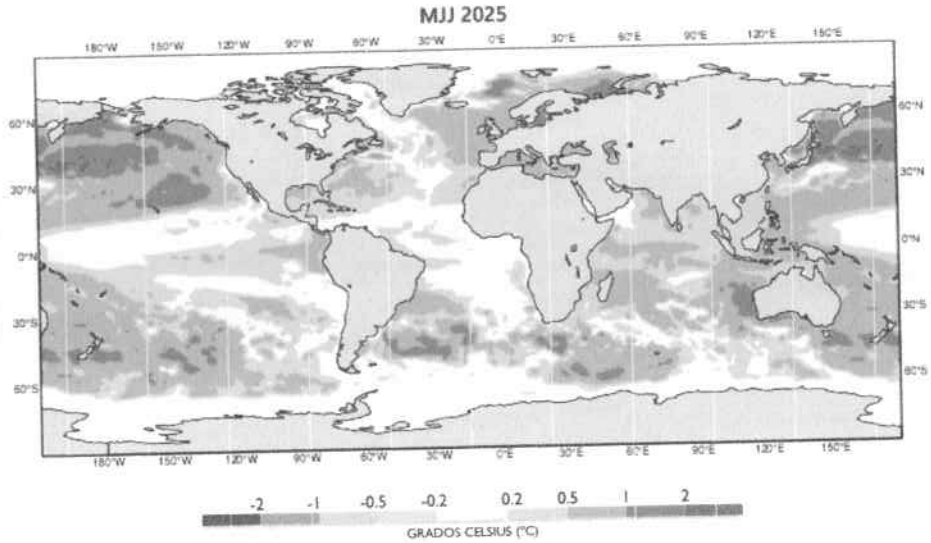


De acuerdo con la predicción del ECMWF:

Se estiman temperaturas alrededor de valores normales y con anomalías positivas en la franja central-oriental del océano Pacífico ecuatorial y el Atlántico Tropical, en el rango 0.2 °C a 1.0 °C.

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | PRECIPITACIÓN MAYO 2025

Mapa 3

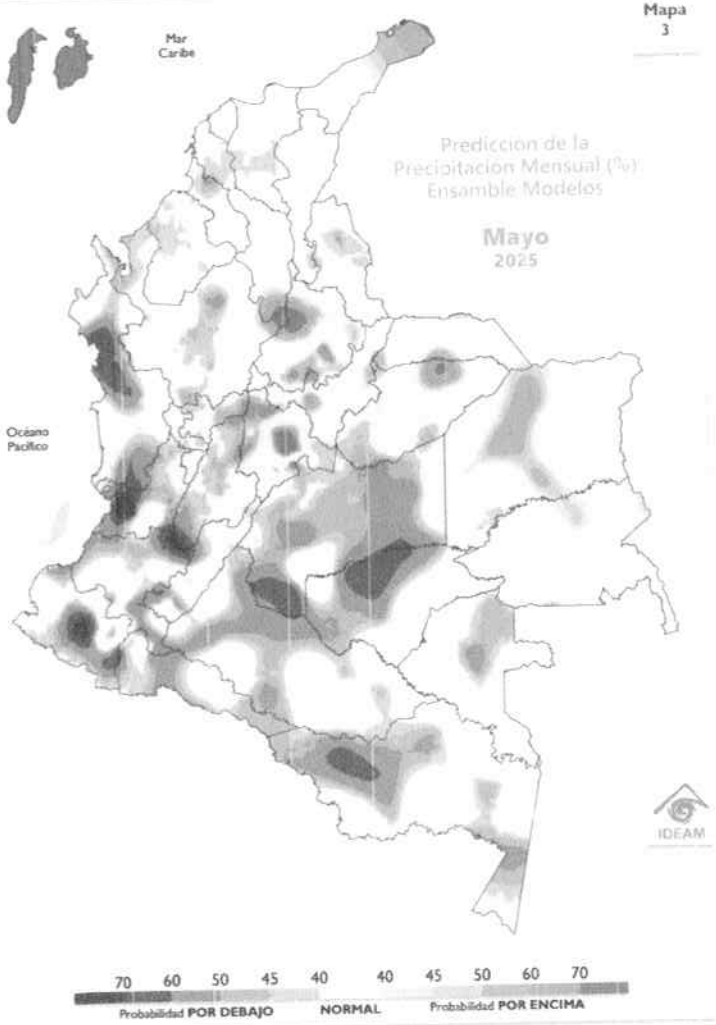

PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría **POR DEBAJO** de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se concentraría en amplias extensiones del centro y sur del país, con probabilidades que oscilan entre el **45%** y **70%**.


La categoría por encima de lo normal se estima en el área insular Caribe y zonas puntuales de La Guajira, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Arauca, Vichada y Guainía, con probabilidades entre el **50%** y **70%**.

El comportamiento **normal** se espera en áreas restantes.

CLIMATOLOGÍA


Mayo hace parte de la primera temporada lluviosa del año en la región Andina, época en la cual la ZCIT se ubica en el centro del territorio nacional. Al oriente del país, las precipitaciones dependen más de las fluctuaciones asociadas a la ZCAS y del ingreso de masas húmedas procedentes del sur de continente, lo cual marca el inicio de la temporada de lluvias a lo largo del Piedemonte Llanero de la Orinoquia. Sobre la región Caribe, es normal que aumenten significativamente los volúmenes de precipitación con respecto al mes anterior, producto del paso de ondas tropicales de este – temporada de mayo a noviembre. En la región Pacífica se incrementan las precipitaciones con respecto a abril y, paulatinamente sobre la Amazonia, empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación con respecto al mes anterior sobre el trapecio Amazónico, pero continúan en ascenso hacia el piedemonte de esta región, para alcanzar sus máximos volúmenes hacia el mes de junio.

Mapa 4

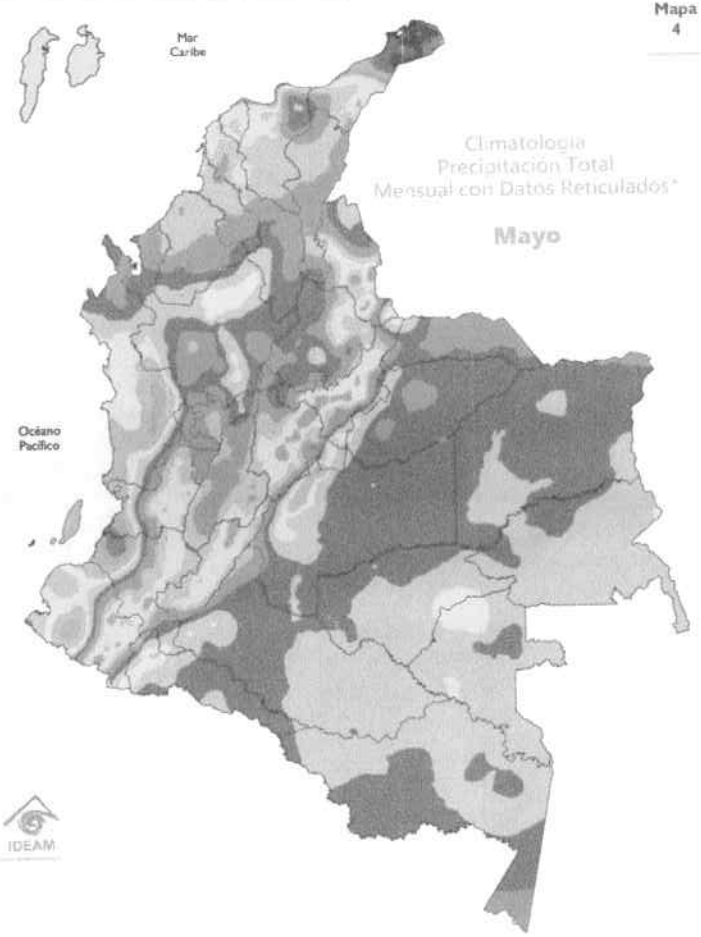

* Observaciones + Satélite + Salida de Datos + ERA5

Mapa 5

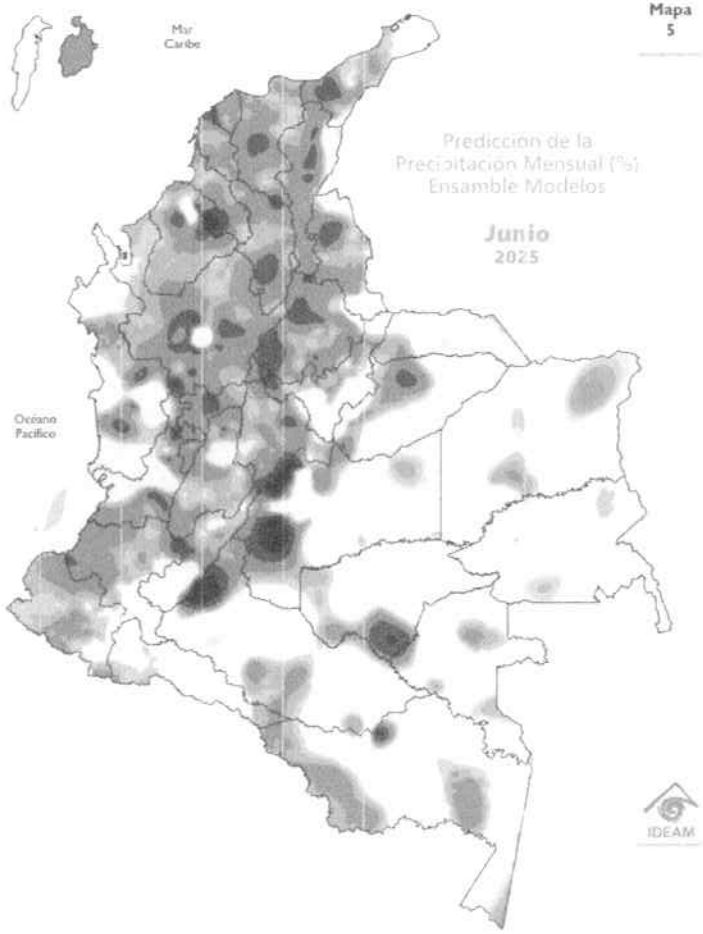

PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría **POR DEBAJO** de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta para la mayor parte de las regiones Caribe (incluyendo la isla de Providencia), Andina y Pacífica, además en zonas de menor extensión en la Orinoquia y Amazonia, con probabilidades que oscilan entre el **50%** y **70%**.


La categoría por encima de lo normal se espera en zonas puntuales de Arauca, Meta, Vichada, Guainía, Vaupés, Caquetá y Amazonas, con probabilidades que fluctúan entre el **45%** y el **70%**.

El comportamiento **normal** dominaría en sectores del sur del país.

CLIMATOLOGÍA


En junio se presenta la transición entre la primera temporada de precipitaciones y la segunda temporada de menos lluvias del año, que se presenta en la mayor parte de la región Andina y en el oriente de la región Caribe. En sectores del norte del país es normal que las lluvias persistan, debido a la migración paulatina de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) desde el centro hacia el norte del país, junto con la actividad ciclónica del mar Caribe propia de la época del año. Al oriente del territorio nacional, las precipitaciones dependen más de las fluctuaciones asociadas a la migración de la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ), la cual apoya la transición de la época de menos lluvias a la temporada de mayores precipitaciones, de mitad y parte del segundo semestre del año en la Orinoquia colombiana. En la Amazonia, se incrementan las lluvias al nororiente, mientras que descienden en amplios sectores, especialmente los que se ubican en el centro y sur de la región.

Mapa 6

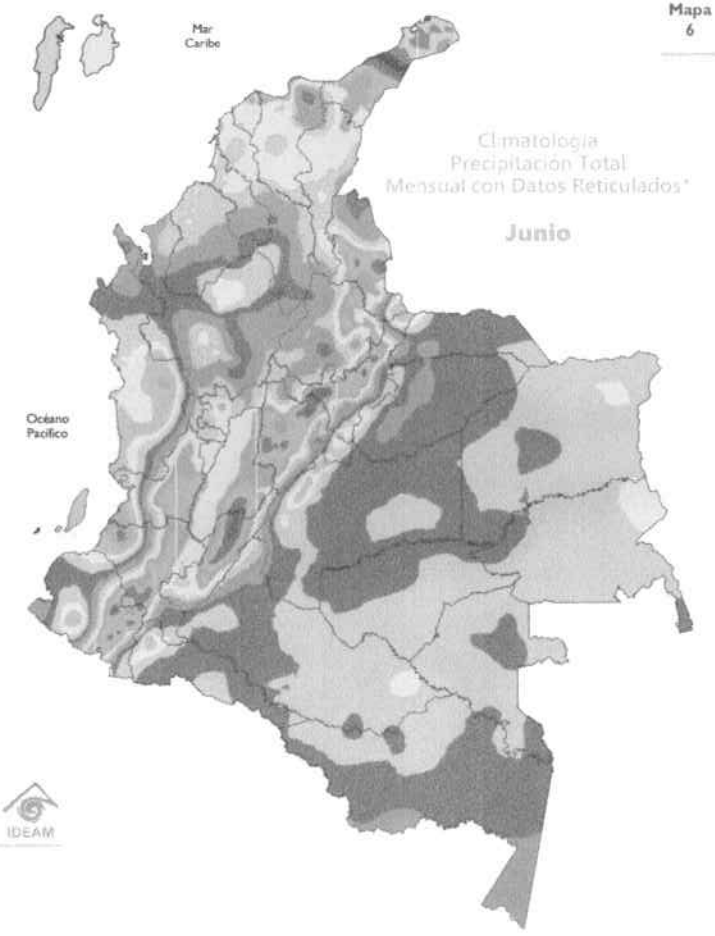

* Observaciones - CHIRPS - Cubo de Datos - IDEAM

Mapa 7

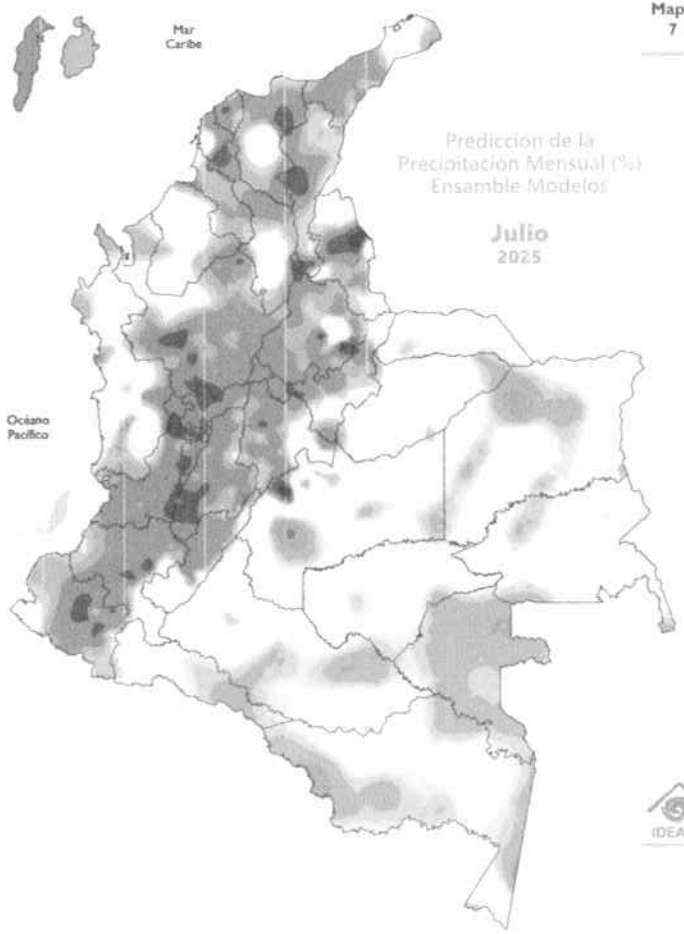

PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría **POR DEBAJO** de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta para la mayor parte de las regiones Caribe (incluyendo el área insular) y Andina, así como en el sur de la región Pacífica, con probabilidades que oscilan entre el **50%** y **70%**.


La categoría por encima de lo normal se espera en sectores del oriente del país, el Urabá y nororiente de La Guajira, con probabilidades que fluctúan entre el **50%** y el **70%**.

El comportamiento **normal** dominaría en sectores del sur del país.

CLIMATOLOGÍA

Julio hace parte de la segunda temporada de menos lluvias de la región Andina y el oriente de la Caribe. En sectores de la región Caribe es normal que se presenten precipitaciones, debido al tránsito de ondas tropicales del este, la actividad ciclónica del mar Caribe y la paulatina migración de la ZCIT al norte del país. Es importante resaltar que la Orinoquia está atravesando su época de mayores precipitaciones y, para este mes, se espera que éstas dependan más de las fluctuaciones asociadas a la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ). En la Amazonia colombiana, las precipitaciones disminuyen en la totalidad de la región con respecto a junio, aunque continúan siendo frecuentes y abundantes; además se destaca como uno de los meses menos lluviosos del año en el sur del departamento del Amazonas.


Mapa 8

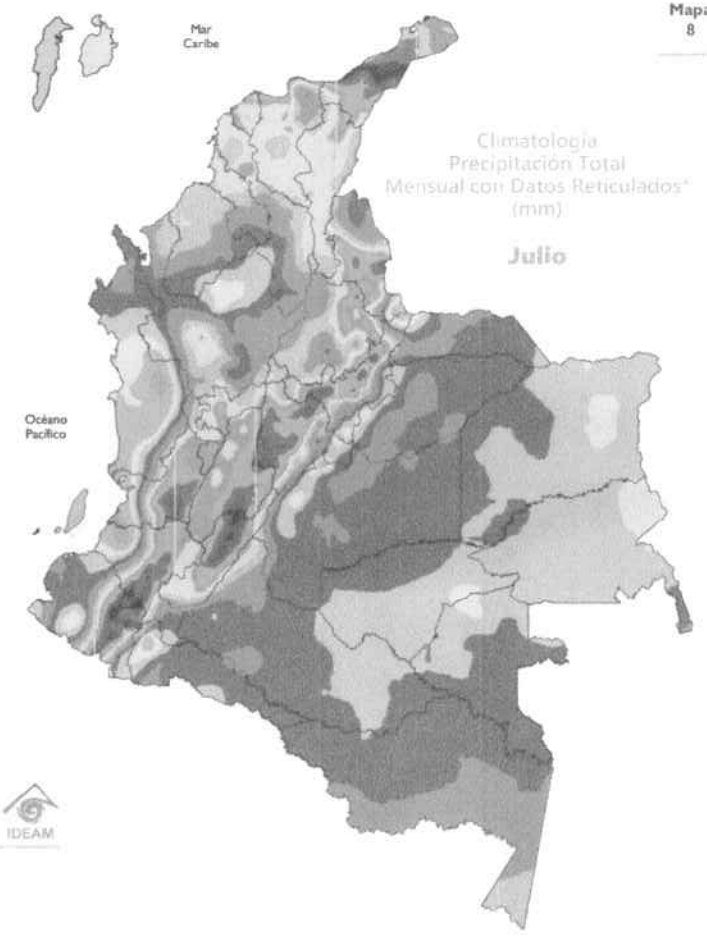

* Observaciones + CHIRPS + Celdas No Data + ERA5

PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÍNIMA
MAY - JUN - JUL | 2025

Mapa 9

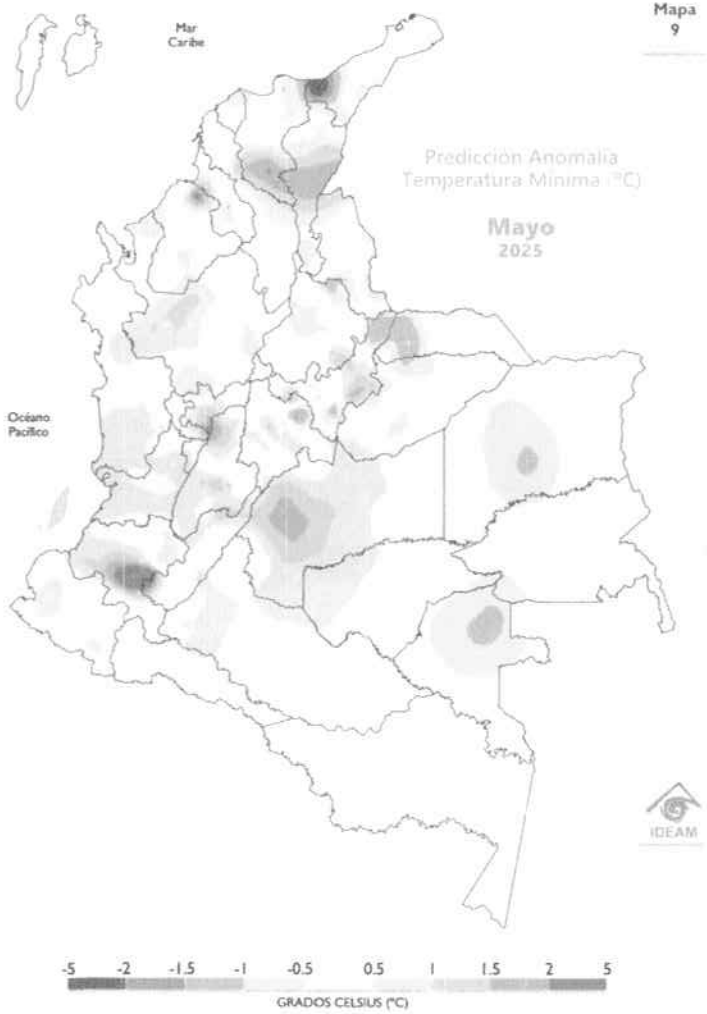

PREDICCIÓN MAYO

Las anomalías positivas se estiman en sectores ubicados en el centro, norte y occidente del país, mientras que, las anomalías negativas se esperan en sectores del centro y oriente del territorio nacional. Los valores normales se favorecen en áreas restantes.


Mapas 10 - 11





PREDICCIÓN CLIMÁTICA | TEMPERATURA MÁXIMA
MAY - JUN - JUL | 2025


Mapa 12

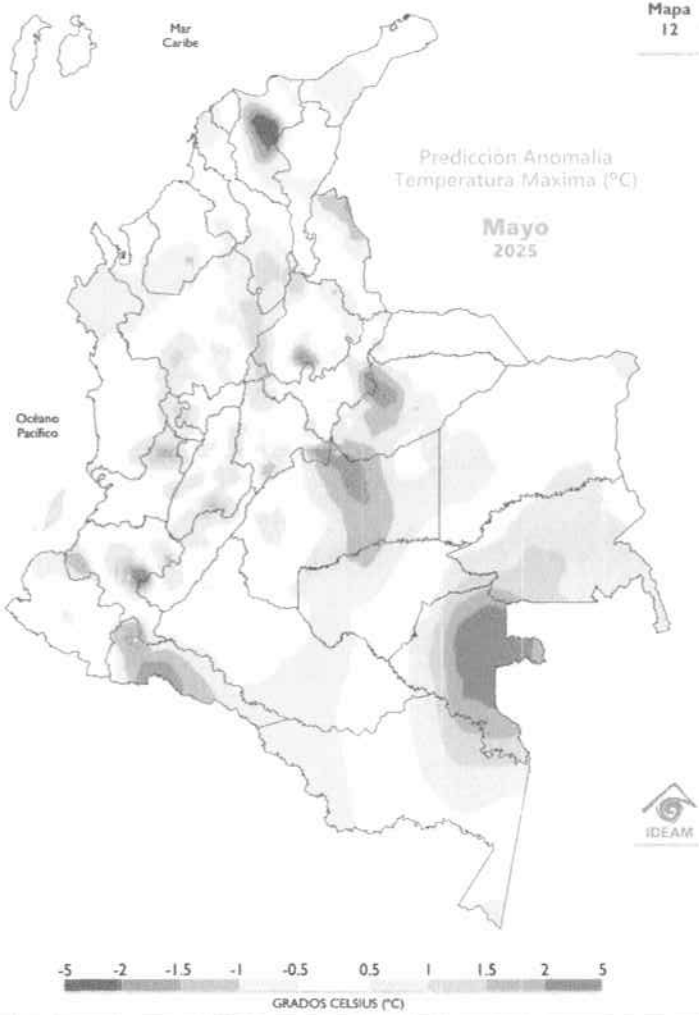


PREDICCIÓN MAYO

Las anomalías positivas se destacarían sobre una franja central ubicada en las regiones Andina y Caribe, además de amplias extensiones en Guainía, Vaupés y Amazonas. Las anomalías negativas se estiman en áreas de la mayoría de los departamentos que conforman el país.

Mapas 13 - 14

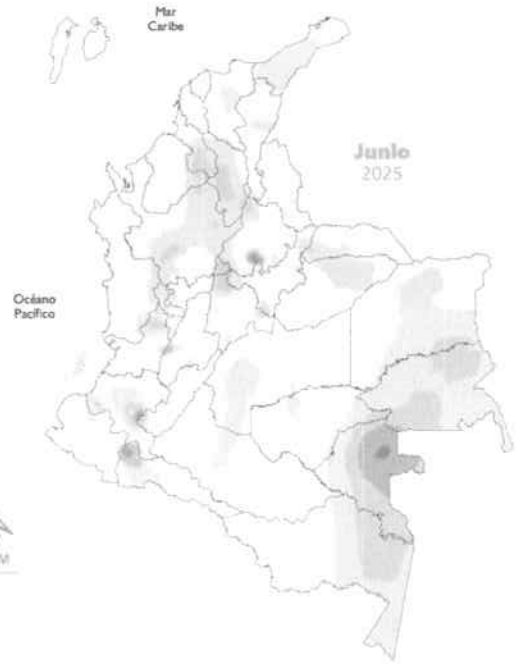

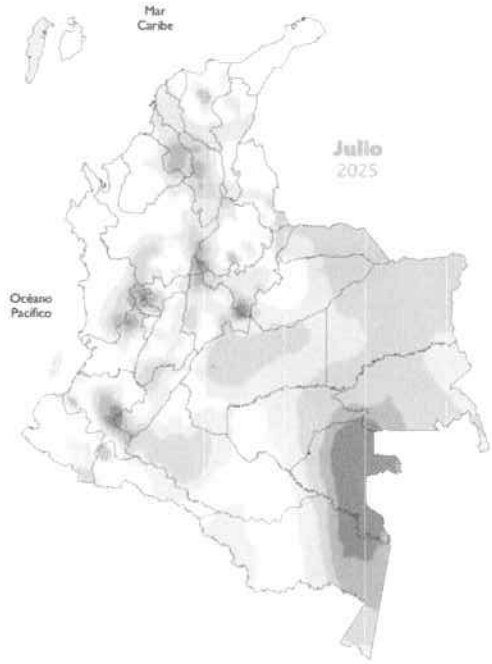



Cuenca de los ríos Magdalena y Cauca

Persiste la condición de niveles en ascenso en estos ríos, para los cuales se alcanzan los más altos niveles durante el mes de mayo; la magnitud de los niveles se mantendrá con valores en el rango de niveles altos.

Cuenca del río San Jorge

Para el río San Jorge y el sistema asociado de ciénagas se mantendrán los niveles en el rango alto.

Cuenca del río Sinú

En el río Sinú, con régimen influido por la operación y regulación del embalse de Urrá, se esperan niveles en el rango de niveles altos para el mes de mayo.

Río Atrato

Se mantendrá con incrementos de nivel en magnitudes que corresponden al rango de niveles altos.

Ríos Patía y Mira

En los ríos Mira y Patía se mantendrán niveles en el rango de los valores altos, particularmente en las cuencas media y baja de estos ríos.

Río Arauca

En algunos afluentes de la cuenca alta del río Arauca se espera continúen presentándose moderados incrementos de nivel y para el río Arauca los niveles se mantendrán en el rango medio.

Ríos Meta y Guaviare

En el río Meta, como consecuencia de los incrementos de nivel en sus principales afluentes, se mantendrá la tendencia de ascenso en los niveles, que en algunos tramos de la cuenca media alcanzarán el rango de niveles altos. En el río Guaviare también se esperan niveles en ascenso en el rango de los valores altos.

Ríos Inírida y Vaupés

Con una tendencia al ascenso en los niveles de los ríos Inírida y Vaupés, éstos se mantendrán con valores superiores al promedio de esta época del año, en el rango de niveles medios a altos.

Río Orinoco

Se mantiene la tendencia al ascenso en los niveles del río Orinoco y sus valores corresponden al rango de niveles medios a altos.

Ríos Caquetá y Putumayo

Con incrementos moderados de nivel en algunos afluentes de la zona del piedemonte de los departamentos de Caquetá y Putumayo, se espera que los niveles de los ríos Caquetá y Putumayo, particularmente en la cuenca media y baja se mantengan con niveles en el rango de valores medios a altos.

Río Amazonas

A la altura de Leticia, el río Amazonas presentará una tendencia de ascenso en los niveles con valores ligeramente por encima de los promedios de esta época del año.

Mapa 15



PARA TENER EN CUENTA

En las condiciones de mayores volúmenes de precipitación en amplias zonas de la región Andina, como condición típica de mes de mayo, predominarán los niveles en ascenso en los principales ríos afluentes a los ríos Cauca y Magdalena. Esto ocasionará que en algunos sectores se puedan alcanzar niveles altos que pueden ocasionar afectaciones a las poblaciones ribereñas de estos sistemas hídricos. Además, se espera una alta ocurrencia de incrementos súbitos de nivel en afluentes de la cuenca alta y media de los ríos Cauca y Magdalena, por efecto de lluvias locales de alta intensidad y duración.

En efecto, algunos ríos ya han evidenciado durante el mes de abril una recurrencia mayor de eventos como crecientes súbitas y desbordamientos afectando a las poblaciones ribereñas. Se resalta que a lo largo del mes de abril se presentaron eventos de inundación y crecientes súbitas en amplios sectores de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Caldas, así como en algunos municipios de los departamentos de Cauca, Huila, Tolima, Santander y Norte de Santander, entre otros. Además, algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Yumbo registraron inundaciones urbanas detonadas por lluvias intensas.

Para los ríos del piedemonte de la Orinoquia se esperan incrementos de nivel que pueden ocasionar afectaciones en las poblaciones ribereñas a los ríos Guatiquía, Guayuriba, Guéjar, Guamal y Ariari en el departamento del Meta, así como los ríos Upía y Cravo Sur en el departamento del Casanare.

En la región Caribe y en particular en los afluentes de las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta se esperan incrementos moderados de nivel.

Para conocer más acerca de los niveles en nuestros ríos, consulte el enlace:


fews.ideam.gov.co

CONDICIONES MUY ALTAS
Se esperan niveles cercanos a cotas históricas o de desbordes.

CONDICIONES ALTAS
Se esperan niveles en el rango de valores altos, respecto a los valores históricos del mes.

CONDICIONES MEDIAS
Se esperan niveles con valores cercanos a los promedios respecto a los valores históricos del mes.

CONDICIONES BAJAS
Se esperan niveles con valores en el rango de los mínimos, respecto a los valores históricos del mes.

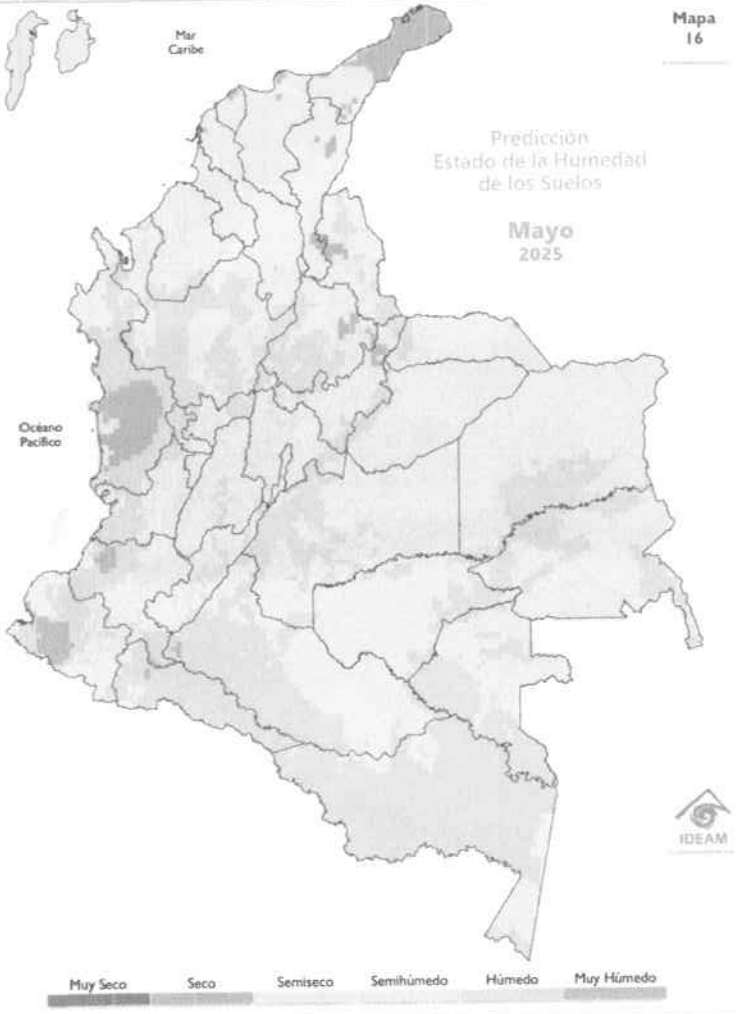

Región Caribe

Se prevén condiciones de humedad en los suelos, acorde con la temporada. Predominará el estado seco en amplias zonas de la península de La Guajira, así como en sectores puntuales del occidente de Atlántico, Magdalena y Bolívar, y del oriente de Cesar. Se esperan suelos semisecos en gran parte de la región, especialmente en los departamentos de Magdalena, noroccidente de Bolívar, Sucre, Córdoba, occidente y suroriente de Cesar, centro y sur de La Guajira, además del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. No obstante, podrán encontrarse suelos [illegible] en amplios sectores del sur y centro de Bolívar, Córdoba y Cesar, así como en el suroriente de Sucre, La Guajira y Magdalena, incluyendo áreas puntuales de la Sierra Nevada de Santa Marta. Asimismo, podrían presentarse suelos húmedos en ciertas zonas del sur de Córdoba, Bolívar y Cesar.

Región Andina

En general, se espera un predominio de suelos [illegible] en amplias zonas de la región, especialmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Antioquia, Huila, Santander, el Eje Cafetero y Norte de Santander. Sin embargo, se prevé la presencia de suelos húmedos en áreas específicas de Norte de Santander, en gran parte de Antioquia, así como en el sur y occidente de Santander, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca. Asimismo, podrán encontrarse suelos semisecos en sectores de Norte de Santander, Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y el nororiente de Santander. No obstante, en zonas puntuales del nororiente de Santander, el norte de Boyacá y el occidente de Norte de Santander, podrían presentarse suelos secos.

Región Pacífica

Se prevén condiciones muy húmedas en el centro del departamento de Chocó, el sur de Nariño, y el occidente y sur de Cauca. Asimismo, se espera la presencia de suelos húmedos en amplias zonas de Chocó, sectores del occidente del Valle del Cauca, Nariño, y el oriente y occidente de Cauca. Por otro lado, podrían encontrarse suelos semisecos en áreas puntuales de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Para el resto de la región, prevalecerán suelos [illegible].

Región Orinoquía

Se prevé un predominio de suelos [illegible] en amplias zonas de los departamentos de Meta, Casanare, Arauca y Vichada. Asimismo, se espera la presencia de suelos húmedos hacia el piedemonte llanero, en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta así como en el sur de Vichada. No obstante, en zonas del nororiente de Arauca, occidente y oriente de Casanare y oriente de Vichada, podrían encontrarse suelos [illegible], mientras que en un área puntual del nororiente de Arauca podrían presentarse suelos secos.

Región Amazonía

Se prevé un predominio de suelos [illegible] a [illegible] en amplias zonas de los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo. En sectores del Piedemonte Amazónico podrán encontrarse suelos muy húmedos hacia Caquetá y Putumayo. No obstante, en sectores puntuales del sur de Guainía, Guaviare y el oriente de Vaupés, podrían presentarse suelos [illegible].

MUY SECO
Suelo sin agua, se mueren los organismos deshidratan.

SECO
Suelo con poca o nula agua, punto de marchitez permanente.

SEMISECO
Suelo con déficit de agua.

SEMIHÚMEDO
Suelo con déficit momentáneo de agua.

HÚMEDO
Suelo a capacidad de campo o de retención de agua.

MUY HÚMEDO
Suelo saturado de agua.

PREDICCIÓN DESLIZAMIENTOS | MAYO 2025

Región Caribe

La amenaza se prevé entre moderada y alta en zonas puntuales del suroccidente de Bolívar, Córdoba y el oriente de Cesar, especialmente hacia la Serranía de Perijá. Por otro lado, se espera una amenaza baja en amplios sectores de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, particularmente hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en áreas específicas del occidente de Bolívar, Sucre y Atlántico. En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no se prevé riesgo, al igual que en el resto de la región.

Región Andina

Se prevé una amenaza moderada a alta en amplias zonas de los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, así como en sectores puntuales de Tolima, el norte y oriente de Cundinamarca, el centro y sur de Santander, el norte de Norte de Santander y, el suroriente y occidente de Boyacá. No obstante, en áreas específicas del centro y sur de Antioquia, en amplias zonas del oriente de Santander, Tolima, Huila, Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá, así como en el occidente de Caldas y algunas zonas de Quindío y Risaralda, se prevé una amenaza moderada a baja. En el resto de la región, no se espera este tipo de riesgo.

Región Pacífica


Se prevé una amenaza alta a muy alta en zonas del centro y suroriente del departamento de Nariño, así como en el occidente y oriente de Cauca, Chocó y el suroccidente de Valle del Cauca. Por otro lado, hacia el norte de Chocó, en amplios sectores del Valle del Cauca y en el oriente de Cauca y Nariño, la amenaza se espera entre moderada y baja. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.

Región Orinoquía

Se prevé una amenaza muy alta en zonas del occidente del departamento del Meta, con un nivel alto especialmente en la Serranía de la Macarena y en el occidente de Meta y Casanare. Por otro lado, la amenaza se espera entre moderada y baja en sectores puntuales del occidente de Arauca, Casanare y Meta, dentro de la jurisdicción del piedemonte llanero. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.

Región Amazonía

Se prevé una amenaza alta en zonas puntuales del occidente de los departamentos de Putumayo y Caquetá, dentro de la jurisdicción del piedemonte amazónico. Asimismo, la amenaza se espera entre moderada y baja en algunos sectores del occidente de Caquetá y Putumayo. En el resto de la región, no se prevé este tipo de riesgo.

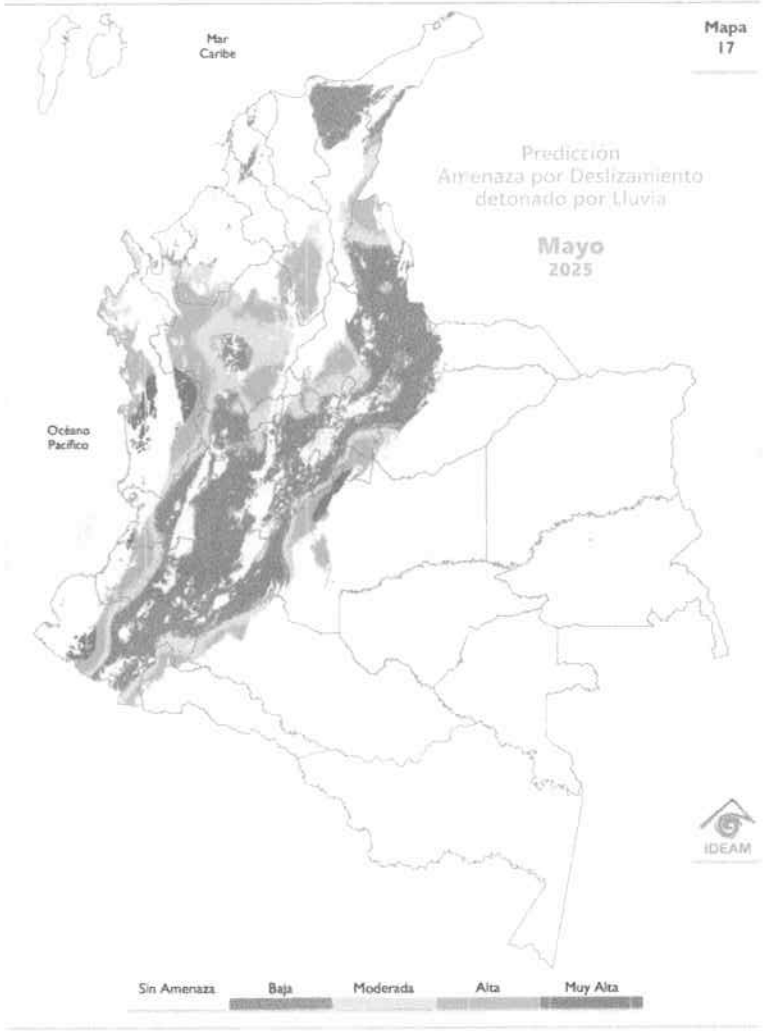

RECOMENDACIONES

Dadas las condiciones climáticas previstas para el territorio nacional en el mes de mayo, se prevé una alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunas zonas de ladera de la región Andina, especialmente en los departamentos del Eje Cafetero, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá. Asimismo, en la región Pacífica, el riesgo será mayor en zonas del centro y suroriente de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. En la región Caribe, se espera una mayor amenaza en el sur de Bolívar y Córdoba, mientras que, en la región de la Orinoquía y la Amazonia, el riesgo será más alto en sectores puntuales del occidente, particularmente en los Piedemontes Llanero y Amazónico, dentro de los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Putumayo y Caquetá.

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Eje Cafetero y Piedemontes. Por tanto, se recomienda al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener activos los planes de contingencia ante la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en áreas inestables y vulnerables que han presentado o presentan dinámicas actuales por condiciones de inestabilidad de laderas.

Dada la dinámica presentada actualmente, es preciso que los sectores de infraestructura vial, transporte, servicios públicos, recreación y demás, tengan en cuenta que se mantiene la amenaza por deslizamientos de tierra en áreas inestables de ladera en especial en los departamentos anteriormente indicados. Importante considerar la posible ocurrencia de avenidas torrenciales en las cuencas de alta pendiente ocasionadas por eventos extremos hidrometeorológicos locales. Se sugiere mantener la cobertura vegetal y la humedad en los suelos en zonas secas, para prevenir y mitigar los procesos de degradación de los suelos por erosión y salinización, en aquellas zonas donde se puede presentar déficit hídrico.

PREDICCIÓN INCENDIOS | MAYO 2025

Región Caribe

Se espera una condición alta en gran parte de la región Caribe en los departamentos de Córdoba, Sucre, La Guajira, Magdalena, Cesar y el sur del Atlántico. Se prevé una condición moderada en San Andrés y Providencia, la sección media de la Sierra Nevada de Santa Marta y noroccidente del departamento de Norte de Santander.

Región Andina

Se prevé una condición alta en el sur de Cesar y Bolívar, suroriente de Norte de Santander, oriente de Santander, norte y centro del departamento de Tolima y Huila; una condición moderada en la mayor parte de Norte de Santander y Santander, en el Eje Cafetero en los departamentos de Antioquia, Caldas y Quindío, así como en Huila y Tolima; una condición baja en las demás áreas que compone la región.

Región Pacífica

Se prevé una condición entre alta y moderada para el norte del Chocó; y una condición baja al norte de Chocó y Nariño, y una condición muy baja al centro y sur del departamento del Chocó, Cauca, y sin información en el resto del área que compone el departamento de Cauca.


Región Orinoquía

Se prevé condición alta para el departamento de Arauca y Casanare en su mayoría y norte del departamento del Vichada; y una condición moderada para el área norte del departamento del Meta y, centro y sur del departamento del Vichada.

Región Amazonía

Se prevé condición moderada en una zona muy puntual ubicada en el noroniente y norte de la región; con excepción de una zona entre Guaviare, Caquetá y Vaupés donde se presenta una condición muy baja, para el resto de la región se presenta una condición baja.

Mapa 18

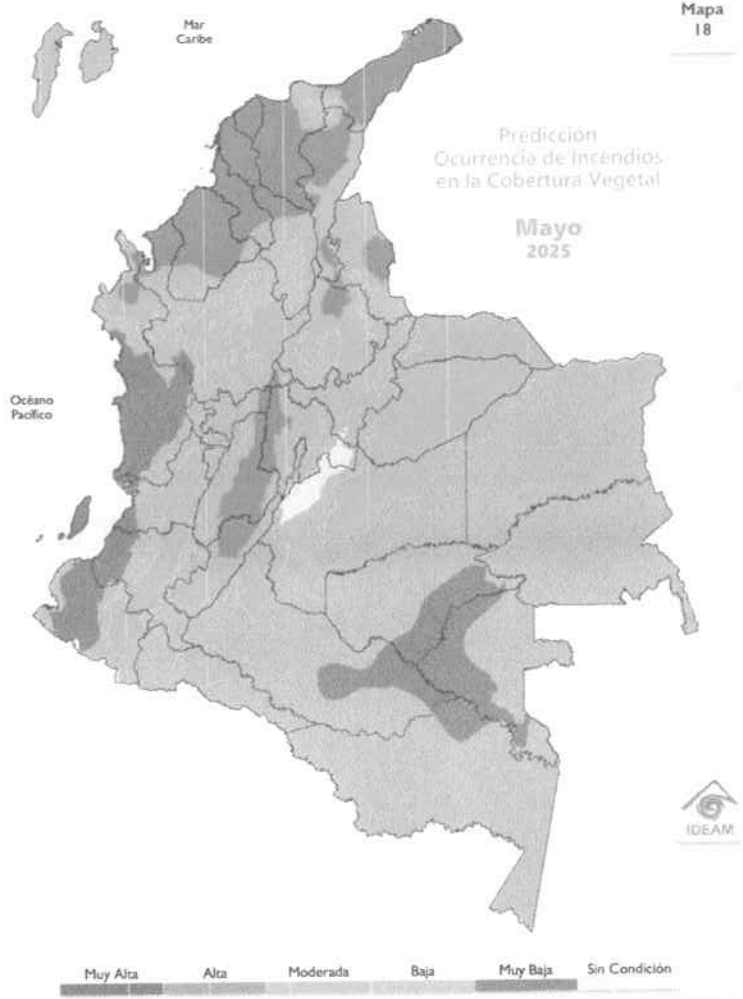

RECOMENDACIONES

A la comunidad en general, turistas y caminantes, apagar debidamente las fogatas y colillas encendidas, no dejar residuos de materiales tipo vidrio u otros elementos que permitan concentrar la radiación, igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.

A los Consejos de Gestión de Riesgo de Desastres Departamentales Distritales y Municipales (Art 15 de la Ley 1523), y a las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos, especialmente en áreas de reserva forestal y de Parques Nacionales Naturales.

A los sistemas regionales y locales de bomberos disponer de los elementos y la logística necesaria para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal.

A las personas que realizan quemas abiertas controladas para actividades agrícolas y mineras, se les recuerda que, para permitir se realización, deben cumplir con los requisitos, términos y condiciones establecidos en la Resolución No. 532 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para ampliar la información sobre la ocurrencia diaria de incendios de la cobertura vegetal visite el siguiente enlace:

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/informe-diario-de-incendios

PROBABILIDAD MUY ALTA
La humedad disponible en la vegetación presente y las precipitaciones esperadas en el mes son escasas, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son altos, lo cual favorece la propagación del fuego.

PROBABILIDAD ALTA
La humedad disponible en la vegetación presente y las precipitaciones esperadas en el mes son escasas, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son altos, lo cual favorece la propagación del fuego.

PROBABILIDAD MODERADA
Hay disponibilidad de humedad para la vegetación presente, pero las precipitaciones esperadas en el mes son escasas, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son altos, lo cual favorece la propagación del fuego.

PROBABILIDAD BAJA
Hay disponibilidad de humedad para la vegetación presente y se esperan algunas precipitaciones en el mes, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son bajos, lo cual influye en alguna medida la propagación del fuego o viceversa.

PROBABILIDAD MUY BAJA
La humedad disponible para la vegetación presente es muy escasa, se esperan precipitaciones altas en el mes, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son muy bajos, lo cual no favorece la propagación del fuego.

SIN CONDICIÓN
Se esperan niveles con valores en el rango de los mínimos para que se desarrollen incendios en la vegetación respecto a los valores históricos del mes.

RECOMENDACIONES





Sistema Nacional de Riesgo de Desastres

Se recomienda tener en cuenta la última salida del modelo probabilístico del Ideam, que favorece la categoría por **debajo de lo normal** durante el trimestre mayo-junio-julio, que hará parte de las temporadas de lluvias y menos lluvias en las regiones de comportamiento monomodal y bimodal del territorio nacional.

Estar atentos ante la posible ocurrencia y propagación de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina.



Sector transporte

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se puede iniciar o evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Santander, Cundinamarca, Huila, Meta, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena, así como en el Eje Cafetero y piedemontes.



Sector agropecuario y ganadero

Todas las recomendaciones necesarias con respecto a efectos y recomendaciones para el sector agropecuario por regiones y departamentos, las podrá encontrar en el enlace:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico

Sector salud


Evite la exposición directa al Sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo. La exposición al Sol sin protección es nociva, ya que produce manchas en la piel, envejecimiento, problemas oculares y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en la piel. Las recomendaciones en relación con las enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y enfermedad diarreica aguda, las podrá encontrar en:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-clima-y-salud



Sector energético

Realizar una operación adecuada del recurso hídrico, puesto que en términos generales se estiman volúmenes de lluvia entre los valores **normales** y **por encima de esta condición** sobre amplias extensiones de las cuencas de interés durante mayo-junio y julio.

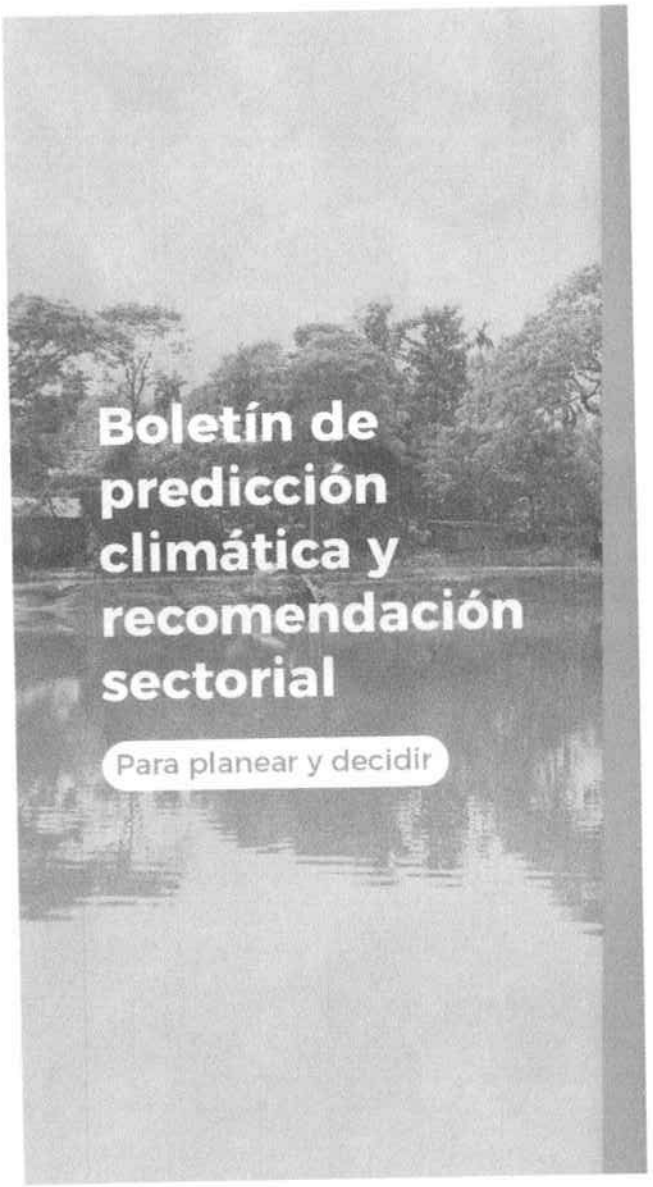

Boletín de predicción climática y recomendación sectorial

Para planear y decidir

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

DIRECTIVOS

Ghisliane Echeverry Prieto
Directora General

Ingrid Tatiana Sierra
Subdirectora de Meteorología

AUTORES

Julieta Serna Cuenca
Coordinación del boletín
Grupo de Climatología y Agrometeorología
Subdirección de Meteorología

Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima
Predicción Climática Nacional
Subdirección de Meteorología

Nelsy Verdugo
Comportamiento hidrológico
Subdirección de Hidrología

Luis Mario Moreno
Cesar Valbuena
Incendios de la cobertura vegetal
Subdirección de Ecosistemas

Nubia Traslaviña
Suelos y deslizamientos
Subdirección de Ecosistemas

Apoyo Técnico
Subdirección de Meteorología

Julieta Serna Cuenca
Edición y Diagramación
Subdirección de Meteorología



ANEXOS DE SOPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

- Página de internet **The Waether Channel**

Tiempo mensual - Valle del Guamuez, Putumayo, Colombia

A partir de las 09:41 GMT-05:00

< Abr. | May ▾ 2025 ▾ Vista | Jun. >

SOL	LUN	MAR	MIÉ	JUE.	VIE	SÁB
27	28	29	30	1	2	3
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--
4	5	6	7	8	9	10
--	--	--	--	26°	30°	28°
--	--	--	--	19°	20°	20°
11	12	13	14	15	16	17
25°	25°	26°	26°	25°	27°	28°
19°	19°	19°	20°	19°	19°	20°
18	19	20	21	22	23	24
30°	25°	29°	27°	28°	27°	25°
20°	19°	20°	19°	20°	20°	19°
25	26	27	28	29	30	31
24°	26°	28°	28°	26°	24°	25°
20°	19°	20°	20°	20°	19°	20°


Tiempo mensual - Valle del Guamuez, Putumayo, Colombia

A partir de las 09:54 GMT-05:00

< Mayo | Jun ▾ 2025 ▾ Vista | Jul. >

SOL	LUN	MAR	MIÉ	JUE.	VIE	SÁB
1 23° 19°	2 25° 19°	3 24° 19°	4 26° 19°	5 26° 19°	6 24° 19°	7 30° 20°
8 28° 19°	9 28° 20°	10 27° 19°	11 28° 19°	12 27° 19°	13 28° 19°	14 28° 19°
15 29° 19°	16 28° 19°	17 26° 18°	18 26° 18°	19 28° 18°	20 26° 18°	21 Promedio -- --
22 Promedio -- --	23 Promedio -- --	24 Promedio -- --	25 Promedio -- --	26 Promedio -- --	27 Promedio -- --	28 Promedio -- --
29 Promedio -- --	30 Promedio -- --	1 Promedio -- --	2 Promedio -- --	3 Promedio -- --	4 Promedio -- --	5 Promedio -- --

- Página de internet **Accuweather**

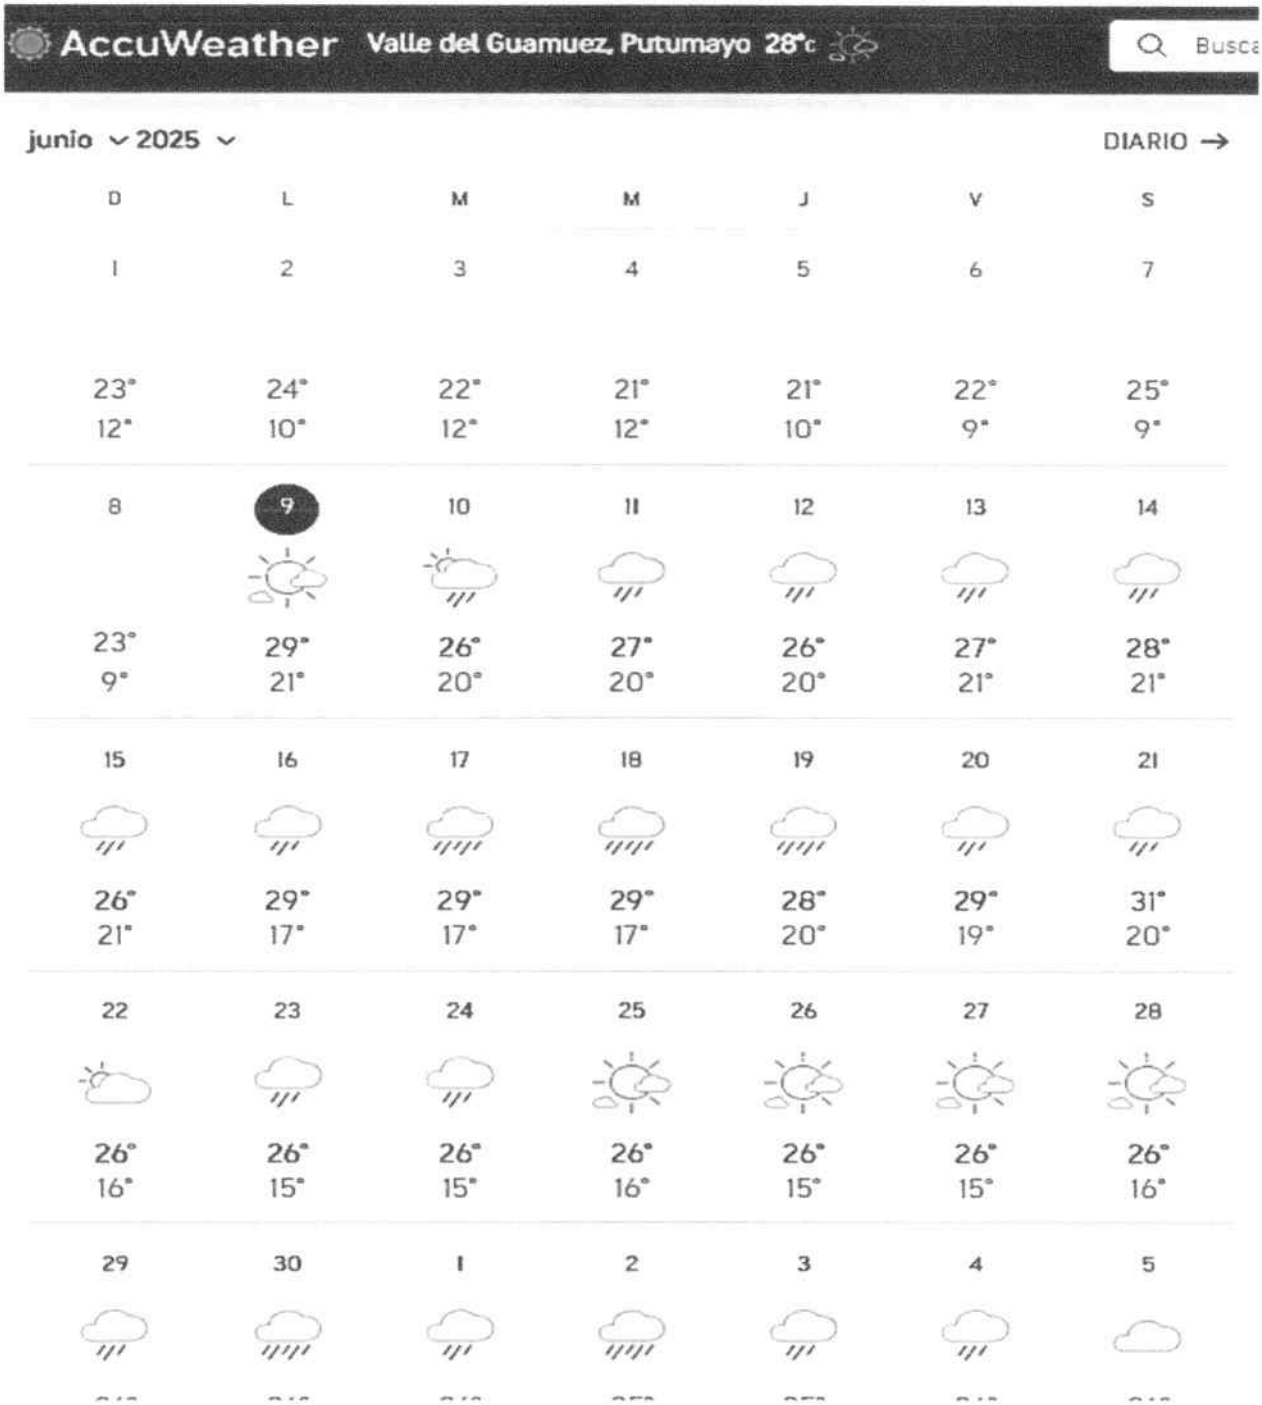

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 28°c Busc

julio 2025 DIARIO →

D	L	M	M	J	V	S
29	30	1	2	3	4	5
26° 15°	26° 15°	26° 15°	25° 15°	25° 16°	26° 15°	26° 16°
6	7	8	9	10	11	12
26° 15°	26° 15°	25° 16°	25° 15°	26° 15°	26° 16°	26° 15°
13	14	15	16	17	18	19
25° 15°	26° 15°	26° 15°	26° 15°	26° 16°	26° 15°	26° 15°
20	21	22	23	24	25	26
26° 15°	29° 17°	28° 16°	29° 17°	29° 17°	28° 17°	28° 16°
27	28	29	30	31	1	2
29° 16°	29° 17°	30° 16°	31° 16°	31° 17°	29° 17°	28° 16°

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22°c

Busc

LUN. 9/6  **26°** /20° 40 %

Momentos de nubes y sol, con chaparrón con tormenta eléctrica en determinados lugares

RealFeel®	**31°**	Índice UV máx.	**10 (Poco saludable)**
RealFeel Shade™	**26°**	Viento	**ONO 6 km/h**

MAR. 10/6  **26°** /20° 48 %

No se descarta la probabilidad de un chaparrón en la mañana, con considerable nubosidad seguido de intervalos de nubes y sol

RealFeel®	**30°**	Índice UV máx.	**4 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**27°**	Viento	**S 6 km/h**

MIÉ. 11/6  **26°** /21° 60 %

Mayormente nublado, con lluvias leves en la tarde

RealFeel®	**31°**	Índice UV máx.	**7 (Poco saludable (sensible))**
RealFeel Shade™	**27°**	Viento	**SO 6 km/h**

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22°C

JUE.
12/6

27° /22°

65 %

Lluvias leves en la mañana; nublado

RealFeel®	28°	Índice UV máx.	6 (Poco saludable (sensible))
RealFeel Shade™	27°		
		Viento	O 7 km/h

VIE.
13/6

28° /17°

63 %

Nublado y húmedo; tormenta eléctrica en partes de la zona en la mañana seguido de lluvias leves en la tarde

RealFeel®	35°	Índice UV máx.	2 (Bueno)
RealFeel Shade™	35°	Viento	N 2 km/h

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22°C

SÁB.
14/6

29° /17°

60 %

Húmedo, con períodos de lluvia

RealFeel®	36°	Índice UV máx.	2 (Bueno)
RealFeel Shade™	34°	Viento	E 4 km/h

DOM. 15/6  **29°** /17°

62 %

Lluvias leves en la mañana; nublado

RealFeel®	**35°**	Índice UV máx.	**5 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**33°**	Viento	**E 4 km/h**

LUN. 16/6  **30°** /20°

60 %

Períodos de lluvia

RealFeel®	**35°**	Índice UV máx.	**6 (Poco saludable (sensible))**
RealFeel Shade™	**32°**		
		Viento	**SE 2 km/h**

MAR. 17/6  **32°** /21°

57 %

Mayormente nublado y muy cálido, con lluvias leves

RealFeel®	**37°**	Índice UV máx.	**5 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**34°**	Viento	**ENE 2 km/h**

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22°C Busc

MIÉ. 18/6  **31°** /19°

60 %

Períodos de lluvia

RealFeel®	**36°**	Índice UV máx.	**10 (Poco saludable)**
RealFeel Shade™	**34°**	Viento	**NNE 2 km/h**

JUE. 19/6  **26°** /15° 70 %

Períodos de lluvia en la mañana; nubosidad considerable

RealFeel®	**29°**	Índice UV máx.	**3 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**28°**	Viento	**NNO 2 km/h**

VIE. 20/6  **25°** /15° 63 %

Lluvias regulares

RealFeel®	**28°**	Índice UV máx.	**3 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**28°**	Viento	**ONO 2 km/h**

SÁB. 21/6 **26°** /16° 40 %

Nublado, no se descarta la probabilidad de un chaparrón

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**3 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**26°**	Viento	**N 2 km/h**

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22°C Busc

DOM. 22/6  **26°** /15° 55 %

Nublado; lluvias leves en la mañana seguido de un par de chaparrones en la tarde

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**2 (Bueno)**
RealFeel Shade™	**27°**	Viento	**NO 2 km/h**

LUN. 23/6  **26°** /15° 56 %

Nublado; un par de chaparrones en la mañana, luego lluvias leves en la tarde

RealFeel®	**26°**	Índice UV máx.	**2 (Bueno)**
RealFeel Shade™	**26°**	Viento	**NO 4 km/h**

MAR. 24/6  **26°** /15° 60 %

Períodos de lluvia

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**2 (Bueno)**
RealFeel Shade™	**27°**	Viento	**NO 4 km/h**

MIÉ. 25/6  **26°** /15° 56 %

Lluvias leves en la mañana; mayormente nublado

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**4 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**25°**	Viento	**OSO 4 km/h**

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22° Busc

JUE. 26/6  **26°** /15° 60 %

Mayormente nublado; lluvias leves en la mañana, luego no se descarta la probabilidad de un chaparrón en la tarde

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**3 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**26°**	Viento	**NO 2 km/h**

VIE. 27/6  **26°** /16° 59 %

Bastante nublado, con chaparrones

RealFeel®	27°	Índice UV máx.	4 (Moderado)
RealFeel Shade™	26°	Viento	NO 2 km/h

SÁB. 28/6  **25°** /15° 64 %

Nublado, con chaparrones localizados

RealFeel®	26°	Índice UV máx.	2 (Bueno)
RealFeel Shade™	26°	Viento	ONO 4 km/h

DOM. 29/6  **26°** /15° 63 %

Lluvioso

RealFeel®	27°	Índice UV máx.	2 (Bueno)
RealFeel Shade™	26°	Viento	NO 6 km/h

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22°C Buscar

LUN. 30/6  **25°** /15° 61 %

Lluvias aisladas

RealFeel®	27°	Índice UV máx.	2 (Bueno)
RealFeel Shade™	27°	Viento	NNO 4 km/h

MAR. 1/7 **26°** /15°

20 %

Varias horas de sol

RealFeel®	**30°**	Índice UV máx.	**10 (Poco saludable)**
RealFeel Shade™	**25°**	Viento	**OSO 2 km/h**

MIÉ. 2/7  **26°** /15°

25 %

Nubes y sol

RealFeel®	**28°**	Índice UV máx.	**4 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**26°**	Viento	**NE 4 km/h**

JUE. 3/7  **26°** /15°

63 %

Chaparrones en la mañana; mayormente nublado

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**3 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**26°**	Viento	**NO 4 km/h**

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22°c Busc

VIE. 4/7  **26°** /15°

25 %

Nubes y sol

RealFeel®	**28°**	Índice UV máx.	**6 (Poco saludable (sensible))**
RealFeel Shade™	**25°**	Viento	**O 4 km/h**

SÁB. 5/7  **26°** /16° 56 %

Nublado, con lluvias leves en la tarde

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**4 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**26°**	Viento	**O 4 km/h**

DOM. 6/7  **25°** /15° 55 %

Nublado, con lluvias leves

RealFeel®	**26°**	Índice UV máx.	**3 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**25°**	Viento	**NO 2 km/h**

LUN. 7/7  **26°** /15° 58 %

Cubierto, con lluvias leves en la tarde

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**4 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**26°**	Viento	**ONO 2 km/h**

MAR. 8/7  **25°** /16° 63 %

Lluvioso

RealFeel®	**26°**	Índice UV máx.	**2 (Bueno)**
RealFeel Shade™	**25°**	Viento	**ONO 4 km/h**

MIÉ. 9/7  25° /15° 65 %

Nubosidad considerable, con chaparrones localizados

RealFeel®	27°	Índice UV máx.	4 (Moderado)
RealFeel Shade™	26°	Viento	NO 4 km/h

JUE. 10/7  26° /15° 55 %

Nubosidad considerable; lluvias leves en la mañana, luego no se descarta la probabilidad de un chaparrón en la tarde

RealFeel®	27°	Índice UV máx.	3 (Moderado)
RealFeel Shade™	26°	Viento	O 2 km/h

VIE. 11/7 26° /16° 20 %

Soleado con algo de nubosidad

RealFeel®	30°	Índice UV máx.	10 (Poco saludable)
RealFeel Shade™	25°	Viento	NNE 4 km/h

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22°C Busc

SÁB. 12/7  26° /15° 59 %

Chaparrón pasajero en la mañana, por otra parte nubes y sol

RealFeel®	30°	Índice UV máx.	9 (Poco saludable)
RealFeel Shade™	26°	Viento	NO 2 km/h

DOM. 13/7  **26°** /15° 74 %

Mayormente nublado; chaparrón pasajero en la mañana seguido de lluvia en la tarde

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**3 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**27°**	Viento	**NO 4 km/h**

LUN. 14/7  **26°** /15° 62 %

Lluvia

RealFeel®	**26°**	Índice UV máx.	**3 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**26°**	Viento	**ONO 6 km/h**

MAR. 15/7  **26°** /15° 67 %

Nublado, con lluvia en descenso

RealFeel®	**28°**	Índice UV máx.	**2 (Bueno)**
RealFeel Shade™	**27°**	Viento	**NNO 4 km/h**

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 22°C Busc

MIÉ. 16/7 **26°** /15° 25 %

Mayormente nublado

RealFeel®	**27°**	Índice UV máx.	**3 (Moderado)**
RealFeel Shade™	**25°**	Viento	**OSO 2 km/h**

JUE. 17/7  **26°** /16° 25 %

Momentos de nubes y sol

RealFeel®	29°	Índice UV máx.	6 (Poco saludable (sensible))
RealFeel Shade™	26°		
		Viento	NO 4 km/h

VIE. 18/7 **29°** /18° 25 %

Momentos de nubes y sol

RealFeel®	29°	Índice UV máx.	10 (Poco saludable)
RealFeel Shade™	27°	Viento	SE 11 km/h

SÁB. 19/7  **28°** /18° 25 %

Momentos de nubes y sol

RealFeel®	30°	Índice UV máx.	10 (Poco saludable)
RealFeel Shade™	27°	Viento	ESE 11 km/h

AccuWeather Valle del Guamuez, Putumayo 29°C Busc

DOM. 20/7  **26°** /15° 57 %

Lluvias leves en la mañana; considerable nubosidad

RealFeel®	28°	Índice UV máx.	4 (Moderado)
RealFeel Shade™	26°	Viento	NNO 4 km/h

LUN.
21/7



29° /17°

5 %

Soleado la mayor parte del día

RealFeel®	**30°**	Índice UV máx.	**10 (Poco saludable)**
RealFeel Shade™	**27°**	Viento	**ESE 15 km/h**

MAR.
22/7

28° /16°

13 %

Parcialmente soleado

RealFeel®	**29°**	Índice UV máx.	**10 (Poco saludable)**
RealFeel Shade™	**27°**	Viento	**ESE 13 km/h**

La Hormiga Valle del Guamuez, 05 de junio del 2025

Señor
RICARDO ROMERO LOPEZ
Identificado con C.C. No. 12.992.771 de Pasto (N)
Contratista de Obra

Asunto: Citación a comité técnico

Ref. Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 del 08 de mayo del 2025, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA MIRAVALLE MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.

Cordial saludo,

La Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio Valle del Guamuez – Putumayo solicita contar con su presencia el día lunes 09 de junio de 2025 a las 10:00 AM de manera personal en nuestras oficinas, para tratar temas referentes Solicitud de Prorroga en tiempo y proyección del Otro Si No. 1 necesarios para solucionar los inconvenientes presentados en la ejecución del presente contrato de la referencia, manifestado para el Contrato de Obra No. Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 del 08 de mayo del 2025.

Por la atención y colaboración prestada a esta solicitud anticipo sinceros agradecimientos.

Cordialmente,

HERNANDO BLADIMIR CABRERA O.
Secretario De Planeación Y Obras Públicas
Supervisor

Proyectó: Mario Leandro Ojeda
Apoyo profesional SPOPM

ACTA DE COMITE TECNICO No. 1

ACTA No:	01
FECHA:	09 de junio del 2025
CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 DEL 08 DE MAYO DEL 2025
CONTRATISTA DE OBRA:	RICARDO ROMERO LOPEZ Identificado con C.C. No. 12.992.771 de Pasto (N)
OBJETO:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA MIRAVALLE MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ	Secretario de Planeación y Obras (Supervisor)	Alcaldía De Valle del Guamuez.
MARIO LENADRO OJEDA	Apoyo Profesional SPOPM	Alcaldía De Valle del Guamuez.
RICARDO ROMERO LOPEZ	Representante legal	Contratista de Obra

OBJETIVO:

- Hacer seguimiento al estado actual de la ejecución de la obra dando cumplimiento a los aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales, ambientales en cuanto a los diseños y especificaciones técnicas contenidas en las obligaciones generales y especificas del contrato de obra.

TEMAS A TRATAR:

- Saludo y presentación por parte de los participantes.
- Tratar temas referentes a la solicitud de Solicitud de Prorroga en tiempo y proyección del Otro Si No. 1 necesarios para solucionar los inconvenientes presentados en la ejecución del presente contrato de la referencia.

DESARROLLO DEL ACTA

1. Siendo las 10:10 A.M. del día nueve (09) de junio de 2025 se empieza el comité técnico con el saludo de bienvenida por parte del Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio Valle del Guamuez, el ingeniero **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**; Supervisor del **CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 DEL 08 DE MAYO DEL 2025**, donde manifiesta la disponibilidad por parte de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal, para cooperar en la solución de inconvenientes y de esta manera lograr un buen desarrollo y culminación de las obras.

2. El señor **RICARDO ROMERO LOPEZ,** Contratista según CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 del 08 de mayo del 2025, manifiesta que mediante oficio de fecha 04 de junio de 2025 realizado de su parte

Argumenta que durante la ejecución de las actividades del Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025, La fecha de terminación del contrato está programada para el día 13 de junio de 2025, tiempo insuficiente para la culminación y cumplimiento del alcance contractual, lo que conlleva a la necesidad de realizar y presentar una reprogramación de obra acorde a los tiempos necesarios para culminar el total de actividades contractuales, de acuerdo a lo pactado en el presupuesto contractual, especificaciones técnicas y obligaciones contenidas en la minuta contractual de la obra.

Es necesario mencionar que se ha presentado limitaciones para la logística de la ejecución de la obra y restricción que no han permitido ejecutar con normalidad dicho contrato como lo es: las malas condiciones climáticas, que han retrasado considerablemente la ejecución de la obra para el cumplimiento del objeto contractual en el plazo acordado, donde es una situaciones no prevista y no han sido responsabilidad en la ejecución de la obra por parte del contratista, y tampoco pudo ser planificada por parte del ente contratante.

En el mes pasado y lo que va transcurrido del presente, se vienen registrando periodos de lluvias prolongados, los cuales afectan de manera considerable el rendimiento de las actividades en campo; dentro de algunas de las actividades, entre las cuales están se clasifican de la siguiente manera:

Localización Y Replanteo y Excavación Mecánica En Material Común, estas actividades no se han empezado a ejecutar debido a que su proceso requiere intervenir el área asignada en los planos, y teniendo en cuenta que este tanque sedimentador que se realizara dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Rural Miravalle Sede Principal, al realizar esta excavación en sitio en este periodo de lluvias intensas presentadas desde el mes de mayo y teniendo en cuenta que es una excavación mecánica con una profundidad total de 2.8 mt sería un riesgo tanto para los obreros que se encuentre dentro de la excavación, como también para la población estudiantil que se encuentre alrededor, y que posiblemente se puedan presentar deslizamientos de los taludes, aun teniendo previsto que la excavación se hará en forma trapezoidal, que conllevara un sobreancho en la parte superficial con una correspondiente pendiente, así mismo se desea evitar que por el tiempo que ha transcurrido por las lluvias intensas hasta el dia de hoy en el sitio de la obra, ha impedido laborar normalmente, adicionalmente y de acuerdo a la topografía del terreno donde se construirá, es una zona baja que se ha estado inundando constantemente por las aguas de escorrentía provenientes de las lluvias.

En cuanto al Suministro E Instalación De Concreto Ciclópeo y el Suministro E Instalación De Concreto 3000 Psi Para Construcción De Tanque Sedimentador, no se han logrado empezar debido a que se deben hacer en el sitio indicado en planos y no se ha podido realizar una previa construcción o armada de la formaleta en madera tanto para el concreto ciclópeo, como también para la estructura del tanque sedimentador y que posteriormente se pueda aplicar la mezcla de los concretos, con su tiempo de fragüe y se obtenga la resistencia requerida que es de 3000 PSI.

Se *Anexa el Boletín de predicción climática y recomendación sectorial del IDEAM*, así mismo se anexan los estados del tiempo en el mes de mayo y del pronóstico del mes de junio en la página de internet The Waether Channel, información que se puede confirmar en el siguiente

link.https://weather.com/esHN/tiempo/mensual/l/d34d05da0b50d5a5ac4954f85e587f87217d5eaf201720f188d7a6cfbb1b7e54

Y se anexa el pronóstico del mes de junio y julio en la página de internet Accuweather información que se puede confirmar en los siguientes links.

https://www.accuweather.com/es/co/valle-del-guamuez/1863641/june-weather/1863641

https://www.accuweather.com/es/co/valle-del-guamuez/1863641/daily-weather forecast/1863641

Por otra parte, lo que corresponde a las actividades del El Acero De Refuerzo De 60000 Psi y del Suministro E Instalación Malla Electrosoldada 5mm 2.35 X 6.00 M, estas ya SE adquirieron, pero no se ha llevado a obra porque no se ha dispuesto al personal para empezar, a condicionar el área precisamente por el mal estado del tiempo o malas condiciones climáticas presentadas, desde el 14 de mayo del 2025 fecha de inicio de labores, y teniendo en cuenta que la totalidad del acero de refuerzo y de la malla se tiene que armar dentro de la Excavación que no se podido realizar por lo expuesto anteriormente

Es de esta manera que muy formalmente solicitamos a usted que sea pertinente conceder una prórroga en tiempo de 45 días calendario para la terminación a satisfacción de las actividades contractuales de la obra, recordando las actividades contractuales contenidas en el presupuesto del contrato, debe cumplirse las recomendaciones y procedimiento a ejecutar en cada estos ítems que están determinadas en el anexo de las especificaciones técnicas y obligaciones contenidas no solo en el proyecto, sino también basado, en el estudio previo, pliegos e condiciones para la Contratación de Mínima Cuantía No. IMC-020-2025 y minuta contractual del Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025.

3. El ingeniero **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** Supervisor del **CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 DEL 08 DE MAYO DEL 2025** manifiesta que es necesario realizar una Visita al sitio de la obra, revisar el estado actual del avance de ejecución de las actividades contractuales, y comenzar adelantar la correspondiente documentación necesaria según lo mencionado y acordado en el presente comité toda vez que influye en el normal desarrollo de las obras en calidad, cantidad y seguridad de esta.

4. Siendo las 10:40 A.M por parte del secretario de Planeación Municipal y el Contratista de Obra se procede a dirigirse a campo a constatar lo mencionado en el presente comité.

5. Una vez verificada en obra que las situaciones presentadas en la solicitud del contratista de obra, son reales, el ingeniero **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**, da viabilidad y se procede a realizar la documentación pertinente para la modificación del contrato y prórroga del Contrato de Obra.

6. Que en razón a que se realiza una modificación en tiempo es necesario efectuar una prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendario para la ejecución de las actividades contractuales faltantes a partir de la fecha de la última terminación del contrato.

Al finalizar las partes se reúnen para determinar los acuerdos.

ACUERDOS
• Solicitar al ordenador del gasto autorización y a quien corresponda para realizar la Modificación de la Cláusula 12. Plazo, del **CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 DEL 08 DE MAYO DEL 2025.**
• Se acuerda ampliar el plazo del **CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 DEL 08 DE MAYO DEL 2025,** por Cuarenta Y Cinco (45) Días calendario más a partir de la última fecha de terminación de los contratos.
• Suscribir el Otro Si No. 1 para el **CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 DEL 08 DE MAYO DEL 2025,** donde quede suscrita y aprobada esta modificación solicitada.

Para constancia se firma la presenta acta en La Hormiga Municipio Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo, por quienes en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de junio del 2025.

POR EL CONTRATISTA	POR LA SUPERVISIÓN
RICARDO ROMERO LOPEZ **C.C. No. 12.992.771 de Pasto (N)**	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**
Contratista Según Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 Del 08 De Mayo Del 2025	Secretario De Planeación Y Obras Públicas

Proyectó: Mario Leandro Ojeda
Apoyo Profesional SPOPM

Valle del Guamuez (P), 09 de junio del 2025

CONCEPTO DE VIABILIDAD:

El suscrito Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio Valle del Guamuez, teniendo en cuenta la solicitud de fecha del 04 de junio del 2025, por parte del señor RICARDO ROMERO LOPEZ contratista, según el Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 Del 08 De Mayo Del 2025, Solicitando Prorroga en tiempo y proyección del Otro Si No. 1 necesarios para solucionar los inconvenientes presentados en la ejecución del Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 Del 08 De Mayo Del 2025. Además de lo constatado en visita a obra realizada durante el comité técnico No. 1, concluye que es posible realizar la modificación solicitada, ya que estas no afectan la estabilidad ni la calidad de la obra a ejecutar, además de la necesidad de la suscripción del Otro Si No. 01 en la cual se confirme la modificación realizada.

Se otorga la viabilidad para la realización de la modificación solicitada, para la proyección y aprobación del Otro Si No. 1, del Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 Del 08 De Mayo Del 2025.

Por lo tanto, se avala la solicitud hecha a esta supervisión, y considera que el tiempo de prorroga a conceder sería de Cuarenta Y Cinco (45) Días Calendario, contados a partir de la última fecha de terminación establecida del Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025.

Para constancia se firma en el municipio de Valle del Guamuez a los nueve (09) días del mes junio del 2025.

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
Supervisor

Proyectó: Mario Leandro Ojeda
Apoyo Profesional SPOPM

Valle del Guamuez - Putumayo, 09 de junio de 2025

Señor
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Alcalde (D) Municipio Valle del Guamuez
Según Decreto No. 087 del 31 de Mayo del 2025
Ordenador Del Gasto
Ciudad

Ref. CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 DEL 08 DE MAYO DEL 2025, cuyo Objeto es: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA MIRAVALLE MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.

Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PRORROGA DEL PLAZO Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 12 PLAZO DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Mediante el presente se informa que, en el marco de la ejecución del Contrato en referencia, el Contratista de la Obra el señor RICARDO ROMERO LOPEZ contratista, según el Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 Del 08 De Mayo Del 2025, Solicitando Prorroga en tiempo y proyección del Otro Si No. 1 necesarios para solucionar los inconvenientes presentados en la ejecución del Contrato De Obra No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 Del 08 De Mayo Del 2025. Además de lo constatado en visita a obra realizada durante el comité técnico No. 1, concluye que es posible realizar la modificación solicitada, ya que estas no afectan la estabilidad ni la calidad de la obra a ejecutar, además de la necesidad de la suscripción del Otro Si No. 01 en la cual se confirme la modificación realizada, con lo cual se sustenta la necesidad de adelantar el Otro Si No. 1 para el contrato de obra, por lo tanto en el Comité Técnico No. 01 realizado el día 09 de junio del 2025, se identificó que la alternativa que permite mayor agilidad para surtir dicho proceso es realizar una prorroga en tiempo al contrato en referencia y se considera oportuna la Modificación de la Cláusula 12. Plazo para el SPOPM-CO-IMC-308-2025 Del 08 De Mayo Del 2025, por tal razón se solicita que como ordenador del gasto se autorice la suscripción de Otro Si No. 01.

Así mismo se prorrogue el tiempo por el término de Cuarenta Y Cinco (45) días calendario más, a partir de la última fecha de terminación del contrato, para que el contratista de la obra realice la culminación a satisfacción de las actividades contractuales.

Agradecemos su colaboración

Cordialmente,

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario Planeación y Obras Públicas Municipal
Supervisor

Proyectó: Mario Leandro Ojeda
Apoyo Profesional SPOPM

Anexo:
- Oficio de fecha del 09 junio del 2025 (37 folios)
- Citación a comité técnico por parte de la Supervisión (01 folio)
- Acta de Comité Técnico No. 1 (03 folios)
- Concepto de viabilidad de la Supervisión (01 folio)

La Hormiga (Valle del Guamuez), 09 de junio del 2025

Ingeniero
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Secretario Planeación Y Obras Publicas
Municipio Valle del Guamuez
Ciudad.

Ref. CONTRATO DE OBRA No. SPOPM-CO-IMC-308-2025 DEL 08 DE MAYO DEL 2025, cuyo Objeto es: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA MIRAVALLE MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.

Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PRORROGA DEL PLAZO Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 12 PLAZO DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

Cordial saludo,

Por medio del presente y en calidad de ordenador del gasto se autoriza la suscripción de Otro Si No. 01 para la prorroga en tiempo por el término de Cuarenta Y Cinco (45) días calendario y Modificación de la Cláusula 12. Plazo para el contrato en referencia. Teniendo en cuenta la justificación mencionada en el oficio de solicitud y soportes adjuntos.

Cordialmente,

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
Alcalde (D) Municipio Valle del Guamuez
Según Decreto No. 087 del 31 de Mayo del 2025
Ordenador Del Gasto

Reviso: Eneida Patricia Queta Gomez
Asesora de Despacho Municipal
