DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3661-2024
Periodo:	DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4622 del 02 de OCTUBRE de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

01. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda el Cural, en el corredor vial denominado Vía vereda el Cural – Utica (Vía que comunica del municipio de Caparrapí – Utica – Sector Vereda Puente Río Pata hasta el tramo El cascajal en la vereda El Cural) que tiene una longitud de atención 0,23 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía que comunica del municipio de Caparrapí – Utica – Sector Vereda Puente Río Pata, y el punto final de referencia es PR0+230 El cascajal en la vereda El Cural, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

02. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Córdoba, en el corredor vial denominado vía Córdoba, sector obra los Viejitos hasta la Quebrada la Morena municipio de Caparrapí, con una longitud de atención de 0.16km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Córdoba sector los Viejitos, y el punto final de referencia es PR0+160 vía Córdoba, sector

Quebrada la Morena, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

03. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PEÑALOSA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Peñaloza, en el corredor vial denominado Vía vereda Peñaloza-Utica, tramo comprendido en la vía que comunica del municipio de Caparrapí-Utica, sector vereda Peñaloza, que tiene una longitud de atención de 0,40km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía vereda Peñaloza Utica, y el punto final de referencia es PR0+400 en la Vía vereda Peñaloza-Utica, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

04. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TATI DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Tati, en el corredor vial denominado Vía San Carlos – Tati – Sector capote sitio Clavijo, siete vueltas intermedio, sitio donde la señora Nohora y quebrada de los indios municipio Caparrapí tiene una longitud de atención de 0,15km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía San Carlos, y el punto final de referencia es PR0+150 en la parte de la quebrada de los indios , conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

05. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Peñón del departamento de Cundinamarca en la vereda ENCANTADO, en el corredor vial denominado la vía El Florido, vía que comunica El Encantado al Florido, que tiene una longitud de atención de 0,26km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Tubo del acueducto veredal, y el punto final de referencia es PR0+260 en la parte de la vía el florido, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

06. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Peñón del departamento de Cundinamarca en la vereda la Aguada, en el corredor vial denominado Vía la Aguada entrada Talauta a la vereda curiche que tiene una longitud de atención de 0,30km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Finca sr Benjamín y el punto final de referencia es PR0+300 en la parte de Benjamín Bustos terminando la finca, conforme

a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

07. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO FRIODEL MUNICIPIO DE LA PALMA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda Rio Frio, en el corredor vial denominado Rio Frio y Naranjal, vía que comunica vereda Rio Frio con vereda Naranjal, que tiene una longitud de atención de 0,29km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 en la alcantarilla, y el punto final de referencia es PR0+290 en la parte entrada a la vereda Rio Frio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

08. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda el Barrancón, en el corredor vial denominado vía vereda de El Barrancón Alto de Cañas, tramo comprendido entre la vereda de El Barrancón con la vereda Alto de Cañas la cual conduce a la vía Central del municipio; especialmente el tramo entre el predio de la señora Janeth Mahecha hasta el predio del señor Raúl Marroquín, que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 predio señora Yanet Mahecha, y el punto final de referencia es PR0+220 en la parte de la predio del señor Raúl Marroquín, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

09. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda Loma en medio, en el corredor vial denominado vía que comunica la vereda de Loma en Medio con la Vía central del municipio, específicamente el tramo desde el sector conocido como las monas hasta la loma de cabao que tiene una longitud de atención de 3km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa de las monas, y el punto final de referencia es PR0+3000 en la parte que tiene inicio del ramal, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

10. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca en la vereda Siria, en el corredor vial denominado Vía interna vereda siria, en el tramo conocido como "La Laja" que tiene una longitud de atención de 0,25km, tomando como punto de inicio

de referencia el PR0+00 Escuela rural de Siria, y el punto final de referencia es PR0+250 en la parte baja de la Vía interna vereda siria, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

11. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca en la vereda palmar, en el corredor vial denominado Inspección de Cuatro Caminos a la Vereda el Palmar sector "Curva de Don Adán" tiene una longitud de atención de 0.2km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de Cuatro Caminos, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la Vereda el Palmar sector "Curva de Don Adán, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

12. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Términos, en el corredor vial denominado vía Honduras, vía que comunica las veredas de Honduras a Términos que tiene una longitud de atención de 0,34km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Honduras, y el punto final de referencia es PR0+340 en la vía Honduras, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

13. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Naranjal, en el corredor vía Capira denominado vereda Naranjal con el sector Capira y Loma Finca de los Andes que tiene una longitud de atención de 0,17km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vereda Naranjal con el sector Capira, y el punto final de referencia es PR0+170 en la vía Capira Loma Finca de los Andes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías

14. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda de Patatas, en el corredor vial denominado vía Patatas Guayabal en el sector (Loma esquina del colegio – hasta frente de don Chivagocha, placa huella con cunetas 0.2 km Vda Patatas) que comunica las veredas de Patatas, Pisco Chiquito, Alto de Micos,

Inspección de Guayabal del Peñón y Pisco Grande con el casco urbano (Vía alterna de la zona) que tiene una longitud de atención de 0,24km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía el colegio, y el punto final de referencia es PR0+240 en la Vía el colegio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

15. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Caquian, en el corredor vial denominado Vía Caquian alto, en la via que comunica las veredas de Caquian y San Antonio de Aguilera que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Caquian alto, y el punto final de referencia es PR0+200 en la vía Caquian alto, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

16. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Muchipay, en el corredor vial denominado Vía de la vereda Muchipay, que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vía vereda Muchipay, y el punto final de referencia es PR0+200 en la vía vereda Muchipay, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

17. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PURAY DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Puray, en el corredor vial denominado Yacopí - Llano Mateo Sector PURAY que tiene una longitud de 1.92 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Entrada de Eulisis, y el punto final de referencia es PR 1+920 Casa de Italo conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

18. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda La Glorieta, en el corredor vial denominado Yacopí-Ye Glorieta, vía que comunica el casco urbano de Yacopi con la inspección de Ibama, que tiene una longitud de atención de 2.5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco Urbano, y el punto final de referencia es PR 2+500 Inspección de Ibama, conforme

a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

19. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda la chapa, en el corredor vial denominado cruce vía ático-Escuela Chapa (Vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la Inspección de Llano Mateo) que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa de la señora Raquel, y el punto final de referencia es PR0+220 en la vereda la chapa, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

20. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Moray, en el corredor vial denominado Moray - Rio Ático sector placa huella Chapa -Rio Ático, vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de Aposentos que tiene una longitud de atención de 0.45 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco Urbano Yacopí, y el punto final de referencia es PR 0+450 Inspección rio negro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías

21. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda limonal, en el corredor vial denominado la vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de lbama que tiene una longitud de atención de 1,62km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Yacopí-ibama, y el punto final de referencia es PR1+620 en la Vía Yacopí Corregimiento Ibama sector Limonal, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

22. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Laguneta, en el corredor vial denominado Vía Yacopí-corregimiento Ibama vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de lbama que tiene una longitud de atención de 0,31km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Yacopí-Corregimiento Ibama, y el punto final de referencia es PR0+310 en la Vía Yacopí-Corregimiento Ibama sector la Escuela, conforme a la información

levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

23. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA IBAMA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la INSPECCIÓN DE IBAMA, en el corredor Vía Yacopí-corregimiento Ibama sector vía llanadas, en la vía que comunica el casco urbano de Yacopí con Ibama, que tiene una longitud de atención1.26 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco urbano Yacopí, y el punto final de referencia es PR 1+260 Inspección de Ibama, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

24. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA – MUNICIPIO DE QUIPILE: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quipile del departamento de Cundinamarca en la vereda La Argentina, en el corredor vial denominado Cuatro Caminos - La Joya, vía que comunica de la vereda Guadalupe sector 4 caminos a la vereda la Joya, que tiene una longitud de atención de 0.45 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 000 vereda Guadalupe sector 4 caminos, y el punto final de referencia es PR 0 + 450 Vereda la Joya, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

25. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL IMPARAL – MUNICIPIO DE SUPATÁ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Supatá del departamento de Cundinamarca en la vereda El Imparal, en el corredor vial denominado Vía Imparal (Vía que comunica El Colegio El Imparal con la Vereda Girón), con una longitud de recorrido de atención de 1.89 km, el punto de inicio de referencia PR 0 + 00 es la vía Vereda Girón y el punto final de referencia es el PR 1 + 089 en el Sector Colegio El Imparal; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

26. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PULISITO – MUNICIPIO DE PULÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la vereda Pulisito, en el corredor vial denominado Vía Sector Villamarta – Vía que de la planta de gas conduce a la vía el chocho, tiene una longitud de 1.5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 vía sector Villamarta y el punto final de referencia el PR 1 + 500 en la parte de la vía el chocho, conforme a la información levantada en campo

por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

27. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANETA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Francisco del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Sabaneta, en el corredor vial denominado Vía Sabaneta Sector Los Nocua (Vía que comunica a Sabaneta Alto Sector Los Nocua), con una longitud de atención de 0.22 km, el punto de referencia de inicio es el PR 0 + 00 Sector Los Nocua y el punto final de referencia es el PR 0 + 220 Vía Nacional Autopista Medellín (Bogotá – La Vega), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

28. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANADAS CENTRO – MUNICIPIO DE CHAGUANÍ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chaguaní del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Llanadas Centro, en el corredor vial denominado Vía hacía Guaduas, que comunica las Veredas de Llanadas Chaguaní y Campeona Guaduas y Hatillo Guaduas con las vías principales que van desde Chaguaní a Guaduas, con una longitud de atención de 3.0 km, donde el punto de inicio de referencia es el PR 0 +00 Finca Los Naranjitos y el punto final de referencia es el PR 3 + 000 Sector Rosalito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

29. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMANCHA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Camancha, en el corredor vial denominado Vía Camancha Sector Los Pirineos, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 en la Finca Laura Arias y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Vía Vereda Santa Isabel, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

30. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA GRATA – MUNICIPIO DE FACATATIVÁ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Facatativá del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Tierra Grata, en el corredor vial denominado Vía Tierra Grata Baja hacía Tierra Grata Alta Sector Camino Al Cielo, tramo comprendido en la Vía Transversal Medellín KM 21 + 500 Entrada Norte destapada Ruta Camino Al Cielo – Bogotá, que tiene una longitud de atención de 0.207 km, tomando como punto de inicio de

referencia el PR 0 + 00 Vía Tierra Grata Baja, y el punto final de referencia el PR 0 + 207 en la Vereda Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

31. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABRERA – MUNICIPIO DE PULÍ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Cabrera, en el corredor vial entre sucesión Quiroga y la Finca del señor Solio Rojas, límites de la Vereda La Hamaca, con una longitud de 0.27 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 sucesión Quiroga Ismael Gómez y Solio Rojas, y el punto final de referencia es el PR 0 + 270 límites de la Vereda La Hamaca, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

32. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIRIA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Liria, en el corredor vial denominado Vía Vereda Liria Sector La Escuela Vereda Las Mercedes, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 en Vía Liria y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Vía Vereda Las Mercedes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

33. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUADALUPE – MUNICIPIO DE QUIPILE: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quipile del Departamento de Cundinamarca en la Vereda el Guadalupe, en el corredor vial denominado Vía Veredal Guadalupe Alto, tramo comprendido en la vía principal La Sierra con la Vereda Guadalupe Alto, que tiene una longitud de atención de 0.44 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía principal La Sierra, y el punto final de referencia el PR 0 + 440 Vereda Guadalupe Alto, conforma a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

34. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Centro Antiguo, en el corredor vial denominado Vía Vereda Centro San Cayetano vía a la Vereda Canutillal, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Vía Centro, y el punto final de referencia es el PR 1+ 00 Vía Vereda Canutillal, conforme a la información levantada en campo

por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

35. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLEDAL - MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabal de Síquima del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Robledal, en el corredor vial denominado Vereda El Robledal (Vía Principal y Camino de la Vereda Robledal), con una longitud de atención de 0.2 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Vía Principal, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Camino 1 Vereda Robledal, conforma a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

36. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MANANTIAL – MUNICIPIO DE PULÍ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Manantial, en el corredor vial denominado Vía El Prado y El Congo, con una longitud de atención de 20 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía al Prado, y el punto final de referencia es el PR 20 + 000 en la parte de la Vía El Congo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

37. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIGO – MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabal de Síquima del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Trigo, en el corredor vial denominado El Retén, vía que comunica La Vereda El Trigo con el Casco Urbano del Municipio de Guayabal de Síquima, con una longitud de atención de 0.89 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 vía que comunica La Vereda El Trigo, y el punto final de referencia es el PR 0 + 890 tramo del Casco Urbano del Municipio de Guayabal de Síquima, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

38. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MODELIA – MUNICIPIO DE VIOTÁ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Viotá del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Modelia, en el corredor vial denominado Vía Jasminia San Gabriel, tramo que comunica la Vereda Modelia a la Vereda California, con una longitud de atención de 0.18 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía de la Vereda Modelia, y el punto final de referencia es el PR 0 + 180 Vía a la Vereda California, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

39. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE – MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Antonio del Tequendama del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Quebrada Grande, en el corredor vial denominado Vía Quebrada Grande (Tramo comprendido en la vía que comunica la Entrada Pantano Rico Sector Milán Vía Santandercito Vereda Quebrada Grande), con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Finca Milán, y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Pantano Rico, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

40. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR – MUNICIPIO DE VERGARA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Vergara del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Palmar, en el corredor vial denominado Vías El Palmar, La Vistosa, y El Vergel, La Paz, Sector Colegio Fidel León Triana, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía El Palmar – La Vistosa, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Vía El Vergel – La Paz Sector El Colegio Fidel León Triana, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

41. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Juan de Río Seco del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Honduras Alto, en el corredor vial denominado Vía Honduras Alto a San Nicolás, vía que comunica la Vereda Honduras Alto con la Inspección de San Nicolás, Municipio de San Juan de Río Seco, con una longitud de atención de 0.25 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía Honduras Alto, y el punto final de referencia en el PR 0 + 250 Vía Honduras Alto a la Inspección San Nicolás, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

42. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARCELLA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Colegio del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Marcella, en el corredor vial denominado Vía Cansaperros KM 10 Vía La Victoria, tramo comprendido en la vía que comunica Marsella Baja al Km 10 Vía la Victoria, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Finca Salomón, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Finca de Javier, conforme la información levantada en campo por parte del

equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

43. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA – MUNICIPIO DE LA VEGA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Vega del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Alianza, en el corredor vial denominado Río Cañas a Chilín en la Vereda La Alianza del Municipio de La Vega, que tiene una longitud de atención de 0.22 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Sector Río Cañas, y el punto final de referencia es el PR 0 + 220 Sector Santa Teresita, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

44. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA – MUNICIPIO DE UTICA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Útica del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Montaña, en el corredor vial denominado La Montaña vía que comunica al municipio de Útica con el tramo El Caliche, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de referencia el PR 0 + 000 el Tramo el Caliche, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 vía que comunica al Municipio de Útica, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

46. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA – MUNICIPIO DE ARBELÁEZ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Arbeláez del departamento de Cundinamarca en la vereda de Santa Barbara alta, en el corredor vial denominado Vía Santa Barbara Sector Casa Blanca en el punto Calamar Hasta quebrada La Legía, comprendido que tiene una longitud de atención de 0,2km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía santa bárbara, y el punto final de referencia es PR0+200 en la Vía santa Bárbara, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

47. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS – MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Las Águilas, en el corredor vial denominado vía Escuela águilas-Cabrera con una longitud de 0.315 km, el punto de inicio de referencia PR 0+00 en curva de la finca de Yesid Delgado y el punto final de referencia es PR0 + 315 después de la alcantarilla, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

48. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Zona Urbana, en el corredor vial denominado Vía veredas de Peñas blancas, Pueblo viejo, Paquilo, Canadá, La Playa, Hoyerías, La Cascada, Las Águilas hacia el casco urbano del municipio de Cabrera, en el tramo conocido como "las brisas - vías peñas blancas" que tiene una longitud de atención de 0,65km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 las brisas, y el punto final de referencia es PR0+650 en la parte baja de la Vías peñas blancas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

49. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA -MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda La Playa, en el corredor vial denominado vía Puente Sumapaz -La Playa, punto de referencia inicial en el puente Sumapaz y punto de referencia final Segunda Placa huella sector rio-Caserío. tiene una longitud de atención de 0,74km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 punto de referencia inicial en el puente Sumapaz, y el punto final de referencia es PR0+740 punto de referencia final Segunda Placa huella sector rio-Caserío, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

50. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA - MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Santa Rita parte baja, en el corredor vial denominado Sector El Corral vía que comunica de la vereda las Águilas hacia el casco urbano del municipio de Cabrera con una longitud de atención de 0.70km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía que comunica de la vereda las Águilas, y el punto final de referencia es PR0+700 vía que comunica de la vereda las Águilas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

51. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Fusagasugá del departamento de Cundinamarca en la vereda Guavio Bajo, en el corredor vial denominado Guavio Bajo - Guavio Alto, tramo comprendido en la vía que comunica de la vereda Guavio bajo a la vereda Guavio Alto que tiene una longitud de atención de 1,04km, tomando como punto de inicio de referencia el

PR0+00 Vía Guavio Bajo – Guavio alto, y el punto final de referencia es PR1+04 en la Vía Guavio Bajo – Guavio alto, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

52. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL-ASORURAL - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Fusagasugá del departamento de Cundinamarca en la vereda La Trinidad, en el corredor vial denominado Vía de la vereda La Trinidad, sector el Trapiche, trayecto desde el sitio Villa Inés hasta finca Sergio Mendoza tiene una longitud de atención de 0.16km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía vereda La Trinidad (Sitio Villa Inés), y el punto final de referencia es PR0+160 Vía vereda La Trinidad hasta la finca Sergio Mendoza, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

53. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS - MUNICIPIO DE GUAYABETAL: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca en la vereda el Limoncitos, en el corredor vial denominado vía antigua Bogotá Villavicencio hasta casa de Víctor Romero que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía antigua Villavicencio, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la casa de Víctor Romero, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

54. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO - MUNICIPIO DE GUAYABETAL : El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca en la vereda San Antonio, en el corredor vial denominado Sector vía paramo, vía que comunica la casa el caliche hasta mata grande que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa el caliche, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la mata grande, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

55. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PEÑAS - MUNICIPIO DE MANTA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Manta del departamento de Cundinamarca en la vereda Peñas, en el corredor vial denominado Vía que conduce de Puente Berlín al sitio La Escuela de la Vereda Peñas sector Potrero que tiene una longitud de atención de 1.15 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Puente Berlín, y el punto

final de referencia es PR 1+150 La Escuela, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

56. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina departamento de Cundinamarca en la vereda de Los Alpes, en el corredor vial denominado vía la inspección de los Alpes sector monumento de la Paz (Tramo comprendido en la vía que comunica a la inspección de los Alpes), con una longitud de atención de 1.40 km, el punto de inicio de referencia PR0+00 es la vía que comunica a la vereda de los Alpes sector monumento de la Paz y el punto final de referencia es PR1 +040 es caño Blanco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

57. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda La Esmeralda, en el corredor vial denominado Inspección de San Pedro de Guajaray a la Inspección de la Esmeralda en el sitio Puerto Masato, que tiene una longitud de atención de 1,3km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de San Pedro de Guajaray, y el punto final de referencia es PR1+300 en la parte de la Inspección de la Esmeralda, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

58. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda San José de Alto Redondo, en el corredor vial denominado, Vía inspección el engaño en vereda San José Alto Redondo, vía que conduce desde la Inspección de Maya a la Vereda San José de Alto Redondo, en el sitio Alto el Algarrobo tiene una longitud de atención de 0,24km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de Maya a la Vereda San José, y el punto final de referencia es PR0+240 en la parte del sitio Alto el Algarrobo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

59. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN PEDRO DE GUAJARAY - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda Guarajay, en el corredor vial denominado sector borrachero vía San Pedro Guarajay, con una

longitud de atención de 1,77 km, el punto de inicio de referencia PR00+0 vía San Pedro Guajaray y el punto final de referencia PR1+77 es vía San Pedro Guajaray, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

60. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda San Juanito, en el corredor vial denominado Vía San Juanito – Gasatavena sector de Libertad que tiene una longitud de atención de 0,94km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía San Juanito, y el punto final de referencia es PR0+094 en el sector la Libertad, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

61. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda Los Alpes centro, en el corredor vial denominado Vía Marginal de la Selva a la Vía Los Alpes Sector La Loma de Los Morenos, vía que comunica la Inspección de San Pedro de Guajaray a la Inspección de los Alpes sector Alto de los Moreno, tiene una longitud de atención de 0.23km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 la Inspección de San Pedro de Guajaray, y el punto final de referencia es PR0+230 Inspección de los Alpes sector Alto de los Moreno, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

62. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda el Engaño, en el corredor vial denominado Vía maya el engaño sector la Y san pedro de jagua que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Finca Gilberto, y el punto final de referencia es PR0+220 en el chamizo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

63. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS - MUNICIPIO DE PARATEBUENO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda San Jesús de Palomas, en el corredor vial denominado Vía Maña sector los Líos que conduce a la Vereda San Jesús de Palomas (tramo comprendido en la vía que conduce a la vereda San Jesús de Palomas), con una longitud de atención

de 1.56 km, el punto de inicio de referencia PR0+00 es la vía Maña y el punto final de referencia es PR1 +56 es Sector los Líos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

64. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda Buenavista alto Redondo, en el corredor vial denominado Vía Maya el Engaño, vía que conduce a la vereda Buenavista de alto redondo que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 sector la H, y el punto final de referencia es PR0+200 frente a la casa de Jairo Reyes en la vía que comunica a la Vereda Buenavista de Alto Redondo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

65. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA - MUNICIPIO DE TAUSA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tausa del departamento de Cundinamarca en la vereda Rasgata, en el corredor vial denominado vía principal troncal del carbón, vía que comunica Troncal del carbón sector Pantano Redondo, tiene una longitud de atención de 0,40km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 en la troncal del carbón, y el punto final de referencia es PR0+400 sector Pantano Redondo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

66. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO - MUNICIPIO DE UBAQUE: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ubaque del departamento de Cundinamarca en la vereda Romero, en el corredor vial denominado Vía alterna sector el Sobandero (Via Alterna Sector el Sobandero, inicia Finca Pedro Saray Lavado y Termina en La Via Principal Ubaque - Fomeque - Vereda ROMERO Municipio de UBAQUE), bajo con una longitud de corredor de atención de 0.32 km, el punto de inicio de referencia finca Pedro Saray Lavado y el punto final de referencia es PR 00+320 vía principal Ubaque – Fomeque – Vereda Romero, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2585 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CURAL EN EL MUNICIPIO CAPARRAPÍ DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA.
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	201.072.692,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA ACTA DE INICI0:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2690 DE 2024 CÓRDOBA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2690 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORDOBA MUNICIPIO DE CAPARRAPI
NIT.	832.007.302-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$201.049.181,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2390 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA CAPARRAPI DEL MUNICIPIO CAPARRAPI, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA DEL MUNICIPIO CAPARRAPI
NIT.	901.017.574-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.089.987 (DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	SIN INFORMACION
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2332 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO TATI MUNICIPIO DE CAPARRAPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO TATI MUNICIPIO DE CAPARRAPI
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.955.709,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2525 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCIÓN COMUNAL DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON
NIT.	900.784.449-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.043.481,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2353 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA AGUADA DEL MUNICIPIO EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA AGUADA DEL MUNICIPIO EL PEÑON
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.867.389,00 (DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2393 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA
NIT.	901.274.670-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.961.874,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2834 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC VEREDA DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA
NIT.	901.130.029-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.964.505,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2321 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA
NIT.	901.099.545-6
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.982.165,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2164 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA DE SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA DE SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME
NIT.	901.277.978-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.208.920,00 (DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2747 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE VDA. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE VDA. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME
NIT.	901.277.963-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.060.720,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2296 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$201.010.045,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2429 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI
NIT.	900.184.436-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.531.208,00 (DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2586 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.430-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.935.282,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2400 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.811-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.935.282,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2394 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.420-4
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.032.018,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	SIN INFORMACION
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2129 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PURAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ELMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PURAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	901.277.113-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.997.327,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2223 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	901.277.247-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.929.009,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2383 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ
NIT.	901.515.683-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.799.504,00 (DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2214 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DELDEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ELMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	900.042.762-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.061.288,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2779 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ
NIT.	901487525-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.871.439,00 (DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2241 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ
NIT.	807.002.146-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.086.476,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2281 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	901.121.418-2
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.917.714,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2222-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA. LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE ALTA	NIT:	901.013.320-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	09/11/2024	2024S-VBOG-083754	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (200.970.578,00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (200.970.578,00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2226-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	NIT:	832.006.991-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	2024S-VBOG-061505	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (200.893.500,00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (200.893.500,00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2253-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PULISITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	NIT:	900.994.281-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PULISITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	5/09/2024	2024S-VBOG-062500	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($201.006.282,00) MONEDA CORRIENTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($201.006.282,00) MONEDA CORRIENTE		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2298-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SABANETA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	NIT:	901.003.772-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE SABANETA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060754	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($200.911.938,00), MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($200.911.938,00), MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2302-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANADAS CENTRO	NIT:	901.767.959-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANADAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	01/11/2024	2024S-VBOG-081586	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE PESOS ($201.000.611,00), MONEDA CORRIENTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE PESOS ($201.000.611,00), MONEDA CORRIENTE		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2307-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMANCHA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO	NIT:	901.046.566-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMANCHA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	5/09/2024	2024S-VBOG-062505	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($200.994.658,00) MONEDA CORRIENTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($200.994.658,00) MONEDA CORRIENTE		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2308-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ	NIT:	900.040.926-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	N/A	N/A	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($200.987.421,00), MONEDA CORRIENTE		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($200.987.421,00), MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2345-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULÍ	NIT:	808.002.466-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060729	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($200.994.250,00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($200.994.250,00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2351-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, VEREDA LIRIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA	NIT:	901.577.185-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, VEREDA LIRIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060615	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($200.994.658,00), MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($200.994.658,00), MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2371-2024		
CONTRATISTA:	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: SECTOR ALTO VEREDA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE QUIPILE	NIT:	901.003.063-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL Y/O ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: SECTOR ALTO VEREDA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:			
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($201.069.084,00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($201.069.084,00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2378-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO	NIT:	901.529.117-3.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	5/09/2024	2024S-VBOG-062510	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($200.944.344,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($200.944.344,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2380-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ROBLEDAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA	NIT:	900.813.471-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ROBLEDAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	2024S-VBOG-061411	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($200.908.091,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($200.908.091,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2399-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MANANTIAL MUNICIPIO PULÍ.	NIT:	901.049.328-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MANANTIAL MUNICIPIO PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060724	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($201.006.282,00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($201.006.282,00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2624-2024		
CONTRATISTA:	JAC EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA	NIT:	900.114.191-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	04/09/2024	2024S-VBOG-062246	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($201.030.732,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($201.030.732,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2755-2024		
CONTRATISTA:	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ	NIT:	808.002.214-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060620	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($201.000.813,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($201.000.813,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3018-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADAGRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	NIT:	800.029.337-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADAGRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060610	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($200.962.899,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($200.962.899,00)		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3482-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANA DE VERGARA DEL MUNICIPIO DE VERGARA	NIT:	901.113.133-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANA DE VERGARA DEL MUNICIPIO DE VERGARA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082504	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($200.933.953,00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($200.933.953,00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3499-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO	NIT:	901.018.330-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	2024S-VBOG-072619	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($200.900.694,00)		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($200.900.694,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3542-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO	NIT:	900.732.003-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	2024S-VBOG-072620	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($200.954.396,00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($200.954.396,00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3873-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA	NIT:	900.790.862-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	2024-11-06	024S-VBOG-082569	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($201.164.639,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($201.164.639,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3978-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE UTICA DEL DEPARTAMENTO	NIT:	900.906.291-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE UTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082512	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($200.942.212,00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($200.942.212,00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4018-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE UTICA DEL DEPARTAMENTO	NIT:	900.906.291-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/11/2024	2024S-VBOG-082513	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS $200.771.798,00) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS $200.771.798,00) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2203-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SANTA BARBARA ALTA MUNICIPIO DE ARBELAEZ	NIT:	901070188-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	1/11/2024	2024S-VBOG-081584	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (200.979.179) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (200.979.179) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA N:	1		
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 1:	HASTA 31 DE MARZO DE 2025		
SUSPENSION 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	2		
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 2:	HASTA 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2125-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS MUNICIPIO DE CABRERA	NIT:	900.569.331-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060616	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS (200.956.701) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS (200.956.701) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA N:	1		
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 1:	HASTA 31 DE MARZO DE 2025		
SUSPENSION 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	2		
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 2:	HASTA 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2526-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA MUNICIPIO DE CABRERA	NIT:	900.272.654-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ZONA URBANA MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	4/09/2024	2024S-VBOG-062247	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (201.077.617) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (201.077.617) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2533-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLAYA MUNICIPIO DE CABRERA	NIT:	900.608.122-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060641	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (201.026.599) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (201.026.599) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA N:	1		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE MARZO DE 2025		
SUSPENSION 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	2		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2710-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA MUNICIPIO DE CABRERA	NIT:	900.588.475-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060766	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (201.057.392) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (201.057.392) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2436-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	NIT:	808.003.459-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAVIO BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	2024S-VBOG-061227	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (201.033.054) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (201.033.054) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2946-2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASORURAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	NIT:	901.031.866-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN RURAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - ASORURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	1/11/24	2024S-VBOG-081588	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (201.060.582) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (201.060.582) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSION 1:	1		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 14 DE MARZO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2389-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS MUNICIPIO DE GUAYABETAL	NIT:	901.028.437-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LIMONCITOS DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	2/09/2024	2024S-VBOG-061226	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (200.802.790) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (200.802.790) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2800-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE GUAYABETAL	NIT:	901.028.032-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060615	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (200.965.694) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (200.965.694) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2259-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PEÑAS MUNICIPIO DE MANTA	NIT:	900.809.556-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VEREDA DE PEÑAS DEL MUNICIPIO DE MANTA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060732	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (200.995.403) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (200.995.403) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2252-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALPES MUNICIPIO DE MEDINA	NIT:	900.304.999-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	3/09/2024	2024S-VBOG-060723	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (200.895.912) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (200.895.912) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA N1:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 1:	HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025		
PRÓRROGA N2:	2		
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2279-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA MUNICIPIO DE MEDINA	NIT:	900.715.676-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	5/09/2024	2024S-VBOG-062501	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (200.895.356) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (200.895.356) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2315-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO MUNICIPIO DE MEDINA	NIT:	900.247.104-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN JOSE DE ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060822	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (201.007.463) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (201.007.463) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2518-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY MUNICIPIO DE MEDINA	NIT:	900.294.931-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN PEDRO DE GUAJARAY DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060644	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (201.052.494) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (201.052.494) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA N1:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 1:	HASTA 31 DE MARZO DEL 2025		
PRÓRROGA N2:	2		
FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 2:	HASTA 31 DE JULIO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2547-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO MUNICIPIO DE MEDINA	NIT:	900.298.850-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	5/09/2024	2024S-VBOG-062514	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (201.068.440) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (201.068.440) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSION 1:	1		
FECHA DE FINALIZACIÓN SUSP 1:	HASTA 14 DE MARZO DEL 2025		
SUSPENSION 2:	2		
REINICIO	HASTA 13 DE MARZO DEL 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN SUSP 2:	HASTA 31 DE JULIO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2547-2024		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE JAC MEDINA CUNDINAMARCA	NIT:	901.662.959-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA, CUNDINAMARCA DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	3/09/2024	2024S-VBOG-061780	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (201.006.282) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (201.006.282) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE MARZO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2221-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ENGAÑO MUNICIPIO DE PARATEBUENO	NIT:	901.116.838-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ENGAÑO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060638	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (201.014.808) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (201.014.808) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2268-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS MUNICIPIO DE PARATEBUENO	NIT:	901.030.694-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060746	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (200.960.298) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (200.960.298) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2322-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTOREDONDO MUNICIPIO DE PARATEBUENO	NIT:	900.757.703-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BUENA VISTA ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060745	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (201.094670) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (201.094670) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 31 DE MARZO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2669-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA ALTA MUNICIPIO DE TAUSA	NIT:	900.668.935-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASGATA DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	6/11/24	2024S-VBOG-082564	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (200.947.390) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (200.947.390) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
SUSPENSION 1:	1		
FECHA DE FINALIZACIÓN SUSP 1:	HASTA EL 14 DE MARZO DEL 2025		
SUSPENSION 2:	2		
FECHA DE FINALIZACIÓN SUSP 2:	HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2309-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO MUNICIPIO DE UBAQUE	NIT:	900.308.926-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC DE LA VDA. DE ROMERO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	2024S-VBOG-060791	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (200.843.748) MONEDA CORRIENTE.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (200.843.748) MONEDA CORRIENTE.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA N:	1		
SUSPENSION 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Convenio	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO
2585	687824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.072.692	$200.072.692
2690	692024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.049.181	$200.049.181
2390	958424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.089.987	$ 0.00
2332	637824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.955.709	$199.955.709
2525	687724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.043.481	$200.043.481
2353	683824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.867.389	$199.867.389
2393	671524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.961.874	$199.961.874
2834	710724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.964.505	$199.964.505
2321	674424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.982.165	$199.982.165
2164	666224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.208.920	$199.208.920
2747	710924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.060.720	$200.060.720

2296	670124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.010.045	$ 0.00
2429	698824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.531.208	$199.531.208
2586	692424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.935.282	$ 0.00
2400	664924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.935.282	$ 0.00
2394	698824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.032.018	$200.032.018
2129	606624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.997.327	$199.997.327
2223	631924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.929.009	$199.929.009
2383	672624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.799.504	$199.799.504
2214	636724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.061.288	$200.061.288
2779	711124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.871.439	$199.871.439
2241	671324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.086.476	$200.086.476
2281		2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.917.714	$ 0.00
2222	637024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,970,578.00	$ 0.00

2226	665924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,893,500.00	$ 199,893,500.00
2253	665124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,006,282.00	$ 200,006,282.00
2298	637324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,911,938.00	$ 199,911,938.00
2302	953324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,000,611.00	$ 0.00
2307	665324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,994,658.00	$ 199,994,658.00
2308	641424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,987,421.00	$ 199,987,421.00
2345	671924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,994,250.00	$ 199,994,250.00
2351	676924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,994,658.00	$ 199,994,658.00
2371		2024	10	No Registra	No Registra	No Registra
2378	691724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,944,344.00	$ 199,944,344.00
2380	673224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,908,091.00	$ 199,908,091.00
2399	665024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,006,282.00	$ 200,006,282.00
2624	686024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,030,732.00	$ 200,030,732.00

2755	711024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,000,813.00	$ 200,000,813.00
3018	740624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,962,899.00	$ 199,962,899.00
3482	865624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,933,953.00	$ 0.00
3499	861924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,900,694.00	$ 0.00
3542	928324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,954,396.00	$ 0.00
3873	960924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,164,639.00	$ 0.00
3978	989324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,942,212.00	$ 0.00
4018	1022324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 199,771,798.00	$ 0.00
2203	684024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,979,179.00	$ 200,979,179.00
2125	634024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,956,701.00	$ 200,956,701.00
2526	700424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,077,617.00	$ 201,077,617.00
2533	700624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,026,599.00	$ 201,026,599.00
2710	693424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,057,392.00	$ 201,057,392.00

2436	681124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,033,054.00	$ 201,033,054.00
2946	1024824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,060,582.00	$ 0.00
2389	672524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,802,790.00	$ 200,802,790.00
2800	710624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,965,694.00	$ 200,965,694.00
2259	673524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,995,403.00	$ 200,995,403.00
2252	675024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,895,912.00	$ 200,895,912.00
2279	666524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,895,356.00	$ 200,895,356.00
2315	665624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,007,463.00	$ 201,007,463.00
2518	687624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,052,494.00	$ 201,052,494.00
2547	687524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,068,440.00	$ 201,068,440.00
2571	687424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,006,282.00	$ 201,006,282.00
2221		2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,014,808.00	$ 201,014,808.00
2268	676124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,960,298.00	$ 200,960,298.00

2322	665224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 201,094,670.00	$ 201,094,670.00
2669	958624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,947,390.00	$ 0.00
2309	671024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200,843,748.00	$ 200,843,748.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 3 de fecha 30 DE ENERO 2025, para el periodo DICIEMBRE, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.072.692,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0	76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.049.181,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.089.987,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	**$** 200.955.709,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.043.481,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.867.389,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.961.874,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.964.505,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.982.165,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.208.920,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.060.720,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.010.045,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.531.208,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.935.282,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.935.282,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.032.018,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.997.327,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.929.009,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.799.504,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.061.288,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.871.439,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.086.476,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.917.714,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2222-2024 LA ARGENTINA:

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.970.578,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0	69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2226-2024 EL IMPARAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.893.500,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2253-2024 PULISITO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.006.282,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2298-2024 SABANETA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.911.938,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$50.227.984.50	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$96.437.730.24	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2302-2024 LLANADAS;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.000.611,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2307-2024 CAMANCHA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.994.658,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2308-2024 TIERRA GRATA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.987.421,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$48.236.981,04	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$20.098.742,10	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2345-2024 CABRERA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.994.250,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2351-2024 LIRIA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.994.658,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2371-2024 GUADALUPE;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.069.084,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2378-2024 CENTRO ANTIGUO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.944.344,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2380-2024 ROBLEDAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.908.091,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$48.217.041,84	74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$8.036.323,64	88%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2399-2024 MANANTIAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.006.282,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.241.507,68	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$20.100.628,20	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2624-2024 EL TRIGO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.030.732,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2755-2024 MODELIA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.000.813,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3018-2024 QUEBRADA GRANDE;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.962.899,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$48.231.095,76	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$6.028.886,97	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3482-2024 URBANA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.933.953,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3499-2024 HONDURAS ALTO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.900.694,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3542-2024 MARSELLA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.954.396,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3873-2024 LA ALIANZA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.164.639,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3978-2024 LA MONTAÑA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.942.212,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 4018-2024 ANTIOQUEÑITA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.771.798,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2203-2024;

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.979.179,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 54.264.378,33	74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	61%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2125-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.956.701,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 54.264.378,33	78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2526-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.077.617,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.258.628,08	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2533-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.026.599,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.246.383,76	78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2710-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.057.392,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.253.774,08	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2436-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.033.054,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.247.932,96	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2946-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.060.582,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2389-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.802.790,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$48.192.669.60	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 16.064.223,20	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2800-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.965.694,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$48.231.766,56	94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 28.135.197,16	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2259-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.995.403,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.238.896,72	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2252-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.895.912,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.215.018,88	96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	98%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2279-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.895.356,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.214.885,44	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2315-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.007.463,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.241.791,12	78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2518-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.052.494,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 16.084.199,52	72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	56%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2547-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.068.440,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.256.425,60	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2571-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.006.282,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.241.507,68	82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2221-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.014.808,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.243.553,92	66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2268-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.960.298,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.230.471,52	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2322-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.094.670,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 20.109.467,00	66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$12.065.680.20	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2669-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.947.390,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2309-2024;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.843.748,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 48.202.499,52	90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

Meta física programada %76.00
Meta física ejecutada %: 62.00

Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

Meta física programada %:0.00
Meta física ejecutada %: 0.00

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

Meta física programada %:96.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

Meta física programada %:96.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

Meta física programada %: 75.00
Meta física ejecutada %:40.00

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

Meta física programada %: 75.00
Meta física ejecutada %:56.00

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %:0.00

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

Meta física programada %: 75.00
Meta física ejecutada %:5.00

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %:0.00

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %:0.00

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

Meta física programada %: 78.00
Meta física ejecutada %:85.00

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

Meta física programada %: 96.00
Meta física ejecutada %100.00

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

Meta física programada %: 96.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %:0.00

Convenio 2222-2024;

Meta física programada %: 69.00%
Meta física ejecutada %: 98.00%

Convenio 2226-2024;

Meta física programada %: 75.00%
Meta física ejecutada %: 92.00%

Convenio 2253-2024;

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2298-2024;

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2302-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 2307-2024;

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2308-2024;

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2345-2024;

Meta física programada %: 74.00%
Meta física ejecutada %: 83.00%

Convenio 2351-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 2371-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 2378-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 2380-2024;

Meta física programada %: 74.00%
Meta física ejecutada %: 88.00%

Convenio 2399-2024;

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2624-2024;

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2755-2024;

Meta física programada %: 74.00%
Meta física ejecutada %: 55.00%

Convenio 3018-2024;

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 3482-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 3499-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 3542-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 3873-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 3978-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 4018-2024;

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 2203-2024;

Meta física programada %:74.00
Meta física ejecutada %: 61.00

Convenio 2125-2024;

Meta física programada %: 78.00
Meta física ejecutada %: 76.00

Convenio 2526-2024;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2533-2024;

Meta física programada %: 78.00
Meta física ejecutada %:74.00

Convenio 2710-2024;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2436-2024;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2946-2024;

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %:0.00

Convenio2389-2024;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2800-2024;

Meta física programada %: 94.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2259-2024;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2252-2024;

Meta física programada %: 96.00
Meta física ejecutada %:98.00

Convenio2279-2024;

Meta física programada %: 90.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2315-2024;

Meta física programada %: 78.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2518-2024;

Meta física programada %: 72.00
Meta física ejecutada %:56.00

Convenio 2547-2024;

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %:0.00

Convenio 2571-2024;

Meta física programada %: 82.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2221-2024;

Meta física programada %: 66.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2268-2024;

Meta física programada %: 90.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio2322-2024;

Meta física programada %: 66.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio2669-2024;

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %:0.00

Convenio2309-2024;

Meta física programada %: 90.00
Meta física ejecutada %:100.00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha ninguna Junta de Acción Comunal a tramitado Ítems No Previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado reprogramaciones para ninguna JAC en el presente periodo.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han tramitado actas de suspensión.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han tramitado Adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

CONVENIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/2024	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.107.270,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.636,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.214.539,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/2024	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.104.919,00	0	25/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.052.460,00	0	25/07/24	31/10/27
Estabilidad de la Obra	40.209.837,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.108.999,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.054.500,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.217.998,00	0	16/12/24	31/12/29

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.095.571,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.047.786,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.191.142,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.104.349,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.052.175,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.208.697,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	12/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.086.739,00	0	12/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.043.370,00	0	12/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.173.478,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.096.188,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.094,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.192.375,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	30/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.096.451,00	0	30/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.226,00	0	30/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.192.901,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.098.217,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.049.109,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.196.433,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	03/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.020.892,00	0	03/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.010.446,00	0	03/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.041.784,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	26/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.106.072,00	0	26/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.036,00	0	26/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.212.144,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.101.005,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.503,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.202.009,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	17/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.053.121,00	0	17/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.026.561,00	0	17/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.106.242,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.093.529,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.046.765,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.187.057,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.093.529,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.046.765,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.187.057,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.103.202,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.051.601,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.206.404,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	02/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.099.733,00	0	02/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.049.867,00	0	02/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.199.466,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	08/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.092.901,00	0	08/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.046.451,00	0	08/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.185.802,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.079.951,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.039.976,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.159.901,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.106.129,00	0	10/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.065,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.212.258,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.087.144,00	0	29/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.043.572,00	0	29/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.174.288,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	05/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.108.648,00	0	05/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.054.324,00	0	05/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.217.296,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.191.772,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.095.886,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.383.543,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	1	11/07/24	31/12/2024
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.084.375,00	0	11/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.042.188,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.168.750,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2222-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	360-74-994000008826	08/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,097,059.00	360-47-994000032060	08/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,048,530.00		08/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,194,117.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2226-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 8/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008792	08/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,089,351.00	360-47-994000031989	08/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,044,676.00		08/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,178,701.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2253-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008804	09/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,100,629.00	360-47-994000032028	09/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,315.00		09/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,201,257.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2298-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008807	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,091,195.00	360-47-994000032030	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,045,598.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,182,389.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2302-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008808	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,100,062.00	360-47-994000032031	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,032.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,200,123.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2307 -2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008809	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,099,466.00	360-47-994000032032	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,733.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,198,932.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2308-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008822	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,098,743.00	360-47-994000032055	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,372.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,197,485.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2345-2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008820	12/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,099,425.00	360-47-994000032053	12/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,713.00		12/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,198,850.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2351-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	NB-100085749	12/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,099,466.00	NB-100338209	12/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,733.00		12/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,198,932.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2371-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008831	16/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,106,909.00	360-47-994000032079	16/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,053,455.00		16/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,213,818.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2378-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008863	23/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,094,435.00	360-47-994000032152	23/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,047,218.00		23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,188,870.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2380-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008832	16/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,090,810.00	360-47-994000032080	16/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,045,405.00		16/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,181,619.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2399-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008837	16/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,100,629.00	360-47-994000032085	16/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,315.00		16/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,201,257.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2624-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008864	23/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,103,074.00	360-47-994000032153	23/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,051,538.00		23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,206,147.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2755-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008879	26/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,100,082.00	360-47-994000032315	26/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,042.00		26/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,200,163.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3018-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008926	06/08/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,096,290.00	360-47-994000032638	06/08/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,048,146.00		06/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,192,580.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3482-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009075	04/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,093,396.00	360-47-994000033590	04/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,046,699.00		04/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,186,791.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3499-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-9940000090555	03/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,090,070.00	360-47-994000033451	03/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,045,036.00		03/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,180,140.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3542-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009074	05/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,095,441.00	360-47-994000033589	05/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,047,721.00		05/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,190,880.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3873-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009135	20/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,116,465.00	360-47-994000033966	20/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,058,233.00		20/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,232,928.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3978-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009186	27/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,094,222.00	360-47-994000034203	27/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,047,112.00		27/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,188,443.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 4018-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009185	01/10/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,077,181.00	360-47-994000034204	01/10/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,038,591.00		01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,154,361.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2203-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	5/07/2024	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.097.918,00	0	5/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.959,00	0	5/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.195.836,00	0	5/07/24	31/12/29

Convenio 2125-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	3/07/24	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.095.671,00	0	3/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.047.836,00	0	3/07/24	31/10/27
Estabilidad de la Obra	40.191.341,00	0	3/07/24	31/10/29

Convenio 2526-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	19/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.107.762,00	0	19/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.881,00	0	19/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.215.524,00	0	19/07/24	31/12/29

Convenio 2533-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.102.660,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.051.330,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.205.320,00	0	22/07/24	31/12/29

Convenio 2710-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 6/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	25/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.103.306,00	0	17/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.051.653,00	0	17/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.206.611,00	0	17/07/24	31/12/29

Convenio 2946 -2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	02/08/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.106.059,00	0	02/08/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.030,00	0	02/08/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.212.117,00	0	02/08/24	31/12/29

Convenio 2389-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.080.280,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.040.141,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.160.559,00	0	16/07/24	31/12/29

Convenio 2800-2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	29/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.096.570,00	0	29/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.286,00	0	29/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.193.140,00	0	29/07/24	31/12/29

Convenio 2259-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.099.541,00	0	10/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.049.771,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.199.081,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2252-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.089.592,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.044.796,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.179.183,00	0	10/07/24	31/12/29

Convenio 2279-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.089.536,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.044.768,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.179.072,00	0	10/07/24	31/12/29

Convenio 2315-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.100.747,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.374,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.201.493,00	0	11/07/24	31/12/29

Convenio 2518-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.105.250,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.052.625,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.210.499,00	0	22/07/24	31/12/29

Convenio 2547-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.106.844,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.422,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.213.688,00	0	22/07/24	31/12/29

Convenio 2571-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.100.629,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.315,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.201.257,00	0	22/07/24	31/12/29

Convenio 2221-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	5/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.101.481,00	0	5/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.741,00	0	5/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.202.962,00	0	5/07/24	31/12/29

Convenio 2268-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.096.030,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.015,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.192.060,00	0	16/07/24	31/12/29

Convenio 2322-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.109.467,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.054.734,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.218.934,00	0	11/07/24	31/12/29

Convenio 2669-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	26/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.094.740,00	0	26/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.047.371,00	0	26/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.189.479,00	0	26/07/24	31/12/29

Convenio 2309-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.084.375,00	0	11/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.042.188,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.168.750,00	0	31/12/24	31/12/29

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

ENVIADA:

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3661-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL FR	NIT:	901.865.971-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	FJB INGENIERIA SAS (90%) R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA (10%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O		

	MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	02/10/2024	2024S-VBOG-071656	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($2.908.466.591), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($2.908.466.591), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	1		
PRÓRROGA 2:	2		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

916924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	2.908.466.591,00	$0,00	2.908.466.591,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1	$ 85.073.280	$ 16.163.923	$0	$ 101.237.203
Acta Mensual de Costos No. 2	$145.680.440	$ 27.679.284	$0	$ 173.359.724
Acta Mensual de Costos No. 3	$226.750.216	$ 43.082.541,04	$0	$ 43.082.541,04
Acta Mensual de Costos No. 4	$243.651.167	$46.293.721,73	$0	$46.293.721,73
Acta Mensual de Costos No. 5	$448.021.315	$85.124.049,85	$0	$85.124.049,85
Acta Mensual de Costos No. 6	$303.066.379,70	$57.582.612,14	$0	$57.582.612,14

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6 de fecha 30 de Marzo para el período el contrato reporta un avance de 51.44 %:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ $1.496.086.003,51 (51.44%)
Total inversión ejecutada: $ $1.496.086.003,51 (51.44%)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…27/12/2024	…01
…17/03/2025	…02

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No RADICADO	FECHA	ASUNTO
CO-VIALFR-047-186-2025	4/03/2025	Señores: DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA sau@car.gov.co Dirección: Carrera 5 N° 3 - 02 Vianí – Cundinamarca

CO-VIALFR-047-187-2025	4/03/2025	Señores JAC VRDA CORDOBA, JAC VRDA TATI Atención: MIRIAM ACOSTA; EFREN TRIANA IBARRA Representantes Legal jaccordoba.2017@hotmail.com; santiagotriana732@gmail.com. Caparrapí.
CO-VIALFR-047-188-2025	4/03/2025	Señores JAC VRDA EL ENCANTADO, JAC VRDA LA AGUADA Atención: HEICOL MAHECHA ORTIZ; EDGAR JULIO RODRIGUEZ Representantes Legal encantadovereda@gmail.com; vereda.aguada@gmail.com. Peñón.
CO-VIALFR-047-189-2025	4/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-190-2025	5/03/2025	Señores JAC VRDA LOS ALPES, JAC VRDA ESMERALDA, JAC VRDA SAN JOSE DE ALTO REDONDO Atención: LUIS TORRES TORRES; JOSE GERARDO RUIZ; JAIRO MIGUEL CASTAÑEDA BONILLA. Representantes Legal admarcel1@hotmail.com; esmeraldajacmedina@gmail.com; jacveredasanjosedealtoredondo@gmail.com Medina.

CO-VIALFR-047-191-2025	5/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÛELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 atencionciudadano@invias.gov.co jfarguello@invias.gov.co Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-192-2025	6/05/2025	Señores JAC VRDA ENGAÑO, JAC VRDA SAN JESUS DE PALOMAS, VRDA BUENA VISTA DE ALTOREDONDO Atención: JAMES SMIDT GUZMÁN; JOSE HERNAN URREGO GONZALEZ; CRISPILIANO GARZON Representantes Legal jacelengano@gmail.com; sedesanjesusdepalomas@gmail.com; jacveredasanjosedealtoredondo@gmail.com Caparrapí.
CO-VIALFR-047-193-2025	6/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atención: Ing. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad Bogotá D.C
CO-VIALFR-047-194-2025	6/03/2025	Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Atención: JAIRO FERNANDO ARGUELLO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD Ciudad
CO-VIALFR-047-195-2025	6/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atención: Ing. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad Ciudad

CO-VIALFR-047-196-2025	6/03/2025	Señores: JAC VEREDA QUEBRADA GRANDE – SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Atención: MERARDO BARRERA DIAZ Representante Legal jacveredaq.bradagrande@gmail.com
CO-VIALFR-047-197-2025	6/03/2025	Señores: JAC VEREDA LA PLAYA – CABRERA Atención: ALEXANDER RUNZA PINILLA Representante Legal runzaalexander3@gmail.com
CO-VIALFR-047-198-2025	6/03/2025	Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Atención: JAIRO FERNANDO ARGUELLO SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD Ciudad
CO-VIALFR-047-199-2025	6/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atención: Ing. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad Ciudad
CO-VIALFR-047-200-2025	6/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atención: Ing. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad Bogotá D.C
CO-VIALFR-047-201-2025	6/03/2025	Señores JAC VRDA RIO FRIO, JAC VRDA EL BARRACON, JAC VRDA LOMA EN MEDIO Atención: MAYRA ALENDRA ALVARADO, DANNY CARRILLO MAHECHA; IVAN GOMEZ MELO Representantes Legal alvarado03mayra@gmail.com; jacdeelbarrancon@gmail.com; juntalomadelmedio@gmail.com La Palma.

CO-VIALFR-047-202-2025	6/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Supervisor Contrato Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-203-2025	6/03/2025	Señores: JAC VEREDA MANANTIAL – PULÍ Atención: JAIRO ROMERO ROMERO Representante Legal jacmanantial22@gmail.com Pulí
CO-VIALFR-047-204-2025	6/03/2025	Señores: JAC VEREDA PULISITO – PULÍ Atención: JAIME JEISSON HERREÑO ESPAÑOL Representante Legal jeissonhe@hotmail.com Pulí
CO-VIALFR-047-205-2025	7/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-206-2025	7/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-207-2025	7/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.

CO-VIALFR-047-208-2025	7/02/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-209-2025	7/02/2025	Señores: JAC VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL Atención: OSCAR ROZO LÓPEZ Representante Legal gbetal.jac.sanantonio@gmail.com
CO-VIALFR-047-210-2025	7/03/2025	Señores JAC VRDA PURAY, JAC VRDA LA GLORIETA, LA CHAPA, VRDA MORAY, VRDA LIMONAL, VRDA LAGUNETA. Atención: EUCLIDES AVILA PACHON; ARNULFO ESCARRAGA; ORLANDO ZAMUDIO, GLORIA CAROLINA PINEDA, LEONOR MORALES, EFRAÍN AVILA. Representantes Legal j.a.c.veredapuray@gmail.com; junta.a.c.laglorieta@gmail.com; juntaacchapa@gmail.com; jacmorayyacopi@gmail.com; jaclimonal@gmail.com; j.a.c.laguneta@gmail.com. Yacopí.
CO-VIALFR-047-211-2025	7/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Supervisor Contrato Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.

CO-VIALFR-047-212-2025	10/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-213-2025	10/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-214-2025	10/03/2025	Señores: ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA, CUNDINAMARCA Atención: JORGE ALBERTO SANTANA ZAMUDIO REPRESENTANTE LEGAL asojuntasmedinacundinamarca@gmail.com
CO-VIALFR-047-215-2025	11/03/2025	Señores: JAC VEREDA LAS AGUILAS – CABRERA Atención: WILMER YESID DIAZ RUNZA Representante Legal yesid920308@hotmail.com
CO-VIALFR-047-216-2025	12/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÛELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 atencionciudadano@invias.gov.co jfarguello@invias.gov.co Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-217-2025	12/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.

CO-VIALFR-047-218-2025	12/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-219-2025	13/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-220-2025	14/03/2025	señores **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** Atención: **ING. JARIO FERNANDO ARGUELLO URREGO** Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90
CO-VIALFR-047-221-2025	14/03/2025	Señores **JAC VRDA EL ENGAÑO** SEÑORES. **JAMES SMITD GUZMAN VACA** PRESIDENTE OAC jacelengano@gmail.com Paratebueno
CO-VIALFR-047-222-2025	14/03/2025	Señores **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL CUNDINAMARCA** sau@car.gov.co
CO-VIALFR-047-223-2025	18/03/2025	señores **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** Atención: **ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO** Supervisor Contrato Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.

CO-VIALFR-047-224-2025	18/03/2025	Señores **INSTITUTO NACIOANAL DE VIAS - INVIAS** Atención: **ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO** Supervisor contrato Ciudad
CO-VIALFR-047-225-2025	19/03/2025	Señores **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** Atención: **ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA** **DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €**
CO-VIALFR-047-226-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-227-2025	19/03/2025	Señores: JAC VEREDA TIERRA GRATA BAJA – FACATATIVA Atención: ANGUIE SANABRIA ARAGON Representante Legal jacvdatierragrata@gmail.com Facatativá
CO-VIALFR-047-228-2025	19/03/2025	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SABANETA Atención: Luz Amparo Montoya Quiceno Representante Legal jacsabaneta@gmail.com - yeisonstibbohorquezcontreras@gmail.com San Francisco
CO-VIALFR-047-229-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad

CO-VIALFR-047-230-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-231-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-232-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90
CO-VIALFR-047-233-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-234-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-235-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad

CO-VIALFR-047-236-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-237-2025	19/03/2025	Señores: JAC VEREDA LAS AGUILAS – CABRERA Atención: WILMER YESID DIAZ RUNZA Representante Legal yesid920308@hotmail.com
CO-VIALFR-047-238-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-239-2025	19/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Supervisor Contrato Ciudad
CO-VIALFR-047-240-2025	20/03/2025	Señores **JAC VEREDA LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO MANTA** Atención: ALFREDO CONTRERAS GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL jacpenasmanta@gmail.com Manta
CO-VIALFR-047-241-2025	20/03/2025	Señores **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** ING. **JAIRO FERNANDP ARGUELLO URREGO** Subdirector de sosteniblidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad

CO-VIALFR-047-242-2025	20/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-243-2025	20/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-244-2025	20/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de sostenibilidad jfarguello@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-245-2025	20/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. JAIRO FERNANDO ARGÜELLO URREGO Subdirector de Sostenibilidad Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-246-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-247-2024	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €

CO-VIALFR-047-248-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-249-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-250-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-251-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-252-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-253-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-254-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-255-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)

CO-VIALFR-047-256-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-257-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-258-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-259-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-260-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-261-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-262-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-270-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. ANGIE JULIET MILA DIAZ Subdirectora de sostenibilidad amila@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.

CO-VIALFR-047-271-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. ANGIE JULIET MILA DIAZ Subdirectora de sostenibilidad amila@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-273-2025	21/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-274-2025	25/03/2025	Señores: JAC VEREDA CAMANCHA – SAN CAYETANO Atención: RAMIRO HERNÁN COLMENARES Representante Legal jaccamanchasancayetano@gmail.com
CO-VIALFR-047-275-2025	25/03/2025	eñores: JAC VEREDA LA PLAYA – CABRERA Atención: ALEXANDER RUNZA PINILLA Representante Legal runzaalexander3@gmail.com
CO-VIALFR-047-276-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Supervisor Contrato Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.
CO-VIALFR-047-277-2025	26/03/2025	Señores JAC VEREDA LIMONCITOS DEL MUNICIPIO GUAYABETAL Atención: LUIS ENRIQUE CARRILLO REPRESENTANTE LEGAL presidentejuntalimoncitos@gmail.com Guayabetal

CO-VIALFR-047-278-2025	26/03/2025	Señores: JAC VEREDA LAS PEÑAS Atención: ALFREDO CONTRERAS GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL Correo: jacpenasmanta@gmail.com Manta
CO-VIALFR-047-279-2025	26/03/2026	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-280-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-281-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €
CO-VIALFR-047-282-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-283-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-284-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA €

CO-VIALFR-047-285-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-286-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-287-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)
CO-VIALFR-047-288-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. ANGIE JULIET MILA DIAZ Subdirectora de sostenibilidad amila@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-289-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS ING. ANGIE JULIET MILA DIAZ Subdirectora de sostenibilidad amila@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-290-2025	26/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Atención: Ing. ANGIE JULIET MILA DIAZ Subdirectora de sostenibilidad amila@invias.gov.co Calle 25G # 73B-90 Ciudad

CO-VIALFR-047-291-2025	27/03/2025	Señores JAC VRDA PURAY, JAC VRDA LA GLORIETA, LA CHAPA, VRDA MORAY, VRDA LIMONAL, VRDA LAGUNETA. Atención: EUCLIDES AVILA PACHON; ARNULFO ESCARRAGA; ORLANDO ZAMUDIO, GLORIA CAROLINA PINEDA, LEONOR MORALES, EFRAÍN AVILA. Representantes Legal j.a.c.veredapuray@gmail.com; junta.a.c.laglorieta@gmail.com; juntaacchapa@gmail.com; jacmorayyacopi@gmail.com; jaclimonal@gmail.com; j.a.c.laguneta@gmail.com. Yacopí.
CO-VIALFR-047-292-2025	27/03/2025	Señores JAC VRDA CORDOBA, JAC VRDA TATI Atención: MIRIAM ACOSTA; EFREN TRIANA IBARRA Representantes Legal jaccordoba.2017@hotmail.com; santiagotriana732@gmail.com. Caparrapí.
CO-VIALFR-047-293-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE CORDOBA Atención: MIRYAM ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL jaccordoba.2017@hotmail.com Caparrapí
CO-VIALFR-047-294-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA EL ENCANTADO Atención: HEICOL MAHECHA ORTIZ REPRESENTANTE LEGAL encantadovereda@gmail.com El Peñón
CO-VIALFR-047-295-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE LA AGUADA Atención: EDGAR JULIO RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL vereda.aguada@gmail.com El Peñón

CO-VIALFR-047-296-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE PURAY Atención: EUCLIDES AVILA PACHON REPRESENTANTE LEGAL j.a.c.veredapuray@gmail.com Yacopí
CO-VIALFR-047-297-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE MORAY Atención: GLORIA CAROLINA PINEDA REPRESENTANTE LEGAL jacmorayyacopi@gmail.com Yacopí
CO-VIALFR-047-298-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE TATI Atención: EFREN TRIANA IBARRA REPRESENTANTE LEGAL santiagotriana732@gmail.com Caparrapí
CO-VIALFR-047-299-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE LAGUNETA Atención: EFRAÍN AVILA REPRESENTANTE LEGAL j.a.c.laguneta@gmail.com Yacopí
CO-VIALFR-047-300-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE LIMONAL Atención: LEONOR MORALES REPRESENTANTE LEGAL jaclimonal@gmail.com Yacopí
CO-VIALFR-047-301-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE LA CHAPA Atención: ORLANDO ZAMUDIO REPRESENTANTE LEGAL juntaacchapa@gmail.com Yacopí
CO-VIALFR-047-302-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE RIO FRIO Atención: MAYRA ALENDRA ALVARADO REPRESENTANTE LEGAL alvarado03mayra@gmail.com La Palma

CO-VIALFR-047-303-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE LA GLORIETA Atención: ARNULFO ESCARRAGA REPRESENTANTE LEGAL junta.a.c.laglorieta@gmail.com Yacopí
CO-VIALFR-047-304-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA EL BARRANCON Atención: DANNY CARRILLO MAHECHA REPRESENTANTE LEGAL jacdeelbarrancon@gmail.com La Palma
CO-VIALFR-047-305-2025	27/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA DE LOMA EN MEDIO Atención: IVAN GOMEZ MELO REPRESENTANTE LEGAL juntalomadelmedio@gmail.com La Palma
CO-VIALFR-047-307-2025	28/03/2025	Señores: JAC VEREDA QUEBRADA GRANDE Atención: MERARDO BARRERA DIAZ Representante Legal jacveredaq.bradagrande@gmail.com San Antonio del Tequendama
CO-VIALFR-047-308 (307)-2025	28/03/2025	Señores: JAC VEREDA EL TRIGO Atención: GILMA MARY GÓMEZ JIMÉNEZ Representante Legal juntaaccioncomunaleltrigo@gmail.com – gilmargoji@hotmail.com Guayabal de síquima
CO-VIALFR-047-309-2025	28/03/2025	Señores: JAC VEREDA LA ARGENTINA Atención: JULIO ROBERTO BENÍTEZ MOYA Representante Legal jac.argentinaquipile@gmail.com – julio3191@hotmail.com QUIPILE

CO-VIALFR-047-310-2025	28/03/2025	EÑORES: JAC VEREDA LA ESMERALDA Atención: JOSE GENARO ASCENCIO RUIZ REPRESENTANTE LEGAL jaclaesmeralda923@gmail.com Medina
CO-VIALFR-047-311-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO Atención: JAIRO MIGUEL CASTAÑEDA BONILLA REPRESENTANTE LEGAL jacveredasanjosedealtoredondo@gmail.com Medina
CO-VIALFR-047-312-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA ASOJUNTAS Atención: JORGE ALBERTO SANTANA ZAMUDIO REPRESENTANTE LEGAL asojuntasmedinacundinamarca@gmail.com Medina
CO-VIALFR-047-313-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA EL ENGAÑO Atención: JAMES SMITD GUZMAN VACA REPRESENTANTE LEGAL jacelengano@gmail.com Paratebueno
CO-VIALFR-047-314-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SAN JESUS DE PALOMAS Atención: JOSE HERNAN URREGO GONZALEZ REPRESENTANTE LEGAL sedesanjesusdepalomas@gmail.com Paratebueno
CO-VIALFR-047-315-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA BUENAVISTA ALTO REDONDO Atención: CRISPILIANO GARZON ESPINOSA REPRESENTANTE LEGAL jacbuenavistaaltoparatebueno@gmail.com Paratebueno
CO-VIALFR-047-316-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA ROMERO Atención: ANA MILENA TRUJILLO HERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL jacromero2@gmail.com

CO-VIALFR-047-317-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SAN ANTONIO Atención: OSCAR ROZO LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL gbetal.jac.sanantonio@gmail.com Guayabetal
CO-VIALFR-047-318-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA LIMONCITOS Atención: LUIS ENRIQUE CARRILLO REPRESENTANTE LEGAL presidentejuntalimoncitos@gmail.com Guayabetal
CO-VIALFR-047-319-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SANTA BARBARA Atención: LAURA MARCELA RUBIO CHITIVA REPRESENTANTE LEGAL jacsantabarbaralta@gmail.com Arbeláez
CO-VIALFR-047-320-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA ÁGUILAS Atención: WILMER YESID DIAZ RUNZA REPRESENTANTE LEGAL yesid920308@hotmail.com Cabrera
CO-VIALFR-047-321-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA ZONA URBANA Atención: MARTHA MARGARITA GONZÁLEZ CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL margocas9016@gmail.com Cabrera
CO-VIALFR-047-322 (321)-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA ZONA URBANA Atención: MARTHA MARGARITA GONZÁLEZ CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL margocas9016@gmail.com Cabrera

CO-VIALFR-047-323-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SANTA RITA Atención: JORGE EDILBERTO RAMIREZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL jacveredasantaritacabreracund@yahoo.com Cabrera
CO-VIALFR-047-324-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA LOS ALPES Atención: LUIS ALBERTO TORRES TORRES REPRESENTANTE LEGAL jaclosalpes.473@gmail.com Medina
CO-VIALFR-047-325-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY Atención: NELCY MARLENY URREGO URREGO REPRESENTANTE LEGAL comunal2022sanpedro@gmail.com Medina
CO-VIALFR-047-326-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA LAS PEÑAS Atención: ALFREDO CONTRERAS GUERRERO REPRESENTANTE LEGAL jacpenasmanta@gmail.com Manta
CO-VIALFR-047-327-2025	28/03/2025	SEÑORES: JAC VEREDA GUAVIO BAJO Atención: ILDEFONSO PACHON CUBILLOS REPRESENTANTE LEGAL Jacguaviobajo@gmail.com Fusagasugá
CO-VIALFR-047-328-2025	28/03/2025	Señores JAC VRDA SIRIA, JAC VRDA EL PALMAR Atención: JINNY RODRIGUEZ; OMAR RODRIGUEZ Representantes Legal jacsiria1968@gmail.com; jacelpalmar1977@gmail.com. Peñón.

CO-VIALFR-047-329-2025	28/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Supervisor Contrato Calle 25G # 73B-90 Ciudad
CO-VIALFR-047-332-2025	28/03/2025	Señores: JAC VEREDA MANANTIAL – PULÍ Atención: JAIRO ROMERO ROMERO Representante Legal jacmanantial22@gmail.com Pulí
CO-VIALFR-047-333-2025	28/03/2025	Señores: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SABANETA Atención: Luz Amparo Montoya Quiceno Representante Legal jacsabaneta@gmail.com - yeisonstibbohorquezcontreras@gmail.com San Francisco
CO-VIALFR-047-334-2025	28/03/2025	Señores: JAC VEREDA TIERRA GRATA BAJA – FACATATIVA Atención: ANGUIE SANABRIA ARAGON Representante Legal jacvdatierragrata@gmail.com Facatativá
CO-VIALFR-047-335-2025	28/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Supervisor Contrato Calle 25G # 73B-90 Ciudad

CO-VIALFR-047-336-2025	28/03/2025	Señores JAC VRDA EL ENCANTADO, JAC VRDA LA AGUADA Atención: HEICOL MAHECHA ORTIZ; EDGAR JULIO RODRIGUEZ Representantes Legal encantadovereda@gmail.com; vereda.aguada@gmail.com. Peñón.
CO-VIALFR-047-337-2025	28/03/2025	Señores JAC VRDA LOS ALPES, JAC VRDA ESMERALDA, JAC VRDA SAN JOSE DE ALTO REDONDO Atención: LUIS TORRES TORRES; JOSE GERARDO RUIZ; JAIRO MIGUEL CASTAÑEDA BONILLA. Representantes Legal admarcel1@hotmail.com; esmeraldajacmedina@gmail.com; jacveredasanjosedealtoredondo@gmail.com Medina.
CO-VIALFR-047-338 (335)-2025	28/03/2025	Señores: JAC VEREDA ZONA URBANA Atención: MARTHA MARGARITA GONZÁLEZ CASTILLO REPRESENTANTE LEGAL margocas9016@gmail.com Cabrera
CO-VIALFR-047-339-2025	31/03/2025	Señores JAC VRDA RIO FRIO, JAC VRDA EL BARRACON, JAC VRDA LOMA EN MEDIO Atención: MAYRA ALENDRA ALVARADO, DANNY CARRILLO MAHECHA; IVAN GOMEZ MELO Representantes Legal alvarado03mayra@gmail.com; jacdeelbarrancon@gmail.com; juntalomadelmedio@gmail.com La Palma.

CO-VIALFR-047-340-2025	31/03/2025	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO Supervisor Contrato Calle 25G # 73B-90 Bogotá D.C.

2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el inicio de ejecución de los convenios, se presentan demoras en los tramites de cotizaciones por parte de las JAC. Para desembolsos.

Siguen juntas de acción sin recibir desembolsos del valor total del contrato a las cuentas suscritas en las entidades bancarias.

Dificultades en la metodología para afiliaciones de personal de obra.

Deficiencias en la presentación de información técnica y compromisos contractuales por parte de los profesionales de las jac.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Perfiles profesionales para la ejecución de la obra no cumplen o envían sin certificaciones.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

Demoras en trámites de las JAC.

Inconvenientes en la práctica de legalización en aspectos financieros para aplicar retenciones a los insumos.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A.

Las juntas de acción comunal han informado inconformidades para tramitar aprobación de materiales de agregados de cantera, debido a que se solicita documentación legal de explotación minera de estos agregados y las licencias ambientales.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo en mención en realizaron las visitas correspondientes por parte de la interventoría en aras de garantizar la supervisión de los convenios a cargo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión del INVIAS se encarga de monitorear la ejecución de los convenios solidarios. Durante el período del informe, se llevaron a cabo actividades sociales y visitas técnicas con el objetivo de asegurar una adecuada ejecución por parte de las juntas de acción comunal. Además, se proporcionaron asesorías y se identificaron los requisitos necesarios para el cumplimiento de cada convenio solidario:

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 62% al ejecutar 85. mts de 6.8 mts y se espera poder terminar labores físicas finalizando el mes de abril, se han presentado alguno inconvenientes por el cierre vial por parte de las autoridades, se ha explicado el convenio y se ha dado paso a un solo carril de vehículos livianos entendiendo que hay una vía alterna para la circulación de los vehículos pesados. A la finalización de este mes se proyecto una prorroga de dos meses entendiendo que el clima ha jugado un papel desfavorable en los retrasos de las labores por eso se aprueba por parte de interventoría conceder una prorroga de 2 meses a 31 de mayo para finalizar las labores de obra.









JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>CORDOBA</u> DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.










JUNTA DE ACCION COMUNAL PEÑALOSA MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, el convenio solidario se modifica en una ampliación a la suspensión velando por los términos contractuales, esto debido que aún no se tenía certeza de los desembolsos, por tal motivo se amplía hasta el 14 de mayo de 2025 mas los días contractuales que quedaban del pazo inicial, se espera que a esta fecha se puedan tener los recursos.

La junta recibe información por parte de la entidad bancaria sobre el desembolso otorgado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, una vez allegada la información a la interventoría se procede a reunir los documentos necesarios y las aprobaciones justificadas del reinicio de actividades, y se inicia nuevamente la búsqueda de profesionales y búsqueda de cotizaciones para la realización del comité operativo y poder superar la tapa de alistamiento de la forma más rápida y de esta forma empezar la etapa de construcción de así como el análisis del tiempo otorgado para una prórroga suficiente en tiempo que permita concluir el objeto contractual.

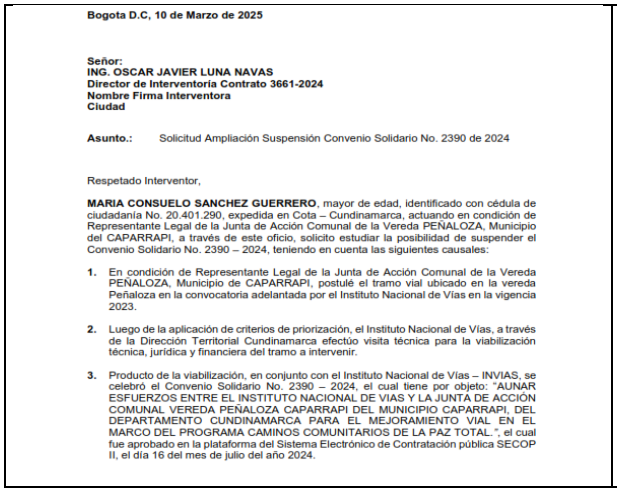

Bogota D.C, 10 de Marzo de 2025


Señor:
ING. OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoría Contrato 3661-2024
Nombre Firma Interventora
Ciudad

Asunto.: Solicitud Ampliación Suspensión Convenio Solidario No. 2390 de 2024

Respetado Interventor,

MARIA CONSUELO SANCHEZ GUERRERO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 20.401.290, expedida en Cota – Cundinamarca, actuando en condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda PEÑALOZA, Municipio del CAPARRAPI, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de suspender el Convenio Solidario No. 2390 – 2024, teniendo en cuenta las siguientes causales:

1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda PEÑALOZA, Municipio de CAPARRAPI, postulé el tramo vial ubicado en la vereda Peñaloza en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la vigencia 2023.
2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través de la Dirección Territorial Cundinamarca efectúo visita técnica para la viabilización técnica, jurídica y financiera del tramo a intervenir.
3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se celebró el Convenio Solidario No. 2390 – 2024, el cual tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA CAPARRAPI DEL MUNICIPIO CAPARRAPI, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", el cual fue aprobado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II, el día 16 del mes de julio del año 2024.

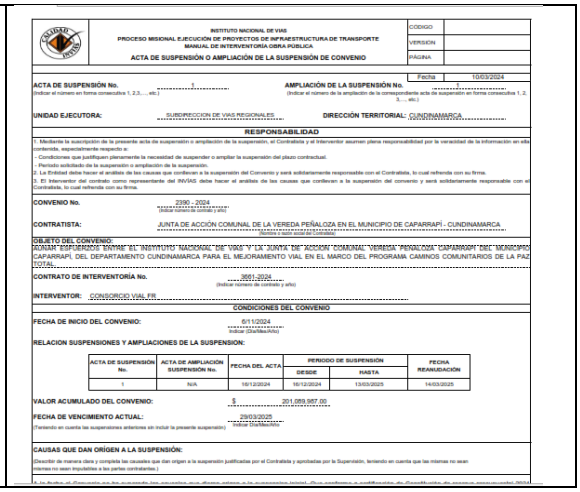

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

Fecha: 10/03/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 1 (Indicar el número en forma consecutiva 1, 2, 3, ... etc.)
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.: (Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3, ... etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.
2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.
3. El Interventor del contrato como representante del INVIAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

CONVENIO No.: 2390 - 2024 (Indicar número de contrato y año)
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑALOZA EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA (Nombre o razón social del Contratista)
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA CAPARRAPÍ DEL MUNICIPIO CAPARRAPÍ, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3661-2024 (Indicar número de contrato y año)
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

CONDICIONES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 6/11/2024 (Indicar Día/Mes/Año)
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSION:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	16/12/2024	16/12/2024	13/03/2025	14/03/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 201.089.987,00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/03/2025 (Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) (Indicar Día/Mes/Año)
CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TATI DEL MUNICIPIO CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.









JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ENCANTADO DEL MUNICIPIO EL PEÑON:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.








JUNTA DE ACCION COMUNAL DE <u>RIO FRIO</u> DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



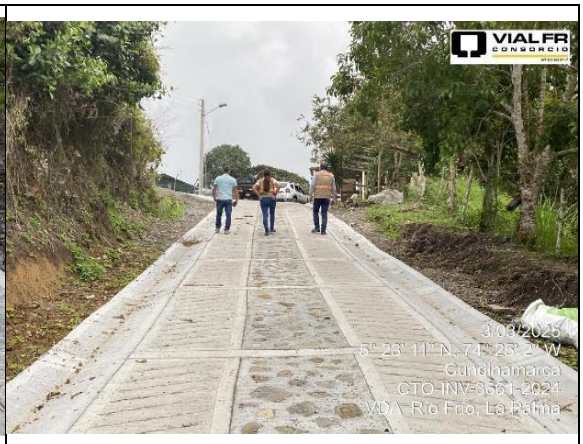





JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOMA MEDIO DEL MUNICIPIO LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.









JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA SIRIA DEL MUNICIPIO PAIME:


Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 40% al ejecutar 50 mts de 4.1 mts y se espera poder terminar labores físicas a mitad de el mes de Mayo por tanto es necesario contemplar un prorroga para poder ejecutar todas las actividades contractuales.
A la finalización de este mes se proyecto una prorroga de dos meses entendiendo que el clima ha jugado un papel desfavorable en los retrasos de las labores por eso se aprueba por parte de interventoría conceder una prorroga de 2 meses a 31 de mayo para finalizar las labores de obra.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO PAIME:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 56% al ejecutar 114 mts en media calzada de 5 mts y se espera poder terminar labores físicas a finales del mes de abril por tanto es necesario contemplar un prórroga para poder ejecutar todas las actividades contractuales.

A la finalización de este mes se proyectó una prórroga de dos meses entendiendo que el clima ha jugado un papel desfavorable en los retrasos de las labores por eso se aprueba por parte de interventoría conceder una prórroga de 2 meses a 31 de mayo para finalizar las labores de obra.

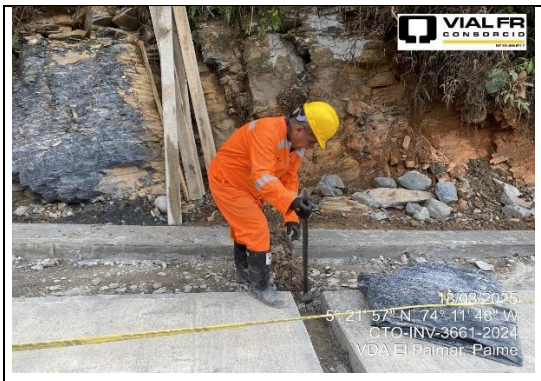








JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>TERMINOS</u> DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario se modifica en una ampliación a la suspensión velando por los términos contractuales, esto debido que aún no se tenía certeza de los desembolsos, por tal motivo se amplía hasta el 14 de mayo de 2025 más los días contractuales que quedaban del pazo inicial, se espera que a esta fecha se puedan tener los recursos.

La junta recibe información por parte de la entidad bancaria sobre el desembolso otorgado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, una vez allegada la información a la interventoría se procede a reunir los documentos necesarios y las aprobaciones justificadas del reinicio de actividades, y se inicia nuevamente la búsqueda de profesionales y búsqueda de cotizaciones para la realización del comité operativo y poder superar la tapa de alistamiento de la forma más rápida y de esta forma empezar la etapa de construcción de así como el análisis del tiempo otorgado para una prórroga suficiente en tiempo que permita concluir el objeto contractual.

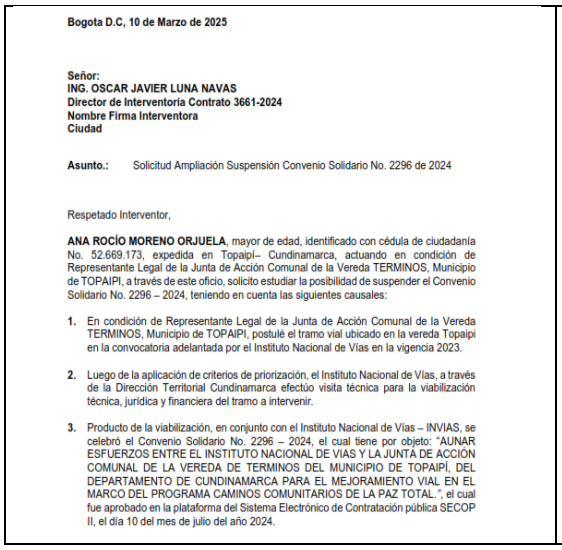

Bogota D.C, 10 de Marzo de 2025

Señor:
ING. OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoría Contrato 3661-2024
Nombre Firma Interventora
Ciudad

Asunto.: Solicitud Ampliación Suspensión Convenio Solidario No. 2296 de 2024

Respetado Interventor,

ANA ROCÍO MORENO ORJUELA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 52.669.173, expedida en Topaipí– Cundinamarca, actuando en condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda TERMINOS, Municipio de TOPAIPI, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de suspender el Convenio Solidario No. 2296 – 2024, teniendo en cuenta las siguientes causales:

1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda TERMINOS, Municipio de TOPAIPI, postulé el tramo vial ubicado en la vereda Topaipi en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la vigencia 2023.
2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través de la Dirección Territorial Cundinamarca efectúo visita técnica para la viabilización técnica, jurídica y financiera del tramo a intervenir.
3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se celebró el Convenio Solidario No. 2296 – 2024, el cual tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", el cual fue aprobado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II, el día 10 del mes de julio del año 2024.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 (Indicar el número en forma consecutiva 1, 2, 3,... etc.)
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1 (Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,... etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.
2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.
3. El interventor del contrato como representante del INVIAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

CONVENIO No. 2296 - 2024 (Indicar número de contrato y año)
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (Nombre o razón social del contratista)
OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3661-2024 (Indicar número de contrato y año)
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

CONDICIONES DEL CONVENIO

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 5/09/2024 Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	16/12/2024	16/12/2024	13/03/2025	14/03/2025

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 201,010,045.00

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>NARANJAL</u> DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal después de hacer el 4 cambio de equipo de profesionales se da inicio a las labores administrativas de consecución de personal, cotizaciones y se realiza el comité operativo se espera poder iniciar labores en el mes de abril con personal y maquinaria. se da la aprobación de la prórroga hasta el 31 de mayo para lograr llevar acabo todas las actividades necesarias de ejecución.






JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>PAPATAS</u> DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, el convenio solidario se modifica en una ampliación a la suspensión velando por los términos contractuales, esto debido que aún no se tenía certeza de los desembolsos, por tal motivo se amplía hasta el 14 de mayo de 2025 mas los días contractuales que quedaban del pazo inicial, se espera que a esta fecha se puedan tener los recursos.

La junta recibe información por parte de la entidad bancaria sobre el desembolso otorgado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, una vez allegada la información a la interventoría se procede a reunir los documentos necesarios y las aprobaciones justificadas del reinicio de actividades, y se inicia nuevamente la búsqueda de profesionales y búsqueda de cotizaciones para la realización del comité operativo y poder superar la tapa de alistamiento de la forma más rápida y de esta forma empezar la etapa de construcción de así como el análisis del tiempo otorgado para una prórroga suficiente en tiempo que permita concluir el objeto contractual.

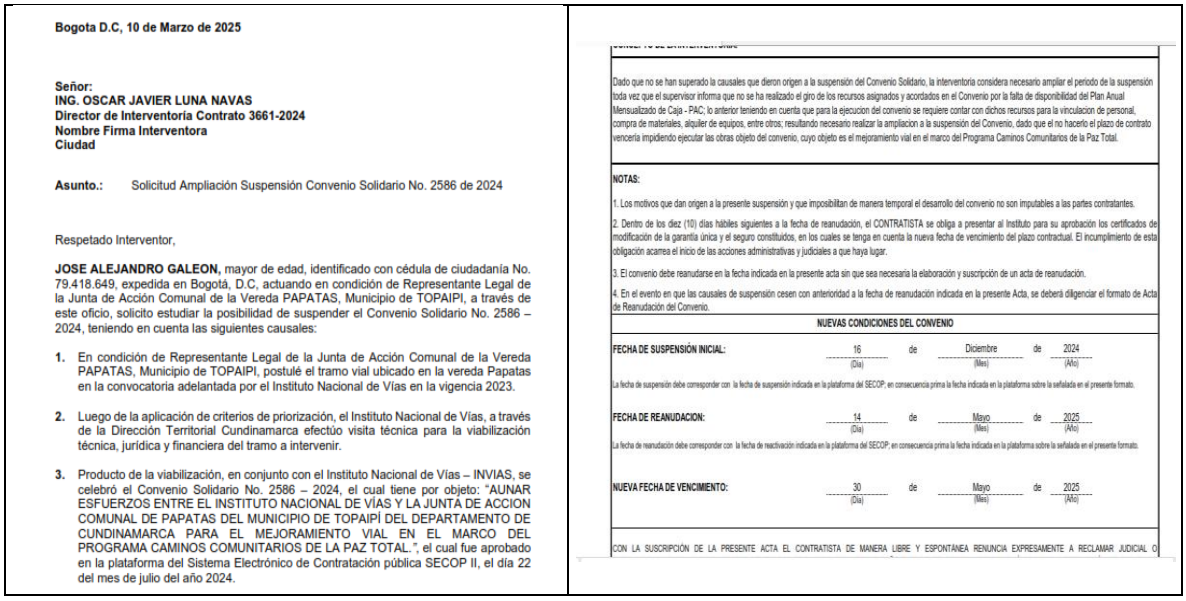

Bogota D.C, 10 de Marzo de 2025

Señor:
ING. OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoría Contrato 3661-2024
Nombre Firma Interventora
Ciudad

Asunto.: Solicitud Ampliación Suspensión Convenio Solidario No. 2586 de 2024

Respetado Interventor,

JOSE ALEJANDRO GALEON, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.418.649, expedida en Bogotá, D.C, actuando en condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda PAPATAS, Municipio de TOPAIPI, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de suspender el Convenio Solidario No. 2586 – 2024, teniendo en cuenta las siguientes causales:

1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda PAPATAS, Municipio de TOPAIPI, postulé el tramo vial ubicado en la vereda Papatas en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la vigencia 2023.
2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través de la Dirección Territorial Cundinamarca efectúo visita técnica para la viabilización técnica, jurídica y financiera del tramo a intervenir.
3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se celebró el Convenio Solidario No. 2586 – 2024, el cual tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", el cual fue aprobado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II, el día 22 del mes de julio del año 2024.

Dado que no se han superado la causales que dieron origen a la suspensión del Convenio Solidario, la interventoria considera necesario ampliar el periodo de la suspensión toda vez que el supervisor informa que no se ha realizado el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio por la falta de disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, lo anterior teniendo en cuenta que para la ejecucion del convenio se requiere contar con dichos recursos para la vinculacion de personal, compra de materiales, alquiler de equipos, entre otros; resultando necesario realizar la ampliacion a la suspensión del Convenio, dado que el no hacerlo el plazo de contrato vencería impidiendo ejecutar las obras objeto del convenio, cuyo objeto es el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibiltan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de Reanudación del Convenio.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACION: 14 (Día) de Mayo (Mes) de 2025 (Año)


La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 30 (Día) de Mayo (Mes) de 2025 (Año)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CAQUIAN DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, La junta recibe información por parte del INVIAS sobre el estado del desembolso el cual difícilmente llegaría para este mes, por tal motivo se inició un proceso de ampliación de suspensión de convenio ante la entidad puesto que sin desembolso no se podrán adelantar procesos de obras, por tal motivo se envió solicitud a la interventoría para dar aprobación ante el Invias justificando la suspensión en la carencia de PAC de la entidad lo cual no ha permitido el desembolso de recursos del programa caminos comunitarios de la paz total. Dicha solicitud que fue avalada con fecha de ampliación de suspensión hasta 14 de mayo de, esperando que a esta fecha los recursos ya estén en las cuentas de cada junta.

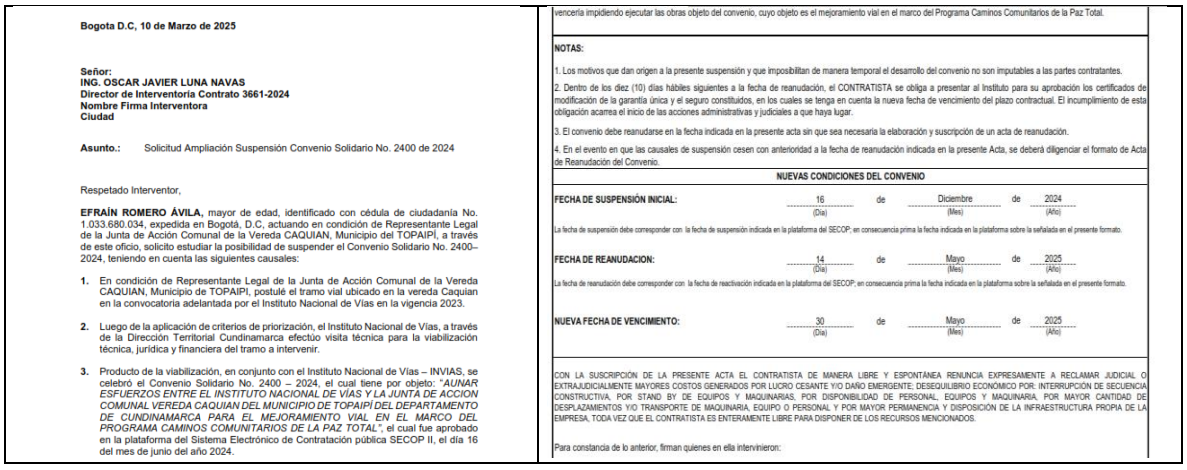

Bogota D.C, 10 de Marzo de 2025

Señor:
ING. OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoria Contrato 3661-2024
Nombre Firma Interventora
Ciudad

Asunto.: Solicitud Ampliación Suspensión Convenio Solidario No. 2400 de 2024

Respetado Interventor,

EFRAÍN ROMERO ÁVILA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.033.680.034, expedida en Bogotá, D.C, actuando en condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda CAQUIAN, Municipio del TOPAIPI, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de suspender el Convenio Solidario No. 2400–2024, teniendo en cuenta las siguientes causales:

1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda CAQUIAN, Municipio de TOPAIPI, postulé el tramo vial ubicado en la vereda Caquian en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la vigencia 2023.
2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través de la Dirección Territorial Cundinamarca efectúo visita técnica para la viabilización técnica, jurídica y financiera del tramo a intervenir.
3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se celebró el Convenio Solidario No. 2400 – 2024, el cual tiene por objeto: "*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*", el cual fue aprobado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II, el día 16 del mes de junio del año 2024.

vencería impidiendo ejecutar las obras objeto del convenio, cuyo objeto es el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibiltan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de Reanudación del Convenio.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACION: 14 (Día) de Mayo (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 30 (Día) de Mayo (Mes) de 2025 (Año)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MUCHIPAY DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 85% al ejecutar 120 mts de 4.1 mts y una alcantarilla, se espera poder terminar labores físicas a inicios del mes de abril por tanto es necesario contemplar un prorroga para poder ejecutar todas las actividades contractuales.

A la finalización de este mes se proyecto una prorroga de dos meses entendiendo que el clima ha jugado un papel desfavorable en los retrasos de las labores por eso se aprueba por parte de interventoría conceder una prorroga de 2 meses a 31 de mayo para finalizar las labores de obra.










JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>PURAY</u> DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.







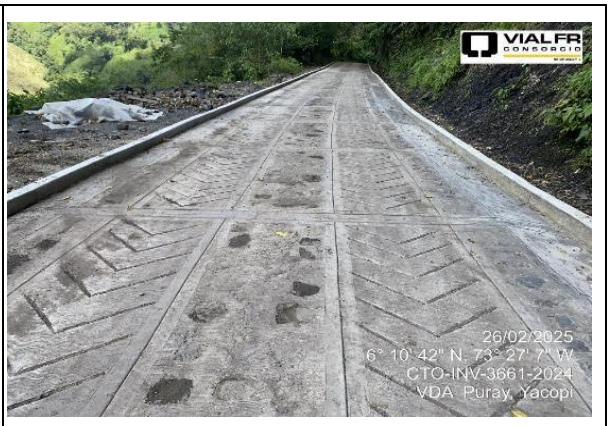

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.









JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CHAPA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.









JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>LIMONAL</u> DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>LAGUNETA</u> DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, comunal se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.








JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE IBAMA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta recibe información por parte de la entidad bancaria sobre el desembolso otorgado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, una vez allegada la información a la interventoría se procede a reunir los documentos necesarios y las aprobaciones justificadas del reinicio de actividades, y se inicia nuevamente la búsqueda de profesionales y búsqueda de cotizaciones para la realización del comité operativo y poder superar la tapa de alistamiento de la forma más rápida y de esta forma empezar la etapa de construcción de así como el análisis del tiempo otorgado para una prórroga suficiente en tiempo que permita concluir el objeto contractual.

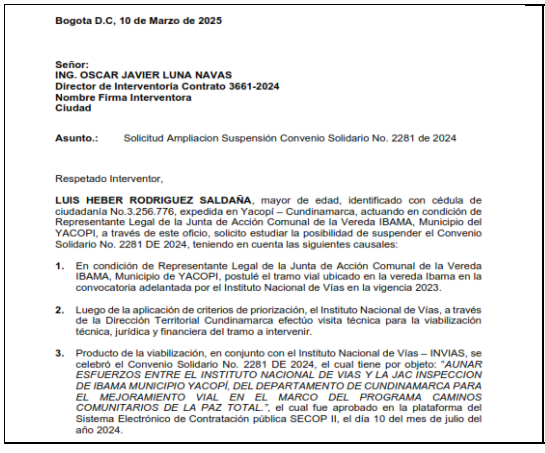

Bogota D.C, 10 de Marzo de 2025


Señor:
ING. OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoria Contrato 3661-2024
Nombre Firma Interventora
Ciudad

Asunto.: Solicitud Ampliacion Suspensión Convenio Solidario No. 2281 de 2024

Respetado Interventor,

LUIS HEBER RODRIGUEZ SALDAÑA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.3.256.776, expedida en Yacopí – Cundinamarca, actuando en condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda IBAMA, Municipio del YACOPI, a través de este oficio, solicito estudiar la posibilidad de suspender el Convenio Solidario No. 2281 DE 2024, teniendo en cuenta las siguientes causales:

1. En condición de Representante Legal de la Junta de Acción Comunal de la Vereda IBAMA, Municipio de YACOPI, postulé el tramo vial ubicado en la vereda Ibama en la convocatoria adelantada por el Instituto Nacional de Vías en la vigencia 2023.
2. Luego de la aplicación de criterios de priorización, el Instituto Nacional de Vías, a través de la Dirección Territorial Cundinamarca efectúo visita técnica para la viabilización técnica, jurídica y financiera del tramo a intervenir.
3. Producto de la viabilización, en conjunto con el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se celebró el Convenio Solidario No. 2281 DE 2024, el cual tiene por objeto: "*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*.", el cual fue aprobado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación pública SECOP II, el día 10 del mes de julio del año 2024.

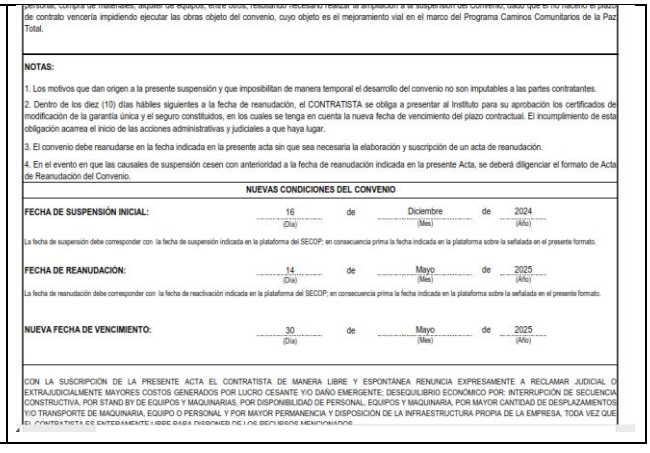

personal, compra de materiales, alquiler de equipos, entre otros, resultando necesario realizar la ampliación a la suspensión del Convenio, dado que el no hacerlo el plazo de contrato vencería impidiendo ejecutar las obras objeto del convenio, cuyo objeto es el mejoramiento vial en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del convenio no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El convenio debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se deberá diligenciar el formato de Acta de Reanudación del Convenio.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONVENIO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 14 (Día) de Mayo (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 30 (Día) de Mayo (Mes) de 2025 (Año)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA SE ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL IMPARAL – MUNICIPIO DE SUPATÁ.

- ✓ Durante el periodo la JAC El 31 de marzo de 2025 a través de la plataforma SECOP II, se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 2 del Convenio Solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31 de mayo de 2025, con el fin de poder culminar la totalidad de actividades constructivas de la obra física, plan de inversión social, socialización de cierre, cierres financieros y administrativos, y liquidación del convenio.









JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PULISITO – MUNICIPIO DE PULÍ.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 182 metros lineales de placa huella.
- ✓ Durante el mes de marzo de 2025, se realizó la autorización de pagos y desembolso de recursos a proveedores para la ejecución de actividades en el marco del plan de inversión social, el cual consistió en el suministro y conformación de material de cantera en tramo adicional de la placa huella construida.
- ✓ Durante las próximas semanas, se adelantarán los trámites tendientes a la liquidación del convenio solidario.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se realice la socialización de cierre del proyecto, teniendo en cuenta la culminación de las actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **182 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANETA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 201 metros lineales de placa huella.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de las actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **201 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron la totalidad de actividades en el marco del plan de inversión social, con el **suministro e instalación de 30 luminarias LED solares** en diferentes sectores de influencia de la vereda: (8) Sector Alto del Vino, (8) Sector Villamizar Prospero, (3) Sector Carlos Orjuela, (5) Sector Becerra/Gómez, (6) Sector Los Novia-Placa Huella.
- ✓ Previamente, en el mes de enero de 2025 se había realizado la socialización de cierre del convenio en conjunto con la comunidad, JAC e Interventoría.








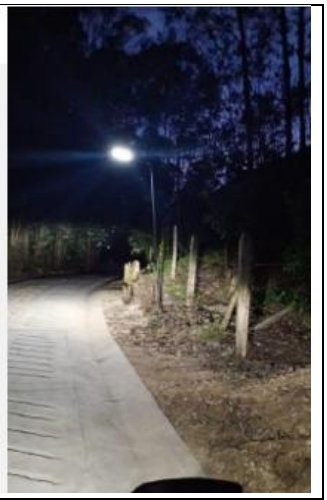

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANADAS CENTRO – MUNICIPIO DE CHAGUANÍ

- ✓ El 13-marzo-2025 se dio aprobación en la plataforma SECOP II a la ampliación No. 1 a la suspensión No. 1 por un término de (2) meses, es decir, hasta el 13 de mayo de 2025.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante realizó el giro o desembolso de recursos a la Junta de Acción Comunal, por lo cual se estima que en el mes de abril de 2025 se suscriba el acta de reanudación del convenio con el fin de iniciar la ejecución de la etapa de alistamiento y obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**

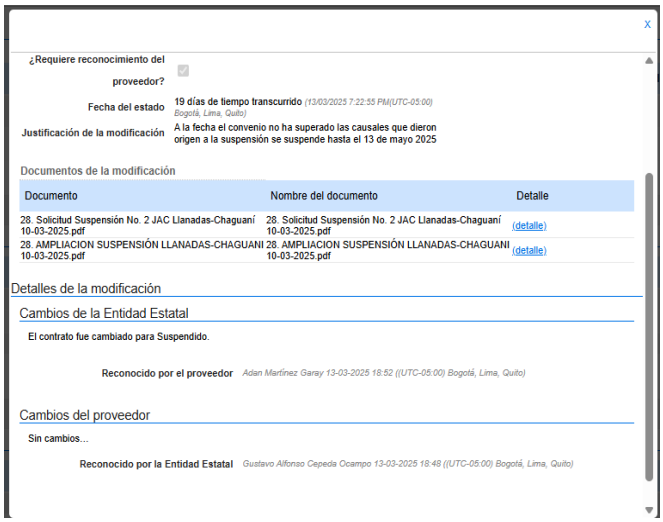

x

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Fecha del estado: 19 días de tiempo transcurrido (13/03/2025 7:22:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación: A la fecha el convenio no ha superado las causales que dieron origen a la suspensión se suspende hasta el 13 de mayo 2025

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
28. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Llanadas-Chaguaní 10-03-2025.pdf	28. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Llanadas-Chaguaní 10-03-2025.pdf	(detalle)
28. AMPLIACION SUSPENSIÓN LLANADAS-CHAGUANI 10-03-2025.pdf	28. AMPLIACION SUSPENSIÓN LLANADAS-CHAGUANI 10-03-2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor: Adan Martínez Garay 13-03-2025 18:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 13-03-2025 18:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMANCHA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

- ✓ Durante el mes de marzo de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Extensión, conformación y compactación de material de cantera en el tramo objeto de intervención de la placa huella.
  - Armado y figurado de acero de refuerzo de elementos estructurales de la placa huella.
  - Actividades de mejoramiento de alcantarilla existente en tramo de la placa huella objeto de intervención.
  - Vaciados de concreto de elementos de huellas, centros, sobreanchos, cunetas, bordillos de la placa huella objeto de intervención.
  - Construcción de filtro francés en parte de la longitud de la placa huella a ser intervenida.
  - A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tiene un avance de obra física aproximado de **60%**, con la construcción de **150 metros lineales de filtro de drenaje,** mejoramiento de **(1) alcantarilla,** y construcción de **83 metros lineales de placa huella**.
- ✓ El 31 de marzo de 2025, a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 2 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31 de mayo de 2025, con el fin de poder culminar la totalidad de actividades constructivas de la obra física, plan de inversión social, socialización de cierre, cierres financieros y administrativos, y liquidación del convenio.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA GRATA – MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 219,5 metros lineales de placa huella.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de las actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **219,5 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron la totalidad de actividades en el marco del plan de inversión social, con las actividades de remodelación, mejoramiento y ampliación de carácter locativo en la sede del acueducto veredal.
- ✓ El 28-febrero-2025, se realizó la socialización de cierre del convenio solidario, en conjunto con la comunidad, JAC e Interventoría.






JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABRERA – MUNICIPIO DE PULÍ.

- ✓ Durante el mes de marzo de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Extensión, conformación y compactación de material de cantera en el tramo objeto de intervención de la placa huella.
  - Armado y figurado de acero de refuerzo de elementos estructurales de la placa huella.
  - Armado de formaletas y alistamiento para vaciados de concreto.
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
  - A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **160 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **83%.**
- ✓ El 31 de marzo de 2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 2 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31 de mayo de 2025, con el fin de poder culminar la totalidad de actividades constructivas de la obra física, plan de inversión social, socialización de cierre, cierres financieros y administrativos, y liquidación del convenio.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIRIA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante no ha realizado el desembolso de recursos para el convenio solidario, con el fin de reanudar e iniciar la ejecución de las obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**

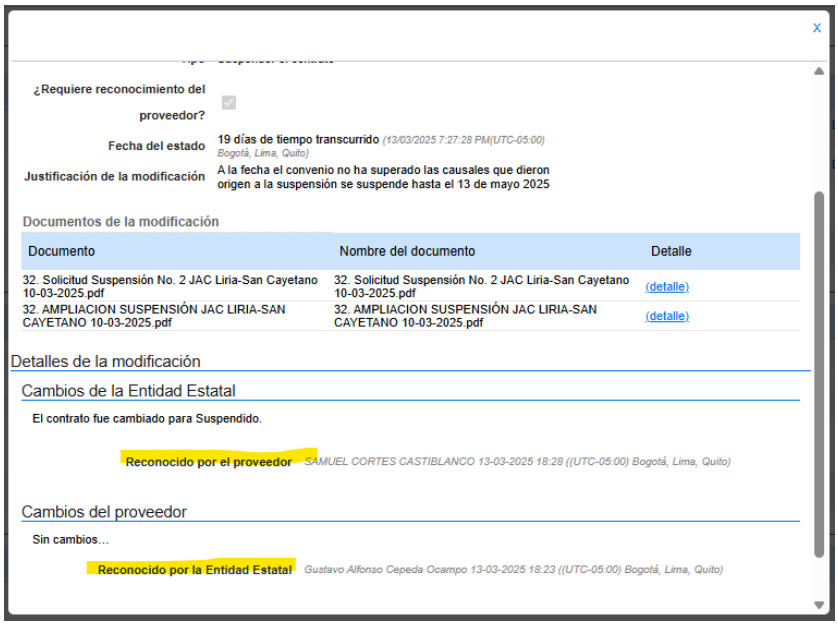

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Fecha del estado: 19 días de tiempo transcurrido *(13/03/2025 7:27:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación: A la fecha el convenio no ha superado las causales que dieron origen a la suspensión se suspende hasta el 13 de mayo 2025

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
32. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Liria-San Cayetano 10-03-2025.pdf	32. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Liria-San Cayetano 10-03-2025.pdf	(detalle)
32. AMPLIACION SUSPENSIÓN JAC LIRIA-SAN CAYETANO 10-03-2025.pdf	32. AMPLIACION SUSPENSIÓN JAC LIRIA-SAN CAYETANO 10-03-2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *SAMUEL CORTES CASTIBLANCO 13-03-2025 18:28 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*


Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 13-03-2025 18:23 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUADALUPE- MUNICIPIO DE QUIPILE

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante realizó al giro o desembolso de recursos a la Junta de Acción Comunal, por lo cual se estima que durante el mes de abril de 2025, se suscriba entre las partes el acta de reanudación del convenio solidario, con el fin de iniciar las actividades de la etapa de alistamiento y obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**

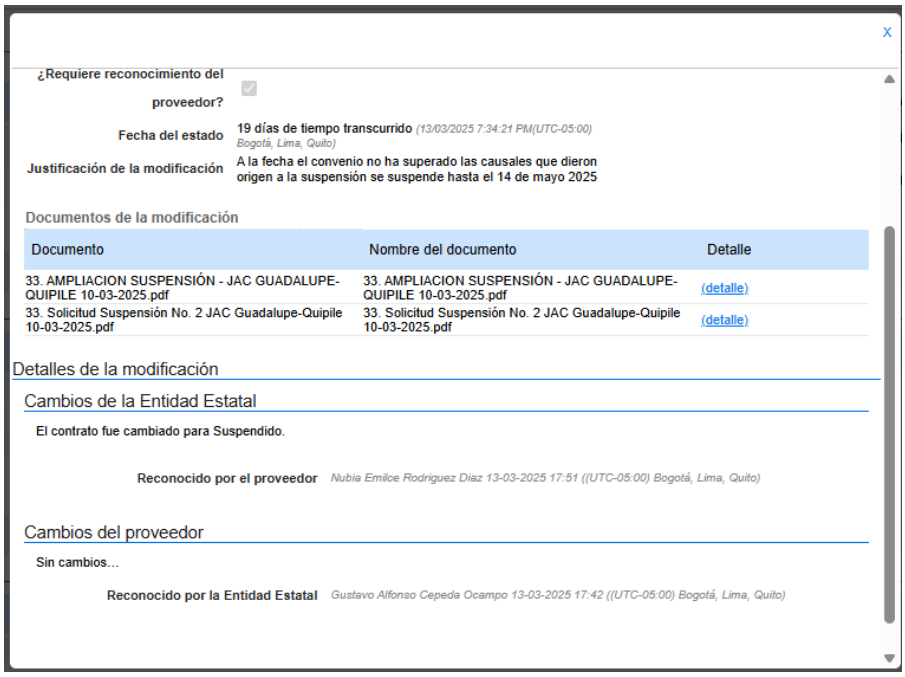

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Fecha del estado: 19 días de tiempo transcurrido (13/03/2025 7:34:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación: A la fecha el convenio no ha superado las causales que dieron origen a la suspensión se suspende hasta el 14 de mayo 2025

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
33. AMPLIACION SUSPENSIÓN - JAC GUADALUPE-QUIPILE 10-03-2025.pdf	33. AMPLIACION SUSPENSIÓN - JAC GUADALUPE-QUIPILE 10-03-2025.pdf	(detalle)
33. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Guadalupe-Quipile 10-03-2025.pdf	33. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Guadalupe-Quipile 10-03-2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor: Nubia Emilce Rodriguez Diaz 13-03-2025 17:51 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 13-03-2025 17:42 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante realizó el giro o desembolso de recursos a la Junta de Acción Comunal, por lo cual se estima que en el mes de abril de 2025 se suscriba entre las partes el acta de reanudación, con el fin de iniciar las actividades de la etapa de alistamiento y obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**
- ✓ Etapa de alistamiento por parte de la Junta de Acción Comunal.

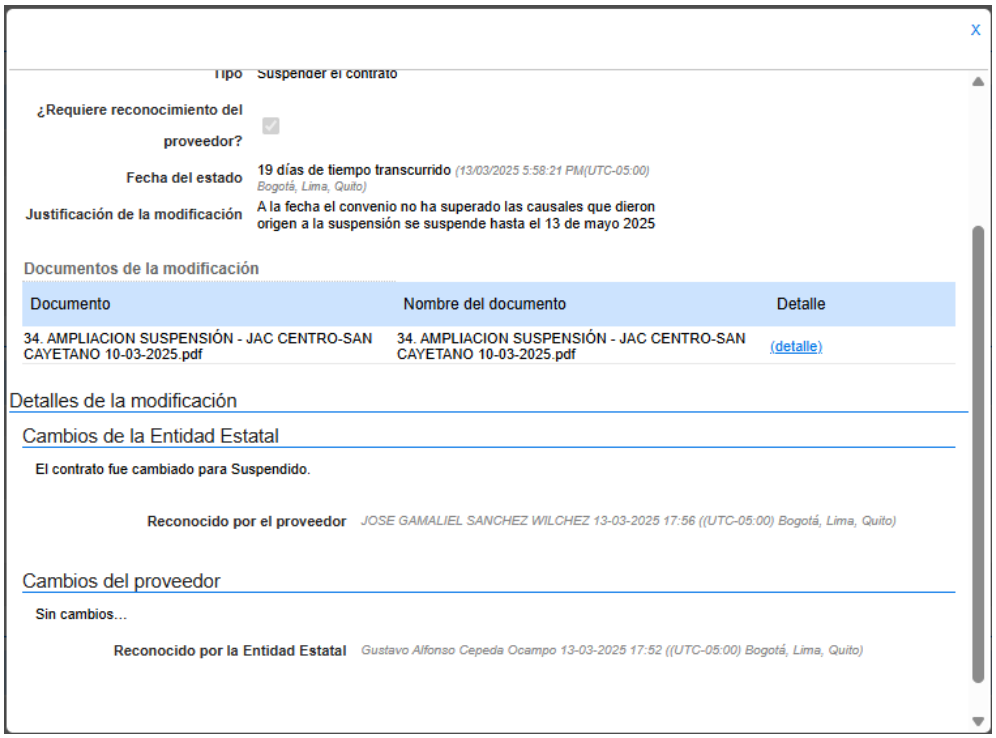

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLEDAL - MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA:

- ✓ Durante el mes de marzo de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Extensión, conformación y compactación de material de cantera en el tramo objeto de intervención de la placa huella.
  - Armado y figurado de acero de refuerzo de elementos estructurales de la placa huella.
  - Armado de formaletas y alistamiento para vaciados de concreto.
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
  - A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **130 metros lineales de placa huella, y (1) alcantarilla rehabilitada** correspondiente a un avance físico de obra del **88%.**
- ✓ El 31 de marzo de 2025, a través de la plataforma transaccional SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 2 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31 de mayo de 2025, con el fin de poder culminar la totalidad de actividades constructivas de la obra física, plan de inversión

social, socialización de cierre, cierres financieros y administrativos, y liquidación del convenio.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MANANTIAL – MUNICIPIO DE PULÍ:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 175 metros lineales de placa huella.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de la obra física y actividades.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **175 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, el 31-marzo-2025 se iniciaron las actividades de reparaciones y adecuaciones locativas en la Escuela El Manantial de la vereda, en el marco de actividades del plan de inversión social, para lo cual se estima sean culminadas durante el mes de abril de 2025.

- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se realicen las gestiones para llevar a cabo la socialización de cierre del convenio.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIGO – MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA:

- ✓ Durante el mes de marzo de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 180 metros lineales de placa huella.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de la obra física y actividades del plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **180 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizó la ejecución de las actividades en el marco del plan de inversión social, en el cual se realizó la dotación de sillas y

mesas en el salón comunal de la vereda, cuya actividad a la fecha ya está ejecutada en su totalidad.

- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se realicen las gestiones para llevar a cabo la socialización de cierre del convenio.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MODELIA – MUNICIPIO DE VIOTÁ:

- ✓ Durante el mes de marzo de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Extensión, conformación y compactación de material de cantera en el tramo objeto de intervención de la placa huella.

- Armado y figurado de acero de refuerzo de elementos estructurales de la placa huella.
- Armado de formaletas y alistamiento para vaciados de concreto.
- Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
- A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **96 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **55%.**
- En el presente mes, los rendimientos de la obra sufrieron retrasos, principalmente por cuenta de las condiciones climáticas de lluvia adversas en el sector del Municipio de Viotá.

✓ El 31 de marzo de 2025, a través de la plataforma transaccional SECOP II, se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 2 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31 de mayo de 2025, con el fin de poder culminar la totalidad de actividades constructivas de la obra física, plan de inversión social, socialización de cierre, cierres financieros y administrativos, y liquidación del convenio.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE – MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA:


- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 188 metros lineales de placa huella.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de la obra física y actividades.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **188 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron las actividades establecidas en el marco del plan de inversión social.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se realicen las gestiones para llevar a cabo la socialización de cierre del convenio.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PALMAR – MUNICIPIO DE VERGARA:


- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante realizó al giro o desembolso de recursos a la Junta de Acción Comunal, por lo cual se estima que durante el mes de abril de 2025, se suscriba entre las partes el acta de reanudación del convenio solidario, con el fin de iniciar las actividades de la etapa de alistamiento y obras de mejoramiento.

- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**.

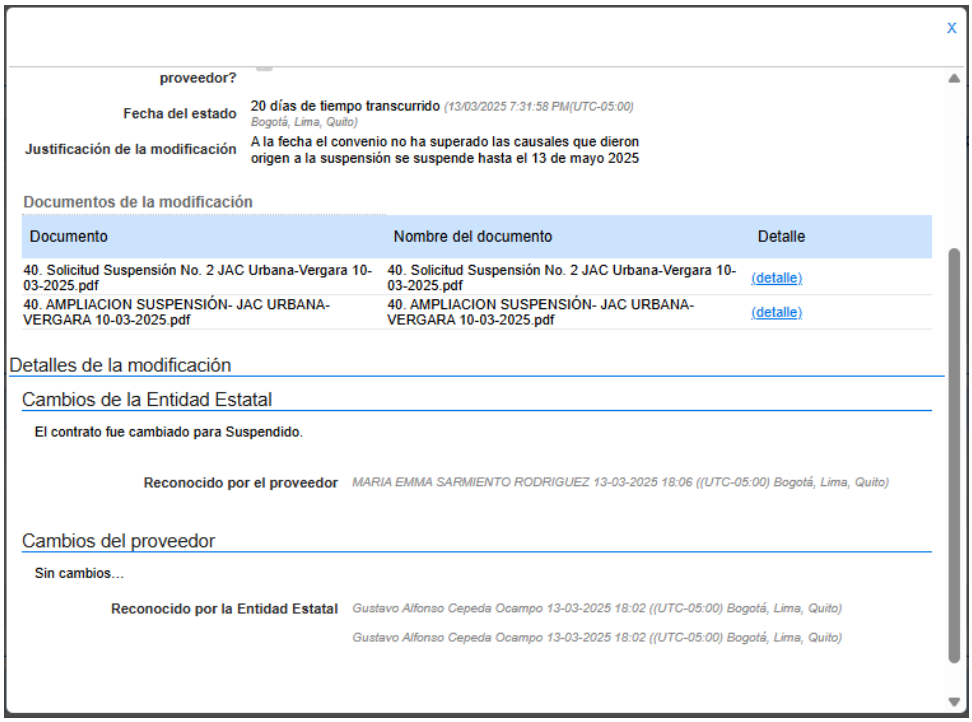

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LAS HONDURAS – MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante no ha realizado el desembolso de recursos para el convenio solidario, con el fin de reanudar e iniciar la ejecución de las obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**

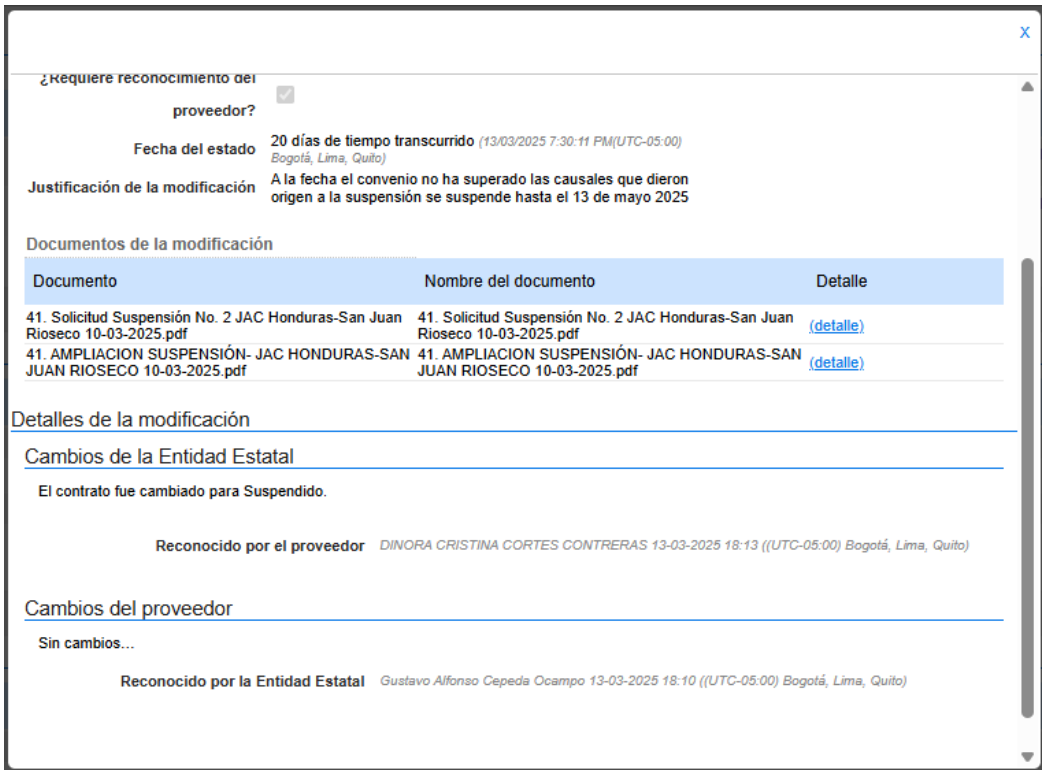

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Fecha del estado: 20 días de tiempo transcurrido (13/03/2025 7:30:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación: A la fecha el convenio no ha superado las causales que dieron origen a la suspensión se suspende hasta el 13 de mayo 2025

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
41. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Honduras-San Juan Rioseco 10-03-2025.pdf	41. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Honduras-San Juan Rioseco 10-03-2025.pdf	(detalle)
41. AMPLIACION SUSPENSIÓN- JAC HONDURAS-SAN JUAN RIOSECO 10-03-2025.pdf	41. AMPLIACION SUSPENSIÓN- JAC HONDURAS-SAN JUAN RIOSECO 10-03-2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor: DINORA CRISTINA CORTES CONTRERAS 13-03-2025 18:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 13-03-2025 18:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARCELLA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante realizó al giro o desembolso de recursos a la Junta de Acción Comunal, por lo cual se estima que durante el mes de abril de 2025, se suscriba entre las partes el acta de reanudación del convenio solidario, con el fin de iniciar las actividades de la etapa de alistamiento y obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**.

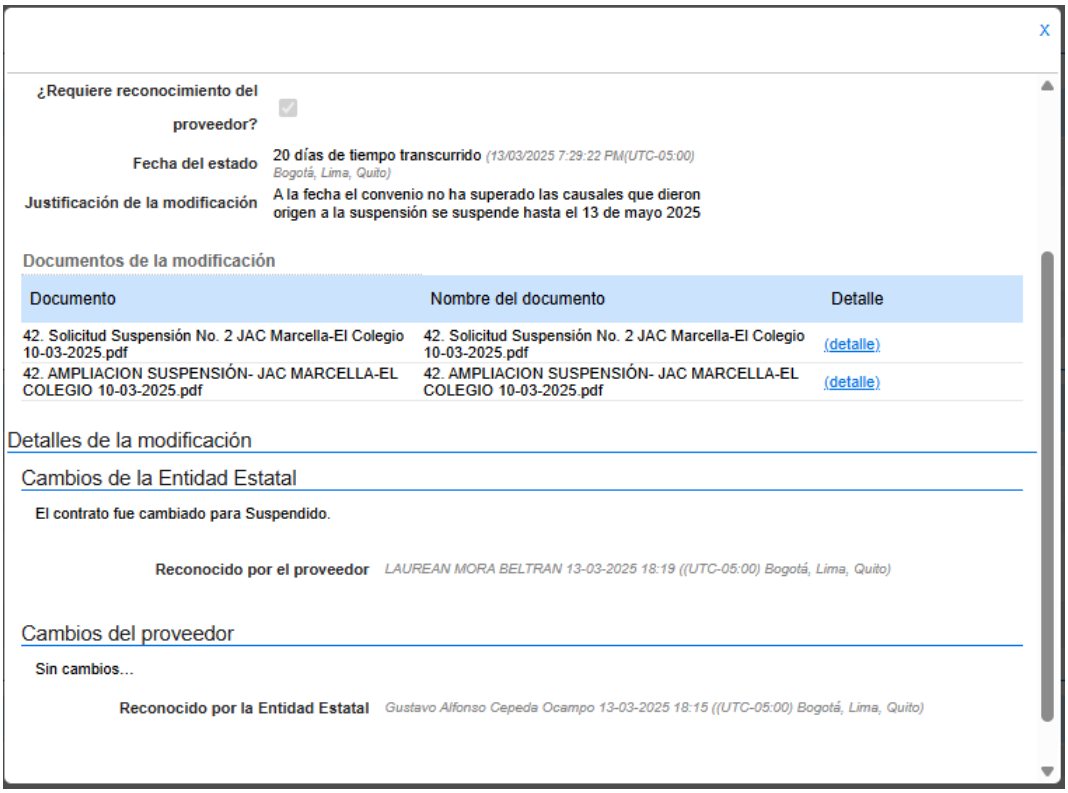

x

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Fecha del estado: 20 días de tiempo transcurrido *(13/03/2025 7:29:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación: A la fecha el convenio no ha superado las causales que dieron origen a la suspensión se suspende hasta el 13 de mayo 2025

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
42. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Marcella-El Colegio 10-03-2025.pdf	42. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Marcella-El Colegio 10-03-2025.pdf	(detalle)
42. AMPLIACION SUSPENSIÓN- JAC MARCELLA-EL COLEGIO 10-03-2025.pdf	42. AMPLIACION SUSPENSIÓN- JAC MARCELLA-EL COLEGIO 10-03-2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *LAUREAN MORA BELTRAN 13-03-2025 18:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*


Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 13-03-2025 18:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALIANZA– MUNICIPIO DE LA VEGA:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante no ha realizado el desembolso de recursos para el convenio solidario, con el fin de reanudar e iniciar la ejecución de las obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**

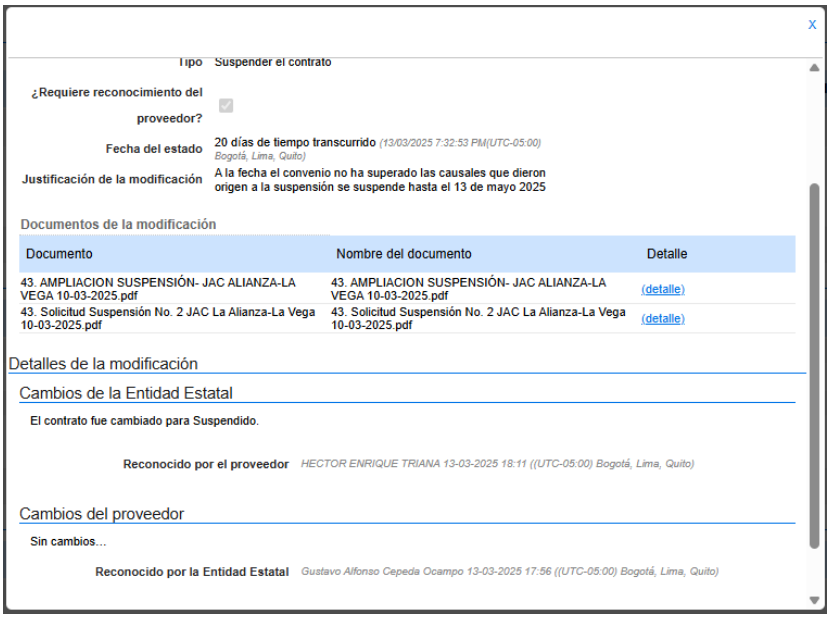


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA – MUNICIPIO DE UTICA:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante no ha realizado el desembolso de recursos para el convenio solidario, con el fin de reanudar e iniciar la ejecución de las obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**

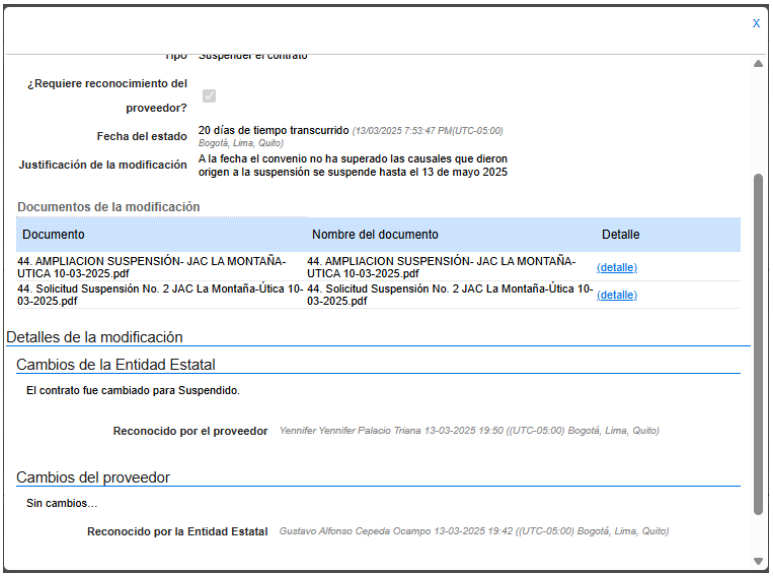

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ANTIOQUEÑITA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante no ha realizado el desembolso de recursos para el convenio solidario, con el fin de reanudar e iniciar la ejecución de las obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**.

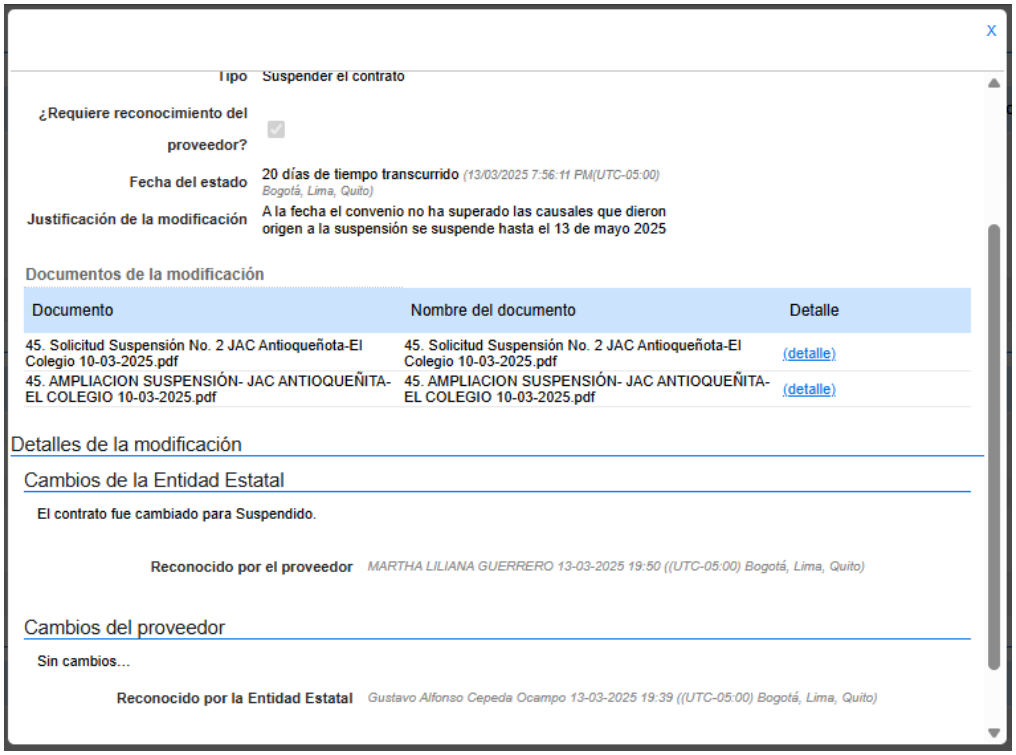

x

Tipo Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Fecha del estado 20 días de tiempo transcurrido *(13/03/2025 7:56:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación A la fecha el convenio no ha superado las causales que dieron origen a la suspensión se suspende hasta el 13 de mayo 2025

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
45. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Antioqueñota-El Colegio 10-03-2025.pdf	45. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Antioqueñota-El Colegio 10-03-2025.pdf	(detalle)
45. AMPLIACION SUSPENSIÓN- JAC ANTIOQUEÑITA-EL COLEGIO 10-03-2025.pdf	45. AMPLIACION SUSPENSIÓN- JAC ANTIOQUEÑITA-EL COLEGIO 10-03-2025.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *MARTHA LILIANA GUERRERO 13-03-2025 19:50 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 13-03-2025 19:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA – MUNICIPIO DE ARBELÁEZ:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente, se radica el 10 de marzo la prórroga No.2 desde el 01 de abril al 31 de julio del 2025.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS – MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, la junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente, se radica el 10 de marzo la prórroga No.2 desde el 01 de abril al 31 de julio del 2025.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente se termina la meta física con 208 ml de placa huella. Adicionalmente se termina la meta física del proyecto con 200 ml de placa huella y el mejoramiento de alcantarilla.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA -MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente, se radica el 10 de marzo la prórroga No.2 desde el 01 de abril al 31 de julio del 2025.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA - MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente se termina la meta física con 260 ml de placa huella, mejoramiento de alcantarilla.




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente se termina la meta física del proyecto con 200 ml de placa huella, mejoramiento de alcantarilla y 70 ml de filtro.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASORURAL - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:

Durante el periodo mencionado, Se continua con la suspensión No.1 del convenio desde el 26 de diciembre del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025, debido a que el convenio no cuenta con desembolso.

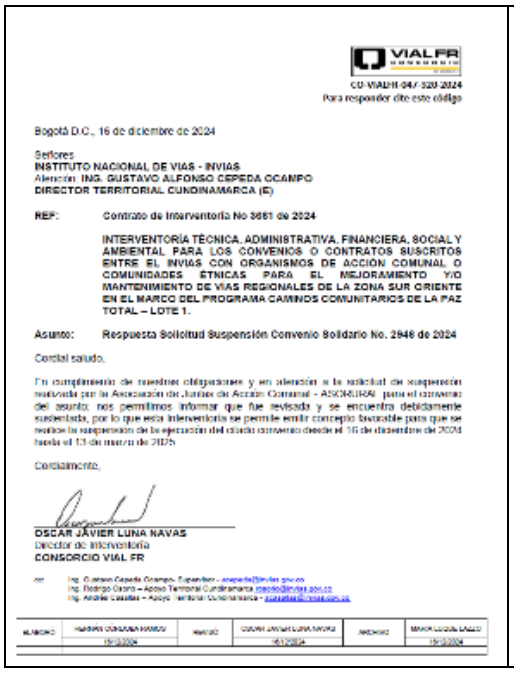

VIALFR CONSORCIO

CO-VIALFR-04/ 320-2024
Para responder cite este código

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)

REF: Contrato de Interventoría No 3661 de 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

Asunto: Respuesta Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2946 de 2024

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones y en atención a la solicitud de suspensión realizada por la Asociación de Juntas de Acción Comunal - ASORURAL para el convenio del asunto; nos permitimos informar que fue revisada y se encuentra debidamente sustentada, por lo que esta interventoría se permite emitir concepto favorable para que se realice la suspensión de la ejecución del citado convenio desde el 26 de diciembre de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL FR

cc: Ing. Gustavo Cepeda Ocampo- Supervisor - gcepeda@invias.gov.co
Ing. Rodrigo Osorio – Apoyo Territorial Cundinamarca rosorio@invias.gov.co
Ing. Andrés Casallas – Apoyo Territorial Cundinamarca - acasallas@invias.gov.co

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
	16/12/2024		16/12/2024		16/12/2024



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS - MUNICIPIO DE GUAYABETAL:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente se termina la meta física del proyecto con 207 ml de placa huella y mejoramiento de alcantarilla.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO - MUNICIPIO DE GUAYABETAL:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente se termina la meta física del proyecto con 227 ml de placa huella y el mejoramiento de alcantarilla.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS PEÑAS - MUNICIPIO DE MANTA:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente se termina la meta física del proyecto con 239 ml de placa huella, mejoramiento de alcantarilla y 12 ml de filtro.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. También se termina la meta física del proyecto con 190 ml de placa huella, mejoramiento de alcantarilla y 50 ml de filtro.
Adicionalmente, se radica el 10 de marzo la prórroga No.2 desde el 01 de abril al 31 de julio del 2025.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal finaliza la meta física de la placa huella con un total de 180 ml. La interventoría comparte vía electrónica el check list de liquidación con la JAC y programa la socialización de cierre del convenio solidario.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal finaliza la meta física de la placa huella con un total de 147.85 ml. La interventoría comparte vía electrónica el check list de liquidación con la JAC y programa la socialización de cierre del convenio solidario.




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal inicia la etapa de ejecución con la instalación del filtro, conformación de calzada, fundida de ciclópeo, huellas y cunetas; adicionalmente se realizan el corte, figurado y amarre del acero para el refuerzo en huellas, vigas, cunetas y bordillos.
Adicionalmente, se gestiona la prorroga No.2 la cual empieza a regir desde el 01 de abril del 2025 al 31 de julio del 2025.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, Se continua con la suspensión No.1 del convenio desde el 26 de diciembre del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025, debido a que el convenio no cuenta con desembolso.

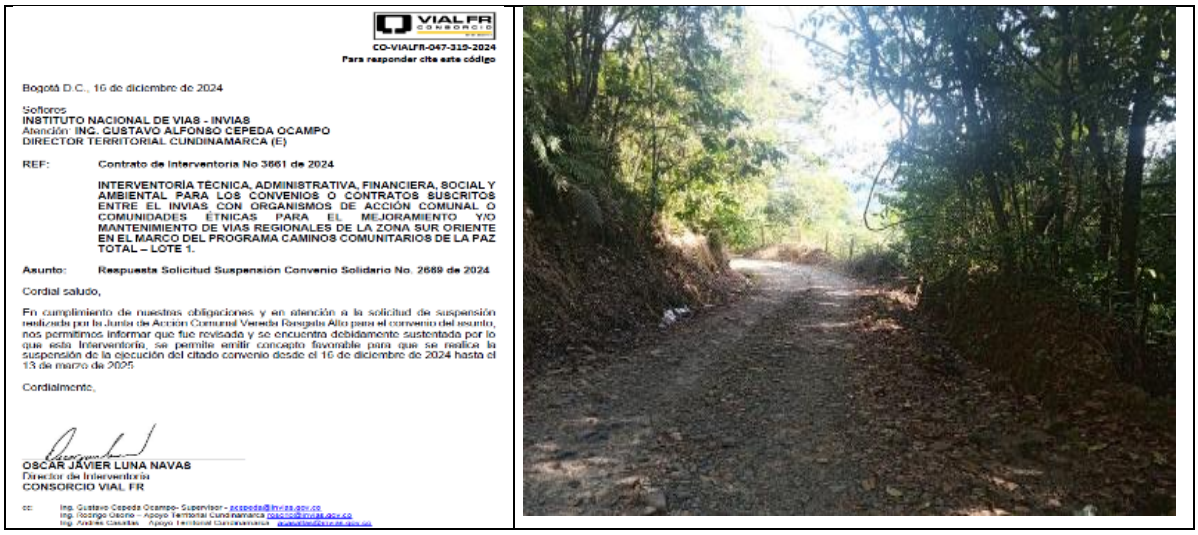

CO-VIALFR-047-310-2024
Para responder cite este código

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atención ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA (E)

REF: Contrato de Interventoria No 3661 de 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

Asunto: Respuesta Solicitud Suspension Convenio Solidario No. 2689 de 2024

Cordial saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones y en atención a la solicitud de suspensión radicada por la Junta de Acción Comunal Vereda Rasgata Alto para el convenio del asunto, nos permitimos informar que fue revisada y se encuentra debidamente sustentada por lo que esta Interventoría, se permite emitir concepto favorable para que se realice la suspensión de la ejecución del citado convenio desde el 16 de diciembre de 2024 hasta el 13 de marzo de 2025

Cordialmente,

OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL FR

cc: Ing. Gustavo Cepeda Ocampo- Supervisor - gcepeda@invias.gov.co
Ing. Rodrigo Osorio – Apoyo Territorial Cundinamarca rosorio@invias.gov.co
Ing. Andrés Castillo – Apoyo Territorial Cundinamarca acastillo@invias.gov.co

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, el convenio No. 2571-2024, se termina la meta física del proyecto con 183.1 ml de placa huella y el mejoramiento de alcantarilla.
Adicionalmente, se continua con el diligenciamiento de los formatos de liquidación y solicitando soportes; tanto para el área técnica, social, ambiental y sst.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, se termina la meta física del proyecto con 142 ml de placa huella y el mejoramiento de alcantarilla.
La Junta de Acción comunal sigue diligenciando los formatos de liquidación y solicitando soportes; tanto para el área técnica, social, ambiental y sst.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, se termina la meta física del proyecto con 150 ml de placa huella y el mejoramiento de alcantarilla.
La Junta de Acción comunal sigue diligenciando los formatos de liquidación y solicitando soportes; tanto para el área técnica, social, ambiental y sst.




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, se termina la meta física del proyecto con 150.2 ml de placa huella y el mejoramiento de alcantarilla.
La Junta de Acción comunal sigue diligenciando los formatos de liquidación y solicitando soportes; tanto para el área técnica, social, ambiental y sst.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA- MUNICIPIO DE TAUSA:

Durante el periodo mencionado, el convenio 2669-2024 continua con la suspensión No.1 del convenio desde el 26 de diciembre del 2024 hasta el 31 de marzo del 2025, debido a que el convenio no cuenta con desembolso.

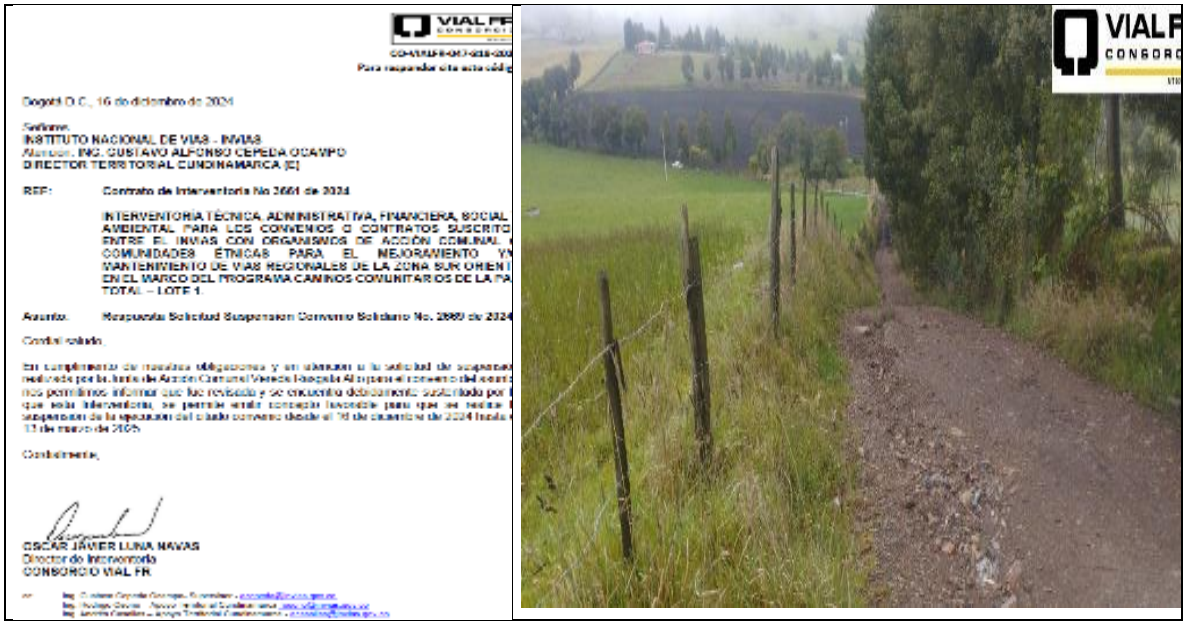

Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Atención: ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA [E]

REF: Contrato de Interventoría No 2661 de 2024

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL
AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITO
ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL
COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIEN
EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PA
TOTAL – LOTE 1

Asunto: Respuesta Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2669 de 2024

Cordial saludo

Cordialmente,

OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL FR

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO - MUNICIPIO DE UBAQUE:

Durante el periodo mencionado, se termina la meta física del proyecto con 206 ml de placa huella, el filtro con 16 ml y el mejoramiento de alcantarilla.
La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se continua con la obtención de soportes para las áreas técnica, sst, ambiental y social.



6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR DE LA TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA (E)
