DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3661-2024 |
| **Periodo:** | DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | 4622 del 02 de OCTUBRE de 2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

**01. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda el Cural, en el corredor vial denominado Vía vereda el Cural – Utica (Vía que comunica del municipio de Caparrapí – Utica – Sector Vereda Puente Río Pata hasta el tramo El cascajal en la vereda El Cural) que tiene una longitud de atención 0,23 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía que comunica del municipio de Caparrapí – Utica – Sector Vereda Puente Río Pata, y el punto final de referencia es PR0+230 El cascajal en la vereda El Cural, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**02. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Córdoba, en el corredor vial denominado vía Córdoba, sector obra los Viejitos hasta la Quebrada la Morena municipio de Caparrapí, con una longitud de atención de 0.16km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Córdoba sector los Viejitos, y el punto final de referencia es PR0+160 vía Córdoba, sector

Quebrada la Morena, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**03. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PEÑALOSA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Peñaloza, en el corredor vial denominado Vía vereda Peñaloza-Utica, tramo comprendido en la vía que comunica del municipio de Caparrapí-Utica, sector vereda Peñaloza, que tiene una longitud de atención de 0,40km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía vereda Peñaloza Utica, y el punto final de referencia es PR0+400 en la Vía vereda Peñaloza-Utica, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**04. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TATI DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Tati, en el corredor vial denominado Vía San Carlos – Tati – Sector capote sitio Clavijo, siete vueltas intermedio, sitio donde la señora Nohora y quebrada de los indios municipio Caparrapí tiene una longitud de atención de 0,15km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía San Carlos, y el punto final de referencia es PR0+150 en la parte de la quebrada de los indios , conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**05. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON**: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Peñón del departamento de Cundinamarca en la vereda ENCANTADO, en el corredor vial denominado la vía El Florido, vía que comunica El Encantado al Florido, que tiene una longitud de atención de 0,26km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Tubo del acueducto veredal, y el punto final de referencia es PR0+260 en la parte de la vía el florido, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**06. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Peñón del departamento de Cundinamarca en la vereda la Aguada, en el corredor vial denominado Vía la Aguada entrada Talauta a la vereda curiche que tiene una longitud de atención de 0,30km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Finca sr Benjamín y el punto final de referencia es PR0+300 en la parte de Benjamín Bustos terminando la finca, conforme

a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**07. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO FRIODEL MUNICIPIO DE LA PALMA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda Rio Frio, en el corredor vial denominado Rio Frio y Naranjal, vía que comunica vereda Rio Frio con vereda Naranjal, que tiene una longitud de atención de 0,29km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 en la alcantarilla, y el punto final de referencia es PR0+290 en la parte entrada a la vereda Rio Frio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**08. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda el Barrancón, en el corredor vial denominado vía vereda de El Barrancón Alto de Cañas, tramo comprendido entre la vereda de El Barrancón con la vereda Alto de Cañas la cual conduce a la vía Central del municipio; especialmente el tramo entre el predio de la señora Janeth Mahecha hasta el predio del señor Raúl Marroquín, que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 predio señora Yanet Mahecha, y el punto final de referencia es PR0+220 en la parte de la predio del señor Raúl Marroquín, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**09. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda Loma en medio, en el corredor vial denominado vía que comunica la vereda de Loma en Medio con la Vía central del municipio, específicamente el tramo desde el sector conocido como las monas hasta la loma de cabao que tiene una longitud de atención de 3km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa de las monas, y el punto final de referencia es PR0+3000 en la parte que tiene inicio del ramal, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**10. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca en la vereda Siria, en el corredor vial denominado Vía interna vereda siria, en el tramo conocido como "La Laja" que tiene una longitud de atención de 0,25km, tomando como punto de inicio

de referencia el PR0+00 Escuela rural de Siria, y el punto final de referencia es PR0+250 en la parte baja de la Vía interna vereda siria, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**11. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca en la vereda palmar, en el corredor vial denominado Inspección de Cuatro Caminos a la Vereda el Palmar sector "Curva de Don Adán" tiene una longitud de atención de 0.2km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de Cuatro Caminos, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la Vereda el Palmar sector "Curva de Don Adán, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**12. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Términos, en el corredor vial denominado vía Honduras, vía que comunica las veredas de Honduras a Términos que tiene una longitud de atención de 0,34km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Honduras, y el punto final de referencia es PR0+340 en la vía Honduras, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**13. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Naranjal, en el corredor vía Capira denominado vereda Naranjal con el sector Capira y Loma Finca de los Andes que tiene una longitud de atención de 0,17km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vereda Naranjal con el sector Capira, y el punto final de referencia es PR0+170 en la vía Capira Loma Finca de los Andes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías

**14. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda de Patatas, en el corredor vial denominado vía Patatas Guayabal en el sector (Loma esquina del colegio – hasta frente de don Chivagocha, placa huella con cunetas 0.2 km Vda Patatas) que comunica las veredas de Patatas, Pisco Chiquito, Alto de Micos,

Inspección de Guayabal del Peñón y Pisco Grande con el casco urbano (Vía alterna de la zona) que tiene una longitud de atención de 0,24km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía el colegio, y el punto final de referencia es PR0+240 en la Vía el colegio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**15. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Caquian, en el corredor vial denominado Vía Caquian alto, en la via que comunica las veredas de Caquian y San Antonio de Aguilera que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Caquian alto, y el punto final de referencia es PR0+200 en la vía Caquian alto, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**16. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Muchipay, en el corredor vial denominado Vía de la vereda Muchipay, que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vía vereda Muchipay, y el punto final de referencia es PR0+200 en la vía vereda Muchipay, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**17. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PURAY DEL MUNICIPIO DE YACOPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Puray, en el corredor vial denominado Yacopí - Llano Mateo Sector PURAY que tiene una longitud de 1.92 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Entrada de Eulisis, y el punto final de referencia es PR 1+920 Casa de Italo conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**18. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda La Glorieta, en el corredor vial denominado Yacopí-Ye Glorieta, vía que comunica el casco urbano de Yacopi con la inspección de Ibama, que tiene una longitud de atención de 2.5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco Urbano, y el punto final de referencia es PR 2+500 Inspección de Ibama, conforme

a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**19. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda la chapa, en el corredor vial denominado cruce vía ático-Escuela Chapa (Vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la Inspección de Llano Mateo) que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa de la señora Raquel, y el punto final de referencia es PR0+220 en la vereda la chapa, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**20. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO DE YACOPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Moray, en el corredor vial denominado Moray - Rio Ático sector placa huella Chapa -Rio Ático, vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de Aposentos que tiene una longitud de atención de 0.45 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco Urbano Yacopí, y el punto final de referencia es PR 0+450 Inspección rio negro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías

**21. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda limonal, en el corredor vial denominado la vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de lbama que tiene una longitud de atención de 1,62km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Yacopí-ibama, y el punto final de referencia es PR1+620 en la Vía Yacopí Corregimiento Ibama sector Limonal, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**22. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Laguneta, en el corredor vial denominado Vía Yacopí-corregimiento Ibama vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de lbama que tiene una longitud de atención de 0,31km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Yacopí-Corregimiento Ibama, y el punto final de referencia es PR0+310 en la Vía Yacopí-Corregimiento Ibama sector la Escuela, conforme a la información

levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**23. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA IBAMA DEL MUNICIPIO DE YACOPI:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la INSPECCIÓN DE IBAMA, en el corredor Vía Yacopí-corregimiento Ibama sector vía llanadas, en la vía que comunica el casco urbano de Yacopí con Ibama, que tiene una longitud de atención1.26 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco urbano Yacopí, y el punto final de referencia es PR 1+260 Inspección de Ibama, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**24. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA – MUNICIPIO DE QUIPILE:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quipile del departamento de Cundinamarca en la vereda La Argentina, en el corredor vial denominado Cuatro Caminos - La Joya, vía que comunica de la vereda Guadalupe sector 4 caminos a la vereda la Joya, que tiene una longitud de atención de 0.45 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 000 vereda Guadalupe sector 4 caminos, y el punto final de referencia es PR 0 + 450 Vereda la Joya, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**25. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL IMPARAL – MUNICIPIO DE SUPATÁ:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Supatá del departamento de Cundinamarca en la vereda El Imparal, en el corredor vial denominado Vía Imparal (Vía que comunica El Colegio El Imparal con la Vereda Girón), con una longitud de recorrido de atención de 1.89 km, el punto de inicio de referencia PR 0 + 00 es la vía Vereda Girón y el punto final de referencia es el PR 1 + 089 en el Sector Colegio El Imparal; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**26. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PULISITO – MUNICIPIO DE PULÍ:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la vereda Pulisito, en el corredor vial denominado Vía Sector Villamarta – Vía que de la planta de gas conduce a la vía el chocho, tiene una longitud de 1.5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 vía sector Villamarta y el punto final de referencia el PR 1 + 500 en la parte de la vía el chocho, conforme a la información levantada en campo

por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**27. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANETA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Francisco del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Sabaneta, en el corredor vial denominado Vía Sabaneta Sector Los Nocua (Vía que comunica a Sabaneta Alto Sector Los Nocua), con una longitud de atención de 0.22 km, el punto de referencia de inicio es el PR 0 + 00 Sector Los Nocua y el punto final de referencia es el PR 0 + 220 Vía Nacional Autopista Medellín (Bogotá – La Vega), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**28. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANADAS CENTRO – MUNICIPIO DE CHAGUANÍ:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chaguaní del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Llanadas Centro, en el corredor vial denominado Vía hacía Guaduas, que comunica las Veredas de Llanadas Chaguaní y Campeona Guaduas y Hatillo Guaduas con las vías principales que van desde Chaguaní a Guaduas, con una longitud de atención de 3.0 km, donde el punto de inicio de referencia es el PR 0 +00 Finca Los Naranjitos y el punto final de referencia es el PR 3 + 000 Sector Rosalito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**29. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMANCHA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Camancha, en el corredor vial denominado Vía Camancha Sector Los Pirineos, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 en la Finca Laura Arias y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Vía Vereda Santa Isabel, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**30. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA GRATA – MUNICIPIO DE FACATATIVÁ:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Facatativá del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Tierra Grata, en el corredor vial denominado Vía Tierra Grata Baja hacía Tierra Grata Alta Sector Camino Al Cielo, tramo comprendido en la Vía Transversal Medellín KM 21 + 500 Entrada Norte destapada Ruta Camino Al Cielo – Bogotá, que tiene una longitud de atención de 0.207 km, tomando como punto de inicio de

referencia el PR 0 + 00 Vía Tierra Grata Baja, y el punto final de referencia el PR 0 + 207 en la Vereda Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**31. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABRERA – MUNICIPIO DE PULÍ:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Cabrera, en el corredor vial entre sucesión Quiroga y la Finca del señor Solio Rojas, límites de la Vereda La Hamaca, con una longitud de 0.27 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 sucesión Quiroga Ismael Gómez y Solio Rojas, y el punto final de referencia es el PR 0 + 270 límites de la Vereda La Hamaca, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**32. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIRIA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Liria, en el corredor vial denominado Vía Vereda Liria Sector La Escuela Vereda Las Mercedes, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 en Vía Liria y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Vía Vereda Las Mercedes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**33. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUADALUPE – MUNICIPIO DE QUIPILE:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quipile del Departamento de Cundinamarca en la Vereda el Guadalupe, en el corredor vial denominado Vía Veredal Guadalupe Alto, tramo comprendido en la vía principal La Sierra con la Vereda Guadalupe Alto, que tiene una longitud de atención de 0.44 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía principal La Sierra, y el punto final de referencia el PR 0 + 440 Vereda Guadalupe Alto, conforma a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**34. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Centro Antiguo, en el corredor vial denominado Vía Vereda Centro San Cayetano vía a la Vereda Canutillal, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Vía Centro, y el punto final de referencia es el PR 1+ 00 Vía Vereda Canutillal, conforme a la información levantada en campo

por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**35. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLEDAL - MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabal de Síquima del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Robledal, en el corredor vial denominado Vereda El Robledal (Vía Principal y Camino de la Vereda Robledal), con una longitud de atención de 0.2 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Vía Principal, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Camino 1 Vereda Robledal, conforma a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**36. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MANANTIAL – MUNICIPIO DE PULÍ:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Manantial, en el corredor vial denominado Vía El Prado y El Congo, con una longitud de atención de 20 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía al Prado, y el punto final de referencia es el PR 20 + 000 en la parte de la Vía El Congo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**37. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIGO – MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabal de Síquima del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Trigo, en el corredor vial denominado El Retén, vía que comunica La Vereda El Trigo con el Casco Urbano del Municipio de Guayabal de Síquima, con una longitud de atención de 0.89 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 vía que comunica La Vereda El Trigo, y el punto final de referencia es el PR 0 + 890 tramo del Casco Urbano del Municipio de Guayabal de Síquima, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**38. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MODELIA – MUNICIPIO DE VIOTÁ:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Viotá del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Modelia, en el corredor vial denominado Vía Jasminia San Gabriel, tramo que comunica la Vereda Modelia a la Vereda California, con una longitud de atención de 0.18 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía de la Vereda Modelia, y el punto final de referencia es el PR 0 + 180 Vía a la Vereda California, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**39. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE – MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Antonio del Tequendama del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Quebrada Grande, en el corredor vial denominado Vía Quebrada Grande (Tramo comprendido en la vía que comunica la Entrada Pantano Rico Sector Milán Vía Santandercito Vereda Quebrada Grande), con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Finca Milán, y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Pantano Rico, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**40. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR – MUNICIPIO DE VERGARA:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Vergara del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Palmar, en el corredor vial denominado Vías El Palmar, La Vistosa, y El Vergel, La Paz, Sector Colegio Fidel León Triana, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía El Palmar – La Vistosa, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Vía El Vergel – La Paz Sector El Colegio Fidel León Triana, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**41. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Juan de Río Seco del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Honduras Alto, en el corredor vial denominado Vía Honduras Alto a San Nicolás, vía que comunica la Vereda Honduras Alto con la Inspección de San Nicolás, Municipio de San Juan de Río Seco, con una longitud de atención de 0.25 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía Honduras Alto, y el punto final de referencia en el PR 0 + 250 Vía Honduras Alto a la Inspección San Nicolás, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**42. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARCELLA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Colegio del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Marcella, en el corredor vial denominado Vía Cansaperros KM 10 Vía La Victoria, tramo comprendido en la vía que comunica Marsella Baja al Km 10 Vía la Victoria, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Finca Salomón, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Finca de Javier, conforme la información levantada en campo por parte del

equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**43. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA – MUNICIPIO DE LA VEGA:** El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Vega del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Alianza, en el corredor vial denominado Río Cañas a Chilín en la Vereda La Alianza del Municipio de La Vega, que tiene una longitud de atención de 0.22 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Sector Río Cañas, y el punto final de referencia es el PR 0 + 220 Sector Santa Teresita, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**44. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA – MUNICIPIO DE UTICA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Útica del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Montaña, en el corredor vial denominado La Montaña vía que comunica al municipio de Útica con el tramo El Caliche, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de referencia el PR 0 + 000 el Tramo el Caliche, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 vía que comunica al Municipio de Útica, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**46. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA – MUNICIPIO DE ARBELÁEZ:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Arbeláez del departamento de Cundinamarca en la vereda de Santa Barbara alta, en el corredor vial denominado Vía Santa Barbara Sector Casa Blanca en el punto Calamar Hasta quebrada La Legía, comprendido que tiene una longitud de atención de 0,2km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía santa bárbara, y el punto final de referencia es PR0+200 en la Vía santa Bárbara, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**47. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS – MUNICIPIO DE CABRERA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Las Águilas, en el corredor vial denominado vía Escuela águilas-Cabrera con una longitud de 0.315 km, el punto de inicio de referencia PR 0+00 en curva de la finca de Yesid Delgado y el punto final de referencia es PR0 + 315 después de la alcantarilla, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**48. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Zona Urbana, en el corredor vial denominado Vía veredas de Peñas blancas, Pueblo viejo, Paquilo, Canadá, La Playa, Hoyerías, La Cascada, Las Águilas hacia el casco urbano del municipio de Cabrera, en el tramo conocido como "las brisas - vías peñas blancas" que tiene una longitud de atención de 0,65km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 las brisas, y el punto final de referencia es PR0+650 en la parte baja de la Vías peñas blancas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**49. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA -MUNICIPIO DE CABRERA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda La Playa, en el corredor vial denominado vía Puente Sumapaz -La Playa, punto de referencia inicial en el puente Sumapaz y punto de referencia final Segunda Placa huella sector rio-Caserío. tiene una longitud de atención de 0,74km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 punto de referencia inicial en el puente Sumapaz, y el punto final de referencia es PR0+740 punto de referencia final Segunda Placa huella sector rio-Caserío, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**50. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA - MUNICIPIO DE CABRERA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Santa Rita parte baja, en el corredor vial denominado Sector El Corral vía que comunica de la vereda las Águilas hacia el casco urbano del municipio de Cabrera con una longitud de atención de 0.70km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía que comunica de la vereda las Águilas, y el punto final de referencia es PR0+700 vía que comunica de la vereda las Águilas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**51. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Fusagasugá del departamento de Cundinamarca en la vereda Guavio Bajo, en el corredor vial denominado Guavio Bajo - Guavio Alto, tramo comprendido en la vía que comunica de la vereda Guavio bajo a la vereda Guavio Alto que tiene una longitud de atención de 1,04km, tomando como punto de inicio de referencia el

PR0+00 Vía Guavio Bajo – Guavio alto, y el punto final de referencia es PR1+04 en la Vía Guavio Bajo – Guavio alto, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**52. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL-ASORURAL - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Fusagasugá del departamento de Cundinamarca en la vereda La Trinidad, en el corredor vial denominado Vía de la vereda La Trinidad, sector el Trapiche, trayecto desde el sitio Villa Inés hasta finca Sergio Mendoza tiene una longitud de atención de 0.16km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía vereda La Trinidad (Sitio Villa Inés), y el punto final de referencia es PR0+160 Vía vereda La Trinidad hasta la finca Sergio Mendoza, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**53. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS - MUNICIPIO DE GUAYABETAL:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca en la vereda el Limoncitos, en el corredor vial denominado vía antigua Bogotá Villavicencio hasta casa de Víctor Romero que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía antigua Villavicencio, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la casa de Víctor Romero, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**54. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO - MUNICIPIO DE GUAYABETAL :** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca en la vereda San Antonio, en el corredor vial denominado Sector vía paramo, vía que comunica la casa el caliche hasta mata grande que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa el caliche, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la mata grande, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**55. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PEÑAS - MUNICIPIO DE MANTA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Manta del departamento de Cundinamarca en la vereda Peñas, en el corredor vial denominado Vía que conduce de Puente Berlín al sitio La Escuela de la Vereda Peñas sector Potrero que tiene una longitud de atención de 1.15 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Puente Berlín, y el punto

final de referencia es PR 1+150 La Escuela, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**56. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES - MUNICIPIO DE MEDINA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina departamento de Cundinamarca en la vereda de Los Alpes, en el corredor vial denominado vía la inspección de los Alpes sector monumento de la Paz (Tramo comprendido en la vía que comunica a la inspección de los Alpes), con una longitud de atención de 1.40 km, el punto de inicio de referencia PR0+00 es la vía que comunica a la vereda de los Alpes sector monumento de la Paz y el punto final de referencia es PR1 +040 es caño Blanco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**57. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE MEDINA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda La Esmeralda, en el corredor vial denominado Inspección de San Pedro de Guajaray a la Inspección de la Esmeralda en el sitio Puerto Masato, que tiene una longitud de atención de 1,3km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de San Pedro de Guajaray, y el punto final de referencia es PR1+300 en la parte de la Inspección de la Esmeralda, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**58. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE MEDINA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda San José de Alto Redondo, en el corredor vial denominado, Vía inspección el engaño en vereda San José Alto Redondo, vía que conduce desde la Inspección de Maya a la Vereda San José de Alto Redondo, en el sitio Alto el Algarrobo tiene una longitud de atención de 0,24km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de Maya a la Vereda San José, y el punto final de referencia es PR0+240 en la parte del sitio Alto el Algarrobo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**59. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN PEDRO DE GUAJARAY - MUNICIPIO DE MEDINA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda Guarajay, en el corredor vial denominado sector borrachero vía San Pedro Guarajay, con una

longitud de atención de 1,77 km, el punto de inicio de referencia PR00+0 vía San Pedro Guajaray y el punto final de referencia PR1+77 es vía San Pedro Guajaray, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**60. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO - MUNICIPIO DE MEDINA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda San Juanito, en el corredor vial denominado Vía San Juanito – Gasatavena sector de Libertad que tiene una longitud de atención de 0,94km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía San Juanito, y el punto final de referencia es PR0+094 en el sector la Libertad, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**61. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda Los Alpes centro, en el corredor vial denominado Vía Marginal de la Selva a la Vía Los Alpes Sector La Loma de Los Morenos, vía que comunica la Inspección de San Pedro de Guajaray a la Inspección de los Alpes sector Alto de los Moreno, tiene una longitud de atención de 0.23km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 la Inspección de San Pedro de Guajaray, y el punto final de referencia es PR0+230 Inspección de los Alpes sector Alto de los Moreno, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**62. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda el Engaño, en el corredor vial denominado Vía maya el engaño sector la Y san pedro de jagua que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Finca Gilberto, y el punto final de referencia es PR0+220 en el chamizo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**63. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda San Jesús de Palomas, en el corredor vial denominado Vía Maña sector los Líos que conduce a la Vereda San Jesús de Palomas (tramo comprendido en la vía que conduce a la vereda San Jesús de Palomas), con una longitud de atención

de 1.56 km, el punto de inicio de referencia PR0+00 es la vía Maña y el punto final de referencia es PR1 +56 es Sector los Líos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**64. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda Buenavista alto Redondo, en el corredor vial denominado Vía Maya el Engaño, vía que conduce a la vereda Buenavista de alto redondo que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 sector la H, y el punto final de referencia es PR0+200 frente a la casa de Jairo Reyes en la vía que comunica a la Vereda Buenavista de Alto Redondo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**65. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA - MUNICIPIO DE TAUSA:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tausa del departamento de Cundinamarca en la vereda Rasgata, en el corredor vial denominado vía principal troncal del carbón, vía que comunica Troncal del carbón sector Pantano Redondo, tiene una longitud de atención de 0,40km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 en la troncal del carbón, y el punto final de referencia es PR0+400 sector Pantano Redondo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

**66. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO - MUNICIPIO DE UBAQUE:** El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ubaque del departamento de Cundinamarca en la vereda Romero, en el corredor vial denominado Vía alterna sector el Sobandero (Via Alterna Sector el Sobandero, inicia Finca Pedro Saray Lavado y Termina en La Via Principal Ubaque - Fomeque - Vereda ROMERO Municipio de UBAQUE), bajo con una longitud de corredor de atención de 0.32 km, el punto de inicio de referencia finca Pedro Saray Lavado y el punto final de referencia es PR 00+320 vía principal Ubaque – Fomeque – Vereda Romero, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

# CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

**Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;**

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2585 de 2024 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CURAL EN EL MUNICIPIO CAPARRAPÍ DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA. |
| **NIT.** | 900.592.212-9 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | 201.072.692,00<br>(DOSCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCIÓN |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2690 DE 2024 CÓRDOBA;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2690 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORDOBA MUNICIPIO DE CAPARRAPI |
| **NIT.** | 832.007.302-1 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $201.049.181,00<br>(DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2390 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA CAPARRAPI DEL MUNICIPIO CAPARRAPI, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA DEL MUNICIPIO CAPARRAPI |
| **NIT.** | 901.017.574-9 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 201.089.987<br>(DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | SIN INFORMACION |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2332 DE 2024 TATI;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2332 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO TATI MUNICIPIO DE CAPARRAPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO TATI MUNICIPIO DE CAPARRAPI |
| **NIT.** | 900.592.212-9 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $200.955.709,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2525 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCIÓN COMUNAL DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON |
| **NIT.** | 900.784.449-1 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 201.043.481,00<br>(DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2353 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA AGUADA DEL MUNICIPIO EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA AGUADA DEL MUNICIPIO EL PEÑON |
| **NIT.** | 900.592.212-9 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $200.867.389,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2393 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA |
| **NIT.** | 901.274.670-9 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $200.961.874,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2834 de 2024 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC VEREDA DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA |
| **NIT.** | 901.130.029-9 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $200.964.505,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2321 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA |
| **NIT.** | 901.099.545-6 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $200.982.165,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2164 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA DE SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA DE SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME |
| **NIT.** | 901.277.978-5 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 200.208.920,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2747 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE VDA. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE VDA. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME |
| **NIT.** | 901.277.963-5 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 201.060.720,00<br>(DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2296 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ |
| **NIT.** | 900.592.212-9 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $201.010.045,00<br>(DOSCIENTOS UN MILLONES DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2429 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI |
| **NIT.** | 900.184.436-1 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 200.531.208,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2586 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ |
| **NIT.** | 900.184.430-8 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 200.935.282,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 30 DE SEPTIEMBRE |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2400 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ |
| **NIT.** | 900.184.811-0 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 200.935.282,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 30 DE SEPTIEMBRE |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2394 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ |
| **NIT.** | 900.184.420-4 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 201.032.018,00<br>(DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | SIN INFORMACION |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2129 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PURAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ELMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PURAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ |
| **NIT.** | 901.277.113-1 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 200.997.327,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2223 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPÍ |
| **NIT.** | 901.277.247-1 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 200.929.009,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NUEVE PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2383 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ |
| **NIT.** | 901.515.683-1 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 200.799.504,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2214 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DELDEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ELMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ |
| **NIT.** | 900.042.762-9 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 201.061.288,00<br>(DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2779 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ |
| **NIT.** | 901487525-3 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 200.871.439,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 30 DE SEPTIEMBRE |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2241 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ |
| **NIT.** | 807.002.146-3 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 201.086.476,00<br>(DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

## Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

| | |
|---|---|
| **No. CONVENIO SOLIDARIO** | 2281 de 2024 |
| **OBJETO:** | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS |
| **CONTRATISTA:** | JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPÍ |
| **NIT.** | 901.121.418-2 |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 200.917.714,00<br>(DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE) |
| **INTERVENTORIA** | CONSORCIO VIAL FR |
| **No. CONTRATO INTERVENTORIA** | 3661 DE 2024 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **FECHA ACTA DE INICI0:** | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:** | 01/01/2025 |
| **FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:** | 31/03/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2222-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA. LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE ALTA | NIT: | 901.013.320-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 09/11/2024 | 2024S-VBOG-083754 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (200.970.578,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (200.970.578,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2226-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | NIT: | 832.006.991-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 02/09/2024 | 2024S-VBOG-061505 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (200.893.500,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS (200.893.500,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2253-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PULISITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | NIT: | 900.994.281-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PULISITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 5/09/2024 | 2024S-VBOG-062500 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($201.006.282,00) MONEDA CORRIENTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($201.006.282,00) MONEDA CORRIENTE | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2298-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SABANETA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | NIT: | 901.003.772-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE SABANETA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060754 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($200.911.938,00), MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($200.911.938,00), MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2302-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANADAS CENTRO | NIT: | 901.767.959-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANADAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 01/11/2024 | 2024S-VBOG-081586 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE PESOS ($201.000.611,00), MONEDA CORRIENTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE PESOS ($201.000.611,00), MONEDA CORRIENTE | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2307-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMANCHA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO | NIT: | 901.046.566-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMANCHA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 5/09/2024 | 2024S-VBOG-062505 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($200.994.658,00) MONEDA CORRIENTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($200.994.658,00) MONEDA CORRIENTE | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2308-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ | NIT: | 900.040.926-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | N/A | N/A | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($200.987.421,00), MONEDA CORRIENTE | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS ($200.987.421,00), MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2345-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULÍ | NIT: | 808.002.466-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060729 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($200.994.250,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($200.994.250,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2351-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, VEREDA LIRIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA | NIT: | 901.577.185-9 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, VEREDA LIRIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060615 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($200.994.658,00), MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($200.994.658,00), MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2371-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: SECTOR ALTO VEREDA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE QUIPILE | NIT: | 901.003.063-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL Y/O ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: SECTOR ALTO VEREDA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | | | |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($201.069.084,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS ($201.069.084,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2378-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO | NIT: | 901.529.117-3. |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 5/09/2024 | 2024S-VBOG-062510 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($200.944.344,00) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($200.944.344,00) | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2380-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ROBLEDAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA | NIT: | 900.813.471-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ROBLEDAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 2/09/2024 | 2024S-VBOG-061411 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($200.908.091,00) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($200.908.091,00) | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2399-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MANANTIAL MUNICIPIO PULÍ. | NIT: | 901.049.328-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MANANTIAL MUNICIPIO PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060724 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($201.006.282,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($201.006.282,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2624-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JAC EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA | NIT: | 900.114.191-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 04/09/2024 | 2024S-VBOG-062246 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($201.030.732,00) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($201.030.732,00) | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2755-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ | NIT: | 808.002.214-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060620 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($201.000.813,00) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($201.000.813,00) | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3018-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADAGRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | NIT: | 800.029.337-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE QUEBRADAGRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060610 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($200.962.899,00) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($200.962.899,00) | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3482-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANA DE VERGARA DEL MUNICIPIO DE VERGARA | NIT: | 901.113.133-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANA DE VERGARA DEL MUNICIPIO DE VERGARA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 06/11/2024 | 2024S-VBOG-082504 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($200.933.953,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($200.933.953,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3499-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO | NIT: | 901.018.330-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 05/10/2024 | 2024S-VBOG-072619 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($200.900.694,00) | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($200.900.694,00). | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **SUSPENSIONES:** | 1 | | |
| **AMPLIACIONES A SUSPENSIONES:** | 2 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3542-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO | NIT: | 900.732.003-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 05/10/2024 | 2024S-VBOG-072620 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($200.954.396,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($200.954.396,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3873-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA | NIT: | 900.790.862-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 2024-11-06 | 024S-VBOG-082569 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($201.164.639,00). | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($201.164.639,00). | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 3978-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE UTICA DEL DEPARTAMENTO | NIT: | 900.906.291-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE UTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 06/11/2024 | 2024S-VBOG-082512 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($200.942.212,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($200.942.212,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 4018-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE UTICA DEL DEPARTAMENTO | NIT: | 900.906.291-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 06/11/2024 | 2024S-VBOG-082513 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS $200.771.798,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS $200.771.798,00) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2203-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE SANTA BARBARA ALTA MUNICIPIO DE ARBELAEZ | NIT: | 901070188-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 1/11/2024 | 2024S-VBOG-081584 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (200.979.179) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS (200.979.179) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 1:** | HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA N:** | 2 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 2:** | HASTA 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2125-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS MUNICIPIO DE CABRERA | NIT: | 900.569.331-0 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060616 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS (200.956.701) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS (200.956.701) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 1:** | HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA N:** | 2 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 2:** | HASTA 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2526-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA MUNICIPIO DE CABRERA | NIT: | 900.272.654-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ZONA URBANA MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 4/09/2024 | 2024S-VBOG-062247 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (201.077.617) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS (201.077.617) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2533-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PLAYA MUNICIPIO DE CABRERA | NIT: | 900.608.122-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060641 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (201.026.599) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (201.026.599) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA N:** | 2 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA 31 DE JULIO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2710-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA MUNICIPIO DE CABRERA | NIT: | 900.588.475-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060766 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (201.057.392) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (201.057.392) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2436-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | NIT: | 808.003.459-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAVIO BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 2/09/2024 | 2024S-VBOG-061227 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (201.033.054) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (201.033.054) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2946-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | ASOCIACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASORURAL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ | NIT: | 901.031.866-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN RURAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL - ASORURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 1/11/24 | 2024S-VBOG-081588 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (201.060.582) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (201.060.582) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA N:** | N/A | | |
| **SUSPENSION 1:** | 1 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 14 DE MARZO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2389-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS MUNICIPIO DE GUAYABETAL | NIT: | 901.028.437-5 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LIMONCITOS DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 2/09/2024 | 2024S-VBOG-061226 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (200.802.790) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS (200.802.790) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2800-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO MUNICIPIO DE GUAYABETAL | NIT: | 901.028.032-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060615 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (200.965.694) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (200.965.694) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2259-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PEÑAS MUNICIPIO DE MANTA | NIT: | 900.809.556-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA VEREDA DE PEÑAS DEL MUNICIPIO DE MANTA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060732 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (200.995.403) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (200.995.403) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2252-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LOS ALPES MUNICIPIO DE MEDINA | NIT: | 900.304.999-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 3/09/2024 | 2024S-VBOG-060723 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (200.895.912) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS (200.895.912) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **PRÓRROGA N1:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 1:** | HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025 | | |
| **PRÓRROGA N2:** | 2 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 2:** | HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2279-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA MUNICIPIO DE MEDINA | NIT: | 900.715.676-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 5/09/2024 | 2024S-VBOG-062501 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (200.895.356) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (200.895.356) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2315-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO MUNICIPIO DE MEDINA | NIT: | 900.247.104-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN JOSE DE ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060822 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (201.007.463) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (201.007.463) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2518-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY MUNICIPIO DE MEDINA | NIT: | 900.294.931-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN PEDRO DE GUAJARAY DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060644 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (201.052.494) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (201.052.494) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **PRÓRROGA N1:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 1:** | HASTA 31 DE MARZO DEL 2025 | | |
| **PRÓRROGA N2:** | 2 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN PRORROGA 2:** | HASTA 31 DE JULIO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2547-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO MUNICIPIO DE MEDINA | NIT: | 900.298.850-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 5/09/2024 | 2024S-VBOG-062514 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (201.068.440) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (201.068.440) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA N:** | N/A | | |
| **SUSPENSION 1:** | 1 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN SUSP 1:** | HASTA 14 DE MARZO DEL 2025 | | |
| **SUSPENSION 2:** | 2 | | |
| **REINICIO** | HASTA 13 DE MARZO DEL 2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN SUSP 2:** | HASTA 31 DE JULIO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2547-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | ASOCIACIÓN DE JAC MEDINA CUNDINAMARCA | NIT: | 901.662.959-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA, CUNDINAMARCA DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 3/09/2024 | 2024S-VBOG-061780 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (201.006.282) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (201.006.282) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA 31 DE MARZO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2221-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ENGAÑO MUNICIPIO DE PARATEBUENO | NIT: | 901.116.838-2 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ENGAÑO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060638 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (201.014.808) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS (201.014.808) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2268-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS MUNICIPIO DE PARATEBUENO | NIT: | 901.030.694-8 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060746 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (200.960.298) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (200.960.298) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2322-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTOREDONDO MUNICIPIO DE PARATEBUENO | NIT: | 900.757.703-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BUENA VISTA ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060745 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (201.094670) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (201.094670) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA 31 DE MARZO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2669-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA ALTA MUNICIPIO DE TAUSA | NIT: | 900.668.935-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASGATA DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 6/11/24 | 2024S-VBOG-082564 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (200.947.390) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (200.947.390) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | N/A | | |
| **PRÓRROGA N:** | N/A | | |
| **SUSPENSION 1:** | 1 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN SUSP 1:** | HASTA EL 14 DE MARZO DEL 2025 | | |
| **SUSPENSION 2:** | 2 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN SUSP 2:** | HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.** | 2309-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO MUNICIPIO DE UBAQUE | NIT: | 900.308.926-3 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC DE LA VDA. DE ROMERO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/08/2024 | 2024S-VBOG-060791 | SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (200.843.748) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN NN:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (200.843.748) MONEDA CORRIENTE. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA N:** | 1 | | |
| **SUSPENSION 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| Convenio | REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR DESEMBOLSADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2585 | 687824 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.072.692 | $200.072.692 |
| 2690 | 692024 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.049.181 | $200.049.181 |
| 2390 | 958424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.089.987 | $ 0.00 |
| 2332 | 637824 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.955.709 | $199.955.709 |
| 2525 | 687724 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.043.481 | $200.043.481 |
| 2353 | 683824 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.867.389 | $199.867.389 |
| 2393 | 671524 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.961.874 | $199.961.874 |
| 2834 | 710724 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.964.505 | $199.964.505 |
| 2321 | 674424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.982.165 | $199.982.165 |
| 2164 | 666224 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.208.920 | $199.208.920 |
| 2747 | 710924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.060.720 | $200.060.720 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | 670124 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.010.045 | $ 0.00 |
| 2429 | 698824 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.531.208 | $199.531.208 |
| 2586 | 692424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.935.282 | $ 0.00 |
| 2400 | 664924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.935.282 | $ 0.00 |
| 2394 | 698824 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.032.018 | $200.032.018 |
| 2129 | 606624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.997.327 | $199.997.327 |
| 2223 | 631924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.929.009 | $199.929.009 |
| 2383 | 672624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.799.504 | $199.799.504 |
| 2214 | 636724 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.061.288 | $200.061.288 |
| 2779 | 711124 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.871.439 | $199.871.439 |
| 2241 | 671324 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.086.476 | $200.086.476 |
| 2281 | | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.917.714 | $ 0.00 |
| 2222 | 637024 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,970,578.00 | $ 199,970,578.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2226 | 665924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,893,500.00 | $ 199,893,500.00 |
| 2253 | 665124 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,006,282.00 | $ 200,006,282.00 |
| 2298 | 637324 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,911,938.00 | $ 199,911,938.00 |
| 2302 | 953324 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,000,611.00 | $ 200,000,611.00 |
| 2307 | 665324 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,994,658.00 | $ 199,994,658.00 |
| 2308 | 641424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,987,421.00 | $ 199,987,421.00 |
| 2345 | 671924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,994,250.00 | $ 199,994,250.00 |
| 2351 | 676924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,994,658.00 | $ 199,994,658.00 |
| 2371 | 1160824 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200.069.084 | $ 200.069.084 |
| 2378 | 691724 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,944,344.00 | $ 199,944,344.00 |
| 2380 | 673224 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,908,091.00 | $ 199,908,091.00 |
| 2399 | 665024 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,006,282.00 | $ 200,006,282.00 |
| 2624 | 686024 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,030,732.00 | $ 200,030,732.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2755 | 711024 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,000,813.00 | $ 200,000,813.00 |
| 3018 | 740624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,962,899.00 | $ 199,962,899.00 |
| 3482 | 865624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,933,953.00 | $ 199,933,953.00 |
| 3499 | 861924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,900,694.00 | $ 0.00 |
| 3542 | 928324 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,954,396.00 | $ 199,954,396.00 |
| 3873 | 960924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,164,639.00 | $ 200,164,639.00 |
| 3978 | 989324 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,942,212.00 | $ 199,942,212.00 |
| 4018 | 1022324 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 199,771,798.00 | $ 199,771,798.00 |
| 2203 | 684024 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,979,179.00 | $ 200,979,179.00 |
| 2125 | 634024 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,956,701.00 | $ 200,956,701.00 |
| 2526 | 700424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,077,617.00 | $ 201,077,617.00 |
| 2533 | 700624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,026,599.00 | $ 201,026,599.00 |
| 2710 | 693424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,057,392.00 | $ 201,057,392.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | 681124 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,033,054.00 | $ 201,033,054.00 |
| 2946 | 1024824 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,060,582.00 | $ 0.00 |
| 2389 | 672524 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,802,790.00 | $ 200,802,790.00 |
| 2800 | 710624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,965,694.00 | $ 200,965,694.00 |
| 2259 | 673524 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,995,403.00 | $ 200,995,403.00 |
| 2252 | 675024 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,895,912.00 | $ 200,895,912.00 |
| 2279 | 666524 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,895,356.00 | $ 200,895,356.00 |
| 2315 | 665624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,007,463.00 | $ 201,007,463.00 |
| 2518 | 687624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,052,494.00 | $ 201,052,494.00 |
| 2547 | 687524 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,068,440.00 | $ 201,068,440.00 |
| 2571 | 687424 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,006,282.00 | $ 201,006,282.00 |
| 2221 | | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,014,808.00 | $ 201,014,808.00 |
| 2268 | 676124 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,960,298.00 | $ 200,960,298.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | 665224 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 201,094,670.00 | $ 201,094,670.00 |
| 2669 | 958624 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,947,390.00 | $ 0.00 |
| 2309 | 671024 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $ 200,843,748.00 | $ 200,843,748.00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo Parcial de Obra No. __ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Ajuste ___ No. | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 30 DE ABRIL 2025, para el periodo ABRIL, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.072.692,00 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0 | 86% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 81% |

| | | |
|---|---|---|
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $201.049.181,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.089.987,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2332 DE 2024 TATI;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | **$** 200.955.709,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.043.481,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 96% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.867.389,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 96% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.961.874,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.964.505,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.982.165,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.208.920,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 81% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 70% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.060.720,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 75% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 56% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.010.045,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.531.208,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 81% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 25% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.935.282,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.935.282,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.032.018,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 87% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2129 DE 2024 PURAY;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.997.327,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.929.009,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.799.504,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 96% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2214 DE 2024 MORAY;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.061.288,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.871.439,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 96% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.086.476,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.917.714,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 15% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 25% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2222-2024 LA ARGENTINA:**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.970.578,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $166,805,579.74 | 83% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $200.970.578,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2226-2024 EL IMPARAL;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.893.500,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $174,777,345 | 87% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $200.893.500 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2253-2024 PULISITO;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $201.006.282,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $201.006.282 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $201.006.282 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2298-2024 SABANETA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.911.938,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $200.911.938 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $200.911.938 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2302-2024 LLANADAS;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $201.000.611,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2307-2024 CAMANCHA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.994.658,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $174,865,352.46 | 87% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $200.994.658 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2308-2024 TIERRA GRATA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.987.421,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $200.987.421 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $200.987.421 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2345-2024 CABRERA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.994.250,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $174,865,352.46 | 86% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $200.994.250 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2351-2024 LIRIA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.994.658,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2371-2024 GUADALUPE;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $201.069.084,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2378-2024 CENTRO ANTIGUO;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.944.344,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2380-2024 ROBLEDAL;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.908.091,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $172,780,958.26 | 86% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $200.908.091 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2399-2024 MANANTIAL;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.006.282,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 201.006.282 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $201.006.282 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2624-2024 EL TRIGO;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.030.732,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $201.030.732 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $201.030.732 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2755-2024 MODELIA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.000.813,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $172,860,699.18 | 86% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $152,760,617.88 | 76% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 3018-2024 QUEBRADA GRANDE;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.962.899,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $200.962.899 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $200.962.899 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 3482-2024 URBANA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.933.953,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 3499-2024 HONDURAS ALTO;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.900.694,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 3542-2024 MARSELLA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.954.396,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 3873-2024 LA ALIANZA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.164.639,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 3978-2024 LA MONTAÑA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.942.212,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 4018-2024 ANTIOQUEÑITA;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.771.798,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0% |

**Convenio 2203-2024;**

| **ITEM** | **VALOR (MILLONES)** | **%** |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.979.179,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 54.264.378,33 | 90% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 95% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2125-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.956.701,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 54.264.378,33 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2526-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $201.077.617,00 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.258.628,08 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2533-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $201.026.599,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.246.383,76 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2710-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $201.057.392,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.253.774,08 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2436-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $201.033.054,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.247.932,96 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2946-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $201.060.582,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 4% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2389-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.802.790,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $48.192.669.60 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 16.064.223,20 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2800-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.965.694,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $48.231.766,56 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 28.135.197,16 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2259-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $200.995.403,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.238.896,72 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2252-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.895.912,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.215.018,88 | 96% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 98% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2279-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.895.356,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.214.885,44 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2315-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.007.463,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.241.791,12 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2518-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.052.494,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 16.084.199,52 | 88% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 95% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2547-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.068.440,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.256.425,60 | 12% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 36% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2571-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.006.282,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.241.507,68 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2221-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.014.808,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.243.553,92 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2268-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.960.298,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.230.471,52 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2322-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 201.094.670,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 20.109.467,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $12.065.680.20 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2669-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.947.390,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 12% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

**Convenio 2309-2024;**

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONVENIO | $ 200.843.748,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 48.202.499,52 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 100% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0 |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | N/A |
| **Amortizado** | N/A |
| **Saldo** | N/A |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

**Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;**

Meta física programada %86.00
Meta física ejecutada %: 81.00

**Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;**

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

**Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;**

Meta física programada %:0.00
Meta física ejecutada %: 0.00

**Convenio 2332 DE 2024 TATI;**

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;**

Meta física programada %:96.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;**

Meta física programada %:96.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;**

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;**

Meta física programada %: 81.00
Meta física ejecutada %:70.00

**Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;**

Meta física programada %: 75.00
Meta física ejecutada %:56.00

**Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;**

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %:0.00

**Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;**

Meta física programada %: 81.00
Meta física ejecutada %:25.00

**Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;**

Meta física programada %: 0.00
Meta física ejecutada %:0.00

**Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;**

Meta física programada %:0.00
Meta física ejecutada %:0.00

**Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;**

Meta física programada %: 87.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2129 DE 2024 PURAY;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;**

Meta física programada %: 96.00
Meta física ejecutada %100.00

**Convenio 2214 DE 2024 MORAY;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;**

Meta física programada %: 96.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;**

Meta física programada %: 15.00
Meta física ejecutada %:25.00

**Convenio 2222-2024;**

Meta física programada %: 83.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2226-2024;**

Meta física programada %: 87.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2253-2024;**

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2298-2024;**

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2302-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 2307-2024;**

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2308-2024;**

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2345-2024;**

Meta física programada %: 86.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2351-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 2371-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 2378-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 2380-2024;**

Meta física programada %: 86.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2399-2024;**

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2624-2024;**

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 2755-2024;**

Meta física programada %: 86.00%
Meta física ejecutada %: 76.00%

**Convenio 3018-2024;**

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

**Convenio 3482-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 3499-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 3542-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 3873-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 3978-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 4018-2024;**

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

**Convenio 2203-2024;**

Meta física programada %:90.00
Meta física ejecutada %: 95.00

**Convenio 2125-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

**Convenio 2526-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

**Convenio 2533-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2710-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio2436-2024;**

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2946-2024;**

Meta física programada %: 4.00
Meta física ejecutada %:0.00

**Convenio2389-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio2800-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio2259-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio2252-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio2279-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2315-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2518-2024;**

Meta física programada %: 88.00
Meta física ejecutada %:95.00

**Convenio 2547-2024;**

Meta física programada %: 12.00
Meta física ejecutada %:36.00

**Convenio 2571-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio 2221-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

**Convenio2268-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

**Convenio2322-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

**Convenio2669-2024;**

Meta física programada %: 12.00
Meta física ejecutada %:0.00

**Convenio2309-2024;**

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha ninguna Junta de Acción Comunal a tramitado Ítems No Previstos.

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado reprogramaciones para ninguna JAC en el presente periodo.

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

## 1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han tramitado actas de suspensión.

## 1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han tramitado Adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

| CONVENIO | FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

**Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 25/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 22/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.107.270,00 | 0 | 22/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.053.636,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.214.539,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 25/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 22/07/2024 | 31/12/24 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.104.919,00 | 0 | 25/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.052.460,00 | 0 | 25/07/24 | 31/10/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.209.837,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 23/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 16/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.108.999,00 | 0 | 16/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.054.500,00 | 0 | 16/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.217.998,00 | 0 | 16/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2332 DE 2024 TATI;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 18/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 11/07/24 | 31/12/24 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.095.571,00 | 0 | 11/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.047.786,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.191.142,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 25/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 22/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.104.349,00 | 0 | 22/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.052.175,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.208.697,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 18/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 12/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.086.739,00 | 0 | 12/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.043.370,00 | 0 | 12/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.173.478,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 25/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 16/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.096.188,00 | 0 | 16/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.048.094,00 | 0 | 16/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.192.375,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 06/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 30/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.096.451,00 | 0 | 30/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.048.226,00 | 0 | 30/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.192.901,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 16/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 11/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.098.217,00 | 0 | 11/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.049.109,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.196.433,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 05/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 03/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.020.892,00 | 0 | 03/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.010.446,00 | 0 | 03/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.041.784,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 06/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 26/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.106.072,00 | 0 | 26/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.053.036,00 | 0 | 26/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.212.144,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 13/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 11/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.101.005,00 | 0 | 10/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.050.503,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.202.009,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 06/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 17/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.053.121,00 | 0 | 17/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.026.561,00 | 0 | 17/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.106.242,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 22/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.093.529,00 | 0 | 22/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.046.765,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.187.057,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 23/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 16/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.093.529,00 | 0 | 16/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.046.765,00 | 0 | 16/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.187.057,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 16/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.103.202,00 | 0 | 16/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.051.601,00 | 0 | 16/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.206.404,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2129 DE 2024 PURAY;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 04/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 02/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.099.733,00 | 0 | 02/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.049.867,00 | 0 | 02/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.199.466,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 12/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 08/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.092.901,00 | 0 | 08/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.046.451,00 | 0 | 08/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.185.802,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 23/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 16/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.079.951,00 | 0 | 16/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.039.976,00 | 0 | 16/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.159.901,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 22/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 10/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.106.129,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.053.065,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.212.258,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 11/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.087.144,00 | 0 | 29/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.043.572,00 | 0 | 29/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.174.288,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 10/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 05/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.108.648,00 | 0 | 05/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.054.324,00 | 0 | 05/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.217.296,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 18/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 10/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.191.772,00 | 0 | 10/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.095.886,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.383.543,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 18/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 1 | 11/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 1 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 1 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 1 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.084.375,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.042.188,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.168.750,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2222-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 360-74-994000008826 | 08/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,097,059.00 | 360-47-994000032060 | 08/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,048,530.00 | | 08/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,194,117.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2226-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 8/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008792 | 08/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,089,351.00 | 360-47-994000031989 | 08/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,044,676.00 | | 08/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,178,701.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2253-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 09/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008804 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,100,629.00 | 360-47-994000032028 | 09/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,050,315.00 | | 09/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,201,257.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2298-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 11/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008807 | 11/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,091,195.00 | 360-47-994000032030 | 11/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,045,598.00 | | 11/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,182,389.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2302-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 11/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008808 | 11/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,100,062.00 | 360-47-994000032031 | 11/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,050,032.00 | | 11/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,200,123.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

## Convenio 2307 -2024;

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 11/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008809 | 11/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,099,466.00 | 360-47-994000032032 | 11/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,049,733.00 | | 11/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,198,932.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2308-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 11/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008822 | 11/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,098,743.00 | 360-47-994000032055 | 11/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,049,372.00 | | 11/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,197,485.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

## Convenio 2345-2024

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 12/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008820 | 12/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,099,425.00 | 360-47-994000032053 | 12/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,049,713.00 | | 12/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,198,850.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2351-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 12/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | NB-100085749 | 12/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,099,466.00 | NB-100338209 | 12/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,049,733.00 | | 12/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,198,932.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2371-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 16/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008831 | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,106,909.00 | 360-47-994000032079 | 16/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,053,455.00 | | 16/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,213,818.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2378-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 23/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008863 | 23/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,094,435.00 | 360-47-994000032152 | 23/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,047,218.00 | | 23/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,188,870.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2380-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 16/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008832 | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,090,810.00 | 360-47-994000032080 | 16/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,045,405.00 | | 16/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,181,619.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2399-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 16/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008837 | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,100,629.00 | 360-47-994000032085 | 16/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,050,315.00 | | 16/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,201,257.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2624-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 23/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008864 | 23/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,103,074.00 | 360-47-994000032153 | 23/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,051,538.00 | | 23/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,206,147.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2755-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 26/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008879 | 26/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,100,082.00 | 360-47-994000032315 | 26/07/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,050,042.00 | | 26/07/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,200,163.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 3018-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 06/08/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000008926 | 06/08/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,096,290.00 | 360-47-994000032638 | 06/08/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,048,146.00 | | 06/08/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,192,580.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 3482-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 04/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000009075 | 04/09/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,093,396.00 | 360-47-994000033590 | 04/09/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,046,699.00 | | 04/09/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,186,791.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 3499-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 03/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-9940000090555 | 03/09/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,090,070.00 | 360-47-994000033451 | 03/09/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,045,036.00 | | 03/09/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,180,140.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 3542-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 05/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000009074 | 05/09/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,095,441.00 | 360-47-994000033589 | 05/09/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,047,721.00 | | 05/09/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,190,880.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 3873-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 20/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000009135 | 20/09/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,116,465.00 | 360-47-994000033966 | 20/09/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,058,233.00 | | 20/09/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,232,928.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 3978-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 27/09/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000009186 | 27/09/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,094,222.00 | 360-47-994000034203 | 27/09/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,047,112.00 | | 27/09/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,188,443.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 4018-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/10/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:**
**PÓLIZAS ACTUALIZADAS:** SI **X** O NO

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: RCE**<br>**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | 260,000,000.00 | 360-74-994000009185 | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | | | |
| Contratistas y Subcontratista | | | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS**<br>**TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO**<br>**Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.**<br>**Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20,077,181.00 | 360-47-994000034204 | 01/10/2024 | 31/10/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10,038,591.00 | | 01/10/2024 | 31/12/2027 |
| Estabilidad de la Obra | 40,154,361.00 | | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**Convenio 2203-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 5/07/2024 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.097.918,00 | 0 | 5/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.048.959,00 | 0 | 5/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.195.836,00 | 0 | 5/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2125-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 5/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 3/07/24 | 31/12/24 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.095.671,00 | 0 | 3/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.047.836,00 | 0 | 3/07/24 | 31/10/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.191.341,00 | 0 | 3/07/24 | 31/10/29 |

**Convenio 2526-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 30/07/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 19/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.107.762,00 | 0 | 19/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.053.881,00 | 0 | 19/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.215.524,00 | 0 | 19/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2533-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 1/08/2024
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 22/07/24 | 31/12/24 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.102.660,00 | 0 | 22/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.051.330,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.205.320,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2710-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 6/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 25/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.103.306,00 | 0 | 17/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.051.653,00 | 0 | 17/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.206.611,00 | 0 | 17/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2946 -2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 02/08/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.106.059,00 | 0 | 02/08/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.053.030,00 | 0 | 02/08/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.212.117,00 | 0 | 02/08/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2389-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 06/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 16/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.080.280,00 | 0 | 16/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.040.141,00 | 0 | 16/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.160.559,00 | 0 | 16/07/24 | 31/12/29 |

## Convenio 2800-2024

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 06/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 29/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.096.570,00 | 0 | 29/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.048.286,00 | 0 | 29/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.193.140,00 | 0 | 29/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2259-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 10/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.099.541,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.049.771,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.199.081,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2252-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 16/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 10/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.089.592,00 | 0 | 10/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.044.796,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.179.183,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2279-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 17/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 10/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.089.536,00 | 0 | 10/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.044.768,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.179.072,00 | 0 | 10/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2315-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 17/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 11/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.100.747,00 | 0 | 11/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.050.374,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.201.493,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2518-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 01/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 22/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.105.250,00 | 0 | 22/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.052.625,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.210.499,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2547-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 26/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 22/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.106.844,00 | 0 | 22/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.053.422,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.213.688,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2571-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 05/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 22/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.100.629,00 | 0 | 22/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.050.315,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.201.257,00 | 0 | 22/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2221-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 5/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.101.481,00 | 0 | 5/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.050.741,00 | 0 | 5/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.202.962,00 | 0 | 5/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2268-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 19/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 16/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.096.030,00 | 0 | 16/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.048.015,00 | 0 | 16/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.192.060,00 | 0 | 16/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2322-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 17/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 11/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.109.467,00 | 0 | 11/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.054.734,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.218.934,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2669-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 08/08/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 26/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.094.740,00 | 0 | 26/07/24 | 31/10/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.047.371,00 | 0 | 26/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.189.479,00 | 0 | 26/07/24 | 31/12/29 |

**Convenio 2309-2024;**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: APROBADA
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 18/07/24
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI _ O NO **X**

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: RCE<br>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales | $260.000.000 | 0 | 11/07/24 | 31/12/2024 |
| Patronal | | 0 | | |
| Contratistas y Subcontratista | | 0 | | |
| Vehículos Propios y No Propios | | 0 | | |

| **CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>Póliza de Cumplimiento** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 20.084.375,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/25 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 10.042.188,00 | 0 | 11/07/24 | 31/12/27 |
| Estabilidad de la Obra | 40.168.750,00 | 0 | 31/12/24 | 31/12/29 |

### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | | | … |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

ENVIADA:

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 3661-2024 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL FR | NIT: | 901.865.971-7 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | FJB INGENIERIA SAS (90%)<br>R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA (10%) | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 02/10/2024 | 2024S-VBOG-071656 | SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES |
| **VALOR INICIAL:** | DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($2.908.466.591), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO. | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICIÓN 1:** | N/A | | |
| **ADICIÓN N:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($2.908.466.591), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO. | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA 31 DICIEMBRE 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 2 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 1 | | |
| **PRÓRROGA 2:** | 2 | | |
| **SUSPENSIÓN 1:** | N/A | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025 | | |

## 2.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 916924 | 2024 | 10 | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | 2.908.466.591,00 | $0,00 | 2.908.466.591,00 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 1 | $ 85.073.280 | $ 16.163.923 | $0 | $ 101.237.203 |
| Acta Mensual de Costos No. 2 | $145.680.440 | $ 27.679.284 | $0 | $ 173.359.724 |
| Acta Mensual de Costos No. 3 | $226.750.216 | $ 43.082.541,04 | $0 | $ 43.082.541,04 |
| Acta Mensual de Costos No. 4 | $243.651.167 | $46.293.721,73 | $0 | $46.293.721,73 |
| Acta Mensual de Costos No. 5 | $448.021.315 | $85.124.049,85 | $0 | $85.124.049,85 |
| Acta Mensual de Costos No. 6 | $303.066.379,70 | $57.582.612,14 | $0 | $57.582.612,14 |
| Acta Mensual de Costos No. 7 | $286.496.819,70 | $54.434.395,743 | $0 | $54.434.395,743 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 7 De fecha 30 de Abril para el período el contrato reporta un avance de 61.28 %:

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 1.782.582.823,21 (61.28%)
Total inversión ejecutada: $ 1.782.582.823,21 (61.28%)

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| …27/12/2024 | …01 |
| …17/03/2025 | …02 |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO | | ASUNTO |
|---|---|---|
| No. Consecutivo | FECHA | |
| CO-VIALFR-047-341-2025 | 1/04/2025 | Convenio Solidario Número 2298 de 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SABANETA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEL DEPARTAMENTO DE |

| | | |
|---|---|---|
| | | CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" Segunda entrega del convenio" |
| **CO-VIALFR-047-342-2025** | 1/04/2025 | Reiteración entrega de documentación final ambiental para liquidación de los convenios solidarios. |
| **CO-VIALFR-047-343-2025** | 3/04/2025 | SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-345-2025** | 3/04/2025 | RADICADO INFORMES SEMANALES PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2025. |
| **CO-VIALFR-047-346-2025** | 3/04/2025 | SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-347-2025** | 3/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-349-2025** | 4/04/2025 | CUARTA SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-350-2025** | 4/04/2025 | Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos |
| **CO-VIALFR-047-351-2025** | 4/04/2025 | Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de pasivos |
| **CO-VIALFR-047-352-2025** | 4/04/2025 | Certificación de la Interventoría, acerca de la NO generación de RCD |
| **CO-VIALFR-047-353-2025** | 7/04/2025 | Entrega documentación gestión final CONVENIO 2298 – 2024 Junta De Acción Comunal Sabaneta, municipio San Francisco. |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-354-2025** | 7/04/2025 | SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-355-2026** | 4/04/2025 | RESPUESTA AL RADICADO 2025S-VCUN-019134 "Devolución del Acta de Costos No. 4 para ajustes". |
| **CO-VIALFR-047-356-2025** | 7/04/2025 | Segunda solicitud de limpieza inmediata del área de influencia directa de la vía en intervención |
| **CO-VIALFR-047-357-2025** | 7/04/2025 | SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-358-2025** | 7/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-348-2025** | 8/04/2025 | Solicitud de mesa de trabajo para el área social con la subdirección de sostenibilidad, tema: radicados fase inicial y radicados fase de cierre. |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-359-2025** | 8/04/2025 | Convenio Solidario Número 2345 de 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" Respuesta a PQRS remitido desde Personería Municipal Cabrera. |
| **CO-VIALFR-047-360-2025** | 8/04/2025 | ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 2394 DE 2024 |
| **CO-VIALFR-047-361-2026** | 8/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-362-2025** | 8/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-363-2025** | 8/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-364-2025** | 8/04/2025 | CUARTA SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-365-2025** | 8/04/2025 | SEGUNDA SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-366-2025** | 8/04/2025 | SEGUNDA SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-367-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2302-2024 |
| **CO-VIALFR-047-368-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2351-2024 |
| **CO-VIALFR-047-369-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2371-2024 |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-370-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2378-2024 |
| **CO-VIALFR-047-371-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 3482-2024 |
| **CO-VIALFR-047-372-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 3542-2024 |
| **CO-VIALFR-047-373-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 3873-2024 |
| **CO-VIALFR-047-374-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 3978-2024 |
| **CO-VIALFR-047-375-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 4018-2024 |
| **CO-VIALFR-047-376-2025** | 9/04/2025 | Solicitud de acompañamiento al proceso de investigación presunto hurto de material perteneciente a la placa huella bajo el convenio #2747 el Palmar de Paime Cundinamarca. |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-377-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2390-2024 |
| **CO-VIALFR-047-378-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2296-2024 |
| **CO-VIALFR-047-379-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2586-2024 |
| **CO-VIALFR-047-380-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2281-2024 |
| **CO-VIALFR-047-381-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2946-2024 |
| **CO-VIALFR-047-382-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2547-2024 |
| **CO-VIALFR-047-383-2025** | 9/04/2025 | Respuesta Solicitud Prorroga No.1 Convenio Solidario No. 2669-2024 |
| **CO-VIALFR-047-384-2025** | 11/04/2025 | RADICADO INFORMES SEMANALES PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL DE 2025. |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-385-2025** | 11/04/2025 | RADICADO FACTURA No. VFR 7 – ACTA DE COSTOS No.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 |
| **CO-VIALFR-047-386-2025** | 15/04/2025 | ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA No.1 CONVENIOS REANUDADOS CON ANTECEDENTES ACTUALIZADOS. |
| **CO-VIALFR-047-387-2025** | 15/04/2025 | INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL EN EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DE OBRA. |
| **CO-VIALFR-047-388-2025** | 15/04/2025 | Tercera solicitud de limpieza inmediata del área de influencia directa de la vía en intervención |
| **CO-VIALFR-047-399-2025** | 21/04/2025 | RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA |
| **CO-VIALFR-047-400-2025** | 21/04/2025 | REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA EVALUABLES CONVENIO SOLIDARIO 2371 DE 2024 |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-401-2025** | 21/04/2025 | REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA EVALUABLES CONVENIO SOLIDARIO 2302 DE 2024 |
| **CO-VIALFR-047-402-2025** | 21/04/2025 | RADICADO INFORMES SEMANALES PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE 2025. |
| **CO-VIALFR-047-403-2025** | 21/04/2025 | SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-404-2025** | 24/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-405-2025** | 24/04/2025 | CERTIFICACIÓN DE BAJA COMPLEJIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCÍA |
| **CO-VIALFR-047-407-2025** | 24/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-408-2025** | 24/04/2025 | SEGUNDA SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-409-2025** | 24/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES |

| | | |
|---|---|---|
| | | DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-410-2025** | 24/04/2025 | SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-412-2025** | 24/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-413-2025** | 24/04/2025 | SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-414-2025** | 24/04/2025 | SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO |
| **CO-VIALFR-047-415-2025** | 24/04/2025 | SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-416-2025** | 25/04/2025 | RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL INICIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA |
| **CO-VIALFR-047-417-2025** | 25/04/2025 | INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN DE INICIO JAC PEÑALOZA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ |
| **CO-VIALFR-047-418-2025** | 25/04/2025 | INVITACIÓN SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JAC¨S |

| | | |
|---|---|---|
| | | LAGUNETA, LA GLORIETA Y LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPI |
| **CO-VIALFR-047-419-2025** | 25/04/2025 | RESPUESTA A RADICADO 10252001502, CON ASUNTO SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-420-2025** | 25/04/2025 | RESPUESTA A RADICADO 12252003467 SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-421-2025** | 25/04/2025 | Alcance 2025E-VUVRAZ-023706 CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2315 DE 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JOSÉ DE ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL Entrega Inicial de Documentos Área Social. |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-422-2025** | 25/04/2025 | SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES |
| **CO-VIALFR-047-423-2025** | 25/04/2025 | Certificación de baja complejidad del proyecto |
| **CO-VIALFR-047-424-2025** | 25/04/2025 | Entrega documentación gestión inicial CONVENIO 2371 – 2024 Junta De Acción Comunal Guadalupe, municipio Quipile. |
| **CO-VIALFR-047-429-2025** | 28/04/2025 | INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTAS DE ACCION COMUNAL EL ROBLEDAL Y JAC EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA. |
| **CO-VIALFR-047-430-2025** | 28/04/2025 | VISITA TÉCNICA PQRS GERMÁN LADINO PARA EL CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2389-2024 PARA LA VEREDA LIMONCITOS DEL MUNICIPIO GUAYABETAL |
| **CO-VIALFR-047-431-2025** | 28/04/2025 | VISITA TÉCNICA PQRS GERMÁN LADINO PARA EL CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2389-2024 PARA LA VEREDA LIMONCITOS DEL MUNICIPIO GUAYABETAL. |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-432-2025** | 28/04/2025 | RADICADO ACTA No.6 PERIODO DE MARZO DE 2025 |
| **CO-VIALFR-047-433-2025** | 29/04/2025 | INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTA DE ACCION COMUNAL MANANTIAL MUNICIPIO DE PULI |
| **CO-VIALFR-047-434-2025** | 29/04/2025 | INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTA DE ACCION COMUNAL CABRERA MUNICIPIO DE PULI. |
| **CO-VIALFR-047-435-2025** | 29/04/2025 | INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTA DE ACCION COMUNAL PULISITO MUNICIPIO DE PULI. |
| **CO-VIALFR-047-436-2025** | 29/04/2025 | ENTREGA HOJA DE VIDA PERSONAL INTERVENTORIA |
| **CO-VIALFR-047-437-2025** | 30/04/2025 | CERTIFICACIÓN DE BAJA COMPLEJIDAD DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCÍA |
| **CO-VIALFR-047-438-2025** | 30/04/2025 | RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL INICIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA |
| **CO-VIALFR-047-439-2025** | 30/04/2025 | RADICADO FACTURA No. VFR 8 – ACTA DE COSTOS No.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **CO-VIALFR-047-440-2025** | 30/04/2025 | REPROGRAMACIÓN VISITA TÉCNICA PQRS GERMÁN LADINO PARA EL CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2389-2024 PARA LA VEREDA LIMONCITOS DEL MUNICIPIO GUAYABETAL. |
| **CO-VIALFR-047-441-2025** | 30/04/2025 | REPROGRAMACIÓN VISITA TÉCNICA PQRS GERMÁN LADINO PARA EL CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2389-2024 PARA LA VEREDA LIMONCITOS DEL MUNICIPIO GUAYABETAL |
| **CO-VIALFR-047-442-2025** | 30/04/2025 | RADICADO INFORMES SEMANALES PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 |

### 2.11 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

### 3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el inicio de ejecución de los convenios, se presentan demoras en los tramites de cotizaciones por parte de las JAC. Para desembolsos.

Siguen juntas de acción sin recibir desembolsos del valor total del contrato a las cuentas suscritas en las entidades bancarias.

Dificultades en la metodología para afiliaciones de personal de obra.

Deficiencias en la presentación de información técnica y compromisos contractuales por parte de los profesionales de las jac.

### 3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Perfiles profesionales para la ejecución de la obra no cumplen o envían sin certificaciones.

### 3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

Demoras en trámites de las JAC.

Inconvenientes en la práctica de legalización en aspectos financieros para aplicar retenciones a los insumos.

### 3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A.

Las juntas de acción comunal han informado inconformidades para tramitar aprobación de materiales de agregados de cantera, debido a que se solicita documentación legal de explotación minera de estos agregados y las licencias ambientales.

## 4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo en mención en realizaron las visitas correspondientes por parte de la interventoría en aras de garantizar la supervisión de los convenios a cargo.

## 5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión del INVIAS se encarga de monitorear la ejecución de los convenios solidarios. Durante el período del informe, se llevaron a cabo actividades sociales y visitas técnicas con el objetivo de asegurar una adecuada ejecución por parte de las juntas de acción comunal. Además, se proporcionaron asesorías y se identificaron los requisitos necesarios para el cumplimiento de cada convenio solidario:

## JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 81% al ejecutar 96. mts de 6.8 mts y se espera poder terminar labores físicas finalizando el mes de marzo, se han presentado alguno inconvenientes por el cierre vial por parte de las autoridades, se ha explicado el convenio y se ha dado paso a un solo carril de vehículos livianos entendiendo que hay una vía alterna para la circulación de los vehículos pesados.










## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.








## JUNTA DE ACCION COMUNAL PEÑALOSA MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, La junta recibe información por parte de la entidad bancaria sobre el desembolso otorgado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, una vez allegada la información a la interventoría se procede a reunir los documentos necesarios y las aprobaciones justificadas del reinicio de actividades, y se inicia nuevamente la búsqueda de profesionales y búsqueda de cotizaciones para la realización del comité operativo y poder superar la tapa de alistamiento de la forma más rápida y de esta forma empezar la etapa de construcción de así como el análisis del tiempo otorgado para una prórroga suficiente en tiempo que permita concluir el objeto contractual.

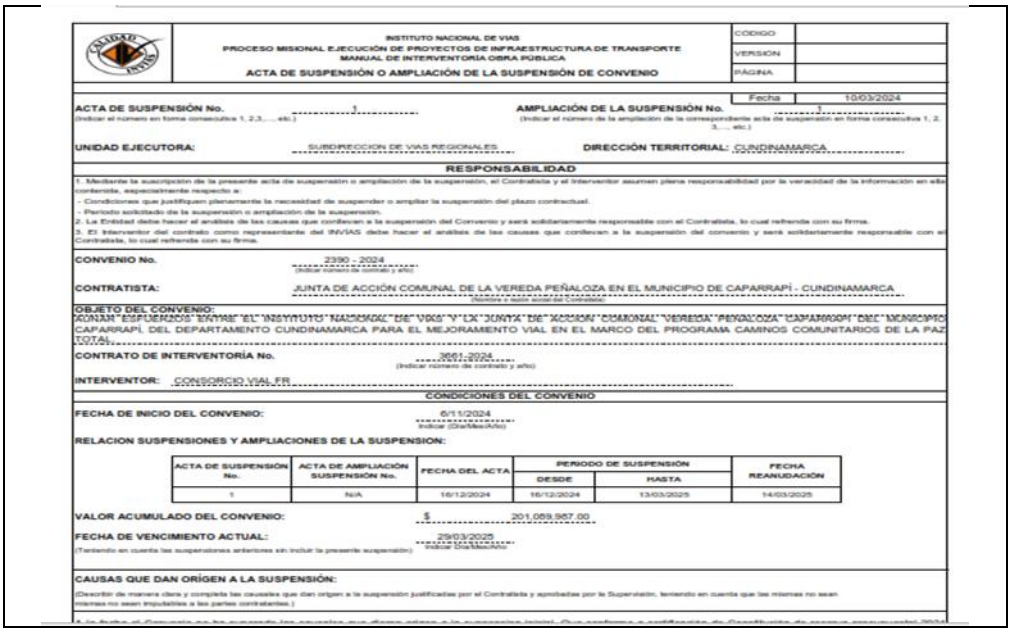

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE CONVENIO

CODIGO | VERSION | PAGINA

Fecha: 19/03/2024

ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 1 (Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,.... etc.)
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.: 1 (Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,.... etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.
2. La Entidad debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del Convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.
3. El Interventor del contrato como representante del INVIAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del convenio y será solidariamente responsable con el Contratista, lo cual refrenda con su firma.

CONVENIO No.: 2390 - 2024 (Indicar número de contrato y año)
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑALOZA EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA (Nombre o razón social del Contratista)
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PEÑALOZA CAPARRAPI DEL MUNICIPIO CAPARRAPÍ, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3641-2024 (Indicar número de contrato y año)
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

**CONDICIONES DEL CONVENIO**

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 6/11/2024 Indicar (Día/Mes/Año)
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSION:

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| 1 | N/A | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 13/03/2025 | 14/03/2025 |

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 201,089,957.00
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/03/2025 Indicar Día/Mes/Año
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión)

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la Supervisión, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TATI DEL MUNICIPIO CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ENCANTADO DEL MUNICIPIO EL PEÑON:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.













## JUNTA DE ACCION COMUNAL DE <u>RIO FRIO</u> DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.




## JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.




**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE <u>LOMA MEDIO</u> DEL <u>MUNICIPIO LA PALMA:</u>**

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.













## JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA SIRIA DEL MUNICIPIO PAIME:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 70% al ejecutar 66 mts de 4.1 mts y se espera poder terminar labores físicas a mitad del mes de Mayo por tanto es necesario contemplar un prórroga para poder ejecutar todas las actividades contractuales.
A la finalización de este mes se proyectó una prórroga de dos meses entendiendo que el clima ha jugado un papel desfavorable en los retrasos de las labores por eso se aprueba por parte de interventoría conceder una prórroga de 2 meses a 31 de mayo para finalizar las labores de obra.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO

CODIGO | VERSION | PÁGINA

FECHA 12 | 3 | 2025 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN | MODIFICACIÓN | PRÓRROGA X

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcion del presente formato, los firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del convenio.

ANTECEDENTES

CONVENIO No. 2764 de 2024 (Indicar número de convenio y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIRIA (Nombre o razón social del Contratista )

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3661 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: Hasta el 31/12/2024 (Indique el plazo del convenio principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 2/09/2024 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| N.A | N/A | N/A |
| N.A | N/A | N/A |
| N.A | N/A | N/A |

PRÓRROGAS:

| Convenio Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| 1 | 27/12/2024 | 1/01/2025 | 31/03/2025 |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |






## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO PAIME:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 87% al ejecutar 114 mts en media calzada de 5 mts y se espera poder terminar labores físicas a finales del mes de mayo por tanto es necesario contemplar un prórroga para poder ejecutar todas las actividades contractuales.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>TERMINOS</u> DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, la junta recibe información por parte de la entidad bancaria sobre el desembolso otorgado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, una vez allegada la información a la interventoría se procede a reunir los documentos necesarios y las aprobaciones justificadas del reinicio de actividades, y se inicia nuevamente la búsqueda de profesionales y búsqueda de cotizaciones para la realización del comité operativo y poder superar la tapa de alistamiento de la forma más rápida y de esta forma empezar la etapa de construcción de así como el análisis del tiempo otorgado para una prórroga suficiente en tiempo que permita concluir el objeto contractual.

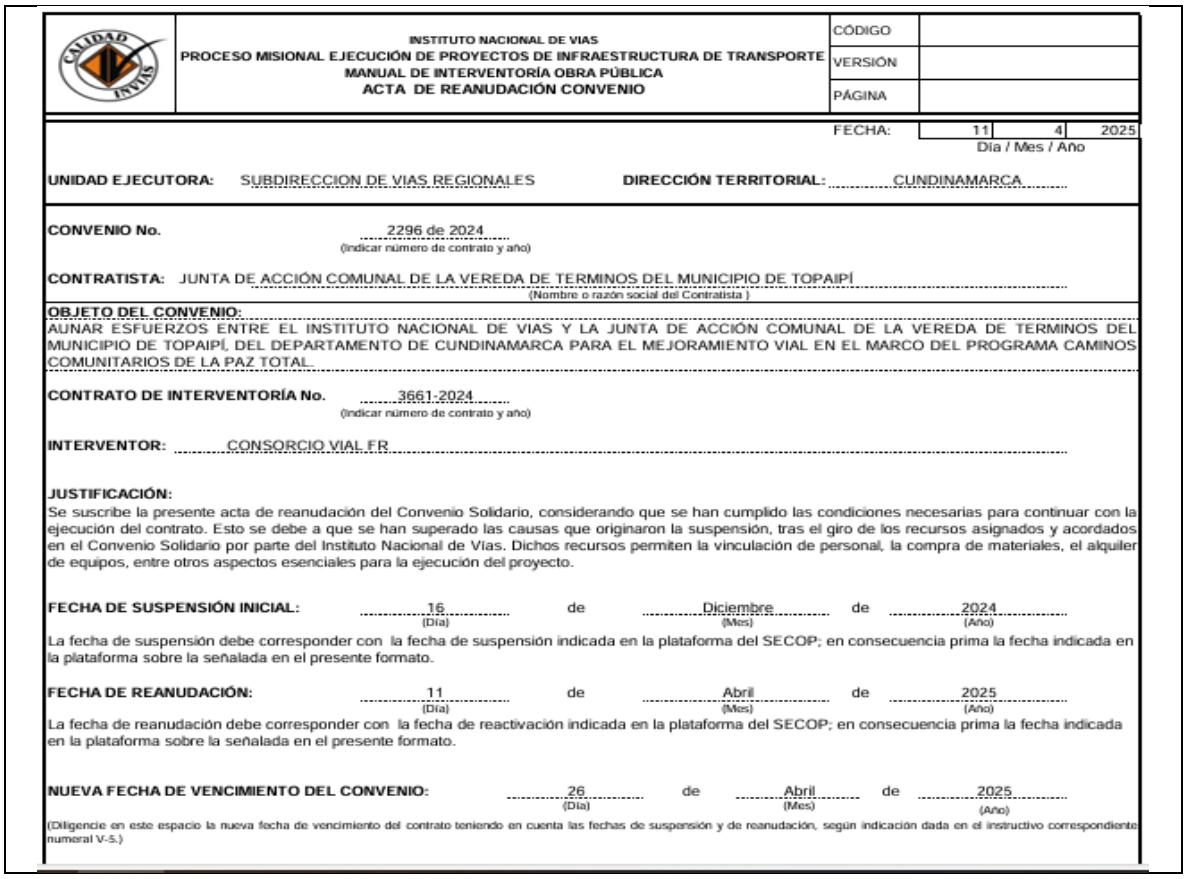

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 11 (Día) 4 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONVENIO No.** 2296 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ (Nombre o razón social del Contratista)

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3661-2024 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

**JUSTIFICACIÓN:**
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vias. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)
La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE NARANJAL DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal después de hacer el 4 cambio de equipo de profesionales se da inicio a las labores administrativas de consecución de personal, se da inicio a las actividades de obra realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 25% se espera poder terminar labores en el mes de junio con personal y maquinaria. se da la aprobación de la prórroga hasta el 31 de junio para lograr llevar a cabo todas las actividades necesarias de ejecución.











## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, La junta recibe información por parte de la entidad bancaria sobre el desembolso otorgado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, una vez allegada la información a la interventoría se procede a reunir los documentos necesarios y las aprobaciones justificadas del reinicio de actividades, y se inicia nuevamente la búsqueda de profesionales y búsqueda de cotizaciones para la realización del comité operativo y poder superar la tapa de alistamiento de la forma más rápida y de esta forma empezar la etapa de construcción de así como el análisis del tiempo otorgado para una prórroga suficiente en tiempo que permita concluir el objeto contractual.

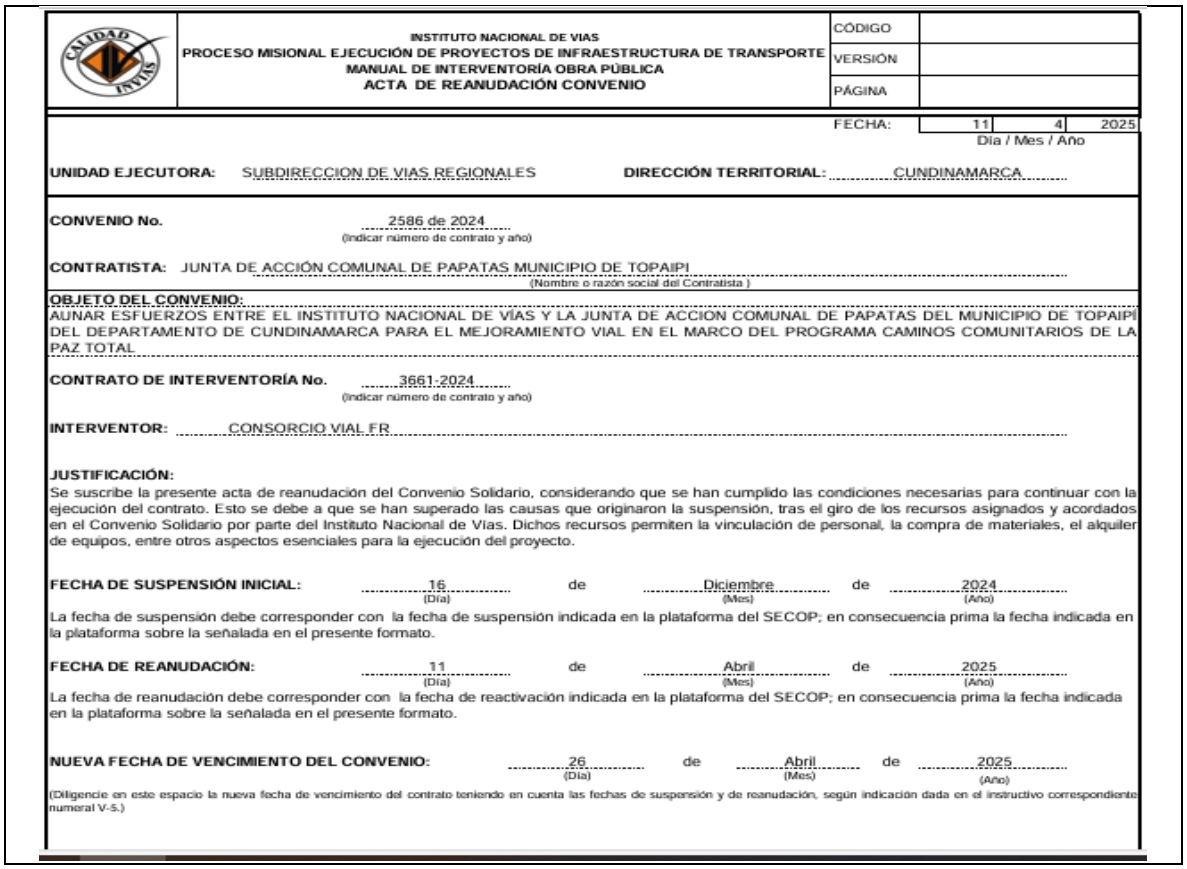

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 11 / 4 / 2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONVENIO No.** 2586 de 2024 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAPATAS MUNICIPIO DE TOPAIPI (Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3661-2024 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

**JUSTIFICACIÓN:**
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)
La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CAQUIAN DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, La junta recibe información por parte del INVIAS sobre el estado del desembolso el cual difícilmente llegaría para este mes, por tal motivo se inició un proceso de ampliación de suspensión de convenio ante la entidad puesto que sin desembolso no se podrán adelantar procesos de obras, por tal motivo se envió solicitud a la interventoría para dar aprobación ante el Invias justificando la suspensión en la carencia de PAC de la entidad lo cual no ha permitido el desembolso de recursos del programa caminos comunitarios de la paz total. Dicha solicitud que fue avalada con fecha de ampliación de suspensión hasta 14 de mayo de, esperando que a esta fecha los recursos ya estén en las cuentas de cada junta.

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MUCHIPAY DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de

2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 100% al ejecutar 149 mts de 4.1 mts y una alcantarilla, habiendo culminado labores de obra físicas 8 de abril.

A la finalización de este mes se proyectó una prórroga de dos meses entendiendo que el clima ha jugado un papel desfavorable en los retrasos de las labores por eso se aprueba por parte de interventoría conceder una prórroga de 2 meses a 31 de mayo para finalizar las labores de obra.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PURAY DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.













## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>LA CHAPA</u> DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.






**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA <u>MORAY</u> DEL MUNICIPIO YACOPI:**

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.












## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>LIMONAL</u> DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.












## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAGUNETA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, comunal se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE IBAMA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta recibe información por parte de la entidad bancaria sobre el desembolso otorgado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, una vez allegada la información a la interventoría se procede a reunir los documentos necesarios y las aprobaciones justificadas del reinicio de actividades, y se inicia nuevamente la búsqueda de profesionales y búsqueda de cotizaciones para la realización del comité operativo y poder superar la tapa de alistamiento de la forma más rápida y de esta forma empezar la etapa

de construcción de así como el análisis del tiempo otorgado para una prórroga suficiente en tiempo que permita concluir el objeto contractual. se da inicio a las actividades de obra realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 25% se espera poder terminar labores en el mes de junio con personal y maquinaria. se da la aprobación de la prórroga hasta el 31 de junio para lograr llevar a cabo todas las actividades necesarias de ejecución.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11 (Día) 4 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONVENIO No.** 2281 DE 2024 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE INSPECCION DE IBAMA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ (Nombre o razón social del Contratista)

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3661-2024 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

**JUSTIFICACIÓN:**
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)






## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL IMPARAL – MUNICIPIO DE SUPATÁ.

- ✓ Durante el mes de abril de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se terminó la ejecución y alcance del mejoramiento vial, con la construcción de **145 metros lineales de placa huella**.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de actividades constructivas de la obra física. Sin embargo, se está a la espera que se ejecuten las actividades en el marco de la obra social, las cuales consistirán en adecuaciones y construcción de baterías sanitarias en el polideportivo veredal.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **145 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, no se han iniciado las actividades en el marco del plan de inversión social previstas con las adecuaciones en las baterías sanitarias del polideportivo veredal, sin embargo, se estima que durante el mes de mayo de 2025 sean ejecutadas y se lleve a cabo el cierre social del convenio solidario.









## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PULISITO – MUNICIPIO DE PULÍ.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 182 metros lineales de placa huella.
- ✓ Durante el mes de abril, se realizó la autorización de pagos y desembolso de recursos a proveedores para la ejecución de actividades en el marco del plan de inversión social, el cual consistió en el suministro y conformación de material de cantera en tramo adicional de la placa huella construida.
- ✓ Durante las próximas semanas, se adelantarán los trámites tendientes a la liquidación del convenio solidario.
- ✓ Se estima que a principios del mes de mayo de 2025, se realice la socialización de cierre del proyecto, teniendo en cuenta la culminación de las actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **182 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**










## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANETA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 201 metros lineales de placa huella.
- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de las actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **201 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron la totalidad de actividades en el marco del plan de inversión social, con el **suministro e instalación de 30 luminarias LED solares** en diferentes sectores de influencia de la vereda: (8) Sector Alto del Vino, (8) Sector Villamizar Prospero, (3) Sector Carlos Orjuela, (5) Sector Becerra/Gómez, (6) Sector Los Novia-Placa Huella.
- ✓ Previamente, en el mes de enero de 2025 se había realizado la socialización de cierre del convenio en conjunto con la comunidad, JAC e Interventoría.
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**






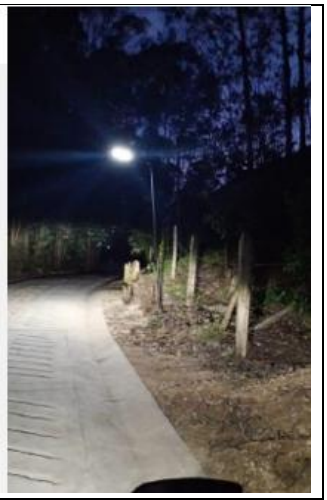

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANADAS CENTRO – MUNICIPIO DE CHAGUANÍ

- ✓ El 11-abril-2025 se suscribió entre las partes el acta de reanudación No. 1 del convenio solidario, tras haber superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 1, una vez desembolsados los recursos del convenio a la Junta de Acción Comunal por parte de la entidad contratante.
- ✓ El 21-abril-2025 mediante oficio de interventoría No. CO-VIALFR-047-401-2025 se emitió aprobación a las hojas de vida del residente, contador y maestro de obra presentados por parte de la Junta de Acción Comunal, según los requerimientos del anexo técnico del convenio solidario.
- ✓ El 22-abril-2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 1 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31-julio-2025.
- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se lleve a cabo el comité operativo e iniciar la etapa de obras de mejoramiento.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución.**

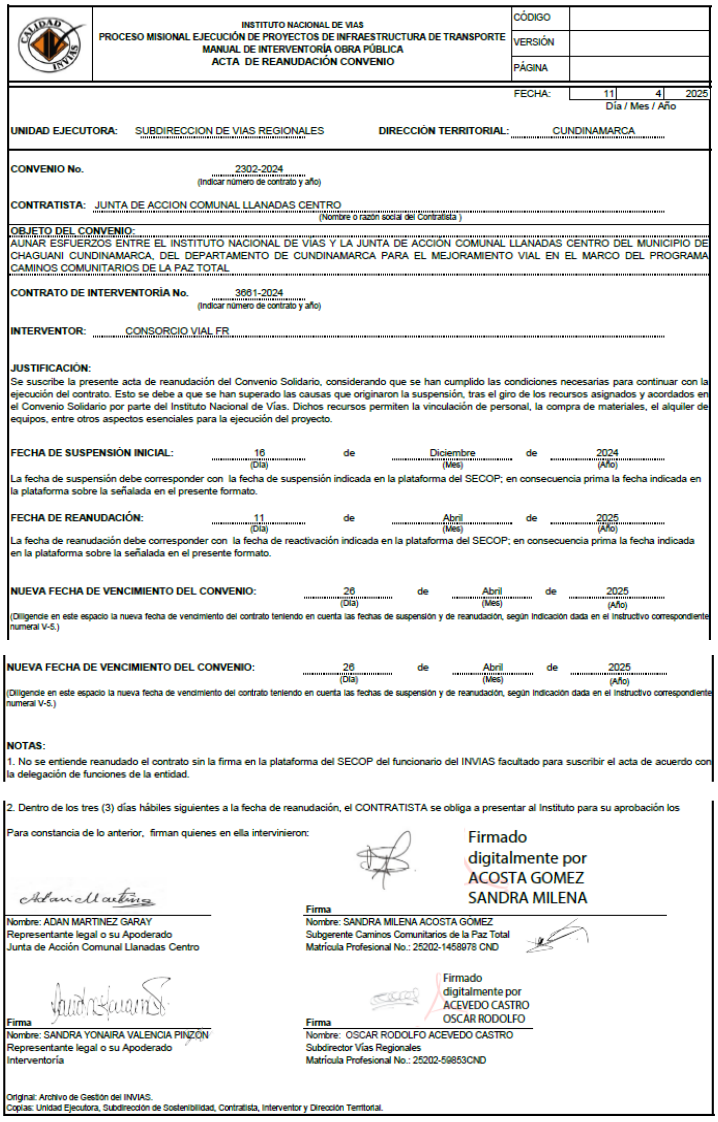

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 11 (Día) 4 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONVENIO No. 2302-2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANADAS CENTRO (Nombre o razon social del Contratista )

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANADAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3661-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

JUSTIFICACIÓN:
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)
La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)


NOTAS:
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA

Firma
Nombre: ADAN MARTINEZ GARAY
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Llanadas Centro

Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMANCHA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

- ✓ Durante el mes de abril de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se terminó la ejecución y alcance del mejoramiento vial, con la construcción de **125 metros lineales de placa huella**, construcción de **150 metros lineales de filtro de drenaje,** y mejoramiento de **(1) alcantarilla** en el tramo vial.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de actividades

constructivas de la obra física. Sin embargo, se está a la espera que se ejecuten las actividades en el marco de la obra social, las cuales consistirán en actividades de mejoramiento en el parque principal.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **125 metros lineales de placa huella, 150 metros lineales de filtro de drenaje y 1 alcantarilla,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, no se han iniciado las actividades en el marco del plan de inversión social previstas con el mejoramiento del parque principal, sin embargo, se estima que durante el mes de mayo de 2025 sean ejecutadas y se lleve a cabo el cierre social del convenio solidario.



## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA GRATA – MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 219,5 metros lineales de placa huella.

- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de las actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **219,5 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron la totalidad de actividades en el marco del plan de inversión social, con las actividades de remodelación, mejoramiento y ampliación de carácter locativo en la sede del acueducto veredal.
- ✓ El 28-febrero-2025, se realizó la socialización de cierre del convenio solidario, en conjunto con la comunidad, JAC e Interventoría.
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**




**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABRERA – MUNICIPIO DE PULÍ.**

- ✓ Durante el mes de abril de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se terminó la ejecución y alcance del mejoramiento vial, con la construcción de **201,3 metros lineales de placa huella**.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social con la adecuación e instalación del parque infantil.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **201,3 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, una vez ejecutado el alcance físico de la placa huella y la instalación del parque infantil en el marco del plan de inversión social, se estima que a principios del mes de mayo de 2025 se lleve a cabo la socialización de cierre del convenio solidario.









## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIRIA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

- ✓ El 11-abril-2025 se suscribió entre las partes el acta de reanudación No. 1 del convenio solidario, tras haber superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 1, una vez desembolsados los recursos del convenio a la Junta de Acción Comunal por parte de la entidad contratante.
- ✓ El 16-abril-2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 1 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31-julio-2025.
- ✓ El 29-abril-2025 se llevó a cabo sesión de Comité Operativo con la Junta de Acción Comunal, Veeduría e Interventoría, en el cual se dio aprobación entre las partes a las cotizaciones de proveedores de insumos y materiales para proceder con las respectivas compras necesarias para la ejecución de obras de mejoramiento, por lo que se estima que en el mes de mayo de 2025 se lleve a cabo la aprobación y autorización de cartas de desembolso respectivas.
- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO | CÓDIGO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

1FECHA: 11 | 4 | 2025
Día / Mes / Año

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONVENIO No.** 2351-2024
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LIRIA
(Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LIRIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3861-2024
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

**JUSTIFICACIÓN:**
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligende en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el Instructivo correspondiente numeral V-5.)


**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligende en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el Instructivo correspondiente numeral V-5.)


**NOTAS:**
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Nombre: SAMUEL CORTEZ CASTIBLANCO
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Llanadas Centro

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA

Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

**Acta de reanudación del convenio de fecha 11-abril-2025. Vda Liria, San Cayetano**

**CLAUSULAS ADICIONALES**
**CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2351 DE 2024**
**PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025**

**CLÁUSULA PRIMERA**: **PRORROGAR** el plazo del Convenio Solidario No. 2351 del 2024, hasta el 31 de Julio del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.

**CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN.** – Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL OAC** se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.


**CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL OAC** se obliga a modificar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico.

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Abogado SGCPA
Revisó: Abogada SGCPA
Vo. Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Abogado SVR

**Prórroga No. 1 del convenio solidario. Vda Liria, San Cayetano**

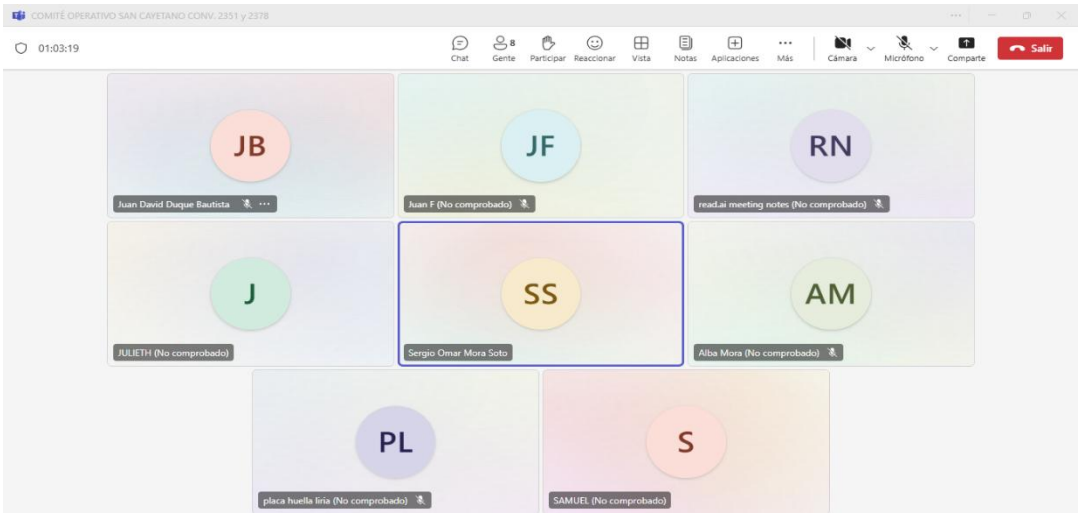


**Comité operativo del 29-abril-2025. Vda Liria, San Cayetano**

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUADALUPE- MUNICIPIO DE QUIPILE

- ✓ El 11-abril-2025 se suscribió entre las partes el acta de reanudación No. 1 del convenio solidario, tras haber superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 1, una vez desembolsados los recursos del convenio a la Junta de Acción Comunal por parte de la entidad contratante.

- ✓ El 16-abril-2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 1 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31-julio-2025.
- ✓ El 29-abril-2025 se llevó a cabo sesión de Comité Operativo con la Junta de Acción Comunal, Veeduría e Interventoría, en el cual se dio aprobación entre las partes a las cotizaciones de proveedores de insumos y materiales para proceder con las respectivas compras necesarias para la ejecución de obras de mejoramiento, por lo que se estima que en el mes de mayo de 2025 se lleve a cabo la aprobación y autorización de cartas de desembolso respectivas.
- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución.**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

1FECHA: 11 4 2025
Día / Mes / Año

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONVENIO No.** 2351-2024
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL LIRIA
(Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LIRIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3861-2024
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

**JUSTIFICACIÓN:**
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el Instructivo correspondiente numeral V-5.)

**NOTAS:**

1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA

**Firma**
Nombre: SAMUEL CORTEZ CASTIBLANCO
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Llanadas Centro

**Firma**
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

**Firma**
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

**Firma**
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**CLAUSULAS ADICIONALES**
**CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2351 DE 2024**
**PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025**

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo del Convenio Solidario No. 2351 del 2024, hasta el 31 de Julio del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.


**CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN.** – Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL OAC** se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.

**CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL OAC** se obliga a modificar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico.

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.


**CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Abogado SGCPA
Revisó: Abogada SGCPA
Vo. Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Abogado SVR

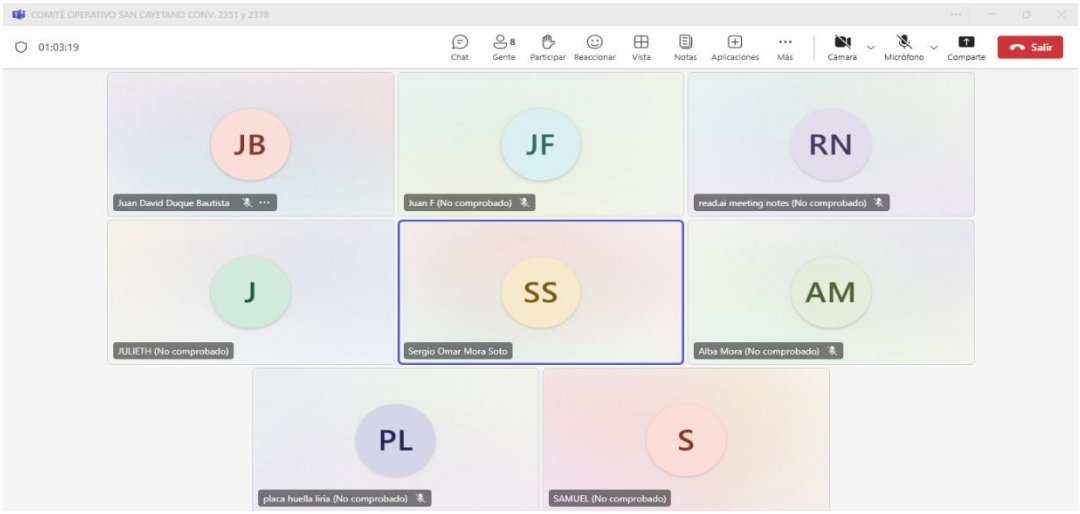


## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO:

- ✓ El 11-abril-2025 se suscribió entre las partes el acta de reanudación No. 1 del convenio solidario, tras haber superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 1, una vez desembolsados los recursos del convenio a la Junta de Acción Comunal por parte de la entidad contratante.
- ✓ El 16-abril-2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 1 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31-julio-2025.
- ✓ El 29-abril-2025 se llevó a cabo sesión de Comité Operativo con la Junta de Acción Comunal, Veeduría e Interventoría, en el cual se dio aprobación a las cotizaciones de proveedores de insumos y materiales a ser vinculados al proyecto, con el fin de proceder con el proceso de trámite de cartas de desembolso y compras respectivas.
- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**.

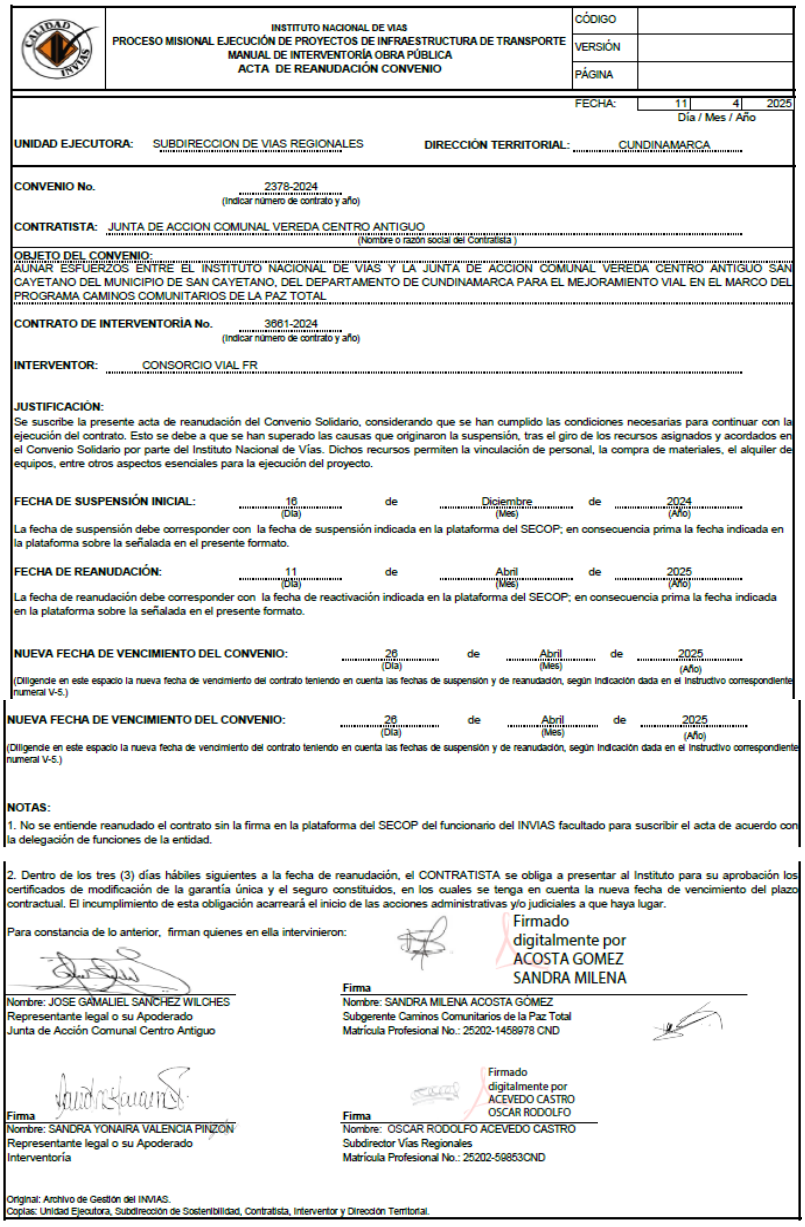

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 11 / 4 / 2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONVENIO No.** 2378-2024 (Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO (Nombre o razón social del Contratista )

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3661-2024 (Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

**JUSTIFICACIÓN:**
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)


**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)


**NOTAS:**
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA

Nombre: JOSE GAMALIEL SANCHEZ WILCHES
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Centro Antiguo

Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Acta de reanudación del convenio de fecha 11-abril-2025. Vda Centro Antiguo, San Cayetano

**CLAUSULAS ADICIONALES**
**CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2378 DE 2024**
**PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025**

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo del Convenio Solidario No. 2378 del 2024, hasta el 31 de julio del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.

**CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN. –** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL OAC** se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.


**CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL OAC** se obliga a modificar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico.

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Angelica Quiroga - Abogada SGCPA
Revisó: Paola Rincón - Abogada SGCPA
Vo. Bo. Carolina Pabón - Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Revisó: Valentina Martínez Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Johnny Alexander López Martín - Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Cristian Beltran - Abogado SVR

**Prórroga No. 1 del convenio solidario. Vda Centro Antiguo, San Cayetano**

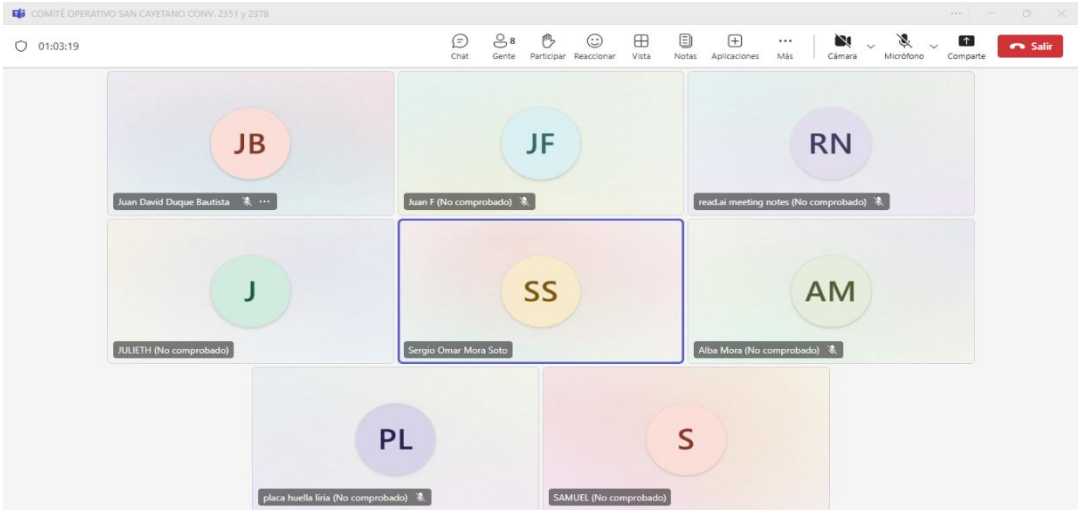


**Comité operativo del 29-abril-2025. Vda Centro Antiguo, San Cayetano**

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLEDAL - MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA:

- ✓ Durante el mes de abril de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - o Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se terminó la ejecución y alcance del mejoramiento vial, con la construcción de **160 metros lineales de placa huella** y **mejoramiento de (1) alcantarilla** en el tramo vial.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social con la adecuación e instalación del parque infantil.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **160 metros lineales de placa huella** y **mejoramiento de (1) alcantarilla** del tramo vial**,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**

A la fecha de corte del presente informe, una vez ejecutado el alcance físico de la placa huella y la instalación de luminarias solar LED en área de influencia de la placa huella en el marco del plan de inversión social, se estima que a principios del mes de mayo de 2025 se lleve a cabo la socialización de cierre del convenio solidario.









## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MANANTIAL – MUNICIPIO DE PULÍ:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 175 metros lineales de placa huella.
- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de la obra física y actividades.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **175 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron la totalidad de actividades en el marco del plan de inversión social, con las actividades de adecuaciones y mejoramiento de las condiciones físico ambientales de la Escuela Rural Manantial.
- ✓ Se estima que en los primeros días del mes de mayo de 2025, se realice la socialización de cierre del convenio con la Junta de Acción Comunal y la comunidad.
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIGO – MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 180 metros lineales de placa huella.
- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de la obra física y actividades del plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **180 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizó la ejecución de las actividades en el marco del plan de inversión social, en el cual se realizó la dotación de sillas y mesas en el salón comunal de la vereda, cuya actividad a la fecha ya está ejecutada en su totalidad.
- ✓ Se estima que en los primeros días del mes de mayo de 2025, se realice la socialización de cierre del convenio con la Junta de Acción Comunal y la comunidad.
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**



## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MODELIA – MUNICIPIO DE VIOTÁ:

- ✓ Durante el mes de abril de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Extensión, conformación y compactación de material de cantera en el tramo objeto de intervención de la placa huella.
  - Armado y figurado de acero de refuerzo de elementos estructurales de la placa huella.
  - Armado de formaletas y alistamiento para vaciados de concreto.
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.

- A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **110 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **55%.**
- En el presente mes, los rendimientos de la obra sufrieron retrasos, principalmente por cuenta de las condiciones climáticas de lluvia adversas en el sector del Municipio de Viotá.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE – MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 188 metros lineales de placa huella.
- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de la obra física y actividades.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **188 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron las actividades establecidas en el marco del plan de inversión social.

- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se realicen las gestiones para llevar a cabo la socialización de cierre del convenio.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PALMAR – MUNICIPIO DE VERGARA:

- ✓ El 11-abril-2025 se suscribió entre las partes el acta de reanudación No. 1 del convenio solidario, tras haber superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 1, una vez desembolsados los recursos del convenio a la Junta de Acción Comunal por parte de la entidad contratante.
- ✓ El 16-abril-2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 1 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31-julio-2025.
- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO | CÓDIGO | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 11 | 4 | 2025
Día / Mes / Año

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

**CONVENIO No.** 3482-2024
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANA
(Nombre o razon social del Contratista )

**OBJETO DEL CONVENIO:**
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANA DE VERGARA DEL MUNICIPIO DE VERGARA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 3861-2024
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL FR

**JUSTIFICACIÓN:**
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

**FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL:** 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**FECHA DE REANUDACIÓN:** 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligende en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

**NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO:** 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligende en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

**NOTAS:**
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma
Nombre: MARIA EMMA SARMIENTO RODRIGUEZ
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Urbana

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA

Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59863CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Acta de reanudación del convenio de fecha 11-abril-2025. Vda Urbana, Vergara



**CLAUSULAS ADICIONALES**
**CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3482 DE 2024**
**PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025**

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo del Convenio Solidario No. 3482 del 2024, hasta el 31 de julio del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.

**CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN. –** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL OAC** se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.

**CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL OAC** se obliga a modificar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico.

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.


**CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Abogado SGCPA
Revisó: Abogado SGCPA
Vo. Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Abogado SVR

**Prórroga No. 1 del convenio solidario. Vda Urbana, Vergara**

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LAS HONDURAS – MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante no ha realizado el desembolso de recursos para el convenio solidario, con el fin de reanudar e iniciar la ejecución de las obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**

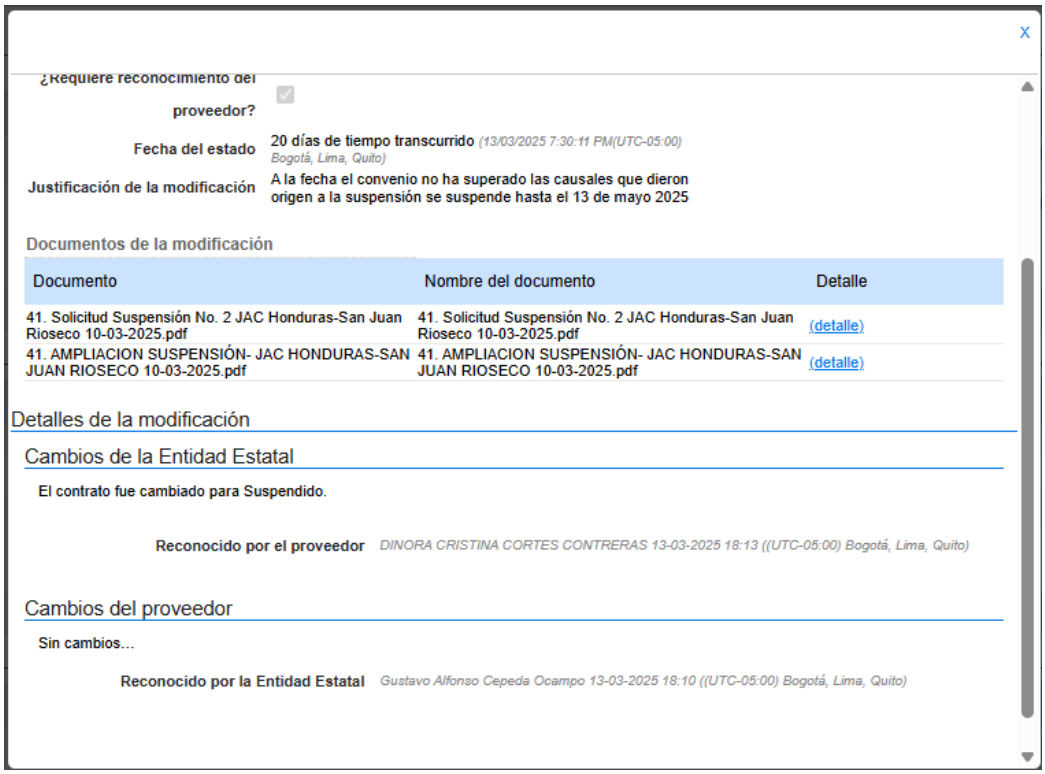

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Fecha del estado: 20 días de tiempo transcurrido (13/03/2025 7:30:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación: A la fecha el convenio no ha superado las causales que dieron origen a la suspensión se suspende hasta el 13 de mayo 2025

Documentos de la modificación

| Documento | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 41. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Honduras-San Juan Rioseco 10-03-2025.pdf | 41. Solicitud Suspensión No. 2 JAC Honduras-San Juan Rioseco 10-03-2025.pdf | (detalle) |
| 41. AMPLIACION SUSPENSIÓN- JAC HONDURAS-SAN JUAN RIOSECO 10-03-2025.pdf | 41. AMPLIACION SUSPENSIÓN- JAC HONDURAS-SAN JUAN RIOSECO 10-03-2025.pdf | (detalle) |

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor: DINORA CRISTINA CORTES CONTRERAS 13-03-2025 18:13 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo 13-03-2025 18:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARCELLA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO:

- ✓ El 11-abril-2025 se suscribió entre las partes el acta de reanudación No. 1 del convenio solidario, tras haber superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 1, una vez desembolsados los recursos del convenio a la Junta de Acción Comunal por parte de la entidad contratante.
- ✓ El 22-abril-2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 1 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31-julio-2025.
- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**.

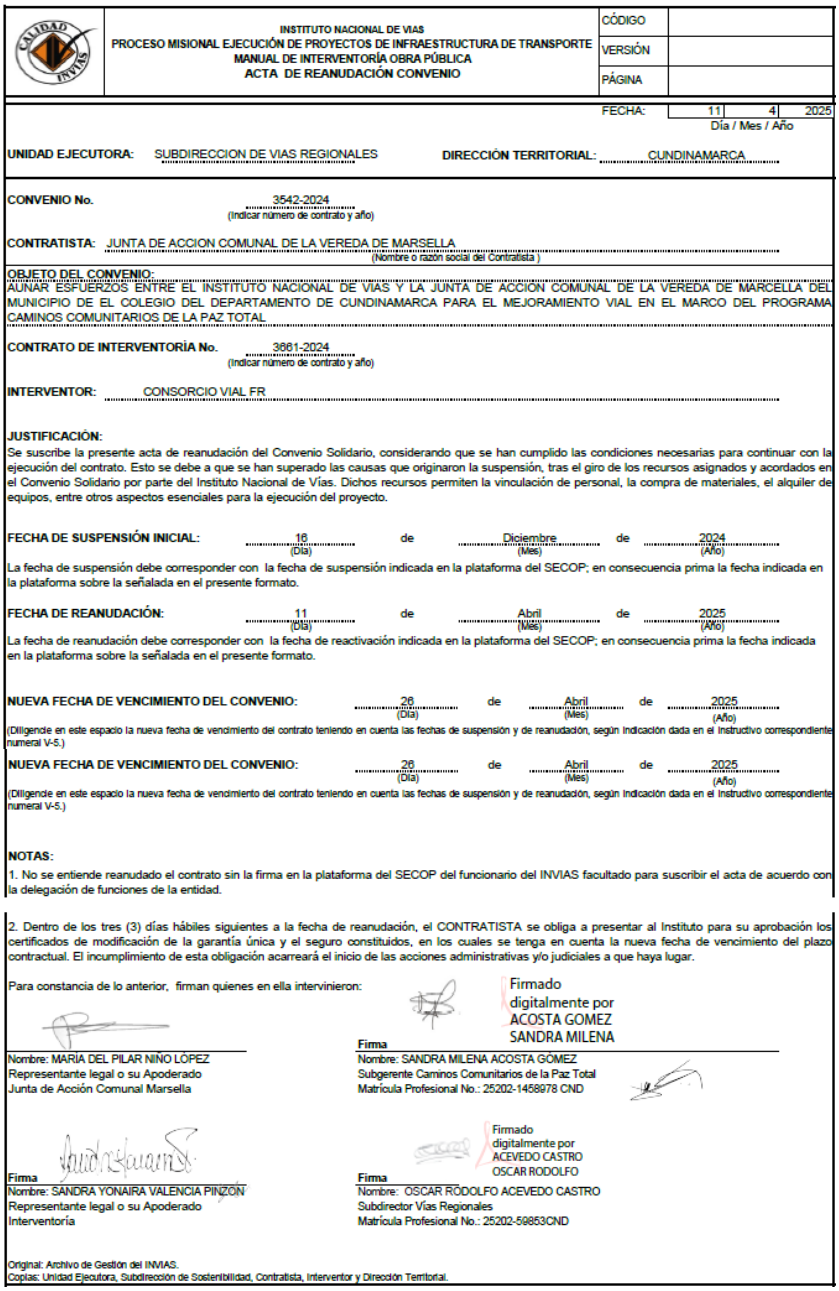

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 11 4 2025
Día / Mes / Año

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONVENIO No. 3542-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE MARSELLA
(Nombre o razon social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3661-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

JUSTIFICACIÓN:
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)
La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NOTAS:
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma
Nombre: MARIA DEL PILAR NIÑO LÓPEZ
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Marsella

Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Acta de reanudación del convenio de fecha 11-abril-2025. Vda Marsella, El Colegio

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALIANZA– MUNICIPIO DE LA VEGA:

- ✓ El 11-abril-2025 se suscribió entre las partes el acta de reanudación No. 1 del convenio solidario, tras haber superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 1, una vez desembolsados los recursos del convenio a la Junta de Acción Comunal por parte de la entidad contratante.

- ✓ El 22-abril-2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 1 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31-julio-2025.
- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**

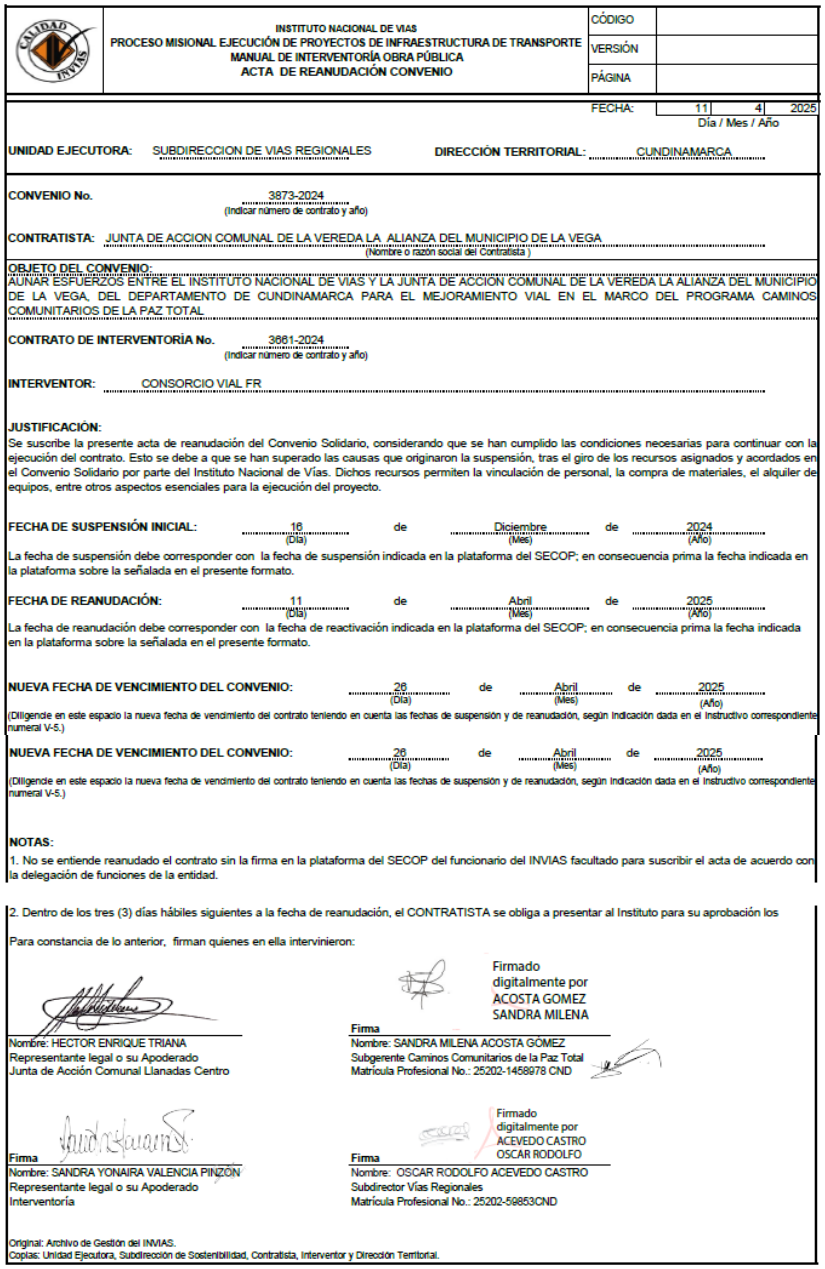

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 11 | 4 | 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONVENIO No. 3873-2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3861-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

JUSTIFICACIÓN:
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NOTAS:
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Nombre: HECTOR ENRIQUE TRIANA
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Llanadas Centro


Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA
Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Acta de reanudación del convenio solidario de fecha 11-abril-2025. Vda La Alianza, La Vega

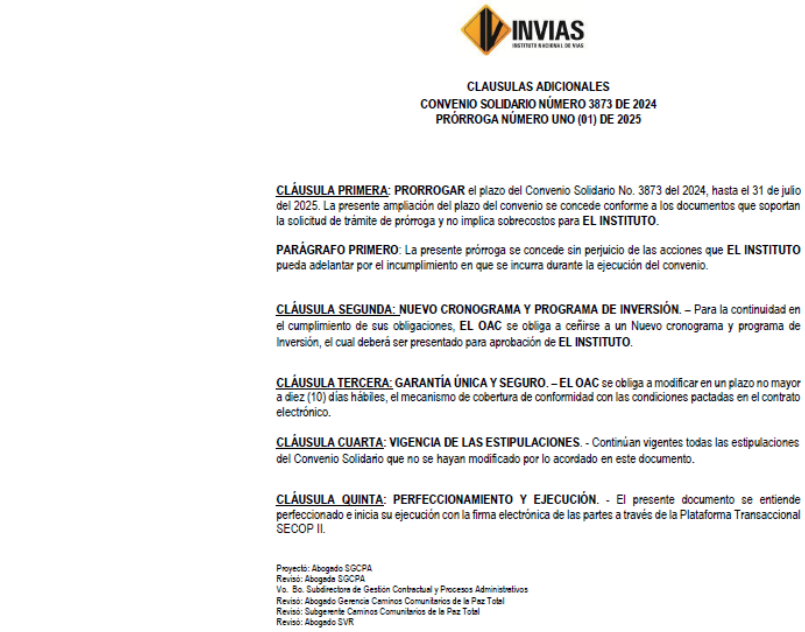

INVIAS

CLAUSULAS ADICIONALES
CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3873 DE 2024
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025

**CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo del Convenio Solidario No. 3873 del 2024, hasta el 31 de julio del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.

**CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN.** – Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL OAC** se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.

**CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL OAC** se obliga a modificar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico.

**CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.


**CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Abogado SGCPA
Revisó: Abogada SGCPA
Vo. Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Abogado SVR

Prórroga No. 1 del convenio solidario. Vda La Alianza, La Vega

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA – MUNICIPIO DE UTICA:

- ✓ El 11-abril-2025 se suscribió entre las partes el acta de reanudación No. 1 del convenio solidario, tras haber superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 1, una vez desembolsados los recursos del convenio a la Junta de Acción Comunal por parte de la entidad contratante.
- ✓ El 22-abril-2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 1 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31-julio-2025.
- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**

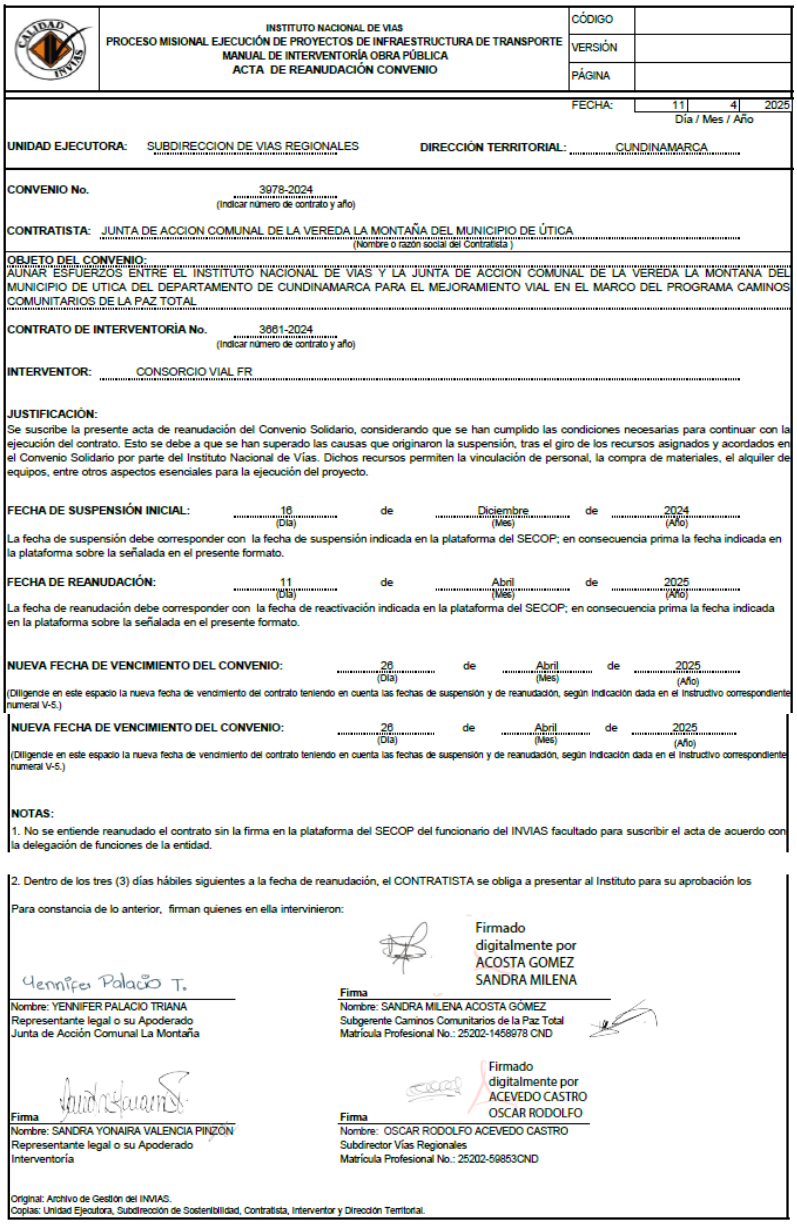

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 11 4 2025
Día / Mes / Año

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONVENIO No. 3978-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE ÚTICA
(Nombre o razón social del Contratista )

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE UTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3861-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

JUSTIFICACIÓN:
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones neoesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligende en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligende en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NOTAS:
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Yennifer Palacio T.
Nombre: YENNIFER PALACIO TRIANA
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal La Montaña

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA
Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
Representante legal o su Apoderado
Interventoría


Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ANTIOQUEÑITA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO:

- ✓ El 11-abril-2025 se suscribió entre las partes el acta de reanudación No. 1 del convenio solidario, tras haber superado las causales que dieron origen a la suspensión No. 1, una vez desembolsados los recursos del convenio a la Junta de Acción Comunal por parte de la entidad contratante.
- ✓ El 22-abril-2025 a través de la plataforma SECOP II se dio aprobación entre las partes a la prórroga No. 1 del convenio solidario, estableciendo una nueva fecha de terminación para el 31-julio-2025.

- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**

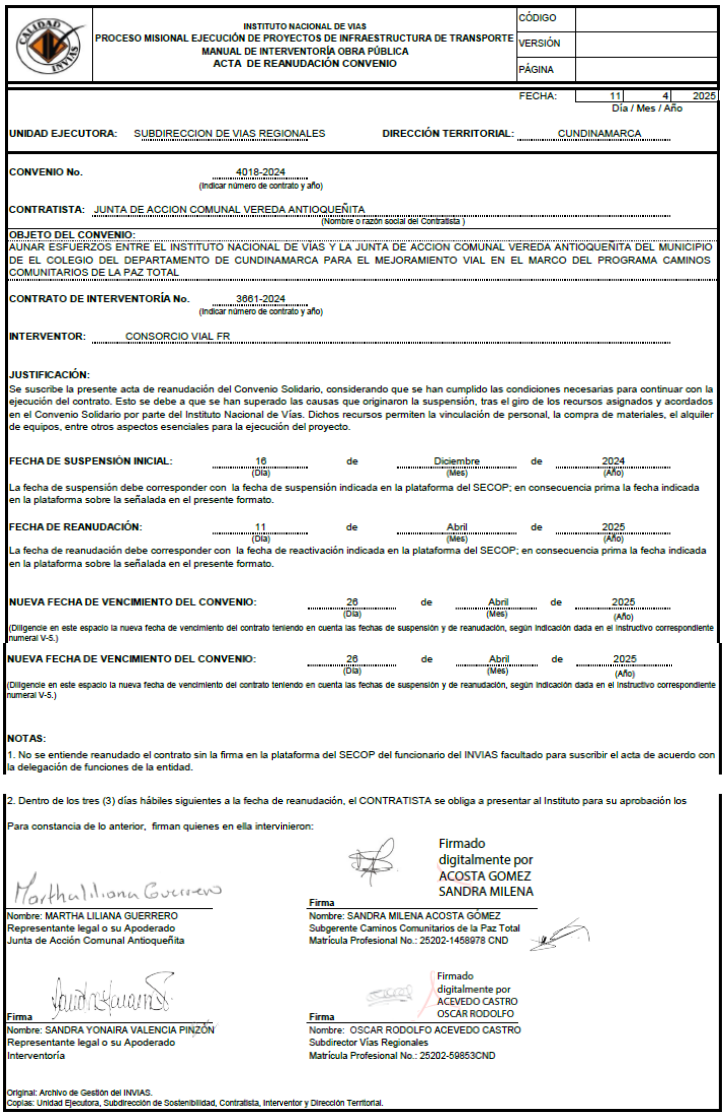

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA

FECHA: 11 (Día) 4 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONVENIO No. 4018-2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3661-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

JUSTIFICACIÓN:
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)
La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)
(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NOTAS:
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma
Nombre: MARTHA LILIANA GUERRERO
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Antioqueñita

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA
Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Acta de reanudación No. 1 del convenio solidario con fecha del 11-abril-2025. Vda Antioqueñita, El Colegio

INVIAS

**CLAUSULAS ADICIONALES**
**CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4018 DE 2024**
**PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025**

**CLÁUSULA PRIMERA**: **PRORROGAR** el plazo del Convenio Solidario No. 4018 del 2024, hasta el 31 de julio de 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

**PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.

**CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN**. – Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL OAC** se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.

**CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO**. – **EL OAC** se obliga a modificar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico.

**CLÁUSULA CUARTA**: **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

**CLÁUSULA QUINTA**: **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Abogado SGCPA
Revisó: Abogada SGCPA
Vo. Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Abogado SVR

Minuta de prórroga No. 1 del convenio solidario. Vda Antioqueñita, El Colegio

## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA – MUNICIPIO DE ARBELÁEZ:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente, se radica el 10 de marzo la prórroga No.2 desde el 01 de abril al 31 de julio del 2025.






## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS – MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central en los dos tramos de placa huella; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, sobreanchos en curvas, losas de aproximación y cunetas en los tramos de placa huella; se finalizó construcción de los dos tramos de placa huella, primer tramo de placa huella: 136 metros y segundo tramo de placa huella: 103 metros, para un total de 239 metros de placa huella en este convenio solidario.







## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario 2526-2024 se encuentra en etapa de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.






## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA -MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central en los dos tramos de placa huella; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, sobreanchos en curvas, losas de aproximación y cunetas en los tramos de placa huella; se finalizó construcción de los dos tramos de placa huella, primer tramo de placa huella: 100 metros y segundo tramo de placa huella: 136 metros, para un total de 236 metros de placa huella en este convenio solidario.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA - MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra en el mes de marzo de 2025, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central en los dos tramos de placa huella; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras y cunetas en los tramos de placa huella; se realizó jornada de aseo y limpieza en obra; se finalizó construcción de los dos tramos de placa huella, primer tramo de placa huella: 151 metros y segundo tramo de placa huella: 119 metros, para un total de 270 metros de placa huella en este convenio solidario.
El convenio solidario 2710-2024 se encuentra en etapa de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:


Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra en el mes de marzo de 2025, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); encofrado, instalación de acero de refuerzo y fundición de huellas, vigas riostras y cunetas; se finalizó construcción del filtro de drenaje; se finalizó corte y figurado de acero; se realizó jornada de aseo y limpieza en obra.
Para este convenio solidario se obtuvo una meta física de 200 metros de placa huella y 70 metros de filtro.
El convenio solidario 2436-2024 se encuentra en etapa de liquidación, adicionalmente se prepara la socialización de cierre.



## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASORURAL - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:

Durante el periodo mencionado, Se reinició el convenio solidario el 28 de abril de 2025, dado que INVIAS realizó el desembolso de los recursos a la JAC; se realizó comité operativo, donde se expone y aprueba el plan de compras junto con las cotizaciones correspondientes;

la JAC debe entregar las cartas de transferencias para proceder con el inicio de las actividades de obra.

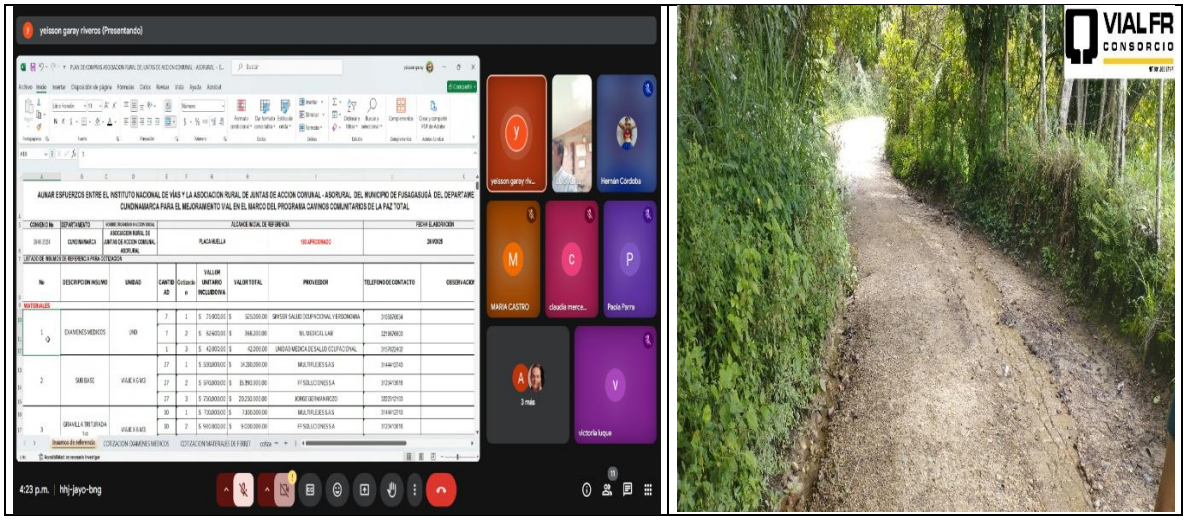


## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS - MUNICIPIO DE GUAYABETAL:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario 2389-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se adelanta gestión para la socialización de cierre.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO - MUNICIPIO DE GUAYABETAL:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario finaliza etapa de ejecución de obra, se finalizó corte y figurado de acero; se finalizó encofrado y fundición de placa huella (losa de aproximación, vigas riostras, cunetas y bordillos); se realizó limpieza y aseo en obra. Este convenio solidario logro un alcance de 225 metros de placa huella.
El convenio solidario 2800-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se adelanta gestión para la socialización de cierre.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS PEÑAS - MUNICIPIO DE MANTA:

Durante el periodo mencionado, la junta finalizó etapa de ejecución de obra, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central en los dos tramos de placa huella; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, sobreanchos en curvas, vigas riostras y cunetas en los tramos de placa huella; se finalizó construcción de los dos tramos de placa huella, primer tramo de placa huella: 109 metros y segundo tramo de placa huella: 130 metros, para un total de 239 metros de placa huella en este convenio solidario. el proyecto de inversión social, el cual es una obra civil, no se ha ejecutado.
El convenio solidario 2259-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se realiza la gestión documental para la socialización de cierre.







## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central y sobreanchos; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, losas de aproximación, cunetas y bordillos en el tramo de placa huella; se finalizó construcción del tramo de placa huella, logrando un alcance de 190 metros de placa huella en este convenio solidario: El proyecto de inversión social, el cual es una obra civil, no se ha ejecutado.
El convenio solidario 2252-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se gestiona el proceso documental para la socialización de cierre.





## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal finaliza etapa de ejecución de obra; se finalizó con el encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); se finalizó el encofrado, instalación de acero de refuerzo y fundición de huellas, vigas riostras, losas de aproximación, cunetas y bordillos. El convenio solidario logro un alcance de 180 metros de placa huella.
El convenio solidario 2279-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se gestiona el proceso documental para la socialización de cierre.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal finalizó etapa de ejecución de obra en el mes de febrero de 2025, logrando una longitud de placa huella de 147.9 metros; Se deben diligenciar todos los formatos correspondientes a la entrega final del componente social y ambiental, se debe realizar la socialización de cierre y diligenciar todos los formatos correspondientes para el proceso de liquidación.
El convenio solidario 2315-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se gestiona el proceso documental para la socialización de cierre.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal continuó etapa de ejecución de obra, se continuó encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); se continuó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, cunetas, bordillos y losa de aproximación; se continuó corte y figurado de acero; se continuó acopio de materiales. Se tiene programado terminar la ejecución de obra, los primeros días del mes de mayo; se debe ir gestionando la documentación para la liquidación del convenio.



## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, Se reinició el convenio solidario el 11 de abril de 2025 y se prorrogó hasta el 31 de julio, dado que INVIAS realizó el desembolso de los recursos a la JAC; se realizó comité operativo, donde se expone y aprueba el plan de compras junto con las cotizaciones correspondientes; Se finaliza la etapa de alistamiento y se inicia la etapa de ejecución de obra, con la conformación e instalación de subbase granular; se inició encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); se inició encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos; se inició corte y figurado de acero; se inició acopio de materiales.





## ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal finalizó etapa de ejecución de obra en el mes de febrero, logrando una longitud de placa huella de 183.1 metros; Se deben diligenciar todos los formatos correspondientes a la entrega final del componente social y ambiental, se debe realizar la socialización de cierre y diligenciar todos los formatos correspondientes para el proceso de liquidación.
El convenio solidario 2571-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se adelanta la gestión para la socialización de cierre.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal se encuentra en etapa de liquidación del convenio solidario 2221-2024.
Se realiza revisión documental de la etapa de liquidación y se programa socialización de cierre.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario 2268-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se solicita la documentación requerida para la programación de la socialización de cierre.





## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal se encuentra en etapa de liquidación del convenio solidario 2322-2024. Revisión documental de la etapa de liquidación y programación para la socialización de cierre.




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA- MUNICIPIO DE TAUSA:

Durante el periodo mencionado, Se reinició el convenio solidario el 11 de abril de 2025 y se prorrogó hasta el 31 de julio, dado que INVIAS realizó el desembolso de los recursos a la JAC.
El convenio solidario continua en etapa de alistamiento, no se ha realizado comité operativo, debido a que la JAC no ha enviado la documentación requerida.

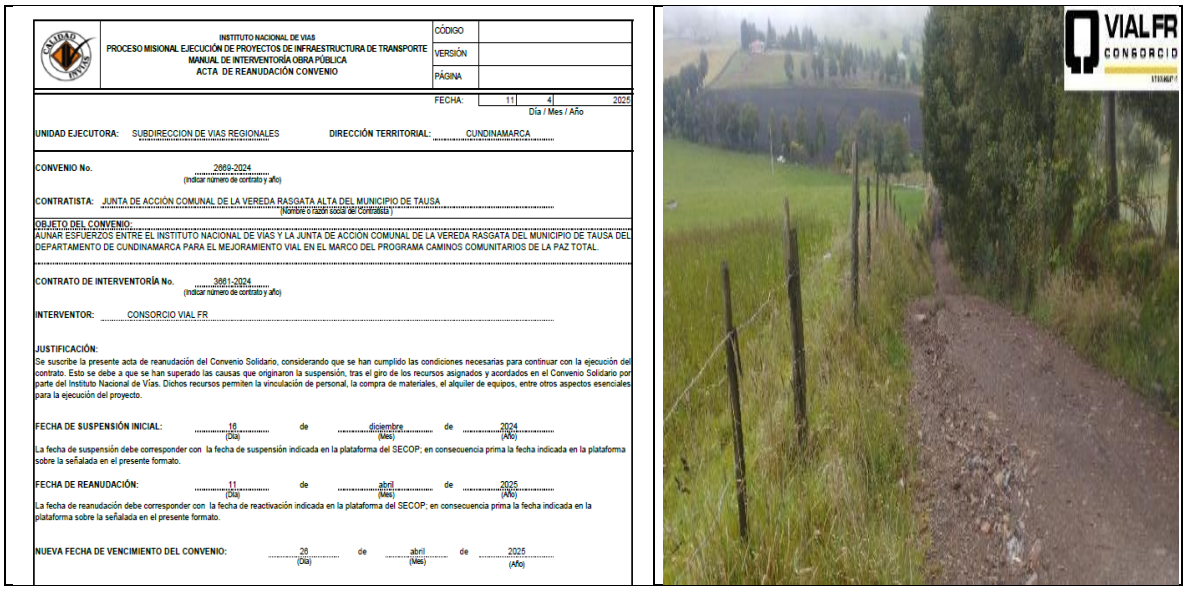

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 11 / 4 / 2025
Día / Mes / Año

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONVENIO No. 2669-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASGATA ALTA DEL MUNICIPIO DE TAUSA
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASGATA DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3661-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

JUSTIFICACIÓN:
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 (Día) de abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de abril (Mes) de 2025 (Año)




## JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO - MUNICIPIO DE UBAQUE:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal se encuentra en etapa de liquidación del convenio solidario 2309-2024. Revisión documental de la etapa de liquidación y programación para la socialización de cierre.



## 6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

**GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
DIRECTOR DE LA TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA (E)
