CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.381-2024
Nombre del Contratista:	**CAPITAL NETWORKS S.A.S.**
Periodo del informe:	1 de abril al 31 de mayo de 2025
Supervisores:	Clara Liliana Bertel Otálora, Pablo Antonio Fique Salas
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología - Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo a los componentes de cableado estructurado y corriente regulada para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

De acuerdo con el objeto del contrato y a las obligaciones específicas del contratista señaladas en el Anexo No.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OBLIGACIONES MINIMAS del documento CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL PLIEGO DE CONDICIONES, durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Requerimientos solicitados

Se dio apertura a dos (2) requerimientos de acuerdo con la siguiente relación:

TICKET	DESCRIPCION	FECHA SOLICITUD
MHCP-009	Instalación de punto de red para en la puerta de vidrio de la Sede Casas de Santa Bárbara (CSB), punto de control de acceso para la custodia y cuidado de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional	2025/04/14
MHCP-010	Reparación de puntos de red en auditorio y sala de capacitación sede Casas de Santa Bárbara	2025/05/29

3.2. Requerimientos en ejecución y/o en revisión

A la fecha de corte del presente informe se encuentran en ejecución y/o en revisión los siguientes requerimientos:

TICKET	DESCRIPCION	FECHA SOLICITUD	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
MHCP-004	Instalación de puntos de red, puntos eléctricos y de audiovisuales para conexión de pantallas interactivas en sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara	2025/01/20	Aprobación de perforación de pase en placa a Piso 1 (en obra) por parte de Subdirección de Servicios del MCHP. Cableado en mesa de juntas. Instalación de puntos de red y circuitos eléctricos en auditorio CSB. Instalación de patch cords de administración en rack de comunicaciones para puntos instalados en sala Roberto Junguito
MHCP-010	Reparación de puntos de red en auditorio y sala de capacitación sede Casas de Santa Bárbara	2025/05/29	Reponchar y certificar puntos de red

3.3. Requerimientos finalizados y entregados

Se realiza entrega de los siguientes requerimientos, los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte del Ministerio de acuerdo con el informe presentado a continuación:

TICKET	DESCRIPCION	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	ESTADO
MHCP-004 C2	Instalación de puntos de red, puntos eléctricos y de audiovisuales para conexión de pantallas interactivas en sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara. [Oficina despacho Secretaría General]	2025/01/20	2025/04/07	ENTREGADO
MHCP-007	Instalación de punto de red y tomas eléctricas para puesto de trabajo en sótano sede San Agustín – Archivo Centralizado	2025/03/17	2025/04/07	ENTREGADO
MHCP-008	Instalación de puntos de red para puestos de trabajo en Dirección de Política Macroeconómica sede San Agustín Piso 3	2025/03/25	2025/04/07	ENTREGADO
MHCP-009	Instalación de punto de red para en la puerta de vidrio de la Sede Casas de Santa Bárbara (CSB), punto de control de acceso para la custodia y cuidado de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional	2025/04/14	2025/05/13	ENTREGADO

REQUERIMIENTO No. 004

Instalación de puntos de red, puntos eléctricos y de audiovisuales para conexión de pantallas interactivas en sedes San Agustín y Casas de Santa Bárbara	**TICKET DE SERVICIO No.**	MHCP-004-C2
	Fecha solicitud	2025/01/20
	Fecha de entrega	2025/04/07
	Estado	TERMINADO
	% Avance de ejecución	100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Apertura y adecuación de muro en drywall. Instalación de coraza, cajas y accesorios. Instalación de tomas lógicas y eléctricas. Instalación de cable eléctrico y F/UTP. Instalación de cable HDMI. Certificación y marquillado de puntos de red. Instalación y marquillado de patch cord de administración	Punto de red, puntos de audiovisuales y tomas eléctricas en servicio para conexión de equipos y componentes de videoconferencia en oficina de despacho Secretaría General. Punto HDMI en sala de juntas despacho Director DGCPTN



Localización y plan de trabajo




Localización y plan de trabajo





Corte de muro de drywall




Inspección y plan de trabajo. Estado inicial

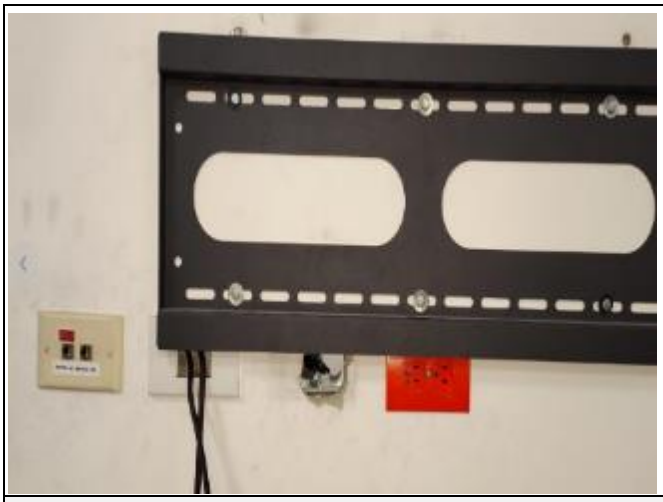	
Desinstalación de equipo	Desinstalación de tomas
	
Instalación de cajas, corazas y accesorios	Instalación de cajas, corazas y accesorios
	
Instalación de cable eléctrico	Instalación de cable F/UTP y HDMI

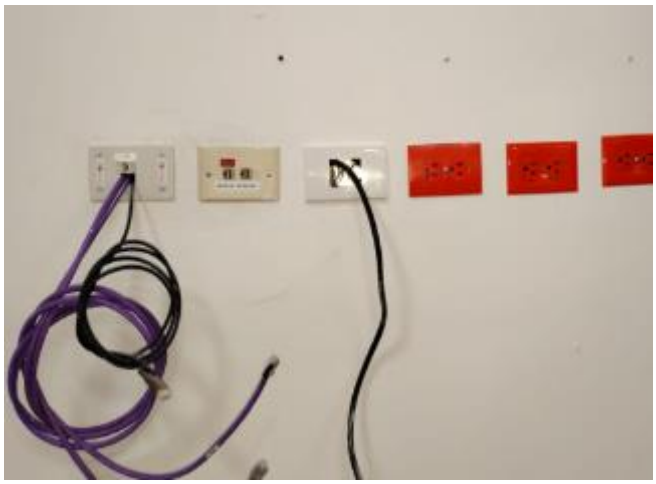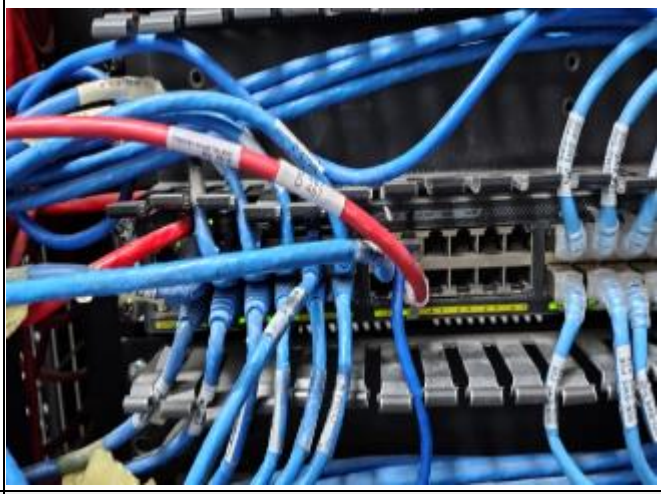
	
Terminación de pared, tomas y faceplates	Marquillado de tomas eléctricas y faceplates
	
Certificación de punto de red	Instalación de punto (cable) auxiliar
	
Ponchado y marquillado en patch panel	Instalación y marquillado de patch cord




Instalación y marquillado de patch cord

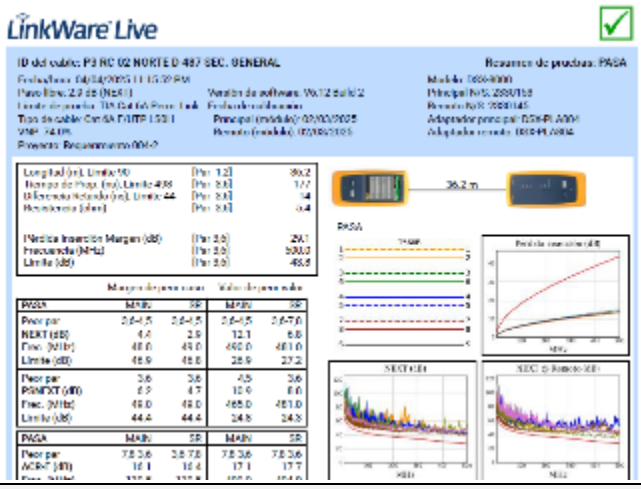


Certificación D487-N PASA

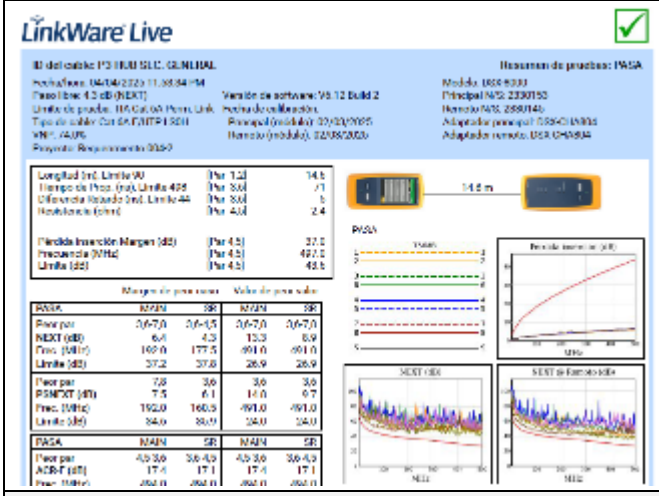

Certificación cable HUB PASA

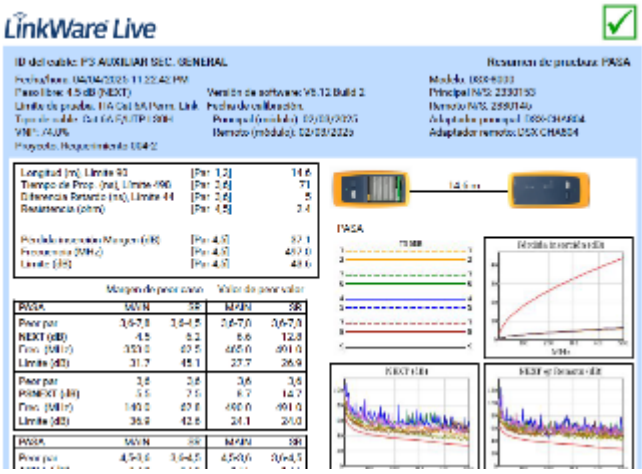


Certificación cable AUX PASA

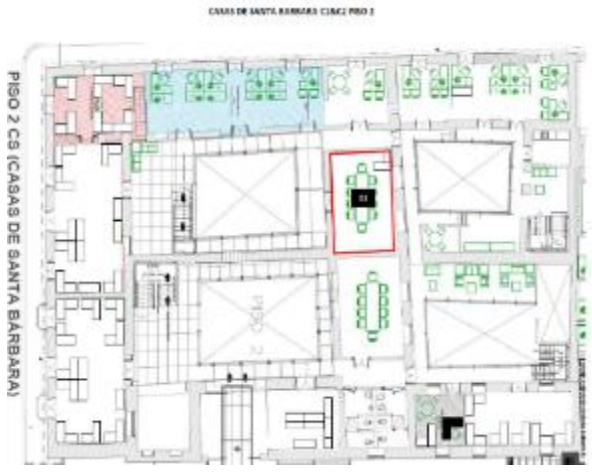

Localización oficina despacho DGCPTN



Salida cable HDMI en grommet

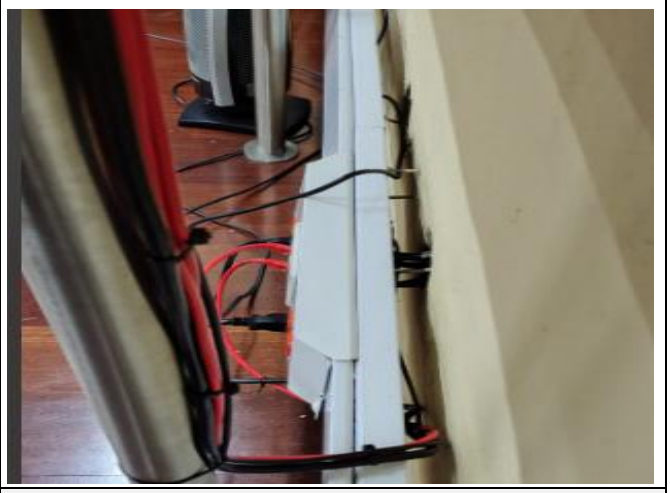	
Instalación de cable HDMI en canaleta perimetral	Instalación de cable HDMI en canaleta perimetral
	
Salida HDMI en muro	Equipo en servicio


REQUERIMIENTO No. 007

Instalación de punto de red y tomas eléctricas para puesto de trabajo en sótano sede San Agustín – Archivo Centralizado	**TICKET DE SERVICIO No.**	MHCP-007
	Fecha solicitud	2025/03/17
	Fecha de entrega	2025/04/07
	Estado	TERMINADO
	% Avance de ejecución	100%

ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Instalación de troqueles, faceplate y tomas eléctricas. Instalación de cable F/UTP y cable eléctrico. Ponchado, certificación y marquillado de punto de red. Marquillado de tomas eléctricas.	Punto de red y tomas eléctricas en servicio en puesto de trabajo para conexión de usuario a servicios de red



Localización y plan de trabajo

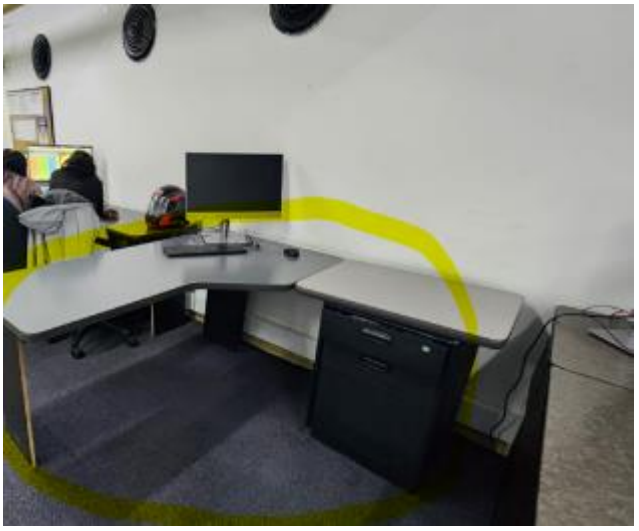


Inspección del puesto de trabajo




Estado inicial canaleta perimetral



Punto a reubicar

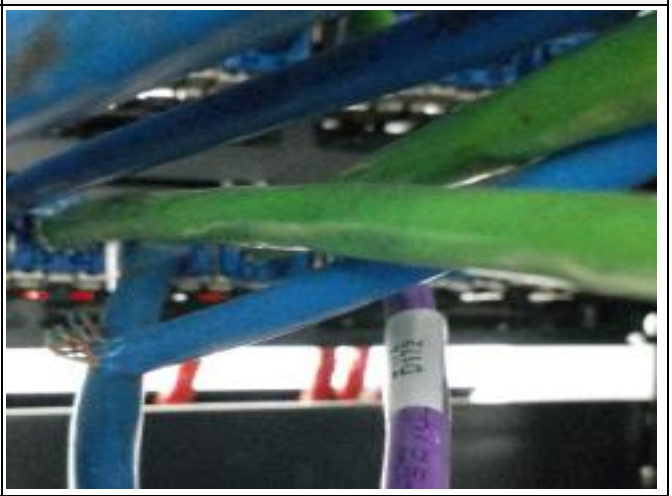	
Instalación de cable F/UTP	Instalación de cable F/UTP
	
Instalación de cable F/UTP	Ponchado y marquillado
	
Terminación y marquilladp de tomas	Tomas en servicio

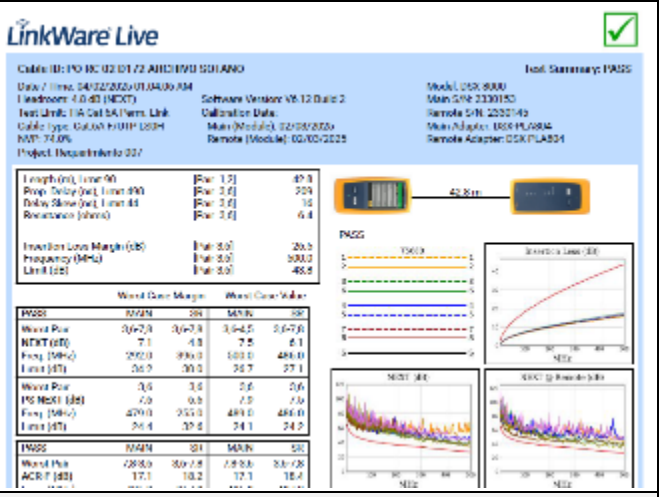	
Conexión en patch panel.	Certificación D172 PASA


REQUERIMIENTO No. 008

Instalación de puntos de red para puestos de trabajo en Dirección de Política Macroeconómica sede San Agustín Piso 3	**TICKET DE SERVICIO No.**	MHCP-008
	Fecha solicitud	2025/03/25
	Fecha de entrega	2025/04/07
	Estado	TERMINADO
	% Avance de ejecución	100%


ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Instalación de cable F/UTP. Instalación de faceplates, Ponchado, certificación y marquillado de puntos de red. Identificación y marquillado de puntos no marcados.	Puntos de red en servicio para conexión de usuarios a servicios de red.



Localización y plan de trabajo

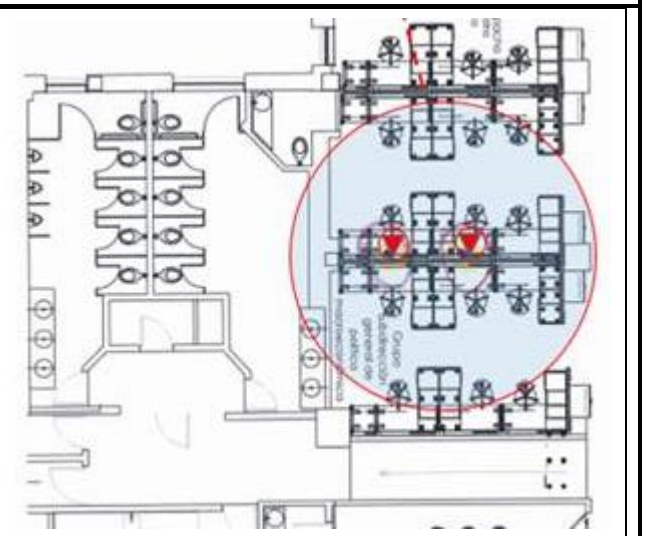


Localización y plan de trabajo

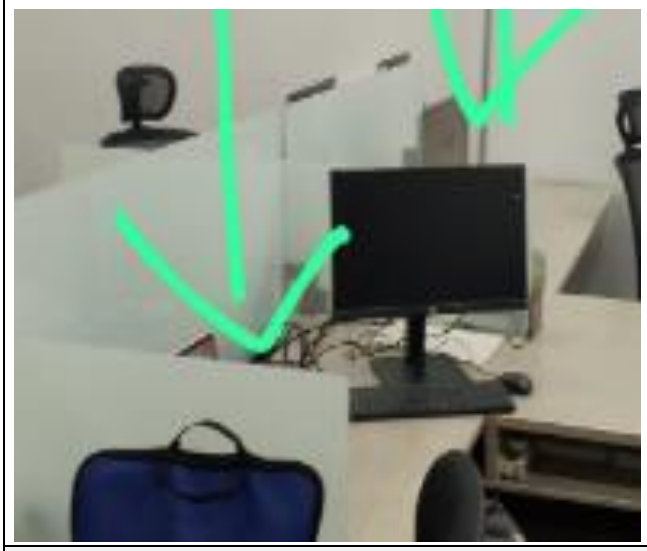

Inspección puestos de trabajo



Estado inicial canaleta y tomas

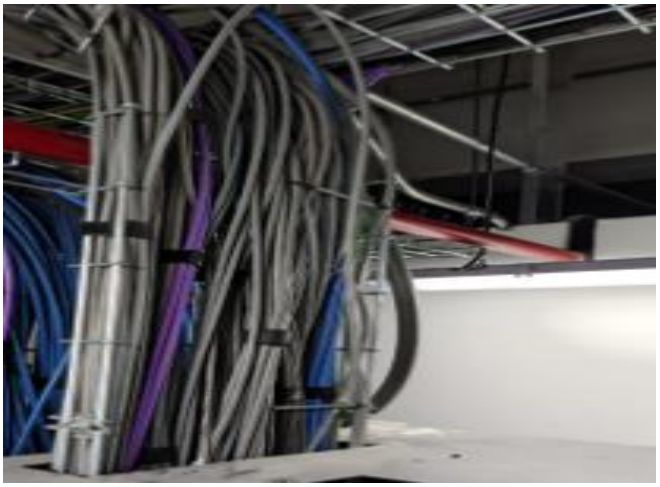	
Estado inicial canaleta y tomas	Inspección de canaletas en Piso 2
	
Inspección de canaletas en Piso 2	Instalación de cable F/UTP
	
Instalación de cable F/UTP	Ponchado en patch panel




Instalación y marquillado de patch cords en rack




Ponchado y marquillado en puesto de trabajo




Ponchado y marquillado en puesto de trabajo

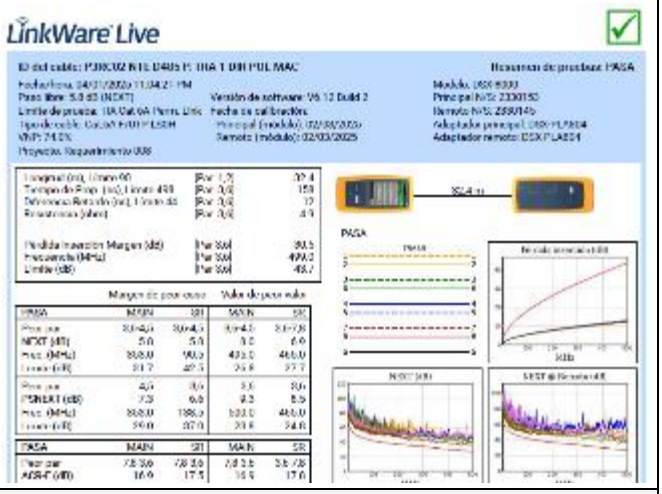


Certificación D485-N PASA

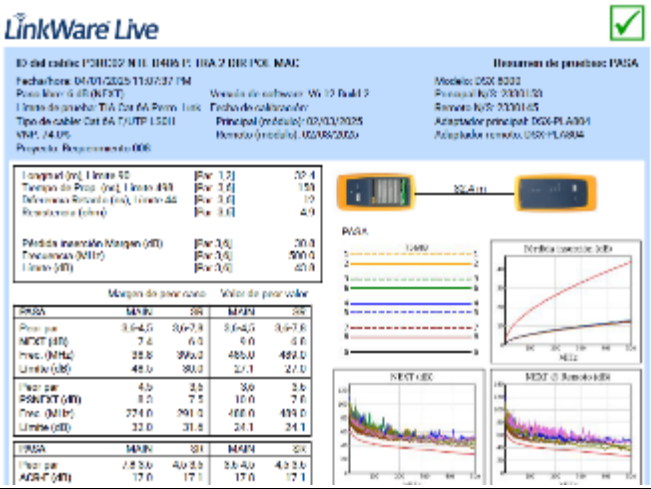

Certificación D486-N PASA

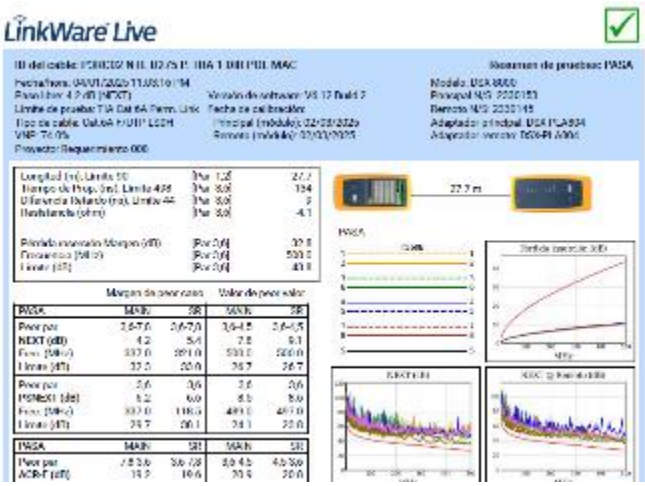


Certificación D275-N PASA

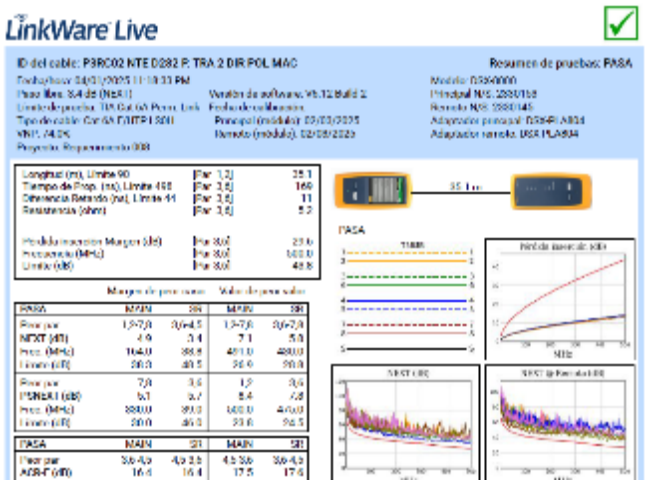	Informe de ejecución y supervisión Contrato 3.381-2024
Certificación D282-N PASA	Certificación D487-N PASA

REQUERIMIENTO No. 009

Instalación de punto de red para en la puerta de vidrio de la Sede Casas de Santa Bárbara (CSB), punto de control de acceso para la custodia y cuidado de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional	**TICKET DE SERVICIO No.**	MHCP-009
	Fecha solicitud	2025/04/14
	Fecha de entrega	2025/05/13
	Estado	TERMINADO
	% Avance de ejecución	100%


ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRODUCTOS ENTREGADOS
Instalación de caja y tubo EMT. Instalación de cable F/UTP y faceplate, Ponchado, certificación y marquillado de punto de red. Instalación y marquillado de patch cord de administración en rack de comunicaciones.	Punto de red en servicio para conexión de dispositivo de control de acceso.

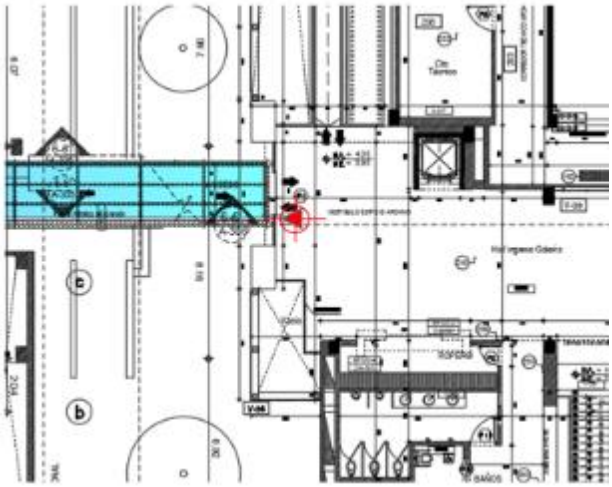

Localización y plan de trabajo



Localización y plan de trabajo

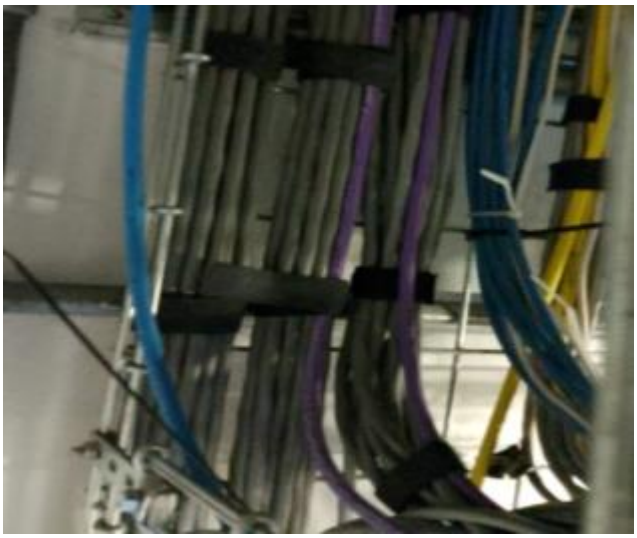


Instalación de cable F/UTP



Instalación de cable F/UTP

	
Ponchado y marquillado en patch panel	Ponchado y marquillado en patch panel
	
Instalación y marquillado de patch cord	Conexión a switch
	
Instalación de caja, faceplate y ponchado	Marquillado de faceplate

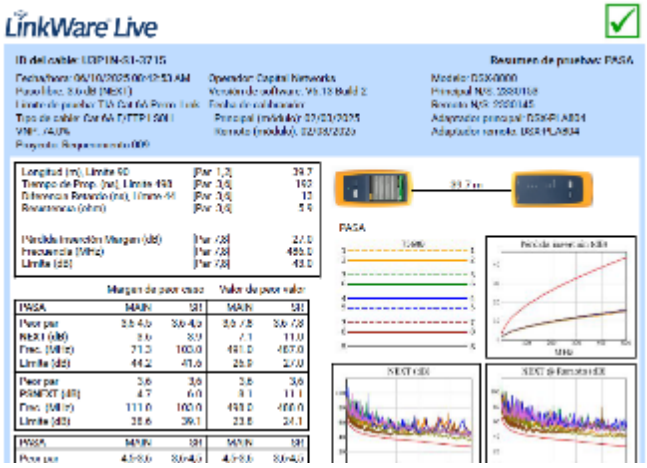

Informe de ejecución y supervisión
Contrato 3.381-2024

Certificación U3P1N-D1-3715 PASA

HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ
Representante Legal
CAPITAL NETWORKS S.A.S.

EDWARD ENRIQUE LOPEZ DIAZ
Ingeniero de Mantenimiento
CAPITAL NETWORKS S.A.S.

En calidad de supervisores del contrato nos permitimos avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

BERTEL OTALORA CLARA LILIANA
Firmado digitalmente por BERTEL OTALORA CLARA LILIANA

Clara Liliana Bertel Otalora
Supervisor Contrato No. 3.381-2024
Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos

FIQUE SALAS PABLO ANTONIO
Firmado digitalmente por FIQUE SALAS PABLO ANTONIO

Pablo Antonio Fique Salas
Supervisor Contrato No. 3.381-2024
Subdirección de Administración de Recursos Tecnológicos
