CONSORCIO CMCPV10-0824

Manizales, mayo 12 de 2025

INT-04102024-1376-OFICIO-05

Ingeniero
ESTEBAN DIAZ OSORIO
Supervisor Secretaría de Vivienda Gobernación de Caldas Manizales, Caldas.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 04102024-1376 cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRIMERO TU CASA EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. LOTE 01

Asunto: Aprobación prórroga del contrato de obra.

Una vez analizadas las condiciones actuales del contrato de la referencia y de acuerdo a solicitud realizada por el señor HÉCTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO, representante legal del contratista CONSORCIO HJ&E, en los términos que se expresan en su oficio de fecha 09 de mayo de 2025, la interventoría respalda las siguientes razones:

- A la fecha no se han recibido los lotes faltantes (15) en el sector de La Primavera por parte de la alcaldía municipal de La Dorada; es de anotar que desde el inicio del contrato se ha venido solicitando la entrega de estos lotes, y a la fecha solo se tienen conversaciones de entrega y licenciamiento de estos lotes por parte del municipio.

- Además, los lotes del corregimiento de Guarinocito se pudieron empezar a intervenir desde hace 20 días, una vez realizado el relleno autorizado por la secretaria de vivienda y territorio. Este atraso en la entrega de los lotes se refleja en el atraso de la ejecución programada, pues las actividades se desarrollan únicamente sobre la mitad del proyecto, debido a la falta de lotes dispuestos por la alcaldía municipal desde el inicio de la ejecución de este proyecto.

- La temporada invernal sufrida en el Municipio de La Dorada en los últimos meses de ejecución del contrato, ha retrasado el proceso de construcción y las actividades que se debieron llevar a cabo como: excavación y retiro de material en cimentaciones, instalación de acero

de refuerzo para vigas de cimentación, vaciado de vigas de cimentación, instalación de mampostería; adicional a ello, se suma el riesgo que podrían tener los trabajadores al estar ejecutando actividades bajo la lluvia, entre otras consecuencias derivadas de las fuertes lluvias presentadas.

Así las cosas, interventoría considera necesaria la prórroga en tiempo, para lograr culminar debidamente el objeto contractual.

La Interventoría recomienda que la prórroga en tiempo debe ser de 1 mes, esto es hasta el día 19 de junio de 2025.

Se anexa el oficio del contratista de obra con asunto: Solicitud de ampliación plazo de ejecución al contrato 04102024-1376 relacionado con construcción de CASAS LA DORADA, CALDAS.

Atento saludo,

CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
R.L..CONSORCIO CMCPV10-
0824 Interventor

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA- SECRETARÍA DE VIVIENDA Y TERRITORIO	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 11/05/2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 29 . PERÍODO: MAY. 05 A MAY. 11 DE 2025

INTERVENTOR:	CONSORCIO CMCPV10-0824
CONTRATO INTERVENTORÍA:	04102024-1380
CONTRATISTA:	CONSORCIO HJ&E
No. DE CONTRATO:	04102024-1376
OBJETO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL "PRIMERO TU CASA" EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y LA DORADA, CALDAS. (GRUPO 01, CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS)

CONTROL DE PLAZO DEL CONTRATO

Fecha de Iniciación: 21 DE OCTUBRE DE 2024	**Fecha de vencimiento inicial:** 20 DE MAYO DE 2025
Plazo: SIETE (7) MESES	**Fecha de vencimiento final:**
Fecha de suspensión No1:	**Fecha de suspensión No 2:**
Fecha de reiniciación No 1:	**Fecha de reiniciación No 2:**
Prorrogas en plazo No. 1:	**Prorrogas en plazo No. 2:**
Prorrogas en plazo No. 3:	**Prorrogas en plazo No. 4:**

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Valor inicial: $ 3,445,150,226	**Adición en valor No. 1:**
Valor con adición:	**Adición en valor No. 2:**
Valor acta No.1: $ 364,006,512	**Valor acta No.2:** $ 555,078,989
Valor acta No.3: $ 382,176,877	**Valor acta No.4:**

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA:

Ayudantes	18	Oficiales	7	Maestros	1	SST	1	Residente:	1
Almacenista	1	Social	1	Cadeneros	0			Topógrafo	0

PERSONAL EMPLEADO POR LA INTERVENTORIA:

Auxiliares: 0 Ingenieros: 1

AVANCE DE LA OBRA:

	INICIAL	ADICIÓN No 1	ADICIÓN No. 2	ADICIÓN No. 3	TOTAL	%
% Inversión acumulada programada:	3,301,525,665				3,301,525,665	95.83%
% Inversión acumulada ejecutada:	1,463,321,654				1,463,321,654	42.47%
% Plazo transcurrido:	196				196	92.02%

REPORTE DE ACCIDENTES (con o sin afectación de personas y/o medio ambiente):
A la fecha no se han reportado accidentes

SEÑALIZACION DE LA OBRA:	SI	NO
Valla informativa:	X	
Vallas preventivas:		X
Postes, cintas y señales preventivas:	X	

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA- SECRETARÍA DE VIVIENDA Y TERRITORIO SIG	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 11/05/2025

POLIZAS

GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	EC-100036576-2	21/10/2024	21/09/2025	$ 689,030,045.20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	EC-100036576-2	21/10/2024	21/05/2028	$ 689,030,045.20
ESTABILIDAD	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	EC-100036576-2	21/10/2024	21/05/2027	$ 1,033,545,067.80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	EC-100011178-2	21/10/2024	21/07/2025	$ 520,000,000.00

COMENTARIOS GENERALES (favor incluir análisis y si la situación generada lo amerita amplíe en el cuadro de "ACTUACIONES"):
Se hace excavación en la manzana D casa 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 barrio el trébol corregimiento de guarinocito.
Se funde zarpa en concreto ciclópeo en la manzana D casa 14, 15, 16, 19 y 20 barrio el trébol corregimiento de guarinocito.
Se funde viga de cimentación en la manzana D casa 18 y 19 barrio el trébol corregimiento de guarinocito.
Se hace instalación de acero en la manzana D casa 17 y 18 barrio el trébol corregimiento de guarinocito.
Se hace instalación de cubierta en la manzana F casa 3 barrio primavera.
Se hace instalación de enchape para pared ducha manzana F casa 9, 10, 11, 12 y 13 provigua corregimiento de guarinocito.
Se hace instalación de enchape piso cerámico en la manzana F casa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 provigua corregimiento de guarinocito.
Se hace revoque liso muro en la manzana F casa 4, 5, 6 y 7 barrio primavera.
Se hace instalación de ventana corrediza en la manzana F casa 8, 9 y 10 provigua corregimiento de guarinocito.
Se hace instalación de puerta en la manzana F casa 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 provigua corregimiento de guarinocito.
Se hace instalación de tubería hidráulica en la manzana F casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 barrio primavera.
Se hace instalación de red eléctrica en la manzana F casa 2, 3, 4 y 5 barrio primavera.

La obra presenta un atraso de 53,36%

ACTUACIONES:

SITUACION (DESCRIPCIÓN)	ANÁLISIS (Relacione las consecuencias derivadas de la situación)	TIPO DE CONSECUENCIA (Señale con una "X")						ACTUACION	COMUNICACIÓN GENERADA	
		Técnica	Jurídica	Económica	Ambiental	S&SO	(*) Otra (Cual)		Dirigida a: (Persona y Entidad)	Número

(*) Otra. Cual:

Compromisos adquiridos y cumplidos: Contratista de Obra, Interventoria, Entidad Contratante, otros (información resultante del Comité de Obra Semanal)

OTRA CORRESPONDENCIA ENVIADA

Número	Dirigida a:	Asunto / Comentarios

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Número	Dirigida a:	Asunto / Comentarios

Manizales, mayo 12 de 2025

R.L. CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
Ingeniero Interventor Obra

GOBIERNO DE CALDAS	LISTA DE CHEQUEO DE CONTROL DE INTERVENTORÍA	Codigo: HS-FO-08 Versión: 02 Fecha Modificación: 11/05/2025

Aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional			
	SI	**NO**	**NA**
a) Verificó estado de Fachadas y Aleros de Construcciones aledañas. INCLUIR FOTOS.	X		
b) Verificó interferencia y cruce de otras líneas de servicios que puedan generar peligro. INCLUIR FOTOS.	X		
c) Verificó que todo el personal laborando en obra estuviera afiliado a EPS, ARP, Pensiones y Caja de Compensación.	X		
d) Verificó que toda excavación o talud estuviera debidamente entibado y apuntalado. INCLUIR FOTOS.			X
e) Verificó que todo el personal tuviera los elementos de protección personal necesarios para las labores desarrolladas. INCLUIR FOTOS.	X		
f) Verificó que toda excavación o abertura estuviera señalizada. INCLUIR FOTOS.			X
g) Verificó que todos los accesos a residencias y cruces peatonales estuvieran debidamente construidos. INCLUIR FOTOS.			X
Aspectos Ambientales			
a) Verificó que el perímetro de la obra esté protegido con lona. INCLUIR FOTOS.			X
b) Verificó que el producto de las demoliciones y retiro de sobrantes se llevarán a Escombreras autorizadas. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION.			X
c) Verificó que el producto de sobrantes de plástico y residuos no degradables se lleven al relleno sanitario. INCLUIR FOTOS Y CERTIFICACION.			X
d) Verificó que los vehículos (Volquetas, Camionetas, etc) utilizadas en obra tuvieran el certificado ambiental vehicular vigente. INCLUIR FOTOS Y COPIAS DE LOS CERTIFICADOS.			X
e) Verificó que las volquetas utilizadas en obra tengan la lona de protección para el vuelco. INCLUIR FOTOS.	X		

R.L. CARLOS ALBERTO CEBALLOS CIFUENTES
Ingeniero Interventor Obra

GOBIERNO DE CALDAS	PRESUPUESTOS- CONTRATO No. 04102024-1376	Codigo: HS-FO-08
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 11/05/2025

PRESUPUESTOS - CONTRATO Nº 04102024-1376 (CONTRATISTA)

MUNICIPIO: La Dorada

ÍTEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
1	EJECUTAR OBRAS PRELIMINARES										
1.01	REALIZAR LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE INTERVENCIÓN, INCLUYE IMPLANTACION DE LA VIVIENDA EN LOTE, PLANO RECORD, HILADEROS Y ELEMENTOS DE LOCALIZACIÓN.	m2	2729.16	1,504	4,104,657	0.00	2016.00	0.00	0.00	3,032,064	0
1.02	REALIZAR DESCAPOTE MANUAL de 0-20 cm Y LIMPIEZA DE LOTE, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	2729.16	2,289	6,247,047	0.00	2016.00	2729.16	0	4,614,624	6,247,047
1.03	REALIZAR CERRAMIENTO PROVISIONAL CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN INCLUYE SEÑALIZADOR TUBULAR DOS CINTAS	ml	1821.72	3,220	5,865,938	0.00	487.00	1821.72	0	1,568,140	5,865,938
2	EJECUTAR EXCAVACIONES Y LLENOS										
2.01	REALIZAR EXCAVACION MANUAL DE VIGAS DE FUNDACION DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	491.76	20,390	10,027,023	6.06	200.36	491.76	123,563	4,085,340	10,027,023
2.02	REALIZAR EXCAVACIÓN MANUAL DE REDES SANITARIAS DE 0 - 2 METROS. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	199.47	20,390	4,067,224	0.00	95.21	199.47	0	1,941,332	4,067,224
2.03	REALIZAR NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL DE SITIO, INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	1916.60	3,657	7,009,015	0.00	960.68	1916.60	0	3,513,207	7,009,015
2.04	REALIZAR RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHÍCULO AUTOMOTOR CARGUE MANUAL (HASTA 15 Km)	m3	649.44	27,392	17,789,597	0.00	268.80	649.44	0	7,362,970	17,789,597
NP.3	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR, INSTALAR Y COMPACTAR MECANICAMENTE MATERIAL DE RELLENO	m3		80,000	0	0.00	1027.18	0.00	0	82,174,400	0
5	CONSTRUIR CIMENTACION										
5.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO CICLOPEO O VIGA ZARPA 30x30 cm (60% Concreto 3000 psi Impermeabilizado y 40% piedra media zonga), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	245.88	346,099	85,099,134	11.59	161.45	245.88	4,011,287	55,877,684	85,099,134
5.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI impermeabilizado VIGA DE CIMENTACION DE 30x30 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m3	245.88	536,021	131,797,326	8.18	126.79	245.88	4,384,652	67,962,103	131,797,326

ÍTEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
6	CONSTRUIR ESTRUCTURA EN CONCRETO										
6.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LOSA DE CONTRAPISO DE 3000 PSI e=10cm, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	2444.73	66,092	161,577,097	0.00	1195.60	2444.73	0	79,019,595	161,577,097
6.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI COLUMNA 12x18 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	2310.21	30,131	69,608,938	0.00	1175.16	2310.21	0	35,408,746	69,608,938
6.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 3000 PSI VIGA 12x20 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	3079.14	31,135	95,869,024	0.00	1364.72	3079.14	0	42,490,557	95,869,024
6.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CONCRETO 2500 PSI COLUMNETA, VIGA CINTA Y ALFAJIAS DE 12x10 cm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	3314.55	19,183	63,583,013	0.00	1727.32	3314.55	0	33,135,180	63,583,013
6.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15X15CM	m2	2444.73	19,005	46,462,094	0.00	1195.60	2444.73	0	22,722,378	46,462,094
6.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO #4 O 1/2" DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	Kg	40315.57	7,708	310,752,386	852.40	20851.20	40315.57	6,570,299	160,721,050	310,752,386
6.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 O 3/8" FY= 4200 KG/CM2	Kg	4020.00	7,708	30,986,197	74.40	2718.18	4020.00	573,475	20,951,731	30,986,197
6.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #2 O 1/4" FY= 4200 KG/CM2	Kg	11407.55	7,708	87,929,415	118.16	4963.84	11407.55	910,777	38,261,279	87,929,415
7	INSTALAR MAMPOSTERIA										
7,01-comp	EJECUTAR INSTALACION DE MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=12CMS (0,20X0,40) REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2	5087.08	24,942	126,881,924	0.00	0.00	5087.08	0	0	126,881,924
NP.1	SUMINISTAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MURO EN LADRILLO FAROL 12X20X30; REVITADO AMBAS CARAS PARA REVOQUE, CONTROL DE CALIDADA EN PLOMOS Y ESCUADRAS, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. (INCLUYE MORTERO TIPO S)	m2		59,750	-	37.98	2486.86	0.00	2,269,305	148,589,885	0
8	INSTALAR CUBIERTA										
8.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA EN C DE 120X60 3mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	2736.00	62,276	170,387,136	0.00	0.00	2736.00	0	0	170,387,136
NP.2	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DE CORREA METÁLICA TUBULAR DE 100X50 2,0 mm PARA CUBIERTA, INCLUYE VARILLAS DE ANCLAJE EN VIGAS CINTAS Y DE AMARRE CULATAS, SOLDAURA A PERFILES, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml		45,000	-	42.00	1176.00	0.00	1,890,000	52,920,000	0

ÍTEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
8.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO PERFIL 7 #8. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	2705.22	32,136	86,934,950	47.87	1244.62	2705.22	1,538,350	39,997,108	86,934,950
8.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CANAL EN PVC TIPO AMAZONAS O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS Y GANCHOS.	ml	228.00	467,706	106,636,968	0.00	0.00	228.00	0	0	106,636,968
8.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR FLANCHE EN MEMBRANA IMPERMEABLE DE 3.0 MM. CON FOIL DE ALUMINIO Y REFUERZO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. d/ 0.50 m.	ml	484.50	201,845	97,793,903	0.00	39.14	484.50	0	7,900,213	97,793,903
8.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CABALLETE EN FIBROCEMENTO, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	342.00	42,182	14,426,244	6.00	156.00	342.00	253,092	6,580,392	14,426,244
8.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CLARABOYA Y VIDRIO 4mm, INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	un	57.00	78,293	4,462,701	1.00	26.00	57.00	78,293	2,035,618	4,462,701
NP.4	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALACION TEJA PLASTICA #5 EN PATIOS	un		60,000	0	0.00	75.00	0.00	0	4,500,000	0
9	CONSTRUIR ACABADOS										
9.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED DUCHA DE BAÑO (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	517.45	63,211	32,708,279	23.40	37.44	517.45	1,479,137	2,366,620	32,708,279
9.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ENCHAPE PARED COCINA Y ROPAS 2 HILADAS h= 50 cm (Pared Cerámica Jaya Blanco 25x35 cm caja 2 m2 o similar). INCLUYE ALISTADO REVOQUE PARED, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	ml	237.69	39,739	9,445,563	0.00	0.00	237.69	0	0	9,445,563
9.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PISO CERÁMICO BLANCO O BEIGE DE 45.8x45.8 cm Ó 50x50 cm. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN 3 cm, SE DEBE PRESENTAR DESPIECE, JUNTAS ELASTICAS 5mm RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	123.92	65,248	8,085,403	16.72	16.72	123.92	1,090,947	1,090,947	8,085,403
9.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REVOQUE LISO MUROS 1:3, (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACIVIDAD.	m2	646.38	21,008	13,579,151	36.80	455.54	646.38	773,094	9,569,984	13,579,151
9.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	390.91	16,777	6,558,230	0.00	0.00	390.91	0	0	6,558,230

ÍTEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
9.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS COLORES SEGÚN DISEÑOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES), INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	m2	646.38	29,972	19,373,301	0.00	204.06	646.38	0	6,116,086	19,373,301
9.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA ENTAMBORADA CARAS EN MDF ACABADO MELAMINA. ANCHO: 0,70 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. MARCO EN MDP RH ARMADO A LA PUERTA. INCLUYE BISAGRAS OMEGA Y PERFORACIÓN DE CERRADURA.	un	57.00	241,033	13,738,881	0.00	0.00	57.00	0	0	13,738,881
10	INSTALAR CARPINTERIA METALICA										
10.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.2x1.2 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-1)	un	114.00	236,320	26,940,480	6.00	16.00	114.00	1,417,920	3,781,120	26,940,480
10.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR VENTANA CORREDIZA Y FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 4 MM DE 1.0x1.0 metros (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM.). INCLUYE ALFAJIA INFERIOR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE (VT-2)	un	114.00	169,596	19,333,944	6.00	16.00	114.00	1,017,576	2,713,536	19,333,944
10.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUERTA 1 PANEL Y MARCO METALICO CALIBRE 18 E= 8.5 CM SENCILLO, EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, VANO DE 0.90x2.2m. ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE (Pintura electrostática). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE,CERRADURA DE SOBREPONER, BISAGRES Y TORNILLOS SEGUN DETALLE (PT-1 Y PT-2)	un	114.00	440,414	50,207,196	25.00	56.00	114.00	11,010,350	24,663,184	50,207,196
11	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS										
11.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COMBO SANITARIO (INODORO, LAVAMANOS CON PEDESTAL E INCRUSTACIONES) INCLUYE GRIFERÍA	un	57.00	372,181	21,214,317	0.00	0.00	57.00	0	0	21,214,317
11.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR DUCHA SENCILLA, (REGADERA Y GRIFERÍA)	un	57.00	39,927	2,275,839	0.00	0.00	57.00	0	0	2,275,839
11.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CHARQUERO EN CONCRETO DE 2500PSI. 0,1X0.04m.	ml	62.70	16,320	1,023,264	0.00	0.00	62.70	0	0	1,023,264
11.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO 90X60cm (INCLUYE PEDESTAL)	un	57.00	218,509	12,455,013	0.00	0.00	57.00	0	0	12,455,013
11.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR COCINA EN ACERO INOXIDABLE. CUBIERTA DE 1.5m X 0.52m, INCLUYE POCETA, ESTUFA INCORPORADA DE 4 HORNILLAS, GRIFERÍA Y MUEBLE INFERIOR EN MADERA AGLOMERDA. SEGÚN DETALLE	un	57.00	1,215,583	69,288,231	0.00	0.00	57.00	0	0	69,288,231

ÍTEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
12	EJECUTAR INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS										
12.01	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 3/4", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 3/4"	un	114.00	51,352	5,854,128	0.00	0.00	114.00	0	0	5,854,128
12.02	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO HIDRAULICO DE 1/2", INCLUYE ADAPTADORES, CODOS, TEES, UNIONES CON UN MAXIMO DE 3 M DE TUBERÍA DE 1/2"	un	456.00	44,753	20,407,368	28.00	196.00	456.00	1,253,084	8,771,588	20,407,368
12.03	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 13.5.	ml	1368.00	10,231	13,996,008	49.00	196.00	1368.00	501,319	2,005,276	13,996,008
12.04	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR REGISTRO DE CORTE 1/2".	un	114.00	30,802	3,511,428	0.00	21.00	114.00	0	646,842	3,511,428
12.05	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR MEDIDORES AGUA 1/2" (Incluye caja de 60*60*14) SEGÚN ESPECIFICACIONES EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	un	57.00	449,546	25,624,122	0.00	0.00	57.00	0	0	25,624,122
12.06	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 2", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	342.00	56,658	19,377,036	0.00	196.00	342.00	0	11,104,968	19,377,036
12.07	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO SANITARIO 4", INCLUYE HASTA 2M DE TUBERÍA, CODOS, TEES Y UNIONES	un	57.00	94,334	5,377,038	0.00	28.00	57.00	0	2,641,352	5,377,038
12.08	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 2"	ml	456.00	20,230	9,224,880	0.00	0.00	456.00	0	0	9,224,880
12.09	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERÍA SANITARIA 4"	ml	570.00	36,256	20,665,920	0.00	201.60	570.00	0	7,309,210	20,665,920
12.11	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-ALL 2" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	171.00	24,439	4,179,069	0.00	0.00	171.00	0	0	4,179,069
12.12	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR PUNTO DESAGUE PVC 3" Aguas lluvias (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	un	342.00	80,380	27,489,960	0.00	28.00	342.00	0	2,250,640	27,489,960
12.13	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ml	342.00	30,432	10,407,744	0.00	0.00	342.00	0	0	10,407,744
12.14	SUMINISTRAR E INSTALAR LLAVE TERMINAL PLASTICA 1/2" (Válvula de Bola H2OFF)	un	114.00	45,516	5,188,824	0.00	0.00	114.00	0	0	5,188,824
12.15	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X40cm	un	57.00	140,287	7,996,359	0.00	28.00	57.00	0	3,928,036	7,996,359
12.16	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR CAJA AGUAS SERVIDAS 60X60cm	un	57.00	212,725	12,125,325	0.00	28.00	57.00	0	5,956,300	12,125,325
12.17	SUMINISTRAR, TRANSPORTAR E INSTALAR TUBERIA PVC-S 6" PARA VENTILACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS, REJILLA Y GORRO DE VENTILACIÓN)	ml	201.78	157,661	31,812,837	0.00	0.00	201.78	0	0	31,812,837
12.18	REALIZAR RECUBRIMIENTO TUBERÍA 4" BAJANTE AGUAS RESIDUALES	ml	125.40	14,616	1,832,846	0.00	0.00	125.40	0	0	1,832,846
13	EJECUTAR INSTALACIONES ELECTRICAS										
13.01	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA 15 AMP; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.	un	684.00	90,906	62,179,704	16.50	225.50	684.00	1,499,949	20,499,303	62,179,704
13.02	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO DE TIERRA AISLADO GFCI; 125 VOLTS, CON IMPLEMENTO PARA USO GENERAL. INCLUYE TUBERÍA Y CABLE x 3.3M, CAJA Y APARATO.	un	171.00	100,722	17,223,462	4.50	61.50	171.00	453,249	6,194,403	17,223,462
13.03	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	un	342.00	66,655	22,796,010	9.00	123.00	342.00	599,895	8,198,565	22,796,010
13.04	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE DATOS Y TV. INCLUYE TUBERÍA x 3M, CAJA METÁLICA GALVANIZADA 4x4, CABLE COAXIAL, CABLE UTP CAT 6, JACK, CONECTOR RJ45 Y SALIDA COAXIAL	un	114.00	71,093	8,104,602	9.00	47.00	114.00	639,837	3,341,371	8,104,602

ÍTEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CANTIDAD SEMANAL	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD PROYECTADA	VR. TOTAL SEMANA	VR. TOTAL ACUMULADO	VR. TOTAL PROYECTADO
		UND	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL						
13.05	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACIÓN. INCLUYE TUBERÍA Y CABLEADO x 3.8 METROS, CAJA METÁLICA GALVANIZADA, PORTALÁMPARA E27 Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. NO INCLUYE LUMINARIA	un	342.00	83,522	28,564,524	9.00	123.00	342.00	751,698	10,273,206	28,564,524
13.06	SUMINISTRAR E INSTALAR TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS (INCLUYE UN BREAKER 15A y CUATRO 20A)	un	57.00	296,798	16,917,486	0.00	19.00	57.00	0	5,639,162	16,917,486
13.07	SUMINISTRAR E INSTALAR ALIMENTADOR 2x8 + 1x8 THWN/THHN, DESDE MEDIDOR HASTA TABLERO	ml	399.00	21,592	8,615,208	0.00	0.00	399.00	0	0	8,615,208
13.08	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA 1x8 + 1x8 AWG, DE CAJA PORTABORNERA A MEDIDOR	ml	969.00	32,466	31,459,554	0.00	0.00	969.00	0	0	31,459,554
13.09	SUMINISTRAR E INSTALAR MEDIDOR 2F-N	un	57.00	408,977	23,311,689	0.00	0.00	57.00	0	0	23,311,689
13.1	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA PARA DUCHA ELECTRICA, INCLUYE BREAKER MONOPOLAR DE INSCRUSTAR DE 30A Y CABLEADO ELECTRICO No 10 AWG (NO INCLUYE DUCHA)	un	57.00	116,195	6,623,115	0.00	0.00	57.00	0	0	6,623,115
13,1.	SUMINISTRAR E INSTALAR VARILLAS COOPERWELD DE 2,40 COBRE x 5/8	un	57.00	230,497	13,138,329	0.00	0.00	57.00	0	0	13,138,329
NP.5	SUMINISTRAR E INSTALAR CAJA HERMETICA ANTIFRAUDE PARA MEDIDOR MONOFÁSICO EN POLICARBONATO Y VISOR DE VIDRIO	un		124,200	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
NP.6	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES DE 1"	un		276,600	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
NP.7	SUMINISTRAR E INSTALAR TUBO PARA REALCE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE CAPACETE Y CONECTORES 3/4"	un		148,250	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
NP.8	SUMINISTRAR E INSTALAR MALLA PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INCUYE CONDUCTOR DE COBRE N° 4 Y CONECTOR CERTIFICADO TIPO TGC	ml		62,200	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0

COSTO DIRECTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR		**2,516,530,617**			**45,091,148**	**1,076,427,295**	**2,612,425,961**
ADMINISTRACION	27.76%	698,588,899	ADMINISTRACION	27.76%	12,517,303	298,816,217	697,449,447
IMPREVISTOS	2.00%	50,330,612	IMPREVISTOS	2.00%	901,823	21,528,546	50,248,519
UTILIDAD	5.00%	125,826,531	UTILIDAD	5.00%	2,254,557	53,821,365	125,621,298
AIU	34.76%	874,746,042	AIU	34.76%	15,673,683	374,166,128	873,319,264
IVA SOBRE UTILIDAD	19.00%	23,907,041	IVA SOBRE UTILIDAD	0.00%	0	0	0
VALOR TOTAL PROYECTO		**3,416,183,700**			**60,764,831**	**1,460,693,423**	**3,386,746,226**
REALIZAR PGIO - PAPSO		29,966,526			533,181	12,728,231	29,917,648
VALOR TOTAL		**3,446,150,226**			61,298,012	1,463,321,654	3,415,662,873

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME FOTOGRAFICO SIG	Codigo: HS-FO-08
		Versión: 02
		Fecha Modificación: 11/05/2025

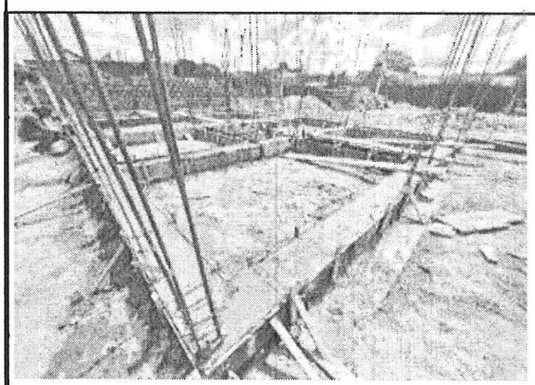


FOTO 1: Instalalcion de acero M-D-18		
BARRIO O SECTOR: El trebol Guarinocito		
MUNICIPIO: La Dorada		
CONT. No: 04102024-1376	FECHA:	May. 11/2025

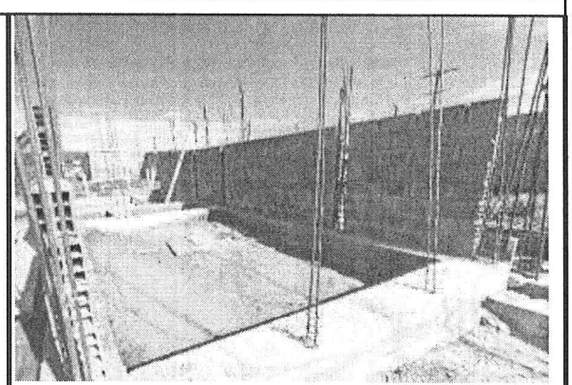


FOTO 2: Mamposteria M-D-20		
BARRIO O SECTOR: El trebol Guarinocito		
MUNICIPIO: La Dorada		
CONT. No: 04102024-1376	FECHA:	May. 11/2025



FOTO 3: Instalacion de teja fibrocemento M-F-3		
BARRIO O SECTOR: Primavera		
MUNICIPIO: La Dorada		
CONT. No: 04102024-1376	FECHA:	May. 11/2025

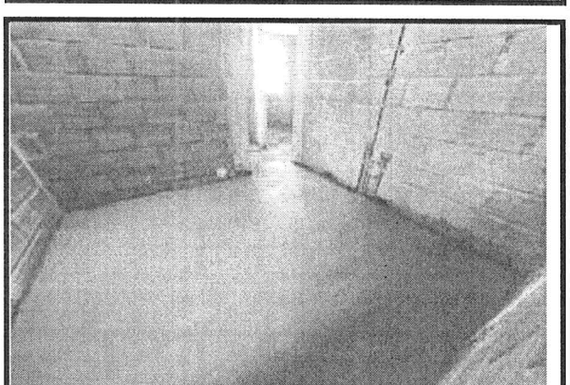


FOTO 4: Losa de contrapiso M-F-5		
BARRIO O SECTOR: Primavera		
MUNICIPIO: La Dorada		
CONT. No: 04102024-1376	FECHA:	May. 11/2025

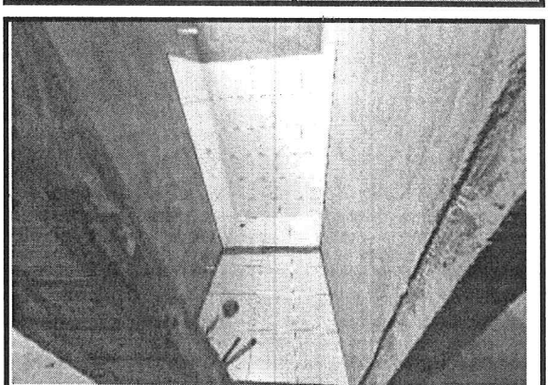


FOTO 5: Enchape pared ducha de baño M-F-12		
BARRIO O SECTOR: Guarincito		
MUNICIPIO: La Dorada		
CONT. No: 04102024-1376	FECHA:	May. 11/2025

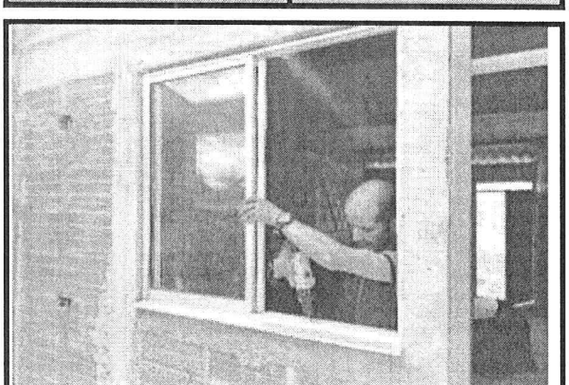
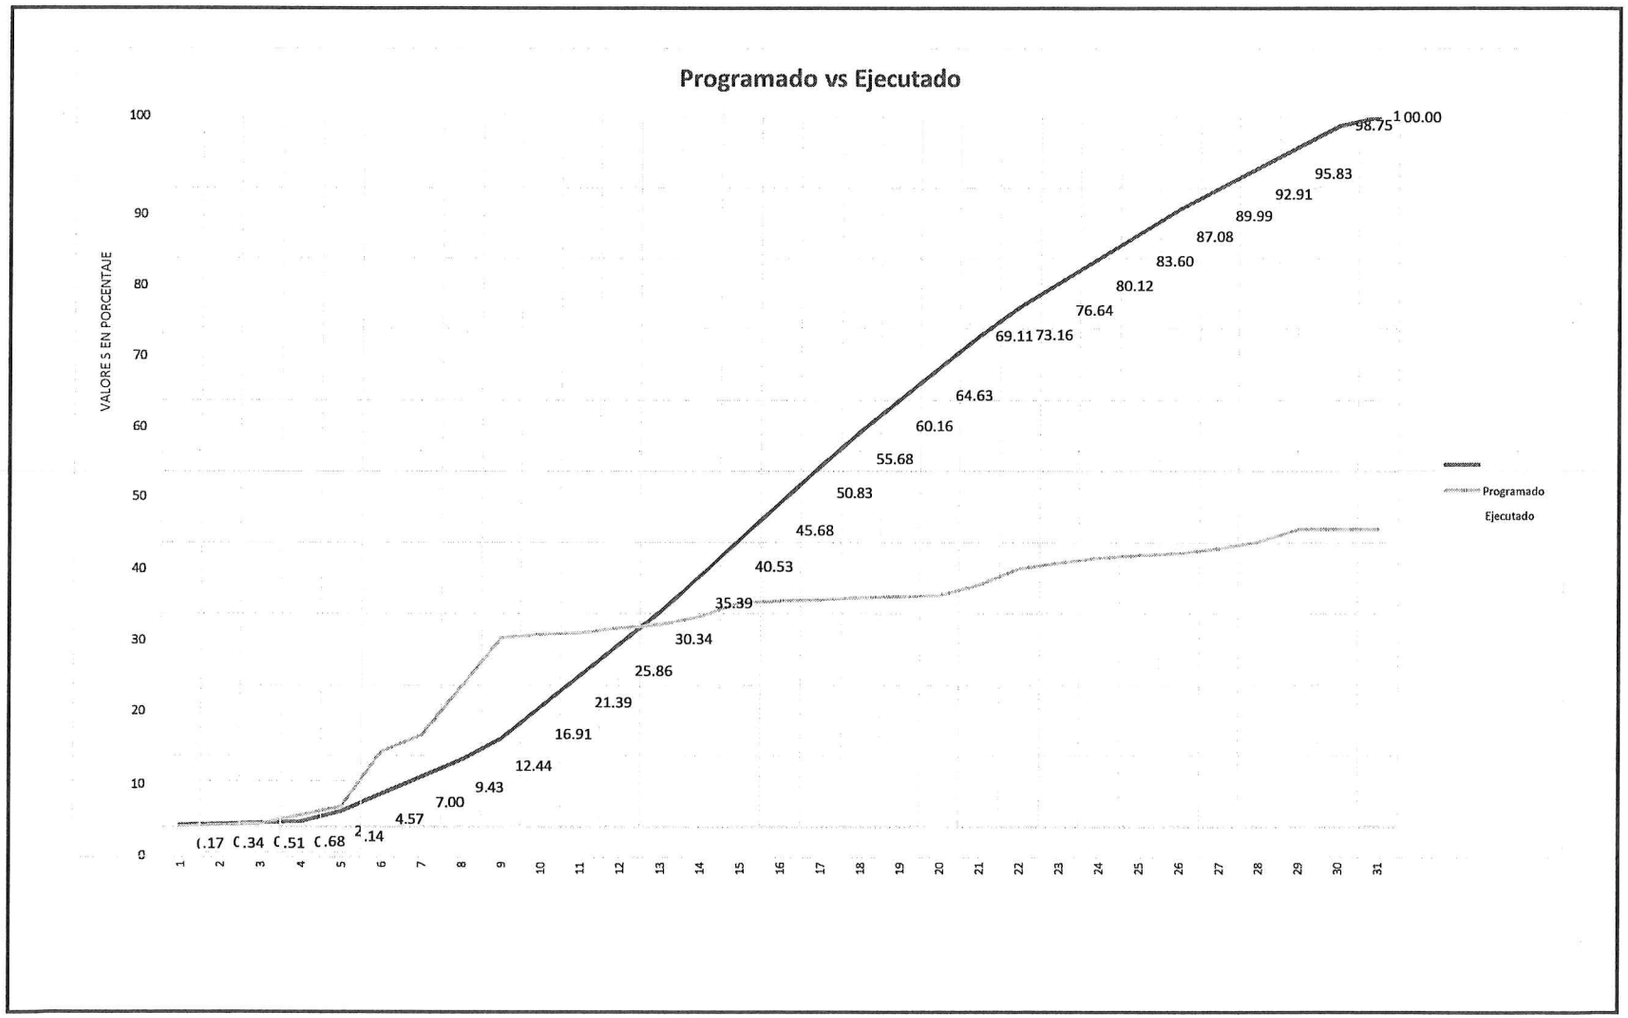


FOTO 6: Instalacion de ventana corrediza M-F-10		
BARRIO O SECTOR: Guarinocito		
MUNICIPIO: La Dorada		
CONT. No: 04102024-1376	FECHA:	May. 11/2025


Programado vs Ejecutado
VALORES EN PORCENTAJE
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
.17
.34
.51
.68
2.14
4.57
7.00
9.43
12.44
16.91
21.39
25.86
30.34
35.39
40.53
45.68
50.83
55.68
60.16
64.63
69.11
73.16
76.64
80.12
83.60
87.08
89.99
92.91
95.83
98.75
100.00
Programado
Ejecutado

	Programado				Ejecutado			
Semana	Valor semana	Acumulado semana	%semanal	%acumulado	Valor semana	Acumulado semana	%semanal	%acumulado
1	$ 5,868,077	$ 5,868,077	0.17	0.17	$ 947,754	$ 947,754	0.03	0.03
2	$ 5,868,077	$ 11,736,155	0.17	0.34	$ 6,253,808	$ 7,201,562	0.18	0.21
3	$ 5,868,077	$ 17,604,232	0.17	0.51	$ 6,592,941	$ 13,794,502	0.19	0.40
4	$ 5,868,077	$ 23,472,310	0.17	0.68	$ 41,789,141	$ 55,583,644	1.21	1.61
5	$ 50,315,303	$ 73,787,613	1.46	2.14	$ 42,489,988	$ 98,073,632	1.23	2.85
6	$ 83,650,723	$ 157,438,336	2.43	4.57	$ 265,932,883	$ 364,006,515	7.72	10.57
7	$ 83,650,723	$ 241,089,058	2.43	7.00	$ 82,050,084	$ 446,056,599	2.38	12.95
8	$ 83,650,723	$ 324,739,781	2.43	9.43	$ 238,662,486	$ 684,719,085	6.93	19.87
9	$ 103,794,561	$ 428,534,341	3.01	12.44	$ 234,366,422	$ 919,085,506	6.80	26.68
10	$ 154,154,156	$ 582,688,497	4.47	16.91	$ 16,713,444	$ 935,798,950	0.49	27.16
11	$ 154,154,156	$ 736,842,653	4.47	21.39	$ 8,154,008	$ 943,952,958	0.24	27.40
12	$ 154,154,156	$ 890,996,808	4.47	25.86	$ 23,324,841	$ 967,277,799	0.68	28.08
13	$ 154,154,156	$ 1,045,150,964	4.47	30.34	$ 16,588,247	$ 983,866,046	0.48	28.56
14	$ 173,992,144	$ 1,219,143,108	5.05	35.39	$ 38,391,159	$ 1,022,257,206	1.11	29.67
15	$ 177,298,476	$ 1,396,441,584	5.15	40.53	$ 67,133,206	$ 1,089,390,411	1.95	31.62
16	$ 177,298,476	$ 1,573,740,060	5.15	45.68	$ 9,484,771	$ 1,098,875,182	0.28	31.90
17	$ 177,298,476	$ 1,751,038,535	5.15	50.83	$ 5,889,419	$ 1,104,764,602	0.17	32.07
18	$ 167,379,481	$ 1,918,418,017	4.86	55.68	$ 10,746,954	$ 1,115,511,555	0.31	32.38
19	$ 154,154,156	$ 2,072,572,172	4.47	60.16	$ 5,005,797	$ 1,120,517,352	0.15	32.52
20	$ 154,154,156	$ 2,226,726,328	4.47	64.63	$ 4,554,689	$ 1,125,072,041	0.13	32.66
21	$ 154,154,156	$ 2,380,880,484	4.47	69.11	$ 52,381,107	$ 1,177,453,149	1.52	34.18
22	$ 139,469,913	$ 2,520,350,397	4.05	73.16	$ 76,513,135	$ 1,253,966,283	2.22	36.40
23	$ 119,890,922	$ 2,640,241,319	3.48	76.64	$ 28,651,345	$ 1,301,262,375	0.83	37.23
24	$ 119,890,922	$ 2,760,132,241	3.48	80.12	$ 24,303,596	$ 1,325,565,971	0.71	37.94
25	$ 119,890,922	$ 2,880,023,164	3.48	83.60	$ 11,587,504	$ 1,337,153,475	0.34	38.27
26	$ 119,890,922	$ 2,999,914,086	3.48	87.08	$ 10,414,243	$ 1,347,567,718	0.30	38.57
27	$ 100,537,193	$ 3,100,451,279	2.92	89.99	$ 23,850,781	$ 1,371,418,499	0.69	39.27
28	$ 100,537,193	$ 3,200,988,472	2.92	92.91	$ 30,605,138	$ 1,402,023,637	0.89	40.15
29	**$ 100,537,193**	**$ 3,301,525,665**	**2.92**	**95.83**	**$ 61,298,012**	**$ 1,463,321,649**	**1.78**	**41.93**
30	$ 100,537,193	$ 3,402,062,858	2.92	98.75		$ 1,463,321,649		41.93
31	$ 43,087,368	$ 3,445,150,226	1.25	100.00		$ 1,463,321,649		41.93
	$ 3,445,150,226				$ 1,444,676,903			
