Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GEPOL Nro. GS-2025- -DILOF

-013845

Teniente
Winny Bustamante Córrdoba
Jefe Grupo Central de Cuentas

TURNO No. 289 RESERVA

No. SISCO:	488717	**No. REGISTRO QUIPU :**	No aplica
No. CONTRATO:	06-6-10357-23	**FECHA DE RECIBIDO :**	2-May-25
VALOR PAGO:	$ 208,622,895.31	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	132025
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	CONSORCIO SAN CAYETANO
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	SC 12	**NIT DEL CONTRATISTA:**	901.783.679-8

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI _____ NO ___X___

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI _____ NO ___X___

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI _____ NO ___X___

CESIÓN A: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP)	458624	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)		X
6. FACTURA ORIGINAL;		X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	2/4/2025	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4300198702	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIÉN :	No aplica	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP		X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP		X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.		N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP		N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.		N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,		N/A

SIIF = 325025

Secop = OYM

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO ___

FIRMA _____

CP504 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS

ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI_____ NO_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

03/05/25

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlcaldero	LUIS CARLOS CALDERON BUITRAGO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	5/05/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	325025	Fecha Registro:	2025-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		Nro. Compromiso:	458624
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	208.622.895,31
Valor Inicial:	208.622.895,31	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	208.622.895,31	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	191.829.492,31	Nro. Cdp:	0,00	Nro. Cdp:	74324
Valor Deducciones:	16.793.403,00	Valor Neto:	191.829.492,31	Atributo Contable:	0,00	05-NINGUNO		Comprobante Contable:	191023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00						

TERCERO

Identificacion:	901783679	Razon Social:	CONSORCIO SAN CAYETANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05400002225	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	132025	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SC 12 DEL 09/04/2025	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICÍA	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	208.622.895,31	0,00	208.622.895,31	208.622.895,31

Objeto:	06-6-10357-23; TURNO 289 RESERVA SC 12 DEL 09-04-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	Generada	208.622.895,31

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	207.143.300,00	2,000 %	4.142.866,00	4.142.866,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.479.595,00	15,000 %	221.939,00	221.939,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	207.143.300,00	5,000 %	10.357.165,00	10.357.165,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	207.143.300,00	1,000 %	2.071.433,00	2.071.433,00

Brigadier General **HERBERT LUGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

ELABORÓ: PP. LUIS CARLOS CALDERÓN BUITRAGO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: TE. WINNY BUSTAMANTE CORDOBA
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

21/05/2025
OP-75525525

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CPS.02 GERMAN TORRES TORRES
REVISIÓN TRIBUTARIA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA**	Ejercicio	:2025
N° documento	:1500057443	NIT	: 800141397-5	Período	:05
Fe. documento	:21.05.2025	Fe.contab.	: 21.05.2025	Moneda doc.	:COP
Referencia	:INVERSION				
Texto cab. Doc.	:OB-325025 OP-153522525				

ACREEDOR NIT :9017836798 NOMBRE : CONSORCIO SAN CAYETANO

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		7000007301		191.829.492,31
002	25	2401020010	CONSORCIO SAN CAYETA	9017836798		191.829.492,31	
					TOTALES:	191.829.492,31	191.829.492,31

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: CT-06-6-10357-23 DT 289 CONSORCIO SAN CAYETANO

Elaboró: TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Ciudad y fecha:	Bogotá D.C, 02 MAY 2025
Unidad Contratante:	Dirección Logística y Financiera
Contrato No.	PN DIRAF No. 06-6-10357-23
Fecha suscripción contrato:	26 de diciembre de 2023
Objeto del contrato:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.
Lugar de ejecución de la obra:	

REGIÓN	DPTO.	OBJETO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRICULA INMOBILIARIA	ÁREA LOTE M2
1	DEBOY	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	Calle 11 # 9-82 – VILLA DE LEYVA	070-158695	698,00 m2

Constancia de recibo No.	**11**
Contratista:	CONSORCIO SAN CAYETANO
NIT del contratista:	901.783.679-8
Fecha del acta de inicio:	2 de enero de 2024
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución será de trescientos sesenta (360) días calendario por los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2023 y 2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de interventoría. En el evento de no haberse contratado la interventoría para la fecha de inicio del contrato de obra, la Policía Nacional optará por suspender el contrato. De acuerdo a la **prórroga No. 1 del 26/12/2024**, aprobada por ambas partes para el plazo de ejecución, quedando actualizado hasta el día 11/04/2025.
Nombre del Interventor del contrato:	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	ANDRÉS HUMBERTO MARTÍNEZ VESGA Representante Legal CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ
Valor del contrato:	**Vigencia 2023:** MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($1.500.000.000,00) INCLUIDO AIU E IVA. **Vigencia 2024:** MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS MONEDA LEGAL ($1.147.591.744,14) INCLUIDO AIU E IVA.
Adición No. 1	**Vigencia 2024:** QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($508´978.512,86) INCLUIDO AIU E IVA.
Fecha de Suspensión del contrato:	N/A
Fecha de Reiniciación:	N/A

T= 289 Recibo 2.P 408624 8800 488717 81F/31205 02052025 14:32hrs

43/198102

Valor total del contrato:	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL ($3.156´570.257,00) INCLUIDO AIU E IVA
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI__X__ Entrega Total: Si____
Periodo de entrega certificado:	Indicar el periodo de entrega que se está certificando: Periodo certificado: **Del 25/02/2025 Al 24/03/2025** — Acta de corte *: **# 11** *El acta de corte está adjuntado al presente documento
Forma de Pago:	La Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional cancelará el valor del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma: **PAGOS PARCIALES:** Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar. Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a su ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección de Infraestructura, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (y fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: • Acta de recibo parcial. (suscrita entre los contratistas de obra e interventoría) • Factura de venta • Balance de cantidades ejecutadas. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. • Certificación pagos FIC • Memoria de cantidades ejecutadas. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

	Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). **Nota 1:** Para el caso puntual de elementos y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta. **Nota 2:** Para ejecutarse el pago, el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020, en materia de Facturación Electrónica. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: CONSORCIO SAN CAYETANO NIT: 901.783.679-8 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A. TIPO CUENTA: AHORROS NÚMERO DE CUENTA: 05400002225
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial vigencia 2024.	REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No. 1 **RPC 458624**

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar
DILOF	11	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	$ 208.622.895,31	$ 208.622.895,31	$0	$ 208.622.895,31

Observaciones:	N/A

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $2.712.643.250,85 Avance parcial recibido: $ 208.622.895,31 Total Acumulado $2.921.266.146,16
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Corte **11** – Acta avance parcial desde el **25/02/2025 hasta el 24/03/2025.**
Memorias de cálculo.	SI
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO___ SI_X__ siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: **26/12/2024**
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO___ SI__X__ (Autorizados mediante modificatorio No. **3** de fecha: **26/12/2024)**
Documentos requeridos para el trámite de pago:	• Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra e interventoría) • Factura de venta • Balance de cantidades ejecutadas. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. • Certificación pagos FIC • Memoria de cantidades ejecutadas.

Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial de obra **No.11**	$208.622.895,31	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SC No. 12	09 ABR 2025	$208.622.895,31	$0,00	$208.622.895,31
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$208.622.895,31	$0,00	$208.622.895,31

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor, acredito que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Nota 1: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Se aclara, para establecer los valores en el acta, los mismos se redondean a dos (02) decimales con el fin de simplificar a centavos el valor y minimizar las novedades en términos contables.

Nota 2: De acuerdo a la unidad de medida de los diferentes ítems relacionados en el presente balance de obra, los cuales están dados en M2 y M3, se presentan posibles diferencias en decimales, situación que no afecta el valor del contrato, siendo verificado y avalado por el interventor.

De acuerdo a la parametrización de la empresa de facturación del contratista, se desagrega el valor del IVA, lo cual se esclarece en LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **SC No. 12,** en la cual se muestran los valores desagregados de forma individual.

Este pago de **$208.622.895,31**, es a cargo del registro presupuestal **No. RPC 458624** del adicional No. 1 correspondiente a la ejecución del recurso presupuestal de la vigencia 2024.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de interventor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista **CONSORCIO SAN CAYETANO** y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte de los supervisores, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas

del proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

Se cita lo establecido en la Ley 1474 de 2011, articulo 83 "La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría."

Es de anotar que la firma contratista de interventoría, ha ejercido el control necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas para el contratista de obra y aplicará para sí, las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

En Constancia, firman:

RAFAEL MOGOLLON RODRÍGUEZ
Representante Legal Consorcio Obra
CONSORCIO SAN CAYETANO

ANDRÉS HUMBERTO MARTÍÑEZ VESGA
Representante Legal Consorcio Interventoría
CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Nro. GS- 2025- GS-002945 **/ DIFRA – GUTEP – 3.1**

Bogotá D.C., 28 ABR 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26-21, CAN
Bogotá DC,

Asunto: certificación proyecto reforzamiento VILLA DE LEYVA

Respetuosamente me permito informar a mi general, que teniendo en cuenta la comunicación oficial Nro. GS-2025-004976-DILOF del 14/02/2025 y de acuerdo a las funciones asignadas, al señor Subteniente JUAN PABLO BELTRAN QUIMBAYO como supervisor del contrato de interventoría PN DIRAF No. 06-3-10362-23, y respecto al contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10357-23, se certifica que, en el informe de supervisión No. 15 correspondiente al periodo de entrega certificado del 01/03/2025 al 31/03/2025, se ajusta a las obligaciones del proceso contractual y al contenido adecuado correspondiente para el respectivo pago, así:

NO. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	NOMBRAMIENTO SUPERVISOR	ÚLTIMO INFORME SUPERVISIÓN	PERIODICIDAD DEL INFORME DE SUPERVISION
06-3-10362-23	*INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONSORCIO INTERVENTORIES PRODIARQ	GS-2025-004976-DILOF del 14/02/2025	GS-2025-002364-DIFRA del 07/04/2025	Mensual Número 15 del 07/04/2025
06-6-10357-23	*REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE*	CONSORCIO SAN CAYETANO	N/A	INT-PONAL-VDL-228-2024	Mensual GE-2025-028372-DIPON del 08/04/205

No obstante, se realiza la revisión bajo las siguientes consideraciones:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia "Principio de buena fé", se asume que los documentos contenidos están sujetos a este principio y que han contado con la revisión y concepto favorable de la interventoría del proceso y contratista.

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte del suscrito, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

Atentamente,

Mayor **DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ VERNAZA**
Jefe Área de Gestión de Proyectos (E)

Elaboró: ST Juan Pablo Beltrán Quimbayo
DIFRA – GUTEP

Fecha de elaboración: 21/04/2025
Ubicación: Y:\2025\Villa de leyva\cortes de obra\CORTE DE OBRA No 10

Carrera 59 26-21 CAN Bogotá

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

FACTURA CORTE No 11

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

12

Factura Electrónica De Venta No

SC No. 12

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089199711 que habilita desde SC 10 hasta SC 50. Vence 2026-02-20

CONSORCIO SAN CAYETANO

Nit 901783679

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4330 6.90 X 1000

CLIENTE	POLICIA NACIONAL DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIER	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800141397 5	CORTE DE OBRA No 11 CONTRATO DIRAF No. 06-6-10357-23 #$16-01-01-000;06-6-10357-23;jp.beltran00001@correo.policia.gov.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
KR 59 26 21	Bogota D.C. / 5159113		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/04/2025	09/05/2025	CONSORCIO SAN CAYETANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra	1	Und.	55.746.842,34	0%	0	155.746.842,34
2	41309502	Administración	1	Und.	42.051.647,43	0%	0	42.051.647,43
3	41309503	Imprevistos	1	Und.	1.557.468,42	0%	0	1.557.468,42
4	41309504	Utilidad	1	Und.	7.787.342,12	19%	1.479.595	7.787.342,12

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**207.143.300,31**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**1.479.595,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**208.622.895,31**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**208.622.895,31**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/04/2025 09:45:38

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764089199711

(415)7707212489984(8020) 001876408919971 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8				

11. Razón social: CONSORCIO SAN CAYETANO

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección: DG 117 45 47 PRIMER PISO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-20 / 12:22:53 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: MOGOLLON RODRIGUEZ RAFAEL

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación: 19388445 — 1004. DV: 9

1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal

1006. Organización: CONSORCIO SAN CAYETANO

997. Fecha formalización: 2025-02-20 12:22:53

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764089199711

(415)7707212489984(8020) 001876408919971 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 8 3 6 7 9	8				

11. Razón social

CONSORCIO SAN CAYETANO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO SAN CAYETANO DG 117 45 47 PRIMER PISO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SC	10	50	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

ACTA DE CORTE No 11

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23	OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.847.591.744,14	PLAZO INICIAL		360 Dias Calendario
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86	FECHA INICIACIÓN		martes, 2 de enero de 2024
C.C. ó NIT	901763879-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00	FECHA TERMINACIÓN		jueves, 26 de diciembre de 2024
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL		105 Dias calendario
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO		NA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL		465 Dias Calendario
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 -- 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.695,31	FECHA TERMINACIÓN FINAL		viernes, 11 de abril de 2025
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE				
TELÉFONO	(571) 2456144					

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1											
1,0	PRELIMINARES										
1.01	Localización, trazado y replanteo de la planimetría y la altimetría entregada (ejes, abscisado y detalles, cotas negras, cotas de subrasante, cotas de rellenos, cotas rasantes, ubicación de redes, esta actividad se desarrollará con equipo topográfico.	M2	644,04	$ 12.536,00	$ 8.073.686,44	0,00	$ -	644,04	$ 8.073.686,44	644,04	$ 8.073.686,44
1.02	Cerramiento en polisombra (suministro e instalacion, incluye polisombra, fiston en madera, puntilla y concreto)	ML	58,85	$ 10.174,00	$ 598.739,90	0,00	$ -	54,26	$ 552.041,24	54,26	$ 552.041,24
1.03	Valla informativa acatando las especificaciones gráficas por parte de la entidad (suministro e instalación, incluye marco de soporte metálico con perfil cuadrado de 2.5 cm, espesor. 1.5 mm y lamina metálica calibre 18. incluye retiro y disposicion al momento de la terminacion de la obra). incluye la gestión ante la Secretaria de Planeacion del municipio del cambio de Constructor Responsable de Obra por el Constructor Responsable del contratista que debe cumplir con los requisitos indicados en el articulo 34 de la Ley 400 de 1997 (para dar cumplimiento al Parágrafo 4 del articulo 7 del Decreto 2218 de 2015).	UN	1,00	$ 1.456.650,00	$ 1.456.650,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.456.650,00	1,00	$ 1.456.650,00
1.04	Campamento de obra - adecuacion de espacio aprobado por la entidad para trabajo administrativo y almacenamiento de materiales, para un area de 40m2 ubicados en las instalaciones, incluye punto de agua y luz.	GBL	1,00	$ 3.156.463,00	$ 3.156.463,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.156.463,00	1,00	$ 3.156.463,00
2,0	DESMONTES Y DEMOLICIONES										
2.01	Retiro de mobiliario existente en la edificación a intervenir	GBL	1,00	$ 1.457.533,00	$ 1.457.533,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.457.533,00	1,00	$ 1.457.533,00
2.02	Desmonte de marco+ puertas en vidrio, madera, metalicas o cualquier otro material (incluye cargue retiro y disposicion de escombros si la entidad contratante asi lo considere)	UN	37,00	$ 10.627,00	$ 393.199,00	0,00	$ -	37,00	$ 393.199,00	37,00	$ 393.199,00
2.03	Desmonte aparato sanitario (incluye cargue y retiro)	UN	29,00	$ 30.111,00	$ 873.219,00	0,00	$ -	29,00	$ 873.219,00	29,00	$ 873.219,00
2.04	Desmonte de cielo raso existente tipo machimbre conservando su funcionalidad	M2	0,00	$ 16.387,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.05	Demolicion de cielo raso tipo drywall (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	185,00	$ 9.922,00	$ 1.835.570,00	0,00	$ -	185,00	$ 1.835.570,00	185,00	$ 1.835.570,00
2.06	Demolicion de cielo raso en yeso (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	63,50	$ 12.077,00	$ 766.889,50	0,00	$ -	63,50	$ 766.889,50	63,50	$ 766.889,50
2.07	Desmonte cubierta existente en teja de barro, incluye desmonte de estructura en madera (incluye cargue y retiro)	M2	412,93	$ 15.704,00	$ 6.484.852,72	0,00	$ -	406,65	$ 6.386.031,60	406,65	$ 6.386.031,60

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025		FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14		PLAZO INICIAL	360 Dias Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86		FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	105 Dias calendario	
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	465 Dias Calendario	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31		FECHA TERMINACIÓN FINAL	viernes, 11 de abril de 2025	
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
2.08	Demolicion de muros en mamposteria e max=0.30m (incluye demolicion de acabado sobre muros, incluye cargue y retiro de escombros)	M2	51,00	$ 27.337,00	$ 1.394.187,00	0,00	$ -	49,12	$ 1.342.793,44	49,12	$ 1.342.793,44
2.09	Demolición de escalera en concreto reforzado (incluye cargue y retiro)	M2	0,00	$ 23.189,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.10	Desmonte piso existente conservando su funcionalidad (incluye cargue y retiro)	M2	551,00	$ 10.487,00	$ 5.778.337,00	0,00	$ -	550,07	$ 5.768.584,09	550,07	$ 5.768.584,09
2.11	Demolicion placa e=10-20 cm (incluye cargue y retiro de escombros)	M2	429,00	$ 43.091,00	$ 18.486.039,00	0,00	$ -	428,05	$ 18.445.102,55	428,05	$ 18.445.102,55
2.12	Demolición de concreto ciclópeo de cimentación	M3	102,89	$ 117.942,00	$ 12.135.052,38	0,00	$ -	102,89	$ 12.135.052,38	102,89	$ 12.135.052,38
2.13	Demolicion de antepecho en mamposteria en jardin interior	ML	0,00	$ 21.856,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.14	Demolición de piso exterior sobre tanque de almacenamiento en jardin interior	M2	0,00	$ 8.950,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.15	Mantenimiento teja de barro de la cubierta. Incluye desmonte, cambio de piezas, lavado, reemplazo de tejas rotas y reinstalación de tejas rescatadas	M2	412,95	$ 64.086,00	$ 26.466.139,60	0,00	$ -	314,41	$ 20.149.908,08	314,41	$ 20.149.908,08
2.16	Mantenimiento estructura de cubierta. Incluye desmonte, cambio de piezas, reemplazo de durmientes, pintura y sellado.	M2	412,95	$ 117.673,00	$ 48.593.065,36	0,00	$ -	412,88	$ 48.584.828,24	412,88	$ 48.584.828,24
2.17	Desmonte de ventaneria y rejas en aluminio, madera, metalicas o cualquier otro material (incluye cargue, retiro y disposicion de escombros si la entidad contratante asi lo considera)	UN	10,00	$ 11.505,00	$ 115.050,00	0,00	$ -	10,00	$ 115.050,00	10,00	$ 115.050,00
2.18	Remocion de revoque o pañete y limpieza con chorro de agua a presion, de acuerdo a especificaciones de planimetria estructural	M2	290,00	$ 13.177,00	$ 3.821.330,00	0,00	$ -	289,42	$ 3.813.740,050	289,42	$ 3.813.740,05
2.19	Impermeabilizacion de cubierta con manto asfaltico	M2	412,95	$ 128.370,00	$ 53.010.391,50	0,00	$ -	412,88	$ 53.001.405,60	412,88	$ 53.001.405,60
3,0	EXCAVACIONES										
3.01	Excavacion manual en material comun (incluye cargue y retiro)	M3	253,00	$ 43.907,00	$ 11.108.471,00	0,00	$ -	252,50	$ 11.086.517,50	252,50	$ 11.086.517,50
3.02	Relleno con material del sitio para nivelacion del terreno incluye extendido, humedecimiento, compactacion en caso de ser necesaria, cargue, descargue, traspaleo	M3	87,00	$ 28.119,00	$ 2.448.353,00	0,00	$ -	86,01	$ 2.418.515,19	86,01	$ 2.418.515,19
4,0	ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO										
4.01	Solado concreto de limpieza e=0.05m 2000 psi 14mpa (suministro e instalacion)	M2	123,00	$ 27.507,00	$ 3.383.361,00	0,00	$ -	122,43	$ 3.367.682,01	122,43	$ 3.367.682,01
4.02	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalacion)	KG	22.300,00	$ 8.956,00	$ 199.696.500,00	446,40	$ 3.997.512,00	21.852,51	$ 195.669.227,05	22.298,91	$ 199.666.739,05
4.03	Elementos de concreto de 3000 psi, 21 mpa para estructura aporticada (suministro e instalación)	M3	200,88	$ 1.119.773,00	$ 224.713.318,07	0,00	$ -	156,97	$ 175.770.767,81	156,97	$ 175.770.767,81

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-8-10357-23	OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14	PLAZO INICIAL	360 Dias Calendario
DIRECCIÓN	CG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86	FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00	FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	105 Días calendario
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	465 Días Calendario
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31	FECHA TERMINACIÓN FINAL	viernes, 11 de abril de 2025
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
4.04	Suministro e instalacion de sistema de apuntalamiento para elementos horizontales tipo muro o estructurales mediante parales metalicos y foreclamp, segun detallado estructural hasta altura de 8.4m	M2	380,00	$ 180.327,00	$ 68.524.260,00	0,00	$ -	380,00	$ 68.524.260,00	380,00	$ 68.524.260,00
4.05	suministro e instalacion de conectores a cortante mediante pernos 1/2" según planimetria estructural	UN	0,00	$ 8.047,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.06	suministro e instalacion de adhesivo epoxico para puente entre concreto viejo y nuevo, (Sikadur 32 o Similar)	M2	45,00	$ 178.582,00	$ 8.036.190,00	0,00	$ -	44,79	$ 7.998.687,78	44,79	$ 7.998.687,78
4.07	apeos y apuntalamiento para entrepiso y elementos en concreto, según detallado estructural para elementos horizontales, entrepisos y vigas de la estructura	M2	756,00	$ 63.018,00	$ 47.641.608,00	0,00	$ -	756,00	$ 47.641.608,00	756,00	$ 47.641.608,00
5,0	REFORZAMIENTO DE TANQUE										
5.01	Escarificacion mecanica para estructura en concreto, e=0.05m - 0.20m (incluye transporte de escombros)	M2	33,10	$ 36.167,00	$ 1.197.789,70	0,00	$ -	32,99	$ 1.193.809,13	32,99	$ 1.193.809,13
5.02	Sikadur - 32 primer o equivalente para reforzamiento en estructuras de concreto (suministro e instalacion)	M2	0,00	$ 66.020,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.03	Anclaje epoxico para barra corrugada 3/8"- #3 (suministro e instalacion, incluye sika anchorfix-3001 o similar)	UND	0,00	$ 18.056,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.04	Malla electrosoldada d=6.0mm, 15c/c (suministro e instalación)	KG	98,97	$ 8.465,00	$ 839.760,45	0,00	$ -	98,63	$ 836.875,55	98,63	$ 836.875,55
6,0	MUROS										
6.01	Mamposteria doble en bloque # 5 33x23x11.5 cm (suministro e instalación, incluye mortero de pega 1:3,dovelas entre 1,5 y 2 mts como maximo, replanteo de ubicacion y cimbrado. el valor incluye lineales, y el área de medida sera el área efectivamante construida)	M2	15,00	$ 177.968,00	$ 2.669.520,00	0,00	$ -	7,48	$ 1.331.200,64	7,48	$ 1.331.200,64
6.02	Pañete liso en mortero 1:4 e=0,02 m (suministro e instalacion)	M2	280,00	$ 16.496,00	$ 4.618.880,00	0,00	$ -	276,91	$ 4.567.907,36	276,91	$ 4.567.907,36
6.03	Estuco no impermeable liso, para muros, (suministro e instalación, incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente estucada))	M2	1.100,00	$ 15.524,00	$ 17.076.400,00	0,00	$ -	1.098,63	$ 17.055.132,12	1.098,63	$ 17.055.132,12
6.04	Pintura tipo vinilo lavable vinilтex de pintuco o similar que cumpla con la NTC 1335 para muros color blanco 3 manos + 1 mano final de entrega (suministro e instalación, cumple ntc para pintura. no incluye estuco. el valor incluye lineales, filos y dilataciones. el área de medida será el área efectivamente pintada)	M2	1.440,00	$ 43.763,00	$ 63.018.720,00	0,00	$ -	1.070,23	$ 46.836.475,49	1.070,23	$ 46.836.475,49
6.05	Antepecho en ladrillo para jardin interior sobre tanque reforzado (suministro e instalación)	ML	0,00	$ 27.993,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO		VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14		PLAZO INICIAL	360 Días Calendario
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102		VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86		FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024
C.C. ó NIT	901783679-8		VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927		ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	105 Días calendario
			ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	465 Días Calendario
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.		VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31		FECHA TERMINACIÓN FINAL	viernes, 11 de abril de 2025
C.C. ó NIT	901.764.826 - 9		SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE				
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
6.06	Anclaje epoxico para barra corrugada #2 (suministro e instalacion, incluye sika anchorfix-3001 o similar)	UN	8.730,00	$ 30.066,00	$ 262.668.240,00	0,00	$ -	8.730	$ 262.660.718,00	8.730	$ 262.660.718,00
6.07	Malla electrosoldada d=4mm, 15c/c (suministro e instalación)	KG	2.500,00	$ 8.497,00	$ 21.242.500,00	0,00	$ -	2.496,58	$ 21.213.440,26	2.496,58	$ 21.213.440,26
6.08	Recubrimiento con grout fachado de 4000 psi (suministro e instalación)	M3	19,00	$ 880.378,00	$ 16.727.182,00	0,00	$ -	19,00	$ 16.727.182,00	19,00	$ 16.727.182,00
6.09	Dintel en concreto según detalle estructural	ML	0,00	$ 25.672,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.10	resanes generales (incluye vena, pañete y filos)	M2	520,00	$ 14.495,00	$ 7.537.400,00	0,00	$ -	509,39	$ 7.383.608,05	509,39	$ 7.383.608,05
6.11	Anclaje epoxico para barra corrugada #3 (suministro e instalacion, incluye sika anchorfix-3001 o similar) - instalacion en escaleras	UN	0,00	$ 19.873,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.12	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye aislamiento superficie.	M2	527,60	$ 47.312,00	$ 24.961.811,20	0,00	$ -	480,83	$ 22.749.028,96	480,83	$ 22.749.028,96
7.0	RED HIDRÁULICA										
7.01	Tuberia pvc-c rde-9 500 psi 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	35,00	$ 13.212,00	$ 462.420,00	0,00	$ -	31,20	$ 412.214,40	31,20	$ 412.214,40
7.02	Tuberia pvc-c rde-11 400 psi 3/4" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	70,00	$ 14.146,00	$ 990.220,00	0,00	$ -	63,42	$ 897.139,32	63,42	$ 897.139,32
7.03	Tuberia pvc-c rde-13.5 200 psi 1" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	40,00	$ 15.803,00	$ 632.120,00	0,00	$ -	40,00	$ 632.120,00	40,00	$ 632.120,00
7.04	Tuberia pvc-c rde 21-200 psi 1 1/4" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	10,36	$ 19.155,00	$ 198.477,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.05	Tuberia pvc-c rde 21-200 psi 1 1/2" (suministro e instalación, incluye accesorios)	ML	10,50	$ 19.170,00	$ 201.285,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.0	PUNTOS HIDRAULICOS										
8.01	Punto hidraulico pvc rde-9 1/2" (suministro e instalacion, incluye toda la tuberia y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto)	UN	52	$ 68.022,00	$ 3.537.144,00	0,00	$ -	46,00	$ 3.129.012,00	46,00	$ 3.129.012,00
9.0	RED SANITARIA										
9.01	Tuberia sanitaria pvc 2" (suministro e instalacion, incluye toda la tuberia y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tuberia)	ML	37,49	$ 30.348,00	$ 1.137.746,52	0,00	$ -	18,64	$ 565.686,72	18,64	$ 565.686,72
9.02	Tuberia sanitaria pvc 4" (suministro e instalacion, incluye toda la tuberia y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tuberia)	ML	95,00	$ 52.731,00	$ 5.009.445,00	0,00	$ -	94,16	$ 4.965.150,96	94,16	$ 4.965.150,96

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO		VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14		PLAZO INICIAL	360 Días Calendario
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102		VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86		FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024
C.C. ó NIT	901783879-8		VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927		ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	105 Días calendario
			ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	465 Días Calendario
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.		VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31		FECHA TERMINACIÓN FINAL	viernes, 11 de abril de 2025
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9		SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE				
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
9.03	Valvula de admisión de aire 2" (suministro e instalación, incluye caja y accesorios de conexión)	UN	0,00	$ 219.389,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10	PUNTOS SANITARIOS										
10.01	Punto sanitario pvc 2" y 4" (suministro e instalacion, incluye toda la tuberia y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto)	UN	55	$ 204.193,00	$ 11.230.615,00	0,00	$ -	46,00	$ 9.392.878,00	46,00	$ 9.392.878,00
10.02	Punto sanitario pvc 4" (suministro e instalacion, incluye toda la tuberia y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación del punto)	UN	0	$ 122.852,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11	TUBERIA AGUA LLUVIA										
11.01	Tuberia sanitaria pvc 4" (suministro e instalacion, incluye toda la tuberia y accesorios requeridos (codos, uniones, tees, bujes, adaptadores, tapones) para el funcionamiento desde el inicio a la terminación de la tuberia)	ML	0,00	$ 52.655,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.02	Carcamo prefabricado con rejilla en concreto de 0.5mx0.2m (suministro e instalacion)	ML	16,80	$ 162.924,00	$ 2.737.123,20	0,00	$ -	16,75	$ 2.728.977,00	16,75	$ 2.728.977,00
11.02	Canal rectangular en lámina cold rolled de 0.2x0.6 para aguas lluvia (suministro e instalación)	ML	5,60	$ 135.619,00	$ 758.906,40	0,00	$ -	5,60	$ 758.906,40	5,60	$ 758.906,40
12	RED ELECTRICA										
12.01	Salida iluminación incrustar y sobreponer, tuberia 3/4"emt (suministro e instalacion, incluye marquillado, curvas, uniones, prensa estopa y clavija áerea y demas elementos necesarios de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	204,00	$ 446.507,00	$ 91.087.428,00	0,00	$ -	204,00	$ 91.087.428,00	204,00	$ 91.087.428,00
12.02	Salida para sensor de movimiento, incluye marquillado, tuberia 3/4"emt, curvas, uniones, prensa estopa y clavija áerea y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	37,00	$ 426.211,00	$ 15.769.807,00	0,00	$ -	37,00	$ 15.769.807,00	37,00	$ 15.769.807,00
12.03	Salida para interruptor sencillo de incrustar con polo a tierra (color blanco) ,incluye suministro e instalacion marquillado,toma, tuberia pvc, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	29,00	$ 145.165,00	$ 4.209.785,00	0,00	$ -	29,00	$ 4.209.785,00	29,00	$ 4.209.785,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025		FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14	PLAZO INICIAL		360 Dias Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86	FECHA INICIACIÓN		martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00	FECHA TERMINACIÓN		jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL		105 Dias calendario	
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO		NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL		465 Dias Calendario	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31	FECHA TERMINACIÓN FINAL		viernes, 11 de abril de 2025	
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
12.04	Salida para interruptor doble de incrustar con polo a tierra (color blanco) ,incluye suministro e instalacion marquillado,toma, tuberia pvc, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	2,00	$ 155.604,00	$ 311.208,00	0,00	$ -	2,00	$ 311.208,00	2,00	$ 311.208,00
12.05	Suministro e instalación salida bifasica manejadora y/o condensadora de aire acondionado, incluye todos los elementos y accesorios necesarios pasa su correcta instalación y puesta en servicio	UN	3,00	$ 277.357,00	$ 832.071,00	0,00	$ -	3,00	$ 832.071,00	3,00	$ 832.071,00
13	SALIDAS DE TOMAS EN TUBERIA EMT										
13.01	Salida para tomacorriente doble de incrustar monofasica tipo nema 5-15r con polo a tierra (suministro e instalacion, incluye marquillado regulada color anaranjado (mas linea a tierra aislada),incluye marquillado,toma, tuberia emt, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item de acuerdo a especificación tecnica y plano de tomas)	UN	87,00	$ 227.833,00	$ 19.821.471,00	0,00	$ -	87,00	$ 19.821.471,00	87,00	$ 19.821.471,00
13.02	Salida para tomacorriente doble de incrustar monofasica tipo nema 5-20r con polo a tierra , incluye marquillado regulada color anaranjado (mas linea a tierra aislada),incluye marquillado,toma, tuberia emt, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de tomas)	UN	29,00	$ 149.337,00	$ 4.330.773,00	0,00	$ -	29,00	$ 4.330.773,00	29,00	$ 4.330.773,00
13.03	Salida para tomacorriente doble de incrustar monofasica tipo nema 5-15r con polo a tierra tipo gfci , incluye marquillado tipo hospitalario (mas linea a tierra aislada),incluye marquillado,toma, tuberia pvc, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de tomas)	UN	4,00	$ 142.642,00	$ 570.568,00	0,00	$ -	4,00	$ 570.568,00	4,00	$ 570.568,00
13.04	Suministro e instalación salida con ducha eléctrica, incluye marquillado,toma, tuberia EMT, accesorios EMT, uniones, curvas, cableado 2#10+1#12T AWG, varilla roscada, riel channel, pernos de anclaje, elementos de conexión y demas accesorios necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de tomas)	UN	5,00	$ 450.818,00	$ 2.254.090,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.254.090,00	5,00	$ 2.254.090,00
14	TABLEROS DE ENCHUFABLES					0,00			$ -		
14.01	Tablero de automáticos de 12 circuitos trifásico (suministro, transporte e instalacion, incluye puerta, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial de acuerdo a especificación tecnica y plano de tableros, nota: el tablero ofertado debe tener la posibilidad de albergar las acometidas que le pertenecen)	UN	2,00	$ 1.408.095,00	$ 2.816.190,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.816.190,00	2,00	$ 2.816.190,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS	RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025	FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23	OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14	PLAZO INICIAL	360 Días Calendario
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86	FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00	FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL	105 Días calendario
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO	NA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL	465 Días Calendario
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31	FECHA TERMINACIÓN FINAL	viernes, 11 de abril de 2025
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE			
TELÉFONO	(571) 2456144				

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
14.02	Tablero automatico de 30 circuitos trifasico con puerta incluye, chapeta de cierre y espacio para totalizador industrial (de acuerdo a especificación tecnica y plano de tableros) nota: el tablero ofertado debe tener la posibilidad de albergar las acometidas que le pertenecen (suministro, transporte e instalacion)	UN	1,00	$ 1.762.449,00	$ 1.762.449,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.762.449,00	1,00	$ 1.762.449,00
14.03	Suministro e instalación bandeja portacables 30x5cm, incluye, cable cobre desnudo, con conectores certificados, ademas de todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación	ML	27,00	$ 111.871,00	$ 3.020.517,00	0,00	$ -	26,36	$ 2.948.919,56	26,36	$ 2.948.919,56
15	INTERRUPTORES										
15.01	Interruptor cortacircuito magnetico 1x20a 10 ka a 120/240v. tipo enchufable (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y cuadro de carga)	UN	35,00	$ 33.195,00	$ 1.161.825,00	0,00	$ -	35,00	$ 1.161.825,00	35,00	$ 1.161.825,00
15.02	Interruptor cortacircuito magnetico 3x30a 10 ka a 120/240v. tipo enchufable (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y cuadro de carga)	UN	6,00	$ 51.670,00	$ 310.020,00	0,00	$ -	6,00	$ 310.020,00	6,00	$ 310.020,00
15.03	Interruptor cortacircuito magnetico 3x100a 15 ka a 120/240v. tipo totalizador (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y cuadro de carga)	UN	1,00	$ 241.847,00	$ 241.847,00	0,00	$ -	1,00	$ 241.847,00	1,00	$ 241.847,00
16	ACOMETIDAS ELECTRICAS										
16.01	Acometida 3x10f+8t cu lszh (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas)	ML	200,00	$ 37.356,00	$ 7.471.200,00	0,00	$ -	40,00	$ 1.494.240,00	40,00	$ 1.494.240,00
16.02	Acometida 3x6f+2n+8t cu lszh (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas)	ML	52,00	$ 52.254,00	$ 2.717.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.03	Acometida 3x2f+3/0n+6t cu lszh (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas)	ML	6,00	$ 91.685,00	$ 551.190,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.04	Suministro e instalación tubería EMT 1 1/4" con accesorios	ML	37,20	$ 86.189,00	$ 3.206.230,80	0,00	$ -	37,20	$ 3.206.230,80	37,20	$ 3.206.230,80
16.05	Alimentador inicio circuitos iluminación -tomacorriente, incluye cable, tubería, accesorios y herrajes de fijación	ML	626,00	$ 34.902,00	$ 21.848.652,00	0,00	$ -	626,00	$ 21.848.652,00	626,00	$ 21.848.652,00
17	CANALIZACIONES PARA ACOMETIDA										
17.01	Canalización de 2 de 1" en pvc tipo tl para acometidas subterraneas (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas, incluye accesorios para salida de bandeja, recurrido de bandeja hasta los tableros ver también cuadros de carga)	ML	42,00	$ 107.276,00	$ 4.505.592,00	0,00	$ -	42,00	$ 4.505.592,00	42,00	$ 4.505.592,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025		FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23	OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23			

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14	PLAZO INICIAL		360 Días Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86	FECHA INICIACIÓN		martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00	FECHA TERMINACIÓN		jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL		105 Días calendario	
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO		NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL		465 Días Calendario	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31	FECHA TERMINACIÓN FINAL		viernes, 11 de abril de 2025	
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
17.02	Canalización de 2 de 1 1/4" en pvc tipo tl para acometidas subterraneas (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas, incluye accesorios para salida de bandeja, recurrido de bandeja hasta los tableros ver también cuadros de carga)	ML	30,00	$ 108.286,00	$ 3.248.580,00	0,00	$ -	30,00	$ 3.248.580,00	30,00	$ 3.248.580,00
17.03	Canalización de 2 de 2" en pvc tipo tl para acometidas subterraneas (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas, incluye accesorios para salida de bandeja, recurrido de bandeja hasta los tableros ver también cuadros de carga)	ML	25,00	$ 107.965,00	$ 2.699.125,00	0,00	$ -	25,00	$ 2.699.125,00	25,00	$ 2.699.125,00
18	SISTEMA DE CAPTACION DE RAYOS Y PUESTA A TIERRA										
18.01	Varilla de cobre puesta a tierra configuración tipo b (ntc 4552-3) sistema de protección externa (suministro e instalacion, incluye excavacion y relleno de recebo)	UN	14,00	$ 185.176,00	$ 2.592.464,00	0,00	$ -	14,00	$ 2.592.464,00	14,00	$ 2.592.464,00
18.02	Aviso de prevención para sistema de protección contra rayos, según ntc 4552 (suministro e instalacion)	UN	1,00	$ 189.815,00	$ 189.815,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.03	Suministro, instalación y transporte de caja de inspeccion de 0,3x0,3m para puesta a tierra, homologada normas operador de red, con carga de tratamiento mejoramiento puesta a tierra incluye excavaciones y demás obras civiles, retiro de escombros. sistema de puesta a tierra y apantallamiento.	UN	8,00	$ 362.363,00	$ 2.898.904,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.898.904,00	8,00	$ 2.898.904,00
18.04	Puesta a tierra configuración tipo b (ntc 4552-3) sistema de protección externa (suministro e instalacion, incluye excavacion y relleno de recebo)	ML	190,00	$ 147.903,00	$ 28.101.570,00	16,00	$ 2.366.448,00	149,84	$ 22.161.785,52	165,84	$ 24.528.233,52
18.05	Sistema de captación de rayos compuesto por puntas captadoras de 60 cm y malla captadora en alambron de aluminio de 8mm (suministro e instalacion)	ML	130,00	$ 219.299,00	$ 28.508.870,00	17,28	$ 3.789.486,72	112,72	$ 24.719.383,28	130,00	$ 28.508.870,00
19	BANDEJAS PORTACABLES, LUMINARIAS, ILUMINACIÓN EXTERIOR Y UPS										
19.01	Ups de 5 kva , autoredundante,autonomia de 5 minutos a plena de carga. debe incluir además del equipo: la instalación,puesta en marcha y garantia de tres años (de acuerdo a especificación tecnica y plano de acometidas)"	UN	1,00	$ 12.021.800,00	$ 12.021.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.021.800,00	1,00	$ 12.021.800,00
19.02	Luminaria antivandalica hermetica feilo sylvania p24359 led 50w di led (suministro e instalacion de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	14,00	$ 172.571,00	$ 2.415.994,00	0,00	$ -	14,00	$ 2.415.994,00	14,00	$ 2.415.994,00
19.03	Luminaria iluminaciones tecnicas 020703-3000 confort lens e03 600x611x81 sobreponer 2f-lt5 24w (suministro e instalacion)	UN	34,00	$ 199.372,00	$ 6.778.648,00	0,00	$ -	34,00	$ 6.778.648,00	34,00	$ 6.778.648,00
19.04	Luminaria bata led sylvania 24w 6500k sobreponer 2f-lt5 24w (suministro e instalacion)	UN	81,00	$ 82.408,00	$ 6.675.048,00	0,00	$ -	81,00	$ 6.675.048,00	81,00	$ 6.675.048,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025		FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 08-8-10357-23 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 08-8-10362-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14	PLAZO INICIAL		360 Días Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 568.978.512,86	FECHA INICIACIÓN		martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00	FECHA TERMINACIÓN		jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL		105 Días calendario	
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO		NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL		465 Días Calendario	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31	FECHA TERMINACIÓN FINAL		viernes, 11 de abril de 2025	
C.C. ó NIT	901.784.828 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
21.06	Suministro, instalación y transporte de switche de core/distribución de 24 puertos cat 6a con 4 puertos de fibra de 10 gbps para utilizar como uplinks a los switches de core puertos 10/100/1000 layer 3 (de acuerdo a especificación técnica, plano de voz y datos) (suministro e instalación)	UN	1,00	$ 15.321.728,00	$ 15.321.728,00	1,00	$ 15.321.728,00	0,00	$ -	1,00	$ 15.321.728,00
21.07	Caja de paso 60 x60 cm (suministro e instalacion, incluye tuberia y canalización (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos)	UN	2,00	$ 1.942.657,00	$ 3.885.314,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.885.314,00	2,00	$ 3.885.314,00
21.08	Patch panel x 24 cat 6a - incluye elementos de fijación (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos)	UND	4,00	$ 647.172,00	$ 2.588.688,00	4,00	$ 2.588.688,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.588.688,00
21.09	Patch cord 2m cat 6a ftp (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)	UN	28,00	$ 24.206,00	$ 677.768,00	28,00	$ 677.768,00	0,00	$ -	28,00	$ 677.768,00
21.10	Cable de fibra óptica 12 hilos multimodo mo4 (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)	ML	60,00	$ 175.783,00	$ 10.546.980,00	0,00	$ -	52,40	$ 9.211.029,20	52,40	$ 9.211.029,20
21.11	Organizador de cable vertical - incluye elementos de fijación (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)	UN	2,00	$ 342.895,00	$ 685.790,00	2,00	$ 685.790,00	0,00	$ -	2,00	$ 685.790,00
21.12	Patch cord fibra optica 2 metros (suministro e instalacion de acuerdo a especificaciones tecnicas y los planos de voz y datos)	UN	60,00	$ 65.051,00	$ 3.903.060,00	4,00	$ 260.204,00	0,00	$ -	4,00	$ 260.204,00
21.13	Conectores de fibra óptica lc de 10 gb(de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos)	UN	20,00	$ 10.715,00	$ 214.300,00	4,00	$ 42.860,00	0,00	$ -	4,00	$ 42.860,00
21.14	Sistema puesta a tierra centro de datos según norma ansi/j std-607, incluye barraje de cobre con perforaciones roscadas de tierra cable awg 3/0 con canalización de en tuberia de 3/4" (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)	UN	1,00	$ 712.402,00	$ 712.402,00	0,00	$ -		$ -		
21.15	Certificación de puntos lógicos de toda la edificación	UN	28,00	$ 37.250,00	$ 1.043.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.16	Suministro e instalación aire split 9000BTU/h (para cuarto técnico rack), incluye tuberia de succión, liquido, bomba de condensados, tuberia drenaje de condensados, tuberia EMT y cableado de control 3X18AWG entre manejadora y condensadora, soporte antivibratorios, carga de refrigerante ecologico, pruebas de alto vacio, herrajes de fijación, soporteria, coraza americana, prensa estopa, control remoto alámbrico, arranque del equipo y demas elementos y accesorios para su correcta instalación y puesta en óptimo funcionamiento	UN	2,00	$ 2.840.284,00	$ 5.680.568,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.680.568,00	2,00	$ 5.680.568,00
22	SUBESTACIÓN ELECTRICA										
22.01	Suministro, transporte e instalación tablero general de acometidas, incluye barrajes, totalizador, breakers industriales, DPS, y demas elementos necesarios según requerimiento técnico	UN	1,00	$ 6.413.149,00	$ 6.413.149,00	0,00	$ -	1,00	$ 6.413.149,00	1,00	$ 6.413.149,00
22.02	Suministro e instalación gabinete de medida con medidor normalizado OR, incluye pin de corte	UN	1,00	$ 2.825.999,00	$ 2.825.999,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.825.999,00	1,00	$ 2.825.999,00

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025		FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14		PLAZO INICIAL	360 Días Calendario	
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86		FECHA INICIACIÓN	martes, 2 de enero de 2024	
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00		FECHA TERMINACIÓN	jueves, 26 de diciembre de 2024	
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL	105 Días calendario	
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO	NA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL	465 Días Calendario	
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 602 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31		FECHA TERMINACIÓN FINAL	viernes, 11 de abril de 2025	
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
22.03	Tramite ante el OR de la zona para normalización equipo de medida (no requiere RETIE uso final -numeral 34.8 RETIE)	UN	1,00	$ 664.108,00	$ 664.108,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.04	Suministro e instalación alimentador eléctrico en 3#2F+1#2N+1#6T	ML	35,00	$ 151.339,00	$ 5.296.865,00	0,00	$ -	35,00	$ 5.296.865,00	35,00	$ 5.296.865,00
23	MONTAJE DE ELEMENTOS RETIRADOS - ACABADOS ARQUITECTONICOS										
23.01	Suministro e instalación de cielo raso en panel de yeso de 12.7mm, incluye pintura tipo vinilo	M2	0,00	$ 44.238,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.02	Cielo raso drywall fibrocemento e=6mm (suministro e instalacion, incluye pintura epoxica color blanco)	M2	195,00	$ 131.099,00	$ 25.564.305,00	0,00	$ -	194,16	$ 25.454.181,84	194,16	$ 25.454.181,84
23.03	Montaje de puertas y/o ventanas desmontadas por proceso de reforzamiento	UN	42,00	$ 24.276,00	$ 1.019.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
23.04	Montaje de cubierta existente retirada por proceso de reforzamiento, incluye estructura en madera y teja española patrimonial	M2	325,00	$ 43.700,00	$ 14.202.500,00	0,00	$ -	317,13	$ 13.858.581,00	317,13	$ 13.858.581,00
23.05	Rehabilitación de jardin interior intervenido por proceso de reforzamiento de tanque subterráneo, incluye tierra negra, pasto, plantas, mortero y todo lo requerido para conservar las condiciones iniciales del espacio	M2	12,00	$ 116.532,00	$ 1.398.384,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
24	ASEO										
24.01	Aseo general grueso (limpieza de todas las áreas horizontales). Incluye cargue, trasiego, retiro de materiales sobrantes, escombros y disposición en sitio autorizado permitido, no incluye el costo que cobra el sitio de disposición por recibir el material. (el cual se cobra por aparte, si lo hubiere). Incluya transporte de escombros a escombrera autorizada.	M2	418,64	$ 22.757,00	$ 9.526.975,01	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25	ACABADOS ARQUITECTONICOS Y OTRAS ACTIVIDADES NO CONTEMPLADAS										
	APARATOS SANITARIOS										
25.01	Suministro e instalacion tasas sanitarias de doble descarga con accesorios	UN	14,00	$ 776.600,00	$ 10.858.400,00	14,00	$ 10.858.400,00	0,00	$ -	14,00	$ 10.858.400,00
25.02	Suministro e instalacion orinales sanitarios con griferia	UN	4,00	$ 436.275,00	$ 1.745.100,00	3,00	$ 1.308.825,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.308.825,00
25.03	Suministro e instalación griferia lavamanos pared	UN	11,00	$ 536.073,00	$ 5.896.803,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25.04	Suministro e instalación griferia lavamanos convencional	UN	0,00	$ 310.240,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25.05	Suministro e instalación griferia duchas	UN	9,00	$ 116.340,00	$ 1.047.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACABADOS DE PINTURA										
25.06	Pañete liso en mortero 1:4 espesor 0,02 (suministro e instalación)	M2	0,00	$ 14.567,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
25.07	Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección, incluye alistamiento superficie	M2	0,00	$ 24.276,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACABADOS DE PISOS										
25.08	Suministro e instalación de pisos en gres tipo tablón tradicional 30X30 con especificaciones técnicas iguales o similares a la existente, junta de dilatación entre tabletas mínimo de 1 CM	M2	495,00	$ 145.875,00	$ 72.208.123,03	0,00	$ -	474,67	$ 69.242.486,25	474,67	$ 69.242.486,25
	OTROS ACABADOS										

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025		FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23 CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23	OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	

CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14	PLAZO INICIAL		360 Días Calendario
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86	FECHA INICIACIÓN		martes, 2 de enero de 2024
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00	FECHA TERMINACIÓN		jueves, 26 de diciembre de 2024
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%	PLAZO ADICIONAL		105 Días calendario
		ANTICIPO AMORTIZADO		TIEMPO SUSPENDIDO		NA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR		PLAZO TOTAL		465 Días Calendario
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.896,31	FECHA TERMINACIÓN FINAL		viernes, 11 de abril de 2025
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE				
TELÉFONO	(571) 2456144					

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.									
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
26.28	Salida para lámparas de emergencia ,incluye suministro e instalacion marquillado,interruptor, tuberia pvc, uniones, curvas, cableado, elementos de conexión y demas elementos necesarios para la instalación de este item (de acuerdo a especificación tecnica y plano de iluminación)	UN	1	$ 187.641,32	$ 187.641,32	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26.29	Suministro e instalación lámparas de emergencia tipo led R1 2X1.6w o similar	UN	36	$ 130.259,34	$ 4.689.336,24	0,00	$ -	36,00	$ 4.689.336,24	36,00	$ 4.689.336,24
26.30	Suministro e instalación cinta antideslizante alto tráfico 50mm bicolor para huella de escalera (texa o similar)	ML	10	$ 25.618,54	$ 256.185,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26.31	Muro en super board dos caras	M2	25	$ 143.550,92	$ 3.588.773,00	0,00	$ -	25,00	$ 3.588.773,00	25,00	$ 3.588.773,00
26.32	cartera en super board para muro	ML	9	$ 45.855,60	$ 412.700,40	0,00	$ -	7,67	$ 360.883,57	7,67	$ 360.883,57
26.33	Elementos de confinamiento en concreto de 3000PSI para mamposteria	ML	18	$ 121.537,27	$ 2.187.670,86	0,00	$ -	17,95	$ 2.181.594,00	17,95	$ 2.181.594,00
26.34	Suministro e instalación de meson en marmol para baños, incluye salpicadero perforaciones para lavamanos y faldon o reengruese frontal y lateral (incluye transporte y traslego horizontal y vertical)	M2	3,6	$ 1.184.360,10	$ 4.145.330,35	2,88	$ 3.411.014,69		$ -	2,88	$ 3.411.014,69
26.35	Lava traperos incluye mamposteria, pañete, enchape, sifon, afinado de piso, rejilla con sosco y llave tipo jardin	UN	1	$ 689.751,61	$ 689.751,61	1,00	$ 689.751,61	0,00	$ -	1,00	$ 689.751,61
26.36	Suministro e instalación de lavadero prefabricado en concreto y granito pulido de 60x60 h= 80 cms, con tanque de almacenamiento de agua y base de soporte (incluye llave tipo jardin metálica y sifon doble)	UN	2	$ 721.178,71	$ 1.442.357,42	0,00	$ -	2,00	$ 1.442.357,42	2,00	$ 1.442.357,42
26.37	Suministro e instalación de meson en marmol para recepción, incluye faldon fontal y posterior A=60 cms, incluye transporte y traslego horizontal y vertical	ML	3,9	$ 1.452.073,20	$ 5.663.085,48	3,15	$ 4.574.030,58	0,00	$ -	3,15	$ 4.574.030,58
26.38	Desmonte de Piso en piedra,(incluye acopio para posterior reinstalación)	M2	25	$ 37.663,60	$ 941.587,50	0,00	$ -	21,27	$ 801.102,65	21,27	$ 801.102,65
26.39	Suministro e instalación de piso en Piedra gravinada	M2	25	$ 421.750,13	$ 10.543.753,25	0,00	$ -	8,85	$ 3.732.488,65	8,85	$ 3.732.488,65
26.40	Demolición de elementos macizos en concreto	M3	12	$ 458.997,70	$ 5.507.972,40	0,00	$ -	6,41	$ 2.942.175,26	6,41	$ 2.942.175,26
26.41	pases para vigas y columnas en muros y placas de entrepiso espesor entre 10 y 40 cms	UN	174	$ 131.815,19	$ 22.935.843,06	0,00	$ -	174,00	$ 22.935.843,06	174,00	$ 22.935.843,06
26.42	tapa registro plastica de 20 x 20 cms	UN	12	$ 37.484,54	$ 449.814,48	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26.43	cerramiento en mortero y mamposteria para confinamiento de teja ondulada y para remate de estructura en concreto contra muros existentes.	ML	346,74	$ 33.222,65	$ 11.519.821,66	0,00	$ -	344,93	$ 11.459.488,66	344,93	$ 11.459.488,66
26.44	Pañete liso en mortero 1:4 e=0,02 m	ML	1620	$ 13.156,85	$ 21.314.097,00	0,00	$ -	1455,90	$ 19.155.057,92	1455,90	$ 19.155.057,92
26.45	Retiro de madera existente en piso de casa fiscal No. 1 Incluye retiro de escombros y traslego horizontal y vertical	M2	32	$ 13.022,15	$ 416.708,80	0,00	$ -	32,00	$ 416.708,80	32,00	$ 416.708,80

POLICIA NACIONAL DIRECION LOGISTICA Y FINANCIERA	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS		RADICACIÓN No.	1
	CORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/02/2025 Y EL 24/03/2025		FECHA RADICACIÓN:	

CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10357-23		OBJETO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.				
CONTRATO DE INTERVENTORIA PN DIRAF No. 06-3-10362-23							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO	VR. INICIAL	$ 2.647.591.744,14		PLAZO INICIAL		360 Días Calendario
DIRECCIÓN	DG 117 No. 45 - 47 OFC. 102	VR. ADICIONAL	$ 508.978.512,86		FECHA INICIACIÓN		martes, 2 de enero de 2024
C.C. ó NIT	901783679-8	VR. ACTUAL	$ 3.156.570.257,00		FECHA TERMINACIÓN		jueves, 26 de diciembre de 2024
TELÉFONO	601-7048891 CEL: 3114529927	ANTICIPO	0,0%		PLAZO ADICIONAL		105 Días calendario
		ANTICIPO AMORTIZADO			TIEMPO SUSPENDIDO		NA
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	ANTICIPO POR AMORTIZAR			PLAZO TOTAL		465 Días Calendario
DIRECCIÓN	Calle 120A No 7 – 36, Ofic. 802 Bogotá DC.	VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	$ 208.622.895,31		FECHA TERMINACIÓN FINAL		viernes, 11 de abril de 2025
C.C. ó NIT	901.784.826 - 9	SON:DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE					
TELÉFONO	(571) 2456144						

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 11		REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN PARA LA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLA DE LEYVA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.											
CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO No 3						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	Vr Unitario	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
26.79	suministro e instalación de lavamanos de incrustar tipo san lorenzo o similar (incluye sifon y desague)	UN	6	$ 342.134,61	$ 2.052.807,66	3,00	$ 1.026.403,83	0,00	$ -	3,00	$ 1.026.403,83
26.80	suministro e instalación de sensor de calor de sobreponer	UN	2	$ 213.954,78	$ 427.909,56	0,00	$ -	2,00	$ 427.909,56	2,00	$ 427.909,56
26.81	suministro e instalación de canaleta metalica de voz y datos con division de 12 x 5 cms cal. 22	ML	16,84	$ 80.073,99	$ 1.348.445,99	0,00	$ -	16,84	$ 1.348.445,99	16,84	$ 1.348.445,99
26.82	suministro e instalación de caja de paso metálica de 30 x 30 x 15 cms	UN	2	$ 88.050,46	$ 176.100,92	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26.83	suministro e instalación de interruptor corta circuito magnetico 2x20amp 10ka a 220 v tipo enchufable (de acuerdo a especificaciones técnicas y cuadro de carga)	UN	3	$ 80.833,71	$ 242.501,13	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
26.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BYPASS PARA UPS 10KVA a 220 VCA; Incluye 3 interruptores termomagneticos de 40A, 1 conmutador tetrapolar de 40A 3 bornera riel de 10 mm 1 soporte para conmutador, 1 barraje tierra de 5 huecos, 1 canaleta ranurada de 40x60, cable # 8 vehiculo, gabinete de 60x50x25 cms en lámina cold rolled, chapa triangular, ensamble electrico, mecánico, accesorios de conexionado y marquillado, certificación retie, puesta en marcha de servicio y energización (de acuerdo a especificaciones técnicas y cuadro de carga)	UN	1	$ 3.363.924,93	$ 3.363.924,93	0,00	$ -	1,00	$ 3.363.924,93	1,00	$ 3.363.924,93
RESUMEN CONSOLIDADO DEL ACTA DE OBRA PARCIAL No. 011											
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 2.356.528.747,30		$ 156.746.842,34		$ 2.025.893.903,43		$ 2.181.640.745,77
	ADMINISTRACIÓN		27,00%		$ 636.262.761,77		$ 42.051.647,43		$ 546.991.353,92		$ 589.043.001,35
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 23.565.287,46		$ 1.557.468,42		$ 20.258.939,03		$ 21.816.407,45
	UTILIDAD		6,00%		$ 117.826.437,37		$ 7.787.342,12		$ 101.294.695,18		$ 109.082.037,30
	IVA SOBRE UTILIDAD		19,00%		$ 22.387.023,10		$ 1.479.595,00		$ 19.245.992,08		$ 20.725.587,08
	AMORTIZACION ANTICIPO		0%		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.041.632,79		$ 1.041.632,79
	VALOR NETO A PAGAR				$ 3.156.570.257,00		$ 208.622.895,31		$ 2.712.643.250,85		$ 2.921.266.146,16

Para constancia se firma el documento por los participantes, a los _____

EL CONTRATISTA:

Arq. RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SAN CAYETANO
CONTRATISTA

EL INTERVENTOR:

Arq. ANDRÉS MARTÍNEZ VESGA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ
INTERVENTORÍA

Consorcio
San Cayetano
NIT. 901.783.679-8

MEMORIAS DE CALCULO

CORTE DE OBRA No 11

Diagonal 117 No 45-47 Primer Piso
Teléfono: (601) 7048891 / (601) 7041078
Email: consorciosancayetano2@gmail.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA		
CONTRATISTA	CONORCIO SAN CAYETANO	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ

CAPITULO	ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO	ITEM	4.02	UNIDAD DE MEDIDA	Kg	ACTIVIDAD	Acero de refuerzo figurado 60000 psi-420mpa (suministro e instalacion)

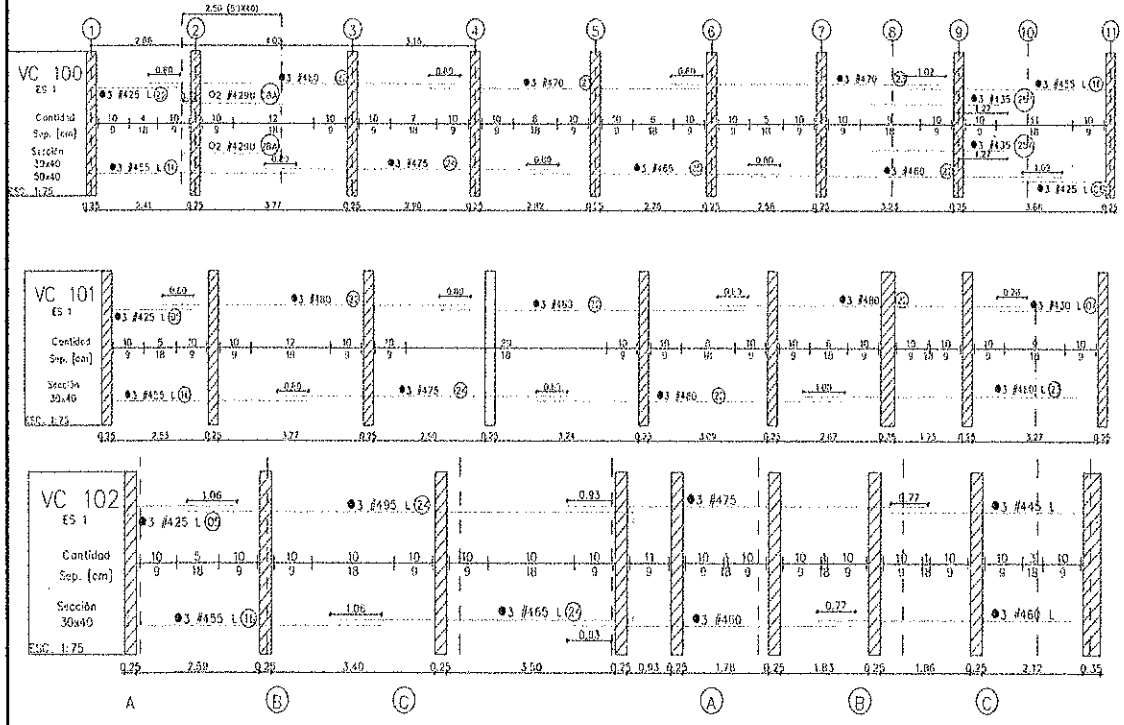



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					No. TRASLAPOS	MEDIDA TOTAL
	Diámetro	long traslapos	long total	Pesoml	cant Varillas	CANT.	
VIGAS DE CIMENTACIÓN B1							
VC 100	1/2"	0,80	0,80	1,00	18,00	4,00	57,60
VC 101	1/2"	0,80		1,00	18,00	4,00	57,60
VC 102	1/2"	0,80		1,00	12,00	4,00	38,40
VC 109	1/2"	0,80		1,00	9,00	4,00	28,80
VC111	1/2"	0,80		1,00	12,00	4,00	38,40
VC108A	1/2"	0,80		1,00	6,00	3,00	14,40
VIGAS NIVEL 3,65 B1							
VG 102	1/2"	0,80		1,00	6,00	3,00	14,40
VG 103	1/2"	0,80		1,00	6,00	3,00	14,40
VG 108	1/2"	0,80		1,00	6,00	3,00	14,40
VG 110	1/2"	0,80		1,00	6,00	3,00	14,40
VG 111	1/2"	0,80		1,00	9,00	2,00	14,40
VG 127	1/2"	0,80		1,00	9,00	3,00	21,60
VG 128	1/2"	0,80		1,00	9,00	2,00	14,40
VG 130	1/2"	0,80		1,00	6,00	2,00	9,60
VG 134	1/2"	0,80		1,00	6,00	3,00	14,40


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016
















VG 135	1/2"	0,80		1,00	9,00	2,00	14,40
VIGAS NIVEL 5.95 B1							
VG 201	1/2"	0,80		1,00	15,00	3,00	36,00
VG 203	1/2"	0,80		1,00	12,00	3,00	28,80


VG 108
ES 1
Cantidad
Sep. [cm]
Sección
25x25
ESC. 1:75
3 #430L
1.00
3 #475
1.05
3 #470L
1.06
3 #450 L
11/5 27/10 11/5 11/5 20/10 11/5 11/5 16/10 11/5


VG 110
ES 1
Cantidad
Sep. [cm]
Sección
25x25
ESC. 1:75
0.73
3 #430 L
3 #455 L
3 #470 L
0.73
3 #415 L
11/5 23/10 11/5 11/5 22/10 11/5


VG 111
ES 1
Cantidad
Sep. [cm]
Sección
25x25
ESC. 1:75
3 #630 L
0.75
3 #665
0.83
3 #625
3 #650 L
0.75
3 #675
0.83
3 #620 L
10/5 36/5 37/5 37/5 43/5



VG 127
ES 1
Cantidad
Sep. [cm]
Sección
25x25
ESC. 1:75
3 #445L
0.90
3 #455
1.04
3 #455L
3 #465 L
0.94
3 #480L
11/5 10/10 11/5 11/5 13/10 11/5 11/5 10/10 11/5 11/5 10/10 11/5 11/5 12/10 11/5 21/5



VG 128
ES 1
Cantidad
Sep. [cm]
Sección
25x25
3 #420L
0.93
3 #465
0.86
3 #420L
3 #450L
0.88
3 #445L
11/5 12/10 11/5 11/5 12/10 11/5 11/5 16/10 11/5

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

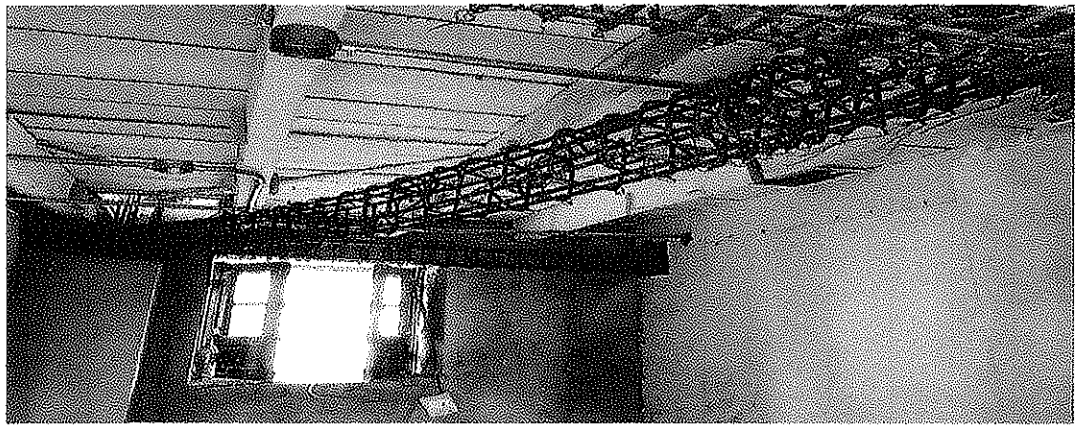

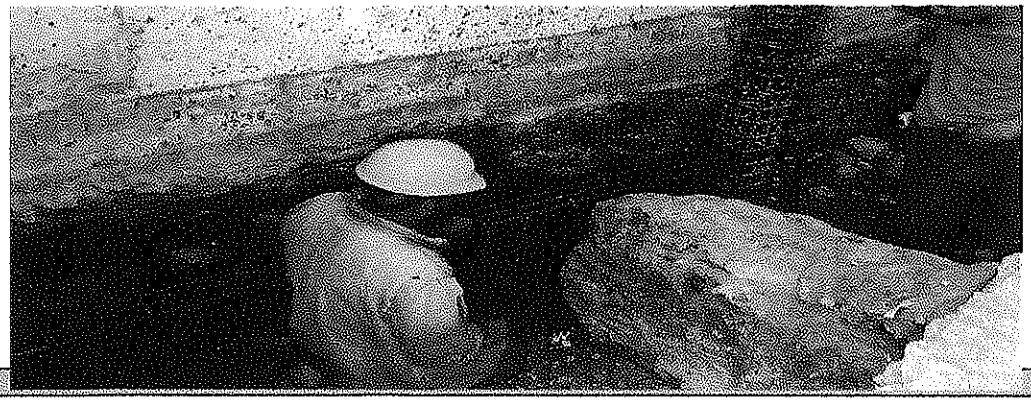


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO	SISTEMA DE CAPTACION DE RAYOS Y PUESTA A TIERRA	ITEM	18,04	UNIDAD DE MEDIDA	ML	ACTIVIDAD	Puesta a tierra configuración tipo b (nte 4552-3) sistema de protección externa (suministro e instalacion, incluye excavacion y relleno de recebo)

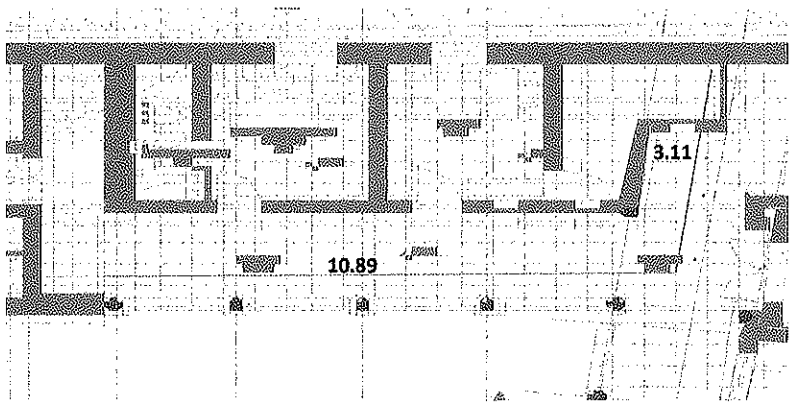


LOCALIZACION	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG.	ALTO	UN.	CANT.	
POR BANDEJA PASILLO	10,89			1,00	10,89
POR BANDEJA PASILLO HACIA CUARTO TECNICO	3,11			1,00	3,11
BAJA A TGD	2			1,00	2,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

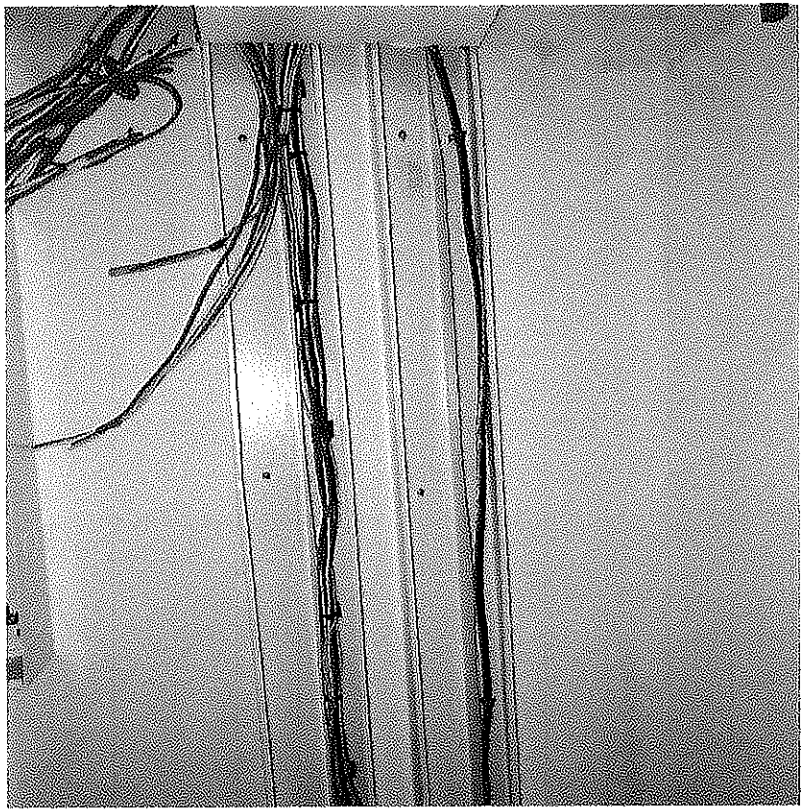


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO	SISTEMA DE CAPTACION DE RAYOS Y PUESTA A TIERRA	ITEM	18,05	UNIDAD DE MEDIDA	ML	ACTIVIDAD	Sistema de captación de rayos compuesto por puntas captadoras de 50 cm y malla captadora en alambron de aluminio de 8mm (suministro e instalacion)

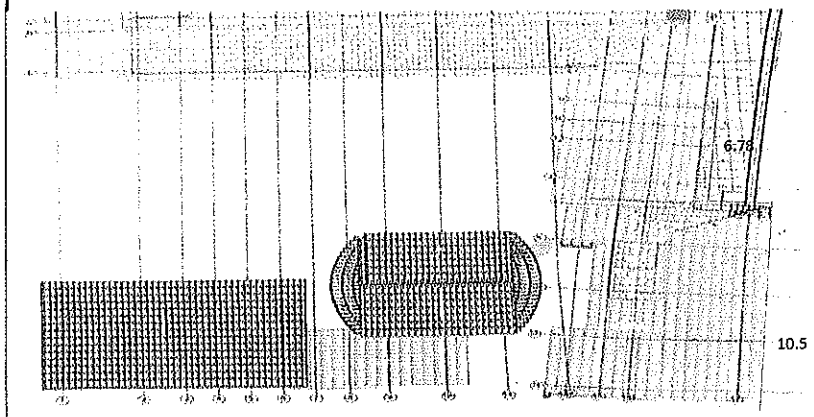

PLANTA NIVEL
CUBIERTAS


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	UN	CANT.	
TERRAZA	6,78			1,00	6,78
FACHADA SUR	10,5			1,00	10,50

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016



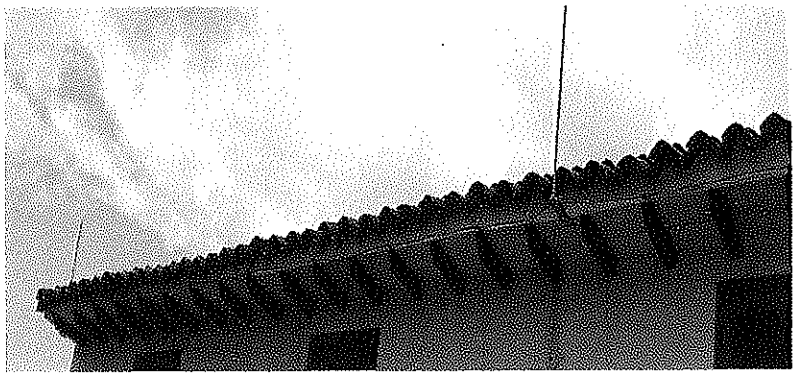

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	17,28
PLANO DE REFERENCIA: ELE 11 DE 17 DETALLES 2	VIENEN	
	TOTAL	17,28

OBSERVACIONES:	REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL	NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA MT. PROF: 152021346465YC	NOMBRE: FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA MT. PROF: 192020897SOCAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ			
CAPITULO	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM	21,04	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Suministro, instalación y transporte de switch de 8 puertos de 10 gb de fibra óptica - bandeja de fibra óptica x 6 hilos.	

SW FIBRA DE FO 24 PUERTOS

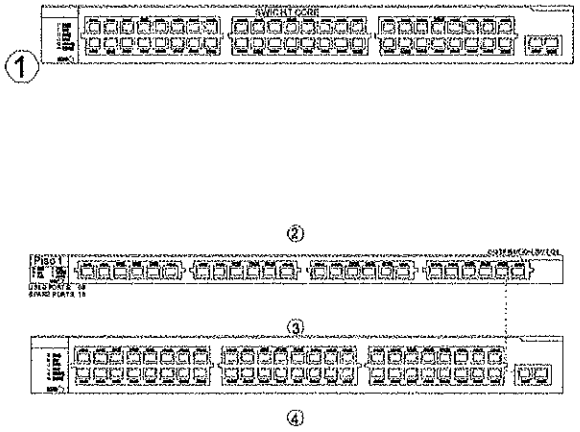


RACK 1: PRINCIPAL PISO 1


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	UN	CANT.	
RACK - CUARTO TECNICO				1,00	1,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2018

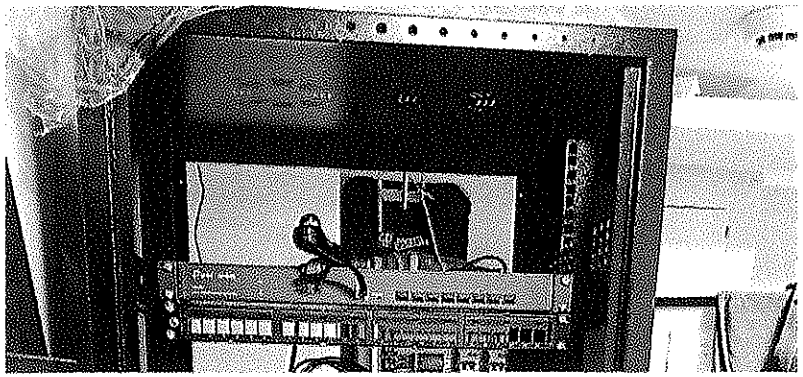

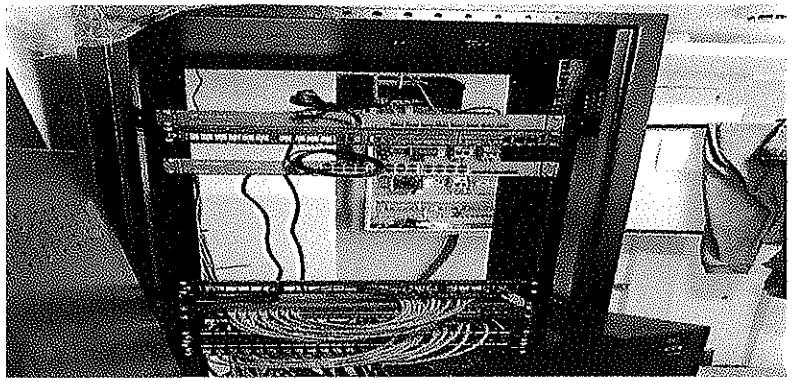


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPITULO	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM	21,05	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Suministro, instalación y transporte de switch de acceso de 48 puertos cat 6a con 2 puertos de fibra de 10 gbps para utilizar como uplinks a los switches de core puertos 10/100/1000 layer 2 de acuerdo a especificación técnica, plano de voz y datos.

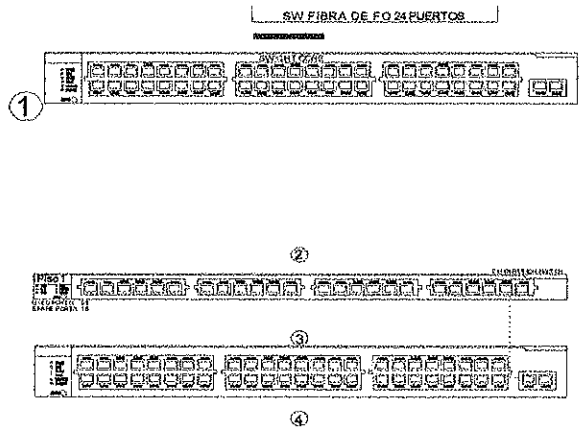


RACK 1: PRINCIPAL PISO 1


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	UN	CANT.	
RACK - CUARTO TECNICO				1,00	1,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

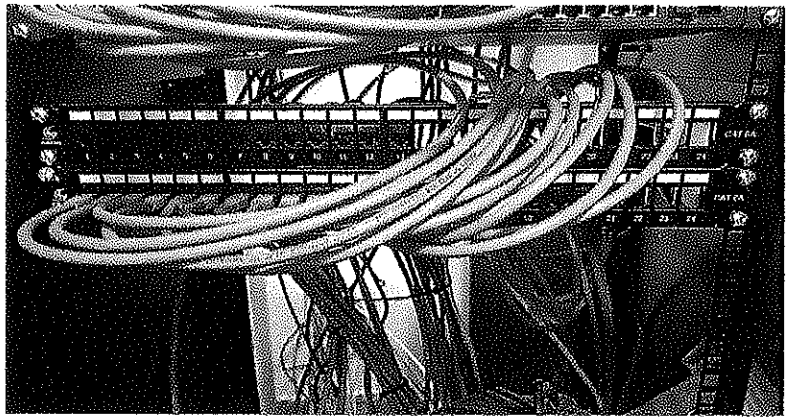

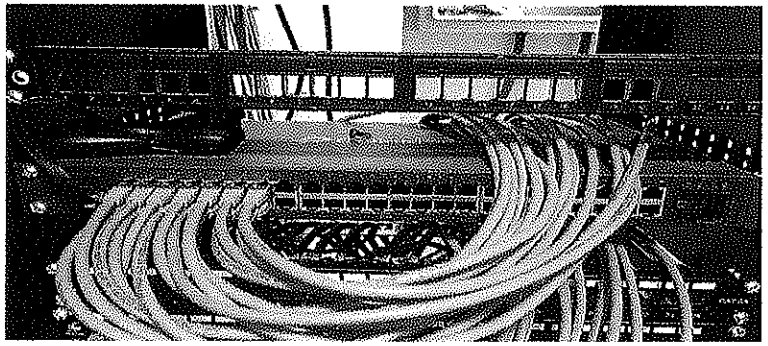

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	1,00
PLANO DE REFERENCIA: ELE 06 DE 17 DETALLE VOZ Y DATOS	VIENEN	
	TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	1520213464BYC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	1920208975DCAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ			
CAPÍTULO	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM	21,06	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Suministro, instalación y transporte de switche de core/distribución de 24 puertos cat 6a con 4 puertos de fibra de 10 gbps para utilizar como uplinks a los switches de core puertos 10/100/1000 layer 3 (de acuerdo a especificación técnica, plano de voz y datos) (suministro e instalación)		

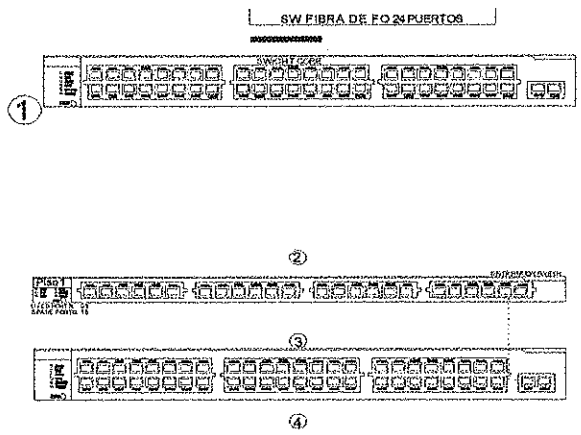


RACK 1: PRINCIPAL PISO 1


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	UN	CANT.	
RACK - CUARTO TECNICO				1,00	1,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2018

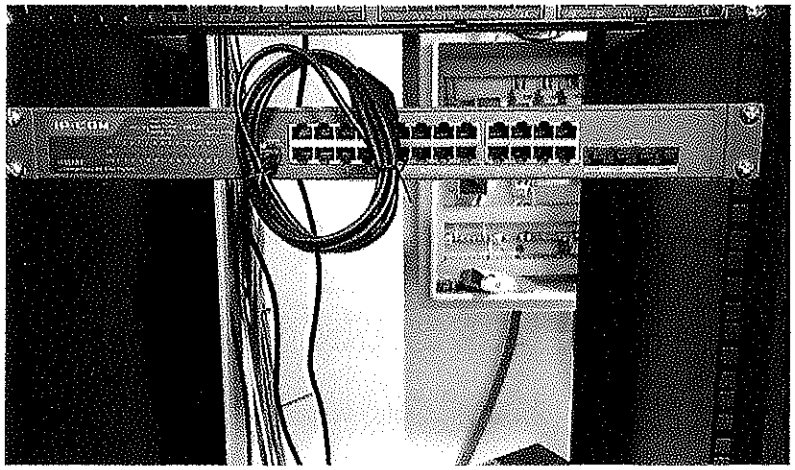


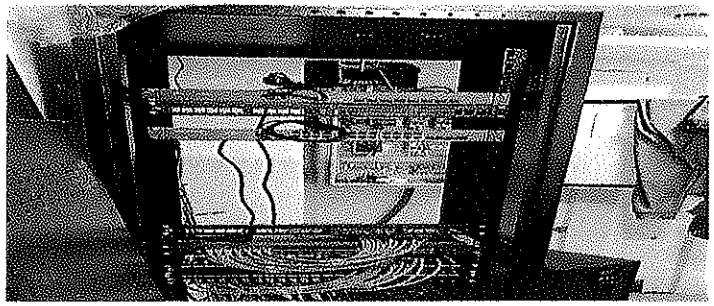

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

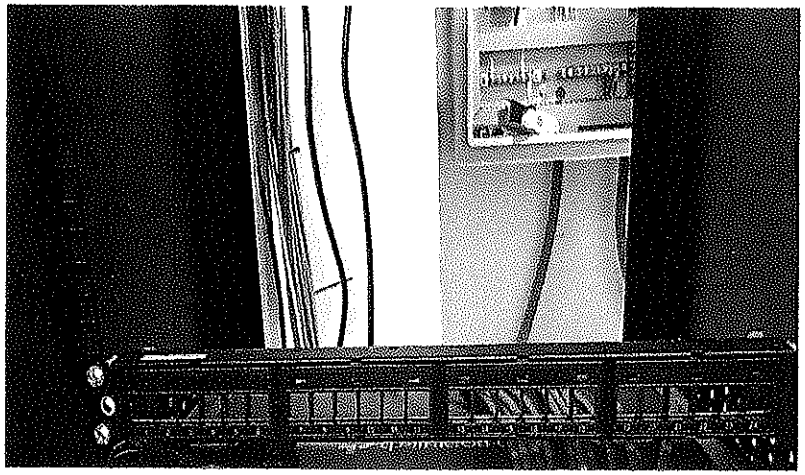

OBSERVACIONES:		
PLANO DE REFERENCIA: ELE 06 DE 17 DETALLE VOZ Y DATOS	SUBTOTAL:	4,00
	VIENEN:	
	TOTAL:	4,00

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021346465YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	1920239750CAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM	21,09	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Patch cord 2m cat 6a ftp (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)

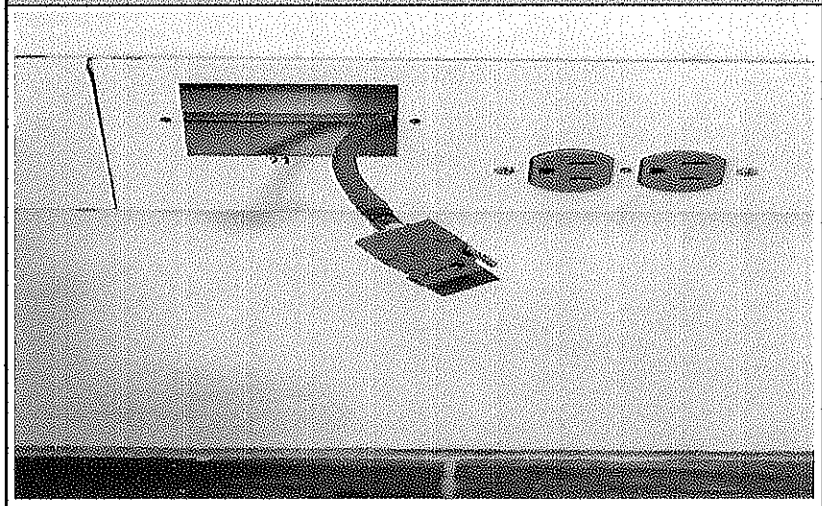

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG.	ALTO	UN.	CANT.	
centro cctv				13,00	13,00
Salón de reuniones				6,00	6,00
armerillo				2,00	2,00
comando distrito				2,00	2,00
secretaria				2,00	2,00
recepcion				2,00	2,00
archivo				1,00	1,00
SUBTOTAL					28,00
VIENEN					
TOTAL					28,00

OBSERVACIONES:
PLANO DE REFERENCIA: ELE 06 DE 17 DETALLE VOZ Y DATOS

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021346466YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192020089750CAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO:	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ÍTEM:	21,1f	UNIDAD DE MEDIDA:	UN	ACTIVIDAD:	Organizador de cable vertical - Incluye elementos de fijación (de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos) (suministro e instalacion)

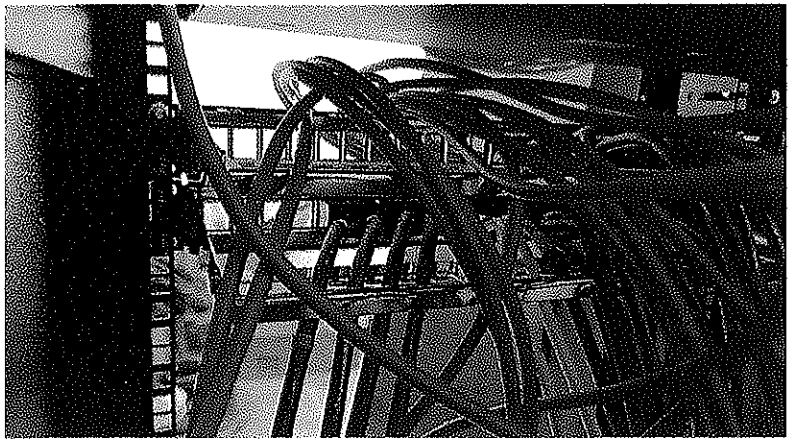

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG.	ALTO	UN.	CANT.	
RACK - CUARTO TÉCNICO				2,00	2,00
SUBTOTAL:					2,00
VIENEN					
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:
PLANO DE REFERENCIA: ELE 06 DE 17 DETALLE VOZ Y DATOS	SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:
NOMBRE: HELIO EFRAIN ZABALA MESA	NOMBRE: FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF: 1520213464GBYC	MT. PROF: 192020897SOCAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO		INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ	
CAPÍTULO	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM 21,12	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD: Patch cord fibra optica 2 metros (suministro e instalacion de acuerdo a especificaciones tecnicas y los planos de voz y datos)

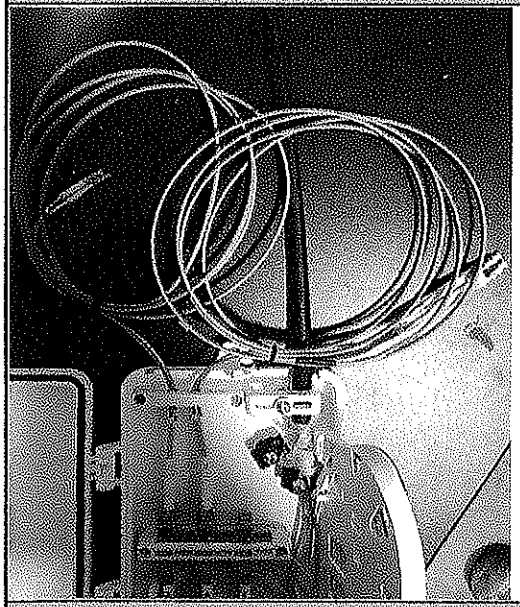

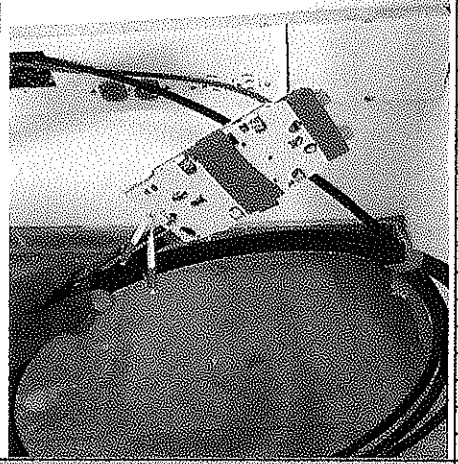

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES UN.	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
RACK - CUARTO TÈCNICO				2,00	2,00
CENTRO CCTV				2,00	2,00
SUBTOTAL					4,00
VIENEN					
TOTAL					4,00

OBSERVACIONES:

PLANO DE REFERENCIA: ELE 06 DE 17 DETALLE VOZ Y DATOS

OBSERVACIONES
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	1520213464BYC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	1920209975OCAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM	21,13	UNIDAD DE MEDIDA:	UN	ACTIVIDAD	Conectores de fibra óptica lc de 10 gb(de acuerdo a especificación tecnica, plano de voz y datos)

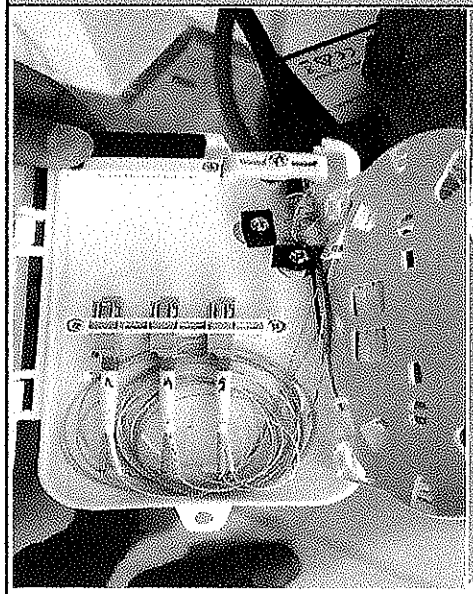

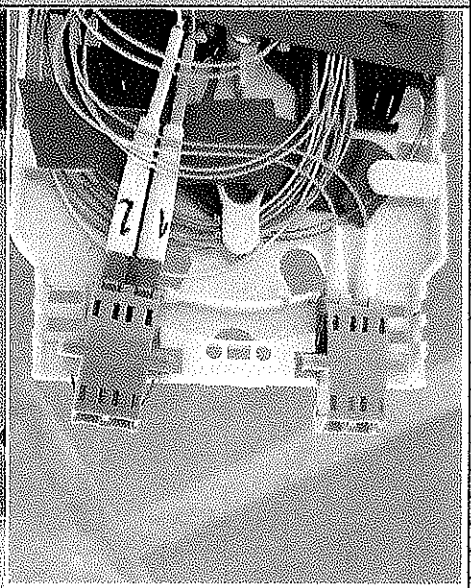

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES UN.	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
RACK - CUARTO TÉCNICO				2,00	2,00
CENTRO CCTV				2,00	2,00
SUBTOTAL					4,00
VIENEN					
TOTAL					4,00

OBSERVACIONES:
PLANO DE REFERENCIA: ELE 06 DE 17 DETALLE VOZ Y DATOS

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021346468YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	19202089750CAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARG		
CAPITULO:	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM:	25,01	UNIDAD DE MEDIDA:	UN	ACTIVIDAD:	Suministro e instalacion tasas sanitarias de doble descarga con accesorios

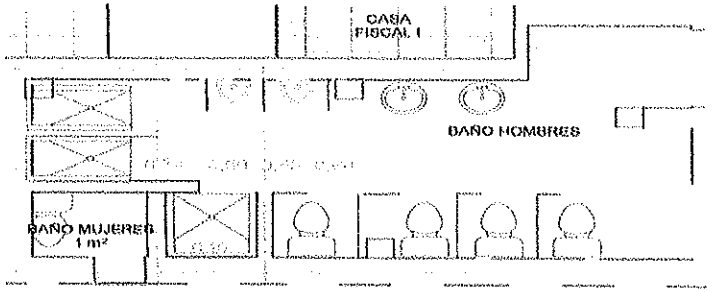



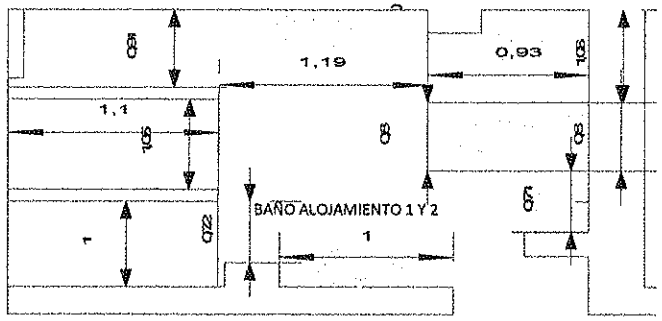

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG.	ALTO	UN.	CANT.	
baño mujeres				1,00	1,00
baño hombres				4,00	4,00
baño casa 2				1,00	1,00
baño habitación casa 2				1,00	1,00
baño alojamiento mujeres				2,00	2,00
baño alojamientos 1 y 2				2,00	2,00
baño casa 1 piso 1				1,00	1,00
baño casa 1 piso 2				1,00	1,00
baño comando 9°Distrito				1,00	1,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016






MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM	25,02	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Suministro e instalacion orinales sanitarios con griferia

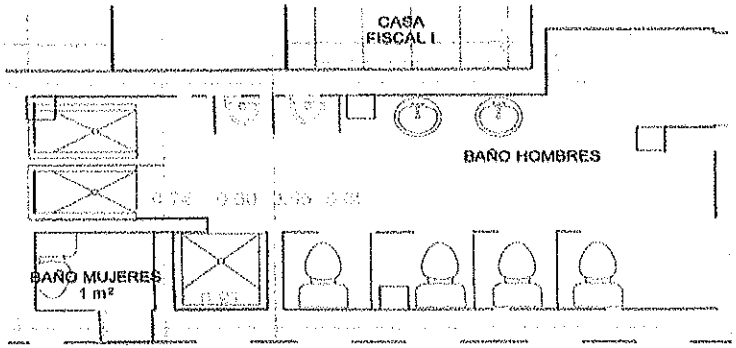

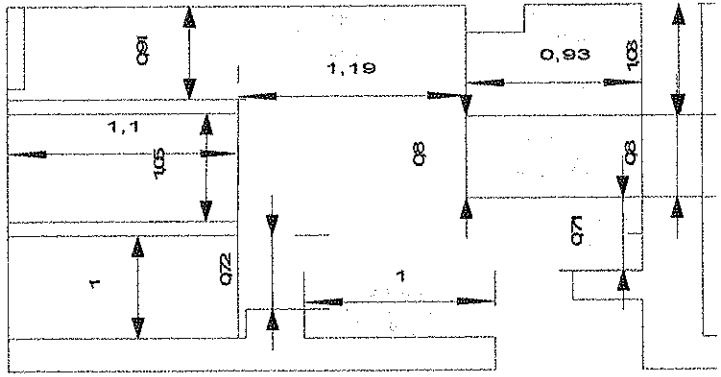


BAÑO ALOJAMIENTO 1 Y 2


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES UN	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
baño hombres				2,00	2,00
baño alojamientos 1 y 2				1,00	1,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

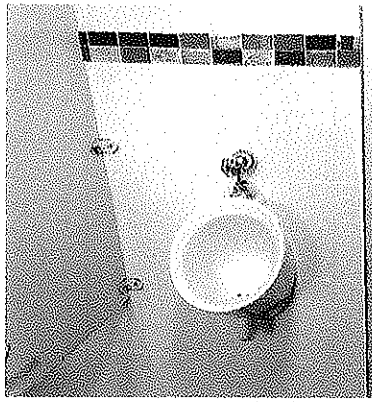

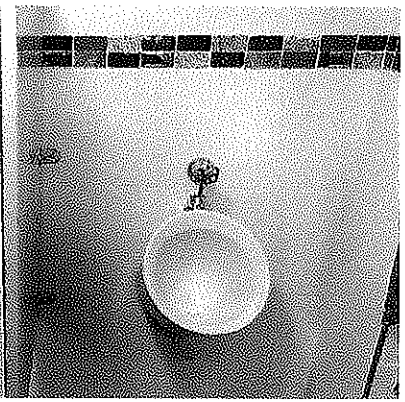




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPITULO:	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM:	25.09	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD:	Suministro e instalación enchape pared cerámico, igual o similar al existente

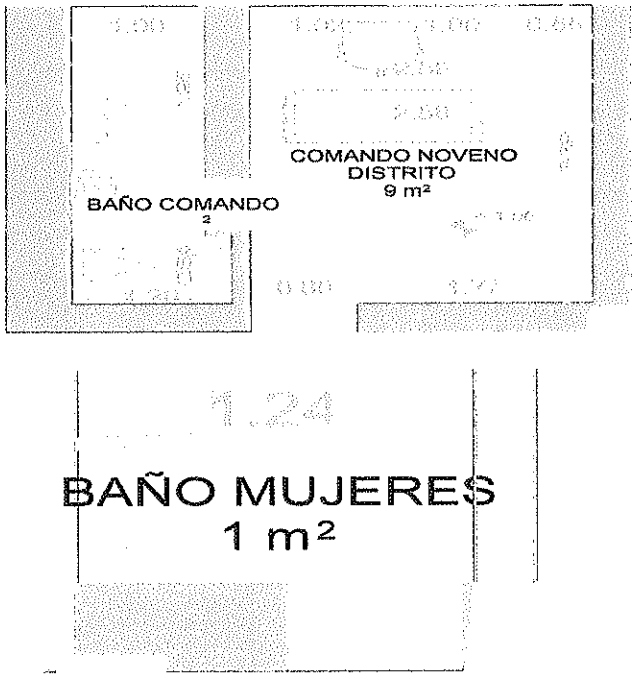

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG.	ALTO	AREA	CANT.	
BAÑO MUJERES	1,63	1,95	3,17	1,00	3,17
	2,25	1,74	3,92	1,00	3,92
BAÑO COMANDO 9° DISTRITO	2,02	2,00	4,04	1,00	4,04
	0,75	2,00	1,50	1,00	1,50
	1,1	2,00	2,20	1,00	2,20
	3	1,40	4,20	1,00	4,20

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORO
DIA	MES	AÑO			
25	3	2026	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ			
CAPÍTULO	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM	25.11	UNIDAD DE MEDIDA:	UN	ACTIVIDAD:	suministro e instalacion puerta en madera entamborada 1.00 m. (suministro e instalación. altura hasta 2.40m. Incluye marco)	



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	AREA	CANT.	
ALOJAMIENTO MUJERES				1,00	1,00
BAÑO ALOJAMIENTOS 1 Y 2				2,00	2,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016


FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ			
CAPÍTULO	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	ITEM	25,13	UNIDAD DE MEDIDA	M2	ACTIVIDAD	suministro e instalacion divisiones de baño en acero inoxidable	

WC HOMBRES

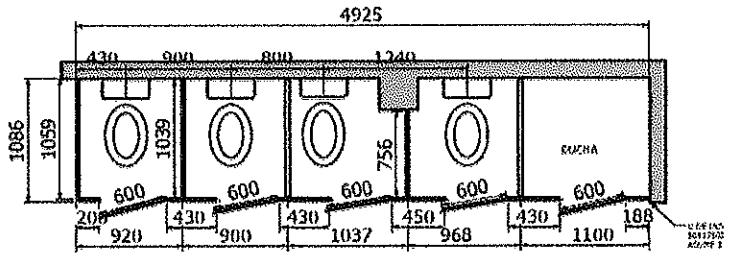

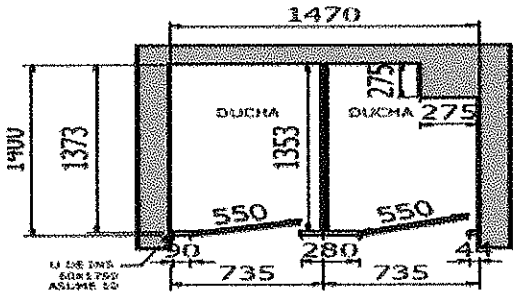




LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	AREA	CANT.	
BAÑO HOMBRES					
PARAL BISAGRA TABIQUE	0,43	1,8	0,77	3,00	2,32
	0,45	1,80	0,81	1,00	0,81
	0,19	1,80	0,34	1,00	0,34
	0,2	1,80	0,36	1,00	0,36
PUERTA	0,6	1,60	0,96	5,00	4,80
DIVISIONES	1,09	1,60	1,74	4,00	6,96
	0,76	1,60	1,22	1,00	1,22
PUERTA DUCHAS	0,55	1,80	0,99	2,00	1,98
DIVISION DUCHAS	1,36	1,80	2,45	1,00	2,45
PARAL BISAGRA TABIQUE DUCHHAS	0,28	1,80	0,50	1,00	0,50
	0,09	1,80	0,16	1,00	0,16
	0,05	1,80	0,09	1,00	0,09
DIVISION ORINALES	0,50	0,96	0,48	2,00	0,96
	0,22	0,96	0,21	1,00	0,21
BAÑO ALOJAMIENTOS 1 Y 2					
PARAL BISAGRA TABIQUE	0,30	1,80	0,54	2,00	1,08
	0,24	1,80	0,43	1,00	0,43
DIVISION SANITARIOS	1,05	1,60	1,68	2,00	3,36
PUERTAS SANITARIOS	0,57	1,60	0,91	2,00	1,82
DIVISION ORINAL	0,22	0,96	0,21	1,00	0,21
DIVISON DUCHAS	1,06	1,80	1,91	2,00	3,82
PUERTAS DUCHAS	0,57	1,80	1,03	2,00	2,05


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

WC ALOJAMIENTOS





WC ALOJAMIENTO MUJERES

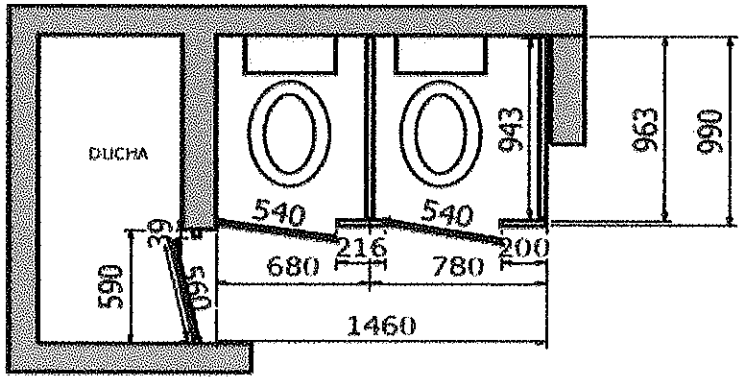


PARAL BISAGRA TABIQUE	0,30	1,80	0,54	2,00	1,08
	0,20	1,80	0,37	1,00	0,37
BAÑO ALOJAMIENTO MUJERES					
DIVISIONES SANITARIOS	0,98	1,60	1,54	2,00	3,08

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016



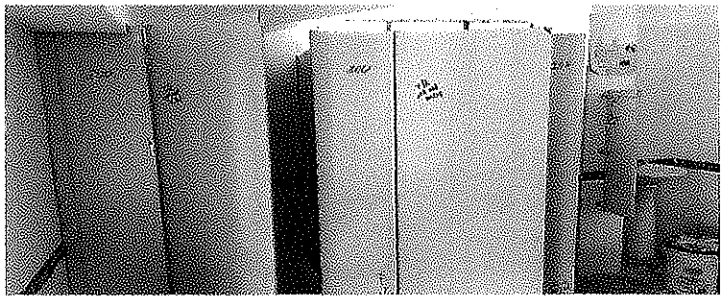

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
25	3	2026	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ			
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	26,18	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Suministro e instalación cocina integral apartamento comandante compuesta por cajonera parte superior (2,07 ML), cajonera parte inferior (1,57 ML) con entrepaños y puertas en mdf, meson en granito (1,57 ML), lavaplatos, griferia tipo cuello de ganso, rejilla lavaplatos, sifon y acoples flexibles		



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	AREA	CANT.	
CASA FISCAL 2				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00
VIENEN					
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

PLANO DE REFERENCIA: LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	1520213464GBYC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	PABLO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192020597SDCAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA								
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ				
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	26,19	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Suministro e instalación cocina integral apartamento subcomandante compuesta por cajonera parte superior (2,30 ML), cajonera parte inferior (2,30 ML), con entrepaños y puertas en mdf, meson en granito (2,30 ML), lavaplatos, grifería tipo cuello de ganso, rejilla lavaplatos, sifon y acoplea flexibles		



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES AREA	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
CASA FISCAL 1				1,00	1,00

OBSERVACIONES:		
PLANO DE REFERENCIA: LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	SUBTOTAL	1,00
	VIENEN	
	TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021346469YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192020897SOCAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO:	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO:	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM:	26,34	UNIDAD DE MEDIDA:	ML	ACTIVIDAD:	Suministro e instalación de meson en marmol para baños, incluye salpicadero perforaciones para lavamanos y faldon o reengruese frontal y lateral (incluye transporte y traslego horizontal y vertical)

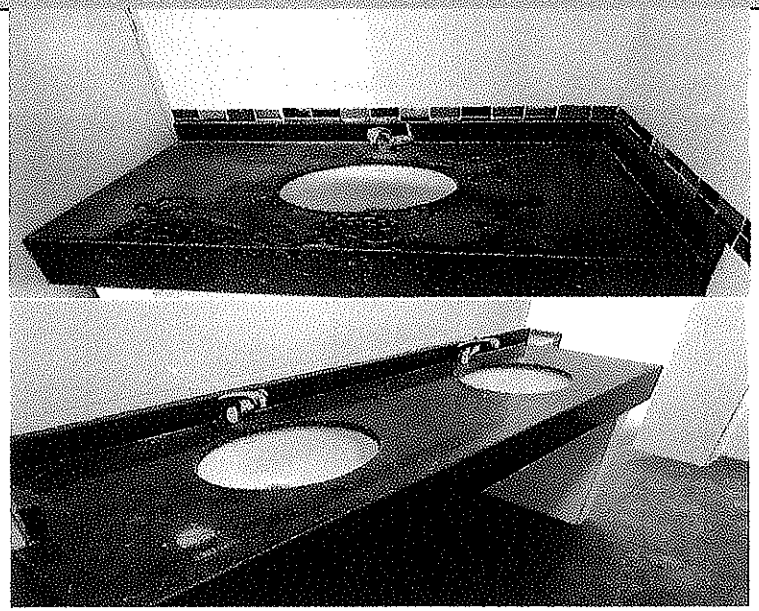

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	AREA	CANT.	
BAÑO HOMBRES	1,78			1,00	1,78
BAÑO ALOJAMIENTO MUJERES	1,1			1,00	1,10
SUBTOTAL					2,88
VIENEN					
TOTAL					2,88

OBSERVACIONES:

PLANO DE REFERENCIA: LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021346465YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	PABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192020099750CAU


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ÍTEM	26,35	UNIDAD DE MEDIDA	UN	ACTIVIDAD	Lava traperos incluya mamposteria, pañete, enchape, sifon, afinado de piso, rejilla con sosco y llave tipo jardin

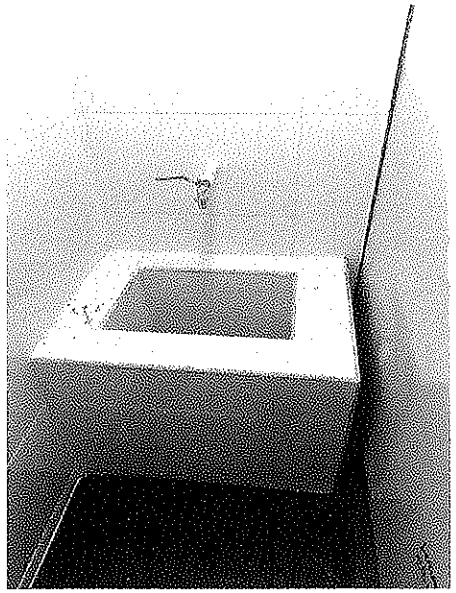

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG.	ALTO	AREA	CANT.	
BAÑO HOMBRES				1,00	1,00
SUBTOTAL					1,00
VIENEN					
TOTAL					1,00

PLANO DE REFERENCIA: LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO

OBSERVACIONES
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021346468YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	PABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192020897SOCAU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
26	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA						
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ		
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	26,37	UNIDAD DE MEDIDA	ML	ACTIVIDAD	Suministro e instalación de meson en marmol para recepción, incluye faldon frontal y posterior A=60 cms, Incluye transporte y traslego horizontal y vertical



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG	ALTO	AREA	CANT	
RECEPCION	3,15			1,00	3,15

OBSERVACIONES:		
PLANO DE REFERENCIA: LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO	SUBTOTAL	3,15
	VIENEN	
	TOTAL	3,15

OBSERVACIONES:
SE MANTIENE LA CANTIDAD CONTRACTUAL

REPRESENTANTE CONTRATISTA: RESIDENTE DE OBRA	
NOMBRE:	HELIO EFRAIN ZABALA MESA
MT. PROF:	152021346468YC

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
NOMBRE:	FABIO ALBERTO CAÑON ZUÑIGA
MT. PROF:	192020897500AU

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DÍA	MES	AÑO			
25	3	2025	11	2	HELIO EFRAIN ZABALA MESA

PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DEL COMANDO DE POLICIA DE VILLA DE LEYVA							
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CAYETANO			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORES PRODIARQ			
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	26,51	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 8 mm para duchas; incluye herrajes en acero inoxidable (incluye transporte y traslago horizontal y vertical).	



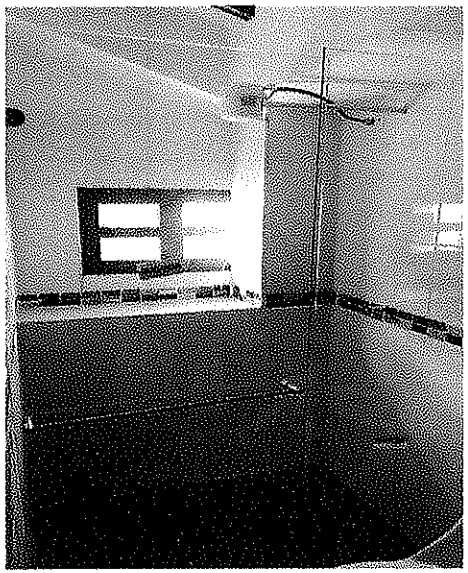

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	LONG.	ALTO	AREA	CANT.	
BAÑO CASA FISCAL 2	1,10	1,90	2,09	1,00	2,09
BAÑO HABITACIÓN CASA FISCAL 2	1,50	1,90	2,85	1,00	2,85
BAÑO CASA FISCAL1	1,10	1,76	1,94	1,00	1,94
