ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°5

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	31 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2025		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA / 5724	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO

PARQUE VILLA CORDIALIDAD







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ZONA DE CANCHA DE FUTBOL (RELLENO FINAL) (CARTERA TOPOGRAFICA)							338,22
2. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN ANDENES LADO DE LOS EDIFICIOS EN ZONA DE LA CANCHA	74,47	1,20	0,20				17,87
3. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN ANDENES LADO DE LOS EDIFICIOS EN ZONA DEL SALON COMUNAL	50,50	1,20	0,20				12,12


Cantidad contractual según modificartoria No.5	8.500,00
Acumulado anterior	6584,61
Acumulado a presente acta	8462,80
Obra por ejecutar	37,20

TOTAL PRESENTE ACTA:	368,21

OBSERVACIONES:

Vo.Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
CARLOS VILLEGAS	HERMOGENES HEREIRA	DIEGO RADA


PLANO DE EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO

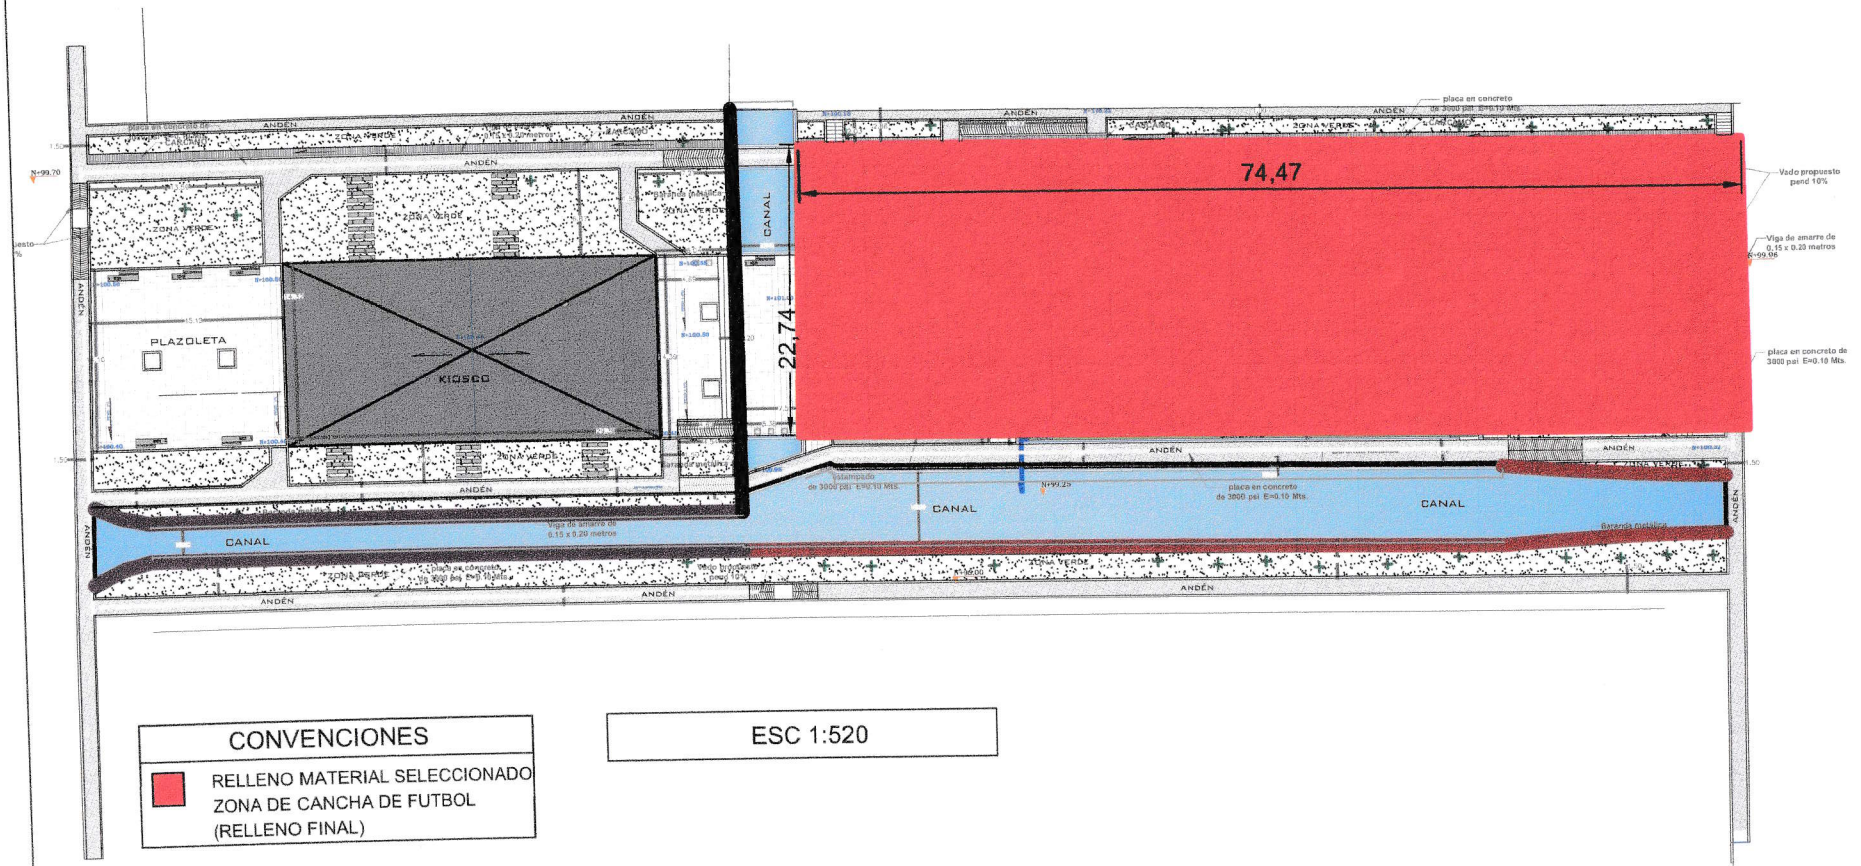

CONVENCIONES
RELLENO MATERIAL SELECCIONADO ZONA DE CANCHA DE FUTBOL (RELLENO FINAL)

ESC 1:520

Cortes zona de cancha de futbol.
Villa Cordizlidad

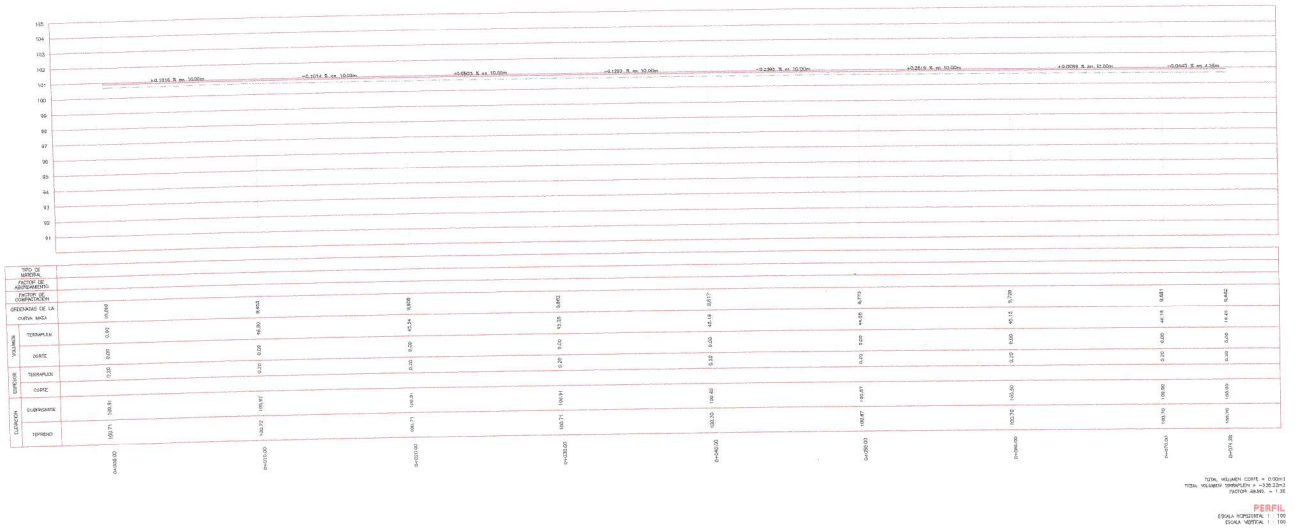

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jeiso\Downloads\ZONA CANCHA.txt
Pagina 1
PERFIL

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+000.00	0.00	-4.84	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+010.00	0.00	-4.54	10.00	0.00	-46.90	9,953.10
0+020.00	0.00	-4.53	10.00	0.00	-45.34	9,907.76
0+030.00	0.00	-4.52	10.00	0.00	-45.26	9,862.50
0+040.00	0.00	-4.52	10.00	0.00	-45.19	9,817.31
0+050.00	0.00	-4.40	10.00	0.00	-44.58	9,772.73
0+060.00	0.00	-4.63	10.00	0.00	-45.15	9,727.58
0+070.00	0.00	-4.60	10.00	0.00	-46.15	9,681.43
0+074.28	0.00	-4.58	4.28	0.00	-19.65	9,661.78


TOTAL VOLUMEN CORTE = 0.00m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -338.22m3
COEF. ABUNDAMIENTO: 1.20

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\jeiso\Downloads\ZONA CANCHA.txt
Pagina 1
PERFIL

ESTACION	ELEVACIONES TERRENO	ELEVACIONES SUBRASANTE	ESPESORES CORTE	ESPESORES TERRAPLEN
0+000.00	100.71	100.91	----	0.20
0+010.00	100.72	100.92	----	0.20
0+020.00	100.71	100.91	----	0.20
0+030.00	100.71	100.91	----	0.20
0+040.00	100.70	100.90	----	0.20
0+050.00	100.67	100.87	----	0.20
0+060.00	100.70	100.90	----	0.20
0+070.00	100.70	100.90	----	0.20
0+074.28	100.70	100.90	----	0.20

PLANO DE EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO

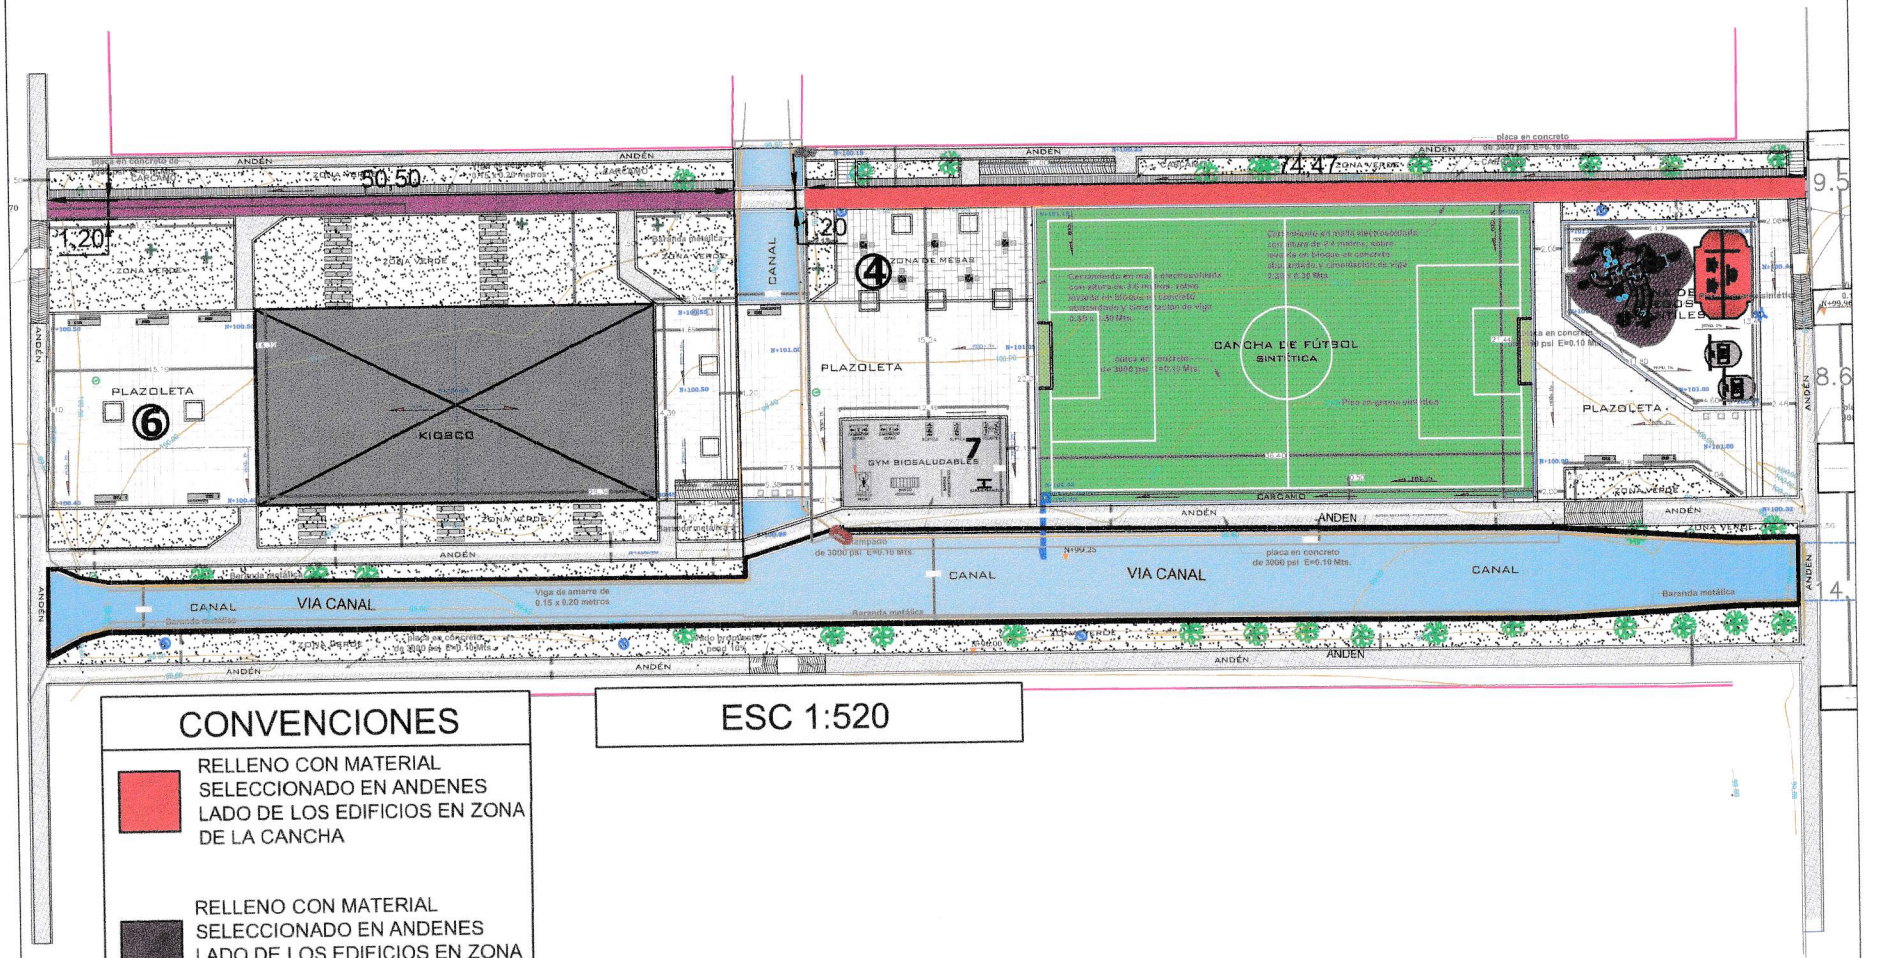

CONVENCIONES

- RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN ANDENES LADO DE LOS EDIFICIOS EN ZONA DE LA CANCHA
- RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO EN ANDENES LADO DE LOS EDIFICIOS EN ZONA DEL SALON COMUNAL

ESC 1:520

Secciones de cuneta
Vía Coroico.
