ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°5

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	31 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2025		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA / 377	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)








LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. EXCAVACIONES PARA REPOSICION DE MATERIAL EN ANDENES INCLUYE EXCAVACION DE LA VIGA DE 0,20X0,15M EN ZONA DE CANCHA LADO DE LOS EDIFICIOS	74,47	1,70	0,20				25,32
2. EXCAVACIONES PARA REPOSICION DE MATERIAL EN ANDENES INCLUYE EXCAVACION DE LA VIGA DE 0,20X0,15M EN ZONA DE SALON SOCIAL LADO DE LOS EDIFICIOS	50,50	1,70	0,20				17,17
3. EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCION DE ANDEN INTERNOS LADO DEL MURO DE CONTENCION, INCLUYE EXCAVACION DE LA VIGA DE 0,20X0,15M EN ZONA DE SALON SOCIAL	50,50	2,00	0,10				10,10
4. EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCION DE ANDEN INTERNOS LADO DEL MURO DE CONTENCION, ZONA DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	74,47	1,30	0,10				9,68
5. EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCION DE ANDEN INTERNOS LADO DEL MURO EN BLOQUE ABUZARDADO, EN ZONA DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	74,47	1,10	0,10				8,19
6. EXCAVACION PARA ALCORQUES EN ZONA DE MESAS	1,20	0,80	0,80	5,00			3,84
7. EXCAVACION PARA RAMPA DE ACCESO A LA ZONA DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	10,30	1,10	0,40				4,53
Cantidad contractual según modificartoria No.5	1437,6						
Acumulado anterior	226,09						
Acumulado a presente acta	304,92						
Obra por ejecutar	1.132,68						
TOTAL PRESENTE ACTA:							78,83

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
CARLOS VILLEGAS	HERMOGENES HEREIRA	DIEGO RADA

EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

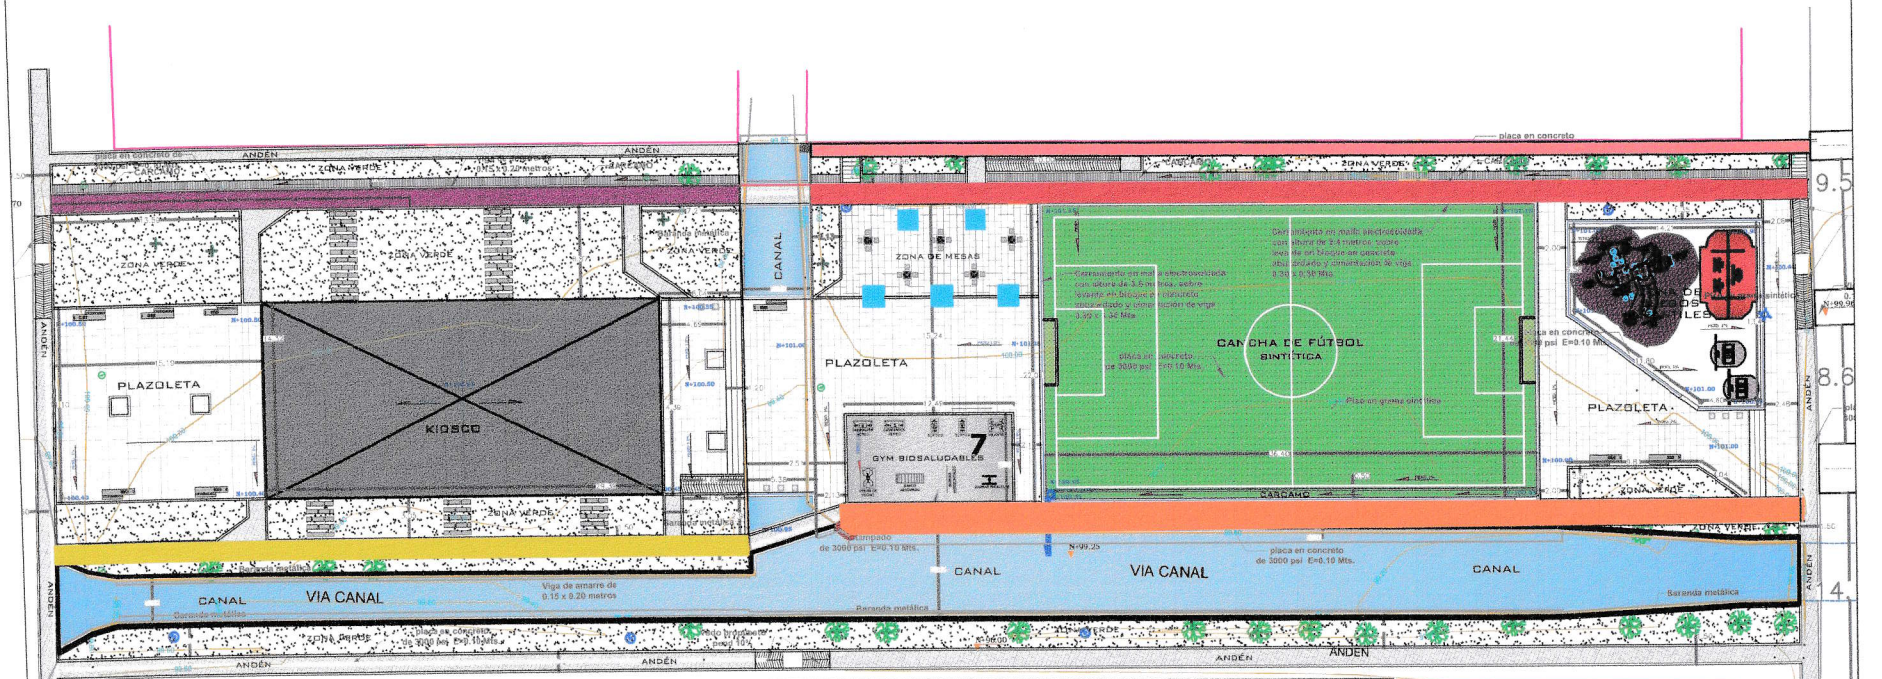

CONVENCIONES

- EXCAVACIONES PARA REPOSICION DE MATERIAL EN ANDENES INCLUYE EXCAVACION DE LA VIGA DE 0,20X0,15M EN ZONA DE CANCHA LADO DE LOS EDIFICIOS
- EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCION DE ANDEN INTERNOS LADO DEL MURO DE CONTENCION, INCLUYE EXCAVACION DE LA VIGA DE 0,20X0,15M EN ZONA DE SALON SOCIAL
- EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCION DE ANDEN INTERNOS LADO DEL MURO EN BLOQUE ABUZARDADO, EN ZONA DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA
- EXCAVACIONES PARA REPOSICION DE MATERIAL EN ANDENES INCLUYE EXCAVACION DE LA VIGA DE 0,20X0,15M EN ZONA DE SALON SOCIAL LADO DE LOS EDIFICIOS
- EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCION DE ANDEN INTERNOS LADO DEL MURO DE CONTENCION, ZONA DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA
- EXCAVACION PARA ALCORQUES EN ZONA DE MESAS
