ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°5

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	31 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2025			
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: AD-06	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESRO PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

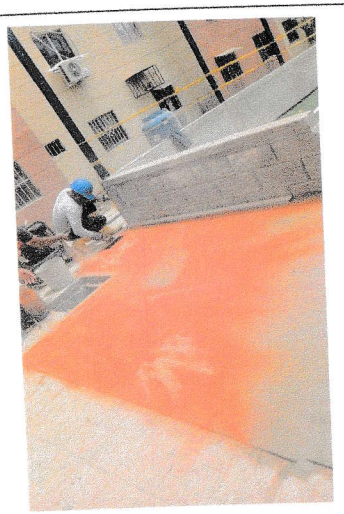




LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. PLACA PARA LA ZONA DE JUEGOS DE MESAS						95,36	
2. PLACA PARA LA PLAZOLETA 3						239,79	
Cantidad contractual según modificartoria No.5	612,37						
Acumulado anterior	119,84						
Acumulado a presente acta	454,99						
Obra por ejecutar	157,38						
TOTAL PRESENTE ACTA:							335,15

OBSERVACIONES:LAS ÁREAS FUERON TOMADAS DEL PLANO DE AUTOCAD

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
CARLOS VILLEGAS	HERMOGENES HEREIRA	DIEGO RADA

PLANO DE PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR PROMEDIO 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO

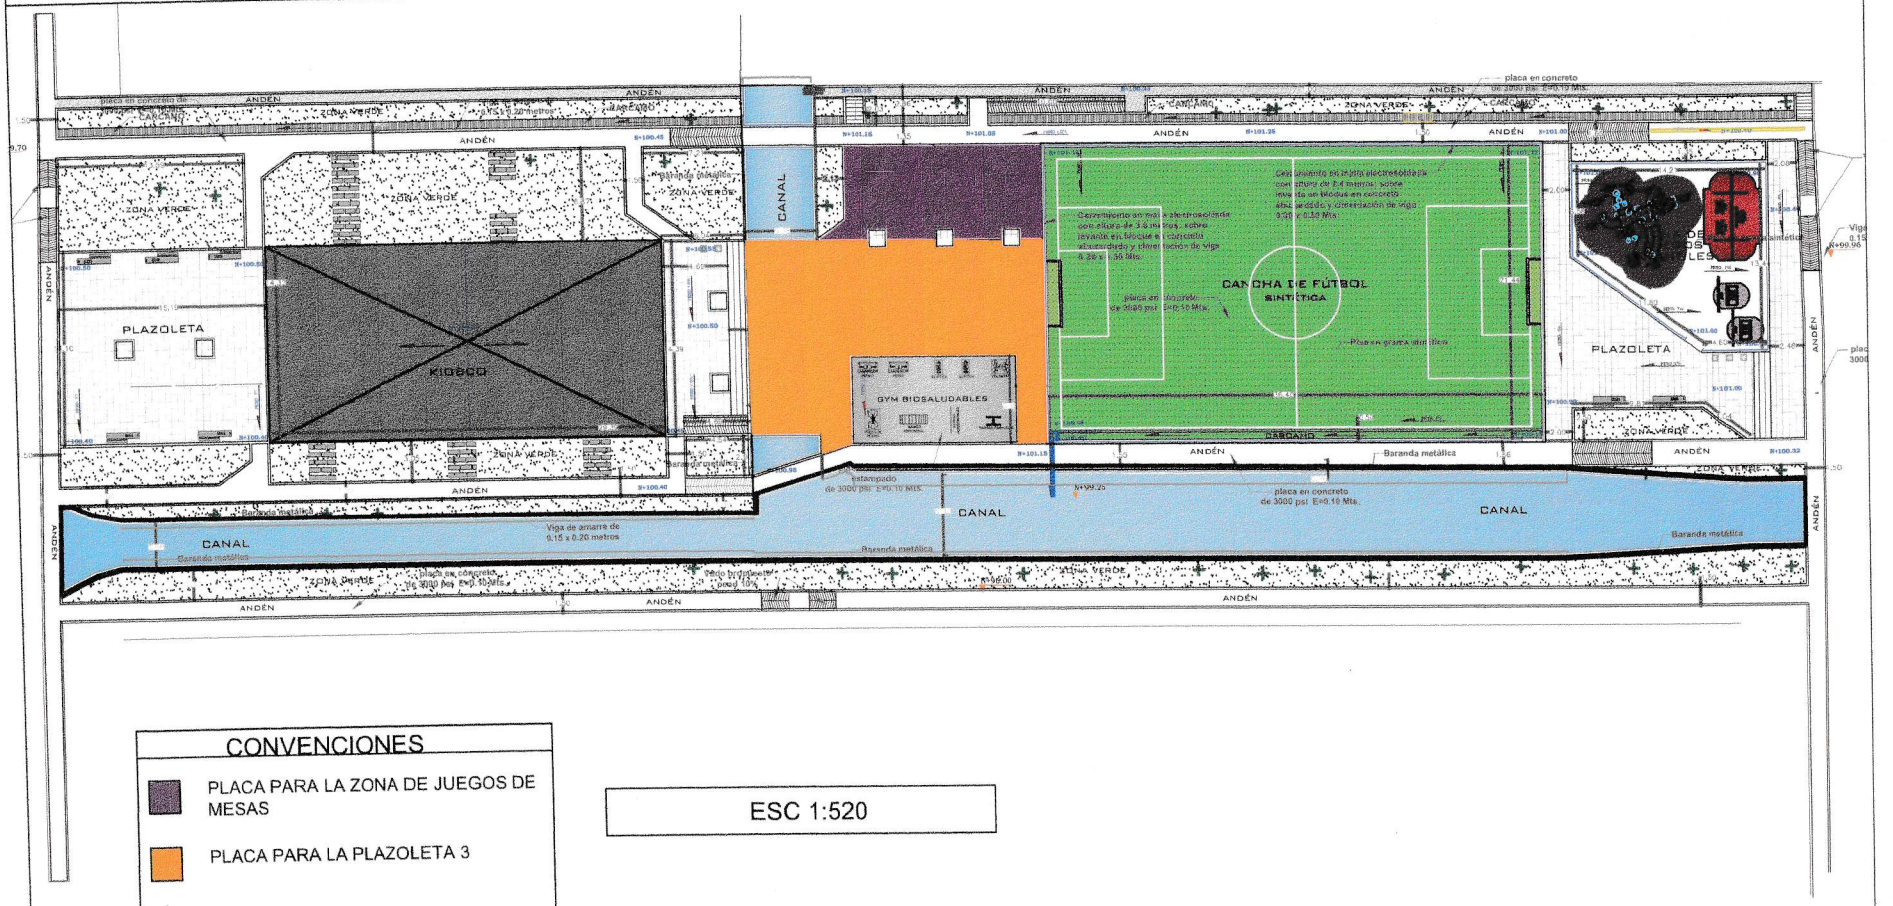

CONVENCIONES

- PLACA PARA LA ZONA DE JUEGOS DE MESAS
- PLACA PARA LA PLAZOLETA 3

ESC 1:520

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°5


Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024			**OBJETO DEL CONTRATO:**	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	31 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	**CÓDIGO DEL ITEM:**	214	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D=1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

PARQUE JORGE ROBLEDO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

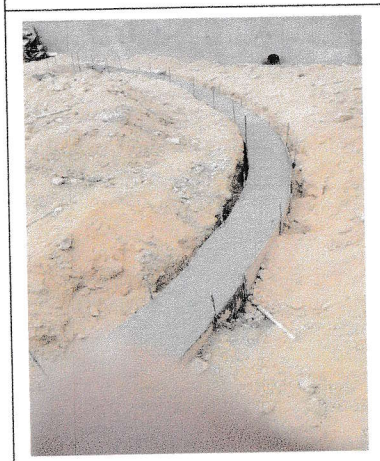

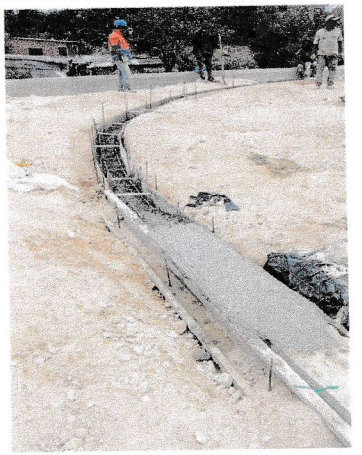


LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1.VIGA DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	19,50				19,50		
TOTAL PRESENTE ACTA:							19,50

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
CARLOS VILLEGAS	HERMOGENES HEREIRA	DIEGO RADA

ANO DE VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

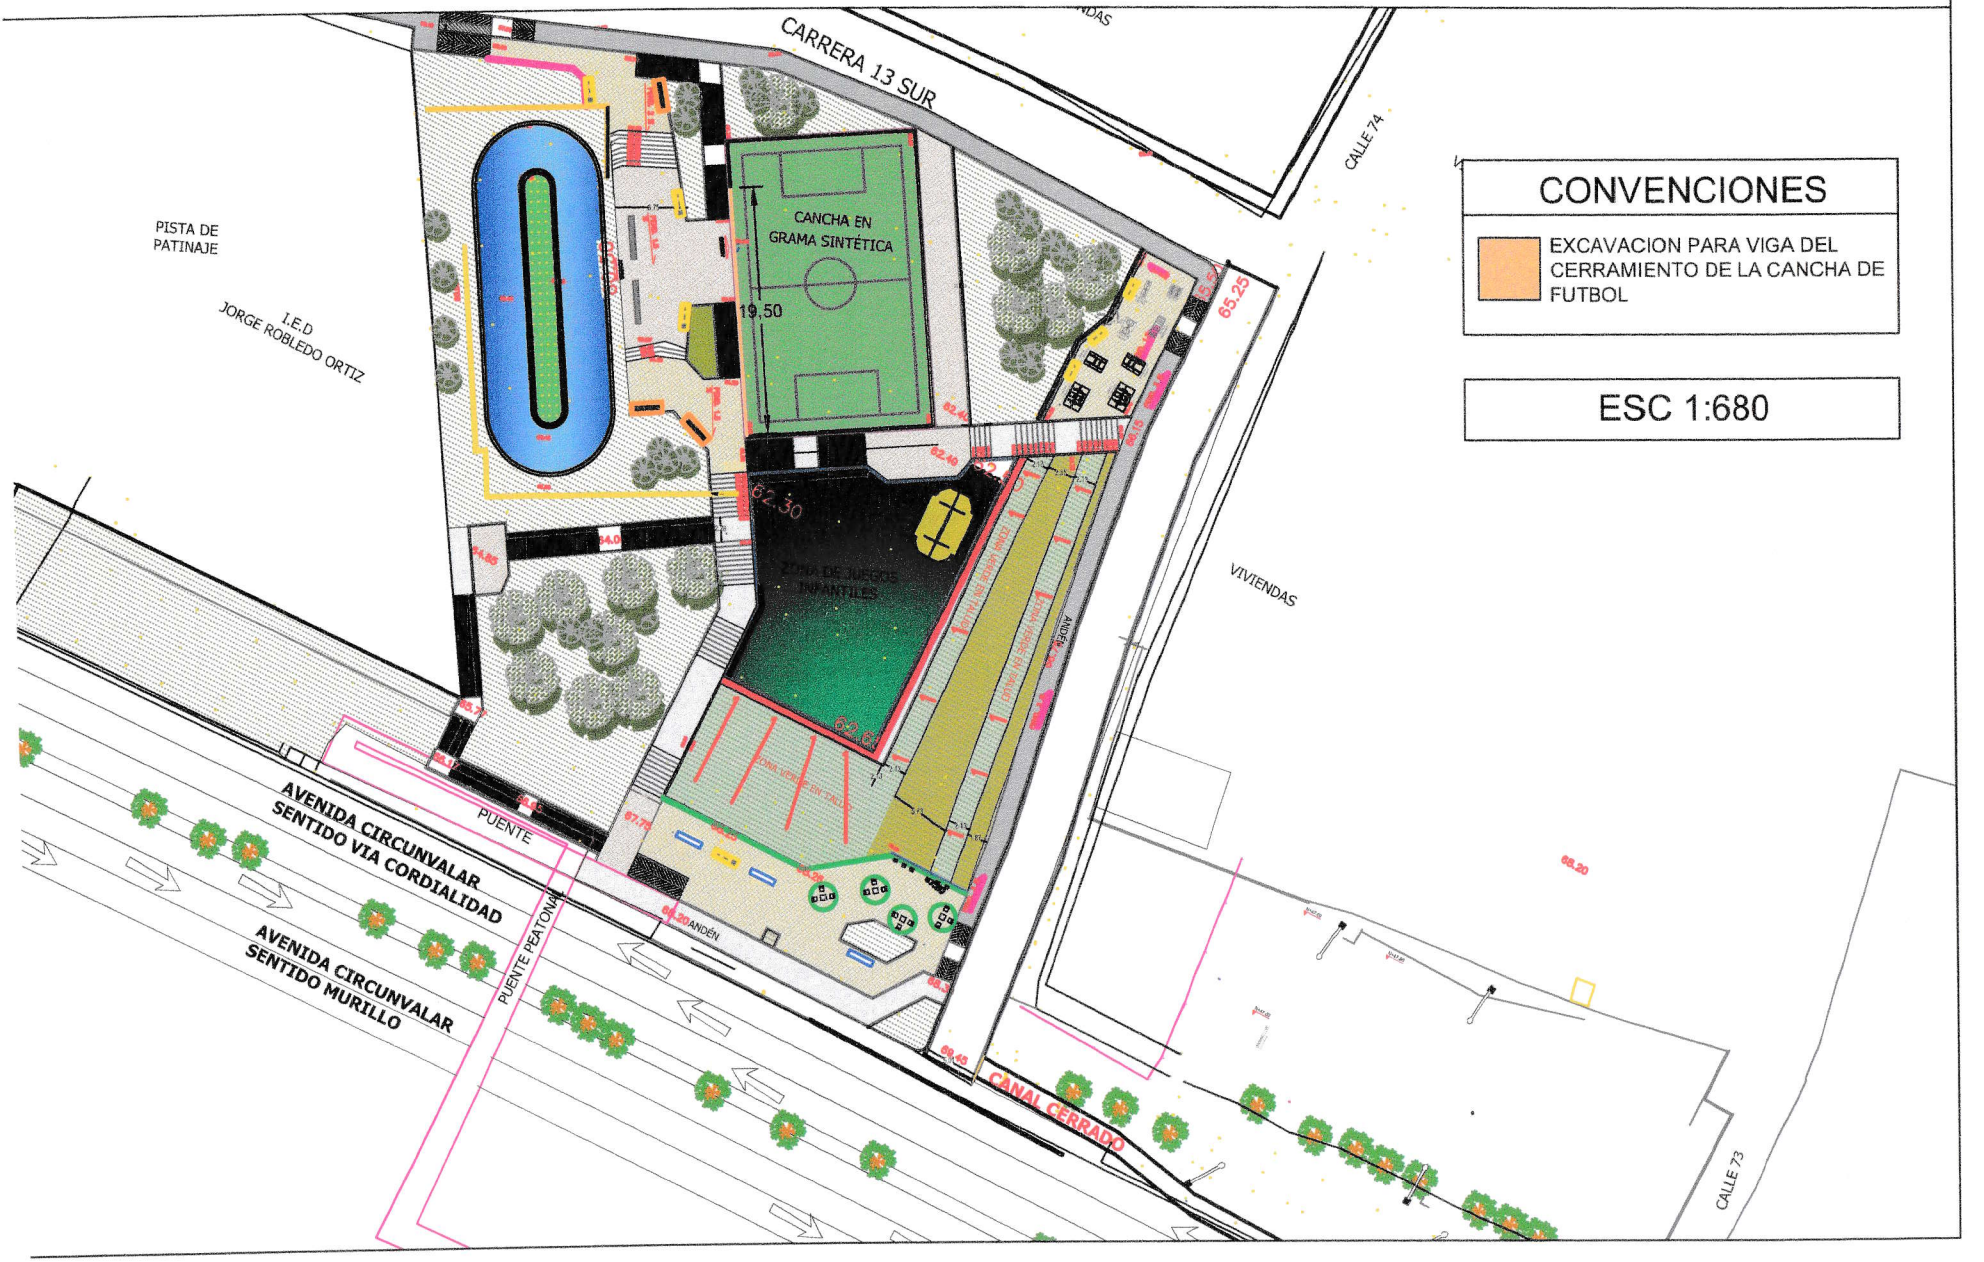

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°5

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	31 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	214	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30 X 0,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

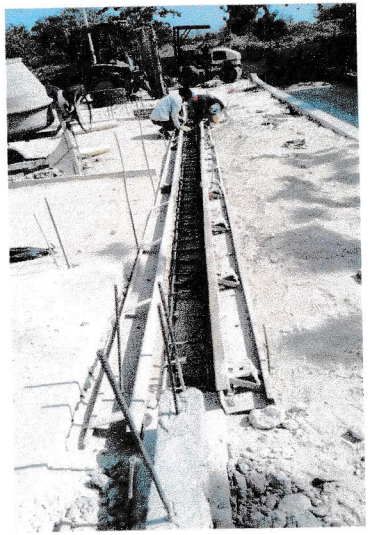




LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1.VIGA PERIMETRAL DE LOS ALCORQUES PARTE DE ABAJO	4,00			5,00	20,00		
2.VIGA DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE JUEGO DE LOS NIÑOS	48,90				48,90		
3. VIGA DE MURO DE CONTENCION DE LA ENTRADA CALLE PRINCIPAL	28,50				28,50		
4. VIGA ENTRE JARDINERA Y RAMPA DE LA ENTRADA PRICIPAL LADO DE LA ZONA DE JUEGO DE NIÑOS	10,30				10,30		
Cantidad contractual según modificartoria No.5	932,20						
Acumulado anterior	433,77						
Acumulado a presente acta	560,97						
Obra por ejecutar	371,23						
TOTAL PRESENTE ACTA:							107,70

OBSERVACIONES:

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
CARLOS VILLEGAS	HERMOGENES HEREIRA	DIEGO RADA

PLANO DE VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS

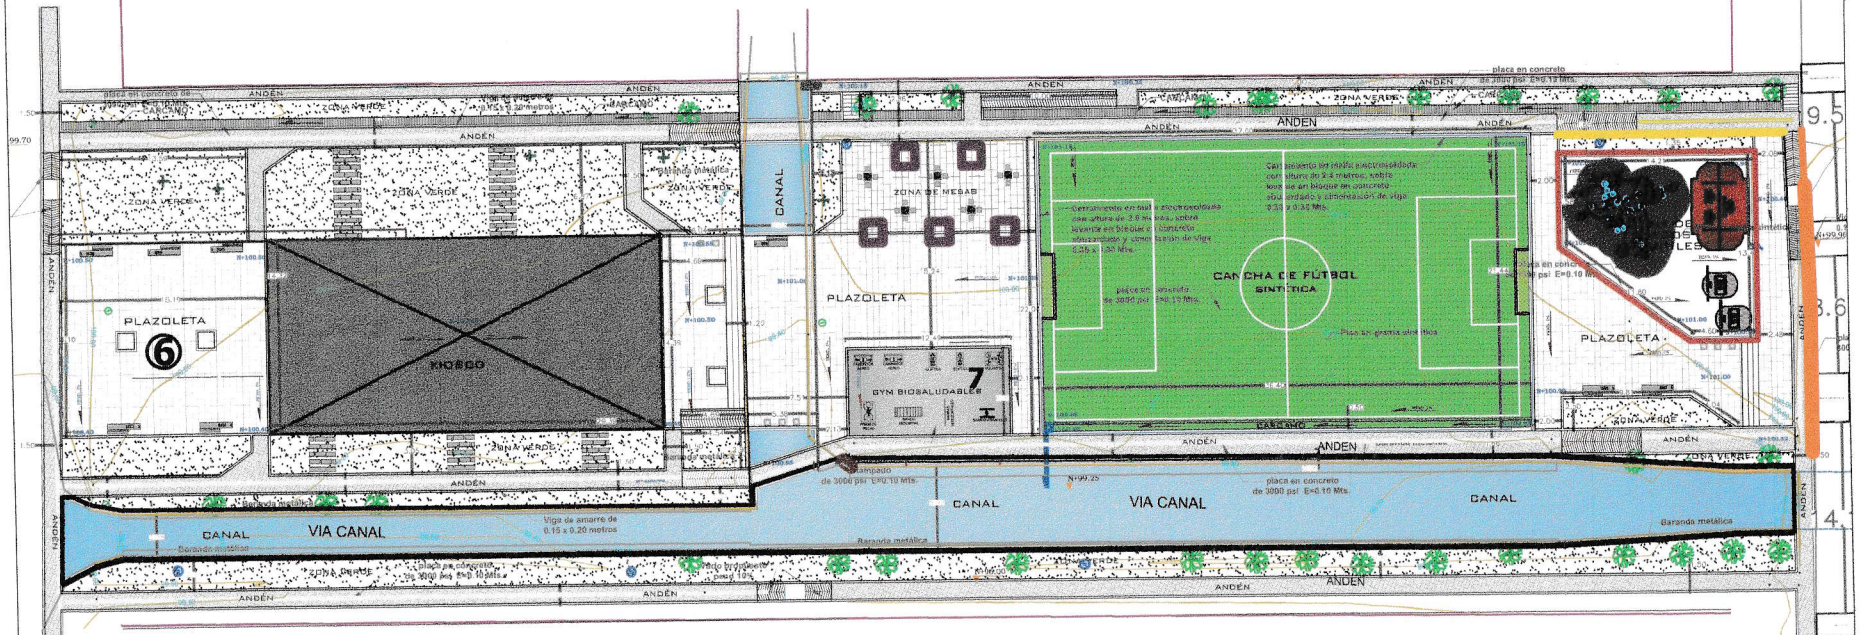

CONVENCIONES

- VIGA DEL CERRAMIENTO DE LA ZONA DE JUEGO DE LOS NIÑOS
- VIGA DE MURO DE CONTENCION DE LA ENTRADA CALLE PRINCIPAL
- VIGA ENTRE JARDINERA Y RAMPA DE LA ENTRADA PRICIPAL LADO DE LA ZONA DE JUEGO DE NIÑOS
- VIGA PERIMETRAL DE LOS ALCORQUES PARTE DE ABAJO

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°5

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	31 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	1141	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

PARQUE VILLA CORDIALIDAD

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

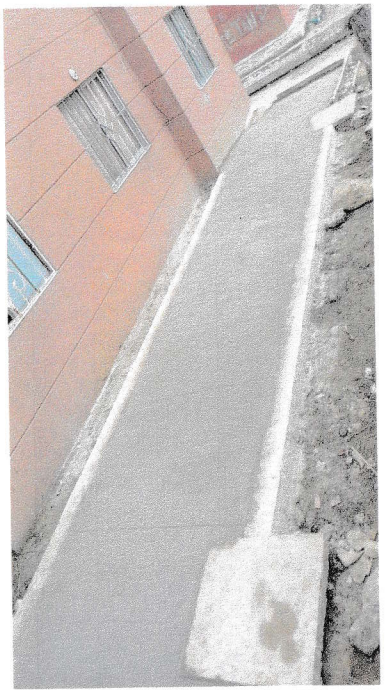



LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)		ML	M2	M3
1. PLACA PARA LA ZONA DE JUEGO DE NIÑOS AREA X AUTOCAD						173,52	
2. PLACA PARA ANDEN DEL LADO DERECHO DE LA CANCHA SINTETICA	74,47	1,20				89,36	
3. PLACA PARA ANDEN DEL LADO IZQUIERDO DE LA CANCHA SINTETICA	74,47	1,00				74,47	
4 PLACA PARA ANDEN DEL LADO DERECHO DE LA ZONA DEL SALON COMUNAL	50,50	1,10				55,55	
5. PLACA PARA ANDEN EXTERNO EN ZONA DE CANCHA LADO DE LOS EDIFICIOS	74,47	1,00				74,47	
6. PLACA PARA ANDEN EXTERNO EN ZONA DEL SALON SOCIAL LADO DE LOS EDIFICIOS	50,50	1,00				50,50	
7. PLACA ANDEN INTERNO LADO DEL MURO DE CONTENCION, EN ZONA DE SALON SOCIAL	50,50	1,30				65,65	
TOTAL PRESENTE ACTA:							583,52

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
CARLOS VILLEGAS	HERMOGENES HEREIRA	DIEGO RADA

OBSERVACIONES:
