ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°5

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	2 de 2

CONTRATO:	LP-001-2024		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	31 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2025			
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 1141	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

PARQUE JORGE ROBLEDO

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

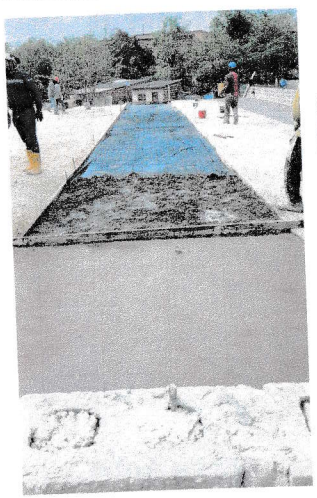



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
1. PLACA INTERNA DE LA PISTA DE PATINAJE, AREA POR AUTOCAD						56,66	
2. AREA DE CUNETA DE LA PISTA DE PATINAJE						15,20	
2. PLACA PARA LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	29,50	18,60				548,70	
Cantidad contractual según modificartoria No.5	**2900,00**						
Acumulado anterior	**1679,31**						
Acumulado a presente acta	**2883,39**						
Obra por ejecutar	**16,61**						
TOTAL PRESENTE ACTA:						620,56	

OBSERVACIONES: EL ÁREA DEL OVALO DE LA PISTA DE PATINAJE SE CALCULÓ POR AUTOCAD

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
CARLOS VILLEGAS	HERMOGENES HEREIRA	DIEGO RADA


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA N°5

Código:	IO-FM-29
Versión:	02
Fecha:	6/09/2021
Páginas:	1 de 1

CONTRATO:	LP-001-2024			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES, SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 4 "PARQUES, LOCALIDADES Y ESPACIOS DE CONFORMIDAD AL ANEXO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
PERIODO:	31 DE MARZO AL 30 DE MAYO DE 2025				
CAPITULO:	ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM:	78	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FIGURADO

PARQUE JORGE ROBLEDO

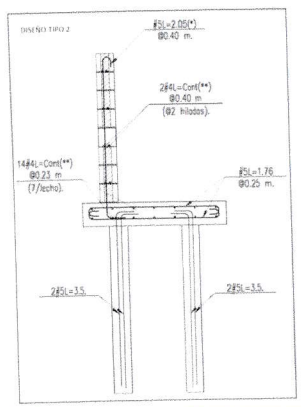





LOCALIZACION	DIMENSIONES				UND	CAN	TOTALES		
	KG/ML (m)	Long (ml)	Diametro (Ø)				M	M2	KG
1. ACERO FIGURADO CANAL CERRADO	1,00	88,20	#4	1/2"	KG	25,30			2231,46
2. ACERO LONGITUDINAL CANAL CERRADO	1,00	52,00	#4	1/2"	KG	25,30			1315,60
3. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 3) ACERO LONGITUDINAL TIPO 2 SEGUN DISEÑO	1,00	9,60	#4	1/2"	KG	4,00			38,40
4. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA PISTA DE PATINAJE (LADO 3) ESTRIBOS TIPO 2 SEGUN DISEÑO	0,56	1,00	#3	1/2"	KG	45,00			25,20
5. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA ELE DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA (LADO 1) ACERO LONGITUDINAL TIPO 2 SEGUN DISEÑO	1,00	30,50	#4	1/2"	KG	4,00			122,00
6. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA ELE DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA (LADO 1) ESTRIBOS TIPO 2 SEGUN DISEÑO	0,56	1,00	#3	1/2"	KG	135,00			75,60
7. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA (LADO LATERAL) ACERO LONGITUDINAL TIPO 2 SEGUN DISEÑO	1,00	33,00	#4	1/2"	KG	4,00			132,00
8. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA (LADO LATERAL) ESTRIBOS TIPO 2 SEGUN DISEÑO	0,56	1,00	#3	1/2"	KG	150,00			84,00
9. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA (LADO 2) ACERO LONGITUDINAL TIPO 2 SEGUN DISEÑO	1,00	20,00	#4	1/2"	KG	4,00			80,00
10. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA (LADO 2) ESTRIBOS TIPO 2 SEGUN DISEÑO	0,56	1,00	#3	1/2"	KG	100,00			56,00
11. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA PLAZOLETA 10 ACERO LONGITUDINAL TIPO 2 SEGUN DISEÑO	1,00	21,80	#4	1/2"	KG	4,00			87,20
12. ACERO PARA LA VIGA INTERMEDIA DEL MURO DE CONTENCION EN BLOQUE DE LA PLAZOLETA 10 ESTRIBOS TIPO 2 SEGUN DISEÑO	0,56	1,00	#3	1/2"	KG	100,00			56,00





13. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION TIPO 2 ENTRE LA PLAZOLETA 10 Y LA ESCALERA ACERO LONGITUDINAL	**1,00**	**17,30**	**#4**	**1/2"**	**KG**	**14,00**			**242,20**
14. ACERO PARA LA ZAPATA DEL MURO DE CONTENCION TIPO 2 ENTRE LA PLAZOLETA 10 Y LA ESCALERA ACERO TRANSVERSAL	1,56	1,76	#5	5/8"	KG	85,00			**233,38**
15. ACERO PARA ESCALERA ENTRE PLAZOLETA 10 Y MURO EN TIERRA ARMADA ACERO LONGITUDINAL	**1,00**	**30,20**	**#4**	**1/2"**	**KG**	**36,00**			**1087,20**
16. ACERO PARA ESCALERA ENTRE PLAZOLETA 10 Y MURO EN TIERRA ARMADA ACERO TRANSVERSAL	**1,00**	**3,20**	**#4**	**1/2"**	**KG**	**274,00**			**876,80**
17. ACERO PARA PILOTES TIPO 2 PARA MURO DE CONTENCION ENTRE LA PLAZOLETA 10 Y ECALERA	1,56	3,50	#3	3/8"	KG	128,00			698,88
Cantidad contractual según modificartoria No.5	**79361,53**								
Acumulado anterior	**61767,42**								
Acumulado a presente acta	**69209,34**								
Obra por ejecutar	**10152,19**								
TOTAL PRESENTE ACTA:									7.441,92

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. RESIDENTE INTERVENTORIA:	Vo.Bo. DIR INTERVENTORIA:
CARLOS VILLEGAS	HERMOGENES	DIEGO RADA

OBSERVACIONES:
