CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

Informe Mensual de Consultoría No. 01.

Contrato No.-2695-2023

Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda grupo AMV 2 Lote 10.

Versión 1.0

Periodo 28 de agosto al 30 de septiembre 2023.

Pereira Risaralda - octubre 2023.

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de avance No. 1 presentado por el Consorcio SUPERVISION VIAL A5, correspondiente a las actividades adelantadas durante el 28 de agosto al 30 de septiembre de 2023.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	30-09-2023		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el Consorcio SUPERVISION VIAL A5 en el marco del Contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, respecto al seguimiento mensual de las vías relacionadas y las cooperativas. De igual forma, se relaciona el estado administrativo, técnico y financiero del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Código: NA	Versión 1.0		
Autor	Consorcio SUPERVISION VIAL A5 – Equipo de contrato		
Revisó	CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN....5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....6
3. INFORMACIÓN LEGAL....10
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO....11
4.1. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO....12
4.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD....12
4.3. TIEMPO DE TRABAJO - JORNADAS DE TRABAJO....12
4.4. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA....14
4.5. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO AVANCE FÍSICO....14
4.6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO....14
5. INFORME SISO....15
5.1. ACTIVIDADES SISO REALIZADAS....15
6. GESTIÓN DOCUMENTAL....19
6.1. GESTIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE OFICIOS....19
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....22
8. ANEXOS....23
8.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO....23
8.2. BITÁCORA DE OBRA....28
8.3. INFORMES SEMANALES DEL ADMINISTRADOR VIAL....29
8.4. REGISTRO DE ASISITENCIA COMITES VIALES....30
8.5. NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL....31

ÍNDICE DE IMAGENES

IMAGEN 1 RUTA 5003 - SANTA CECILIA (PR 13+00) - ASIA 6
IMAGEN 2RUTA 2302- ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA 6
IMAGEN 3 RUTA 2507- REMOLINOS - CAUYA 7
IMAGEN 4 RUTA 25RSA - PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA 7
IMAGEN 5 RUTA 2902 - PUENTE MOSQUERA - AVENIDA CRUCE FERROCARIL 8
IMAGEN 6 RUTA 29RSA - VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO 8
IMAGEN 7RUTA 29RSB - VARIANTE GALICIA 9
IMAGEN 8 RUTA 50RS01 - APIA - LA VIRGINIA 9
Imagen 9 Chalecos Reflectivos. 16
Imagen 10 Equipos de emergencia 16
Imagen 11 Lista de Asistencia Capacitación Riesgos 17
Imagen 12 Capacitación de Riesgos 17
Imagen 13 Utilización Señales Viales 18

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 INFORMACIÓN LEGA DEL CONTRATO 10
TABLA 2 LISTADO DE REUNIONES 12
TABLA 3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 12
TABLA 4 LISTADO DE PERSONAL 15
TABLA 5. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 19
TABLA 6. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS ENVIADOS POR EL CONSORCIO DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 20
Tabla 7 . GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES AL CONSORCIO DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 21

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de mediante concurso de méritos CAM-DEO-008-2023, adjudicó el Contrato de Consultoría No. 2596 del 2023 al CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5 con el objeto de "*Brindar acompañamiento, técnico y financiero al Min TRANSPORTE en el desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, y regulatorias, por parte de los operadores y prestadores del servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Risaralda sectores 50RS01 Apia –La Virginia,5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, 25RSA paso por la Virginia, 29RSB Variante Galicia,29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira, 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar*", durante el período comprendido entre el 28 de agosto del 2023 y 28 de diciembre de 2023.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral 7 del literal C *"OBLIGACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES"* de la CLÁUSULA SEGUNDA del referido contrato, celebrado entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE RISARALDA** y el **CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5**, que establece:

> *"Entregar un informe mensual de avance que detalle las actividades desarrolladas en el período, en el último informe mensual de cada vigencia."*

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5 durante el período del presente informe, de conformidad con el desarrollo del Modelo de Vigilancia y Control, implementado por de *Min TRANSPORTE*.


El presente documento, se constituye como "*INFORME 01 DEL 28 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023*"

El presente informe hace relación a las actividades, documentación y demás actividades necesarias para la gestión y desarrollo, durante el periodo comprendido **del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2023** del Contrato de consultoría No **2695 DE 2023**, cuyo objeto es: **contrato de consultoría Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda grupo AMV 2 Lote 10.**

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Vías a cargo del instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Risaralda sectores 50RS01 Apia –La Virginia,5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, 25RSA paso por la Virginia, 29RSB Variante Galicia,29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira, 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar.

IMAGEN 1 RUTA 5003 - SANTA CECILIA (PR 13+00) - ASIA

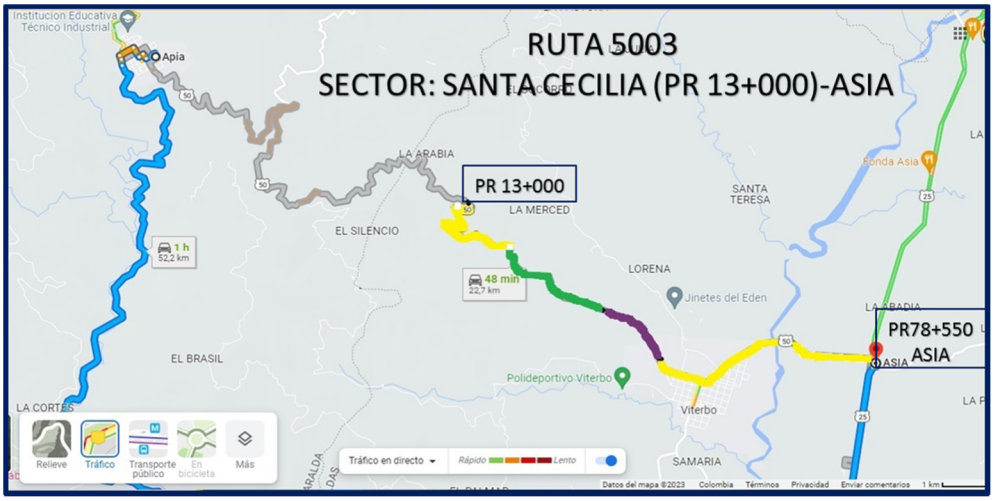

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 2RUTA 2302- ANSERMANUEVO-LA VIRGINIA



Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 3 RUTA 2507- REMOLINOS - CAUYA




Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 4 RUTA 25RSA - PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA




Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 5 RUTA 2902 - PUENTE MOSQUERA - AVENIDA CRUCE FERROCARIL

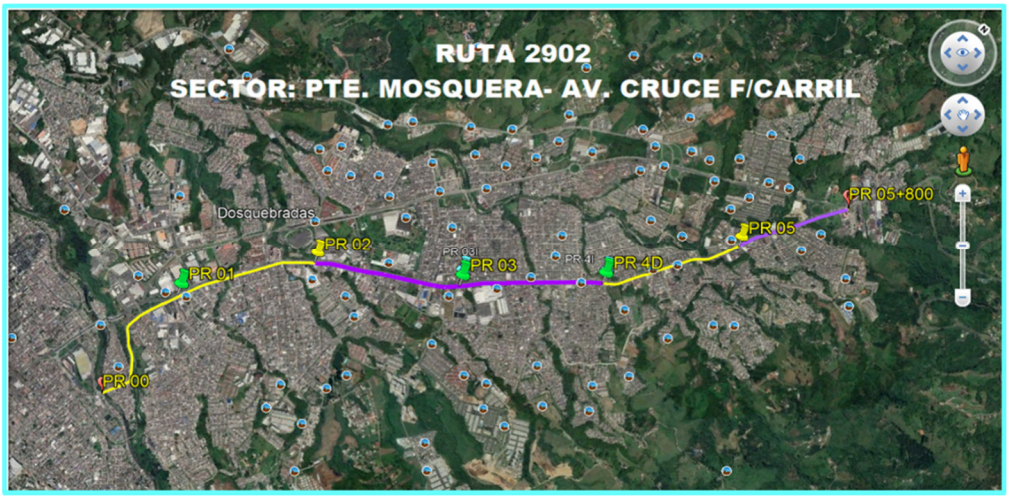

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 6 RUTA 29RSA - VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO

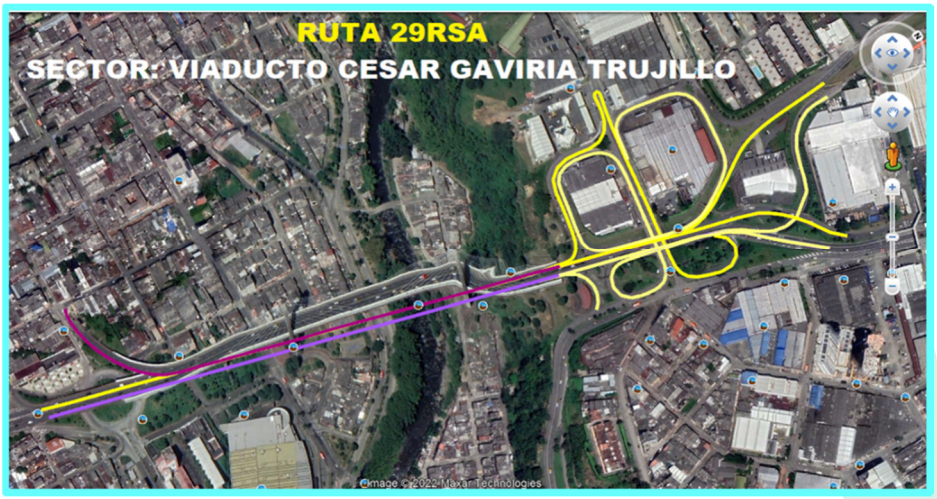

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 7RUTA 29RSB - VARIANTE GALICIA



Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 8 RUTA 50RS01 - APIA - LA VIRGINIA



Fuente: Elaboración Propia

3. INFORMACIÓN LEGAL

A continuación, se presenta la información legal correspondiente al Contrato de consultoría:

TABLA 1 INFORMACIÓN LEGA DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No 2695 DE 2023	
Objeto: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda grupo AMV 2 Lote 10.	
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5
NIT DE LA EMPRESA:	901734171-1
APODERADO - REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA JANNETH HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN OFICINA:	Diagonal 43 calle 43 No 7-16 – Dosquebradas - Risaralda
TELÉFONOS:	3156719235-3162243546
EMAIL:	Supervisionviala5@aciproyectos.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 283.776.853,00 M/cte.
FECHA DE INICIO:	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DICIEMBRE DE 2023.
PÓLIZAS INICIALES:	Póliza de cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 0 aprobado mediante oficio DT-RIS- 47006. Póliza de Cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 2. Aprobado mediante oficio 2023S-VRIS-003291.

Fuente: Elaboración Propia

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

Durante el período de este informe, el consorcio Supervisión Vial A5 adelanto las actividades estipuladas en el contrato de consultoría. Estas acciones fueron realizadas bajo la supervisión del Ing. Héctor Iván Gutiérrez Salazar, quien es un funcionario del INVIAS. Las actividades llevadas a cabo en el marco del Contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, incluyeron las siguientes acciones:

Seguimiento mensual de las vías objeto del contrato se realizó mediante recorridos, la inspección y control; el seguimiento a las cooperativas para este periodo no se generó toda vez que estas iniciarán actividades el 01 de octubre 2023.

Se relacionó el estado administrativo, técnico y financiero del contrato, durante el período del presente informe para los sectores (i) 50RS01 Apia – La Virginia, (ii) 5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, (iii) 25RSA paso por la Virginia, (iv) 29RSB Variante Galicia, (v) 29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira y (vi) 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar.

Se realizó el levantamiento de puentes (SIGP) de los puentes Mosquera, Nicole y Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, se hizo el reconocimiento de las vías a cargo, la falta de señalización de las vías, protección, obras a realizar, vandalismo, predios de invasión de la franja de INVIAS, etc.

Durante el período de este informe, no se ha recibido ninguna información que deba ser reportada a la plataforma Sukubum sobre el atropellamiento de fauna en la red vial que administra el Consorcio Supervisión Vial A5. No se han registrado incidentes de este tipo en el área bajo nuestra supervisión durante el período en cuestión.

El Consorcio Supervisión Vial A5, en colaboración con la supervisión del INVIAS, identificó la necesidad de mejorar la señalización en ciertas áreas específicas de las vías bajo nuestra administración. Las medidas incluyen reforzar las señales verticales y marcas viales en las siguientes vías: 50RS01, 29RSA, 2902, 2507 y 25RSA. Se han enfocado en las señales reglamentarias y preventivas, así como en las señales que indican curvas pronunciadas. En la vía 25RSA, se ha planificado reforzar las líneas logarítmicas, repintar los pictogramas de velocidad a 30 km/h y recuperar los pictogramas dañados. Además, en la vía 2902, se implementarán líneas antibloqueo para mejorar la seguridad vial en esa área específica. Estas acciones se están llevando a

cabo para garantizar un entorno de conducción seguro y eficiente en las vías que supervisamos, el registro se presenta en el anexo 8.5 “Necesidad de Señalización Vertical”.

4.1. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de la ejecución de la administración vial, se han adelantado las siguientes reuniones:

TABLA 2 LISTADO DE REUNIONES

ID	Fecha	Participantes	Tema
1	30/08/2023	Territorial Risaralda Administración vial	Reunión Inicial de Seguimiento
2	05/09/2023	Territorial Risaralda Administración vial	Planos Puentes faltantes AMV anterior
3	13/09/023	Territorial Risaralda Y Bogotá.	Capacitación Gestión del Riesgo

Fuente: Elaboración Propia

4.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Durante el periodo del 28 de agosto al 30 de septiembre no se suministraron insumos ya que las cooperativas no iniciaron actividades hasta el 01 de octubre de 2023.

TABLA 3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Tipo	Estado
Materiales	Inicio de Actividades en octubre
Procesos Constructivos	Inicio de Actividades en octubre
Maquinaria	Inicio de Actividades en octubre

Fuente: Elaboración Propia

4.3. TIEMPO DE TRABAJO - JORNADAS DE TRABAJO

Se desarrollan sin novedad, lunes a viernes de 7 am. a 5 pm y sábados de 7 am. a 12 m; jornadas normales a excepciones de las siguientes novedades:

El día 24 de septiembre de 2023, en horas de la noche con altas precipitaciones y fuertes vientos, se presentó la caída de un árbol, chamizos y dejaron dos guaduas en riesgo de caer a la vía en la ruta 2507- PR 48+0850 y PR 45+0600 (Cerritos –

Cauya), con apoyo del cuerpo de bomberos de Anserma Nuevo se atendió la emergencia y al siguiente día con el apoyo de la cooperativa comuneros se realizó el corte y retiro de escombros y despeje de la vía


El día 25 de septiembre Ruta 5003 PR 74 +0700 Santa Cecilia-Asia se presentaron fuentes vientos que tumbaron tres árboles con el apoyo de la cooperativa comuneros se realizó el corte y retiro de escombros y despeje de la vía.

4.4. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Durante el mes de septiembre la mayoría del tiempo fue seco, se presentaron lloviznas los días 24 y 25 con una gran cantidad de precipitaciones y fuertes vientos, tal como se registró en el reporte diario AMV 2023.

4.5. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO AVANCE FÍSICO

Para este período el consorcio lleva un avance en tiempo del 27,50% correspondiente al periodo del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2023, en donde para agosto entre el 28 y el 31 de agosto corresponde a un 2.5% y para el periodo del 01 al 30 de septiembres es del 25.00% ; en cuanto al avance financiero del 18.03% equivalente a $51.169.463, esta diferencia se presente de acuerdo con lo estipulado en la forma de pago, en donde corresponde a los costos fijos de personal y costos variables de acuerdo con los soportes de los costos incurridos.

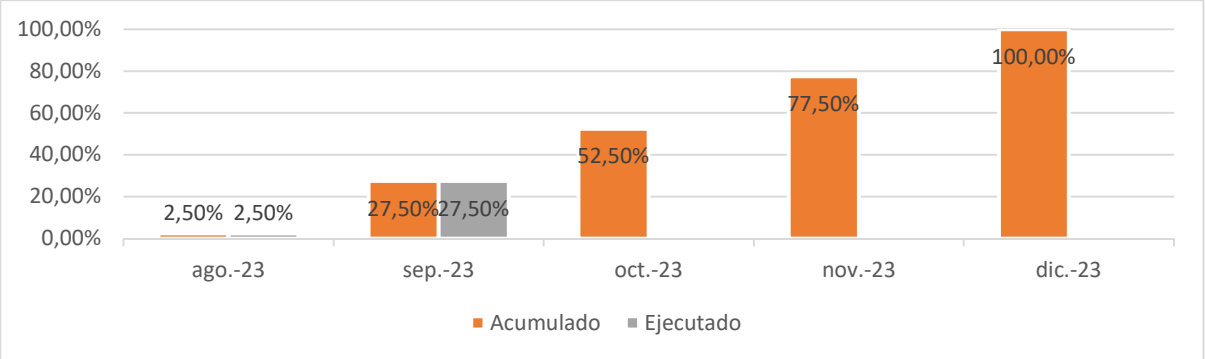

4.6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO

A la fecha se han definido actividades relacionadas con el proyecto y que hacen parte de del cronograma de la administración vial como son las señalizaciones, elementos de protección de las vías y las obras a adelantar que generan riesgo en los sectores solicitados los cuales son:

- El puente La Víbora en la Ruta 2902 PR 71+0805 Dosquebradas, presenta obstrucción del flujo por mole de concreto que el contratista del puente dejo (soporte de la formaleta) y acumulación de material de arrastre ya que la obra anterior canal en concreto no entrega directamente en el puente.
- El puente Mocatán en la Ruta 50RS01 PR 31+0200 en La Virginia que presentan obstrucción del flujo ya que colapso una parte del muro de contención margen izquierda aguas arriba, lo que no permite que el flujo siga su rumbo natural y se acumule basura y material antrópico represándose este material en el pilón central del puente.

5. Informe SISO

Dentro de este periodo la Supervisión verificó dentro del trámite del acta de costos la afiliación del personal y el pago de la seguridad social y los parafiscales, del siguiente personal:

TABLA 4 LISTADO DE PERSONAL

Cargo	Nombre	Fecha radicado soportes
Ingeniero Residente	Jose Olmis Gonzalez H.	04/09/2023
Ingeniera Auxiliar	Kelly Ramírez Cuervo	14/08/2023
Inspector SISO	Martha Mancera	14/08/2023
Tecnólogo y/o inspector Vial	Jhon Jairo Vargas	20/09/2023
Conductor	Javier ortega Ríos	14/08/2023

Fuente: Elaboración Propia

5.1. ACTIVIDADES SISO REALIZADAS

Recomendaciones frente a la importancia del uso de chalecos reflectivos como elemento de protección personal cubriendo el torso del trabajador proporcionando alta visibilidad, utilización del casco, gafas, botas de seguridad, tapa oídos.

Se recomienda que el chaleco cumpla con las características especiales para actividades que necesitan mayor nivel de visibilidad debido a que existe un alto peligro en el desarrollo de la actividad, de ser posible estas prendas debe ser en materiales fluorescentes y reflectivos.

Material fluorescente: tiene la función de transformar la luz ultravioleta invisible en luz visible. Por esta razón, es ideal para establecer visibilidad nocturna. Los colores utilizados en este material son verde, amarillo, naranja y rojo.

Imagen 9 Chalecos Reflectivos.



Fuente: Elaboración Propia

Se realiza instalación de equipos de Emergencia en el punto de atención, Botiquín, camilla y extintor

Imagen 10 Equipos de emergencia



Fuente: Elaboración Propia

Capacitación Gestión del Riesgo: se realiza acompañamiento el 13 de septiembre 2023,en la que se trató además del cumplimiento normativo, se analizó el contexto de los trazados viales en el territorio, se evidencia que las amenazas recurrentes sobre la infraestructura expuesta se relacionan con los movimientos en masa y las inundaciones, surgidas de causas inherentes relacionadas con el territorio diverso en el que se emplaza, por lo que se evidencia que guarda alta complejidad y plantea la necesidad de ampliar el área de análisis para visibilizar el origen de los eventos adversos sobre el trazado vial en sus dimensiones físicas, sociales, ambientales y económicas.

Imagen 12 Capacitación de Riesgos



Imagen 11 Lista de Asistencia Capacitación Riesgos



Fuente: Elaboración Propia

La importancia de la señalización para llamar la atención a los conductores e informaran el área de trabajo, trabajadores y equipos.

Las barricadas, los paneles verticales, barriles y conos son las señales transitorias más utilizadas para advertir a los conductores sobre las condiciones peligrosas en las zonas de trabajo de las vías. Por la noche, pueden estar acompañadas por luces de advertencia.

Imagen 13 Utilización Señales Viales






Fuente: Elaboración Propia

Se realizó las inspecciones Preoperacionales del Vehículo asignado al proyecto.



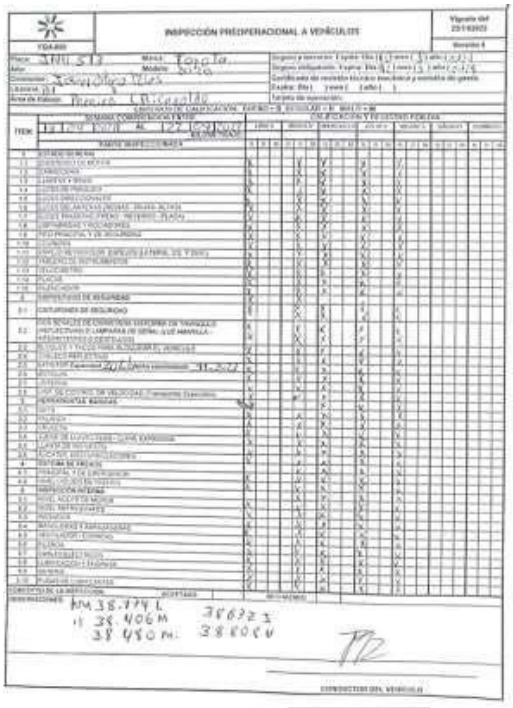

Fuente: Elaboración Propia

6. Gestión documental

En las siguientes tablas se presenta la relación de oficios remitidos y recibidos del MinTransporte durante el periodo del presente informe relacionados con el contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, celebrado entre INVIAS y el Consorcio Supervisión Vial A5.

6.1. Gestión documental mediante oficios

Durante este periodo se recibieron oficios por parte del INVIAS al Consorcio Supervisión Vial A5, los cuales se listan a continuación:

TABLA 5. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Resolución 03340	Correo	22/09/2023	Resolución “Clásico RCN 2023”
Resolución 03341	Correo	22/09/2023	Resolución Evento “XXVIII Vuelta a Colombia Máster 2023”
2023S-VRIS-005602	Correo	20/09/2023	Presentación directorio de emergencia y video inicial vías a cargo.
2023S-VRIS-005396	ENT-23-018947	19/09/2023	Presentación directorio de emergencias y video inicial vías a cargo.
Resolución 20233040025285	Correo	18/09/2023	Resolución Parametro de las Vallas.
2023-VRIS-004231	ENT-23-018583	13/09/2023	Solicitud elementos de logística Cto. 2695-2023
2023S-VRIS-003291	ENT-23-018332	11/09/2023	Aprobación Póliza de cumplimiento No 11-44-101205943 anexo 2
2023S-VRIS-002005	MAIL-23-07391	05/09/2023	Observaciones documentos del Vehículo.
DT-RIS 640229	CORREO	30/08/2023	Manual Sukubum
2023I-VBOG-001329	ENT-23-018433	28/08/2023	Solicitud Concepto de viabilidad para el Clásico RCN 2023

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
2023S-VRIS-000319	ENT-23-017372	24/08/2023	Aprobación hoja de Vida de Ingeniero Residente e ingeniero Auxiliar.
2023S-VRIS-000727	ENT-23-017578	20/08/2023	Orden de Inicio contrato No. 2695-2023
DIT-RIS-47804	ENT-23-017055	16/08/2023	No cumple hoja de vida ingeniero residente.
DIT-RIS-47006	ENT-23-016688	14/08/2023	Aprobación Póliza cumplimiento no. 11-44-101205943 anexo 0.

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente se presenta el detalle de los oficios enviados por el Consorcio Supervisión Vial A5 al MinTransporte a cargo de la dirección Territorial de Risaralda:

TABLA 6. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS ENVIADOS POR EL CONSORCIO DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Correo	SAL-23-014207	04/09/2023	Cumplimiento Requerimiento mínimo del vehículo.
2023E-VUVRAZ-006065	SAL-23-014302	05/09/2023	Especificaciones GPS “V30 PLUS”
Correo	SAL-23-014286	05/09/2023	Entrega Especificaciones Dron “Matrice 200”
20230906-24316	Correo	06/09/2023	Reporte Accidentalidad Alcaldía Dosquebradas.
Correo	SAL-23-014655	13/09/2023	Respuesta Radicada 2023S-VRIS-002005 Observaciones de información sobre Vehículo.
Correo	SAL-23-014654	13/09/2023	Viabilidad Vuelta RCN 2023
2023E-VUVRAZ-010845	SAL-23-014714	14/09/2023	Hoja de vida Tecnólogo y/o Inspector Vial
Correo	SAL-23-014861	18/09/2023	Entrega Logística Administración Vial Grupo 2, Lote 10. Respuesta

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
			radicada 2023S-VRIS-004231.
20233040025285-20-06-2023	Correo	18/09/2023	Resolución Valla completa 20233040025285.
2023E-VUVRAZ-010256	SAL-23-014859	18/09/2023	Invasión Malla faja de vía 50RS01 Apia-La Virginia
Correo	SAL-23-015068	21/09/2023	Oficina Dispuesta para la ejecución del proyecto Dosquebradas – Risaralda.
2023E-VUVRAZ-011361	SAL-23-015077	21/09/2023	Directorio de Emergencia en atención al radicado 2023S-VRIS-005602.
2023S-VRIS-007301	Correo	25/09/2023	Rechazo Pólizas Contrato No. 3150 de 2023. “Cooperativa de Trabajo Asociado el Centro”
2023S-VRIS-008738	Correo	29/09/2023	Aprobación Pólizas contrato No. 3150 de 2023 “Cooperativa de Trabajo Asociado el Centro”

Fuente: Elaboración Propia

Lo siguientes oficios fueron enviados por entidades diferentes al INVIAS

Tabla 7 . GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES AL CONSORCIO DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
20230906-24316	Correo	06/09/2023	Respuesta Solicitud de Accidentalidad Alcaldía Municipal de Dosquebradas

Fuente: Elaboración Propia

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentan las actividades realizadas por el Consorcio SUPERVISION VIAL A5 en el marco del Contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, respecto al seguimiento mensual de las vías con los respectivos recorridos, inspección y seguimiento y relacionadas y las cooperativas que prestaron apoyo el día 24 y 25 de septiembre se relacionan e inician labores legales el 01 de octubre de 2023; se realizó el levantamiento de puentes (SIGP) de los puentes Mosquera, Nicole y Viaducto Cesar Gaviria Trujillo, se hizo el reconocimiento de las vías a cargo, la falta de señalización de las vías, protección, obras a realizar, vandalismo, predios de invasión de la franja de INVIAS, etc.

Para este período el consorcio lleva un avance en tiempo del 29,90% correspondiente al periodo del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2023.

Se presenta un avance financiero del 18.03% equivalente a $51.169.463.


8. ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSPECCIÓN VISUAL PUENTE MOSQUERA



INSPECCIÓN VISUAL PUENTE NICOLE



CAPACITACIÓN ARL SURA



INSPECCIÓN VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO



MEDICIÓN DE ELEMENTOS PUENTE



ATENCIÓN DERECHO DE PETICIÓN RUTA 50RS01



CAPACITACIÓN GESTIÓN DEL RIESGO



RECORRIDO VIAS-VIAS ALTERNAS



SEGUIMIENTO RUTA 50RS01



VIDEO PARA PRESENTAR ESTADO DE LAS VIAS



ATENCIÓN CAÍDA DE ÁRBOLES RUTA 2507



DESPEJE DE LA VÍA RUTA 2507 PR40+0650



ATENCIÓN CAÍDA DE ÁRBOLES RUTA 2507



CORTE Y DESPEJE DE LA VÍA PR48+0900



CAÍDA ÁRBOL RUTA 5003 PR74+0700



ATENCIÓN CAÍDA DE ÁRBOLES RUTA 5003



CAÍDA ÁRBOL RUTA 5003 PR41+0450



RUTA 5003 PR41+0450



RUTA 2507 PR 45+0000



GAVIÓN EN RIESGO DE COLAPSAR



RUTA 2507 PR 45+0000



DERRUMBE RUTA 2507 PR 45+0000



RUTA 2507 PR 43+0000



PR 43+0000 DERRUMBE LATERAL DEL MURO



RUTA 2507 PR 44+0300



ASENTAMIENTO DE LA VÍA PR 44+0300



DERRUMBE RUTA 2902 PR 5+0213



RUTA 2902 PR 5+0213



RUTA 2902 PR4+0600



RUTA 2902 ASENTAMIENTO PR4 +0600

8.2. BITÁCORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra del período del mes de agosto 28 al 30 de septiembre 2023 correspondiente al informe.

8.3. INFORMES SEMANALES DEL ADMINISTRADOR VIAL

Se anexa copia de los informes semanales correspondiente al período del 28 de agosto al 30 de septiembre 2023.

8.4. REGISTRO DE ASISITENCIA COMITES VIALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGISTRO DE PARTICIPANTES

Código	ABIENS-FR-3
Versión	1
Página	1 de 1

PROCESO:
TEMA:
Quien convoca reunión: Hector Ivan Gutierrez
Cargo: Profesional Especializado
Lugar de reunión:
Fecha:
Hora de inicio:
Hora Finalización:

NOMBRE	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	E-MAIL	FIRMA
José Oliver González	ACI Proyectos	Residente Interventoría	3134919592	[illegible]	
Kelly J. Ramirez C	INV AUX-ACI P.	INV AUXILIAR.	3005692291	Kjramirez.civil@gmail.com	
Martha Lucía Hernandez	ACI proyectos	Ingeniera Soso	3104190246	malumata729@gmail.com	
Pablo Andrés Ramírez Acuña	DT - Risaralda	Profesional Universitario	3145560898	praramirez@invias.gov.co	
Hector Iv Gutierrez Soler	" " "	Profesional especializado	3197027468	higutierrez@invias.gov.co	
Carlos Eduardo Zaluaga Mejia	Invias/DT Risaralda	Profesional Especializado	3204910766	czaluaga@invias.gov.co	

Formato registro Participantes Reunion interna / Externa

ASITENCIAL COMITÉ VIAL No 1

8.5. NECESIDADES DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
