CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME

Fecha: 29 DE ABRIL DE 2025

PARA: GOBERNACION DE BOYACA

DE: JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO.
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

ASUNTO: INFORME DE INTERVENTORIA N° 16

PERIODO: 18 DE MARZO DE 2025 AL 17 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE OBRA: 001 DE 2023 "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTALAFECTADA PORTEMPORADA DELLUVIAS ENMUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 2567 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Yo, JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1010200976, en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE identificada con Nit 901719548-1 en calidad de interventor del contrato de obra N° 001 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.", celebrado entre el Departamento de Boyacá y NYS CONSTRUCOL S.A.S, PRESENTO el informe de interventoria N° 16 del periodo 18 de Marzo de 2025 al 17 de Abril de 2025 y CERTIFICO que toda la información contenida en este informe y los documentos soporte del mismo, es veraz y corresponde al seguimiento de las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato de obra N° 001 de 2023.

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
C.C 1.010.200.976

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
OSVALDO ENRIQUE SANCHEZ BOLIVAR
Fecha: 17/06/2025

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**16**		FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025			
PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

CONTRATO No:	**1**	DE	**2023**	REGISTRO BP Y P No	**N.A.**

OBJETO:

"CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTALAFECTADA POR TEMPORADA DELLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

Provincia de norte en el departamento de Boyacá (En los Municipios; Viracacha, Chitaraque, Campohermoso, Paez, San Mateo, San Eduardo, Santa Maria y El Cocuy)

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

CONECTIVIDAD SEGURA PARA UN BOYACÁ GRANDE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
N&S CONSTRUCOL S.A.S	**JHONATAN BRAYAN MENESES SÁNCHEZ**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE R.L JUAN FRANCISCO PACHON	**JAVIER IVAN BARRETO PINTO**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA No. 1	N/A	OCHO (8) MESES
2	PRORROGA No. 2	N/A	CINCO (5) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

VALOR INICIAL:	$ 1,259,433,527.00	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 1,259,433,527.00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	21	de	MAYO	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	21	de	MAYO	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**94.10%**	% DE AVANCE DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**85.9%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**85.9%**



Se requiere reprogramacion de acuerdo al tramite del modificatorio No. 4 una vez se publique en la plataforma del SECOP II

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

No PÓLIZA	14-44-101171029	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							11/02/2025		

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento del Contrato	6	9	2023	1	12	2025	$ 188.915.029,05
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	6	9	2023	21	5	2025	$ 377.830.058,10
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	6	9	2023	1	12	2027	$ 188.915.029,05
Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 3 años, 0 meses y 1 día						$ 251.886.705,40

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA									
Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual									
No PÓLIZA	14-40-101052221	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							12/02/2025		

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Predios Labores y Operaciones	6	9	2023	21	5	2025	$ 260.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	6	9	2023	21	5	2025	$ 260.000.000,00
Vehiculos propios y no propios	6	9	2023	21	5	2025	$ 260.000.000,00

ESTADO DEL TIEMPO							
BUENO		REGULAR		MALO		PÉSIMO	

Descripción: El presente informe, que abarca el periodo del 18 de marzo de 2025 al 17 de abril de 2025, no se realizaron activiades de obra por tramites correspondientes al modificatorio No. 4.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	6	9	2023
ACTA DE SUSPENSION 1	28	12	2023
ACTA DE REINICIO 1	18	4	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
1. MUNICIPIO DE VIRACACHA -SECTOR SECTOR PUERTO GENARO, VÍA CIENEGA	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**5°25'20,5'' N, 73°16'51,4'' W**
2. MUNICIPIO DE CHITARAQUE	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 6`` PERFORADA	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TECDREN	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	**6°02'53,1'' N, 73°26'34,2'' W**
3. MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-CORREDOR MACANAL-CAMPOHERMOSO-PAEZ	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**5°04'38,6'' N, 73°04'32,7''W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**5°03'02,6'' N, 73°05'27,1'' W**

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**5°03’02,6’’ N, 73°05’27,1’’ W** **5°04’38,6’’ N, 73°04’32,7’’W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**5°03’02,6’’ N, 73°05’27,1’’ W** **5°04’38,6’’ N, 73°04’32,7’’W**
DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	**5°04’38,6’’ N, 73°04’32,7’’W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**5°04’38,6’’ N, 73°04’32,7’’W**
CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	**5°04’38,6’’ N, 73°04’32,7’’W**
SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	**5°04’38,6’’ N, 73°04’32,7’’W**
PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	**5°04’38,6’’ N, 73°04’32,7’’W**
PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	**5°04’38,6’’ N, 73°04’32,7’’W**
MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**5°04’38,6’’ N, 73°04’32,7’’W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	**5°03’02,6’’ N, 73°05’27,1’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	**5°03’02,6’’ N, 73°05’27,1’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**5°03’02,6’’ N, 73°05’27,1’’ W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**5°03’02,6’’ N, 73°05’27,1’’ W**
4. MUNICIPIO DE PAEZ	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**5°05’43,9’’ N, 73°03’29,4’’ W** **5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	**5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	**5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**5°05’43,9’’ N, 73°03’29,4’’ W** **5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**5°05’43,9’’ N, 73°03’29,4’’ W** **5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**5°05’43,9’’ N, 73°03’29,4’’ W** **5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	**5°05’43,9’’ N, 73°03’29,4’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	**5°05’43,9’’ N, 73°03’29,4’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**5°05’43,9’’ N, 73°03’29,4’’ W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**5°05’39,5’’ N, 73°03’50,5’’ W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**5°05’43,9’’ N, 73°03’29,4’’ W**
5. MUNICIPIO DE SAN MATEO	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**6°23’37,95’’ N, 72°33’30,3’’ W**
7. MUNICIPIO DE SANTA MARIA	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**4°49’56,8’’ N, 73°15’37,7’’ W** **4°49’47,62’’ N, 73°15’33,98’’ W** **4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**4°49’56,8’’ N, 73°15’37,7’’ W** **4°49’47,62’’ N, 73°15’33,98’’ W** **4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**4°49'56,8'' N, 73°15'37,7'' W 4°49'47,62'' N, 73°15'33,98'' W 4°48'21.5"N, 73°15'52.2"W**
8. MUNICIPIO DE EL COCUY	
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
PEDRAPLEN COMPACTO	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**
MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**6°20'13,2'' N, 72°27'57,4'' W**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se realizó visita con el supervisor del contrato el día 3 de abril para revisión de las obras y entrega de los tres puntos en el municipio de Santa María.	Santa Maria
Revisión y verificación de planillas de Seguridad Social y Parafiscales del contratista del mes de Marzo de 2025.	N/A
Brindar el acompañamiento necesario para el levantamiento de las actas de entrega y actas de vecindad de cierre, debidamente diligenciadas y suscritas, para los frentes en los que se hayan finalizado actividades dentro del periodo del presente informe.	N/A
Verificar que el consultor ejecute las actividades de obra conforme a las normas generales y las especificaciones técnicas vigentes aplicables al proyecto.	N/A
Se elabora el informe mensual No. 16 del contrato de Interventoría correspondiente al periodo entre el 18 de marzo de 2025 al 17 de abril de 2025.	N/A
La interventoría realizó el acompañamiento y supervisión de los tramites administrativos correspondientes al periodo de ejecución	N/A

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
	NO APLICA		

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
	NO APLICA	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
	NO APLICA		

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		$ 377,830,058.10
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 377,830,058.10**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		
ACTA PARCIAL No.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0.00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
18/03/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-106. Observaciones Informe 13	Radicado Vía Correo Electrónico
26/03/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-107. Ratificacion Aval Suspensión del Cto de obra	Radicado Vía Correo Electrónico
26/03/2025	SECRETARIA DE CONTRATACION - Procesos de Seleccion JAVIER IVAN BARRETO PINTO Supervisor Gobernacion de Boyacá	C.I.P-2567-2024-108. Información demora trámite de Modificatorio de obra	Radicado Vía Correo Electrónico
2/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-109. ACTA PARCIAL DE OBRA N.1 v2	Radicado Via Correo Electronico
10/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-110. Entrega Informe Mensual N 15	Radicado Vía Correo Electrónico
10/04/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	C.I.P-2567-2024-111. Respuesta tramite modificatorio N°4	Radicado Vía Correo Electrónico
10/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-112. Subsanacion de Observaciones Informe Mensual N 14	Radicado Vía Correo Electrónico
10/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-113. Respuesta a su comunicado S-2025-000517-INFDDIV SUBSANACION DE OBSERVACIONES ACTA PARCIAL No. 1.	Radicado Vía Correo Electrónico
14/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-114. Subsanacion de Observaciones Informe Mensual N 14	Radicado Vía Correo Electrónico
14/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-115. Respuesta a su comunicado S-2025-000483-INFDDIV Trámite permiso ocupación del cauce - CORPOCHIVOR Remisión de documentos solicitados mediante auto de 0095 del 12 de Marzo de 2025	Radicado Vía Correo Electrónico
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
18/03/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	G.B.-C.O.-2024-057. Respuesta al auto 0076 de 06 de marzo de 2025, con radicado 2024EE12869.	Radicado Via Correo Electronico
20/03/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	S-2025-000411-INFDDIV. Respuesta a comunicación C.I.P-2567-2024-105 - Avance de tramites POC	Radicado Via Correo Electronico

27/03/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	S-2025-000444-INFDDIV. Programación visita técnica. Santa Maria	Radicado Via Correo Electronico
4/04/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	S-2025-000483-INFDDIV	Radicado Via Correo Electronico
2/04/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	G.B.-C.O.-2024-058. Entrega de observaciones acta parcial No 1.	Radicado Via Correo Electronico
11/04/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	G.B.-C.O.-2024-058 A. Respuesta al auto 0095 de 12 de marzo de 2025	Radicado Via Correo Electronico
11/04/2024	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	S-2025-000530-INFDDIV. Devolución Informe de Interventoría No. 14	Radicado Via Correo Electronico

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
Isduar Humberto Paez Ramos	C.C 4.158.923	X	X	X	18	3	2025	17	4	2025
Sonia Malena Marín Sotelo	C.C 1.053.340.500	X	X	X	18	3	2025	17	4	2025

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Obra	Isduar Humberto Paez Ramos	C.C 4.158.923
Residente de Obra	Sonia Malena Marín Sotelo	C.C 1.053.340.500

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de Interventoría	Juan Francisco Pachon Roncancio	C.C 1.010.200.976
Residente de Interventoría	Laura Yaneth Rodriguez Berdugo	C.C 1.057.589.899

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se realizó visita previa el día 31 de marzo del 2025 por parte de Corpochivor al municipio de San Eduardo para la generación del permiso de ocupación del cauce.	San Eduardo

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
NO APLICA	

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA DE VACIADO dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN			
I.N.V.E - 410 -13. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO - COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETO DE ZANJA DE CORONACION (SAN MATEO)	18	2	2025	Resistencia de diseño (P.S.I)	2500 PSI	Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I)	2604,46 PSI
I.N.V.E - 410 -13. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO - COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETO DE ZANJA DE CORONACION Y SECCION FILTRANTE (SAN MATEO)	19	2	2025	Resistencia de diseño (P.S.I)	2500 PSI	Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I)	2570,53 PSI
I.N.V.E - 410 -13. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO - BOLSACRETO SECCION SUPERIOR DE LA POCETA PARA CANALIZACION DEL CAUCE (SAN MATEO)	24	2	2025	Resistencia de diseño (P.S.I)	2500 PSI	Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I)	2597,83 PSI

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA DE VACIADO dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN			
I.N.V.E - 410 -13. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO - COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETO DE ZANJA DE CORONACION (SAN MATEO)	18	2	2025	Resistencia de diseño (P.S.I)	2500 PSI	Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I)	2580,25 PSI
				Resistencia de diseño (P.S.I)	2500 PSI	Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I)	2602,67 PSI
I.N.V.E - 410 -13. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO - COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETO DE ZANJA DE CORONACION Y SECCION FILTRANTE (SAN MATEO)	19	2	2025	Resistencia de diseño (P.S.I)	2500 PSI	Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I)	2717,20 PSI
				Resistencia de diseño (P.S.I)	2500 PSI	Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I)	2626,91 PSI
I.N.V.E - 410 -13. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO - BOLSACRETO SECCION SUPERIOR DE LA POCETA PARA CANALIZACION DEL CAUCE (SAN MATEO)	24	2	2025	Resistencia de diseño (P.S.I)	2500 PSI	Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I)	2595,50 PSI
				Resistencia de diseño (P.S.I)	2500 PSI	Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I)	2579,37 PSI

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
NO APLICA			

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
NO APLICA				

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO DESDE dd	mm	aaaa	HASTA dd	mm	aaaa	OBSERVACIÓN
Informe de Interventoría No. 0	N/A			N/A			Informe previo al acta de Inicio.
Informe de Interventoría No. 1	6	9	2023	5	10	2023	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 2	6	10	2023	5	11	2023	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 3	6	11	2023	5	12	2023	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 4	6	12	2023	27	12	2023	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 5	18	4	2024	17	5	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 6	18	5	2024	17	6	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 7	18	6	2024	17	7	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 8	18	7	2024	17	8	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 9	18	8	2024	17	9	2024	Informe correspondiente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 10	18	9	2024	17	10	2024	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 11	18	10	2024	17	11	2024	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 12	18	11	2024	17	12	2024	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 13	18	12	2024	17	1	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 14	18	1	2025	17	2	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 15	18	2	2025	17	3	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra
Informe de Interventoría No. 16	18	3	2025	17	4	2025	Informe correspondiente a la etapa ejecución de obra

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe, se han completado las actividades contractuales de obra y actualmente se está a la espera de la suscripción del modificatorio de obra, con el cual se dará inicio a las actividades en el municipio de San Eduardo.

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	N.A.	
Memorias y planos de diseño aprobados	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	ANEXO
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	ANEXO
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	ANEXO

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE: JUAN FRANCISCO PACHON

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO No. 2567 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA".

JUAN FRANCISCO PACHON
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
INTERVENTORIA

INFORME No. 16

ABRIL 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2.1. Antecedentes. 5
2.2. Localización general 5
2.3. Ejecución del proyecto. 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8
3.1. Información general del contrato 8
3.2. Alcance e impacto del proyecto 9
3.3. Proceso Contractual. 9
3.4. Aspectos Financieros contrato de Obra 10
3.4.1 Forma de Pago. 10
3.5. Aspectos legales y revisión de pólizas. 11
3.6. Relación de personal del contrato de obra. 12
3.7. Descripción de las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe. 13
3.8. Estados de Avance. 13
3.9. Estado general del tiempo. 14
3.10. Relación de Actas de Comité. 14
3.11. Pruebas de calidad y ensayos de laboratorio 14
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
4.1. Información general del contrato de interventoría 15
4.2. Proceso contractual 16
4.3. Forma de pago 16
4.4. Estado financiero del contrato de interventoría 17
4.5. Relación de personal de interventoría 17
4.6. Aspectos legales y revisión de pólizas de interventoría. 18

4.7. Descripción de los trabajos realizados en el mes por la interventoría.....19
5. RELACION DE CORRESPONDENCIA 21
5.1 Correspondencia.....21
6. CONCLUSIONES 24
7. ANEXOS..... 24

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las obligaciones del contrato No. 2567 de 2023, de presentar informes mensuales, el objeto del contrato de realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra pública No. 001 de 2023, y las obligaciones generales de realizar un reconocimiento técnico y detallado del contrato actual. En el presente informe se describe el control y seguimiento que se realizará durante el plazo contractual, con el fin de cumplir el objeto previsto en el alcance.

El documento se desarrolla de la siguiente manera: En primer lugar, se describe la localización del proyecto, estado inicial del sitio de implantación, así como las características técnicas del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y estructural.

Posteriormente, se presenta la información general del contrato de obra, que incluye el presupuesto inicial, las garantías contractuales, la descripción de las actividades que se van a ejecutar. De igual manera se presenta la información del contrato de interventoría con las mismas especificaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Antecedentes.

El Gobernador de Boyacá, por medio del decreto 000400 de 04 de mayo de 2022 declara la situación de calamidad pública en parte del territorio del departamento de Boyacá, prorrogada mediante decreto 0660 de 01 de septiembre de 2022 y ampliada por el decreto 1696 del 26 de octubre de 2022, lo anterior en uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas por los artículos 2,209 y 305 de la constitución política, la ley 2200 de 2022 y artículos 57 y siguientes de la ley 1523 de 2012.

Mediante Circular CDGRD-003-2022, del 02 de marzo de 2022, la UAEGRD lanzó un plan de contingencia frente a la primera temporada de lluvias de 2022, atendiendo los métodos de pronóstico (IDDEAM-IRI), que advertían que los volúmenes de precipitación estaban en aumento, razón por la cual era necesario realizar una serie de recomendaciones, entre otros, con el propósito de alertar a la comunidad con el fin de adelantarse y tomar las medidas pertinentes para evitar cualquier situación de desastre.

2.2. Localización general

El proyecto con objeto "CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA" fue suscrito entre la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ y N&S CONSTRUCOL S.A.S., y se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia. Tiene como finalidad atender las emergencias producto de la fuerte temporada de lluvias se presentaron afectaciones en los siguientes municipios:

- VIRACACHÁ
- SAN EDUARDO
- PÁEZ
- CAMPOHERMOSO

- SANTA MARÍA
- EL COCUY
- SAN MATEO
- CHITARAQUE

2.3. Ejecución del proyecto.

Durante el período cubierto por el presente informe, no se realizaron actividades de ejecución de la obra ya que se encontraba en trámite el modificatorio No. 4 para terminar la intervención en el municipio de San Eduardo.

A continuación, se presenta un resumen por punto que describe el tipo de obra a ejecutar. Cada apartado incluye una breve explicación del alcance y características de los trabajos para una mayor claridad.

N.	Municipio	Obra	Coordenadas
1	Viracachá	Se construirá la caja de encole en concreto de forma convencional, instalando un tubo PVC novaloc de 36" y en el descole se emplean bolsas de rellenas de concreto además de realizar la construcción de un filtro drenante para realizar una conducción efectiva de las aguas subsuperficiales como medidas efectivas debido a la condición de inestabilidad de la zona a causa de la humedad	5° 25 '20.5 " 73° 16 '51.4 "
2	Chitaraque	Muro en concreto reforzado y elementos de drenaje que contribuyan con la estabilidad de la zona. Esta medida tiene como objetivo contener la banca y asegurar la transitabilidad de manera efectiva.	6° 02 '53.1 " 73° 26 '34.2 "
3	Campo-Hermoso	Recuperación de la placa superior un box culvert existente, construcción del disipador de energía, además de realizar un apuntalamiento de vigas ipd en la parte superior con el fin de generar un soporte para construir una placa de steel	5° 04 '38.6 " 73° 04 '32.7 "

		deck para recuperar la sección transversal de la vía.	
4	Campo-Hermoso	Reforzamiento de una de las aletas de otro box culvert mediante el uso de muro en tierra armada.	5° 03 ′02,6 ″ 73° 05 ′27.1″
5	Páez	Construcción de un box culvert en concreto reforzado con sección 2.50 m x 2.50 m.	5° 03 ′02,6 ″ 73° 05 ′27.1″
6	Páez	Construcción de muro en tierra armada para la recuperación de una aleta de otro box culvert existente.	5° 05 ′39.5 ″ 73° 03 ′50.5″
7	San Mateo	Construcción de una alcantarilla con pocetas convencionales, pero con descoles en una estructura flexible con bolsas rellenas de concreto teniendo en cuenta la inestabilidad del terreno además de la construcción de filtros drenantes en la parte del talud, y la recuperación de la vía mediante una estructura con pedraplen y afirmado.	4° 49 ′56.8 ″ 73° 15 ′37.7″
8	San Eduardo	Construcción de una alcantarilla con cabezales de entrada y salida y una tubería con un diámetro de 1.50 metros con la finalidad de que le capacidad hidráulica de la alcantarilla se encuentre en rangos admisibles ante la solicitación de drenaje del cuerpo de agua que la atraviesa	5° 13 ′33.4 ″ 73° 06 ′ 09.5″
9	Santa María	Construcción de alcantarilla tipo INVIAS de 36″	4° 49 ′56.8 ″ 73° 15 ′37.7″
10	Santa María	Construcción de alcantarilla tipo INVIAS de 36″	4° 49 ′47.62″ 73° 15 ′33.98″
11	Santa María	Construcción de un box culvert de sección interna de 2.00 x 2.00 metros.	4° 48 ′21.5″ 73° 15 ′52.2″
12	El Cocuy	Construcción de un box culvert de sección de 2.50 x 2.50 metros para realizar un correcto manejo de aguas en la zona de intervención.	6° 20 ′13.2″ 72° 27 ′57.4″

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT.	891.800.498-1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	001 DEL 04 DE ENERO DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA	N&S CONSTRUCOL S.A.S. NIT. 901.306.824-9 R/L JHONATAN BRAYAN MENESES
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($1,259,433,527.00).
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MES Y VEINTISEIS (26) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO 1	18 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA 1	20 DE ABRIL DE 2024 - OCHO (8) MESES
PRORROGA 2	16 DE DICIEMBRE DE 2024 - CINCO (5) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21 DE MAYO DE 2025
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO	"Conectividad Segura Para Un Boyacá Grande"

3.2. Alcance e impacto del proyecto

El alcance del proyecto se fundamenta en los resultados de los estudios y diseños previamente realizados, los cuales han requerido modificaciones debido a cambios en las condiciones iniciales, ajustes técnicos necesarios y actualizaciones en los requisitos normativos y operativos, con el fin de asegurar la viabilidad y efectividad del proyecto en su fase de ejecución final.

El objeto del contrato de obra es realizar la construcción de diferentes obras de mitigación sobre la red vial de las provincias de Centro, Norte, Gutiérrez, Lengupá, Ricaurte y Neira del departamento de Boyacá, localizadas en ocho municipios del departamento, los cuales se ha visto afectados por la temporada de lluvias, por ende, se deberán atender las necesidades urgentes y garantizar la protección de las estructuras a intervenir.

3.3. Proceso Contractual.

- El día 04 de enero de 2023, se firmó virtual el Contrato de Obra Pública No. 001 de 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA."

- El día 06 de septiembre del 2023 se suscribe acta de inicio del contrato.

- El día 31 de octubre del 2023 se suscribe modificatorio No 1 al contrato de obra donde se modifica la cláusula 5 correspondiente a la forma de pago en la sección correspondiente al anticipo.

- El día 28 de diciembre de 2023 se realiza suspensión No 1 al contrato.

- El día 18 de abril de 2024 se da reinicio No 1 al contrato.

- El día 20 de abril de 2024 se suscribe adicional en tiempo No 1 por un periodo de ocho (8) meses más.

- El día 13 de septiembre de 2024 se suscribe el modificatorio No 2 al contrato de obra donde se modifica la cláusula No 1 correspondiente al objeto contractual, permitiendo el ajuste del presupuesto de la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas producto de los Estudios y Diseños.

- El día 14 de noviembre de 2024 se suscribe el Modificatorio No. 3 y Aclaratorio No. 1 al contrato de obra, mediante el cual se realiza la aclaración de fecha de terminación del contrato modificando la cláusula 6.

- El día 16 de diciembre de 2024 se suscribe adicional en tiempo No 2 por un periodo de cinco (5) meses más.

3.4. Aspectos Financieros contrato de Obra

3.4.1 Forma de Pago.

El Departamento, cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

a) El treinta por ciento (30%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, previo perfeccionamiento del mismo.

b) El sesenta por ciento (60%) se cancelará de acuerdo a las actas de recibo parcial de las obras aprobadas por el supervisor delegado y con Vo. Bo del director de desarrollo de la infraestructura vial.

c) El diez (10%) restante, correspondiente al último pago, que se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación.

FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA				
PAGO	**COMPONENTE**	**FORMA DE PAGO**	**PORCENTAJE**	**VALOR A PAGAR**
1	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	ANTICIPO	30%	$ 377.830.058,10
2		ACTAS DE RECIBO PARCIAL	60%	$ 755.660.116,20

3		ACTA DE LIQUIDACIÓN	10%	$ 125.943.352,70
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA				$ 1.259.433.527,00

De acuerdo con la forma de pago, se desembolsó al contratista el anticipo correspondiente al 30 % del valor total del contrato, equivalente a trescientos setenta y siete millones ochocientos treinta mil cincuenta y ocho pesos con diez centavos ($377.830.058,10).

3.5. Aspectos legales y revisión de pólizas.

El contrato de obra pública No. 001 de 2023 del 04 de enero de 2023 en su CLÁUSULA DECIMA SEXTA "GARANTÍAS", establece que el contratista debe presentar garantía de cumplimiento para cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, de igual manera debe contar con un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual, con las siguientes especificaciones:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR DEL ANTICIPO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ES DECIR POR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE ESTE.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.	EL VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE PORCIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
EL AMPARO DEBE PROTEGER AL DEPARTAMENTO DE EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL QUE SURJA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DE SU CONTRATISTA; IGUALMENTE DEBE CUBRIR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL QUE SURJAN DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS O EN SU DEFECTO, QUE ACREDITE QUE EL SUBCONTRATISTA CUENTA CON UN SEGURO PROPIO CON EL MISMO OBJETO Y QUE LA ENTIDAD ESTATAL SEA EL ASEGURADO	IGUAL AL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EL VALOR ES EQUIVALENTE A 200 SMMLV

Las pólizas de cumplimiento No. 14-44-101171029 ANEXO 5., y de responsabilidad Civil Extracontractual No. 14-40-101052221 ANEXO 6 expedidas el día 17 de diciembre de 2024 por la compañía de SEGUROS DEL ESTADO, se encuentran aprobadas de Acta de Aprobación de fecha 11 de febrero de 2025, por parte de la secretaria de contratación del Departamento de Boyacá. Esta información puede ser verificada en la plataforma SECOP II.

3.6. Relación de personal del contrato de obra.

Durante el periodo de ejecución que comprende el presente informe se referencia el personal de obra que estuvo presente:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	PROFESIÓN
DIRECTOR DE OBRA	ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS	No. 4.158.923 DE MARIPÍ – BOYACÁ	INGENIERO CIVIL

RESIDENTE DE OBRA	SONIA MALENA MARÍN SOTELO	No. 1.053.340.500 DE CHIQUINQUIRÁ - BOYACÁ	INGENIERO CIVIL

Se adjuntan las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo de obra utilizado en desarrollo del objeto contratado de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de obra.

3.7. Descripción de las actividades ejecutadas en el periodo del presente informe.

En el marco del Contrato de Obra No. 001-2023, no se realizaron actividades operativas debido al trámite del modificatorio No. 4 el cual se encuentra en proceso de aprobación por parte del departamento.

3.8. Estados de Avance.

Avance Porcentual

El porcentaje de avance reportado hasta la fecha se detalla a continuación:

- Porcentaje (%) de avance de tiempo transcurrido **= 94.1%**
- Porcentaje (%) de avance estudios **= 100%**
- Porcentaje (%) de avance ejecutado **= 85.9%**
- Porcentaje (%) de avance programado **= 85.9%**

Es importante destacar que el Modificatorio N.4 se encuentra actualmente en trámite. Asimismo, es necesario aclarar que la ejecución de las obras en el municipio de San Eduardo sigue pendiente y representa una parte significativa del presupuesto. Hasta que se apruebe el modificatorio no es posible iniciar los trabajos en dicho municipio, lo que esta generando retrasos en la programación y el avance de la obra. En los demás municipios contemplados dentro del marco del contrato, ya se han culminado con las distintas actividades de obra.

3.9. Estado general del tiempo.

Durante el periodo cubierto por el presente informe no se realizaron actividades operativas razón por la cual no se realiza registro del estado del tiempo.

3.10. Relación de Actas de Comité.

No se realizaron comités de obra durante el periodo en mención.

3.11. Pruebas de calidad y ensayos de laboratorio

No se realizaron pruebas de calidad ni ensayos de laboratorio durante el periodo en mención.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Información general del contrato de interventoría

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT.	891.800.498-1
CONTRATO DE INTERVENTORIA	2567 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
NIT.	901.719.548-1
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 71.088.277) M/CTE.
FECHA FIRMA CONTRATO	07 DE JUNIO DE 2023
ACTA DE INICIO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (03) MES Y VEINTISEIS (26) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	18 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA No. 1	20 DE ABRIL DE 2024 OCHO (8) MESES
PRORROGA No. 2	16 DE DICIEMBRE DE 2024 CINCO (5) MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21 DE MAYO DE 2025

4.2. Proceso contractual

El día 07 de junio de 2023, se firmó virtualmente el Contrato de Interventoría No. 2567 del 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA". Entre CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE.

- El día 06 de septiembre contrato se suscribe acta de inicio del contrato.
- El día 28 de diciembre de 2023 se realiza suspensión No 1 al contrato.
- El día 18 de abril de 2024 se da reinicio No 1 al contrato.
- El día 20 de abril se suscribe adicional en tiempo No 1 por un término de ocho (08) meses.
- El día 14 de noviembre de 2024 se emite el Modificatorio No. 1 y el Aclaratorio No. 1 del contrato de Interventoría.
- El día 16 de diciembre de 2024 se suscribe adicional en tiempo No 2 por un término de cinco (5) meses más.

4.3. Forma de pago

El valor del contrato será cancelado al INTERVENTOR de la manera que se detalla a continuación:

La forma de pago es por precio GLOBAL, la oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica.

Para efectos de los desembolsos anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. Así mismo deberá presentar los de informes de avance, cuadro de cantidades, memorias de cálculo al supervisor y/o interventor; lo anterior previamente radicados en la Secretaría de Contratación.

4.4. Estado financiero del contrato de interventoría

FORMA DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA				
PAGO	**COMPONENTE**	**FORMA DE PAGO**	**PORCENTAJE**	**VALOR A PAGAR**
1	INTERVENTORIA	ACTAS PARCIALES	90%	$ 63.979.449,30
2		ACTA DE LIQUIDACIÓN	10%	$ 7.108.827,70
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DEINTERVENTORÍA				$ 71.088.277,00

4.5. Relación de personal de interventoría.

Durante la ejecución del contrato, se hace referencia al personal de interventoría que estará asignado y presente

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	PROFESIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO	C.C. No. 1.010.200.976 DE BOGOTÁ D.C.	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	LAURA YANETH RODRIGUEZ BERDUGO	C.C. No. 1.057.589.899 DE SOGAMOSO	INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

Las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo, operativo y de obra utilizados en desarrollo del objeto

contratado se adjuntarán mes a mes de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de interventoría.

4.6. Aspectos legales y revisión de pólizas de interventoría.

El contrato de interventoría No. 2567 de 2023 en su CLÁUSULA NOVENA "GARANTÍAS", establece que el oferente y el contratista se obliga a constituir, a favor del Departamento de Boyacá garantía única que ampare lo siguiente:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CALIDAD DEL SERVICIO	VIGENCIA POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO Y CINCO (05) AÑOS MÁS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.	EL VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

A partir de lo anterior el contratista suscribió las siguientes pólizas actualizadas según contrato de interventoría.

Pólizas actualizadas de acuerdo a la prórroga No. 2. Expedidas por la compañía aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) el día 16 de diciembre de 2024, cuentan con aprobación por parte de la secretaria de contratación de la gobernación de Boyacá del día 24 de Diciembre de 2024.

A continuación, se presenta la información de las últimas pólizas expedidas.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
POLIZA No. 14-44-101186064		ANEXO 5	
FECHA DE EXPEDICIÓN		16/12/2024	
CONCEPTO	VIGENCIAS (FECHAS)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/09/2023	06/01/2026	$ 14.217.655,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/09/2023	06/07/2028	$ 14.217.655,40
CALIDAD DE SERVICIO	06/09/2023	21/05/2030	$ 14.217.655,40

La información previamente descrita puede verificarse en la plataforma SECOP II.

4.7. Descripción de los trabajos realizados en el mes por la interventoría.

Para el presente informe que comprende desde el 18 de marzo al 17 de abril de 2025, se describen las actividades desarrolladas:

Aspectos técnicos:

- Se realizó el informe mensual No. 16 de interventoría correspondiente a la etapa de ejecución de Obra.
- Se reportó la pausa de actividades operativas debido al trámite administrativo del modificatorio No. 4.
- Se expidió el certificado de cumplimiento de las obligaciones de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social por parte del contratista de Obra. Constatando así que el contratista cumple con sus responsabilidades laborales y de seguridad social.
- Se realizó el respectivo informe mensual en el cual se realiza el estado del proyecto en donde se establece el avance de la ejecución del convenio, lo que permite una evaluación constante del progreso y continuidad del proyecto.

Estados de Avance Contrato de Obra

A la fecha del presente informe con corte al día 17 de abril de 2025 se reportan los siguientes estados de Avance correspondientes.

- Avance de Tiempo Transcurrido: **94.10** % de acuerdo a Prórroga 2.

Durante el periodo comprendido entre el 18 de marzo al 17 de abril de 2025 del presente año, no se realizaron actividades operativas por parte del contratista de obra debido al trámite del modificatorio.

5. RELACION DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona el listado de correspondencia presentada durante el mes del presente informe.

5.1 Correspondencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
18/03/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-106. Observaciones Informe 13	Radicado Vía Correo Electrónico
26/03/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-107. Ratificación Aval Suspensión del Cto de obra	Radicado Vía Correo Electrónico
26/03/2025	SECRETARIA DE CONTRATACION - Procesos de Selección JAVIER IVAN BARRETO PINTO Supervisor Gobernacion de Boyacá	C.I.P-2567-2024-108. Información demora trámite de Modificatorio de obra	Radicado Vía Correo Electrónico
2/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-109. ACTA PARCIAL DE OBRA N.1 v2	Radicado Vía Correo Electrónico
10/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-110. Entrega Informe Mensual N 15	Radicado Vía Correo Electrónico
10/04/2025	Jhonatan Brayan Meneses Sánchez R/L NYS CONSTRUCOL SAS	C.I.P-2567-2024-111. Respuesta tramite modificatorio N°4	Radicado Vía Correo Electrónico

10/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-112. Subsanación de Observaciones Informe Mensual N 14	Radicado Vía Correo Electrónico
10/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-113. Respuesta a su comunicado S-2025-000517-INFDDIV SUBSANACION DE OBSERVACIONES ACTA PARCIAL No. 1.	Radicado Vía Correo Electrónico
14/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-114. Subsanacion de Observaciones Informe Mensual N 14	Radicado Vía Correo Electrónico
14/04/2025	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-115. Respuesta a su comunicado S-2025-000483-INFDDIV Trámite permiso ocupación del cauce - CORPOCHIVOR Remisión de documentos solicitados mediante auto de 0095 del 12 de Marzo de 2025	Radicado Vía Correo Electrónico

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA RADICADO	**INTERESADO**	**ASUNTO**	**RESPUESTA O TRÁMITE**
18/03/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	G.B.-C.O.-2024-057. Respuesta al auto 0076 de 06 de marzo de 2025, con radicado 2024EE12869.	Radicado Vía Correo Electrónico

20/03/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	S-2025-000411-INFDDIV. Respuesta a comunicación C.I.P-2567-2024-105 - Avance de tramites POC	Radicado Vía Correo Electrónico
27/03/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	S-2025-000444-INFDDIV. Programación visita técnica. Santa Maria	Radicado Vía Correo Electrónico
4/04/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato		Radicado Vía Correo Electrónico
2/04/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	G.B.-C.O.-2024-058. Entrega de observaciones acta parcial No 1.	Radicado Vía Correo Electrónico
11/04/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	G.B.-C.O.-2024-058 A. Respuesta al auto 0095 de 12 de marzo de 2025	Radicado Vía Correo Electrónico
11/04/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	S-2025-000530-INFDDIV. Devolución Informe de Interventoría No. 14	Radicado Vía Correo Electrónico

6. CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido entre el 18 de marzo al 17 de abril de 2025, el contratista presenta un avance ejecutado del 85.90%, el cual corresponde al avance presentado en el informe anterior, ya que para el presente periodo no se realizar actividades operativas por motivos de aprobación del modificatorio No. 4.
- Se realizó visita previa el día 31 de marzo del 2025 por parte de Corpochivor al municipio de San Eduardo para la generación del permiso de ocupación del cauce.
- Se realizó visita con el supervisor del contrato el día 3 de abril para revisión de las obras y entrega de los tres puntos en el municipio de Santa María.
- Se reitera la importancia que el contratista elabore el manual de mantenimiento correspondiente para cada obra terminada, con el propósito de asegurar su correcto funcionamiento, preservación y sostenibilidad a largo plazo.
- A la fecha del presente informe, el avance de tiempo transcurrido del proyecto es del 94.10%.

7. ANEXOS

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

1. INFORMACION GENERAL

1.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO N°:	FECHA DE SUSCRIPCION:	PLAZO:	VALOR:
001 DE 2023	**4/01/2023**	**TRES (3) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS**	**$ 1,259,433,527.00**

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA:			REPRESENTANTE LEGAL:		
NYS CONSTRUCOL S.A.S			**JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ**		
Teléfono: **3112847686**	Dirección:	Cra 2 MZ A CA 16 Coper	Teléfono: 3114778252	Dirección:	Coper

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N°:	FECHA DE SUSCRIPCION:	PLAZO:	VALOR:
2567 DE 2023	**7/06/2023**	**TRES (3) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS**	**$ 71,088,277.00**

ENTIDAD CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:			REPRESENTANTE LEGAL:		
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE			**JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO**		
Teléfono: **3143501710**	Dirección:	Cra 4 # 7 - 53 P 3 Chiquinquirá	Teléfono: 3222186323	Dirección:	Chiquinquirá

1.3 REGISTRO DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE DE LA MODIFICACION
1	MODIFICATORIO N° 1	31/10/2023	Modificación cláusula 5 Forma de pago
2	MODIFICATORIO N° 2	13/09/2024	Modificación cláusula 1 Objeto del contrato
3	MODIFICATORIO N° 3 Y ACLARATORIO No 1	14/11/2024	Modificación cláusula 6 Plazo del contrato

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA	DETALLE DE LA MODIFICACION
1	MODIFICATORIO N° 1 Y ACLARATORIO No 1	14/11/2024	Modificación cláusula 6 Plazo del contrato

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

1.4 ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Adicional en plazo No. 1	$ 0.00	OCHO (8) MESES
2	Adicional en plazo No. 2	$ 0.00	CINCO (5) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	Adicional en plazo No. 1	$ 0.00	OCHO (8) MESES
2	Adicional en plazo No. 2	$ 0.00	CINCO (5) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

1.5 FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	6	9	2023	6	9	2023
PLAZO INICIAL	3 MESES Y 26 DÍAS			3 MESES Y 26 DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	31	12	2023	31	12	2023
TOTAL Adicionales en plazo	TRECE (13) MESES			TRECE (13) MESES		
PLAZO TOTAL (Inicial + Adiciones)	16 MESES Y 26 DÍAS			16 MESES Y 26 DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN (Según prórrogas y suspensiones)	21	5	2025	21	5	2025

1.6 DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS (POR UNIDAD FUNCIONAL)

N°	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD POR UNIDAD CONSTRUCTIVA	LOCALIZACION	UNIDAD	META	AVANCE INFORME ANTERIOR	AVANCE ACUMULADO	% AVANCE
	1. MUNICIPIO DE VIRACACHA -SECTOR SECTOR PUERTO GENARO, VÍA CIENEGA						
2.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	70.28	0	70.28	100%
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	113.3	0	113.3	100%
2.4	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	41.06	0	41.06	100%
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3-KM	1633.08	0	1633.08	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	136.09	0	136.09	100%
C-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	0.65	0	0.65	100%
C-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	3.07	0	3.07	100%
C-4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	KG	188.04	0	188.04	100%
INP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	ML	6.5	0	6.5	100%
INP - 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	105.71	0	105.71	100%
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	M3	4.42	0	4.42	100%
INP - 4	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	5°25'20,5'' N 73°16'51,4'' W	ML	120	0	120	100%
	2. MUNICIPIO DE CHITARAQUE						
4.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	135.98	0	135.98	100%
4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	12.66	0	12.66	100%
4.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M2	15	0	15	100%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (soldados)	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	4.27	0	4.27	100%
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	30.45	0	30.45	100%
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	38.22	0	38.22	100%
4.8	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	10.18	0	10.18	100%
4.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	KG	6502.04	0	6502.04	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

4.16	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3	212.63	0	212.63	100%
4.17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M3-KM	6081.22	0	6081.22	100%
INP - 5	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 6`` PERFORADA	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	ML	21	0	21	100%
INP - 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TECDREN	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	M2	84	0	71.4	85.0%
INP - 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	6°02'53,1'' N 73°26'34,2'' W	ML	19.6	0	15.75	80.36%
	3. MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-CORREDOR MACANAL-CAMPOHERMOSO-PAEZ						
6.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	M3	134.75	0	134.75	100%
6.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	M3	7.56	0	7.56	100%
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	2.93	0	2.93	100%
6.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	5°03'02,6'' N 73°05'27,1''W MURO TIERRA ARMADA	KG	275.14	0	275.14	100%
6.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	5°03'02,6'' N 73°05'27,1''W MURO TIERRA ARMADA 5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3-KM	6045.43	0	6045.43	100%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	5°03'02,6'' N 73°05'27,1''W MURO TIERRA ARMADA 5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	134.75	0	134.75	100%
INP - 9	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	13.78	0	13.78	100%
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	21.06	0	21.06	100%
INP - 11	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M3	19.5	0	19.5	100%
INP - 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	KG	385.65	0	385.65	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

INP - 14	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	KG	321.11	0	321.11	100%
INP - 15	PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	M2	10.8	0	10.8	100%
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	5°04'38,6'' N 73°04'32,7''W BOX CULVERT	UND	1	0	1	100%
INP - 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	5°03'02,6'' N 73°05'27,1''W MURO TIERRA ARMADA	M2	363	0	363	100%
INP - 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	M2	66	0	66	100%
INP - 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	ML	40.9	0	40.9	100%
INP - 20	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	5°03'02,6'' N 73°05'27,1'' W MURO TIERRA ARMADA	ML	5	0	5	100%
	4. MUNICIPIO DE PAEZ						
8.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA 5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	112.5	0	112.5	100%
8.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	16.73	0	16.73	100%
8.3	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	21	0	21	100%
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	2.39	0	2.39	100.00%
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	12.23	0	12.23	100.00%
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	18.56	0	18.56	100.00%
8.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA 5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	KG	3671.34	0	3671.34	100.00%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

8.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA 5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3-KM	4910.06	716.1	4910.06	100.0%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA 5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	130.5	11.6	130.5	100.00%
INP - 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA	M2	223.2	0	223.2	100%
INP - 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA	M2	43.2	0	43.2	100%
INP - 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA	ML	26.2	0	26.2	100%
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	M3	13.49	0	13.49	100%
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	5°05'39,5'' N 73°03'50,5'' W BOX CULVERT	UND	1	0	1	100%
INP - 4	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	5°05'43,9'' N 73°03'29,4'' W MURO TIERRA ARMADA	ML	4	0	4	100%
	5. MUNICIPIO DE SAN MATEO						
	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	245.72	155.36	245.72	100.00%
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	65.21	26.6	65.21	100.00%
	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	24.73	0	24.73	100.00%
	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	ML	188.04	0	188.04	100.00%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	6160.63	3104.23	6160.63	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	0.65	0	0.65	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	3.07	0	3.07	100.00%
	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	106.09	72.74	106.09	100.00%
	PEDRAPLEN COMPACTO	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	111.6	90	111.6	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	ML	6.5	0	6.5	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	79.67	49.05	79.67	100.00%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	M3	4.42	0	4.42	100.00%
	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	6°23'37,95'' N 72°33'30,3'' W	ML	60	0	60	100.00%
	7. MUNICIPIO DE SANTA MARIA						
14.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	164.62	0	164.62	100%
14.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	18.37	0	18.37	100%
14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	14.2	0	14.2	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

14.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	26.71	0	26.71	100%
14.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	KG	3566.1	0	3566.1	100%
14.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3-KM	2164.82	0	2164.82	100%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	47.18	0	47.18	100%
INP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	ML	13	0	13	100%
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	12.13	0	12.13	100%
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	4°49'56,8'' N 73°15'37,7'' W ALCANTARILLA 4°49'47,62'' N 73°15'33,98'' W ALCANTARILLA 4°48'21.5"N 73°15'52.2"W BOX CULVERT	M3	10.83	0	10.83	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

	8. MUNICIPIO DE EL COCUY						
16.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	28.8	0	28.8	100%
16.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	16.73	0	16.73	100%
16.6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	KG	3671.34	0	3671.34	100%
16.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3-KM	986.41	0	986.41	100%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	43.2	0	43.2	100%
C-5	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	21.52	0	21.52	100%
C-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	17.91	0	17.91	100%
C-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	12.23	0	12.23	100%
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	2.39	0	2.39	100%
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	M3	13.49	0	13.49	100%
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	6°20'13,2'' N 72°27'57,4'' W	UND	1	0	1	100%

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	VIRACACHÁ			
SECTOR:	PUERTO GENARO VÍA CIENAGA							
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°25'20,5''N	LONGITUD	73°16'51,4''W	LATITUD	5°25'20,5''N	LONGITUD	73°16'51,4''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	CHITARAQUE			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	6°02'53,1''N	LONGITUD	73°26'34,2''W	LATITUD	6°02'53,1''N	LONGITUD	73°26'34,2''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	CAMPOHERMOSO			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°04'38,6''N	LONGITUD	73°04'32,7''W	LATITUD	5°04'38,6''N	LONGITUD	73°04'32,7''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	CAMPOHERMOSO			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°03'02,6''N	LONGITUD	73°05'27,1''W	LATITUD	5°03'02,6''N	LONGITUD	73°05'27,1''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	PAEZ			
SECTOR:	BOYACÁ							
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°05'43,9''N	LONGITUD	73°03'29,4''W	LATITUD	5°05'43,9''N	LONGITUD	73°03'29,4''W
1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA								



LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	PAEZ			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	5°05'39,5''N	LONGITUD	73°03'50,5''W	LATITUD	5°05'39,5''N	LONGITUD	73°03'50,5''W
1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA								



ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	SAN MATEO			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	6°23'37,95''N	LONGITUD	72°33'30,3'' W	LATITUD	6°23'37,95''N	LONGITUD	72°33'30,3'' W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



P

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	SANTA MARIA			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	4°49'47,62''N	LONGITUD	73°15'33,98''W	LATITUD	4°49'47,62''N	LONGITUD	73°15'33,98''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025


LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	SANTA MARIA			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	4°49'56,8''N	LONGITUD	73°15'37,7''W	LATITUD	4°49'56,8''N	LONGITUD	73°15'37,7''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	SANTA MARIA			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	4°48'21.5"N	LONGITUD	73°15'52.2"W	LATITUD	4°48'21.5"N	LONGITUD	73°15'52.2"W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA

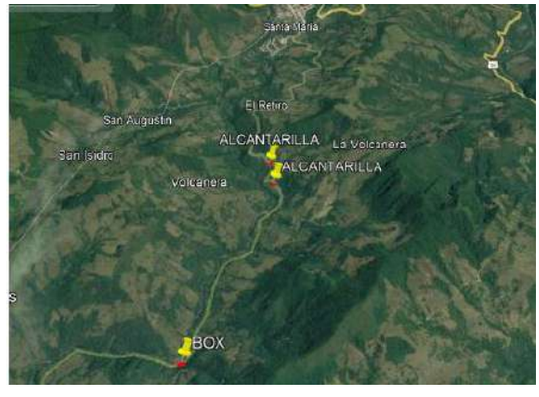

ANEXO COMPLEMENTARIO AL FORMATO A-AD-GC-F-O46

CONTRATO OBRA No:	1	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

LOCALIZACION								
DEPARTAMENTO:	BOYACÁ			MUNICIPIO:	EL COCUY			
SECTOR:								
COORDENADAS	INICIO				FIN			
	LATITUD	6°20'13,2''N	LONGITUD	72°27'57,4''W	LATITUD	6°20'13,2''N	LONGITUD	72°27'57,4''W

1.7 ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA OBRA



1.8 RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
NO APLICA				

1.9 RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
NO APLICA							

* Adjuntar copia de Actas de comité generadas en el periodo

GARANTIAS CONTRACTUALES

NOTA: En este periodo no se generaron actos administrativos

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2025

2. SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

2.1 SEGUIMIENTO A PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	ANEXO No.	FECHA EXP (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACIÓN CONTRATACIÓN (dd/mm/aaaa)	MOTIVO DE LA ACTUALIZACION
14-44-101171029	6	17/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	11/02/2025	PRORROGA 2
14-40-101052221	6	17/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	12/02/2025	PRORROGA 2

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS POLIZA VIGENTE	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6	9	2023	1	12	2025	$ 188,915,029.05
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	6	9	2023	21	5	2025	$ 377,830,058.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6	9	2023	21	11	2028	$ 188,915,029.05
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍA						$ 251,886,705.40
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	6	9	2023	21	5	2025	$ 260,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	6	9	2023	21	5	2025	$ 260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	6	9	2023	21	5	2025	$ 260,000,000.00

2.1 SEGUIMIENTO A PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA


No PÓLIZA	ANEXO No.	FECHA EXP (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACIÓN CONTRATACIÓN (dd/mm/aaaa)	MOTIVO DE LA ACTUALIZACION
14-44-101186064	5	16/12/2024	SEGUROS DEL ESTADO S.A	24/12/2024	PRORROGA 2

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS POLIZA VIGENTE	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	6	9	2023	6	1	2026	$ 14,217,655.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	6	9	2023	6	7	2028	$ 14,217,655.40
CALIDAD DEL SERVICIO	6	9	2023	21	5	2030	$ 14,217,655.40

* Adjuntar copia de la aprobación de las polizas vigentes

* Adjuntar copia de actualización de polizas en el evento que se genere en el periodo.

FIRMA:



NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

AVANCE DE OBRA

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	FECHA: 29 DE ABRIL DE 2025

3. AVANCE DE OBRA


CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

3.1 AVANCE DE EJECUCIÓN

PLAZO ACTUAL (DIAS)	506	TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS)	472	TIEMPO RESTANTE (DIAS)	34
% PROGRAMADO CTO DE OBRA	85.9%	% DE AVANCE CTO DE OBRA	85.9%	% RETRASO	0.0%

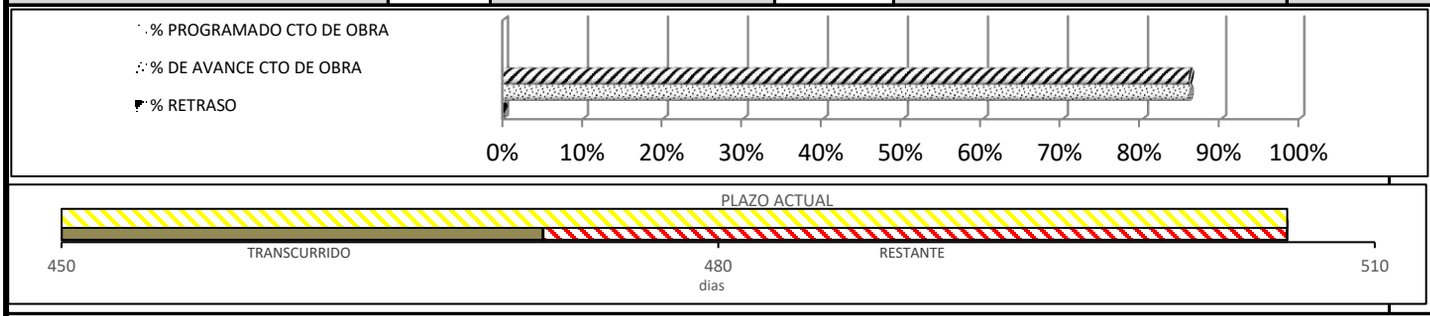

CAUSALES DEL RETRASO DE LAS OBRAS:

Se debe realizar una reprogramación una vez se apruebe el modificatorio No. 4

3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD S/PRESUPUESTO ACTUALIZADO	CANTIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUTADO ACUMULADO
	1. MUNICIPIO DE VIRACACHA -SECTOR SECTOR PUERTO GENARO, VÍA CIÉNEGA					
2.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	70.28	0.00	70.28	100%
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	113.3	0.00	113.30	100%
2.4	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	41.06	0.00	41.06	100%
2.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	1633.08	0.00	1633.08	100%
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3	136.09	0.00	136.09	100%
C-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	M3	0.65	0.00	0.65	100%

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2025

3. AVANCE DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

C-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**3.07**	**0.00**	**3.07**	**100%**
C-4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**188.04**	**0.00**	**188.04**	**100%**
INP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**ML**	**6.5**	**0.00**	**6.50**	**100%**
INP - 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	**M3**	**105.71**	**0.00**	**105.71**	**100%**
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**M3**	**4.42**	**0.00**	**4.42**	**100%**
INP - 4	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**ML**	**120**	**0.00**	**120**	**100%**
	2. MUNICIPIO DE CHITARAQUE					
4.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**135.98**	**0.00**	**135.98**	**100%**
4.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**12.66**	**0.00**	**12.66**	**100%**
4.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	**M2**	**15**	**0**	**15**	**100%**
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (soldados)	**M3**	**4.27**	**0.00**	**4.27**	**100%**
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**30.45**	**0.00**	**30.45**	**100%**
4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**38.22**	**0.00**	**38.22**	**100%**
4.8	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**M3**	**10.18**	**0.00**	**10.18**	**100%**
4.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**6502.04**	**0.00**	**6502.04**	**100%**
4.16	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**212.63**	**0.00**	**212.63**	**100%**
4.17	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**6081.22**	**0.00**	**6081.22**	**100%**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2025

3. AVANCE DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16

FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

INP - 5	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 6`` PERFORADA	**ML**	**21**	**0.00**	**21**	**100%**
INP - 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TECDREN	**M2**	**84**	**0.00**	**71.40**	**85.0%**
INP - 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 3"	**ML**	**19.6**	**0.00**	**15.75**	**80.36%**
3. MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-CORREDOR MACANAL-CAMPOHERMOSO-PAEZ						
6.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**134.75**	**0.00**	**134.75**	**100%**
6.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**7.56**	**0.00**	**7.56**	**100%**
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**2.93**	**0.00**	**2.93**	**100%**
6.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**275.14**	**0.00**	**275.14**	**100%**
6.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**6045.43**	**0.00**	**6045.43**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**134.75**	**0.00**	**134.75**	**100%**
INP - 9	DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	**M3**	**13.78**	**0.00**	**13.78**	**100%**
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	**M3**	**21.06**	**0.00**	**21.06**	**100%**
INP - 11	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	**M3**	**19.5**	**0.00**	**19.50**	**100%**
INP - 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	**KG**	**385.65**	**0.00**	**385.65**	**100%**
INP - 14	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	**KG**	**321.11**	**0.00**	**321.11**	**100%**
INP - 15	PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	**M2**	**10.8**	**0.00**	**10.80**	**100%**
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**UND**	**1**	**0.00**	**1**	**100%**
INP - 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	**M2**	**363**	**0.00**	**363**	**100%**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2025

3. AVANCE DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16

FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

INP - 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	**M2**	**66**	**0.00**	**66**	**100%**
INP - 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**ML**	**40.9**	**0.00**	**40.90**	**100%**
INP - 20	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**ML**	**5**	**0.00**	**5**	**100%**
	4. MUNICIPIO DE PAEZ					
8.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**112.5**	**0.00**	**112.50**	**100%**
8.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**16.73**	**0.00**	**16.73**	**100%**
8.3	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	**M3**	**21**	**0.00**	**21**	**100%**
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	**M3**	**2.39**	**0.00**	**2.39**	**100%**
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**12.23**	**0.00**	**12.23**	**100%**
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**18.56**	**0.00**	**18.56**	**100%**
8.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**3671.34**	**0.00**	**3671.34**	**100%**
8.14	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**4910.06**	**716.1**	**4910.1**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**130.5**	**11.6**	**130.5**	**100%**
INP - 17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	**M2**	**223.2**	**0.00**	**223.20**	**100%**
INP - 18	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	**M2**	**43.2**	**0.00**	**43.20**	**100%**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2025

3. AVANCE DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

INP - 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**ML**	**26.20**	**0.00**	**26.20**	**100%**
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	**M3**	**13.49**	**0**	**13.49**	**100%**
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**UND**	**1**	**0**	**1**	**100%**
INP - 4	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**ML**	**4**	**0**	**4**	**100%**
	7. MUNICIPIO DE SAN MATEO					
10.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**245.72**	**155.36**	**245.72**	**100%**
14.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**65.21**	**26.60**	**65.21**	**100%**
14.3	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	**M3**	**24.73**	**0.00**	**24.73**	**100%**
14.8	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**M3**	**188.04**	**0.00**	**188.04**	**100%**
14.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3**	**6160.63**	**3104.23**	**6160.63**	**100%**
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**KG**	**0.65**	**0.00**	**0.65**	**100%**
14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3-KM**	**3.07**	**0.00**	**3.07**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**106.09**	**72.74**	**106.09**	**100%**
INP - 1	PEDRAPLEN COMPACTO	**ML**	**111.6**	**90.00**	**111.6**	**100%**
INP - 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**M3**	**6.5**	**0.00**	**6.5**	**100%**
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	**M3**	**79.67**	**49.05**	**79.67**	**100%**
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**M3**	**4.42**	**0.00**	**4.42**	**100%**

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2025

3. AVANCE DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

10.2	DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4`` PERFORADA	**M3**	**60**	**0**	**60**	**100%**
	7. MUNICIPIO DE SANTA MARIA					
14.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**164.62**	**0.00**	**164.62**	**100%**
14.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**18.37**	**0.00**	**18.37**	**100%**
14.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**14.2**	**0.00**	**14.20**	**100%**
14.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**26.71**	**0.00**	**26.71**	**100%**
14.10	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**3566.10**	**0.00**	**3566.10**	**100%**
14.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**2164.82**	**0.00**	**2164.82**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**47.18**	**0.00**	**47.18**	**100%**
INP - 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	**ML**	**13**	**0**	**13**	**100%**
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	**M3**	**12.13**	**0.00**	**12.13**	**100%**
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**M3**	**10.83**	**0.00**	**10.83**	**100%**
	8. MUNICIPIO DE EL COCUY					
16.1	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	**M3**	**28.8**	**0.00**	**28.80**	**100%**
16.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	**M3**	**16.73**	**0.00**	**16.73**	**100%**
16.6	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	**KG**	**3671.34**	**0.00**	**3671.34**	**100%**
16.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	**M3-KM**	**986.41**	**0.00**	**986.41**	**100%**
C-1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	**M3**	**43.2**	**0.00**	**43.20**	**100%**

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	FECHA: 29 DE ABRIL DE 2025

3. AVANCE DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16

FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

C-5	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	**M3**	**21.52**	**0.00**	**21.52**	**100%**
C-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	**M3**	**17.91**	**0.00**	**17.91**	**100%**
C-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	**M3**	**12.23**	**0.00**	**12.23**	**100%**
INP - 3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	**M3**	**2.39**	**0.00**	**2.39**	**100%**
INP - 10	PEDRAPLEN COMPACTO	**M3**	**13.49**	**0.00**	**13.49**	**100%**
INP - 16	MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	**UND**	**1**	**0.00**	**1**	**100%**

* Insertar las filas que sean requeridas de acuerdo a los Items del presupuesto.

* Adjuntar informe detallado de las actividades desarrolladas en el periodo y sabana de cantidades contratadas y ejecutadas.

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA N°:	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

CRONOGRAMA




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo anticipado	Comienzo real	Variación de comienzo	Comienzo	Fin
1		**<Tarea nueva>**	**167 días?**	**73%**	**mar 1/10/24**	**mar 1/10/24**	**0 días**	**mar 1/10/24**	**mié 21/05/25**
2		**1. MUNICIPIO DE VIRACACHA -SECTOR SECTOR PUERTO GENARO, VÍA CIENEGA**	**1 día**	**100%**	**jue 12/12/24**	**vie 15/11/24**	**0 días**	**jue 12/12/24**	**jue 12/12/24**
3		**PRELIMINARES**	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
4		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
5		**CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES FILTRO PERIMETRAL ZANJA DE CORONACION**	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
6		EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	15 días	100%	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0 días	vie 13/12/24	jue 2/01/25
7		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	20 días	100%	mar 17/12/24	mar 17/12/24	0 días	mar 17/12/24	lun 13/01/25
8		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL. 12	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
9		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	10 días	100%	jue 26/12/24	jue 26/12/24	0 días	jue 26/12/24	mié 8/01/25
10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
11		CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
12		DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
13		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
14		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	45 días	100%	vie 15/11/24	vie 15/11/24	0 días	vie 15/11/24	jue 16/01/25
15		**ITEMS COMPLEMENTARIOS**	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
16		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	45 días	100%	vie 15/11/24	vie 15/11/24	0 días	vie 15/11/24	jue 16/01/25
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	2 días	100%	mié 18/12/24	mié 18/12/24	0 días	mié 18/12/24	jue 19/12/24
18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	4 días	100%	mié 18/12/24	mié 18/12/24	0 días	mié 18/12/24	lun 23/12/24
19		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	15 días	100%	mié 18/12/24	mié 18/12/24	0 días	mié 18/12/24	mar 7/01/25
20		**ITEMS NO PREVISTOS**	1 día	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24
21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	1 día	100%	mié 18/12/24	mié 18/12/24	0 días	mié 18/12/24	mié 18/12/24
22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	20 días	100%	mar 24/12/24	mar 24/12/24	0 días	mar 24/12/24	lun 20/01/25
23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	2 días	100%	mié 18/12/24	mié 18/12/24	0 días	mié 18/12/24	jue 19/12/24
24		DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4" PERFORADA	10 días	100%	jue 26/12/24	jue 26/12/24	0 días	jue 26/12/24	mié 8/01/25
25		2. MUNICIPIO DE CHITARAQUE	81 días	96%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 21/01/25
26		**PRELIMINARES**	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
27		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
28		**ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN, DISIPADORES Y FILTROS**	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
29		EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	15 días	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	lun 21/10/24
30		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	8 días	100%	lun 21/10/24	lun 21/10/24	0 días	lun 21/10/24	mié 30/10/24
31		DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	1 día	100%	lun 21/10/24	lun 21/10/24	0 días	lun 21/10/24	lun 21/10/24
32		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	15 días	100%	lun 21/10/24	lun 21/10/24	0 días	lun 21/10/24	vie 8/11/24
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	20 días	100%	jue 3/10/24	jue 3/10/24	0 días	jue 3/10/24	mié 30/10/24
34		CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
35		SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	30 días	100%	jue 31/10/24	jue 31/10/24	0 días	jue 31/10/24	mié 11/12/24
36		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	10 días	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	mié 25/12/24
37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
38		CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO 24,5 MPa - (3500 PSI)	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
39		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	26 días	100%	jue 3/10/24	jue 3/10/24	0 días	jue 3/10/24	jue 7/11/24
40		DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
42		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
43		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
44		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	19 días	100%	jue 26/12/24	jue 26/12/24	0 días	jue 26/12/24	mar 21/01/25
45		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	19 días	100%	jue 26/12/24	jue 26/12/24	0 días	jue 26/12/24	mar 21/01/25
46		**ITEMS NO PREVISTOS**	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
47		DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 6" PERFORADA	8 días	100%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	lun 23/12/24
48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA TECDREN	12 días	18%	jue 12/12/24	jue 12/12/24	0 días	jue 12/12/24	jue 9/01/25
49		CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	1 día	100%	mar 1/10/24	mar 1/10/24	0 días	mar 1/10/24	mar 1/10/24
50		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC SANITARIA D= 9"	30 días	100%	jue 31/10/24	jue 31/10/24	0 días	jue 31/10/24	mié 11/12/24
51		3. MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO-CORREDOR MACANAL-CAMPOHERMOSO-PAEZ	60 días	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	jue 23/01/25
52		**PRELIMINARES**	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
53		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
54		**PONTON Y OBRAS DE CONTENCION**	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
55		EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	10 días	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24
56		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	3 días	100%	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0 días	vie 13/12/24	mar 17/12/24
57		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17,5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	3 días	100%	mar 31/12/24	mar 31/12/24	0 días	mar 31/12/24	jue 2/01/25
61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo anticipado	Comienzo real	Variación de comienzo	Comienzo	Fin
62		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
63		CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 0 A 7.0 Mts.	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
64		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	15 días	100%	mar 31/12/24	mar 31/12/24	0 días	mar 31/12/24	lun 20/01/25
65		CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
66		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
67		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
68		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	20 días	100%	mar 12/11/24	mar 12/11/24	0 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24
69		**ITEMS COMPLEMENTARIOS**	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
70		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	20 días	100%	mar 12/11/24	mar 12/11/24	0 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24
71		**ITEMS NO PREVISTOS BOX**	1 día	100%	vie 1/11/24	vie 1/11/24	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24
72		DEMOLICIÓN CONCRETO CICLOPEO (INCLUYE RETIRO)	3 días	100%	mar 17/12/24	mar 17/12/24	0 días	mar 17/12/24	jue 19/12/24
73		PEDRAPLEN COMPACTO	7 días	100%	vie 20/12/24	vie 20/12/24	0 días	vie 20/12/24	lun 30/12/24
74		CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	5 días	100%	vie 3/01/25	vie 3/01/25	0 días	vie 3/01/25	jue 9/01/25
75		SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	2 días	100%	vie 10/01/25	vie 10/01/25	0 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25
76		PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	2 días	100%	vie 10/01/25	vie 10/01/25	0 días	vie 10/01/25	lun 13/01/25
77		PLACA CON STEEL DECK 24.5 MPa - (3500 PSI) E= 0.10 MTS	5 días	100%	vie 17/01/25	vie 17/01/25	0 días	vie 17/01/25	jue 23/01/25
78		MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	1 día	100%	mar 17/12/24	mar 17/12/24	0 días	mar 17/12/24	mar 17/12/24
79		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	20 días	100%	mar 12/11/24	mar 12/11/24	0 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24
80		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	20 días	100%	mar 12/11/24	mar 12/11/24	0 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24
81		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	20 días	100%	mar 12/11/24	mar 12/11/24	0 días	mar 12/11/24	lun 9/12/24
82		DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4'' PERFORADA	1 día	100%	lun 18/11/24	lun 18/11/24	0 días	lun 18/11/24	lun 18/11/24
83		4. MUNICIPIO DE PAEZ	64,58 días	53%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	vie 28/02/25
84		**PRELIMINARES**	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
85		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
86		**CONSTRUCCION DE BOX CULVERT, CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE, APLICACION DE AFIRMADO COMPACTADO, CONSTRUCCION DE FILTRO**	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
87		EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	15 días	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	jue 19/12/24
88		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	20 días	38%	lun 6/01/25	lun 6/01/25	0 días	lun 6/01/25	vie 31/01/25
89		DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	10 días	100%	sáb 7/12/24	sáb 7/12/24	0 días	sáb 7/12/24	jue 19/12/24
90		DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
91		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
92		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
93		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SÍMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	2 días	38%	jue 9/01/25	jue 9/01/25	0 días	jue 9/01/25	vie 10/01/25
94		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SÍMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	10 días	37%	lun 13/01/25	lun 13/01/25	0 días	lun 13/01/25	vie 24/01/25
95		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SÍMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	15 días	0%	mar 21/01/25	NOD	0 días	mar 21/01/25	lun 10/02/25
96		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	21 días	54%	jue 9/01/25	jue 9/01/25	0 días	jue 9/01/25	jue 6/02/25
97		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
98		CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
99		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
100		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	35 días	3%	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0 días	vie 13/12/24	jue 27/02/25
101		**ITEMS COMPLEMENTARIOS**	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
102		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	35 días	3%	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0 días	vie 13/12/24	vie 28/02/25
103		**ITEMS NO PREVISTOS ALETA**	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
104		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA DE REFUERZO, RESISTENCIA ULTIMA 27.5 KN/M	21 días	100%	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0 días	vie 13/12/24	vie 10/01/25
105		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL T, RESIST ULTIMA A LA ROTURA(TIRA ANCHA)=33.8 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	21 días	100%	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0 días	vie 13/12/24	vie 10/01/25
106		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	21 días	100%	vie 13/12/24	vie 13/12/24	0 días	vie 13/12/24	vie 10/01/25
107		PEDRAPLEN COMPACTO	2 días	40%	mié 8/01/25	mié 8/01/25	0 días	mié 8/01/25	jue 9/01/25
108		MANEJO Y DESVIÓ DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	1 día	100%	dom 1/12/24	dom 1/12/24	0 días	dom 1/12/24	dom 1/12/24
109		DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4'' PERFORADA	1 día	100%	vie 20/12/24	vie 20/12/24	0 días	vie 20/12/24	vie 20/12/24
110		5. MUNICIPIO DE SAN MATEO	41 días	0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días	sáb 25/01/25	lun 24/03/25
111		**PRELIMINARES**		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
112		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
113		**CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN Y OBRAS DE CONTENCION, CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE ,APLICACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO**		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
114		EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	20 días	0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días	sáb 25/01/25	jue 20/02/25
115		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	18 días	0%	jue 30/01/25	NOD	0 días	jue 30/01/25	lun 24/02/25
116		DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
117		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	10 días	0%	jue 13/02/25	NOD	0 días	jue 13/02/25	mié 26/02/25
118		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
119		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
120		CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS , LONGITUD DE 0 A 7.0 Mts.		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
121		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	9 días	0%	jue 6/02/25	NOD	0 días	jue 6/02/25	mar 18/02/25

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo anticipado	Comienzo real	Variación de comienzo	Comienzo	Fin
122		CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
123		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
124		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	18 días	0%	jue 27/02/25	NOD	0 días	jue 27/02/25	lun 24/03/25
125		**ITEMS COMPLEMENTARIOS**		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
126		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	1 día	0%	jue 6/02/25	NOD	0 días	jue 6/02/25	jue 6/02/25
127		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	4 días	0%	jue 13/02/25	NOD	0 días	jue 13/02/25	mar 18/02/25
128		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	8 días	0%	jue 13/03/25	NOD	0 días	jue 13/03/25	lun 24/03/25
129		**ITEMS NO PREVISTOS**		0%	sáb 25/01/25	NOD	0 días		
130		PEDRAPLEN COMPACTO	10 días	0%	jue 27/02/25	NOD	0 días	jue 27/02/25	mié 12/03/25
131		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	1 día	0%	jue 30/01/25	NOD	0 días	jue 30/01/25	jue 30/01/25
132		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSA TEXTIL BAG RELLENA DE CONCRETO MEZCLADO EN SITIO	20 días	0%	mié 19/02/25	NOD	0 días	mié 19/02/25	mar 18/03/25
133		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	1 día	0%	mié 29/01/25	NOD	0 días	mié 29/01/25	mié 29/01/25
134		DRENAJES EN TUBERÍA DE PVC 4'' PERFORADA	10 días	0%	jue 13/02/25	NOD	0 días	jue 13/02/25	mié 26/02/25
135		6. MUNICIPIO DE SAN EDUARDO	58 días?	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	sáb 1/03/25	mié 21/05/25
136		**PRELIMINARES**		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
137		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	sáb 1/03/25	
138		**CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA 36"**		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
139		EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	15 días	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	sáb 1/03/25	jue 20/03/25
140		EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	10 días	0%	mié 12/03/25	NOD	0 días	mié 12/03/25	mar 25/03/25
141		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	5 días	0%	mié 12/03/25	NOD	0 días	mié 12/03/25	mar 18/03/25
142		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
143		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	4 días	0%	vie 28/03/25	NOD	0 días	vie 28/03/25	mié 2/04/25
144		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	15 días	0%	lun 7/04/25	NOD	0 días	lun 7/04/25	vie 25/04/25
145		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
146		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
147		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	21 días	0%	vie 28/03/25	NOD	0 días	vie 28/03/25	vie 25/04/25
148		DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
149		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
150		CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
151		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
152		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	1 día	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	sáb 1/03/25	sáb 1/03/25
153		**ITEMS COMPLEMENTARIOS**		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
154		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	18 días	0%	lun 28/04/25	NOD	0 días	lun 28/04/25	mié 21/05/25
155		**ITEMS NO PREVISTOS**		0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días		
156		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	3 días	0%	mar 25/03/25	NOD	0 días	mar 25/03/25	jue 27/03/25
157		CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	1 día	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	sáb 1/03/25	sáb 1/03/25
158		PEDRAPLEN COMPACTO	2 días	0%	vie 21/03/25	NOD	0 días	vie 21/03/25	lun 24/03/25
159		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA NOVAFORT CON ALMA DE ACERO D=1.5 M	1 día	0%	sáb 1/03/25	NOD	0 días	sáb 1/03/25	sáb 1/03/25
160		7. MUNICIPIO DE SANTA MARIA	60 días	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	mié 19/02/25
161		**PRELIMINARES**	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
162		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
163		**TERRACEO FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACION DE BANCA VIA**	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
164		EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	60 días	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	mié 19/02/25
165		EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
166		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	20 días	100%	jue 19/12/24	jue 19/12/24	0 días	jue 19/12/24	mié 15/01/25
167		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
168		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
169		DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
170		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
171		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	10 días	100%	lun 6/01/25	lun 6/01/25	0 días	lun 6/01/25	vie 17/01/25
172		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	12 días	100%	jue 9/01/25	jue 9/01/25	0 días	jue 9/01/25	vie 24/01/25
173		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	15 días	100%	lun 6/01/25	lun 6/01/25	0 días	lun 6/01/25	vie 24/01/25
174		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
175		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	3 días	100%	lun 27/01/25	lun 27/01/25	0 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25
176		**ITEMS COMPLEMENTARIOS**	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
177		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	3 días	100%	lun 27/01/25	lun 27/01/25	0 días	lun 27/01/25	mié 29/01/25
178		**ITEMS NO PREVISTOS**	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
179		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 36"	2 días	100%	jue 2/01/25	jue 2/01/25	0 días	jue 2/01/25	vie 3/01/25
180		PEDRAPLEN COMPACTO	2 días	100%	vie 27/12/24	vie 27/12/24	0 días	vie 27/12/24	lun 30/12/24
181		MANEJO Y DESVIO DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	1 día	100%	jue 28/11/24	jue 28/11/24	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24
182		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	2 días	100%	mar 31/12/24	mar 31/12/24	0 días	mar 31/12/24	mié 1/01/25
183		8. MUNICIPIO DE EL COCUY	30 días	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	mié 15/01/25
184		**PRELIMINARES**	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
185		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24

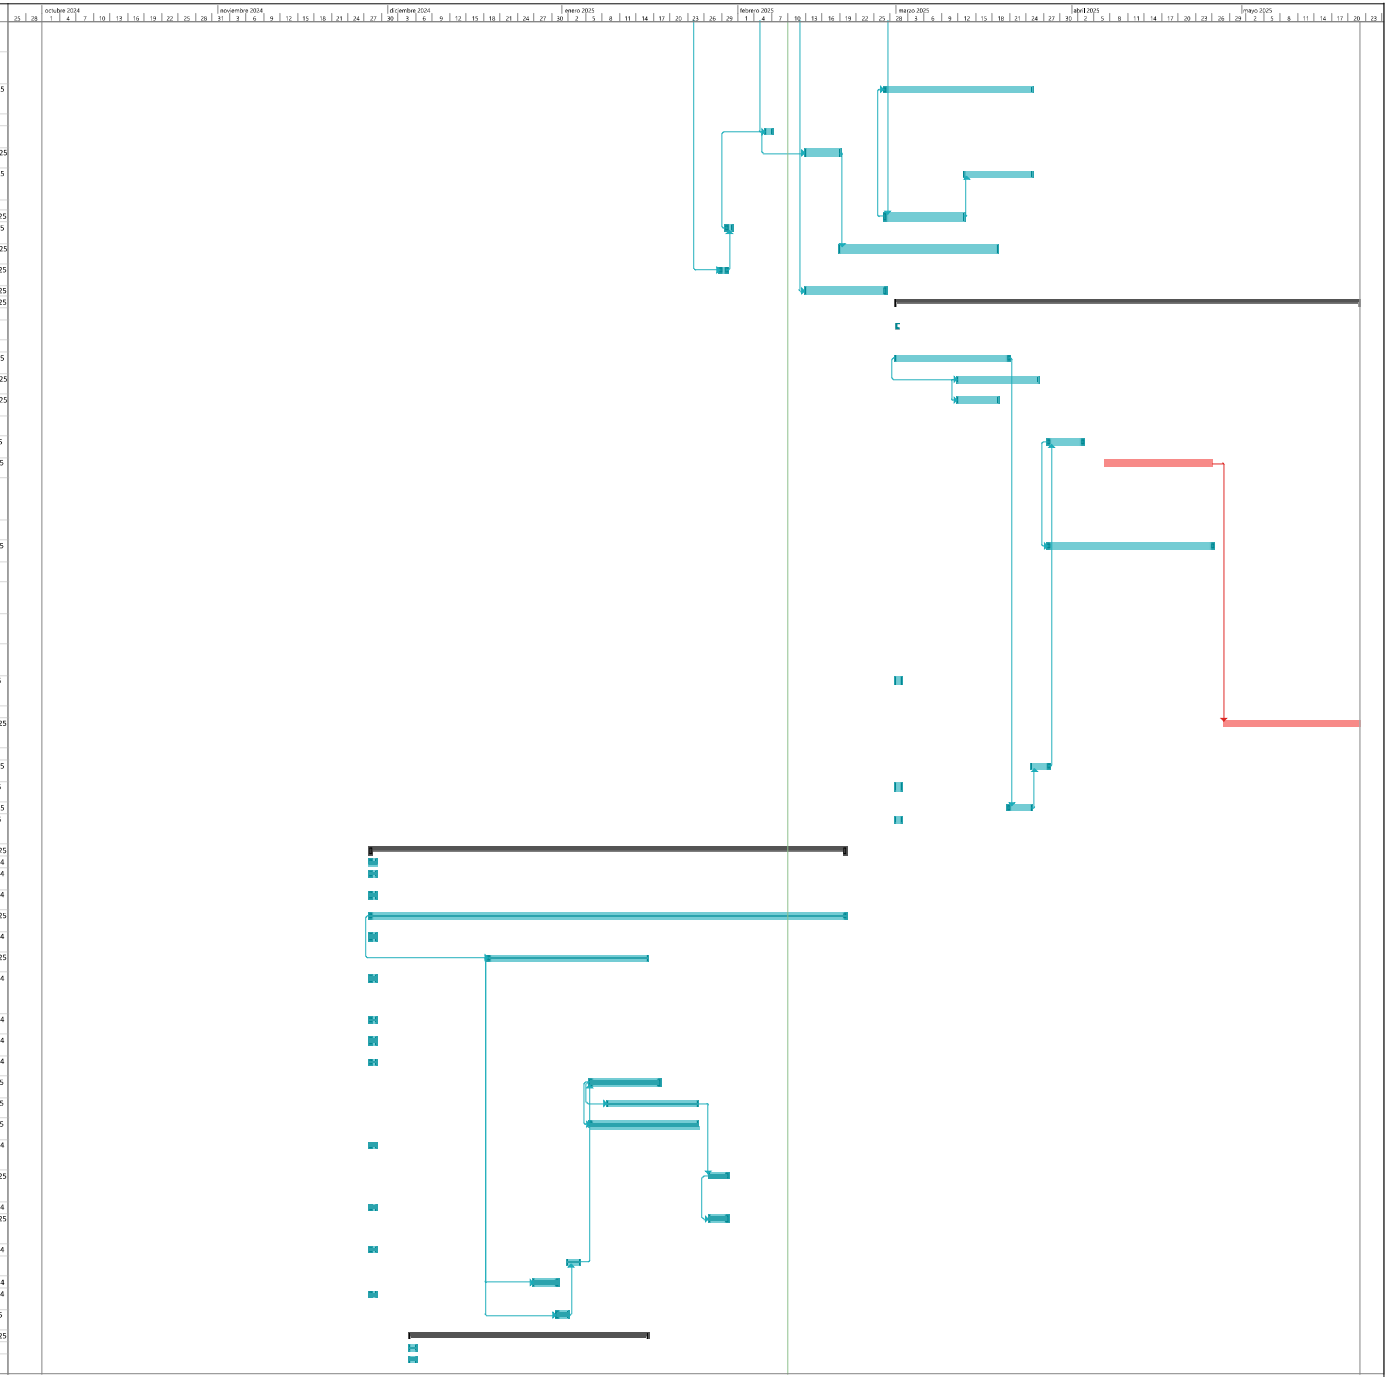

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	% completado	Comienzo anticipado	Comienzo real	Variación de comienzo	Comienzo	Fin
186		**TERRACEO FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACION DE BANCA VIA, APLICACIÓN DE MATERIAL**	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
187		EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	7 días	100%	vie 6/12/24	vie 6/12/24	0 días	vie 6/12/24	lun 16/12/24
188		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
189		DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
190		CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
191		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
192		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	12 días	100%	vie 20/12/24	vie 20/12/24	0 días	vie 20/12/24	lun 6/01/25
193		CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
194		CONCRETO DE 28 MPa - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS . LONGITUD DE 0 A 7.0 Mts.	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
195		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
196		TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	7 días	100%	mar 7/01/25	mar 7/01/25	0 días	mar 7/01/25	mié 15/01/25
197		**ITEMS COMPLEMENTARIOS**	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
198		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	7 días	100%	mar 7/01/25	mar 7/01/25	0 días	mar 7/01/25	mié 15/01/25
199		DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	8 días	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	lun 16/12/24
200		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	7 días	100%	vie 27/12/24	vie 27/12/24	0 días	vie 27/12/24	lun 6/01/25
201		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	5 días	100%	vie 20/12/24	vie 20/12/24	0 días	vie 20/12/24	jue 26/12/24
202		**ITEMS NO PREVISTOS**	1 día	100%	jue 5/12/24	jue 5/12/24	0 días	jue 5/12/24	jue 5/12/24
203		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	2 días	100%	mié 18/12/24	mié 18/12/24	0 días	mié 18/12/24	jue 19/12/24
204		PEDRAPLEN COMPACTO	3 días	100%	mar 17/12/24	mar 17/12/24	0 días	mar 17/12/24	jue 19/12/24
205		MANEJO Y DESVÍO DE AGUAS TEMPORALES PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS	1 día	100%	mar 17/12/24	mar 17/12/24	0 días	mar 17/12/24	mar 17/12/24

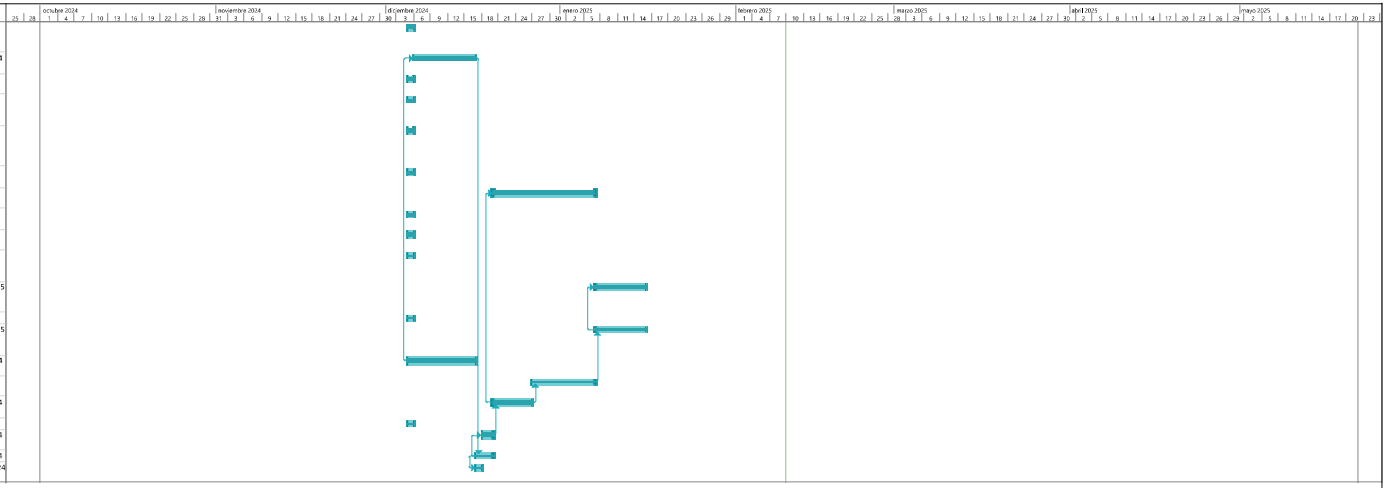

CONTROL DE PLAZOS OBRA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2025

5.1 CONTROL DE PLAZOS OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

	FECHA		PLAZO				
			AÑOS	MESES	DIAS		
ACTA DE INICIO	06/09/2023	PLAZO		3	26	FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO	31/12/2023

SUSPENSIONES							
			ANOS	MESES	DIAS		FECHA
SUSPENSION 1	28/12/2023	TIEMPO		3	20	REINICIO 1	18/04/2024
SUSPENSION 2		TIEMPO				REINICIO 2	
SUSPENSION 3		TIEMPO				REINICIO 3	
SUSPENSION 4		TIEMPO				REINICIO 4	
SUSPENSION 5		TIEMPO				REINICIO 5	
SUSPENSION 6		TIEMPO				REINICIO 6	
SUSPENSION 7		TIEMPO				REINICIO 7	
SUSPENSION 8		TIEMPO				REINICIO 8	
SUSPENSION 9		TIEMPO				REINICIO 9	
SUSPENSION 10		TIEMPO				REINICIO 10	
			AÑOS	MESES	DIAS		
TOTAL SUSPENSIONES		**TIEMPO**	**0**	**3**	**20**		

ADICIONES EN PLAZO							
			ANOS	MESES	DIAS		FECHA
ADICION 1	20/04/2024	TIEMPO		8		PARA VERIFICAR SI ES (HASTA FECHA ?)	20/12/2024
ADICION 2	16/12/2024	TIEMPO		5		PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	16/05/2025
ADICION 3		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 4		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 5		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 6		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 7		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 8		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 9		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 10		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
			AÑOS	MESES	DIAS		
TOTAL ADICIONES EN PLAZO		**TIEMPO**	**0**	**13**	**0**		

	AÑOS	MESES	DIAS
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**0**	**16**	**26**

FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	**21/05/2025**
	miércoles, 21 de mayo de 2025

CONTROL DE PLAZOS
INTERVENTORIA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	**FECHA:** 29 DE ABRIL DE 2025

5.2 CONTROL DE PLAZOS INTERVENTORIA

CONTRATO No:	**2567**	DE	**2023**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**16**	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

	FECHA		PLAZO				
			AÑOS	MESES	DIAS		
ACTA DE INICIO	06/09/2023	PLAZO		3	26	FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO	31/12/2023

SUSPENSIONES							
			AÑOS	MESES	DIAS		FECHA
SUSPENSION 1	28/12/2023	TIEMPO		3	20	REINICIO 1	18/04/2024
SUSPENSION 2		TIEMPO				REINICIO 2	
SUSPENSION 3		TIEMPO				REINICIO 3	
SUSPENSION 4		TIEMPO				REINICIO 4	
SUSPENSION 5		TIEMPO				REINICIO 5	
SUSPENSION 6		TIEMPO				REINICIO 6	
SUSPENSION 7		TIEMPO				REINICIO 7	
SUSPENSION 8		TIEMPO				REINICIO 8	
SUSPENSION 9		TIEMPO				REINICIO 9	
SUSPENSION 10		TIEMPO				REINICIO 10	
			ANOS	**MESES**	**DIAS**		
TOTAL SUSPENSIONES		**TIEMPO**	**0**	**3**	**20**		

ADICIONES EN PLAZO							
			ANOS	**MESES**	**DIAS**		**FECHA**
ADICION 1	20/04/2024	TIEMPO		8		PARA VERIFICAR SI ES (HASTA FECHA ?)	20/12/2024
ADICION 2	16/12/2024	TIEMPO		5		PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	16/05/2025
ADICION 3		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 4		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 5		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 6		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 7		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 8		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 9		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
ADICION 10		TIEMPO				PARA VERIFICAR SI ES HASTA FECHA ?	
			AÑOS	**MESES**	**DIAS**		
TOTAL ADICIONES EN PLAZO		**TIEMPO**	**0**	**13**	**0**		

	AÑOS	**MESES**	**DIAS**
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**0**	**16**	**26**

FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	**21/05/2025**
	miércoles, 21 de mayo de 2025

SEGUIMIENTO FINANCIERO

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA	FECHA: 29 DE ABRIL DE 2025

7. SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

6.1 CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR
1	CONDICIONES INICIALES	3 meses y 26 días	$ 1,259,433,527.00
2	ADICIONAL EN PLAZO 1	8 meses	
3	ADICIONAL EN PLAZO 2	5 meses	
	VALOR TOTAL		$ 1,259,433,527.00

6.2 DESEMBOLSOS Y/O PAGOS CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA			AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	VALOR PAGADO
ANTICIPO	11	12	2023		$ 377,830,058.10	
ACTA PARCIAL No. 1						
ACTA PARCIAL No. 2						
ACTA PARCIAL No. 3						
TOTAL PAGOS CONTRATO DE OBRA						**$ 0.00**
SALDO DEL CONTRATO DE OBRA						$ 1,259,433,527.00

6.3 CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR
1	CONDICIONES INICIALES	3 meses y 26 días	$ 71,088,277.00
2	ADICIONAL EN PLAZO 1	8 meses	
3	ADICIONAL EN PLAZO 2	5 meses	
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 71,088,277.00

6.4 DESEMBOLSOS Y/O PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA			AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO ANTICIPO	VALOR PAGADO
ANTICIPO						
ACTA PARCIAL No. 1						
ACTA PARCIAL No. 2						
ACTA PARCIAL No. 3						
TOTAL PAGOS CONTRATO DE INTERVENTORIA						**$ 0.00**
SALDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA						$ 71,088,277.00

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHÓN
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

*Anexar copia de actas generadas en el periodo

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO DE OBRA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACION Y PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.200.976, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE identificado con Nit 901.719548-1 en calidad de interventor del contrato de obra N° 001 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA REDVIAL DEPARTAMENTALAFECTADA PORTEMPORADA DELLUVIAS ENMUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", celebrado entre el Departamento de Boyacá y NYS CONSTRUCOL S.A.S, certifico que durante el periodo del presente informe, la empresa NYS CONSTRUCOL S.A.S identificada con Nit 901306834-9, ha realizado las afiliaciones de personal y el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes durante el periodo comprendido desde el 18 de marzo de 2025 al 17 de abril de 2025 . Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Chiquinquirá Boyacá, a los 17 días del mes de abril de 2025.

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

NIT. 901.306.834-9

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.053.324.568 de Chiquinquirá, Boyacá y con Tarjeta Profesional No. 186579-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de NYS CONSTRUCOL S.A.S. identificada con NIT 901.306.834-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante el 18 de marzo de 2025 al 17 de abril de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa NYS CONSTRUCOL SAS se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (artículo *3 Decreto 1047 de 1983)* se realizará en cuanto se obtenga el acta de recibo final.

En constancia, se firma en Chiquinquirá, a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2025.

JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS
CONTADOR PÚBLICO

NYS CONSTRUCOL S.A.S.



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186579-T

JULIAN CAMILO
RAMIREZ CASTELLANOS
C.C. 1053324568
RESOLUCION INSCRIPCION 058
UNIVERSIDAD U. P. T. C.

FECHA 12/02/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

195673



187143

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 7 B D 5 E A 0 C A F 3 5 B 9 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053324568 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 186579-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

10.1 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

8.1.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO CONTRATO DE OBRA
(Debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada por el contratista de obra)

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA EXP (dd/mm/aaaa)	CARGO	TIPO VINCULACIÓN	TIPO RIESGO (I,II,III,IV,V)	ASIGNACIÓN BASICA MENSUAL	BASE COTIZACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PARAFISCALES (CCF, SENA, ICBF)	PERIODO COTIZADO		
												MES COTIZADO	DIAS	PLANILLA N°
ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	4.158.923	19/05/1995	Director	CONTRATO	I	1,423,500	1,423,500	X	X	X	X	MARZO		32762419
SONIA MALENA MARIN SOTELO	1.053.340.500	23/12/2010	Residente	CONTRATO	V	3,600,000	3,600,000	X	X	X	X	MARZO		85911928

8.1.3 PERSONAL MANO DE OBRA
(Debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada por el contratista de obra)

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	FECHA EXP (dd/mm/aaaa)	CARGO	TIPO VINCULACIÓN	TIPO RIESGO (I,II,III,IV,V)	ASIGNACIÓN BASICA MENSUAL	BASE COTIZACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PARAFISCALES (CCF, SENA, ICBF)	PERIODO COTIZADO		
												MES COTIZADO	DIAS	PLANILLA N°

NOTAS:

* Adjuntar copia de los contratos de trabajo del personal que no este incluido en la nomina del contratista

* Adjuntar certificados de afiliación (ARL y EPS), y copia de las planillas de pago

* El personal debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada

* Si se incluyó personal profesional nuevo en el periodo se debe adjuntar la hoja de vida y certificado de aprobación de interventoría, previo al ingreso del personal.

* El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

* El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los aportes legales y seguridad social del personal vinculado al contrato de obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

* El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
M.P N°:	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
M.P N°	25202274731-CND

RAZÓN SOCIAL :	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-4158923
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-04-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-04-14
FECHA DE PAGO:	2025-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-03
PERÍODO SALUD:	2025-03
NÚMERO PLANILLA:	32762419
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32762419
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 900	$ 178.000	$ 178.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 227.800	$ 228.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.500	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 413.300	$ 415.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS	CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	22/04/2025	85911928	$3.225.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.000	0		0		0	12	1.800	0	221.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	190.000	0		0		0	12	1.500	0	191.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	3.800	0		0		0	12	100	0	3.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	576.000	0	0	0	0	12	4.500	0	580.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.079.200	0	0	0	0	12	8.400	0	1.087.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	717.200				717.200	12	5.600	722.800			7.172	722.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	413.800	12	3.300	417.100	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	413.800	417.200
Pensión	2	1.655.200	1.668.100
Riesgos Laborales	1	717.200	722.800
CCF	1	413.800	417.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.200.000	3.225.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	22/04/2025	85911928	$3.225.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001272279	ROCHA TORRES ANA MARIA	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.300	CCF10	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
2	CC	1053340500	MARIN SOTELO SONIA MALENA	1	0			S																	230201	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-4	3.600.000	5	250.600	CCF10	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
3	CC	1055551012	BELTRAN VEGA ELVER ALFONSO	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF10	47.450	1.900	0	0	0	0	0
4	CC	1055963752	CASALLAS ROBAYO ILBAR FERNANDO	1	0			S	X																230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-4	47.450	1	300	CCF10	47.450	1.900	0	0	0	0	0
5	CC	80217561	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	4.750.000	760.000	0	0	0	0	EPS017	4.750.000	190.000	14-4	4.750.000	5	330.600	CCF10	4.750.000	190.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVICINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA”

Asunto: CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mediante la presente Yo, JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.010.200.976, en mi calidad de Representante legal de CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE identificada con Nit 901719548-1, de acuerdo con los estados financieros certifico el pago de aportes de seguridad social, pensión, salud y riesgos laborales, así como el pago de aportes parafiscales durante el periodo de 18 de marzo de 2025 al 17 de abril de 2025.

Dando cumplimiento a los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2025.

R/L JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

NIT: 901.719.548-1

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES


ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022

(PESONAS JURIDICAS)

NELSY JAKELINE RIVERA ROCHA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1053.322.012 de Chiquinquirá, Boyacá y con tarjeta profesional No. 326628-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador Público del Consorcio INTER EMERGENCIAS NORTE identificado con NIT 901.719.548-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación Familiar, y el fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de la Construcción (Articulo 65 Ley 1819 de 2016 y el articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía para el periodo del 18 de Marzo de 2025 al 17 de Abril de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, bajo gravedad de juramento, manifiesto que el CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor dl Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones del Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas Jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto de renta y complementarios a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chiquinquirá a los veintinueve (29) días del mes de Abril de 2025



NELSY JAKELINE RIVERA ROCHA

CONTADOR PÚBLICO

TP-326628-T




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

326628-T

NELSY JAKELINE
RIVERA ROCHA
C.C. 1053322012
RES. INSCRIPCION 266 DEL 21/05/2024
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SAN GIL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

377004 386610

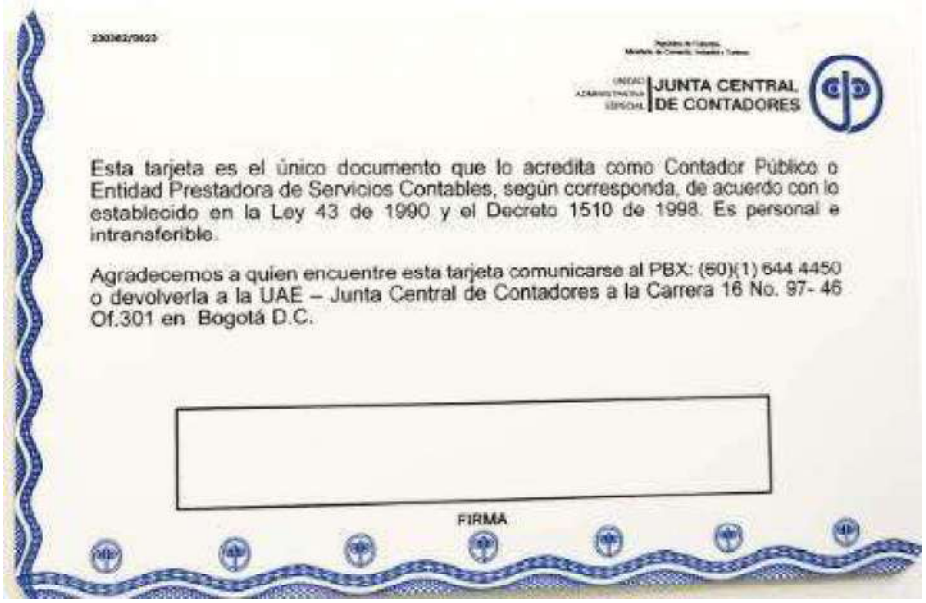

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

10.2 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES INTERVENTORIA

CONTRATO No:	**2567**	DE	**2023**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**16**	FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025

PERIODO:	DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

8.2.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(Debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada por el interventor)

NOBRES Y APELLIDOS	CARGO	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CAJA COMP, SENA, ICBF	PERIODO	
							MES	PLANILLA N°
JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO	Director	1.010.200.976	X	X	X	X	MARZO	9484282887
LAURA YANETH RODRIGUEZ BERDUGO	Residente	1.057.589.899	X	X	X	X	MARZO	85818140

NOTAS:

***** Adjuntar certificados de afiliación (ARL y EPS), y copia de las planillas de pago

***** El personal debe estar acorde al pliego de condiciones y propuesta presentada

***** Si se incluyó personal profesional nuevo en el periodo se debe adjuntar la hoja de vida y certificado de aprobación del supervisor, previo al ingreso del personal.

* El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

* El Supervisor realiza la verificación del pago de los aportes legales y seguridad social del personal vinculado al contrato de interventoría, así como el cumplimiento de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique, basado en la documentación presentada y en virtud del principio de buena fé sobre la veracidad de dicha información.

* El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la supervisión la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JAVIER IVAN BARRETO PINTO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
	SUPERVISOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010200976		PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 18 7 28	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3222186	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1433644749	9484282887	I	2025/04/21	2025/04/25	BANCO AV VILLAS	4	$506,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1010200976	PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO																		230301	30	EPS037	30		0	14-11	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010200976		PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 18 7 28	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3222186	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1433644749	9484282887	I	2025/04/21	2025/04/25	BANCO AV VILLAS	4	$506,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$600	$0	$228,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$600	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$300	$0	$99,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$300	$0	$99,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$500	$0	$178,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$500	$0	$178,500
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$1,400**	**$0**	**$506,300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901719548-1	CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE	CRA 4 7 53 P3	3143501710	jypconsul.2019@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	14/04/2025	85818140	$442.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	4	200	0	57.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	4	600	0	228.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	4	300	99.400			991	99.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	57.000	4	200	57.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.200
Pensión	1	227.800	228.400
Riesgos Laborales	1	99.100	99.400
CCF	1	57.000	57.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	440.900	442.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901719548-1	CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE		CRA 4 7 53 P3	3143501710	jypconsul.2019@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	14/04/2025	85818140	$442.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057589899	RODRIGUEZ BERDUGO LAURA YANETH	1	0			S		X															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ENSAYOS DE LABORATORIO
CONTRATO DE OBRA

CHIQUINQUIRA: CLL 4 # 7-53	**EMAIL: jypconsul.2019@gmail.com**	**TELEFONO:** 3143501710

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

13.1 ENSAYOS DE LABORATORIO OBRA

CONTRATO No:	1	DE	2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16		FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025		
PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

LABORATORIO:	DIRECCION:	TELEFONO:	CERTIFICADO N°:
GLOBALCIVIL INGENIERIA S.A.S.	Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur	313 891 2400	

ENSAYOS DE LABORATORIO

N°	TIPO DE ENSAYO	FECHA DE MUESTRA	NORMA	MATERIAL	LOCALIZACION	N° MUESTRA	RANGO CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	OBSERVACION		
									CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIDA CORRECTIVA (Si se requiere)
1	Resistencia a la Compresión	18/02/2025	I.N.V.E-410-13	Concreto	COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETO DE ZANJA DE CORONACION (SAN MATEO)	3	2500	2604,46 PSI	X		Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I) FECHA DE FALLA 18/03/2025
2	Resistencia a la Compresión	19/02/2025	I.N.V.E-410-13	Concreto	COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETO DE ZANJA DE CORONACION (SAN MATEO)	3	2500	2570,53 PSI	X		Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I) FECHA DE FALLA 19/03/2025
3	Resistencia a la Compresión	24/02/2025	I.N.V.E-410-13	Concreto	BOLSACRETO SECCION SUPERIOR DE LA POCETA PARA CANALIZACION DEL CAUCE (SAN MATEO)	3	2500	2597,83 PSI	X		Resistencia obtenida a 28 días (P.S.I) FECHA DE FALLA 24/03/2025

* Adjuntar copia de la certificación de calidad del laboratorio
* Adjuntar copia de los resultados y/o informes de laboratorio firmados
* Adjuntar informe de seguimiento al PLAN DE CALIDAD avalado por la interventoria

FIRMA:

NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA Nº	25202098884-CND

FIRMA:

NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorias y Construccion

Página 1 de 1	ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA INV E – 410 –13	

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
DIRIGIDO A :	NYS CONSTRUCOL
RESISTENCIA DE DISEÑO:	f´c = 2500 p.s.i. CONCRETO CLASE E (175 Kg/cm2)
FECHA:	18/03/2025

Numero de Cilindros	1	2	3
Tipo de Estructura	FUNDICIÓN DE LOS COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETOS DE ZANJA DE CORONACIÓN (SAN MATEO)	FUNDICIÓN DE LOS COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETOS DE ZANJA DE CORONACIÓN (SAN MATEO)	FUNDICIÓN DE LOS COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETOS DE ZANJA DE CORONACIÓN (SAN MATEO)
Fecha de Vaciado	18/02/2025	18/02/2025	18/02/2025
Fecha de Falla	25/02/2025	4/03/2025	18/03/2025
Edad del Cilindro (En Dias)	7	14	28
Diametros del Cilindro (cm)	10,20	10,00	10,10
	10,10	10,00	10,20
Alturas del Cilindro (cm)	20,30	20,30	20,10
	20,10	20,00	20,30
Area (cm²)	80,91	78,54	80,91
R:L/d	1,990	2,015	1,990
Resistencia Deseada (Psi)	2500	2500	2500
Asentamientos (pul)			
Carga (Kg)	10258	12593	14816

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

(Kg/cm²)	**126,78**	**160,34**	**183,11**
(PSI)	**1803,23**	**2280,61**	**2604,46**
Porcentaje Alcanzado	**72,13**	**91,22**	**104,18**
Tipo de Falla	**Tipo 5**	**Tipo 5**	**Tipo 5**

REF. MT 12 N. 158

Observaciones : Los cilindros fueron suministrados por el cliente

ING.JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC
DIRECTOR GLOBALCIVIL INGENIERIA S.A.S.

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e-mail: globalcivilsas@gmail.com

Laboratorio de Suelos GlobalCivil Interventorias y Construccion

Página 1 de 1	ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA INV E – 410 –13	

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
DIRIGIDO A :	NYS CONSTRUCOL
RESISTENCIA DE DISEÑO:	f´c = 2500 p.s.i. CONCRETO CLASE E (175 Kg/cm2)
FECHA:	19/03/2025

Numero de Cilindros	1	2	3
Tipo de Estructura	FUNDICIÓN COSTADOS LATERALES BOLSACRETOS SECCION DE ZANJA DE CORONACIÓN Y SE CONTINÚA CON SECCIÓN FILTRANTE (SAN MATEO)	FUNDICIÓN COSTADOS LATERALES BOLSACRETOS SECCION DE ZANJA DE CORONACIÓN Y SE CONTINÚA CON SECCIÓN FILTRANTE (SAN MATEO)	FUNDICIÓN COSTADOS LATERALES BOLSACRETOS SECCION DE ZANJA DE CORONACIÓN Y SE CONTINÚA CON SECCIÓN FILTRANTE (SAN MATEO)
Fecha de Vaciado	19/02/2025	19/02/2025	19/02/2025
Fecha de Falla	26/02/2025	5/03/2025	19/03/2025
Edad del Cilindro (En Dias)	7	14	28
Diametros del Cilindro (cm)	10,10	10,20	10,00
	10,00	10,30	10,00
Alturas del Cilindro (cm)	20,20	20,10	20,10
	20,10	20,30	20,00
Area (cm²)	79,33	82,52	78,54
R:L/d	2,005	1,971	2,005
Resistencia Deseada (Psi)	2500	2500	2500
Asentamientos (pul)			
Carga (Kg)	10003	13073	14194

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

(Kg/cm²)	**126,10**	**158,42**	**180,73**
(PSI)	**1793,58**	**2253,33**	**2570,53**
Porcentaje Alcanzado	**71,74**	**90,13**	**102,82**
Tipo de Falla	**Tipo 5**	**Tipo 5**	**Tipo 5**

REF. MT 12 N. 158

Observaciones : Los cilindros fueron suministrados por el cliente

ING.JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC
DIRECTOR GLOBALCIVIL INGENIERIA S.A.S.

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e-mail: globalcivilsas@gmail.com

Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorias y Construccion

Página 1 de 1	ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA INV E – 410 –13	

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA
DIRIGIDO A :	NYS CONSTRUCOL
RESISTENCIA DE DISEÑO:	f´c = 2500 p.s.i. CONCRETO CLASE E (175 Kg/cm2)
FECHA:	24/03/2025

Numero de Cilindros	1	2	3
Tipo de Estructura	FUNDICIÓN DE BOLSACRETOS EN LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA POCETA PARA CANALIZACIÓN DEL CAUCE (SAN MATEO)	FUNDICIÓN DE BOLSACRETOS EN LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA POCETA PARA CANALIZACIÓN DEL CAUCE (SAN MATEO)	FUNDICIÓN DE BOLSACRETOS EN LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA POCETA PARA CANALIZACIÓN DEL CAUCE (SAN MATEO)
Fecha de Vaciado	24/02/2025	24/02/2025	24/02/2025
Fecha de Falla	3/03/2025	10/03/2025	24/03/2025
Edad del Cilindro (En Dias)	7	14	28
Diametros del Cilindro (cm)	10,00	10,00	10,30
	10,20	10,10	10,20
Alturas del Cilindro (cm)	20,10	20,30	20,10
	20,10	20,10	20,10
Area (cm²)	80,12	79,33	82,52
R:L/d	1,990	2,010	1,961
Resistencia Deseada (Psi)	2500	2500	2500
Asentamientos (pul)			
Carga (Kg)	9993	12675	15071

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

(Kg/cm²)	**124,73**	**159,78**	**182,65**
(PSI)	**1774,06**	**2272,60**	**2597,83**
Porcentaje Alcanzado	**70,96**	**90,90**	**103,91**
Tipo de Falla	**Tipo 5**	**Tipo 5**	**Tipo 5**

REF. MT 12 N. 158

Observaciones : Los cilindros fueron suministrados por el cliente

ING.JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC
DIRECTOR GLOBALCIVIL INGENIERIA S.A.S.

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e-mail: globalcivilsas@gmail.com

ENSAYOS DE LABORATORIO
CONTRATO DE INTERVENTORIA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

13.2 ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA

CONTRATO No:	1	DE	2023								
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16			FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025		
PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

LABORATORIO:	DIRECCION:	TELEFONO:	CERTIFICADO N°:
GEOCONTROL LAB	CALLE 13 N° 12-16	311 211 7489	

ENSAYOS DE LABORATORIO


N°	TIPO DE ENSAYO	FECHA	NORMA	MATERIAL	LOCALIZACION	N° MUESTRA	RANGO CUMPLIMIENTO	VALOR OBTENIDO	OBSERVACIÓN		
									CUMPLE	NO CUMPLE	MEDIDA CORRECTIVA (Si se requiere)
1	**Resistencia a la Compresión**	**18/02/2025**	INV-E-410-13	Concreto	COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETO DE ZANJA DE CORONACION (SAN MATEO)	1	**2500**	**2580,25 PSI**	x		Fecha de rotura 18/03/2025
						2	**2500**	**2602,67 PSI**			
2	**Resistencia a la Compresión**	**19/02/2025**	INV-E-410-13	Concreto	COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETO DE ZANJA DE CORONACION Y SECCION FILTRANTE (SAN MATEO)	1	**2500**	**2717,20 PSI**	x		Fecha de rotura 19/03/2025
						2	**2500**	**2626,91 PSI**			
3	**Resistencia a la Compresión**	**24/02/2025**	INV-E-410-13	Concreto	BOLSACRETO SECCION SUPERIOR DE LA POCETA PARA CANALIZACION DEL CAUCE (SAN MATEO)	1	**2500**	**2595,50 PSI**	x		Fecha de rotura 24/03/2025
						2	**2500**	**2579,37 PSI**			

* Adjuntar copia de los resultados y/o informes de laboratorio firmados por el laboratorio en el anexo correspondiente.

* Adjuntar copia de la certificación del laboratorio

* Ajuntar certificación de aprobación de los ensayos reportados en el perido.

FIRMA:



NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

GEOCONTROL LAB

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
CALLE 13 N° 12-16
E-MAIL: LUIFENET@HOTMAIL.COM
CEL 3112117489

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

(INV E – 410 -13 O ASTM C39)

PROYECTO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA**
DIRIGIDO A :	**CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE**
RESISTENCIA DE DISEÑO:	**f´c = 2500 p.s.i. CONCRETO CLASE E (175 Kg/cm2)**
MUNICIPIO:	**SAN MATEO**
FECHA:	**18/03/2025**

Cilindro N°	Tipo de Estructura	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Edad Días	Diámetro (cm)	Altura (cm)	Área (cm²)	Carga (Kg)	R: L/d	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/cm²)	(Psi)	(%)	Deseada (Psi)	Tipo de Falla
1	FUNDICIÓN DE LOS COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETOS DE ZANJA DE CORONACIÓN	18/02/25	18/03/25	28	10,20 10,30	20,10 20,30	82,52	14969,2	1,97	**181,41**	**2580,25**	**103,21**	**2500,0**	Tipo 5
2	FUNDICIÓN DE LOS COSTADOS LATERALES DE BOLSACRETOS DE ZANJA DE CORONACIÓN	18/02/25	18/03/25	28	10,30 10,00	20,10 20,30	80,91	14806	1,99	**182,99**	**2602,67**	**104,11**	**2500,0**	Tipo 5

REF. TM 12 N. 158

Observaciones Los cilindros fueron suministrados por el cliente



LUISA FERNANDA GONZALEZ
MP.25202181944 CND

GEOCONTROL LAB

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
CALLE 13 N° 12-16
E-MAIL: LUIFENET@HOTMAIL.COM
CEL 3112117489

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

(INV E – 410 -13 O ASTM C39)

PROYECTO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA**
DIRIGIDO A :	**CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE**
RESISTENCIA DE DISEÑO:	**f´c = 2500 p.s.i. CONCRETO CLASE E (175 Kg/cm2)**
MUNICIPIO:	**SAN MATEO**
FECHA:	**19/03/2025**

Cilindro N°	Tipo de Estructura	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Edad	Diámetro (cm)	Altura (cm)	Área (cm²)	Carga (Kg)	R: L/d	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN				Tipo de Falla
				Días						(Kg/cm²)	(Psi)	(%)	Deseada (Psi)	
1	FUNDICIÓN COSTADOS LATERALES BOLSACRETOS SECCION DE ZANJA DE CORONACIÓN Y SE CONTINÚA CON SECCIÓN FILTRANTE	19/02/25	19/03/25	28	10,10 10,10	20,10 20,00	80,12	15305,7	1,99	**191,04**	**2717,20**	**108,69**	**2500,0**	Tipo 5
2	FUNDICIÓN COSTADOS LATERALES BOLSACRETOS SECCION DE ZANJA DE CORONACIÓN Y SE CONTINÚA CON SECCIÓN FILTRANTE	19/02/25	19/03/25	28	10,20 10,20	20,30 20,10	81,71	15091,6	1,98	**184,69**	**2626,91**	**105,08**	**2500,0**	Tipo 5

REF. TM 12 N. 158

Observaciones Los cilindros fueron suministrados por el cliente

LUISA FERNANDA GONZALEZ
MP.25202181944 CND

GEOCONTROL LAB

LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
CALLE 13 N° 12-16
E-MAIL: LUIFENET@HOTMAIL.COM
CEL 3112117489

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

(INV E – 410 -13 O ASTM C39)

PROYECTO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA**
DIRIGIDO A :	**CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE**
RESISTENCIA DE DISEÑO:	**f´c = 2500 p.s.i. CONCRETO CLASE E (175 Kg/cm2)**
MUNICIPIO:	**SAN MATEO**
FECHA:	**24/03/2025**

Cilindro N°	Tipo de Estructura	Fecha Vaciado	Fecha Rotura	Edad Días	Diámetro (cm)	Altura (cm)	Área (cm²)	Carga (Kg)	R: L/d	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/cm²)	(Psi)	(%)	Deseada (Psi)	Tipo de Falla
1	FUNDICIÓN DE BOLSACRETOS EN LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA POCETA PARA CANALIZACIÓN DEL CAUCE	24/02/25	24/03/25	28	10,10 10,20	20,20 20,10	80,91	14765,3	1,99	**182,48**	**2595,50**	**103,82**	**2500,0**	Tipo 5
2	FUNDICIÓN DE BOLSACRETOS EN LA SECCIÓN SUPERIOR DE LA POCETA PARA CANALIZACIÓN DEL CAUCE	24/02/25	24/03/25	28	10,20 10,10	20,20 20,20	80,91	14673,5	1,99	**181,35**	**2579,37**	**103,17**	**2500,0**	Tipo 5

REF. TM 12 N. 158

Observaciones Los cilindros fueron suministrados por el cliente



LUISA FERNANDA GONZALEZ
MP.25202181944 CND



SEGUIMIENTO A LA CORRESPONDENCIA

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

16. SEGUMIENTO A CORRESPONDENCIA

CONTRATO No:	1	DE	2023
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16		
FECHA:	29 de ABRIL de 2025		
PERIODO:	DEL 18 de MARZO de 2025 AL 17 de ABRIL de 2025		

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

N°	FECHA RADICADO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
	18/03/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	G.B.-C.O.-2024-057. Respuesta al auto 0076 de 06 de marzo de 2025, con radicado 2024EE12869.	Radicado Via Correo Electronico
	20/03/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	S-2025-000411-INFDDIV. Respuesta a comunicación C.I.P-2567-2024-105 - Avance de tramites POC	Radicado Via Correo Electronico
	27/03/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	S-2025-000444-INFDDIV. Programación visita técnica. Santa Maria	Radicado Via Correo Electronico
	4/04/2025	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte		Radicado Via Correo Electronico
	2/04/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	G.B.-C.O.-2024-058. Entrega de observaciones acta parcial No 1.	Radicado Via Correo Electronico
	11/04/2025	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	G.B.-C.O.-2024-058 A. Respuesta al auto 0095 de 12 de marzo de 2025	Radicado Via Correo Electronico

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

16. SEGUMIENTO A CORRESPONDENCIA

CONTRATO No:	1	DE	2023
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29 de ABRIL de 2025
PERIODO:	DEL 18 de MARZO de 2025	AL	17 de ABRIL de 2025

N°	FECHA RADICADO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
CORRESPONDENCIA PRESENTADA					
	11/04/2024	Ing. Javier Ivan Barreto Pinto Supervisor contrato	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	S-2025-000530-INFDDIV. Devolución Informe de Interventoría No. 14	Radicado Via Correo Electronico
CORRESPONDENCIA ENVIADA					
	18/03/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-106. Observaciones Informe 13	Radicado Via Correo Electronico
	26/03/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-107. Ratificacion Aval Suspensión del Cto de obra	Radicado Via Correo Electronico
	26/03/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	SECRETARIA DE CONTRATACION - Procesos de Seleccion JAVIER IVAN BARRETO PINTO Supervisor Gobernacion de Boyacá	C.I.P-2567-2024-108. Información demora trámite de Modificatorio de obra	Radicado Via Correo Electronico
	2/04/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-109. ACTA PARCIAL DE OBRA N.1 v2	Radicado Vía Correo Electrónico

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

16. SEGUMIENTO A CORRESPONDENCIA

CONTRATO No:	1	DE	2023
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16		
FECHA:	29 de ABRIL de 2025		
PERIODO:	DEL 18 de MARZO de 2025 AL 17 de ABRIL de 2025		

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

N°	FECHA RADICADO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
	10/04/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-110. Entrega Informe Mensual N 15	Radicado Via Correo Electronico
	10/04/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Jhonatan Meneses Sanchez R/L. NYS Construcol S.A.S	C.I.P-2567-2024-111. Respuesta tramite modificatorio N°4	Radicado Via Correo Electronico
	10/04/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-112. Subsanacion de Observaciones Informe Mensual N 14	Radicado Via Correo Electronico
	10/04/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-113. Respuesta a su comunicado S-2025-000517-INFDDIV SUBSANACION DE OBSERVACIONES ACTA PARCIAL No. 1.	Radicado Vía Correo Electrónico
	14/04/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-114. Subsanacion de Observaciones Informe Mensual N 14	Radicado Vía Correo Electrónico

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

16. SEGUMIENTO A CORRESPONDENCIA


CONTRATO No:	1	DE	2023
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16	FECHA:	29 de ABRIL de 2025
PERIODO:	DEL 18 de MARZO de 2025	AL	17 de ABRIL de 2025

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

N°	FECHA RADICADO	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
	14/04/2025	Juan Francisco Pachón Roncancio. R/L. Consorcio Interemergencias Norte	Javier Iván Barreto Supervisor Contrato de Interventoría. Gobernación de Boyacá	C.I.P-2567-2024-115. Respuesta a su comunicado S-2025-000483-INFDDIV Trámite permiso ocupación del cauce - CORPOCHIVOR Remisión de documentos solicitados mediante auto de 0095 del 12 de Marzo de 2025	Radicado Vía Correo Electrónico


* Adjuntar copia de la correspondencia generada (enviada y recibida) en el periodo en el anexo correspondiente.

FIRMA:



NOMBRE:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ
CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
MATRICULA N°:	25202098884-CND

FIRMA:



NOMBRE:	JUAN FRANCISCO PACHON
CARGO:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MATRICULA N°:	25202274731-CND

NIT: 901.306.834-9

Tunja, 18 de marzo de 2025.

G.B.-C.O.-2024-057

Doctora:
LAURA TATIANA LOZANO PINTO
Subdirectora de gestión ambiental.
Corpochivor.
Cc
Ingeniero:
JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
Representante Legal.
Consorcio Interemergencias Norte.

ING. JAVIER IVAN BARRETO PINTO
Supervisor contrato de interventoría
Gobernación de Boyacá

REF. CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASUNTO: Respuesta al auto 0076 de 06 de marzo de 2025, con radicado 2024EE12869.

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor) respecto al ajuste de la documentación técnica para la solicitud de permiso de ocupación de cauce, se presenta el informe correspondiente a la construcción de un sistema de drenaje tipo Box Culvert en el municipio de Santa María.

Este informe abarca los componentes hidráulico y topográfico requeridos para el análisis y evaluación del proyecto. En particular, se incluyen los resultados del estudio hidráulico, acompañados de las modelaciones respectivas, así como la información topográfica en su formato original, consolidada en la cartera topográfica.

El propósito de este documento es proporcionar la información técnica necesaria para la evaluación del proyecto, asegurando el cumplimiento de los requisitos exigidos por Corpochivor.

Jhonatan Meneses

N&S CONSTRUCOL S.A.S
R/L JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ

Cra 2B n 42A-32 *correo: nysconstrucol.contable@gmail.com* *CELULAR 3112847686*

RADICADO No: S-2025-000411-INFDDIV
FECHA RADICADO: 20 de marzo de 2025

TUNJA, 20 de marzo de 2025

Contraseña:NGKNbzW9Vo

Ingeniero
JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
R. L.CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
jypconsul.2019@gmail.com
Chiquinquira.

ASUNTO: Respuesta a comunicación C.I.P-2567-2024-105

Ref: Contrato No. 2567 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Cordial saludo.

En atención a su comunicación C.I.P-2567-2024-105 del 17 de marzo del presente año remitida a través de correo electrónico, relacionado con el avance de los trámites de permisos de ocupación del cauce, se informa que se elevo solicitud ante CORPOBOYACA, firmada por el Secretario de Infraestructura Publica con Radicado No. S-2025-000404-INFDDIV de fecha 20 de marzo de 2025, para constancia se adjunta copia.

Cordialmente,

JAVIER IVAN BARRETO PINTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Anexos: Si
Número de folios: 2

Revisó:

Elaboró: JAVIER IVAN BARRETO PINTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

RADICADO No: S-2025-000444-INFDDIV
FECHA RADICADO: 27 de marzo de 2025

TUNJA, 27 de marzo de 2025

Contraseña:cVgmC4GjaB

Ingeniero
JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
R. L.CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
jypconsul.2019@gmail.com
Chiquinquira.

ASUNTO: Programación visita técnica.

Ref: Contrato No. 2567 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Cordial saludo.

Con el propósito de verificar las obras terminadas dentro del alcance del Contrato de Obra No. 001 de 2023, específicamente las construidas en la vía secundaria denominada Santa María - El Guavio, se programó visita técnica por parte de esta supervisión para el jueves 3 de abril de 2025 a las 10:00 a.m, punto de encuentro parque principal municipio de Santa María, es así que se requiere la presencia de la interventoría, y que de igual manera se cite al contratista de obra.

Cordialmente,

JAVIER IVAN BARRETO PINTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Anexos: No
Número de folios:

Revisó:
Elaboró: JAVIER IVAN BARRETO PINTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NIT: 901.306.834-9

Tunja, 02 de abril de 2025.

G.B.-C.O.-2024-058

Ingeniero:
JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
Representante Legal.
Consorcio Interemergencias Norte.

ING. JAVIER IVAN BARRETO PINTO
Supervisor contrato de interventoría
Gobernación de Boyacá

REF. CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASUNTO: Entrega de observaciones acta parcial No 1.

Cordial saludo,

En respuesta a la solicitud de observaciones sobre los documentos del Acta Parcial No. 1, adjunto las correcciones del informe, la sábana y el acta para su revisión y aprobación.

Quedo pendiente a cualquier otra solicitud.

Atentamente

Jhonatan Meneses

N&S CONSTRUCOL S.A.S
R/L JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ

RADICADO No: S-2025-000483-INFDDIV
FECHA RADICADO: 4 de abril de 2025

TUNJA, 4 de abril de 2025

Contraseña:DIHJphX241

Ingeniero
JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
R. L. CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
jypconsul.2019@gmail.com
Chiquinquira.

ASUNTO: Trämite permiso ocupación del cauce - CORPOCHIVOR

Ref: Contrato No. 2567 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Cordial saludo.

Con relación a los tramites de permisos de ocupación del cauce ante CORPOCHIVOR, se da traslado del oficio No. 2025EE2010 del 3 de abril de 2025, mediante el cual CORPOCUIVOR comunica la Notificación electrónica del Auto 0095 del 12 de marzo de 2025, que corresponde a la construcción del box-coulvert , sobre la fuente denominada "Quebrada La Tigrana, ubicada en la vereda Encenillo del municipio de Campohermoso, lo anterior para que se proceda de acuerdo a lo dispuesto en el mismo.

Cordialmente,

JAVIER IVAN BARRETO PINTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Anexos: Si
Número de folios: 2 archivos

Revisó:
Elaboró: JAVIER IVAN BARRETO PINTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NIT: 901.306.834-9

Tunja, 11 de abril de 2025.

G.B.-C.O.-2024-058

Doctora:
LAURA TATIANA LOZANO PINTO
Subdirectora de gestión ambiental.
Corpochivor.

Cc
Ingeniero:
JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
Representante Legal.
Consorcio Interemergencias Norte.

ING. JAVIER IVAN BARRETO PINTO
Supervisor contrato de interventoría
Gobernación de Boyacá

REF. CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA

ASUNTO: Respuesta al auto 0095 de 12 de marzo de 2025

Cordial saludo,

Atendiendo la solicitud de presentar los ajustes de la propuesta de recuperación de la estructura de box culvert en el municipio de Campohermoso

- Se presenta el ajuste de diseño estructural en el que se encuentran las columnas y las zapatas.
- Se presenta la modelación de la placa de recuperación con el respectivo memorial de responsabilidad del diseñador estructural.
- Se ajustan las carteras topográficas indicando la norte y la este
- Se entrega el informe hidráulico estableciendo los caudales con diferentes periodos de retorno,

Corfialmente.

Jhonatan Meneses

N&S CONSTRUCOL S.A.S
R/L JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ

Chiquinquirá, 18 de marzo de 2025

C.I.P-2567-2024-106

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: RESPUESTA COMUNICADO S-2025-000323-INFDDIV. REVISIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA No. 13.

Cordial saludo,

Con respecto al comunicado mencionado, me permito remitir el Informe No. 13, en el cual se atiendo cada uno de los requerimientos expuestos. Lo anterior, para su respectiva revisión y aprobación.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

RADICADO No: S-2025-000530-INFDDIV
FECHA RADICADO: 11 de abril de 2025

TUNJA, 11 de abril de 2025

Contraseña:G5Q89Nn235

Ingeniero
JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
R. L. CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE
jypconsul.2019@gmail.com
Chiquinquira.

ASUNTO: Devolución Informe de Interventoría No. 14

Ref: Contrato No. 2567 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA".

Cordial saludo.

En atención a su comunicación C.I.P-2567-2024-112 del 10 de abril del presente, mediante el cual entrega nuevamente el Informe de Interventoría de Obra No. 14 subsanado, pero hecha nuevamente la revisión de acuerdo a las observaciones presentadas en el oficio con Radicado No. S-2025-000496-INFDDIV del 7 de abril de 2025, se evidencia que algunas no se tuvieron en cuenta o no se corrigieron adecuadamente, y que se relacionan a continuación:

- En el oficio remisorio (Tomo I - pág. 1); dentro del texto se hace referencia al Informe **No. 13** lo cual no es correcto seria **No. 14**. En la pagina 5 en el periodo se indica 18 de enero de **2024, corregir.**

- En el formato (pág 8) se relacionan los ensayos de laboratorio realizados por el Contratista de Obra y el de Interventoría, pero al confrontar con los soporte se evidencia que no corresponden, p.e. para el contrato de obra se relacionan 9 ensayos y se presentan tres reportes, y para interventoría se relacionan 6 y se reportan 3. Es importante tener en cuenta que se consigna unicamente la acción realizada en el periodo (si es solo toma, o si es la fecha del reporte si así corresponde).

- Respecto a la certificación de pago de seguridad social y parafiscales del personal del contrato de interventoría firmada por el representante legal y avalada por el contador publico incluyendo la tarjeta profesional y vigencia, se tiene que certifican para el mes de febrero de 2025, pero no se ha presentado la de enero de 2025. La certificación del contador debe estar detallado el periodo reportado, y no de manera global para los últimos seis meses.

- Se evidencia que se presenta anexos de la correspondencia tramitada que no corresponde al periodo reportado.

Se llama la atención, en cuanto a la dedicación y calidad de los Informes de Interventoría de Obra, que deben ser coherentes, claros, oportunos, para que no se convierta en un simple requisito de tramite, de tal manera que no se tenga que incurrir en reprocesos (revisión - devolución), dada cuenta, que aun se presentan inconsistencias que ya se habían advertido en anteriores revisiones de otros informes.

Una ves más se solicita que se haga una revisión detallada del informe, por si se evidencian otras aspectos a ajustar, y se presenten nuevamente. Se deja constancia que el Acta Parcial No. 1 del contrato de obra no se puede radicar hasta tanto no se radique el informe de interventoría No. 14, como lo solicito la Secretaria de Contratación en el oficio con Radicado No: S-2025-008861-SECCON del 8 de abril de 2025.

Quedo atento a cualquier inquietud que se presente.

Cordialmente,



JAVIER IVAN BARRETO PINTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: JAVIER IVAN BARRETO PINTO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Chiquinquirá, 18 de marzo de 2025

C.I.P-2567-2024-106

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: RESPUESTA COMUNICADO S-2025-000323-INFDDIV. REVISIÓN INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA No. 13.

Cordial saludo,

Con respecto al comunicado mencionado, me permito remitir el Informe No. 13, en el cual se atiendo cada uno de los requerimientos expuestos. Lo anterior, para su respectiva revisión y aprobación.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

Chiquinquirá, 26 de marzo de 2025

C.I.P-2567-2024-107

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá
C.C
Ingeniero
Jhonatan Meneses
R/L. NYS CONSTRUCOL S.A.S
Contratista de Obra

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: RATIFICACIÓN DE AVAL SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA 001 DE 2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito ratificar nuevamente la solicitud de suspensión del contrato de obra presentada por NYS CONSTRUCOL S.A.S., contratista de la obra, el 7 de marzo del presente año. Ya que se evidencian atrasos en la programación de la obra, por la imposibilidad de realizar actividades constructivas en el municipio de San Eduardo, situación que ha surgido debido a la necesidad de suscribir el Modificatorio No. 4 del contrato 001 de 2023.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el avance de la obra se encuentra al 85.91%, esta interventoría apoya la decisión de suspender temporalmente la ejecución del contrato, hasta tanto se obtengan los trámites administrativos necesarios para continuar con las actividades de obra pendientes.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

Chiquinquirá, 26 de marzo de 2025

C.I.P-2567-2024-108

Secretaría de Contratación
Gobernación de Boyacá.
Procesosdeseleccion@boyaca.gov.co

CC.

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá.

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: SOLICITUD INFORMACIÓN TRÁMITE DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA 001 DE 2023.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicito se me informe sobre el estado en el que se encuentra el **Modificatorio No. 4 del contrato de obra No. 001 de 2023**. Dicho modificatorio fue remitido por correo electrónico a través del oficio C.I.P-2567-2024-090 el **14 de febrero** del presente año, y hasta la fecha no hemos recibido ninguna observación, ya sea de carácter técnico o jurídico.

El 28 de febrero de 2025, se realizó una consulta informal por medio de WhatsApp al número +57 317 6569029, entendiendo que corresponde a la área de Contratación de la Gobernación de Boyacá. La respuesta recibida fue que el modificatorio se encontraba en revisión y que se debía estar pendientes de cualquier actualización.

Esta interventoría tiene conocimiento de que los retrasos en la programación de la obra se deben a la imposibilidad de intervenir en el municipio de San Eduardo, situación que está directamente relacionada con la necesidad de suscribir el Modificatorio No. 4 del contrato mencionado, trámite que a la fecha, no se ha completado.

En virtud de lo anterior, y considerando que el avance de la obra se encuentra al 85.91%, solicitamos se le de celeridad a los trámites administrativos pertinentes para continuar con las actividades de obra pendientes. Cabe resaltar que los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades en este municipio deben ser solicitados con al menos un mes de antelación, debido a que los insumos requeridos no están disponibles con proveedores nacionales.

Asimismo, como se ha documentado en los informes semanales, las actividades contractuales fueron culminadas desde el mes de febrero de 2025, tal como se detalla en los informes semanales y mensuales que se han remitido al Supervisor del Contrato.

Dado el impacto directo que la falta de firma del Modificatorio No. 4 tiene sobre el avance de la obra, solicitamos con urgencia se realicen los trámites administrativos pendientes para garantizar la continuidad de las actividades programadas. La ejecución de la obra no puede seguir retrasándose, ya que el avance actual del 85.91% demuestra que la obra está próxima a su finalización, pero requiere de estos trámites esenciales para concluir conforme al plan establecido.

Agradecemos su pronta intervención y respuesta para evitar mayores demoras en la ejecución del contrato.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

Chiquinquirá, 02 de Abril de 2025

C.I.P-2567-2024-0109

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA 001 DE 2023 versión No. 2

Cordial saludo,

Me permito adjuntar la documentación correspondiente al Acta Parcial N.º 1 del Contrato de Obra N.º 001 de 2023, la cual ha sido revisada y aprobada previamente por esta Interventoría. Se realizan los ajustes solicitados de acuerdo a la comunicación No. S-2025-000301-INFDDIV.

Quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

CHIQUINQUIRA: CLL 4 # 7-53	**EMAIL: jypconsul.2019@gmail.com**	**TELEFONO:** 3143501710

Chiquinquirá, 10 de abril de 2025

C.I.P-2567-2024-110

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto : ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta Interventoría se permite entregar el Informe Mensual N.º 15, correspondiente al período comprendido entre el 18 de febrero de 2025 y el 17 de marzo de 2025, para su respectiva revisión.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

Chiquinquirá, 10 de Abril de 2025

C.I.P-2567-2024-0111

Ingeniero.
JHONATAN MENESES SANCHEZ
R/L N&S CONSTRUCOL S.A.S
Contratista de Obra.

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: RESPUESTA TRAMITE MODIFICATORIO N°4

Cordial saludo,

De acuerdo al comunicado RADICADO No: S-2025-000499-INFDDIV emitido por la supervisión, donde se informa que se estaba tramitando el Modificatorio No. 4 al Contrato de Obra No. 001de 2023 ante la Secretaría de Contratación, por medio del presente se pone en conocimiento la respuesta dada por ese despacho a través del oficio con Radicado No. S-2025-008726-SECCON del 7 de abril de 2025, en el que se indica que; no es necesario proceder a modificatorio del contrato, razón por la cual se puede continuar con la ejecución de las obras que están pendientes.

Por tal motivo se solicita iniciar con las actividades programadas para cumplir con las obras en el plazo contractual.

Quedo atento a cualquier comentario o requerimiento adicional.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

CHIQUINQUIRA: CLL 4 # 7-53	**EMAIL: jypconsul.2019@gmail.com**	**TELEFONO:** 3143501710

Chiquinquirá, 10 de abril de 2025

C.I.P-2567-2024-112

Ingeniero
JAVIER IVÁN BARRETO PINTO
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto : Respuesta a su comunicado S-2025-000496-INFDDIV SUBSANACION DE OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta Interventoría se permite entregar el Informe Mensual N.º 14, correspondiente al período comprendido entre el 18 de enero de 2025 y el 17 de febrero de 2025, subsanando las observaciones presentadas en el comunicado S-2025-000496-INFDDIV, para su respectiva revisión.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

CHIQUINQUIRA: CLL 4 # 7-53	**EMAIL: jypconsul.2019@gmail.com**	**TELEFONO:** 3143501710

Chiquinquirá, 10 de abril de 2025

C.I.P-2567-2024-113

Ingeniero
JAVIER IVÁN BARRETO PINTO
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: Respuesta a su comunicado S-2025-000517-INFDDIV SUBSANACION DE OBSERVACIONES ACTA PARCIAL No. 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta Interventoría se permite entregar acta parcial No. 1, correspondiente al período comprendido entre el 06/09/2023 al 27/12/2023 y 18/04/2024 al 17/02/2025, subsanando las observaciones presentadas en el comunicado S-2025-000517-INFDDIV, para su respectiva revisión y tramite.

El informe Mensual de Interventoría No. 14 se remitió mediante comunicado C.I.P-2567-2024-112.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

CHIQUINQUIRA: CLL 4 # 7-53	**EMAIL: jypconsul.2019@gmail.com**	**TELEFONO:** 3143501710

Chiquinquirá, 14 de abril de 2025

C.I.P-2567-2024-114

Ingeniero
JAVIER IVÁN BARRETO PINTO
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto : Respuesta a su comunicado S-2025-000530-INFDDIV SUBSANACION DE OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta Interventoría se permite entregar el Informe Mensual N.º 14, correspondiente al período comprendido entre el 18 de enero de 2025 y el 17 de febrero de 2025, subsanando las observaciones presentadas en el comunicado S-2025-000530-INFDDIV, para su respectiva revisión.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

CHIQUINQUIRA: CLL 4 # 7-53	**EMAIL: jypconsul.2019@gmail.com**	**TELEFONO:** 3143501710

Chiquinquirá, 14 de abril de 2025

C.I.P-2567-2024-115

Ingeniero
JAVIER IVÁN BARRETO PINTO
Supervisor Contrato de Interventoría.
Gobernación de Boyacá

Ref.: CONTRATO CON NÚMERO DE PROCESO SMC-GB-021-2023, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CENTRO, NORTE, GUTIERREZ, LENGUPA, RICAURTE, NEIRA DEPARTAMENTO DE BOYACA"

Asunto: Respuesta a su comunicado S-2025-000483-INFDDIV Trámite permiso ocupación del cauce - CORPOCHIVOR Remisión de documentos solicitados mediante auto de 0095 del 12 de Marzo de 2025

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, esta Interventoría se permite remitir la información relacionada por el contratista en su comunicado No. G.B.-C.O. -2024-058, con respecto a la documentación solicitada en el comunicado S-2025-000483-INFDDIV, con respecto al trámite de permiso de ocupación del cauce ante CORPOCHIVOR, se da traslado del oficio No. 2025EE2010 del 3 de abril de 2025, mediante el cual CORPOCUIVOR comunica la Notificación electrónica del Auto 0095 del 12 de marzo de 2025, que corresponde a la construcción del box-coulvert , sobre la fuente denominada "Quebrada La Tigrana, ubicada en la vereda Encenillo del municipio de Campohermoso para su respectivo tramite.

Sin otro particular,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEREMERGENCIAS NORTE

CHIQUINQUIRA: CLL 4 # 7-53	**EMAIL: jypconsul.2019@gmail.com**	**TELEFONO:** 3143501710

REGISTRO FOTOGRAFICO VISITAS

CHIQUINQUIRA: CLL 4 # 7-53	**EMAIL: jypconsul.2019@gmail.com**	**TELEFONO:** 3143501710

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

B. REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No:	1	DE	2023								
INFORME DE INTERVENTORÍA No:	16			FECHA:	29	de	ABRIL	de	2025		
PERIODO: DEL	18	de	MARZO	de	2025	AL	17	de	ABRIL	de	2025

MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITA CON SUPERVISOR 3 DE ABRIL



BOX CULVERT



BOX CULVERT



BOX CULVERT



BOX CULVERT

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

	
BOX CULVERT	ALCANTARILLA 1
	
ALCANTARILLA 1	ALCANTARILLA 1
	
ALCANTARILLA 1	ALCANTARILLA 2

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

	
ALCANTARILLA 2	ALCANTARILLA 2
	
ALCANTARILLA 2	ALCANTARILLA 2

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

SAN EDUARDO VISITA CORPOCHIVOR 28 DE MARZO	
	
VISITA CORPOCHIVOR	VISITA CORPOCHIVOR
	
VISITA CORPOCHIVOR	VISITA CORPOCHIVOR

ANEXO COMPLEMENTARIO FORMATO A-AD-GC-F-O46

	
VISITA CORPOCHIVOR	VISITA CORPOCHIVOR
	
VISITA CORPOCHIVOR	VISITA CORPOCHIVOR
	
VISITA CORPOCHIVOR	
