CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

Informe Mensual de Consultoría No. 03.

Contrato No.-2695-2023

Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda grupo AMV 2 Lote 10.

Versión 1.0

Periodo 01 de noviembre al 30 de noviembre 2023.

Pereira Risaralda - Diciembre 2023.

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de avance No. 1 presentado por el Consorcio SUPERVISION VIAL A5, correspondiente a las actividades adelantadas durante el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	14-12-2023		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el Consorcio SUPERVISION VIAL A5 en el marco del Contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, respecto al seguimiento mensual de las vías relacionadas y las cooperativas. De igual forma, se relaciona el estado administrativo, técnico y financiero del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Código: NA	Versión 1.0		
Autor	Consorcio SUPERVISION VIAL A5 – Equipo de contrato		
Revisó	CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN....5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....6
3. INFORMACIÓN LEGAL....10
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO....11
4.1. SEGUIMIENTO A CONTRATOS....12
- CONTRATO NO. 3227-2023....12
- CONTRATO NO. 3074-2023....12
- COOPERATIVA ALTAGRACIA: RUTAS 29RSA Y 2902....13
- COOPERATIVA CENTRO: RUTAS 50RS02, 25RSA Y 29RSB....13
- COOPERATIVA COMUNEROS: RUTAS 5003 Y 2507....13

4.2. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO....14
4.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD....15
4.4. TIEMPO DE TRABAJO - JORNADAS DE TRABAJO....16
4.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA....16
4.6. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO AVANCE FÍSICO....16
4.7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO....16
5. INFORME SISO....17
5.1. ACTIVIDADES SISO REALIZADAS....17
6. GESTIÓN DOCUMENTAL....30
6.1. GESTIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE OFICIOS....30
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....40
8. ANEXOS....41
8.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO....41
8.2. BITÁCORA DE OBRA....50
8.3. INFORMES SEMANALES DEL ADMINISTRADOR VIAL....51
8.4. REGISTRO DE ASISITENCIA COMITES VIALES....52

ÍNDICE DE IMAGENES

IMAGEN 1 RUTA 5003 - SANTA CECILIA (PR 13+00) - ASIA 6
IMAGEN 2 RUTA 2507- REMOLINOS - CAUYA 6
IMAGEN 3 RUTA 25RSA - PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA 7
IMAGEN 4 RUTA 2902 - PUENTE MOSQUERA - AVENIDA CRUCE FERROCARIL 7
IMAGEN 5 RUTA 29RSA - VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO 8
IMAGEN 6 RUTA 29RSB - VARIANTE GALICIA 8
IMAGEN 7 RUTA 50RS01 - APIA - LA VIRGINIA 9
IMAGEN 8 EQUIPOS DE EMERGENCIA 28

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 INFORMACIÓN LEGA DEL CONTRATO 10
TABLA 2 LISTADO DE REUNIONES 14
TABLA 3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 15
TABLA 4 LISTADO DE PERSONAL 17
TABLA 5. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 30
TABLA 6. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS ENVIADOS POR EL CONSORCIO AL INVIAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 34
TABLA 7 . GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES AL CONSORCIO DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 36
TABLA 8. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS ENVIADOS POR EL CONSORCIO OTRAS ENTIDADES DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 38

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de mediante concurso de méritos CAM-DEO-008-2023, adjudicó el Contrato de Consultoría No. 2596 del 2023 al CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5 con el objeto de "*Brindar acompañamiento, técnico y financiero al Min TRANSPORTE en el desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, y regulatorias, por parte de los operadores y prestadores del servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Risaralda sectores 50RS01 Apia –La Virginia,5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, 25RSA paso por la Virginia, 29RSB Variante Galicia, 29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira, 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar*", durante el período comprendido entre el 28 de agosto del 2023 y 28 de diciembre de 2023.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral 7 del literal C *"OBLIGACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES"* de la CLÁUSULA SEGUNDA del referido contrato, celebrado entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE RISARALDA** y el **CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5**, que establece:

> *"Entregar un informe mensual de avance que detalle las actividades desarrolladas en el período, en el último informe mensual de cada vigencia."*

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5 durante el período del presente informe, de conformidad con el desarrollo del Modelo de Vigilancia y Control, implementado por de *Min TRANSPORTE*.


El presente documento, se constituye como "*INFORME 03 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023*"

El presente informe hace relación a las actividades, documentación y demás actividades necesarias para la gestión y desarrollo, durante el periodo comprendido **del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023** del Contrato de consultoría No **2695 DE 2023**, cuyo objeto es: **contrato de consultoría Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda grupo AMV 2 Lote 10.**

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Vías a cargo del instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Risaralda sectores 50RS01 Apia –La Virginia, 5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, 25RSA paso por la Virginia, 29RSB Variante Galicia, 29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira, 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar.

IMAGEN 1 RUTA 5003 - SANTA CECILIA (PR 13+00) - ASIA

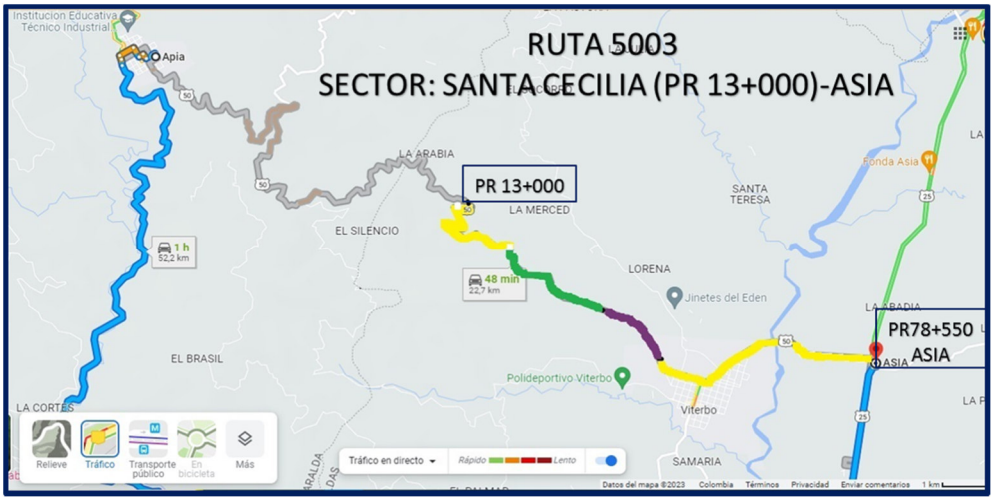

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 2 RUTA 2507- REMOLINOS - CAUYA




Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 3 RUTA 25RSA - PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA




Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 4 RUTA 2902 - PUENTE MOSQUERA - AVENIDA CRUCE FERROCARIL

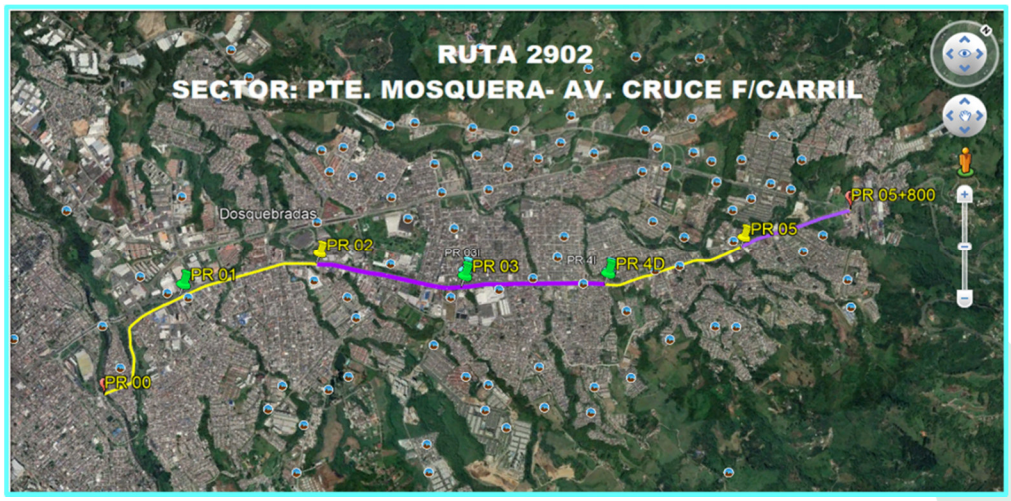

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 5 RUTA 29RSA - VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO

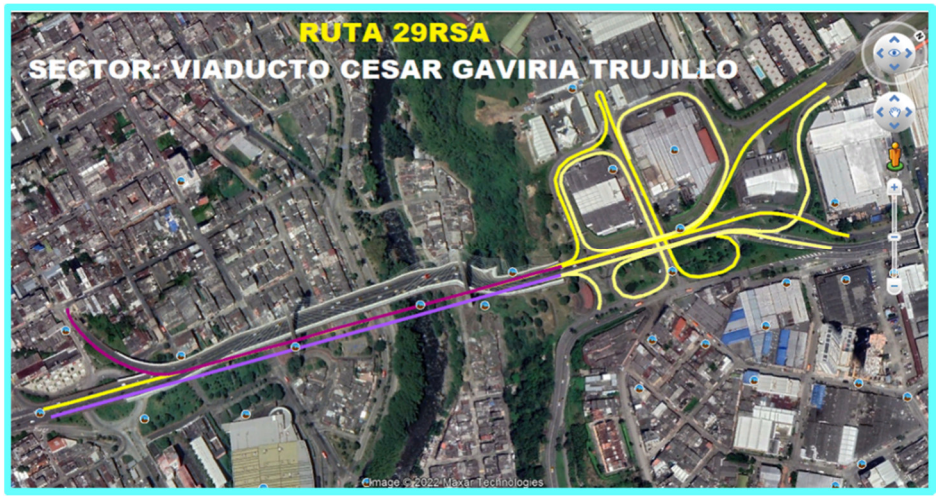

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 6 RUTA 29RSB - VARIANTE GALICIA



Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 7 RUTA 50RS01 - APIA - LA VIRGINIA



Fuente: Elaboración Propia

3. INFORMACIÓN LEGAL

A continuación, se presenta la información legal correspondiente al Contrato de consultoría:

TABLA 1 INFORMACIÓN LEGA DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No 2695 DE 2023	
Objeto: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda grupo AMV 2 Lote 10.	
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5
NIT DE LA EMPRESA:	901734171-1
APODERADO - REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA JANNETH HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN OFICINA:	Diagonal 43 calle 43 No 7-16 – Dosquebradas - Risaralda
TELÉFONOS:	3156719235-3162243546
EMAIL:	Supervisionviala5@aciproyectos.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 283.776.853,00 M/cte.
FECHA DE INICIO:	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DICIEMBRE DE 2023.
PÓLIZAS INICIALES:	Póliza de cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 0 aprobado mediante oficio DT-RIS- 47006. Póliza de Cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 2. Aprobado mediante oficio 2023S-VRIS-003291.

Fuente: Elaboración Propia

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

Durante el período de este informe, el consorcio Supervisión Vial A5 adelanto las actividades estipuladas en el contrato de consultoría. Estas acciones fueron realizadas bajo la supervisión del Ing. Héctor Iván Gutiérrez Salazar, quien es un funcionario del INVIAS. Las actividades llevadas a cabo en el marco del Contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, incluyeron las siguientes acciones:

Seguimiento mensual de las vías objeto del contrato se realizó mediante recorridos, la inspección y control y el seguimiento a las cooperativas en las actividades programadas y las emergencias diarias que se puedan presentar en las vías asignadas a cada cooperativa que iniciaron actividades desde el 01 de octubre 2023.

Se relacionó el estado administrativo, técnico y financiero del contrato, durante el período del presente informe para los sectores (i) 50RS01 Apia – La Virginia, (ii) 5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, (iii) 25RSA paso por la Virginia, (iv) 29RSB Variante Galicia, (v) 29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira y (vi) 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar.

Se continuo con el recorrido de las vías a cargo, se continuó la instalación de señales verticales y horizontales en las vías que estaban faltas de señalización y protección por pate del contrato No 3227 de 2023, obras a realizar, predios de invasión de la franja de INVIAS, etc.

Durante el período de este informe, no se ha recibido ninguna información que deba ser reportada a la plataforma Sukubum sobre el atropellamiento de fauna en la red vial que administra el Consorcio Supervisión Vial A5. No se han registrado incidentes de este tipo en el área bajo nuestra supervisión durante el período en cuestión.

El Consorcio Supervisión Vial A5, en colaboración con la supervisión del INVIAS, se continua con la señalización en ciertas áreas específicas de las vías bajo nuestra administración, como reforzar las señales verticales y marcas viales en las siguientes vías: 50RS01, 29RSA, 2902, 2507 y 25RSA. Se ha priorizado en las señales reglamentarias y preventivas, así como en las señales que indican curvas pronunciadas. En la vía 25RSA, se planifico reforzar las líneas logarítmicas, repintar los pictogramas de velocidad a 30

km/h y recuperar los pictogramas dañados. Además, en la vía 2902, pintaron las líneas laterales y centrales del PR4+0300 al PR5+0200 para mejorar la seguridad vial en esa área específica que estaban muy borrosas y poco visibles. Estas acciones se están llevando a cabo para garantizar un entorno de conducción seguro y eficiente en las vías que supervisamos.

4.1. SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Dentro de las actividades de seguimiento durante el periodo del presente informe se hizo seguimiento a los siguientes contratos de monto agotable:

- **Contrato No. 3227-2023**

Contrato suscrito entre Luisa Fernanda Avalos Peralta e INVIAS, dicho contrato tiene acta de inicio 10 de octubre de 2023, dentro del desarrollo de este contrato la Administración vial ha realizado la continua vigilancia y control de calidad de las actividades realizadas en los sitios y tramos en intervención en las diferentes rutas tales como: 2507, 50RS01, 25RSA, 2902, 29RSA, en este periodo se ejecutaron los siguientes ítems y se tramito el acta No 1:

i. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL SP, SR Y SI 75 CM X 75 CM LAMINA RETROREFLECTIVA IX.
ii. MARCAS VIALES CON PINTURA EN FRIO.
iii. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO PREVENTIVA DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SP-75. REFLECTIVO TIPO IX (75X60cm).
iv. LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.

- **Contrato No. 3074-2023**

Contrato suscrito entre Constructora Civilcol S.A.S e INVIAS, el representante legal es Heverth Quintero Pineda, se generó acta de inicio 20 de septiembre de 2023, se continuó con las visitas pertinentes al sitio a intervenir y se hacen las respectivas reuniones y se dio inicio a las actividades tales como manejo de aguas, intervención con maquina retro excavadora en excavación y despeje del cauce en conglomerado, en los

extremos que cabe la maquinaria grande y la extensión del brazo, se hace retiro de material sobrante a un sitio autorizado.

Del mismo modo se presenta las actividades de seguimiento durante el periodo del presente informe sobre los contratos de las cooperativas:

- Cooperativa Altagracia: Rutas 29RSA Y 2902

Se les hizo seguimiento las cuales realizaron la totalidad de las rocerías, desmonte manual, limpieza de cunetas y canales, limpieza y despojo de muros, poda y retiros, limpieza de obras, limpieza de cunetas, parcheo Ruta 2902 PR1 a PR5 +0200, se hace señalización en el viaducto rede media calzada para instalación de luces navideñas ruta 29RSA PR0+0650, reciben las capacitaciones por parte del profesional SST y asesor capacitación de seguridad social y beneficios y características del sistema pensional en Colombia.

- Cooperativa Centro: Rutas 50RS02, 25RSA Y 29RSB

Se les hizo seguimiento y realizaron la totalidad de las rocerías, desmonte manual, limpieza de cunetas, poda y retiros, limpieza de pequeñas obras,- limpieza de sumideros, limpieza de cunetas, reparcheo de la vía en el centro PR 2 +0050, 50RS01, Puente Mocatán, despeje de derrumbes, despeje de vía por caída de árboles ruta 25RSA PR0+0800 a PR0+0850, rocería y limpieza de canales, limpieza de transversales; reciben las capacitaciones por parte del profesional SST y asesor capacitación de seguridad social y beneficios y características del sistema pensional en Colombia

- Cooperativa Comuneros: Rutas 5003 y 2507

Se les hizo seguimiento y realizaron la totalidad de las rocerías en taludes y zonas verdes, desmonte manual, limpieza de cunetas, limpieza de obras, poda y retiro de árboles, limpieza de pequeñas obras, despeje de vía Ruta 2507 PR 49+0700 por caída de árbol, se presenta reguero de aciite en la Ruta 2507 PR49+0800 se acordona el sitio y se riega aserien para minimizar el riesgo de accidentalidad, Reparcheo en Viterbo, PR 76+0000 a PR77+PR0+0100, se Presenta volcamiento de dos camionetas por vía

mojada y velocidad de los vehículos en la ruta 2507 PR 40+0900 y PR 42+0040 reciben las capacitaciones por parte del profesional SST y asesor capacitación de seguridad social y beneficios y características del sistema pensional en Colombia.

4.2. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de la ejecución de la administración vial, se han adelantado las siguientes reuniones:

TABLA 2 LISTADO DE REUNIONES

ID	Fecha	Participantes	Tema
1	07/11/2023	Territorial Risaralda Administración vial	Comité CTA
2	14/11/2023	Territorial Risaralda Administración vial	Comité INVIAS
3	20/11/023	Territorial Risaralda Y Bogotá.	Comité INVIAS
4	24/11/2023	Comité virtual contrato 3227 RL Luisa Fda Avalos Peralta	Acta parcial
5	27/11/023	Territorial Risaralda Y Bogotá.	Comité INVIAS

Fuente: Elaboración Propia



COMITÉ INICIO CTA 07/11/23



COMITÉ SEMANAL INVIAS 14/11/23



COMITÉ SEMANAL INVIAS 20/11/23



COMITÉ SEMANAL INVIAS 27/11/2

4.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Durante el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre se suministraron los insumos tales como:

TABLA 3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Tipo	Estado
Materiales	Nylon, ACPM, Planta eléctrica, Aceite 2 tiempos, emulsión, fresado.
Procesos Constructivos	Rocería, reparcheo.
Maquinaria	Guadañas, Machetes, sopladora, Estacionarias, picas, palas, Polines, Buguis, Rastrillo, motosierra.

Fuente: Elaboración Propia

4.4. TIEMPO DE TRABAJO - JORNADAS DE TRABAJO


Se desarrollan sin novedad, lunes a viernes de 7 am. a 5 pm y sábados de 7 am. a 12 m; jornadas normales.

4.5. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Durante el mes de noviembre se han presentado altas precipitaciones a inicios del mes y mucha lluvia en horas de la noche, igualmente algunos días con llovizna, nublados y secos tal como se registró en el reporte diario AMV 2023.

4.6. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO AVANCE FÍSICO

Para este período el consorcio lleva un avance acumulado en tiempo del 77,50% correspondiente al periodo del 28 de agosto al 30 de noviembre de 2023, en cuanto al avance financiero del 58.47% equivalente a $165.910.856 esta diferencia se presente de acuerdo con lo estipulado en la forma de pago, en donde corresponde a los costos fijos de personal y costos variables de acuerdo con los soportes de los costos incurridos.

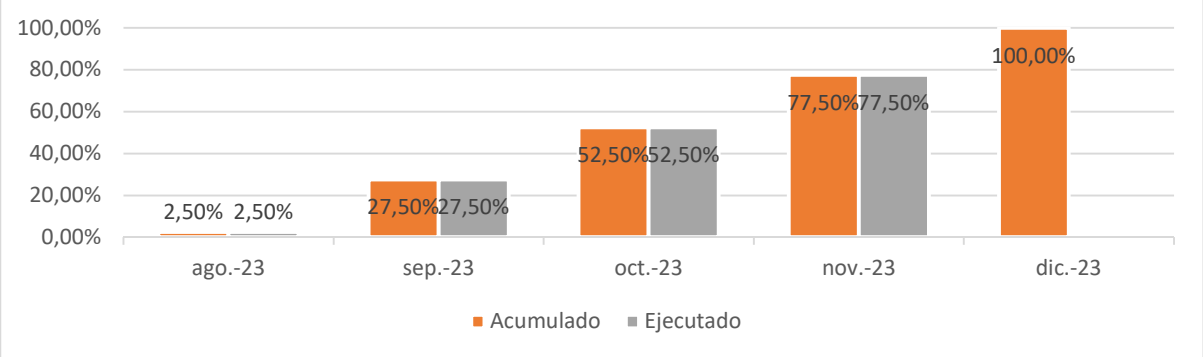

4.7. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO

A la fecha se han definido actividades relacionadas con el proyecto y que hacen parte del cronograma de la administración vial como son las señalizaciones, que están en el proceso de ejecución, elementos de protección de las vías y las obras a adelantar que generan riesgo en los sectores solicitados los cuales son:

- El puente La Víbora en la Ruta 2902 PR 71+0805 Dosquebradas, presenta obstrucción del flujo por lo cual se está haciendo limpieza para dar la capacidad del paso de volumen de agua y acumulación de material de arrastre ya que la obra anterior del canal en concreto no continua en el paso del puente, y así evitar futuros represamientos de la quebrada e inundaciones.
- El puente Mocatán en la Ruta 50RS01 PR 31+0200 en La Virginia que presenta obstrucción del flujo ya que colapso una parte del muro de contención margen izquierda aguas arriba, lo que no permite que el flujo siga su rumbo natural, se acumule basura y material antrópico represándose este material en el pilón central del puente, esta actividad no fue aprobada en Bogotá según informe en comité del 11 de septiembre de 2023.

5. Informe SISO

Dentro de este periodo la Supervisión verificó dentro del trámite del acta de costos la afiliación del personal y el pago de la seguridad social y los parafiscales, del siguiente personal:

TABLA 4 LISTADO DE PERSONAL

Cargo	Nombre	Fecha radicado soportes
Ingeniero Residente	Jose Olmis Gonzalez H.	04/09/2023
Ingeniera Auxiliar	Kelly Ramírez Cuervo	14/08/2023
Inspector SISO	Martha Mancera	14/08/2023
Tecnólogo y/o inspector Vial	Jhon Jairo Vargas	20/09/2023
Conductor	Javier ortega Ríos	14/08/2023

Fuente: Elaboración Propia

5.1. ACTIVIDADES SISO REALIZADAS

Dentro de las actividades realizadas se realizó inducción en SG-SST, en la cual se presentaron las políticas y objetivos dentro de las cooperativas, junto con los deberes del trabajador

REUNIÓN INDUCCIÓN SST Y POLÍTICAS

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES COOPERATIVAS

REENTREENAMIENTO DE ALTURAS COOPERATIVA ALTAGRACIA Y COMUNEROS





SEÑALIZACION ADECUADA OBRAS EN LA VIA









ACTIVIDADES COOPERATIVA ALTAGRACIA





REGISTRO FOTOGRAFICO DE UTILIZACION DE EPPS Y SEÑALIZACION EN OFICINA DEL CONSORCIO






BOTAS DE SEGURIDAD Y APOYA PIES






SEÑALIZACION OFICINA EXTINTOR, RUTAS DE EVACUACION

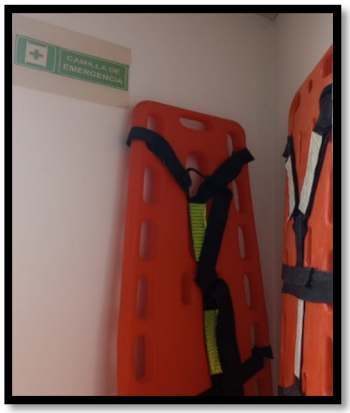




CAMILLAS DE EMERGENCIAS Y TABLERO SST DONDE SE ENCUENTRAN PUBLICADAS LAS POLITICAS DEL CONSORCIO

EVIDENCIA DE PARTICIPACION EN CAPACITACION VIRTUAL DE CAIDAS A NIVEL

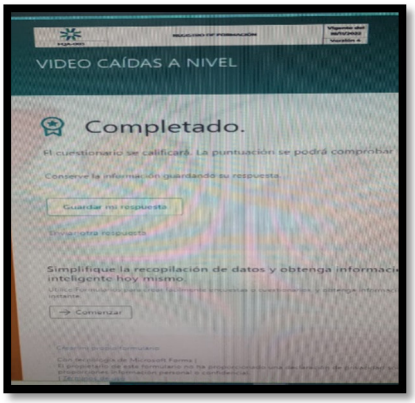



CAPACITACION COOPERATIVA ALTAGRACIA, CENTRO, COMUNEROS









COMO ACTUAR ANTE PICADURAS DE INSECTOS











CUIDADO DE MANOS Y PAUSA ACTIVA






ASISTENCIAS A CAPACITACIONES

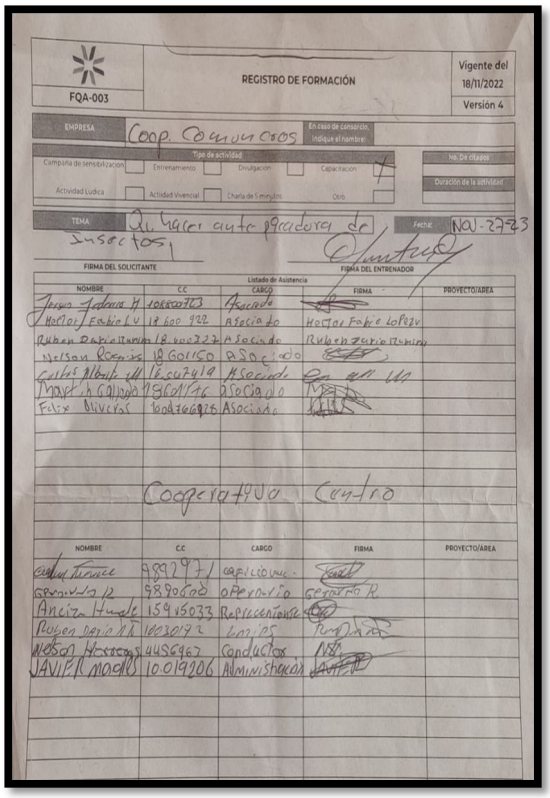

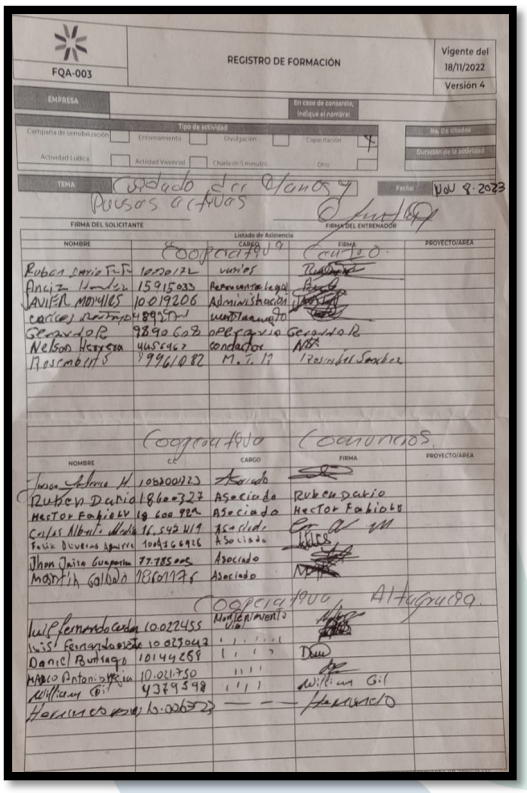

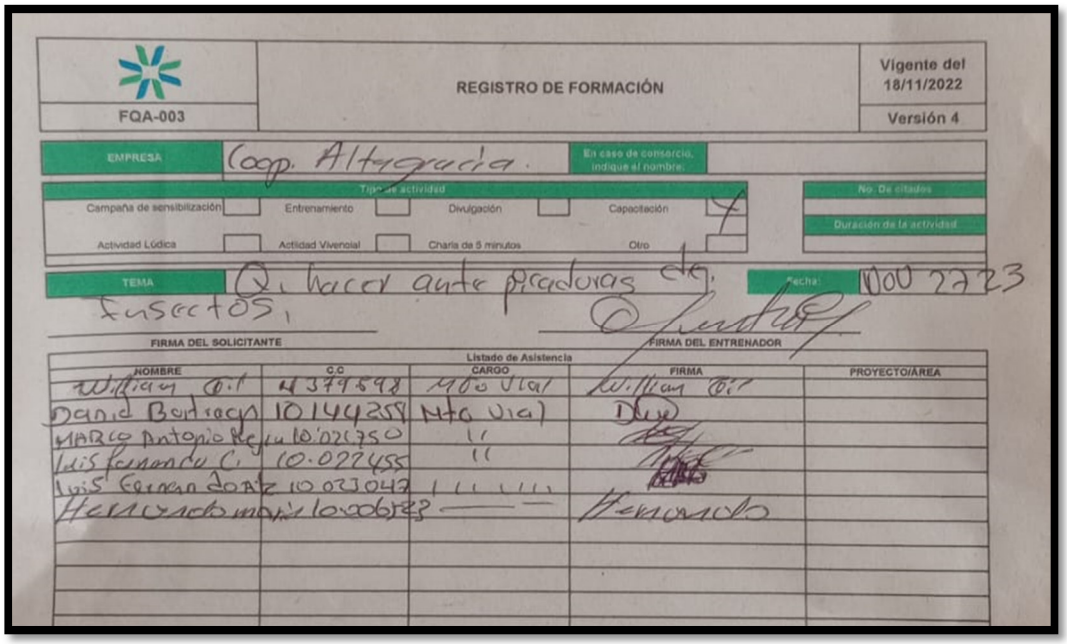

FQA-003

REGISTRO DE FORMACIÓN

Vigente del 18/11/2022

Versión 4

EMPRESA: Coop. Altagracia.

En caso de consorcio, indique el nombre:

Tipo de actividad: Campaña de sensibilización ☐ Entrenamiento ☐ Divulgación ☐ Capacitación ☐ Actividad Lúdica ☐ Actividad Vivencial ☐ Charla de 5 minutos ☐ Otro ☐

No. De citados:

Duración de la actividad:

TEMA: Q. hacer ante picaduras de insectos.

Fecha: 1000 2023


FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL ENTRENADOR

Listado de Asistencia

NOMBRE	C.C	CARGO	FIRMA	PROYECTO/AREA
William Ortiz	4379598	Apoyo Vial	William Ortiz	
David Bedoya	10144258	Ayto Vial	David	
Mario Antonio Reyes	10.021750	"		
Luis Fernando C.	10.022455	"		
Luis Fernando Ortiz	10.023042	"		
Hernando Morales	10.006283	—	Hernando	

SEGUIMIENTO CONTRATISTA ING LUISA AVALOS
PINTURA EN LA VIA

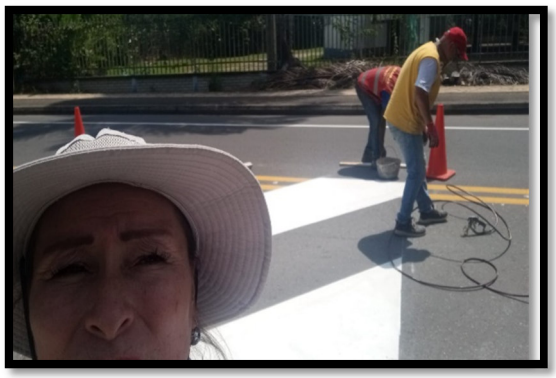







USO DE E.P.P`S Y SEÑALIZACIÒN EN LA VIA CONTRATISTA DE PINTURA









SEÑALIZACION VIA QUEBRADA LA VIBORA






UTILIZACION DE EPPS IMPERMEABLES Y TAPABOCAS

Dentro de las oficinas del consorcio Supervisión Vial A5 se mantienen los equipos de Emergencia en el punto de atención, Botiquín, camilla y extintor

IMAGEN 8 EQUIPOS DE EMERGENCIA

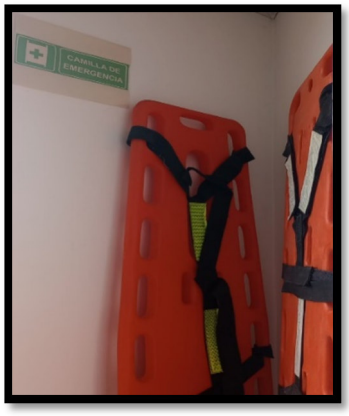

Fuente: Elaboración Propia





LINEAS LATERALES Y CENTRAL (PONTOLLON)



RESALTO FISICO



RESALTO VIRTUAL









ZONA ESCOLAR





DELINEADORES

6. **Gestión documental** En las siguientes tablas se presenta la relación de oficios remitidos y recibidos del MinTransporte durante el periodo del presente informe relacionados con el contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, celebrado entre INVIAS y el Consorcio Supervisión Vial A5.

6.1. Gestión documental mediante oficios

Durante este periodo se recibieron los siguientes oficios y correos por parte del INVIAS al Consorcio Supervisión Vial A5, los cuales se listan a continuación:

TABLA 5. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
2023E-VUVRAZ-024226	SAL-23-016741	01/11/2023	Radicada la solicitud que usted ha generado vía correo electrónico: número de radicado: 2023E-VUVRAZ-024226 remite: consorcio supervisión vial a5.
2023I-VBOG-021407	Correo	02/11/2023	Solicitud evento deportivo juegos nacionales 2023
2023I-VBOG-020278	Correo	02/11/2023	Solicitud evento deportivo juegos paranacionales 2023
2023I-VBOG-006042	Correo	02/11/2023	Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto nacional de vías dirección territorial Risaralda. sectores 29RSB variante de Galicia, PR0+0000-PR1+0710
2023E-VUVRAZ-026002	SAL-23-016823	08/11/2023	Solicitud radicada. posible invasión de la faja de vía 50RS01 en el PR15+0000 entre Apía- la virginia
2023E-VUVRAZ-026006	SAL-23-016822	08/11/2023	Solicitud radicada. construcción ramada en

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
			guadua en la ruta 50RS01 Apia la Virginia PR24 06300 en faja de la vía.
2023E-VUVRAZ-026190	Correo	08/11/2023	Solicitud radicada. accidentalidad mes de septiembre amv2
Correo	Correo	14/11/2023	0080. Radicación acta 1 y soportes de contratos de mantenimiento rutinario
No Radicación: 83754	Número de Contrato 2695/2023	14/11/2023	sgi - dt ris – acta de recibo parcial de costos 1 cont 2695-2023 consorcio supervisión vial a5
2023I-VBOG-016875	memorando 2023I-VRIS-015938	15/11/2023	Solicitud de autorización del débito de recursos del contrato de monto agotable 3074-2023, para la atención de la emergencia que se presenta en el PR 1+0700 de la vía Pereira – Dosquebradas
2023I-VBOG-019873	Correo	16/11/2023	Presentación cuentas y cierre vigencia fiscal 2023
2023E-VUVRAZ-028550	Correo	16/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. Acta Cooperativa Centro
2023E-VUVRAZ-028625	Correo	16/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. sitios críticos amv 2 Risaralda
2023E-VUVRAZ-028979	Correo	17/11/2023	Informes semanales consorcio supervisión vial a5
2023E-VUVRAZ-029019	Correo	17/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado back up de las cotizaciones

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
			suministradas a la plataforma invicostos a cargo del consorcio supervisión vial a5
Correo	Correo	20/11/2023	Urgente envío informes estado de la red vial con criterio técnico amv 1 y amv 2 – Risaralda
2023E-VUVRAZ-030290	memorando 2023I-VBOG-012502 d	21/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado Criterio técnico AMV G2
2023E-VUVRAZ-030418	Correo	22/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. CRITERIO TECNICO CONSORCIO VIAL A5
Correo	Correo	22/11/2023	RADICAR ACTA 1 CONTRATO 3227-2023. Acta de obra #1 de contrato 3227-2023 de señalización vial
No Radicación: 85471	Correo	22/11/2023	Cuenta Radicada ACTA 1 CONTRATO 3227-2023
2023S-VRIS-022323	Correo	22/11/2023	Comunicado de Salida
Correo	Correo	22/11/2023	MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2023 cto 3077
2023I-VBOG-023036	Correo	23/11/2023	Manuales, instaladores e instructivos del Sistema Inteligente de Gestión de Puentes – SIGP
2023I-VBOG-028811	Correo	23/11/2023	Lineamientos Contratos de Administración Vial Actuales
2023E-VUVRAZ-031093	Correo	23/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. Acta Altagracia mes de octubre

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Correo	Correo	24/11/2023	Comité 3227-2023
2023E-VUVRAZ-031631	Correo	24/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. Acta de comuneros
2023E-VUVRAZ-031636	Correo	24/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. Acta de comuneros mes de octubre.
Correo	Correo	25/11/2023	indicadores acta 2
Correo	Correo	25/11/2023	Tramite actas de costos
2023E-VUVRAZ-032243	SAL-23-017914	28/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. Solicitud adición contrato 3227 23
2023E-VUVRAZ-032426	Correo	28/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. ACTA 01 COOPERATIVA CENTRO
2023E-VUVRAZ-032613	SAL-23-017948	28/11/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. NOTIFICACION OBRA AGUAS Y AGUAS SIN PERMISO RUTA 29RSB PR 0 0050
Correo	Correo	28/11/2023	tema capacitaciones
Correo	Correo	30/11/2023	PLAZO CUENTAS RADICADAS DICIEMBRE 7: cuentas con corte al 30 de noviembre y Reserva Presupuestal DICIEMBRE 13 : Cuentas de diciembre
2023E-VUVRAZ-033503	SAL-23-018059	30/11/2023	SAL 23 018059 viabilidad prorroga contrato 3227 23

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
2023E-VUVRAZ-033523	SAL-23-018057	28/11/2023	Notificación hurto de señales en las rutas 25RSA y 50RS01

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente se presenta el detalle de los oficios enviados por el Consorcio Supervisión Vial A5 al MinTransporte a cargo de la dirección Territorial de Risaralda:

TABLA 6. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS ENVIADOS POR EL CONSORCIO AL INVIAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Corre	Correo	01/11/2023	Informe mensual 01;AMV 2
Correo	Correo	02/11/2023	SITIOS CRÍTICOS
Correo	SAL-23-016823	08/11/2023	construcción vivienda en estructura liviana en la ruta 50rs01
Correo	SAL-23-016822	08/11/2023	construcción ramada en guadua en la ruta 50rs01
2023I-VBOG-020278	SAL-23-016962	08/11/2023	solicitud evento deportivo juegos para nacionales 2023
Correo	Correo	08/11/2023	accidentalidad mes de septiembre amv2
Correo	Correo	09/11/2023	Matriz_hitos_2023-11-08-dt-ris. seguimiento de obra
Correo	Correo	09/11/2023	sitios críticos
Correo	Correo	15/11/2023	Adjunto documentos editables del acta no. 02 de la interventoría.
Correo	Correo	16/11/2023	Acta no.1 Altagracia.
Correo	Correo	16/11/2023	Acta cooperativa centro
Correo	Correo	16/11/2023	Acta no.1 comuneros para revisión
Correo	Correo	16/11/2023	16-11-2023 sitios críticos amv 2 Risaralda

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Correo	Correo	17/11/2023	informes semanales consorcio supervisión vial a5
Correo	Correo	17/11/2023	Back up de las cotizaciones suministradas a la plataforma invicostos a cargo del consorcio supervisión vial a5.
2023I-VBOG-012502	Correo	21/11/2023	Criterio técnico amv g2. para conocer el estado de la red vial a cargo
Correo	Correo	21/11/2023	Criterio técnico consorcio vial a5. tabla de calificación rutas
Correo	Correo	21/11/2023	criterio técnico ruta 29rsa
Correo	Correo	21/11/2023	Acta Altagracia. acta en Excel y pdf para revisión
Correo	Correo	23/11/2023	acta Altagracia mes de octubre
2023I-VBOG-016106	Correo	23/11/2023	Registro fotográfico mes de noviembre.
Correo	Correo	24/11/2023	certificaciones bancarias cooperativas
Correo	Correo	24/11/2023	Acta de comuneros mes de octubre. adjuntamos lo del asunto para los trámites pertinentes
Correo	SAL-23-017914	27/11/2023	solicitud adición contrato 3227-23
Correo	Correo	28/11/2023	Acta 01 cooperativa centro
Correo	SAL-23-017948	28/11/2023	notificación obra aguas y aguas sin permiso ruta 29rsb PR 0+0050
Correo	SAL-23-018059	30/11/2023	Viabilidad prórroga contrato 3227-23
Correo	Correo	30/11/2023	Sitios críticos 30-11-2023 consorcio supervisión vial a5
Correo	SAL-23-018057	30/11/2023	Notificación hurto de señales en las rutas 25rsa y 50rs01
Correo	Correo	30/11/2023	Informe semana 14 consorcio supervisión vial a5

Fuente: Elaboración Propia

Lo siguientes oficios fueron enviados por entidades diferentes de INVIAS, al consorcio supervisión vial A5.

TABLA 7 . GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES AL CONSORCIO DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado	Entidad	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Correo	OBRAS - CPM Ltda	Correo	01/11/2023	Comunicación cg-cto 3227-invias-2023-05 diseño valla
Correo	consroadscap-j&s	Correo	07/11/2023	Acta de reunión N° 6 administradores viales
20231006 22727E - #20231108 -30502-I	saianotificaciones@dosquebradas.gov.co	Correo	08/11/2023	Respuesta a solicitud accidentalidad mes de septiembre 2023
20231006 22727E	controlvial@dosquebradas.gov.co	Correo	08/11/2023	Respuesta a solicitud accidentalidad mes de septiembre 2023
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	08/11/2023	CONTRATO 3227-2023 PREACTA #1. *Construcción obras de señalización y seguridad vial en vías*
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	08/11/2023	CTO 3227-2023 PREACTA DE OBRA #1. el archivo en pdf tiene "trocadas"
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	09/11/2023	Información personal obra, de afiliaciones y recaudos de (kurvass)
correo	OBRAS - CPM Ltda.	correo	09/11/2023	Tramite acta #1 cto 3227-2023
20231114-25291-e	saianotificaciones@dosquebradas.gov.co	correo	14/11/2023	Solicitud accidentalidad mes de octubre en las vías simón bolívar y

Radicado	Entidad	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
				viaducto César Gaviria
correo	OBRAS - CPM Ltda.	correo	14/11/2023	Preacta de obra #1 cto 3227-2023. para revisión y trámite por parte del interventor
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	14/11/2023	Reunión para tocar tema de legalización acta 1 de costos del contrato 3227
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	15/11/2023	Resolución defensas en trámite
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	15/11/2023	Documentos acta de obra 1 cto 3227-2023. con bitácora de obra y preacta de obra #1
Correo	consroadscap-j&s	Correo	17/11/2023	Certificaciones contratos cooperativas
Correo	consroadscap-j&s	correo	20/11/2023	Documento Recepción Gestionado
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	20/11/2023	Planillas seguridad social acta 1. Contrato3227-2023
Correo	consroadscap-j&s	Correo	21/11/2023	borrador acta N°8 administradores viales 20 nov 2023
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	24/11/2023	proyección cantidades adición
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	24/11/2023	CTO 3227-2023 ACTA #1 PDF
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	27/11/2023	Acta mod proyectada para adición
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	27/11/2023	Reprogramación por adición. cto 3227-2023

Radicado	Entidad	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Correo	SG-SST Civilcol	Correo	28/11/2023	Documentos de ingreso personal Civilcol- la víbora
Correo	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	30/11/2023	Solicitud prorroga plazo del contrato. CTO 3227-2023
Correo	INFO CARDER	Correo	23/11/2023	Información Importante Re: Solicitud recorrido ruta 50RS01 Apía la Virginia y 25RSA paso Nacional La Virginia

Fuente: Elaboración Propia

Los siguientes oficios fueron enviados por el Consorcio Supervisión Vial A5 a las entidades diferentes al MinTransporte:

TABLA 8. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS ENVIADOS POR EL CONSORCIO OTRAS ENTIDADES DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado	ENTIDAD	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
SAL-23-016773	OBRAS - CPM Ltda.	Correo	01/11/2023	Revisión disponibilidad maquinaria y Requerimientos CTO 3227-2023
Correo	pramireza@invias.gov.co	Correo	02/11/2023	SITIOS CRÍTICOS 02-11-2023 CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5
Correo	Civilcol	SAL-23-017213	14/11/2023	Solicitud disponibilidad de quipos y directorio de emergencias del contrato No.3074-23
Correo	Secretaria de tránsito Dosquebradas	Correo	14/11/2023	Solicitud accidentalidad mes de octubre en las vías Simón Bolívar y Viaducto César Gaviria.
Correo	Secretaria de tránsito la Virginia	Correo	14/11/2023	Solicitud accidentalidad mes de

Radicado	ENTIDAD	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
				octubre. (Paso Nacional por la Virginia 25RSA y 50RS01 Apia- La Virginia
Correo	Movilidad de Pereira	Correo	14/11/2023	Solicitud accidentalidad mes de octubre. 29RSA Solución vial Pereira - Dosquebradas *Viaducto César Gaviria* y 29RSB variante Galicia
Correo	consroadscap-j&	Correo	17/11/2023	ACTA COMITE N7
Correo	Luisa Fernanda Avalos	Correo	21/11/2023	Adjunta acta para firmas faltantes.
Correo	CARDER	SAL-23-018056	30/11/2023	Solicitud recorrido ruta 50RS01 Apía la Virginia y 25RSA paso Nacional La Virginia
Correo	Serviciudad esp	SAL-23-018058	30/11/2023	Solicitud reposición de tapas de cámaras de inspección en la ruta 2902.

Fuente: Elaboración Propia

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentan las actividades realizadas por el Consorcio SUPERVISION VIAL A5 en el marco del Contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, respecto al seguimiento mensual de las vías con los respectivos recorridos, inspección, seguimiento y relacionadas con las cooperativas.

Las cooperativas se dedican al servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo, despejar las vías y dar el embellecimiento a las zonas y áreas, realizaron la totalidad de las rocerías, desmonte manual, limpieza de cunetas, poda y retiros, reciben las capacitaciones por parte del profesional SST y asesor capacitación de seguridad social y beneficios y características del sistema pensional en Colombia; igualmente se llenan los formatos relacionados con el pago de las cooperativas.

Se continua la interventoría del contrato No 3227-2023 con Luisa Fernanda Avalos Peralta en las diferentes rutas tales como: 2507, 50RS01, 25RSA, 2902, 29RSA; la Administración vial ha realizado la continua vigilancia y control de calidad de las actividades realizadas en los sitios y tramos en intervención se ejecutaron los siguientes ítems: suministro e instalación de señales verticales, marcas viales con pintura en frio, suministro e instalación de señal vertical de transito tipo preventiva, delineador de curva horizontal y líneas de demarcación con pintura en frio; igualmente se tramito acta parcial No 1 ante Invías.

No 3074-2023 Constructora Civilcol S.A.S, se hace el despeje de la zona del pontón PR1+0805 como manejo de aguas, intervención con maquina retro excavadora en la excavación y despeje del cauce en conglomerado y se retiran a un sitio autorizado.

Se revisan predios de invasión de la franjas de INVIAS.

Para este período el consorcio lleva un avance acumulado en tiempo del 77,50% correspondiente al periodo del 28 de agosto al 30 de noviembre de 2023.

Se presenta un avance financiero del 58.47% equivalente a $165.910.856.

8. ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO



LINEAS LONGITUDINALES RUTA 2902 DDAS



LINEAS LATERAL BLANCA CONTINUA, CENTRAL BLANCA SEGMENTADA, LATERAL AMARILLA CONTINÚA (EN LOS DOS CARRILES) RUTA 2902 DDAS.



RUTA 25RSA LA VIRGINIA



RUTA 25RSA PR 0+0040-PR1+0500





SEÑAL VERTICAL RUTA 2902 DDAS



SEÑAL VERTICAL RUTA 29RSA DDAS



ROCERIA RUTA 2507 Y LIMPIZA DE CUNETAS

ROCERIA RUTA 2902





PODA DE ARBOLES RUTA 50RS01

LIMPIEZA DE OBRAS





ROCERIA Y LIMPIEZA



LIMPIEZA ALCANTARILLA RUTA 50RS01




LIMPIEZA CANAL- RUTA 50RS01



PODA Y RETIRO RUTA 50RS01



REPARCHEO RUTA 5003 PR75+0800

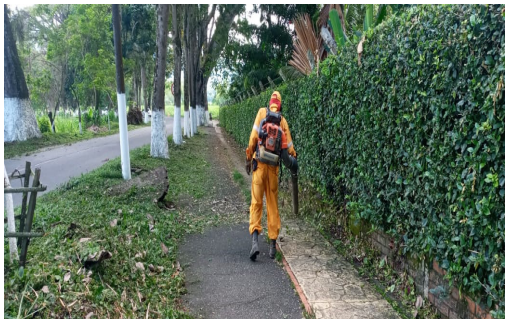



PODA CERRAMIENTOS VIVOS



DESPEJE Y LIMPIEZA DE VIA RUTA 25RSA

DESPEJE DE VIA Y RETIRO DE ARBOLES



ROCERIA RUTA 2902



LIMPIEZA DE SUMIDEROS RUTA 25RSA



ROCERIA CANALES RUTA 50RS01





ROCERIA Y LIMPIEZA RUTA 2507



ROCERIA RUTA 2902



ROCERIA Y LIMPIEZA RUTA 2902


LAVADO DE PR1+00 RUTA 25RSA





ATENCION REGUERO DE ACEITE RUTA 2507

ATENCION CAIDA DE ARBOL RUTA 2507

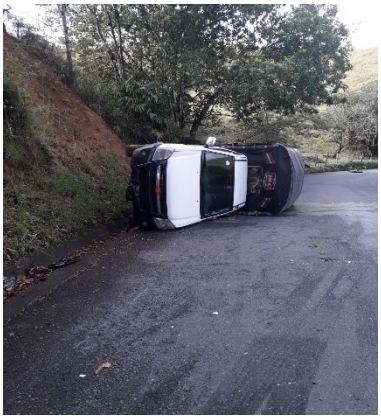



AVOLCAMIENTO DE VEHICULOS POR VIA MOJADA Y VELOCIDAD

ACTIVIDADES MONTO AGOTABLE.





CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION ALTURA MATERIAL ACUMULADO





EXCAVACION CONGLOMERADO BAJO AGUA





MAQUINARIA Y EQUIPO



RUTA 2507 PR 45+0000



GAVIÓN EN RIESGO DE COLAPSAR





RUTA 2507 PR 45+0000



DERRUMBE RUTA 2507 PR 45+0000



RUTA 2507 PR 43+0000



PR 43+0000 DERRUMBE LATERAL DEL MURO



RUTA 2507 PR 44+0300



ASENTAMIENTO DE LA VÍA PR 44+0300



DERRUMBE RUTA 2902 PR 5+0213

RUTA 2902 PR 5+0213



RUTA 2902 PR4+0600



RUTA 2902 ASENTAMIENTO PR4 +0600

8.2. BITÁCORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra del período del mes de noviembre del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2023 correspondiente al informe.

8.3. INFORMES SEMANALES DEL ADMINISTRADOR VIAL

Se anexa copia de los informes semanales correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre 2023.

8.4. REGISTRO DE ASISITENCIA COMITES VIALES

ACTAS COMITÉS INVIAS
