BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	**SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024**		
Fecha:	**9/05/2025**	**Hora de inicio: 8:00 A.M**	**Modalidad:** **X Presencial** / **Virtual** / **Telefónica** / **Mixta**
Lugar:	**EN OBRA**	**Hora de finalización:**	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
C.C	1018482756	FREDY SANCHEZ	HOMBRE	INFRAESTRUCTURA FDLUS			X						X	Fredyeduardo.sanchez@gmail.com	
C.C	79.316.195	HENRY GUEVARA	HOMBRE	CONSORCIO USAQUEN 005 2024			X						X	consorciousaquen005@gmail.com	
C.C	80.194.680	DANIEL CHARRY CEDIEL,	HOMBRE	CONSORCIO USAQUEN 005 2024			X						X	consorciousaquen005@gmail.com	
C.C	52,077,469,	SANDRA JANETH RODRIGUEZ ALVAREZ	MUJER	CONSORCIO USAQUEN 005 2024			X						X	consorciousaquen005@gmail.com	
C.C	1.018.497.703	NICOLAS CHAVEZ ROSERO	HOMBRE	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S			X						X	rymparquesusaquen743@gmail.com	
C.C	39,549,955	ESPERANZA QUEVEDO	MUJER	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S			X						X	rymparquesusaquen743@gmail.com	
C.C	1,067,726,377	KATHERIN JIMENEZ	MUJER	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S			X						X	rymparquesusaquen743@gmail.com	
C.C	51740684	MARGARITA GOMEZ GOMEZ	MUJER	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S			X						X	rymparquesusaquen743@gmail.com	
C.C															

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.13 :

REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR

1.1 PROGRAMAR REUNIONES DE INICIO . RESP.CONTRATISTA . PROXIMO COMITE - LAS REUNIONES SE PROGRAMARON DE ACUERDO A LA TABLA ADJUNTA. COMPROMISO CUMPLIDO

MES DE MAYO/2025

PARQUE - CÓDIGO	DIRECCIÓN	FECHA	HORA
URBANIZACIÓN SANTA BARBARÁ 01-126	CALLE 114 CON CARRERA 19 A	9/05/2025	11:30 A.M
URBANIZACIÓN MULTIFAMILIAR EL VERGEL 01-407	CARRERA 9 A CON CALLE 131A	9/05/2025	2:00 P.M
EL CEDRO BOLÍVAR – UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR - CONJUNTO RESIDENCIAL EL CEDRAL 01- 016	CALLE 150 A CON CARRERA 20	16/05/2025	11:30 A.M
URBANIZACIÓN CAPRI II ETAPA 01-059	CARRERA 12 CON CALLE 150	16/05/2025	2:00 P.M

1.2 RADICACION CUENTA DE OBRA - INTERVENTORIA No.1 EN EL FDLUS RESP.INTERVENTORIA. (5-05-2025): SE REALIZO LA RADICACION CON OFICIO No.R&M-CTO-038-743-2025 CUENTA DE OBRA No. 1 CON RADICADO No.2025-511-007469-2 Y CON OFICIO No.R&M-CTO-037-2025 CUENTA DE INTERVENTORIA No.1 CON RADICADO No.2025-511-007468-2 DEL 5 DE MAYO DE 2025. COMPROMISO CUMPLIDO

1.3 REVISAR PRESUPUESTO PARQUE EL VERGEL 01-407, PARA INCLUIR MANTENIMIENTO CERRAMIENTO DE CANCHA EXISTENTE.RESP.CONTRATISTA (P.SEMANA). EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE ESTA REVISANDO PARA INCLUIR EN EL BALANCE Y LA PROXIMA SEMANA SE INFORMARA

1.4 BALANCE GENERAL DEL CONTRATO .RESP.CONTRATISTA (P.COMITE): EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA EN REVISION DE LAS ACTIVIDADES DE CADA FRENTE Y LA PROXIMA SEMANA SE INFORMARA.

DESARROLLO COMITÉ

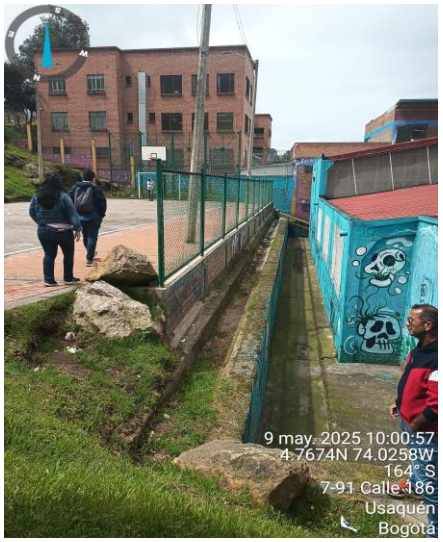
AVANCE: PROGRAMADO 30,14% - EJECUTADO 31,78%

01-189 ESTRELLA NORTE: SE AVANZA EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES E INSTALACION DE BORDILLO A-80, SE ALISTA TRAMOS DE SENDEROS CON LA INSTALACION DE LA ARENA PARA INICIAR INSTALACION DE ADOQUIN, SE VERIFICA EL JUEGO INFANTIL INSTALADO Y TENIENDO EN CUENTA QUE POR LA REUBICACION DEL JUEGO EN LA ZONA INFANTIL QUEDO ESPACIO EN LA ZONA ORIENTAL Y SE VERIFICARA LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UN JUEGO PARA GATEADORES O EN EL DISEÑO DEL PISO DE CAUCHO UBICAR JUEGOS (GOLOSA - PISTA). SE REALIZO LA INSTALACION DE LAS BASES DE LOS BISALUDABLES PARA POSTERIOR INSTALCION DE LAS MAQUINAS BIOSALUDABLES

01-483 JARDINES DEL ORIENTE: SE ADELANTAN ACTIVIDADES DE INSTALACION BORDILLO A-80, Y LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES ESTA LISTA PAR FUNDIR LA PLACA DE CONTRAPISO Y EL CONCRETO SE TIENE PROGRAMADO PARA LAS 9:00 AM (9-05-2025)

01-556 ALCAZAR DEL RIO: SE AVANZA EN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE BORDILLO A-80 EN LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y EN LA INSTALACION DE LOS PARALES DE LA BARANDA M-83 EN AL ZONA INFANTIL, YA QUE SE TIENE PROGRAMADO FUNDIR LA PLACA DE CONTRAPISO EL (10-05-2025) A LAS 9:00 A.M

VISITA PARQUE EL CODITO: SE REALIZO VISITA AL PARQUE A LADO DEL SALON COMUNAL PARA REVISAR Y VERIFICAR SI SE PUEDE PONER PIEDRAS PEGADAS AL BORDE DE LA CAÑUELA EXISTENTE Y MURO PARA EVITAR QUE LOS HABITANTES DE CALLE SE ACOMODEN A DORMIR Y HACER SUS NECESIDADES , LO TIENEN COMO BAÑO PUBLICO, PERO REVISANDO NO SERIA UNA SOLUCION ADECUADA - SE REVISARA POR PARTE DEL FDLUS SI SE PUEDE INSTALAR UN CERRAMIENTO PARA AISLAR ESTA ZONA.

 
01-117 URBANIZACION LOS MOLINOS: SE AVANZA EN LA INSTALACION DEL SARDINEL A-10 Y LA CONFORMACION DE LA RAMPA PEATONAL EN EL COSTADO OCCIDENTAL, ASI MISMO CONTINUA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADOQUIN Y FUNDIDA DE CINTAS DE AJUSTE EN CONCRETO.
01-009 SAN PATRICIO: SE ESTA REALIZANDO LA INSTALACION DE LA BANCAS M-31, SE FUNDEN BASES EN CONCRETO DE LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y SE VERIFICA LA CARGA DE LA USB PARA CELULARES EN LAS LOS GIMNASIOS AL PEDALEAR, SE REALIZA ADECUACION DE LA ZONA COSTADO SUR-OCCIDENTE EN LA CALLE 108 CON CRA 17A, PARA FUNDIR ANDEN, RAMPA Y TAPA POZO
01-126 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BARBARA: SE REALIZA REUNION DE INICIO CON LA COMUNIDAD DONDE SE LES EXPLICA LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: DESMONTE DE UNO DE LOS JUEGOS EN MADERA- PASAMOS METALICO Y CONSTRUCCION DE LA ZONA INFANTIL CON UN JUEGO IMPORTADO Y PISO EN GRANO DE CAUCHO CON PROTECCION BARANDA M-83, SE VA A RETIRAR LOS JUEGOS BIOSALUDABLES EXISTENTES, SE LES HARA MANTENIMIENTO, LA COMUNIDAD SOLICITO VERIFICAR SI SE LE PODIA HACER ALGO A LA ZONA DE LA CANASTA INCLUYENTE YA QUE ESTA EN PASTO PERO LA ZONA DE LA ZONA DEBAJO DE LA CANASTA ESTA EN TIERRA Y SUPER HUNDIDO Y PARA LOS BIOSALUDABLES HACERLES PLACA EN CONCRETO, YA QUE AL ESTAR DIRECTAMENTE EN LA ZONA VERDE ESTAN MUY OXIDADOS.
01-407 URBANIZACIÓN CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL: SE REALIZA REUNION DE INICIO CON LA COMUNIDAD DONDE SE LES EXPLICA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: DESMONTE DE JUEGO INFANTIL EN MADERA Y CONSTRUCCION DE LA ZONA INFANTIL CON UN JUEGO IMPORTADO Y PISO EN GRANO DE CAUCHO, CON PROTECCION BARANDA M-83, DOS PLAZOLETAS DE PERMANENCIA EN ADOQUIN CON LA UBICACION DE BANCAS, SE ARREGLARA LA ZONA DEL SUMIDERO, EL SR.JAIRO CASTILLO BENEDETTI, MANIFIESTA QUE QUIERE MOSTRAR OTRAS COSAS SI SE LES PUEDE HACER MANTENIMIENTO: REVISAR MALLA DE PROTECCION EN MINI CANCHA DE BALONCESTO PAAR HACER MANTENIMIENTO - SE REVISARA POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL FDLUS SI SE PUEDE HACER MANTENIMIENTO YA QUE LA MALLA EXISTENTE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ACTUALES, PONER TORNILOS EN LA ESTRUCTURA DE BALONCESTO Y SE HARA, SOLICITO MANTENIMIENTO EN EL CERRAMIENTO PERIMETRAL AL PARQUE Y SE LE EXPLICO QUE NO SE PUEDE HACER NINGUN TIPO DE MANTENIMIENTO A ESE CERRAMIENTO YA QUE SERIA INVERTIR RECURSOS EN ACTIVIDADES NO PERMITIDAS, YA QUE LOS CERRAMIENTO EN PARQUES PUBLICOS DE APROXIMACION NO SON PERMITIDOS POR EL POT VIGENTE DE BOGOTA.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	BALANCE PRESUPUESTAL	**CONTRATISTA**	**16/05/2025**
	CUENTAS OBRA - INTERVENTORIA No.2 , SUBIR AL ONE DRIVE DEL CONTRATO FDLUS	**CONTRATISTA - INTERVENTORIA**	**14/05/2025**

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.
