CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

Informe Mensual de Consultoría No. 04.

Contrato No.-2695-2023

Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda grupo AMV 2 Lote 10.

Versión 1.0

Periodo 01 de diciembre al 31 de diciembre 2023.

Pereira Risaralda - enero 2024.

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe mensual de avance No. 4 presentado por el Consorcio SUPERVISION VIAL A5, correspondiente a las actividades adelantadas durante el 01 de diciembre al 30 de diciembre de 2023.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	04-01-2024		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el Consorcio SUPERVISION VIAL A5 en el marco del Contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, respecto al seguimiento mensual de las vías relacionadas y las cooperativas. De igual forma, se relaciona el estado administrativo, técnico y financiero del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	Lenguaje	Español
Código: NA	Versión 1.0		
Autor	Consorcio SUPERVISION VIAL A5 – Equipo de contrato		
Revisó	CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN....5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....6
3. INFORMACIÓN LEGAL....10
4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO....11
4.1. SEGUIMIENTO A CONTRATOS....13
- CONTRATO NO. 3227-2023....13
- CONTRATO NO. 3074-2023 MONTO AGOTABLE....13
- COOPERATIVA ALTAGRACIA: RUTAS 29RSA Y 2902....13
- COOPERATIVA CENTRO: RUTAS 50RS02, 25RSA Y 29RSB....14
- COOPERATIVA COMUNEROS: RUTAS 5003 Y 2507....14

4.1.1. REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO....14
4.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD....16
4.3. TIEMPO DE TRABAJO - JORNADAS DE TRABAJO....16
4.4. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA....16
4.5. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO AVANCE FÍSICO....16
4.6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO....17
5. INFORME SISO....18
5.1. ACTIVIDADES SISO REALIZADAS....18
- REPORTES DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS....24
- REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTE DE TRABAJO....24
- ESTILOS DE VIDA SALUDABLE....24

6. GESTIÓN DOCUMENTAL....30
6.1. GESTIÓN DOCUMENTAL MEDIANTE OFICIOS....30
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....36
8. ANEXOS....38
8.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO....38
8.2. BITÁCORA DE OBRA....43
8.3. INFORMES SEMANALES DEL ADMINISTRADOR VIAL....44
8.4. REGISTRO DE ASISITENCIA COMITES VIALES....45

ÍNDICE DE IMAGENES

IMAGEN 1 RUTA 5003 - SANTA CECILIA (PR 13+00) - ASIA 6
IMAGEN 2 RUTA 2507- REMOLINOS - CAUYA 6
IMAGEN 3 RUTA 25RSA - PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA 7
IMAGEN 4 RUTA 2902 - PUENTE MOSQUERA - AVENIDA CRUCE FERROCARIL 7
IMAGEN 5 RUTA 29RSA - VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO 8
IMAGEN 6 RUTA 29RSB - VARIANTE GALICIA 8
IMAGEN 7 RUTA 50RS01 - APIA - LA VIRGINIA 9

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 INFORMACIÓN LEGA DEL CONTRATO 10
TABLA 2 LISTADO DE REUNIONES 14
TABLA 3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 16
TABLA 4 LISTADO DE PERSONAL 18
TABLA 5. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 30
TABLA 6. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS ENVIADOS POR EL CONSORCIO AL INVIAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 33
TABLA 7 . GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES AL CONSORCIO DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 35

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de mediante concurso de méritos CAM-DEO-008-2023, adjudicó el Contrato de Consultoría No. 2596 del 2023 al CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5 con el objeto de "*Brindar acompañamiento, técnico y financiero al Min TRANSPORTE en el desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, y regulatorias, por parte de los operadores y prestadores del servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Risaralda sectores 50RS01 Apia –La Virginia,5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, 25RSA paso por la Virginia, 29RSB Variante Galicia, 29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira, 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar*", durante el período comprendido entre el 28 de agosto del 2023 y 28 de diciembre de 2023.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral 7 del literal C *"OBLIGACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES"* de la CLÁUSULA SEGUNDA del referido contrato, celebrado entre el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE RISARALDA** y el **CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5**, que establece:

> *"Entregar un informe mensual de avance que detalle las actividades desarrolladas en el período, en el último informe mensual de cada vigencia."*

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5 durante el período del presente informe, de conformidad con el desarrollo del Modelo de Vigilancia y Control, implementado por de *Min TRANSPORTE*.

El presente documento, se constituye como "*INFORME 04 DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEM BRE DE 2023*"

El presente informe hace relación a las actividades, documentación y demás actividades necesarias para la gestión y desarrollo, durante el periodo comprendido **del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2023** del Contrato de consultoría No **2695 DE 2023**, cuyo objeto es: **contrato de consultoría Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda grupo AMV 2 Lote 10.**

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Vías a cargo del instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Risaralda sectores 50RS01 Apia –La Virginia, 5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, 25RSA paso por la Virginia, 29RSB Variante Galicia, 29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira, 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar.

IMAGEN 1 RUTA 5003 - SANTA CECILIA (PR 13+00) - ASIA



Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 2 RUTA 2507- REMOLINOS - CAUYA




Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 3 RUTA 25RSA - PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA



Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 4 RUTA 2902 - PUENTE MOSQUERA - AVENIDA CRUCE FERROCARIL

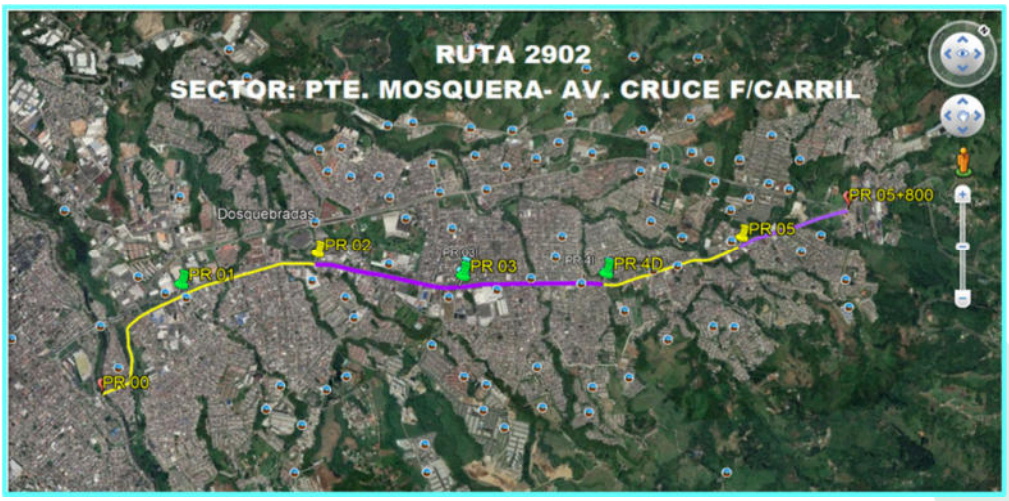

Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 5 RUTA 29RSA - VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO



Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 6 RUTA 29RSB - VARIANTE GALICIA



Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN 7 RUTA 50RS01 - APIA - LA VIRGINIA



Fuente: Elaboración Propia

3. INFORMACIÓN LEGAL

A continuación, se presenta la información legal correspondiente al Contrato de consultoría:

TABLA 1 INFORMACIÓN LEGA DEL CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA No 2695 DE 2023	
Objeto: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial de Risaralda grupo AMV 2 Lote 10.	
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SUPERVISION VIAL A5
NIT DE LA EMPRESA:	901734171-1
APODERADO - REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA JANNETH HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN OFICINA:	Diagonal 43 calle 43 No 7-16 – Dosquebradas - Risaralda
TELÉFONOS:	3156719235-3162243546
EMAIL:	Supervisionviala5@aciproyectos.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 283.776.853,00 M/cte.
ADICIÓN No. 01	$ 75.673.827 M/cte.
VALOR ACTUALIZADO	$ 359.450.680 M/cte.
FECHA DE INICIO:	28 DE AGOSTO DE 2023
PRORROGA No. 01	3 días, hasta el 31 de diciembre de 2023
PRORROGA No. 03	1 mes, hasta el 31 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUA:	31 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No 2695 DE 2023	
PÓLIZAS INICIALES:	Póliza de cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 0 aprobado mediante oficio DT-RIS- 47006. Póliza de Cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 2. Aprobado mediante oficio 2023S-VRIS-003291.
PÓLIZAS ADICIÓN Y PRORROGA No. 01	Póliza de cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 2. Póliza de Cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 3. Póliza de Cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 4.
PÓLIZAS MODIFICACIÓN No. 01	Póliza de Cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 5.
PÓLIZAS PRORROGA No. 02	Póliza de Cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 6. Póliza de Cumplimiento estatal No. 11-44-101205943, Anexo 7.

Fuente: Elaboración Propia

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

Durante el período de este informe, el consorcio Supervisión Vial A5 adelanto las actividades estipuladas en el contrato de consultoría. Estas acciones fueron realizadas bajo la supervisión del Ing. Héctor Iván Gutiérrez Salazar, quien es un funcionario del INVIAS. Las actividades llevadas a cabo en el marco del Contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, incluyeron las siguientes acciones:

Seguimiento mensual de las vías objeto del contrato se realizó mediante recorridos, la inspección y control y el seguimiento a las cooperativas en las

actividades programadas y las emergencias diarias que se puedan presentar en las vías asignadas a cada cooperativa que iniciaron actividades desde el 01 de octubre 2023.

Se relacionó el estado administrativo, técnico y financiero del contrato, durante el período del presente informe para los sectores (i) 50RS01 Apia – La Virginia, (ii) 5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, (iii) 25RSA paso por la Virginia, (iv) 29RSB Variante Galicia, (v) 29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira y (vi) 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar.

Se continuo con el recorrido de las vías a cargo, se continuó la instalación de señales verticales, horizontales y defensas viales en las vías que estaban faltas de señalización y protección por pate del contrato No 3227 de 2023, obras a realizar, predios de invasión de la franja de INVIAS, etc.

Durante el período de este informe, no se ha recibido ninguna información que deba ser reportada a la plataforma Sukubum sobre el atropellamiento de fauna en la red vial que administra el Consorcio Supervisión Vial A5. No se han registrado incidentes de este tipo en el área bajo nuestra supervisión durante el período en cuestión.

El Consorcio Supervisión Vial A5, en colaboración con la supervisión del INVIAS, se continua con la señalización en ciertas áreas específicas de las vías bajo nuestra administración, como reforzar las señales verticales, marcas viales y defensas en las siguientes vías: 50RS01, 29RSA, 2902, 2507 y 25RSA. Se ha priorizado en las señales reglamentarias y preventivas, así como en las señales que indican curvas pronunciadas. En la vía 25RSA, se planifico reforzar las líneas logarítmicas, repintar los pictogramas de velocidad a 30 km/h y recuperar los pictogramas dañados. Además, en la vía 2902, pintaron las líneas laterales y centrales del PR4+0300 al PR5+0200 y 25RSA PR0+0000 al PR4+0455 para mejorar la seguridad vial en esas áreas específicas que estaban muy borrosas y poco visibles. Estas acciones se están llevando a cabo para garantizar un entorno de conducción seguro y eficiente en las vías que supervisamos.

4.1. SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Dentro de las actividades de seguimiento durante el periodo del presente informe se hizo seguimiento a los siguientes contratos:

- **Contrato No. 3227-2023**

  Contrato suscrito entre Luisa Fernanda Avalos Peralta e INVIAS, dicho contrato tiene acta de inicio 10 de octubre de 2023, dentro del desarrollo de este contrato la Administración vial ha realizado la continua vigilancia y control de calidad de las actividades realizadas en los sitios y tramos en intervención en las diferentes rutas tales como: 2507, 50RS01, 25RSA, 2902, 29RSA, en este periodo se ejecutaron los siguientes ítems y se tramito el acta No 2 y Acta 3, para un total ejecutado de $ 99.368.637:

- **Contrato No. 3074-2023 Monto agotable**

Contrato suscrito entre Constructora Civilcol S.A.S e INVIAS, el representante legal es Heverth Quintero Pineda, se generó acta parcial No 1, se continuó con las visitas pertinentes al sitio a intervenir y se hacen las respectivas reuniones, se continúan actividades tales como manejo de aguas, intervención con maquina retro excavadora, bobcat y volquetas de 7m3 en excavación, despeje del cauce en conglomerado, se hace retiro de material sobrante a un sitio autorizado.

Del mismo modo se presentan las actividades de seguimiento durante el periodo del presente informe sobre los contratos de las cooperativas:

- **Cooperativa Altagracia: Rutas 29RSA Y 2902**

Se continúa el seguimiento la cual realizaron rocerías, desmonte manual, limpieza de cunetas y canales, limpieza y despojo de muros, poda y retiros, limpieza de obras, reforestación, limpieza de cunetas, señales y barandas, reciben las capacitaciones por parte del profesional SST y asesor capacitación de valores y principios cooperativos, seguridad vial.

- **Cooperativa Centro: Rutas 50RS02, 25RSA Y 29RSB**

Se les hizo seguimiento y realizaron rocerías, desmonte manual, limpieza de cunetas, poda y retiros, limpieza de pequeñas obras, señales, barandas y defensas, limpieza de sumideros, limpieza de cunetas, despeje de vía por caída de árboles ruta 50RS01 PR29+0600 a PR29+0630, rocería y limpieza de canales, limpieza de transversales; reciben las capacitaciones por parte del profesional SST y asesor capacitación de valores y principios cooperativos, seguridad vial.

- **Cooperativa Comuneros: Rutas 5003 y 2507**

Se les hizo seguimiento y realizaron rocerías en taludes y zonas verdes, desmonte manual, limpieza de cunetas, limpieza de obras, poda y despeje de la vía con retiro de árboles Ruta 2507 PR49+0800, limpieza de pequeñas obras, barandas, retiro de derrumbes PR48+0850, señales y defensas, en la Ruta 2507 PR45+0250 se presenta intento de invasión con cerco en estacones; reciben las capacitaciones por parte del profesional SST y asesor capacitación de valores y principios cooperativos, seguridad vial.

4.1.1.REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de la ejecución de la administración vial, se han adelantado las siguientes reuniones:

TABLA 2 LISTADO DE REUNIONES

ID	Fecha	Participantes	Tema
1	04/12/2023	Territorial Risaralda Administración vial	Comité CTA
2	11/12/2023	Territorial Risaralda Administración vial	Comité INVIAS
3	11/12/023	Contratista 3074-Interventoria CSV A5	Comité Monto Agotable
4	18/12/2023	Territorial Risaralda Administración vial	Comité INVIAS
5	19/12/023	Gobernación de Risaralda.	Concejo Territorial de Seguridad Vial.

Fuente: Elaboración Propia



COMITÉ INICIO CTA 04/12/23



COMITÉ SEMANAL INVIAS 11/12/23



COMITÉ MONTO AGOTABLE 11/12/23



COMITÉ MONTO AGOTABLE 18/12/23



CONCEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD VIAL



COMITÉ INICIO CTA 26/12/23

4.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Durante el periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre se suministraron los insumos tales como:

TABLA 3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Tipo	Estado
Materiales	Planta eléctrica, emulsión. Epóxido para pega de taches.
Procesos Constructivos	Rocería, Instalación taches, reparcheo con fresado y emulsion.
Maquinaria	Guadañas, Machetes, sopladora, Estacionarias, picas, palas, Polines, Buguis, Rastrillo, motosierra.

Fuente: Elaboración Propia

4.3. TIEMPO DE TRABAJO - JORNADAS DE TRABAJO

Se desarrollan sin novedad, lunes a viernes de 7 am. a 5 pm y sábados de 7 am. a 12 m; jornadas normales.


4.4. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

Durante el mes de diciembre se han presentado precipitaciones altas en los últimos días del mes, el resto han sido días con lluvias leves, secos y soleados; tal como se registró en el reporte diario AMV 2023.

4.5. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO AVANCE FÍSICO

Para este período el consorcio lleva un avance acumulado en tiempo del 100% correspondiente al periodo del 28 de agosto al 31 de diciembre de 2023, en cuanto al avance financiero del 60.48% equivalente a $217.385.992, donde corresponde a los costos fijos de personal y costos variables de acuerdo con los soportes de los costos incurridos; se solicitó prorroga hasta el 31 de enero de 2024, con el fin de seguir brindando el acompañamiento, técnico y financiero al Min Transporte en

el desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias, y regulatorias, por parte de los operadores y prestadores del servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Risaralda sectores 50RS01 Apia –La Virginia,5003 Santa Cecilia-Asia, 2507 Cerritos Cauya, 25RSA paso por la Virginia, 29RSB Variante Galicia, 29RSA solución Vial Dosquebradas-Pereira, 2902 Pereira Chinchiná Avenida Simón Bolívar", A continuación se presenta el estado de la ejecución en tiempo del contrato:

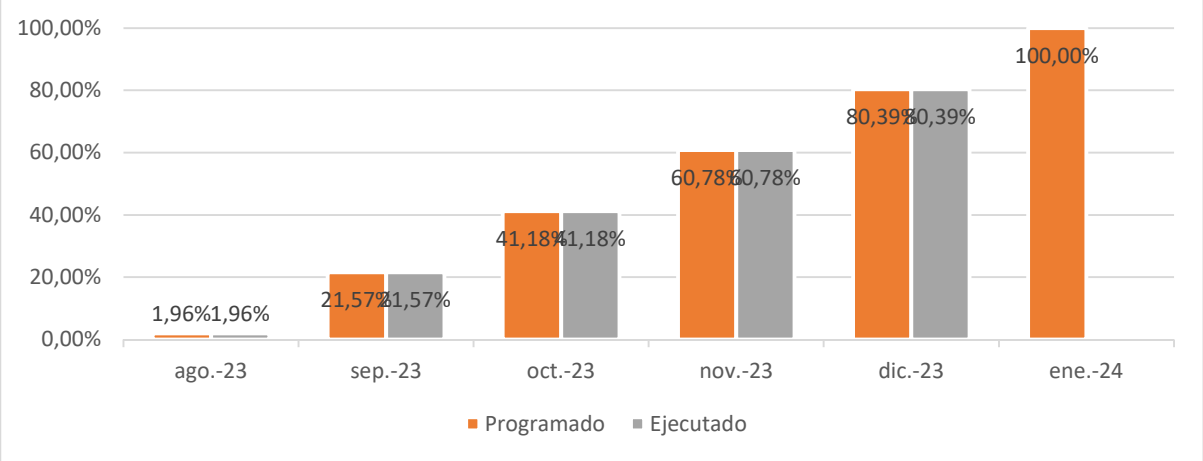

4.6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO

A la fecha se han definido actividades relacionadas con el proyecto y que hacen parte del cronograma de la administración vial como son las señalizaciones, que están en el proceso de ejecución, elementos de protección de las vías y las obras a adelantadas que generan riesgo en los sectores solicitados los cuales son:

- El puente La Víbora en la Ruta 2902 PR 71+0805 Dosquebradas, presentaba obstrucción del flujo por lo cual se continuo con la limpieza para dar la capacidad del paso de volumen de agua y acumulación de material de arrastre ya que la obra anterior del canal en concreto no continua en el paso del puente, y así evitar futuros represamientos de la quebrada e inundaciones.

5. Informe SISO

Dentro de este periodo la Supervisión verificó dentro del trámite del acta de costos la afiliación del personal y el pago de la seguridad social y los parafiscales, del siguiente personal:

TABLA 4 LISTADO DE PERSONAL

Cargo	Nombre	Fecha radicado soportes
Ingeniero Residente	Jose Olmis Gonzalez H.	04/09/2023
Ingeniera Auxiliar	Kelly Ramírez Cuervo	14/08/2023
Inspector SISO	Martha Mancera	14/08/2023
Tecnólogo y/o inspector Vial	Jhon Jairo Vargas	20/09/2023
Conductor	Javier ortega Ríos	14/08/2023

Fuente: Elaboración Propia

5.1. ACTIVIDADES SISO REALIZADAS

Dentro de las actividades realizadas se realizó capacitación en asesor capacitación de valores y principios cooperativos, seguridad vial.

IMPORTANCIA DEL REPORTE DE ACCIDENTE E INCIDENTE COOPERATIVAS ALTAGRACIA, CENTRO Y COMUNEROS



REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO ARL POSITIVA



REPORTE ACCIDENTE DE TRABAJO ARL LA EQUIDAD



+Información

En caso de Accidente de Trabajo:

- Presta los primeros auxilios al trabajador accidentado.
- Informa al Coordinador o Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Comunicate a la línea segura #324 desde Bogotá o 7460392 y en el resto del país al 018000 91 95 38.
- Con el aviso nuestros asesores direccionarán al trabajador a una IPS adecuada según las caracteristicas del accidente y la ubicación del trabajador.

Una vez registrado el aviso y adicionalmente a la llamada, debes reportar el accidente de trabajo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha del evento a través de nuestra página web.

Recuerda que:

- Nuestra Línea Segura está habilitada las 24 horas del día, 7 días a la semana.
- Luego de la atención de urgencias, si requieres la entrega de medicamentos, autorización de terapias y tratamientos especiales, solicita las autorizaciones a través de nuestra línea segura **#324**. Opción 1.

REPORTE DE ACCIDENTE ARL SURA



REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES COOPERATIVAS







Registró fotográfico quebrada la víbora Verificación Recolección de escombros y materiales





Registro fotográfico trabajo Viaducto Cesar Gaviria Trujillo








Señalización adecuada conos en la vía





Asistencias a capacitaciones

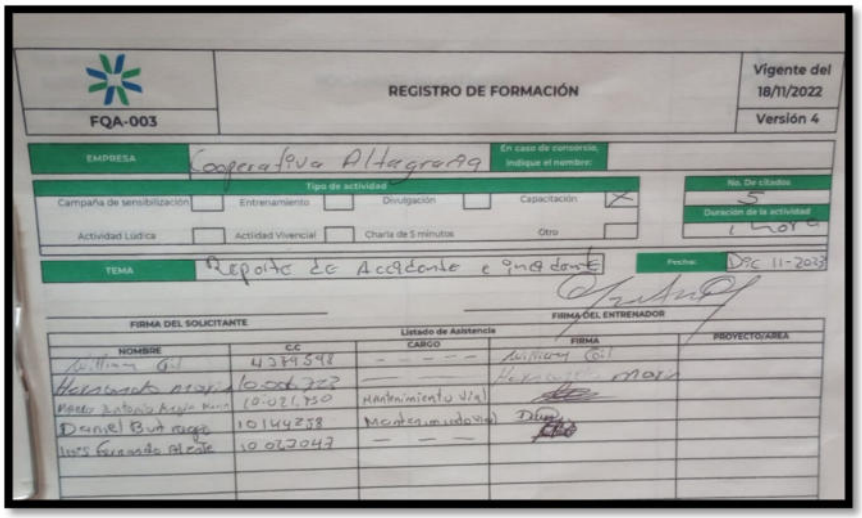

FQA-003 — REGISTRO DE FORMACIÓN — Vigente del 18/11/2022 — Versión 4

EMPRESA: Cooperativa Altagracia — En caso de consorcio, indique el nombre:

Tipo de actividad: Campaña de sensibilización ☐ Entrenamiento ☐ Divulgación ☐ Capacitación ☒ Actividad Lúdica ☐ Actividad Vivencial ☐ Charla de 5 minutos ☐ Otro ☐


No. De citados: 5 — Duración de la actividad: 1 hora

TEMA: Reporte de Accidente e Incidente — Fecha: DIC 11-2023

FIRMA DEL SOLICITANTE — FIRMA DEL ENTRENADOR

Listado de Asistencia

NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA	PROYECTO/AREA
William Gil	4279598	- - - - -		
Hernando Arango	10.006.727	— — —		
Pedro Antonio Acosta Muñoz	10.021.750	Mantenimiento Vial		
Daniel Buitrago	10144238	Monitoreo ambiental		
Luis Fernando Alzate	10.027.047	— — —		

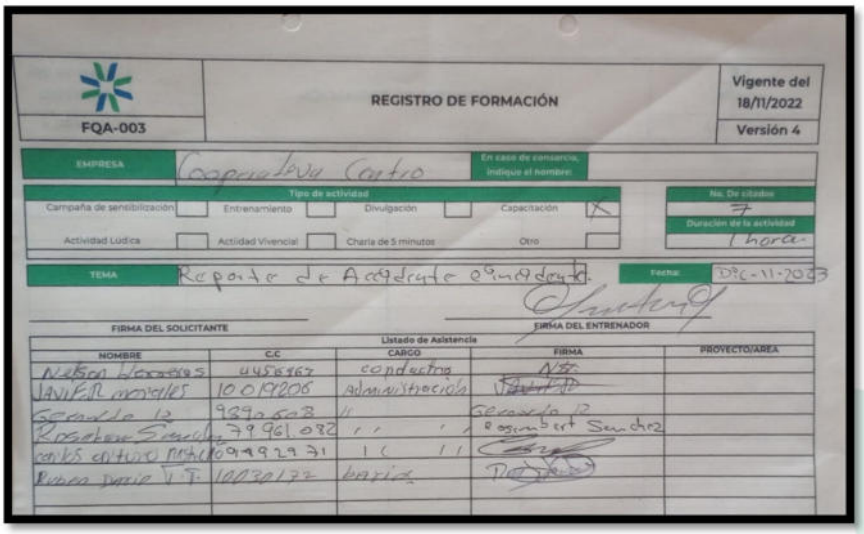

FQA-003 — REGISTRO DE FORMACIÓN — Vigente del 18/11/2022 — Versión 4

EMPRESA: Cooperativa Centro — En caso de consorcio, indique el nombre:

Tipo de actividad: Campaña de sensibilización ☐ Entrenamiento ☐ Divulgación ☐ Capacitación ☒ Actividad Lúdica ☐ Actividad Vivencial ☐ Charla de 5 minutos ☐ Otro ☐


No. De citados: 7 — Duración de la actividad: 1 hora

TEMA: Reporte de Accidente e Incidente — Fecha: DIC-11-2023

FIRMA DEL SOLICITANTE — FIRMA DEL ENTRENADOR

Listado de Asistencia

NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA	PROYECTO/AREA
Nelson [illegible]	4456967	conductor		
JAVIER MORALES	10019806	Administración		
Gerardo [illegible]	9896603	"	Gerardo P.	
Rodolfo Sánchez	79961.082	" "	Rodolfo Sanchez	
[illegible]	1099929731	" "		
Rubén Darío V. T.	10020172	barrio		

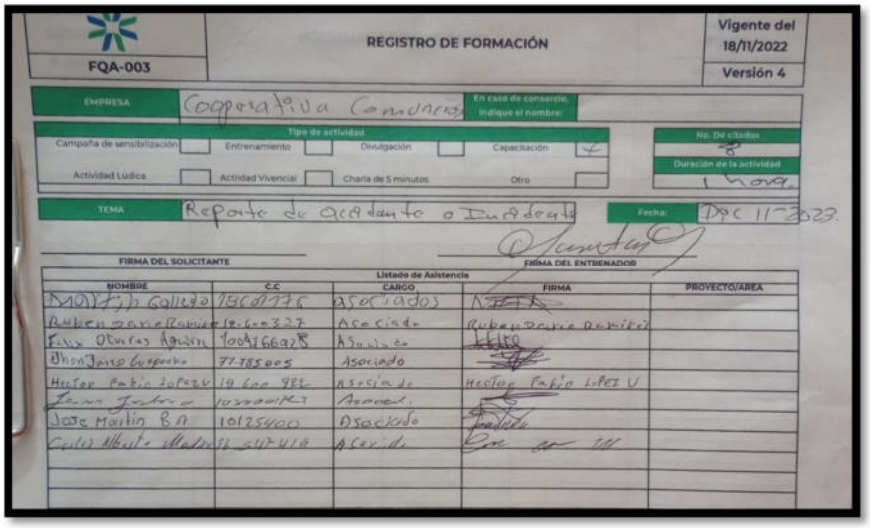

FQA-003

REGISTRO DE FORMACIÓN

Vigente del 18/11/2022

Versión 4

EMPRESA: Cooperativa Comunera

En caso de consorcio, indique el nombre:

Tipo de actividad: Campaña de sensibilización ☐ Entrenamiento ☐ Divulgación ☐ Capacitación ☑ Actividad Ludica ☐ Actividad Vivencial ☐ Charla de 5 minutos ☐ Otro ☐

No. De citados: 8

Duración de la actividad: 1 hora

TEMA: Reporte de accidente o Incidente

Fecha: DIC 11-2023

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL ENTRENADOR

Listado de Asistencia


NOMBRE	C.C	CARGO	FIRMA	PROYECTO/AREA
Mayerlin Gallego	1152077776	Asociados		
Ruben Dario Ramirez	18.600.327	Asociado	Ruben Dario Ramirez	
Felix Octavio Agudelo	10097669?8	Asociado		
Jhon Jairo Guapacha	77.785.005	Asociado		
Hector Fabio Lopez V	19.600.982	Asociado	Hector Fabio Lopez V	
Jaime Jaramillo	10.330.817	Asociado		
Jose Martin B.A	10125400	Asociado		
Carlos Alberto Madrid	87.470.118	Asociado		

Se le dio cumplimiento al cronograma de capacitacion a los trabajadores del Consorcio Administración Vial A5

Temas:

- Reportes de actos y condiciones inseguras
- Reporte de accidente e incidente de trabajo
- Estilos de vida Saludable



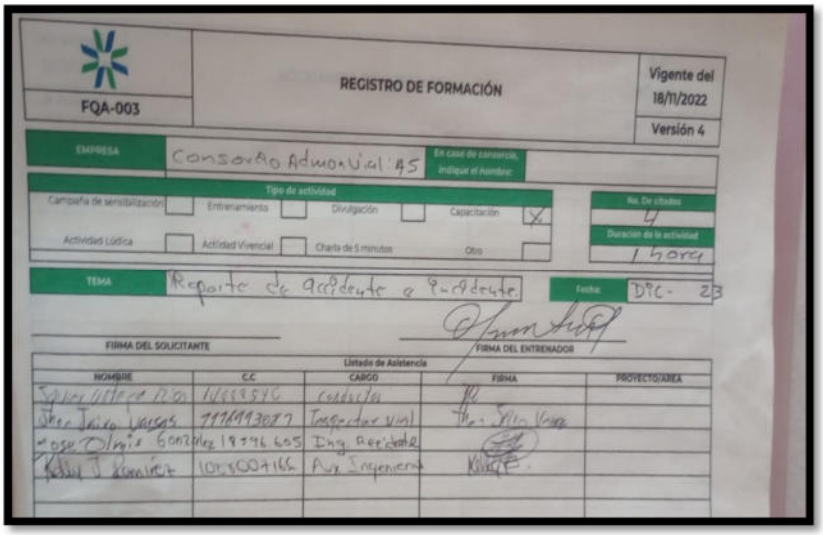

FQA-003

REGISTRO DE FORMACIÓN

Vigente del 18/11/2022

Versión 4

EMPRESA: Consorcio AdmonVial 45

En caso de consorcio, indique el nombre:

Tipo de actividad: Campaña de sensibilización ☐ Entrenamiento ☐ Divulgación ☐ Capacitación ☒ Actividad Lúdica ☐ Actividad Vivencial ☐ Charla de 5 minutos ☐ Otro ☐

No. De citados: 4

Duración de la actividad: 1 Hora

TEMA: Reporte de accidente e incidente

Fecha: DIC- 23

FIRMA DEL SOLICITANTE

FIRMA DEL ENTRENADOR

Listado de Asistencia

NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA	PROYECTO/AREA
Sylvia Ulloa [illegible]	1088[illegible]516	conductor		
Jhon Jairo Vargas	7716930877	Inspector Vial		
Jose Dario Gonzalez	19796605	Ing. Residente		
[illegible]	1075[illegible]165	Aux. Ingeniero		

Seguimiento contratista Luisa Fernanda Avalos

Pintura en la vía La Virginia





Se realizo acompañamiento al Segundo encuentro de las cooperativas en capacitacion seguridad social y fondos de pensiones



Se realizo acompañamiento al Tercer encuentro de Cooperativas en capacitacion de Princicipios y valores cooperativos






Encuentro cooperativas Capacitacion Seguridad Vial



Preoperacional sst vehiculo consorcio, se realizo recarga Extintor camioneta consorcio Supervision vial a5

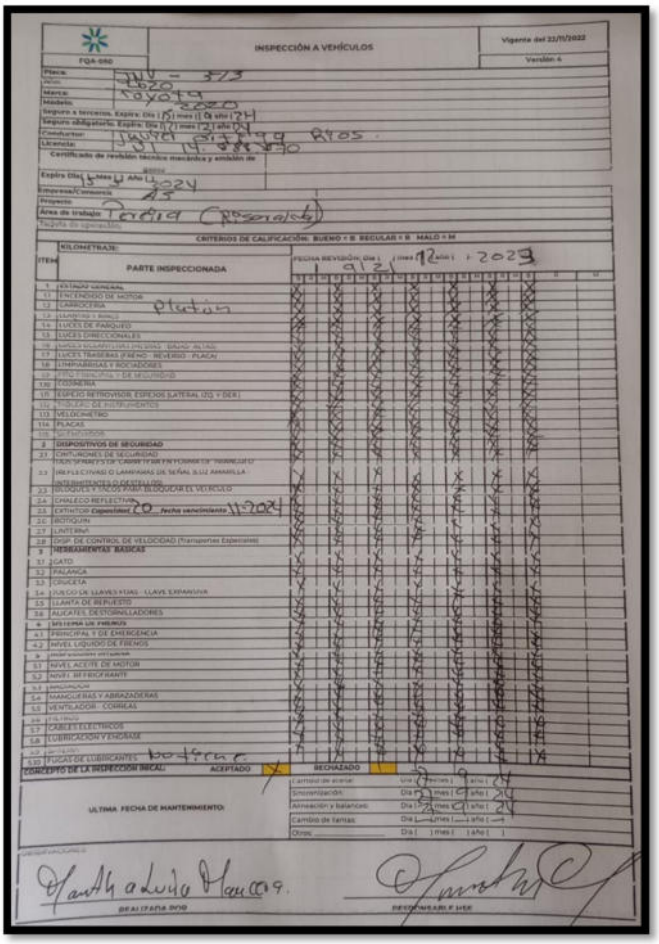



Se resalta el cumplimiento en la acción de mejora de la Cooperativa Centro, al realizar la correspondiente identificación del recipiente de transvase de gasolina.



Fuente: Elaboración Propia



PASO PEATONAL Y LINEA DE PARE




VELOCIDAD MAXIMA 30 KM/H



ZONA ESCOLAR



ZONA ESCOLAR

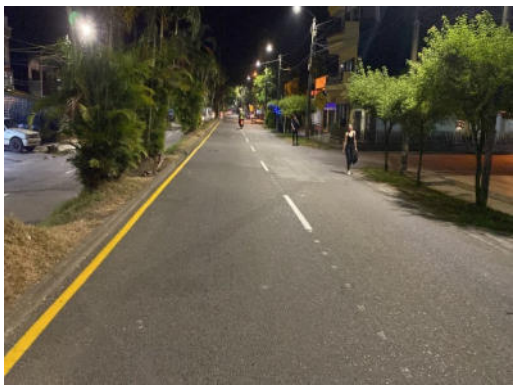



LINEAS LATERAL AMARILLA CONTINUA, CENTRAL BLANCA SEGMENTADA 25RSA





DELINEADORES Y DEFENSAS VIALES

6. **Gestión documental** En las siguientes tablas se presenta la relación de oficios remitidos y recibidos del MinTransporte durante el periodo del presente informe relacionados con el contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, celebrado entre INVIAS y el Consorcio Supervisión Vial A5.

6.1. Gestión documental mediante oficios

Durante este periodo se recibieron los siguientes oficios y correos por parte del INVIAS al Consorcio Supervisión Vial A5, los cuales se listan a continuación:

TABLA 5. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS POR LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Correo	Correo	01/12/2023	Tramite actas de costos 3 CTO 2695-202. La presentación de actas de costos debe venir completo el paquete con todos los formatos debidamente diligencias.
2023E-VUVRAZ-033576	Correo	01/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. Informe semana 14 consorcio supervisión vial a5.
2023E-VUVRAZ-033964	Correo	01/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado. Informe mensual no. 02. Para su revisión y tramite
Correo	Correo	02/12/2023	Acta 1 cooperativas. Acta n0. 1 CTO 3077-20 y autorización del anticipo.
Correo	Correo	04/12/2023	Borrador plegable AMV g1 folleto
2023E-VUVRAZ-034815	Correo	05/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Acta comuneros mes de noviembre
Correo	Correo	05/12/2023	Pablo Andres Ramírez acuña ha compartido la carpeta "contrato 3227-2023" contigo

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
2023E-VUVRAZ-034973	Correo	05/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Radicado acta Altagracia noviembre
2023E-VUVRAZ-034983	Correo	05/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Radicado acta centro noviembre
2023E-VUVRAZ-035805	Correo	07/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Acta no. 01 del contrato de monto agotable CTO 3074-23
2023E-VUVRAZ-035809	Correo	07/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Acta no. 01 del contrato de monto agotable CTO 3074-23
2023E-VUVRAZ-035811	Correo	07/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Acta no. 01 del contrato de monto agotable CTO 3074-23
Al contestar cite este radicado: 2023S-VMAG-026856 n radicado SAL-23-018177	Correo	07/12/2023	Solicitud de información de recursos restantes. Por instrucciones del ingeniero Fabián Arango me permito adjuntar oficio 2023s-vmag-026856 para los fines pertinentes.
radicado 2023E-VUVR-034702 RV Aprobacion documento SAL 23 018164	Correo	11/12/2023	La solicitud que hizo en el sistema de servicio al ciudadano de INVIAS ya ha sido resuelta.
Radicado # 2023S-VANT-027424	Correo	11/12/2023	Radicado # 2023s-vant-027424 - la solicitud que hizo

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
			en el sistema de servicio al ciudadano de INVIAS ya ha sido resuelta.
2023E-VUVRAZ-036916	Correo	12/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Radicado acta 03 diciembre Altagracia
2023E-VUVRAZ-036926	SAL-23-018442	12/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado relacionado con la viabilidad de solicitud de prórroga del CTO. 3077-23 comuneros.
2023E-VUVRAZ-036936	SAL-23-018443	12/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado relacionado con la viabilidad de solicitud de prórroga del CTO. 3150-23 el centro
2023E-VUVRAZ-036941	SAL-23-018444	12/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado relacionado con la viabilidad de solicitud de prórroga del CTO. 3149-23 Altagracia
2023E-VUVRAZ-036994	Correo	12/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Radicado acta 03 diciembre el centro
2023E-VUVRAZ-037006	Correo	12/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. Radicado acta 03 diciembre comuneros

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente se presenta el detalle de los oficios enviados por el Consorcio Supervisión Vial A5 al MinTransporte a cargo de la dirección Territorial de Risaralda:

TABLA 6. GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS ENVIADOS POR EL CONSORCIO AL INVIAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Corre	SAL-23-018055	01/12/2023	Adjunto informe mensual No. 02. Para su revisión y trámite.
Correo	Correo	05/12/2023	ACTA COMUNEROS MES DE NOVIEMBRE
Correo	Correo	05/12/2023	ACTA ALTAGRACIA NOVIEMBRE FIRMADA
Correo	Correo	05/12/2023	ACTA CENTRO NOVIEMBRE FIRMADA
Correo	Correo	07/12/2023	Acta No. 01 del contrato de monto agotable Cto 3074-23. Planilla ADMON SEPTIEMBRE
Correo	Correo	07/12/2023	Acta No. 01 del contrato de monto agotable Cto 3074-23. Planilla ADMON OCTUBRE
Correo	Correo	07/12/2023	Acta No. 03 del contrato de monto agotable Cto. 3074-23
Correo	Correo	11/12/2023	ACTA 03 DICIEMBRE ALTAGRACIA
Correo	SAL-23-018442	11/12/2023	Solicitud de prórroga del Cto. 3077-23 comuneros.
Correo	SAL-23-018443	11/12/2023	Solicitud de prórroga del Cto. 3150-23 El Centro.
Correo	SAL-23-018444	11/12/2023	Solicitud de prórroga del Cto. 3149-23 Altagracia.
Correo	Correo	11/12/2023	ACTA 03 DICIEMBRE EL CENTRO
Correo	Correo	11/12/2023	ACTA 03 DICIEMBRE COMUNEROS
Correo	Correo	13/12/2023	acta de recibió definitivo contrato 3227-2023, TRATO: "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN LA JURISDICCIÓN DE

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
			LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA"
2023E-VUVRAZ-037630	Correo	13/12/2023	Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado por INVIAS. ACTA DE COSTOS 04 CONTRATO 3074-2023
Correo	Correo	14/12/2023	Solicitud de prórroga Contrato 3074-2023. Contratos CIVILCOL
2023E-VUVR-034700	SAL 23 018155	16/12/2023	Certificación Contrato No. 2074-2005
Correo	Correo	18/12/2023	Adjunto el radicado SICOR 38452, dando alcance al traslado de la Alcaldía de Dosquebradas sobre la Solicitud de apoyo para poda de árboles en puntos de cámaras de seguridad CCTV - MEPER de la Policía Nacional
Correo	Correo	18/12/2023	Adjunto el radicado 40905 de Sicor del 25 de abril de 2023 en el que el administrador vial del contrato 2455-2019 menciona que se requiere intervenir la zona en el PR47+0800 RUTA 2507 VÍA CERRITOS -CAUYA, debido a las condiciones de la carpeta asfáltica
Correo	Correo	18/12/2023	Radicado 57094 sicor para su conocimiento
Correo	Correo	18/12/2023	Radicado 57094 sicor para su conocimiento
Correo	Correo	18/12/2023	respuesta de corpocaldas a solicitud de visita técnica para revisión de árboles en riesgo en las vías 2507 y 5003
2023E-VUVR-034900	SAL 23 018168	18/12/2023	respuesta PQRS 2023e-vuvr-034900, solicitud certificación contrato no. 3277 de 2008
2023S-VBOG-029544	Correo	18/12/2023	Radicado # 2023s-vbog-029544 - la solicitud que hizo en el sistema de servicio al

Radicado Invias	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
			ciudadano de INVIAS ya ha sido resuelta.
2023S-VRIS-029682		18/12/2023	Reunión técnica inicial del Contrato No. 4161 de 2023. Formato MEPI-MN1-IN-1- FR-3
2023S-VRIS-029685		18/12/2023	Reunión técnica inicial del Contrato No. 4107 de 2023. Formato MEPI-MN1-IN-1- FR-3
2023E-VUVRAZ-039660	SAL-23-018749	19/12/2023	Solitud de adición al contrato 2695-2023, junto con los formatos de acuerdo con el manual Invias para dicho trámite.

Fuente: Elaboración Propia

Lo siguientes oficios fueron enviados por entidades diferentes de INVIAS, al consorcio supervisión vial A5.

TABLA 7 . GESTIÓN DOCUMENTAL - OFICIOS RECIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES AL CONSORCIO DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME

Radicado	ENTIDAD	No. Radicado interno	Fecha	Asunto Oficio
Correo	CIVILCOL	Correo	05/12/2023	FORMATO PRESENTACIÓN ACTAS
Correo	MOVILIDADPEREIRA	Correo	12/12/2023	Solicitud accidentalidad mes de noviembre
Correo	contactenos@lavirginia-risaralda.gov.co	Correo	12/12/2023	Solicitud accidentalidad mes de noviembre
Correo	TRANSITODOSQUEBRADAS	Correo	15/12/2023	solicitud accidentalidad mes de noviembre

Fuente: Elaboración Propia

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentan las actividades realizadas por el Consorcio SUPERVISION VIAL A5 en el marco del Contrato de Consultoría No. 2695 de 2023, respecto al seguimiento mensual de las vías con los respectivos recorridos, inspección, seguimiento y relacionadas con las cooperativas.

Las cooperativas se dedicaron al servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo, despejar las vías y dar el embellecimiento a las zonas y áreas, realizaron las rocerías, desmonte manual, limpieza de cunetas, poda y retiros, limpieza de señales, barandas y defensas, pega de tachas, reparcheos, limpieza de obras, retiro de derrumbes, reciben las capacitaciones por parte del profesional SST y asesor capacitación de valores y principios cooperativos, seguridad vial; igualmente se llenan los formatos relacionados con el pago de las cooperativas y solicitud de prórroga de las mismas.

Se continua la interventoría del contrato No 3227-2023 con Luisa Fernanda Avalos Peralta en las diferentes rutas tales como: 2507, 50RS01, 25RSA, 2902, 29RSA; la Administración vial ha realizado la continua vigilancia y control de calidad de las actividades realizadas en los sitios y tramos en intervención, se ejecutaron los siguientes ítems: marcas viales con pintura en frio, suministro e instalación de señal vertical de transito tipo preventiva, valla vía a Balboa y La Celia y sus distancias, delineador de curva horizontal y líneas de demarcación con pintura en frio, defensas viales; igualmente se tramita acta parcial No 2 ante Invías.

No 3074-2023 Constructora Civilcol S.A.S, se hace el despeje de la zona del pontón PR1+0805 como manejo de aguas, intervención con maquina retro excavadora grande y retro excavadora pequeña y una bobcat y volquetas de 7 m3 en la excavación y despeje del cauce en conglomerado y se retiran a un sitio autorizado y se tramita acta parcial No 1.

Se revisan predios de invasión de la franjas de INVIAS Ruta 2507 PR45+0250.

Para este período el consorcio lleva un avance acumulado en tiempo del 100% correspondiente al periodo del 28 de agosto al 31 de diciembre de 2023.

Se presenta un avance financiero del 60.48% equivalente a $217.385.992.

8. ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁFICO



ROCERIA RUTA 2507 Y LIMPIZA DE CUNETAS



ROCERIA RUTA 2902



LAVADA DE BARANDAS RUTA 2507



LIMPIEZA DE DEFENSAS




LIMPIEZA DE BERMA Y SEPARADOR



PODA DE ARBOLES



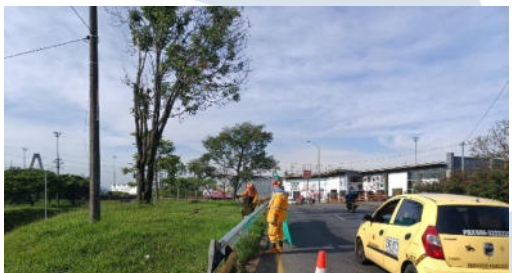

LIMPIEZA BARANDAS Y SEÑALES RUTA 2507



PODA Y ROCERIA RUTA 50RS01

LIMPIEZA DEFENSAS RUTA 29RSA



REPARCHEO RUTA 5003 PR75+0700





REFORESTACION



CAIDA ARBOL Y DESPEJE DE VIA RUTA 2507



LIMPIEZA DESCOLE



LAVADO DEFENSAS METALICAS



DESPEJE DE VIA CAIDA DE ARBOL RUTA- 50RS01



ROCERIA Y LIMPIEZA RUTA 2507



ROCERIA RUTA 2902





INSTALACION TACHAS RUTA 25RSA PR2+0050





CAPACITACIONES COOPERATIVAS

ACTIVIDADES MONTO AGOTABLE.





EXCAVACION CONGLOMERADO BAJO AGUA

SITIOS CRITICOS.



RUTA 2507 PR 45+0000



GAVIÓN EN RIESGO DE COLAPSAR



RUTA 2507 PR 43+0000



DERRUMBE RUTA 2507 PR 43+0000



RUTA 2507 PR 43+0000



PR 43+0000 DERRUMBE LATERAL DEL MURO



RUTA 2507 PR 44+0300



ASENTAMIENTO DE LA VÍA PR 44+0300

8.2. BITÁCORA DE OBRA

Se anexa copia de la bitácora de obra del período del mes de diciembre del 01 de 2023 al 31 de diciembre de 2023 correspondiente al informe.

FECHA	BITACORA DE ACTIVIDADES	ANEXO FOTOGRAFICO
viernes, 01 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Se hizo recorrido a las RUTAS 2507,5003, en la RUTA 25RSA PR2+0050 se instalaron tachas blancas con rojo y amarillas, este trabajó lo realizo la coopertativa del CENTRO. En la RUTA 2902 PR1+0806 se inspeccionó la obra del pontón la Víbora	
sábado, 02 de diciembre de 2023		
domingo, 03 de diciembre de 2023		
lunes, 04 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Nos desplazamos con equipo de trabajo hacia la territorial de INVIAS a comite con las administraciones. Hacemos inspeccion con los ingenieros del contrato 3074-2023 en la RUTA 2902 PR1+805(PONTON LA VIBORA).	
martes, 05 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Hacemos trabajo en oficina adelantado informes, accidentalidad, consolidado del mes de noviembre y bitacora. En la tarde hacemos recorrido en la RUTA2902 y RUTA29RSA. Flujo vehicular transitando con normalidad.	
miércoles, 06 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Salimos con equipo de la administracion para hacer recorrido en las RUTAS 50RS01, 25RSA, 29RSB Y 2902 paran supervision de la via. En la RUTA 29RSB, siguen con una caja de inspeccion de agua potable.	
jueves, 07 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Salimos con equipo de la administracion para reunirnos con el ingeniero del CONTRATO 3227-2023 por OBRAS - CPM Ltda en la la RUTA 50RS01 para acordar presuspuesto de pintura y que se iba a realizar en esta RUTA. Hacemoas recorrido a la RUTA25RSA, 5003 Y RUTA 2507	
viernes, 08 de diciembre de 2023		
sábado, 09 de diciembre de 2023		
domingo, 10 de diciembre de 2023		
lunes, 11 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** En la mañana salimos a la territorial para el comite de todos los lunes con las administraciones, También reunion con monto agotable, se recorrió las RUTAS 2507,5003, 50RS01, y en la RUTA 29RSB se realizó el video de fin de año 2023, también se hizo recorrido con la SST a las CTA. Se llevo emulsion a la cooperativa de comuneros	
martes, 12 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Salimos con el ingeniero residente a recorrió la RUTA 2902,29RSA y en el PR1+0805 se supervisó con medidas la obra de la Víbora. El contrato No.3074-23	
miércoles, 13 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Salimos con la administracion para la territotial de INVIAS para reunion con el ingeniero Zuluaga para acordar unas actas de monto agotable con los ingenieros de la administracion. Hacemos recorrido en la RUTA2902.	

jueves, 14 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Hacemos recorrido con el ingeniero residente a las RUTAS 50RS01 para inspecionar el contrato de marcacion vial **CONTRATO 3227-2023 por OBRAS - CPM Ltda.** Hacemos recorrido a la RUTA25RSA, 2507 Y 5003. Y toma de fotos para informe de la RUTA 2507**.**	
viernes, 15 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Se hace trabajos en oficina sobre. bitacoras y consolidado del mes de diciciembre y se hace recorrido a la RUTA 2902 Y 29RSA	
sábado, 16 de diciembre de 2023		
domingo, 17 de diciembre de 2023		
lunes, 18 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Salimos con la administracion para la territorial de INVIAS para COMITE con las dos administraciones viales. Vamos a la capacitacion de cooperativas de invias. Hacemos recorrido a la RUTA50RS01, 25RSA Y 2507. Toma de videos de estas RUTAS.	
martes, 19 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Hacemos trabajo en la oficina en la mañana. En la tarde salimos a una capacitacion en la gobernacion de risaralda sobre (CONCEJOS TERRITORIALES DE SEGURIDAD VIAL). Hacemos recorrido en las RUTAS 2902 Y toma de video	
miércoles, 20 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Se hizo reparcheo en la RUTA 2902 con la cooperativa,tambien las CTA estuvieron en capacitación con las profesionales en seguridad en el trabajo sobre el tema (seguridad vial)	
jueves, 21 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Hacemos comite en la territorial de INVIAS para el contrato MANTENIMINETO VIAS EJE, Se hace recorrido con el ING Elkin Mejia de invias Risalda, se recorrió las RUTAS 2507,5003, también movilizamos al ing Elkin Mejia a los municipios de Riosucio, Supia con el mismo contratista, en la RUTA 5003 nos desplazamos hasta el PR60+0000.	
viernes, 22 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Se hace recorrido con la Directora de DT RIS, motivo, inspección de las señales instaladas en la RUTA 2507, 50RS01, también se inspeccionó el contrato de pintura y marcas viales, recibo contrato 3227-23, con la directora Y supervisor de la Territorial de Risaralda.	
sábado, 23 de diciembre de 2023		

domingo, 24 de diciembre de 2023		
lunes, 25 de diciembre de 2023		
martes, 26 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** En la mañana comité en el INVIAS, se hizo recorrido a la RUTA 25RSA,50RS01,tambien se hizo video de la marcacion vial en la Virginia....	
miércoles, 27 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Se hizo recorrido a la RUTA 2902, 29RSA,tambien se realizó un video en la RUTA 29RSA.	
jueves, 28 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Se hizo jornada de tapa huecos en la RUTA 2902, recorrido a las RUTAS 2507,5003, 25RSA,tambien se les entregó los volanta a las CTA, Los cuales repartieron a los usuarios de las RUTAS 2507,5003, 25RSA, 2507, 2902, 29RSA, 29RSB	
viernes, 29 de diciembre de 2023	**TIEMPO: SOLEADO** **TRABAJOS DE OFICINA RECORRIDO :** Se hace trabajo en oficina para adelantar trimestral, informes etc. Se hace recorrido a la RUTA2902, 25RSA Y 29RSB.	

8.3. INFORMES SEMANALES DEL ADMINISTRADOR VIAL

Se anexa copia de los informes semanales correspondiente al período del 01 al 31 de diciembre 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/12/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — SEMANA No.: 16 del 8/12/2023 al 14/12/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HÉCTOR IVÁN GUTIERREZ SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
INTEGRANTES: ALTAGRACIA- COMUNEROS-CENTRO
CONTRATO No. 3149-3077-3150
FECHA DE INICIO: 1/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023

VALOR INICIAL: $ 363.917.508,00
VALOR REDUCCIÓN IVA: $ (616.865,00)
VALOR ACUMULADO: $ 363.300.643,00
$ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5
INTEGRANTES: CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5
CONTRATO No. 2596
FECHA DE INICIO: 28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28 DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

VALOR INICIAL: $ 283.776.853,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 363.300.643			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 231.669.975			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 131.630.668			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 283.776.853			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 255.399.168			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 28.377.685			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 363.300.643,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 231.669.975,00	63,77%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 231.669.975,00	63,77%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 231.669.975,00	63,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 231.669.975,00	63,77%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.192.538,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.192.538,00	5,83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 255.399.168,00	90,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 255.399.168,00	90,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.553.650,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.553.650,00	5,83%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 63,77%
Meta Física Ejecutada %: 63,77%
Avance o Atraso Físico %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario					Prog	$ 231.669.975,00			$ 231.669.975,00	
					Ejec	$ 231.669.975,00			$ 231.669.975,00	
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X	

OBSERVACIONES:NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:NO APLICA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: LA PREOFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZA SOCIALIZACIÓN CON LAS COOPERAIVAS DE TRABAJO ACERCA DE LOS REPORTES DE ACCIDENTES E INCIDENTES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:NO APLICA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO
SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A LAS RUTAS 50RS01,25RSA,5003,29RSB,2507,2902.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BERMAS DE LA RUTA 2902 PR 4+0000 "SIMÓN BOLIVAR", CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA LIMPIEZA DE DEFENSAS, CTA COMUNEROS
SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REALIZA ROCERIA RUTA 2902 PR 0+0650, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES , CTA COMUNEROS
SE REALIZA PARCHEO EN RUTA 5003, CTA COMUNEROS
LIMPIEZA DE DESCOLES RUTA 50RS01, CTA CENTRO
LIMPIEZA DE GAVIONES RUTA 2902CTA ALTAGRACIA
SE ATIENDE ARBOL CAÍDO EN LA RUTA 50RS01, CTA CENTRO
SE REALIZA INFORME SEMANAL
SE REALIZA INFORME LIMPIEZA DE DEFENSAS RUTA 50RS01 , CTA CENTRO
SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL A CARGO
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA DE LA RUTA 50RS01 PR 25+0650, CTA CENTRO
SE REALIZA LIMPIEZA DE SEÑALES EN LA RUTA 50RS01
SE REALIZA ROCERIA PARTE BAJA DEL VIADUCTO RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA LIMPIEZA DE CALZADA Y DE BERMAS EN LA CRA 15 DE LA VIRGINIA , CTA CENTRO
SUPERVISIÓN :
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°3150-23
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°3149-23
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA COMUNEROS BAJO EL CONTRATO N°3077-23
INTERVENTORIA:

SE REALIZA SEGUIMIENTO A LA INSTALACIÓN DE PINTURA EN LAS RUTAS 25RSA POR MEDIO DEL CONTRATO 3227-23

SE REALIZAN ACTAS DE COSTOS DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.

SE REALIZAN ACTAS DE COSTOS DE LAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ATENCIÓN ÁRBOL CAÍDO RUTA 50RS01 ,CTA CENTRO



LIMPIEZA DE DEFENSAS RUTA 2507 CTA COMUNEROS



LIMPIEZA DE SEÑALES RUTA 29RSB, CTA ALTAGRACIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES Y SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

INGENIERO RESIDENTE

FIRMA

NOMBRE: JOSÉ OLMIS GONZALEZ HIDALGO

Matrícula Profesional No.: 66202-80414

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — SEMANA No.: 17 del 16/12/2023 al 21/12/2023, Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HÉCTOR IVÁN GUTIERREZ SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO		
INTEGRANTES:	ALTAGRACIA- COMUNEROS-CENTRO		
CONTRATO No.	3149-3077-3150	VALOR INICIAL:	$ 363.917.508,00
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	VALOR REDUCCIÓN IVA	$ (616.865,00)
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 363.300.643,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5		
INTEGRANTES:	CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5		
CONTRATO No.	2596	VALOR INICIAL:	$ 283.776.853,00
FECHA DE INICIO:	28 DE AGOSTO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28 DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 363.300.643			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 252.862.513			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 110.438.130			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 283.776.853			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 271.952.817			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 11.824.036			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 363.300.643,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 252.862.513,00	69,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 252.862.513,00	69,60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 252.862.513,00	69,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 252.862.513,00	69,60%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.192.538,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.192.538,00	5,83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 271.952.817,00	95,83%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 271.952.817,00	95,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.553.650,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 16.553.650,00	5,83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 69,60%
Meta Física Ejecutada %: 69,60%
Avance o Atraso Físico %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario					Prog	$ 252.862.513,00			$ 252.862.513,00	
					Ejec	$ 252.862.513,00			$ 252.862.513,00	
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:NO APLICA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES
EL CONSORCIO SUPERVISION VIAL A 5 REALIZA CAPACITACIONES A LAS COOPERATIVAS EN LOS SIGUIENTES TEMAS:

1)VALORES Y PRINCIPIOS COORPORATIVOS
2)SEGURIDAD VIAL

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:NO APLICA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO
SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A LAS RUTAS 50RS01,25RSA,5003,29RSB,2507,2902.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BERMAS DE LA RUTA 2902 , CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA LIMPIEZA DE SEÑALES RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REALIZA ROCERIA RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA DE LA RUTA 29RSB
SE REALIZA PARCHEO EN RUTA 5003, CTA COMUNEROS
CONTINUA LIMPIEZA DE DESCOLES RUTA 50RS01, CTA CENTRO
SE REALIZA JORNADA TAPAHUECOS RUTA 2507 , CTA COMUNEROS
SE REALIZA INFORME SEMANAL
SE REALIZA INFORME LIMPIEZA DE DEFENSAS RUTA 50RS01 , CTA CENTRO
SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL A CARGO
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA DE LA RUTA 50RS01 PR 13+050, CTA CENTRO
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA RUTA 25RSA PR 1+0000
SE REALIZA ROCERIA PARTE BAJA DEL VIADUCTO RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA
SE PARTICIPO EN LA REUNION DE CONCEJOS TERRITORIALES DE SEGURIDAD VIAL EN LA GOBERNACION DE RISARALDA

SUPERVISIÓN :

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°3150-23
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°3149-23
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA COMUNEROS BAJO EL CONTRATO N°3077-23

INTERVENTORIA:

SE REALIZAN ACTAS DE COSTOS DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO.
SE SOLICITA PRORROGA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADOS.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



SIEMBRA DE PLANTAS ,CTA CENTRO



LIMPIEZA DE VÍA Y CUNETAS RUTA 5003, CTA COMUNEROS



JORNADA TAPAHUECOS RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES Y SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

INGENIERO RESIDENTE

FIRMA

NOMBRE: JOSÉ OLMIS GONZALEZ HIDALGO

Matrícula Profesional No.: 66202-80414

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 28/12/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — SEMANA No.: 18 del 22/12/2023 al 28/12/2023 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HÉCTOR IVÁN GUTIERREZ SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
INTEGRANTES: ALTAGRACIA- COMUNEROS-CENTRO
CONTRATO No. 3149-3077-3150 — VALOR INICIAL: $ 363.917.508,00
FECHA DE INICIO: 1/10/2023 — VALOR REDUCCIÓN IVA: $ (616.865,00)
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 363.300.643,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5
INTEGRANTES: CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5
CONTRATO No. 2596 — VALOR INICIAL: $ 283.776.853,00
FECHA DE INICIO: 28 DE AGOSTO DE 2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 28 DICIEMBRE DE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 363.300.643			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 274.055.050			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 89.245.593			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 283.776.853			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 277.628.355			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 6.148.498			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 363.300.643,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 274.055.050,00	75,43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 274.055.050,00	75,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 274.055.050,00	75,43%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 274.055.050,00	75,43%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.192.538,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.192.538,00	5,83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

CONSULTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 283.776.853,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 277.628.355,00	97,83%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.824.036,00	4,17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.675.537,00	2,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 75,43% — Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 75,43%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario					Prog	$ 274.055.050,00			$ 274.055.050,00	
					Ejec	$ 274.055.050,00			$ 274.055.050,00	
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:NO APLICA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: SE REALIZA SEGUIMIENTO AL USO DE LOS EPPS POR PARTE DE LA PROFESIONAL EN SEGURIRAR Y SALUD EN EL TRABAJO

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:NO APLICA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO
SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A LAS RUTAS 50RS01,25RSA, 29RSA,5003,29RSB,2507,2902.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BERMAS DE LA RUTA 2902 , CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA LIMPIEZA DE SEÑALES RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA RUTA 2507 PR 50+0000, CTA COMUNEROS
SE REALIZA ROCERIA RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA DE LA RUTA 29RSB
SE REALIZA PARCHEO EN RUTA 5003, CTA COMUNEROS
CONTINUA LIMPIEZA DE DESCOLES RUTA 50RS01, CTA CENTRO
SE REALIZA JORNADA TAPAHUECOS RUTA 2507 , CTA COMUNEROS
SE REALIZA INFORME SEMANAL
SE REALIZA LIMPIEZA DE DEFENSAS RUTA 50RS01 , CTA CENTRO
SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL A CARGO
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA DE LA RUTA 50RS01 PR 16+0000, CTA CENTRO
SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS CALLE 15 LA VIRGINIA
SE REALIZA ROCERIA EN SEPARADOR RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA
SE PARTICIPO EN EL COMITÉ INICIAL DEL CONTRATO VIAS DEL EJE QUE REALIZARÁ OBRAS EN LAS RUTAS 2507 Y 5003
SUPERVISIÓN :
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°3150-23
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°3149-23
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA COMUNEROS BAJO EL CONTRATO N°3077-23
CONSULTORIA:
SE REALIZA SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO 2695-2023

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LIMPIEZA DE OBRAS ,CTA CENTRO



RECORRIDO CONTRATO VIAS DEL EJE



JORNADA TAPAHUECOS RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES Y SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

INGENIERO RESIDENTE

FIRMA

NOMBRE: JOSÉ OLMIS GONZÁLEZ HIDALGO

Matrícula Profesional No.: 66202-80414

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/01/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — SEMANA No.: 19 del 29/12/2023 al 4/01/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HÉCTOR IVÁN GUTIERREZ SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO		
INTEGRANTES:	ALTAGRACIA- COMUNEROS-CENTRO		
CONTRATO No.	3149-3077-3150	VALOR INICIAL:	$ 363.917.508,00
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	VALOR REDUCCIÓN IVA	$ (616.865,00)
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 363.300.643,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE CONSULTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5		
INTEGRANTES:	CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5		
CONTRATO No.	2596	VALOR INICIAL:	$ 283.776.853,00
FECHA DE INICIO:	28 DE AGOSTO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ 75.673.827,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28 DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 359.450.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 363.300.643			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 295.247.588			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.053.055			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 283.776.853			
	RECURSOS ADICIÓN	$ 75.673.827			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 301.098.297			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.352.383			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 363.300.643,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 295.247.588,00	81,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 295.247.588,00	81,27%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 295.247.588,00	81,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 295.247.588,00	81,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.192.538,00	5,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.192.538,00	5,83%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

CONSULTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 301.098.297,00	83,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 301.098.297,00	83,77%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.898.948,00	4,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 12.898.948,00	4,55%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 81,27%
Meta Física Ejecutada %: 81,27%
Avance o Atraso Físico %:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario					Prog	$ 295.247.588,00			$ 295.247.588,00	
					Ejec	$ 295.247.588,00			$ 295.247.588,00	
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado.
(Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:NO APLICA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:NO APLICA

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:NO APLICA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:POLITICAS DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:NO APLICA

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO
SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A LAS RUTAS 50RS01,25RSA, 29RSA,5003,29RSB,2507,2902.
SE REALIZA ROCERÍA DE LA RUTA 29RSA, LADERAS DEL VIADUCTO , CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA ENTREGA DE FOLLETOS CAMPAÑA DE PREVENCIÓN USUARIOS EN EPOCA DECEMBRINA POR MEDIO DE LAS 3 COOPERATIVAS
SE REALIZA LA NIVELACIÓN DE HUECO UBICADO EN LA RUTA 2902 PR3+0508,CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA ROCERIA RUTA 2902 PR0+0450, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA EN RUTA 5003 PR 73+0900, CTA COMUNEROS
SE REALIZA JORNADA DE TAPA HUECOS EN LA RUTA 50RS01, CTA CENTRO
SE REALIZA LIMPIEZA DE OBRAS EN LA RUTA 5003 PR53+0700,CTA COMUNEROS
SE REALIZA INFORME SEMANAL
SE REALIZA LIMPIEZA DE BERMAS EN LA RUTA 25RSA PR 0+0200 , CTA CENTRO
SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS DE LA RED VIAL A CARGO

SUPERVISION :

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°3150-23
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°3149-23
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA COMUNEROS BAJO EL CONTRATO N°3077-23

CONSULTORIA:

SE ACTUALIZAN POLIZAS DEL CONTRATO CONFORME A LA ADICIÓN
SE REALIZA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN POLITICAS DEL ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CAPACITACIÓN POLITICAS DEL ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



ENTREGA DE FOLLETOS TEMPORADA DECEMBRINA



ROCERIA Y LIMPIEZA RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES Y SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

INGENIERO RESIDENTE

FIRMA

NOMBRE: JOSÉ OLMIS GONZÁLEZ HIDALGO

Matrícula Profesional No.: 66202-80414

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora. Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.4. REGISTRO DE ASISITENCIA COMITES VIALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	4/12/2023 (D a / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS ACTA N° 9:
Se da lectura al acta N° 9 verificando los compromisos y sus responsables, encontrandose que todos ellos se cumplieron asi
Se consultó el estado real del consorcio megavias choco, se manifestó que el contrato del consorcio finaliza el dia 8 de diciembre
Realizar pintura de muro 50RS01. Cumplido por la AMV G1
Entregar actas de las cooperativas mes de noviembre. Se está cumpliendo por parte de las AMV
*Reporte novedades via whatsapp en formato indicado se esta cumpliendo por parte de las AMV.
Registrar los cierres viales totales en el aplicativo de emergencias, si hay derrumbe o inundación, excepto orden publico. Se cumple con la instrucción
Solicitar la extension del contrato de monto agotable. Pendiente DT RIS
Dialogo con consorcio Megavias Choco para el tema de deposito de materiales. Pendiente DT RIS
Definir el alcance que deben tener los especialistas estructural e hidraulico para ser contratados por las AMV y definir que tipo de inspeccion se debe realizar. Pendiente DT RIS
Enviar las fichas que se tienen de cada puente a las AMV. Pendiente DT RIS
Definir tema de los plegables. DT RIS aprobó el diseño del plegable de la AMV G1; Pendiente diseño de la AMV G2
2. DIRECTRICES POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-TERRITORIAL RISARALDA.
Intervencion de la Directora Ing. Maria Celeny Ocampo Arias:
Intervencion del Supervisor Ing. Carlos Eduardo Zuluaga Muñoz
*Para el tema de los gaviones en el PR 45+XXXX de la ruta 2507 se debe enviar el presupuesto...
*Para el tema de puentes existe un memorando en el que se expresa que Bogotá es quien decide como se hará la inspección de puentes con los especialistas, por ahora no se ha definido nada
Realiza lectura del memorando 2023I-VBOG-028811 en el que se manifiesta que no se debe dejar vencer los contratos de las AMV y se deben redistribuir los recursos para extender los contratos minimo al 31 de diciembre
*Recomienda extender el tiempo del contrato de monto agotable para atender los dias de fin e inicio de año y garantizar equipo disponible.
*Elaborar las actas en 0 del contratista de monto agotable de los meses de septiembre y octubre, y el acta de noviembre para enviar al supervisor
*El consorcio Megavias finaliza el 8 de diciembre, pero deben realizar unas garantias, posiblemente las zonas de deposito de material que están adecuadas estén disponibles, sin embargo hay que esperar confirmación.
*La proxima semana se programará una reunion con el contratista del monto agotable
*Prioridad de la AMV G1 enviar las actas de noviembre de las cooperativas y de la AMV; enviar la solicitud de prorroga hasta el 31 de dicembre junto con los formatos presentes en el manual de interventoria
*Consulta con la Ing Maria Celeni si aprueba el diseño del plegable de la AMV G1, posteriormente notifica que si es aprobado
*En el sector que maneja la AMV G1 todos los puentes tienen diagnostico, pero la dificultad es saber cual es la metodologia que dicta bogotá para hacer inspección.
*Hablar con el monto agotable para pactar precios de excavación, le solicita a la AMV G2 pactar un precio no previsto.
*Prioridad de la AMV G2 enviar las actas de las cooperativas y de la AMV y las del monto agotable y del precio no previsto.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **4/12/2023**
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. **10**
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: **SGI** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **RISARALDA**

CONTRATOS DE CONSULTORIA No. **2614/2023 Y 2695/2023**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ROADS CAP - J&S Y CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N.A

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
SEGUIMIENTO A LABORES A CARGO DE LOS ADMINISTRADORES VIALES GRUPO 1 Y GRUPO 2 DE LA TERRITORIAL RISARALDA.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
1.SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS ACTA Nº 9.
2. DIRECTRICES POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-TERRITORIAL RISARALDA.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 4/12/2023 (Día / Mes / Año)

Intervencion del Supervisor Ing. Hector Ivan Gutierrez Salazar
*Sugiere que en el plegable contenga las señales y unos mensajes de navidad y pide que le envien el plegable de la AMV G1
Intervencion AMV Grupo 2:
*El contratista de monto agotable inició actividades el 24 de noviembre de 2023, en las actas en cero (0) no pueden ir las firmas de ninguno de los ingenieros
*Hablaron con .... para que las actas de las cooperativas se enviaran se enviaran el lunes 4 de diciembre para agilizar el proceso, esperan por parte de las cooperativas el soporte de pago de la planilla y del seguro.
*Se realizó un oficio solicitado por el ingeniero (....) en el que se solicita una relación e la maquinaria disponible para derrumbes en las rutas 2507 y (....). (El Ing zuluaga pide copia de este oficio)
*Pide al ingeniero zuluaga que se defina el alcance de los especialistas que vayan a ser contratados.
Intervencion AMV Grupo 1:
*Se consulta al supervisor a quien llamar en caso de que se presenten derrumbes en la via, este responde que se debe llamar al monto agotable
*Se entrega cotizacion de propuesta tecnica para inspeccion del estado estructural de los puentes vehiculares en el tramo Mumbú - Apia. Se aclara que la propuesta está solamente para 10 puentes dado a que no hay tiempo para hacer los 22 puentes que solicita la territorial.
*Pide aclaración al supervisor sobre el tema de la pintura para los logos de los muros y el supervisor manifiesta que ha sido aprobado
*Recuerda al supervisor que las actas de noviembre fueron enviadas la semana pasada, el supervisor manifiesta que revisó las actas de las cooperativas y dice que está de acuerdo, queda pendiente el acta de la AMV

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Consultar a la ingeniera Claudia Acero cual es la propuesta para la inspección de puentes.	11 de diciembre de 2023	DT-RIS
Elaborar el acta en cero de los meses de septiembre, octubre y noviembre del contratista de monto agotable; y las actas de las cooperativas	5 de diciembre de 2023	AMV G2
Confirmar con el consorcio Megavias Choco la zona de deposito de material	11 de diciembre de 2023	DT RIS
Revision del acta de la AMV y de las cooperativas	11 de diciembre de 2023	DT-RIS
Dialogar con el contratista de monto agotable para pactar los precios de la excavación	11 de diciembre de 2023	AMV G2
Enviar solicitud de prorroga del contrato AMV G1 y los formatos correspondientes	11 de diciembre de 2023	AMV G1
Consultar con INVIAS Bogotá que especialistas se requieren.	11 de diciembre de 2023	DT-RIS
Hablar con Alvaro lo de la sede y monto agotable puntos criticos	11 de diciembre de 2023	DT-RIS

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **4/12/2023** (Dia / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 11/12/2023 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing. Hector Ivan Gutierrez Salazar	Supervisor AMV grupo 2	Invias - Territorial Rda	
Ing. Carlos Eduardo Zuluaga Muñoz	Supervisor AMV grupo 1	Invias - Territorial Rda	
Ing. Jose Olmis Gonzales	Residente	AMV grupo 2	
Ing. Kelly J. Ramirez C.	Auxiliar	AMV grupo 2	
Ing. Santiago Rodriguez Zafra	Auxiliar 2	AMV grupo 1	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2023 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SGI

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATOS DE CONSULTORIA No. 2614/2023 Y 2695/2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ROADS CAP - J&S Y CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7.
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N.A

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LABORES A CARGO DE LOS ADMINISTRADORES VIALES GRUPO 1 Y GRUPO 2 DE LA TERRITORIAL RISARALDA.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS ACTA Nº 9.
2. DIRECTRICES POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-TERRITORIAL RISARALDA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS ACTA Nº 10:

Se da lectura al acta Nº 10 verificando los compromisos y sus responsables, encontrandose que todos ellos se cumplieron así:

Enviar las fichas que se tienen de cada puente a las AMV. Pendiente DT RIS

Entregar actas de las cooperativas mes de noviembre y diciembre Se está cumpliendo por parte de las AMV

*Reporte novedades via whatsapp en formato indicado: se esta cumpliendo por parte de las AMV.

Registrar los cierres viales totales en el aplicativo de emergencias, si hay derrumbe o inundación, excepto orden publico. Se cumple con la instrucción

Solicitar la extension del contrato de monto agotable. Pendiente DT RIS

Dialogo con consorcio Megavias Choco para el tema de deposito de materiales. Pendiente DT RIS

Definir el alcance que deben tener los especialistas estructural e hidraulico para ser contratados por las AMV y definir que tipo de inspeccion se debe realizar. Pendiente DT RIS

Enviar las fichas que se tienen de cada puente a las AMV. Pendiente DT RIS

Definir tema de los plegables de la AMV G2, ajustar diseño

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	11/12/2023 (Día / Mes / Año)

2. DIRECTRICES POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-TERRITORIAL RISARALDA.
Intervencion de la Directora Ing. Maria Celeny Ocampo Arias: NA
Intervencion del Supervisor Ing. Carlos Eduardo Zuluaga Muñoz
Manifiesta que para definir la inspección de los puentes,ha intentado comunicar a la ingeniera Claudia Acero y no ha obtenido respuesta al respecto
solicita a la AMV2 realizar trámites correspondientes y prorrogar contrato de monto agotable hasta el 31 de enero
*Elaborar las actas en 0 del contratista de monto agotable de los meses de septiembre y octubre, y el acta de noviembre para enviar al supervisor
*El consorcio Megavias finaliza el 8 de diciembre, pero deben realizar unas garantias, posiblemente las zonas de deposito de material que están adecuadas estén disponibles, sin embargo hay que esperar confirmación.
*La proxima semana se programará una reunion con el contratista del monto agotable
*Prioridad de la AMV G1 enviar las actas de noviembre de las cooperativas y de la AMV; enviar la solicitud de prorroga hasta el 31 de dicembre junto
*En el sector que maneja la AMV G1 todos los puentes tienen diagnostico, pero la dificultad es saber cual es la metodologia que dicta bogotá para
*Hablar con el monto agotable para pactar precios de excavación, le solicita a la AMV G2 pactar un precio no previsto.
para atender los sucesos que ocurran en enero en caso que monto agotable no prorrogue la territorial de Risaralda cuenta unicamente con contrato de mantenimiento rutinario toca esperar directrices directamente de BOGOTÁ
Intervencion del Supervisor Ing. Hector Ivan Gutierrez Salazar
*informa que a la fecha el CDP no han llegador CDP para prorrogar contrato de AMV 2
Intervencion AMV Grupo 2:
informa que se entregaron las actas en 0 que habían solicitado de los mes de septiembre a noviembre del contrato 3071-2023
informa que para pasar acta de diciembre se requiere pactar precio.
informa que ya se estan adelantando los documentos del acta correspondiente al mes de diciembre
Intervencion AMV Grupo 1:
informa que el dia de hoy se da inicio a la pintura de los logos
infroma que ya realizó la solicitud de prorroga del contrato AMV G1 y los formatos correspondientes
consulta acerca de la sede de los puntos críticos,atención de monto agotable

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2023 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Consultar a la ingeniera Claudia Acero cual es la propuesta para la inspección de puentes.	18 de diciembre de 2023	DT-RIS
Elaborar el acta en cero de los meses de septiembre, octubre y noviembre del contratista de monto agotable; y las actas de las cooperativas	12 de diciembre de 2023	AMV G2
Confirmar con Raúl Ardila permiso de la zona de deposito de material	12 de diciembre de 2023	DT RIS
Revision del acta de la AMV y de las cooperativas	12 de diciembre de 2023	DT-RIS
Dialogar con el contratista de monto agotable para pactar los	11 de diciembre de 2023	AMV G2
Enviar solicitud de prorroga del contrato AMV G1 y los formatos correspondientes	11 de diciembre de 2023	AMV G1
Consultar con INVIAS Bogotá que especialistas se requieren.	11 de diciembre de 2023	DT-RIS
Hablar con Alvaro lo de la sede y monto agotable puntos criticos	11 de diciembre de 2023	DT-RIS

FECHA PROXIMA REUNION 18/12/2023 (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing Hector Ivan Gutierrez Salazar	Supervisor AMV grupo 1 y 2	Invias - Territorial Rda	
Ing Carlos Eduardo Zuluaga Muñoz	Ingeniero	Invias - Territorial Rda	
Ing Jose Olmis Gonzales	Residente	AMV grupo 2	
Ing Kelly J. Ramirez C.	Auxiliar	AMV grupo 2	
Ing Pedro Maya	Residente	AMV grupo 1	
Ing Mercedes	Auxiliar	AMV grupo 1	

Original Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2023 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 13
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SGI

DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA

CONTRATOS DE CONSULTORIA No. 2614/2023 Y 2695/2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ROADS CAP - J&S Y CONSORCIO SUPERVISIÓN VIAL A5

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 1 LOTE 7
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA GRUPO AMV 2 LOTE 10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N.A

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LABORES A CARGO DE LOS ADMINISTRADORES VIALES GRUPO 1 Y GRUPO 2 DE LA TERRITORIAL RISARALDA.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS ACTA Nº 12.
2. DIRECTRICES POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-TERRITORIAL RISARALDA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PACTADOS ACTA Nº 1:

Se da lectura al acta **Nº 11** verificando los compromisos y sus responsables, encontrandose lo siguiente:
Hablar en planeacion en Viterbo... Zonas de nivelación... Pendiente AMV 2, apoyo interventoria Vias del eje.
Consultar con la subdireccion la metodologia para la inspeccion de puentes. Pendiente de respuesta Planta Central
Hablar con la directora general para asignacion de recursos. Pendiente DT RIS
Presentar los documentos de adicion de los contratos Cumplido AMV1 y AMV 2

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	26/12/2023
	(Día / Mes / Año)

2. DIRECTRICES POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-TERRITORIAL RISARALDA.
Intervencion de la Directora Ing. Maria Celeny Ocampo Arias:
ingeniera informa que en Bogotá están organizando y relacionando las reservas presupuestales para el año 2024
Consulta el estado de pago de las cooperativas hasta el momento
menciona que debe pedir a la directora general 250000 millones de pesos para atender las necesidades
ingeniera Maria Celeny habla con ingeniero Yesid, el cual informa que el contrato 1757 solo tiene prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 y solicita reunión para tener información del proyecto, el ingeniero informa que todo está en el informe de interventoria.
Intervencion del Supervisor Ing. Carlos Eduardo Zuluaga Muñoz
la zona de deposito debe revisarse con la interventoria del contrato vias del eje
El consorcio mega vias continua removiendo derrumbes en la via hasta el 31 de diciembre. Mientras estos continuen no se puede utilizar el contrato de monto agotable.
el ingeniero consulto en Bogotá e informa que en Bogotá faltan revisarse la mayoria de puentes de ruta del Samán, faltan todas las inspecciones de puentes tipo 2
el rubro de especialistas no se ha tocado , sin embargo, se esperan instrucciones porque se tiene el puente Tatamá que es de un solo carril y no cumple la norma del 2014, por que no tienen conectores de cortante.
informa que se debe consultar en Bogota en la sudirección para saber que presupuestos hay y que procesos licitatorios existen en el momento para realizar seguimiento y solicitar recursos.
hasta el viernes deben realizarse las prorrogas de las coopertivas hasta el 31 de enero.
se van a pagar ya las actas de las AMV 1 y 2, con recursos de la sustitución
ingeniero Zuluaga informa que el grupo AMV1 realizó entrega de folletos , en compañía del ejercito, la policía, bomberos.
Atencion de emergencias queda cubierto con monto agotable y contrato de vias del eje.
ingeniero Zuluaga informa que reviso la hoja de vida del residente que reemplaza al ingeniero Pedro en vacaciones
Hacer un cuadro de los sitios críticos
Estar pendientes del plan retorno, estar atentos por si hay señalización.
Intervencion del Supervisor Ing. Hector Ivan Gutierrez Salazar
informa que hay que entregar informe trimestral con corte a noviembre
consulta por los folletos y solicita que se entreguen inmediatamete.
Intervencion AMV Grupo 2:
El contratista debe hacer una obra de canalizacion para evitar socavacion en los estribos del puente.
Se informa que en el sector de mataburro del 3+000, hay un asentamiento peligroso para los transeúntes, falta emulsión para realizar tapa huecos.
Informa que en el transcurso del día se realizará la impresión de los folletos y se iniciará la entrega por medio de las cooperativas.
Intervencion AMV Grupo 1:
el ingeniero Maya informa que el consrocio Megavias continua con maquinaria en el corredor vial hasta el 31 de diciembre, posiblemente lo
ingeniero Pedro consulta acerca del manejo del presupuesto de los materiales
se va a realizar la última capacitación del año el 27/12/2023

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 26/12/2023 (Dia / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES
Comprar emulsión para atender Simón Bolivar	inmediatamente	AMV G2
Consultar con la subdireccion la metodologia para la inspeccion de puentes	26 de diciembre de 2023	DT RIS
Hablar con la directora general para asignacion de recursos	26 de diciembre de 2023	DT RIS
Hacer entrega de los folletos y estar pendientes en fecha de retorno	26 de diciembre de 2023	AMV G1 Y G2
consultar procesos que se están adelantando desde Bogotá,para vias del Choco llamar a Guillermo Villate	inmediatamente	DT RIS

FECHA PROXIMA REUNION 03/01/2024 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing Maria Celeny Ocampo	Directora Territorial Risaralda	Invias - Territorial Rda	
Ing Hector Ivan Gutierrez Salazar	Supervisor AMV grupo 2	Invias - Territorial Rda	
Ing Carlos Eduardo Zuluaga Muñoz	Supervisor AMV grupo 1	Invias - Territorial Rda	
Ing Jose Olmis Gonzales	Residente	AMV grupo 2	
Ing Kelly J. Ramirez C.	Auxiliar	AMV grupo 2	
Ing Pedro Maya	Residente	AMV grupo 1	
Ing Santiago	Auxiliar	AMV grupo 1	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner
