INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.6703620 DE 2024

CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO – META, LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO

CONSORCIO INTERCONSULTORES
NIT: 901.450.714-1
R.L. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO





PERIODO DEL INFORME
04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2025

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Objeto de Interventoría:	CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO – META, LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDADCON EL OBJETO DE "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO".	
Título de Documento:	Informe Mensual de Interventoría No. 7	
Documento No:	INFAO-001	
APROBACIÓN		
	Nombre :	**Ing. Ma. LUCRECIA LÓPEZ AROCA**
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	15-04-2025
	Nombre :	**Ing. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO**
Vo Bo R.L. de interventoría:	Firma:	
		15-04-2025

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. SEGUIMIENTO A ACTUALIZADCIONES CONTRACTUALES Y GARANTIAS
2.1. ACTUALIZACIONES CONTRACTUALES
2.1.1. INFORMACIÓN BÀSICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
2.1.2. INFORMACIÓN BÀSICA DEL CONTRATO DE OBRA
2.2. CONTRATO AEJECUTAR
2.3. LOCALIZACIÓN
2.4. GARANTIAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA
2.4.1. CONTROL DE PÓLIZAS DE OBRA
2.4.2. CONTROL DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

3. INFORME TÉCNICO
3.1. CRONOGRAMA
3.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
3.2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO INFRAESTUCTURA A&V
3.2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA
3.2.3. PRINCIPALES FUNCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA
3.2.4. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORÍA
3.3. AVANCE FÍSICO
3.4. ENSAYOS DE LABORATORIO

4. SEGUIMIENTO DE VINCULACIÓN DE PERSONAL DE OBRA
4.1. REGISTRO DE PERSONAL Y PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
4.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
4.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONSORCIO INTERCONSULTORES

5. INFORME FINANCIERO
5.1. AVANCE FINACIERO EN EL PERIODO
5.2. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL
5.3. INVERSIÓN ANTICIPO
5.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
6.1. OBLIGACIONES GENERALES

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONSORCIO INTERCONSULTORES
7.1. OBLIGACIONES GENERALES
7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

8. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

9. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

10. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

11. COMPONENTE AMNIENTAL Y SOCIAL
11.1. COMPONENTE AMBIENTAL
11.2. COMPONENTE SOCIAL

12. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORECCTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO.

13. ESTADO DEL TIEMPO

14. OBSERVACIONES

15. ANEXOS

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al informe mensual de interventoría No. 07 del periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril de 2025; de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1. PCCNTR. 6703620 de 2024 y sus anexos, se da cumplimiento al objeto contractual verificando que la obra objeto del contrato que se interviene, se ejecute de acuerdo con los documentos y especificaciones en forma integral, con los enfoques, organigramas, recursos humanos y dentro del plazo contractual.

A través de este informe cuyo objeto contractual es "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO.", en lo referente a los aspectos administrativos, financieros y jurídicos de las actividades desarrolladas durante todas las fases de ejecución del contrato que se interviene; así mismo se describe la información detallada que evidencia el desarrollo del contrato con el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V, se presentarán todos los por menores correspondientes a la ejecución del contrato.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

2. SEGUIMIENTO A ACTUALIZACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS.

2.1. ACTUALIZACIONES CONTRACTUALES

2.1.1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6703620 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MERITOS
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	CM02 DE 2024
OBJETO	CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO – META, LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDADCON EL OBJETO DE "REALIZAR LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO".
LOCALIZACIÓN	CARRERA 29 N° 33 B – 27 TORRE B Y TORRE A PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO – META PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO – META
PLAZO INICIAL	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	60 DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 2	45 DIAS CALENDARIO
PLAZO ACTUALIZADO	7,5 MESES
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS COP ($303.248.028,00) INCLUIDOS IMPUESTOS.
ADICIÓN No. 1	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CATORCE PESOS ($151.624.014) COP

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

VALLOR ACTUALIZADO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS ($454.872.042,00)
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	QUINCE (15) DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
COORDINADOR DE PROYECTO	MARIA LUCRECIA LOPEZ AROCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2024

2.1.2. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 6687049 DEL 04 DE SEPTIEMBRE 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	LP004 DE 2024
OBJETO	Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial Villavicencio Meta, las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio.
LOCALIZACIÓN	CARRERA 29 N° 33 B – 27 TORRE A PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO – META PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO – META
PLAZO INICIAL	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	60 DIAS CALENDARIO
PRORROGA No. 2	45 DIAS CALENDARIO
PLAZO ACTUALIZADO	7,5 MESES
VALOR INICIAL	DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS COP ($2.945.313.493,00).

ADICIÓN No. 1	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($298.497.863,49).
VALOR ACTUALIZADO	TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE PESOS
FECHA DE INICIO	CUATRO (04) DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	QUINCE (15) DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V


2.2. CONTRATO A EJECUTAR

De acuerdo con las prioridades de CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, el contrato de obra se encuentra estipulado para realizar el mantenimiento del piso 5, baños, cubiertas y fachada del Palacio de Justicia de Villavicencio – Meta, inscritas en el proyecto denominado ""CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO.” con un valor asignado de $3.243.811.356,49

2.3. LOCALIZACIÓN

El siguiente fragmento de mapa tomado de Google Maps expone la localización geográfica del Palacio de Justicia de Villavicencio – Meta.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

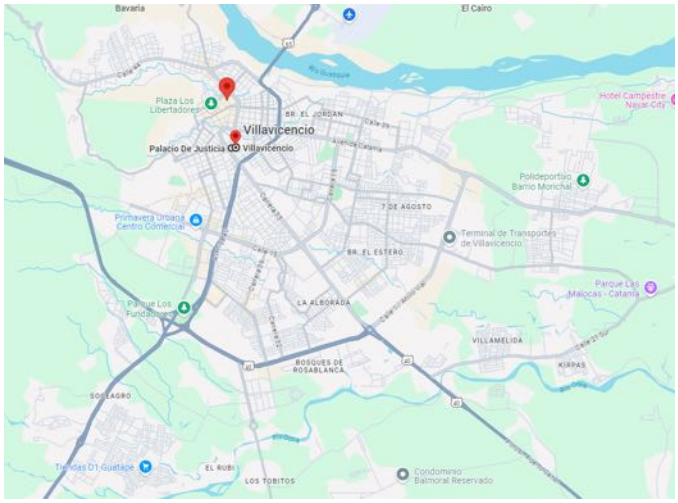

Localización geográfica Villavicencio - Meta



Ubicación Geográfica Palacio de Justicia

2.4. GARANTIAS DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

2.4.1. CONTROL DE POLIZAS DE OBRA

Pólizas según firma del contrato **N° CO1.PCCNTR. 6687049 2024**, junto con el valor asegurado.

Pólizas Iniciales con firma del Contrato

Póliza de Cumplimiento:	**33-44-101253132**		
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
Anexo	**0**		
Fecha de Expedición:	**30/08/2024**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento	28/08/2024	31/10/2025	$441.797.023,95
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	28/08/2024	31/12/2027	$441.797.023,95
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	5 años, 0 meses y 0 días*		$736.328.373,25
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años, 0 meses y 0 días*		$736.328.373,25

***Nota: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.**

Póliza RCE:	**33-40-101081191**		
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
Anexo	**0**		
Fecha de Expedición:	**30/08/2024**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Predios labores y operaciones	28/08/2024	31/12/2027	$390.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	28/08/2024	31/12/2027	$390.000.000,00
Vehículos Propios y No propios	28/08/2024	31/12/2027	$390.000.000,00

Pólizas actualizadas según Acta de Inicio

Póliza de Cumplimiento:	**33-44-101253132**	
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**	
Anexo	**2**	
Fecha de Expedición:	**17/09/2024**	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

	Fecha Inicial	Fecha Final	ASEGURADO
Cumplimiento	04/09/2024	07/11/2025	$441.797.023,95
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	04/09/2024	07/01/2028	$441.797.023,95
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	5 años, 0 meses y 0 días*		$736.328.373,25
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años, 0 meses y 0 días*		$736.328.373,25

***Nota: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.**

Póliza RCE:	**33-40-101081191**		
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
Anexo	**2**		
Fecha de Expedición:	**17/09/2024**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Predios labores y operaciones	04/09/2024	07/01/2025	$390.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	04/09/2024	07/01/2025	$390.000.000,00
Vehículos Propios y No propios	04/09/2024	07/01/2025	$390.000.000,00

Pólizas actualizadas según Adición No. 1 y Prorroga No. 1

Póliza de Cumplimiento:	**33-44-101253132**		
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
Anexo	**4**		
Fecha de Expedición:	**24/12/2024**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento	04/09/2024	01/01/2026	$486.571.703,47
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	04/09/2024	01/03/2028	$486.571.703,47
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	5 años, 0 meses y 0 días*		$810.952.839,12
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años, 0 meses y 0 días*		$810.952.839,12

*Nota: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

Póliza RCE:	**33-40-101081191**	
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**	
Anexo	**3**	
Fecha de Expedición:	**24/12/2024**	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR**

	Fecha Inicial	Fecha Final	ASEGURADO
Predios labores y operaciones	04/09/2024	01/03/2025	$390.000.000,00
Contratistas y Subcontratistas	04/09/2024	01/03/2025	$390.000.000,00
Vehículos Propios y No propios	04/09/2024	01/03/2025	$390.000.000,00

Pólizas actualizadas según Prorroga No. 2

Póliza de Cumplimiento:	**33-44-101253132**		
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
Anexo	**5**		
Fecha de Expedición:	**03/03/2025**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento	04/09/2024	15/02/2026	$486.571.703,47
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	04/09/2024	14/04/2028	$486.571.703,47
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes	5 años, 0 meses y 0 días*		$810.952.839,12
Estabilidad y calidad de la Obra	5 años, 0 meses y 0 días*		$810.952.839,12

*Nota: Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.

2.4.2. CONTROL DE POLIZAS DE INTERVENTORIA.

Pólizas según firma del contrato N° CO1.PCCNTR. 6703620 DE 2024, junto con el valor asegurado, quedando de la siguiente forma:

POLIZAS INICIALES

Póliza de Cumplimiento:	**33-44-101253179**		
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
Fecha de Expedición:	**02/09/2024**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento	02/09/2024	30/06/2025	$60.649.605,60
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	02/09/2024	31/12/2029	$30.324.802,80
Calidad de servicio	31/12/2024	31/12/2027	$60.649.605,60

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

POLIZAS ACTUALIZADAS ADICIÓN No. 1 y PRORROGA No. 1

Póliza de Cumplimiento:	**33-44-101253179**		
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
Fecha de Expedición:	**27/12/2024**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento	02/09/2024	01/09/2025	$90.974.408,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	02/09/2024	01/03/2028	$45.487.204,20
Calidad de servicio	31/12/2024	31/12/2029	$90.974.408,40

POLIZAS ACTUALIZADAS PRORROGA No. 2

Póliza de Cumplimiento:	**33-44-101253179**		
Expedida por:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
Fecha de Expedición:	**05/03/2025**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento	02/09/2024	15/10/2025	$90.974.408,40
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización	02/09/2024	15/04/2028	$45.487.204,20
Calidad de servicio	31/12/2024	31/12/2029	$90.974.408,40

3. INFORME TECNICO

3.1. CRONOGRAMA

A la fecha del presente informe, teniendo en cuenta el acta de inicio del 04 de septiembre de 2024, con un plazo actualizado de ejecución de siete (7) meses y 15 días; han transcurrido doscientos doce (212) días de ejecución correspondiente al 95,07% de avance tiempo total para el contrato de obra.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7

AVANCE EN TIEMPO:

OBJETO	PLAZO ACTUAL	ACTA DE INICIO	PLAZO TRANSCURRIDO	% DE TIEMPO TRANSCURRIDO
CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO".	Hasta el 31 de diciembre de 2024	SEPTIEMBRE 4 DE 2024	212 días	95,07%

3.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

3.2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

SEMANA 27. DEL DÍA 03 DE MARZO AL 09 DE MARZO DE 2025

- Se adelanta actividad de instalación de tubería de suministro de agua potable batería de baños torre A
- Se adelanta actividad de instalación de tubería sanitaria y red de ventilación batería de baños torre A
- Se adelanta actividad de adecuación de caja de paso de aguas servidas en piso 1
- Se solicita visita de ingeniero estructural de contratista para emitir concepto sobre reparación de hallazgos en viguetas
- No se ha iniciado instalación de aires acondicionados y tampoco cableado correspondiente
- Se realiza retiro de escombros (pendiente entrega de certificacion)
- Se realiza prueba de manejo de presión e agua en tuberías instaladas

SEMANA 24. DEL DÍA 10 DE MARZO AL 16 DE MARZO DE 2025

- Se continua actividad de instalación de tubería de suministro de agua potable batería de baños torre A
- Se continua actividad de instalación de tubería sanitaria y red de ventilación batería de baños torre A pisos 5-4-3-2-1

- Se adelanta actividad de adecuación para instalación de registros de paso en cada piso
- Se adelanta actividad de instalación de tubería de cobre para suministro gas aires acondicionados oficinas 509-515
- Se realiza hallazgo de daos en aires acondicionados centrales y se llevan a reparación partes afectadas
- Se adelanta labor de instalación de soportes para ductería aires acondicionados
- Se adelanta actividad de instalación de marcos en aluminio para puertas en oficinas 509-515 torre B
- Se adelanta actividad de e instalación de cerraduras, puertas en aluminio de acceso a oficinas 509-515
- Se adelanta actividad de reparación y de instalación de vidrios faltantes en oficinas 509-515 torre B
- Se adelantan actividades de aseo en oficinas 509-515
- Se informa disminución de personal de obra civil en la entidad

SEMANA 29. DEL DÍA 17 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2025

- Se continua actividad de instalación de tubería de cobre para suministro gas aires acondicionados oficinas 514-513 torre B
- Se continua actividad de instalación de rubatex para protección de tubería de cobre oficinas 514-513 torre B
- Se adelanta actividad de adecuación de ductos en piralum para aire acoindicio9nado central oficinas 514-513 torre B
- Se adelanta actividad de terminación de instalación de cielo raso PVC oficinas 514-513 torre B
- Se adelanta labor de instalación de soportes para ductería aires acondicionados
- Se continua actividad de instalación de marcos en aluminio para puertas en oficinas 509-515 torre B
- Se continua con actividades de pintura en oficinas 514-513
- Se continua actividad de conexión de puntos de datos en rack principal para oficinas 509-515 – se entregan patch cord al área de sistemas de la entidad
- Se solicita mejoramiento de aseo en obra
- Se solicita reunión presencial para los directores de obra e interventoría día 20 de marzo de 2025
- Se continua activida de paeñete de muros en bateria de baños torre A
- Se adelanta actividad de perfilado de cajas de red contra incendio en batería de baños torre A

- Se continua actividad de instalación de tubería de suministro batería de baños torre A
- Se adelanta actividad de armado de mochetas para instalación de lavamanos batería de baños torre A

SEMANA 30. DEL DÍA 24 DE MARZO AL 30 DE MARZO DE 2025

- Se realizaron entregas parciales de oficinas 514-513 torre B – entrega de llave a funcionarios
- Se continua actividad de adecuación de aires acondicionados centrales oficinas 514-513 torre B
- Se adelanta actividad de adecuación de ductos en piralum para aire acoindicio9nado central oficinas 514-513 torre B
- Se continua actividad de instalación de rejillas de flujo de aire acondicionado central oficina 514-513 torre B
- Se tiene pendiente actividad de instalación de cielo raso PVC en corredores anexos oficinas 509-515 torre B
- Se adelanta actividad de desmonte en oficinas 501-502 torre B
- Se adelanta actividad de demolición de enchapes de baños y pisos en oficinas 501-502 torre B
- Se adelanta actividad de armado de mochetas para instalación de lavamanos batería de baños torre A
- Se continua actividad de instalación de enchapes de muro y piso en batería de baños torre A
- Se adelanta actividad de instalación de perfilería para cielo raso PVC batería de baños torre A
- Se encuentra almacenado en sitio sanitarios y lavamanos batería de baños torre A

SEMANA 31. DEL DÍA 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2025

- Se realizaron entregas parciales de oficinas 511-510 torre B – entrega de llave a funcionarios
- Se continua actividad de pruebas de funcionamiento de aires acondicionados mini split oficinas 512-510-509
- Se realizan observaciones de acabados en cielo raso PVC, aseo de pisos y aseo de muros
- Se continua actividad de instalación de rejillas de flujo de aire acondicionado central oficina 514-513 torre B
- Se tiene pendiente actividad de instalación de cielo raso PVC en corredores anexos oficinas 509-515 torre B

- Se adelanta actividad de desmonte en oficinas 503-504-505-506 torre B
- Se adelanta actividad de demolición de enchapes de baños y pisos en oficinas 503-504-505-506 torre B
- Se adelanta actividad desmonte de cableado eléctrico, de canaletas, puntos eléctricos de oficinas 501-506 torre B
- Se continua actividad de instalación de enchapes de muro y piso en batería de baños torre A
- Se adelanta actividad de instalación de perfilería para cielo raso PVC batería de baños torre A
- Se encuentra almacenado en sitio sanitarios y lavamanos batería de baños torre A
- Está pendiente de terminación muro externo baño familiar piso 1 torre A
- Se adelanta actividad de instalación de lámparas led para batería de baños torre A
- Se realiza retiro de escombros de obra (pendiente entrega de certificación)

3.2.2. PRINCIPALES FUNCIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

La Interventoría desempeña una posición imparcial, por lo que en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones ha actuado en concordancia con sus objetivos principales, los cuales se aplican de la siguiente manera:

Supervisión del Proyecto: Supervisar todas las actividades del proyecto para garantizar que se desarrollen según lo planificado y que se cumplan los plazos establecidos.

Función de Control: La más importante, lograda mediante inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, asegurando que la ejecución se ajuste a lo pactado, especialmente respecto a:

- Especificaciones técnicas del objeto contratado.
- Actividades administrativas del contratista.
- Aspectos legales.
- Actividades financieras y presupuestales.
- Todas las estipulaciones contractuales.
- Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad.
- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado.
- Cumplimiento de plazos, términos y condiciones contractuales, garantizando una inversión eficiente y oportuna.

- Control de Calidad: Verificar que los materiales utilizados y los procesos de construcción cumplan con los estándares de calidad establecidos en los documentos del proyecto.
- Control de Costos: Realizar un seguimiento detallado de los costos del proyecto para asegurar que se mantengan dentro del presupuesto aprobado.
- Gestión de Cambios: Evaluar y gestionar cualquier modificación en el alcance, requisitos o condiciones del proyecto, minimizando su impacto en costo, cronograma y calidad.
- Gestión de Riesgos: Identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados para reducir su impacto en los objetivos del proyecto.
- Coordinación entre Partes: Actuar como intermediario entre el contratista, el cliente y otras partes interesadas, promoviendo una comunicación efectiva y resolviendo conflictos durante la ejecución.
- Informe de Avance: Elaborar informes periódicos que reflejen el progreso del proyecto, destacando logros, problemas detectados y acciones correctivas.
- Función de Absolver: Resolver dudas surgidas en el desarrollo del contrato, garantizando una comunicación efectiva entre las partes, en virtud del principio de inmediación.
- Función de Colaborar: Formar un grupo de trabajo con profesionales idóneos, en conjunto con el contratista, para resolver dificultades técnicas, jurídicas, administrativas y financieras, siempre respetando la autonomía e independencia de cada parte.
- Función de Exigir: Cuando se detecta incumplimiento de las cláusulas contractuales, solicitar al contratista el cumplimiento estricto de los términos y garantías establecidas.
- Función de Solicitar: Pedir oportunamente al contratista que subsane fallas en la ejecución del contrato.
- Función de Prevenir: Enfocarse en corregir conceptos erróneos y evitar desviaciones en el objeto del contrato, más allá de sancionar incumplimientos.
- Función de Verificar: Confirmar el cumplimiento de la normativa vigente por parte del contratista, mediante la aplicación de correctivos, exigencias y resolución de problemas, asegurando el cumplimiento de lo pactado.

3.2.3. SEGUIMIENTO DE LA INTERVENTORIA

- Seguimiento y control de Impacto Urbano y mitigación: Es la evaluación de impacto urbano comprende un conjunto de estrategias diseñadas para minimizar los efectos

que las actividades humanas puedan tener sobre el entorno. El objetivo principal es lograr una convivencia armónica entre el desarrollo de los proyectos y la sostenibilidad ambiental.

- Seguimiento y control de compromisos laborales y sistema integral de seguridad social: Durante el período del informe, esta interventoría realizó seguimiento y control para verificar que el contratista cumpliera con proporcionar un entorno de trabajo seguro, ofrecer salarios acordes a lo pactado en su propuesta, así como garantizar las afiliaciones a la seguridad social y el cumplimiento de las leyes y reglamentos laborales establecidos en el Código del Trabajo y otras normativas laborales aplicables.
- Seguimiento y control del Plan de Gestión Social:
- En este período, la interventoría realizó seguimiento y control a la implementación de estrategias destinadas a prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos, así como a potenciar los efectos positivos derivados de la ejecución de las obras. Esto como parte de una planificación que busca garantizar la participación y el compromiso de la comunidad, fomentando el empoderamiento social respecto a la infraestructura y promoviendo su sostenibilidad.
- Seguimiento y control al Estado del Tiempo: Durante este período, la interventoría llevó a cabo un seguimiento riguroso de las condiciones climatológicas, con el fin de evaluar cómo estas afectan la ejecución del contrato, permitiendo tomar decisiones oportunas para mitigar posibles impactos relacionados con el clima.
- Seguimiento y control al plan de calidad: Se realizó un seguimiento exhaustivo del alcance del plan de calidad, verificando los elementos de entrada, asegurando el cumplimiento de los objetivos, las responsabilidades de la dirección, así como la gestión del control de documentos, datos, registros y recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
- Seguimiento y control de Seguridad Industrial:Durante este período, la interventoría controló que el contratista cumpliera con la afiliación del personal al sistema de seguridad social. Asimismo, se verificó el cumplimiento del Decreto Único 1072 de 2015, que unificó las normas relacionadas, estableciendo la obligatoriedad de implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte de todas las empresas, sin importar su nivel de riesgo.

3.3. AVANCE FISICO EJECUTADO.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
I	CAMBIO DE CUBIERTA TORRE B	VALOR	%					
1.00	PRELIMINARES		0,00%					
1.01	Ajuste de diseños estructural, redes eléctricas, aguas lluvias e hidrosanitarias. Incluye planos as built	$ 13.876.112,00	0,43%		$ -	0,00%	$ 13.876.112,00	0,43%
1.02	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$ 17.290.249,57	0,53%		$ 1.118.810,00	0,07%	$ 11.817.190,88	0,32%
1.03	Desmonte de cubierta existente canaleta 90. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$ 29.599.940,61	0,91%		$ -	0,00%	$ 15.705.240,54	0,51%
1.04	Desmonte de puntos de iluminación para lámparas existentes, incluye desmonte de tubería, cableado, aparatos eléctricos. Retiro y disposición a sitios autorizados	$ 6.796.365,00	0,21%		$ 948.330,00	0,03%	$ 4.330.707,00	0,10%
1.05	Desmonte de canaleta o ductería existente, incluye desconexión y retiro de cableado.	$ 10.189.440,00	0,31%		$ 566.080,00	0,04%	$ 5.943.840,00	0,17%
1.06	Desmonte de tablero de 12 circuitos TWS	$ 699.150,00	0,02%		$ -	0,00%	$ 349.575,00	0,01%
1.07	Desmonte de tablero de 24 circuito TWP	$ 1.000.384,00	0,03%		$ -	0,00%	$ 500.192,00	0,02%
1.08	Cerramiento provisional en muro 1 cara lamina fibrocemento 6 mm, incluye estructura cal 26, plástico interior, acabado cara exterior (estuco 3 manos de pintura) y media caña pvc	$ 1.554.608,00	0,05%		$ -	0,00%	$ 1.554.608,00	0,05%
1.09	Desmonte y reinstalación de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	$ 2.121.880,00	0,07%		$ 212.188,00	0,02%	$ 1.220.081,00	0,02%
1.10	Desmonte y reinstalación de aires acondicionados, incluye desmonte y montaje de condensadoras, protección de equipos y traslados de equipos a punto de acopio de la entidad, mantenimiento de equipos, cableado y tubería de conexión a puntos eléctricos	$ 23.156.822,00	0,71%		$ -	0,19%	$ 7.491.913,00	0,19%
1.11	Desmonte, mantenimiento y reinstalación de ventanas aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	$ 1.243.035,61	0,04%		$ -	0,00%	$ 432.971,00	0,00%
1.12	Desmonte y reinstalación de Cámaras de seguridad existentes, incluye conexión al circuito cerrado de TV.	$ 1.370.688,00	0,04%		$ -	0,01%	$ 913.792,00	0,03%
		$ 108.898.674,79	3,36%		$ 2.845.408,00	0,09%	$ 64.136.222,42	1,98%

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
2.00	CUBIERTA							
2.01	Suministro e instalación flanche lámina galvanizada cal.22 A=0,40m anclado a muro. Incluye cinta bituminosa autoadhesiva Sika Multiseal o similar 0.10x10m o	$ 8.948.644,30	0,28%			0,03%	$ 5.017.819,03	0,14%
2.02	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal con manto asfáltico (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para viga canal	$ 19.339.931,89	0,60%			0,00%	$ 27.857.511,36	0,86%
2.03	Suministro e instalación cubierta tipo Sandwich cal 26 prepintada. Incluye poliuretano 38mm densidad 35-38 KG/M#, clips de fijación, tornillos autoperforantes, remate 0,30 en lámina cal 26 x 2,44 ml	$ 263.957.860,67	8,14%		$ -	0,00%	$ 196.395.621,40	7,22%
2.04	Acero estructural ASTM A500-Grado C. (incluye pernos, platinas y anclaje, suministro, montaje y pintura)	$ 273.220.117,28	8,42%		$ -	0,55%	$ 205.457.961,24	4,39%
2.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	$ 116.610.260,41	3,59%		$ 6.149.369,20	0,00%	$ 61.088.322,39	1,29%
2.06	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, resane pañete muros interiores mort 1:4 Impermeabilizado, filos y dilataciones	$ 37.158.748,15	1,15%		$ 4.234.704,18	0,00%	$ 29.406.780,97	0,42%
2.07	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para remates de cubierta en muro	$ 27.610.535,52	0,85%			0,00%	$ 26.108.643,42	0,50%
		$ 746.846.098,22	**23,02%**		**$ 10.384.073,38**	**0,32%**	**$ 551.332.659,81**	**17,00%**
3.00	RED ELECTRICA							
3.01	Suministro e instalación bandeja porta cable tipo malla ancho 30 cm; incluye anclajes, accesorios, clips de conexión y puesta a tierra para su correcto funcionamiento	$ 23.048.655,00	0,71%		$ 2.974.020,00	0,04%	$ 11.212.055,41	0,18%
3.02	Tablero de 12 circuitos TWS	$ 2.258.628,14	0,07%		$ -	0,00%	$ 1.255.310,00	0,04%
3.03	Tablero de 24 circuito TWP	$ 3.589.934,25	0,11%		$ -	0,00%	$ 1.995.229,00	0,06%

Página 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
3.04	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	$ 42.661.737,11	1,32%		$ -	0,00%	$ 23.160.927,01	0,71%
3.05	Salida eléctrica para punto de iluminación, incluye caja, tubería, cableado, toma y demás accesorios para su correcto funcionamiento 3m.	$ 47.297.594,24	1,46%		$ 1.132.728,00	0,15%	$ 22.088.196,01	0,79%
3.06	Suministro e instalación de lámpara de evacuación de emergencia. Incluye anclajes, soportes y todos los accesorios para su correcta instalación.	$ -	0,00%		$ 1.337.735,00	0,00%	$ 1.337.735,00	0,00%
3.07	Suministro e instalación de lámpara de emergencia con batería de respaldo. Incluye anclajes, soportes y todos los accesorios para su correcta instalación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
3.08	Suministro e instalación de toma normal incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	$ 38.129.605,00	1,18%		$ -	0,00%	$ 11.271.978,11	0,35%
3.09	Suministro e instalación de toma regulado incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos 3m	$ 27.516.372,00	0,85%		$ -	0,11%	$ 12.347.090,01	0,38%
3.10	Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos	$ 5.879.218,00	0,18%		$ -	0,00%	$ 2.734.520,00	0,15%
3.11	Suministro e instalación de interruptor doble, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 12 libre de halógenos	$ 1.976.286,00	0,06%		$ -	0,00%	$ 912.132,00	0,03%
3.12	Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico incluye totalizador y protecciones	$ 4.679.308,00	0,14%		$ -	0,07%	$ 2.339.654,00	0,07%
3.13	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#6+1#6+1#8) incluye regata y resane	$ 19.148.808,00	0,59%		$ -	0,00%	$ 15.117.480,01	0,47%
3.14	Suministro e instalación acometida eléctrica para tableros en líneas (3#4+1#4+1#6) incluye regata y resane	$ 14.209.872,00	0,44%		$ -	0,23%	$ 7.478.880,00	0,23%
3.15	Suministro e instalación de toma bifásico, incluye salida en tubería ScH 40 y cable # 10 libre de	$ 6.279.052,00	0,19%		$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%

ISO 9001 Icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 Icontec No. GP 059 - 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
3.16	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de iluminación, tomas normales y regulados sobre bandeja eléctrica Cable libre de halógenos calibre 12 AWG(1#12+1#12+1#12) hasta 3ml incluye regata y resane	$ 13.897.691,79	0,43%		$ -	0,00%	$ 7.543.500,00	0,23%
3.17	Suministro e instalación acometida eléctrica para circuitos de aire acondicionado Cable libre de halógenos calibre 10 AWG (1#10+1#10+1#10). hasta 3ml incluye regata y resane	$ 6.807.023,84	0,21%		$ 3.391.840,00	0,00%	$ 3.391.840,00	0,00%
		$ 257.379.785,37	**7,93%**		**$ 8.836.323,00**	**0,27%**	**$ 124.186.526,58**	**3,83%**
4.0	RED AGUA LLUVIA							
4.01	Revisión de punto aguas lluvias (prueba de taponamiento con sonda eléctrica) y adecuación de bajantes	$ -	0,00%		$ -	0,02%	$ 632.187,00	0,02%
4.02	Suministro e instalación de rejillas con cuello para bajantes	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
4.03	Perforación pase de tubería 4"/canaleta en muros y placa en concreto. (Incluye demolición, afinado, trasiego y disposición final)	$ 82.346,67	0,00%		$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%
4.04	Suministro e Instalación Tubería aguas lluvias 4", incluye soporte y accesorios de fijación	$ 15.954.400,00	0,49%		$ -	0,00%	$ 0,00	0,00%
		$ 16.036.746,67	**0,49%**		**$ -**	**0,00%**	**$ 632.187,00**	**0,02%**
II	**IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS**							
5	IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS		0,00%					
5.01	Hidrolavado de limpieza de pisos, senderos, muros de terrazas, antepechos y fachada con hidrojet 1700 PSI	$ 75.843.026,40	2,34%			0,00%	$ 75.843.026,38	2,34%
5.02	Demolición manual de enchape muros de terrazas, antepechos y fachadas. Incluye la demolición de pañete e=0,05 y retiro y disposición a sitios autorizados	$ 688.450,00	0,02%			0,01%	$ 688.450,00	0,02%
5.03	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	$ 1.903.160,00	0,06%			0,03%	$ 1.903.160,00	0,06%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
5.04	Sellador sistema hidrofóbico fachada aplicación sistema sika transparente 10 o similar 3 manos. Incluye andamios, equipos, hidrófugo, preparación de la superficie, limpiador rinse sika o similar	$	554.375.324,70	17,09%	$ 11.466.524,70	0,35%	$ 554.375.324,70	17,09%
5.05	Suministro e instalación de enchape fachaleta arcilla existente, incluye andamios, equipos, corte, emboquillada con pegacor y todos los elementos para su correcta instalación	$	3.095.100,00	0,10%		0,00%	$ 3.095.100,00	0,10%
5.06	Pintura barniz sobre muro fachada. Incluye andamios, equipos, filos y dilataciones	$	150.356.322,85	4,64%		0,00%	$ 150.356.322,85	4,64%
		$	**786.261.383,95**	**24,24%**	**$ 11.466.524,70**	**0,35%**	**$ 786.261.383,93**	**24,24%**
III	**REMODELACIÓN DE BAÑOS**							
6.0	REMODELACION DE BAÑOS							
6.01	Desmonte de cielo raso existente. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$	3.986.479,86	0,12%	0	0,00%	$ 790.199,52	0,02%
6.02	Desmonte divisiones baños. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	$	5.704.946,16	0,18%	0	0,00%	$ 5.704.946,16	0,18%
6.03	Demolición manual placa aligerada concreto reforzado hasta e= 0,25m. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$	21.123.452,52	0,65%	$ 701.240,00	0,02%	$ 21.824.692,52	0,67%
6.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	$	20.669.973,80	0,64%	$ 0,00	0,00%	$ 20.669.973,80	0,64%
6.05	Juego de incrustaciones blanco	$	-	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%
6.06	Suministro e instalación de sanitario incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de sanitario existente y disposición final en sitios autorizados.	$	80.502.120,00	2,48%	$ -	0,00%	$ 46.959.570,00	1,45%
6.07	Suministro e instalación de orinal incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de orinal existente y disposición final en sitios autorizados.	$	11.311.890,00	0,35%	$ -	0,00%	$ 3.393.567,00	0,10%
6.08	Suministro e instalación lavamanos cerámica sobreponer incluye tubería, grifería tipo push en acero inoxidable y accesorios de instalación, desmonte y retiro de lavamanos existente y disposición final en sitios autorizados.	$	16.371.576,75	0,50%	$ -	0,00%	$ 7.964.748,00	0,25%

Página 2

ISO 9001 Icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 Icontec No. GP 059 - 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
6.09	Mesones en granito natural para lavamanos incluye (salpicadero 8cm. Faldón 10cm)	$ 16.621.924,80	0,51%		$ -	0,00%	$ 9.130.673,76	0,28%
6.10	Suministro e instalación espejo flotante biselado 4mm. Incluye desmonte de espejo existente y disposición final en sitios autorizados.	$ 2.164.042,22	0,07%		$ 0,00	0,00%	$ 1.427.846,30	0,04%
6.11	Mortero de nivelación (contrapiso) E= 1 a 4 cm	$ 7.352.153,34	0,23%		$ 0,00	0,00%	$ 7.352.153,34	0,23%
6.12	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	$ -	0,00%		0	0,00%	$ -	0,00%
6.13	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	$ 30.199.400,00	0,93%		$ 0,00	0,00%	$ 29.871.990,85	0,92%
6.14	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	$ 4.904.584,00	0,15%		$ 0,00	0,00%	$ 5.798.060,00	0,18%
6.15	Suministro e instalación de Punto de desagüe lavamanos en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	$ 4.694.822,00	0,14%		$ 0,00	0,00%	$ 5.109.071,00	0,16%
6.16	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	$ 4.222.368,00	0,13%		$ 0,00	0,00%	$ 4.222.368,00	0,13%
6.17	Suministro e instalación de Punto de desagüe orinal en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	$ 1.795.079,00	0,06%		$ 0,00	0,00%	$ 1.795.079,00	0,06%
6.18	Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 6" Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
		$ 231.624.812,45	**7,14%**		**$ 701.240,00**	**0,02%**	**$ 172.014.939,25**	**5,30%**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
7.0	CARPINTERIA METALICA							
7.0	CARPINTERIA METALICA							
7.01	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar.Incluye desmon	$ -	0,00%		$ 0,00	0,00%	$ -	0,00%
7.02	Divisiones de baño, divisores, parales y puertas elaboradas en acero inoxidable calibre 20-22 tipo 304 satinado	$ 125.587.080,00	3,87%		$ 0,00	0,00%	$ 71.752.085,04	2,21%
7.03	Suministro e instalación de ventana en aluminio corredizo, con marco y vidrio 4mm, incluye accesorios de instalación	$ 8.651.317,50	0,27%		$ 0,00	0,00%	$ 2.422.368,90	0,07%
7.04	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegacor y boquilla. (Formato según especificación técnica)	$ 58.401.735,00	1,80%		$ 1.259.650,85	0,04%	$ 27.674.361,70	0,85%
7.05	Suministro e instalación de cielo raso PVC 8mm (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	$ 29.777.690,46	0,92%		$ 1.259.650,85	0,04%	$ 14.850.259,58	0,46%
7.06	Pañete muro interior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	$ 14.964.931,06	0,46%		$ 0,00	0,00%	$ 17.521.447,70	0,54%
7.07	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, filos y dilataciones	$ 2.255.250,72	0,07%		$ 0,00	0,00%	$ 2.100.462,70	0,06%
		$ 239.638.004,74	**7,39%**		**$ 2.519.301,70**	**0,08%**	**$ 136.320.985,62**	**4,20%**
8.0	RED HIDRAULICA							
8.01	Suministro e instalacion de Equipo hidroflo con tanque de diafragma, bomba centrifuga incluye accesorios, válvulas, 2 electrobombas, tanque, base metalica, manometro, presostato, maguera flexible, conexión 5 vias,flotador (5,5 HP, 3450 RPM, 220V, 50/70 PS	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
8.02	Tuberia PVCP RDE 21 2" suministro e instalación	$ 10.893.312,00	0,34%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
8.03	Tuberia PVCP RDE 21 1-1/2" suministro e instalación	$ 2.514.030,00	0,08%		$ -	0,00%	$ -	0,00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
8.04	Tubería PVCP RDE 21 1-1/4" suministro e instalación	$ 1.073.376,00	0,03%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
8.05	Tubería PVCP RDE 21 1" suministro e instalación	$ 2.580.224,00	0,08%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
8.06	Accesorio PVCP 3/4" suministro e instalación	$ 264.422,00	0,01%		$ -	0,00%	$ 455.900,00	0,01%
8.07	Accesorio PVCP 1/2" suministro e instalación	$ 106.318,00	0,00%		$ -	0,00%	$ 750.480,00	0,02%
8.08	Accesorio PVCP 1" suministro e instalación	$ 1.036.660,00	0,03%		$ -	0,00%	$ 24.392,00	
8.09	Accesorio PVCP 1-1/4" suministro e instalación	$ 356.736,00	0,01%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
8.10	Accesorio PVCP 1-1/2" suministro e instalación	$ 383.744,00	0,01%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
8.11	Accesorio PVCP 2" suministro e instalación	$ 593.952,00	0,02%		$ -		$ -	0,00%
		$ 19.802.774,00	**0,61%**		**$ -**	**0,00%**	**$ 1.230.772,00**	**0,04%**
9.0	RED SANITARIA							
9.01	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
9.02	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
9.03	Suministro e instalación de Punto de desagüe en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
		$ -	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**
IV	**CONEXIONES**							
10.	CONEXIONES CUBIERTA							
10.01	Suministro e instalación de domo en cubierta en policarbonato incluye canal en lámina galvanizada calibre 20, LD=0.60, soporte, estructura y todos los elementos de fijación.	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 26	
8.03	Tubería PVCP RDE 21 1-1/2" suministro e instalación	$ 2.239.388,13	0,07%		$ -	0,00%
8.04	Tubería PVCP RDE 21 1-1/4" suministro e instalación	$ 956.116,46	0,03%		$ -	0,00%
8.05	Tubería PVCP RDE 21 1" suministro e instalación	$ 2.279.197,86	0,07%		$ -	0,00%
8.06	Accesorio PVCP 3/4" suministro e instalación	$ 235.535,54	0,01%		$ -	0,00%
8.07	Accesorio PVCP 1/2" suministro e instalación	$ 94.703,40	0,00%		$ -	0,00%
8.08	Accesorio PVCP 1" suministro e instalación	$ 923.411,40	0,03%		$ -	0,00%
8.09	Accesorio PVCP 1-1/4" suministro e instalación	$ 317.764,86	0,01%		$ -	0,00%
8.10	Accesorio PVCP 1-1/2" suministro e instalación	$ 341.822,44	0,01%		$ -	0,00%
8.11	Accesorio PVCP 2" suministro e instalación	$ 529.066,50	0,02%		$ -	
		$ 17.620.292,87	**0,54%**		**$ -**	**0,00%**
9.0	RED SANITARIA					
9.01	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	$ -	0,00%		$ -	0,00%
9.02	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	$ -	0,00%		$ -	0,00%
9.03	Suministro e instalación de Punto de desagüe en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	$ -	0,00%		$ -	0,00%
		$ -	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
10.02	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para remates de cubierta en muro	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
10.03	Pintura vinilo tipo 1 sobre muro interior 3 manos (Alta calidad). Incluye estuco, resane pañete muros interiores mort 1:4 Impermeabilizado, filos y dilataciones	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
		$ -	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**
V	**SEGURIDAD**							
11	PUERTAS AUTOMATICAS	$ -	0,00%					
11.01	Suministro e instalación de puerta automática en vidrio templado de 10mm incoloro con zócalo inferior en aluminio. Dimensiones 1.70X2.00h. Cabezal para puerta automática avanti 4200 de 4.2 metros de longitud para una hoja hasta 2 metros de longitud y 100	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
		$ -	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**
12	GARITA PARQUEADERO	$ -	0,00%					
		$ -	0,00%					
12.01	Demolición placa en concreto e=0.10m-0.15m. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.02	Demolición de muros en mamposteria. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.03	Excavación manual en material común, incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.04	Relleno material seleccionado tamaño max. 2"	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.05	Zapata en concreto20.7mpa(3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.06	Viga en concreto 20.7mpa (3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.07	Placa de contrapiso en Concreto impermeabilizado 20.7mpa (3000psi) mezcla en obra. Suministro y construcción	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.08	Columna en concreto 20.7 mpa (3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.09	Viga aérea en concreto 20.7mpa(3000psi) mezcla en obra.suministro y construcción	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.10	Dinteles en concreto 17.2mpa(2500psi)mezcla en obra.suministro y construcción	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%

Página 3

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
12.11	Acero de refuerzo fy=4200 mpa (4200 kg/cm2, g60) incluye suministro, figurado, armado, colocación y amarre, zapata, vigas, columnas y placas	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.12	Muro en bloque flexa no. 5, 0.12x0.20x0.30 m (mortero tipo s 1:3)	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.13	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.14	Pañete muro interior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.15	Suministro e instalación de enchape fachaleta arcilla existente, incluye andamios, equipos, corte, emboquillada con pegacor y todos los elementos para su correcta instalación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.16	Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) 3 manos	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.17	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegacor y boquilla. (Formato según especificación técnica)	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.18	Placa de cubierta en concreto impermeabilizado 27.6 Mpa (4000 PSI). E=0,10m Incluye lámina stell deck cal 18 y malla electrosoldada	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.19	Suministro e instalación (emulsión asfáltica, primera capa manto de 2,2mm, segunda capa manto foil aluminio de 3,2 mm y aluminol) para remates de cubierta en muro	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.20	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.21	Suministro e instalación lámpara Led Panel 60x60cm 40w Vida Útil: 30.000 horas. Incluye accesorios y cableado de instalación, clavija, marco en aluminio para su correcto funcionamiento.	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
12.22	Suministro e instalación tubería sanitaria 4" PVC; Incluye accesorios(Yee,Codos 45, 90°, Tee,uniones, codos,silla, limp. Y soldad.) y elementos de fijación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.23	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.24	Suministro e instalación de Punto de desagüe lavamanos en PVC 2". (Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.25	Salida sanitaria sifón de piso 2" (incluye suministro e instalación rejilla)	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.26	Suministro e instalación lavamanos cerámica sobreponer incluye tubería, grifería tipo push en acero inoxidable y accesorios de instalación, desmonte y retiro de lavamanos existente y disposición final en sitios autorizados.	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.27	Suministro e instalación de sanitario incluye grifería tipo push, tubería, accesorios de instalación, desmonte y retiro de sanitario existente y disposición final en sitios autorizados.	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
12.28	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca yale o Similar.Incluye desmon	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
		$ -	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
VI	**REPARACIONES LOCATIVAS Y DAÑOS POR SISMO**							
13	REPARACIONES LOCATIVAS Y DAÑOS POR SISMO							
13.01	Demolición manual pañete muros. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$ 1.268.798,40	0,04%		$ -	0,00%	$ 1.406.748,40	0,04%
13.02	Demolición manual pañete bajo placa. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.03	Demolición de muros en mamposteria. Incluye retiro y disposición a sitios autorizados	$ 897.701,08	0,03%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.04	Demolición de enchape piso y pared existente. Incluye retiro y disposición final en sitios autorizados.	$ 1.179.640,00	0,04%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.05	Desmonte y reinstalación manejadora aire acondicionado. Incluye todos los soportes y anclajes para su correcto funcionamiento	$ 1.043.458,37	0,03%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.06	Desmonte y reinstalación de lámparas (60x60 cm). Incluye todos los soportes y anclajes para su correcto funcionamiento	$ 190.379,85	0,01%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.07	Desmonte y reinstalación de ventana en aluminio con vidrio. Incluye todos los soportes y accesorios para su correcta instalación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.08	Desmonte y reinstalación de Gabinete red contra incendios (80X100cm)	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.09	Desmonte y reinstalación interruptor eléctrico	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.10	Desmonte y reinstalación punto eléctrico regulado	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.11	Desmonte y reinstalación de puertas en madera o en aluminio, incluye desmonte de marco y accesorios, retiro a punto de acopio de la entidad	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.12	Desmonte y reinstalación mesón atención a público	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
13.13	Desmonte y reinstalación parlantes y cámara web	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
		$ 4.579.977,70	**0,14%**		**$ -**	**0,00%**	**$ 1.406.748,40**	**0,04%**

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
14	PISOS, MUROS Y ACABADOS							
14.01	Suministro e instalación de cielo raso PVC (incluye estructura metálica y rejillas de ventilación)	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
14.02	Suministro e instalación de enchape cerámico para piso y pared incluye wines, afinado pegacor y boquilla. (Formato según especificación técnica)	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
14.03	Muro en bloque flexa no. 5, 0.12x0.20x0.30 m (mortero tipo s 1:3)	$ 4.856.244,00	0,15%		$ -	0,00%	$ 417.259,80	0,01%
14.04	Pañete liso bajo placa, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ 4.146.563,78	0,13%
14.05	Pañete muro exterior y culatas, dilataciones mortero 1:4 impermeabilizado, suministro y aplicación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
14.06	Suministro e instalación de estuco plástico	$ 5.911.563,84	0,18%		$ -	0,00%	$ 5.763.299,68	0,18%
14.07	Pintura vinilo tipo 1 s/muro (alta calidad) 3 manos	$ 2.674.912,05	0,08%		$ -	0,00%	$ 2.834.439,61	0,09%
14.08	Piso en granito pulido incluye destronque y pulida	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
14.09	Suministro e instalación juntas elastoméricas rampa de conexión entre torres. Incluye anclajes y todo lo necesario para su correcta instalación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
14.10	Suministro e instalación de vidrio transparente liso 5mm	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
14.11	Puerta en aluminio, marco en aluminio 3x1, hoja un En aluminio entamborada color natural + vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura de seguridad tipo alcoba con pomo o manija marca	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%

Página 4

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
VII	**ZONAS EXTERIORES**							
15	PAISAJISMO							
15.01	Suministro e instalación de paisajismo tipo tropical (Según especificación técnica)	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
		$ -	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**	**$ -**	**0,00%**
VIII	**CERTIFICACIONES ELECTRICAS**							
16.01	Certificación RETILAP iluminación	$ -	0,00%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
16.02	Estudio fotométrico iluminación	$ 15.635.052,00	0,48%		$ -	0,00%	$ 15.635.052,00	0,48%
		$ 15.635.052,00	**0,48%**		**$ -**	**0,00%**	**$ 15.635.052,00**	
	ITEM NO PREVISTOS							
NP 01	Demolición manual de mortero de nivelación Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	$ 3.442.074,11	0,11%			0,00%	$ 3.497.850,00	0,11%
NP 02	Desmonte de puntos electricos tomas, interruptores, incluye desmonte de tuberia, cableado, aparatos eléctricos. Incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	$ 3.094.793,73	0,10%			0,00%	$ 3.094.793,73	0,10%
NP 03	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	$ 7.992.281,83	0,25%			0,00%	$ 8.492.526,41	0,26%
NP 04	Desmonte de meson en concreto, incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	$ 1.125.567,63	0,03%			0,00%	$ 1.125.567,63	0,03%
NP 05	Desmonte de ducto flexible en aluminio,incluye Retiro y disposición a sitios autorizados	$ 4.183.013,11	0,13%		$ 451.404,29	0,01%	$ 2.708.425,75	0,08%
NP 06	Desmonte de manejadoras de aire acondionado	$ 1.457.442,07	0,04%			0,00%	$ 1.457.442,07	0,04%
NP 07	Suministro, transporte e instalación de Salida voz y datos, incluye: caja rectangular, herrajes, jack, face plate, 3 mts de cable UTP categoria 6, ponchado del cable y marcación	$ 35.513.608,57	1,09%			0,00%	$ 18.212.106,96	0,56%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
NP 08	Suministro e instalacion de cable utp cat 6A	$ 65.200.941,29	2,01%			0,00%	$ 36.785.008,67	1,13%
NP 09	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 2 m	$ 1.113.879,42	0,03%			0,00%	$ -	0,00%
NP 10	Suministro e instalacion de Patch - Cord, Cat. 6A de 1 m	$ 1.189.292,97	0,04%			0,00%	$ -	0,00%
NP 11	Salida tomacorriente doble tipo GFCI en tubo pvc 1/2"	$ 5.598.033,93	0,17%			0,00%	$ 5.598.033,93	0,17%
NP 12	Suministro e instalacion de soporte en hierro con angulo de 1 1/2"X1/8" para unidad condensadora de aire acondicionado.	$ 2.756.968,92	0,08%			0,00%	$ -	0,00%
NP 13	Suministro e instalacion de boquilla sobre dilataciones de fachaleta donde corresponda, fachada Incluye andamios, equipos	$ 53.339.208,75	1,64%			0,00%	$ 53.339.208,75	1,64%
NP 14	Remocion de graffiti sobre fachadas	$ 1.435.002,48	0,04%		$ 1.076.251,86	0,03%	$ 2.511.254,34	0,08%
NP 15	Diseño, suministro e instalacion de ducteria de aire acondicionado lamina de poliisocianurato (PirAlum). Incluye soporte en rangulo 1 "x 1/8" y varilla roscada 1/4".	$ 86.656.047,84	2,67%			0,00%	$ 43.328.023,50	1,34%
NP 16	Instalacion de aire acondicionado de hasta 24,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	$ 7.954.505,40	0,25%		$ 5.965.879,05	0,18%	$ 7.291.629,95	0,22%
NP 17	Suministro e instalacion de Bomba de condensado tipo tanque 220V para aires acondicionado hasta de 24.000 BTU. Incluye soporte para la unidad.	$ 8.895.082,56	0,27%		$ 6.671.311,92	0,21%	$ 8.153.825,68	0,25%
NP 18	Suministro e instalacion de Manguera transparente para drenaje para bomba condensadora tipo tanque o similar.	$ 903.692,40	0,03%		$ 625.633,20	0,02%	$ 625.633,20	0,02%
NP 19	Instalacion de aire acondicionado de hasta 60,000 BTU.Incluye instalacion de la unidad interior y exterior. No incluye ningún material.	$ 6.083.741,86	0,19%		$ 1.738.211,96	0,05%	$ 4.653.827,63	0,14%


ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
NP 20	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Minisplit. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revisión y limpieza del drenaje, Inspección y limpieza del ventilador interior y Limpieza de la unidad exterior (condensadora).	$ 4.495.932,60	0,14%		$ 3.371.949,45	0,10%	$ 4.121.271,55	0,13%
NP 21	Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo piso techo. Incluye Limpieza de la unidad interior, Retiro y limpieza de los filtros de aire, aletas del intercambiador de calor, revisión y	$ 500.247,33	0,02%			0,00%	$ -	0,00%
NP 22	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de hasta 12.000 BTU	$ 3.211.183,54	0,10%			0,00%	$ -	0,00%
NP 23	Suministro e instalación de tubería de cobre con aislamiento térmico tipo rubatex en aires acondicionados de desde 18.000 BTU hasta 24.000 BTU	$ 65.167.675,94	2,01%		$ 39.379.610,90	1,21%	$ 52.022.538,61	1,60%
NP 24	Suministro e instalacion de Rejilla de suministro 12x12 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornilleria para su instalacion, no incluye damper	$ 8.043.429,30	0,25%		$ 1.476.644,60	0,05%	$ 4.060.772,65	0,13%
NP 25	Suministro e instalacion de Rejilla de retorno 18x18 de cuatro vias en aluminio. Incluye tornilleria para su instalacion, no incluye damper	$ 4.772.389,01	0,15%		$ -	0,00%	$ -	0,00%
NP 26	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 4x14	$ 389.209,60	0,01%			0,00%	$ -	0,00%
NP 27	Suministro e instalacion de cable encauchetado para potencia 3x12	$ 7.850.792,40	0,24%		$ 3.925.396,20	0,12%	$ 8.073.772,46	0,25%
NP 28	Suministro e instalación de gas refrigerante para aires acondicionado. Incluye el cargue de gas refrigerante adecuado (según especificaciones del equipo), garantizando una presión óptima para el correcto funcionamiento del sistema. La instalación contempla verificación de fugas, ajuste de presiones y pruebas de rendimiento para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro	$ 3.356.619,71	0,10%		$ 1.855.823,40	0,06%	$ 3.173.736,74	0,10%

Página 5

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
NP 29	Desmonte de manto asfáltico, Incluye retiro y disposicion final	$	5.369.382,15	0,17%		0,00%	$ 6.787.504,80	0,21%
NP 30	Suministro e instalacion de tuberia PVC 2" liviana red de ventilacion, incluye accesorios	$	5.560.544,80	0,17%		0,00%	$ 2.911.280,00	0,09%
NP 31	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion 3/4". No incluye accesorios.	$	3.203.048,03	0,10%		0,00%	$ 3.203.048,03	0,10%
NP 32	Suministro e instalacion de tuberia pvc presion 1/2". No incluye accesorios	$	1.191.873,73	0,04%		0,00%	$ 746.788,05	0,02%
NP 33	Suministro e instalacion de Tapa en Lámina Galvanizada y aluminio 60X60 Tipo palanca	$	2.356.785,70	0,07%		0,00%	$ 1.178.392,85	0,04%
NP 34	Suministro e instalacion de registro de bola metalico 2"	$	1.166.675,44	0,04%		0,00%	$ 583.337,72	0,02%
NP 35	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1"	$	3.343.074,90	0,10%		0,00%	$ 3.343.074,90	0,10%
NP 36	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 3/4"	$	2.435.591,40	0,08%		0,00%	$ 2.435.591,40	0,08%
NP 37	Suministro e instalacion de Registro de bola metalico 1/2"	$	6.729.991,80	0,21%		0,00%	$ 6.729.991,80	0,21%
NP 38	Suministro e instalacion de Punto hidráulico pvc de 1/2". Incluye accesorios y 3 metros de tuberia	$	10.305.428,94	0,32%		0,00%	$ 10.305.425,31	0,32%
NP 39	Suminstro e instalcion de Mueble para lavamanos 55 cm x 60 cm (axh)	$	5.064.255,52	0,16%		0,00%	$ 2.532.127,76	0,08%
NP 40	Suministro e instalacion de guardaescobas en areas comunes en ceramica h: 8 cm. incluye pintura en esmalte.	$	1.038.468,44	0,03%		0,00%	$ 1.241.567,60	0,04%
NP 41	Media caña en mortero impermeabilizado 1:3. (Incluye impermeabilizante integral)	$	1.149.033,35	0,04%		0,00%	$ -	0,00%
NP 42	Suministro e instalacion de griferia lavamanos alta monocontrol	$	3.407.119,92	0,11%		0,00%	$ 1.703.559,96	0,05%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
NP 43	Suministro e instalación lavamanos de sobreponer cuadrado slim blanco 37 x 37, incluye accesorios de instalación.	$	5.066.706,96	0,16%		0,00%	$ 2.533.353,48	0,08%
NP 44	Desmonte de aparato sanitario. Incluye disposicion final.	$	3.550.709,80	0,11%		0,00%	$ 3.227.918,00	0,10%
NP 45	Suministro es instalacion de puerta marco en aluminio color anolock, hoja un En vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura tipo pomo, Incluye desmonte puerta existente.	$	55.578.042,86	1,71%		0,00%	$ 55.342.654,41	1,71%
NP 46	Suministro es instalacion de puerta marco en aluminio color anolock, hoja un En vidrio Incoloro 4mm sandblasting cortinado 2cm, bisagras redondas 5/8x68mm, cerradura tipo pomo, Incluye desmonte puerta existente.	$	9.333.362,21	0,29%		0,00%	$ -	0,00%
NP 47	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 12W	$	-	0,00%		0,00%	$ 1.482.930,30	0,05%
NP 48	Suministro e instalacion de Panel led empotrar 24W	$	284.109,12	0,01%	$ 1.349.518,32	0,04%	$ 1.633.627,44	0,05%
NP 49	Suministro e instalacion de Equipo hidroflo con tanque hidroacumulador vertical de 200 litros, 2 electrobombas (2 HP, 3450 RPM, 220V, 40/60 PSI 60HZ) incluye accesorios y tablero de control.	$	18.246.495,01	0,56%		0,00%	$ -	0,00%
NP 50	Suministro e instalacion de pelicula sand blasting tipo frost. (Suministro e instalación)	$	-	0,00%		0,00%	$ 1.164.838,85	0,04%
NP 51	Suministro e instalación de tubería de cobre para aire acondicoonado 60.000 BTU con rubatex con cinta	$	39.483.094,00	1,22%		0,00%	$ 23.013.003,66	0,71%
NP 52	Aplicación de pintura en esmalte sobre guardaescobas	$	4.682.654,33	0,14%		0,00%	$ 4.519.543,00	0,14%
NP 53	Suministro e instalacion de cerrojo o chapa de seguridad	$	1.545.937,54	0,05%		0,00%	$ 2.455.312,56	0,08%

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO			EJECUTADO SEMANA 31		ACUMULADO SEMANA 31	
NP 54	Suministro e instalacion de ventana en aluminio tipo rejilla incluye desmonte de ventanas existente.	$ 7.052.409,80	0,22%			0,00%	$ -	0,00%
NP 55	Suministro e instalacion de puerta metalica en cold rolled cal 18 con fijo superior en marco metalico y vidrio incoloro 4mm y chapa tipo pomo, incluye desmonte de puerta existente.	$ -	0,00%			0,00%	$ -	0,00%
		$ 592.867.454,05	**18,28%**		**$ 67.887.635,15**	**2,09%**	**$ 411.402.122,09**	**12,68%**
	INVERSION SEMANAL				$ 104.640.505,94		2.277.721.161,98	
	% SEMANAL							
	INVERSIÓN ACUMULADA	$ 3.033.013.483,83	93,50%		$ 104.640.505,94	1,59%	$ 2.277.721.161,96	
	% ACUMULADO							
		$ 3.033.013.483,83	**93,50%**		$ 104.640.505,94		**$ 2.277.721.161,98**	**70,22%**

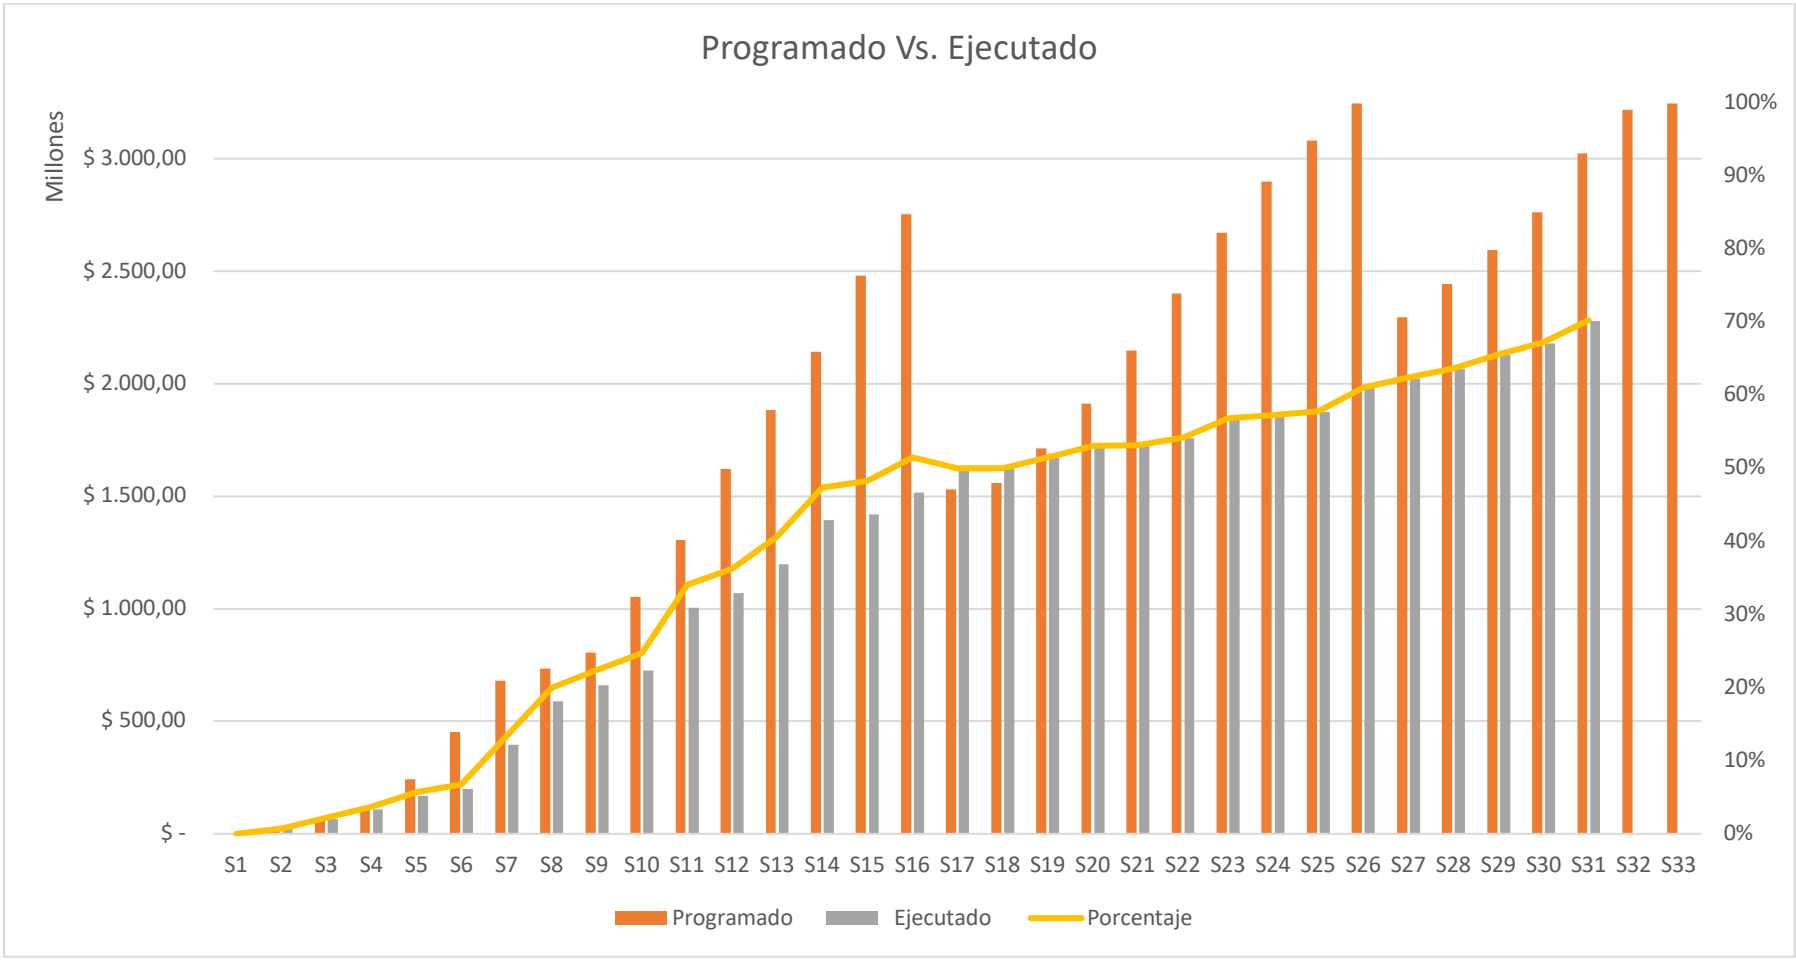

Grafica 1: Programado acumulado vs Avance ejecutado Mes No. 6

	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO ACUMULADO – INCLUYE ADICION Y PRORROGA
MES 1	$ 242.725.788,92	$ 242.725.788,92	$ 167.138.064,28	$ 167.138.064,28
MES 2	$ 563.056.850,00	$ 805.782.638,92	$ 493.077.818,06	$ 660.215.882,34
MES 3	$ 1.076.764.149,15	$ 1.882.546.788,07	$ 543.551.835,22	$ 1.203.767.717,56
MES 4		$1.559.826.625,03	$ 416.765.913,44	$ 1.620.533.631,00
MES 5	$ 839.692.357,60	$ 2.399.518.982,63	$ 125.985.283,16	$ 1.746.518.914,16
MES 6		$ 2.184.088.860,46	$ 232.957.722,07	$ 1.979.476.636,23
MES 7	$ 848.924.623,37	$ 3.033.013.483,83	$ 298.244.525,75	$ 2.277.721.161,98

Tabla : Programado acumulado vs Avance ejecutado

3.4. ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo del presente informe el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V no presenta ensayos de laboratorio debido a que las actividades ejecutadas no lo requirieron.

Se realizaron pruebas de presión y estanqueidad a los baños intervenidos; para verificación de las tuberías instaladas; a continuación se muestra el registro fotográfico de las Baterías sanitarias de la Torre A.







4. SEGUIMIENTO A VINCULACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

4.1. REGISTRO DE PERSONAL Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

	CC	CE	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	PERFIL	RH	PLANILLA ENERO 2025	PLANILLA FEBRERO	PLANILLA MARZO	PLANILLA ABRIL	NOVEDADES
1	X		12370591	VILLANUEVA	TOVAR	FRANCISCO JAVIER	Director de Obra	O+		24/02/2025			ACTIVO
3	X		1121926925	CASTAÑEDA	ACOSTA	FABIAN CAMILO	Residente de Obra	A+	13/01/2025	24/02/2025	19/03/2025		ACTIVO
7	X		1121896483	DUQUE	ROJAS	LEIDY MILENA	SISO	O+	22/01/2025	24/02/2025	19/03/2025		ACTIVO
8	X		1.075.290.375	SALAZAR	TOVAR	DAVID JOSE	ADMINISTRATIVO A&V	A-	NA	NA	NA	14/04/2025	ACTIVO
11	X		1079033189	GONZALEZ	GONZALEZ	DAIRO HUMBERTO	Supervisor	O+		25/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
16	X		86056596	ARIZA	AGUILAR	JOSE OLIVERIO	MAESTRO	A+	NA	15/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
24	x		79601270	BEDOYA	OSORIO	CESAR AUGUSTO	OFICIAL	O+	NA	15/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
25	X		1018492230	BELTRAN	URREGO	DANILO ARNULFO	OFICIAL	A+	NA	15/02/0205	25/03/2025		ACTIVO
26	X		86088862	SERNA	MONSALVE	ROLANDO	OFICIAL	O+	NA	20/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
27	X		86075040	QUICENO	ROMERO	JOSE NELSON	OFICIAL	O+	NA	20/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
30	X		1069900199	GONZALES	GONZALES	JERSI GERMAN	OFICIAL	O+	24/01/2025	24/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
31	x		1121847656	CEBALLOS	PENAGOS	DAIRO	PLOMERO	O+	NA	20/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
32	X		1069900188	GONZALEZ	GONZALEZ	YERSON ANDRES	AYUDANTE	O+		12/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
33	X		8852783	PRIETO	ROMERO	HENRY FABIAN	TECNICO AIRES	O+	NA	19/02/2025	11/03/2025		ACTIVO
34	X		1081514629	CHICUE	OSORIO	ALEX HUMBERTO	TECNICO AIRES	O+		19/02/2025	11/03/2025		ACTIVO
35	X		1081156592	HERNANDEZ	GARCIA	DANIEL FELIPE	AIRES ACONDIONADOS	O+		19/02/2025	11/03/2025		ACTIVO
36	X		1075265699	VARGAS	DIAZ	CARLOS FERNANDO	AIRES ACONDIONADOS	At		19/02/2025	11/03/2025		ACTIVO
37	X		1121912130	GONZALEZ	PERALTA	GEYDER ALFONSO	PUERTAS	O+			08/03/2025		ACTIVO
38	X		79733263	VILLALOBOS	MALPICA	WALDO WILSON	PUERTAS	O+			11/03/2025		ACTIVO
39	X		80728983	MALPICA	VILLALOBOS	HERMES WENSESLAO	PUERTAS	O+		02/02/2025	08/03/2025		ACTIVO
40	X		16945059	VALENCIA	RENTERIA	JOSE	OFICIAL	O+	21/01/2025	20/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
47	X		7222021	MENDIVELSO		RICARDO	Maestro	O+	09/01/2025	03/02/2025	25/03/2025		ACTIVO
39	X		17652967	URREA	ORTIZ	ARLEY	electricista	A+	09/01/2025	NA	11/03/2025		ACTIVO
49	X		1.075.211.031	NOGUERA	GUITIERREZ	ALEXANDER	electricista	O+	09/01/2025	10/02/2025	11/03/2025		ACTIVO
70	X		1010123592	PARDO	GONZALEZ	CRISTIAN DAVID	PUERTAS METALICAS	O+	NA	NA	NA	09/04/2025	ACTIVO
71	X		1121825334	GUITIERREZ	NIETO	WILDER YAMIT	PUERTAS METALICAS	A+	NA	NA	NA	08/04/2025	ACTIVO
72	X		6233535	ROJAS	SANCHEZ	WILDER ALEXANDER	PUERTAS METALICAS		NA	NA	NA	08/04/2025	ACTIVO
73	X		1121854644	CAMPO	MELO	JAIDER IVAN	PUERTAS METALICAS	O+	NA	NA	NA	09/04/2025	ACTIVO
74	X		1006823197	LINARES	ACEVEDO	DUBAN FELIPE	INSTALACION MESONES GRANI	O+	NA	NA	29/03/2025		INGRESO
81	X		86058896	QUINTORA	MARTINEZ	VICTOR MAURO	INSTALACION MESONES GRANI	O+	NA	NA	29/03/2025		INGRESO
81	X		86058896	QUINTORA	MARTINEZ	VICTOR MAURO	INSTALACION MESONES GRANI	O+	NA	NA	29/03/2025		INGRESO
82	X		1006838477	RODRIGUEZ	JARAMILLO	HAROLD LISANDRO	INSTALACION MESONES GRANI	O+	NA	NA	NA	01/04/2025	INGRESO
84	X		1058325236	GONZALEZ	LINARES	LINA YURANY	ASEO	O+	NA	NA	14/03/2025		ACTIVO
85	X		8190700	AGUIRRE	MARIN	JORGE ALBERTO	PUERTAS DE MADERA	A+	NA	NA	17/03/2025		ACTIVO
86	X		1121842688	AGUIRRE	SOZA	JORGUE ALBERTO	PUERTAS DE MADERA	A+	NA	NA	17/03/2025		ACTIVO
87	X		91323954	URIBE	RANGEL	ANTONIO JOSE	AYUDANTE	O+	NA	NA	18/03/2025		ACTIVO
89	X		98587740	TORRES	MOSQUERA	RAMON FREDY	OFICIAL	O+	NA	NA	20/03/2025		ACTIVO
91	X		80083331	MORALES	MUÑOZ	CARLOS ANDRES	OFICIAL	O+	NA	NA	20/03/2025		ACTIVO
92	X		10555629	CASTILLO	CAMBINDO	JOSE DOLORES	OFICIAL	O+	NA	NA	22/03/2025		ACTIVO
93	X		79711231	ESPITIA	QUIASUA	JHON HERNANDO	OFICIAL	A+	NA	NA	NA	07/04/2025	ACTIVO
94	X		1121909478	CARDENAS	RODRIGUEZ	ENER	OFICIAL	O+	NA	NA	NA	08/04/2025	ACTIVO

4.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

NOMBRE	CARGO	DEDICACION	OBSERVACIONES
Ing. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR	Director de Obra	50%	

Ing. FABIAN CAMILO CASTAÑEDA ACOSTA	Residente de Obra	100%	
Ing. LUIS FERNANDO GRACIA ORTIZ	Especialista en Estructuras	10%	
Ing. ALIRIO ZULETA YATE	Ingeniero Electricista	10%	
ING. HUGO ANDRES MORALES CALDERÓN	Ingeniero Hidráulico	10%	
LEIDY MILENA DUQUE ROJAS	Profesional en Salud Ocupacional	100%	

4.3. PERSONAL MINIMO REQUERIDO CONSORCIO INTERCONSULTORES

NOMBRE	CARGO	DEDICACION	OBSERVACIONES
Ing. Ma. LUCRECIA LOPEZ AROCA	Directora de Interventoría	50%	
Arq. JHON ALEXANDER PEREZ LOPEZ	Residente de Interventoría	100%	
Ing. MADELEINE KATHERIN MOSQUERA IBAGOS	Ingeniero Ambiental	50%	
Ing. LUIS ANGEL ESPITIA LOPEZ	Especialista en Estructuras	30%	
Ing. MAURO ANDRES HINCAPIE DUQUE	Ingeniero Eléctrico o Electricista	30%	
Ing. LUIS ALEJANDRO MURCIA SALAMANCA	Especialista hidráulico y/o hidrosanitario	30%	
JUAN CARLOS MARTINEZ ROA	Profesional en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	

5. INFORME FINANCIERO

5.1. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODOD

Teniendo en cuenta el presente informe del 04 de marzo al 03 de abril de 2025 el avance de esta interventoría corresponde al 79,15% con un valor ejecutado de $360.049.416,12; de acuerdo con la forma de pago del contractual.

El porcentaje de ejecución para el avance de obra del 04 de marzo al 03 de abril de 2025, corresponde al 70,22% con un valor ejecutado de $2.277.721.161,98.

5.2. AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL.

A la fecha se encuentra que únicamente se dio trámite para el acta parcial 2 del contratista, que corresponde al 49,95% de avance de los trabajos de obra, correspondiente a la actualización del valor de la obra.

CONTRATO DE OBRA	
VALOR INICIAL	$ 2.945.313.493,00
ADICIÓN No. 1	$ 298.497.863,49
VALOR TOTAL CONTRATO (ADICION)	$ 3.243.811.355,94
FACTURADO	$ 1.619.922.300,76
PAGADO	$ 1.619.922.300,76
VALOR PENDIENTE POR CAUSAR Y/O FACTURAR	$ 1.623.889.054,73

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL	$ 303.248.028,00
ADICIÓN No. 1	$ 151.624.014,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 458.872.042,00
FACTURADO	$ 227.244.975,02
PAGADO	$ 227.244.975,02
VALOR PENDIENTE POR CAUSAR Y/O FACTURAR	$ 227.627.066,98

5.3. INVERSIÓN ANTICIPO

En el presente contrato NO se contempló anticipo de obra, por lo cual, no se relaciona la inversión del mismo.

5.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

En el presente contrato NO se contempló anticipo de obra, por lo cual, no se relaciona excedentes ni rendimientos financieros.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

6.1. OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los compromisos, enunciados en el numeral 1.2 Compromiso Anticorrupción de este pliego de condiciones.	X		Se encuentra en ejecución
2	Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.	X		Se encuentra en ejecución
3	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.	X		Se encuentra en ejecución
4	Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del documento.	X		
5	Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier modificación del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores,	X		

No.	OBLIGACIONES GENERALES:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique el garante en los términos establecidos por él.			
6	Permitir en cualquier momento a la Interventoría, entes de control y a los demás servidores o funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren realizando con ocasión al objeto del contrato.	X		Se encuentra en ejecución
7	Suministrar a la Entidad y a la Interventoría, cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier aspecto de la obra objeto del contrato.	X		Se encuentra en ejecución
8	Presentar a la Interventoría durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas para pago del contrato de obra. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el ítem "FORMA DE PAGO", del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligación.			Se encuentra en ejecución
9	Presentar a la Interventoría la solicitud de suspensión y de reinicio del contrato y requerir con al menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga o adición debidamente soportado y justificado de requerirlo.			A la fecha no se ha presentado
10	Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes.	X		Se encuentra en ejecución

6.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Suscribir junto con la Interventoría, el acta de inicio del contrato de obra, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías.	X		
2	Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría lo siguiente	X		
2.1	PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA EN PROJECT O SOFTWARE DE PROPÓSITO SIMILAR: En medio magnético del programa y en PDF, dentro de la cual deberá especificar los tiempos a desarrollar la presente contratación, teniendo en cuenta el plazo de ejecución establecido por la entidad y deberá tener en cuenta el sitio en que se va a desarrollar la obra, naturales, geológicas, climáticas, garantizando la ejecución del proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta y actualizada en el campamento de obra. Así mismo tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: Programa de Trabajo e inversiones: Es el reconocimiento, en forma descriptiva, del modo en que el CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra, constituida en días enteros en función del plazo establecido en el contrato; para tal fin el CONTRATISTA se obligará a estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que será convocada y presentará el programa de construcción mediante el cronograma de barras o "Diagrama de Gantt", estrictamente de acuerdo con la metodología y conformación a continuación relacionada: Para su elaboración y la de cada uno de sus componentes que hacen parte de la programación requerida deberá utilizar software para planeación de proyectos, tal como Microsoft Project®, Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera Project Planner® u otro similar. La programación de la obra deberá presentarse de la siguiente manera: • El CONTRATISTA debe definir el programa de ampliación de acuerdo con las necesidades del	X		Se entrego, de acuerdo con las condiciones contractuales iniciales y en cada una de las modificaciones realizadas.

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	proyecto, las especificaciones de construcción, el proceso constructivo técnicamente viable, con los rendimientos y tipos de cuadrillas definidos, las cantidades de obra y el plazo establecido. • El plazo y el valor del programa de obra presentado debe ser estrictamente igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta. • El plazo no debe superar al plazo establecido dentro del contrato. • El cronograma de barras o "Diagrama de Gantt" deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre de los Ítems, duración del ítem, iniciación y terminación del ítem, holgura total, ítems predecesores o antecesores. La programación se presentará en días NO CALENDARIZADOS Y por Items en función del plazo establecido, el programa deberá identificar todos los Ítems que componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, deberá elaborarse por el método Pert, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project o similar, este deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución de los capítulos, incluyendo como mínimo los siguientes reportes: a) En el Diagrama de Gantt Se deberá como mínimo describir la siguiente información de verificación complementada así: • Nombre del capitulo • Duración • Valor del ítem • Precedencias • Comienzo • Fin • Número del ítem • Holguras • Limite de comienzo • Limite de finalización • Demora permisible • Margen de demora total • Ruta crítica de ejecución b) En el Diagrama de Pert.			

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	En el Diagrama de Pert. se deberá como mínimo describir la siguiente información de verificación complementada así: • Nombre del capítulo Duración • Precedencias • Número del ítem • Holguras • Limite de comienzo • Limite de finalización • Demora permisible • Margen de demora total • Ruta crítica de ejecución c) FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO: El CONTRATISTA deberá presentar el flujo de inversión, expresado en pesos conforme a la oferta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del deberá realizarse utilizando una aplicación software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) contenidas en el presupuesto de obra, discriminadas por semanas y compiladas por mes. d) CUADRO DE RENDIMIENTO Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, de acuerdo con el análisis realizado a él o los ítem que la componen, señalando para la actividad su número, su descripción, su nomenclatura de identificación (de ser el caso) y la duración de la misma y para el caso del o de los ítem constituyentes, estos deben consignar el identificador del ítem, descripción, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, numero de cuadrillas utilizadas y su duración en días o su asignación a criterio del proponente cuando corresponda a suministros. Se recalca el hecho que el contratista deberá presentar una programación de obra por ítems, los cuales deberán estar asociados de forma coherentes y correspondiente con la esencia de su actividad.			

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	Las duraciones de cada ítem que compone cada actividad deberán ser correspondientes con los con los rendimientos y tipos de cuadrillas definidos por el contratista. Se pueden aplicar los principios de simultaneidad o de secuencia de los ítems constituyentes de la actividad, para definir su duración. Para el caso de considerar la simultaneidad del o de los ítems constituyentes de cada actividad, se tendrá en cuenta el ítem con mayor incidencia o cantidad, el cual determinará la duración de la misma, por otro lado, si se aplica el principio de secuencia, este debe verse reflejado en la construcción de los diagramas que exijan discriminación de los ítems que constituye cada actividad (Lista de Actividades y Diagrama de Gantt de persona). DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o cuadrillas utilizadas, como elemento de soporte a la labor de la interventoría y la supervisión, el contratista deberá entregar el diagrama de GANTT de personal, con las barras que describen el desarrollo de cada actividad, utilizando para su construcción los tiempos que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se señaló en el desarrollo de la misma, sobre las cuales se debe reseñar la actividad (identificación de la actividad y la duración de la misma), de acuerdo a lo fijado previamente por el contratista y en el flujo de personal por tareas. Para tal fin, se exige la discriminación en el cuadro de Gantt de personal, para cada ítem que componen a cada actividad, con los datos relacionados a: ÍTEM, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada uno de ellos. Las barras que señalan los tiempos y duraciones de cada ítem deben poder determinar el momento en que se utilizan las cuadrillas señaladas por el contratista, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad o de secuencia, para la ejecución de los ítems que constituyen cada actividad. f) Histograma de Personal Se establece una tabla que contenga el número de personas trabajando en cada Actividad a diario, es de aclarar que el número de personas de la actividad en cada día será el producto			

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	del número de personas por cuadrilla y el número de cuadrillas realizando la actividad en este día, lo que nos permitirá saber cuántas personas en total realizaran actividades diarias. Actividad | Descripción | Nº de Personas diarias 1 2 3 4 5 6 7 8 total Los Análisis de Precios Unitarios APUs que soportan la oferta económica presentada. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo de trabajo del contratista de obra. Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra.			
2.2	Los Análisis de Precios Unitarios APUs que soportan la propuesta económica presentada. Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán cubrir todos costos, directos e indirectos, que implique la ejecución de las obras, como equipos, materiales y mano de obra, teniendo en cuenta además los factores de producción, transporte y las condiciones de la zona como régimen de lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotación y producción de los agregados pétreos, todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los ítems enunciados y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos y contribuciones y utilidades del Contratista. Los valores de mano de obra de acuerdo con la estructura del "Análisis de Precios Unitarios" deberán afectarse por el factor prestacional que el contratista debe discriminar presentando de igual manera como anexo el "Cálculo del Factor Prestacional", en caso de que el contratista considere que el factor prestacional se ve afectado por otros aspectos diferentes a los considerados en el "Cálculo del Factor Prestacional", deberá relacionarlos	X		Se entrego, de acuerdo con las condiciones contractuales iniciales y en cada una de las modificaciones realizadas. A la fecha se han presentado 55 actividades no contractuales.

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	anotando el porcentaje que aporta cada uno al factor prestacional. Los precios unitarios deben cubrir los costos por concepto de señalización, autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, planos récord de construcción y demás costos inherentes al proyecto, incluidos en el factor A.I.U. Asimismo, el contratista deberá presentar como anexo la discriminación de la "Determinación de factor A.I.U." Para elaborar los análisis de precios unitarios correspondientes a los ítems señalados, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: - Que estén de acuerdo con los ítems de pago de las especificaciones generales y particulares dadas en el presente pliego. - Las condiciones de la región en cuanto a los costos básicos y la disponibilidad de mano de obra, materiales de construcción, factores de producción, régimen de lluvias, accesos a los sitios de trabajo y demás aspectos que puedan influir en el costo final de los precios unitarios. - La unidad de medida deberá estar de acuerdo con la especificación. - Los precios de los materiales deben corresponder a valores actualizados. Es necesario relacionar las cantidades requeridas para ejecutar cada Ítem, incluyendo desperdicios y los materiales auxiliares y o adicionales transitorios. - Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocación incluyendo todos los fletes. - En la mano de obra se deben considerar los jornales de las cuadrillas y de personal especializado teniendo en cuenta el jornal básico o el vigente en la región, afectado del porcentaje de prestaciones sociales de acuerdo con disposiciones legales vigentes. Los rendimientos establecidos deberán ser el resultado de un estudio cuidadoso que determine óptimamente el tiempo de ejecución de la unidad del ítem considerado. - En la determinación de los costos indirectos se deben tener en cuenta las condiciones de la zona y la localización de la obra con respecto a los centros de producción y abastecimiento, discriminando los gastos			

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	por administración y los porcentajes para imprevistos y utilidad.			
3	Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoría, dentro de cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones de construcción, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes y/o demás información técnica que sea suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto, los cuales deberán ser recibidos a satisfacción por el contratista durante la etapa construcción. Por lo anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la Interventoría que registre la revisión y aceptación de la información entregada.	X		Se informo a la Entidad, en su momento que la información entregada, no era suficiente; por lo cual se tuvo que realizar diseños a las diferentes áreas de intervención como fueron, diseños Hidrosanitarios, Eléctricos y Estructurales; los cuales hicieron parte del ítem 1.01 Ajuste de diseños estructural, redes eléctricas, aguas lluvias e hidrosanitarias. Incluye planos as built.
4	Revisar y analizar al inicio del contrato conjuntamente con la interventoría, veinte (20) días hábiles, la información técnica definida por la entidad; posteriormente hacer entrega a la misma, dentro del plazo definido en el cronograma, de los entregables relacionados con la primera etapa del objeto del contrato, de acuerdo con el anexo técnico de entregables y las especificaciones técnicas de estudios y diseños, debidamente aprobados por la Interventoría.	X		La información entregada, fue técnicamente insuficiente por lo cual dentro del desarrollo del contrato se tuvo que realizar diseños a las diferentes áreas de intervención como fueron, diseños Hidrosanitarios, Eléctricos y Estructurales; los cuales hicieron parte del ítem 1.01 Ajuste de diseños estructural, redes eléctricas, aguas lluvias e hidrosanitarias. Incluye planos as built.
5	Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las modificaciones, ajuste o complementación que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes técnicos del proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar.			Se han presentado durante la ejecución del Contrato.
6	Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad vigente, la calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al cronograma de obra, de conformidad con los diseños y demás especificaciones técnicas definidas para la obra, ciñéndose estrictamente a los planos e indicaciones suministradas por la Interventoría del contrato y las condiciones señaladas en las licencias,	X		Se encuentra en ejecución.

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, el contratista se compromete a disponer todos los equipos, máquinas e implementos y personal para la correcta y oportuna ejecución del contrato.			
7	Programar y realizar la adquisición de mobiliario, equipos y demás elementos requeridos, previendo los correspondientes tiempos de importación, nacionalización y/o fabricación, entre otros según se requiera; con el fin de dar cumplimiento al cronograma de la obra y ejecución del objeto del contrato en el plazo establecido.			En el periodo no se han presentado la presente condición contractual
8	Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la ejecución del contrato de obra. Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y personal especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones establecidos en el contrato. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra. Realizar revisiones periódicas del estado de su equipo, (Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones o retrasos en el desarrollo de la obra.	X		El contratista de obra, ha contratado diferentes empresas especializadas para la ejecución del Objeto contractual.
9	Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las especificaciones técnicas definidas para la ejecución de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos.	X		Se encuentra en ejecución, se han presentado las respectivas fichas técnicas para su cumplimiento.
10	Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en los sitios indicados o donde indique por escrito la Interventoría del contrato, así como responder y garantizar la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1480 de 2011.	X		Se encuentra en ejecución
11	Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y protección contra cualquier daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras, instalaciones de redes de	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	servicios, entre otros; dentro del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su exclusiva responsabilidad responder y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo señalado por el artículo 2060 del Código Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato, de conformidad con la ley.			
12	Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o bienes que no cumplan con lo previsto en los planos entregados, especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos de fabricación o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.	X		Se encuentra en ejecución
13	Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega física de la misma a la Interventoría y a la Entidad.	X		Se encuentra en ejecución
14	Presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. El plan de la calidad debe indicar como van a llevarse a cabo las actividades requeridas, ya sea directamente o por referencia a los procedimientos documentados apropiados:	X		
15	Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en los términos del Decreto No. 1443 de 2014 "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo(SG-SST) compilado en el Decreto No. 1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA1610560 DE 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 (treinta) días calendario posteriores a	X		

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de obra, para su revisión y aprobación. Los documentos revisados y aprobados por la Interventoría serán remitidos a la Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de Interventoría. Los atrasos ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los documentos serán atribuibles al Contratista y a la Interventoría.			
16	Obtener para la Entidad y previo concepto de la Interventoría las licencias, permisos y/o autorizaciones que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del proyecto. Garantizando además la conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con estos trámites están a cargo del Contratista.	X		A la fecha no se ha realizado ningún trámite.
17	Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto entre el Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.	X		Se encuentra en ejecución
18	Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones dadas por la interventoría externa contratado. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, tanto generales como particulares acordados.	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
19	Presentar a la Interventoría para su revisión y aprobación, las actividades no previstas identificadas por el Contratista durante la etapa de planeación de inicio de actividades o en la ejecución de las mismas, para lo cual deberá adjuntar: a) Una justificación técnica y detallada de la necesidad. b) El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con base en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de precios de insumos de construcción tales como "construdata", "revista constructora" o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado colombiano "datos abiertos", o de listados de precios usados por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública. c) Especificaciones técnicas, d) Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra o actividades no previstas. e) Memorias de cálculo de cantidades f) Programación de obra actualizada de ejecución del balance del contrato. g) Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el correspondiente trámite ante la entidad. Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez será responsable de verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación de las	X		Se presento en para la modificación del 23 de diciembre de 2024, como soporte

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	actividades no previstas que se requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno. Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta misma obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la interventoría. Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán mediante la suscripción entre la interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los nuevos APU's aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades no previstas, la interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra,			

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	sin verificar la legalización de la respectiva modificación del contrato de obra.			
2.20	Realizar reuniones semanales con la interventoría para evaluar el avance del contrato de obra y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con la programación de la obra.	X		Se encuentra en ejecución
2.21	Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de avance real de las labores contratadas, para ser entregado a la interventoría.	X		Se encuentra en ejecución
2.22	Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el cual debe incluir los porcentajes de avance, gráficos, fotografías, video en formato digital y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas, para ser entregado a la interventoría dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes.	X		Se encuentra en ejecución
23	Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y entregar copia digital como anexo del informe mensual, para ser entregado a la interventoría.	X		Se encuentra en ejecución
24	Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que estén obligados, que se generen y que hagan parte de la ejecución del contrato. Incluidos los cortes e informes mensuales previamente aprobados por la Interventoría y el Coordinador del proyecto.		X	Se han presentado los respectivos informes; falta subirlos a la plataforma SECOP II
25	Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo con la normatividad vigente, el plan de calidad de los materiales y las instrucciones de la interventoría, presentando los resultados al mismo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y entregar una copia de los mismos en el informe mensual. En el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de un resultado satisfactorio para la interventoría, el Contratista deberá, a su costo, desarrollar las actividades correctivas, hasta que obtenga la aprobación de la interventoría.	X		Se encuentra en ejecución
26	En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará a la Interventoría del contrato			No se ha presentado esta condición.

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	el plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante Legal. Sobre este plan, la Interventoría deberá pronunciarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de su recibo. La Interventoría podrá aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta observaciones, el Contratista deberá atenderlos en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. Esto se realizará hasta que obtenga la aprobación de la Interventoría.			
27	Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos y presentarle los soportes correspondientes para su aprobación. El valor de los imprevistos no podrá superar el valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la oferta económica. En el caso de que alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.	X		Se encuentra en ejecución
28	Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante.	X		Se encuentra en ejecución
29	Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los entes de control, con sus respectivos soportes.			A la fecha no se ha solicitado
30	Suscribir junto con la Interventoría, el acta de entrega y recibo final de la obra, en la cual debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el contratista deberá entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), memorias de cálculo con registro fotográfico a todo color de cada uno de los ítems ejecutados, todos los planos récord de las obras ejecutadas (Arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos,			A la fecha el contrato se encuentra en ejecución, obligación que se realiza al terminar el contrato.

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	sanitarios, etc.), bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños, certificaciones de calidad de los materiales, informes de las pruebas de estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del contrato.			
31	Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la vigencia de la Garantía de Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan costos para la Entidad. Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos, reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que presenten deficiencias de calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento por causa imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá genera un informe detallado y registro fotográfico de las intervenciones realizadas.	X		A la fecha el contrato se encuentra en ejecución, por parte del Consorcio Infraestructura A&V, de las actividades que se han desarrollado a la fecha.
32	Prestar el servicio de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo integral sin costo adicional para la entidad, durante un periodo no inferior a un (1) año posterior a la firma del acta de recibo final de la obra, para el equipo de presión redes hidrosanitarias suministrado con el contrato. Para lo cual el contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría el Plan de Mantenimiento Preventivo con un cronograma de aplicación, donde se establezcan el número y las condiciones para la prestación de los servicios de los mantenimiento preventivos, el cual deberá obedecer a las recomendaciones establecidas por los fabricante o distribuidores de los equipos así como de las garantías técnicas correspondientes, para lo cual deberá tener en cuenta, la provisión e instalación de insumos, partes, piezas, repuestos, accesorios y mano de obra especializada, dentro de la debida oportunidad, para ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar la funcionalidad y operatividad de los equipos y sistemas que los		X	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución, obligación que se realiza al terminar el contrato.

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	componen, incluyendo los mantenimientos correctivos y reparación de los bienes en caso de daño o defecto de funcionamiento. Parágrafo: El Plan de Mantenimiento Preventivo y cronograma de visitas debe ser presentado a la interventoría del contrato, al momento de la suscripción del acta de recibo final y enviar un informe detallado de las intervenciones realizadas en dichas visitas.			
33	Brindar a la Interventoría y al Supervisor del contrato de interventoría, la colaboración necesaria para la elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato. Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvos de encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecutó el contrato.		X	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución, obligación que se realiza al terminar el contrato.
34	Entregar a la interventoría para cada pago y en la Liquidación del contrato de obra, las certificaciones y soportes con los que acredite que se encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de prestación de servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.		X	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución, obligación que se realiza al terminar el contrato.
35	Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales realizados durante el proceso de selección de contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un		X	Se encuentra en ejecución, el cual se hace uso dependido de la actividad a ejecutar y necesidades de las áreas y actividades a realizar.

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso de selección.			
36	El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles definidos en la "Tabla 2 – Cuadro requisitos del personal del contratista" incluida en el Anexo 1 – Especificaciones y Características Técnicas del Proyecto. Esta obligación debe ser revisada por la Interventoría, en cada una de las etapas contractuales.	X		Se encuentra en ejecución
37	Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado.	X		Se encuentra en ejecución
38	Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar las intervenciones; cuando estas se deban desarrollar en diferentes áreas del Palacio de Justicia, el contratista deberá garantizar la ejecución de actividades de manera simultánea en las mismas conforme con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecución del contrato, conforme con el cronograma de ejecución y el tiempo pactado.	X		Se encuentra en ejecución
39	Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva del Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	X		Se encuentra en ejecución
40	Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente. Parágrafo: En el caso del personal de la Interventoría esté vinculado mediante contrato de prestación de servicios, es necesario que allegue la certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.			
41	Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la interventoría del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.	X		Se encuentra en ejecución
42	Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma. Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor o Coordinador del contrato, en el evento que éste realice una visita de inspección durante el desarrollo de la obra	X		Se encuentra en ejecución
43	Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
44	Durante todo el tiempo de desarrollo de los trabajos de la obra es obligación del Contratista mantener el aseo general, orden y protección. Igualmente deberá aislar adecuadamente con polisombra las zonas de trabajo a intervenir, realizar la protección de los enseres, equipos o elementos existentes en la zona y que se encuentren en riesgo de afectación por las obras y mantener la correcta disposición en el almacenamiento de insumos, materiales y retiro oportuno de los escombros sobrantes de obra.	X		Se encuentra en ejecución. Se ha realizado el aislamiento de acuerdo con las actividades contractuales.
45	En caso de presentarse eventos de lluvias, el contratista dispondrá a su costo los equipos y elementos necesarios para mantener completamente protegida la zona a intervenir y evitar que las aguas afecten el desarrollo de las obras, los elementos existentes y la calidad de los mismos.	X		Se encuentra en ejecución
46	En aras de dar cumplimiento en el plazo establecido, el contratista previa concertación con el Interventor y la Supervisión, dispondrá de personal para jornadas laborales de 24 horas los 7 días de la semana.	X		Se encuentra en ejecución
	Nota 1: El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.	X		Se encuentra en ejecución
	Nota 2: El contratista es el único responsable por la vinculación de personal la cual realiza a su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la Entidad adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al contratista el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones, así como las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, Salud, Pensión, ARL, y parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X		Se encuentra en ejecución
	Nota 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN- Con la suscripción del contrato el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011.			
	Así mismo se obliga a no celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso contractual.	X		Se encuentra en ejecución

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONSORCIO INTERCONSULTORES

7.1. OBLIGACIONES GENERALES

No.	OBLIGACIONES GENERALES:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los compromisos, enunciados en el numeral 1.2 Compromiso Anticorrupción de este pliego de condiciones.	X		Se encuentra en ejecución
2	Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural.	X		Se encuentra en ejecución
3	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.	X		Se encuentra en ejecución
4	Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015 y solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones que se llegaran a	X		

No.	OBLIGACIONES GENERALES:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del documento.			
5	Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier modificación del estado del riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación que le indique el garante en los términos establecidos por él.	X		Se actualizan pólizas; de acuerdo con la modificación del contrato realizada a la fecha.
6	Permitir en cualquier momento a la supervisión, entes de control y a los demás servidores o funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren realizando con ocasión al objeto del contrato.	X		Se encuentra en ejecución
7	Suministrar a la Entidad cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier aspecto de la obra objeto del contrato.	X		Se encuentra en ejecución
8	Presentar a la Entidad durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas para pago del contrato de Obra. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el ítem "FORMA DE PAGO", del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligación.	X		Se entregan a la Supervisión en el momento que esta interventoría de aval y aprobación a las Actas entregadas por el Contratista de Obra.
9	Presentar al supervisor del contrato, previa revisión y aprobación del interventor, las solicitudes que realice el contratista de obra para suspensión o reinicio del contrato; y con al menos con un (1) mes de anterioridad las solicitudes de prórroga y/o adición, debidamente soportada y justificada por el contratista de obra.			El Contratista de Obra – Consorcio Infraestructura A&V no ha presentado durante la ejecución de contrato ninguna suspensión a la Interventoría.
10	Presentar al supervisor del contrato para su revisión y aprobación, las solicitudes de prórroga y/o adición del contrato de interventoría, debidamente soportadas y justificadas, para lo cual deberá tener en cuenta los costos de personal y otros gastos variables establecidos en la propuesta presentada por la interventoría, según se requieran en esa etapa del proyecto.	X		A la fecha se han presentado 1 Modificatorio.

No.	OBLIGACIONES GENERALES:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
11	Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes.	X		Se encuentra en ejecución

7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral del contrato de obra que tiene por objeto: "Realizar las adecuaciones y mantenimientos al Palacio de Justicia de Villavicencio".	X		Se encuentra en ejecución
2	Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista de obra el cumplimiento exacto de sus obligaciones en los tiempos acordados, con las especificaciones técnicas descritas en el Proceso de Contratación, con la calidad pactada y costos asociados	X		Se encuentra en ejecución
3	Realizar el control, vigilancia y/o las gestiones necesarias para la oportuna ejecución de actividades dentro del cronograma pactado de Obra.	X		Se encuentra en ejecución, y de acuerdo con las cantidades y actividades aprobadas se le da seguimiento a la programación presentada por el contratista de obra.
4	Suscribir junto con la supervisión, el Acta de inicio del contrato de interventoría, dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías del contrato de interventoría por parte de la Entidad.	X		
5	Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar, aprobar y enviar al supervisor dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrega por parte del Contratista de obra de los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, los documentos relacionados a continuación, los cuales deberán ser remitidos al supervisor y exigir su cumplimiento durante toda la ejecución del contrato e informar al supervisor de cualquier novedad:		X	La información no se entregó dentro de los 5 días calendario; pero ya fue entregada a la Entidad

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
a	PROGRAMACIÓN DETALLADA DE OBRA EN PROJECT O SOFTWARE DE PROPÓSITO SIMILAR: En medio magnético del programa y en PDF, dentro de la cual deberá especificar los tiempos a desarrollar la presente contratación, teniendo en cuenta el plazo de ejecución establecido por la entidad y deberá tener en cuenta el sitio en que se va a desarrollar la obra, naturales, geológicas, climáticas, garantizando la ejecución del proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta y actualizada en el campamento de obra. Así mismo tendrá en cuenta consideraciones establecidas por la entidad.	X		
b	Los Análisis de Precios Unitarios (APUs) presentados por parte del Contratista de obra que soportan la propuesta económica presentada. Los APUs aprobados, junto con el certificado de aprobación, deben ser remitidos al supervisor del contrato, debidamente suscrito y en original.	X		
c	Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo de trabajo del contratista de obra.	X		
d	Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra.	X		
6	Suscribir el acta de inicio del Contrato de Obra. Parágrafo: La Interventoría deberá revisar, verificar y conminar al contratista para que el contratista de obra entregue en debida forma y cargue en el SECOP II las garantías requeridas en el contrato de obra, en los términos allí establecidos.	X		
7	Revisar y analizar conjuntamente con el contratista de obra, dentro de cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones de construcción, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes y/o demás información técnica que sea suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el desarrollo normal del proyecto, los cuales deberán ser recibidos	X		Se reviso los documentos entregados por la Entidad, y el personal de apoyo del Contratista de Obra e Interventoría realizaron y revisaron respectivamente los diseños que se están implementando en la actualidad

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	a satisfacción por el contratista durante la etapa construcción. Por lo anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la Interventoría que registre la revisión y aceptación de la información entregada.			
8	Analizar y emitir concepto técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental, sobre las sugerencias, reclamaciones, consultas y/o solicitudes de modificación, ajuste o complementación que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes del proyecto antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay lugar, que sean necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. Los cuales deberán ser emitidos por los profesionales idóneos con que la Interventoría debe contar para tal fin; dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo y dar traslado de la misma a la Entidad. Así mismo, apoyar a la Entidad en las respuestas a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra.	X		Se encuentra en ejecución
9	Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, puede en cualquier momento, exigir al contratista de obra la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas, ambientales y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.	X		Se encuentra en ejecución
10	Expedir para efectos de pago del Contrato de obra las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras, ambientales y administrativas del Contratista de obra. La certificación de cumplimiento que expide la Interventoría constituye la prueba de la verificación y aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista de Obra.	X		Se encuentra en ejecución
11	Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de las actas de recibo, solo cuando dichas actas hayan sido previamente aprobadas por el Supervisor de la Interventoría. Solo se incluirán en el	X		A la fecha el Contratista de Obra ha entregado dos Actas Parcial y estas han sido canceladas por la Entidad Contratante.

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	acta y solo se facturarán los ítems sobre los que no haya controversia.			
12	Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de obra del ordenamiento jurídico colombiano y en especial de las siguientes normas:			
I	Ley 1383 de 2010, por lo que debe verificar que el contratista de obra cumpla con los permisos requeridos para el transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación).	X		Se encuentra en ejecución
II	Decreto Nacional No. 392 de 2018, por lo que debe vigilar, controlar y exigir al contratista de obra que durante la ejecución del contrato mantenga en su planta de personal el número de trabajadores en condición de discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor en el proceso exigiendo el certificado expedido por el Representante Legal del contratista de obra en el que establezca y demuestre que cumple con dicho requisito.	X		Se encuentra en ejecución
III	Decreto Nacional No. 1072 de 2015, por lo que le corresponde verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra respecto de la normatividad en (i) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y (ii) el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos laborales y Parafiscales, cuando haya lugar, del personal que se utilice durante la ejecución del contrato de obra, conforme con lo estipulado en el artículo 2.2.4.6.28 de la norma citada.	X		Se encuentra en ejecución
IV	Resolución No. 4386 del 09 de octubre de 2018, "Por la cual se crea e implementa el Registro único de Trabajadores Extranjeros en Colombia RUTEC", expedida por el Ministerio del Trabajo, cuando en la ejecución del contrato se vinculen o contraten personas extranjeras.			N/A
V	Normatividad sobre el medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato. Así mismo, debe	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	verificar y exigir que el Contratista de obra minimice el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por el Contratista de Obra en el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables.			
13	Acompañar jurídica y técnicamente a la Entidad durante los procesos sancionatorios contractuales o de afectación de garantías, rendir los testimonios que sean decretados y presentar los informes técnicos que le sean requeridos.			N/A
14	Proyectar para la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio la respuesta jurídica, técnica, contable y financiera ante reclamaciones por presunto desequilibrio económico o mayor permanencia de obra.			N/A
15	Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de Obra, con el propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de ejecutar las labores objeto del contrato que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: permisos para aprovechamiento forestal, sustracción de reserva o levantamiento de veda, concesión de aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos, permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos temporales, obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo del proyecto. Así como a los trámites realizados con el propósito de obtener las licencias y permisos que se requieran con el fin de realizar la conexión efectiva de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. Los costos asociados a estos trámites de licencias y permisos estarán a cargo del Contratista de Obra.	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
16	Cumplir con los horarios de trabajo, definidos conjuntamente con el Contratista, la Interventoría y el Supervisor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta las condiciones específicas de la ciudad, la sede y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	X		Se encuentra en ejecución
17	Requerir por escrito al contratista de obra sobre cualquier aspecto requerido para el cumplimiento de este contrato. Para ello, deberá documentar con las formalidades requeridas e informar si el contratista de obra se rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la Interventoría. En estos casos, la Interventoría le notificará por escrito al contratista de obra sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, la Interventoría debe comunicar dicha situación a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio para que inicie el proceso de incumplimiento contractual.	X		Se encuentra en ejecución
18	Estudiar, evaluar y aprobar (o no) los ítems no previstos identificados y presentados por el Contratista durante la planeación de actividades o en la ejecución de las mismas, para lo cual este deberá realizar el correspondiente análisis y verificación de lo entregado por el contratista:	X		Se evaluaron las actividades no previstas; de acuerdo con la modificación del contrato realizada a la fecha.
I	Justificación técnica y detallada de la necesidad.	X		Se presento; de acuerdo con la modificación del contrato realizada a la fecha.
II	Análisis de Precios Unitarios (APU) soportados en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de precios de insumos de construcción tales como "construdata", "revista constructor" o cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado colombiano "datos abiertos", o de listados de precios usados por	X		Se evaluaron las actividades no previstas; de acuerdo con la modificación del contrato realizada a la fecha

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública.			
III	Especificaciones técnicas de los ítems no previstos,	X		
IV	Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos.	X		Se presento balance actualizado; de acuerdo con la modificación del contrato realizada a la fecha
V	Programación de ejecución de obra actualizado según balance del contrato.	X		Se presento programación; de acuerdo con la modificación del contrato realizada a la fecha
VI	Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el correspondiente trámite ante la entidad.	X		Se presento; de acuerdo con la modificación del contrato realizada a la fecha
	Parágrafo 1. Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez deberá revisar la información recibida y realizar la validación y comparación de los precios teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación de los ítems no previstos que se requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno.	X		Se presento; de acuerdo con la modificación del contrato realizada a la fecha
	Parágrafo 2. En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para la fijación de los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta misma obligación que le permitan verificar las presentadas por el contratista de obra, esta	X		

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios elaborados por la interventoría acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la interventoría.			
	Parágrafo 3. La aprobación de las actividades no previstas se formalizará mediante la suscripción entre interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, acompañada de los nuevos APU's aprobados por la interventoría y/o supervisión según corresponda y el balance de obra actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados los ítems no previstos, la interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos dentro del contrato haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva modificación del contrato de obra.	X		
19	Impedir que el contratista de obra ejecute mayores cantidades sin que se cuenten con los recursos en el contrato para su pago y verificar que se dé aviso previo al garante.	X		Se encuentra en ejecución
20	Revisar mensualmente la proyección de cantidades de obra del contrato e informar inmediatamente a la Entidad en caso de evidenciar un posible agotamiento del recurso financiero o del tiempo de vigencia del contrato que impida completar la obra en los términos previstos.	X		Se encuentra en ejecución
21	Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los porcentajes de avance real de las labores contratadas, el cual debe ser entregado al	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	supervisor. El Informe debe ser cargado en la plataforma informática que indique la Entidad.			
22	Elaborar mensualmente un Informe de Interventoría detallando el estado y avance del contrato de obra, el cual debe incluir porcentajes de avance, gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas, rendimientos financieros generados en la fiducia producto del anticipo entregado al Contratista de obra y certificar el cumplimiento de: el Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y del documento Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). El Informe debe ser cargado en la plataforma informática que indique la Entidad.	X		Se encuentra en ejecución
23	Revisar los videos e informes presentados por el Contratista de Obra, confirmar que se cargue la información en la plataforma informática que indique la Entidad y allegarlos en original al supervisor del contrato, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por parte del Contratista de Obra, con el correspondiente concepto de cumplimiento técnico, jurídico, financiero y contable emitido por la Interventoría. Los informes suscritos y en original debe ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	X		Se encuentra en ejecución
24	Evaluar el avance de ejecución del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a presentar a través de comités de obra semanales con el Contratista de obra. Lo anterior de acuerdo a la programación de obra del contrato. De dichos comités deberá dejarse constancia en acta, documento que debe ser allegado a la Entidad a través del supervisor del contrato, en copia, a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la realización del Comité. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	X		Se encuentra en ejecución
25	Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al ordenador del gasto en los que dé cuenta de las obligaciones incumplidas por el			N/A

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	contratista de obra en caso de presentarse. Dichos informes deben incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, las normas y cláusulas presuntamente violadas, la tasación de los perjuicios en caso de requerirse y adjuntar las pruebas o evidencias que tiene en su poder. De igual manera se deben realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, contables y ambientales a que haya lugar. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.			
26	Publicar toda la información relevante del contrato aprobada por el supervisor, como son: programación de obra, acta de inicio, pólizas, informes semanales, mensuales, actas de pago parciales y final, entre otros; en la Plataforma SECOP II y/o aplicativo que disponga la entidad.		X	Pendiente de la publicación de documentos
27	Solicitar al Contratista de Obra la ejecución de las pruebas de calidad del concreto de acuerdo con la normatividad vigente y el Plan de Calidad, cuyos resultados deben ser entregado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, previo análisis por parte de la Interventoría.			N/A
28	Solicitar al Contratista de Obra, en caso de retraso de las obras, un Plan de Contingencia que permita terminar la obra en los tiempos previstos. La Interventoría debe exigir el cumplimiento de esta obligación. Este Plan debe ser aprobado por la Interventoría y remitido al Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	X		Se solicita Plan de Contingencia por los atrasos presentados en el desarrollo de las actividades
29	Evaluar, valorar y recomendar sobre la solicitud realizada por el contratista de obra con relación a las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos, basado en los soportes correspondientes del imprevisto generado y aprobar el pago correspondiente conjuntamente con el supervisor del contrato de interventoría. En todo caso el valor de los imprevistos no podrá superar el valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la propuesta económica. En el caso de que alguna			N/A

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las decisiones del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.			
30	Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes y demás escritos que se generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la Interventoría. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	X		
31	Anexar con cada acta de recibo de obra, una certificación suscrita por el Director de la Interventoría, donde éste garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron verificados en obra por su equipo de trabajo y que se encuentran conforme con lo contratado.	X		
32	Elaborar y presentar informe o concepto: técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero y/o contable; de acuerdo a los requerimientos que le realice el supervisor del contrato. Los cuales deberán ser emitidos por el profesional idóneo con que la Interventoría debe contar para tal fin. Una vez hecha la solicitud, el interventor tendrá cinco (5) días hábiles para presentar el concepto por escrito y debidamente suscrito.	X		
33	Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, las peticiones que soliciten los Entes de Control, tanto para el Contrato de obra, como para el contrato de Interventoría. Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Entidad. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.			N/A
34	Validar los informes parciales y final presentados por el Contratista de obra y allegarlos en original al supervisor del contrato, a más tardar dentro de los	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de los mismos por parte del Consultor, con el correspondiente concepto de cumplimiento técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero y contable emitido por la Interventoría. Los informes suscritos y en original deben ser custodiados por el Supervisor designado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.			
35	Entregar en debida forma a la Entidad las modificaciones necesarias de la Garantía Única de Cumplimiento, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de terminación del contrato y exigirlas al contratista de obra.	X		Se encuentra en ejecución
36	Realizar con posterioridad a la terminación del contrato de obra, el balance de actividades ejecutadas y el balance presupuestal que servirán como insumo para la elaboración del acta de liquidación del contrato.			N/A
37	Coordinar y verificar que a la firma del Acta de Recibo Final de Obra, el Contratista haga entrega en medio físico y magnético, a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, el presupuesto ejecutado consolidado y firmado (en formato pdf y Excel) Memorias de Cálculo consolidadas y firmadas (en formato pdf y Excel), dos (2) copias de todos los planos récord firmados, de las obras ejecutadas (arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc., en formato pdf y Autocad) bitácora de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños realizados, certificaciones, informes de las pruebas de estanqueidad u otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del contrato. Además, la información debe ser cargada en la plataforma informática que indique la Entidad.			N/A
38	Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista de Obra, el acta de entrega y recibo final y recibo a satisfacción de obra en el cual debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron,			N/A

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	cumplieron con las cantidades, calidades y especificaciones técnicas contratadas.			
39	Compilar la documentación necesaria para la Liquidación de los contratos, crear los escenarios de reuniones y como resultado de ello, proyectar las actas de liquidación de los contratos de obra y de interventoría, durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de finalización o al recibo a satisfacción de los mismos y suscribir dichas actas. Las actas de liquidación deben remitirse a Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio - Consejo Superior de la Judicatura una vez sean revisadas, aprobadas y suscritas por las partes.			N/A
	Parágrafo 1: Dicha acta debe ser firmada por el Contratista, la Interventoría, el Supervisor del contrato de Interventoría y el Director de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio responsable del contrato de obra de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.			N/A
	Parágrafo 2: La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio no reconoce costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la liquidación del contrato.			N/A
40	Entregar al Supervisor previo a la firma del acta de liquidación, la certificación de cumplimiento de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente, así como los Paz y Salvos de encontrarse al día en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas con los cuales ejecute el contrato.			N/A
41	Verificar que el Contratista de la obra mantenga durante toda la ejecución de las labores contratadas, el equipo de trabajo mínimo y solicitar la sustitución de cualquiera de ellos, en caso de que no cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su desempeño no sea el adecuado.	X		Se encuentra en ejecución
42	Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos	X		Se encuentra en ejecución

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	adicionales realizados durante el proceso de selección de contratista y por medio de los cuales, obtuvo un puntaje adicional o acreditó un factor de desempate, a efectos de ser adjudicatario del proceso de selección, así como verificar y exigir al Contratista de Obra el cumplimiento de los ofrecimientos por este realizados por los que obtuvo puntaje o acreditó un factor de desempate.			
43	La Interventoría para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales y técnicos que cumplan con los perfiles descritos a continuación. Esta obligación debe ser revisada por el supervisor del contrato, en cada una de las etapas contractuales. El equipo mínimo debe cumplir con los siguientes requisitos:	X		Personal de Interventoría aprobado
a	El personal que conforme el equipo mínimo de trabajo necesario para la ejecución del proyecto. Si la interventoría requiere vincular personal adicional para la correcta ejecución del contrato, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que la Interventoría utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.	X		Personal de Interventoría aprobado
b	Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por entidades de derecho público o de derecho privado que contrató el proyecto u obra o la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. En el evento de no disponerse de la certificación de experiencia, se deberá adjuntar copia del acta de terminación del contrato laboral, de prestación de servicios o el documento que corresponda; donde conste la ejecución del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades y/o fecha de ejecución las actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual deberá venir suscrita según corresponda, por el representante de la entidad contratante y el Contratista.	X		Personal de Interventoría aprobado

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
c	No se aceptan certificaciones relacionadas con interventoría a obras civiles tales como: edificaciones de uso unifamiliar, vías y andenes, puentes, alcantarillados, acueductos, canales, tanques, torres de comunicaciones, canchas deportivas, parques o plazoletas.	X		Personal de Interventoría aprobado
d	Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación.	X		Personal de Interventoría aprobado
e	No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes.	X		Personal de Interventoría aprobado
f	Para el cálculo de los años de experiencia se tomarán en cuenta años laborales de 360 días, de acuerdo a lo consagrado en el derecho comercial, en concordancia con lo expuesto en el Concepto 104544 de abril 21 de 2008, emitido por el Ministerio de la Protección Social.	X		Personal de Interventoría aprobado
g	Ninguna certificación de experiencia se contabilizará por tiempos simultáneos, es decir, no será tenida en cuenta de forma simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la cual sólo se agregará una vez dentro de la suma de experiencia de cada integrante.	X		Personal de Interventoría aprobado
h	No se aceptan auto-certificaciones.	X		Personal de Interventoría aprobado
i	Si la interventoría ofrece un profesional para realizar actividades de dos (2) o más cargos, este deberá cumplir los requisitos exigidos para cada uno de los ellos, siempre y cuando no supere el 100% de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.			N/A
j	Ninguno de los profesionales que se presenten en cumplimiento de este requisito, puede encontrarse prestando sus servicios en virtud de otros contratos de obra, interventoría o consultoría con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, que le impida desempeñar el cargo objeto de esta postulación en el porcentaje de dedicación exigido	X		

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	para ello, para lo cual el personal deberá aportar Certificación que así lo afirme.			
k	La interventoría garantizará que los profesionales estén disponibles cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.	X		Se encuentra en ejecución
l	La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma.	X		Personal de Interventoría aprobado
	Parágrafo: Para el caso específico de los Ingenieros y Arquitectos, la experiencia profesional solo se computará a partir de la expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, conforme con lo estipulado por la Ley 842 de 2003 y la Ley 435 de 1998. Lo anterior operará también para aquellas profesiones que requieran tarjeta o matrícula profesional para el desempeño profesional (Abogados, Contadores, etc.). Caso contrario, se aplicará el artículo 229 del Decreto No. 019 de 2012.	X		Personal de Interventoría aprobado
m	Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto Ley 2106 de 2019.	X		Personal de Interventoría aprobado
n	En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado o posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida por Colombia Compra Eficiente,	X		Personal de Interventoría aprobado


No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	el personal del Contratista puede acreditar la formación académica en el exterior con:			
1	Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación CINE o,	X		Personal de Interventoría aprobado
2	La convalidación correspondiente.			
	Parágrafo: En el caso de los títulos de posgrado obtenidos en el exterior de los ingenieros civiles se deberá entregar copia apostillada, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 842 de 2003.			N/A
o	Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no serán susceptibles de inscripción en el registro profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando se necesite acreditar tal calidad, bastará con la presentación del título de postgrado respectivo, debidamente otorgado por universidad o institución autorizada por el Estado para tal efecto.			N/A
p	Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional para ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o la entidad competente.			N/A
44	Adicionalmente al personal mínimo requerido, la interventoría se obliga a contar con el personal profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto.	X		
45	Disponer y suministrar el personal y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar las intervenciones; cuando estas se deban desarrollar en diferentes sedes, la interventoría deberá garantizar la ejecución de actividades de manera simultánea en las mismas conforme con los tiempos y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecución del contrato, conforme con el cronograma de ejecución y el tiempo pactado.	X		
46	La Interventoría deberá garantizar que el equipo mínimo trabajo ofrecido y aprobado por la entidad, con la dedicación requerida y pactada, siendo estos	X		

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	quienes deben ejecutar el contrato. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben ser sustentadas, la interventoría presentará la hoja de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración del supervisor del contrato. En este caso, la persona que reemplazará al profesional del equipo mínimo de trabajo debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en el pliego de condiciones para el cargo correspondiente, si se trata de un profesional que hace parte del equipo de trabajo clave evaluable por el cual se asignó puntaje, adicionalmente deberá acreditar como mínimo los años de experiencia específica adicional y el título de formación académica adicional sobre los cuales le fue otorgado el puntaje al profesional presentado con la oferta. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.			
47	Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva de la interventoría, por lo tanto, el personal que ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio.	X		Se encuentra en ejecución
48	Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente.	X		
	Parágrafo: En el caso del personal de la Interventoría esté vinculado mediante contrato de prestación de servicios, es necesario que allegue la certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de	X		

No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	CUMPLIO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
	aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.			
49	Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la interventoría del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite.	X		
50	Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma.	X		
	Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe estar disponible para el Supervisor del contrato, en el evento que éste realice una visita de inspección durante el desarrollo de la obra por parte de la entidad o los entes del control.	X		Se encuentra en ejecución
	Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.	X		Se encuentra en ejecución

8. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD.

En el presente contrato, se contempló personal en condiciones de discapacidad. De acuerdo al Certificado del Ministerio de Trabajo del Consorciado INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS

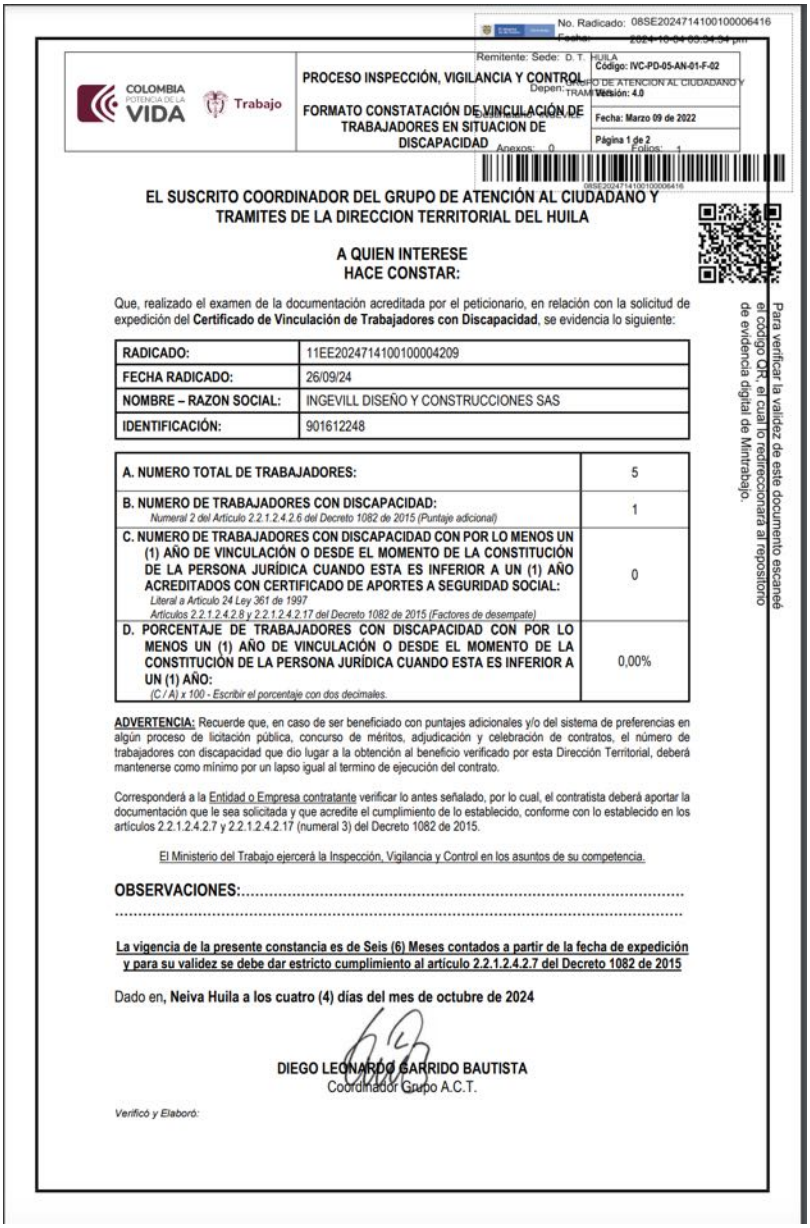

No. Radicado: 08SE2024714100100006416
Fecha: 2024-10-04 05:04:34 pm
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen: GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES
Anexos: 0 Folios: 1

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02
FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Versión: 4.0
	Fecha: Marzo 09 de 2022
	Página 1 de 2

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL HUILA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	11EE2024714100100004209
FECHA RADICADO:	26/09/24
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	INGEVILL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS
IDENTIFICACIÓN:	901612248

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	5
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997 Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	0
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	0,00%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES:.....
.....

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, **Neiva Huila a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2024**

DIEGO LEONARDO GARRIDO BAUTISTA
Coordinador Grupo A.C.T.

Verificó y Elaboró:

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionara al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

9. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Hasta la presente fecha no se han presentado accidentes laborales ni inconvenientes o molestias en las cuales los trabajadores se puedan ver afectados, de igual manera, tampoco se han recibido o se ha sabido de reclamaciones ya sean por actividades laborales realizadas o tema de pagos.

Durante el período transcurrido de la obra hasta la fecha, no se han registrado inconvenientes ni accidentes laborales que hayan afectado las condiciones de salud de los trabajadores.

10. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

En el momento la falta de personal tanto administrativo como operativo por parte del Consorcio A&V, contratista que ejecuta la obra pone en riesgo las fechas de cumplimiento de entrega de espacios pactadas con la supervisión de la obra, fechas que en su momento fueron entregadas tanto a interventoría como a supervisión por parte del mismo contratista. Esto mantiene el nivel de atraso que se trae hace varios meses en la obra y a pesar de los llamados de atención escritos por parte de la Interventoría (área técnica en lo referente a procesos y acabados, área de personal en lo referente al aumento de cuadrillas de ejecución, cumplimiento de horarios extendidos que el mismo contratista propuso), el contratista no ha mostrado la voluntad de querer revertir esta situación.

La no consecución no oportuna de los insumos de las actividades que se están ejecutando a la fecha por parte del contratista de obra; está ocasionando retrasos y afectación de la ruta crítica del proyecto; el contratista de obra ha manifestado que está haciendo todo la posible para realizar su compra y ejecutar planes de contingencia.

11. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

11.1. COMPONENTE AMBIENTAL:

En este lapso, se lleva a cabo la organización y acopio de materiales con el objetivo de mantener despejada y adecuadamente organizada el área de trabajo. Esto se realiza considerando que las actividades programadas para este mes incluyen procesos de demolición y desmonte. Se realiza retiro de escombros.

ZODME GUATIQUIA
NIT: 901.313.682-5

ZODME GUATIQUIA S.A.S
NIT. 901313682-5

CERTIFICADO

CERTIFICA [Nº 1109]

Que la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V, con NIT 901863382-1, hizo disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, RCD (**DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION**), producto de la actividad de excavación, construccion, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas que se generaron de **DISPOSICION PROVENIENTE DE PALACIO DE JUSTICIA SON DIECIOCHO METROS CUBICOS DE DEMOLICION** , y que se relacionan a continuación:

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	**18.00** m³

Esta disposición se hizo en la ZODME GUATIQUIA, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta margen izquierda del río Guatiquía, sector vanguardia y que se encuentra debidamente autorizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", según los permisos otorgados,mediante los oficios, No. PM GA 3.17.6217 Y PM GA 3.18.4664, PS-GJ.1.2.6.19.2837

La presente se expide en Villavicencio a los 10 días del mes 3 del año 2.025.

MAURICIO VELASQUEZ ZAPATA
Representante Legal

ZODME GUATIQUIA
NIT. 901.313.682-5

Vereda Vanguardia Sector la Playa
ZODME GUATIQUIA Cel.: 350 370 83 54
Villavicencio - Meta
zodmeguatiquia@gmail.com

11.2. COMPONENTE SOCIAL:

En la contratación del personal, se ha priorizado la selección de individuos originarios del municipio, con el propósito de atender las demandas de empleo y brindar oportunidades a esta población específica.

12. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

- Conducir sesiones de inducción y capacitación mediante actividades lúdicas, como talleres, dirigidas por el inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). El propósito es fomentar la participación activa dentro de las capacitaciones, y mejorar las habilidades técnicas del personal y promover un entorno laboral más seguro.

- Realizar inspecciones periódicas y parciales a lo largo del proceso de construcción con el fin de detectar posibles defectos o desviaciones antes de que evolucionen hacia problemas significativos.

- Establecimiento de acuerdos sólidos con proveedores de materiales para garantizar la calidad y la disponibilidad oportuna de los insumos necesarios.

13. ESTADO DEL TIEMPO

La siguiente relación detalla el estado del clima de cada día durante el periodo correspondiente al informe que se presenta.

FECHA	DIA LABORABLE (SI/NO)	ESTADO DEL CLIMA	PERIODO DE LLUVIAS(HRS)		INTERRUMPIO ACTIVIDADES (SI/NO)
Martes 04 de marzo de 2025	SI	L.F.			NO
Jueves 06 de marzo de 2025	SI	L.L.			NO
Viernes 7 de marzo de 2025	SI	L.F.			NO
Viernes 14 de marzo de 2025	SI	L.L.			NO
Lunes 17 de marzo de 2025	SI	L.F.			NO
Jueves 20 de marzo de 2025	SI	L.L.			NO
Sábado 22 de marzo de 2025	SI	L.F			NO
Jueves 27 de marzo de 2025	SI	L.L.			NO
Sábado 29 de marzo de 2025	SI	L.F.			NO

FECHA	DIA LABORABLE (SI/NO)	ESTADO DEL CLIMA	PERIODO DE LLUVIAS(HRS)		INTERRUMPIO ACTIVIDADES (SI/NO)
Lunes 31 marzo de 2025	SI	L.F.			NO
Martes 1 de abril de 2025	Si	L.L.			NO
Miércoles 2 de abril de 2025	SI	L.F.			NO
Jueves 3 de abril de 2025	SI	L.L			NO
Viernes 4 de abril de 2025	SI	L.F.			NO

L.F: LLUVIAS FUERTES
L.L: LLUVIAS LEVES

14. OBSERVACIONES

El contratista de obra ha manifestado que las actividades no previstas del modificatorio No. 2, en especial los relacionados con las actividades del funcionamiento de los aires acondicionados; en especial del material Pirlum; su adquisición ha sido limitada, por lo cual ha presentado atraso e impacto a la ruta crítica del proyecto; es por ello que a la fecha presenta un atraso del 23%; ya que esta actividad es su proceso constructivo limito el avance de las demás actividades.

15. ANEXOS

ANEXO 1.	INFORMES SEMANALES
ANEXO 2.	BITACORA
ANEXO 3.	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA
ANEXO 4.	FICHAS TECNICAS DE MATERIALES EMPLEADOS
ANEXO 5.	ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

ANEXO 1. INFORMES SEMANALES

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO.".

OG

INFORME SEMANAL

Semana Número: 27 Del: 3 de marzo de 2025 Al: 9 de marzo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 187

ENTIDAD CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA	SEDE: PALACIO DE JUSTICIA VILLAVICENCIO	SUPERVISOR	Ing. MONICA LUCIA GONZALEZ BARON


OBJETO:

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JSUTICIA DE VILLAVICENCIO."

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	70,77%	70,77%	Obra Física Ejecutada (%)	1,36%	62,38%
Valor básico de la Obra	$ 2.295.539.977,28	$ 2.295.539.977,28	Valor básico de la Obra	$ 44.042.780,84	$ 2.023.519.417,07

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	**Interventor:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6687049 DE 2024	Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6703620 DE 2024
Valor Inicial:	$ 2.945.313.493,00	Valor Inicial:	$ 303.248.028,00
Valor Actualizado:	$ 3.243.811.335,49	Valor Actualizado:	$ 454.872.042,00
Plazo Inicial:	4 Meses	Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	7,5 Meses	Plazo Actualizado:	7,5 Meses
Fecha de Iniciación:	4-sept-24	Fecha de Iniciación:	4-sept-24
Fecha de Vencimiento:	15-abr-25	Fecha de Vencimiento:	15-abr-25

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

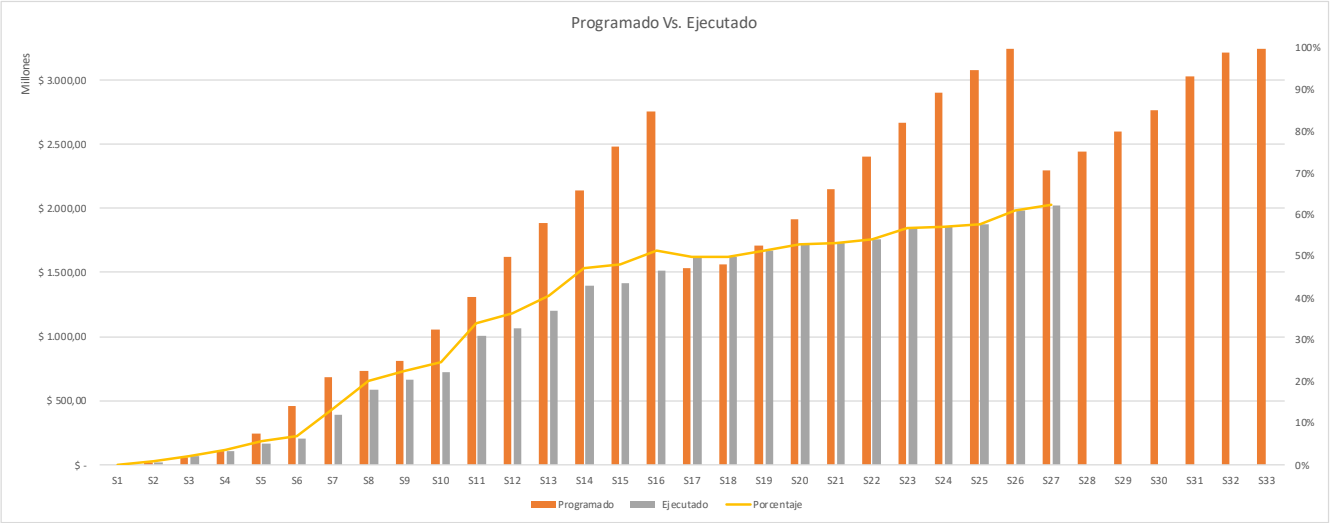

AVANCE

SE PRESENTA UN ATRASO EN EJECUCION DE OBRA DE 8,39% (BASADO EN PRORROGA 2 Y AJUSTE DE FLUJOS DE CAJA). Se inicio la inbstalacion de tubería de suministro de agua (1/2" color blanco) y de 4" y 2" (color amarillo) para la red sanitaria y 6 la red de ventilación de los sifones de la batería de baños de la torre A. Se ha iniciado este proceso en los pisos 5, 4, 3 y 2 de la torre de baños y de esta manera también se han inicado las labores de pañetes. Se realizó la adecuación de la caja de paso de aguas residuales que se encuentra en el primer piso de la batería de baños de la torre A, esto con el fin de evitar realizar regatas o daños en los pisos y la plazoleta de la torre A. Se ha solicitado al residente de obra del contratista la visita del ingeniero estructural para que nos haga la recomendación por escrito de la solución de ajuste a algunos daños encontrados en el 3 piso en las vigas de los baños que aparecen con perforaciones, esto con el fin de evitar futuros inconvenientes o daños en esta estructura. A la fecha de este informe aún no se han inicado las labores de instalación de aires acondicionados, cableado y tubería correspondiente a los aires acondicionados, cableado de potencia de los aires acondicionados, puertas y detalles faltantes en las oficinas de magistrados del ala A piso 5 torre B. Se hace retiro de escombros el día sabado 08 de marzo del sitio de acopio al sitio de disposición final, quedando pendientes las certificaciones.

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE PAÑETES BATERIA DE BAÑOS TORRE A

IMAGENES AVANCE





INSTALACION DE TUBERIA DE SUMINISTRO BATERIA DE BAÑOS TORRE A






INSTALACION DE TUBERIA DE SUMINISTRO BATERIA DE BAÑOS TORRE A





INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA BATERIA DE BAÑOS TORRE A



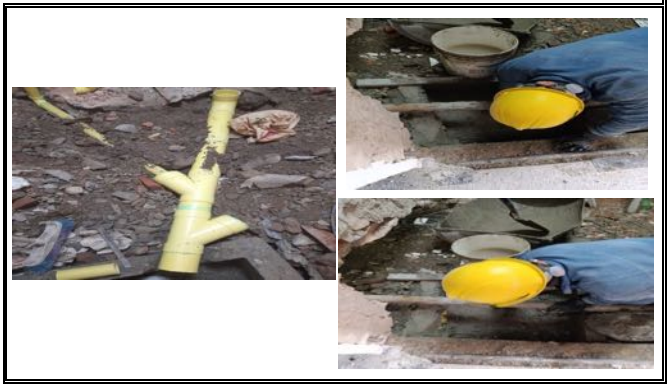

INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA BATERIA DE BAÑOS TORRE A










RETIRO DE ESCOMBROS // LIMPIEZA DE AREAS

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estandares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningun tipo de novedad. No se presentan novedades en el area ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantias que rigen el contrato de obra e interventoria se encuentran VIGENTES. Se firmo Prorroga por 45 dias.	Firma Nombre Ing. Ma. LUCRECIA LOPEZ AROCA DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO.".

OG

INFORME SEMANAL

Semana Número: 28 Del: 10 de marzo de 2025 Al: 16 de marzo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 194

ENTIDAD CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA	SEDE: PALACIO DE JUSTICIA VILLAVICENCIO	SUPERVISOR	Ing. MONICA LUCIA GONZALEZ BARON

OBJETO:

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JSUTICIA DE VILLAVICENCIO."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,51%	75,28%
Valor básico de la Obra	$ 146.345.535,63	$ 2.441.885.512,91

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,24%	63,62%
Valor básico de la Obra	$ 40.299.304,06	$ 2.063.818.721,14


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6687049 DE 2024
Valor Inicial:	$ 2.945.313.493,00
Valor Actualizado:	$ 3.243.811.335,49
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	7,5 Meses
Fecha de Iniciación:	4-sept-24
Fecha de Vencimiento:	15-abr-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6703620 DE 2024
Valor Inicial:	$ 303.248.028,00
Valor Actualizado:	$ 454.872.042,00
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	7,5 Meses
Fecha de Iniciación:	4-sept-24
Fecha de Vencimiento:	15-abr-25

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

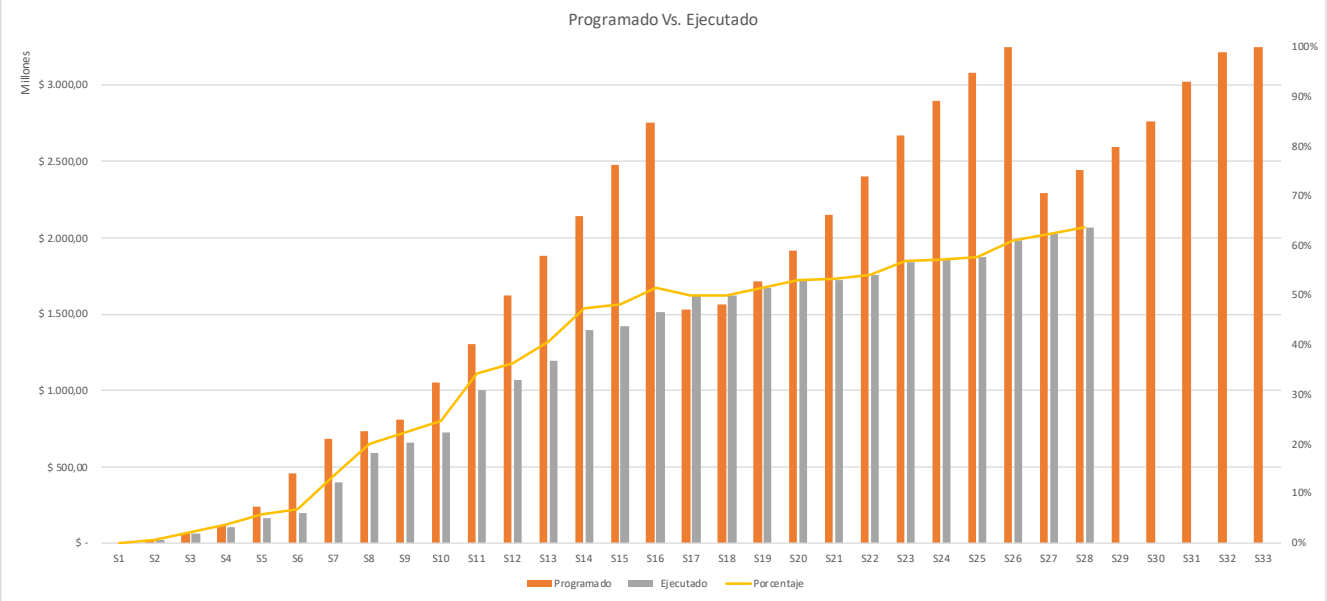

AVANCE

SE PRESENTA UN ATRASO EN EJECUCION DE OBRA DE 11,66% (BASADO EN PRORROGA 2 Y AJUSTE DE FLUJOS DE CAJA). Se continua con la instalación de tubería de suministro PVC color blanco para todos los pisos incluyendo el primer nivel (exceptuando el 5 piso baño de hombres). Así mismo se hace la adecuación para la instalación de los registros de paso de cada piso a la columna central y se tiene pendiente la conexión a la válvula de la cubierta de la torre A para el suministro de agua en la batería de baños correspondiente. De igual manera se continúa con la instalación de las tuberías sanitarias de cada uno de los pisos exceptuando 5 piso hombres, 2 piso mujeres (sanitarios) por la no apertura del cuarto de la planta telefónica del primer piso que ya se ha solicitado a la supervisión. En primer piso los 3 baños cuentan con todas las redes tanto de suministro como de evacuación instaladas. Ya se adelantaron labores de sobre piso en los baños de la torre A excepto en el 5 piso y el 2 piso (5 piso por un tema de unas vigas que aparecieron perforadas y en 2 piso por la apertura de la planta telefónica). Se iniciaron labores de instalación de ductos para cableado eléctrico (cajas, tubería) en los baños de la torre A de igual manera, 5-4-3-2 piso. Aún no se han hecho pañetes externos del muro de cerramiento del primer piso. Se adelanta labor de instalación de ductos de cobre para los aires acondicionados correspondientes a las oficinas 514 y 513 de la torre b piso 5, donde se encontraron serpentines internos de distribución que estaban dañados y fueron enviados a taller de reparación por parte del contratista. Se instalan tornillos y soportes para los ductos y se hace limpieza de las condensadoras que están en la cubierta, sin embargo, por temas de lluvias fuertes no se ha podido hacer la perforación de paso para la tubería que se está instalando, por eso se han presentado retrasos en el trabajo de instalación, sumado a que únicamente se encuentran en sitio dos operarios para esta labor. Se ha realizado la instalación de los marcos de las puertas de aluminio, de las puertas de aluminio y de las cerraduras normales y de seguridad para dichas puertas, y se han instalado vidrios pendientes en las oficinas y se ha hecho reparación de los marcos dañados por golpes durante desmontes de cubierta en estas oficinas. Se está al pendiente de la instalación de las puertas de madera en los baños de los magistrados de las oficinas de 5 piso y se empiezan a adelantar labores de aseo en obra con el personal correspondiente a esta actividad. Se informa que el personal que se encuentra en obra no es el inicialmente informado por el contratista de obra y que esto repercute en las demoras y atrasos que se presentan en la obra.

IMAGENES AVANCE





INSTALACIÓN DE TUBERIA DE SUMINISTRO Y SANITARIA BATERIA DE BAÑOS TORRE A





INSTALACION DE TUBERIA DE SUMINISTRO BATERIA DE BAÑOS TORRE A





FUNDIDO DE SOBREPISOS PARA PLACAS EN BATERIA DE BAÑOS TORRE A





IMAGENES AVANCE

INSTALACION DE TUBERIA Y CABLEADO ELECTRICO BATERIA DE BAÑOS TORRE A












LIMPIEZA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CUBIERTA TORRE B










INSTALACION DE TUBERIA Y DUCTERIA AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS PISO 5 TORRE B / INSTALACION DE MARCOS, PUERTAS DE ALUMINIO Y CERRADURAS PARA OFICINAS PISO 5 TORRE B

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estándares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningún tipo de novedad. No se presentan novedades en el área ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantías que rigen el contrato de obra e interventoría se encuentran VIGENTES. Se hace Prorroga por 45 días.	Firma Nombre : Ing. Ma. LUCRECIA LOPEZ AROCA DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO.".

OG

INFORME SEMANAL

Semana Número: 29 Del: 17 de marzo de 2025 Al: 23 de marzo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 201

ENTIDAD CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA	SEDE: PALACIO DE JUSTICIA VILLAVICENCIO	SUPERVISOR	Ing. MONICA LUCIA GONZALEZ BARON

OBJETO:

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JSUTICIA DE VILLAVICENCIO."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,70%	79,98%
Valor básico de la Obra	$ 152.392.683,99	$ 2.594.278.196,90

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	1,94%	65,57%
Valor básico de la Obra	$ 63.078.059,77	$ 2.126.896.780,91


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6687049 DE 2024
Valor Inicial:	$ 2.945.313.493,00
Valor Actualizado:	$ 3.243.811.335,49
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	7,5 Meses
Fecha de Iniciación:	4-sept-24
Fecha de Vencimiento:	15-abr-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6703620 DE 2024
Valor Inicial:	$ 303.248.028,00
Valor Actualizado:	$ 454.872.042,00
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	7,5 Meses
Fecha de Iniciación:	4-sept-24
Fecha de Vencimiento:	15-abr-25

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

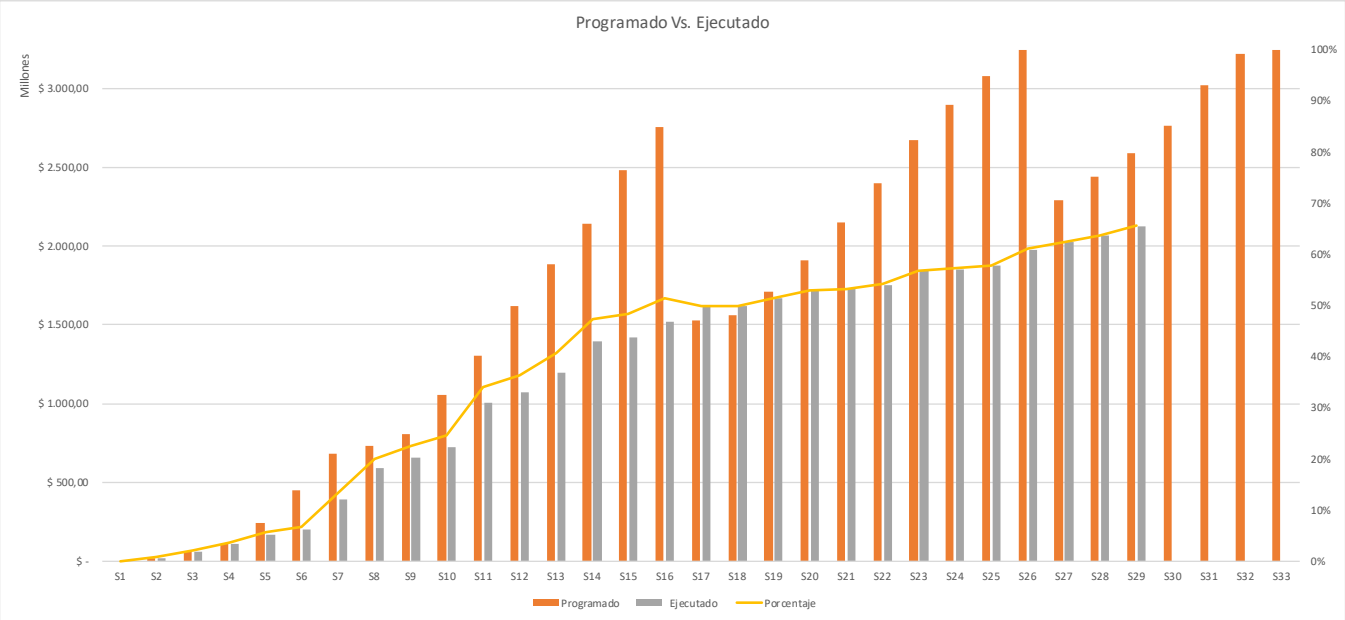

AVANCE

SE PRESENTA UN ATRASO EN EJECUCION DE OBRA DE 14,41% (BASADO EN PRORROGA 2 Y AJUSTE DE FLUJOS DE CAJA). Se adelanta la labor de instalación de los ductos de cobre, protección con rubatex y tubería de suministro de potencia de los aires centrales de las oficinas 514 y 513, así como se adelanta el proceso de armado de los ductos en aluminio de dichas oficinas. Se está al pendiente de terminar esta tarea el fin de semana para proceder con la instalación pendiente del cielo raso en PVC de dichas oficinas. Esta tubería ya se encuentra direccionada hacia la cubierta a través de un ducto que se hizo para tal fin con unos ladrillos que evitan la entrada del agua a esta zona. Está pendiente por instalación el cable que alimentará la acometida eléctrica correspondiente a los aires acondicionados. Se continúa con la labor de estucado, lijado y aplique de retoques de pintura en las áreas de las oficinas 514 y 513 de la torre B piso 5, en especial en las áreas de los marcos de las puertas de baños e internas que se modificaron y en las áreas de las puertas externas. Está pendiente de realizar estos retoques la zona de la sala 515 debido a que el encargado de los ductos de aire acondicionado se encuentra en dicha área. Se solicita al ingeniero residente de obra del contratista especial atención en los detalles de pintura de estos marcos y en los marcos de las ventanas hacia la fachada externa. Se ha solicitado en reiteradas ocasiones al ingeniero residente de obra del contratista en la limpieza y aseo de los corredores y las zonas internas de las oficinas para poder realizar la pre-entrega de dichas áreas; sin embargo hasta finalizar la semana se iniciaron las labores de limpieza y aseo general de estas áreas. Se hace la terminación de ponchado e instalación de las regletas para los puntos de datos del rack de la torre B piso 5 que estaban pendientes de terminación y se solicita al ingeniero residente del contratista la entrega de los patch cord de datos correspondientes a esta zona y de realizar las pruebas de continuidad de los puntos de datos de las oficinas que se van a entregar a la supervisión tal como se solicitó en la reunión presencial de los directores de obra realizada el día jueves 20 de marzo en las instalaciones de la sede administrativa de la alborada. En la batería de baños de la torre A se continúa con el proceso de pañete en los muros de todos los pisos y se empiezan a hacer los detalles de las zonas y cajas correspondientes a la red contra incendio, esto con el fin de tener estas áreas listas para el inicio de colocación de enchapes de pared y piso en la batería de baños de la torre A. Se termina el proceso de instalación de la tubería en PVC de suministro con sus correspondientes registros de corte y queda pendiente la instalación de tubería sanitaria en las placas de los baños de 5 piso y de 2 piso por temas de recalce y reparación de las viguetas de dicha placa y abajo por la apertura tardía de un cuarto de comunicaciones. Se continua con el armado de las mochetas que sostendrán los mesones de granito para los lavamanos en cada uno de los pisos. Se informa que se realizarán las adecuaciones previstas para habilitar el baño para uso de discapacitados en el primer piso pero sin incluir insumos diferentes a los programados y planteados en el presupuesto.

IMAGENES AVANCE





INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE Y SUMINISTRO PARA IARES ACONDICIONADOS - INSTALACIÓN DE MINI SPLIT EN OFICINAS PISO 5 TORRE B





RESANES DE MUROS, RESANES DE MARCOS DE PUERTAS Y RETOQUES EN PINTURA DE AREAS A ENTREGAR (OFIC. 515-514-513)





INICIO DE LABORES DE ASEO Y DESPEJE DE CORREDORES, BAÑOS Y AREAS DE OFICINAS A ENTREGAR EN PISO 5 TORRE B





INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO, PONCHADO DE REGLETAS Y ORGANIZACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES PISO 5 TORRE B

IMAGENES AVANCE













PAÑETE Y RECORTES EN GABINETES DE RED CONTRA INCENDIO, TERMINACION DE TUBERIA DE SUMINISTRO Y REGISTROS, TERMINACION DE TUBERÍA SANITARIA EN BATERIA DE BAÑOS TORRE A. MOCHETAS PARA SOPORTE DE GRANITO PARA LAVAMANOS BATERIA DE BAÑOS TORRE A




RECALCE DE VIGUETAS EN ENTREPISO BAÑOS 5 PISO Y CUARTO PISO TORRE A

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estándares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningún tipo de novedad. No se presentan novedades en el área ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantías que rigen el contrato de obra e interventoría se encuentran VIGENTES. Se hace Prorroga por 45 días.	Firma Nombre : Ing. Ma. LUCRECIA LOPEZ AROCA DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO.".

OG

INFORME SEMANAL

Semana Número: 30 Del: 24 de marzo de 2025 Al: 30 de marzo de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 208

ENTIDAD CONTRATANTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA	SEDE: PALACIO DE JUSTICIA VILLAVICENCIO		SUPERVISOR	Ing. MONICA LUCIA GONZALEZ BARON


OBJETO:

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JSUTICIA DE VILLAVICENCIO."

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,15%	85,13%	Obra Física Ejecutada (%)	1,61%	67,18%
Valor básico de la Obra	$ 167.140.270,96	$ 2.761.418.467,86	Valor básico de la Obra	$ 52.302.416,38	$ 2.179.199.197,29

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	**Interventor:**	CONSORCIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6687049 DE 2024	Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6703620 DE 2024
Valor Inicial:	$ 2.945.313.493,00	Valor Inicial:	$ 303.248.028,00
Valor Actualizado:	$ 3.243.811.335,49	Valor Actualizado:	$ 454.872.042,00
Plazo Inicial:	4 Meses	Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	7,5 Meses	Plazo Actualizado:	7,5 Meses
Fecha de Iniciación:	4-sept-24	Fecha de Iniciación:	4-sept-24
Fecha de Vencimiento:	15-abr-25	Fecha de Vencimiento:	15-abr-25

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

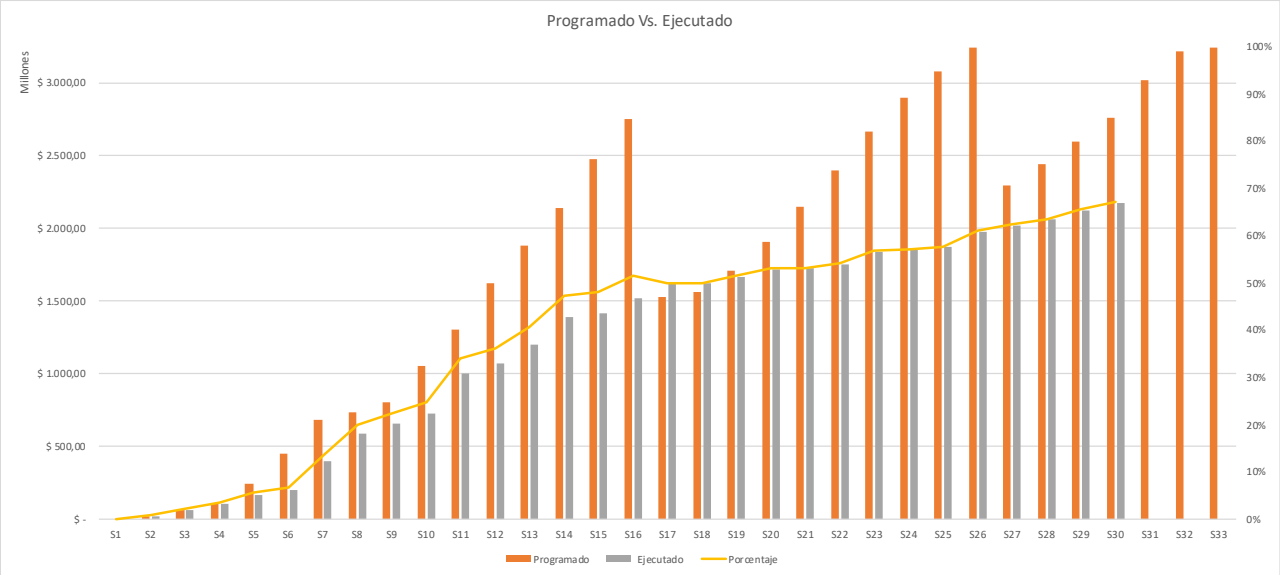

AVANCE

SE PRESENTA UN ATRASO EN EJECUCION DE OBRA DE 18,14% (BASADO EN PRORROGA 2 Y AJUSTE DE FLUJOS DE CAJA). Se realizaron las entregas parciales de las oficinas 514 y 513 del piso 5 de la Torre B, según lo solicitado por la ingeniera de supervisión. Se realizaron las pruebas de funcionamiento de los aires acondicionados centrales y se terminaron los detalles que estaban pendientes (instalación de rejillas de suministro, instalación de ductos y rejillas de retorno, retoques en pintura de color blanco y pintura de guarda escobas color negro, limpieza y aso de pisos y baños de magistrados) y se realizó la entrega de un juego de llaves a los empleados de la oficina 514 que ya se encuentra ocupada. En la otra oficina se encuentran muebles armados y por organizar pero aun no se ha pasado el personal operativo de la misma. La sala 515 también se está alistando para la entrega, se realizaron los retoques de pinturas en muros y guarda escobas, quedando pendientes retoques en los pisos y limpieza de manchas en los mismos; los mini split de aire acondicionado ya se encuentran instalados y en correcto funcionamiento de enfriamiento del área, la ubicación fue la aprobada previamente por supervisión de la obra. Se ha continuado con la instalación de los mini split de la oficina 512 que presentaban un daño de funcionamiento inicial, pero que ya se superó y se realizaron pruebas de funcionamiento y enfriamiento sin novedades adicionales. Los técnicos de aire acondicionado continúan con la instalación de mini split en el cuarto de rack de comunicaciones y seguirán en la oficina 511 en la misma labor, han instalado la tubería de cobre y las líneas de fuerza de la parte eléctrica de los mismos y las han llevado hacia la cubierta para realizar la conexión con las condensadoras correspondientes a cada equipo. En el área de corredores de las oficinas entregadas aún está pendiente la instalación del cielo raso en PVC y está pendiente la limpieza a fondo de los pisos. Se ha iniciado el desmonte de la sala de audiencias y sala 502 del ala b del piso 5 de la torre B, se hizo desmonte de marcos de puertas, de puertas y se hizo demolición del baño correspondiente; la supervisión informa que otras de las oficinas de ese piso serán desalojadas en los próximos días para continuar con los desmontes. Se continua con la instalación de enchapes de muros y de pisos en los baños de la torre A (enchape de piso color negro piso 1-2-3 // enchape de pared pisos 1-2-3-4) y se adelanta a la par el proceso de instalación de los cielo rasos en PVC de cada una de las zonas y se inicia con la actividad de armado de los dinteles en cada uno de los pisos para posteriormente realizar acabados e iniciar la adecuación de las puertas correspondientes a cada piso en la entrada de los baños. En sitio se encuentran almacenados los sanitarios, los orinales y los lavamanos correspondientes a la batería de baños de la Torre A

IMAGENES AVANCE














INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE Y SUMINISTRO PARA IARES ACONDICIONADOS - INSTALACIÓN DE MINI SPLIT EN OFICINAS PISO 5 TORRE B

RESANES DE MUROS, RESANES DE MARCOS DE PUERTAS Y RETOQUES EN PINTURA DE AREAS A ENTREGAR (OFIC. 515-514-513)







INICIO DE LABORES DE ASEO Y DESPEJE DE CORREDORES, BAÑOS Y AREAS DE OFICINAS A ENTREGAR EN PISO 5 TORRE B EINSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO

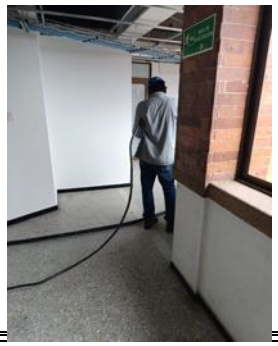





OFICINAS ENTREGADAS A SUPERVISION PALACIO DE JUSTICIA PISO 5 TORRE B

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estándares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningún tipo de novedad. No se presentan novedades en el área ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantías que rigen el contrato de obra e interventoría se encuentran VIGENTES. Se hace Prorroga por 45 días.	Firma Nombre : Ing. Ma. LUCRECIA LOPEZ AROCA DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

PROCESO: DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: "CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL VILLAVICENCIO – META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO.".

OG

INFORME SEMANAL

Semana Número: 31 Del: 31 de marzo de 2025 Al: 6 de abril de 2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días 215

ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SEDE: PALACIO DE JUSTICIA VILLAVICENCIO

SUPERVISOR: Ing. MONICA LUCIA GONZALEZ BARON

OBJETO:

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JSUTICIA DE VILLAVICENCIO."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,08%	93,21%
Valor básico de la Obra	$ 262.261.653,76	$ 3.023.680.121,62

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,04%	70,22%
Valor básico de la Obra	$ 98.521.964,60	$ 2.277.721.161,90


CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6687049 DE 2024
Valor Inicial:	$ 2.945.313.493,00
Valor Actualizado:	$ 3.243.811.335,49
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	7 Meses
Fecha de Iniciación:	4-sept-24
Fecha de Vencimiento:	15-abr-25

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERCONSULTORES
Contrato No.	CO1. PCCNTR. 6703620 DE 2024
Valor Inicial:	$ 303.248.028,00
Valor Actualizado:	$ 454.872.042,00
Plazo Inicial:	4 Meses
Plazo Actualizado:	7 Meses
Fecha de Iniciación:	4-sept-24
Fecha de Vencimiento:	15-abr-25

GRAFICO AVANCE SEMANAL PROGRAMADO

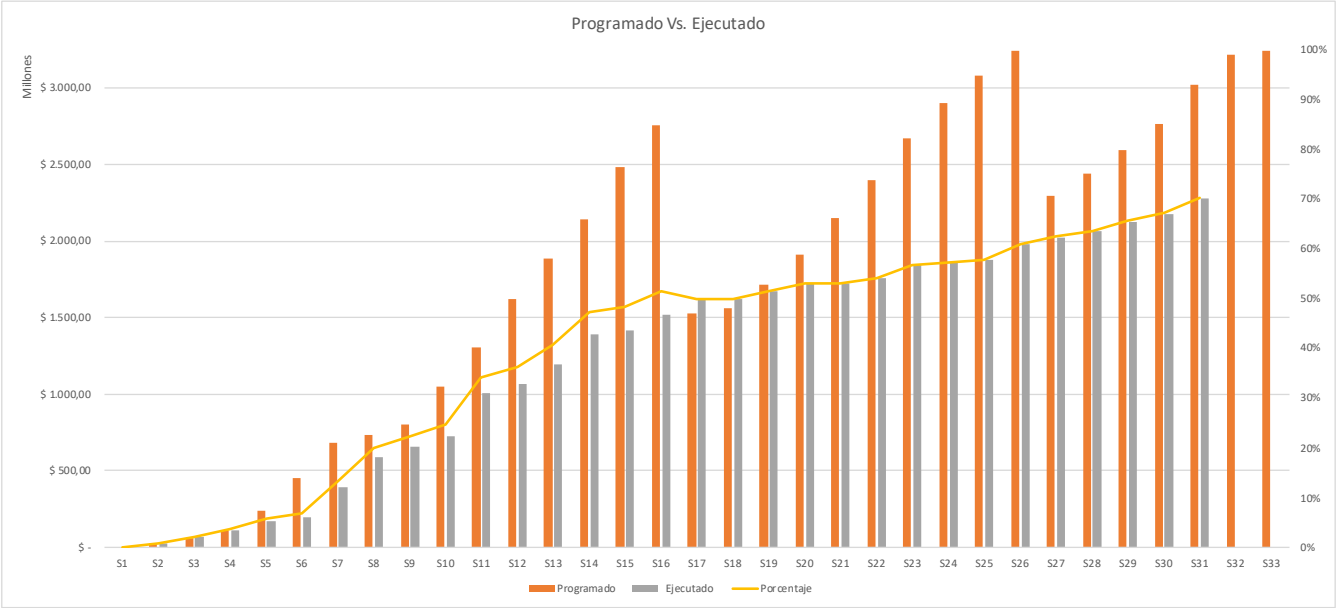

AVANCE

SE PRESENTA UN ATRASO EN EJECUCION DE OBRA DE 22,99% (BASADO EN PRORROGA 2 Y AJUSTE DE FLUJOS DE CAJA). Se realizaron las entregas parciales de las oficinas 512 y 511 del piso 5 de la Torre B, según lo solicitado por la ingeniera de supervisión. Se realizaron las pruebas de funcionamiento de los aires acondicionados tipo mini split y se trabajaron los detalles que estaban pendientes (instalación y ajuste de lámparas, pintura en muros y guardaescobas, quedando pendiente silicona de cielo raso, limpieza y aseo de pisos y baños de magistrados) y se realizó la entrega de un juego de llaves a los empleados de la oficina 512 que ya se encuentra ocupada; en el transcurso de la semana y terminando la misma se inició el trasteo de la oficina 511 asignada por la supervisión a los funcionarios. En la otra oficina (510) se encuentran armando bibliotecas y muebles para terminar la adecuación por parte de infraestructura, pero aún no se ha pasado el personal operativo de la misma; los minisplit de aire acondicionado ya se encuentran instalados y en correcto funcionamiento de enfriamiento del área, la ubicación fue la aprobada previamente por supervisión de la obra. En la zona de corredores de las oficinas entregadas aún está pendiente la instalación del cielo raso en PVC y está pendiente la limpieza a fondo de los pisos. Se ha continuado con el desmonte de las oficinas 506 y 504 del ala de la Torre B piso 5 (desmonte de cielo raso, desmonte de canaleta de instalaciones eléctricas y de datos, se hizo desmonte de marcos de puertas, de puertas y se está pendiente de la demolición del baño correspondiente; la supervisión informa que la oficina restante de ese piso será desalojada en los próximos días para terminar con los desmontes). Se continua con la instalación de enchapes de muros y de pisos en los baños de la torre A (enchape de piso color negro piso 5-4 // enchape de pared pisos 5-4) y se adelanta a la par el proceso de instalación de los cielo rasos en PVC de cada una de las zonas y se inicia con la actividad de detallado de los dinteles ya armados en cada uno de los pisos para posteriormente realizar acabados e iniciar la adecuación de las puertas correspondientes a cada piso en la entrada de los baños. En sitio se encuentran almacenados los sanitarios, los orinales y los lavamanos correspondientes a la batería de baños de la torre A. Se está a la espera de confirmación de inicio de la instalación de las divisiones de acero inoxidable que debería haberse iniciado durante esta semana pero que a la fecha no se han adelantado, así como las medidas finales de los mesones de los lavamanos. No se ha terminado la pared exterior del baño de adecuación para discapacitados ubicado en el piso 1 de la batería de baños de la torre A. Se encuentran instaladas algunas lámparas en los cielo rasos de PVC que se instalaron, pero a la fecha no se han instalado interruptores ni se han instalado tomas GFCI (cabe anotar que en obra a la fecha no se encuentra personal de la parte eléctrica). Se tuvo visita del personal que hará la cotización de las motobombas requeridas para la regulación del sistema de agua de las baterías de baños para las torres A y B. Se realiza retiro de escombros en obra.

IMAGENES AVANCE





TERMINACION DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS ALA A PISO 5 TORRE B





OFICINAS PISO 5 TORRE B ALA A 512-511







INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y PISOS BAÑOS TORRE A // INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC Y ADECUACIÓN DE DINTEL PARA PUERTAS // ASEO

IMAGENES AVANCE








INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED Y PISOS BAÑOS TORRE A // INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS // ASEO











RETIRO DE ESCOMBROS





REPARACION DE FACHALETA EN FACHADAS // ASEO EN CORREDORES

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
Se realizan todas las actividades bajo todos los estándares de bioseguridad y seguridad industrial que requieren las actividades sin ningún tipo de novedad. No se presentan novedades en el área ambiental ya que no se han iniciado actividades en obra. Todas las garantías que rigen el contrato de obra e interventoría se encuentran VIGENTES. Se hace Prorroga por 45 días. Por inconvenientes en el suministro de materiales por parte del proveedor el contratista de Obra va a solicitar prorroga del contrato.	Firma Nombre : Ing. Ma. LUCRECIA LOPEZ AROCA DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ANEXO 2. BITACORA

MARZO 01 DE 2025
SE REALIZAN LABORES DE ASEO EN AREA DE INGRESO DE PARQUEO TORRE B
SE CONTINUA LABOR DE PAÑETES EN MUROS DE BATERIA BAÑOS TORRE A
SE SUBE A PISO 5 MARCOS DE PUERTA Y PUERTAS EN ALUMINIO TORRE B OFICINAS

ARQ. JOHN ALEX LÓPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 03 DE 2025
SE ADELANTA LABOR DE PAÑETES EN PISO 3 Y 2 BATERIA DE BAÑOS TORRE A
SE INICIA INSTALACION DE TUBERIA SUMINISTRO BAÑOS TORRE A
SE HACE PERFORACION EN 1 PISO PARA ADECUACION CAJA DE INSPECCION
SE CONTINUA LIMPIEZA EN AREAS TORRE B

ARQ. JOHN ALEXANDER LÓPEZ / RESIDENTE INTERVENTORÍA

MARZO 04 DE 2025
SE ADELANTA LABOR DE APLICACION DE PAÑETES EN PISOS 3-2 Y SE INICIA PISO 1
SE CONTINUA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE TUBERIA DE SUMINISTRO EN BATERIA DE BAÑOS TORRE A
SE CONTINUA ADECUACION CAJA DE INSPECCION PISO 1 TORRE A

ARQ. JOHN ALEXANDER LÓPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 05 DE 2025
SE CONTINUA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE TUBERIA DE SUMINISTRO Y SE ADELANTA TUBERIA DE SANITARIA EN PISOS 5-4-3
SE SUSPENDEN ACTIVIDADES 2 HORAS POR CELEBRACION RELIGIOSA

Powered by CamScanner

SE CONTINUA ACTIVIDAD DE PAÑETES EN PISOS 2-3-2-1
BAÑOS TORRE A

ARQ. JOHN ALEXANDER LÓPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 06 DE 2025
SE ADELANTA INSTALACION DE TUBERIA DE SUMINISTRO
PARA BAÑO PISO 4-3-2
SE ADELANTA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PARA
BAÑOS PISO 4-3
SE ADELANTAN PEGANTES EN MUROS DE BAÑOS
SE SUSPENDEN ACTIVIDADES POR ACTIVIDAD EN PLACOLETA
TORRE A
SE IDENTIFICAN NOVEDADES EN ALGUNAS VIGAS DE LA
PARTE ESTRUCTURAL EN PLACA 5-4 PISO - SE SOLICITA
AL CONTRATISTA VISITA DE INSPECCION DE INGENIERO
ESTRUCTURAL PARA DAR CONCEPTO
SE TERMINA ACTIVIDAD Y SE RETIRAN LABORES

ARQ. JOHN ALEX LOPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 07 DE 2025
SE SUSPENDEN ACTIVIDADES DE PISO POR CELEBRACION
EN PLACOLETA TORRE A
SE CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA DE SUMINISTRO Y
TUBERIA SANITARIA BAÑOS TORRE A
SE TERMINA ADECUACION CAJA DE INSPECCION PISO 4
SE INICIA TAPADO DE MURO EN BAÑO AUXILIAR 1 PISO

ARQ. JOHN ALEXANDER LÓPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 08 DE 2025
SE ADELANTA LABOR DE RETIRO DE ESCOMBROS EN 1
PISO ZONA AUTORIZADA
SE COMPLEMENTA MURO EN 1 PISO PARA PODER HACER
PAÑETES BAÑOS TORRE A

ARQ. JOHN ALEXANDER LÓPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 10 DE 2025
SE CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA SUMINISTRO AGUA TORRE
A PISO 3-2 BAÑOS
SE ADELANTA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA BAÑOS
TORRE A PISO 3-2
SE CONTINUA LABOR DE PAÑETES EN PISO 1 TORRE A
SE HACE VANO DE VENTANA EN CAÑO AUXILIAR TORRE A Y
SE DEJA VANO PARA PUERTA

ARQ. JOHN ALEX LOPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 11 DE 2025
SE ADELANTAN LABORES DE PUERTAS PARA INSTALACIONES
ELECTRICAS BAÑOS TORRE A
SE INICIA LABOR DE INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO OFICINAS
SE CONTINUA INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA Y SANITARIA
BAÑOS TORRE A
PERSONAL DE AIRE ACONDICIONADO LLEGA A PM 3:00 PM
Y DESCARGA MATERIAL

ARQ. JOHN ALEX LÓPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 12 DE 2025
SE CONTINUA INSTALACION DE MARCOS Y PUERTAS DE
ALUMINIO OFICINAS PISO 5 TORRE B
SE INSTALAN 2 MARCOS DE PUERTA BAÑOS MAQUETEADOS
PISO 5 TORRE B
SE SUSPENDE ACTIVIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN
CUBIERTA POR LLUVIA FUERTE
SE ADELANTA CAPUCHE DE PISO EN BAÑOS TORRE A

ARQ. JOHN ALEX LÓPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Marzo 13 de 2025
Se suspende actividad de limpieza de aire acondicionado en cubierta por lluvias fuertes
Se adelanta fundida de sobrepiso en cuadros torre A
Se adelanta instalación de cajas electricas y regatas baños piso 1-2-3 torre A
Se adelanta labor de pruebas de conexión electrica de aires acondicionados
No ha llegado a obra oficial de parte electrica
No se ha terminado labor de instalación de puertas de aluminio
No se han iniciado labores en piso 5 torre B
No se han bajado al acopio los marcos desinstalados de piso 5 torre B
Se solicita al residente de obra del contratista tapar 1 ventana del corredor con plastico negro

Arq John Alex Lopez / Residente Interventoria

Marzo 14 de 2025
Se presenta lluvia fuerte desde inicio de labores a 7:00 am
Se hace la aclaración en referencia al color de la puerta del rack. La ingeniera supervisora confirma que debe ser gris para mayor apariencia en la entrega.
Se hace aclaración que la interventoria informa al contratista las indicaciones de la supervisión.

Marzo 15 de 2025

Marzo 16 de 2025

Residente de Interventoria ausente por temas de fuerza mayor

Marzo 17 de 2025

Se presentan lluvias fuertes desde la noche anterior y se acentua a las 10:00 am
Por notificación via telefonica se debe presentar muestra de pintura de puerta rack de comunicaciones a ingeniera de supervisión (notificación de rechazo de interventoria).
Se hace aprobación del color puerta rack comunicaciones por parte de la supervisión (similar al antiblock de las puertas de aluminio)
Se hace perforación en cubierta para paso de tubería de aire acondicionado

John Alex Lopez / Residente Interventoria

Marzo 18 de 2025
Se hace recorrido con la ingeniera de supervisión
Informa que no se ve avance en obra
Informa que no hay personal en los baños torre A
Se cita a reunión en oficina 212 PDV 10:00 am
Actividades del dia => contención de aire acondicionado
contención de tubería de agua potable
instalación de marcos aluminio
faltantes y vidrios en piso 5
pañete en muros de baños torre A
cantidad de personal insuficiente
Pdte cita entrega a ingeniera supervisión
Fecha de entrega aires acondicionados x oficinas
El ingeniero residente del contratista manifiesta que no se habian iniciado labores por falta de recursos económicos para contratar
Los técnicos de aires acondicionados no informan de fecha de entrega cierta. Ulcamente se informa que el serpentin ya llego apenas llega.
Mano Puerta Of 509
Ajuste lam para - Axo

Powered by CamScanner

TAPAR A PARTIR DEL VIERNES - RENATE MARCOS PUERTA
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN COMPENSADO 5 PDO
PLASTICO VENTANA COMPENSADO AUXILIAR - RELLENO PISOS CON GRANITO
ALISTAMIENTO HUECOS EN PISO OFICINAS 513 - 509 - 510

MARZO 18 DE 2025

Se sigue a la espera de recorrido de sismo el cual se realizo el dia 14 MARZO 2025 donde la supervision no a sacado tiempo para el recorrido, donde el recorrido se realizo que la supervisora Monica gonzalez No le gusta el color de el marco de la puerta de baño de magistrados pidiendo Blanco color el cual tuvieron a desistir toda la puerta cada marco por poderlo pintar y adicionarlo en otro, esto fichas tecnicas matriz por la intervencion la puerta esto se finido de color gris vacks la cual hasta el dia de AYER realizaron una modificacion al color el cual Apenas se APROBO entro a pintar. Anoche se intento en varias ocasiones para poder realizar el ingreso Ach cuando en el primer piso que manejan todas las comunicaciones telefonicas el cual se requiere para el proceso de instalacion de tuberias. Sanitarios.

→ Se hace la adenda que la actividad de Aires acondicionados No se Habian iniciado ya que son item no previstos los cuales no estaban aprobados en el momento. por este motivo no se Habian iniciado a instalar, esta Actividad se encuentra Activa con el personal correspondiente.

Ing Fabian Castañeda

SE INFORMA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA QUE DE TRABAJA HASTA LAS 9:30 PM

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 19 - 2025

PROGRAMACION

PENDIENTE REVISAR FELIPE LAS AIRE CENTRAL

MARZO 19 - 2025

Se informa en recorrido realizado entre la supervision y la interventoria que se realizaran el cambio de color de las puerta de madera de los baños de magistrados, se informa el anclaje con varilla y Fundida de Vigas deja placa del 5 piso, se informa a las 4:30 pm que el cuarto requerido en el primer piso fue desocupado.

Con respecto a la actividad de cambiar el color de las puertas de madera de los baños de magistrados de parte del contratista no se realizaron cambios ya que ese fue el color pactado o informado para poderlo aplicar el color sera cambiado si se realiza el pago adicional para poder desmontar y repintar la madera.

Ing residente: Fabian Castañeda

MARZO 20 DE 2025

SE HACE RECORRIDO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA, OBRA Y SUPERVISION EN EDIF. ALBORADA

SE ADELANTA REVISION DE PORCENTAJES DE AVANCE, DE EJECUCION

SE SOLICITA AL DIRECTOR DE OBRA DEL CONTRATISTA ACELERAR TRABAJOS, INCLUSIVE DE PERSONAL ADICIONAL POR RETRASOS

SE INICIAN DESMONTES EN OFICINAS Y SALA (502 - SALA JUNTAS) ZONA B PISO 5 TORRE B

SE ADELANTA INSTALACION DE TUBERIA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN ZONA A PISO 5 TORRE B

NO SE ADELANTAN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL OFICINA 514

SE HACE LIJADO DE PAREDES Y SE HACE INICIO DE ESTUCO EN PAREDES.

ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

MARZO 21 DE 2025

SE ADELANTA INSTALACION DE CAJAS, TUBERIA Y CABLEADO ELECTRICO EN BAÑOS TORRE A

SE HACE INSTALACION DE CABLEADO INTERNO DE AIRES

Powered by CamScanner

Se hace el estudios y ajuste de oficinas bloque A piso 5 torre B
Se adelanta aplicacion de estuco en baños torre A
Se adelanta enchape en baños piso 3 torre A
Se adelanta reparacion de viga dañada (viga ubicada en torre A baños piso 3 y 4)
Aplicacion de pintura en oficinas piso 5 bloque A torre B
Instalacion de tuberia sanitaria piso 5 y 4 baño torre A

Marzo 22 de 2025
Arquitecto de interventoria ausente por calamidad familiar

Arq. John Alex López / Residente Interventoria

Marzo 23 de 2025
Arquitecto de interventoria ausente por calamidad familiar

Arq. John Alex López / Residente Interventoria

Marzo 24 de 2025
Se continua instalacion de cableado electrico para aconditos de aires acondicionados
Se continua instalacion de ductos para aire acondicionado por encima de cielo raso
Se hacen pruebas para verificar ausencia de fugas en aires acondicionados centrales
No se ha instalado cielo raso en oficinas 514-513 ni el corredor
No se ha realizado un pieza en viga canal de cubierta zona A piso 5 torre B
Se adelanta enchape en paredes baños torre A
Se adelanta aseo en corredores y baños zona A piso 5 torre B
Arq. John Alex López / Residente Interventoria

Marzo 25 de 2025
Se adelanta enchape de piso en baños torre A (Piso 1-2-3)
Terminacion de areas de cielo raso PVC en oficina 514 piso 5 torre B
Pruebas funcionamiento aire acondicionado central 514
Instalacion de cableado pendiente y de lamparas de emergencia
Retoques de pintura oficinas 514-513
Se hace recorrido para entrega oficina 514

Arq. John Alex López / Residente Interventoria

Marzo 26 de 2025
Se continua instalacion de enchapes en baños torre A (piso 1-2-3)
Retoques de estuco y pintura oficinas 514-513
Pruebas funcionamiento aire acondicionado central of 513
Terminacion de areas de cielo raso PVC oficina 513 piso 5 torre B
Retoques pintura oficinas 514-513
Se hace recorrido para entrega oficina 513
Se hace mudanza y se instala mobiliario ofic 514
Se entregan patch cord a sistemas
Arq. John Alex López / Residente Interventoria

Marzo 27 de 2025
Se continua mudanza e instalacion de mobiliario oficinas 514-513 piso 5 torre B por instrucciones de ingeniera de supervision
Se inician retoques de pintura en oficina 515 piso 5
Se continuan labores de instalacion de mini split en oficinas 512-511 piso 5 torre B
Cambio de fachaleta en cerramiento y reparacion de pendientes
Se continua instalacion de enchapes en pisos y paredes piso 5-3-2-1
Se adelanta instalacion de perfileria para cielo raso en zona de corredor

Powered by CamScanner

Se suspenden actividades provisionalmente por sismo leve y evacuacion de la edificacion
Se inicia demolicion de baños en oficina 502 piso 5 torre B

Arq. John Alex López / Residente Interventoria

Marzo 28 de 2025
Se adelanta instalacion de PVC en bateria baños torre A
Retoques de pintura oficinas piso 5 torre B
Instalacion de cableado pendiente baños torre A
Instalacion de anillos de soporte para tuberia sanitaria
Se inicia desmonte oficina 508 piso 5 torre B
Se continua instalacion de mini split oficinas 511 - 510
Se hace traslado de funcionarios a oficina 513 piso 5
Arq. John Alex López / Residente Interventoria

Marzo 29 2025
Se continua instalacion de aires acondicionados y mini split oficinas 511 - 510
Se continua desmonte oficina 508 torre B piso 5
Se adelanta instalacion de enchape baños torre A

Arq. John Alex López / Residente Interventoria

Marzo 30 de 2025
Se trabaja instalacion de mini split oficina 510
No hay trabajos de enchape
No hay trabajos de obra civil
No hay trabajos de obra electrica

Arq. John Alexander López / Residente Interventoria

Marzo 31 de 2025
Se presentan lluvias fuertes desde primera hora de la mañana
Se retira de obra 1 enchapador en hora de la mañana

Abril 01 de 2025
Se inicia el dia con lluvias fuertes
Se continua instalacion de los aires acondicionados mini split en oficinas
Se continua instalacion de enchapes en pisos 5-4 torre A
Se adelanta trabajos de instalacion de fachaleta
No se hacen a la fecha reparaciones de enmaquillado y piezas faltantes en fachada
Se adelanta instalacion de cielo raso PVC baños torre A
Arq. John Alexander López / Residente Interventoria

Abril 02 de 2025
Se inicia el dia con lluvias fuertes
Se encuentran detalles de silicona en los esquineros de la oficina 512 (falta silicona y falta limpieza)
Se encuentran detalles de aseo por manchas de pintura en los marcos de aluminio
Se solicita al ingeniero residente de obra la reparacion de estas inconformidades
Las rejillas del aire acondicionado zona de retorno no son las que se informan en el apu. Se solicita correccion al ingeniero director de proyecto
La puerta del rack de comunicaciones no tiene buen acabado. Se solicita al ingeniero residente del contratista verificacion
Se solicita al ingeniero residente del contratista atender los pendientes
Se inicia traslado de los funcionarios a la oficina 512
[redacted] - Se hace entrega de llaves a funcionarios de la oficina y por instrucciones de supervision se verifica funcionamiento de aires acondicionados para uso de los funcionarios restantes
Arq. John Alexander López / Residente Interventoria

Powered by CamScanner

ABRIL 03 DE 2025
SE CONTINUA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y MOBILIARIO A OFICINA 512 - SE SOLICITA REVISION DE EMBOQUILLADO EN CIELO RASO A RESIDENTE DE OBRA

EL ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE RETIRADO DE OBRA POR MOTIVOS FAMILIARES

ABRIL 04 DE 2025
AUSENCIA DE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ABRIL 05 DE 2025
AUSENCIA DE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ABRIL 07 DE 2025
AUSENCIA DE RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ABRIL 08 DE 2025
SE HACE PRESENTE EN OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA INFORMA EL INGENIERO RESIDENTE DE [redacted] OBRA QUE LA INGENIERA DE SUPERVISION SE HIZO PRESENTE EL DIA VIERNES 04 DE ABRIL CON EL MAGISTRADO PARA AUTORIZAR LA RECEPCION DE LA OFICINA 510 DEL PISO 5 TORRE D. LOS FUNCIONARIOS SE TRASLADAN EL DIA LUNES 07 DE ABRIL Y OCUPAN LA OFICINA CORRESPONDIENTE
SE CONTINUA ENCHAPE DE BAÑOS
SE HACE INSTALACION DE SANITARIOS
SE HACE APLICACION DE BOQUILLA
SE INICIA EMPALME DE TUBERIA PARA RED CONTRA INCENDIO
ARQ. JOHN ALEXANDER LÓPEZ / RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ANEXO 3. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450714-9	CONSORCIO INTERCONSULTORES	CALLE 147 No. 7 -92	3106181398	gordillogog@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	Y	04/04/2025	85435690	$323.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	323.500				323.500	1	300	323.800			3.235	323.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	323.500	323.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	323.500	323.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901450714-9	CONSORCIO INTERCONSULTORES		CALLE 147 No. 7 -92	3106181398	gordillogog@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	Y	04/04/2025	85435690	$323.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1083868569	ARTUNDUAGA TORRES ANGELA MARCELA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1083918230	NUÑEZ PALOMAR OSCAR DAVID	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	33218953	VILLARREAL AMARIS SANDRA MILENA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-25	1.800.000	5	125.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACIONES

Fecha creación reporte: 2025-04-04, 12:00:15 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Planilla Número:** 76558024

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 04/04/2025

Nit: N860011153

Administradora: POSITIVA DE SEGUROS

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS				
Documento	NI900581578	**Dirección**	CL 147 #7 B - 92 TORRE 1 INT 701		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8034165		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	6
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO	**Identificación**	CC 19287455		

II. DETALLE DE LOS AFILIADOS

Datos del Afiliado							Novedades									Riesgos						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ext. no obligado	Residente Exterior	Código Depto y Municipio	ING	RET	VCT	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	IRP	Salario Básico	Días Cotizados	Tarifa	IBC	Cotización	Código Centro de Trabajo	Código Nueva Administradora de Salud	Código Nueva Administradora de Pensión
CC 1016027631	MADELEINE KATHERIN MOSQUERA IBAGOS	59	00			11 001										0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1049636766	DIANA KATHERINE RUBIO PAREDES	59	00			15 001										0	$ 1.600.000	30	0.0696	$ 1.600.000	$ 111.400	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1121827525	JUAN CARLOS MARTINEZ ROA	59	00			50 001										0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 1233491368	CRISTIAN STIVEN RODRIGUEZ LEAL	59	00			11 001										0	$ 1.423.500	30	0.0696	$ 1.423.500	$ 99.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 79722084	JOHN ALEXANDER LOPEZ PEREZ	59	00			50 001										0	$ 1.600.000	30	0.0696	$ 1.600.000	$ 111.400	000000000	NIN-EP	NIN-AF
CC 80073262	RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO	59	00			11 001										0	$ 2.400.000	30	0.0696	$ 2.400.000	$ 167.100	000000000	NIN-EP	NIN-AF

III. TOTAL AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES:

Sumatoria IBC	Incapacidades Pagadas	Valor Pagado a otros Subsistemas Riesgos	Valor Aportes Netos	Intereses Mora Riesgos	Saldo a favor	Total Pagado
$ 9.870.500	$ 0	$ 0	$ 687.200	$ 0	$ 0	$ 687.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901450714-9	CONSORCIO INTERCONSULTORES	CALLE 147 No. 7 -92	3106181398	gordillogog@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85434737	$5.678.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	62.400	0		0		0	1	100	0	62.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	694.500	0		0		0	1	500	0	695.000	5

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	521.600	0	0	0	0	1	400	0	522.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.505.600	0	0	49.900	49.900	1	1.700	200	2.607.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.033.400				1.033.400	1	700	1.034.100			10.334	1.034.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	461.000	1	300	461.300	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	182.000	1	200	182.200	3
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	113.900	1	100	114.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	756.900	757.500
Pensión	2	3.127.000	3.129.300
Riesgos Laborales	1	1.033.400	1.034.100
CCF	3	756.900	757.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.674.200	5.678.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	901450714-9	CONSORCIO INTERCONSULTORES	CALLE 147 No. 7 -92	3106181398	gordillogog@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					6	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85434737	$5.678.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1020760496	GORDILLO MACHADO LAURA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1063162994	CARDENAS BARRIOS INES MARIA	1	0			S																	230301	1.560.000	249.600	0	0	0	0	EPS002	1.560.000	62.400	14-25	1.560.000	1	8.200	CCF06	1.560.000	62.400	0	0	0	0	0
3	CC	46371421	FONSECA CRISTANCHO VIVIANA YANETH	1	0			S																	25-14	2.847.000	455.600	0	0	0	0	EPS005	2.847.000	113.900	14-25	2.847.000	5	198.200	CCF43	2.847.000	113.900	0	0	0	0	0
4	CC	52387407	LOPEZ AROCA MARIA LUCRECIA	1	0			S																	25-14	9.964.500	1.594.400	0	0	49.900	49.900	EPS005	9.964.500	398.600	14-25	9.964.500	5	693.600	CCF06	9.964.500	398.600	0	0	0	0	0
5	CC	52800424	GORDILLO MACHADO ADRIANA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	79522618	LOPEZ AROCA RAUL WILLIAM	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900581578-1	GORDILLO ASOCIADOS SAS	CALLE 147 No. 7B-92 Apto 701	6018034165	gordillogog@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85433138	$437.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	148.100	0		0		0	0	0	0	148.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	26.900				26.900	0	0	26.900			269	26.900	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF06	Combarranquilla	890102002-2	148.100	0	0	148.100	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	205.100	205.100
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	26.900	26.900
CCF	2	205.100	205.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	437.100	437.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900581578-1	GORDILLO ASOCIADOS SAS	CALLE 147 No. 7B-92 Apto 701	6018034165	gordillogog@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	04/04/2025	85433138	$437.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19287455	GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	3.700.033	148.100	14-23	3.700.033	1	19.400	CCF06	3.700.033	148.100	0	0	0	0	0
2	CC	19360389	ALEJO PAEZ FERNANDO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	19287455	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO	CALLE 160 NO. 73 - 47 TORRE 5 APTO 1401	3027413	gordillogog@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	04/04/2025	85396195	$185.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	185.500	185.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	19287455	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO		CALLE 160 NO. 73 - 47 TORRE 5 APTO 1401	3027413	gordillogog@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	04/04/2025	85396195	$185.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19287455	GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO	59	2			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 6. FICHAS TECNICAS DE MATERIALES EMPLEADOS

GRIFOS TIG

LAVAMANOS DE PUSH ECO

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: TLP-03

TIPO: PUSH




CARACTERÍSTICAS GENERALES

Grifo para lavamanos de accionamiento manual tipo push. Caudal de 1,5 gpm y conexión de ½". Cuerpo en bronce sólido cromado. Unidad de cierre en bronce. Presión de funcionamiento: 10–125 psi. Construida para resistir las duras pruebas de la norma ANSI 112.18.1.M, ICONTEC 1644. Cierre suave, evitando golpe de ariete. Económica y durable.

CONTENIDO

1. Grifo lavamanos tipo push.
2. Empaque de fijación.
3. Kit de fijación.
4. Escudo cromado.
5. Tuerca de fijación.

PLANOS TÉCNICOS

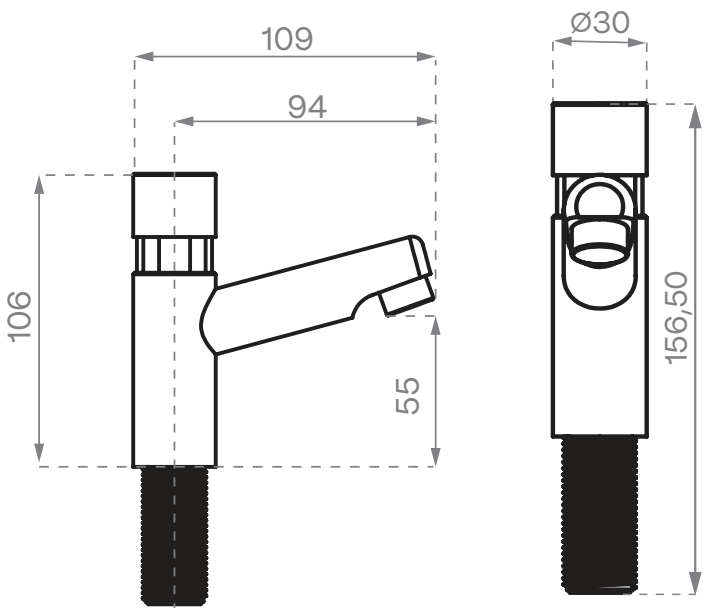

FUNCIONAMIENTO

1. Presione la válvula para permitir el paso del agua.

2. Despues de 5 segundos el grifo se cierra automaticamente.

Nota: El tiempo de apertura varía dependiendo de la presión del agua.

www.grifostig.com

grifostig

GRIFOS TIG

cerámica SAN LORENZO

Con manos y corazón colombianos



Piedra Pizarra **Negra**

Tipo: Piso
Tamaño Nominal: 50x50cm
Acabado: Mate
Uso: RG - Residencial General
Tipología: Rústico - Piedra

Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales.
Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.

Simulación composición de producto

cerámica SAN LORENZO

Con manos y corazón colombianos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los productos fabricados por Cerámica San Lorenzo cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321. Garantía del producto 5 años.

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL				
ITEM	**ESPECIFICACIÓN**		**ENSAYO NTC**	**CUMPLE**
Longitud y Ancho	La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación	+/- 0,6%	4321-2	✓
Espesor	La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación	+/- 5,0%	4321-2	✓
Rectinilidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,5%	4321-2	✓
Ortogonalidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,5%	4321-2	✓
Planaridad	La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)	+/- 0,5%	4321-2	✓
Calidad Superficial	La Baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia	Mínimo 95%	4321-2	✓
PROPIEDADES FÍSICAS				
ITEM	**ESPECIFICACIÓN**		**ENSAYO NTC**	**CUMPLE**
Absorción de agua	6 % < Eb ≤ 10 % (Grupo BIIb)	6% al 10%	4321-3	✓
Resistencia a la rotura por flexión (N)	Espesor ≥ 7,5 mm	>500N	4321-4	✓
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18, mínimo Indiv.16	> 18N/mm2	4321-4	✓
Resistencia al impacto	Coeficiente de restitución	> 0,55	4321-5	✓
Resistencia a la Abrasión	Clase		4321-7	Clase 2
Resistencia por humedad en mm/m2	Método de ensayo disponible		4321- 10	✓
Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas)	Requerido		4321- 11	✓
Coeficiente de Fricción	Clase de coeficiente de fricción según el método DCOF.		4321-17	Clase 1
PROPIEDADES QUÍMICAS				
ITEM	**ESPECIFICACIÓN**		**ENSAYO NTC**	**CUMPLE**
Resistencia a los químicos	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Mínimo GB	4321-13	GLA
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Clase 3	4321-14	Clase 5

CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO			
CLASE	**RESULTADO**	**ABREV.**	**DESCRIPCIÓN**
CLASE 1	DCOF < o = 0.42	C1	Pisos cuya superficie se mantendrá seca cuando camine sobre ella.
CLASE 2	DCOF > 0.42	C2	Pisos con presencia permanente de agua cuando se camina sobre ellos. Ej: Pisos de duchas, zonas exteriores a la intemperie, alrededores de piscinas.
NO APLICA		N/A	Paredes. Este método de ensayo solo aplica para productos que se empleen para uso en pisos.
Esta clasificación es orientativa ya que el riesgo de deslizamiento no puede ser completamente eliminado en revestimientos cerámicos. **Señor consumidor:** Asegúrese la información correcta para determinar qué productos son los apropiados para las condiciones específicas de uso.			

INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO
Marca comercial: Cerámica San Lorenzo País Origen: Colombia Tipo de calidad: Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja). Tipo de superficie: Esmaltada (GL) Método de fabricación: Método B, prensado en seco Norma Técnica Colombiana: NTC 919, anexo K / ISO 13006 Fabricante: Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia SAS ZFPE NIT 900.208.445
Tamaño Nominal: 50,0 cm X 50,0 cm Tamaño Fabricación: 500 mm X 500 mm X 7,0 mm Tamaño modular Lote y fecha de fabricación: verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.

	INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA		
	TIPO DE PRODUCTO	**TAMAÑO NOMINAL**	**PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA**
	PISO	50x50	3,56
	INFORMACIÓN PARA UNA CAJA		
	NÚMERO DE PIEZAS	**ÁREA NOMINAL M2**	**PESO APROXIMADO (kg) X CAJA**
	9	2,25	32,50
	INFORMACIÓN PARA UNA PALLET		
	NÚMERO DE CAJAS	**ÁREA NOMINAL M2**	**PESO APROXIMADO (kg) X PALLET**
	56	126,0	1.820


USO		**TABLA DE USOS RECOMENDADOS**
P		**PARED:** Uso exclusivo para instalar en muros y/o paredes en zonas interiores y algunos exteriores.
RM		**RESIDENCIAL MODERADO:** uso en habitaciones y áreas sociales sin acceso directo a la calle. Evite instalar en cocinas y áreas con acceso al exterior como escaleras, pasillos y corredores.
RG		**RESIDENCIAL GENERAL:** uso en áreas sociales, cocinas, pasillos, ingresos, patios, balcones y algunas terrazas.
CM		**COMERCIAL MODERADO:** uso en puntos fijos, salas de reunión, consultorios, oficinas e interior de locales comerciales, todos ellos con tráfico liviano sin acceso directo al exterior.
CG		**COMERCIAL GENERAL:** uso en oficinas y locales comerciales con tráfico moderado. No usar en áreas de alto tráfico.
Para cualquier uso, verificar si el producto es apto para instalar en zonas húmedas según las recomendaciones en la tabla de coeficiente de fricción impresa en la caja.		

cerámica SAN LORENZO

Con manos y corazón colombianos



Grado de Destonificación



Todas las piezas de la referencia son iguales, no hay variaciones ni de tono ni de diseño.

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA es una boquilla cementicia con desempeño mejorado en abrasión, clasificada como CG2A según la norma NTC 6050-3. Está diseñada a partir de la mezcla en polvo de cemento, agregados finos, aditivos poliméricos (látex) y pigmentos, los cuales se homogenizan fácilmente con agua. Además, presenta una nueva tecnología que evita la formación de hongos y algas creando espacios más higiénicos.

Usos
CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA está diseñada para emboquillar las juntas de 1-5 mm en revestimientos de alta y baja absorción como cerámica, revestimientos porcelánicos, piedras naturales (pizarra, granito, mármol) y revestimientos vitrificados (Cristanac) en zonas interiores y exteriores, además de fachadas, balcones, terrazas y piscinas.

3. VENTAJAS

- CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA viene lista para usar y no requiere mezclas con otros materiales.
- Inhibe la formación de hongos y algas.
- Disminuye la aparición de eflorescencias (aparecen como una mancha blancuzca) en las boquillas de color oscuro.
- Permite emboquillar juntas de 1-5mm con una textura suave y sin fisuras.
- Está clasificada como CG2A según la norma NTC 6050-3 y por lo tanto presenta un desempeño mejorado en abrasión, es decir, que su desgaste es menor en el tiempo en comparación con las boquillas normales (CG1).
- Ideal para emboquillar todo tipo de revestimiento: cerámica, revestimientos porcelánicos, piedras naturales (pizarra, mármol, granito) y revestimientos vitrificados (tipo Cristanac), en zonas interiores y exteriores, paredes y pisos, en fachadas exteriores[1], balcones, terrazas y zonas con estanqueidad[2] (piscinas, fuentes de agua, etc).
- Ofrece una amplia gama de colores.
- Solo basta agregar la cantidad de agua recomendada (3 partes de Concolor® Junta Estrecha por 1 parte de agua).
- Su consistencia cremosa permite excelente trabajabilidad y facilidad de aplicación.
- Permite preparar la cantidad total de la bolsa (5 kg o 2 Kg sin que se fragüe tempranamente en el balde (aprox. 40 min).
- Respaldo y garantía de la marca Corona. Encuentra los detalles en https://corona.co/garantias

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA se presenta en cajas de 2kg y 5kg en colores variados.

Se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado, separado del piso y de las paredes. Se sugiere no arrumar más de 5 cajas o bandejas contenedoras (cada bandeja contiene 6 cajas de 5 kg o 12 cajas de 2 kg).

El producto vencerá 12 meses después de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

5. PROPIEDADES

Tabla de rendimiento en kg/m²

A continuación se presenta el rendimiento de la boquilla CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA (en kg/m²) según el ancho de la junta (en mm) y el formato del revestimiento (en cm).

	ANCHO DE JUNTA			
FORMATO (cm)	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
10x10x0,9	0,65	0,97	1,30	1,62
20x20x0,9	0,32	0,49	0,65	0,81
30x30x0,9	0,22	0,32	0,43	0,54
30x60x0,9	0,16	0,24	0,32	0,41
40x40x0,9	0,16	0,24	0,32	0,41

El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique. Ver en la sección 7 las recomendaciones de ancho de juntas mínimos en relación con el tamaño del revestimiento.

[1] Para instalación de fachadas se recomienda hidrofugar la junta con Superfachada Paraguas®.

[2] Para instalación en zonas húmedas (terrazas, piscinas, fuentes, etc) se recomienda el Concolor de color blanco o súper blanco.

Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co

Características en estado seco

Densidad suelta en polvo	1.0 ±0.1 g/cm$^{3.}$
Color(es)	Variados.

Características en estado fresco (CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA + más agua)

Consistencia	Cremosa.
pH	Aprox. 11.
Densidad	1.8 ± 0.1 g/cm$^{3.}$
Relación de agua en la mezcla	3 partes de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA por 1 parte de agua (medidas en volumen).
Duración de la mezcla en balde	40 minutos.
Tiempo de espera para acabado	30 minutos a partir de que la junta se observe opaca.
Tráfico peatonal ligero	24 horas.
Puesta en servicio	>10 días.

Prestaciones finales

Determinadas según los procedimientos de las normas NTC 6050-3 y NTC 6050-4.

Característica	Valor
Resistencia a la flexión (MPa)	≥2.5
Resistencia a la compresión (MPa)	≥15
Absorción de agua a 30 min (g)	≤5
Absorción de agua a 240 min (g)	≤10
Retracción (%)	≤0.3
Resistencia a la abrasión (mm^3)	≤1000

El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

6. INSTRUCCIONES DE USO Y LIMPIEZA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

- Antes de emboquillar las juntas se debe asegurar que estén secas y limpias, sin polvo, grasas, pintura, exceso de adhesivo, lechada de cemento o cualquier otro tipo de impureza. Asegurar que las juntas estén vacías en al menos 2/3 partes del espesor del revestimiento.
- Remueva el polvo, exceso de adhesivo o cualquier otro contaminante que pueda causar cambio de color o tono en la junta.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Homogenice el polvo que se encuentra dentro de la bolsa de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA antes de utilizarla.
- En un recipiente limpio verter 1 parte de agua limpia por 3 partes de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA (medidas en volumen).
- Mezcle a baja velocidad con una mezcladora (300 rpm aproximadamente) durante 1 minuto.
- Deje reposar la mezcla mínimo 5 minutos.
- Vuelva a mezclar nuevamente el producto durante 1 minuto, sin agregar agua.
- A temperaturas mayores a 35°C puede ocurrir una rápida evaporación de agua adicionada a la mezcla, ocasionando un secado rápido. Si el producto se pone rígido antes de usarlo totalmente (40 minutos aproximadamente) mezcle nuevamente, sin agregar agua, para continuar utilizándolo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplique la mezcla de CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA con una espátula de caucho, en forma diagonal a la dirección de las juntas, presionando para que la mezcla pueda entrar en estas, cuidando que el producto quede compacto y libre de vacíos, hendiduras o fisuras.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- Para la limpieza inicial después de la instalación, permita que el material adquiera suficiente dureza superficial para evitar dañarlo, usualmente entre 20-30 minutos dependiendo de la temperatura y humedad relativa del sitio de instalación. Debe comprobarse al tacto que el material no se adhiera al dedo.
- Remueva el exceso del producto en la superficie del revestimiento con una esponja de espuma rígida ligeramente húmeda. Esta limpieza debe realizarse de la misma forma en que se realizó la aplicación, es decir limpiando en forma diagonal a la dirección de la junta.
- Tenga presente enjuagar la esponja periódicamente con agua limpia. Evite poner en contacto la boquilla con agua en exceso, esto causa cambios en el color y aparición de eflorescencias.
- Realice la segunda limpieza después de aproximadamente 2 horas con un paño limpio y seco. Limpie la superficie del revestimiento en forma diagonal al sentido de la junta. Tenga cuidado con el polvo que pueda estar sobre el revestimiento pues podría impregnar la junta ocasionado contaminaciones y cambios de tono.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- Las condiciones de obra (como limpieza de la junta, tipo de herramientas, limpieza de agua, exposición a los rayos del sol, humedad, exposición prolongada al agua y el paso del tiempo, entre otros) el tipo de revestimiento y su grado de absorción pueden afectar el tono final del producto y puede variar la uniformidad del color en toda la junta instalada., por lo tanto, realice una prueba preliminar de 10 m^2 para controlar que el color en la junta sea el esperado. Deje fraguar por lo menos 24 horas y haga una revisión de lo instalado. Si observa cambios en la tonalidad o el color no es el esperado, suspenda inmediatamente la instalación y comuníquese a la línea de servicio al cliente 018000512030. Si no realiza la prueba y/o si realizada la prueba continúa instalando, no se aceptará ningún tipo de reclamación sobre la instalación para ser evaluada.

Superficies, Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co

- La etiqueta que indica el color en el empaque del producto es solo una guía. El tono del color puede presentar variaciones una vez aplicado el producto.
- CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA debe ser aplicado al menos 24 horas después de la instalación del revestimiento, asegurándose que el adhesivo esté seco y que los revestimientos estén bien fijados. Si la temperatura ambiente es menor de 10°C se debe esperar 72 horas antes de instalar.
- CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA debe ser mezclado en los tiempos recomendados en esta ficha técnica. De otra forma pueden ocurrir cambios de tonalidad o aparición de manchas.
- CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA está diseñado para juntas desde 1mm de espesor hasta 5 mm. Para un desempeño óptimo de la boquilla, se recomienda que las juntas sean mínimo de 2mm para revestimientos menores de 30cm, y mayores de 3mm para revestimientos de más de 30cm.
- No realizar juntas a tope, pues ello impide una buena penetración del producto dentro de la junta, desfavoreciendo la adherencia y el funcionamiento de todo el sistema instalado.
- No mezcle el producto con cemento de ningún tipo, arena, blanco de zinc, dióxido de titanio, ni otros productos.
- El agua, los recipientes y las herramientas de trabajo deben estar limpias antes de entrar en contacto con CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA.
- No agregue más agua de la indicada en la preparación del producto ni durante su aplicación. Esto puede ocasionar contracciones excesivas, fisuración, aparición de eflorescencias y tonalidades de color diferente. Además puede producir hundimiento de la junta instada, afectando la estética del revestimiento.
- CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA es una formula a base de cemento portland susceptible a la formación de eflorescencias. Esta formación de carbonato de calcio que aparece sobre el producto puede ser también causado por la humedad residual contenida en el pegante o en el mortero, o por humedad ascendente las cuales no obedecen a defectos de calidad del Concolor.
- No realice la aplicación en superficies contaminadas con polvo, grasa, aceite y suciedad, ya que esto ocasiona perdida de adherencia, texturas rugosas y cambio de color.
- No realice la aplicación sobre boquilla ya existente, esto ocasiona desprendimientos y cambios de color.
- Mantenga el área donde se aplicó el producto libre de tráfico por lo menos 24 horas
- En piscinas asegure que el llenado no sea antes de 15 días y que el agua de la piscina en todo momento cumpla con pH neutro (7.2 a 7.6), cloro residual libre (1 a 3 mg/L) , dureza total (200 y 400 mg/L) y alcalinidad total (80 y 140 mg/L). Si las condiciones no se cumplen existirá una pérdida de la resistencia de la boquilla y un deterioro inminente de la junta. Además, se deben seguir las indicaciones de las sustancias que utiliza para el control de todos los parámetros, entre ellas la dilución y cantidad de producto por m^3 de agua, etc. Igualmente, asegúrese de cumplir con los otros parámetros establecidos en la Resolución Número 1618 De 7 Mayo de 2010 emitida por el Ministerio de Protección Social.
- CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA contiene dentro de su formulación cemento portland. Por tanto, la prolongada exposición a sustancias acidas y/o altas concentraciones de cloro ponen en riesgo las resistencias mecánicas del producto, pueden alterar su color y se pueden formar eflorescencias
- La aplicación en temperaturas ambiente menores de 5°C puede ocasionar tiempos largos de secado del producto ocasionando hundimientos de la junta instalada.
- En temperaturas ambiente mayores a 35°C puede ocurrir una rápida evaporación de agua del producto, ocasionando un secado rápido del mismo.
- No emboquille las juntas de expansión/movimiento con CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA. El producto no permite el libre movimiento en las juntas.
- No debe utilizarse en áreas donde existan condiciones de acidez.
- Si la limpieza se realiza omitiendo las indicaciones de limpieza que se encuentran en esta ficha técnica (cuando al tacto con la junta hay adherencia del producto), las juntas pueden vaciarse parcialmente y tiene mayor probabilidad de presentar tonalidades diferentes en su color.
- En caso de aplicación en climas calurosos, secos o con alta ventilación o revestimientos muy absorbentes, humedecer las juntas con agua limpia antes de comenzar la aplicación.
- Use CONCOLOR® ANTIMANCHAS cuando requiera resistencia a químicos y no formación de eflorescencias en la superficie instalada.(ver ficha técnica del productowww.corona.co).
- Se recomienda hacer limpieza de las juntas después de 28 días de instalado el CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA, con cepillo de cerdas suaves y limpiadores recomendados para este uso.
- No utilizar ningún limpiador de pH acido en juntas de color oscuro (negras, azul, ladrillo. etc).

Superficies, Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co

8.EXCLUSIONES DE GARANTIA

Los siguientes eventos no están cubiertos por esta garantía y por lo tanto, los gastos y costos derivados de los mismos no serán asumidos por Corona, aunque sucedan durante el período de garantía:

1- La variación de color y las eflorescencias, debido a que son condiciones normales de los productos a base de cementos hidráulicos y por lo tanto no constituyen defectos de fabricación.
2- Problemas, defectos y daños derivados de la no atención de las instrucciones de instalación y uso las cuales se encuentran en el empaque y las fichas técnicas. Esto incluye, pero no se limita a:
    a. Problemas o mala instalación del producto.
    b. Mezcla del producto con cualquier elemento diferente al agua.
    c. Daños derivados de la incorrecta dosificación de agua de amasado.
    d. Omisión o uso incorrecto de llana de goma.
    e. Omisión de los tiempos establecidos en la ficha técnica para los procesos de limpieza requeridos.
    f. Omisión o incorrecto uso de las dimensiones de las juntas y de la limpieza de las mismas.
    g. Omisión de los tiempos establecidos en la ficha técnica para la transitabilidad y/o puesta en uso de la instalación.
3- Omisión de las condiciones establecidas en la ficha técnica para el uso en piscinas.
4- Problemas, defectos y daños causados por un mantenimiento inadecuado, o la limpieza del producto con elementos no recomendados como químicos, abrasivos, ácidos, disolventes o herramientas de aseo diferentes a las recomendadas en la ficha técnica.
5- Desgaste normal del producto por su uso o el paso del tiempo.
6- Eventos en los que el producto ha sido intervenido o reparado por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por Corona.
7- Reclamos relativos a los defectos obvios o evidentes en la apariencia y color con posterioridad a la instalación.
8- Daños causados a otros bienes como consecuencia de la instalación del producto.
9- Problemas, defectos y daños causados por el contacto con elementos extraños tales como humedades permanentes por fugas de agua, elementos vibratorios, sismos o elementos que imposibiliten su correcto funcionamiento.
10- Daños que ocurran al producto durante su transporte o instalación que no sean imputables a Corona.
11- Problemas, defectos y daños derivados de la omisión de utilizar en las aplicaciones que forman parte de la instalación los productos que se indican en la ficha técnica del producto.
12- Producto endurecido después de la fecha de vencimiento descrita en el empaque.

Por favor tenga en cuenta que conforme al Estatuto de Protección al Consumidor el productor se exonerará de hacer efectiva la garantía cuando los problemas, defectos y daños se deriven de: a) La fuerza mayor o caso fortuito; b) El hecho de un tercero; c) El uso indebido del producto por parte del consumidor; y d) no atender las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual de producto y en la garantía.

9. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona son compatibles a CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA.

Rascador de juntas Rubi: Para eliminar residuos de pegante en las juntas.

Poliuretano 100%: **P**ara rellenar las juntas de expansión/dilatación.

Sellador de Juntas Corona: Para proteger la junta después de emboquillar.

Limpiador de Juntas-Corona: Para realizar la limpieza de las juntas (Este producto úselo máximo 2 veces al año). No recomendado para colores oscuros de boquilla.

Además, crucetas o separadores de juntas y llanas según formato de revestimiento.

10. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto	Tipologia de producto	VOC calculados máximos(*)	Materiales regionales (distancia < 800 km)
Concolor® Junta Estrecha	Polvo	0.00g/l	Sabaneta (Ant.)
Contenido de materiales post-industriales (% en peso)			0

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC´s en base humeda.

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad: Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas durante la manipulación del producto. Este producto no es inflamable.

12. SEGURIDAD AMBIENTAL

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de este producto para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación se debe tener en cuenta lo siguiente:

SUELO
Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

AIRE
Evite la dispersión del producto y la generación de material particulado (polvo). Para ello, al verter el

Superficies, Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co

contenido de los empaques, hágalo desde una altura moderada (no superior a 50cm).

AGUA
Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental del producto consulte la Hoja de Seguridad del Producto que la encuentra en https://corona.co/productos/boquillas/concolor-junta-estrecha/p/993057501

13. NOTAS LEGALES

La información proporcionada en esta Ficha de Técnica de Producto, está concebida solamente como una guía para el uso del CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA, y es suministrada de buena fe basados en la experiencia y la práctica de CORONA® sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la gran variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obras diferentes, y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de la mano de obra, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

La garantía ofrecida por CORONA®, sólo cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de los mismos, en la ficha técnica, documento de garantía y/u hoja de seguridad entregada al cliente.

CORONA® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Todo usuario del CONCOLOR® JUNTA ESTRECHA, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.

Superficies, Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co

Cielos Rasos PVC

Infinity pvc Ceiling

PVC arquitectónico ind.

- Auto extinguible
- Aislante térmico
- Aislante acústico
- Fácil de limpiar
- Rápidos de instalar
- Alta durabilidad
- Resistente al agua
- No necesita pintura



Zonas Húmedas: Baños, Turcos, Piscinas, Saunas, Gimnasios.



Zonas de Alto Tráfico



Zonas Antisépticas: Hospitales, Clínicas, Laboratorios, Restaurantes.

Láminas de PVC para cielos



Ejecutivo



Gris jaspeado

Blanco brillante



Blanco mate



Blanco humo



Madera claro

www.adldrywall.com









Grifería de push para lavamanos de mesa

SKU: TLP-08

Grifo de muro para lavamos de accionamiento manual tipo push. Caudal de 0.9 gpm (4 L/min) conexión de 1/2". Cuerpo en acero inoxidable 304. Cartucho magnético. Presión de funcionamiento 10-125 psi. Construida para resistir las duras pruebas de la norma ANSI 112.18.1.M, ICONTEC 1644. Cierre suave, evitando golpe de ariete. Disponible con extensor cuando se usa con lavamanos Vessel (no está incluido).

REF: TLP-08

Ver Ficha Técnica

Menos

LAVAMANOS TIPO VESSEL

RAZIONALE

Diseño vanguardista que hará de su baño un espacio moderno y exclusivo
Inspirado en las formas rectas y cúbicas.

- Permite la instalación de grifería monocontrol o conjunto de 4 y 8 pulg. de pico mediano.
- Tamaño ajustable para instalación en gran variedad de mesones.
- Incluye agujero de rebose integral con tapón cromado y desagüe push.



REF. O14601001

ESPECIFICACIONES

Material	Porcelana Vítrea
Acabado	Brillante
Largo	465 mm (18 3/8")
Ancho	465 mm (18 3/8")
Alto	145 mm (5 5/8")
Peso Neto	19.7 kg (43.4 lb)
Forma	Cuadrado
Profundidad del pozo	90 mm (3 1/2")
Dimensiones del pozo	L430 x A320 mm (L16 7/16 x A12 5/8")
Diámetro del desagüe	43.5 mm (1 3/4")
∅ agujero grifería	35 mm (1 3/8")
Tipo de lavamanos	Vessel
Tipo de instalación	Sobre superficie **(764 cm - 30 1/8" desde el piso)**

PRODUCTO EMPACADO

Peso Bruto	20.6 kg (45.4 lb)
Largo	470 mm (18 1/2")
Ancho	160 mm (6 5/16")
Alto	490 mm (19 5/16")
Volumen	0.04 m³ (1.3 ft³)

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética al producto y además le brindan protección.
- Para prolongar sus cualidades, es vital que la limpieza profunda del producto se haga **únicamente** con agua y jabón suave y que el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio.
- Dicha limpieza se recomienda **2 veces a la semana,** y en zonas costeras **a diario** por la salinidad del ambiente.
- Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto.
- Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

COMPONENTES INCLUIDOS

Botón rebose	Cromado **(ref. O19770001)**
Desagüe	Push met. c/rebose **(ref. 701110001)**

COLORES

100 - BLANCO

GARANTÍA COMPLETA
PARA SIEMPRE
En porcelana vítrea

GARANTÍA DE 5 AÑOS
En componentes

Tecnología
AquaFlow
Superficie homogenea que impide la acumulación de agua y residuos.

Tecnología
CoverGloss
Alta resistencia al rayado y a cambios de temperatura.

corona


LAVAMANOS TIPO VESSEL

RAZIONALE

NTC 920-2011
Aparatos Sanitarios de Cerámica

PLANOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO*

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

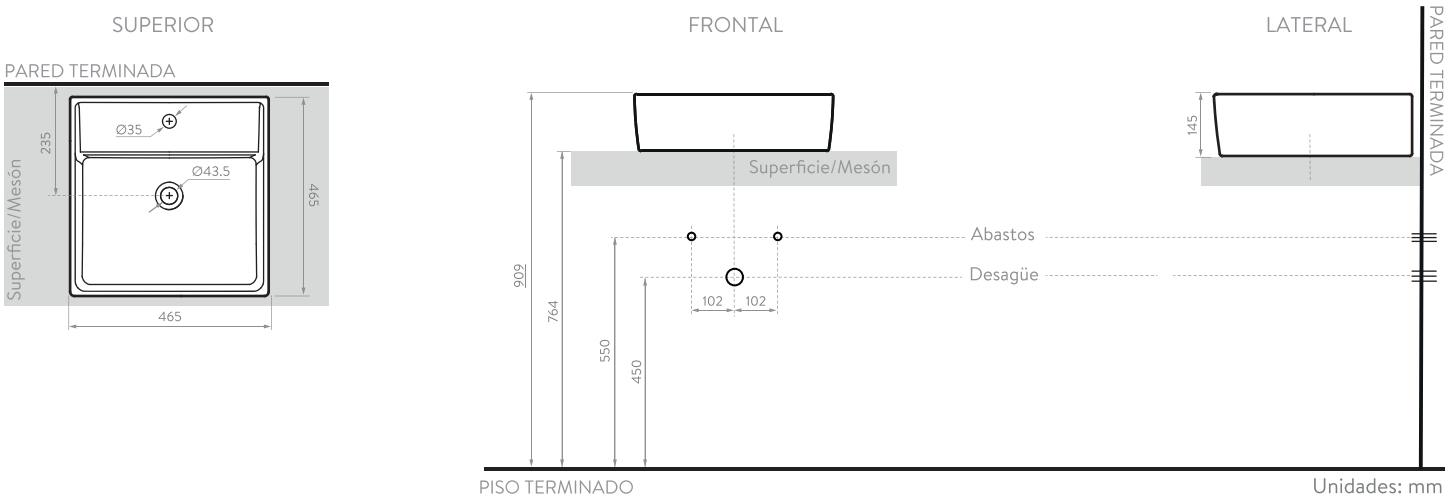

IMPACTO AMBIENTAL DEL PRODUCTO

El **95%** de los materiales por peso utilizados en la manufactura de nuestros productos cerámicos son extraídos/fabricados en territorio Colombiano de nuestras plantas de Antioquia y Cundinamarca.

Tipo de material	Contenido	Proceso
Pasta cerámica: 93.5% peso aproximado producto		
Arcillas Arcabuco (Boyacá)	89,5%	Extraído
Arcillas (Amalfi - Antioquia)		Extraído
Caolín (La Unión - Antioquia)		Extraído
Feldespato (Ibagué - Tolima)		Extraído
Residuos de tipo cerámico (Local: Girardota/Madrid)		Fabricado
Caolín (EUA, Portugal, Inglaterra)	4%	Extraído
Arcillas Finas (Inglaterra)		Extraído
Esmalte Vidriado: 6.5% peso aproximado producto		
Esmalte (Sabaneta - Ant.)	6.5%	Fabricado

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontarlo en el siguente link: **https://empresa.corona.co/sostenibilidad**

MATERIAL RECICLADO

Rotura aprovechada / Total de materias primas.

12% Planta Girardota

17% Planta Madrid

MATERIAL DE EMPAQUE

FSC www.fsc.org
MIXTO
Embalaje procedente de fuentes responsables
FSC® C011320

Fibra virgen **70%** | Reciclado **30%**

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá **404 88 84** / Resto del país **01 8000 5120 30**

CENTRO AMÉRICA: Guatemala **(502) 1-800-6240-109** / Nicaragua **(505) 2249-5521**
El Salvador **(503) 2274-4620** / Honduras San Pedro Sula **(504) 9482-6710**
Honduras Tegucigalpa **(504) 9767-0821** / Costa Rica **(506) 4001-4966** / Panamá **(507) 8000-202**
contacto_ca@corona.co.com

MÉXICO: Directo **(81) 8125 2000** / LADA sin costo **01 800 705 1020**

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

ANEXO 4. ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO SEMANAL


ACTA DE COMITÉ N° 21	FECHA	04-03-2025
	HORA	02:00 PM
	LUGAR	Palacio de Justicia Villavicencio - Virtual

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO."

ASISTENTE	CARGO	EMPRESA
ING. MONICA GONZALEZ	SUPERVISORA	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ING. LUCRECIA LOPEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
PROF. JUAN CARLOS MARTINEZ	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ING. FRANCISCO VILLANUEVA	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
PROF. MILENA DUQUE	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
ING. RODRIGO GONZALEZ	APOYO TÉCNICO OBRA CONSORCIO A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
ING. FABIAN CASTAÑEDA	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

TEMAS TRATADOS EN LA REUNION:	
TEMA HSE	
TECNICO ADMINISTRATIVO	
	HORARIO DE COMITÉ 2:00 PM

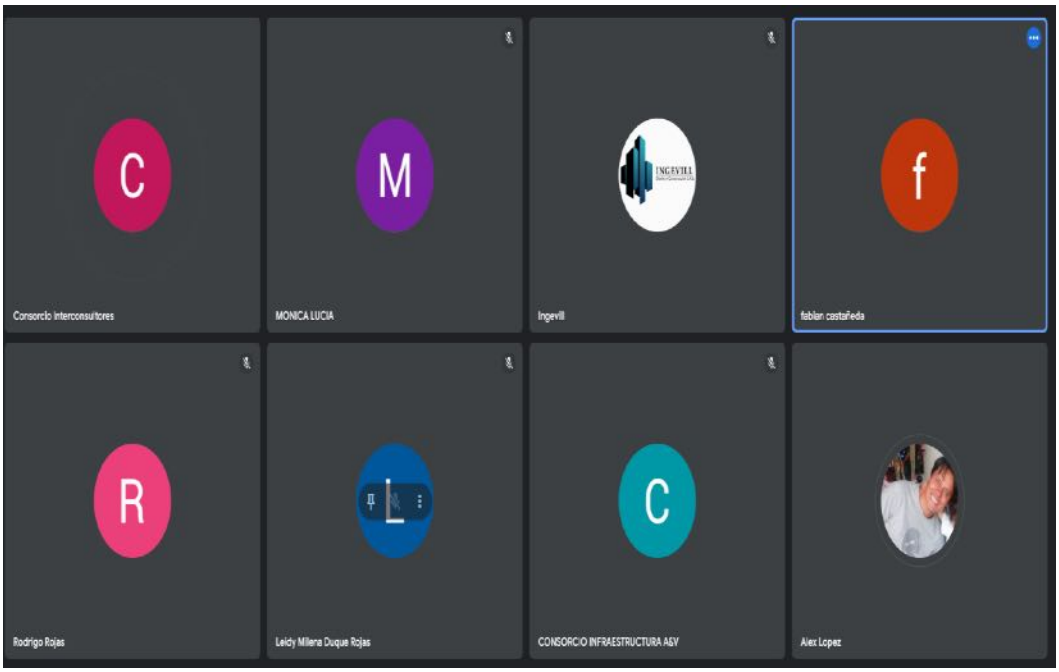

SE REALIZA VISITA Y RECORRIDO CON EMPRESA DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS POR SERVITEDH
SE SOLICITA CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TR 600
SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO PREVIO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y EL INGENIERO DIRECTOR DEL CONTRATISTA INFORMA QUE ESTA SEMANA SE INICIARÁ LA LABOR DE INSTALACIÓN DE DUCTERÍA

	EL INGENIERO DIRECTOR DEL CONTRATISTA INFORMA QUE VA A MOSTRAR FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA QUE LAS MAQUINAS TR 600 NO PUEDEN ESTAR EN FUNCIONAMIENTO JUSTIFICACION DE INFORMACION DEL EVENTO ENCONTRADO EN RELACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS LA SUPERVISION INFORMA QUE LOS AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES DEBEN QUEDAR FUNCIONANDO PARA QUE SE PUEDAN ENTREGAR Y POR ENDE ENTREGAR LAS OFICINAS – SUPERVISION SOLICITA FECHA DE ENTREGA DE LAS OFICINAS INTERVENTORIA HIZO OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO POR SER DEMASIADO GENERAL Y SE SOLICITA EL INFORME MAS DETALLADO SUPERVISION INFORMA QUE LAS OFICINAS DEBEN SER ENTREGADAS CON LOS AIRES FUNCIONANDO INGENIERO DIRECTOR DE CONTRATISTA INFORMA QUE NO PUEDE APLICAR GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE CENTRAL SUPERVISION SOLICITA AL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA LA ENTREGA DE LAS OFICINAS TIEMPOS DE REVISION DE DOCUMENTOS SON MUY EXTENSOS Y SUPERVISION SOLICITA QUE LOS AIRES CENTRALES DEBEN QUEDAR FUNCIONANDO FECHA DE ENTREGA DE LAS OFICINAS 18 DE MARZO DE 2025 SEGUN CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA A&V SUPERVISION SOLICITA QUE LOS AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES QUEDEN EN FUNCIONAMIENTO RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE ESTA SEMANA TENER EN CUENTA OBSERVACIONES REVISION DEL VOLTAJE EN OBRA DIA 05-03-2025 SE AHARA POR PARTE DE LA SUPERVISION Y EL PERSONAL ENCARGADO NOVEDADES DE PLANILLAS VENCIDAS REVISAR FECHAS REVISAR ACTIVIDADES ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA DE OBRA REVISAR SI HACEN FALTA ALGUNAS ACTIVIDADES PARA PODERLAS COMPLEMENTAR Y PODER DAR ALERTAS DE NECESIDADES DE ACTIVIDADES ADICIONALES LA REVISION DEL TEMA DE LAS MUESTRAS DE LAS TEJAS SE REALIZARA ANTES DEL DIA VIERNES 07 DE MARZO DE 2025 EL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA DEL CONSOCIO A&V SOLICITA REUNION VIRTUAL DE REVISION DE BALANCE DE OBRA PRESENTADO PARA EL MODIFICATORIO SUPERVISION INFORMA QUE EL DIA LUNES 10 DE MARZO DE 2025 SE HARÁ LA REUNION

CONTRATISTA A&V SOLICITA INFORMACION DEL COMPONENTE FINANCIERO POR TEMAS DE PAGOS DETENIDOS

SOLICITUD DE CANTIDADES PARA UNA NUEVA FACTURACIÓN PROBABLE LO MAS PRONTO POSIBLE

ACTUALIZACION DE LAS POLIZAS PENDIENTE INTERVENTORIA Y OBRA YA LAS OFICIALIZO
CARGADAS EN EL SECOP PARA APROBACION
PRIORIDAD DE ENTREGA DE OFICINAS

SEMANA 25	SEMANA 26
17-feb-25	24-feb-25
22-feb-25	1-mar-25
$ 182.757.793,94	$ 163.235.092,39
5,63%	5,03%
$ 3.080.576.263,55	$ 3.243.811.355,94
94,97%	**100,00%**
$ 16.884.669,41	$ 106.340.334,76
0,52%	3,28%
$ 1.873.135.701,47	$ 1.979.476.036,23
57,74%	**61,02%**
$ 182.757.793,96	$ 163.235.091,67
5,63%	5,03%
$ 3.080.576.263,82	$ 3.243.811.355,49
94,97%	**100,00%**
-37,22%	**-38,98%**

PORCENTAJE DE AVANCE: RETRASO 32.11%

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
	REUNION CON DIRECCION ADMINISTRATIVA, INTERVENTORIA, CONSORCIO	SUPERVISION DIRECCION EJECUTIVA-CONSORCIO INTERCONSULTORES - CONSORCIO A&V	10-03-2025
	REVISION DE MATERIAL DE TEJAS UPVC PARA APROBACION	SUPERVISION DIRECCION EJECUTIVA	07-03-2025
	FECHA DE ENTREGA DE OFICINAS 515-514-513	CONAORCIO A&V	18-03-2025

SEGUIMIENTO SEMANAL


ACTA DE COMITÉ N° 22	FECHA	27-03-2025
	HORA	02:00 PM
	LUGAR	Palacio de Justicia Villavicencio - Virtual


OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO."

ASISTENTE	CARGO	EMPRESA
ING. MONICA GONZALEZ	SUPERVISORA	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ING. LUCRECIA LOPEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
PROF. JUAN CARLOS MARTINEZ	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ING. FRANCISCO VILLANUEVA	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
PROF. MILENA DUQUE	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
ING. RODRIGO GONZALEZ	APOYO TÉCNICO OBRA CONSORCIO A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
ING. FABIAN CASTAÑEDA	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

TEMAS TRATADOS EN LA REUNION:	
TEMA HSE	
TECNICO ADMINISTRATIVO	
	HORARIO DE COMITÉ 2:00 PM

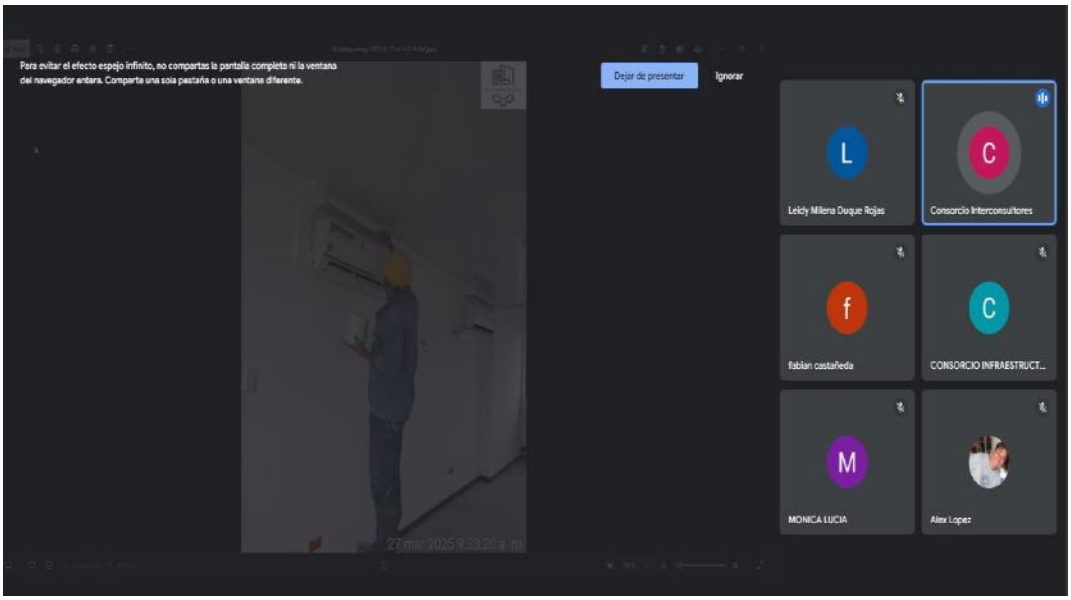

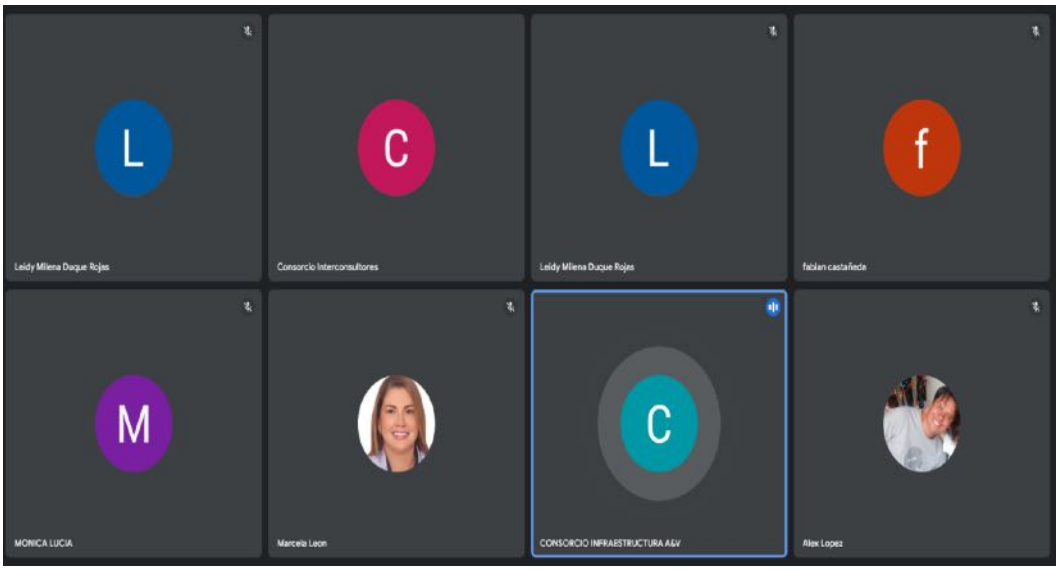

PRESENTACION DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS DE LA CUBIERTA PARA EL DIA DE HOY 27-03-2025 Y ESTO DEBE ESTAR METIDO EN LA PRORROGA

SOLICITUD DE LOS MACROMEDIDORES – PENDIENTE DEL MANEJO DE LOS MEDIDORES

OFICIO SOBRE LAS PUERTAS DE ACCESO – REUNION PARA DAR DIRECTRIZ AL CONTRATISTA

ENTREGA DE LAS OFICINAS 515-514-513 PARA AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR EL MOVIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ALA B
SE SOLICITA EL TEMA DE OFICINAS 512 Y 510 PARA ENTREGA Y PASAR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ALA B AL ALA A DE LA TORRE B PISO 5

SE SOLICITA NO BAJAR EL RITMO DE TRABAJO PARA ENTREGA DE LAS OFICINAS RESTANTES

QUEDA PENDIENTE DE REVISAR EL TEMA DE SISMOS PARA CONFIRMAR EL AREA DE ESTE ITEM Y PONERLO EN EL BALANCE FINAL

REVISAR AREAS DE RESANE Y PINTURA DE LOS CORREDORES DE AMBAS TORRES PARA PODER SACAR LAS CANTIDADES E INCLUIR EN EL BALANCE – SE INCLUYE ACCESO A CORREDOR DE ASCENSORES

TEMA DE GARITAS SE INFORMA EN EL PROXIMO COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE SUPERVISION DE OBRA

MATERIAL DE GRIFERIA, SANITARIOS Y LAVAMANOS YA ESTÁ EN VILLAVICENCIO PARA ENTREGA – YA PAGADO
PENDIENTE DE ENTREGA UNICAMENTE

SE INFORMA POR PARTE DEL CONTRATISTA A&V QUE SE ENTREGAN EN 12

DIAS LAS OFICINAS A LAS 7:00 AM // 07 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION DE ENCHAPES DE BAÑOS INFORMA EL CONTRATISTA A&V 02 DE ABRIL DE 2025 E INSTALACION DE CIELO RASO DE LAS AREAS DE BAÑOS DE TORRE A

VISITA DE REVISION DE MOTOBOMBAS Y DE PAISAJISMO PARA EL DIA 28-03-2025

REVISION DE SEÑALIZACION, DE ELEMENTOS EPP, DE VESTIMENTA DEL PERSONAL PARA AUDITORIA LOS DIAS 31-03-2025 // 01-04-2025

SE VERIFICA CON SST DE DIRECCION LAS INDUCCIONES PARA TENER EN CUENTA EN LA AUDITORIA QUE SE REALIZARA LA PROXIMA SEMANA – YA SE HA SEÑALIZADO Y SE HAN ORGANIZADO ELEMENTOS PARA EVITAR CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO

ENTREGA DE APU PARA EL DIA SABADO 29-03-2025

REVISION DE CANTIDADES DE BALANCE 28-03-2025 PARA ENTREGA

SEMANA 29
17-mar-25
22-mar-25
$ 152.392.683,99
4,70%
$ 2.594.278.196,90
79,98%
$ 63.078.059,77
1,94%
$ 2.121.562.647,98
65,40%
14,57%

PORCENTAJE DE RETRASO 14,57%

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
	REVISION DE DOCUMENTOS PARA PRESENTACION DE MODIFICATORIO Y ADICION PRESUPUESTAL	CONSORCIO A&V - CONSORCIO INTERCONSULTORES	28-03-2025
	ENTREGA DE BAÑOS ENCHAPADOS CON ACABADOS FINALES	CONSORCIO A&V	02-04-2025
	ENTREGA DE OFICINAS 514-513 A FUNCIONAMIENTO	CONSORCIO A&V	28-03-2025
	ENTREGA DE APUS DE CONSORICO A INTERVENTORIA	CONSORCIO A&V	28-03-2025
	ENTREGA DE OFICINAS ALA A PISO 5 TORRE B	CONSORCIO A&V	07-04-2025

SEGUIMIENTO SEMANAL


ACTA DE COMITÉ N° 23	FECHA	01-04-2025
	HORA	02:00 PM
	LUGAR	Palacio de Justicia Villavicencio - Virtual

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO."

ASISTENTE	CARGO	EMPRESA
ING. MONICA GONZALEZ	SUPERVISORA	DIRECCION EJECUTIVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ING. LUCRECIA LOPEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
PROF. JUAN CARLOS MARTINEZ	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ARQ. JOHN ALEXANDER LOPEZ	RESIDENTE INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERCONSULTORES
ING. FRANCISCO VILLANUEVA	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
PROF. MILENA DUQUE	PROFESIONAL HSE	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
ING. RODRIGO GONZALEZ	APOYO TÉCNICO OBRA CONSORCIO A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V
ING. FABIAN CASTAÑEDA	INGENIERO RESIDENTE CONSORCIO A&V	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

TEMAS TRATADOS EN LA REUNION:	
TEMA HSE	
TECNICO ADMINISTRATIVO	
	HORARIO DE COMITÉ 2:00 PM

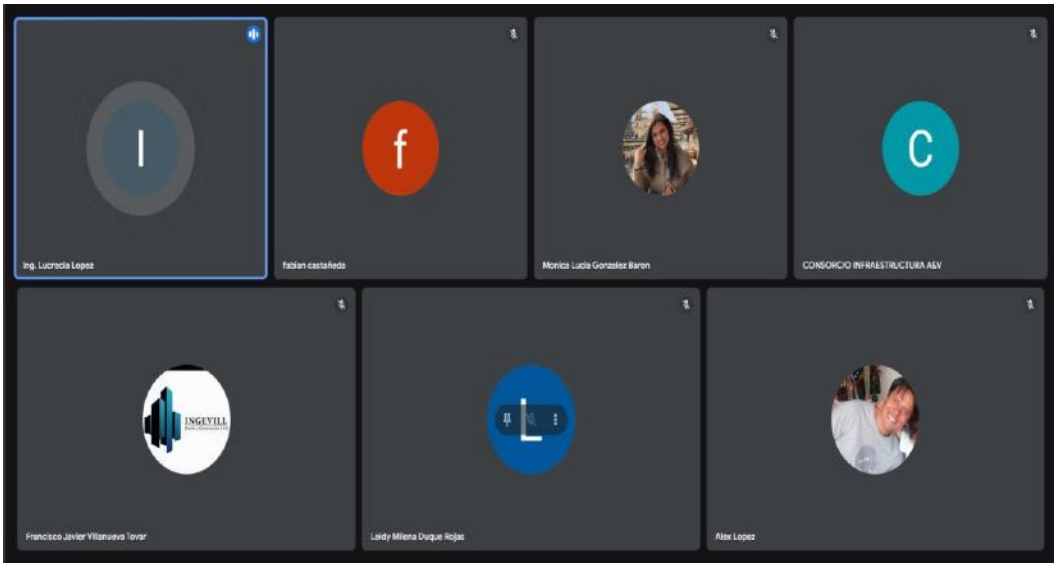

SE RECIBIERON COTIZACIONES DE APUS PARA BOMBAS Y MEDIDORES
SE ENTREGAN ENEN HORAS DE LA TARDE DE 01-04-2025
DOS MACROMEDIDIORES DE PULGADA Y MEDIA PARA EL DIA DE HOY 01-04-2025 PARA REVISION DE INTERVENTORIA

SE HACE REVISION EN COMITÉ DE OBRA DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LOS DOMOS DE LA CUBIERTA DE LAS TORREA A Y B
SE SOLICITA EL COSTO DE LA PROPUESTA – EL COTRATITA INFORMA QUE LA INGENIERIA DE DETALLE SE REQUIERE COSTEAR PARA DEFINIR SI SE VA A REALIZAR DE ACUERDO A LOS COSTOS REQUERIDOS
AJUSTE DE CANTIDADES PARA EVITAR HACER UN NUEVO MODIFICATORIO

CON EL FIN DE CORREGIR VALORES Y CANTIDADES.
LA INGENIERA DE SUPERVISION SOLICITA QUE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS COSTOS DE LOS DOMOS PARA EL DIA JUEVES 03 ABRIL DE 2025

SE SOLICITA PRESENTAR APUS 01-04-2025
Y SE SOLICITA ENTREGA DE COSTOS DE LOS DOMOS PARA EL DIA JUEVES 03-04-2025 PARA PODER REALIZAR LA REVISION

REVISION DEL TEMA DE PÁISAJISMO Y DE LAS PUERTAS ELECTRICAS EN ESTUDIO POR PARTE DE INTERVENTORIA PARA APROBACION

REVISION DE LAS OFICINAS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN POR SISMOS
SE SOLICITA UN INFORME DE INTERVENTORIA CON LAS AFECTACIONES QUE SE DEBEN REALMENTE EJECUTAR SE INICIA RECORRIDO EL DIA 02-04-2025

SE SOLICITA PERSONAL ADICIONAL EN LOS BAÑOS PARA EVITAR MÁS DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS
EL CONTRATISTA INFORMA QUE SE ENTREGARAN LOS BAÑOS ENCHAPADOS EL DIA SABADO 05 DE ABRIL DE 2025 PARA LA SEMANA QUE SIGUE PODER INSTALAR DIVISIONES DE ACERO INOXIDABLE

SE SOLICITA LA ENTREGA DE LAS OFICINAS RESTANTES 509-510-511 PARA PODER DESOCUPAR EL ALA B DEL PISO 5 DE LA TORRE B

SE SOLICITA ENTREGA DE LA OFICINA 512 PARA EL DÍA 02-04-2025 Y REALIZAR EL MOVIMIENTO

SEMANA 31
30-mar-25
4-abr-25
$ 204.628.556,20
6,31%
$ 2.760.814.964,01
85,11%
$ 104.640.505,94
3,23%
$ 2.277.721.161,90
70,22%
14,89%

OBRA PROGRAMADA 85,11%
OBRA EJECUTADA 70,22%
RETRASO 14,89%

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
	ENTREGA DE APUS PARA REVISION DE INTERVENTORIA	CONSORCIO A&V - CONSORCIO INTERCONSULTORES	01-04-2025
	ENTREGA DE BAÑOS ENCHAPADOS CON ACABADOS FINALES	CONSORCIO A&V	05-04-2025
	REVISION DE LAS OFICINAS QUE TIENEN AFECTACIONES POR SISMOS Y RECORRIDO	CONSORCIO A&V	02-04-2025
	ENTREGA DE OFICINA 512 PISO 5 TORRE B	CONSORCIO A&V	02-04-2025
	ENTREGA DE INFORMACION DE COSTEO DOMOS	CONSORCIO A&V	03-04-2025

CONSORCIO INTERCONSULTORES
Consultoría e Interventoría de Obras Civiles.

INFORME DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA No. 7 Marzo 2025



INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA #CO1.PCCNTR. 6687049-2024

OBJETO: CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL VILLAVICENCIO-META, LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO AL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO

INTRODUCCION

En cumplimiento del Contrato de Interventoría se presenta a continuación el Informe SST Mensual No. 7 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2025, el cual contiene la gestión de Seguridad Y Salud realizada por el Consorcio Infraestructura A&V, en desarrollo del alcance del Contrato de OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLAVICENCIO 5PISO, CUBIERTAS, BAÑOS, MEJORAMIENTO LOCATIVO, ELECTICO, SANITARIO Y MUEBLES.

Este Informe describe las actividades implementadas durante el periodo reportado, incluye inducciones, charlas de seguridad, capacitaciones, reporte de accidentes e incidentes, investigaciones, seguimiento a incapacidades, entrega de EPP, requisitos de ingreso de personal, certificado de afiliaciones, planillas de seguridad social, inspecciones, llamados de atención, gestión de los comités, permisos de trabajo, correspondencia enviada y recibida, además de reporte de condiciones de seguridad entre otras.

PERSONAL ACTIVO

Personal activo Consorcio Infraestructura A&V/ mes marzo 2025

N°	EMPRESA	N° DE TRABAJADORES EN OBRA	OBSERVACION
1	Consorcio INFRAESTRUCTURA A&V	3 administrativos	El personal responsable de la coordinación para la ejecución de las actividades
2	Contratista Grupo Elite asociados	12 obra civil	El personal contratado para diversas actividades durante la ejecución del contrato
3	Contratista de eléctricos	2 obra eléctrica	El personal responsable para actividades eléctricas, prolongación
4	Contratista instalación de fachaleta	2 instaladores	El personal responsable para actividades
5	Contratista de instalación y mantenimiento de aires acondicionados	3 técnicos	Personal responsable instalación

Personal Interconsultores / mes Marzo 2025

CEDULA		NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	MOVIL	PERFIL
CC	CE						
X		1121827525	MARTINEZ	ROA	JUAN CARLOS	3164027359	HSE INTERVENTORIA
X		79722084	LOPEZ	PEREZ	JOHN ALEXANDER	3107580840	ING RESIDENTE INTERVENTORIA
X		52387407	LOPEZ	AROCA	MARIA LUCRECIA	3108849049	DIRECTORA OBRA INTERVENTORIA
		79111813	MURCIA	SALAMANCA	LUIS ALEJANDRO		PROF HIDRAULICO

INGRESOS E INDUCCIONES:

La inducción en SST es el proceso mediante el cual al trabajador nuevo se le informa sobre aquellos temas relevantes en Seguridad y Salud en el Trabajo que debe tener en cuenta en el cargo que va a ocupar, así como los peligros y riesgos a los que se expone durante la ejecución de la tarea y las medidas de prevención que debe implementar para garantizar su seguridad y la de su equipo de trabajo.

El profesional de SST del consorcio Infraestructura A&V, Es el responsable de realizar

dicha inducción a todo el personal al momento del ingreso, independientemente de su forma de contratación y de dejar constancia en los formatos internos de su SG-SST.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2025, el contratista A&V reporto un total de Cinco (5) ingresos distribuidos de la siguiente manera.

N.º PARTICIPANTES	*EMPRESA/PROVEEDOR*
08	(2) Enchapadores; (3) Tec. Aires, (1); Persona de Aseo y (2) Ayudante Obra Civil

Registro fotográfico de inducción de seguridad y salud en el trabajo A&V

A) CHARLAS DE SEGURIDAD E INDUCCION SST

Las charlas de seguridad de 10 minutos son de carácter obligatorio y se realizan todos los días antes de iniciar las actividades.










20 mar 2025 7:51:47 a. m.


19 mar 2025 7:16:41 a. m.


15 mar 2025 7:14:53 a. m.


11 mar 2025 7:46:16 a. m.


11 mar 2025 3:33:53 p. m.



RETIROS MES DE Marzo 2025:

Para el mes de marzo el área SST del contratista reportó un total de nueve (0) retiros

N.º PARTICIPAN TES	*EMPRESA/PROVEEDOR*

Exámenes de egreso:

De acuerdo con lo establecido a la Resolución 2346 de 2007, una vez sea retirado el trabajador, la empresa deberá programarle y enviarlo a que se realice su respectivo examen de egreso, en caso tal de que este renuncie al derecho de hacerlo debe quedar una notificación por escrito donde se evidencie que se le realizo entrega e informo al trabajador, así mismo el contratista debe anexar todos los meses en el informe correspondiente a cada periodo reportado.

Paz y salvos:

De acuerdo con el pliego de condiciones Numeral 4.3 formas de pago, Ítem 2; el contratista deberá presentar los certificados de paz y salvo del personal retirado. La interventoría solicita dichos certificados de manera mensual, con el fin de evitar traumatismos al momento de cierre o finalización del mismo. Sin embargo, a la fecha aún está pendiente la entrega de varios registros, los cuales se relacionan en correo enviado el 08 Enero 2025 sin respuesta por parte del contratista. ***PERSISTE LA NOVEDAD SIN PAZ Y SALVO DEL PERSONAL QUE SE RETIRO EN ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025.***

CHARLAS DE SEGURIDAD MES DE MARZO

Las charlas de seguridad o de cinco (05) minutos, se llevan a cabo diariamente antes de dar inicio a las actividades laborales, el área SST del Consorcio Infraestructura A&V, diseña un cronograma de charlas de acuerdo a los peligros y riesgo identificados en su matriz IPVR y los evidenciados en obra.

A continuación, se relacionan los temas y número de participantes del periodo comprendido entre el 01 al 31 de Marzo de 2025:

CONSORCIO INTERCONSULTORES

Consultoría e Interventoría de Obras Civiles.

Charlas SST realizadas en el mes de Marzo 2025

CHARLAS SST Marzo 2025		
FECHA	TEMA	N.º PART
03/03/2025	CONDICIONES LOCATIVO	5
04/03/2025	INSPECCIONAR Y VERIFICACION DE LA HERRAMIENTAS	7
05/03/2025	ROTULACION DE QUIMICIOS SGA	8
06/03/2025	MANIPULACION MANUAL Y ELECTRICA DE HERRAMIENTAS	7
07/03/2025	PAUSAS ACTIVAS Y ESTIRAMIENTO	7
08/03/2025	CAIDA DE OBJETOS, AL MISMO NIVEL Y DIFERENTES	8
11/03/2025	CHARLA PREVENCION Y AUTOCUIDADO	9
12/03/2025	SENALIZACION Y DELIMITACION DE LAS AREAS	12
13/03/2025	QUE ES AT? Y TIPOS DE AT, COMO SE DEBE REPORTAR	10
14/03/2025	ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DE PERMISOS DE T	11
17/03/2025	AUTOCUIDADO	10
18/03/2025	ROTULACION DE QUIMICIOS SGA	13
19/03/2025	DINAMICA, LUDICA DE CONCENTRACION	14
20/03/2025	RIESGO LOCATIVO	13
21/03/2025	FORMATO DE CI-AI/AT	9
23/03/2025	ORDEN Y ASEO EN TODAS AREAS DE TRABAJO	9
24/03/2025	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO, SUPERVISION	10
25/03/2025	USAR ADECUADAMENTE LOS ACCESORIOS DE LAS PULIDORAS	15
26/03/2025	TRABAJO EN EQUIPO Y LDERAZGO	17
27/03/2025	REINDUCCION SST DE LA RAMA JUDICIAL 2025	14
28/03/2025	RIESGO FISICO – RUIDO- USO PROTECCION AUDITIVO	15
29/03/2025	IMPORTANCIA DELIMITAR Y SEÑALIZAR ZONAS CON RIESGO	14
30/03/2025	RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD	13

Registro fotográfico charlas SST



















CALISTENIA

PAUSAS ACTIVAS

Se realiza con los diferentes grupos de trabajo calistenia y pausas activas para así evitar el agotamiento musculo esquelético o cansancio muscular en los trabajadores. Dinámicas lúdicas, trabajo en equipo, concentración.















APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL/ MES MARZO 2025

Todo el personal que labora en obra de forma directa o indirecta, se encuentra afiliado al sistema general de riesgos laborales (EPS, ARL y AFP). El profesional SST del contratista Consorcio Infraestructura A&V, verifica la respectiva afiliación del trabajador y la fecha límite de pago de acuerdo al NIT de cada contratista. A continuación, se relacionan el listado de planillas de seguridad social evidenciadas a interventoría. Además, se deja nota de las inconsistencias presentadas en el pago de las mismas y las cuales han sido reportadas a través de correo electrónico y actas de comité.

EMPRESA	*NIT*	*FECHA LIMITE DE PAGO*	*FECHA DE PAGO*	*DIAS DE MORA*
CONSORCIO A&V	900534311-2	22-02-2025	19-03-2024	0
Obra civil Grupo Elite	901747796	25-02-2025	25-03-2024	0
OTROS CONTRATISTAS		RADICADOS DE	ARL MARZO	NA

NOTA*: No Se generó, grandes novedades

AUSENTIMO LABORAL:

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al ausentismo como la inasistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba iba a asistir, excluyendo periodos vacacionales, huelgas o permisos sindicales

Los análisis de las causas que dan lugar al ausentismo son de gran importancia para su clasificación, bien sea desde la perspectiva preventiva o correctiva.

Manejo causas de ausentismo:

PP Permiso Personal NJ No Justificada EC Enfermedad Común LP Licencia de Paternidad AT Accidente de Trabajo EP Enfermedad Profesional AC Accidente Común.

Nota: a la fecha presente no se tiene Accidentes laborales generados por la operación y no se tiene reportes de ausentismo laborales sin justa causa, solo (2) retiro laborales.

GESTION DE LOS COMITES:

COPASST (comité paritario de seguridad y salud): para el mes de Marzo de 2025 el residente de Seguridad Y Salud cito a reunión a los integrantes del comité para tratar los siguientes temas:

NOMBRE	CARGO
Harvey Gutiérrez Cardona	Supervisor fachada (Copasst)
Alexander Monroy Zúñiga	Ayudante (Cocolab)
Milena Duque Rojas	SISO (Cocolab)

Suministro de EPP

Es una obligación del empleador suministrar los EPP a todo el personal, garantizando

lo estipulado en los artículos 230 del CST, Art 176,177 de la Resolución 2400 de 1979, art. 2.2.4.2.4.2 del Decreto 1072 de 2015


Consolidada entrega de EPP -Mes Marzo 2025
Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de Marzo de 2025, el contratista A&V reportó la entrega de los siguientes elementos de protección personal.









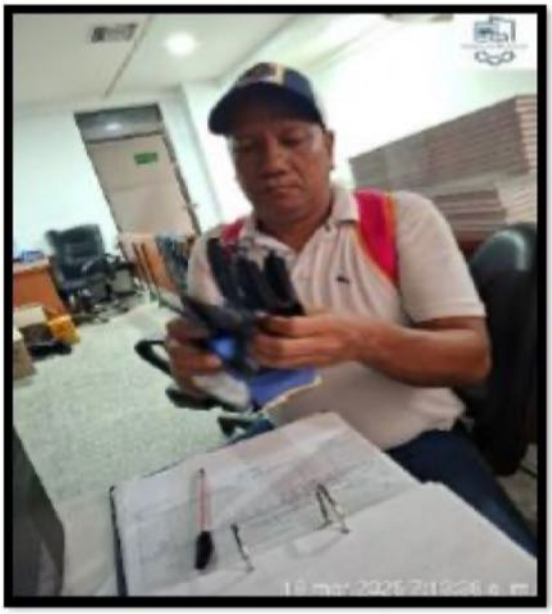







11. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y REPOSICION.









c) SEÑALIZACION DE ZONAS DE TRABAJO E INSTALACION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA

se inicia la instalación de señalización a las diferentes zonas de trabajo, de igual manera se instala puntos de equipos de emergencia.

Se instala señalización y delimitación informativa y preventiva en las actividades a intervenir.














Antes de iniciar actividades se inspecciona herramienta manual y eléctrica que se encuentre en óptimas condiciones para su uso. Personal utiliza los elementos de protección adecuados.

Inspección actividad instalación de enchape





Subida de material

Orden y aseo en áreas de trabajo




INSPECCIONES GENERALES

Las inspecciones que se realizan a máquinas, equipos, herramientas y áreas de trabajo, se hacen a través de observación directa esto nos permite identificar actos o condiciones de riesgo que podrían llegar a generar accidentes de trabajo. Para el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Marzo de 2025, el área SST reporto las siguientes inspecciones:

Se inician actividades con las respectivas inspecciones de las zonas a intervenir y a los equipos a usar:

- Instalación de Mesones de Granito
- Instalación de manto
- Aplicación de pintura y estuco
- Instalación de Espejos
- Instalación de puertas de divisiones de baños
- Instalación de fachaleta en cerramiento
- Instalación de División de Baños
- Instalación de Marcos para lámparas

Se realiza inspección visual a herramienta menor y eléctrica como:

- Taladro inalámbrico
- Taladro demoledor
- Pulidora
- Puntero con protección
- Maceta
- Cegueta.
- Electrosoldador

Actividad demolición de piso



Inspección de herramienta





Actividad mantenimiento de aires acondicionados





E) se realiza inspección a extintor de 5 libras se encuentra con fecha vigente para su uso y en buenas condiciones.



Personal con epp, volqueta sale del palacio carpada, paletero en vía para dar paso a volqueta



ACTIVIDADES AMBIENTALES

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), se realizan actividades ambientales para así evitar la contaminación del medio.

- Diariamente se realizan jornadas de orden y aseo para finalmente hacer recolección y disposición de residuos.



- Se realiza las respectivas recomendaciones para el buen manejo de los residuos y así evitar la contaminación del medio.
- Se realiza recolección y disposición final de escombros.
- Se realiza retiro de escombros de 3 viaje, total 18 m3, se hace la disposición final al área ZODME GUATIQUIA la cual está autorizada.

Plan de preparación, atención y repuesta ante emergencias:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.25, el cual indica que cada empresa "debe implementar y mantener las disposiciones necesarias, en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores.

Inspección de Equipos de Atención de Emergencias.

Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo, extintores, camillas, botiquín, rutas de evacuación, esto con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento. El Consorcio O.M tiene establecido dentro de su SG-SST realizar inspecciones mensuales.

Formato inspección de Extintor: Acorde al cronograma del consorcio se ejecutar bimensual (Marzo 2025).



12. ACOPIO DE QUIMICOS Y MATERIAL

Acopio de materiales y químicos (cemento, sika, ladrillo) se encuentra señalizado y rotulado







CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

La correspondencia enviada y recibida incluye los correos y oficios que son enviados al contratista Consorcio Infraestructura A&V, con copia a la interventoría al igual los que el consorcio envía a la interventoría.

JUAN CARLOS MARTINEZ ROA
HSE INTERVENTORIA INTERCONSULTORES 3164027359
VILLAVICENCIO - META

ANEXO N° 1

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-23, 11:26:15 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77182629

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 22/04/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AYV	**Nombre Sucursal**	CONTRATO RAMA	**Código Sucursal**	2
Documento	NI901863382	**Dirección**	CL 9 #4 - 19		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6088645004		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	VILLANUEVA TOVAR FRANCISCO JAVIER	**Identificación**	CC 12370591		
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121896483	LEIDY MILENA DUQUE ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.271.196	$ 363.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.271.196	$ 90.900	6,960	$ 2.271.196	$ 158.100	(CCF34) COFREM	$ 2.271.196	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 703.300
CC 1121926925	FABIAN CAMILO CASTAÑEDA ACOSTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.586.956	$ 574.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.586.956	$ 143.500	6,960	$ 3.586.956	$ 249.700	(CCF34) COFREM	$ 3.586.956	$ 143.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.110.700
CC 1121967209	WILDER DAVIAN CORTES ROJAS	01	00		X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 474.500	$ 19.000	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(CCF34) COFREM	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.332.652	$ 6.332.652	$ 6.332.652	$ 6.332.652	$ 1.013.400	$ 253.400	$ 440.900	$ 253.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.100	$ 1.600	$ 1.962.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N° 2

PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE OBRA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-26, 09:35:26 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76735760

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 26/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS	**Nombre Sucursal**	BOGOTA	**Código Sucursal**	004
Documento	NI901747796	**Dirección**	CR 5 ESTE #90 - 58		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107697575		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GONZALEZ GONZALEZ JERSI GERMAN	**Identificación**	CC 1069900199		
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1069900199	JERSI GERMAN GONZALEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1069900199	JERSI GERMAN GONZALEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900	$ 500	$ 441.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-25, 11:29:05 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76735757

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 25/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS	**Nombre Sucursal**	OBRA VILLAVICENCIO	**Código Sucursal**	002
Documento	NI901747796	**Dirección**	CR 5 ESTE #90 - 58		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107697575		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GONZALEZ GONZALEZ JERSI GERMAN	**Identificación**	CC 1069900199		
Total Afiliados	11	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1023932370	MAIKOL STIVEN CASTAÑEDA LEON	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF34) COFREM	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 1023932370	MAIKOL STIVEN CASTAÑEDA LEON	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF34) COFREM	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 1069900188	YERSON ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 901.550	$ 144.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 901.550	$ 36.100	6,960	$ 901.550	$ 62.800	(CCF34) COFREM	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300
CC 1079033189	DAIRO HUMBERTO GONZALEZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF34) COFREM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1121823926	EDWAR SANTIAGO MARTINEZ RINCON	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF34) COFREM	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 1121847656	DAIRO CEBALLOS PENAGOS	01	00	X	X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 237.250	$ 38.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 237.250	$ 9.500	6,960	$ 237.250	$ 16.600	(CCF34) COFREM	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.600
CC 12131924	ALEXANDER MONROY ZUÑIGA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF34) COFREM	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 16945059	JOSE MARIA VALENCIA RENTERIA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF34) COFREM	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 16945059	JOSE MARIA VALENCIA RENTERIA	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF34) COFREM	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 79601270	CESAR AUGUSTO BEDOYA OSORIO	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF34) COFREM	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 86056596	JOSE OLIVERIO ARIZA AGUILAR	01	00	X																0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 521.950	$ 83.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF34) COFREM	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 86075040	JOSE NELSON QUICENO ROMERO	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 521.950	$ 83.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF34) COFREM	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800
CC 86088862	ROLANDO SERNA MONZALVE	01	00	X																0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 521.950	$ 83.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 521.950	$ 20.900	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(CCF34) COFREM	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.303.750	$ 8.303.750	$ 8.303.750	$ 8.303.750	$ 1.329.500	$ 332.500	$ 578.800	$ 332.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.573.300	$ 0	$ 2.573.300

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-26, 08:07:27 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 76962359

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 26/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ELITE Y ASOCIADOS SAS	**Nombre Sucursal**	OBRA VILLAVICENCIO	**Código Sucursal**	002
Documento	NI901747796	**Dirección**	CR 5 ESTE #90 - 58		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3107697575		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	GONZALEZ GONZALEZ JERSI GERMAN	**Identificación**	CC 1069900199		
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018492230	DANILO ARNULFO BELTRAN URREGO	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 332.150	$ 13.300	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(CCF34) COFREM	$ 332.150	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 332.150	$ 332.150	$ 332.150	$ 332.150	$ 53.200	$ 13.300	$ 23.200	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000	$ 400	$ 103.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-09, 02:34:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77229346

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 09/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EIC ELECTRIX SAS	**Nombre Sucursal**	NEIVA	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901886658	**Dirección**	CR 1 #72 A - 15		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3138322419		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	URREA ORTIZ ARLEY	**Identificación**	CC 17652967		
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1075211031	ALEXANDER NOGUERA GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1075309388	JOHAN ANDREY RAMIREZ CEDIEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1084924276	EDUARD QUINA ROCHA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 17652967	ARLEY URREA ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.200	$ 228.000	$ 248.000	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.200	$ 0	$ 1.615.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-09, 02:34:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77229346

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 09/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EIC ELECTRIX SAS	**Nombre Sucursal**	NEIVA	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901886658	**Dirección**	CR 1 #72 A - 15		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3138322419		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	URREA ORTIZ ARLEY	**Identificación**	CC 17652967		
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1075211031	ALEXANDER NOGUERA GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1075309388	JOHAN ANDREY RAMIREZ CEDIEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1084924276	EDUARD QUINA ROCHA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 17652967	ARLEY URREA ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	4,350	$ 1.423.500	$ 62.000	(CCF32) COMFAMILIAR HUILA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 5.694.000	$ 911.200	$ 228.000	$ 248.000	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.615.200	$ 0	$ 1.615.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO N° 3

REGISTRO DE INDUCCIONES Y CAPACITACIONES SST.

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	FT-SST-015	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:	Agosto- 2024
		Versión:	001
		Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	22	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? capacitación Calistenia, actividad ludica, Estiramiento
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST	X	
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez L.	1058332536	Aseo	
2	Josemario Valencia	16943054	OF	
3	FREDY TORRES N	98587.740.	OF	
4				
5	JOSE			
6	José Vicente	86075040	AY	JOSE
7	Oliveno Aria	86056596	MI	Oliver
8	Alexander Noboa	1071 21109	Electrico	Alex
9	Daniel Hernandez Garcia	1081156592	Tecnico	
10	Carlos Fernando Vargas	1075265099	Tecnico	
11	Fabian Prieto	8852.783	Tecnico	
12	Jose. Castillo	1055556299	Oficial	
13	Danilo Beltran	1018497230	OF	Danilo
14	Yerson Gonzalez	1069900782	EAS	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Milena Duque Rojas	Milena Duque

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Paulo Beltran Yesén Gonzalez

No. identificación 1018942130 1064900188

Tema evaluado CALISTENIA, ACTIVIDAD LUDICA, ESTIRAMIENTO

Fecha de evaluación 22/03/25

3/3


1. Que son las pausas activas.

   A. Breves periodos de tiempo durante la jornada laboral donde se realizan diferentes ejercicios
   B. Detener actividades para sentarse a hablar con el compañero
   C. Hidratarse bastante en la jornada laboral
   D. Parar actividades a las 9:00 Am y 3:00 Pm para alimentarse

2. Cuales son los beneficios al realizar las pausas activas

   A. Sobrepeso, dolor de cabeza, dolor de espalda
   B. Reducción muscular, disminución del estrés, fatiga.
   C. Promueve el autocuidado, ayuda a la concentración, dolor de cabeza.
   D. Reducción muscular, disminución del estrés, autocuidado, concentración.

3. Señale que tipos de ejercicios para pausas activas serían los recomendables.

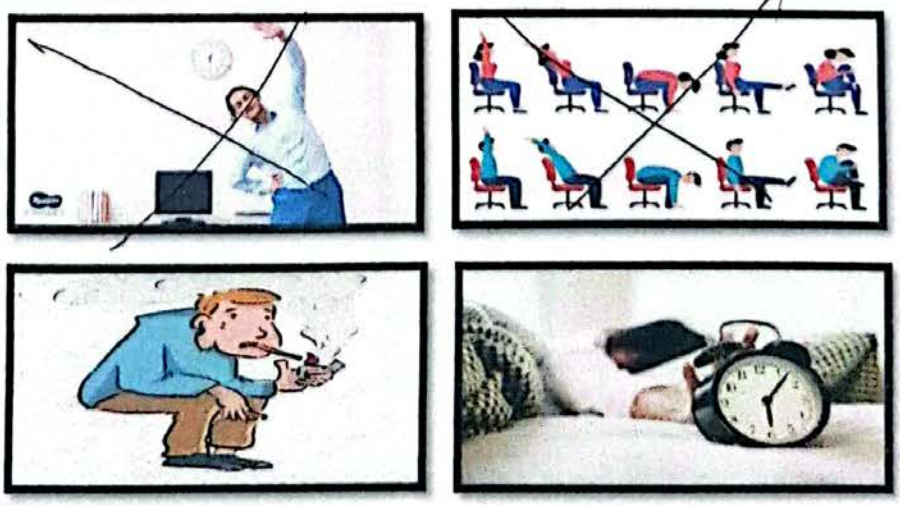

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Lina Maria / Jose Mario Jaleno /
No. identificación 1058325236 16995054

Tema evaluado CALISTENIA, ACTIVIDAD LUDICA, ESTIRAMIENTO

Fecha de evaluación 22/03/25

3/3


1. Que son las pausas activas.

   A. Breves periodos de tiempo durante la jornada laboral donde se realizan diferentes ejercicios
   B. Detener actividades para sentarse a hablar con el compañero
   C. Hidratarse bastante en la jornada laboral
   D. Parar actividades a las 9:00 Am y 3:00 Pm para alimentarse

2. Cuales son los beneficios al realizar las pausas activas

   A. Sobrepeso, dolor de cabeza, dolor de espalda
   B. Reducción muscular, disminución del estrés, fatiga.
   C. Promueve el autocuidado, ayuda a la concentración, dolor de cabeza.
   D. Reducción muscular, disminución del estrés, autocuidado, concentración.

3. Señale que tipos de ejercicios para pausas activas serían los recomendables.

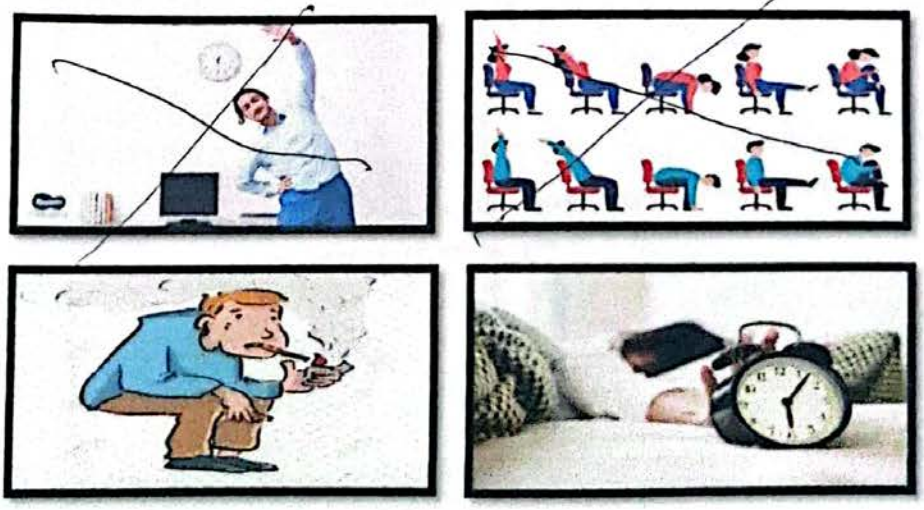

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador fredy torres / cesar bedoya /

No. identificación 98587740 79601270

Tema evaluado CALISTENIA, ACTIVIDAD LUDICA, ESTIRAMIENTO

Fecha de evaluación 22/03/25

1. Que son las pausas activas.


   A. Breves periodos de tiempo durante la jornada laboral donde se realizan diferentes ejercicios
   B. Detener actividades para sentarse a hablar con el compañero
   C. Hidratarse bastante en la jornada laboral
   D. Parar actividades a las 9:00 Am y 3:00 Pm para alimentarse

2. Cuales son los beneficios al realizar las pausas activas

   A. Sobrepeso, dolor de cabeza, dolor de espalda
   B. Reducción muscular, disminución del estrés, fatiga.
   C. Promueve el autocuidado, ayuda a la concentración, dolor de cabeza.
   D. Reducción muscular, disminución del estrés, autocuidado, concentración.

3. Señale que tipos de ejercicios para pausas activas serían los recomendables.



Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Jose Uribe / Jose Quiceno /
No. identificación 91323651 / 86075046

Tema evaluado CALISTENIA, ACTIVIDAD LUDICA, ESTIRAMIENTO

Fecha de evaluación 27/03/25

3/3


1. Que son las pausas activas.

   A. Breves periodos de tiempo durante la jornada laboral donde se realizan diferentes ejercicios ✓
   B. Detener actividades para sentarse a hablar con el compañero
   C. Hidratarse bastante en la jornada laboral
   D. Parar actividades a las 9:00 Am y 3:00 Pm para alimentarse

2. Cuales son los beneficios al realizar las pausas activas

   A. Sobrepeso, dolor de cabeza, dolor de espalda
   B. Reducción muscular, disminución del estrés, fatiga.
   C. Promueve el autocuidado, ayuda a la concentración, dolor de cabeza.
   D. Reducción muscular, disminución del estrés, autocuidado, concentración. ✓

3. Señale que tipos de ejercicios para pausas activas serían los recomendables.

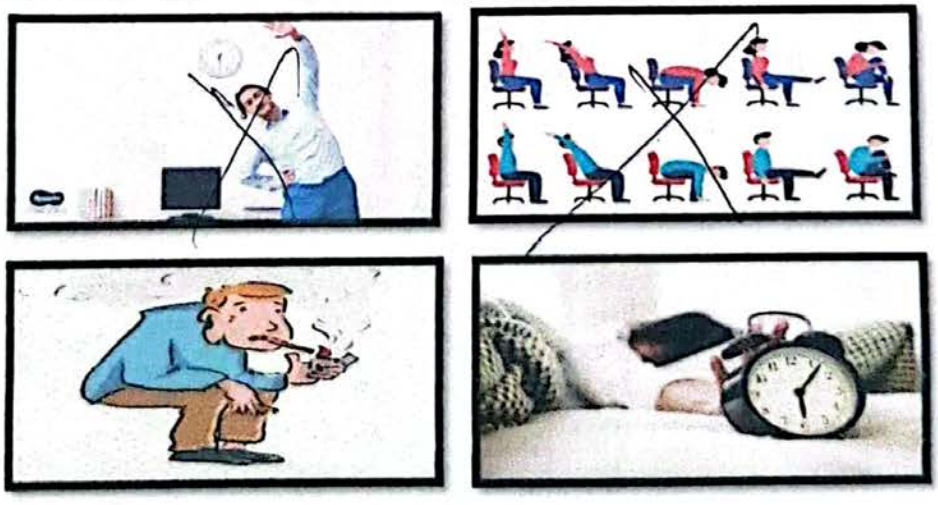

✓

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Oliveiro Avila Alexander Noguera

No. identificación 86086596 1075240131

Tema evaluado CALISTENIA, ACTIVIDAD LUDICA, ESTIRAMIENTO

Fecha de evaluación 22/08/25

3/3


1. Que son las pausas activas.

   A. Breves periodos de tiempo durante la jornada laboral donde se realizan diferentes ejercicios
   B. Detener actividades para sentarse a hablar con el compañero
   C. Hidratarse bastante en la jornada laboral
   D. Parar actividades a las 9:00 Am y 3:00 Pm para alimentarse

2. Cuales son los beneficios al realizar las pausas activas

   A. Sobrepeso, dolor de cabeza, dolor de espalda
   B. Reducción muscular, disminución del estrés, fatiga.
   C. Promueve el autocuidado, ayuda a la concentración, dolor de cabeza.
   D. Reducción muscular, disminución del estrés, autocuidado, concentración.

3. Señale que tipos de ejercicios para pausas activas serían los recomendables.

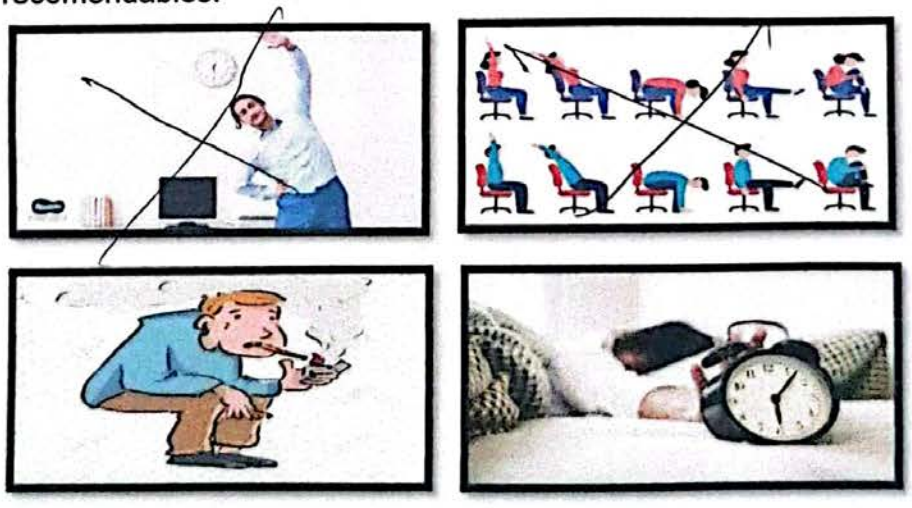

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Daniel Hernandez Carlos Vargas

No. identificación 1081156542 1075266414

Tema evaluado CALISTENIA, ACTIVIDAD LUDICA, ESTIRAMIENTO

Fecha de evaluación 22/03/25


1. Que son las pausas activas.

   A. Breves periodos de tiempo durante la jornada laboral donde se realizan diferentes ejercicios
   B. Detener actividades para sentarse a hablar con el compañero
   C. Hidratarse bastante en la jornada laboral
   D. Parar actividades a las 9:00 Am y 3:00 Pm para alimentarse

2. Cuales son los beneficios al realizar las pausas activas

   A. Sobrepeso, dolor de cabeza, dolor de espalda
   B. Reducción muscular, disminución del estrés, fatiga.
   C. Promueve el autocuidado, ayuda a la concentración, dolor de cabeza.
   D. Reducción muscular, disminución del estrés, autocuidado, concentración.

3. Señale que tipos de ejercicios para pausas activas serían los recomendables.

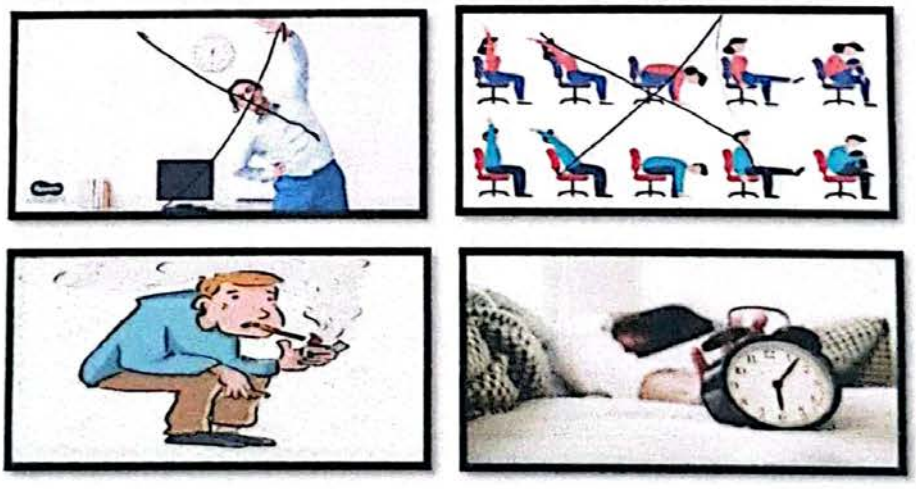

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador FABIAN PEREO JOSE CASTILLO /

No. identificación 88[illegible]783 1055556294

Tema evaluado CALISTENIA, ACTIVIDAD LUDICA, ESTIRAMIENTO

Fecha de evaluación 22/03/25


1. Que son las pausas activas.

   A. Breves periodos de tiempo durante la jornada laboral donde se realizan diferentes ejercicios
   B. Detener actividades para sentarse a hablar con el compañero
   C. Hidratarse bastante en la jornada laboral
   D. Parar actividades a las 9:00 Am y 3:00 Pm para alimentarse

2. Cuales son los beneficios al realizar las pausas activas

   A. Sobrepeso, dolor de cabeza, dolor de espalda
   B. Reducción muscular, disminución del estrés, fatiga.
   C. Promueve el autocuidado, ayuda a la concentración, dolor de cabeza.
   D. Reducción muscular, disminución del estrés, autocuidado, concentración.

3. Señale que tipos de ejercicios para pausas activas serían los recomendables.

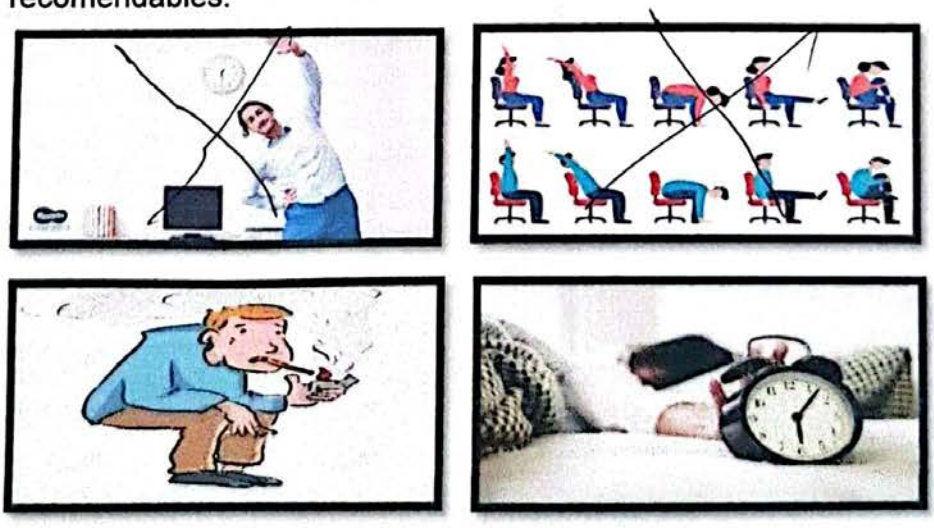

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	11	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	X	¿Cuál? Inducción SST, socialización políticas de seguridad, riesgos a los cuales estan expuestos ARL a la que estan afiliados, reportar cualquier accidente inmediatamente, horario de trabajo
Charla de seguridad		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Daniel Hernandez Garcia	1081156592	Tecnico	
2	Cesar Leonardo Vargas	1075265699	Tecnico	
3	Alex Chicue Osorio	1081514679	Tecnico	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Lady Milena Argue Rojas	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha: /2024 Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 11/03/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Carlos Fernando Vargas CEDULA: 1075265699

AREA/SECCION: Palacio de Justicia CARGO: Tecnico

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Milagrosa

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1075265699

Responsable del SG-SST
C.C. 1118065183

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°: FT-SST-026	
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha: /2024	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 11/03/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Alex chaves osorio CEDULA: 1081514629

AREA/SECCION: Palacio De Justicia CARGO: Tecnico

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Hilari Ospre

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y asi promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1081514629.

Responsable del SG-SST
C.C. 1121846483

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 11/03/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Daniel Fernando Garcia CEDULA: 1081156592

AREA/SECCION: Palacio de Justicia CARGO: Tecnico

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Milena Duque

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la Inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

- Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
- Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
- Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
- Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

- Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
c.c. 1081156592


Responsable del SG-SST
c.c. 1.112896483

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre: Luis Chicaiza CORTO
Cedula: 1081514221
Fecha: 11/03/25
Tema: Induccion SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:

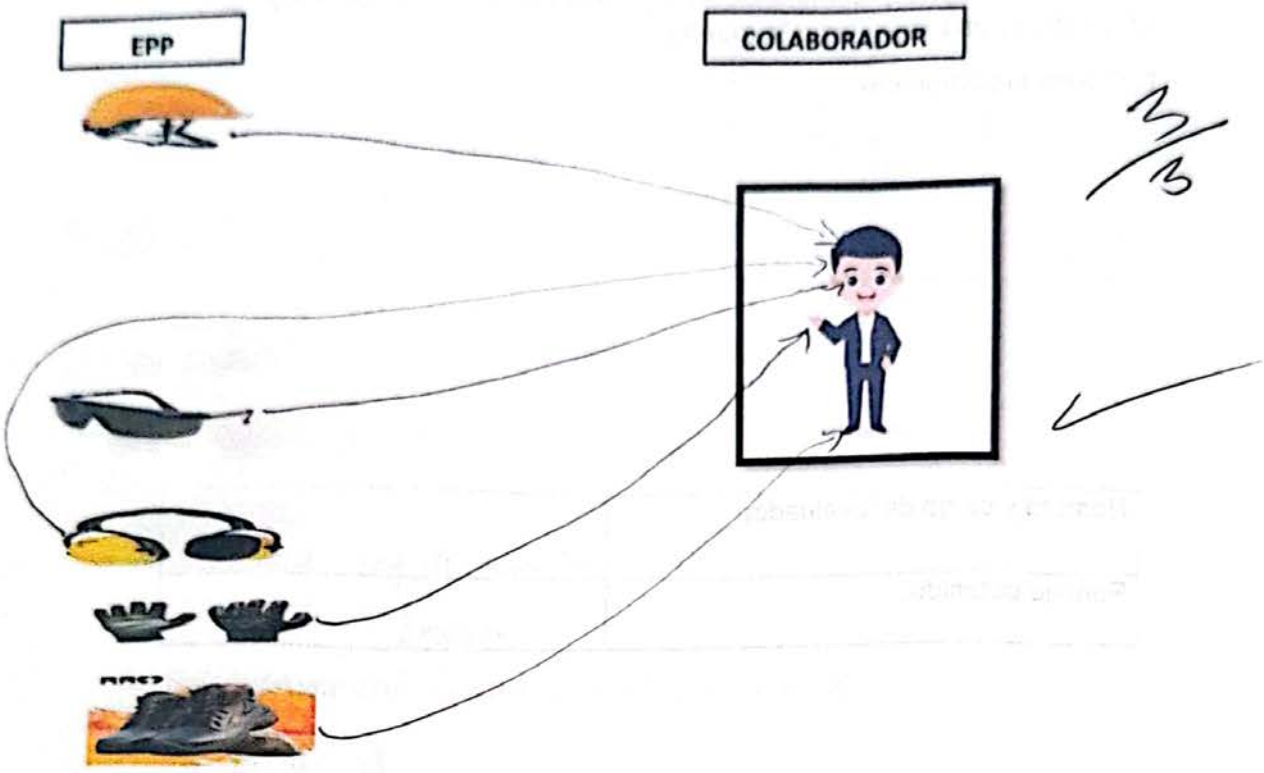

3/3

2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:

A.



B.



C.



D.



X
X

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

C. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.

Nombre y cargo del evaluador:	Helen Duque SST
Puntaje obtenido:	100%

Powered by CamScanner


Nombre: Carlos Fernando Vargas

Cedula: 1023256677

Fecha: 11/03/25

Tema: Inducción SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:

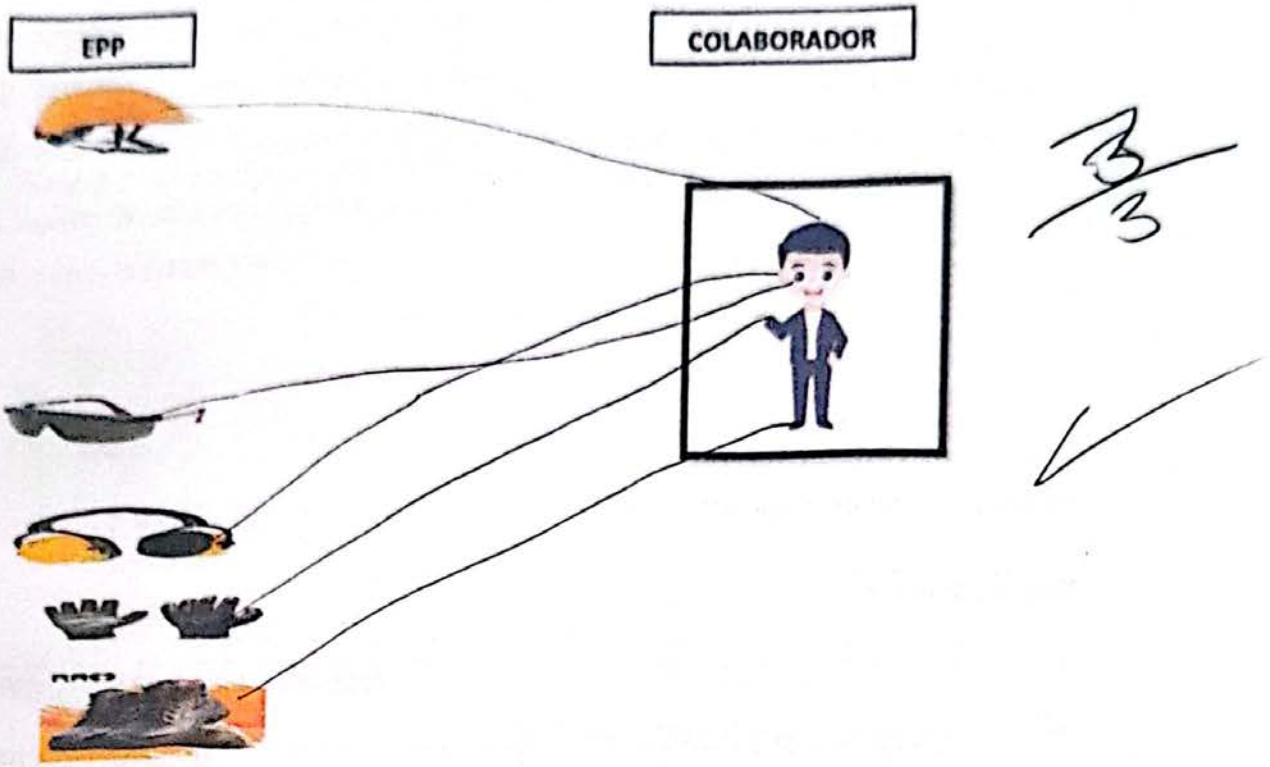

3/3

2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:

A. 

B. 

C. 

D. 

X
X

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

C. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.


Nombre y cargo del evaluador:	Hilary Sugue Rojas Prof SST
Puntaje obtenido:	100%

Powered by CamScanner

Nombre: Daniel F Hernandez Garcia

Cedula: 1081156912
Fecha: 11/08/25
Tema: Induccion SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:

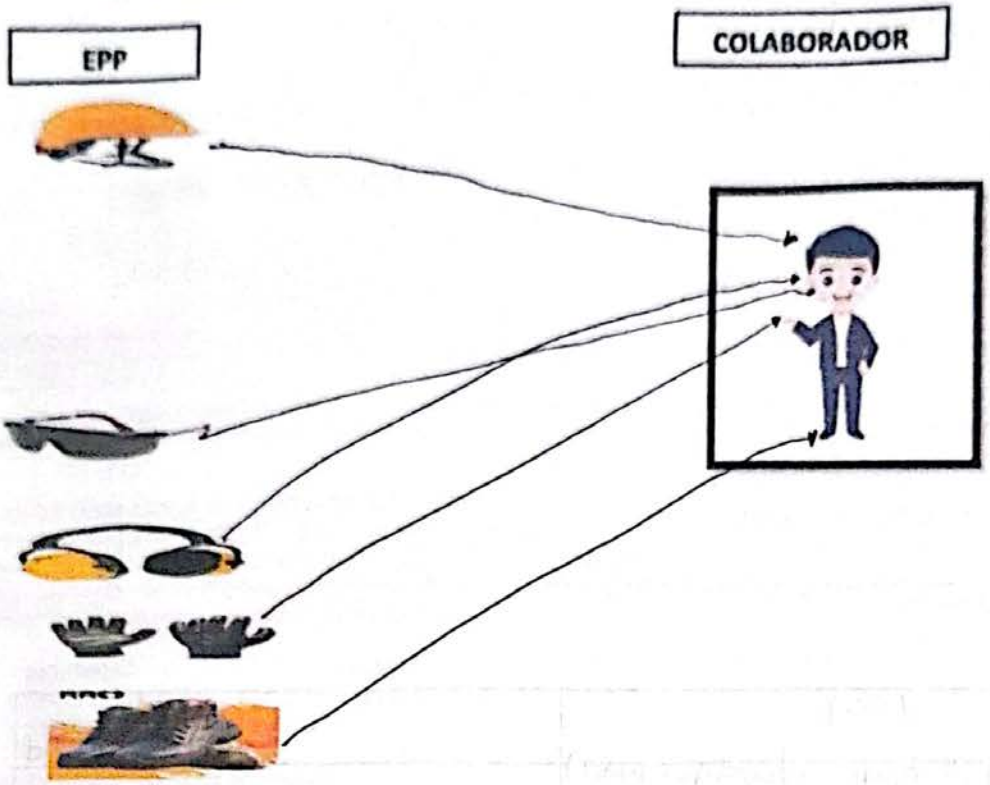

3/3

2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:

A.



B.



C.



D.



X
X

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

(C) suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.

Nombre y cargo del evaluador:	Lady Melgarejo Inspe SST
Puntaje obtenido:	100 %

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-026
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha:	/2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 11/03/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: [illegible] CEDULA: 1324[illegible]30

AREA/SECCION: Palacio de Justicia CARGO: A-1

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Edna Dayhe

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

* Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
* Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
* Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
* Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
* Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

* Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 1121912130

Responsable del SG-SST
C.C. 1[illegible]6983


Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
		Fecha	Versión
	EVALUACION DE CAPACITACION		
		23/09/2024	1

Nombre: Brian Cortes

Cedula: 1219121130
Fecha: 11-03-25
Tema: Induccion SST

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:

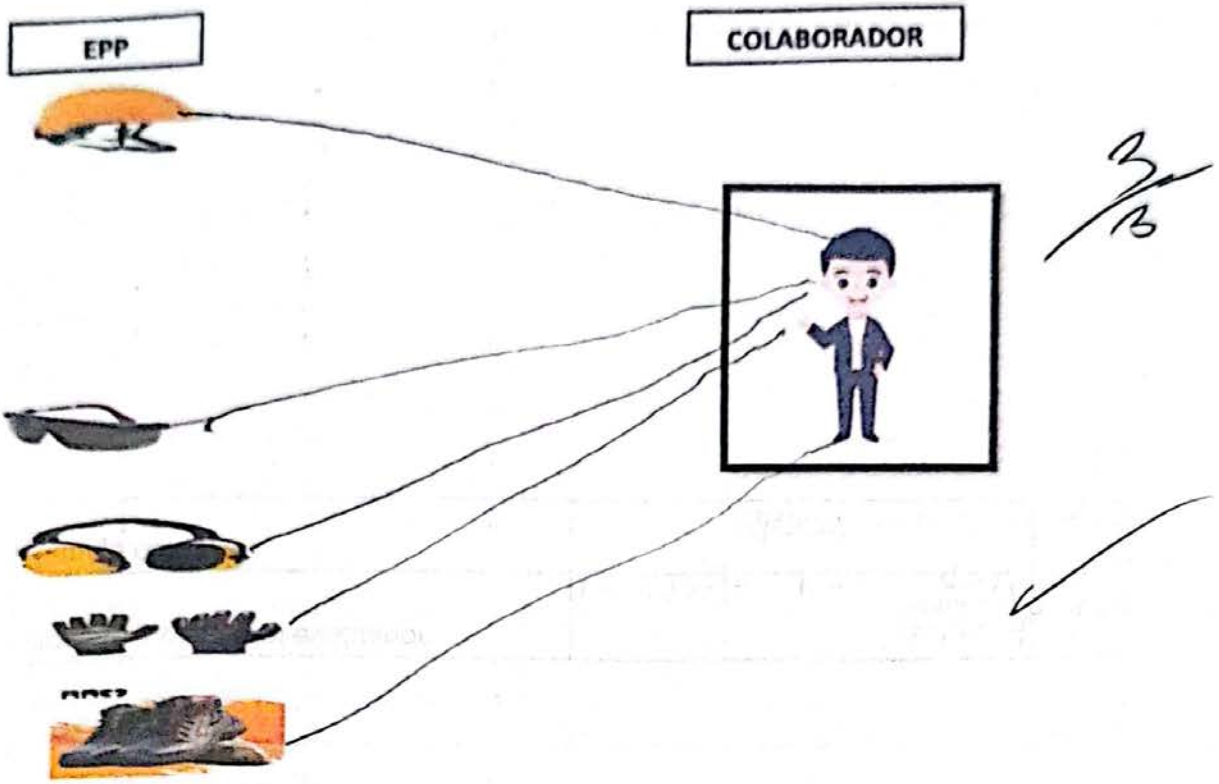

2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:

A. 

B. 

C. 

D. 

X
X

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

C. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.

Nombre y cargo del evaluador:	Yuleisy Rojas 100%
Puntaje obtenido:	100%

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio degustacion	14	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Socialización de políticas, Riesgos asociados a la actividad, ARL a la que estan afiliados, Reporte de condición y accidente de trabajo, Estructura
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez Linares	1058325236	Asesora	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque Rojas	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°: FT-SST-026	
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha: /2024	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 14/03/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: Lina Yurany Gonzalez CEDULA: 1058325236

AREA/SECCION: Palacio de justicia CARGO: Oy

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Ulerapse

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

- Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
- Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
- Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
- Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO	FÍSICO	QUÍMICO
PSICOSOCIAL	BIOMECÁNICOS	CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES		

- Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, asi mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Lina yurany Gonzalez L.
Firma del Trabajador
c.c. 1058325236

Ulerapse
Responsable del SG-SST
c.c.

Powered by CamScanner


	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre: Lina Yuranyi Gonzalez Linares

Cedula: 1058325236
Fecha: 14/08/25
Tema: Educación SST

3/3

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:

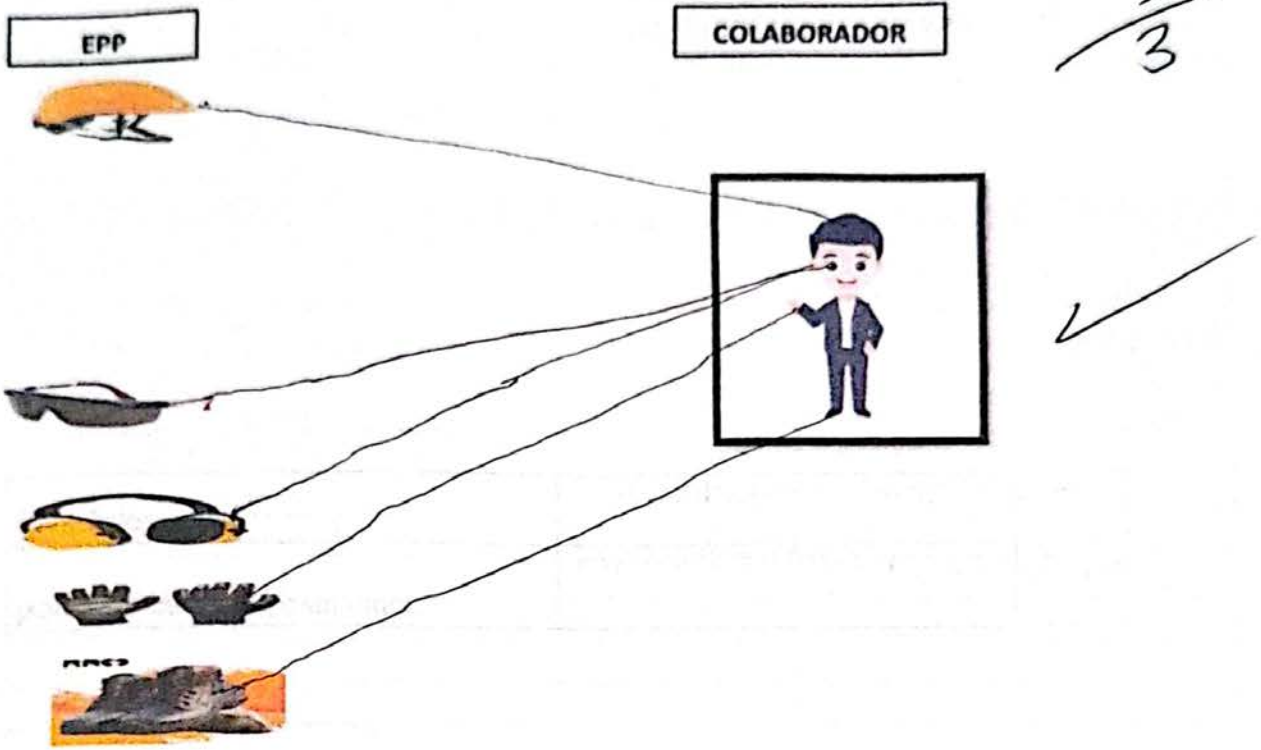

2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:

A.



B.




C.



D.





Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

C. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.

Nombre y cargo del evaluador:	Milena Inspección SST
Puntaje obtenido:	100%

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	FT-SST-015	
		SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha: Agosto 2024	
		Versión: 001	
		Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Pikco de pretel	20	01	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	X	¿Cuál? socialización políticas, reporte de todo accidente de trabajo, accidente, trabajo de trabajo ARL a los que estan afiliados,
Charla de seguridad		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	FREDY YORRES.	9858.740.	Oficial.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Mileidy Rojas	Mileidy

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°: FT-SST-026	
	SG-SST	
FORMATO REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	Fecha: /2024	
	Versión: 001	
	Pagina 1 de 1	

REGISTRO INDUCCION - REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA: 20/03/25 INDUCCIÓN [X] REINDUCCIÓN [ ]

NOMBRE: [illegible] CEDULA: 98387740

AREA/SECCION: Palacio de Justicia CARGO: [illegible]

ENCARGADO DE LA INDUCCION: Milenage

OBJETIVO GENERAL

Con el proposito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra compañía las politicas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

- Bases del SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.
- Conceptos bàsicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Explicación del REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
- Entrega y explicación de las ESTANDARES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la empresa.
- Divulgación factores de riesgo al interior de la empresa.

BIOLÓGICO
FÍSICO
QUÍMICO
PSICOSOCIAL
BIOMECÁNICOS
CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENOMEROS NATURALES

- Procedimientos para tareas de alto riesgo.

Yo como trabajador de la empresa estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor.

Duración de la inducción: 1:00 HORA

Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, así mismo los estandares, procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo

Firma del Trabajador
C.C. 98.387.740.


Milenage
Responsable del SG-SST
C.C. 1M89648

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST	
		Fecha	Versión
	EVALUACION DE CAPACITACION		
		23/09/2024	1

Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Fecha: 26/03/25
Tema: induccion sst

1. Relacione el elemento de protección con la parte del cuerpo:

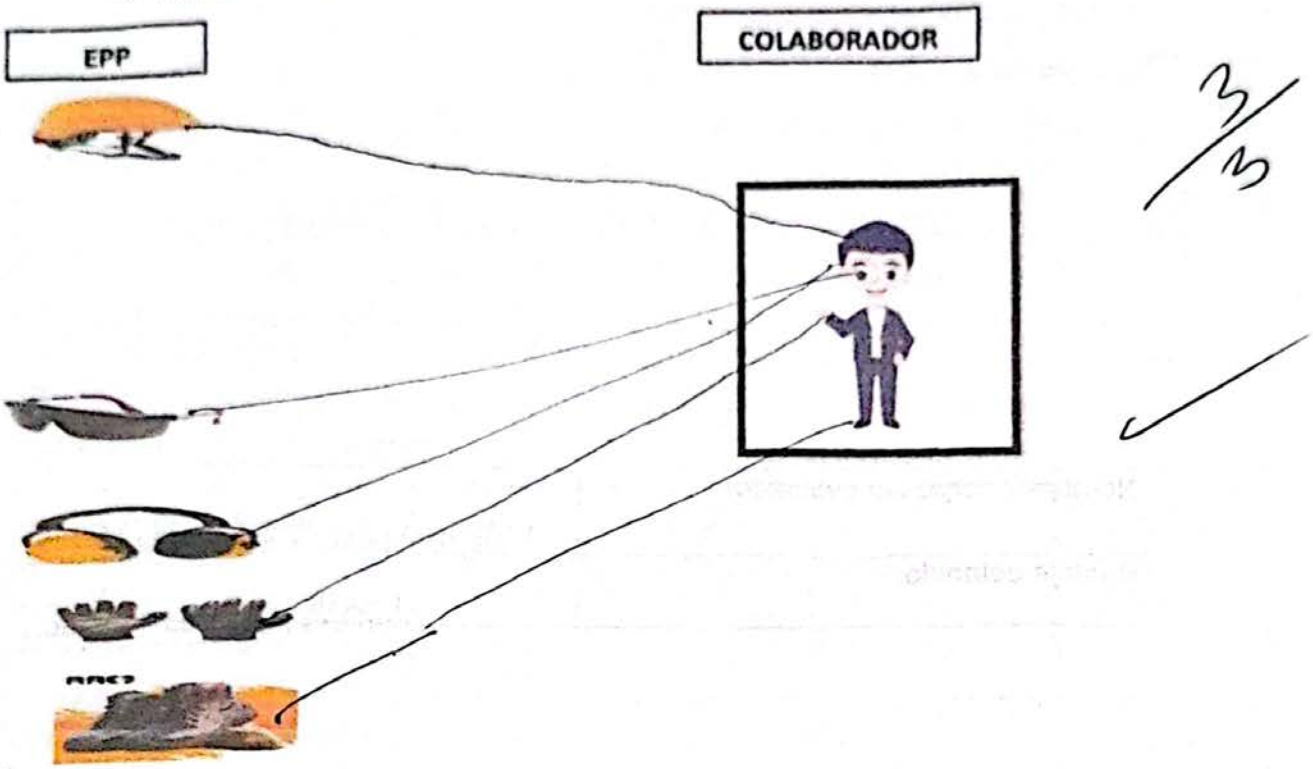

3/3

2. Selección con una X las responsabilidades en SSTA:

A.



B.



C.



D.



✓
✓

Powered by CamScanner

3. Que es un accidente de trabajo:

A. Caída a distinto nivel y mismo nivel.

B. Golpe con maceta, puntero y martillo.

X. suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

D. Todas las anteriores.

Nombre y cargo del evaluador:	Milena Lopez SST
Puntaje obtenido:	100%

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Yerson González / Danilo Beltrán

No. Identificación 1069900788 / 1018492230

Tema evaluado IMPORTANCIA DE DELIMITAR Y SELÑALIZAR LAS AREAS DE TRABAJO

Fecha de evaluación 29/03/25

4/4

1. ¿Porque es importante señalizar el área de trabajo?

Por seguridad y evitar accidentes

2. Con que se puede señalizar las actividades que vamos a realizar

A. Avisos informativos que sean visibles
B. Malla naranja, cadena de seguridad
C. Cinta de peligro
D. Todas las anteriores.

3. Que tipos de señalización que hay:

A. Señalización de obligación, peligro, ruido
B. Señalización de peligro, obligación y prohibición.
C. Ruido, químico, peligro
D. Prohibición, peligro, químico

4. Conteste falso o verdadero a los siguientes enunciados:

A. Se puede retirar o quitar la señalización (F)
B. Si realizamos una excavación se debe señalizar (V)
C. Para actividades de alturas, se debe señalizar el perímetro para que nadie pase por debajo de la actividad. (V)
D. Se miramos una excavación o hueco se puede pasar por encima y saltar F

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 66	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Carlos Fernando Vargas - Daniel Felipe Hernandez Garcia

No. Identificación 1081156392 — 1075265699

Tema evaluado IMPORTANCIA DE DELIMITAR Y SELÑALIZAR LAS AREAS DE TRABAJO

A/A

Fecha de evaluación 24/03/25

1. ¿Porque es importante señalizar el área de trabajo?

Para indicar los riesgos y peligros y para prevenir

2. Con que se puede señalizar las actividades que vamos a realizar

A. Avisos informativos que sean visibles
B. Malla naranja, cadena de seguridad
C. Cinta de peligro
D. Todas las anteriores.

3. Que tipos de señalización que hay:

A. Señalización de obligación, peligro, ruido
B. Señalización de peligro, obligación y prohibición.
C. Ruido, químico, peligro
D. Prohibición, peligro, químico

4. Conteste falso o verdadero a los siguientes enunciados:

A. Se puede retirar o quitar la señalización (F)
B. Si realizamos una excavación se debe señalizar (V)
C. Para actividades de alturas, se debe señalizar el perímetro para que nadie pase por debajo de la actividad. (V)
D. Se miramos una excavación o hueco se puede pasar por encima y saltar (F)

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Carroz Cadena / Jose.

No. identificación 79.601.276 / 1.055.629

Tema evaluado IMPORTANCIA DE DELIMITAR Y SELÑALIZAR LAS AREAS DE TRABAJO

Fecha de evaluación 29/03/2025.

1. ¿Porque es importante señalizar el área de trabajo?

   para prevenir accidentes.

2. Con que se puede señalizar las actividades que vamos a realizar

   A. Avisos informativos que sean visibles
   B. Malla naranja, cadena de seguridad
   C. Cinta de peligro
   D. Todas las anteriores. X

3. Que tipos de señalización que hay:

   A. Señalización de obligación, peligro, ruido
   B. Señalización de peligro, obligación y prohibición. X
   C. Ruido, químico, peligro
   D. Prohibición, peligro, químico

4. Conteste falso o verdadero a los siguientes enunciados:

   A. Se puede retirar o quitar la señalización (F)
   B. Si realizamos una excavación se debe señalizar (SI)
   C. Para actividades de alturas, se debe señalizar el perímetro para que nadie pase por debajo de la actividad. (NO)
   D. Se miramos una excavación o hueco se puede pasar por encima y saltar F

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Jhonatan Ricardo

No. Identificación 1694505 / 17222021

Tema evaluado IMPORTANCIA DE DELIMITAR Y SELÑALIZAR LAS AREAS DE TRABAJO

Fecha de evaluación 24/03/25

1. ¿Porque es importante señalizar el área de trabajo?

   Evitar Peligros

2. Con que se puede señalizar las actividades que vamos a realizar

   A. Avisos informativos que sean visibles
   B. Malla naranja, cadena de seguridad
   C. Cinta de peligro
   D. Todas las anteriores.

3. Que tipos de señalización que hay:

   A. Señalización de obligación, peligro, ruido
   B. Señalización de peligro, obligación y prohibición.
   C. Ruido, químico, peligro
   D. Prohibición, peligro, químico

4. Conteste falso o verdadero a los siguientes enunciados:

   A. Se puede retirar o quitar la señalización (F)
   B. Si realizamos una excavación se debe señalizar (V)
   C. Para actividades de alturas, se debe señalizar el perímetro para que nadie pase por debajo de la actividad. (V)
   D. Se miramos una excavación o hueco se puede pasar por encima y saltar F

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Lina Yurany Gonzalez Oliverio

No. identificación 1058325236 86056596

Tema evaluado IMPORTANCIA DE DELIMITAR Y SELÑALIZAR LAS AREAS DE TRABAJO

Fecha de evaluación 29-03-2025

1. ¿Porque es importante señalizar el área de trabajo?

   Para prevenir accidentes

2. Con que se puede señalizar las actividades que vamos a realizar

   A. Avisos informativos que sean visibles
   B. Malla naranja, cadena de seguridad
   C. Cinta de peligro
   D. Todas las anteriores.

3. Que tipos de señalización que hay:

   A. Señalización de obligación, peligro, ruido
   B. Señalización de peligro, obligación y prohibición.
   C. Ruido, químico, peligro
   D. Prohibición, peligro, químico

4. Conteste falso o verdadero a los siguientes enunciados:

   A. Se puede retirar o quitar la señalización (F)
   B. Si realizamos una excavación se debe señalizar (V)
   C. Para actividades de alturas, se debe señalizar el perímetro para que nadie pase por debajo de la actividad. (V)
   D. Se miramos una excavación o hueco se puede pasar por encima y saltar F

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador JOSE / JHON JONES. Y / 9858720

No. identificación 8607506410

Tema evaluado IMPORTANCIA DE DELIMITAR Y SELÑALIZAR LAS AREAS DE TRABAJO

Fecha de evaluación 29/03/25

3/4

1. ¿Porque es importante señalizar el área de trabajo?
protección personal e identificación de las actividades que se estan realizando, y Prevenir caidas, lesiones

2. Con que se puede señalizar las actividades que vamos a realizar

A. Avisos informativos que sean visibles
B. Malla naranja, cadena de seguridad
C. Cinta de peligro
D. Todas las anteriores.

3. Que tipos de señalización que hay:

X A. Señalización de obligación, peligro, ruido
B. Señalización de peligro, obligación y prohibición.
C. Ruido, químico, peligro
D. Prohibición, peligro, químico

4. Conteste falso o verdadero a los siguientes enunciados:

A. Se puede retirar o quitar la señalización F
B. Si realizamos una excavación se debe señalizar (V)
C. Para actividades de alturas, se debe señalizar el perímetro para que nadie pase por debajo de la actividad. (V)
D. Se miramos una excavación o hueco se puede pasar por encima y saltar F

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE	FORMATO SST-IN 56	
	EVALUACION DE CAPACITACION	Fecha	Versión
		23/09/2024	1

Nombre del Trabajador Jose Cruz / Alexander Noguera /

No. identificación 91 321 950. 1073 211 031

Tema evaluado IMPORTANCIA DE DELIMITAR Y SELÑALIZAR LAS AREAS DE TRABAJO

Fecha de evaluación 19/08/25

1. ¿Porque es importante señalizar el área de trabajo?
   Para Evitar Peligro, Prevenir accidentes

2. Con que se puede señalizar las actividades que vamos a realizar

   A. Avisos informativos que sean visibles
   B. Malla naranja, cadena de seguridad
   C. Cinta de peligro
   X D. Todas las anteriores.

3. Que tipos de señalización que hay:

   A. Señalización de obligación, peligro, ruido
   X B. Señalización de peligro, obligación y prohibición.
   C. Ruido, químico, peligro
   D. Prohibición, peligro, químico

4. Conteste falso o verdadero a los siguientes enunciados:

   A. Se puede retirar o quitar la señalización (F)
   B. Si realizamos una excavación se debe señalizar (V)
   C. Para actividades de alturas, se debe señalizar el perímetro para que nadie pase por debajo de la actividad. (V)
   D. Se miramos una excavación o hueco se puede pasar por encima y saltar F

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	29	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? capacitación importancia de delimitar y señalizar el area de trabajo en actividades
Charla de seguridad		
Capacitación y Entrenamiento en SST	X	
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yuruny Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
2	Josequeseno	86075010	AY	
3	Jhony Torres M.	98587.740.	OF	
4	Jose Castillo	91325934	OF	
5	Jaimar Valencia	1019450459	OF	
6	Perez Bolaya	79601770	AY	
7	Oliveros Anzey	86056596	OF	
8	Ricardo Morales	7222021	OF	
9	Jose Castillo	10555629	Operario	
10	Alexander Noguera	1075211031	Electrico	
11	Danilo Beltrán	1018142730	OF	
12	Yerson Gonzalez	1069900788	contratista	
13	Carlos Fernando Burgos	1075265099	Tecnico	
14	Daniel Alejandro Garcia	1081565992	Tecnico	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Yulena Duque Rojas	Firma	Yulena Duque

Powered by CamScanner

ANEXO N° 4

REGISTRO DE CHARLAS DE SST.

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	03		25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Condiciones Locativas
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Wilder Duvan Cortes R	1121 967 709	AJ	
2	Cesar Bedoya	79 601 270	AX	
3	Oliveros Arizal	86056596	ML	
4	Maikol Silva	1023932270	AX	
5	Jose Maria Valencia	16945054	OF	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque Rojas	Firma	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	4	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Inspección verificación de Herramientas
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Cesar Pedraza	79.601.270	AY	
2	Jose Briceño	86075046	Ay	Jose
3	Oliveros Angel	86056596	HT	Oliveros
4	Wilder Davian Cortes	1121967209	Ay	
5	Rolando Serno	86088862	OF	Rolando
6	Maribel Sáenz	1023922320	Ay	
7	Jesemora Valencia	16945059	OF	Jose L
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Laidy Milena Duque Ramos	Firma	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	5	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Poblacion de quimicos
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Josemaria Valencia	16945059	OF	Jose V
2	Perez Bolaja	79.601770	AY	
3	Jose Vicente	80075046	AY	JOSE
4	Olivero Anza	86056396	MT	Olivero
5	Wilder Dariel cortes R	1121967209	ay	
6	Mustafa Olivera	1073932770	AY	
7	Danilo Beltran	1018492230	OF	
8	Yeison Gonzalez	1069900798	OF	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Asociación de Juntas	6	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Manipulación manual y electrica de Herramientas
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Avicuno	86075040	AY	Jose
2	[illegible] Bedoya	79.601270	AY	[illegible]
3	Oliveros Anza	86056596	HL	Olive
4	Josemaria Valencia	16941059	OF	Josy
5	Yerson Gonzalez	1069001788	OF	[illegible]
6	Danilo Beltran	1018497230	OF	Danilo
7	Wilder Damian Cortes R	1121967209	AY	Wilder Cortes
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque Rojas	Firma	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Valledupar	Palacio de justicia	28	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Pausas activas, Estiramiento
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Quiceno	86075040	AY	Jose
2	Josehaira Valencia	16945054	OF	Jose V
3	[illegible]	79.601.270	AY	[illegible]
4	Olivares Jose	86056596	AT	Oliva
5	maitol silva	1077977770	AY	maitol
6	Danilo Baltran	1018492230	Of	Danilo
7	Yerson Gonzalez	1062[illegible]188	OT	[illegible]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Lady Milena Ovejo	Firma	Milena Ovejo

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	8	03	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	caida de objetos, al mismo nivel y diferente nivel
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Carlos Andres Ramirez	79601770	AY	
2	OLIVERO Angel	86056596	AY	
3	Wilder Dario Cortes R	1121962209	AY	
4	Jose Quiceno	80750140	AY	Jose
5	Mentor Otero	7012937229	AY	
6	Josemario Valencia	16945059	OF	Jose V
7	Danilo Beltran	1018492230	OF	Danilo
8	Yelson Gonzalez	1064900788	OF	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Nilda Ospina	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	14	08	24

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? charla de seguridad ¡autocuidado
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Cesar Bedoya	99601270	AX	Cesar
2	Alexander Rodriguez	1075211031	Electrico	Alex M
3	Oliveros Ana	86055596	HT	Oliveros
4	Jose Ovicendo	86.075040	AT	JOSE
5	Josemaria Valencia	16945059	OF	Josemaria
6	Hermes Malpica	80778983	instalador	
7	waldo villalobos	79 733 263	INSTALADOR	
8	Cesar Gonzalez	1121912130	instalador	Cesar
9	Danilo Beltrán	1010492230	HSE	Danilo
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Yadi Milena Ayala	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	12	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Señalización y delimitación en areas de trabajo.
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Josemaria Valencia	16945059	OF	Jose V
2	Danilo Baltran	1068497230	OF	Danilo
3	Jose Quicano	86075040	A Y	Jose
4	Cesar Bedoya	79.601770	A Y	
5	Silverio Aziz	80056596	HSE	Oliver
6	Alexander Noboa	1075211031	Electrico	Alex
7	Daniel Hernandez Garcia	1081156592	Tecnico	
8	Edwin Fernando Vargas	1075265699	Tecnico	
9	Alex Chaves Osorio	1081514629	Tecnico	Alex Chaves O
10	Hernan malpica.	80778953	Instalador	
11	Cesar Gonzalez	1121912130	Instalador	
12	Waldo villalobos	79733263	Instalador	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Lady Mayerlyne Rojas	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
		SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
		Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	13	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	que es un accidente de trabajo, tipos de accidentes, incidentes, como reportar un accidente de trabajo
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jesomara Valencia	1694 5039	OF	Jose V
2	Cesar Pabon	79.601720	AY	Cesar
3	Jose Quiceno	86075040	AY	JOSE
4	Oliver Ariza	86056596	ML	Oliver
5	Alexander Noguera	1075 111 631	Electrico	Alex
6	ALEX CAICEDO OSORIO	1081514629	Tecnico	Alex Caicedo
7	Carlos Fernando Vargas	1075265649	Tecnico	CarlosVargas
8	Daniel Felipe Hernandez Garcia	1081136592	Tecnico	
9	Danilo Beltran	1018492230	OF	Danilo
10	Dairo Gonzalez	1094033189	Contratista	Dairo
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Milena Ospina	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	14	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Diligenciamiento de permisos
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Quiceno	86075040	AY	Jose
2	Josemaria Valencia	16945059	OF	Jose V
3	[illegible]	79.601270	AY	[illegible]
4	Alexander Noguera	1075270371	Electricco	Alex
5	Oliver Ariza	86056586	H	Oliver
6	Lina Yurany Gonzalez J.	1058395236	Aseadora	[illegible]
7	Danilo Beltran	1018492230	OF	Danilo
8	Yerson Gonzalez	1069900788	contratista	[illegible]
9	Jeiver Gonzalez	1121911730	Instalador	[illegible]
10	Walter Villalobos	74733263	Instalador	[illegible]
11	Hermes Malpica	80728983.	Instalador	[illegible]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Arque Rojas	Firma	Milena Arque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Valledupar	Palacio de justicia	17	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cual?
Charla de seguridad	X	Autocuidado
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Josemaria Valencia	16945059	OF	Josey
2	Lina yuranny Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
3	Cesar Bolaño	79.601290	AY	
4	Jose Quiceno	86075040	AY	Jose
5	Olivero Arce	8605559c	FZ	Olivero
6	Alexander Ndavero	1075211031	Electrico	Alex
7	Danlo Baltrain	1018492230	OF	Danlo
8	Daniel felipe Hernandez	1081156592	Tecnico	
9	Carlos fernando Vargas	1075263699	Tecnico	
10	Brian Gonzalez	1049220788	[illegible]	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Milena Arge	Milenarge

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	FT-SST-015	
	SG-SST		
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:	Agosto- 2024
		Versión:	001
		Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Yumbo	Palacio de Justicia	15	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? Riesgos químicos
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jhonmarco Valencia	16945059	O/=	
2	Jose Quiceno	86075040	AY	
3	Genaro Bedoya	79.601.770	AY	
4	Oliver Garcia	86056595	H	
5	Jose Uribe	91323954	Elect.	
6	Alexander Ndaucu	1075211031	Electrico	
7	Lina Yurany Gonzalez J.	1058325236	Aseo	
8	Daniel Heinander Garcia	1081156592	Tecnico	
9	Luis Fernando Vargas	1075265699	Tecnico	
10	Danilo Beltran	1018197730	OF	
11	Yeison Gonzalez	1069700188	contratista	
12	Hermes Valencia	80178983	instaladores	
13	Waldo villalobos	79733263	Instalador	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milagro Rojas	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo		
	FORMATO:	FT-SST-015	
		SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha: Agosto- 2024	
		Versión: 001	
		Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	19	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		(Cuál)
Charla de seguridad	X	Dinamica, ludica, de concentración
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez Le	1058395236	Aseo	
2	Jose Vicente	86075040	A y	Jose
3	[illegible] Bedoya	79.601270	A y	
4	Olivero Ariza	86056596	Of	Olivero
5	Joseman Valencia	6945759	Of	Jose V
6	Jose Uribe.	91523959.	A y.	
7	Danilo Beltrán	1018492230	Of	Danilo
8	Yerson Cortes	1069900788	contratista	
9	Alexander Ibagura	1075211031	Electrico	Alex
10	Daniel Felipe Hernandez	1081156592	Tecnico	
11	Carlos Fernandez Vargas	1075265699	Tecnico	
12	Hermes malpica	80728988	instalador.	
13	waldo villalobos	79733263	instalador	
14	FABIAN PRIETO	8892783	TECNICO	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Lady Yohana Duque Rojas	Firma	Yuliana Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	20	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo Locativo
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Cesar Bedoya	79.601270	H y	
2	Lina Yurany Gonzalez L	1058325236	Aseo	
3	Jesamara Valencia	1694503	OF	
4	JOSE Uribe-	91325 [illegible]	[illegible]	
5	JOSE QUICENO	86075040	H y	Jose
6	Oliverio Arizo	86056596	GA	
7	Alexander Ndocere	1075211031	Electrico	
8	Danilo Bellrain	1018 492230	of	Danilo
9	FREDY TORRES H.	98.587.740.	OF	
10	Daniel Hernanda Garcia	1081156592	Tecnico	
11	Carlos fernandez Vargas	1077265699	Tecnico	
12	YERSON GONZALEZ	7069900788	contratista	
13	FABIAN PARRA	8357783	TECNICO	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Laidy Milena Duque Rojas	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	21	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo incidente o condición insegura
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	José Quicano	9801540	AY	José
2	Cesar Bolaya	79.601.720	AX	Cesar
3	Oliverio Arias	86056596	CP	Oliverio
4	Alexander Navarro	1075216031	Electrico	Alex
5	José Uribe.	91521934	AY.	
6	Jefferson Valencia	1694 5059	OF	Jefferson
7	Lina Yurany Gonzalez L	1058325236	Aseo	
8	Daniel Hamglin Garcia	1001150914	Tecnic	
9	FABIÁN PARRA	8692783	técnico	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Yulay Duperros	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Reuniones de postas	23	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	orden y aseo en areas de trabajo
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Tatiana Valencia	1C945059	OF	Jusev
2	Alexander Navarro	1075211031	Electrico	Alex
3	Fredy Torres O.	98.587.140.	OF	
4	Jose Uribe	91 523 954.	AUX.	
5	Alex Mc Afe	176R94	elect	
6	Daniel Hernandez Garcia	1088156592	Tecnico	
7	Carlos Fernando Reyes	1075265699	Tecnico	
8	Cesar Bedoya	79.601.770	Ay.	
9	Edison Prieto	8857183	Tecnico	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Milena Duque Rojas	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	24	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Analisis de trabajo seguro, supervisión
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jose Uribe.	91525954	Ay.	
2	Bueno Bedoya	99.661.290	Ay	
3	Jesmare Valencia	1694115059	OF	
4	Dicky Torres H.	98587.740	OF	
5	Alexander Nobocra	1067211031	Electrico	
6	Olivero Ariza	86056596	OP	
7	Jose Castillo	10555629	OP	
8	Daniel Hernandez Garcia	1081156592	Tecnico	
9	Carlos Fernando Vargas	1075265697	Tecnico	
10	Robinson Prieto	8893783	Tecnico	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Lady Milena Duque Rojas	Firma	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	25	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Usar adecuadamente los accesorios de los Evidores
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez J.	1058325236	Aseo	
2	[illegible]	98 539 740	Of	
3	[illegible]	79.601.270	Ay	
4	[illegible]	91 323 951	Ay.	
5	Jose maria Villalba	16945059	OF	Jose V
6	Olivero Anza	8605659C	of.	Olivero
7	Alexander Noboa	1075211031	Electrico	
8	Jose Quiceno	86075040	Ay	Jose
9	Jose Castro	10555629	Oficial	
10	Alley [illegible]	17612617	elect	
11	Danilo Beltran	1018422230	Of	Danilo
12	Daniel Hernandez Garcia	1081156597	Tecnico	
13	Carlos Fernando Vargas	1075265699	Tecnico	
14	FABIAN PRIETO	8852783	TECNICO	
15	Jorge Alberto Aguirre	8190700		
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Arguello	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	08	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	trabajo en equipo
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

	No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
X	1	Cesar Bodoya	79.601.270	A.y.	
X	2	Freddy Torres H.	98.587.740	Of	
X	3	Josmaira Valencia	69'45059	OF	
X	4	Jose Umbr. 2	91323 asr.	A M	
X	5	Hayendy Mebarro	1075241071	Electricista	
X	6	Jose Quiceno	86075040	A y	Jose
X	7	Oliveno Eliriza	86056596	Of	Oliver
X	8	Lina Yuliany Gonzalez L.	1058325936	Aseo	
X	9	Harvey Gutierrez	17'327.914	mayordomo	
X	10	Jose Cristino	10555629	Oficial	
X	11	[illegible]	7222021	Of	
X	12	Danilo Beltran	1018492230	of	Danilo
X	13	[illegible]	1760266	electricista	
	14	Daniel Hernandez	1081156597	tecnico	
X	15	Carlos Fernando Vargas	1075265699	Tecnico	
	16	FABIAN PRIETO	8932783	TECNICO	
	17	Danilo Beltran	1018492230	of	Danilo
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Milena Duque Rojas	Firma	Milena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Pagina 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de justicia	27	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? charla de seguridad e inducción SST de la Rama Judicial personal nuevo
Charla de seguridad	X	
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	FREDY TORRES M.	98587700	OF	
2	Lina Yurany Gonzalez J.	1058395236	Aseo	
3	Jose Cortes.	4132495	AY.	
4	Cesar Barraza	79601270	AY	
5	Jose avi. echo	86075040	AY	Jose
6	Josemaria Valencia	16945059	OF	Jose V
7	Oliverio Arizi	86056596	OF	Oliverio
8	Ricardo Acosta	7222021	OF	
9	Alexander Noguera	1075211031	Electrico	
10	Harvey Gutierrez	17'327.914	Fachada	
11	Daniel Hernandez	1081156591	Tecnico	
12	Carlos Fernando Vargas	1077265699	Tecnico	
13	Jose Castrillo	105556729.	Oficial	
14	Person Gonzalez	1064900788	contratista	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Firma
Leidy Hernandez	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
		SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	28	03	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Riesgo físico (Ruido) importancia de
Capacitación y Entrenamiento en SST		utilizar protección auditiva
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma	
1	FREDY TORRES M.	93.587.740.	OF		X
2	Jose quicheo	86075040	AY	Jose	X
3	Yoseandra Valencia	16945059	OF	JOSE V	X
4	Lina Yurany Gonzalez Jr	1058325236	Aseo		X
5	Jose Uribe	91323954	AY.		X
6	Carmen Bedoya	79601270	AX		X
7	Oliverio Atrico	86056596	OF	Oliver	X
8	Alexander Noboa	1075211031	Electrico	Alex	X
9	Ricardo Gordillo	7222021	OFC		X
10	Daniel Hernandez Garcia	1081156597	Tecnico		X
11	Carlos Fernando Vargas	1075265499	Tecnico		X
12	Jose Castillo	1055558279	Operario		X
13	Yerson Gonzalez	1069900788	contratista		X
14	Danilo Beltran	1018492230	OF	Danilo	X
15	Hender Gutierrez	1713279914	mantto.		X
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Observaciones:

Nombre	Hilenrique Rojas	Firma	

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	FORMATO: FT-SST-015
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Agosto- 2024
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Palacio de Justicia	24	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál? capacitación importancia de delimitar y señalizar el área de trabajo en actividades
Charla de seguridad		
Capacitación y Entrenamiento en SST	X	
Capacitación especifica al cargo		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Lina Yurany Gonzalez L.	1058325236	Aseo	
2	Jose Quiceno	86075010	A y	Jose
3	[illegible]	98587.740.	OF	
4	Jose Cortes	91323935	Ax	
5	Jairo Andres Valencia	1.945.059	OF	Josev
6	Cesar Bataya	79601770	AX	
7	Oliveros Anzey	86056596	OF	Oliver
8	Ricardo [illegible]	7222021	OF	
9	Jose Castillo	10555629	oficial	
10	Alexander Noguera	1075211081	Electrico	Alex
11	Danilo Beltrán	1018142730	OF	Danilo
12	Yerson Gonzalez	1069900788	contratista	
13	Carlos Fernando Vargas	1075265699	Tecnico	
14	Daniel Alexander Garcia	1081565492	Tecnico	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observaciones:

Nombre	Leidy Yulena Duque Rojas	Firma	Yulena Duque

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	FORMATO:	FT-SST-015
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Agosto- 2024
	Versión:	001
	Página 1 de 1	

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Villavicencio	Aulacodejsta	29	08	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		¿Cuál?
Charla de seguridad	X	Recomendaciones de seguridad
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		

	No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
X	1	Jose Quicelmo	80807450 40	AY	Jose
X	2	Jose Mario Valenga	16945059	OF	Jose V
X	3	FREDY TORRES H.	98-187746	OF	
X	4	Cesar Badaya	79.601220	AY	
X	5	Oliveno Anza	86056596	CL	Oliveno
X	6	Jose Oribe.	CI 323 955	AY.	
	7	Ricardo Morelos	7222021	OF	
X	8	Lina Yuriany Gonzalez L.	1058385236	Aseo	
X	9	Danilo Beltrán	1018492230	Of	Danilo
X	10	Yeison Gonzalez	1068000788	contratista	
	11	Alex			
X	12	Daniel Hernandez Garcia	1081156592	Tecnico	
X	13	Carlos Fernando Vargas	1075765699	Tecnico	
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				

Observaciones:

Nombre	leidy Milena Vasquez Rojas	Firma	

Powered by CamScanner

ANEXO N° 5

REGISTRO DE INSPECCIONES Y PREOPERACIONALES.

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 21 al 31 Mes 03	ÁREA:	Palacio de justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	JOSE RICAURTE	GRUPO DE TRABAJO:	Daniel

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO	✓													
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓													
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓													
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓													
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓													
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓													
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓													
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
Nombre del operador														
JOSE	JOSE													
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Relacion de justificio		UBICACION:	cerrera Bantos Cerramento	
PROVEEDOR:	AYN		SERIE:	HR 2026	
ACTIVIDAD:	Cortes de Fachaleta		MARCA:	Uberman	
SEMANA DEL	31 AL 3 DE		25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓				✓							
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓				✓							
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓				✓							
Estado del mango	✓		✓				✓							
Estado del cuerpo	✓		✓				✓							
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓				✓							
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓				✓							
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓				✓							
Condiciones de orden y aseo	✓		✓				✓							

NOMBRES	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Ricardo Hoyos Gutierrez							
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST							
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

VIGENTE DESDE: 23-08-2024

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia	UBICACION:	torre A pisos cerramiento
PROVEEDOR:	AyV	SERIE:	23108.190137
ACTIVIDAD:	corte de fachada 9	MARCA:	JACO
SEMANA DEL	27 AL 3 DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓				✓							
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓				✓							
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓				✓							
Estado del mango	✓		✓				✓							
Estado del cuerpo	✓		✓				✓							
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓				✓							
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓				✓							
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓				✓							
Condiciones de orden y aseo	✓		✓				✓							
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Ricardo Hernandez Gutierrez	MRS													
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 31 al 1 Mes 08 24	ÁREA:	Pellas de gres-horno
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Daniel Hernandez	GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓											
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓													
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓											
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓											
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓											
Nombre del operador														
Daniel Hernandez Garcia														
Carlos Fernando Vargas														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro HP 24 V MODELO: McKita

FECHA: VALIDO DESDE: 31/03/25 HASTA: 4/04/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓																	
	Clavo acerado	✓			✓																	
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓																	
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓																	
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓																	
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓																	
	verificar funcionamiento general	✓			✓																	
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓																	
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	[signature]			[signature]																	
	FIRMA OPERADOR 2	[signature]			[signature]																	
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	Hilarosque			Hilarosque			—			—			—			—			—		
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Hilarosque Rojas	CARGO: Insp SST	FIRMA: Hilarosque
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Daniel Hernandez Garcia	CARGO: Tecnico	FIRMA: [signature]
OPERADOR 2	NOMBRE: Carlos Fernando Vargas	CARGO: Tecnico	FIRMA: [signature]
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio	SI [ ]	NO [X]		Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ANDAMIO ESTRUCTURAL	CÓDIGO: FT-SST : 033 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: Agosto -2024 PÁGINA: 1 de 2

Responsable: Daniel Hernandez — Fecha desde: 31/03/25

Inspección realizada por: Hilerdo Reyes — Fecha hasta: 1/04/25

Altura: 1.50 mts Aprox — Tipo de andamio: tubular

Usuario:

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA

	ASPECTO EVALUADO (USO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	El andamio es metálico y tubular	✓			✓																	
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			✓																	
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			✓																	
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			✓																	
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			✓																	
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			✓																	
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓																				
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			✓																	
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			✓																	
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			✓																	
11	Cuenta con baranda superior			✓		✓																
12	Cuenta con baranda intermedia			✓		✓																
13	Cuenta con rodapiés			✓		✓																
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			✓																	
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			✓																	
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			✓																	

NOMBRES COLABORADORES	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Carlos Vargas	1073526369								
Daniel Hernandez	1081156797								

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Hilerdo Reyes	1082								

NOMBRE INSPECTOR 2	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia	UBICACION:	Torre B 5 piso
PROVEEDOR:	AyV	SERIE:	9359 M12
ACTIVIDAD:	Soldadura	MARCA:	Makita
SEMANA DEL	31 AL 1 DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓											
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓											
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓											
Estado del mango	✓		✓											
Estado del cuerpo	✓		✓											
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓											
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓											
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓											
Condiciones de orden y aseo	✓		✓											
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Daniel Hernandez Garcia														
Carlos Fernando Vargas														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 31 al 5 Mes Ago	ÁREA	Fabricación de estibas
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Danilo Beltran	GRUPO DE TRABAJO	Stanley SOD-111

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO O PULIDORA DE

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓				✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nombre del operador														
Danilo Beltran	Danilo		Danilo		Danilo		Danilo		Danilo		Danilo			
Yerson Calzada														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN ANDAMIO ESTRUCTURAL	CÓDIGO: FT-SST : 033 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: Agosto -2024 PÁGINA: 1 de 2

Responsable: Hilera duque — Fecha desde: 31/03/25

Inspección realizada por: Danilo Beltran — Fecha hasta: 5/04/25

Altura: 1,50 Mts Aprox. — Tipo de andamio: tubular

Usuario:

Marque con una "X" en la columna de ESTADO la condición encontrada para cada uno de los aspectos evaluados.
C=CUMPLE, NC= NO CUMPLE, N/A=NO APLICA

	ASPECTO EVALUADO (USO)	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
1	El andamio es metálico y tubular	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			✓						✓			✓			✓					
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	✓			✓			✓			✓			✓								
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11	Cuenta con baranda superior			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
12	Cuenta con baranda intermedia			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
13	Cuenta con rodapiés			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES COLABORADORES	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Danilo Beltran	1018492230	danilo	Danilo	Danilo	danilo	Danilo	Danilo		
Yerson Collazos	1061990088								

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD
Hilera duque	1121896488	Hilera duque	Hilera duque	Hilera duque	Hilera duque	Hilera duque	Hilera duque		

NOMBRE INSPECTOR 2	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	CONDICION DE SALUD

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 31 al 31 Mes 03	ÁREA	
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Fredy Torres	GRUPO DE TRABAJO	Black Deker

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO (X) O PULIDORA DE ( )

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓													
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓													
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓													
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓													
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓													
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓													
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓													
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓													
Nombre del operador														
FREDY TORRES M.														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Pabellón docente	UBICACION:	Torre Bloque
PROVEEDOR:	A&V	SERIE:	DWE 9010
ACTIVIDAD:	Cortes de enchape	MARCA:	Makita Dewalt
SEMANA DEL	31 AL 5 DE 25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Oliveros Arias	Oliveros		Oliveros		Oliveros		Oliveros		Oliveros		Oliveros			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Milenaque		Milenaque		Milenaque		Milenaque		Milenaque		Milenaque			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia	UBICACION:	torre A pisos
PROVEEDOR:	AyV	SERIE:	TC 6080
ACTIVIDAD:	cortes de enchape	MARCA:	Tool craft Angle Grinder
SEMANA DEL	31 AL 4 DE 25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓				✓		✓		✓					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓		✓					
Estado del accesorio portadiscos	✓				✓		✓		✓					
Estado del mango	✓				✓		✓		✓					
Estado del cuerpo	✓				✓		✓		✓					
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓				✓		✓		✓					
Estado general de la guía y la guarda	✓				✓		✓		✓					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓				✓		✓		✓					
Condiciones de orden y aseo	✓				✓		✓		✓					
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Jesmora Valencia	JESOU				JOJO		JOLOL		JOJO					
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Milenaque		—		Milenaque		Milenaque		Milenaque					
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia	**UBICACION:**	torre Bajos
PROVEEDOR:	AyV	**SERIE:**	012306230219
ACTIVIDAD:	cortes de anclaje	**MARCA:**	Dongheng
SEMANA DEL	31 **AL** 5 **DE** 25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓				✓		✓		✓					
Estado del mango	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓				✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓				✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓				✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Josemario Urrutia	JOSE R				JOSE U		JOSE U		JOSE U		JOSE U			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Milenaque				Milenaque		Milenaque		Milenaque		Milenaque			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia	UBICACION:	Letica Baños
PROVEEDOR:	AyV	SERIE:	16685
ACTIVIDAD:	retiro de cochage	MARCA:	Inper
SEMANA DEL	31 AL 3 DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓													
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓													
Estado del accesorio portadiscos	✓													
Estado del mango	✓													
Estado del cuerpo	✓													
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓													
Estado general de la guía y la guarda	✓													
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓													
Condiciones de orden y aseo	✓													
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Erick Torres M														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia			UBICACION:	torre A Baños
PROVEEDOR:	AVJ			SERIE:	Esmart 9-1
ACTIVIDAD:	Cortes de enchape			MARCA:	draper
SEMANA DEL	31	AL	5	DE	25

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Jeremias Valencia	Jeremias		Jeremias		Jeremias		Jeremias		Jeremias		Jeremias			
Jose Uribe														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Yuleidy		Yuleidy		Yuleidy		Yuleidy		Yuleidy		Yuleidy			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	FORMATO N°:	FT-SST-060	
	SG-SST		
FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES		Fecha:	ago-24
		Versión:	001
			Página 1 de 1

CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		EXTINTOR 4		EXTINTOR 5		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE
	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE					
El extintor está ubicado en el lugrar preestablecido	C														
El extintor no presenta obstáculos para su acceso	C														
El extintor está completamente cargado y operable	C														
Las calcomanias y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor (Tipo/Fecha)	C														
El gabinete o gancho está ubicado a una altura no mayor a 1,5 mt.	C														
La base del extintor está al menos a 10 cm de altura sobre el nivel del piso	C														
El extintor tiene el sello de seguridad	C														
El extintor tienen el pasador o pin de seguridad	C														
La pintura del cilindro está en buen estado	C														
El cilindro está en buen estado, sin oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones	C														
La manguera del extintor está en buen estado, sin roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, animales, entre otros.	C														
Los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla están bien	C														
La Corneta en los extintores de CO2 no presenta fisuras, cristalización y defectos en acoples	C														
La válvula no presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento	C														
La lectura de presión está dentro del rango operable	C														
Fecha de vencimiento	2025	11													

C = Cumple NC = No cumple

			DIA	MES	AÑO
AREA INSPECCIONADA	oficina extintor multiproposito	FECHA DE INSPECCION	20	03	25
RESPONSABLE	Milena Duque Rojas	FIRMA	Milena Duque		

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	COD: FT-SST-049
	LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO	VERSION 001
		Pag 24

FECHA DE INSPECCION: 18/03/25
AREA: Palacio de Justicia
RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Milena Duque

No	CRITERIO	CUMPLE	NO CUMPLE	NA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
	LOCALES				
1	¿Las Plataformas y escaleras están limpias, en buen estado y libres de obstáculos?	✓			
2	Las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, permanecen libres de obstáculos de forma que es posible utilizarlas sin dificultades en todo momento?	✓			
3	¿Las paredes están limpias y en buen estado?	✓			
4	¿El sistema de iluminación está en optimas condiciones para la labor?	✓			
5	¿Las señales de seguridad están visibles, correctamente distribuidas y en perfecto estado de mantenimiento y limpieza?	✓			
6	¿Los extintores están en su lugar de ubicación, visibles y en perfecto estado?	✓			
	SUELOS, PASILLOS Y VÍAS DE CIRCULACIÓN				
1	¿Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni materiales innecesarios?	✓	✓		
2	¿Las vías de circulación de los lugares de trabajo, se pueden utilizar conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para el personal que trabaje en su proximidades?	✓			
3	¿Los pasillos y zonas de transito están libres de obstáculos?	✓			
	ALMACENAJE				
1	¿Las áreas de almacenamiento y deposición de materiales están señalizadas?	✓			
2	¿Los materiales están apilados en su sitio sin invadir zonas de paso?	✓			
3	¿Los materiales se apilan o cargan de manera segura, limpia y ordenada?	✓			
4	¿Se establece claramente donde tiene que estar cada cosa de modo que todo trabajador que vaya a necesitarla sepa de manera indudable donde va a encontrarla y donde debe devolverla?	✓			
	HERRAMIENTAS				
1	¿Están almacenadas estantes adecuados, donde cada herramienta tiene su lugar?	✓			
2	¿Se observan herramientas tiradas en el área de trabajo?		✓		
3	¿Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas?	✓			
	RESIDUOS				
1	¿Se eliminan con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo?	✓		✓	
2	¿ Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo?	✓			
3	¿Están claramente identificados los contenedores de residuos especiales?	✓			
4	¿Se evita el rebose de los contenedores?	✓			
5	¿Existen los medios de limpieza a disposición del personal del área?	✓			
	OBSERVACIONES DE COMPORTAMIENTO				
1	¿Los trabajadores dejan organizadas las herramientas y equipos a finalizar la jornada?	✓			
2	¿Los trabajadores mantienen las áreas de paso libres de obstáculos durante el trabajo ?	✓			
3	¿Por iniciativa propia los trabajadores recogen y disponen los residuos antes de abandonar el área de trabajo ?	✓			

Powered by CamScanner

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO N°: FT-SST-061

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fecha: Enero Agosto 2024
Versión: 001
Página 1 de 1

FECHA: 15/08/24
AREA INSPECCIONADA: elementos de protección personal
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Liliana Ayde Rojas

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR								USA		ESTADO			NO USA POR			MEDIDAS DE CONTROL				
			A	B	C	D	E	F	G	H	SI	NO	B	R	M	NS	NP	NO	1	2	3	4	5
1	Freddy Torres	OF																					
2	Alvaro Ariza	OF																					
3	Cesar Rodallo	OV																					
4	Jose Garcia	OV																					
5	Jose Vides	OV																					
6	Jose Velasco	OF																					
7	Alexander Moreno	OF electrico																					
8	Pablo Mellado	OF																					
9	Daniel Hernandez	electrico																					
10	Carlos Hernandez	OF																					
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							

No	EPP FALTANTE POR PERSONA: CARGO	A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR	ESTADO	NO USA POR	MEDIDAS DE CONTROL
A- OVEROL / CAMISA-PANTALON	B- BUENO	NS- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
B- CASCO			
C- GUANTES			2. MOTIVACION
D- BOTAS			
E- PROTECCION RESPIRATORIA	R- REGULAR	NP- NO PUEDE	3. CAMBIO DE EPP
F- PROTECTORES AUDITIVOS			
G- GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PENDIENTES
H- OTRO			
Cual? CAMIBUSO	M- MALO	NQ- NO QUIERE	5. OTRAS

OBSERVACIONES

FIRMA: Liliana Ayde
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA: Liliana Ayde
RESPONSABLE DEL SG-SST

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST.030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: Taladro HILTI MODELO TE 60 ATC/AVR CONSECUTIVO:

FECHA: 13/08/25 HASTA: 16/08/25

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	DOO	LUNES C	LUNES NC	LUNES N/A	MARTES C	MARTES NC	MARTES N/A	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES N/A	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES N/A	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES N/A	SABADO C	SABADO NC	SABADO N/A	DOMINGO C	DOMINGO NC	DOMINGO N/A
	El piston se encuentra en buen estado										✓			✓			✓			✓		
	Clavo acerado										✓			✓			✓			✓		
	Mangos o puntos de apoyo										✓			✓			✓			✓		
	Cuerpo de la pistola de fijacion										✓			✓			✓			✓		
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones										✓			✓			✓			✓		
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip										✓			✓			✓			✓		
	verificar funcionamiento general										✓			✓			✓			✓		
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado										✓			✓			✓			✓		
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1																					
	FIRMA OPERADOR 2																					
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1																					
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian castaneda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Lady Milena Duque Rojas	CARGO: SISE SST	FIRMA: Milena Duque
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro MODELO GBH 2-20

FECHA: VALIDO DESDE: 10/03/25 HASTA: 16/04/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Clavo acerado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO																							
	FIRMA OPERADOR 1	Alex N.			Alex N			Alex N.			Alex N			Alex			Alex.			Alex		
	FIRMA OPERADOR 2																						
	FIRMA OPERADOR 3																						
	FIRMA OPERADOR 4																						
	FIRMA OPERADOR 5																						
	FIRMA OPERADOR 6																						
	FIRMA OPERADOR 7																						
	FIRMA OPERADOR 8																						
	INSPECTOR SST 1	Yuleidy			Yuleidy			Yuleidy			Yuleidy			Yuleidy			Yuleidy			Yuleidy		
	INSPECTOR SST 2																						

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidi Yuleidy Ayde	CARGO: Insp SST	FIRMA: Yuleidy
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Alexander Ndoviera	CARGO: Electrico	FIRMA: Alex Ndovera
OPERADOR 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio	SI [ ]	NO [X]		Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro | CA21598 | MODELO 4 Lakita

FECHA: 11/03/25 | HASTA: 15/03/25 | CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado																					
	Clavo acerado																					
	Mangos o puntos de apoyo																					
	Cuerpo de la pistola de fijacion																					
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones																					
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip																					
	verificar funcionamiento general																					
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado																					

VERIFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO							
FIRMA OPERADOR 1	—	[illegible]	[illegible]				
FIRMA OPERADOR 2							
FIRMA OPERADOR 3							
FIRMA OPERADOR 4							
FIRMA OPERADOR 5							
FIRMA OPERADOR 6							
FIRMA OPERADOR 7							
FIRMA OPERADOR 8							
INSPECTOR SST 1	—	Lilery Argue	Lilery Argue	Lilery Argue			
INSPECTOR SST 2							

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Lilery Argue Rojas	CARGO: insp SST	FIRMA: Lilery Argue
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Fabian castañeda	CARGO: Residente	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio	SI [ ]	NO [X]		Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO:

FECHA: taladro 11/03/25 HASTA: 14/08/25 MODELO DeWalt D25

PROPIA [X] ALQUILADA [ ] CONSECUTIVO:

ITEM	000	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado				✓			✓						✓								
	Clavo acerado				✓			✓						✓								
	Mangos o puntos de apoyo				✓			✓						✓								
	Cuerpo de la pistola de fijacion				✓			✓						✓								
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones				✓			✓						✓								
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip				✓			✓						✓								
	verificar funcionamiento general				✓			✓						✓								
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado				✓			✓						✓								
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	—			[signature]			[signature]						[signature]								
	FIRMA OPERADOR 2				[signature]			[signature]						[signature]								
	FIRMA OPERADOR 3				[signature]			[signature]						[signature]								
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	—			Fabian Ospe			Fabian Ospe			/			Fabian Ospe								
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian castañeda	CARGO: residente	FIRMA: [signature]
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Milena Ospe Rojas	CARGO: insp SST	FIRMA: [signature]
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Hermes malpica	CARGO: instalador.	FIRMA: [signature]
OPERADOR 2	NOMBRE: waldo villalobos	CARGO: instalador	FIRMA: [signature]
OPERADOR 3	NOMBRE: Gerardo Gonzalez	CARGO: instalador	FIRMA: [signature]
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro | MODELO

FECHA: 11/03/25 HASTA: 14/03/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	000	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado				✓			✓						✓								
	Clavo acerado				✓			✓						✓								
	Mangos o puntos de apoyo				✓			✓						✓								
	Cuerpo de la pistola de fijacion				✓			✓						✓								
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones				✓			✓						✓								
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip				✓			✓						✓								
	verificar funcionamiento general				✓			✓						✓								
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado				✓			✓						✓								
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	—			[signature]			[signature]						[signature]								
	FIRMA OPERADOR 2				[signature]			[signature]						[signature]								
	FIRMA OPERADOR 3				[signature]			[signature]						[signature]								
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	—			[signature]			[signature]			—			[signature]								
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian castañeda	CARGO: Residente	FIRMA: [signature]
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Valencia	CARGO: inspector sst	FIRMA: [signature]
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Hermes malpica.	CARGO: instalador.	FIRMA: [signature]
OPERADOR 2	NOMBRE: waldo villalobos	CARGO: instalador	FIRMA: [signature]
OPERADOR 3	NOMBRE: Geru Gonzalez	CARGO: Instalador	FIRMA: [signature]
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]

C. Conforme / NC: No Conforme

Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 13 al 6 Mes 05	ÁREA:	Palacio de justicia tradicional
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Daniel Felipe	GRUPO DE TRABAJO:	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☑ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN							✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		✓		✓	
Nombre del operador														
	—		—		—									
Daniel Felipe Hernandez Garcia							Daniel		Daniel		Daniel		Daniel	
Cristian Fernando Vargas							Cristian		Cristian		Cristian		Cristian	
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2	—		—		—		Felipe		Felipe		Felipe		Felipe	

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 11 al 14 Mes 03	ÁREA:	Aulas con Justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Hernes maldica	GRUPO DE TRABAJO:	Alwake 2024

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓				✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓				✓					
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN			✓		✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓				✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓				✓					
Nombre del operador														
Hernes maldica.														
waldo villalobos														
Geyser Gonzalez														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 028 VERSIÓN: 01 VIGENTE DESDE: 28-05-2024 PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 12 al 16 Mes 05	AREA	Reforestadora Tres Blackdeker
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Alexander Noboa G	GRUPO DE TRABAJO	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO O PULIDORA DE

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nombre del operador														
Alexander Noboa G	Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex	
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
		VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 11 al 17 Mes 03	ÁREA:	Aeroacuatica
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Hernan Molina	GRUPO DE TRABAJO:	Eulwake 2200

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓				✓					
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓				✓					✓
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN					✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓				✓					
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓				✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓				✓					
Nombre del operador														
Hernan molina														
Waldo villalobos														
Cesar Gonzalez														
Firma de Inspector SST														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia			UBICACION:	Torre A
PROVEEDOR:	AyV			SERIE:	9554 HR
ACTIVIDAD:	Corte			MARCA:	Makita
SEMANA DEL	13	AL	16	DE	25

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)							✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro							✓		✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos							✓		✓		✓		✓	
Estado del mango							✓		✓		✓		✓	
Estado del cuerpo							✓		✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)							✓		✓		✓		✓	
Estado general de la guia y la guarda							✓		✓		✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)							✓		✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo							✓		✓		✓		✓	
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Daniel Hernandez Garcia	—		—		—		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
Carlos Fernandez Vargas							[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST							Miercoles		Miercoles		Miercoles		Miercoles	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia			UBICACION:	turbaco Bolivar
PROVEEDOR:	A&V			SERIE:	HK 2020
ACTIVIDAD:	corte			MARCA:	Ubemon
SEMANA DEL	10	AL	16	DE	25

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Alexander Ñeñora	Alex N.		Alex N.		Alex N		Alex N		Alex N		Alex		Alex	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

FT-SST: 028
Versión 01
Agosto-2024

PROYECTO:	Palacio de justicia	UBICACION:	torre A pisos
PROVEEDOR:	AyV	SERIE:	Esmt 9-1
ACTIVIDAD:	10/03/25 Corte	MARCA:	troper
SEMANA DEL	10 AL 15 DE 25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			/
Condiciones de orden y aseo	✓				✓		✓		✓					/

NOMBRES	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Jose	Jose	Jose	Jose	Jose			/
German Bedoya							/
Oliver Ariza	Oliver						/
Rosmario Valencia	Jose V	Jose V	Jose V	Jose V			/
Yerson Gonzalez							/
Danilo Balta	Danilo	Danilo	Danilo	Danilo	Danilo	Danilo	/
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST							✓
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

FT-SST: 028
Versión 01
Agosto-2024

PROYECTO:	Palacio de justicia	UBICACION:	torre A Bucaramanga
PROVEEDOR:	AW	SERIE:	FLEX 410901 (57727K)
ACTIVIDAD:	Corte	MARCA:	Makita
SEMANA DEL	10 AL 16 DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Alexander Navarro G	Alex N.		Alex N		Alex N		Alex N		Alex		Alex		Alex	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Yulexaque		Yulexaque		Yulexaque		Yulexaque		Yulexaque		Yulexaque		Yulexaque	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 13 al 22 Mes 05	ÁREA:	Palacio de justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Danilo Beltran	GRUPO DE TRABAJO:	Devigil 24V

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓				✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓				✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓				✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN			✓		✓		✓				✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓				✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓				✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓				✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓				✓			
Nombre del operador			Danilo		Danilo		Danilo				Danilo			
Danilo Beltran Yerson Gonzalez **Firma de Inspector SST**														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia			UBICACION:	torre B
PROVEEDOR:	AyV			SERIE:	M0901 (527271)
ACTIVIDAD:	Corte			MARCA:	Makita
SEMANA DEL	17	AL	23	DE	25

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Alexander Noguera Ortiz	Alex.		Alex N		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacios de Justicia			UBICACION:	Torre B
PROVEEDOR:	A&V			SERIE:	HZ 2020
ACTIVIDAD:	Corte			MARCA:	Sherman
SEMANA DEL	17	AL	23	DE	25

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		—		✓	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		—		✓	
Estado del mango	✓		✓		—		✓		✓		—		✓	
Estado del cuerpo	✓		✓		—		✓		✓		—		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		—		✓		✓		—		✓	
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		^		✓		✓		—		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			✓		—		✓		✓		—		✓	
Condiciones de orden y aseo	—		✓		—		✓		✓		—		—	

NOMBRES	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Alexander Ndoura	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex
Alex Jose Ortiz							
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Milagros	Milagros	Milagros	Milagros	Milagros	Milagros	Milagros
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro MODELO GBH 2240

FECHA: 17/03/25 HASTA: 23/03/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Clavo acerado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangos o puntos de apoyo	✓									✓											
	Cuerpo de la pistola de fijacion				✓			✓						✓			✓			✓		
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO								
FIRMA OPERADOR 1	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex	Alex	
FIRMA OPERADOR 2						A	A	
FIRMA OPERADOR 3								
FIRMA OPERADOR 4								
FIRMA OPERADOR 5								
FIRMA OPERADOR 6								
FIRMA OPERADOR 7								
FIRMA OPERADOR 8								
INSPECTOR SST 1	Hilera	Hilera	Hilera	Hilera	Hilera	Hilera	Hilera	
INSPECTOR SST 2								

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian Castañeda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Hilera Ospe Rojas	CARGO: SMSE SST	FIRMA: Hilera Ospe
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Alexander Noboa	CARGO: Electrico	FIRMA: Alex Noboa
OPERADOR 2	NOMBRE: Hay una otra	CARGO: electric	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: Taladro MODELO 2019

FECHA: 17/08/25 HASTA: 1/12/2025 23/09/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Clavo acerado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El perosnal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1																					
	FIRMA OPERADOR 2																					
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1																					
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian castañeda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Hilera Dayre Rojas	CARGO: SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Daniel Felipe Hernandez Garcia	CARGO: Tecnico	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE: Cindy Fernanda Vargas	CARGO: Tecnico	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]

C. Conforme / NC: No Conforme

Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	06-2024

EQUIPO: taladro MODELO 6AU5T8 MARCA makita

FECHA: 17/02/25 HASTA: 17/02/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	000	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clavo acerado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
VERIFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	Jose			Jose			Jose			Jose			Jose			Jose					
	FIRMA OPERADOR 2	Jose			Jose			Jose			—			—			—					
	FIRMA OPERADOR 3	Danilo			—			—			—			—			—					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	Yuleydi			Yuleydi			Yuleydi			Yuleydi			Yuleydi			Yuleydi					
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Yuleydi Arque Rojas	CARGO: HSE SST	FIRMA: Yuleydi Arque
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Jhonnier Valencia	CARGO: OF	FIRMA: Josev
OPERADOR 2	NOMBRE: Jose Quicano	CARGO: AY	FIRMA: Jose
OPERADOR 3	NOMBRE: Danilo Beltran	CARGO: OF	FIRMA: Danilo
OPERADOR 4	NOMBRE: Yeison Gonzalez	CARGO: contratista	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

C. Conforme / NC: No Conforme

Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]

Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia		UBICACION:	bre 8	
PROVEEDOR:	AYV		SERIE:	9554 H2	
ACTIVIDAD:	corte		MARCA:	Makita	
SEMANA DEL	17	AL 23	DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Daniel Eclipe Hernandez Garcia														
Cesar Fernando Vargas														
Fabian Rasero														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

FT-SST: 028
Versión 01
Agosto-2024

PROYECTO:	Palacio de Justicia	UBICACION:	torre B
PROVEEDOR:	AyV	SERIE:	6mat 4-1
ACTIVIDAD:	corte	MARCA:	truper
SEMANA DEL	17 AL 23 DE 25		

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓				✓		✓	
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓				✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Jose maria Valencia	Josev													
Jose Quiroz	Jose		Jose		Jose V		Jose V		Jose V		Jose V		Jose V	
Danilo Beltran	Danilo		Danilo											
Nelson Gonzales														
Jose Cortes														
Enelly Dorices														
Jose Castillo														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Mblanque		Mblanque		Mblanque		Mblanque		Mblanque		Mblanque		Mblanque	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 17 al 23 Mes 05	ÁREA	Palacio de Justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Alexander Noguera	GRUPO DE TRABAJO	Nacif Deker

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		—		—		✓		✓		—	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	—		✓		✓		✓		✓		✓		—	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	—		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Nombre del operador														
Alexander Noguera	Alex.		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex	
Ala cnx. cnf12														
Firma de Inspector SST 1	Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex	
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 17 al 23 Mes 03	ÁREA:	Aduana de Justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR:	Daniel Hernandez	GRUPO DE TRABAJO:	Marta

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓				✓		✓		✓		✓	
Nombre del operador														
Daniel Felipe Hernandez Garcia														
Carlos Fernando Vargas														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 16 al 17 Mes 09	AREA	Hidroadjustica
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Hernan Valencia	GRUPO DE TRABAJO	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☐ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓									
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓									
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN			✓		✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓									
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓									
Nombre del operador														
Hernan Valencia.														
Waldo Villalobos														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 24 al 30 Mes 08	ÁREA	Aulas de soldadura
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Carlos	GRUPO DE TRABAJO	Maestro

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO X O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓						✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓				✓		✓		✓			
Nombre del operador														
Daniel Hernandez Garcia														
Carlos Fernando Vargas														
FABIAN PRIETO														
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 25 al 29 Mes 03	ÁREA	Bodega logistica
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Danilo Beltran	GRUPO DE TRABAJO	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO O PULIDORA DE [X]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		—		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		—		—		✓			
Nombre del operador														
Danilo Beltran			Danilo		Danilo		Danilo		Danilo		Danilo			
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 27 al 31 Mes 03	ÁREA	stanley SCD 711
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Yarsi Gonzalez	GRUPO DE TRABAJO	

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO ☒ O PULIDORA DE ☐

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)							✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS							✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO							✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN							✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA							✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)							✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR							✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS							✓		✓		✓			
Yerson G. Nombre del operador														
Yerson Gonzalez	—		—		—		[illegible]		[illegible]		[illegible]			
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2			—		—		[illegible]		[illegible]		[illegible]			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN	Semana Del 24 al 29 Mes 03	ÁREA	Reforestadora Sharp
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Alexander Noguera	GRUPO DE TRABAJO	Black Decker

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÒN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nombre del operador														
Alexander Noguera	Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex			
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

		CODIGO: FT-SST 028
		VERSIÓN: 01
	INSPECCIONES PRE OPERACIONAL, TALADRO DE MANO Y PULIDORA	VIGENTE DESDE: 28-08-2024
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN:	Semana Del 24 al 24 Mes 03	ÁREA:	Palacio de Justicia
INSPECCIÓN REALIZADA POR:		GRUPO DE TRABAJO:	Black & Decker

REALIZA INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE TALADRO [X] O PULIDORA DE [ ]

DESCRIPCIÓN DE PULIDORA	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)														
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)														
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS														
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO														
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO														
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM														
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA														
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)														
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA TAREA														
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS														
ESTADO DEL DISCO														
DESCRIPCIÓN DE TALADRO INALAMBRICO	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**	**B**	**M**
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nombre del operador														
Jesmary Valencia, Jose Castillo. Oliver	Jesmary Jose —		Jesmary Jose —		Jesmary Jose —		Jesmary Jose —		Jesmary Jose Oliver		Jesmary Jose Oliver			
Firma de Inspector SST 1														
Firma de Inspector SST 2														

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia		UBICACION:	torre A y B	
PROVEEDOR:	AyV		SERIE:		Modo1 (52727K)
ACTIVIDAD:	cortes		MARCA:	Makita	
SEMANA DEL	24 AL 29 DE 25				

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		EIRMA		FIRMA	
Alexander Velasquez Valencia	Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Velasquez		Velasquez		Velasquez		Velasquez		Velasquez		Velasquez			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia		UBICACION:	torre A y B	
PROVEEDOR:	AyV		SERIE:		R 2020
ACTIVIDAD:	cortes		MARCA:	Bremen	
SEMANA DEL	24 AL 29 DE			23	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		—			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		—			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Alex Mauricio Alexander Nocua	Alex		Alex		Alex		Alex		Alex		Alex			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

FT-SST: 028
Versión 01
Agosto-2024

PROYECTO:	Palacio de Justicia	**UBICACION:**	obra Bitos
PROVEEDOR:	AyV	**SERIE:**	Esmalt 9-1
ACTIVIDAD:	Cortes	**MARCA:**	truper
SEMANA DEL	24 **AL** 24 **DE**	'25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Jeremias Vaglenca	JOSE		JOSE		JOSE		JOSE		JOSE		JOSE			
JOSE CASTILLO														
Oliveno Arzen					Oliveno		Oliveno		Oliveno		Oliveno			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST	Yulieth		Yulieth		Yulieth		Yulieth		Yulieth		Yulieth			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de justicia		UBICACION:	Bucaramanga	
PROVEEDOR:	AYV		SERIE:		DWE 4010
ACTIVIDAD:	corte		MARCA:	Dewalt	
SEMANA DEL	25 AL 29 DE				

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)									✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro									✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos									✓		✓			
Estado del mango									✓		✓			
Estado del cuerpo									✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)									✓		✓			
Estado general de la guia y la guarda									✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)									✓		✓			
Condiciones de orden y aseo									✓		✓			
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Oliverio Hazen									Oliverio		Oliverio			
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST									Oliverio		Oliverio			

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Relacio de vistria		UBICACION:	torre A pisos	
PROVEEDOR:	AyV		SERIE:	16683	
ACTIVIDAD:	cortes		MARCA:	truper	
SEMANA DEL	24	AL 29	DE	25	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOMBRES	FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

FT-SST: 028
Versión 01
Agosto-2024

PROYECTO:	Palacio de justicia	UBICACION:	Juzgamiento
PROVEEDOR:	AyV	SERIE:	2310814013T
ACTIVIDAD:	Corte de Pachaleta	MARCA:	Truper
SEMANA DEL	26 AL 29	DE	25

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)														
Estado del interruptor de encendido y su seguro														
Estado del accesorio portadiscos														
Estado del mango														
Estado del cuerpo														
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)														
Estado general de la guía y la guarda														
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)														
Condiciones de orden y aseo														

NOMBRES	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Henry Gutierrez Rincon							
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST							
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST							

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	FT-SST: 028 Versión 01 Agosto-2024
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	

PROYECTO:	Palacio de Justicia	**UBICACION:**	torre B piso 5		
PROVEEDOR:	AW	**SERIE:**	9554-HH2		
ACTIVIDAD:	corte	**MARCA:**	Makita		
SEMANA DEL	24 **AL** 30 **DE**				

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del cuerpo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones de orden y aseo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
NOMBRES	**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**		**FIRMA**	
Daniel Hernandez Garcia														
Carlos Fernando Vargas														
Fabian Pinzon														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														
Vo. Bo SUPERVISOR DE SST														

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: Taladro 24/03/25 MODELO Makita

FECHA: HASTA: 31/03/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	000	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Clavo acerado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1																					
	FIRMA OPERADOR 2																					
	FIRMA OPERADOR 3																					
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1																					
	INSPECTOR SST 2																					

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Rubien castañeda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Milena Duque Rojas	CARGO: Insp SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Daniel Hernandez Garcia	CARGO: Tecnico	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE: Carlos fernando Vargas	CARGO: Tecnico	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR	C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]	Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro MODELO Dewalt

FECHA: 24/03/25 HASTA: 31/03/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓														
	Clavo acerado	✓			✓			✓														
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓														
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓														
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓														
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓			✓														
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓														
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓														

VERIFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO																							
	FIRMA OPERADOR 1	✓			✓			✓															
	FIRMA OPERADOR 2																						
	FIRMA OPERADOR 3																						
	FIRMA OPERADOR 4																						
	FIRMA OPERADOR 5																						
	FIRMA OPERADOR 6																						
	FIRMA OPERADOR 7																						
	FIRMA OPERADOR 8																						
	INSPECTOR SST 1	Yuleny Ospe			Yuleny Ospe			Yuleny Ospe															
	INSPECTOR SST 2																						

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Leidy Yuleny Ospe	CARGO: Insp SST	FIRMA: Yulenyospe
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRÍTICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR				C. Conforme / NC: No Conforme
Fuera de Servicio	SI [ ]	NO [X]		Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla **ÚNICAMENTE** el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST-030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro MODELO: GBH 2240

FECHA: 24/03/25 HASTA: 29/03/25 CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clavo acerado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equi	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	verificar funcionamiento general	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO	FIRMA OPERADOR 1	A			A			A			—			—			—			/		
	FIRMA OPERADOR 2	Alex			Alex			Alex			Alex			Alex			Alex			/		
	FIRMA OPERADOR 3																			/		
	FIRMA OPERADOR 4																					
	FIRMA OPERADOR 5																					
	FIRMA OPERADOR 6																					
	FIRMA OPERADOR 7																					
	FIRMA OPERADOR 8																					
	INSPECTOR SST 1	Milena Rojas			Milena Rojas			Milena Rojas			Milena Rojas			Milena Rojas			Milena Rojas			/		
	INSPECTOR SST 2																			/		

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian castaneda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Milena Rojas	CARGO: insp SST	FIRMA: Milena Rojas
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE: Alejandro ortiz	CARGO: Electricista	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE: Alexander Nolasco	CARGO: Electricista	FIRMA: Alex
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de Servicio SI [ ] NO [ ]

C. Conforme / NC: No Conforme

Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE TALADRO	CÓDIGO	FT-SST:030
		VERSIÓN	1
		FECHA	08-2024

EQUIPO: taladro | MODELO 4 1/2 FHP

FECHA: 21/02/25 | HASTA: 28/02/25 | CONSECUTIVO:

PROPIA [X] ALQUILADA [ ]

ITEM	OOO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
	El piston se encuentra en buen estado	✓			✓																	
	Clavo acerado	✓			✓																	
	Mangos o puntos de apoyo	✓			✓																	
	Cuerpo de la pistola de fijacion	✓			✓																	
	El pulsador o gatillo se encuentra en buenas condiciones	✓			✓																	
	Utilice siempre los elementos de proteccion personal al operar el equip	✓			✓																	
	verificar funcionamiento general	✓			✓																	
	El personal que opera el equipo se encuentra capacitado	✓			✓																	

VERFICACION CONDICIONES DEL EQUIPO																							
	FIRMA OPERADOR 1	✓			✓																		
	FIRMA OPERADOR 2																						
	FIRMA OPERADOR 3																						
	FIRMA OPERADOR 4																						
	FIRMA OPERADOR 5																						
	FIRMA OPERADOR 6																						
	FIRMA OPERADOR 7																						
	FIRMA OPERADOR 8																						
	INSPECTOR SST 1	✓			✓																		
	INSPECTOR SST 2																						

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS

RESPONSABLES DE AUTORIZAR LOS TRABAJOS	NOMBRE: Fabian castaneda	CARGO: Residente	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 1	NOMBRE: Mulacargue Edgar	CARGO: Ing SST	FIRMA:
INSPECTOR DE SST 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 1	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 2	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 3	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 4	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 5	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 6	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 7	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:
OPERADOR 8	NOMBRE:	CARGO:	FIRMA:

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de Servicio SI [ ] NO [X]

C. Conforme / NC: No Conforme

Fecha de corrección: _____

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección pre operacional debe realizarla ÚNICAMENTE el OPERADOR del equipo, en caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al Inspector SST o Supervisor quien tomará la decisión más segura.

Powered by CamScanner

ANEXO N° 6

REGISTRO DE ATS Y PERMISOS DE TRABAJO.

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO	FT.SST. 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Agosto -2024

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones

Frente de Obra: Palacio de justicia Fabio Constanza

Responsable ejecutor Actividad:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación de enchape

Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N° :
*Para realizar el análisis diligenciar el punto A.

Empresa Ejecutora : Consorcio Infraestructura A&V

Fecha de elaboración: Día 29 Mes [illegible] Año 25

Fecha de ejecución: Desde: Día 31 Mes 03 Año 25 Hasta: Día 5 Mes 04 Año 25

Actividades: Albañil, soldador y cortadora de enchape, pintor, maceta, macetin, chazuela

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS	QUIMICOS	ERGONOMICOS	SEGURIDAD - MECANICOS	SEGURIDAD - LOCATIVOS	CONTROL DE LOS RIESGOS HSE
Ruido	X Particulas naturales	Postura prolongada	Atrapamientos X	Trabajo en alturas	Rotulado de envases y hojas de seguridad X
Iluminación excesiva	Particulas inorganicas	Postura forzada	Proyección de particulas X	Espacios confinados	Autoreporte de condiciones de salud X
Iluminación deficiente	Vapores y humos combustibles	Postura antigravitacional X	Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes	Sistema de contención de derrames o fugas
Vibración cuerpo entero	Humos metálicos	Esfuerzo X	SEGURIDAD - ELECTRICOS	Superficies de trabajos con distintos niveles	Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección X
Vibración segmentada	Humos no metálicos	Espacio limitado	Alta o Media Tensión X	Caida de objetos	Aterrizar el equipo X
Altas temperaturas	Liquidos combustibles	Movimiento repetitivo X	Baja tensión X	Condiciones de orden y aseo X	Revisión de equipos y herramientas X
Bajas temperaturas	Liquidos inorganicos	Manipulación de cargas X	Enchufes, tomas, cableado X	Demolición	Protección de sumideros
Radiación por soldadura	Liquidos organicos	Alto desgaste físico X	Estatica	Trabajos simultaneos	Monitoreo de la atmósfera
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	Solido s organicos/inorganico s	Otro ?	Equipos energizados	Instalaciones inadecuadas X	Drenar/Ventilar

AMBIENTE DE TRABAJO	PSICOSOCIA L	BIOLOGICOS	ASPECTOS AMBIENTALES		
Explosiones X	Atención y concentración elevada X	Bacterias, rickettsias X	Captación o desague de agua	Corte de árboles o vegetació n	Clasificación y disposición de residuos X
Fugas/Derrames	Alta responsabilidad	Parasitos, hongos X	Uso de recursos naturales (canteras,	Derrames potenciales	Requiere vigia/Inspecto r/Supervisо r X
Incendio	Jornadas extensas/Turnos X	Virus, fluidos	Emisiones	Afectación de sumidero s	Equipo contraincendio
Manejo de vehiculos	Relaciones interpersonales	P icaduras, mo rdeduras	Generación de residuos (sólidos, liquidos,	Transporte de sustancias químicas o combustibles X	Limpieza y humectación
					Sistema de aislamiento seguro

	AMBIENTAL	ECONOMICO REPUTACIONAL	JURIDICO CONTRACTUAL	PARTES INTERESADAS INVOLUCRADAS	PROBABILIDAD			
Fatalidad	Contaminación irrecuperable	Catastrófico > $100 COP	Multas y sanciones de autoridades	Internacional				
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Grave $30 a $99 COP	Sanciones contractuales	Nacional				
Accidente/Lesión importante	Contaminación localizada	Severo $ 9 A 19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad radicados y cumplimiento parcial especificaciones contractuales (no inhabilidad)	Regional				
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP		Local: Open y tenedores				
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Mayores < $ 1 COP	Sin efectos	Interna: Comercial				
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguno	Sin efectos	Ningún impacto				

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado	X	Gafas especiales	X
Respirador vapores orgánicos		Careta	
Respirador para humos		Manta dielectrica	
Equipo de protección contra caida		Casco dielectrico	X
Botas dieléctricas	X	Equipo de auto contenido	
¿Otros? ¿Cuáles?	guantes, tapabocas		

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (firma y cc)	OBSERVACIONES
31/03/25	730 AM	500PM	[illegible] 1114926975		
1/04/25	730AM	500PM	[illegible] 1114926975		
2/04/25	730AM	500AM	[illegible] 1114926975		
3/04/25	730AM	500PM	[illegible] 1114926975		
4/04/25	730AM	500PM	[illegible] 1114926975		
5/04/25	730AM	500PM	[illegible] 1114926975		

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: Agosto -2024

PARTE C. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Pasos ordenado del trabajo		Peligro/Aspecto		Consecuencias		Acciones de Control (preventivas, protectivas, reactivas)		Responsable
1.	ALISTAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.1	1. RIESGO BIOMECANICO (posturas inadecuadas) 2.RIESGO LOCATIVO (superfice de trabajo irregulares deslizantes)	1.1	1.Lesiones musculo - esqueletico, espamos, Imbalgias, Malas posturas, levantamiento de cargas, dolor lumbal, posturas forzedas o permanentes 2.Caidas al mismo nivel, golpes y fracturas	1.1	1.Autocuidado, charla preoperacional, posturas adecuadas, calestenia, Rotación de actividades, pausas activas, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad. 2. Autocuidado, uso de epp (botas de seguridad),Charlas de seguridad, Diligenciamiento de permisos, Ats,inspección de equipos y herramientas, precaución al realizar la actividad, tener en cuenta señalización y las diferente actividades que se ejecutan en obra.	inspector S.S.T Trabajadores. Ingeniero residente
2.	MEZCLAR (CEMENTO) PARA HACER ALISTADO DE PISO Y PAÑETE DE PAREDES	2.2	1. RIESGO QUIMICO (exposicion a sustancia cemento 2. RIESGO BIOMECANICO (posturas inadecuadas)	2.2	1. Irritación en la piel, enfermedades respiratorias, Irritación en los ojos. 2. Lesiones musculo - esqueletico, espamos, Imbalgias, Malas posturas, levantamiento de cargas, dolor lumbal, posturas forzadas o permanentes	2.2	1. Se utiliza los EPP y dotacion,(gafas de seguridad, guantes de caucho y proteccion respiratoria overol (camisa y pantalón) socialización de las fichas de seguridad del producto químico cemento. 2. pausas activas, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, pausas activas, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad.	inspector S.S.T trabajadores Ingeniero residente
3.	CONECTAR PULIDORA Y TALADRO	3.3	1. Riesgo eléctrico (Baja y alta tensión	3. 3	1. Quemaduras, corto circuito, heridas, posible fatalidad, incendios, descarga electrica, electrocucion.	3.3	1. Inspeccion de extensiones, clavijas, que no esten con añadiduras, inspeccion preoperacional equipos, cableado en buen estado, precaución e inspección del area y uso epp.	Inspector S.S.T. Trabajadores. Ingeniero residente
4.	MEZCLAR PEGACOR	4.4	1. Riesgo eléctrico (Baja tensión) 2.Riesgo mecánico (uso de herramientas manuales y electricas) 3. Riesgo biomecánico (posturas inadecuadas) 4. Riesgo químico (exposición a sustancia de pegacor)	4.4	1. Quemaduras, corto circuito, posible fatalidad, electrocucion, Incendio. 2. atrapamientos, golpes, cortes, machucones, heridas,dolor osteomuscular, abraciones, heridas,contunciones. aciones de alguna extremidad del cuerpo. 3. Lesiones musculo-esquelético, espasmos, lumbalgias 4. Irritación en la piel, enfermedades respiratorias, irritación en los ojos, intoxicación	4.4	1. inspección preoperacional de las herramientas eléctricas, inspección de extensión eléctrica y verificación de los tableros eléctricos, señalización riesgo eléctrico. 2. Autocuidado, diligenciamiento de permisos, ats, uso de epp adecuados (guantes de nitrilo y vaqueta, casco, gafas, tapabocas n95, tapa oídos inserción y copa). Inspección de las herramientas, equipos con todos los accesorios adecuados (guarda de seguridad, mango) verificar que se encuentren en buenas condiciones para su uso, tener precaucion al manipularlos, cuando se deje de utilizar los equipos electricos (pulidora y taladro) desconectar la extension, instalar siempre el disco que ses el adecaudo para la pulidora cuando se haga cambio de disco verificar que esta se encuentra desconectada. señalizar y delimitar area de trabajo 3. Autocuidado, charla preoperacional, posturas adecuadas, calesteria, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad. 4. Uso de tapabocas, socializar hoja de seguridad del pegacor.	Inspector S.S.T. Trabajadores. Ingeniero residente

Powered by CamScanner

5	CORTE DE BALDOSA CON PULIDORA Y CORTADORA DE ENCHAPE	5.5	1. Riesgo eléctrico (Baja tensión) 2.Riesgo mecánico (exposición a partes móviles de la herramienta) 3.Riesgo biomecánico (posturas inadecuadas) 4. Riesgo físico ruido, exposicion a rayos UV (luz solar), vibraciones	5.5	1.Quemaduras, corto circuito, posible fatalidad 2.Irritación en los ojos por proyección de particulas, cortes, heridas, amputaciones, atrapamiento por partes en movimiento externas, quemaduras por proyección de chispas. 3. Lesiones musculo-esqueléticó, espasmos, lumbalgias 4. contaduras, golpes, quemaduras,estrés, dolor de cabeza, hipoacusia.	5.5	1. inspección preoperacional de las herramientas eléctricas, inspección de extensión eléctrica y tableros de la obra señalizados, uso de epp (gafas, tapa oídos, tapabocas, guantes de nitrilo, botas de seguridad, casco, barbuquejo), diligenciamiento de permisos de trabajo, autocuidado, verificar áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo, tarjeta de equipos, carnet de operación de equipos 2. Autocuidado, inspección de herramienta (pulidora), diligenciamiento de permisos, ats, uso de epp adecuados (guantes de nitrilo, casco, gafas, tapabocas, tapa oidos de copa, careta), tarjeta de equipos, carnet de operación de equipos, sistemas de bloqueo y señalización, socialización de reglas cardinales y estándares de seguridad, uso correcto de la guarda de seguridad. 3.posturas adecuadas, calestenia, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad. 4. inspección de equipos, herramientas, uso de tapaoidos, guantes de vaqueta o nitrilo, casco con barbuquejo, gafas de seguridad,careta de esmeriar, tapabocas n95 uso adecuado de equipos, prohibido retirar accesorios de equipos de accesorios. hidretacion a personal, uso de proteccion solar, señalizacion y delimitacion de area	inspector S.S.T trabajadores. Ingeniero residente
6	INSTALAR BALDOSA EN AREA PISOS Y PAREDES	6.6	1. Riesgo biomecánico (Posturas mantenidas y prolongada), 2. Riesgo químico (exposición mezcla pegacor) 3. Riesgo mecánico (herramientas manuales)	6.6	1. Lesiones musculo-esqueléticó, espasmos, lumbalgias 2. Irritación en la piel, irritación en los ojos 3. golpes, machucones, atrapamientos por o entre objetos.	6.6	1. Realizar posturas adecuadas para realizar la actividad, realizar pausas activas de 5 minutos, autocuidado 2. Uso de epp adecuados (guantes de nitrilo, casco, barbuquejo, gafas, tapabocas), autocuidado, socialización de hojas de seguridad de pegacor 3. manejo y movimiento adecuado de las herramientas manuales	Inspector S.S.T. Trabajadores. Encargado.
7	BISELAR BALDOSA	7.7	1. Riesgo eléctrico (Baja y alta tensión) 2. Riesgo mecánico (exposición a partes móviles de la herramienta) 3. Riesgo biomecánico (posturas inadecuadas)	7.7	1.Quemaduras, corto circuito, posible fatalidad 2.Irritación en los ojos, molestias respiratorias, tinitus 3.Lesiones musculo-esqueléticó, espasmos, lumbalgias	7.7	1. inspección preoperacional de las herramientas eléctricas, inspección de extensión eléctrica y tableros de la obra señalizados, uso de epp (gafas, tapa oídos, tapabocas, guantes de nitrilo, botas de seguridad, casco, barbuquejo), diligenciamiento de permisos de trabajo, autocuidado, verificar áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo, tarjeta de equipos, carnet de operación de equipos 2. Autocuidado, inspección de herramienta (pulidora), diligenciamiento de permisos, uso de epp adecuados (guantes de nitrilo, casco, gafas, mascarilla con filtro para polvos, tapa oídos de copa, careta), uso de mesa para biselar, demarcación y señalización del área de baselado, tarjeta de equipos, carnet de operación de equipos, 3. Autocuidado, charla preoperacional, posturas adecuadas, calestenia, pausas activas, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad.	inspector S.S.T trabajadores. Ingeniero residente
8	ORDEN Y ASEO	8.8	1.Riesgo químico (inhalación particulas), 2.Riesgo biomecánico (malas posturas), 3. Riesgo locativo (irregularidades deslizantes y/o caida al mismo nivel)	8.8	1.Irritación en la piel, enfermedades respiratorias, irritación en los ojos, intoxicación 2. Lesiones musculo-esqueléticó, espasmos, lumbalgias 3.caidas, golpes, fracturas	8.8	1.Uso de epp adecuados (guantes de nitrilo, casco, barburquejo, gafas, tapabocas), autocuidado, socialización de hojas de seguridad de pegacor 2. Realizar posturas adecuadas para realizar la actividad, realizar pausas activas de 5 minutos, autocuidado, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad. 3. Autocuidado, uso de epp (botas de seguridad, guantes, casco, gafas, tapabocas), inspección visual área	Inspector S.S.T. Trabajadores.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: AGOSTO 2024

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMIN
Lady Milena Lagos	1118964483	PROFESIONAL SST	Milena Lagos	Milena Lagos	Milena Lagos	Milena Lagos	Milena Lagos	Milena Lagos	—
NOMBRE INSPECTOR 2	**CEDULA**	**CARGO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMIN**

APROBACIÓN DEL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jose Valencia	16945058	OPE	Jose V	Jose V	Jose V	Jose V	Jose	—	
Oliveros	86056	OF	Oliveros	Oliveros	Oliveros	Oliveros	Oliveros	Oliveros	
Montes	1024932021	AY			Montes	Montes	Montes		

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO	FT-SST-931
	BISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Agosto -2024

GENERALIDADES ATS

OBJETO: mantenimiento y adecuaciones

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: instalación de RIC

Fecha de elaboración: Día 24 Mes Año

Fecha de ejecución: Desde: Día 31 Mes Ago Año 25 Hasta: Día 5 Mes Sept Año 25

Frente de Obra: Rehabilitación de vía

Responsable ejecutor Actividad: Andamio

Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°:

*Para realizar el análisis diligenciar el punto A

Empresa Ejecutora: Consorcio Infraestructura A&V

Taladro, Escalera, Andamio, Pistola de tijeras, Bisturí

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS	QUIMICOS	ERGONOMICOS	SEGURIDAD - MECANICOS	SEGURIDAD - LOCATIVOS	C CONTROL DE LOS PELIGROS HSE	
Ruido X	Particulas naturales	Postura prolongada	Atrapamientos	Trabajo en alturas	Polizado de entregas y hojas de seguridad	
Iluminación excesiva	Particulas inorganicas	Postura forzada	Proyección de particulas X	Espacios confinados	Autoreporte de condiciones de salud	X
Iluminación deficiente	Vapores y humos combustibles	Postura antigravitacional	Manejo de elementos cortantes punzantes o contundentes X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes	Sistema de contención de derrames o fugas	
Vibración cuerpo entero	Humos metálicos	Esfuerzo X	SEGURIDAD - ELECTRICOS	Superficie de trabajo con distinto nivel	Instalar barreras / señalización / Demarcación / Protección	X
Vibración segmentada	Humos no metálicos	Espacio limitado	Alta o Media Tensión	Caida de objetos	Asegurar el equipo	
Altas temperaturas	Liquidos combustibles	Movimiento repetitivo	Baja tensión	Condiciones de orden y aseo	Revisión de equipos y herramientas	
Bajas temperaturas	Liquidos inorganicos	Manipulación de cargas X	Enchufes, tomas, cableado	Demolición	Protección de sumideros	
Radiación por soldadura	Liquidos organicos	Alto desgaste físico	Estatica	Trabajos simultaneos	Monitoreo de la atmósfera	
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	Solido s organicos/inorganico s	Otro ?	Equipos energizados	Instalaciones inadecuadas	Orden/Ventilar	

AMBIENTE DE TRABAJO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICOS	ASPECTOS AMBIENTALES		Clasificación y separación de residuos	X
Explosiones	Atención y concentración elevada	Bacterias, rickettsias	Captación o desague de agua	Corte de árboles o vegetación n	Peligros relacionados con gases /	X
Fugas/Derrames	Alta responsabilidad	Parasitos, hongos	Uso de recursos naturales /canteras.	Derrames potenciales	Equipo contraincendio	
Incendio	Jornadas extensas/Turnos	Virus, fluidos	Emisiones	Alteración de sumideros s	Limpieza y humectación	
Manejo de vehiculos	Relaciones interpersonales	Picaduras, mo rdeduras	Generación de residuos (sólidos, líquidos.	Transporte de materiales químicos o combustibles	Sistema de aislamiento seguro	

Peligros	Ambiente	Frecuencia (exposición)	Aspectos Ambientales	Impacto Ambiental Potencial	Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Nivel de Exposición	Valoración del Riesgo
Fatalidad	Contaminación irreversible	Catastrófica > $100 COP	Multas y sanciones de autoridades	Internacional	4	4	4	4
Accidente/Lesión Grave	Contaminación severa	Grave $20 a 99 COP	Sanciones ambientales	Nacional	4	4	3	3
Accidente/Lesión importante	Contaminación localizada	Severo $ 6 A 19 COP	Quejas, reclamos no conformidad ciudadana	Regional	4	4	2	2
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP	Incumplimiento contractual no cuantificable	Local Open y terceros	3	3	2	2
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < $ 1 COP	Sin efectos	Planta Corporativ.	2	2	2	2
Ninguna lesión	Ningun Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ninguna impacto	1	1	1	1

RIESGO MEDIO (RM): Se deben tomar y mantener medidas que controlen mejor el riesgo. El ATS requiere de personal técnico y experto para su seguimiento y ejecución.

RIESGOS BAJO (RB): se deben asegurar las actividades y poder ser mejoras a los procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.

ADICIONAL A LOS EPP BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado		Gafas especiales	
Respirador vapores orgánicos		Careta	
Respirador para humos		Manta dieléctrica	
Equipo de protección contra caída		Casco dieléctrico	X
Botas dieléctricas	X	Equipo de auto contenido	

¿Cuál? Guantes de carnaza

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (Firma y cc)	OBSERVACIONES
31/03/25	8:00 AM	5:00 PM	Milena Duque 1128484983		1121426425
1/04/25	7:30 AM	5:00 PM	Milena Duque 1128484983		1121426425
2/04/25	7:30 AM	5:00 PM	Milena Duque 1128484983		1121426425
3/04/25	7:30 AM	5:00 PM	Milena Duque 1128484983		1121426425
4/04/25	7:30 AM	5:00 PM	Milena Duque 1128484983		1121426425
5/04/25	8:00 AM	1:00 PM	Milena Duque 1128484983		1121426425

Powered by CamScanner

PARTE C. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Pasos ordenado del trabajo					Responsable
1	INSPECCIONAR EL ÁREA, ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL A UTILIZAR (EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERA TIPO TUERA, DRYWALL Y PVC) Andamio tubular	Locativos: Icondiciones de la superficie, superficies lisas,actividades adyacentes en el area, obstaculos en el area a intervenir.	Caidas a nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades .	I- Inspeccionar previamente el area reconociendo la zona e identificando obstaculos removibles y no removibles, huecos que pudieran causar caidas y cualquier tipo de lesion. -Identificar el estado del terreno antes de ingresar. - Implementar la señalizacion preventiva y/o informativa. (conos, cinta de peligro, entre otros) dentificar la ubicación exacta en donde se realizara la instalación de la señalizacion -Uso adecuado de los elementos de protección personal. -Disponer los residuos en un lugar adecuado y demarcado. mantener el orden y aseo para evitar cualquier tipo de incidentes o accidentes de trabajo a causa de los residuos generados por la labor.	Residente, Inspector S.S.T, Personal Operativo
2.	TRASLADO DE DRYWALL Y PVC PARA TODOS LOS PISOS, ASCENSO A LA TORRE POR ESCALERA ESTRUCTURAL	a) MECÁNICO: Manejo de herramientas; trabajos a distinto nivel - Caidos a diferente nivel, caidos de objetos. b)BIOMECANICO : Movimientos repetitivos, posturas prolongadas c)BIOLOGICO : Contacto con aguas estancadas (lluvias) d) FÍSICO: Ruido, por actividades conjuntas. e) LOCATIVO: Trabajo en alturas, Caidas de distinto y mismo nivel. f) QUIMICO: Proyección de particulas	a)Cortes, atrapamientos Golpes, Machucones Caidas de Distinto y mismo nivel. b) : Dolor lumbar, dolor en articulaciones c) Gripe, alergias, irritaciones en ojos, d) Cefalea, hipoacusia. e) Cortes, Atrapamientos, golpes, machucones, Fracturas f) Gripa, Asfixia.	Mantener el equipo y personal necesario para realizar la actividad. -utilizar los elementos de protección personal adecuados a la labor (Guantes, Gafas de seguridad, casco con su respectivo barbuquejo y botas de seguridd, EPCC) -Realizar la actividad con precaución. - mantener una buena higiene postural - Mantener la atención necesaria para evitar las distracciones que puedan provocar un accidente -Transitar por áreas seguras, caminar y no correr, estar atentos a trabajos de terceros	Residente, inspector S.S.T, Personal Operativo
	ARMADO DE ANDAMIO TUBULAR	1. BIOMECANICO: Por la exposicion a posturas forzadas, sobreesfuerzo. 2.CONDICIONES DE SEGURIDAD , LOCATIVO,	1. Dolor lumbar, lesiones musculoesqueletico. 2. caida de herramientas, caida de diferente nivel. 3. Machucones, golpes, fracturas, herida	1. realizar el levantamiento de herramientas y equipos con buena higiene postural procedimiento de la actividad arme de andamio, inspeccion de andamio que cuente con todas piezas del mismo (plataformas metalicas, conectores, tornillos niveladores, escalera, rodapies travesaños. señalizacion de andamio, el Andamio debe contar con la certificacion, inspeccion por la persona competente y ficha tecnica. 3. Autocuidado, inspeccion de herramientas a utilizar llaves, destornillador, diligenciamaineto de Ats, trabajo en equipo, coordinacion de actividad en el armado del andamio, concenraccion en la actividad no distraerse.	Reseidente, inspector S.S.T, personal Operativo
3	TOMA DE MEDIDAS A LAS LAMINAS DEL PVC Y DRYWALL, CORTE CON PULIDORA	a) MECÁNICO: Manejo de herramientas. - Caidas a nivel y a diferente nivel, caidas de objetos. b)BIOMECANICO : Movimientos repetitivos, posturas prolongadas c) FÍSICO: Ruido, por actividades conjuntas.	a)Cortes, atrapamientos Golpes, Machucones Caidas de Distinto y mismo nivel. b) : Dolor lumbar, dolor en articulaciones c) Cefalea, hipoacusia.	*utilizar los elementos de protección personal adecuados para realizar la labor (J6Guantes, Gafas , casco y botas) *Realizar inspección a las herramientas de trabajo antes durante y después de realizar la actividad. H6 *Realizar Pausas Saludables. (Hidratación) *mantener una buena higiene postural.	Residente, Inspector S.S.T, Personal Operativo

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: AGOSTO 2024

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Milena Rojas	1118846983	PROFESIONAL SST	Milena	Milena	Milena	Milena	Milena	Milena	/
NOMBRE INSPECTOR 2	**CEDULA**	**CARGO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

APROBACIÓN DEL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Danilo Beltran	1018493230	SST	Danilo	Danilo	Danilo	Danilo	Danilo	Danilo	/
Jerson Cortes	1069900782	contratista							
Maikol	1023922390	AX	Maikol	Maikol Silva					

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO	FT-SST-[illegible]
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Agosto 2024

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones Subestación Fabricato Envigado

Frente de Obra: Responsable ejecutor Actividad:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Orden de trabajo

Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo Nº:
*Para realizar el análisis diligenciar el punto A.

Empresa Ejecutora: Consorcio Infraestructura A&V

Fecha de elaboración: Día 28 Mes 2 Año 25

Fecha de ejecución: Desde Día 3 Mes 2 Año 25 Hasta: Día 5 Mes 2 Año 25

Arnulfo Rojas, Cristian Cano, Pablo Correa, Cristian Castrillon

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS	QUIMICOS	ERGONOMICOS	SEGURIDAD - MECANICOS	SEGURIDAD - LOCATIVOS	CONTROL DE LOS RIESGOS HSE
Ruido X	Particulas naturales	Postura prolongada	Atrapamientos	Trabajo en alturas	Rotulado de envases y hojas de seguridad
Iluminación excesiva	Particulas inorganicas	Postura forzada	Proyección de particulas X	Espacios confinados	Autoreporte de condiciones de salud X
Iluminación deficiente	Vapores y humos combustibles	Postura antig ovitacional	Manejo de elementos cortantes punzantes o contundentes	Superficie de trabajo irregular o desniveles	Sistema de contención de derrames o fugas
Vibración cuerpo entero	Humos metálicos	Esfuerzo	SEGURIDAD - ELECTRICOS	Superficies de trabajo con distintos niveles	Instalar barreras / señalización / Demarcación / Protección
Vibración segmentaria	Humos no metálicos	Espacio limitado	Alta o Media Tensión	Caida de objetos	Aterrizar el equipo
Altas temperaturas	Liquidos combustibles	Movimiento repetitivo X	Baja tensión	Condiciones de orden y aseo X	Revisión de equipos y herramientas
Bajas temperaturas	Liquidos inorganicos	Manipulación de cargas	Enchufes, tomas, cableado	Demolición	Protección de sumideros
Radiación por soldadura	Liquidos organicos	Alto desgaste físico	Estática	Trabajos simultaneos	Monitoreo de la atmósfera
Radiación por rayos ultravioleta (uv)	Solido s organicos/inorganico s	Otro ?	Equipos energizados	Instalaciones inadecuadas	Drenar/Ventilar

AMBIENTE DE TRABAJO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICOS	ASPECTOS AMBIENTALES		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE
Explosiones	Atención y concentración elevada	Bacterias, ricketsias	Captación o desague de agua	Corte de árboles o vegetación	Clasificación y disposición de residuos X
Fugas/Derrames	Alta responsabilidad	Parasitos, hongos X	Uso de recursos naturales canteras,	Derrames potenciales	Requiere vigía/inspecto r/Supervisor
Incendio	Jornadas extensas/Turnos	Virus, fluidos X	Emisiones	Afectación de sumidero s	Equipo contraincendio
Manejo de vehiculos	Relaciones interpersonales	P icaduras, mo rdeduras	Generación de residuos (sólidos, liquidos,	Transporte de sustancias quimicas o combustibles	Limpieza y humectación
					Sistema de aislamiento seguro

PELIGROS	EFECTOS	CONSECUENCIA (Pesos COP)	REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES	PARTES INTERESADAS AFECTADAS	PROBABILIDAD			
Fatalidad	Contaminación mayor alta	Catastróficas > $100 COP	Multas o sanciones de autoridades	Internacional	4	4	4	4
Accidente/Lesión Grave	Contaminación mayor	Graves $20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	3	3	3	3
Accidente/Lesión importante	Contaminación moderada	Severa $9 A 19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad notificada recibidas negativamente	Regional	2	2	2	2
Accidente/Lesión menor	Efecto menor	Importante $1 A 4.9 COP	contratista/ Ins conformidad	Local: Opant y trabajores	1	1	1	1
Accidente/Lesión leve	Efecto leve	Marginal < $1 COP	Sin efectos	Interna Exclusiva	0	0	0	0
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguna	Sin efectos	Ningún impacto	0	0	0	0

RIESGO ALTO (R): Se deben tomar y mantener inmediatamente todas las medidas posibles para reducir el riesgo. El ATS requiere de personal diestro y experto para su seguimiento y valoración

RIESGO BAJO (R): Se deben asegurar las medidas a partir de lo que ya los procedimientos, tareas de disparos, responsabilidades, protocolos, etc.

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado	X	Gafas especiales	
Respirador vapores orgánicos		Careta	
Respirador para humos		Manta dieléctrica	
Equipo de protección contra caída		Casco dieléctrico	X
Botas dieléctricas	X	Equipo de auto contenido	
¿Otros? ¿Cuáles?			

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cel)	LIDER EJECUTOR (Firma y cel)	OBSERVACIONES
31/03/25	730AM	500PM	Hilarosque 1112816983		1121426425
1/04/25	730AM	500PM	Hilarosque 1112816983		1121426425
2/04/25	730AM	500PM	Hilarosque 1112816983		1121426425
3/04/25	730AM	500PM	Hilarosque 1112816983		1121426425
4/04/25	730AM	500PM	Hilarosque 1112816983		1121426425
5/04/25	730AM	500PM	Hilarosque 1112816983		1121426425
	/		/	/	

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	BISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: Agosto -2024

PARTE C. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Pasos ordenado del trabajo		Peligro/Aspecto		Consecuencias		Acciones de Control (preventivas, protectivas, reactivas)		Responsable
1.	ALISTAMIENTO DE HERAMIENTA MANUAL	1.1	Riesgo biomecánico	1.1	1. Malas posturas, dolor lumbal, posturas permanentes.	1.1	1 pausas activas, precaucion.	inspector S.S.T. Trabajadores ingeniero residente
2	TRANSVASE DE SUSTANCIAS VARSOL, DESENGRASANTE RECIPIENTE (CANECA)	2.2	1. Riesgo quimico (liquidos) 2 3. BIOMECANICO (MOVIMIENTOS REPETITIVOS)	2.2	1.QUIMICO:Cefalea, rinitis, irritación en las vias respiratorias, alergias dermatológicas. 2.BIOMECANICO;posturas prolongadas.	2.2	1. Se utiliza los EPP y dotacion:(gafas de seguridad, guantes de caucho y proteccion respiratoria overol (camisa y pantalón), botas de seguridad o de caucho) Se realiza rotulación del recipiente, socialización de las fichas de seguridad de los productos quimicos. 2. BIOMECANICO;posturas prolongadas.	inspector S.S.T. Trabajdores ingeniero residente
3	DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3.3	1.CONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVO:	3.3	1. caidas del mismo nivel,golpes, contunciones	3.3	1. Realizar el desplazamiento por zonas y/o áreas seguras y adecuadas .	inspector S.S.S Trabajdores ingeniero residente
4	INICIO DE ACTIVIDAD LIMPIEZA EN PISOS PAREDES, CIELO RASO, BARRER, TRAPIAR Y DEJAR LIMPIAS AREAS.	4.4	1.BIOLOGICO 2. BIOMECANICO (MOVIMIENTOS REPETITIVOS), 3.CONDICIONES DE SEGURIDAD , LOCATIVO, 4.QUIMICO	4.4	1.BIOLOGICO:Picaduras de insectos, hongos 2. BIOMECANICO:dolor lumbar, dolor muscular. 3.CONDICIONES DE SEGURIDAD . LOCATIVO: caida al mismo nivel, resbalpones, golpes, contusiones. 4.QUIMICO:Cefalea, rinitis, irritación en las vistas, alergias dermatológicas	4.4	1.BIOLOGICO: uso de camisa mangalarga, calzado de seguridad. 2. BIOMECANICO: realizar el levantamiento de herramientas y equipos con buena higiene postural. 3.LOCATIVO: precaucion, autocuidado. 4.QUIMICO Uso obligatorio de EPP (Guates de caucho gafas de seguridad, casco,(completos (overol (camisa y pantalón), botas de seguridad de caucho. Charla diaria. Acompañamiento SST.	inspector S.S.T. Trabajadores ingeniero residente

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: AGOSTO 2024

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Leidy Milena Ocoyo	1121884485	PROFESIONAL SST							
NOMBRE INSPECTOR 2	**CEDULA**	**CARGO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

APROBACIÓN DEL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Lina yurany G.L.	1058325236	Asco							

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO	FT-SST-091
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Agosto -2024

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento y señalización vía Variante Palmira-Candelaria

Frente de Obra:

Responsable ejecutor Actividad:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

Aplicación de otro y pintura

Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo Nº :
*Para realizar el análisis diligenciar el punto A

Empresa Ejecutora : Consorcio Infraestructura A&V

Fecha de elaboración: Día 24 Mes Año

Fecha de ejecución: Desde: Día 31 Mes 03 Año 25 Hasta: Día 05 Mes 04 Año 25

Brocha, Comeca, Escarpla, lija

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS		QUIMICOS		ERGONOMICOS		SEGURIDAD - MECANICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido		Particulas naturales		Postura prolongada		Atrapamientos		Trabajo en alturas		Rotulado de envases y hojas de seguridad	X
Iluminación excesiva		Particulas inorganicas		Postura forzada		Proyección de particulas	X	Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	X
Iluminación deficiente		Vapores y humos combustibles		Postura antigravitacional		Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes		Superficie de trabajo irregular o deslizantes		Sistema de contención de derrames o fugas	
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo	X	SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superficies de trabajos con distintos niveles		Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección	
Vibración segmentada		Humos no metálicos		Espacio limitado		Alta o Media Tensión		Caida de objetos		Asentar el equipo	X
Altas temperaturas		Liquidos combustibles		Movimiento repetitivo	X	Baja tensión		Condiciones de orden y aseo		Revisión de equipos y herramientas	
Bajas temperaturas		Liquidos inorganicos		Manipulación de cargas	X	Enchufes, tomas, cableado		Demolición		Protección de sumideros	
Radiación por soldadura		Liquidos organicos		Alto desgaste físico		Estática		Trabajos simultaneos		Monitoreo de la atmósfera	
Radiación por rayos ultravioleta (uv)		Solido s organicos/inorganico s		Otro ?		Equipos energizados		Instalaciones inadecuadas		Drenar/Ventilar	
AMBIENTE DE TRABAJO		**PSICOSOCIA L**		**BIOLOGICOS**		**ASPECTOS AMBIENTALES**				Clasificación y disposición de residuos	X
Explosiones		Atención y concentración elevada		Bacterias, ricketsias		Captación o desague de agua		Corte de árboles o vegetació n		Requiere vigia/inspecio n/Supervisi r	X
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos		Uso de recursos naturales (canteras,		Derrames potenciales		Equipo contraincendio	
Incendio		Jornadas extensas/Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	
Manejo de vehiculos		Relaciones interpersonales		P icaduras, mo rdeduras		Generación de residuos (sólidos, liquidos,		Transporte de sustancias quimicas o combustibles	X	Sistema de aislamiento seguro	

Fatalidad	Contaminación irreparable	Catastrofico > $100 COP	Multas y sanciones de autoridades	Internacional	M	A	E	E	
Accidente/Lesion Grave	Contaminación severa	Grave $20 a 99 COP	Sanciones contractuales	Nacional	M	M	A	E	
Accidente/Lesion moderada	Contaminacion localizada	Severo $ 9 A 19 COP	Quejas, reclamos, no conformidad notificada	Regional	B	M	M	A	
Accidente/Lesion menor	Efecto menor	Importante $ 1 A 4.9 COP	Incumplimiento contractual sin notificación	Local, Open y Tenaderos	B	B	M	M	
Accidente/Lesion leve	Efecto leve	Marginal < $ 1 COP	Sin efectos	Interno Comercio	B	B	B	B	
Ninguna lesión	Ningun Efecto	Ninguno	Sin efectos	Ningun impacto	B	B	B	B	

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado	X	Gafas especiales	X
Respirador vapores orgánicos		Careta	
Respirador para humos		Manta dieléctrica	
Equipo de protección contra caida		Casco dieléctrico	X
Botas dieléctricas	X	Equipo de auto contenido	

¿Otros? ¿Cuales? Guantes

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (Firma y cc)	OBSERVACIONES
31/03/25	730AM	500PM	Yuleidy Arteaga 1118269883		1121926925
1/04/25	730AM	500PM	Yuleidy Arteaga 1118269883		1121926925
2/04/25	730AM	500PM	Yuleidy Arteaga 1118269883		1121926925
3/04/25	730AM	500PM	Yuleidy Arteaga 1118269883		1121926925

Powered by CamScanner

PARTE C. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Pasos recavado del trabajo					Responsable
1	INSPECCIONAR EL ÁREA, ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL A UTILIZAR (EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, ESCALERA TIPO TIJERA, DRYWALL Y PVC)	Locativos: Iccondiciones de la superficie, superficies irsas,actividades adyacentes en el area, obstaculos en el area a intervenir.	Caidas a nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades .	1. Inspeccionar previamente el area reconociendo la zona e identificando obstaculos removibles y no removibles, huecos que pudieran causar -Identificar el estado caidas y cualquier tipo de lesion. - Implementar la del terreno antes de ingresar señalizacion preventiva y/o informativa. (conos, cinta de peligro, entre otros) identificar la ubicación exacta en donde se realizara la instalación de la señalizacion -Uso adecuado de los elementos de proteccion personal. Disponer los residuos en un lugar adecuado y demarcado, mantener el orden y aseo para evitar cualquier tipo de incidentes o accidentes de trabajo a causa de los residuos generados por la labor.	Residente, Inspector S.S.T, Personal Operativo
2.	TRASLADO DE PINTURA Y ESTUCO PARA TODOS LOS PISOS, ASCENSO A LA TORRE POR ESCALERA ESTRUCTURAL	a) MECÁNICO: Manejo de herramientas; trabajos a distinto nivel - Caidos a diferente nivel, caidos de objetos. b)BIOMECANICO : Movimientos repetitivos, posturas prolongadas c)BIOLOGICO : Contacto con aguas estancadas (lluvias) d) FÍSICO: Ruido, por actividades conjuntas. e) LOCATIVO: Trabajo en alturas, Caidas de distinto y mismo nivel. f) QUIMICO: Preyección de particulas	a)Cortes, atrapamientos Golpes, Machucones Caidas de Distinto y mismo nivel b) : Dolor lumbar, dolor en articulaciones c) Gripa, alergias, irritaciones en ojos, d) Cefalea, hipoacusia. e) Cortes, Atrapamientos, golpes, machucones, Fracturas f) Gripa, Asfixia.	Mantener el equipo y personal necesario para realizar la actividad. -utilizar los elementos de protección personal adecuados a la labor (Guantes, Gafas de seguridad, casco con su respectivo barbuquejo y botas de seguridd, EPCC) . Realizar la actividad con precaución. - mantener una buena higiene postural Mantener la atención necesaria para evitar las distracciones que puedan provocar un accidente -Transitar por áreas seguras, caminar y no correr, estar atentos a trabajos de terceros.	Residente, Inspector S.S.T, Personal Operativo
	ACCESO A ESCALERA ESTRUCTURAL CON MATERIALES Y HERRAMIENTAS	1. condiciones de seguridad: locativo: superficies, irregulares deslizantes, caidas al mismo nivel. . 2. Biomecanico:por la exposición a sobre esfuerzos, manejo de cargas	1. caida de objetos en extremidades superiores, tropezones, caidas, contusiones, golpes, luxaciones 2. esguinces, fracturas, problemas osteomusculares, fatiga, cansancio	1, utilizar elementos de protección personal, guantes, botas, transitar. 2.manipulación manual de cargas, socialfixación riesgo biomecanico, con cuidado por superficies irregulares. pesar carga manual de 25 kg	Residente, inspector S.S.T Personal operativo
	ARMADO DE ANDAMIO TUBULAR	1. BIOMECANICO: Por la exposicion a posturas forzadas, sobresfuerzo. 2.CONDICIONES DE SEGURIDAD , LOCATIVO,	1. Dolor lumbar, lesiones musculoesqueletico. 2. caida de herramientas, caida al mismo nivel 3. Machucones, golpes, fracturas, herida	1. realizar el levantamiento de herramientas y equipos con buena higiene postural . procedimiento de la actividad armo de andamio, inspeccion de andamio que cuente con todas piezas del mismo (plataformas metalicas, conectores, tornillos nivelatores, escalera, rodapies travesaños, señalizacion de andamio, el Andamio debe contar con la certificacion, inspeccion por la persona competente y ficha tecnica. 3. Autocuidado, inspeccion de herramientas a utilizar llaves, destornillador, llana metalica, diligenciamiento de Ats, trabajo en equipo, coordinacion de actividad en el armado del andamio, concentraccion en la actividad no distraerse	Residente, inspector S.S.T Personal operativo
3	APLICACIÓN DE SEMEFA (ESTUCO Y PINTURA) RN PAREDES	1 Biomecanico: exposición a posturas prolongadas. Repetitivos mantenida o forzada, sobre esfuerzo, movimientos 2.Caidas a distinto nivel. 3. condiciones de seguridad: mecanico: manipulación de herramientas corlopunzanzantes . 4.Quimico: por contacto o por inhalación ,exposición a material particulado. 5.psicosocial: contenido de la tarea , carga mental , estrés ,habilidades , interacción con compañero de trabajo.	1. biomecanico: por la exposicion a posturas forzada, sobresfuerzo 2. esguinces luxacion, golpes, fracturas 3. golpes heridascon objetoso herramientas cortopuzantes (llana metalica) 6. cefalea, estres, ansiedad reacciones alergicas 5.Quimico: Irritación, afecciones pulmonares, metalica)	1. inspeccion de sistemas de acceso escaleras, andamios tubulares y certificados que esten en buen estado, autocuidado 2. utilizar epp herramientas en buen estado aplicación de normas de seguridad 3. uso de proteccion respiratoria, guantes de caucho. 4. manejo del tiempo planeacion, comunicacion asertiva con compañeros de trabajo concentracion	Residente, Inspector S.S.T, Personal Operativo
6	ORDEN Y ASEO DEL ÁREA DE TRABAJO	Locativos: objetos y material, presentes en el lugar de trabajo	Caidas, golpes, lesiones graves en cualquier parte del cuerpo.	*Uso adecuado de los elementos de protección personal Manejo de cargas *Evitar la acumulacion de escombros para evitar cualquier tipo de incidente o accidente en las zonas de trabajo	Residente, Encargado, Inspector S.S.T, Personal Operativo

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: AGOSTO 2024

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Leidy Milena Vega	1118546983	PROFESIONAL SST	Milena Vega	Milena Vega	Milena Vega	Milena Vega	Milena Vega	—	—
NOMBRE INSPECTOR 2	**CEDULA**	**CARGO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

APROBACIÓN DEL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jose Pablo	79604270	AY							
	0113674557	1&T.							
Jose Quicena	86075040	AY			Jose	Jose	Jose	—	

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO	
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Agosto 2024

GENERALIDADES ATS

Frente de Obra: Relocalización postes y Fabricación estructura

Responsable ejecutor Actividad:

Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°

Para realizar el análisis diligenciar el punto A

Empresa Ejecutora: Consorcio Infraestructura A&V

Fecha de elaboración: Día 27 Mes 5 Año 25

Fecha de vigencia: Desde Día 27 Mes 5 Año 25 Hasta: Día 31 Mes 08 Año 25

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FÍSICOS		QUÍMICOS		ERGONÓMICOS		SEGURIDAD - MECÁNICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido		Partículas naturales		Postura prolongada		Atrapamientos		Trabajo en alturas		Entrega de epp's y hojas de seguridad	
Iluminación excesiva		Partículas inorgánicas		Postura forzada		Proyección de partículas	X	Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	
Iluminación deficiente		Líquidos y humos combustibles		Posturas antigravitacionales		Golpes de elementos cortantes contundentes o punzantes	X	Superficie de trabajo irregular o deslizantes	X	Sistema de contención de derrames o fugas	
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo	X	SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superficie de trabajo con distinto niveles		Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección	
Vibración segmentaria		Humos no metálicos		Espacio limitado		Alta o Media Tensión		Caída de objetos	X	Aislar el equipo	X
Altas temperaturas		Líquidos combustibles		Movimiento repetitivo	X	Baja tensión		Condiciones de orden y aseo	X	Revisión de equipos y herramientas	X
Bajas temperaturas		Líquidos inorgánicos		Manipulación de cargas	X	Enchufes, bornes, cableado		Demolición	X	Protección de sumideros	
Radiación por soldadura		Líquidos orgánicos		Alto desgaste físico		Estática		Trabajos simultáneos		Monitoreo de la atmósfera	
Radiación por rayos ultravioleta (uv)		Ácidos o organicos inorganicos o		Otro ?		Equipos energizados		Herramientas inadecuadas		Orden/Ventilar	
AMBIENTE DE TRABAJO		PSICOLOGICOS		BIOLOGICOS		ASPECTOS AMBIENTALES				Clasificación y disposición de residuos	
Expresiones		Atención y concentración mínima		Bacterias, rickettsias		Captación o desagüe de agua		Costo de acción o reparación		Requiere reentrenamiento/Supervisor	X
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos	X	Uso de recursos naturales (tierras)		Derrames potenciales		Equipo contaminando	
Incendio		Jornadas extensas/ Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	
Manejo de vehículos		Relaciones interpersonales		P. cadáveres, ma rdaderos		Generación de residuos (sólidos, líquidos,		Transporte de sustancias químicas o combustibles		Sistema de aislamiento/ seguro	

PELIGRO	AMBIENTAL	EVALUACIÓN CUANTITATIVA	ASPECTO AMBIENTAL	VALORACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	VALORACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	
Trabajos	Generación de residuos	Deportivo 1 PVE COP	Bultos y cemento de cemento	Insignificante	5	5			5	
Accidente de trabajo	Generación de ruido	Bono $20 + $8 COP	Sistema semiabierto	Moderado	5	5	5	5	5	
Accidente de trabajo	Generación de residuos	Bono $ 3 A 10 COP	Desde semana de construcción colocado	Regular	5	5	5	5	5	
Accidente de trabajo	Ruido moral	Incentivo $ 1 A $ 5 COP	Trabajo fuera de construcción	Local, Zonal y Nacional	5	5	5	5	5	
Accidente de trabajo	Ruido moral	Integral + $ 1 COP	Sin efectos	Alerta Corporativa	5	5	5	5	5	
Ningún riesgo	Ningún Ruido	Ninguno	Sin efectos	Ningún impacto	5	5	5	5	5	

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, DOTA S, GAFA S, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado	X	Gafas especiales	X
Respirador vapores orgánicos		Careta	
Respirador para humos		Manta dieléctrica	
Equipo de protección contra caída		Casco dieléctrico	X
Botas dieléctricas	X	Equipo de alta contención	

¿Otros? ¿Cuáles? Guantes reparados

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	HORA: DESDE - HASTA (HORA)	REPRESENTANTE HSE (Firma y cel)	LÍDER EJECUTOR (Firma y cel)	OBSERVACIONES
31/05/25	730AM 500PM	[illegible]	[illegible]	1149269251

Powered by CamScanner

PARTE C. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Pasos ordenado del trabajo		Peligro/Aspecto		Consecuencias		Acciones de Control (preventivas, protectivas, reactivas)		Responsable
1	INSPECCIONAR Y SEÑALIZAR EL ÁREA DE TRABAJO	1.1	Locativos: condiciones de la superficie, superficies lisas,actividades adyacentes en el area, obstaculos en el area a intervenir.	1.1.1.	Caidas al mismo nivel, contusiones, golpes, fracturas en extremidades .	1.1.1.1	I- inspeccionar previamente el area reconociendo la zona e identificando obstaculos removibles y no removibles, huecos que pudieran causar caidas y cualquier tipo de lesion. -Identificar el estado del terreno antes de ingresar. - Implementar la señalizacion preventiva y/o informativa, (conos, cinta de peligro, polisombra) identificar la ubicación exacta en donde se realizara la instalación de la señalizacion -Uso adecuado de los elementos de protección personal. -Disponer los residuos en un lugar adecuado y demarcado, mantener el orden y aseo para evitar cualquier tipo de incidentes o accidentes de trabajo a causa de los residuos generados por la labor.	Inspector S.S.T. Trabajadores, ing residente
2.	ALISTAMIENTO DEL EQUIPO (ESCALERA)	2.2	a) MECÁNICO: Manejo de herramientas; trabajos al mismo nivel, caídos de objetos. b)BIOMECANICO : Movimientos repetitivos, posturas prolongadas c) FÍSICO: Ruido, por actividades conjuntas. D) LOCATIVO: Caídas al mismo nivel.	2.2.2	a)Cortes Golpes, Machucones Caídas de Distinto y mismo nivel. b) : Dolor lumbar, dolor en articulaciones c) Cefalea, hipoacusia, dolor de cabeza e) Cortes, Atrapamientos, golpes, machucones, Fracturas	2.2.2.2	Mantener el equipo y personal necesario para realizar la actividad. -utilizar los elementos de protección personal adecuados a la labor (Guantes de vaqueta Gafas de seguridad, casco de seguridad y botas de seguridad) -Realizar la actividad con precaución, - mantener una buena higiene postural, pausas activas - Mantener la atención necesaria para evitar las distracciones que puedan provocar un accidente -Transitar por áreas seguras, caminar y no correr, estar atentos a trabajos de terceros	
3	ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL A UTILIZAR EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR, PUNTERO, MACETA, ALICATES, ESCALERA TIPO TIJERA) TALADRO	3.3	a) MECÁNICO: Manejo de herramientas. - Caídas a nivel y a caídas de objetos. b)BIOMECANICO : Movimientos repetitivos, posturas prolongadas c) FÍSICO: Ruido, por actividades conjuntas. d) LOCATIVO: Caídas de distinto y mismo nivel.	3.3.3	a)Cortes, atrapamientos Golpes, Machucones Caídas al mismo nivel. b) : Dolor lumbar, dolor en articulaciones c) Cefalea, hipoacusia. d Cortes, Atrapamientos, golpes, machucones, Fracturas	3.3.3.3	*utilizar los elementos de protección personal adecuados para realizar la labor (guantes de vaqueta, Gafas , casco de seguridad, botas de seguridad punta de acero) utilizar las herramientas adecuadas para la actividadd puntero con proteccion y en buen estado. inspeccion de escalera tipo tijera en buen estado, y señalizada. *Realizar inspección a las herramientas de trabajo antes durante y después de realizar la actividad *Realizar Pausas activas, descansos, hidrataccion de personal. *mantener una buena higiene postural, utilizar tapaoidos de insercion para minimizar el ruido.	Inspector S.S.T. Trabajadores, ing residente
4	DESMONTE DE CIELO RASO, SANITARIOS, LAVAMANOS, PUERTAS, ENCHAPE, LUMINARIAS CON ESCALERA TIPO TIJERA	4. 4	a)BIOMECANICO : Movimientos repetitivos, posturas prolongadas b) MECÁNICO: Manejo de herramientaS manuales y electricas C) RIESGO LOCATIVO: Condiciones de orden ,señalizacio n y delimitacion. D) RIESGO ELECTRICO	4. 4	a) : Dolor lumbar, dolor en articulaciones, lesiones muscoloesqueleticas. b) Cefalea, hipoacusia. C) caidas al mismo nivel resbalones, tropezones. D) electrocucion, incendio, descarga electrica	4. 4	*Uso adecuado de los EPP adecuados a la actividad (botas de seguridad, casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes de vaqueta) * Realizar pausas activas hidratacion de personal *Transitar por áreas seguras, caminar y no correr, dejar libre de osbtaculos las areas de transitar, Señlizar y delimitar las areas de trabajo (prohibido el paso, uso de epp, se delimita con conos y polisombra. uso de epp (guantes de nitrilo, gafas de seguridad, autouidado. Preopersacional de equipos, equipo en buen estado precaucion, uso de epp, inspeccion del area de trabajo, autocuidado.	Inspector S.S.T. Trabajadores, ing residente
5	ORDEN Y ASEO DEL ÁREA DE TRABAJO	5. 5	Locativos: objetos y material, presentes en el lugar de trabajo, caida al mismo nivel.	5. 5	Caídas, golpes, luxaciones, lesiones graves en cualquier parte del cuerpo, fatalidades.	5. 5	*Uso adecuado de los elementos de protección personal * Manejo de cargas *Evitar la acumulacion de escombros para evitar cualquier tipo de incidente o accidente en las zonas de trabajo, dejar area en orden y aseo.	Inspector S.S.T. Trabajadores.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: AGOSTO 2024

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Leidy Nilora Ayala	1118961885	PROFESIONAL SST	Leidy	—	—	—	—	—	—
NOMBRE INSPECTOR 2	**CEDULA**	**CARGO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

APROBACIÓN DEL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JOSE	96075040	AY	JOSE	/	/	/	/	/	

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO	
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Agosto 2024

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento de edificaciones — Empresa de Obra: Polaria de Ofertas Nacional Bancaria Tecnica

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Instalación Eléctrica — Nivel de Riesgo: — Permiso de Trabajo N°: — Para realizar se requiere diligenciar el Anexo A

Empresa Ejecutora: Consorcio Infraestructura A&V

Fecha de elaboración: 5-07-25 — Fecha de ejecución: 5-07-25 hasta: 5-07-25

Participantes: Electricista, Ayudante, Soldador, Oficial, Maestro, Auxiliar

PARTE A: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICO	QUIMICO	BIOLOGICO	SEGURIDAD - MECANICO	RESPUESTA A EMERGENCIAS	CONTROL DE LOS PELIGROS QUE
Ruido	Derivados naturales	Fluidos principales	Locativo	Trabajo en alturas	Entrega de EPP y Dotación
Iluminación deficiente	Derivados inorgánicos	Fluidos fecales	Proyección de partículas	Espacios confinados	Capacitación
Iluminación deficiente	Líquidos y fluidos combustibles	Fluidos organismos	Golpes de elementos cortantes y punzantes	Caída de objetos	Sistema de protección de personas y bienes
Ubicación cuerpos de agua	Humos metálicos	Exámenes	SEGURIDAD - ELECTRICOS	Atrapamiento con partes móviles	Señales de Seguridad
Ubicación inapropiada	Humos no metálicos	Espacio limitado	Alto o Medio Tensión	Caída de objetos	Mantenimiento
Altas temperaturas	Líquidos combustibles	Movimiento repetitivo	Altas tensión	Condiciones de orden y aseo	Revisión de equipos y herramientas
Bajas temperaturas	Líquidos inorgánicos	Manipulación de cargas	Enchufes, bornes, bobinado	Demolición	Protección de humedad
Radiación por soldadura	Líquidos orgánicos	Alto desgaste físico	Estático	Trabajo simultaneo	Monitoreo de la atmosfera
Radiación por fibra óptica	Sólido o líquido inorgánico o	Otro ?	Equipos energizados	Instalaciones inadecuadas	Orden y limpieza

MEDIO DE TRABAJO	PSICOSOCIAL	BIOLOGICO	ASPECTOS AMBIENTALES		
Explosivos	Estrés y condiciones psicosociales	Bacterias, infecciones	Captación o desagüe de agua	Costo de árboles o vegetación a	Residuos (mantenimiento eléctrico)
Fuegos/Derrames	Alta responsabilidad	Parasitos, hongos	Uso de recursos naturales (energía)	Derrames potenciales	Equipo contaminado
Incendio	Acoso laboral, violencia, Turnos	Virus, Rickia	Emisiones	Afectación de humedad a	Limpieza y humectación
Manejo de vehículos	Relaciones interpersonales	Picaduras, mordeduras	Generación de residuos (sólidos, líquidos)	Transporte de materiales químicos o combustibles	Sistema de tratamiento seguro

Peatonal	Contratación indirecta	Cotidianas 1 $100.000	Medios y servicios de subsistencia	Permanente	1	1	1	1
Accidentes por choque	Otros $20.000	Otros $20.000	Relaciones comerciales	Normal	1	1	1	1
Accidentes por impactos	Contratación indirecta	Salarios $1.5 M $20	Cuidado, tratamiento, los medicamentos subsidiados	Regional	1	1	1	1
Accidentes de tránsito	Otros menor	Importantes $1 $ 4.5 $20	Hospitales, Clínicas, los medicamentos subsidiados	Local, Urbano y Nacional	1	1	1	1
Accidentes de trabajo	Otros alto	Mayores a $1 $20	Sin afectos	Interno, CONSORCIO	1	1	1	1
Ninguno	Ninguno	Ninguno	Sin afectos	Ninguno impacto	1	1	1	1

ADICIONAL A LOS EPP BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL

Respirador material particulado		Gafas especiales	X
Respirador vapores orgánicos		Careta	
Respirador para humos		Manta ignifugada	
Equipo de protección contra caída		Casco dieléctrico	X
Botas dieléctricas	X	Cinturón de nylon contención	

¿Cómo? ¿Cuándo?: Guantes y gafas

PARTE B: VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	HORAS DESDE - HASTA (HORA)	REPRESENTANTE SST (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (Firma)	OBSERVACIONES
3/04/25	7:30 AM - 5:00 PM	Milenka Jaque 1118483183		1111416425
4/04/25	7:30 AM - 5:00 PM	Milenka Jaque 1118483183		1121426425
5/04/25	7:30 AM - 5:00 PM	Milenka Jaque 1118483183		1121426425

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: AGOSTO 2024

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Leidy Milena Rojas	1148458985	PROFESIONAL SST	Milena Rojas	Milena Rojas	—	Milena Rojas	—	Milena Rojas	—
NOMBRE INSPECTOR 2	**CEDULA**	**CARGO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

APROBACIÓN DEL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Nicolas Hernandez Cotrina	1122021 17327	OPERARIO	[illegible]	[illegible]		[illegible]	-	[illegible]	

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 021
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: Agosto -2024

PARTE C. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Pasos ordenado del trabajo		Peligro/Aspecto		Consecuencias		Acciones de Control (preventivas, protectivas, reactivas)		Responsable
1	ALISTAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.1	1. RIESGO BIOMECANICO (posturas inadecuadas) 2.RIESGO LOCATIVO (superficie de trabajo irregulares deslizantes)	1.1	1 Lesiones musculo - esqueletico, espasmos, Malas posturas. 2.Caidas al mismo nivel.	1.1	1.Autocuidado, charla preoperacional posturas adecuadas, calentarte, Rotación de actividades, pausas activas, 2. Autocuidado, uso de epp (botas de seguridad),Charlas de seguridad. Diligenciamiento de permisos.	Inspector S.S.T. Trabajadores.
2	TRANSLADO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL AL LUGAR DE TRABAJO	2.2	1. RIESGO BIOMECANICO posturas inadecuadas, levantamiento de cargs 2. RIESGO LOCATIVO: especies obstruidos,superficies en mal estado	2.2	1. Problemas osteomusculares, lumbagias, levantamiento de cargas, dolor lumbal. 2. caidas a mismo nivel, esguinces, fracturas.	2.2	1. uso de ayudas mecanicas como carretilla , adoptar buenas posturas (higiene postural) , control de levantamiento de cargas (25kg) , socializacion de estandares de higiene postural 2. inspeccion de areas ,uso de senderos peatonales	
3	CARGUE Y DESCARGUE DE CEMENTO, HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS	3.3	1. RIESGO BIOMECANICO: posturas inadecuadas, levantamiento de carga 2.RIESGO FISICO: exposicion a rayos UV (luz solar), vibraciones 3.RIESGO QUIMICO: inhalacion de sustancia química y material particulado 4. RIESGO LOCATIVO: supérficies inestables 5.RIESGOS NATURALES : lluvias fuertes , vientos , tempesta.	3.3	1. caidas a mismo nivel, esguinces, fracturas. 2. Insolacion , golpe de calor, deshidratacion 3. enfermedades respiratorios , afectacion pulmonar. 4. enfermedades respiratorios , efectacion pulmonar. 5. Inundacion , vendavales.	3.3	1. uso de ayudas mecanicas como carretilla , adoptar buenas posturas (higiene postural) , control de levantamiento de cargas (25kg) , socializacion de estandares de higiene postural. 2. puntos de hidratacion, descansos periodicos. 3. reporte oportuno de posible sintomatologia con el fin de ser atendido por especialista del area de la salud, uso de mascarillas para polvo. 4. uso adecuado y respeto de senderos peatonales , autocuidado. 5. Suspender actividades en caso de lluvia, tormentas y lluvias.	
4	MEZCLAR (CEMENTO) PARA EL PEGUE DE LA FACHALETA	4.4	1. RIESGO QUIMICO (exposicion a sustancia química cemento) 2. RIESGO BIOMECANICO (posturas inadecuadas)	4.4	1. Irritación en la piel, enfermedades respiratorias, irritación en los ojos. 2. Lesiones musculo - esqueletico, espasmos, lmbalgias, Malas posturas, levantamiento de cargas, dolor lumbal, posturas forzadas o permanentes	4.4	1. Se utiliza los EPP y dotacion:(gafas de seguridad, guantes de caucho y proteccion respiratoria overol (camisa y pantalón) socialización de las fichas de seguridad del producto química cemento. 2. pauses activas, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, pausas activas, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad.	Inspector S.S.T Trabajadores.
5	CORTE DE FACHALETA CON PULIDORA, TALADRO	5.5	1.Riesgo mecánico (exposición a partes móviles de la herramienta) 2.Riesgo biomecánico (posturas inadecuadas) 3. Riesgo físico: ruido, exposicion a rayos UV (luz solar), vibraciones	5.5	1. cortes, heridas, amputaciones, atrapamiento por partes en movimiento externos, quemaduras por proyección de chispas. 2. Lesiones musculo-esquelético, espasmos, lumbalgias 3. Golpe de calor, insolacion, deshidratacion, quemaduras,estrés, dolor de cabeza, hipoacusia.	5.5	1. Autocuidado, inspección de herramienta (pulidora), diligenciamiento de permisos, ets. uso de epp adecuados (guantes de nitrilo, casco, gafas, tapabocas, tapa oidos de cope, cerete), uso correcto de la guarda de seguridad. 2 posturas adecuadas, calestenia, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad. 3. uso de tapaoidos,. hidratacción a personal, uso de proteccion solar.	
6	INSTALAR FACHACETA EN EL AREA	6.6	1. Riesgo biomecánico (Posturas mantenidas y prolongada), 2. Riesgo químico (exposición mezcla pegacor) 3. Riesgo mecánico (herramientas manuales)	6.6	1. Lesiones musculo-esquelético, espasmos, lumbalgias 2. Irritación en la piel, Irritación en los ojos 3. golpes, machucones, atrapamientos por o entre objetos.	6.6	1. Realizar posturas adecuadas para realizar la actividad, realizar pausas activas de 5 minutos, autocuidado 2. Uso de epp adecuados (guantes de nitrilo, casco, barbuquejo, gafas, tapabocas), autocuidado, socialización de hojas de seguridad de pegacor 3. manejo y movimiento adecuado de las herramientas manuales	Inspector S.S.T. Trabajadores. Encargado.
7	ORDEN Y ASEO	7.7	1.Riesgo químico (Inhalación particulas), 2.Riesgo biomecánico (malas posturas), 3. Riesgo locativo (irregularidades deslizantes y/o caida al mismo nivel)	7.7	1.Irritación en la piel, enfermedades respiratorias, Irritación en los ojos, Intoxicación 2. Lesiones musculo-esquelético, espasmos, lumbalgias 3 caidas, golpes, fracturas	7.7	1.Uso de epp adecuados (guantes de nitrilo, casco, barbuquejo, gafas, tapabocas), autocuidado, socialización de hojas de seguridad de pegacor 2. Realizar posturas adecuadas para realizar la actividad, realizar pausas activas de 5 minutos, autocuidado, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad. 3. Autocuidado, uso de epp (botas de seguridad, guantes, casco, gafas, tapabocas), inspección visual área	Inspector S.S.T. Trabajadores.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO	FT-SST-031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION	1
	FORMATO ATS	FECHA	Agosto /2024

GENERALIDADES ATS

OBJETO: Mantenimiento y adecuaciones de aires

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Instalación mantenimiento correctivo

Frente de Obra: Fachada Rio Claro

Responsable ejecutor Actividad: Fachada Rio Claro

Nivel de Riesgo: Permiso de trabajo N°:

*Para realizar el análisis diligenciar el punto A

Empresa Ejecutora: Consorcio Infraestructura A&V

Fecha de elaboración: Día 24 Mes 2 Año

Fecha de ejecución: Desde: Día 03 Mes 3 Año 25 Hasta: Día 04 Mes 3 Año 25

Herramientas: taladro, alicates, bisturí

PARTE A. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ASPECTOS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES

FISICOS		QUIMICOS		ERGONOMICOS		SEGURIDAD - MECANICOS		SEGURIDAD - LOCATIVOS		CONTROL DE LOS RIESGOS HSE	
Ruido	X	Partículas naturales		Postura prolongada		Atrapamientos	X	Trabajo en alturas		Rotulado de envases y hojas de seguridad	X
Iluminación excesiva		Partículas inorgánicas		Postura forzada	X	Proyección de partículas	X	Espacios confinados		Autoreporte de condiciones de salud	X
Iluminación deficiente		Vapores y humos combustibles		Postura antigravitacional		Manejo de elementos cortantes, punzantes o contundentes		Superficie de trabajo irregular o deslizantes	X	Sistema de contención de derrames & fugas	
Vibración cuerpo entero		Humos metálicos		Esfuerzo	X	SEGURIDAD - ELECTRICOS		Superficie de trabajo con distintos niveles		Instalar barreras / señalización/ Demarcación / Protección	
Vibración segmentaria		Humos no metálicos		Espacio limitado		Alta o Media Tensión	X	Caída de objetos		Atemizar el equipo	X
Altas temperaturas	X	Líquidos combustibles		Movimiento repetitivo		Baja tensión	X	Condiciones de orden y aseo		Revisión de equipos y herramientas	X
Bajas temperaturas		Líquidos inorgánicos		Manipulación de cargas	X	Enchufes, tomas, cableado	X	Demolición		Protección de sumideros	
Radiación por soldadura		Líquidos orgánicos		Alto desgaste físico	X	Estático		Trabajos simultaneos		Monitoreo de la atmósfera	
Radiación por rayos Ultravioleta (uv)		Sólido s orgánicos/inorgánico s		Otro ?		Equipos energizados	X	Instalaciones inadecuadas		Orden/Ventilar	
AMBIENTE DE TRABAJO		PSICOSOCIAL		BIOLOGICOS		ASPECTOS AMBIENTALES				Clasificación y disposición de residuos	
Explosiones	X	Atención y concentración elevada		Bacterias, rickettsias		Captación o desague de agua		Corte de árboles o vegetación n		Requiere vigía/espacio cilíndrico s	X
Fugas/Derrames		Alta responsabilidad		Parasitos, hongos		Uso de recursos naturales (canteras,		Derrames potenciales		Equipo contrabrincando	
Incendio	X	Jornadas extensas/Turnos		Virus, fluidos		Emisiones		Afectación de sumidero s		Limpieza y humectación	
Manejo de vehículos		Relaciones interpersonales		P icaduras, mo rdeduras	X	Generación de residuos (sólidos, líquidos,		Transporte de materiales químicos o combustibles		Sistema de aislamiento seguro	

PELIGRO	EFECTO	CONTROLES EXISTENTES	FUENTE	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA
Pastillas	Contaminación respiratoria	Capacitación	Internacional	6	4	24	60
Accidente/Lesión Grave	Contaminación piel	Uso de EPP	Nacional	6	4	24	60
Accidente/Lesión Incapacidad	Contaminación localizada	Señalización	Regional	6	4	24	60
Accidente/Lesión Leve	Efecto alergia	Cumplir reglamento interno de seguridad	Local Oficina y Talleres	6	4	24	60
Accidente/Lesión Leve	Efecto leve	Ninguno	Interna Contratista	6	4	24	60
Ninguna lesión	Ningún Efecto	Ninguno	Ninguna Importa	6	4	24	60

ADICIONAL A LOS EPI BÁSICOS (CASCO, BOTAS, GAFAS, GUANTES, PROT. AUDITIVO, CAMISA MANGA LARGA Y/O DOTACIÓN INDUSTRIAL U OVEROL)

Respirador material particulado		Gafas especiales	X
Respirador vapores orgánicos		Careta	
Respirador para humos		Manta dieléctrica	
Equipo de protección contra caída		Casco dieléctrico	X
Botas dieléctricas	X	Equipo de auto contenido	

¿Otros? ¿cuáles? Guantes especiales

PARTE B. VALIDACIÓN PARA TRABAJAR

FECHA	VALIDEZ DESDE - HASTA (HORA)		REPRESENTANTE HSE (Firma y cc)	LIDER EJECUTOR (firma y cc)	OBSERVACIONES
31/3/25	8:00 AM	5:00 PM	Hilenis Ospino 1143878385		1171426925
1/4/25	8:00 AM	4:00 PM	Hilenis Ospino 1143878385		1171426925

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: Agosto -2024

PARTE C. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Pasos ordenado del trabajo		Peligro/Aspecto		Consecuencias		Acciones de Control (preventivas, protectivas, reactivas)		Responsable
1.	ALISTAMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.1	1. RIESGO BIOMECANICO (posturas inadecuadas) 2.RIESGO LOCATIVO (superfice de trabajo irregulares desloizantes)	1.1	1.Lesiones musculo - esqueletico, espamos, imbalgias, Malas posturas, levantamiento de cargas, dolor lumbal, posturas forzadas o permanentes 2.Caidas al mismo nivel, golpes y fracturas.	1.1	1.Autocuidado, charla preoperacional, posturas adecuadas, calesteria, Rotación de actividades, pausas actives, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad. 2. Autocuidado, uso de epp (botas de seguridad),Charlas de seguridad, Diligenciamiento de permisos, Ats,inspección de equipos y herramientas, precaución al realizar la actividad, tener en cuenta señalización y las diferente actividades que se ejecutan en obra.	Inspector S.S.T. Trabajadores.
2	ASCENSO POR ESCALERA ESTRUCTURAL HASTA EL QUINTO PISO LUEGO ASCENSO POR ESCALERA TIPO GATO HASTA LLEGAR A LA CUBIERTA	2.2	1.BIOLOGICO (PICADURAS) 2. BIOMECANICO (MOVIMIENTOS REPETITIVOS). 3.CONDICIONES DE SEGURIDAD , LOCATIVO, TRABAJO EN ALTURAS MECANICO. 4.FENÓMENOS NATURALES: METEOROLÓGICOS O CLIMÁTICOS:	2.2	1.BIOLOGICO:Picaduras de insectos. 2. BIOMECANICO dolor muscular. 3 CONDICIONES DE SEGURIDAD (LOCATIVO): caidas del mismo nivel, caidas de diferente nivel,golpes, contunciones. MECANICO:caidas de herramientas, lacerraciones,hematomas, machucones. 4.FENÓMENOS NATURALES: METEOROLÓGICOS O CLIMÁTICOS: Lluvias torrenciales, tormenta eléctrica, sismos, terremotos	2.2	1.BIOLOGICO: camisa mangalarga, calzado de seguridad. 2.BIOMECANICO, subir despacio las escaleras, y de igual modo debe ser el descanso. 3.LOCATIVO Y MECANICO:Realizar el ascenso por escaleras en buenas condiciones hasta llegar a la superficie de la torre. No llevar carga dimensionada (equipos de altura y herramientas). 4. FENÓMENOS NATURALES: METEOROLÓGICOS O CLIMÁTICOS :Siempre estar pendiente de las condiciones climáticas antes de iniciar y durante la ejecución de las actividades laborales, ante la presencia de vientos fuertes o tormentas eléctricas se suspende inmediatamente la actividad, el trabajador asegura los equipos de alturas; y hace el descenso por la cubierta, una vez estén todos los equipos asegurados el trabajador desciende por la escalera de la cubierta.	Inspector S.ST trabajdores
3	ARMADO DE ANDAMIO TUBULAR	3.3	1. BIOMECANICO: Por la exposicion a posturas forzadas, sobreesfuerzo. 2.CONDICIONES DE SEGURIDAD , LOCATIVO, TRABAJO EN ALTURAS	3.3	1. Dolor lumbar, lesiones musculoesqueletico. 2. caida de herramientas, caida de diferente nivel. TRABAJO EN ALTURAS: fracturas, golpes, trauma craneoencfilico, accidente fatal. 3. Machucones, golpes, fracturas, heridas.	3.3	1. realizar el levantamiento de herramientas y equipos con buena higiene postural 2.caida de herramientas, caida de diferente nivel. TRABAJO EN ALTURAS:Verificación de curso de alturas vigentes del personal, examen medico con enfasis en alturas, condiciones de salud,inspeccion de los equipos de alruras(arnes, eslinga, linea de vida). Acompañamiento SST. Delimitación y señalizacion suficiente del área, socializacion de procedimiento de la actividad arme de andamio, inspeccion de andamio que cuente con todas piezas del mismo (plataformas metalicas, conectores, tornillos nivelladores, escalera, rodapies travesaños. señalizacion de andamio, el Andamio debe contar con la certificacion, inspeccion por la persona competente y ficha tecnica. 3. Autocuidado, inspeccion de herramientas a utilizar llaves, destornillador, diligencimaineto de Ats, trabajo en equipo, coordinacion de actividad en el armado del andamio, concenraccion en la actividad no distraerse.	inspector S.S.T trabajadores.

Powered by CamScanner

4	INSPECCIONAR EL ESTADO DE LAS HERRAMIENTAS Y EPCC AL MOMENTO DE UTILIZARLOS (ESCALERA, ANDAMIO, DESTORNILLADOR, ALICATES, PINZAS, TAALADRO, PULIDORA)	4.4	condiciones de seguridad alturas	4.4	caidas golpes, fracturas, fatalidad	4.4	realizar inspeccion pertinente de los equipos de alturas para desempeñar la actividad	inspector S.S.T trabajadores
5	INICIO DE ACTIVIDAD LAVADO LIMPIEZA DE AIRES ACONDICONADOS	5.5	1.BIOLOGICO 2. BIOMECANICO (MOVIMIENTOS REPETITIVOS). 3.CONDICIONES DE SEGURIDAD, CAIDA AL MISMO NIVEL Y DIFERENTE NIVEL 4.FISICO (RADIACIONES NO IONIZANTES 5.FENÓMENOS NATURALES: METEOROLÓGICOS O CLIMÁTICOS:	5.5	1.BIOLOGICO:Picaduras de insectos 2. BIOMECANICO dolor lumbar, dolor muscular. 3.CONDICIONES DE SEGURIDAD . LOCATIVO: caida de herramientas, caida de diferente nivel , trauma craneoencefico, accidente fatal. 4.FISICO (RADIACIONES NO IONIZANTES: Golpe de calor,mareo,cefalea, deshidrtaccion. 5.FENÓMENOS NATURALES: METEOROLÓGICOS O CLIMÁTICOS: Lluvias torrenciales, tormenta eléctrica, sismos, terremotos	5.5	1.BIOLOGICO: uso de camisa mangalarga, calzado de seguridad. 2. BIOMECANICO: realizar el levantamiento de herramientas y equipos con buena higiene postural. 3.LOCATIVO: caida de herramientas, caida de diferente nivel. Acompañamiento SST. Verificación de puntos de anclaje . Delimitación y señalizacion suficiente del área. 4.FISICO (RADIACIONES NO IONIZANTES: Hidratacion, uso de camisa mangalarga, casco de seguridad, recesos cuando el dia es bastante soleado, uso de protector solar. 5. FENÓMENOS NATURALES: METEOROLÓGICOS O CLIMÁTICOS :Siempre estar pendiente de las condiciones climáticas antes de iniciar y durante la ejecución de las actividades laborales,	inspector S.S.T trabajadores.
6	CONECTAR PULIDORA Y TALADRO	6.6	1. Riesgo eléctrico (Baja y alta tensión	6.6	1. Quemaduras, corto circuito, heridas, posible fatalidad, incendios, descarga electrica, electrocucion.	6.6	1. Inspeccion de extensiones, clavijas, que no esten con añadiduras, inspeccion preoperacional equipos, cableado en buen estado, precaución e inspección del area y uso epp.	
7	CORTAR TUBERIA GALVANIZADA DE COBRE CON PULIDORA	7.7	1. Riesgo eléctrico (Baja tensión) 2.Riesgo mecánico (exposición a partes móviles de la herramienta) 3.Riesgo biomecánico (posturas inadecuadas) 4. Riesgo fisico ruido, exposicion a rayos UV (luz solar), vibraciones	7.7	1.Quemaduras, corto circuito, posible fatalidad 2.irritación en los ojos por proyección de particulas, cortes, heridas, amputaciones, atrapamiento por partes en movimiento externas, quemaduras por proyección de chispas. 3. Lesiones musculo-esquelético, espasmos, lumbalgias 4. cortaduras, golpes, quemaduras,estrés, dolor de cabeza, hipoacusia.	7.7	1. inspección preoperacional de las herramientas eléctricas, inspección de extensión eléctrica y tableros de la obra señalizados, uso de epp (gafas, tapa oidos, tapabocas, guantes de nitrilo, botas de seguridad, casco, barburquejo), diligenciamiento de permisos de trabajo, autocuidado, verificar áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y aseo, tarjeta de equipos, carnet de operación de equipos 2. Autocuidado, inspección de herramienta (pulidora), diligenciamiento de permisos, ats, uso de epp adecuados (guantes de nitrilo, casco, gafas, tapabocas, tapa oidos de copa, careta), tarjeta de equipos, carnet de operación de equipos, sistemas de bloqueo y señalización, socialización de reglas cardinales y estándares de seguridad, uso correcto de la guarda de seguridad. 3.posturas adecuadas, calestenia, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad. 4. inspección de equipos, herramientas, uso de tapaoidos, guantes de vaqueta o nitrilo, casco con barbuquejo, gafas de seguridad,careta de esmeriar, tapebocas n95 uso adecuado de equipos, prohibido retirar accesorios de equipos de accesorios. hidratacion a personal, uso de proteccion solar, señalizacion y delimitacion de area.	
8	orden y aseo	8.8	1.Riesgo químico (inhalación particulas), 2.Riesgo biomecánico (malas posturas), 3. Riesgo locativo (irregularidades deslizantes y/o caida al mismo nivel)	8.8	1.irritación en la piel, enfermedades respiratorias, irritación en los ojos, intoxicación 2. Lesiones musculo-esquelético, espasmos, lumbalgias 3.caidas, golpes, fracturas	8.8	1.Uso de epp adecuados (guantes de nitrilo, casco, barburquejo, gafas, tapabocas), autocuidado, socialización de hojas de seguridad de pegacor 2. Realizar posturas adecuadas para realizar la actividad, realizar pauses activas de 5 minutos, autocuidado, posturas adecuadas, autocuidado, Rotación de actividades, uso de elementos que se adapten al mobiliario para adecuar alcance de herramientas, permanecer siempre con un ayudante para realizar cambio de actividad. 3. Autocuidado, uso de epp (botas de seguridad, guantes, casco, gafas, tapabocas), inspección visual área	Inspector S.S.T. Trabajadores.

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V	CODIGO: FT-SST: 031
	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION: 1
	FORMATO ATS	FECHA: AGOSTO 2024

PARTE D. EQUIPO DE TRABAJO

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS

NOMBRE INSPECTOR 1	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Hilagaeye Rios	1144176983	PROFESIONAL SST	Hilagaeye	Hilagaeye	—	—	—	—	—
NOMBRE INSPECTOR 2	**CEDULA**	**CARGO**	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**	**DOMINGO**

APROBACIÓN DEL ATS

NOMBRE	CEDULA	CARGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Daniel Hernandez	1088156592	Tecnico			—	—	—	—	—
Carlos Vargas	1075265699	Tecnico							

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V


PERMISO DE TRABAJO PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS

Codigo: FT-SST-027
Version: 01
Fecha: 29-08-2024


INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO	31/01/25	PERMISO VALIDO HASTA	5/04/25
ACTIVIDAD A REALIZAR	corte y pulir	NUMERO DE PERSONAS EJECUTADORAS	
EMPRESA EJECUTADORA		AREA O LUGAR	Palacio de justicia


IDENTIFIQUE EL EQUIPO A OPERAR



EQUIPO PARA ELECTRODOS ○



TALADRO ✓



PULIDORA ✓

OTROS EQUIPOS ¿Cuáles?

ASPECTOS A VERIFICAR PARA SU USO

CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO
1. Estado General del equipo			1. Estado general del mando auxiliar	✓		1. Estado general del mando auxiliar	✓	
2. Estado General de los interruptores de encendido y regulador			2. Estado general del boton de bloqueo	✓		2.Estado general de la guarda de seguridad	✓	
3. Estado General del cable de la masa - Incluye pinzas			3.Estado general de la boton de avance y reversa			3. Estado general de la palanca de bloqueo		
4. Estado General del cable electrodo - Incluye el porta electrodo			4.Estado general de interruptor de encendido	✓		4. Estado general de interruptor de encendido	✓	
5. Estado General del electrodo o barra de soldadura			5.Estado general del mandril y llave	✓		5.Estado general del cable de alimentaciónEstado general del cable de alimentación	✓	
6. Estado General de las conexiones eléctricas del equipo			6.Estado general de la carcaza del taladro	✓		6. Estado general de la carcaza de la pulidora		
7. Extintor cerca al área de trabajo			7. Estado general de las conexiones electricas	✓		7.Estado general de la conexiones electicas	✓	
			8. Extintor cerca al área de trabajo	✓		8.Estado general del disco de la pulidora	✓	
DOCUMENTACION	SI	NO	DOCUMENTACION	SI	NO	DOCUMENTACION	SI	NO
8.Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida	✓	
9. Cuenta con Manual de Procedimientos			10. Cuenta con Manual de Procedimientos	✓		10. Cuenta con Manual de Procedimientos	✓	
10. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo			11. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo	✓		11. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo		
11. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar			12. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar	✓		12.Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar	✓	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		

MANTENIMIENTO

PULIDORAS	FECHA ULTIMO MANTTO	OBSERVACIONES
INVERSORES	FECHA ULTIMO MANTTO	
TALADROS	FECHA ULTIMO MANTTO	
ROTOMARTILLOS	FECHA ULTIMO MANTTO	

EL EQUIPO CUENTA CON EXTINTOR DE INCEDIOS EN FRENTE DE TRABAJO	FECHA DE RECARGA	VENCIMIENTO	PROX RECARGA	OBSERVACIONES

LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU USO?	SI		NO	
		✓		

Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se ha delimitado y señalizado el area de trabajo	✓	

Powered by CamScanner

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)					
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	SI	NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP	SI	NO
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		PROTECCIÓN RESPIRATORIA	✓	
GAFAS DE SEGURIDAD O CARETA PARA SOLDAR	✓		BOTAS PUNTA DE ACERO	✓	
GUANTES DE CARNAZA		✓	CARETA SOLDADOR		✓
GUANTES DE VAQUETA	✓		ROPA TRABAJO TIPO ALTA VISIBILIDAD	✓	
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓		CAREA DE SOLDADOR		✓
PETO EN CARNAZA O VAQUETA		✓	MANGAS EN CARNAZA O VAQUETA		✓

FIRMAS EMISOR Y RECOMENDACIONES

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de permisos y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los considerados al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permisos y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA Emisión(dd/mm/aa): 31/03/25 Vence(dd/mm/aa): 5/04/25

HORA Emisión/Vence (hh/hh): 730 AM 1500 PM

EMISOR: Firma: [signature] cc 1113816483

EMISOR: Firma: _____ cc _____

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA EJECUTORES	VALIDACION / SST
31/03/25	Jesmeria Valencia FREDY TORRES Oliveros Ariza	Jose V [signature]	[signature]
1/04/25	Jose maria Valenc Oliveros Ariza	Jose V Oliveros	[signature]
2/04/25	Josemaria Valen Oliveros Ariza Oliveros Ariza	Jose V Oliveros Oliveros	[signature] [signature]
3/04/25	Josemaria Valencia Jose Ariza.	Jose V [signature]	[signature]
4/04/25	Josemaria Valencia Oliveros Ariza	Jose V Oliveros	
5/04/25	Josemaria Valencia Oliveros Ariza	Jose V Oliveros	[signature]
	/	[signature]	/

OBSERVACIONES.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V


PERMISO DE TRABAJO PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS

Codigo: FT SST: 1727
Version: 01
Fecha: 27-08-2024


INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO	31/05/25	PERMISO VALIDO HASTA	1/06/25
ACTIVIDAD A REALIZAR	colag. pel Estacion AyN	NUMERO DE PERSONAS EJECUTADORAS	2
EMPRESA EJECUTADORA		AREA O LUGAR	Pellaco despistol


IDENTIFIQUE EL EQUIPO A OPERAR



EQUIPO PARA ELECTRODOS ○



TALADRO ⊘

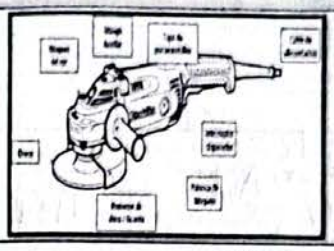

PULIDORA ⊘

OTROS EQUIPOS ¿Cuáles?

ASPECTOS A VERIFICAR PARA SU USO

CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO
1. Estado General del equipo			1. Estado general del mando auxiliar	✓		1. Estado general del mando auxiliar	✓	
2. Estado General de los interruptores de encendido y regulador			2. Estado general del boton de bloqueo	✓		2.Estado general de la guarda de seguridad	✓	
3. Estado General del cable de la masa - incluye pinzas			3.Estado general de la boton de avance y reversa			3. Estado general de la palanca de bloqueo		
4. Estado General del cable electrodo - incluye el porta electrodo			4.Estado general de interruptor de encendido	✓		4. Estado general de interruptor de encendido	✓	
5. Estado General del electrodo o barra de soldadura			5.Estado general del mandril y llave	✓		5.Estado general del cable de alimentaciónEstado general del cable de alimentación	✓	
6. Estado General de las conexiones eléctricas del equipo			6.Estado general de la carcaza del taladro	✓		6. Estado general de la carcaza de la pulidora	✓	
7. Extintor cerca al área de trabajo			7. Estado general de las conexiones electricas	✓		7.Estado general de la conexiones elocticas	✓	
			8. Extintor cerca al área de trabajo	✓		8.Estado general del disco de la pulidora	✓	
DOCUMENTACION	**SI**	**NO**	**DOCUMENTACION**	**SI**	**NO**	**DOCUMENTACION**	**SI**	**NO**
8.Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida	✓		9. Cuenta con hoja de vida		
9. Cuenta con Manual de Procedimientos			10. Cuenta con Manual de Procedimientos	✓		10. Cuenta con Manual de Procedimientos	✓	
10. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo			11. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo	✓		11. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo	✓	
11. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar			12. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar	✓		12.Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar	✓	
OBSERVACIONES			**OBSERVACIONES**			**OBSERVACIONES**		

MANTENIMIENTO

PULIDORAS	**FECHA ULTIMO MANTTO**	**OBSERVACIONES**
INVERSORES	**FECHA ULTIMO MANTTO**	
TALADROS	**FECHA ULTIMO MANTTO**	
ROTOMARTILLOS	**FECHA ULTIMO MANTTO**	

EL EQUIPO CUENTA CON EXTINTOR DE INCEDIOS EN FRENTE DE TRABAJO	**FECHA DE RECARGA**	**VENCIMIENTO**	**PROX RECARGA**	**OBSERVACIONES**

LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU USO?	**SI**	✓	**NO**	

Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el lider ejecutante)	**SI**	**NO**
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se ha delimitado y señalizado el area de trabajo	✓	

Powered by CamScanner

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)					
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP	SI	NO	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP	SI	NO
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		✓
CHALECO REFLECTIVO O CAMISA MANGA LARGA	✓		BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	
GUANTES DE CARNAZA		✓	CAMISA ESTAMPADA		✓
GUANTES DE VAQUETA	✓		BOTAS PUNTA DE ACERO CON CREMALLERA	✓	
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓		CAMISA DE ALGODÓN		✓
MASCARA CARNAZA O VAQUETA		✓	MANGAS DE CARNAZA O VAQUETA		✓

FIRMAS (INICIO Y TERMINACIONES)

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la socialización de formatos y los demás controles para mantener un riesgo aceptable y este inicio y las condiciones de grupo ejecutor he verificado el buen estado de los herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en compañía con el ejecutor la socialización de permisos y los demás controles para mantener un riesgo aceptable y este inicio y cumplimos seguro personal con la ejecución del mismo.

FECHA (Inicio/Fin): 31/03/25 — 1/04/25

HORA: (Inicio/Fin): 800 AM — 400 PM

EMISOR: Firma: [signature] — CC: 1118564093

EJECUTOR: Firma: _____ CC: _____

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA EJECUTORES	VALIDACION / SST
31/03/25	Daniel Hernandez Gricio Carlos Fernando Vargas	[signature] [signature]	[signature]
1/03/25	Daniel Hernandez G. Carlos Fernandez Vargas	[signature] [signature]	[signature]

OBSERVACIONES.

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V


PERMISO DE TRABAJO PARA OPERACIÓN DE EQUIPOS

Codigo: PT-SST-027
Version: 01
Fecha: 27-08-2024


INFORMACION GENERAL

FECHA DE INICIO	31/05/25	PERMISO VALIDO HASTA	31/09/25
ACTIVIDAD A REALIZAR	Corte	NUMERO DE PERSONAS EJECUTADORAS	2
EMPRESA EJECUTADORA	A&V	AREA O LUGAR	Adecuación


IDENTIFIQUE EL EQUIPO A OPERAR



EQUIPO PARA ELECTRODOS ( )



TALADRO ( )



PULIDORA (✓)

OTROS EQUIPOS ¿Cuáles?

ASPECTOS A VERIFICAR PARA SU USO

CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO	CONDICIONES	BUENO	MAL ESTADO
1. Estado General del equipo			1. Estado general del mando auxiliar			1. Estado general del mando auxiliar	✓	
2. Estado General de los interruptores de encendido y regulador			2. Estado general del boton de bloqueo			2.Estado general de la guarda de seguridad	✓	
3. Estado General del cable de la masa - Incluye pinzas			3.Estado general de la boton de avance y reversa			3. Estado general de la palanca de bloqueo	✓	
4. Estado General del cable electrodo - Incluye el parta electrodo			4.Estado general de interruptor de encendido			4. Estado general de interruptor de encendido	✓	
5. Estado General del electrodo o barra de soldadura			5.Estado general del mandril y llave			5.Estado general del cable de alimentaciónEstado general del cable de alimentación	✓	
6. Estado General de las conexiones eléctricas del equipo			6.Estado general de la carcaza del taladro			6. Estado general de la carcaza de la pulidora	✓	
7. Extintor cerca al área de trabajo			7. Estado general de las conexiones electricas			7.Estado general de la conexiones electicas	✓	
			8. Extintor cerca al área de trabajo			8.Estado general del disco de la pulidora	✓	
DOCUMENTACION	**SI**	**NO**	**DOCUMENTACION**	**SI**	**NO**	**DOCUMENTACION**	**SI**	**NO**
8.Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida			9. Cuenta con hoja de vida	✓	
9. Cuenta con Manual de Procedimientos			10. Cuenta con Manual de Procedimientos			10. Cuenta con Manual de Procedimientos	✓	
10. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo			11. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo			11. Cuenta con Programa de Mantenimiento de equipo	✓	
11. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar			12. Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar			12.Cuenta con certificacion de competencia del operador del equipo a utilizar	✓	
OBSERVACIONES			**OBSERVACIONES**			**OBSERVACIONES**		

MANTENIMIENTO

PULIDORAS	FECHA ULTIMO MANTTO	OBSERVACIONES
INVERSORES	FECHA ULTIMO MANTTO	
TALADROS	FECHA ULTIMO MANTTO	
ROTOMARTILLOS	FECHA ULTIMO MANTTO	

EL EQUIPO CUENTA CON EXTINTOR DE INCEDIOS EN FRENTE DE TRABAJO		FECHA DE RECARGA	VENCIMIENTO	PROX RECARGA	OBSERVACIONES
LOS EQUIPOS CUMPLEN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU USO?	SI	✓	NO		

Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	✓	
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas.	✓	
Se ha delimitado y señalizado el area de trabajo	✓	

Powered by CamScanner

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	SI	NO	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	SI	NO
CASCO CON BARBUQUEJO	✓		RESPIRADOR	✓	
CHALECO REFLECTIVO O CAMISA TIPO POLO	✓		BOTAS ANTIDESLIZANTES	✓	
GUANTES DE CARNAZA		✓	CAMISA MANGA LARGA		✓
GUANTES DE NITRILO	✓		BOTAS PUNTA DE ACERO	✓	
PROTECCIÓN AUDITIVA	✓		CAMISA DE ALGODÓN		✓
MEDIDA CAMISA-PANTALÓN		✓	GAFAS DE CARNAZA O NEGRAS		✓

FIRMAS, EMISIÓN Y REVALIDACIONES

COMO EJECUTOR he verificado con el emisor la aplicación de formatos y he dado continuo para minimizar los riesgos identificados y estas tareas y los comprometo a seguir ejecutar las verificando el buen estado de los herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR he verificado en terreno con el ejecutor la aplicación de controles y he dado continuo para minimizar los riesgos identificados y estas tareas y comunicado aquellos relacionados con la ejecución del trabajo.

FECHA (Emisión/Última revisión): 31/03/25 Hasta(Última revisión): 3/04/25

HORA: Emisión/Vigencia (Hora Final): 7:30 AM 5:00 PM

EMISOR: Nombre: Hilario Lastre CC: 1121864186

EJECUTOR: Nombre: _____ CC: _____

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA EJECUTORES	VALIDACION / SST
31/03/25	Ricardo		Hilario
1/04/25	Ricardo Heiver Gutierrez		Hilario
3/04/25	Heiver Gutierrez		Hilario

OBSERVACIONES.

Powered by CamScanner

ANEXO N° 7

CERTIFICADO DE DISPOSICION DE RESIDUOS

ZODME GUATIQUIA S.A.S

NIT. 901313682-5

NIT: 901.313.682-5

CERTIFICADO

Nº 1109

CERTIFICA

Que la empresa CONSORCIO INFRAESTRUCTURA A&V, con NIT 901863382-1, hizo disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, RCD (**DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION**), producto de la actividad de excavación, construccion, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas que se generaron de **DISPOSICION PROVENIENTE DE PALACIO DE JUSTICIA SON DIECIOCHO METROS CUBICOS DE DEMOLICION** , y que se relacionan a continuación:

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	**18.00** m^3

Esta disposición se hizo en la ZODME GUATIQUIA, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta margen izquierda del río Guatiquía, sector vanguardia y que se encuentra debidamente autorizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", según los permisos otorgados,mediante los oficios, No. PM GA 3.17.6217 Y PM GA 3.18.4664, PS-GJ.1.2.6.19.2837

La presente se expide en Villavicencio a los 10 días del mes 3 del año 2,025.

MAURICIO VELASQUEZ ZAPATA
Representante Legal

Vereda Vanguardia Sector la Playa
ZODME GUATIQUIA Cel.: 350 370 83 54
Villavicencio - Meta
zodmeguatiquia@gmail.com

ANEXO 8

CERTIFICADOS DE COMITES

ACTA DE REUNIÓN
SST

Fecha: 30/04/2025	**Lugar: Palacio de justicia**	
Hora Inicial: 7:00 am	**Hora Final: 8:00 am**	**Acta N° 4**

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Se reúne a todo el personal en el mes de marzo para tratar varios temas de seguridad y salud en el trabajo, tales como: el uso de elementos de protección personal cuando se esta ejecutando actividades ya que es un tema reiterativo en algunos colaboradores que no captan el mensaje, se recuerda que es una falta grave la omisión de estos y conlleva consecuencias se hacen charlas de concientización y la importancia de utilizarlos para prevenir incidentes y accidentes laborales. Se socializa la tasa de accidentalidad de este mes entre el 1 de abril al 30 de	José Quiceno	Ay
	José María Valencia	Ay
	Oliverio Ariza	Of
	Lina Yurani Gonzales	aseadora
	Luis Harvey Gutiérrez	Of
	José Uribe	Ay

abril en el cual no se presentó ningún accidente. **2.** Registro fotográfico **3**. Varios y acciones pendientes. **4**. Definición de fecha próxima reunión. 28/ 05/ 2025 **5**. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. INICIO DE COMITE.

El día 30 de marzo del 2025 se reúne a todo el personal operativo para tratar varios temas los cuales son los siguientes:

1. Se enfatizo el tema del uso de los elementos de protección personal en las actividades a realizar para evitar accidentes e incidentes laborales.
2. Socialización de reporte de tasa de accidentalidad del 1 de abril al 30 de abril.
3. se recuerda reportar toda condición de salud, incidente y accidente inmediatamente.
4. Se enfatiza en el tema del orden aseo 100%
