FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

INFORME SEMANAL

CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

PROINCO INGENIERIA S.A.S.

SEMANA No. 2 **DEL** 26/05/2025 **AL** 31/05/2025

CONTRATO No CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO

EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA (HANGARES) DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

CONTRATISTA	PROINCO INGENIERIA S.A.S	**NIT**	900.375.623-2
SUPERVISOR	AZ AREVALO ERICK ANDRES, por parte del Grupo de Apoyo Logístico CATAM-FUERZA AÉROESPACIAL COLOM	**NIT**	899.999.102-2

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	23 (Día)	**DE**	5 (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	15 (Día)	**DE**	8 (Mes)	**DE**	2025 (Año)
FECHA DE PRORROGA 1°	0				


Contrato de Obra

Valor Inicial	$ 916.580.606,43
Valor Actualizado	$ 916.580.606,43
No. de Personal	12


2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado (%)	0,08%	0,48%	Trabajo Ejecutado (%)	0,0%	0,0%
Valor del Trabajo Programado	$ 708.949	$ 4.358.012	Valor del Trabajo Ejecutado	$ -	$ -

% de avance físico

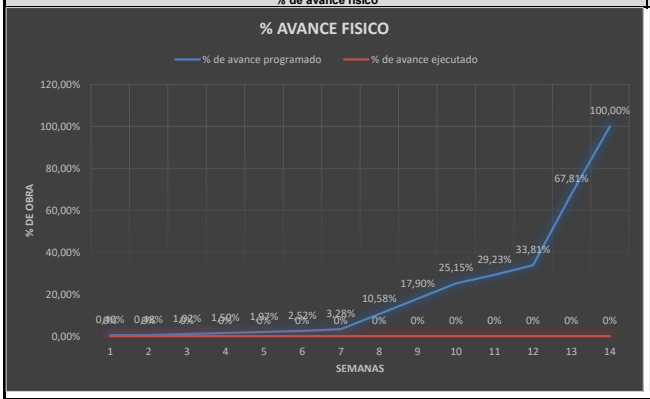

% de avance financiero

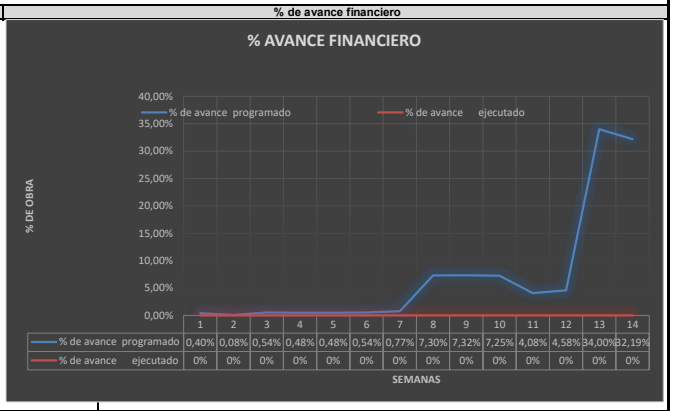

No°	actividades a ejecutar	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON AIU	% PROGRAMADO	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
1	PRELIMINARES				$26.376.110,63	2,88		0,00
111	CAPAMENTO 18 M2	UN	1	$ 2.131.295,00	$ 2.636.411,92	0,29	0	0,00
112	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2,00 MTS	ML	35	$ 436.555,00	$ 540.018,54	0,06	0	0,00
113	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS INCLUYE RETIRO	M3	114	$ 17.634.774,00	$ 21.814.215,44	2,38	0	0,00
114	LIMPIEZA DE JUNTAS INCLUYENDO EL RETIRO DE SELLO BITUMINOSO Y DEMÁS MATERIAL SUELTO. MATERIALES Y DEMÁS ASPECTOS NECESARIOS PARA LLEVARLA ACABO DICHA ACTIVIDAD.	ML	100	$ 955.200,00	$ 1.181.582,40	0,13	0	0,00
115	DESMONTE DE PUERTAS	M2	30	$ 164.820,00	$ 203.882,34	0,02	0	0,00
2	CONCRETOS				$273.195.962,58	29,81		0,00
121	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 10 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	400	$ 74.766.000,00	$ 92.485.542,00	10,09	0	0,00
122	PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI 6 CM CON ACERO Y REFUERZO SINTÉTICO TIPO DRAMIX O SIMILAR UNIÓN SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR A PLACA EXISTENTE CON ACABADOS TIPO CSP GRADO 5 INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	830	$ 133.894.770,00	$ 165.627.830,49	18,07	0	0,00
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE REPARACIÓN TIPO SIKA EMACO S469 SIMILAR O SUPERIOR CON ACABADO TIPO CSP GRADO 5.	M3	2	$ 12.192.878,00	$ 15.082.590,09	1,65	0	0,00
3	ACABADOS E IMPERMABILIZACIONES				$600.955.517,67	65,56		0,00
131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UCRETE HF 6 MM INCLUYE REALIZACIÓN DE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	1250	$ 459.420.000,00	$ 568.302.540,00	62,00	0	0,00
132	JUNTAS DE DILATACIÓN. INCLUYE CORTE DEL CONCRETO, FONDO DE JUNTA, SELLO Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO TEJIDA.	ML	540	$ 23.774.580,00	$ 29.409.155,46	3,21	0	0,00
133	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO).	M2	30	$ 2.622.330,00	$ 3.243.822,21	0,35	0	0,00
4	PINTURAS				$9.512.326,09	1,04		0,00
141	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DEMARCACIÓN EN POLIASPARTICO DE DOS COMPONENTES TIPO SIKAFLOOR 510 O SIMILAR 100% SOLIDOS RESISTENTE A RAYOS UV BAJO OLOR.	ML	200	$ 4.177.600,00	$ 5.167.691,20	0,56	0	0,00
142	PUNTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILACTACIONES)	M2	144,1449216	$ 3.512.235,16	$ 4.344.634,89	0,47	0	0,00
5	ASEO Y ESCOMBROS				$6.540.689,45	0,71		0,00
151	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	1260	$ 5.121.900,00	$ 6.335.790,30	0,69	0	0,00
152	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	3	$ 165.642,00	$ 204.899,15	0,02	0	0,00
					$916.580.606,42			
					% ACTUAL	100,00		0,00

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	INFORME SEMANAL CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025	PROINCO INGENIERIA S.A.S.

SEMANA No. 2 **DEL** 26/05/2025 **AL** 31/05/2025

CONTRATO No CONTRATO DE OBRA N° 015-00-L-CATAM-GRUAL-2025

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

COMPONENTE TECNICO

Por parte del contratista de obra se realizó visita de inspección del sitio de las obras.

ACTIVIDADES REALIZADAS

0	Actividades de inspección de obra, visita para replanteo y ubicación del área de intervención y marcación de las placas según la profundidad de excavación o demolición.
0	Concecusión del personal y equipo

COMPONENTE SST
N.A.

COMPONENTE AMBIENTAL
N.A.

OTROS
PERSONAL DE OBRA: A continuación de plantea el personal de obra a contratar:

REPRESENTANTE LEGAL : JAIME AREVALO	Cc 7.710.008	REPRESENTANTE LEGAL
RESIDENTE DE OBRA :		
PROFESIONAL SST :		
MAESTRO DE OBRA:		
OFICIAL :		

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Avance de obra – semana del 23 al 25 de mayo del 2025. Durante la semana no se realizaron trabajos de ejecución.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO Y DESCRIPCION DE CADA ACTIVIDAD EJECUTADA - SIN REGISTRO

PROINCO INGENIERÍA S.A.S
RL. JAIME ANDRÉS ARÉVALO ROJAS
C.C. No. 7.710.008
CONTRATISTA

PROINCO INGENIERÍA S.A.S
RESIDENTE OBRA. CARLOS EDGAR OCHOA LEAL
C.C No 13.494.384 DE CÚCUTA
Ing. Civil. MP: 25202-051415
