INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA N°9:

CONTRATO NO. 2004 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - SGI
DIRECCION TERRITORIAL DE RISARALDA - DTRIS

INVIAS

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
COLOMBIA

INFORME MENSUAL DE CONSULTORIA N°9:

CONTRATO No. 2004 DE 2024

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
“ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2”.

Responsable por Elaboración	**Nombre:**	Jael del Carmen Moriano Cortes	Kelly Johanna Ramírez Cuervo	Yuliana Reyes Hernández	Neyder David Jaramillo Salamanca
	Cargo:	Residente AMV2	Auxiliar Ingeniería	Inspector SISO	Inspector vial
	Fecha:	08 de abril de 2025			
Supervisor contrato		FERNANDO GARCIA GIRALDO			

SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - SGI
DIRECCION TERRITORIAL DE RISARALDA - DTRIS

DEPARTAMENTO DE RISARALDA, COLOMBIA

1. TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO GENERAL: 5
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO GEOGRÁFICA POR RUTAS: 5

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 9

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 9

5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO 13

6. BITÁCORA DE OBRA 13

7. INFORMES SEMANALES 14

8. PERSONAL CONTRATO DE CONSULTORÍA 14

9. INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 15

10. INFORME DE ACCIDENTALIDAD 15

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

12. ANEXOS 18

Tabla 1 VIAS ASIGNADAS AMV2 4
Tabla 2localización vías a cargo 5
Tabla 5: Ruta 50RS01 5
Tabla 6: Ruta 25RSA 6
Tabla 7: Localización Ruta 29RSB 7
Grafica N° 1: Localización Ruta 29RSA – fuente: Hermes Tabla 8: Localización Ruta 29RSA 7
Grafica N° 2: Localización Ruta 2902 – Fuente Hermes Tabla 9: Localización Ruta 2902 7
Tabla 10: Localización Ruta 2507 8
Tabla 11: Localización Ruta 5003 8

LISTA DE GRAFICAS

Grafica N° 1: Localización Ruta 29RSA – fuente: Hermes Tabla 8: Localización Ruta 29RSA 7
Grafica N° 2: Localización Ruta 2902 – Fuente Hermes Tabla 9: Localización Ruta 2902 7
Grafica N° 3: Localización Cerritos – Cauyá – Fuente: Hermes 8
Grafica N° 4: Localización Ruta 5003 – Fuente: Hermes 8

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo principal consolidar y validar la información necesaria y suficiente de las actividades encaminadas al desarrollo del contrato N° 2004 de 2024, en el cual se describe las actividades ejecutadas por Consorcio Admon 143, a cargo de la administración vial 2, la cual tiene como alcance las rutas que se detallan a continuación:

CODIGO	VIA	SECTOR	LONGITUD TOTAL (KM)
50RS01	APIA - LA VIRGINIA	PR 13+0000	19,07
		PR 30+0290	
		PR 30+0630	
		PR 32+0443	
25RSA	PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA	PR 0+0000	4,437
		PR 4+0455	
29RSB	VARIANTE DE GALICIA	PR 0+0000	1,72
		PR 1+0710	
29RSA	SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS QUEBRADAS	PR 0+0000	5,7
		PR 5+0700	
2902	PEREIRA CHINCHINA	PR 0+0000	5,8
		PR 5+0800	
2507	CERRITOS CAUYA	PR 37+00180	18,242
		PR 55+0430	
5003	SANTA CECILIA - ASIA	PR 72+0000	6,458
		PR 78+0550	
61,427			

Tabla 1 VIAS ASIGNADAS AMV2

Se presentan las actividades ejecutadas en el periodo comprendido 01 al 31 de marzo de 2024.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La administración vial lote 2, grupo 2 acorde a su alcance estimado en el contrato 2004 de 2024, tiene a cargo las vías que se detallan a continuación:

CODIGO	VIA	SECTOR	LONG. TOTAL (KM)	MANTENIMIENTO RUTINARIO/COOPERATIVA
50RS01	APIA - LA VIRGINIA	PR 13+0000	19,07	EL CENTRO
		PR 30+0290		
		PR 30+0630		
		PR 32+0443		
25RSA	PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA	PR 0+0000	4,437	EL CENTRO
		PR 4+0455		
29RSB	VARIANTE DE GALICIA	PR 0+0000	1,72	ALTAGRACIA
		PR 1+0710		
29RSA	SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS QUEBRADAS	PR 0+0000	5,7	ALTAGRACIA
		PR 5+0700		
2902	PEREIRA CHINCHINA	PR 0+0000	5,8	ALTAGRACIA
		PR 5+0800		
2507	CERRITOS CAUYA	PR 37+00180	18,242	COMUNEROS
		PR 55+0430		
5003	SANTA CECILIA - ASIA	PR 72+0000	6,458	
		PR 78+0550		
61,427				**TOTAL : 3/3**

Tabla 2 localización vías a cargo

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO GENERAL:

El proyecto se ejecuta en las vías del departamento de Risaralda; Rutas:

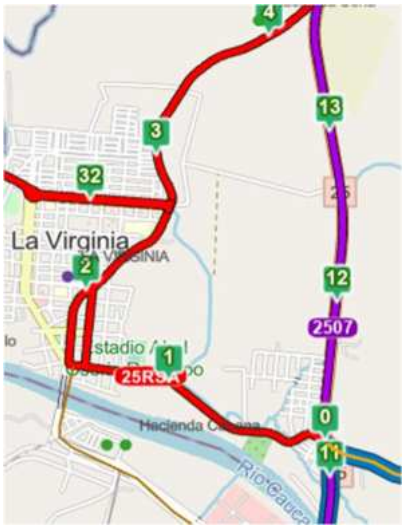
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO GEOGRÁFICA POR RUTAS:



LOTE 2 GRUPO AMV N°2		
TRAMO 1		
CODIGO:	**50 RS 01**	
VIA	**APIA - LA VIRGINIA**	
SECTORES:		
DE:	**PR 13+0000**	**PR 30+0630**
HASTA:	**PR 30+0290**	**PR 32+0443**

Tabla 3: Ruta 50RS01

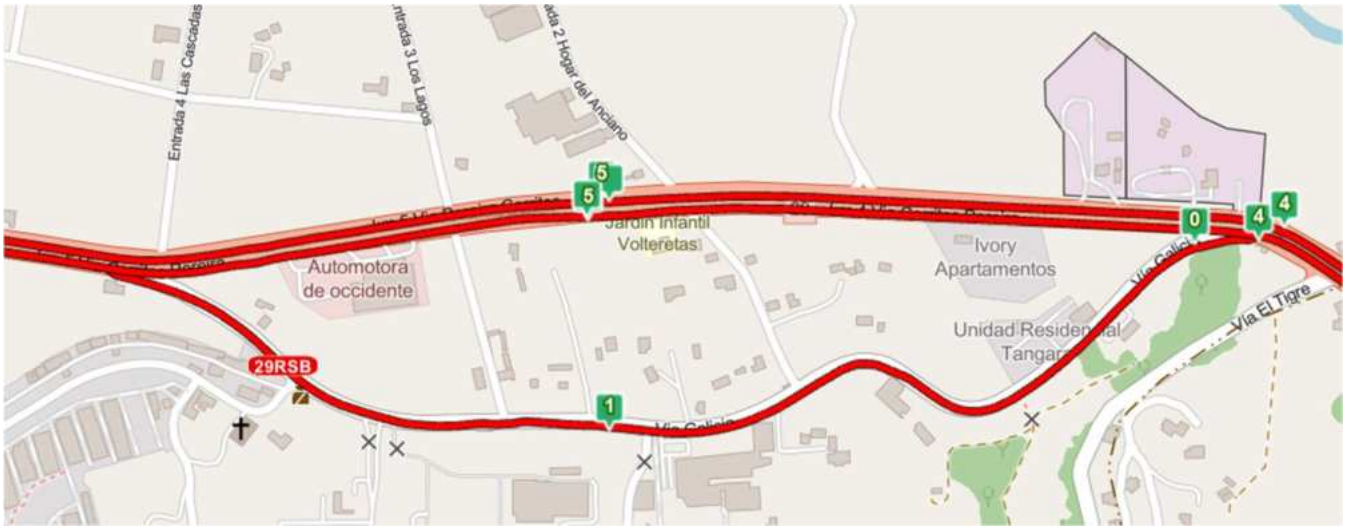
Grafica N° 2: Localización Ruta 50RS01 Fuente: Hermes



LOTE 2 GRUPO AMV N°2	
TRAMO 2	
CODIGO:	**25RSA**
VIA	**PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA**
SECTORES:	
DE:	**PR 0+0000**
HASTA:	**PR 4+0455**

Tabla 4: Ruta 25RSA

Grafica N° 3: Localización Ruta 25RSA – Fuente: Hermes



Grafica N° 4: Localización Ruta 29RSB – Fuente: Hermes

LOTE 2 GRUPO AMV N°2	
TRAMO 3	
CODIGO:	**29RSB**
VIA	**VARIANTE DE GALICIA**
SECTORES:	
DE:	**PR 0+0000**
HASTA:	**PR 1+0710**

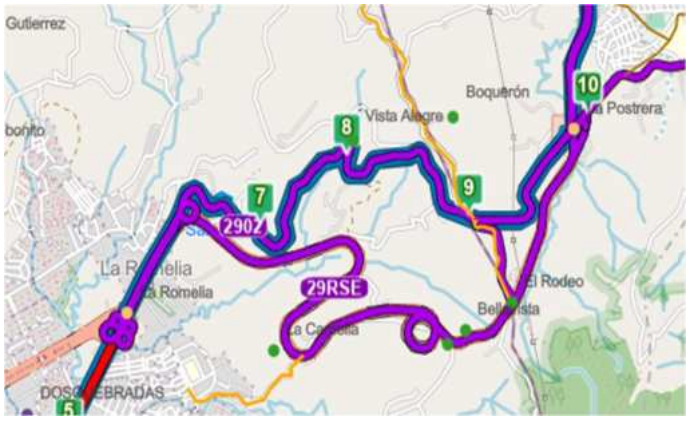
Tabla 5: Localización Ruta 29RSB



Grafica N° 1: Localización Ruta 29RSA – fuente: Hermes

LOTE 2 GRUPO AMV N°2	
TRAMO 4	
CODIGO:	**29RSA**
VIA	**SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS QUEBRADAS**
SECTORES:	
DE:	**PR 0+0000**
HASTA:	**PR 5+0700**

Tabla 6: Localización Ruta 29RSA



Grafica N° 2: Localización Ruta 2902 – Fuente Hermes

LOTE 2 GRUPO AMV N°2	
TRAMO 5	
CODIGO:	**2902**
	PEREIRA
VIA	**CHINCHINA**
SECTORES:	
DE:	**PR 0+0000**
HASTA:	**PR 5+0800**

Tabla 7: Localización Ruta 2902



LOTE 2 GRUPO AMV N°2	
TRAMO 6	
CODIGO:	**2507**
VIA	**CERRITOS CAUYA**
SECTORES:	
DE:	**PR 37+00180**
HASTA:	**PR 55+0430**

Tabla 8: Localización Ruta 2507

Grafica N° 3: Localización Cerritos – Cauyá – Fuente: Hermes



LOTE 2 GRUPO AMV N°2	
TRAMO 7	
CODIGO:	**5003**
VIA	**SANTA CECILIA - ASIA**
SECTORES:	
DE:	**PR 72+0000**
HASTA:	**PR 78+0550**

Tabla 9: Localización Ruta 5003

Grafica N° 4: Localización Ruta 5003 – Fuente: Hermes

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se describe la temporalidad del contrato N° 2004 de 2024, Consorcio Admon 143:

No. CONTRATO	2004 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**“**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.”.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	14 de junio de 2024
PLAZO INICIAL	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIO	9 de Julio de 2024
CONTRATISTA	Consorcio Admon 143
REPRESENTANTE LEGAL	Sandra Liliana Pérez Medina
NIT :	901.838.591-7
OFICINA AMV2:	Carrera 13 Bis N° 38-48 Barrio Guadalupe – Dos Quebradas
TELEFONOS:	313 229 1972 – 313 2298290
CORREO:	consorcioadmon143@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Tres mil ochenta y nueve millones cuatrocientos veinticinco mil ochocientos setenta y ocho pesos, (3.089.425.878), moneda corriente, incluido IVA
POLIZAS FIRMA CONTRATO N°	21-44-101443861 ANEXO 0
POLIZAS ACORDE ORDEN DE INICIO N°	21-44-101443861 ANEXO 1
SUPERVISOR CONTRATO:	FERNANDO GARCIA GIRALDO

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

La administración vial 2, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2025, realizó las siguientes actividades:

1. Seguimiento Contrato cooperativas, acorde a orden de asignación de fecha 10 de julio de 2024, las cuales se citan a continuación:

LOTE	GRUPO AMV N°	CODIGO	VIA	SECTOR	LONGITUD TOTAL (KM)	COOPERATIVA ASIGNADA
2	2	50RS01	APIA - LA VIRGINIA	PR 13+0000	19,07	Cooperativa El Centro, con número de contrato 1453
				PR 30+0290		
				PR 30+0630		
				PR 32+0443		
		25RSA	PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA	PR 0+0000	4,437	
				PR 4+0455		
		29RSB	VARIANTE DE GALICIA	PR 0+0000	1,72	Cooperativa Altagracia, con número de contrato 1455
				PR 1+0710		
		29RSA	SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS QUEBRADAS	PR 0+0000	5,7	
				PR 5+0700		
		2902	PEREIRA CHINCHINA	PR 0+0000	5,8	
				PR 5+0800		
		2507	CERRITOS CAUYA	PR 37+00180	18,242	No se tiene contratada cooperativa
				PR 55+0430		
		5003	SANTA CECILIA - ASIA	PR 72+0000	6,458	
				PR 78+0550		

Quienes realizaron las actividades acorde a sus contratos, cronograma y alcance de los mismos: rocerías, desmonte manual, limpieza de cunetas y canales, limpieza y despojo de muros, poda y retiros, limpieza de obras, limpieza de cunetas, actividades de ornato, atención de emergencias, entre otros, lo cual queda conciliado en los soportes de pago del mes de marzo en las actas N°11 Cta El Centro, N°11 Cta Altagracia y N°6 Cta Comuneros, siendo estas aprobadas y verificadas por la supervisión del contrato. (ver cronogramas en anexos).

Por parte de administración vial y acorde a sus indicadores se cita a continuación el cumplimiento de los mismos.

VARIABLE	OBJETIVOS MÍNIMOS	INDICADOR		CUMPLE		OBSERVACIONES	CALIFICACIÓN = DESCUENTO (Si se verifica incumplimiento)
				SI	NO		
		1	Coordinación para el control del tránsito.	SI		En las actividades de emergencias presentadas en las vías: - Ruta 50RS01: 16/03/25 (mvto en masa) - Ruta 50RS01: 19/03/25 (poda y tala de árboles ppio de precaución) - Ruta 50RS01: 19/03/25 (accidente de tránsito) - Ruta 50RS01: 19/03/25 (reiro de material de deslizamiento) - Ruta 2902: 20/03/25 (accidente de tránsito) - Ruta 50RS01: 20/03/25 ((poda y tala de árboles ppio de precaución) - Ruta 2507: 21/03/25 (poda y tala de árboles ppio de precaución) - Ruta 50RS01: 27/03/25 (caída de árbol) - Ruta 5003: 26/03/25 (caída de árbol)	
		2	Estrategias de atención inmediata y magnitudes,	SI		Actividades de emergencia en la vía por caida de ramas, y especies arboreas. - Al presentarse el evento los miembros de la ctva: notifica mediante grupo de wssp. - La residente de AMV realiza la logistica de desplazamiento del personal de AMV requerido y de ctva. - Realiza las indicaciones. - La residente de AMV, segun la novedad y de requerirse se solicita apoyo de mpio, bomberos, policia de carreteras o tránsito y demás entidades. - Se realiza atención inmediata, incluye control de tráfico; con las cooperativas de los contratos N°1453, 1455, 3814. - Se habilita la vía hasta tanto se llega los organismos requeridos.	10%
		3	Apoyo a contratación de obras	SI		Se tiene en ejecucion -Cto2415- Cto3821 - Cto4161-4025	
		4	Actualización permanente de datos de equipo y contratistas de la zona.	SI		Se tiene en ejecucion -Cto2415- Cto3821 - Cto4161-4025	
		5	Reporte diario de emergencias y actualización permanente de las mismas	SI		Se realiza reportes en el horario de las 6:00 am y 4:00 pm, mediante plataforma whatsapp, a diario. Se informa novedades en las vías a cargo. Se realiza cargue a plataforma Survey, la cuál presenta fallas por ello se remite comunicado: INV-ADM-VIAL-143-305-24 Sitio Criticos Ruta 50RS01. - Se continua manifestando mediante grupo de wssp	
Mantenimiento	Lograr un oportuno, eficiente y eficaz mantenimiento rutinario y apoyar las labores de mantenimiento periódico	1	Cumplimiento de indicadores por parte de los trabajadores de mantenimiento rutinario	SI		Se realiza programación mensual, por semanas, se realiza seguimiento y cumplimiento de cronograma de trabajo, se firma actas de seguimiento por cada cooperativa especificando la programación planeada vs la programación ejecutada.	10%
		2	Efectividad de la inspección rutinaria de puentes	SI		Se ha realizado inspección de puentes acorde a solicitudes e informe de estado de las vias a cargo, mediante comunicados: 2025E-VUVRAZ-012745 2025E-VUVRAZ-012442	
Administración	Obtener información, efectuar estudios, preparar documentos, realizar evaluaciones continuas, gestiones permanentes y presentar informes periódicos y de gestión	1	Obtener información, efectuar estudios, preparar documentos, realizar evaluaciones continuas, gestiones permanentes y presentar informes periódicos y de gestión	SI		- Reporte diario mediante whatsapp, 6:00am y 4:00 pm - Informes semanales - Inspecciones y visitas a sitios críticos. - Gestiones ante mpios y entidades privadas	10%

Información para alimentar diferentes modelos matemáticos que tiene INVIAS para efectos de planificación de la inversión	Suministrar datos actualizados, confiables, homogéneos y oportunos de todos los sistemas definidos.	1	Veracidad, integridad y oportunidad de la información	SI		- Sitios críticos - INV-ADM-VIAL-143-305-24 Sitio Criticos Ruta 50RS01 - INV-ADM-VIAL-143-306-24 Atención emergencias ruta 50RS01 - INV-ADM-VIAL-143-308-24 Atención emergencias ruta 2507 Contrato 4161 - INV-ADM-VIAL-143-309-24 Retiro de señal Contrato 4161 - INV-ADM-VIAL-143-309-24 Solicitud permiso uso de via 29RSB - INV-ADM-VIAL-143-318-24 Radicado # 2025S-VRIS-014376 - Comunicado de Salida	10%
Planeación	Apoyar la elaboración de presupuestos y programas de ejecución de trabajos	1	Intervención oportuna de acuerdo a solicitud de Territorial respectiva.	SI		- 2025E-VUVRAZ-012737 - Programación trabajo mto rutinario - Programación actuaciones respuestas derecho de petición	10%
Vigilancia y Supervisión	Desarrollar acciones para la buena marcha de obras y estudios	1	Calidad de vigilancia y/o supervisión de obras contratadas en la red a su cargo	SI		- Actas de seguimiento a cumplimiento indicadores contratos de mantenimiento rutinario, En el reporte diario se informa lo referente al cto 2415-3821-4161 a cargo de la supervisión de Territorial	10%
Estudios	Analizar problemas, presentar soluciones y hacer seguimiento a programas específicos.	**Sugerencias adecuadas y a corto plazo a:**					10%
		1	Accidentalidad	SI		-Se remitio solicitud de IPAT e informes de policia de carreteras para elboración de informe de accidentalidad: * INV-ADM-VIAL-143-238-25 SOLICITUD IPAT 29RSA Y 2902 * INV-ADM-VIAL-143-239-25 SOLICITUD IPAT 29RSA Y 29RSB * INV-ADM-VIAL-143-266-25 SOLICITUD IPAT 2507 * INV-ADM-VIAL-143-267-25 SOLICITUD IPAT 50RS01 Y 25RSA * INV-ADM-VIAL-143-271-25 SOLICITUD IPAT AMV2 - POLICIA CARRETERAS * INV-ADM-VIAL-143-312-25 DERECHO DE PETICION SOLICITUD IPAT AMV2 - POLICIA CARRETERAS - Se remitio informe de accidentalidad a planta central	
		2	Capacidad y niveles de servicio			No se ha presentado	
		3	Análisis de sitios críticos	SI		- Informe semanal sitios criticos	
		4	Estabilidad de taludes	SI		- Informe semanal sitios criticos - INV-ADM-VIAL-143-294-24 Informe Limpieza Quebrada La Vibora - INV-ADM-VIAL-143-305-24 Sitio Criticos Ruta 50RS01 - INV-ADM-VIAL-143-306-24 Atención emergencias ruta 50RS01 - INV-ADM-VIAL-143-308-24 Atención emergencias ruta 2507 Contrato 4161	
		5	Cálculo del patrimonio vial			No se ha presentado	
		6	Inventario de daños	SI		Criterio tecnico y comunicado: INV-ADM-VIAL-143-318-24 Radicado # 2025S-VRIS-014376 - Comunicado de Salida	
		7	Perfiles			No se ha presentado	
		8	Vulnerabilidad			No se ha presentado	
		9	Diseño obras menores	SI		INV-ADM-VIAL-143-301-24 Respuesta comunicado 2025SE-VRIS-022543	
Relaciones con la comunidad	1 Comunicación permanente con autoridades locales	1	Efectividad de la gestión adelantada	SI		Se realiza mesa de trabajos con secretario de obras, gestión del riesgo, servicios públicos, empresa de aseo,gestión ambiental,empresa de energia eléctrica, policía de carreteras y tránsito de: Dosquebradas, La Virginia, Balboa, Viterbo, Anserma	10%
	2 Difundir programas institucionales			No		No se ha presentado	
	3 Atender a usuarios			SI		Se atiende usuarios y derechos de petición: - INV-ADM-VIAL-143-301-24 Respuesta comunicado 2025SE-VRIS-022543	
	4 Gestionar acciones comunitarias a favor de las vías					No se ha presentado	
Vigilancia y cumplimiento de 1 Derecho de vía 2 Ornato 3 Embellecimiento	1 Gestionar ante las autoridades locales o nacionales el cumplimiento de la reglamentación vigente para el buen uso del espacio vial	1	Eliminación y control de botaderos de basura	Si		Limpieza de 2507 - 29RSA - 25RSA, 2902	5%
		2	Descontaminación visual mediante retiro de avisos y vallas	No		No se ha presentado	
		3	Ejecución de obras no autorizadas	Si		INV-ADM-VIAL-143-309-24 Solicitud permiso uso de via 29RSB	
4 Preservación ambiental	2 Participar activamente en programas y acciones para restauración y protección ambiental	4	Invasiones y otros	Si		INV-ADM-VIAL-143-310-24 Construcción de vivienda ruta 2507 PR 54+900	
		5	Grado de interés en los programas que se adelanten	Si		- INV-ADM-VIAL-143-318-24 Radicado # 2025S-VRIS-014376 - Comunicado de Salida - INV-ADM-VIAL-143-295-24 Respuesta comunicado 2025S-VRIS-012904	

Capacitación	1	A los trabajadores de mantenimiento rutinario en temas relacionados con mantenimiento rutinario y aspectos administrativos	1	Calidad y contenido adecuado de la capacitación y frecuencia de la misma	SI		Se realizo capacitación en los recorridos a ruta a ctvas de trabajo: - INV-ADM-VIAL-143-302-24 Respuesta comunicado 2025S-VRIS-001613 – Informe capacitación febrero 2025 - Capacitación SST	5%
	2	Estímulos permanentes para mejoramiento continuo			SI		En los recorridos de las vías se estimula el mejoramiento continuo del registro fotográfico de los reportes, desarrollo de sus actividades; se les lleva hidratación	
	3	Transferencia de tecnología a los departamentos			SI		Se explica a personal de mantenimiento rutinario el uso de aplicativos en celular, como cam scaner, manejo de almacenamiento virtual, mejora registro fotográfico	
Personal (Ingenieros)	Presencia permanente en la vía del Administrador de Mantenimiento Vial (Ingeniero Residente) y el Ingeniero		1	Presencia permanente de los ingenieros en la vía	SI		Se evidencia en los comunicados remitidos a DTRIS, reportes diarios, se evidencia con los peajes y registro fotografico de las vias, al igual que las mesas de trabajo con Municipios	5%
Personal y logística	Personal, equipo, valla y oficina exigidos en los Pliegos de Condiciones		1	Calidad de personal, oficina y equipos propuestos.	SI		INV-ADM-VIAL-143-024-24:	5%
			2	Tiempo de dedicación al contrato, del personal y vehículo propuesto	SI		Se evidencia en la remisión de documentos informes reportes, recorridos diarios.	
			3	Cambio de personal propuesto.	Si		Se aprobó el recnologo presentado por parte de Territorial	
			4	Propaganda política en oficina y vehículo			Se ha realizado en las vias, en el cumplimiento de visitas o inspecciones la comunidad se acerca con preguntas y solicitudes en especail los trasnportadores de carga pesada, se entrega plegables con la información de AMV2	
			5	Valla cumple ubicación y especificaciones de INVIAS	SI		Ubicada en una de las vias a cargo: 2902 PR0+800	

5. COMITÉS DE SEGUIMIENTO

En el presente periodo se realizaron los siguientes seguimientos:

N°	Fecha	Motivo
1	17/03/2025	Seguimiento a las administraciones viales de carretera grupo 1 y grupo 2 y GVI 3 y 4. (ver en anexos).

6. BITÁCORA DE OBRA

Al presente informe se anexa bitácora correspondiente al periodo de 01 al 31 de marzo de 2025.

7. INFORMES SEMANALES

Para el presente periodo se realizaron informes semanales, los cuales se anexan al presente informe:

N°	Periodo		Medio de envío	
	Del	Hasta	Digital	Correo electrónico:
1	28/02/2025	06/03/2025	x	fgarcia@invias.gov.co
2	07/03/2025	13/03/2025		
3	14/03/2025	20/03/2025		
4	21/03/2025	27/03/2025		
5	28/03/2025	03/03/2025		

8. PERSONAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

A continuación, se relaciona el personal contrato de consultoría N° 2004 de 2024.

PERSONAL			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
1	Jael del Carmen Moriano Cortes	Residente AMV	1.085.245.598 de Pasto
2	Kelly Johanna Ramírez Cuervo	Ingeniera auxiliar	1.088.007.166 de Dosquebradas
3	Juan Ricardo Torres	Especialista Estructural	79.406.449 de Bogotá
4	Yuliana Reyes Hernández	Inspector SISO	1.088.267.280 de Pereira.
5	Neider David Jaramillo Salamanca	Tecnólogo y/o inspector vial	1.012.447.344 de Bogotá.
6	Edirlando Ballesteros Maya	Conductor	1.089.719.143 de Guática.

- Número celular residente AMV (Jael Moriano): 313 229 1972
- Número auxiliar de ingeniería (Kelly Ramírez): 313 229 8290

9. INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se anexa el informe de seguridad y salud en el trabajo.

10. INFORME DE ACCIDENTALIDAD

Se remite solicitud a las entidades Tránsito y policía de carreteras de los municipios de Dosquebradas, Viterbo, Anserma y La Virginia, según corresponde en las rutas a cargo de la AMV2.

A la fecha solo se ha obtenido respuesta por parte del municipio de Dosquebradas, se carga la información en aplicación Hermes.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo a lo requerido en el Contrato 2004 de 2024 entre Instituto Nacional de vías (INVIAS) y Consorcio Admon 143, por medio de las cooperativas de trabajo asociado, se realizan actividades descritas en el contrato, referidas al anexo técnico el cual hace parte integral del contrato; *“3. Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual”.*

- Semanalmente se remite informe de sitios críticos a la entidad, recordando la criticidad de los sitios de riesgo en las vías a cargo según colores y recomendaciones, para que se gestionen recursos y se de solución a tiempo.

- Se inspecciona el uso y porte adecuado de elementos de protección personal y señalización por parte de las cooperativas de trabajo asociado, en las labores de mantenimiento rutinario.

- En la ruta 50RS01, con el personal de la cooperativa El Centro, se realizan labores de despeje de carril y perfilamiento de material los puntos críticos dado que en presencia de altas precipitaciones se generan pequeños desprendimientos.

- Se realiza jornada de poda de árboles con ramas secas por principio de precaución ruta 50rs01, cta El Centro.

- Se da respuesta a comunicado: memorando circular 2025I-VBOG-019114 donde se plasma el cronograma de seguimiento y apoyo por parte del equipo SIGPAV, sin embargo, el equipo AMV2 continua con inconvenientes como se ha mencionado, dado que la información no se refleja en la plataforma, como evidencia, se anexa registro fotográfico del cargue de la misma, con el fin de recibir el apoyo del equipo de SIGPAV para validación de esta.

- Se remite información de señalización de fauna existente en las vías a cargo de la AMV2, en atención a las observaciones y preguntas remitidas por el equipo de sostenibilidad, enviadas por la supervisión del contrato.
- Se realiza limpieza de quebrada la Víbora el día 02/03/2025, por medio de la mano de obra de la CTA ALTAGRACIA y maquinaria de la secretaría de obras públicas del municipio de Dosquebradas como se manifiesta en informe INV-ADM-VIAL-294-25CE.

- Una vez se obtiene aprobación de compra de materiales según cotizaciones remitidas mediante oficio INV-ADM-VIAL-293-25CE, se procede a realizar la compra de material Asfrío y se realizan jornadas de tapa huecos con mano de obra de las cooperativas de trabajo en las rutas 50RS01 Y 2902.
- Se da respuesta al comunicado 2025S-VRIS-001613 – en el cual se remite Informe capacitación realizada a las cooperativas de trabajo el mes de marzo de 2025, tema: seguridad social y pensional.

- Se remite modelo de folleto (plegable) para aprobación por parte del área de comunicaciones y de la supervisión del contrato, en el cual se resalta la ley 1228 y se requiere para cumplimiento de compromisos adquiridos a ejecutar en el mes de abril con las secretarias de tránsito de los municipios de La Virginia, Anserma, Dosquebradas y Viterbo.
- Se remite informe de atención emergencias realizadas el 16/03/2024, presentadas en la ruta 50RS01 en los puntos 13+350, PR 14+650, PR 14+700, PR 14+800, PR 15+100 con apoyo de la cooperativa el Centro.

12. ANEXOS

CRONOGRAMA Y CUMPLIMIENTO CTA ALTAGRACIA

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL

PROGRAMACION MENSUAL Y CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

COOPERATIVA:	ALTAGRACIA																								
RUTA:	29RSB				29RSA														2902						
TRAMO:	PR0+000 PR1+0710				PR0+0000 PR5+0700														PR0+0000 PR5+0800						
VIA	VARIANTE DE GALICIA				SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS														PEREIRA - CHINCHINA						
TRAMO:	29RSB				VIADUCTO, 29RSA														2902						
ACTIVIDAD	MES :				MARZO DE 2025																				
	JORNAL	CANT EJEC.	UNIDAD	DETALLE	0	1	2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	1	2	3	4	5
Limpieza de Cunetas	10	3,700	Mts	P																						
				E																						
Limpieza de obras			Und	P																						
				E																						
Limpieza de pequeñas obras			Und	P																						
				E																						
Parcheo -Bacheo			Mts 3	P																						
				E																						
Limpieza de defensas metalicas			Mts	P																						
				E																						
Limpieza de Bermas	37	12,720	Mts	P																						
				E																						
Limpieza de Calzada			Mts 2	P																						
				E																						
Rocería mecánica y manual	96	91,865	Mts 2	P																						
				E																						
Realce manual			Mts 2	P																						
				E																						
Limpieza zanjas de coronación			Mts	P																						
				E																						
Limpieza de señales y mojones	11	89	Und	P																						
				E																						
Limpieza de Encoles y Descoles			Mts	P																						
				E																						
Limpieza de alcantarillas	2	4	Und	P																						
				E																						
Recorrido y vigilancia	17.5		jor	P																						
				E																						
Limpieza de muros y gaviones			Mts 2	P																						
				E																						
Mantenimiento rutinario de puentes y pontones			Mts3	P																						
				E																						
Atención de emergencias	2	1	Und	P																						
				E																						
Capacitación	8	1	Und	P																						
				E																						
Poda y retiro de arboles (Guaduas)			Und	P																						
				E																						
Retiro manual de derrumbes			Mts 3	P																						
				E																						
Despeje de señales			Und	P																						
				E																						

CRONOGRAMA Y CUMPLIMIENTO CTA EL CENTRO

ING. ARCELIA ARIAS DIAZ

CONSORCIO ADMON 143

IM-N1-2004-2024	Contrato 2004 de 2024"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.".	

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL

PROGRAMACION MENSUAL Y CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

COOPERATIVA:	EL CENTRO	
RUTA:	50RS01	25RSA
TRAMO:	PR13+0000 al PR30+0290 PR30+0630 al PR32+0443	PR 0+0000 al PR 4+0455.
VIA:	APIA - LA VIRGINIA	PASO NACIONAL

ACTIVIDAD	MES :				MARZO DE 2025																							
	JORNAL	CANT EJEC.	UNIDAD	DETALLE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	0	1	2	3	4	5
Limpieza de Cunetas	10.00	700	Mts	P																										
				E																										
Limpieza de ciclo ruta			Mts	P																										
				E																										
Limpieza de bermas	48.00	5,150	Mts	P																										
				E																										
Limpieza de canales	8.00	30.00	Und	P																										
				E																										
Capacitación	8		Und	P																										
				E																										
Retiro manual de derrumbes			Mts ^{3}	P																										
				E																										
Poda, corte y retiro de Arboles	32.00	8.00	Und	P																										
				E																										
Roceria y desmonte manual	48.00	47,835	Mts ^{2}	P																										
				E																										
Realce mecanico y/o despunte			Mts ^{2}	P																										
				E																										
Limpieza de Calzada	16.00	2,200	Mts ^{2}	P																										
				E																										
Limpieza de barandas			Mts	P																										
				E																										
Limpieza de alcantarillas			Und	P																										
				E																										
Limpieza de Encoles Y Descoles			Mts	P																										
				E																										
Limpieza de señales y mojones	24.00	135.00	Und	P																										
				E																										
Limpieza de muros en concreto y gaviones			Und	P																										
				E																										
Limpieza de defensas metálicas			Mts	P																										
				E																										
Atención de emergencias	48		Und	P																										
				E																										
Bacheo (Jornada tapa huecos)	10.00	4	m3	P																										
				E																										
jornada de limpieza (recolección de basuras)			Und	P																										
				E																										
Recorrido y vigilancia	18		Diaria	P																										
				E																										

ING. ARCELIA ARIAS DIAZ

CONSORCIO ADMON 143

IM-N1-2004-2024	Contrato 2004 de 2024"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.".	

ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL

CONTROL INDICADORES MANTENIMIENTO RUTINARIO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

COOPERATIVA:	LOS COMUNEROS
RUTA:	2507 / 5003
TRAMO:	PR 37+0180 A PR 55+0430 / PR72+0000 A PR
VIA	CERRITOS-CAUYA / SANTA CECILIA - ASIA

ACTIVIDAD	MES :			MARZO DE 2025
	JORNAL	CANT EJEC.	UNIDAD	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 72 73 74 75 76 77 78
Limpieza de Cunetas	77.00	23,749	Mts	
Capacitación			Und	
Limpieza de Obras			Und	
Limpieza de defensas metalicas			Mts	
Limpieza de señales y mojones.			Und	
Limpieza de Encoles y Descoles			UND	
Poda, corte y/o retiro de árboles.	4.00	1	Und	
Realoe Manual			Mts ^{2}	
Roceria y desmonte manual	121.00	164,925	Mts ^{2}	
Limpieza de muros y gaviones			Mts ^{2}	
Despeje de Derrumbes			Mts ^{3}	
Parcheo-jornada tapa huecos	6	3	Mts	
Limpieza de calzada			Mts ^{2}	
Limpieza de alcantarillas	14	38	UND	
Limpieza de puentes y pontones			Mts	
Emergencias	4	1.0	UND	
Capacitaciones	11	1.0		
Limpieza de bermas	16.0	11,100	Mts	
Recorrido y vigilancia	18			

INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	ADAPTADA
		PÁGINA	
		FECHA	6/03/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — SEMANA No.: 35 del 28/02/2025 al 6/03/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FERNANDO GARCIA GIRALDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO		
INTEGRANTES:	ALTAGRACIA-CENTRO COMUNEROS		
CONTRATO No.	1955 1453 2014	VALOR INICIAL:	$ 757.530.000,00
FECHA DE INICIO CTA ALTAGRACIA	30/05/2024	VALOR REDUCCIÓN IVA	$ -
FECHA INCIO CTA COMUNEROS	4/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 757.530.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -

CONTRATO DE CONSULTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ADMON 143		
INTEGRANTES:	CONSORCIO ADMON 143		
CONTRATO No.	2884	VALOR INICIAL:	$ 3.089.425.878,00
FECHA DE INICIO:	9/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.089.425.878,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 757.530.000	$ 1.298.196.000	$ 860.334.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 538.439.151	$ 241.608.700,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 219.090.849	$ 1.056.587.300		
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.072.445.374	$ 1.213.306.150	$ 803.674.354	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 803.110.495	$ -	$	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 269.334.879	$ 1.213.306.150	$ 803.674.354	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

PRESTACION DE SERVICIOS

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.298.196.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 241.608.700,00	18,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 241.608.700,00	18,61%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:
VALOR FACTURA:
VALOR FACTURA:

¡En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

CONSULTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 803.110.494,97	22,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 803.110.494,97	22,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	3,110%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	3,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

¡En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,94% — Avance o Atraso Físico % 18,61%
Meta Física Ejecutada % 1,94%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario Altagracia	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.032.200,00			$ 89.833.414,44	6,92%
					Ejec	$ 7.032.200,00			$ 89.833.414,44	6,92%
* Mantenimiento rutinario El Centro	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.661.500,00			$ 97.873.961,12	7,54%
					Ejec	$ 7.661.500,00			$ 97.873.961,12	7,54%
* Mantenimiento rutinario Comuneros	mes	0,23	2025		Prog	$ 10.549.000,00			$ 53.901.324,44	4,15%
					Ejec	$ 10.549.000,00			$ 53.901.324,44	4,15%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Nota: El equipo utilizado por las cooperativas de trabajo asociado se relacionan en fromato 15FR 4, el cual se entrega como soporte mensual de seguimiento.

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMOS ALTAGRACIA: RUTAS 2902, 29RSA Y 29RSB
TRAMOS CENTRO: RUTAS 55RSR1 Y 29RSA
TRAMO COMUNEROS: RUTAS 2507, Y 5003

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: NO APLOCA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta: „" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibil idad."...

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta: „" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibil ad."...

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica memorando/ 20245-VRIS-056915_16141

OBSERVACIONES:NO APLICA
Memorando: 20245-VRIS-056915_16141

V. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	OBRA	CONSULTORÍA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle 13 bis N°38-48 Barrio Guadalupe - Dosquebradas (Risaralda)

OBSERVACIONES: SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DIARIAS, PREOPERACIONALES DEL VEHÍCULO, SE ADELANTA INFORME MENSUAL AMV2, SE REALIZA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CON LA INGENIERA PRISCILA INTEGRANTE DEL COPPAST DE GOCSA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA TEAMS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 20241-IVBOG-056484 - con asunto: Memo AMV y rut información referente a los contratos de administración vial..
„" es necesario aclarar que la Subdirección de Estructuración de proyectos, considerando la esencia de los contratos en men ción, esto es CONSULTORIA Y SERVICIOS, no incluyó obligaciones ambientales y/o sociales pues los contratos no fueron tipificados como obra y/o interventoría"...

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS SITIOS CRÍTICOS, EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ESTABLE.
SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A LAS RUTAS 50RS01,25RSA,5003,29RSB,2507,2902
SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS
SE REALIZA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA ENTREGA DE PLEGABLE
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA RUTA 2507, COMUNEROS
LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REALIZA CONFORMACION DE CUNETA EN TIERRA RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REALIZA LIMPIEZA, DE ENCOLES YD ESCOLES EN LA RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO
SE REALIZA DESPEJE Y LIMPIEZA DE SEÑALES , CTA EL CENTRO
SE REMUEVE DERRUMBE A NIVEL DE BERMA EN RUTA 50RS01 PR 20+0300, CTA EL CENTRO
SE REALIZA PEQUEÑO DESLIZAMIENTO POR LLUVIAS EN LA RUTA 50RS01 PR 13+0350, CTA EL CENTRO
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA TALUDES DE LA RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA REALCE MANUAL RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REALIZA PODA DE ARBOLES RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA
SE ATIENDEN ENCOLES Y DESCOLES QUE POR MOTIVOS DE ARRASTRE DE ROCAS Y LODOS POR LAS FUERTES LLUVIAS SE COLMATARON RUTA 50RS01 CTA EL CENTRO
SE REPORTAN HUECOS CONFORMADOS POR LAS ALTAS PRECIPITACIONES EN LA RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO
LIMPIEZA DE CUNETA EN TIERRA Y OBRA EN LA RUTA 50RS01 QUE SE ENCONTRABA COLMATADA POR MATERIAL DE ARRASTRE EN LAS FUERTES LLUVIAS PR 21+0250, CTA EL CENTRO
LIMPIEZA DE BERMAS RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA RUTA 2902 ,CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA LA ATENCIÓN DE ARBOL CAÍDO RUTA 50RS01 PR 22+0950, CTA EL CENTRO
PODA DE ARBOLES Y DESPEJE DE SEÑALES, RUTA 29RSB, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA ROCERIA Y LIMPIEZA RUTA 29RSB, CTA ALTAGRACIA
CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN TIERRA RUTA 5003, CTA COMUNEROS
LIMPIEZA DE SEÑALES RUTA 29RSB, CTA ALTAGRACIA
REALCE MANUAL RUTA 29RSB, CTA ALTAGRACIA
RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBE RUTA 50RS01 PR 19+0500, CTA EL CENTRO
SE ATIENDE LIMPIEZA DE CALZADA POR RESIDUOS DE MATERIAL ROCOSO (MATERIAL DE ARRASTRE POR DESBORDAMIENTO Y COLMATACIÓN DE OBRAS POR LAS FUERTES LLUVIAS), CTA EL CENTRO
LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS POR LODOS , PALOS
SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REALIZA LA ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 5003, CTA COMUNEROS
SE REALIZA LIMPIEZA DE CANALES RUTA 2902 ,CTA ALTAGRACIA
SE TALA ÁRBOL POR PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN DADO QUE SE DESCONFINA RAÍZ PRODUCTO DE DESLIZAMIENTO EN LA RUTA 50RS01 PR 20+0350, CTA EL CENTRO
SE REALIZA LIMPIEZA DE BERMAS RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA
SE ATIENDE DERRUMBE EN CANAL PROFUNDA EN LA RUTA 50RS01 PR 19+0350, CTA EL CENTRO
LIMPIEZA DE CANALES Y CICLORUTAS , RUTA 5003, CTA COMUNEROS

SUPERVISIÓN:

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°1453-2024
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°1455-24
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA COMUNEROS, BAJO EL CONTRATO N°3814-24

CONSULTORIA:

SE REALIZA LEVANTAMIENTO RUTA 50RS01, 5003 DE FORMA MANUAL
SE REALIZAN REPORTES DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DIARIAMENTE A LAS 6AM Y 4PM
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS OBRAS REALIZADAS POR EL CONTRATO 4161 EN LA RUTA 5003
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 2415, EN LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA RUTA 50RS01 PR 19+0650, FALTA PINTAR NEW JERSEY
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3821, EN LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA RUTA 50RS01 PR 31+0050.SE ENCUENTRA EN FASE DE LLENO POSTERIOR AL MURO CON SUBBASE
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4161, EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MPIO DE VITERBO
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4025,ENCARGADO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RUTA 2902 PR0+0000 AL PR 5+800 (SUSPENDIDO)
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS LABORES EJECUTADAS POR LAS COOPERATIVAS ALTAGRACIA, EL CENTRO, COMUNEROS
SE EMITE RESPUESTA A LOS COMUNICADOS RECIBIDOS POR LA TERRITORIAL
SE REALIZA VISITA RUTA 50RS01 POR POR
ELABORACIÓN ACTAS COOPERATIVAS
ELABORACIÓN ACTA AMV2
PARTICIPACION CONCEJO DE DOSQUEBRADAS 04/03/2025
SE REPORTA INCIDENTE (HURTO), EQUIPOS DE COMPUTO DE LA AMV2 ANTE AUTORIDADES COMPETENTES 28/02/2025

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Inspección de las rutas a cargo.
- Supervisión contratos de mantenimiento rutinario
- Reunión trimestral seguridad vial La virginia
- Reunión ESP La Virginia, socialización proyecto ampliación acueducto el cual pasa por la 50RS01
- Respuesta a comunicados remitidos.
- Visita derecho de petición

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



LIMPIEZA DE CUNETAS RUTA 2507, CTA COMUNEROS



REALCE MANUAL RUTA 2507, CTA COMUNEROS



LAVADO DE SEÑALES Y MOJONES RUTA 29RSB, CTA ALTAGRACIA



ROCERLÍA Y LIMPIEZA DE TALUDES RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA



ATENCIÓN ZANJA COLMATADA MATERIAL DE ARRASTRE POR FUERTES LLUVIAS, LIMPIEZA DE CALZADA RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO



ATENCIÓN DESLIZAMIENTO RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES Y SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

INGENIERO RESIDENTE

FIRMA
NOMBRE: JAIEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
Matrícula Profesional No.: 5220220276SNRN

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	ADAPTADA
		PÁGINA	
		FECHA	13/03/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — SEMANA No.: 36 del 7/03/2025 al 13/03/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FERNANDO GARCIA GIRALDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO		
INTEGRANTES:	ALTAGRACIA-CENTRO COMUNEROS		
CONTRATO No.	1955 (453) 2014	VALOR INICIAL:	$ 757.530.000,00
FECHA DE INICIO CTA ALTAGRACIA	30/05/2024	VALOR REDUCCIÓN IVA	$ -
FECHA INCIO CTA COMUNEROS	4/07/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 757.530.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -

CONTRATO DE CONSULTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ADMON 143		
INTEGRANTES:	CONSORCIO ADMON 143		
CONTRATO No.	2884	VALOR INICIAL:	$ 3.089.425.878,00
FECHA DE INICIO:	9/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.089.425.878,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 757.530.000	$ 1.298.196.000	$ 860.334.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 538.439.151	$ 266.851.400,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 219.090.849	$ 1.031.344.600		
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.072.445.374	$ 1.213.306.150	$ 803.674.354	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 803.110.495	$ -	$	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 269.334.879	$ 1.213.306.150	$ 803.674.354	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

PRESTACION DE SERVICIOS

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.298.196.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 266.851.400,00	20,56%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 266.851.400,00	20,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:
VALOR FACTURA:
VALOR FACTURA:

¡En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

CONSULTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 803.110.494,97	22,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 803.110.494,97	22,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	3,110%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	3,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

¡En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,94% — Avance o Atraso Físico % 20,56%
Meta Física Ejecutada % 1,94%

Descripción de la Meta Física Contractual	Meta Física (Programa de Obra) Linea Base: Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada: Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario Altagracia	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.032.200,00			$ 99.218.995,05	7,64%
					Ejec	$ 7.032.200,00			$ 99.218.995,05	7,64%
* Mantenimiento rutinario El Centro	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.661.500,00			$ 108.099.598,85	8,33%
					Ejec	$ 7.661.500,00			$ 108.099.598,85	8,33%
* Mantenimiento rutinario Comuneros	mes	0,23	2025		Prog	$ 10.549.000,00			$ 59.532.806,09	4,59%
					Ejec	$ 10.549.000,00			$ 59.532.806,09	4,59%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Nota: El equipo utilizado por las cooperativas de trabajo asociado se relacionan en fromato 15FR 4, el cual se entrega como soporte mensual de seguimiento.

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMOS ALTAGRACIA: RUTAS 2902, 29RSA Y 29RSB
TRAMOS CENTRO: RUTAS 5585R1 Y 2585A
TRAMO COMUNEROS: RUTAS 2507, Y 5003

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: NO APLOCA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta: „" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibil idad."...

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta: „" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilid ad."...

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica memorando/ 20245-VRIS-056915_16141

OBSERVACIONES:NO APLICA
Memorando: 20245-VRIS-056915_16141

V. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	OBRA	CONSULTORÍA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N/A
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle 13 bis N°38-48 Barrio Guadalupe - Dosquebradas (Risaralda)

OBSERVACIONES: SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DIARIAS, PREOPERACIONALES DEL VEHÍCULO, SE ADELANTA INFORME MENSUAL AMV2, SE REALIZA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CON LA INGENIERA PRISCILA INTEGRANTE DEL COPPAST DE GOCSA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA TEAMS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 20241-VBOG-056484 - con asunto: Memo AMV y rut información referente a los contratos de administración vial..
„" es necesario aclarar que la Subdirección de Estructuración de proyectos, considerando la esencia de los contratos en men ción, esto es CONSULTORIA Y SERVICIOS, no incluyó obligaciones ambientales y/o sociales pues los contratos no fueron tipificados como obra y/o interventoría"...

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS SITIOS CRÍTICOS, EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ESTABLE.
SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A LAS RUTAS 50RS01,25RSA,5003,29RSB,2507,2902.
SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS
ROCERÍA MECÁNICA EN LA RUTA 2902 SEPARADORES Y LATERALES , CTA ALTAGRACIA
ROCERÍA MECÁNICA Y LIMPIEZA EN LA RUTA 2902 SEPARADORES Y LATERALES , CTA ALTAGRACIA
ROCERÍA MECÁNICA Y LIMPIEZA EN LA RUTA 2507, CTA COMUNEROS
LIMPIEZA DE CUNETAS Y RETIRO DE PEQUEÑO DESLIZAMIENTO EN LA RUTA 2507 PR 37+0350, CTA COMUNEROS
LIMPIEZA DE CUNETA EN TIERRA RUTA 2507, CTA COMUNEROS
ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 50RS01, CTA COMUNEROS
LIMPIEZA DE GAVIONES REVESTIDOS RUTA 2507 PR 42+0500 CTA COMUNEROS
LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES RUTA 2507, CTA COMUNEROS
ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO

SUPERVISIÓN:

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°1453-2024
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°1455-24
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA COMUNEROS, BAJO EL CONTRATO N°3814-24

CONSULTORIA:

SE REALIZA LEVANTAMIENTO RUTA 50RS01, 5003 DE FORMA MANUAL
SE REALIZAN REPORTES DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DIARIAMENTE A LAS 6AM Y 4PM
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 2415, EN LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA RUTA 50RS01 PR 19+0650. FALTA PINTAR NEW JERSEY
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3821, EN LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA RUTA 50RS01 PR 31+0050.SE ENCUENTRA EN FASE DE LLENO POSTERIOR AL MURO,CON SUBBASE
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4161, EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MPIO DE VITERBO
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4025,ENCARGADO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RUTA 2902 PR0+0000 AL PR 5+800 (SUSPENDIDO)
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS LABORES EJECUTADAS POR LAS COOPERATIVAS ALTAGRACIA, EL CENTRO, COMUNEROS
SE EMITE RESPUESTA A LOS COMUNICADOS RECIBIDOS POR LA TERRITORIAL
SE PARTICIPA EN COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
SE REALIZAN AJUSTES ACTAS COOPERATIVAS
SE REALIZAN AJUSTES ACTA AMV2
PARTICIPACIÓN ESP LA VIRGINIA / SOLICITUD PERMISO INTERVENCIÓN I EN COMPAÑÍA SUPERVISOR
SE REALIZA RECORRIDO Y SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3821 CON INGENIERO SUPERVISOR GABRIEL GARRIDO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Inspección de las rutas a cargo.
- Supervisión contratos de mantenimiento rutinario
- Recorrido con supervisión de contrato aMV
- Recorrido con jefe de zona Ingenio Risaralda, revisión de material de cañaduzales de rio y canales del ingenio
- REunión socialización GVI
- Respuesta a comunicados remitidos.
- Visita derecho de petición

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA



ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO



LIMPIEZA DE MURO GAVIONES RUTA 2507,CTA COMUNEROS



LIMPIEZA BERMAS RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA



LIMPIEZA DE SEÑALES RUTA 2507 PR 37+0750, CTA COMUNEROS



REUNIÓN ESP LA VIRGINIA CON INGENIERO GABRIEL INVIAS PARA PERMISO INTERVENCIÓN EN VÍAS NACIONALES DE LA VIRGINIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES Y SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

INGENIERO RESIDENTE

FIRMA
NOMBRE: JAEL DEL CARMEN MORENO CORTES
Matrícula Profesional No.: 522022-2769INRN

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	ADAPTADA
		PÁGINA	
		FECHA	13/03/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — SEMANA No.: 37 del 14/03/2025 al 20/03/2025 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FERNANDO GARCIA GIRALDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO		
INTEGRANTES:	ALTAGRACIA-CENTRO COMUNEROS		
CONTRATO No.	1955 1453 2014	VALOR INICIAL:	$ 757.530.000,00
FECHA DE INICIO CTA ALTAGRACIA	30/05/2024	VALOR REDUCCIÓN IVA	$ -
FECHA INCIO CTA COMUNEROS	4/0/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 757.530.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$ -

CONTRATO DE CONSULTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ADMON 143		
INTEGRANTES:	CONSORCIO ADMON 143		
CONTRATO No.	2884	VALOR INICIAL:	$ 3.089.425.878,00
FECHA DE INICIO:	9/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.089.425.878,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 757.530.000	$ 1.298.196.000	$ 860.334.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 538.439.151	$ 292.094.100,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 219.090.849	$ 1.006.101.900		
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.072.445.374	$ 1.213.306.150	$ 803.674.354	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 298.485.784	$ 116.078.400	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 773.959.590	$ 1.097.227.750	$ 803.674.354	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

PRESTACION DE SERVICIOS

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.298.196.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 292.094.100,00	22,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 292.094.100,00	22,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:
VALOR FACTURA:
VALOR FACTURA:

¡En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

CONSULTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 414.564.184,20	22,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 414.564.184,20	22,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	3,110%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	3,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

¡En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,94% — Avance o Atraso Físico % 22,50%
Meta Física Ejecutada % 1,94%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario Altagracia	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.032.200,00			$ 108.604.575,67	8,37%
					Ejec	$ 7.032.200,00			$ 108.604.575,67	8,37%
* Mantenimiento rutinario El Centro	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.661.500,00			$ 118.325.236,58	9,11%
					Ejec	$ 7.661.500,00			$ 118.325.236,58	9,11%
* Mantenimiento rutinario Comuneros	mes	0,23	2025		Prog	$ 10.549.000,00			$ 65.164.287,75	5,02%
					Ejec	$ 10.549.000,00			$ 65.164.287,75	5,02%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Nota: El equipo utilizado por las cooperativas de trabajo asociado se relacionan en fromato 15FR 4, el cual se entrega como soporte mensual de seguimiento.

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMOS ALTAGRACIA: RUTAS 2902 ,29RSA Y 29RSB
TRAMOS CENTRO: RUTAS 5585R1 Y 29RSA
TRAMO COMUNEROS: RUTAS 2507 Y 5003

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: NO APLOCA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta: „" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibil idad."...

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta: „" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilid ad."...

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica memorando/ 20245-VRIS-056915_16141

OBSERVACIONES:NO APLICA
Memorando: 20245-VRIS-056915_16141

V. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	OBRA	CONSULTORÍA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	33	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle 13 bis N°38-48 Barrio Guadalupe - Dosquebradas (Risaralda)

OBSERVACIONES: SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DIARIAS, PREOPERACIONALES DEL VEHÍCULO, SE ADELANTA INFORME MENSUAL AMV2, SE REALIZA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CON LA INGENIERA PRISCILA INTEGRANTE DEL COPPAST DE GOCSA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA TEAMS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 20241-VBOG-056484 - con asunto: Memo AMV y rut información referente a los contratos de administración vial..
„" es necesario aclarar que la Subdirección de Estructuración de proyectos, considerando la esencia de los contratos en men ción, esto es CONSULTORIA Y SERVICIOS, no incluyó obligaciones ambientales y/o sociales pues los contratos no fueron tipificados como obra y/o interventoría"...

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS SITIOS CRÍTICOS, EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ESTABLE.
SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A LAS RUTAS 50RS01,25RSA,5003,29RSB,2507,2902, 29RSA
SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS
SE REALIZA LIMPIEZA DE SEÑALES RUTA 2507, CTA COMUNEROS
LIMPIEZA DE ANDENES Y BERMAS RUTA 2902 ,CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA ROCERIA MECANICA Y LIMPIEZA DE LA RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO
SE REPORTA INTERVENCIÓN EN LA RUTA 2902 PR 1_{+}0460 POR PARTE DE SERVICIUDAD Y TAPAN HUECO CON TIERRA , CTA ALTAGRACIA
SE REPORTA DESBORDAMIENTO DE CAUCE , EL CUAL DEJA MATERIAL DE ARRASTRE EN EL PR 16_{+}0350 DE LA RUTA 50RS01 ,CTA EL CENTRO ANTIENDE LA LIMPIEZA PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA ZONA
SE ATIENDE DERRUMBE Y SE SEÑALIZA (RECORTE A LINEA DE BERMA PARA DAR TRANSITABILIDAD) EN LA RUTA 50RS01 PR 15_{+}0100, CTA EL CENTRO
SE REALIZA LIMPIEZA Y RECORTE DE RESIDUOS POR FLUJO Y SATURACIÓN PUNTO CRÍTICO DESLIZAMIENTO EN EL PR 13_{+}0350, CTA EL CENTRO
SE REALIZA DESPEJE DE CUNETA POR DESLIZAMIENTO EN LA RUTA 2507 PR 39_{+}0800,39+0300 CTA COMUNEROS
ATENCIÓN Y RECORTE DE DERRUMBE EN RUTA 50RS01,PR 18_{+}0950, CTA EL CENTRO
DESPEJE DE CUNETA POR PEQUEÑO DESLIZAMIENTO EN LA RUTA 50RS01,14+0850 Y PR14+14+0450, CTA EL CENTRO
SE REALIZA JORNADA DEPODA DE ÁRBOLES CON RAMAS SECAS POR PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN RUTA 50RS01 ,CTA EL CENTRO
SE REALIZA TAPAHUECOS CON FRESADO Y EMULSIÓN EN LA RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REALIZA ROCERÍA Y LIMPIEZA EN LA CALLE 15 RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO
SE REALIZA ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA LIMPIEZA DE SUMIDEROS RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA
SE REPORTA ATROPELLAMIENTO A CANINO POR FLOTA ACCIDENTAL RUTA 6430, SE REALIZA ATENCIÓN DE PRIMERA MANO Y SE LLEVA AL VETERINARIO, CTA COMUNEROS
ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 2507, CTA COMUNEROS
SE REPORTA VOLCAMIENTO DE CAMIÓN EN LA RUTA 2902 PR 0_{+}0730, CTA ALTAGRACIA

SUPERVISIÓN:

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°1453-2024
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°1455-24
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA COMUNEROS, BAJO EL CONTRATO N°3814-24

CONSULTORIA:

SE REALIZA LEVANTAMIENTO RUTA 50RS01, 5003 DE FORMA MANUAL
SE REALIZAN REPORTES DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DIARIAMENTE A LAS 6AM Y 4PM
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 2415, EN LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA RUTA 50RS01 PR 19_{+}0650, FALTA PINTAR NEW JERSEY
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3821 EN LA RUTA 50RS01 PR 31_{+}0050,SE CULMINA LABOR EN MURO, SE ESPERA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN CONOCER LAS NUEVAS INTERVENCIONES A REALIZAR EL CONTRATISTA
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4161, EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MPIO DE VITERBO
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4025,ENCARGADO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RUTA 2902 PR 0_{+}0000 AL PR 5_{+}800 (SUSPENDIDO)
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS LABORES EJECUTADAS POR LAS COOPERATIVAS ALTAGRACIA, EL CENTRO, COMUNEROS
SE EMITE RESPUESTA A LOS COMUNICADOS RECIBIDOS POR LA TERRITORIAL
REALIZA CAPACITACION MENSUAL A LAS COOPERATIVAS ALTAGRACIA, EL CENTRO Y COMUNEROS EN EL TEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONAL, DIRIGIDA POR EL ABOGADO JORGE ANDRÉS HOLGUÍN
SE ENVÍA INFORME DE ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS RUTA 50RS01 A DITRIS.
SE REALIZA RECORRIDO CON PERSONAL DEL INGENIO RISARALDA A LAS RUTAS 2507 Y 50RS01,SE ANEXA ACTA DE COMITE.
PARTICIPACIÓN EN COMITE DE SEGUIMIENTO AMV´S EL DÍA LUNES 17/03/2025.
SE REALIZA ATENCIÓN Y APOYO CON SEÑALIZACIÓN EN LOS DERRUMBES OCURRIDOS EL DIA 16/03/2025, SE RECORTAN CON APOYO DE LA CTA EL CENTRO
SE REALIZA PLEGABLE PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA Y A SU VEZ REALIZAR ENTREGA EN TODAS LAS RUTAS A CARGO LA SEMANA ANTES DE LA SEMANA SANTA
SE REPORTA ANTE INGENIO RISARALDA AFECTACIÓN EN LA VIA(RESIDUOS DE PANTANO Y RAMAS POR EXTRACCIÓN DE CAÑA).
SE SOLICITA APOYO PARA RETIRO DE MATERIAL ACOPIADO EN BERMAS POR DERRUMBES DE LA RUTA 50RS01 AL CONTRATO 2415.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Inspección de las rutas a cargo.
- Supervisión contratos de mantenimiento rutinario
- Cómite deguridad vial Dosquebradas
- Revisión sitios criticos ruta 50RS01
- Mesa de trabajo Supervisión
- Proyecto acta de modificación
- Respuesta a comunicados remitidos.
- Visita derecho de petición
- Proyección acta de pago ctvas. AMV

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMITÉ SEGUIMIENTO AMV´S Y GVI



RECORTE DERRUMBES RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO



ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA



LIMPIEZA BERMAS RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA



SEÑALIZACIÓN DE DERRUMBES AMV2, APOYO CTA EL CENTRO



JORNADA TAPAHUECOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES Y SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

INGENIERO RESIDENTE

FIRMA
NOMBRE: JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
Matricula Profesional No.: 5220220276 9NRN

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	ADAPTADA
		PÁGINA	
		FECHA	27/03/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — SEMANA No.: 38 del 21/03/2025 al 27/03/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FERNANDO GARCIA GIRALDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA: COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
INTEGRANTES: ALTAGRACIA-CENTRO COMUNEROS
CONTRATO No. 1455 / 453 /2024 — VALOR INICIAL: $ 2.915.564.672,00
FECHA DE INICIO CTA ALTAGRACIA Y CENTRO: 30/05/2024 — VALOR REDUCCIÓN IVA
FECHA INICIO CTA COMUNEROS 4/10/2024 — VALOR ACUMULADO: $ 2.915.564.672,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — $ -
$ -

CONTRATO DE CONSULTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMON 143
INTEGRANTES: CONSORCIO ADMON 143
CONTRATO No. 2084 — VALOR INICIAL: $ 3.089.425.878,00
FECHA DE INICIO: 9/07/2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/07/2026 — VALOR ACUMULADO: $ 3.089.425.878,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2026 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 757.530.000	$ 1.298.196.000	$ 810.334.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 538.439.151	$ 317.336.800,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 219.090.849	$ 980.859.200		
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.072.445.374	$ 1.213.306.150	$ 803.674.354	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 298.485.784	$ 116.078.400	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 773.959.590	$ 1.097.227.750	$ 803.674.354	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.298.196.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 317.336.800,00	24,44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 317.336.800,00	24,44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025

VALOR FACTURA CENTRO :	$ 33.402.150,00
VALOR FACTURA ALTAGRACIA:	$ 30.658.565,45
VALOR FACTURA COMUNEROS:	$ 45.960.900,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Se tiene radicada las actas en la entidad territorial desde el 12 de marzo de 2025,

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR IC	
En el mes:	
Acumulado:	

CONSULTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 414.564.184,20	22,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 414.564.184,20	22,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	3,110%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	3,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N/A
PERIODO FACTURADO: DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 1,94% — Avance o Atraso Físico % 24,44%
Meta Física Ejecutada % 1,94%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario Altagracia	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.032.200,00			$ 117.990.156,28	9,09%
					Ejec	$ 7.032.200,00			$ 117.990.156,28	9,09%
* Mantenimiento rutinario El Centro	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.661.500,00			$ 128.550.874,31	9,90%
					Ejec	$ 7.661.500,00			$ 128.550.874,31	9,90%
* Mantenimiento rutinario Comuneros	mes	0,23	2025		Prog	$ 10.549.000,00			$ 70.795.769,41	5,45%
					Ejec	$ 10.549.000,00			$ 70.795.769,41	5,45%
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMOS ALTAGRACIA: RUTAS 2902 ,29RSA Y 29RSB
TRAMOS CENTRO: RUTAS 55RS01 Y 29RSA
TRAMO COMUNEROS: RUTAS 2507 Y 5003

MAQUINARIA Y EQUIPO

Nota: El equipo utilizado por las cooperativas de trabajo asociado se relacionan en fromato 15FR 4, el cual se entrega como soporte mensual de seguimiento.

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO — DISPONIBLE
UBICACIÓN: N/A — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: NO APLICA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
„" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibil idad."...

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
„" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibil ad."...

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica memorando/ 20245-VRIS-056915_16141

OBSERVACIONES:NO APLICA
Memorando: 20245-VRIS-056915_16141

V. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	OBRA	CONSULTORÍA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	33	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 13 bis N°38-48 Barrio Guadalupe - Desquebradas (Risaralda)

OBSERVACIONES: SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DIARIAS, PREOPERACIONALES DEL VEHÍCULO, SE ADELANTA INFORME MENSUAL AMV2, SE REALIZA COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CON LA INGENIERA PRISCILA INTEGRANTE DEL COPPAST DE GOCSA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA TEAMS.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 2024I-VBOG-056484 - con asunto: Memo AMV y rut información referente a los contratos de administración vial.,
„" es necesario aclarar que la Subdirección de Estructuración de proyectos, considerando la esencia de los contratos en men ción, esto es CONSULTORIA Y SERVICIOS, no incluyó obligaciones ambientales y/o sociales pues los contratos no fueron tipificados como obra y/o interventoría"...

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SUPERVISIÓN:

CONSULTORIA:

SE REALIZA LEVANTAMIENTO RUTA 50RS01, 5003 DE FORMA MANUAL

SE REALIZAN REPORTES DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DIARIAMENTE A LAS 6AM Y 4PM

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 2415, EN LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA RUTA 50RS01 PR 19+0650, FALTA PINTAR NEW JERSEY

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3821 EN LA RUTA 50RS01 PR 31+0050 SE CULMINÓ LABOR EN MURO, SE TIENE PENDIENTE LA MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4161, EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MPIO DE VITERBO

SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4025,ENCARGADO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RUTA 2902 PR0+0000 AL PR 5+800 (SUSPENDIDO)

SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS LABORES EJECUTADAS POR LAS COOPERATIVAS ALTAGRACIA, EL CENTRO, COMUNEROS

SE EMITE RESPUESTA A LOS COMUNICADOS RECIBIDOS POR LA TERRITORIAL

SE REALIZA CAPACITACIÓN FORMATOS AREA SST DE LA AMV2 A LAS COOPERATIVAS CENTRO Y ALTAGRACIA

SE SOLICITAL AL INGENIO RISARALDA REALIZAR LIMPIEZA DE LA RUTA 50RS01, EN ATENCION A LOS RESIDUOS DEJADO POR EL RETIRO DE CAÑA EN LA ZONA

SE SOLICITA A LAS COOPERATIVAS REALIZAR LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES RUTINARIAS SEGÚN CLAUSULAS DEL CONTRATO DE CADA COOPERATIVA Y ANEXO TECNICO.

SE PARTICIPÓ EN COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL DOSQUEBRADAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Inspección de las rutas a cargo.
- Supervisión contratos de mantenimiento rutinario
- Reunión proveedor pintuco
- Proyecto acta de modificación
- Respuesta a comunicados remitidos.
- Visita derecho de petición
- Proyección acta de pago ctvas. AMV

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



MESA DE TRABAJO TRÁNSITO DOSQUEBRADAS Y AMV2



ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 29RSA (PARQUE DEBAJO DEL VIADUCTO), CTA ALTAGRACIA



LAVADO Y LIMPIEZA DE SEÑALES RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO



RECUPERCAIÓN ENCOLE RUTA 2507, CTA COMUNEROS



ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR CAÍDA DE ÁRBOL RUTA 5003, CTA COMUNEROS



LIMPIEZA DE BERMAS RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES Y SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

INGENIERO RESIDENTE

FIRMA

NOMBRE: JAIC DEL CARMEN MORIANO CORTES

Matrícula Profesional No.: 5220220276 9NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN15-FR-3
VERSIÓN	ADAPTADA
PÁGINA	
FECHA	3/04/2025

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA: GESTION INTEGRAL NACIONAL DE VIAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: RISARALDA — SEMANA No.: 30 del 28/03/2025 al 3/04/2025 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: FERNANDO GARCIA GIRALDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA:

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA:	COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO		
INTEGRANTES:	ALTAGRACIA-CENTRO-COMUNEROS		
CONTRATO No.	1455-1453-3814	VALOR INICIAL:	$ 2.915.564.672,00
FECHA DE INICIO CTA ALTAGRACIA Y CENTRO:	30/05/2024	VALOR REDUCCIÓN IVA	
FECHA INICIO CTA COMUNEROS	4/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2.915.564.672,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026		$ -
			$

CONTRATO DE CONSULTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ADMON 143		
INTEGRANTES:	CONSORCIO ADMON 143		
CONTRATO No.	2004	VALOR INICIAL:	$ 3.089.425.878,00
FECHA DE INICIO:	9/07/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/07/2026	VALOR ACUMULADO:	$ 3.089.425.878,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026	2027
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 757.530.000	$ 1.298.196.000	$ 810.334.000	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 538.439.151	$ 342.579.500,00		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 219.090.849	$ 955.616.500		
CONSULTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.072.445.374	$ 1.213.306.150	$ 803.674.354	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 298.485.784	$ 116.078.400	$	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 773.959.590	$ 1.097.227.750	$ 803.674.354	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.298.196.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 342.579.500,00	26,39%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 342.579.500,00	26,39%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 25.242.700,00	1,94%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 25.242.700,00	1,94%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 01 AL 28 DE FEBRERO

VALOR FACTURA ALTAGRACIA:	$ 30.658.565,45
VALOR FACTURA EL CENTRO:	$ 30.600.150,00
VALOR FACTURA COMUNEROS:	$ 15.990.900,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: HASTA LA FECHA NO SE EVIDENCIA PAGO DE LAS ACTAS

CONSULTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 414.564.184,20	22,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 414.564.184,20	22,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	9,110%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.353.051,00	9,11%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NA
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N/A
Amortizado $	N/A
Saldo $	N/A

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 1,94% — Avance o Atraso Físico % 26,39%
Meta Física Ejecutada % 1,94%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Mantenimiento rutinario Altagracia	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.032.200,00			$ 127.375.736,89	9,81%
					Ejec	$ 7.032.200,00			$ 127.375.736,89	9,81%
Mantenimiento rutinario El Centro	mes	0,23	2025		Prog	$ 7.661.500,00			$ 138.776.512,04	10,69%
					Ejec	$ 7.661.500,00			$ 138.776.512,04	10,69%
Mantenimiento rutinario Comuneros	mes	0,23	2025		Prog	$ 10.549.000,00			$ 76.427.251,07	5,89%
					Ejec	$ 10.549.000,00			$ 76.427.251,07	5,89%
					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMOS ALTAGRACIA: RUTAS 2902 ,29RSA Y 29RSB
TRAMOS CENTRO: RUTAS 2905D Y 2915A
TRAMO COMUNEROS: RUTAS 2907 Y 5003

MAQUINARIA Y EQUIPO

Nota: El equipo utilizado por las cooperativas de trabajo asociado se relacionan en fromato 15FR 4, el cual se entrega como soporte mensual de seguimiento.

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN: N/A	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: NO APLOCA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
„" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilidad."...

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 20245-VRIS-056915_16141 de fecha 20 de agosto de 2024, con asunto: Información sobre los contratos de AMVS y cta. en el cual se argumenta:
„" En este sentido, la administración vial no es de interventoría, así como el de servicios de mantenimiento ritinario, no es de obra, no les es aplicable los formatos del manual de interventoría, referentes a informes trimestrales ambientales, y/o PAGA, por tanto, no deben remitir lo correspondiente a la Subdirección de sostenibilidad."...

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: No aplica memorando/ 20245-VRIS-056915_16141

OBSERVACIONES:NO APLICA
Memorando: 20245-VRIS-056915_16141

V. GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	OBRA	CONSULTORÍA
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	33	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 38

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: NA
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Calle 13 bis N°38-48 Barrio Guadalupe - Dosquebradas (Risaralda)

OBSERVACIONES: SE REALIZA INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DE FEBRERO ATENDIENDO IPATS REMITIDO POR LA SECRETARIA DE TRÁNSITO DE DOSQUEBRADAS, INFORME SST MENSUAL INSPECCIÓN DE DOTACIÓN Y EPP CONSORCIO ADMON 143,

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES:NO APLICA
De acuerdo a memorando 20241-VBOG-056484 - con asunto: Memo AMV y rut información referente a los contratos de administración vial.
„" es necesario aclarar que la Subdirección de Estructuración de proyectos, considerando la esencia de los contratos en mención, esto es CONSULTORIA Y SERVICIOS, no incluyó obligaciones ambientales y/o sociales pues los contratos no fueron tipificados como obra y/o interventoría"...

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO APLICA

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SE REALIZAN REPORTES DIARIOS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE, PARA INFORMAR EL ESTADO DE LAS VIAS A CARGO
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LOS SITIOS CRÍTICOS, EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ESTABLE.
SE REALIZA RECORRIDOS RUTINARIOS A LAS RUTAS 50RS01,29RSA,5003,29RSB,2907,2902, 29RSA
SE REALIZA INFORME SITIOS CRITICOS
SE REALIZA JORNADA TAPA HUECOS RUTA 2902, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA JORNADA DE TAPA HUECOS EN LA RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO
SE REALIZA LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN TIERRA RUTA 5003,CTA COMUNEROS
SE REALIZA LIMPIEZA DE CUNETAS RUTA 29RSA, CTA. ALTAGRACIA
JORNADA DE TALA DE ÁRBOLES MUERTOS EN PIE, POR PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO A LOS USUARIOS VIALES EN LA RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO
LIMPIEZA DE CALZADA CON MANEJO DE TRANSITO (PALETEROS), RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO
SE REALIZA ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA DESPEJE DE SEÑALES RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO
SE REPORTAN LABORES DE INSTALACION DE PAVIMENTO EN LA RUTA 5003, PR 75+0650, POR PARTE DE CONTRATISTA VINCULADO A LA ESP DE VITERBO
SE REALIZA ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 5003, CTA COMUNEROS
CORTE Y PERFILACIÓN DE DERRUMBE A NIVEL DE CUNETA EN LA RUTA 5003 PR 73+0300, CTA COMUNEROS
SE REALIZA CORTE Y RETIRO DE DESLIZAMIENTO A NIVEL DE CUNETA EN LA RUTA 50RS01 PR 18+0950, CTA EL CENTRO
SE REALIZA JORNADA DE TAPAHUECOS EN LA RUTA 5003, CTA COMUNEROS
SE REALIZA LIMPIEZA DE SEÑALES EN LA RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO
SE REALIZA ROCERÍA Y LIMPIEZA RUTA 29RSB, CTA ALTAGRACIA
SE REALIZA LIMPIEZA DE BERMAS RUTA 29RSA, CTA ALTAGRACIA

SUPERVISIÓN:

SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA CENTRO, BAJO EL CONTRATO N°1453-2024
SE REALIZA LA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA ALTAGRACIA, BAJO EL CONTRATO N°1455-24
SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CTA COMUNEROS, BAJO EL CONTRATO N°3814-24

CONSULTORIA:

SE REALIZA LEVANTAMIENTO RUTA 50RS01, 5003 DE FORMA MANUAL
SE REALIZAN REPORTES DEL ESTADO DE LAS VÍAS A CARGO DIARIAMENTE A LAS 6AM Y 4PM
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 2415, EN LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA RUTA 50RS01 PR 19+0650. FALTA PINTAR NEW JERSEY
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 3821 EN LA RUTA 50RS01 PR 31+0050.SE CULMINA LABOR EN MURO. SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR. PARA SEGUIMIENTO DE LAS NUEVAS OBRAS
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4161, EN LA EJECUCION DE OBRAS EN EL MPIO DE VITERBO
SE REALIZA SEGUIMIENTO AL CONTRATO 4025 ENCARGADO DE LA REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RUTA 2902 PR0+0000 AL PR 5+800 (SUSPENDIDO)
SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS LABORES EJECUTADAS POR LAS COOPERATIVAS ALTAGRACIA, EL CENTRO, COMUNEROS
SE EMITE RESPUESTA A LOS COMUNICADOS RECIBIDOS POR LA TERRITORIAL
SE REALIZA VISITA A QUEBRADA LA MINA RICA EN COMPAÑÍA DE FUNCIONARIO DE LA ESP LA VIRGINIA CON EL FIN DE EVIDENCIAR DESCOLES INFORMALES
SE REALIZA COMPRA DE INSUMOS (EMULSIÓN Y ASFALTO EN FRÍO) PARA REALIZAR JORNADAS DE TAPAHUECOS CON LAS COOPERATIVAS A CARGO.
SE REALIZA GESTIÓN CON COORDINADOR DEL INGENIO PARA REALIZAR LOGISTICA LIMPIEZA DE CANALES, OBRAS COLMATADAS Y ZANJA DE CORONACIÓN CON MAQUINARIA EL DÍA (04/04/2025)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- Inspección de las rutas a cargo.
- Supervisión contratos de mantenimiento rutinario
- Realizar rocería ruta 2507, para que el ingenio realice limpieza de canales obstruidas por labores de los mismos .
- Respuesta a comunicados remitidos.
- Visita derecho de petición
- Proyección acta de pago civas. AMV

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISITA QUEBRADA MINA RICA AMV2- FUNCIONARIO ESP LA VIRGINIA



LIMPIEZA DE CALZADA MANUAL, CTA EL CENTRO



LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS RUTA 5003, CTA COMUNEROS



LIMPIEZA DE DERRUMBE RUTA 50RS01, CTA EL CENTRO



JORNADA TAPAHUECOS RUTA 5003, CTA COMUNEROS



LIMPIEZA DE CUNETAS Y BERMAS RUTA 29RSA Y OREJAS, CTA ALTAGRACIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE REALIZAN RECORRIDOS VIALES Y SITIOS CRITICOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACION VIAL

INGENIERO RESIDENTE

FIRMA
NOMBRE: JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
Matrícula Profesional No.: 5202020276IINRR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ACTAS DE COMITÉ

COMITÉ DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
ACTA No. 01 DE 2025

PROCESO: CONTROL Y VIGILANCIA VIAL, SEGURIDAD VIAL	**Fecha:** 11/03/2025
Asistentes: FUNCIONARIOS y REPRESENTANTES DE ENTIDADES CONFORME A LISTADO DE ASISTENCIA ANEXA EN 1 FOLIO	**Hora de Inicio:** 09:15 horas
Tema: REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ	**Hora Fin:** 10:15 horas
Responsable: SECRETARIO DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD	**Elaborado Por:** Diana Patricia Duque Vera – Técnico Administrativo
Dependencia: SECRETARIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD	
Lugar: RECINTO DEL CONCEJO DE LA VIRGINIA (PRESENCIAL)	

AGENDA

1. Verificación de asistencia de los integrantes del comité
2. Observatorio estadístico de Seguridad Vial – Siniestralidad Vial
3. Estrategias de control al transporte informal e ilegal
4. Socialización de la programación de actividades en la Semana de la Seguridad Vial, a realizarse del 21 al 25 de abril de 2025 y vinculación de los integrantes del comité a las actividades programadas
5. Proposiciones y varios

Siendo las 9:15 a.m. se valida el quorum, previa convocatoria a la reunión se verificaficando la asistencia de los integrantes de este comité, el cual es un comité asesor en temas de seguridad vial y movilidad.

Ante la ausencia del señor Alcalde, preside la presente reunión el Secretario de Tránsito y Movilidad de La Virginia, quien saluda y da la bienvenida a los integrantes e invitados del Comité, agradeciendo la asistencia, con lo cual se da inicio a la reunión convocada, procediendo a la verificación de los asistentes:

1. **VERIFICACION DE LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES**: Se inicia con el llamado a lista de los convocados:

- Alcalde (Quien preside el comité) **Ausente**.

Ante la ausencia del Alcalde, quien preside es el Secretario de Tránsito y Movilidad como lo indica el Decreto N°. 114 de 2020.

- Secretario de Gobierno: **Presente.**
- Secretario de Desarrollo Social: **Presente.**
- Secretario de Planeación: **Presente**
- Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad: **Presente, Delegó asistencia a Director TIC´S**
- Subsecretaria de Salud Pública: **Presente.**
- Director Técnico de Infraestructura: **Ausente.**
- Jefe de la Oficina de Ordenamiento Territorial: **Presente.**
- Jefe de la Oficina de Espacio Público: **Presente.**

COMITÉ DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
ACTA No. 01 DE 2025

- Comandante de Agentes de Tránsito: **Presente.**
- Comandante de la Policía Municipal: **Presente.**
- Comandante del Cuerpo de Bomberos: **Ausente**
- Personera Municipal: **Ausente, presentó excusas previamente.**
- Presidente del Concejo: **Ausente.**
- Presidente de Asojuntas: **Ausente.**
- Gerente ESE Hospital San Pedro y San Pablo: **Presente, Delegó asistencia a Subgerente**
- Gerente E.S.P. La Virginia: **Presente, Delegó asistencia a Subgerente**
- Representante Organismos de Socorro –
- Profesional Universitario de Gestión Riesgo: **Presente**

Representante de Establecimientos de Comercio
- Felipe Posada: **Ausente.**

Empresas de Transporte Publico convocadas:
- Líneas Pereiranas - LIPSA: **Ausente**
- Flota Occidental: **Ausente**
- Sociedad de Transportadores La Virginia: **Ausente**
- Transapia: **Ausente**
- Transporte Tatamá: **Ausente**
- Transportes Zapata: **Ausente.**

- Concesión Pacifico Tres: **Presente**

Invitados:

- Laura Victoria Hidalgo Yepes – AMCO
- Kelly J. Ramírez – INVIAS
- Cristian Osorio – Policía de Carreteras

NOTA: Los demás invitados de: MEGABUS, A.N.S.V., GOBERNACION DE RISARALDA no asistieron a la reunión programada y enviada con antelación.

Una vez instalado el comité, se da inicio a la reunión programada con los asistentes a la reunión.

Acto seguido, el Secretario de Tránsito y Movilidad del municipio de La Virginia Juan Alejandro Marulanda Montes, da la bienvenida a la reunión programada y se inicia con el orden del día propuesto a través de una presentación - Diapositivas:

2. **OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD VIAL – SINIESTRALIDAD VIAL con fecha de corte 28 de febrero de 2025:** El Secretario de Tránsito y Movilidad Dr. Juan Alejandro Marulanda Muñoz, explica los datos estadísticos de la siniestralidad vial en el Municipio de La Virginia y su detalle a los asistentes (Se adjunta presentación e informe del técnico operativo de tránsito).

COMITÉ DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
ACTA No. 01 DE 2025

3. ESTRATEGIAS DE CONTROL AL TRANSPORTE INFORMAL E ILEGAL:

Informa al respecto el Secretario de Tránsito y Movilidad Dr. Juan Alejandro Marulanda Muñoz sobre los operativos realizados por parte de los agentes de tránsito contra el transporte informal e ilegal (Se adjunta presentación e informe detallado presentado por el técnico operativo de tránsito).

4. SOCIALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL A REALIZARSE DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2025 Y VINCULACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS: En este momento de la reunión, el Secretario de Tránsito y Movilidad Dr. Juan Alejandro Marulanda Muñoz, expone a los presentes la programación con las actividades a realizarse cada día (Se adjunta presentación y cronograma de actividades)

Acto seguido, el Secretario de Tránsito y Movilidad, solicita acompañamiento y articulación de los integrantes e invitados al presente comité, en las diferentes actividades que se realizaran en la semana de la seguridad vial en abril del presente año.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS:

- LAURA VICTORIA HIDALGO YEPES – Subgerente AMCO: Solicita realizar la apertura de la semana de la Seguridad Vial el día 21 de abril, toda vez que el señor Alcalde se encontrará en reunión metropolitana toda la mañana ese mismo día.

Respecto al tema, el Secretario de Tránsito y Movilidad indicó que se revisará el tema para verificar que se realice la apertura con la Gestora Social en reemplazo del señor Alcalde y así no cambiar la actividad previamente programada con los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, las cuales pueden asistir en horas de la mañana.

Prosigue la Dra. Laura Victoria, indicando que el AMCO se vincula a la semana de la seguridad vial con Yehison Ramírez educador vial del AMCO, quien tiene todos los conocimientos y experticia frente al tema para colaborar y fortalecer las capacitaciones requeridas. También sugiere que se realice una actividad con la Secretaria de Gobierno, Secretaria de Tránsito y con el acompañamiento del AMCO para generar una estrategia masiva en el municipio "Si vas a tomar, entrega las llaves", actividad que se tendrá en cuenta en el cronograma finalizando la semana de la seguridad vial.

Por último, interviene el funcionario del AMCO Yehison Ramírez, quien solicita una reunión previa con los agentes de tránsito y reguladores viales para concertar una capacitación sobre la pedagogía que debe utilizar el personal operativo en las diferentes actividades y operativos que realizan.

- BIBIANA VERA CARO – Subsecretaria de Salud: Solicita incluir para las actividades de jueves y viernes dentro de la semana de la seguridad vial incluir la estrategia saber beber, saber vivir a cargo de la subsecretaria de salud publica.

COMITÉ DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
ACTA No. 01 DE 2025

- CRISTIAN OSORIO – Jefe red SITRA, informa que en el municipio de Viterbo Caldas la semana de la seguridad vial se realizará del 22 al 26 de abril, que la A.N.S.V. – Agencia Nacional de Seguridad Vial apoya con la capacitación a los agentes de tránsito en el manejo de alcohosensores. También solicita que en la programación del jueves en la mañana, no solo se incluya a los concesionarios de motocicletas y almacenes que venden accesorios y repuestos, sino también a los centros de reconocimiento de conductores (CRC), actores importantes para la prevención en siniestralidad vial.

- CARLOS ALBERTO QUINTERO – Representante de Pacifico Tres indica que el viernes 25 de abril en horas de la mañana estará dicha entidad realizando la actividad programada en el sector de la Variante.

- JORGE IVAN CORTES – Director TIC´S, propone realizar publicidad en los diferentes establecimientos de comercio (bares y cantinas) sobre entregar las llaves si va a tomar y demás mensajes persuasivos que eviten la siniestralidad vial.

- GUSTAVO VELEZ MENA – Gestión del Riesgo y representante de los organismos de socorro indica que no solo el cuerpo de bomberos puede realizar la capacitación en primeros auxilios, que también la cruz roja puede realizar una muestra representativa del tema en el marco de la feria para motociclistas el jueves 24 de abril en la mañana. Al respecto el AMCO apoya con el suministro de volantes requeridos.

- CATHERINE CARDONA – Jefe de oficina Ordenamiento Territorial: Indica que la Secretaria de Planeación apoyará la feria el 24 de abril a través de entrega de información importante sobre la importancia de contar con el uso de suelo conforme al momento de contar con un establecimiento de comercio y de esta manera fomentar la cultura ciudadana en estos espacios.

- RICARDO GOMEZ – Subgerente de la ESE Hospital San Pedro y San Pablo, solicita que dentro de las jornadas de capacitación se enfatice sobre el uso adecuado del SOAT requerido para los conductores, verificar que sea un SOAT legal y no sea uno falsificado, esto se requiere al momento de la atención de los diferentes tipos de accidentes de tránsito. También indica que se coordinará con el Hospital Universitario San Jorge a fin de contar dentro de la semana de la seguridad vial con una actividad con el banco de sangre – para donación de sangre en el Hospital San Pedro y San Pablo.

- KELLY J. RAMIREZ – INVIAS: Solicita un espacio para ubicar un stand el 24 de abril de 2025 en la mañana dentro de la feria de motociclistas para entregar folletos de importancia para los actores viales.

- JOHAN TORRES RIOS – Subgerente ESP LA VIRGINIA – Se refiere al tema de inservibles y la importancia de capacitar a las personas en el horario y días de recolección de basuras en el municipio para generar cultura ciudadana, actividad que se incluirá el martes 22 de abril de 2025 a partir de las 2:00 pm.

- CRISTIAN OSORIO – Policía Nacional interviene de nuevo, refiriéndose a los piques ilegales en el sector entre el Ingenio Risaralda y Puente Trompetas, por lo que solicita expedir un decreto prohibiendo la salida por parte de menores de edad a las vías nacionales, a fin de evitar piques ilegales y así salvar vidas. Interpela el Secretario de Tránsito y Movilidad indicando que también se debe tener en cuenta el gravity

COMITÉ DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
ACTA No. 01 DE 2025

bike, así como las carreras callejeras, por lo que sería importante programar un operativo grande con la policía nacional, infancia y adolescencias, secretaria de gobierno y demás autoridades involucradas. También indica que hay que atacar las motocicletas modificadas a 2 tiempos que transitan por la via de Pacifico Tres. Por último, termina indicando que el Decreto Municipal solicitado deberá ser analizado por el área jurídica del municipio para verificar su viabilidad o no.

- CARLOS ENRIQUE HERRERA – Instructor CIA: Aclara indicando que la capacidad es muy reducida por parte de los agentes de tránsito, por lo que se hace necesaria la colaboración de otras autoridades de tránsito, indica que los piques se realizan los fines de semana en horario nocturno y que el impacto a esta clase de actividades lo genera un operativo con un grupo nutrido con policía de carreteras, comisaria de familia, policía de infancia y adolescencia y demás autoridades involucradas en el asunto.

Interpela CRISTIAN OSORIO solicitando al Secretario de Tránsito y Movilidad crear un grupo de whatsapp para atender esta problemática y programar un operativo masivo que impacte estos hechos presentados en la via concesionada por Pacifico Tres.

Siendo las 10:15 a.m. se da por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia a los presentes.

NOTA: La presente acta contiene una relación sucinta de los temas tratados, de las personas que intervinieron, de las proposiciones y sugerencias presentadas, de las decisiones adoptadas y los compromisos establecidos.

MATERIAL FOTOGRAFICO:



COMITÉ DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
ACTA No. 01 DE 2025





ANEXOS:

- CONVOCATORIA A REUNION
- PRESENTACION
- SINIESTRALIDAD DETALLADA Y BASE DE DATOS (OBSERVATORIO)
- INFORME DE TRANSPORTE INFORMAL E ILEGAL
- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL
- MATERIAL FOTOGRAFICO DE LA REUNION ADJUNTO EN LA PRESENTE ACTA.
- ASISTENCIA FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.

	Asuntos y/o Compromisos	Responsable del Compromiso
COMPROMISOS	• Acompañamiento y apoyo en las actividades de la semana de la Seguridad Vial en abril de 2025	Integrantes e Invitados del Comité de Movilidad y Seguridad Vial
	• Viabilidad de expedición de Decreto solicitado	Secretario de Tránsito y Movilidad y Área Jurídica
	• Enfatizar uso adecuado de SOAT en capacitaciones de seguridad vial	Educadores viales e Instructor CIA
	• Apoyo y coordinación de Actividades de la Semana de la Seguridad Vial	Jaime Andrés Román Pineda – Contratista de Tránsito y Movilidad

FIRMA DE LOS ASISTENTES- FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA	
NOMBRE	**FIRMA**
JUAN ALEJANDRO MARULANDA MUÑOZ – Secretario de Tránsito y Movilidad	
SE ADJUNTA FIRMA DE ASISTENTES A LA REUNION	01 FOLIO ADJUNTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA	Código: A22P0-55 Versión:3 Vigencia: 05/01/2024 Pagina: 1 de 1
	Revisado Por: Comité Integrado de Gestión	Aprobado Por: Representante por la Dirección

FORMATO CONSTANCIA ASISTENCIA

TEMAS: REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL - TRIMESTRE I-2026

FECHA: 11/03/2026 LUGAR: RECINTO DEL CONCEJO DE LA VIRGINIA

No.	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Carlos Alberto Quintero	10538746408	CPS	C. Operacion	3146201532	carlosquintero@pa	
2	ESTEBAN ALVAREZ B	1088354753	SEC. Planeación	SEC	3243881101	—	
3	Ricardo Gomez	10.001151	S6. Medica	ESE JR, SP	3117483695		
4	Cristian Osorio Montes	1.010.976.963	Sobre - Ruta	Sibyge Sobre	3107880067	—	
5	Kelly J. Ramirez C	1088007166	AMV 2.	Aux ing	3005187271	Kjraveno.civil@	
6	Andres Mauricio Alvarez	1130907248	PANAL	Sb CMTE. EST	3103628591	AC.mauricio@	
7	Yelissa Ramirez	1082257760	AMCO	Contratista	3170379034	Yelissaramirez	
8	Laura Hidalgo Perez	1085324647	AMCO.	Subdirectora	3153140854	Subdirectacentro @gmail.com	
9	Gustavo Velez Mena	10051248	CMGRD	Coord. Mpal	3145734686		
10	Ana Maria Moreno B.	1114.210600	Desarrollo Social	SEC	3217632461	desarrollosocial@lavirginia-risaralda	Ana Mª Moreno B.
11	Biviana Vargas Cano	42030446	Salud	Jefe. Salud	3012441625	Salud@lavirginia-risaralda.gov.co	
12	Carlos Enrique Correa	10'050.364	Transito Mpal	Inst CIA	3232892838	carlos.henao@360 @cosur.gov.co	
13	Catherine Cardona Castaño	1088022217	Jefe Of O.T	Jefe Of	3239629881	—	
14	Camilo Bayer. C.	1087052353	Gobierno	SEC.	3205073198		
15	Victor Alfonso Marroco	14295901	Gobierno	Esp. Publico	3216194268	espacopublico@lavirginia-risaralda.gov.co	
16	Jorge Cortes P.	1014203491	Competitividad	Dirtic	3142462477	tic@lavirginia-risaralda.gov.co	
17	Jaime Andres Roman	1088547680	Transito	Conductor	3136480279	jimmi.1986@gmail.com	
18	Johan Tovres Rios	1088241755	ESP.	Subgerente	3108486035	subgerente.covenca@	
19	Edinson Zapata	1054081554	S. Tránsito	Tecnico.	3103701115	—	
20							
21							
22							
23							
24							
25							

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

LISTADO DE ASISTENCIA REUNIÓN EXTERNA

Versión: 3 | Vigencia: 02-2014

Nombre de la Reunión:
Fecha:
Lugar:
Facilitador:
Hora Inicio:
Hora Finalización:

	Nombre	Entidad	Cargo	Teléfonos	Correo Electrónico	Dirección	Municipio	Firma	Autorizo Uso de Datos SI	Autorizo Uso de Datos NO
1										
2										
3	Carlos Giovanni Díaz Borja	Secretaria de Infraestructura de Risaralda	Contratista	314 8144122	c_diaz_borja@hotmail.com	Palacio Nacional Piso 7	Pereira			
4	Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez	Secretaria de Infraestructura de Risaralda	Profesional Especializada	305 3194136	cristina.spaggiari@risaralda.gov.co	Palacio Nacional Piso 7	Pereira		X	
5	Jair lopez T.	E.S.P la Virgin	Profesional Universitario	3185327915	profesionaluniversitario esp.-lavirginia-risaralda.gov.co		la Virginia			
6	JAEL MORANO	INVIAS.	Residente AMV 2	3117806016.	consorcioadmon143 @ gmail.com.	DOS-Risaralda.	DOS.			
7	Gabriel Garrido	Invias	Prof. Univ 2044 -1	3103249499	ggarrido@inviasgor.co	DT- Ris	Pereira			
8	Cesar lo Sierra	ESP la Virgina	CPS-009	3216754159	xsr.ingcivil@ggrail.com		la Virginia			
9	Pablo Asorio	ESP la Virginia	CPS 017	3164463324	valonart@hotmail.c		la Virginia			
10	Esteban Alvarez	Planeación	SEC	3043881145	—	Alcaldía	la Virginia			
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										

Powered by CamScanner

Sistema de Gestion de calidad

Formato No :	ADMON143-001
Fecha de creacion:	9/7/2024

CONSORCIO ADMON 143
ACTA DE COMITÉ

Titulo de la reunión: Recorrido 50RS01 – 2507. **Acta de reunión No.**

Proyecto: AMV2. – Ingenio Risaralda.

Fecha y hora: 18/03/25.

Convocada por: AMV2.

Lugar: 2507 3970000.

Ítem	Agenda
1.	Puente Mocatan Ruta 50RS01.
2.	Ruta 2507.
3.	

Ítem	Temas Tratados
1.	Puente mocatan Ruta 50RS01.
	Se revisa en compañía de delegados del
	Ingenio Risaralda, en los predios del mismo
	donde. se evidencia barreras protectoras en
	caña brava propia de la zona tipo silvestre,
	la caña tiene una franja protectora de
aproxim.	medida de la rivera del rio al sembrado.
	de la siguiente manera.
	rioMapa y rio Totui 24 mts, rio Risaralda 30 mts

Elaboró:	Revisó:	Aprobo	Cod: ADMON143-002
Liz Johanna Alzate Llano Profesional SST	Kelly Johanna Ramirez Cuervo Aux Residente	Jael Mariano Cortes Ingeniera residente	Fecha de creacion 9/7/2024

Powered by CamScanner

Sistema de Gestion de calidad

AAD ING. ARCELIA ARIAS DIAZ | GOC | CIVICOL | EC

Formato No :	ADMON143-001
Fecha de creacion:	9/7/2024

CONSORCIO ADMON 143
ACTA DE COMITÉ

ACTA

Rio cauca 30mts.
los delegados del ingenio Risaralda recomiendan. realizar recorrido en lancha aguas arriba y tomar muestras vegetales de la empalizada para determinar especies vegetales.

2. Ruta 2507. PR 397000.- Finca San Vicente.
Se observa encole y descole colmatados por material de arraste aluvial en fincas administradas por el ingenio.
desde El PR 38+700 hasta el PR 397000.0.
Se tiene una zanja de coronación tapada por material vegetal.
Por parte de Ctva Comuneros realizara la poda en los taludes cercanos a la zanja de coronación del PR 387+750. con el fin de dar ingreso a la máquina del ingenio.
La cooperativa. Comuneros prestara el servicio de control vial.

Elaboró:	Revisó:	Aprobo	Cod: ADMON143-002
Liz Johanna Alzate Llano ssi	Kelly Johanna Ramirez Cuervo Aux Residente	Jael Moriano Cortez Ingeniero residente	Fecha de creacion:9/7/2025

Powered by CamScanner

Sistema de Gestión de calidad

CONSORCIO ADMON 143
ACTA DE COMITÉ

ACTA

Elaboró	Revisó	Aprobó	Cód. ADMON 143-001
Lic Johanna Alzate Llano Lider	Kelly Johanna Ramos Cuervo Aux Residente	José Moreno Cortez Ingeniero residente	Fecha de creación 6/7/2023

Powered by CamScanner

Sistema de Gestion de calidad

AAD
ING. ARCELIA ARIAS DIAZ

GOC

Formato No :	ADMON143-001
Fecha de creacion:	9/7/2024

CONSORCIO ADMON 143
ACTA DE COMITE

COMPROMISOS ADQUIRIDOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
- Citar Corneros realizar reunión en el canal PR38+750 (primera semana	citar corneros abril)	15 dias maximo.
- Ingenio Risaralda depto de cultivos. realizara limpieza de encoles y descoles PR39 y PR 38+750., apertura zanja de coronacion.	Ing. Risaralda	3/4/25.

Elaboró:	Revisó:	Aprobo	Cod. ADMON143-001
Liz Johanna Alzate Llano sst	Kelly Johanna Ramirez Cuervo Aux Residente	Jose Mariano Cortez Ingeniero residente	Fecha de creacion:9/7/2024

Powered by CamScanner

Sistema de Gestion de calidad

Formato No.	ADMON143-001
Fecha de creacion	8/1/2024

CONSORCIO ADMON 143
ACTA DE COMITE

Asistentes

Nombre y Apellido	Cargo / Empresa	Telefono / Celular	Email
JAEL MORIANO.	Residente AMV2	3117806016.	consorcio admon 143@outlook.com
Sebastián Saldarriaga O.	Jefe de Zona	3104053948	ssaldarriaga@ingeniosas.com.co

Elaboró: Liz Johanna Alzate Llano	Revisó: Kelly Johanna Ramirez Cuervo, Aux Residente	Aprobo: Jael Moriano Cortez, Ingeniero residente	Cod. ADMON143-001 Fecha de creacion:8/1/2024

Powered by CamScanner

LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	**DENSIDAD Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO DE ARENA NORMA INVIAS INV E 161-13**	CÓDIGO:	FOR-038
		VERSIÓN:	1
		FECHA ELABORACIÓN:	17/02/2020

Compañía: Ingenieria & Diseños INTEGRALES S.A.S

Obra: Reparacion Suministro e Instalacion de Pavimento Flexible en Punto Critico Via Nacional Sector Viterbo

Material: BASE GRANULAR

Fuente: Rio Risaralda

Fecha de Ensayo: 29 de marzo de 2025

DATOS DE IDENTIFICACIÓN						
Prueba Nº:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Ubicación/Abscisas:	PUNTO 1	PUNTO 2				
Profundidad (cm):	15,0	15,0				
Capa Nº:	CAPA 1	CAPA 1				
Espesor de la capa ensayada (cm):	-	-				
Lado:	DERECHO	IZQUIERDO				
DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL MATERIAL EN EL TERRENO						
M1=Constante del cono en (g):	1648	1648				
M2=Masa del frasco y arena inicial (g):	6748	6726				
M3=Masa del frasco y arena restante (g):	2887	2835				
M4=Masa arena utilizada para llenar el hueco (g) (M2-M3-M1)	2213	2243				
γarena=Densidad de la arena (g/cm³):	1,410	1,410				
V=Volumen del hueco (cm³): (M4 / γarena)	1570	1591				
M5=Masa húmeda del material removido del hueco (g):	3756	3823				
W=humedad del material removido (%):	6,5	6,8				
M6=Masa seca del material removido del hueco (g) (M5/(1+(W/100))):	3527	3580				
γw=Densidad húmeda del material (g/cm³) M5/V :	**2,393**	**2,403**				
γs=Densidad seca del material (g/cm³) M6/V:	**2,247**	**2,250**				
Peso unitario seco (kN/m³)	**22,0**	**22,1**				
γsmáx=Densidad seca máxima de laboratorio (g/cm³):	2,245	2,245				
Compactación del terreno γs/γsmáx (%):	**100,1**	**100,2**				
Porcentaje de compactación especificado (%):	100	100				
% humedad óptima laboratorio:	8,0	8,0				

OBSERVACIONES:

Elaboro: Alexander Lopez
Auxi . De Laboratorio

Reviso y Aprobo: Jose Norbey Rivera
Tnlgo.En Obras Civiles - Laboratorista

	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO, DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ No. 200 MEDIANTE LAVADO Y LIMITES DE ATTERBERG NORMAS INVIAS 125,126, 213- 214- 2017	CÓDIGO	FOR-001
S.E ENSAYOS		VERSIÓN	1
		FECHA	17/02/2021

COMPANIA :	ARENA Y GRAVAS
MATERIAL :	BASE GRANULAR BG-40
FUENTE DE MATERIALES	RIO RISARALDA
FECHA DE ENSAYO :	16 de septiembre de 2024

DETERMINACION GRANULOMETRIA DE BASE INVIAS 330-13

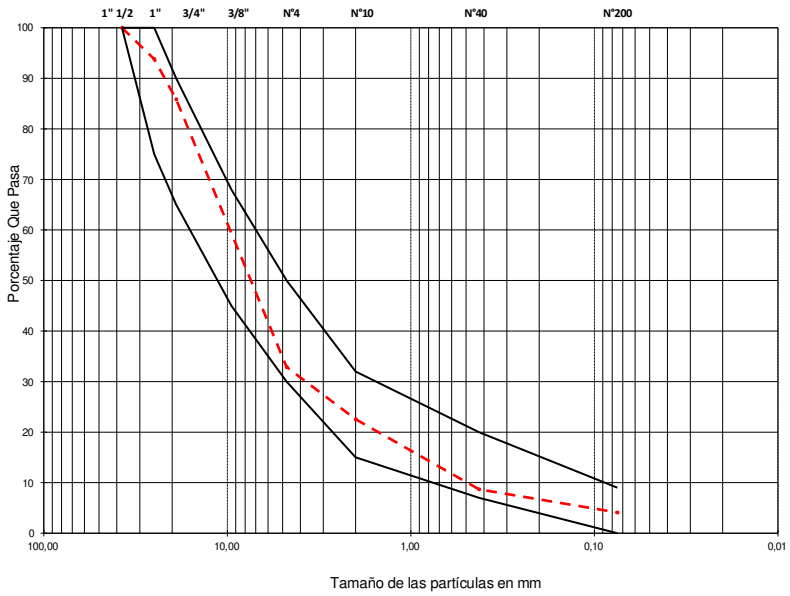
Masa seca inicial (g)		5454,9	Masa seca lavada (g)		5232,3	Invias 2013 Dmax	BG-40
Tamiz (inch)	Tamiz (mm)	Retenino (g)	% Retenido	% Acumulado	% Pasa	Minimo	Maximo
2"	50,0				**100,0**	100	100
1 ½"	37,5		0.0	0.0	**100,0**	100	100
1"	25,0	338,4	6,2	6,2	**93,8**	75	100
3/4"	19,0	434,1	8,0	14,2	**85,8**	65	90
3/8"	9,5	1602,1	29,4	43,5	**56,5**	45	68
Nº4	4,75	1287,2	23,6	67,1	**32,9**	30	50
Nº10	2,00	562,6	10,3	77,4	**22,6**	15	32
Nº40	0,425	757,6	13,9	91,3	**8,7**	7	20
Nº200	0,075	249,3	4,6	95,9	**4,1**		9
FONDO							
Peso final g		5231,3					

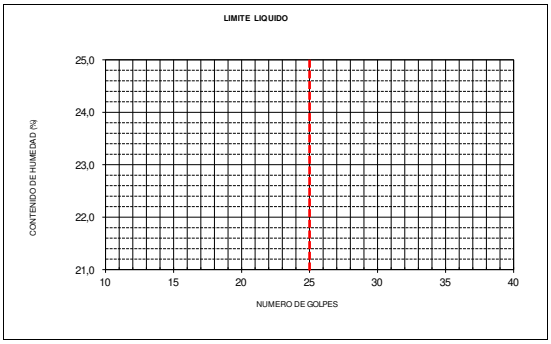
DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO NORMA INV.E-125-13

Determinacion	1	2	3		
N° recipiente					
N. de golpes					
Recipiente + M humedo, g		**N.L**			
Masa del recipiente + material seco, g					
Masa del recipiente ,g					
Contenido de agua, %					

Determinacion	1	2		
N° recipiente			Recipiente Nº	3
Masa del recipiente ,g	**N.P**		Suelo Húmedo (g)	411
Recipiente + material Humedo			Masa Rec. + Suelo Seco (g)	383,9
Recipiente + material Seco			Masa Recipiente (g)	
Contenido de agua, %			**Humedad**	**7,1**

GRADACIÓN





RESULTADOS

LIMITE LIQUIDO	**NL**	**NL**
LIMITE PLASTICO	**NP**	**NP**
INDICE DE PLASTICIDAD	**NP**	**NP**
HUMEDAD NATURAL (%)	**%**	**7,1**
GRAVAS (%) TAMIZ N° 4	**%**	**67,1**
ARENAS (%)	**%**	**28,8**
Pasa Tamiz Nº 200 (%)	**%**	**4,1**

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Alexander Lopez	Jose Norbey Rivera
Auxiliar. De laboratorio	Tnlgo en Obras Civiles - Laboratorista

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

ARENA Y GRAVAS SAS

	INFORME DE PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS - NORMA INVIAS 227 - 2013	Código:	FOR-005
		Versión:	1
		FECHA	17/02/2021

COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS
MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40
FUENTE DE MATERIALES RIO RISARALDA
FECHA DE ENSAYO : 16 de septiembre de 2024

PARTÍCULAS CON UNA CARA FRACTURADA

MÉTODO DE CALCULO			
CONTEO		MASA	

TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 1 o másCaras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)	Porcentaje de partículas con 1 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		F	Q	N	
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"	502,8	492,6	0,0	10,2	98
1"	3/4"	603,6	587,5	0,0	16,1	97
3/4"	1/2"	545,4	531,4	0,0	14,0	97
1/2"	3/8"	418,3	408,7	0,0	9,6	98
MASA TOTAL USADA (g):		2070,1			PROMEDIO =	98

PARTÍCULAS CON DOS O MÁS CARAS FRACTURADAS

MÉTODO DE CALCULO			
CONTEO		MASA	

TAMICES		Peso Total (g)	Peso Partículas con 2 o más Caras Fracturadas (g)	Peso Partículas con Caras Dudosas (g)	Peso Partículas No Fracturadas (g)	Porcentaje de partículas con 2 o más caras fracturadas (%)
Pasa	Retiene		F	Q	N	
2"	1 1/2"					
2"	1 1/2"					
1 1/2"	1"	502,8	477,3	0,0	25,5	95
1"	3/4"	603,6	582,1	0,0	21,5	96
3/4"	1/2"	545,4	516,3	0,0	29,1	95
1/2"	3/8"	418,3	396,7	0,0	21,6	95
MASA TOTAL USADA (g):		2070,1			PROMEDIO =	95

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar. de Laboratorio	Cargo: Tnlgo. En Obras Civiles - Laboratorista

La Virginia - Risaralda
Tel: 3113725717-3117535823 seensayos@gmail.com

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

	INDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS NORMA INVIAS 230-2013	CODIGO	FOR-004
		VERSION	1
		FECHA	17/02/2021

COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS
MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40
FUENTE DE MATERIALES : RIO RISARALDA
FECHA DE ENSAYO: 16 de septiembre de 2024

INDICE DE ALARGAMIENTO INV E 230-13

FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i	MASA Ri DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS RETENIDAS, m_i (g)	ÍNDICE DE ALARGAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Li}=(m_i/R_i) \times 100$
2 1/2"			
2"			
1 1/2"			
1"	502,8	114,2	23%
3/4"	603,6	126,9	21%
1/2"	545,4	174,6	32%
3/8"	418,3	91,3	22%
1/4"	200,5	85,6	43%
$M_1 = SR_i =$	2270,60	$M_2 = Sm_i =$	593
INDICE DE ALARGAMIENTO GLOBAL, $I_L=M_2/M_1 x100$			**26%**

INDICE DE APLANAMIENTO INV E 230 - 13

FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i	MASA Ri DE LA FRACCIÓN GRANULOMÉTRICA d_i/D_i (g)	MASA DE LAS PARTÍCULAS QUE PASAN, m_i (g)	ÍNDICE DE APLANAMIENTO DE LA FRACCIÓN $I_{Ai}=(m_i/R_i) \times 100$
2 1/2"			
2"			
1 1/2"			
1"	502,8	96,9	19%
3/4"	603,6	118,9	20%
1/2"	545,4	156,7	29%
3/8"	418,3	126,5	30%
1/4"	200,5	72,7	36%
$M_1 = SR_i =$	2270,60	$M_2 = Sm_i =$	572
INDICE DE APLANAMIENTO GLOBAL, $I_A=M_2/M_1 x100$			**25%**

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar. de Laboratorio	Cargo: Tnlgo. En Obras Civiles - Laboratorista

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

ARENA Y GRAVAS SAS

	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS NORMA INVIAS - 133	CODIGO	FOR-002
S.E ENSAYOS		VERSION	1
		FECHA	17/02/2021

COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS
MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40
FUENTE DE MATERIALES RIO RISARALDA
FECHA DE ENSAYO : 16 de septiembre de 2024

DETERMINACION No.	1	2	3
Probeta No.	1	2	3
Lectura de Arena (A)	73	73	72
Lectura de Arcilla (B)	159	159	159
E. A. = 100 x (A) / (B)	45,9	45,9	45,3
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) =			**46**

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma 	Firma 
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar.de laboratorio	Cargo: Tnlgo. En obras civiles - Laboratorista

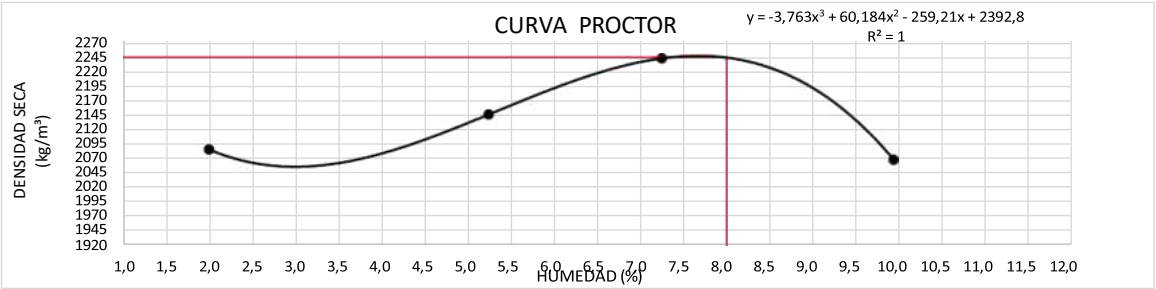
La Virginia - Risaralda
Tel: 3113725717-3117535823 seensayos@gmail.com

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

	RELACIONES DE HUMEDAD- PESO UNITARIO SECO DE LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION) NORMA INVIAS -142	CODIGO	FOR-006
S.E ENSAYOS		VERSION	1
		FECHA	17/02/2021

COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS
MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40
FUENTE DE MATERIALES RIO RISARALDA
FECHA DE ENSAYO : 16 de septiembre de 2024

PRUEBA	1	2	3	4
DETERMINACIÓN DE HUMEDAD				
Recipiente Número:				
M1= Masa Recipiente + masa húmeda (g):	500,0	500,0	500,0	500,0
M2= Masa Recipiente + masa seca (g):	490,2	475,1	466,2	454,8
M3= Masa Recipiente (g):	0,0	0,0	0,0	0,0
Humedad (%):	2,0	5,2	7,3	9,9
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD				
Número de golpes por capa:	56	56	56	56
Número de capas:	5	5	5	5
Masa suelo inicial (g):	6000	6000	6000	6000
Agua adicional (cm^3):	0	120	240	480
Molde Número.:	1	1	1	1
M4=Masa molde y base + suelo compactado (g):	10098	10377	10690	10408
M5= Masa del molde (g):	5583	5583	5583	5583
M6= Masa humeda compacta (g):	4515	4794	5107	4825
Humedad (%):	2,0	5,2	7,3	9,9
M7= Masa seca (g):	4427	4555	4762	4389
V=Volumen del molde (cm^3):	2123	2123	2123	2123
Densidad seca (g/cm^3): (M7/V)	2,085	2,146	2,243	2,067
Densidad seca (kg/m^3):	2085	2146	2243	2067



DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO: 2245 kg/m^3
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO: 2,245 g/cm^3
HUMEDAD ÓPTIMA: 8,0 %

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre:Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar.de laboratorio	Cargo: Tnlgo. En obras civiles - Laboratorista

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

ARENA Y GRAVAS SAS

	ENSAYO DE CBR INV E 148-13	Código:	FOR-007
S.E ENSAYOS		Versión:	1
		Fecha:	17/02/2021

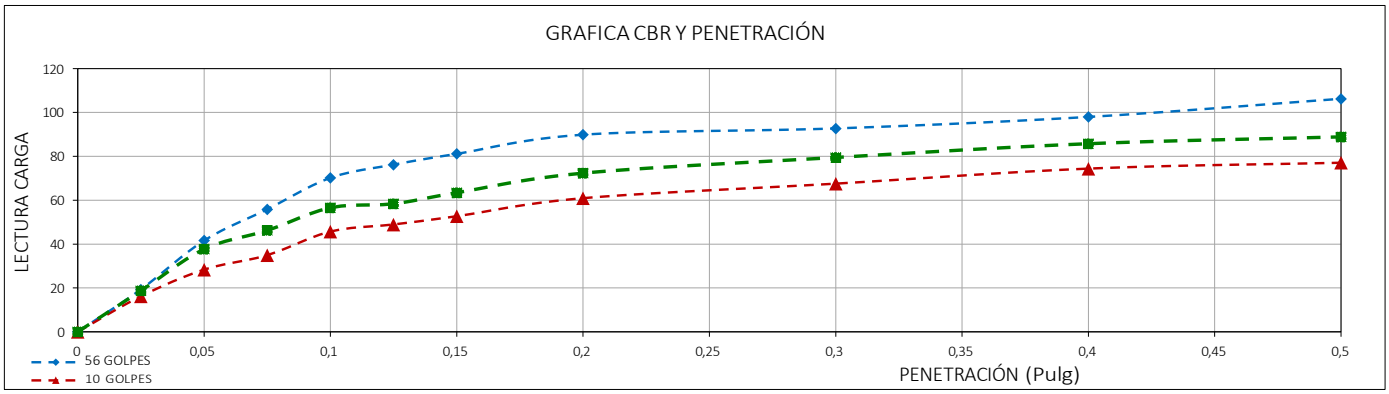
COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS
MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40
FUENTE DE MATERIALES : RIO RISARALDA
FECHA DE ENSAYO : 16 de septiembre de 2024

RESULTADOS

Índice de Grupo		Metodo de Compactación		MANUAL	Densidad Maxima Seca - Laboratorio	kg/m3	2.245
Clasificación Sistema ASSHTO		Condición de Ensayo			Humedad Optima	%	8,0
Clasificación Sistema USCS		Tiempo de Inmersión	h	96,00	Densidad al 98% - Laboratorio	kg/m3	2.200
Índice de Plasticidad	% NP	Peso De Sobrecarga Utilizada	kg		Densidad al 95% - Laboratorio	kg/m3	2.133
CBR Corregido Al 100%	99,7	CBR Corregido Al 98%		97,1	CBR Corregido Al 95%		93,1

DATOS

PENETRACIÓN		CARGA ESTANDAR	MOLDE N° 1				MOLDE N° 2				MOLDE N° 3			
			56 GOLPES				25 GOLPES				10 GOLPES			
(Pulg)	(mm)	kg	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %	LECTURA CELDA DE CARGA KN	CARGA kg	CARGA CORR kg	CBR CORR. %
0	0				0				0				0	
0,025	0,64		*3,712*	379	19,3		*3,602*	367	18,7		*3,119*	318	16,2	
0,050	1,27		*8,005*	817	41,6		*7,258*	740	37,7		*5,459*	557	28,4	
0,075	1,91		*10,751*	1096	55,8		*8,896*	907	46,2		*6,725*	686	34,9	
0,100	2,54	*70,31*	*13,516*	1378	70,2	100	*10,890*	1110	56,6	80	*8,802*	898	45,7	65
0,125	3,18		*14,625*	1496	76,2		*11,236*	1146	58,4		*9,422*	961	48,9	
0,150	3,81		*15,638*	1593	81,1		*12,209*	1245	63,4		*10,145*	1035	52,7	
0,200	5,08	*105,46*	*16,901*	1764	89,9	85	*13,925*	1420	72,3	69	*11,728*	1196	60,9	58
0,300	7,62		*17,812*	1820	92,7		*15,301*	1560	79,5		*13,006*	1326	67,6	
0,400	10,16		*18,726*	1923	98,0		*16,508*	1683	85,8		*14,324*	1461	74,4	
0,500	12,70		*20,345*	2085	106,2		*17,109*	1745	88,9		*14,841*	1513	77,1	



DATOS EXPANSIÓN						
Altura de la Muestra (mm)			114			
	56 GOLPES		25 GOLPES		10 GOLPES	
	(mm)	(%)	(mm)	(%)	(mm)	(%)
INICIAL	*0,00*		*0,00*		*0,00*	
24 Horas	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
36 Horas	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
72 Horas	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
96 Horas	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
EXP. TOTAL %		*0,00%*		*0,00%*		*0,00%*

Porcentaje de Expansión del CBR Al 100%	0,00%
Porcentaje de Expansión del CBR Al 98%	0,00%
Porcentaje de Expansión del CBR Al 95%	0,00%

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar.de laboratorio	Cargo: Tnlgo. En obras civiles - Lboratorista

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

ARENA Y GRAVAS SAS

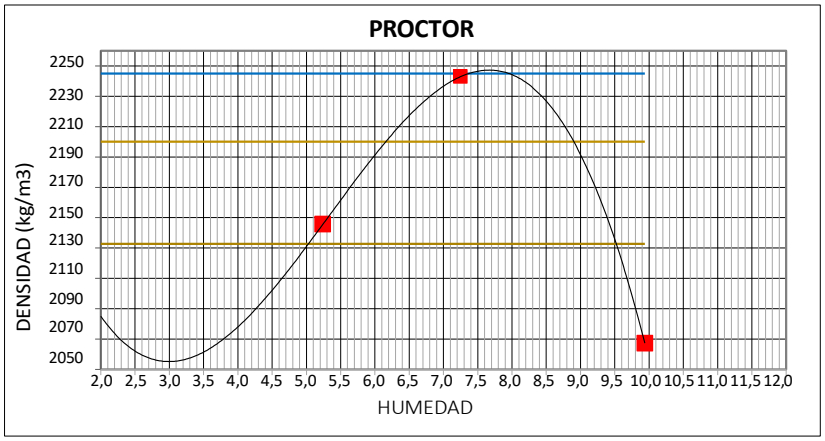
S.E ENSAYOS	**ENSAYO DE CBR** **INV E 148-13**	**Código:**	**FOR-027**
		Versión:	**1**
		Fecha:	**17/02/2020**
		Página	**2 de 2**

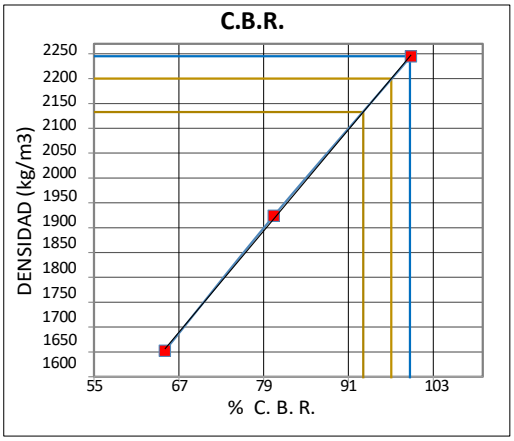
COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS
MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40
FUENTE DE MATERIALES RIO RISARALDA
FECHA DE ENSAYO: 16 de septiembre de 2024

DATOS DE DENSIDADES

ENSAYO		**PROCTOR**				**CBR**		
MOLDE N°		1	2	3	4	1	2	3
N° DE GOLPES		***56***	***56***	***56***	***56***	***56***	***25***	***10***
Peso molde + suelo compactado	gr	*10098*	*10377*	*10690*	*10408*	*13684*	*13046*	*12800*
Peso molde	gr	*5583*	*5583*	*5583*	*5583*	*8130*	*8389*	*8693*
Peso suelo compactado	gr	4515	4794	5107	4825	5554	4657	4107
Volumen de molde	cc	*2123*	*2123*	*2123*	*2123*	*2286,4*	*2226,6*	*2286,4*
Densidad húmeda	kg/m3	2127	2258	2406	2273	2429	2092	1796
Densidad seca	kg/m3	2085	2146	2243	2067	2245	1924	1653
HUMEDAD	%	*2,0*	*5,2*	*7,3*	*9,9*	*8,2*	*8,7*	*8,7*
CBR corregido 0,1"	%	-	-	-	-	***100***	***80***	***65***
CBR corregido 0,2"	%	-	-	-	-	***85***	***69***	***58***

GRAFICAS





ELABORO:	**REVISO Y APROBO:**
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar.de laboratorio	Cargo: Tnlgo. En obras civiles - Laboratorista

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

ARENA Y GRAVAS SAS

	ENSAYO PESO UNITARIO EN LOS AGREGADOS NORMA - INV E -217	CODIGO	FOR-020
S.E ENSAYOS		VERSION	1
		FCHA	20/01/2021

FECHA ENSAYO: 16 de septiembre de 2024

COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS

MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40

FUENTE : RIO RISARALDA

PESO UNITARIO BASE GRANULAR BG-40	
1	19,62
2	19,45
3	19,65
MASA DEL MOLDE (kg)	0,974
MASA DEL MATERIAL (kg)	19,57
VOLUMEN MOLDE (m3)	0,0113
PESO UNITARIO (kg/m3)	**1732**

OBSERVACIONES

Elaboro: Alexander Lopez
Auxi . De Laboratorio

Reviso y Aprobo: Jose Norbey Rivera
Tnlgo.En Obras Civiles - Laboratorista

La Virginia - Risaralda
Tel: 3113725717-3117535823 seensayos@gmail.com

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

S.E ENSAYOS	**RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS MENORES DE 1 1/2" Y MAYORES DE 3/4" POR MEDIO DE LA MÁQUINA LOS ÁNGELES NORMA INVIAS INV E 218/219-2013**	FOR-004 VERSIÓN: 1 FECHA DE ELABORACIÓN 20/01/2021

COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS

MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40

FUENTE DE MATERIALES : RIO RISARALDA

FECHA DE ENSAYO : 16 de septiembre de 2024

Tipo de Granulometría	**A**
Peso Total Muestra Seca Final (g)	4297
Peso Total Muestra Seca Inicial (g)	5000
Desgaste (%)	**14,1**

GRANULOMETRIAS DE LAS MUESTRA DE AGREGADO PARA ENSAYO

Tabla 1. Gradaciones de muestras de ensayo

Tamaño del tamiz, mm (abertura cuadrada)		Masa de los tamaños indicados, g			
Pasa	Retenido en	Gradación			
		A	B	C	D
37,5	25,0	1 250 ± 25	-	-	-
25,0	19,0	1 250 ± 25	-	-	-
19,0	12,5	1 250 ± 10	2 500 ± 10	-	-
12,5	9,5	1 250 ± 10	2 500 ± 10	-	-
9,5	6,3	-	-	2 500 ± 10	-
6,3	4,75	-	-	2 500 ± 10	-
4,75	2,36	-	-	-	5 000 ± 10
Total		5 000 ± 10	5 000 ± 10	5 000 ± 10	5 000 ± 10

Granulometría de ensayo	Número de esferas	Peso Total g
A	12	5000 ± 25
B	11	4584 ± 25
C	8	3330 ± 20
D	6	2500 ± 15

Observaciones: **500 REVOLUCIONES**

ELABORO:	**REVISO Y APROBO:**
Firma 	Firma 
Nombre :Alexander Lopez	Nombre:Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar. De Laboratorio	Cargo: Tnlgo. en Obras Civiles - Laboratorista

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

S.E ENSAYOS	**DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACION POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL NORMA INVIAS INV E 238**	**FOR -026** **Versión :1** **20/01/2021**

COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS

MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40

FUENTE DE MATERIAL : RIO RISARALDA

FECHA DE ENSAYO : 16 de septiembre de 2024

ENSAYO Nº	**1**	
TAMAÑO MAXIMO DE LA MUESTRA	11/2"	
GRADACION USADA	1	
PESO DE ESFERAS (g)	5000	
TIEMPO DE ENSAYO (min)	120	
Nº DE REVOLUCIONES / MINUTO	100	
P1=PESO DE LA MUESTRA SECA ANTES DE ENSAYO(g)	1.501,2	
P2= PESO DE LA MUESTRA SECA DESPUES DE ENSAYO(g)	1.314,9	
P1-P2= PERDIDA (g)	186,3	
% DESGASTE =((P1-P2) / P1)*100	**12,4**	

TAMAÑOS EN mm		PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA (g)		
PASA	RETENIDO	**1**	**2**	**3**
19 - (3/4")	16 - (5/8")	375,0		
16 - (5/8")	12.5 - (1/2")	375,0		
12.5 - (1/2")	9.5 - (3/8")	750,0	750,0	
9.5 - (3/8")	6.3 - (1/4")		375,0	750,0
6.3 - (1/4")	4.75 - (Nº4)		375,0	750,0
TOTAL MATERIAL (g)		1500,0	1500,0	1500,0
PESO DE ESFERAS (g)		**5000±5**	**5000±5**	**5000±5**
Nº DE REVOLUCIONES / MIN		**100±5**	**100±5**	**100±5**
TIEMPO DE ENSAYO (min)		120	105	95

ELABORO	REVISO Y APROBO
Firma : 	Firma : 
Nombre :Alexander Lopez	Nombre :Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar. De Laboratorio	Cargo: Tnlgo. En Obras Civiles - Laboratorista

La Virginia - Risaralda
Tel: 3113725717-3117535823 seensayos@gmail.com

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

ARENA Y GRAVAS SAS

	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DEZLENABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INVIAS -211	CÓDIGO	FOR-025
S.E ENSAYOS		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2021

COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS

MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40

FUENTE DE MATERIALES : RIO RISARALDA

FECHA DE ENSAYO : 16 de septiembre de 2024

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4				
1 1/2"	3/4"	Nº 4	3000	2997,3	26,1%	0,1%
3/4"	3/8"	Nº 4	2000	1998,0	12,8%	0,1%
3/8"	Nº 4	Nº 8	1000	996,5	15,7%	0,4%
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20				
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,09%**

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma:	Firma:
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar. De Laboratorio	Cargo: Tnlgo en Obras Civiles - Laboratorista

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

ARENA Y GRAVAS SAS

	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DEZLENABLES EN LOS AGREGADOS NORMA INVIAS -211	CÓDIGO	FOR-025
S.E ENSAYOS		VERSIÓN	1
		FECHA	20/01/2021

COMPAÑÍA : ARENA Y GRAVAS
MATERIAL : BASE GRANULAR BG-40
FUENTE DE MATERIALES : RIO RISARALDA
FECHA DE ENSAYO : 16 de septiembre de 2024

TAMAÑO DEL AGREGADO		TAMIZ PARA REMOVER EL RESIDUO DE TERRONES DE ARCILLA	MASA DE LA MUESTRA DE ENSAYO (g)	PESO DE LAS PARTICULAS RETENIDAS (g)	% DE GRADACION ORIGINAL	% DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES
PASA TAMIZ	RETENIDO TAMIZ					
MAYORES A 1 1/2"		Nº 4				
1 1/2"	3/4"	Nº 4				
3/4"	3/8"	Nº 4				
3/8"	Nº 4	Nº 8				
AGREGADO FINO RETENIDO Nº 16		Nº 20	50,0	48,0	15,2%	4,0%
PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES						**0,61%**

ELABORO:	REVISO Y APROBO:
Firma	Firma
Nombre: Alexander Lopez	Nombre: Jose Norbey Rivera
Cargo: Auxiliar. De Laboratorio	Cargo: Tnlgo. en Obras Civiles - Laboratorista

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

Versión.1 / 20-01-2021
FOR-023

SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE LAS SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O MAGNESIO
NORMA INVIAS INV E -220

COMPAÑÍA :	ARENA Y GRAVAS
MATERIAL :	BASE GRANULAR BG-40
FUENTE DE MATERIALES	RIO RISARALDA
FECHA DE ENSAYO :	16 de septiembre de 2024


Agregado Grueso

Tamiz	Peso inicial (g)	Peso Final (m)	Diferencia (a-b)	% perdida (c/a)*100	% gradacion Original	% Total (d*e)
	a	b	c	d	e	f
2" - 11/2"						
11/2" - 1"	1500	1479,3	20,7	1,4	28,3	39,1
1" - 3/4"	1500	1477,0	23,0	1,5	28,3	43,4
3/4" -1/2"	1000	978,6	21,4	2,1	18,8	40,2
1/2" - 3/8"	1000	945,7	54,3	5,4	18,8	102,1
3/ 8" - No 4	300	274,8	25,2	8,4	5,7	47,9
Total					**99,9**	**272,6**
% Perdida Total por Accion de Sulfato Agregado Grueso (f/e)					**2,73**	

Agregado fino

Tamiz	Peso inicial (gm)	Peso Final (gm)	Diferencia (a-b)	% perdida (c/a)*100	% gradacion Original	% Total (d*e)
	a	b	c	d	e	f
No 4 - No 8	100,0	95,1	4,9	4,9	8,6	42,1
No 8 -No 16	100,0	96,3	3,7	3,7	7,9	29,2
No 16 - No 30	100,0	94,9	5,1	5,1	4,4	22,4
No 30 - No 50	100,0	98,5	1,5	1,5	4,0	6,0
Total					**24,9**	**99,8**
% Perdida Total por Accion de Sulfato Agregado Fino (f/e)					**4,01**	

% Total perdida por accion de Sulfato (Magnesio)	**3,37**

ELABORO	**REVISO Y APROBO**
Firma : 	Fima: 
Nombre : Alexander Lopez	Nombre : Jose Norbey Rivera
Cargo :Auxiliar. De Laboratorio	Cargo :Tnlgo. en Obras Civiles - Laboratorista

La Virginia - Risaralda
Tel: 3113725717-3117535823 seensayos@gmail.com

Suministro de 7m3
MANUEL OSORIO

Sistema de Gestion de calidad

Formato No	ADMON143-001
Fecha de creacion	9/7/2024

CONSORCIO ADMON 143
ACTA DE COMITÉ

Titulo de la reunión:	Recorrido Empresa Servicios Publicos La Virginia.
Proyecto:	ANZ
Fecha y hora:	1 de abril 2025.
Convocada por:	Residente AMUZ.
Lugar:	25 RSA PR0+200.

Ítem	Agenda
1.	Box Coulvert PR0+200.
2	Aguas negras depositadas ~~normal~~ Quebrada La Pizarra, ~~en colecto~~ ure Quebrada Mina y Rica y Japón.

Ítem	Temas Tratados
1.	Se inspeciona los colectores e interceptores ubicados en el PR0+200, Coulvert Pedro Pablo Bello, los cuales. se encuentran en normal funcionamiento, el funcionario manifiesta que cuando estos no funcionan adecuadamente la ESP realizara la respectiva limpieza, el colector de aguas lluvias no presenta conexiones y/o afectaciones.

Elaboró: Area SST	Revisó: Kelly Johanna Ramirez Cuervo Aux Residente	Aprobo Jael Moriano Cortez Ingeniero residente	Cod. ADMON143

Powered by CamScanner

Sistema de Gestion de calidad

AAD ING. ARCELIA ARIAS DIAZ

Formato No	ADMON143.001
Fecha de creacion:	9/7/2024

CONSORCIO ADMON 143
ACTA DE COMITE

ACTA

2. En el recorrido del canal de la Quebrada La Pizarra se evidencia conexiones presuntamente ilegales, de los moradores de las viviendas aledañas, tuberías las cuales son producto de aguas servidas.

3. Por parte de la ESP La Virginia manifiesta no tener alcantarillado estas viviendas.

Elaboró	Revisó	Aprobo	Cod ADMON143
Area SST	Kelly Johanna Ramirez Cuervo Aux Residente	Jael Moriano Cortez Ingeniero residente	

Powered by CamScanner

Sistema de Gestion de calidad

Formato No	ADMON143-001
Fecha de creacion	9/7/2024

CONSORCIO ADMON 143
ACTA DE COMITE

Asistentes

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
JAEL MORIANO CORTES	Residente SMVZ.	
Jair Lopez Taborda	Prof. Unive. E.S.P La Vigia	

Elaboró	Revisó	Aprobo	
Area SST	Kelly Johanna Ramirez Cuervo Aux Residente	Jael Moriano Cortez Ingeniero residente	Cod. ADMON143

Powered by CamScanner

CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA INGRESO	
FORMATO: CCI - CADMON143	VERSION: 0,0

CONSORCIO ADMON 143

Contrato de consultoria N°:	2004 de 2024	**Objeto contractual:**	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.".
Fecha de Inicio:	martes, 9 de julio de 2024	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Fecha de Terminación:	viernes, 31 de julio de 2026	**Periodo correspondencia:**	Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025

Nº	Nº CONSECUTIVO	ASUNTO / REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN	MEDIO DE ENTREGA	RADICAD		DATOS EMISOR / RECEPTOR		ANEXOS		N° FOLIOS TOTAL	FECHA MÁXIMA DE RESPUESTA	RESPUESTA		OBSERVACIONES
				FECHA DE RADICADO	N° RADICADO	DE	PARA	SI	NO			SI	NO	
1	2025I-VBOG-017541	Reiteración del Memorando Circular No. 2025I-VBOG-006372: Divulgación de la Resolución No. 00221 del 4 de febrero de 2025, la cual Faculta a los Directores	Correo Certificado	26/03/2025	2025I-VBOG-017541	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA	DIRECTORES TERRITORIALES		x	1				
2	2025I-VBOG-017787	Invitación a capacitación Software Vida - Metodología iRAP. Evaluación de seguridad vial. Grupo 1: Zona Centro-Oriente	Correo Certificado	27/03/2026	2025I-VBOG-017787	JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA	Direcciones Territoriales		x	2				
3	2025S-VRIS-013535	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-023277	Correo Certificado	06/03/2025	2025S-VRIS-013535	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
4	2025S-VRIS-014376	Remision memorando interno 2025I-VBOG-013328 Protocolo SIGPAV	Correo Certificado	10/03/2025	2025S-VRIS-014376	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
5	2025S-VRIS-014574	AMVs Solicitud Diligenciamiento Formatos Directorio Emergencia e Inventario Maquinaria Disponible	Correo Certificado	11/03/2025	2025S-VRIS-014574	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSROCIO ADMON 143		x	14				
6	2025S-VRIS-015977	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-027544	Correo Certificado	17/03/2025	2025S-VRIS-015977	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
7	2025S-VRIS-016204	Remision Oficio No 2025E-VUVRAZ-026555	Correo Certificado	17/03/2025	2025S-VRIS-016204	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
8	2025S-VRIS-016337	AMV2 Remision Memorando 2025I-VBOG-015551 Lineamientos reportes emergencias viales	Correo Certificado	18/03/2025	2025S-VRIS-016337	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
9	2025S-VRIS-016339	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-028146	Correo Certificado	18/03/2025	2025S-VRIS-016339	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
10	2025S-VRIS-016340	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-028632	Correo Certificado	18/03/2025	2025S-VRIS-016340	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
11	2025S-VRIS-012906	Remision PQRSD Oficio No. 2025E-VRIS-022543	Correo Certificado	04/03/2025	2025S-VRIS-012906	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
12	20255610001085	TRASLADO POR COMPETENCIA-RADICADO ORFEO 20255610001085	Correo Certificado	06/03/2025	20255610001085	Angela Maria Gonzalez Marin	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
13	SUTRA-SETRA- 29.25	Informando no viabilidad envío de (IPAT)	Correo Certificado	19/03/2025	SUTRA-SETRA- 29.25	DEPARTAMENTO DEPOLICIA RISARALDA	CONSROCIO ADMON 143		x	2				
14	STMEP0601	RESPUESTA A SOLICITUD DE ACCIDENTALIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2025	Correo Certificado	25/03/2025	01513	CARLOS ANDRES GIRALDO	#¡REF!		X	1				
15		SOLICITUD DE PARTICIPACION ACTIVDAD DE LA SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL	Correo Certificado	13/03/2025		SECRETARIO DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMITÉ DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL	X		41				se adjuntan informe en word, presentacion pdf, cronograma semanal en excel, acta en pdf, accidentalidad en excel y solicitud en pdf
16		MANUAL DE REMI REPORTE DE EMERGENCIAS POR MOVIENTOS EN MASA O INUNDACION	Correo Certificado	10/03/2025		CARLOS ZULUAGA	CONSROCIO ADMON 143		X	2				
17		SEGUIMIENTO A LABORES A CARGO DE LOS ADMINISTRADORES VIALES GRUPO 1, GRUPO 2, GRUPO 3 Y GRUPO 4 DE LA TERRITORIAL RISARALDA	Correo Certificado	17/03/2025		TERRITORIAL	CONSROCIO ADMON 143	X		3				

CONTROL DE CORRESPONDENCIA INGRESO	
FORMATO: CCI - CADMON143	VERSION: 0,0

CONSORCIO ADMON 143

Contrato de consultoria N°:	2004 de 2024	**Objeto contractual:**	"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.".
Fecha de Inicio:	martes, 9 de julio de 2024	**Entidad Contratante**	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Fecha de Terminación:	viernes, 31 de julio de 2026	**Periodo correspondencia:**	Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025

Nº	Nº CONSECUTIVO	ASUNTO / REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN	MEDIO DE ENTREGA	RADICAD		DATOS EMISOR / RECEPTOR		ANEXOS		Nº FOLIOS TOTAL	FECHA MÁXIMA DE RESPUESTA	RESPUESTA		OBSERVACIONES
				FECHA DE RADICADO	Nº RADICADO	DE	PARA	SI	NO			SI	NO	
18	INV-ADM-VIAL-300-25CE	Solicitud accidentalidad vías nacionales 29RSA Y 2902 del mes de febrero de 2025	Correo Certificado	10/03/2025	INV-ADM-VIAL-300-25CE	SECRETARIA DE TRANSITO DOSQUEBRADAS	CONSROCIO ADMON 143		X	1				

PROYECTO:		REVISO:		VoBi:	
CARGO:		CARGO:		CARGO	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA SALIDA	
FORMATO: CCS - CADMON143	VERSION: 0,0

CONSORCIO ADMON 143

Contrato de consultoria N°: 2004 de 2024 **Objeto contractual:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.".

Fecha de Inicio: martes, 9 de julio de 2024 **Entidad Contratante** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Fecha de Terminación: viernes, 31 de julio de 2026 **Periodo correspondencia:** Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025

N°	Nº CONSECUTIVO	ASUNTO / REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN	MEDIO DE ENTREGA	TIPO DE COMUNICADO		OFICIO DE SOLICITUD ENTIDAD		OFICIO AMV2		DATOS EMISOR / RECEPTOR		ANEXOS		N° FOLIOS TOTAL	FECHA MÁXIMA DE RESPUESTA	RESPUESTA		OBSERVACIONES
				RESPUESTA (S/N)	GENERAL (S/N)	FECHA DE RADICADO	N° RADICADO	FECHA DE RADICADO	N° RADICADO	DE	PARA	S	N			SI	NO	
1	INV-ADM-VIAL-317-25CE	Solicitud accidentalidad vías nacionales 29RSA Y 2902 del mes de marzo de 2025	Correo Electronico		S			27/03/2025	INV-ADM-VIAL-317-25CE	CONSORCIO ADMON 143	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		X	1				
2		INFORME SEÑALIZACION	Correo Electronico		S			27/03/2025		SST AMDON 143	CONSROCIO ADMON 143		X	1				
3	INV-ADM-VIAL-300-25CE	Solicitud accidentalidad vías nacionales 29RSA Y 2902 del mes de febrero de 2025	Correo Electronico		S			10/03/2025	INV-ADM-VIAL-300-25CE	CONSORCIO ADMON 143	SECRETARIA DE TRANSITO		X	1				
4	INV-ADM-VIAL-299-25CE	Solicitud accidentalidad vías nacionales 29RSA y 29RSB del mes de febrero del año 2025	Correo Electronico		S			10/03/2025	INV-ADM-VIAL-299-25CE	CONSORCIO ADMON 143	SECRETARIA DE TRANSITO		X	1				
5	INV-ADM-VIAL-295-25CE	Solicitud accidentalidad vías nacionales 29RSA, 29RSB, 2902, 2507, 5003, 25RSA, 50RS01 del mes de febrero del 2025	Correo Electronico		S			10/03/2025	INV-ADM-VIAL-295-25CE	CONSORCIO ADMON 143	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE		X	1				
6	INV-ADM-VIAL-297-25CE	Solicitud accidentalidad vías nacionales 25RSA Y 50RS01 del mes de febrero del 2025	Correo Electronico		S			10/03/2025	INV-ADM-VIAL-297	CONSORCIO ADMON 143	SECRETARIA DE TRANSITO DE LA VIRGINIA		X	1				
7	INV-ADM-VIAL-296-25CE	Solicitud accidentalidad de la vía Nacional Troncal de Occidente 2507 – mes febrero de 2025.	Correo Electronico		S			10/03/2025	INV-ADM-VIAL-296-25CE	CONSORCIO ADMON 143	SECRETARIA DE TRANSITO ANSERMA		X	1				
8	INV-ADM-VIAL-312-25CE	Derecho de petición. Solicitud informe de accidentes rutas: 29RSA, 29RSB, 2902, 2507, 5003, 25RSA, 50RS01 del mes de marzo del	Correo Electronico		S			27/03/2025	INV-ADM-VIAL-312-25CE	CONSORCIO ADMON 143	DIRECCIÓN TRÁNSITO Y TRANSPORTE RISARALDA		X	3				
9	INV-ADM-VIAL-315-25CE	Solicitud accidentalidad de la vía Nacional Santa Cecilia - Asia 5003 – mes de marzo de 2025.	Correo Electronico		S			27/03/2025	INV-ADM-VIAL-315-25CE	CONSORCIO ADMON 143	SECRETARIA DE TRANSITO VITERBO		X	1				
10	INV-ADM-VIAL-314-25CE	Solicitud accidentalidad de la vía Nacional Troncal de Occidente 2507 – mes marzo de 2025.	Correo Electronico		S			27/03/2025	INV-ADM-VIAL-314-25CE	CONSORCIO ADMON 143	SECRETARIO DE TRANSITO ANSERMA		X	2				
11	INV-ADM-VIAL-313-25CE	Solicitud accidentalidad vías nacionales 29RSA y 29RSB del mes de marzo del año 2025	Correo Electronico		S			27/03/2025	INV-ADM-VIAL-313-25CE	CONSORCIO ADMON 143	SECRETARIA DE TRANSITO DE PEREIRA		X	1				
12	INV-ADM-VIAL-303-25CE	Alcance respuesta informe policial N°011 – ruta 2507 PR48+900	Correo Electronico		S			13/03/2025	INV-ADM-VIAL-303-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	X		4				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO
13	INV-ADM-VIAL-316-25CE	Solicitud accidentalidad vías nacionales 25RSA Y 50RS01 del mes de marzo del 2025	Correo Electronico		S			27/03/2025	INV-ADM-VIAL-316-25CE	CONSORCIO ADMON 143	SECRETARIA DE TRANSITO DE LA VIRGINIA		X	1				
14	INV-ADM-VIAL-317-25CE	Solicitud accidentalidad vías nacionales 29RSA Y 2902 del mes de marzo de 2025	Correo Electronico		S	01/04/2025	20250401-7828-E	27/03/2025	INV-ADM-VIAL-317-25CE	CONSORCIO ADMON 143	SECRETARIA DE TRANSITO DE DOSQUEBRADAS		X	2				
15	INV-ADM-VIAL-308-25CE	Atención a emergencia Ruta 2507, Cerritos - Cauyá	Correo Electronico		S	18/03/2025	2025E-VUVRAZ-029004	17/03/2025	INV-ADM-VIAL-308-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	X		16				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ANEXAN CARPETA CON REGISTRO FOTOGRAFICO
16	INV-ADM-VIAL-318-25CE	Respuesta comunicado: memorando circular 2025I-VBOG-019114	Correo Electronico	S		03/04/2025	2025E-VUVRAZ-034993	31/03/2025	INV-ADM-VIAL-318-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Directora Territorial Risaralda	X		8				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO, PDF CON PANTALLAZASOS DE LA APLICACIÓN Y SE ANEXA CARPETA CON EL REGISTRO
17	INV-ADM-VIAL-310-25CE	Construcción vivienda, Ruta 2507 PR 54+900	Correo Electronico	S		19/03/2025	2025E-VUVRAZ-029	18/03/2025	INV-ADM-VIAL-310-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Alcaldía Municipal de Anserma		X	4				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO
18	INV-ADM-VIAL-309-25CE	Solicitud permiso uso de vía ruta 29RSB, PR1+0710	Correo Electronico		S	19/03/2025	2025E-VUVRAZ-029	17/03/2025	INV-ADM-VIAL-309-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS		X	4				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO
19	INV-ADM-VIAL-307-25CE	Cambio personal equipo de trabajo – inspector vial.	Correo Electronico		S	17/03/2025	2025E-VUVRAZ-028	17/03/2025	INV-ADM-VIAL-307-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS		X	48				EN EL PDF ANEXARON HOJA DE VIDA Y ANEXOS DE INFORMACION PARA EL CARGO.
20	INV-ADM-VIAL-309-25CE	Retiro de señal SP-04 Ruta 5003, PR74+730, durante la ejecución contrato 4161 de 2023	Correo Electronico		S	18/03/2025	2025E-VUVRAZ-029	17/03/2025	INV-ADM-VIAL-309-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS		X	4				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO
21	INV-ADM-VIAL-306-25CE	Atención emergencias ruta 50RS01- Apia – La Virginia	Correo Electronico		S	17/03/2025	2025E-VUVRAZ-028	16/03/2025	INV-ADM-VIAL-306-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	X		7				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ANEXAN CARPETA CON REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTROL DE CORRESPONDENCIA SALIDA	
FORMATO: CCS - CADMON143	VERSION: 0,0

CONSORCIO ADMON 143

Contrato de consultoria N°: 2004 de 2024 **Objeto contractual:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.".

Fecha de Inicio: martes, 9 de julio de 2024 **Entidad Contratante** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Fecha de Terminación: viernes, 31 de julio de 2026 **Periodo correspondencia:** Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025

N°	Nº CONSECUTIVO	ASUNTO / REFERENCIA/ DESCRIPCIÓN	MEDIO DE ENTREGA	TIPO DE COMUNICADO		OFICIO DE SOLICITUD ENTIDAD		OFICIO AMV2		DATOS EMISOR / RECEPTOR		ANEXOS		N° FOLIOS TOTAL	FECHA MÁXIMA DE RESPUESTA	RESPUESTA		OBSERVACIONES
				RESPUESTA (S/N)	GENERAL (S/N)	FECHA DE RADICADO	N° RADICADO	FECHA DE RADICADO	N° RADICADO	DE	PARA	S	N			SI	NO	
22	INV-ADM-VIAL-305-25CE	Sitios Críticos por deslizamiento Ruta 50RS01	Correo Electronico		S	17/03/2025	2025E-VUVRAZ-028147	15/03/2025	INV-ADM-VIAL-305-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	X		13				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO Y ANEXAN CARPETA CON REGISTRO FOTOGRAFICO
23	INV-ADM-VIAL-302-25CE	Cotización impresión plegables trimestrales	Correo Electronico		S	14/03/2025	2025E-VUVRAZ-027544	12/03/2025	INV-ADM-VIAL-302	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	X		15				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO,ANEXAN CARPETA CON REGISTRO FOTOGRAFICO, PDF CON INFORMACION, ARCHIVO EN
24	INV-ADM-VIAL-302-25CE	Respuesta comunicado 2025S-VRIS-001613 – Informe capacitación febrero 2025	Correo Electronico	S		12/03/2025	2025E-VUVRAZ-026664	12/03/2025	INV-ADM-VIAL-302-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS		X	11				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO
25	INV-ADM-VIAL-300-25CE	Respuesta comunicado 2025SE-VRIS-022543	Correo Electronico	S		12/03/2025	2025E-VUVRAZ-026657	5/03/2025	INV-ADM-VIAL-300-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	X		13				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO, SE ANEXA CARPETA CON REGISTRO FOTOGRAFICO, PROYECCION PPTO EN PDF, PPTO EN EXCEL
26	INV-ADM-VIAL-295-25CE	Respuesta comunicado 2025S-VRIS-012904	Correo Electronico	S		05/03/2025	2025E-VUVRAZ-023369	5/03/2025	INV-ADM-VIAL-295-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS		X	13				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO
27	INV-ADM-VIAL-294-25CE	Informe de actividades – Limpieza Quebrada La Víbora	Correo Electronico		S	04/03/2025	2025E-VUVRAZ-023	4/03/2025	INV-ADM-VIAL-294-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	X		11				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO, SE ANEXA CARPETA CON REGISTRO FOTOGRAFICO
28	INV-ADM-VIAL-293-25CE	Autorización compra material – Mantenimiento de vías	Correo Electronico		S	04/03/2025	2025E-VUVRAZ-023277	4/03/2025	INV-ADM-VIAL-293-25CE	CONSORCIO ADMON 143	Instituto Nacional de Vías - INVIAS	X		17				EN EL PDF ANEXARON REGISTRO FOTOGRAFICO, SE ANEXA COTIZACIONES EN PDF Y EXCEL

PROYECTO:		REVISO:	REVISO:		VoBi:
CARGO:		CARGO:	CARGO:		CARGO
FIRMA:		FIRMA:	FIRMA:		FIRMA

BITÁCORA

fecha 7 MARZO 2025

tiempo seco

AMV2

Realiza reporte de las vias a cargo

RUTA 2507" Cerritos Cauyai

tiempo seco

PR 39+050 talud inestable, señalizado

PR 39+500 talud inestable se deja señalizado

PR 53+500 perdida de berma. (señalizado)

Se recomienda tránsito con precaución en el punto.

Sin novedad en Couces de rio

Norma

Powered by CamScanner

RUTA 2902 AV Simon Bolivar:
Tiempo seco
Sin novedad a Cauces de rio
Cto 7025 rehabilitación de la via Simon Bolivar puntos priorizados 13 medios (suspendido)
transito normal

RUTA 29RSA Solocion Vial Pereira Dosquebradas:
tiempo seco
Sin novedad en Cauces de rio
tránsito normal

RUTA 25 RSA: paso nacional por la Virginia:
tiempo seco
Cauces de rio estables
transito normal

RUTA 50 RSO1: Apia la Virginia
tiempo seco
talud en PR 13+350 el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias presenta Moraderos producto de AGua de escorrentia AMVR mantiene señalizacion
Se solicita atencion
Contratista Cto 3821- actividad muro de contencion PR 31+050 paso restringido en sector
Cauces de rios estable
transito normal

RUTA 29 RSB: Variante Galicia:
tiempo seco
PR 1+090 obra en construccion

sin novedad; tránsito normal

RUTA 5003" Uiterbo - Apia:"
tiempo seco
PR 75+600 Cerrado un carril por daño en tubería de acueducto. entidad responsable: Empocaldas presenta señalización la excavación esta cubierta por material de de sitio y presenta cobertura para evitar filtración de agua: se tiene CDP se inicia proceso de contratación
Cto H161 (suspendido) tenemos en intervención en el PR 74+740 Retiraron una señal esta en sitio. pendiente de instalar por Contratista.
Puente Uiterbo. Geobolsas instaladas en el rio Cauce desviado

fecha 2 marzo 2025
tiempo seco
AMU: lote 2
Realiza reporte de las vías a cargo
personal Residente
AUX Ingeniera
Inspetor Vial
Conductor
RUTA 2507 Cerritos - Caura:"
tiempo seco
PR 39+050 talud inestable. señalizado
PR 39+500 talud inestable se deja señalizado
PR 53+500 perdida de banca (señalizado)
se recomienda tránsito con precaución en el sector
sin novedad en cauces de rio

RUTA 2402 AU Simon Bolivar:"
tiempo seco

Sin novedad en Cauces de rio
Cto 4025 rehabilitacion de la via Simon Bolivar puntos priorizados 13 tramos (suspendido)
transito normal

RUTA 29 RSA solucion vial pereira dos quebradas:
tiempo seco
Sin novedad en cauces de rio
transito normal

RUTA 25 RSA Paso nacional por la virginia:
tiempo seco
Cauces de rio estables
transito normal

RUTA 50 RSO1: "Apia - la Virginia"
tiempo seco
talud en pr 13+350 el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias, presenta Lloraderos producto de AGua de escorrentia AMUE mantiene señalizacion se solicita Atencion
Contratista Cto 3821 - Actividad muro de contencion pr 31+050 paso restringido en sector
Cauces de vios estables
transito normal

RUTA 29 RSB Variante Galicia:
tiempo seco
pr 1+0690 obra en construccion
Sin novedad transito normal

RUTA 5003: Viterbo - Apia

tiempo seco
PR 75+600 Cerrado un carril por daño en la tubería de acueducto. Entidad responsable. Empocaldas. Presenta señalización. La excavación esta cubierta por material de sitio y presenta cobertura para evitar filtración de agua se tiene CDP. Se realizo observación al contratista a la espera de subsanación para nombramiento de contratista
Cto H161 (suspendido) tramos en intervención
En el PR 74+740 Retiraron una señal esta en sitio pendiente de instalar por Contratista quante Viterbo Geoboleas instaladas en el rio Cauce desviado

Fecha 3 marzo 2025
tiempo seco
AMUR lotera
Realiza reporte de las vias a Cargo
Personal Residente
Aux Ingeniera
Inspector Vial
Conductor
RUTA 2507 Cerritos Cortali
tiempo seco
PR 394 050 talud inestable señalizado
PR 394 500 talud inestable se deja señalizado
PR 534 500 perdida de berma (señalizado) se recomienda tránsito con precaución en el punto.
Sin novedad en Cauces de rio

RUTA 2902 AV. Simon Bolivar
tiempo seco

Sin novedad en Cauce de rio
Cto 4025 rehabilitación de la via Simon Bolivar puntos priorizados 13 tramos
(Suspendido)
tránsito normal

RUTA 29RSA solución vial Pereira-Dosquebradas:
tiempo seco
Sin novedas en Cauces de rio
transito normal

RUTA 25RSA Paso nacional por la Virginia:
tiempo seco
Cauces de rio estables
transito normal

RUTA 50RSOL Apia - la Virginia
tiempo seco
talud en 13+350 el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias: Presenta lloraderos producto de Agua de escorrentia AMUZ mantiene señalización
Se solicita atención:
Contratista Cto 3821 actividad muro de Contención PR 31+050 Paso restrigido en sector.
Cruces de rios estables.
transito normal

RUTA 29RSB Variante Galicia:
tiempo seco
PR1+0690 obra en Construcción
Sin novedad: transito normal.

Norma

RUTA 5003 viterbo - APIA:
tiempo seco
PR75+600 Cerrado un carril por daño en tubería de acueducto. entidad responsable: Empocaldas presenta señalización. la excavación esta cubierta por material de sitio y presenta cobertura para evitar filtración de AGua se tiene CDP. se realizó observaciones al contratista a la espera de sobsanación para nombramiento de contratista Cto #161 (suspendido) tramos en intervención: En el PK 74+740 retiraron una señal esta en sitio, pendiente de instalar por contratista. puente viterbo Reabolsas instaladas en el río Cauce desviado

fecha 4 marzo 2025

tiempo seco
AMUZ Lote2
Realiza reporte de las vias a cargo
Personal Residente
AUX Ingeniera
Inspector Vial
Conductor

RUTA 2507" Cerritos Cobija:
tiempo seco
PR 394 050 talud inestable, señalizado.
PR 394 500 talud inestable se deja señalizado
PR 534 500 perdida de berma (señalizado)
se recomienda transito con precaución en el punto:
Sin novedad en Cauces de río

RUTA 2907" AV simon Bolivar:
tiempo seco
Sin novedad en Cauces de río

Norma

Powered by CamScanner

Cto 4025 rehabilitación de la Vía Simon Bolivar. puntos priorizados 13 tramos (Suspendido)
transito normal

RUTAS 29RSA" Solución Vial Pereira. Dosquebrada
tiempo Seco
INVIAS territorial risaralda. asiste a reunion con el consejo de Dosquebradas: Area metropolitana y Gobernación de risaralda AMVZ tema Central, mantenimiento ruta 29RSA. solucion vial Pereira- Dosquebradas (viaducto César Gaviria trujillo)
Sin novedad en Cauces de rio
transito normal

RUTA 25RSA Paso nacional por la Virginia:
tiempo Seco
Cauces de rios estables
transito normal.

RUTA 50RSO:" Apia - la Virginia
tiempo Seco
Falla en PR 13+350 el Cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias: presenta lloraderos producto de Agua de escorrentia AMVZ mantiene señalizacion
Se solicita Atencion
Contratista cto 3821- Actividad muro de contencion PR 31+050 Paso restringido en Sector.
Cauces de rios estables
transito normal

RUTA 29 RSB Variante Galicia:
tiempo Seco
PR 1+0690 obra en Construccion
Sin novedad: transito normal

Norma

Powered by CamScanner

RUTA 5003" Viterbo APIA:
Tiempo Seco
PR 75+600. Cerrado un Carril por daña de tubería de acueducta Entidad Responsable: EmpoCaldas. Presenta Señalización la excavación esta Cubierta por Material de sitio y presenta cobertura para evitar filtración de Agua se tiene CDP. se realizo observaciones al Contratista a la espera de sobsanación para nombramiento de Contratista.
Puente Viterbo Geobolsas instalados en el rio Cauce desviado

Fecha 5 marzo 2025
Tiempo Seco
AMV 2 lote 2
Realiza reporte de las Vias a Cargo
Personal Residente
AUX Ingeniera
Inspetor Vial
Conductor
RUTA 2507" Cerritos- Caura:
Tiempo Seco
PR 39+050 talud inestable. señalizado
PR 39+500 talud inestable. de doble señalizado
PR 531+500 Perdida de banca (señalizado)
se recomienda transito con precaución en el punto
Sin novedad en Cauces de rio

RUTA 2402' AV Simon Bolivar
Tiempo Seco
Sin novedad en Cauces de rio
Cto 4025 rehabilitación de la via Simón Bolivar, puntos priorizados 13 tramos (Suspendido)
transito normal

64

RUTAS 29RSA Solución Vial Pereira - Dos Quebradas:"
Tiempo Seco
Sin novedad en Cauces de rio
transito Normal

RUTA 50RS01" Apia - la Virginia"
Tiempo Seco
talud en PR 13+350 el cual presenta inestabilidad
Con presencia de lluvias; presenta Moraderos
producto de Agua de escorrentia AMVC
mantiene señalizado
Se solicita atención
Contratista Cto 3821 actividad Muro de contención
PR 31+050 Paso restrigido en Sector,
Se atiende emergencia tala de arbol por principio
de precaución PR 22+950
Cauces de rio estables
transito Normal
RUTA 29RSB Variante "Galicia"
Tiempo Seco
PR 1+0690 Obra en Construcción
Sin novedad; transito normal

RUTA 5003" Viterbo - Apia
Tiempo Seco
PR 75+600 Cerrado un Carril por daño en
tuberia de acueducto, Entidad responsable;
Empocaldas presenta señalización la excavación
esta Cubierta por material de Sitio y presenta
Cobertura para evitar filtración de Agua
se tiene CDP se realizo. observación
al contratista a la espera de SUbSanción
para nombramiento de contratista
C.to 1161 tramos en intervencion:
En el PR 74+740 Retiraron una señal esta en

Norma

Powered by CamScanner

sitio pendiente de instalar por contratista
puente Uitabo. Geobolsas instaladas en el rio
Cauce desviado

Fecha 6 marzo 2025
tiempo por sectores
AMUZ lote 2
Realiza reporte de los vias a Cargo
Personal Residente
AUX INGeniera
Inspetor Vial
conductor
RUTA 2507" Lerritos - Cauya:"
tiempo Nuvlas moderadas
PR 39+050 talud inestable señalizado.
PR 39+500 talud inestable se dejar señalizado
PR 53+500 Perdido de berma (señalizado)
Se recomienda transito con precaución en el
punto.
Sin novedad en Cauces de rio

RUTA 2902" NU Simon Bolivar
tiempo seco
sin novedad en Cauce de rio
CTO 4025 rehabilitación de la via Simon Bolivar
Puntos priorizados 13 tramos (suspendido)
transito Normal

RUTAS 29RSA Solución Vial Pereira-
Dos Quebradas"
tiempo seco
sin novedad en Cauces del rio
transito normal

RUTA 50RSO1 APIA la VIRGINIA"
talud en PR 13+350 el Cual Presenta

Inestabilidad con presencia de lluvias:
presenta Horaderos producto de agua de escorrentia ANLUZ mantiene señalizacion se solicita atencion
Contratista Cto 3821 actividad muro de contencion PR 31+050 paso restringido en sector. se presenta deslizamiento y se habilita carriles en los PR 20+400 PR 19+500 se tala arbol en el PR 20+350 por principio de precaucion y mata de arbol.
Cauces de rios estables
transito normal

RUTA 29 RSB" Variante Galicia:
tiempo seco
PR 1+0690 obra en Construccion
Sin novedad transito normal

RUTA 5003" Viterbo- APIA:
tiempo seco
PR 75+600 Cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, Entidad responsable. Empocaldas. presenta señalizacion la excavacion esta cubierta por material de sitio y presenta Cobertura para evitar filtracion de Agua se tiene CDP. se realizó observaciones al Contratista. a la espera de subsanción para nombramiento de Contratista
Cto 1161 tramos en intervencion:
en el PR 74+740 retiraron una señal esta en Sitio. pendiente de instalar por. Contratista Puente Viterbo. Geobolsas instaladas en el rio Cauce desviado.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 7 marzo 2025
Tiempo seco
AMV2 lote 2
Realiza reporte de las vias a cargo
Personal Residente
AUX Ingeniera
Inspector Vial
Conductor
RUTA 2507 Cerritos - Cauca;
Tiempo Seco
PR 39+050 talud inestable
señalizado
PR 39+500. talud inestable. se deja
señalizado
PR 53+500 perdida de berma. (señalizado)
Se recomienda tránsito con precaución en
el punto sin novedad en Cauces de rio

RUTA 2902" AU Simón Bolivar;"
Tiempo seco
Sin novedad en Cauces de rio
C-to 4025. rehabilitacion de la via.
Simón Bolivar. puntos priorizados 13
tramos. (suspendido)
transito normal.

RUTAS 29RSA" solución vial
Pereira - Dosquebradas;"
tiempo seco
Sin novedad en Cauces de rio.
transito normal

RUTA 25RSA;" paso nacional por
la virginia;"
tiempo; seco
Cauces del rio estables

Transito normal.

RUTA 50RS01" Apia - la Virginia"
Tiempo seco
Talud en PR 13+350. el cual presenta
Inestabilidad con presencia de lluvias;
Presenta Moraderos producto de Agua de
Escorrentia, AMVC mantiene señalización.
Se solicita atención.
Contratista Cto 3821 - Actividad: Muro de
Contención PR 31+050 Paso restringido en
sector.
Se presenta Talud inestable en presencia
de Aguas lluvias, PR 20+400. PR 19+500
Cauces del rios estables,
Transito normal

RUTA 29RSB" Variante Goliciai
Tiempo seco
PR 1+0690 obra en Construcción
Sin novedad; transito normal

RUTA 5003;" Viterbo - Apia"
Tiempo seco
PR 75+800 Cerrado en un Carril por
daño en tuberia de Acueducto, entidad
responsable: Empocaldas. presenta.
Señalización, La excavación esta
Cubierta por material de sitio y
presenta Cobertura para evitar filtración
de Agua. Se tiene CDP. Se realizo
observaciones al Contratista, a la
Cooperativa de Subsanación para nombramiento
de Contratista
Cto H161 tramos en intervención:
en el PR 74+740 retiraron una señal

Norma

Powered by CamScanner

Esta en sitio pendiente de instalar por contratista.
Quante Viterbo Geobolsas instaladas en el rio Cauca desviado

fecha 8 marzo 2025
tiempo seco
AMVC lote 2
Realiza reporte de las Nias a cargo
personal Residente
AUX Ingeniera
Inspector Vial
Conductor
RUTA 2507" Cerritos - Cavia"
tiempo seco
PR 39+050 talud inestable. señalizado
PR 39+500 talud inestable. Se deja señalizado
PR 53+500 perdida de berma (señalizado) se recomienda transito con precaución en el punto.
Sin novedad en Cauces de rio

RUTA 2902" AV Simon Bolivar"
tiempo seco
Sin novedad en Cauces de rio
Cto H025 rehabilitación de la via Simon Bolivar, puntos priorizados 13 tramos (suspendido)
transito normal

RUTAS 29RSA Solucion Vial Pereira Dosquebradas
tiempo seco
Sin novedad en Cauces de rio.

Transito normal

RUTA 25 RSA paso nacional por la Virginia
tiempo: seco
Cauces de rio estables.
transito normal.

RUTA 50 ROL" Apia- la Virginia"
tiempo seco
talud en PR 13+350 el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias; presenta lloraderos producto de Agua de escorrentia AMVC mantiene señalización
Se solicita atención
Contratista Cto 3821- actividad: muro de contención PR 31+050 paso restringido en sector.
Se presenta talud inestable en presencia de aguas lluvias. PR 20+400. PR 19+500 puntos señalizados.
Cruces de rios estables.
transito normal

RUTA 29 RSB "Variante Galicia"
tiempo: seco
PR1+0690 obra en construcción, sin novedad; transito normal

RUTA 5003 "Viterbo- Apia"
tiempo seco
PR 75+600 Cerrado con carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable; Empocaldas presenta señalización la excavación esta cubierta por material de sitio y presenta cobertura para

Norma

Powered by CamScanner

evitar filtración de agua. se tiene CDP se realizo observaciones al Contratista a la espera de subsación para nombramiento de Contratista
Puente Viterbo 6 costales instalados en el rio. Cauce desviado.

Fecha 9 marzo 2025

tiempo seco
AMV 2 lote 2
Realiza reporte de los Vias a Cargo:
Personal Residente
AUX Ingeniera
Inspector Vial
Conductor

"RUTA 2507" Cerritos-Cachia"
tiempo seco
PR 39+050 talud inestable. señalizado
PR 39+500 talud inestable. se deja señalizado
PR 53+500 perdida de berma. (señalizado) se recomienda transito con precaución en el punto.
Sin novedad en Cauces de rio

"RUTA 2902" AV simon Bolivar"
tiempo seco
Sin novedad en Cauces de rio
Cto 4025 rehabilitación de la via simon Bolivar. Puntos priorizados 13 tramos (suspendido)
tránsito normal.

RUTAS 29 KSA" solucion vial Pereira - Dosquebradas"

Norma

Powered by CamScanner

tiempo: seco
Sin novedad en Cauces de rio.
transito normal.

RUTA 25 RSA: " paso nacional por la virginia"
tiempo: seco
Cauces de rio estable
transito normal.

RUTA 50 ROL: "Apia- La virginia"
tiempo seco
talud en PR 13+350 el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias; presenta lloraderos producto de Agua de escorrentia, AMVA mantiene señalizado, se solicita atención.
Contratista Cto 3821- actividad: muro de contención PR 31+050. paso restringido en sector.
se presenta talud inestable en presencia de aguas lluvias. PR 20+400.
PR 19+500 puntos señalizados.
Cauces de rios estables.
transito normal.

RUTA 29 RSB " Variante Caldas"
tiempo seco
PR 1+0690 obra en construcción.
Sin novedad: transito normal.

RUTA 5003 " Viterbo - Apia"
tiempo seco
75+800 Cerrado en carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Empocaldas presenta.

Powered by CamScanner

señalización la excavación esta cubierta por material de sitio y presenta cobertura para evitar filtración de agua) pendiente subsanación de documentos para nombramiento de contratista Cto 4161 tramos en intervención: En el PR 74+740 retiraron una señal esta en sitio pendiente de instalar por contratista.
Puente viterbo Geobolsas instaladas en el rio cauce desviado.

fecha 10 marzo 2025

tiempo por rutas
AMV2 lote 2
Realiza reporte de las vias a cargo
Personal residente
Aux Ingeniera
Inspector Vial
Conductor

"RUTA 2507" Cerritos I - Cauca"
tiempo lluvias moderadas
PR 39+050 talud inestable. señalizado
PR 39+500. talud inestable: se deja señalizado
PR 53+500 perdida de berma. (señalizado) se recomienda transito con precaución en el punto
Sin novedad en cauces de rio

RUTAS 29RSN " Solución vial pereira-
Dos quebradas
tiempo: lluvias moderadas
Sin novedad en cauces de rio
transito normal
RUTA 2902 " AV Simon Bolivar"

tiempo: lluvias moderadas
Sin novedad en cauces de rio
Cto 4025. rehabilitación de la via
Simon Bolivar, puntos priorizados 13
tramos (suspendido?
transito normal

RUTA 25RSA "paso nacional por la Virginia"
tiempo: lluvias moderadas
cauce de rio estables
transito normal

RUTA 50RS01 "Apia - la Virginia"
tiempo lluvias moderadas
talud en PR 13+350 el cual presenta
inestabilidad con presencia de lluvias
presenta lloraderos producto de agua
de escorrentia AMVZ mantiene señalizacion
se solicita atención
contratista Cto 3821 - actividad: muro de
contención PR 31+050 paso restringido en
sector.
Se presenta talud inestable en presencias
de aguas lluvias PR 20+400 PR 19+500
puntos señalizados
Cruces de rios estables
transito normal

RUTA 29RSB "Variante Boliciq"
tiempo seco
PR 1+0690 obra en construcion
Sin novedad; transito normal

RUTA 5003 "Viterbo - Apia"
tiempo lluvias moderadas

PR 75+600, Cerrado un Canal por
daño en tubería de acueducto
entidad responsable: Empocaldas.
presenta Señalización la excavación
esta Cubierta por material de Sitio
y presenta Cobertura para evitar
filtración de agua. Pendiente subsanación
de documentos para nombramiento de
Contratista.
Cto 4161 tramos en intervención:
en el PR 74+740 retiraron una señalización
esta en sitio pendiente de instalar por
Contratista.
Puente Viterbo Geobolsas instaladas en
el rio Cauce desviado

Fecha 11 Marzo 2025

Tiempo Seco — Persona: Residente
AMV2 lote 2 — Aux Ingeniera
Realiza reporte de las vias a cargo: — Inspector Vial
Ruta 2507 "Coritos-causa": — Conductor
Tiempo: Seco.
PR39+050, Talud inestable señalizado. PR39+500, talud inestable, se desea señalización.
PR53+500. Perdida de berma, (Señalizado), se recomienda tránsito con
Precaución en el Punto.
sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2902 "Av. Simon Bolivar".
Tiempo seco.
sin Novedad en cauces del rio
·cto 4025, rehabilitación de la via Simon Bolivar, Puntos Priorizados
13 tramos (suspendido).
transito normal.

Norma

Powered by CamScanner

Ruta 29RSA "solución vial Pereira - Quebradas".
Tiempo seco
sin novedades en cauces del río.
Transito normal.

Ruta 25RSA "Paso nacional por la Virginia".
Tiempo: seco.
cauces de rio estable.
transito normal.

Ruta 50RSO1: "Apia - la Virginia"
Tiempo seco
· Talud en PR13+350, el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias; presenta lloraderos producto de agua de escorrentia, AMV2, mantiene señalización.
Se solicita atención.
· Contratista cto 3821 - actividad: muro de contención PR 31+050. Paso Restringido en sector.
· Se presenta talud inestable en presencia de aguas lluvias, PR 20+400, PR+19+500, puntos de señalización,
cauces de rios estables.
transito normal.

Ruta 29RSB "variante Galicia".
Tiempo seco.
PR 1+0690 obra en construcción.
Sin novedad, transito normal.

Ruta 5003 "Viterbo - Apia".
Tiempo seco
- PR75+600, cerrado un carril por daño de tubería de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta señalización, la excavación esta cubierta por material de sitio y Presenta cobertura para evitar filtración de agua.
Pendiente subsanación de documentos para nombramiento de Contratistas.

Norma

Powered by CamScanner

·cto 4161, trams en intervención:
En el PR 74+740, Retiraron una señal en este sitio, Pendiente de instalar por contratista.
·Puente viterbo. Gcobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.
·Se participa en comite de seguridad vial en la Virginia.
Fecha 12 marzo 2025.
Tiempo seco
Amurzilotez.
Realiza reporte de las vias a cargo:
Personal: Residente
AUX Ingeniera
Inspector Vial
conductor
Ruta 2507 "Cerritos-Cauya".
Tiempo seco.
·PR39+050. Talud inestable, Señalizado.
·PR39+500. talud inestable, se desa señalizado.
·PR53+500 Perdida de berma, (señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.
sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2907 "AV. simon Bolivar".
Tiempo: seco.
sin novedad en cauces del Rio.
·cto 4025, rehabilitación de la via simon Bolivar, Puntos Priorizados 13 trams. (suspendido).
transito normal.

Ruta 29RSA "solución vial Pereira-Dosquebradas".
tiempo: seco
sin novedad en cauces de rio.
transito normal.

Ruta 25RSA: "Paso nacional por la Virginia".
tiempo: seco
causes del Rio estables

Norma

Powered by CamScanner

transito normal.

Ruta 5003: "Apia-la virginia".
tiempo seco
• talud en PR13+350, el cual Presenta inestabilidad con presencia de lluvias: Presenta lloraderos Producto de aguas de escorrentia, AmV2, mantiene señalización.
se solicita atención.
• Contratista cto 382-actividad: muro de contención PR 31 toso. Paso Restringido en sector
• Se Presenta talud inestable en Presencia de aguas lluvias, PR 20+400, PR 19+500, Puntos señalizados.
cauces del Rio estables.
Transito normal.

Ruta 5003 "viterbo-Apia":
Tiempo: seco
• PR75+600, Cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad Responsable: Empocaldas, Presenta señalización, la excavación esta cubierta Por material de sitio y Presenta cobertura Para evitar Filtración de agua.
Pendiente subsanación de documentación Para nombramiento de contratista.
• Cto 4161, tramos en intervención:
• En el PR 74+740, retiración una señal esta en sitio, Pendiente de instalar Por contratista.
Puente Viterbo, Geobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.

Ruta 29BSB "Variante Galicia".
tiempo: seco
PR1+0690 obra en construcción.
Sin novedad; transito normal.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 13 marzo 2025

tiempo seco

AMV2/lote 2

Realiza reporte de las vias a cargo.

Personal: Residente

Aux ingeniera

inspector vial

conductor

Ruta 2507 "Cerritos-cauya":

tiempo seco

- PR39+0,50. talud inestable, Senalizado.
- PR53+500 Perdida de berma (senalizado), se recomienda transito con precaución en el Punto.
- PR39+500 talud inestable. Senalizado.

sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2902 "Av. Simon Bolivar"

tiempo: seco

sin novedad en cauces de rio

- Cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntos priorizados 13 tramos. (suspendido).

Transito normal

Ruta 29RSA "solucion vial pereira-Dosquebradas".

tiempo: seco

sin novedad en cauces de no

transito normal.

Ruta 25RSA: "Paso nacional Por la Virginia"

tiempo seco

talud, cauces de no estable.

transito normal.

Ruta 29RSB "Variante Galicia".

tiempo seco.

PR1+0090 obra en construcción. sin novedad; transito normal

Norma

Powered by CamScanner

Ruta SORSOL: "Apia-La Virginia".
Tiempo seco
-talud en PR13+350, El cual Presenta inestabilidad con presencias de lluvias; Presenta Hormideros Producto de agua de escorrentias, Amv2, mantiene señalización.
se solicita atención.
• Contratista Cto 3821, actividad: muro de contención PR 31+050. Paso restringido en sector.
• se Presenta talud inestable en presencia de aguas lluvias, PR20+400, PR 19+500, Puntos señalizados.
Cauces de rios estables.
transito normal.

Ruta: SO03, "viterbo apia".
Tiempo seco
PR75+600, Cerrado un Carril Por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta Señalización, La excavación esta cubierta Por material de sitio y presenta cobertura Para evitar Filtración de agua.
Pendiente subsanación de documentos Para nombramiento de contratista
• Cto 4161, tramos en intervención:
• En el PR 74+740, retiraron una señal esta en sitio, Pendiente de instalar Por contratista.
• Puente viterbo. 6 geobolsas instaladas en el rio, Cauce desviado.

*se realiza recorrido a ruta SORSOL y se visita ESP virginia en Compañia del supervisor Garrido.

Fecha 14 marzo 2025
tiempo seco
Amv2, lote 2
Realiza reportes de la vias a cargo.
Personal: Residente
Aux ingeniera
Inspector Vial
Conductor

Powered by CamScanner

Ruta 2507 "Cerritos-Cauya"
Tiempo: lluvias intensas
·PR39+050 talud inestable, señalizado.
·PR39+500 talud inestable señalizado.
·PR53+500 Perdida de berma, (señalizado), Se recomienda transito con Precaución enel punto.
Sin novedad en Cauces del rio.

Ruta 2902 "Av. Simon Bolivar"
Tiempo: lluvias intensas.
Sin novedad en cauces del rio
·Cto 4025, rehabilitación de la via Simon bolivar, Puntos Priorizados 13 tramos. (suspendido)
Transito normal.
·PR 1+0440, servicidad realizada reparación de hueco, por intervenciones de tuberia realizadas en años anteriores.

Rutas 29RSA "solución Vial Pereira-Dosquebradas"
Tiempo: lluvias intensas
Sin novedad en cauces de rio.
transito normal.

Ruta 25RSA "Paso nacional Por la Virginia.
Tiempo: lluvias intensas
Cauces de rio estables.
transito normal.

Ruta 50RSO1 "Apia-La Virginia"
Tiempo: lluvias intensas
·Talud en PR13+350, el cual Presenta inestabilidad con Presencia de lluvias; Presenta lloraderas producto de agua de escorrentia, AMV2, contiene señalización.
Se solicita atención.
·Contratista cto 3821 - actividad: muro de contención PR 31+050. Paso Restringido en Sector.
·Se presenta talud inestable en Presencia de aguas lluvias, PR 20+400, PR 19+500, Puntos Señalizados
·Se Presenta deslizamiento PR15+100 restringe 1/2 de carril.

Norma

Powered by CamScanner

• Desplazamiento PR16+350, restringe 1/2 carril.
Cooperativa Centro realiza desplazamiento para inicio de labores de recorte de derrumbes y señalización respectiva.
cauces de rio estables.
transito normal.

Ruta 29BSB "Variante galicia".
tiempo: lluvias intensas
PR1+0690 obra en construcción.
Sin novedad; transito normal.

Ruta 5003 "Viterbo-Apia".
Tiempo lluvias intensas.
PR75+600 Cerrado un carril por daño en tubería de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta señalización, la excavación esta cubierta por material de sitio y Presenta cobertura para evitar Filtración de agua.
Pendiente subsanación de documentación para nombramiento de contratista.
• Cto 4161, tramos en intervención:
En el PR74+740, retiraron una señal esta en sitio, Pendiente de instalar Por contratista.
- Puente viterbo. Geobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.

Capacitación cooperativas sede centro.

Fecha 15 marzo 2025
Tiempo seco
Anv2, lote 2
Realiza reparte de las vias a cargo:
Personal: Residente
Aux Ingeniera
Inspector Vial
Conductor

Powered by CamScanner

Ruta 2507 "Caritos-Cauya".
Tiempo seco
. PR39+050 . talud inestable, señalizado.
· PR39+500 talud inestable, señalizado.
· PR53+500 Perdida de berma, (señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.
Sin novedades en cauces de rio.

Ruta 2902 "Av. Simon bolivar"
Tiempo seco
Sin novedades en cauces del rio
, cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntos priorizados 13 frentes (suspendido).
Transito normal.

Ruta 29RSA "Solución Vial pereira-Cosquebradas".
Tiempo seco
Sin novedad en cauces de rio.
Transito normal.

Ruta 25RSA "Paso nacional por la Virginia"
Tiempo seco
Cauces del rio estables.
Transito normal.

Ruta 50RS01 "Apia-La virginia".
Tiempo Seco
• Talud en PR13+350, el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias, presenta lloraderos producto de agua de escorrentia, AMV2, mantiene señalización se solicita atención.
· Contratista cto 3821 - actividad: muro de contención PR 31 toso. Paso restringido en sector.
• Se presenta talud inestable en presencia de aguas lluvias, PR 70+400, PR 194+500, Puntos señalizados
• Deslizamiento PR15+600, ctva Centro habilita via y señaliza punto.
· Deslizamiento PR16+350, habilita via y señaliza.

Norma

Powered by CamScanner

Cauces de rios estables.
transito normal.

Ruta 29 BSB "variante Galicia".
Tiempo Seco
PR 1+0690 obra en construcción.
Sin novedad; transito normal.

Ruta 5003 "viterbo-Apia".
Tiempo Seco
· PR 75+600, Cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta señalización, la excavación esta cubierta por material de sitio y Presenta cobertua Para evitar Filtración de agua.
Pendiente subsanación de documentos para nombramiento de contratista.
· Cto 4161, tramos en intervención:
en el PR 74+700, retiraron una senal esta en sitio, Pendiente de instalar por contratista.
· Puente viterbo. Geobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.

Fecha 16 marzo 2025
tiempo sectores
Am V2, lote 2.
Realiza reporte de las vias a cargo:

Personal	Residente
AUX	Ingeniera
Inspector	Vial
	conductor

Ruta 2507 "cerritos-cayca":
Tiempo Seco.
PR 39+050 talud inestable, señalizado.
PR 39+500 talud inestable, señalizado.
PR 53+500 Perdida de berma, (señalizado), se recomienda transito con Precaución en el punto.
Sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2902 "Av. Simon Bolivar".
Tiempo. seco
sin novedad en cauces de rio.
•cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntos Priorizados 13 tramos. (suspendido).
Transito normal.

Rutas 29RSA "Solución Vial Pereira - Dosquebradas."
Tiempo Seco
sin novedad en cauces de rio.
transito normal.

Ruta 25RSA "paso nacional Por la Virginia".
Tiempo lluvias moderadas, Rios con aumento de cauce.
Transito normal.

Ruta 50RS01 "Apia - La Virginia".
Tiempo lluvias intensas.
•talud en PR13+350, el cual presenta inestabilidad con presencia de lluvias; presenta llorederos producto de agua de escorrentia, AMV2, mantiene señalización.
Se solicita atención.
•Contratista Cto 3821, actividad: muro de contención, termina labores, se habilita carril.
•se presenta talud inestable en presencia de aguas lluvias, PR 20+400, PR 19+500, Puntos señalizados.
•Deslizamiento PR15+350, medio carril, a linea amarilla chva centro inicia traslado se requisere atención de activos de la zona.
•Deslizamiento PR16+350, medio carril, centro inicia traslado se requiere activos en zona.
cauces de rios estables.
transito normal.

Ruta 29RSB "Variante Galicia".
Tiempo Seco
PR1+0690 obra en construcción.
Sin novedad; transito normal.

Norma

Powered by CamScanner

Ruta 5003 "Viterbo-apia".

tiempo Seco

- PR75+600, Cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta Señalización, la exavación esta cubierta por material de sitio y Presenta cobertura para evitar Filtración de agua.

Pendiente Subsanacion de documentos Para nombramiento de contratista.

- Cto 4161, tramos en intervención: En el PR 74+740 retiraron una señal esta en sitio, Pendiente de instalar Por Contratista.
- Puente viterbo. Geobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.

Novedades

Amv2,

Ruta 50RSO1, PR14+650 ctv centro, Realizando limpieza de calzada, en uno de los Puntos de atención.

Ruta 50RSO1, PR13+350 ctv centro, Realizando limpieza de calzada y material deslizamiento en uno de los Puntos criticos

Calzada en la ruta 50RSO1, PR.13+350 limpia y habilitada.

sin embargo continua desprendimiento de material de talud, actualiza información.

Ruta 50RSO1

PR15+100 Realiza recorte deslizamiento, con apoyo ctva centro. se despesa linea amarilla y se deja señalización.

Cto 2415 realizara labores de apoyo con maquinaria.

Fecha 17 marzo 2025

tiempo seco

Amv2, lote 2

Realiza reporte de las vias a cargo:

Personal	Residente
Aux	ingeniera
inspector	vial
	conductor

Norma

Powered by CamScanner

Ruta 2507 "Centas-cauyá"
Tiempo seco
·PR39+050 talud inestable, señalizada
·PR39+500 talud inestable, señalizado.
·PR53+500 perdida de berma (señalizado). Se recomienda transito con precaución en el punto.
sin novedad en cauces del Rio.

Ruta 2902 "Av. Simon bolivar".
Tiempo seco
Sin novedad en cauces de rio
·cto 402S, rehabilitación de la via simon bolivar, Punto Atendido 13 tramos. (Suspendido).
transito normal.

Rutas 25BSA "Paso nacional por la Virginia"
tiempo seco
cauce estable
transito normal.

Ruta 50BSI "Paso Apia-la virginia"
Tiempo seco
-Talud en PR13+350, el cual presenta pequeños deslizamientos de material suelto y llaraderos Producto de agua de escorrentia, Amv2, mantiene señalización y limpieza de material.
se solicita atención.
· Se presenta talud inestable en presencia de aguas lluvia, PR20+400, PR19+500, puntos señalizados.
· deslizamiento PR15+100, medio carril a linea amarilla ctua Centro realiza recorte y señalización del punto.
Sera atendido por cto 241S.
cauces de rios estables, transito normal.

Ruta 29BSB "variante Galicia".
TIEMPO: Seco
PR1+0690 obra en construcción.
Sin novedad; transito normal.

Powered by CamScanner

Ruta 5003 "Viterbo-Apia":
Tiempo: seco
• PR75+600, Cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, presenta señalización la excavacion esta cubierta por material de sitio y presenta cobertura para evitar filtración de agua.
Pendiente subsanación de documentos para nombramiento de contratista.
• cto 4161, traros en intervención:
• En el PR74+740, retiraron una señal esta en sitio, Pendiente de instalar por contratista.
• Puente viterbo. Geobolsas instaladas en el rio, Cauce desviado.

Rutas 29RSA "Solucion vial Pereira-Bosquebradas"
Tiempo: seco
Sin novedad en cauces de rio
transito normal

Comite de seguimiento administración en curias.

Fecha 18 marzo 2025
tiempo Seco
AMV2, lote 2
Realizo reporte de las vias a caso:
Persona Residente
Aux Ingeniera
Inspector Vial
Conductor

" Ruta 2507 "cerritos-Cauya":
tiempo: seco
• PR39+050. talud inestable, Señalizado.
• PR39+500 talud inestable, Señalizado.
• PR53+500 Perdida de berma, (Señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.
Sin novedad en cauces de rio.

Norma

Ruta 2902 "AV. Simon bolivar"
Tiempo Seco
Sin novedad en cauces de rio
· Cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntos priorizados 13 tramos (suspendido)
Transito normal.

Rutas 29BSA "Solución vial Pereira - Dosquebradas"
Tiempo Seco
sin novedad en cauces de rio.
transito normal.

Ruta 25RSA: "Paso nacional Por la Virginia"
Tiempo: Seco
Cauce estable.
transito normal.

Ruta 50RS01 "Apia-la Virginia"
Tiempo Seco
- Talud en PR13+350, el Cual Presenta pequeños deslizamientos de material suelto. y Alcaraderos Producto de agua de escorrentia, AMV2, mantiene señalización y limpieza de material.
Se solicita atención.
· Se presenta talud inestable en presencia de aguas lluvias, PR 20+400, PR 19+500, Puntos Señalizados.
· Deslizamiento PR15+100, 15 metros carril a linea amarilla ctva centro realiza recorte y Señalización del punto.
se solicita atención.
Cauces de rios estables.
transito normal.

Ruta 29BSB "Variante Galicia".
Tiempo Seco
PR1+0690 obra en Construcción.
Sin novedad; transito normal.

Powered by CamScanner

Ruta 5003 "Viterbo-Apia"
Tiempo Seco
• PR75+600, Cerrado un carril por daño en tubería de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta señalización, La excavación esta cubierta por material de sitio y presenta cobertura para evitar Filtración de agua.
Pendiente subsanación de documentos para nombramiento de contratista.
• Cto 4161, tramos en intervención:
En el PR74+740, retiraron una señal esta en sitio Pendiente de instalar por contratista.
• Puente Viterbo Geobolsa instaladas en el rio Cauce desviado.

Fecha 19 marzo 2025
Tiempo seco
Anuz, lotez
Realiza reporte de los vias a cargo:

Persona	Residente
Aux	Ingeniera
Inspector	Vial
	Conductor

Ruta 2503 "Cerritos-Cauya"
Tiempo Seco.
• PR39+500 talud inestable señalizado.
• PR39+520 talud inestable. Señalizado
• PR 53+500 Perdida de berma (señalizado), Se recomienda transito con Precaución en el punto.
Sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2902 "Av. Simon bolivar".
Tiempo Seco
Sin novedad en cauces de rio
• Cto 4025, rehabilitación de la via Simon bolivar, Puntos priorizados 13 tramos (Suspendido).
transito normal.

Rutas 29RSA "Solución Vial Pereira-Dosquebradas".
tiempo seco
Sin novedad en cauces de rio.
transito normal.

Ruta 25RSA: "Paso nacional por la Virginia".
tiempo seco
cauce estable.
transito normal

Ruta 50RSO1 "Apia-La Virginia".
tiempo seco
• talud en PR13+350, el cual presenta pequeños deslizamientos de material suelto y lloraderos producto de agua de escorrentia, AMV2, mantiene señalización y limpieza de material.
se solicita atención.
• Deslizamiento PR15+100, contratista 2415, el dia de hoy continua retiro de material de deslizamiento.
Cauces del rio estable.
transito normal.

Ruta 29RSB "variante Galicia".
tiempo seco
PR1+070 obra en construcción.
Sin novedad; transito normal.

Ruta 5003 "Viterbo-Apia".
tiempo seco
• PR75+600, Cerrado un carril Por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: empocaldas: Presenta señalización, la excavación esta cubierta Por material de sitio y presenta cobertura Para evitar Filtración de agua.
Pendiente Subsanación de documentos Para nombramiento de contratista.
• Cto 4161, tramos en intervención:
En el PR74+740, retiraron una señal esta en sitio, Pendiente de instalar Por contratista.
• Puente Viterbo. Goobolsas ¡ntaladas en el rio, cauce desviado.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 20 marzo 2025

Tiempo seco:

Am V2, lote 2.

Realiza reparte de las vias a cargo:

Personal	Residente
Aux	Ingeniera
inspector	vial
	conductor

Ruta 2507 "Cerritos-cauya".

tiempo seco

- PR39+500. talud inestable, señalizado.
- PR39+520. talud inestable, señalizado.
- PR 53+500. perdida de berma, (señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.

Sin novedad en cauces del rio.

Ruta 2902 "Av. Simon Bolivar".

tiempo seco

Sin novedad en cauces del rio

- Cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntas Priorizados 13 frentes (suspendido)

Transito normal.

Rutas 29RSA "solución vial Pereira-Basquebradas".

Tiempo seco

Sin novedad en cauces de rio.

transito normal.

Ruta 25RSA: "Paso nacional por la Virginia".

tiempo seco

cauce estable.

transito normal.

Ruta 50RSO1 "Apia-la virginia".

tiempo seco

Norma

Powered by CamScanner

•talud en PR13+350, el cual presenta pequeños deslizamientos los cuales realizo limpieza el cto 2415, Amv2 y ctva centro; mantiene señalización y limpieza de material.
cauces de ríos estables.
Transito normal.

Ruta 29RSB "variante galicia".
tiempo seco
PR1+070 obra en construcción.
sin novedad transito normal.

Ruta 5003 "viterbo-Apia".
tiempo seco
·PR75+600 Cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta señalización, la excavación esta cubierta por material de sitio y Presenta cobertura Para evitar Filtración de agua.
Pendiente subsanación de documentos para nombramiento de contratista.
•cto 4161, tramos en intervención:
• En el PR 74+740, retiraron una señal esta en sitio, Pendiente de instalar por contratista.
• Puente viterbo. Geobolsas instaladas en el rio, calce desviado.

Fecha 21 marto 2025
tiempo Seco
Amv2, lote 2.
realiza reporte de las Vias a cargo:
Personal: Residente
Aux ingeniera
inspector vial
conductor

Ruta 2504 "cerritos-Cayd":
tiempo Seco
• PR39+500 talud inestable, señalizado.
• PR39+570 talud inestable, señalizado.
·PR53+500 Perdida de berma, (Señalizado), Se recomienda transito con Precaución

en el punto.
Sin novedad en cauces de río.

Fecha 21 marzo 2025
tiempo seco
Ruta 2402 "AV. simon bolivar".
Sin novedad en cauces de río
•cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntos Priorizados 13 tramos (suspendido).
transito normal.

Rutas 29RSA "solución vial Pereira-Dosquebradas".
tiempo seco
Sin novedad en cauces de río
transito normal

Ruta 25RSA "paso nacional Por la virginia".
tiempo seco
cauce estable
transito normal.

Ruta 50RS01 "Apia-La virginia".
tiempo seco
• talud en PR13+350, presenta saturación de material y material suelto con mvto de reptación y deterioro.
Amv 2 y ctva centro = mantiene señalización y limpieza de material.
cauces de rios estables
transito normal.

Ruta 29RSB "variante santuario".
tiempo seco
PR1 todo obra en construcción.
Sin novedad; transito normal.

Norma

Ruta 5003 "viterbo-Apia":
tiempo seco
•PR75+600, Cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Enpocaldas, Presenta señalización, La excavación esta cubierta por material de sitio y Presenta cobertura para evitar filtración de agua.
Pendiente subsanación de documentos para nombramiento de contratista.
• Cto 4161, tramos en intervención:
• En el PR74+740, retiraron una señal esta en sitio, Pendiente de instalar por contratista.
• Puente viterbo. Geobolsas instaladas en el rio, cauces desviado.

Fecha 22 marzo 2025
tiempo seco
ANV4 lote 2
Realiza reporte de las vias a cargo:
Personal Residente
AUX Ingeniera
Inspector Vial
Conductor

Ruta 2507 "Cerritos-cayya"
tiempo seco
•PR30+500 talud inestable señalizado
•PR39+520 talud inestable señalizado
•PR53+500 Perdida de berma, (señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.
Sin novedades en cauces de rio.

"Ruta 2902" Av. Simon bolivar".
tiempo seco
sin novedad en cauce de rio.
•cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntos priorizados 13 tramos. (suspendido).
transito normal.

Rutas 29RSA "solución vial Pereira-Busquebradas".
tiempo seco
Sin novedad en cauces de rio.
transito normal.

Ruta 25RSA "Paso nacional por la virginia."
tiempo seco.
• Talud en PR13+350, presenta saturación de material y material suelto con muto de reptación y deterioro.
Anuz y ctua centro; mantiene senalización y limpieza de material.
cauces de rios estable.
transito normal.

Ruta 29RSB "variante Galicia".
tiempo seco
PR1+0710 obra en construcción.
sin novedad; transito normal.

Ruta 5003 "viterbo-Apia".
tiempo seco
PR75+600, cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, presenta senalización, la excavación esta cubierta por material de sitio y presenta cobertura para evitar filtración de agua.
ctto 4161, tramos en intervención:
• En el PR 74+740, retiraron una señal esta en sitio, pendiente de instalar por contratista
• puente viterbo. Geobolsus instalados en el rio, cauce desviada

Ruta 50RS01 "apia-la virginia".
tiempo seco
• talud en PR13+350, Presenta saturación de material y material suelto con muto de reptación y deterioro
Anuz y ctua centro: mantiene senalización y limpieza de material.
cauces de rios estables.
transito normal.

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 23 marzo 2025

tiempo seco

AMV2, lote 2.

Realiza reporte de las vias a cargo:

personal	residente
AUX	ingeniera
inspector	vial
	conductor

Ruta 2507 "cerritos-cayá".

tiempo seco

- PR39+500 talud inestable, señalizado.
- PR39+520 talud inestable, señalizado.
- PR 53+500 perdida de berma, (señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.

sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2402 "Av. Simon bolivar".

tiempo seco

Sin novedad en cauces de rio

- Cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntos Priorizado 13 tramos (suspendido)

transito normal.

Ruta 29RSA "Salucion vial Pereira-Dosquebradas".

tiempo seco

sin navedad en cauces de rio.

transito normal.

Ruta 25RSA "Paso nacional por la Virginia.

tiempo seco

cauce estable.

transito normal.

Norma

Powered by CamScanner

Ruta 50RS01: "Apia-La Virginia".
Tiempo seco
·Talud en PR137+350, Presenta saturación de material y material suelto con
muro de reptación y deterioro.
Amv2 y Ctva centro; mantiene señalización y limpieza de material.
cauces de rios estable.
transito normal.

Ruta 29RS8 "Variante Galicia".
Tiempo Seco
PR1+070 obra en construcción.
Sin novedad, transito normal.

Ruta 5003 "Viterbo-Apia":
Tiempo Seco
·PR75+600, Cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad
responsable: Empocaldas, Presenta señalizacion, la excavación esta cubierta
Por material de sitio y presenta cobertura Para evitar Filtración de agua
·Cto 4161, tramos en intervención:
·puente viterbo. Geobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.

Fecha 24 marzo 2025
tiempo seco
Amv2, lote
realiza reporte de las vias a cargo:
personal residente
Aux ingeniera
inspector vial
conductor

Ruta 2507 "Cerritos-Cauyá":
Tiempo Seco
·PR 39+500 talud inestable, Señalizado.
·PR 3a+520 talud inestable, Señalizado.
·PR 53+500 Perdida de berma, (Señalizado), Se recomienda transito con
precaución en el Punta

Sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2902 "AV. Simon bolivar".
Tiempo Seco
Sin novedad en cauces de rio.
·cto 4025, rehabilitación de la via Simon bolivar, Puntos priorizados 13 frentes. (suspendido)
transito normal.

Ruta 29RSA "solución vial Perera-Basquebredas".
tiempo Seco
Sin novedad en cauces de rio
transito normal.

Ruta 25RSA "Paso nacional por la virginia".
tiempo Seco
cauce estable
transito normal

Ruta 50RS01 "Apia-la virginia".
tiempo Seco
·talud en PR13+350, Presenta Saturación de material y material suelto.
con nuto de reptación y deterioro.
· talud PR 15+100, Inestable en Presencia de lluvias.
· talud PR 20+400, Inestable en Presencia de lluvias.
Transitar con Precaución en Puntos Citados.
cauces de rio estable.
transito normal.

Ruta 20RSB "Variante Galicia".
tiempo Seco
PR1+0 Flo obra en construcción.
Sin novedad; transito normal.

Norma

Powered by CamScanner

Ruta 5003 "Viterbo-Apia".
tiempo seco
- PR 75+600, Cerrado un carril por daño en tubería de acueducto, entidad responsable: Empocaldas; presenta señalización, la excavación esta cubierta por material de sitio y presenta cobertura para evitar filtración de agua.
- cto 4161, tramos en intervención:
- Puente Viterbo. Geobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.

Fecha 25 marzo 2025
tiempo seco
Am V2, lote 2.
Realiza reporte de las vias a cargo:
Personal residente
AUX ingeniera
Inspector vial
conductor

Ruta 2507 "Caritos-Cauca":
tiempo seco
- PR 39+500 talud inestable, señalizado.
- PR 39+520 talud inestable, señalizado.
- PR 53+500 Perdida de berma (Señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.

Sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2902 "AV. Simon bolivar".
tiempo seco
Sin novedad en cauce del Rio.
- cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar. Puntos priorizados 13 tramos. (suspendido).

transito normal.

Ruta 29RSA "Solucion Vial Pereira-Dosquebradas".
tiempo seco
sin novedad en cauces de rio. transito normal.

Norma

Powered by CamScanner

Ruta 25RSA: "Paso nacional por la Virginia".
tiempo: Seco
Cauce estable.
transito normal.

Ruta 50RSA "Apia-La Virginia".
tiempo Seco
- Talud en PR13+350, Presenta saturación de material y material suelto con nula de reptación y deterioro.
- Talud PR15+100, inestable en presencia de lluvia.
- Talud PR20+400, inestable en presencia de lluvia.

Transitar con Precaución en puntos citados.
Cauces de rios estables.
Transito normal.

Ruta 29RSB "Variante Galicia".
tiempo Seco
PR1+070 obra en construccion.
Sin novedad; transito normal.

Ruta 5003 "viterbo-Apia".
tiempo-Seco
- PR75+600, cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad Responsable: Empocables, Presenta señalización, la excavacion esta cubierta por material de sitio y Presenta Cobertura para evitar Filtración de agua.
- cto 4161, tramos en intervención:
- Puente viterbo, 6 costalsas instaladas en el rio, Cauce desviado.

Fecha 26 marzo 2025
tiempo Seco
AMU2, tote 2
Realiza reporte de las vias a cargo.
Personal residente conductor
Aux Ingeniera
inspector Vial

Norma

Ruta 2507 "Cerritos-cayya" =
tiempo seco
- PR39+500 talud inestable, señalizado
- PR39+520 talud inestable, señalizado
- PR53+500 Perdida de berma, (señalizado), Se recomienda transito con precaución en el punto.

Sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2907 "Av. Simon bolivar".
tiempo seco
Sin novedad en cauces de rio
- cto 4025, rehabilitación de la via Simon bolivar, Puntos priorizados 13 tramos (suspendido).

transito normal.

Ruta 2ARSA "solucion vial Pereira-Cosquebradas".
tiempo seco
Sin novedad en cauces de cto
transito normal.

Ruta 2SRSA "Paso nacional por la virginia".
tiempo seco
cauce estable
transito normal

Ruta 50RS01= "Apia-La virginia".
tiempo seco
- talud en PR13+350, Presenta saturación de material y material suelto con mvto de reptación y deterioro.
- talud PR 15+100, inestabilidad en presencia de lluvia.
- talud PR 20+400, inestabilidad en presencia de lluvia.

transitar con precaución en puntos citados.
Cauces de rios estables.
transito normal.

Powered by CamScanner

Ruta 29 RSB "Variante Galicia".
Tiempo seco
PR1+0710 obra en construcción
Sin novedad, transito normal

Ruta 5003 "Viterbo-Apia".
Tiempo: seco
· PR75+600, cerrado un carril por daño en tubería de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta señalización, la excavación esta cubierta por material de sitio y Presenta cobertura Para evitar filtración de agua.
· cto 4161, tramos en intervención:
Puente Viterbo: 6cobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.

Fecha 27 mar 20 2025
tiempo seco
AMV2, lote 2
Realiza reporte de las vias a cargo:
Personal Residente
Aux Ingeniera
Inspector vial
conductor

"Ruta 2507 "cerritos-cauyá":
Tiempo seco
· PR 39+500 talud inestable, señalizados.
· PR 39+520 talud inestable, señalizados.
· PR 53+500 Perdida de berma, (señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.
Sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2902 "Av. Simon bolivar".
Tiempo seco
Sin novedad en cauces de rio
· cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntos Priorizados 13 tramos. (Suspendido).

transito normal.

Rutas 29RSA "Solucion vial Pereira-Dosquebradas".
tiempo seco
sin novedades en cauces de rio.
transito normal.

Ruta 25RSA: "Paso nacional Por la virginia".
tiempo seco
cauce estable
transito normal.

Ruta 50RSO1 "Apia - La Virginia".
tiempo seco
· talud en PR13+350, presenta saturación de material y material suelto con muto de reptación y deterioro.
· talud PR 15+100, inestable en presencia de lluvia.
· talud PR 20+400, inestable en presencia de lluvia.
transito con precaución en puntos citados.
cauces de rios estables.
transito normal.

Ruta 29RSB "Variante Galicia".
tiempo seco
PR1+070 obra en construcción.
Sin novedad transito normal.

Ruta 5003 "viterbo - Apia".
tiempo seco
·PR75+600, cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable Empocaldas, Presenta senalización, se inicia trabajos de reposición de pavimento asfaltico, tiempo estimado 15 dias
· cto 4161, tramos en intervención:
·Puente viterbo. Gcobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.

Powered by CamScanner

Fecha 28 2025 marzo

tiempo seco

AMV2, lote 2

Realiza reporte de las vias a Cargo:

Personal residente

Aux ingeniera

Inspector Vial

Conductor

"Ruta 2507 "cerritos-cauya'";

tiempo seco

- PR39+500 talud inestable, señalizado.
- PR39+520 talud inestable, señalizado.
- PR38 +500 Perdida de berma (señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.

Sin novedad en cauces de rio.

Ruta 2902 "Av. Simon bolivar".

tiempo seco.

Sin novedad en cauces de rio

- cto 4025, rehabilitacion de la via simon bolivar, puntos priorizados: 13 tramos. (sus pendido).

transito normal.

Rutas 29RSA "solucion Vial pereira-Bosquebradas".

tiempo-seco

sin novedad en cauces de rio.

transito normal.

Ruta 25RSA "paso nacional por la Virginia".

tiempo seco

cauce estable

transito normal.

Norma

Powered by CamScanner

Ruta 5085O1 "Apia-la virginia".
tiempo seco
•Talud en PR13+350, Presenta saturación de material y material sello con nulo de reptación y deterioro.
•talud PR 15+100, inestable en presencia de lluvia.
•talud PR 7o+400, inestable en presencia de lluvia.
Transitar con precaución en puntos citados.
cauces del rio estable.
transito normal.

Ruta 7085B "variante Galicia".
tiempo seco
PR1+0710 obra en construcción.
Sin novedad; transito normal.

Ruta 5002 "Viterbo-Apia".
tiempo seco
•PR75+600, cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta señalización, se inicia trabajos de reposicion de pavimento estabilico, tiempo estimado 15 dias
•cto 4161, tramos en intervención;
puente viterbo. Geobolsas instaladas en el rio, cauce desviado.

fecha 29 marzo 2025
tiempo seco
AMV2
Realiza reporte de las vias a cargo
Personal Residente
AUX Ingeniera
Inspector Vial
Conductor
RUTA 2507" Cerritos - Cauca
tiempo: seco
PR 39+500. talud inestable. señalizado
PR 39+520 talud inestable señalizado
Pérdida de berma.

(señalizado) se recomienda tránsito
con precaución en el punto.
sin novedad en cauces de rio.

RUTA 7907" Av Simon Bolivar"
tiempo seco
sin novedad en cauces de rio
cto 4025 rehabilitación de la va simón
Bolivar. puntos priorizados 13 tramos.
(suspendido)
transito normal.

RUTAS 29RSA" solución vial
pereira - dosquebradas"
tiempo seco
sin novedad en cauces de rio.
transito normal."

RUTA 25RSA:" paso nacional por la
virginia"
tiempo seco
cauce estable.
tránsito normal

RUTA 50RS01" Apia - la Virginia"
tiempo seco
talud en PR 13+350, presenta
saturación de material y material suelto
con muto de raptación y deterioro.
talud PR 15+100 inestable en presencia
de lluvia,
talud 20+400 inestable en presencia
de lluvia.
transitar con precaución en puntos
citados.
Cauces de rios estables

Norma

Powered by CamScanner

Transito normal.

RUTA 29 RSB" Variante Caticia"
Tiempo Seco
PR 1+0710 obra en construcion,
Sin novedad; transito normal.

RUTA 5003 " Viterbo- Apicai"
Tiempo Seco
PR 75+600 Cerrado en carril por daño
en tuberia de acueducto, entidad
responsable: Empocaldas presenta
señalizacion se inicia trabajos de
reposicion de pavimento asfaltico,
tiempo estimado 15 dias
C/o H161 tramos en intervencion;
puente Viterbo. Gaboblas instaladas en
el rio. Cauce desviado.

Fecha 30 marzo 2025
Tiempo Seco
AMV2
Realiza reporte de las vias a Cargo:
Personal Residente
Aux " Ingeniera
Inspetor Vial
Conductor
RUTA 2507 " Cerritos Cauya"
Tiempo Nuvios en algunos Sectores,
PR 39+500 talud inestable señalizado
PR 39+520 talud inestable. señalizado
PR 53+500 perdida de berma,
(señalizado) se recomienda tránsito
con precaucion en el punto.
Sin novedad en cauces de rio

Ruta 2902 "Av. Simon bolivar".
tiempo seco.
sin novedad en cauces del rio.
· pto 425, rehabilitación de la via simon bolivar, puntos priorizados 13 tramos (suspendido)
transito normal.

Ruta 29RSA "solución vial pereira - Dosquebradas".
tiempo: seco
la secretaria de deporte de dosquebradas realiza actividad vía activa en el
UC6 t, hasta 12 pm (sin novedad)
sin novedad en cauces de rio.
transito normal.

Ruta 25RSA "Peso nacional por la Virginia".
tiempo seco
cauce estable
transito normal.

Ruta 50RSA "Apia - la Virginia".
tiempo seco
· talud en PR13+350, presenta saturación de material y material suelto con muro de reptación y deterioro.
· talud PR 15+100, inestable en Presencia de lluvias.
· talud PR 20+400, inestable en Presencia de lluvias.
transitar con Precaución en puntos citados.
cauces de rios estable.
transito normal.

Ruta 29RS13 "Variante galicia".
tiempo seco
PR1+0710 obra en construcción.
sin novedad, transito normal.

Ruta 5002 "Viterbo - Apia".
tiempo seco.
· PR75+600, cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad

Norma

Powered by CamScanner

responsable: Empocaldas, presenta señalización, se tiene compactado hasta nivel de Sub base.
•cto 4161, tramos en intervención:
•Puente vitorbo, 6 cebolsas instaladas en cauce, cauce desviado.

Fecha 31 marzo 2025
tiempo seco
Amuz
Realiza reporte de las vias a cargo:
Personal residente
AUX ingeniera
inspector vial
conductor.

Ruta 2507 "cerritos - cauya":
tiempo seco.
• PR39+500, talud inestable. señalizado.
• PR39+520, talud inestable. señalizado.
• PR 53+500. Perdida de berma. (señalizado), se recomienda transito con precaución en el punto.
Sin novedad en cauces de rio

Ruta 2902 "Av. Simon bolivar".
tiempo: seco
sin novedad en cauces de rio.
•cto 4025, rehabilitación de la via simon bolivar, Puntos priorizados 13 tramos (suspendido).
transito normal.

Rutas 2RBSA "solución vial pereira-Dosquebradas".
tiempo seco
sin novedad en cauces de rio.
transito normal.

Ruta 2SRSA: "Paso nacional Por la Virginia".
tiempo: seco.

Norma

Powered by CamScanner

cauce estable.
transito normal.

Ruta 50RS01 "Apia-la virginia".
tiempo seco.
talud en PR13+350, Presenta saturación de material y material suelto con nulo de reptación y deterioro.
·talud PR 15+100, inestable en presencia de lluvia.
·talud PR 20+400, inestable en Presencia de lluvia.
transitar con precaución en puntos citados.
cauces de rios estable.
transito normal.

Ruta 29RS12 "variante selva".
tiempo seco.
PR1+0710 obra en construcción.
sin novedad, transito normal.

Ruta 5003 "viterbo-Apia".
tiempo seco.
· PR75+600, cerrado un carril por daño en tuberia de acueducto, entidad responsable: Empocaldas, Presenta señalización, se tiene compactado hasta nivel de Sub base.
· cto 4161, tramos en intervención.
· Puente viterbo, Geobolsas instalados en el rio, cauce desviado.

Powered by CamScanner

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME MES DE MARZO DEL 2025 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO ADMON 143 AMV2

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente documento elaborado por **CONSORCIO ADMON 143** Contiene el **INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA N°02**, correspondiente a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo del 2025, el cual muestra de manera resumida las diferentes actividades realizadas como parte del **Contrato de Interventoría 2004 DEL 2024** cuyo objeto es **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2.".**

En este Informe, la Interventoría hace una descripción a **INVIAS** de las actividades realizadas, de tal manera que, le permita tener a la entidad una visión general del desarrollo del **Contrato de Obra 2004 DEL 2024.** desde la firma del acta de inicio, en sus aspectos de seguridad y salud en el trabajo.

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

1. CONSORCIO ADMON 143 – AMV2

1.1 LISTADO DE PERSONAL CONSORCIO ADMON 143-AMV2

Se verifica los pagos de seguridad social, afiliaciones ARL- EPS- AFP y parafiscales del personal que se encuentra laborando en el proyecto.

N°	DATOS DEL TRABAJADOR										DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO		
	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	N° DE IDENTIFICACION	CARGO	N° CELULAR	EDAD	RH	INFORMACION MEDICA	ENTIDAD A LA CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO					
								SALUD	PENSION	ARL	NOMBRE	DIRECCION	CELULAR
1	JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES	1085245598	RESIDENTE ADMV	3117806016	38	A-	si	NUEVA EPS	COLPENSION	SURA	Camilo Erazo-Tito Erazo	Calle 43 N°7-16	3218303019-3125711125-3136942965
2	KELLY JOHANNA RAMIREZ CUERVO	1.088.007.166	ING AUXILIAR	300 5182271	33	A+	si	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	Cesar Ramírez	CRA 9 47-21 Playa rica	3207457874
3	EDIRLANDO BALLESTEROS MAYA	1089719143	CONDUCTOR	3126256454	35	O+	SI	NUEVA EPS	COLPENSION	SURA	Luisa maría serna	Tinajas	3152939284
4	YULIANA REYES HERNANDEZ	1088267280	INSPECTOR SISO	3137229279	35	A+	SI	SOS	PORVENIR	SURA	JOSE REYES	Perla del sur	3126716224
5	NEYDAR DAVID JARAMILLO	1012447344	INSPECTOR VIAL	3132388420	27	O+	si	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	Erika López	zaguán de villa ventó 2-Dosquebradas	3147369588

Total: Personal ADMON 143 :5

Nota: Ingresa nuevo inspector vial el 19 de marzo de 2025

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

1.2 CHARLAS DE 5 MINUTOS, PAUSAS ACTIVAS Y CAPACITACIONES CONSORCIO ADMON143

El inspector SST del CONSORCIO ADMON 143 debe motivar y sensibilizar al colaborador en conductas de autocuidado y de prevención durante el desarrollo de las actividades planteadas haciendo énfasis en seguridad vial, así que es de vital importancia socializar los ATS antes de cada labor y evaluar bien cada riesgo.

Las pausas activas es una de las principales herramientas en la seguridad y salud del colaborador, para promover actividad física enfocada a mejorar movilidad articular, realizar estiramientos y ejercicios que generen cambios de posición y disminución de cargas osteomusculares por mantenimiento de posiciones prolongadas y/o movimientos repetitivos en la jornada laboral, estas se realizaran todos los días (de lunes a viernes) entre tiempo de labor y después de cada actividad dirigido al personal administrativo durante las horas que se permanece en la oficina.

Del 01 al 31 de marzo de 2025 por parte del inspector SST del CONSORCIO ADMON143 se brindan capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo enfocadas en los riesgos propios y específicos del lugar y puestos de trabajo, la promoción de hábitos saludables y pausas activas diariamente. Entre estas capacitaciones se tratan temas como:

- Ergonomía en el puesto de trabajo
- Gestión del estrés
- Prevención de accidente laborales
- Prevención de riesgos psicosociales
- Protocolo de emergencia y evacuación
- Uso seguro y adecuado de los equipos de oficina
- Pausas activas y estiramientos durante la jornada laboral
- Implementación y cumplimiento del sistema de gestión ambiental
- Orden y aseo en puestos de trabajo
- Uso adecuado de recurso naturales
- Ahorro y uso eficiente de la energía con equipos electrónicos y luminarias

Con estas capacitaciones se busca dar cumplimiento a la normatividad, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aumentar la productividad.

1.3 ATS, PREOPERACIONAL DE VEHICULO E INSPECCION DE SEGURIDAD CONSORCIO ADMON 143

Se realiza ATS de las actividades semanalmente o si cambiara la actividad. Se realiza antes de iniciar la labor planteada donde se evalúa las condiciones de salud del trabajador, EPP, factores de riesgo, estado del área de trabajo, herramientas etc. Para esto se llena el formato de ATS y de inspección de EPP

Se debe diligenciar diariamente preoperacional del vehículo por parte del conductor y es revisado por el inspector SST.

SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION SST		
FORMATO ENTREGADO.	**FECHA**	**CANT**
1. ATS CONSORCIO ADMON143	01 al 31 de marzo	2
2. CONDICIONES DIARIAS DE SALUD	01 al 31 de marzo	1
3. PRE-OPERACIONAL DEL VEHICULO	01 al 31 de marzo	2
4. CHARLAS EN SST	01 al 31 de marzo	3
5. INPECCION DE EPP	01 al 31 de marzo	1
6. INSPECCION LOCATIVAS	01 al 31 de marzo	1

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

1.4 VERIFICACION DE CONDICIONES DIARIAS

Se verifico las condiciones diarias de salud de todo el mes de marzo dando cumplimiento a: “resolución 1016 de 1989 artículo 10, resolución 2346 del 2007 artículo 18, el decreto 1072 del 2015, para conocer la condición de salud de los trabajadores.
y de acuerdo con formato diligenciado se verifico que

1.5 INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO CONSORCIO ADMON 143

Durante el mes no se realizó investigación de accidentes e incidente de trabajo

1.6 INCAPACIDADES MÉDICAS DE ENERO DE 2025

Durante el mes de marzo se presentó incapacidad médica por el colaborador del CONSORCIO ADMON143 Neyder David Jaramillo

NOMBRE	CC	CARGO	Fecha de incapacidad	Días de Incapacidad	Observaciones
Neyder David Jaramillo	1012447344	Inspector vial	21-03-2025	5	Recurre a urgencia por quiste pilonidal

1.7 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El Comité De Convivencia Laboral tiene como objetivo prevenir, atender y resolver situaciones relacionadas con conflictos, acoso laboral, o cualquier forma de maltrato en el entorno laboral. Este comité promueve un ambiente laboral saludable, respetuoso y armonioso, garantizando los derechos de los trabajadores y fomentando una cultura de bienestar.

Algunas funciones principales del comité de convivencia laboral son:

- Prevención
- Recepción de quejas
- Investigación
- Resolución
- Seguimiento
- Informe

1.8 Visita técnica y revisión de vías a cargo AMV2

Las visitas técnicas se realizan con el fin de evaluar con cada una de las cooperativas, los indicadores de cumplimiento semanales para las actividades programadas e indicadores.

En marzo se realizó entre los representantes de las cooperativas de trabajo asociado centro, Altagracia y comuneros con la ingeniera JAEL MORIANO visitas técnicas a las vías para temas técnicos, revisión de vías y recibir indicadores semanales. También se inspeccionan temas de seguridad y salud en el trabajo con las cooperativas.

1.9 CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO CONSORCIO ADMON 143

las condiciones de saneamiento básico para un lugar o puesto de trabajo son las medidas que garantizan un ambiente limpio, seguro y saludable para los trabajadores del lugar. Agua potable, baños limpios, recolección de residuos, ventilación e iluminación y limpieza. Estas condiciones previenen enfermedades y promueve el bienestar de los empleados.

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CENTRO
2.1 LISTADO DE PERSONAL COOPERATIVA ASOCIADA EL CENTRO

Se verifica los pagos de seguridad social, afiliaciones ARL- EPS- AFP y parafiscales del personal que se encuentra laborando en el proyecto

N°	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	N° DE IDENTIFICACION	CARGO	ENTIDAD A LA CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO				
				RH	ESTADO DE AFILIACION	ARL	SALUD	PENSION
1	NELSON HERRERA SERNA	4.456.963	MANTENIMIENTO RUTINARIO	O+	ACTIVO	La Equidad Seguros	NUEVA E.P.S.	COLPENSIONES
2	FRANCISCO JAVIER MORALES RESTREPO	10.019.206	MANTENIMIENTO RUTINARIO	O+	ACTIVO	La Equidad Seguros	NUEVA E.P.S.	COLPENSIONES
3	RUBÉN DARÍO TREJOS	10.030.172	MANTENIMIENTO RUTINARIO	A+	ACTIVO	La Equidad Seguros	NUEVA E.P.S.	PROTECCION
4	JOHNNY ALEJANDRO DÍAZ BERMÚDEZ	1.088.255.117	MANTENIMIENTO RUTINARIO	O+	ACTIVO	La Equidad Seguros	NUEVA E.P.S.	PROTECCION
5	ANCIZAR DE JESÚS HERNÁNDEZ	15.915.033	MANTENIMIENTO RUTINARIO	B+	ACTIVO	La Equidad Seguros	NUEVA E.P.S.	COLPENSIONES
6	ROSEMBERT SÁNCHEZ	79.961.082	MANTENIMIENTO RUTINARIO	A+	ACTIVO	La Equidad Seguros	NUEVA E.P.S.	COLPENSIONES
7	BUENO GALLEGO EDUAR ARBEY	1089718578	MANTENIMIENTO RUTINARIO	O+	ACTIVO	La Equidad Seguros	SALUD TOTAL	PROTECCION
8	BECERRA ARICAPA JHON FREDDY DE JESUS	4538974	MANTENIMIENTO RUTINARIO	O+	ACTIVO	La Equidad Seguros	NUEVA E.P.S	COLPENSIONES
9	CARLOS ARTURO RESTREPO LADINO	9.892.971	MANTENIMIENTO RUTINARIO	O+	ACTIVO	La Equidad Seguros	NUEVA E.P.S.	PORVENIR

Total, personal: 9

2.2 INSPECCIONES COOPERATIVA ASOCIADA EL CENTRO

Se realiza ATS de las actividades semanalmente o si cambiara la actividad. Se realiza antes de iniciar la labor planteada donde se evalúa las condiciones de salud del trabajador, EPP, factores de riesgo, estado del área de trabajo, herramientas etc.

SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION SST		
FORMATO ENTREGADO.	**FECHA**	**CANT**
1. PRE OPERACIONAL GUADAÑA	01 al 31 de marzo	2
2. CHARLAS DE SST	01 al 31 de marzo	2
3. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	01 al 31 de marzo	1
4. CONDICIONES DIARIAS DE SALUD	01 al 31 de marzo	1
5. PRE OPERACIONAL DE VEHICULO	01 al 31 de marzo	2
6. PRE OPERACIONAL DE MOTO	01 al 31 de marzo	2
7. SOPLADORA	01 al 31 de marzo	2

2.3 VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DIARIA

Se verifico las condiciones diarias de todo el mes de marzo dando cumplimiento a: “resolución 1016 de 1989 artículo 10, resolución 2346 del 2007 artículo 18, el decreto 1072 del 2015, para conocer la condición de salud de los trabajadores.
y de acuerdo con formato diligenciado se verifico que

2.4 INCAPACIDADES MÉDICAS

Durante el mes se presentó incapacidades médicas de Alejandro Díaz Bermúdez

NOMBRE	CC	CARGO	Fecha AT	Días de Incapacidad	Observaciones
Jonny Alejandro Diaz	10882555117	Mantenimiento	31/03/2024	10	Accidente laboral, contusión de hombro y brazo.

3.COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA ALTAGRACIA

3.1 LISTADO DE PERSONAL COOPERATIVA ASOCIADA ALTAGRACIA

se verifica los pagos de seguridad social, afiliaciones ARL- EPS- AFP y parafiscales del personal que se encuentra laborando en el proyecto.

N°	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	N° DE IDENTIFICACION	CARGO	ENTIDAD A LA CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO				
				RH	ESTADO DE AFILIACION	SALUD	PENSION	ARL
1	LUIS FERNANDO ALZATE VALENCIA	10.023.047	MANTENIMIENTO DE VIAS	O+	ACTIVO	SALUD TOTAL	COLPENSION.	POSITIVA
2	DANIEL BUITRAGO MORALES	10.144.258	MANTENIMIENTO DE VIAS	O+	ACTIVO	SALUD TOTAL	COLPENSION	POSITIVA
3	LUIS HERNADO MARIN	10.006.723	MANTENIMIENTO DE VIAS	A+	ACTIVO	SALUD TOTAL	COLPENSION	POSITIVA
4	WILIAN DE JESUS GIL	4379 598	MANTENIMIENTO DE VIAS	A+	ACTIVO	SALUD TOTAL	COLPENSION	POSITIVA
5	MARCO ANTONIO MARIN	10.021.750	MANTENIMIENTO DE VIAS	O+	ACTIVO	SALUD TOTAL	COLPENSION	POSITIVA
6	REINEL DE JESUS RIOS	9.920.147	MANTENIMIENTO DE VIAS	O+	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
7	JHON JAIRO PARRA	1088318641	MANTENIMIENTO DE VIAS	O+	ACTIVO	SANITAS	COLPENSION	POSITIVA
8	LUIS FERNANDO CARDONA C	10.022.455	MANTENIMIENTO DE VIAS	O+	ACTIVO	COLSANITAS	COLPENSION	POSITIVA

Total, personal: 8

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

3.2 INSPECIONES COOPERATIVA ASOCIADA ALTAGRACIA

Se realiza ATS de las actividades o si cambiara la actividad. Se realiza antes de iniciar la labor planteada donde se evalúa las condiciones de salud del trabajador, EPP, factores de riesgo, estado del área de trabajo, herramientas etc.

SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION SST		
FORMATO ENTREGADO.	**FECHA**	**CANT**
1. PRE OPERACIONAL GUADAÑA	01 al 31 de marzo	2
2. PRE OPERACIONAL MOTOSIERRA	01 al 31 de marzo	1
3. ANALISIS DE TRABAJO ATS	01 al 31 de marzo	1
4. SOPLADORA		2
5. CHARLA DE SST	01 al 31 de marzo	2
6. PRE OPERACIONAL DE VEHICULO	01 al 31 de marzo	2
7. PRE OPERACIONAL DE MOTO	01 al 31 de marzo	2
8. CONDICIONES DIARIAS	01 al 31 de marzo	1

3.3 VERIFICACION DE CONDICIONES DIARIAS

Se verifico las condiciones diarias de todo el mes de marzo dando cumplimiento a: “resolución 1016 de 1989 artículo 10, resolución 2346 del 2007 artículo 18, el decreto 1072 del 2015, para conocer la condición de salud de los trabajadores.
y de acuerdo con formato diligenciado se verifico que

3.4 INCAPACIDADES MÉDICAS

Durante el mes no se presentaron incapacidades medicas por parte del personal

NOMBRE	D.I.	CARGO	Fecha AT	Días de Incapacidad	Observaciones
-	-	-	-	-	-

4. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS
4.1 LISTADO DE PERSONAL COOPERATIVA ASOCIADA COMUNEROS

se verifica los pagos de seguridad social, afiliaciones ARL- EPS- AFP y parafiscales del personal que se encuentra laborando en el proyecto

N°	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	N° DE IDENTIFICACION	CARGO	ENTIDAD A LA CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO			
				ESTADO DE AFILIACION	SALUD	PENSION	ARL
1	BERNAL AGUDELO JOSE MARTIN	10125400	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
2	ANDICA GAÑAN LUIS AUDONEY	15922888	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
3	MEDINA CARLOS ALBERTO	16547419	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA
4	MONTOYA GOMEZ JOSE RODRIGO	18599978	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
5	AMIREZ QUIROZ RUBEN DARIO	18600327	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
6	LOPEZ VELEZ HECTOR FABIO	18600922	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
7	AMIREZ JARAMILLO NELSON DE JESUS	18601150	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
8	GUAPACHA RAMIREZ JHON JAIRO	71785005	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
9	RANCO MANSO JUAN CARLOS	1004688954	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
10	LOPEZ BEDOYA YHON ANDERSON	1004766831	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
11	OLIVERAS AGUIRRE FELIX ALEJANDRO	1004766928	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA
12	AMIREZ GIRALDO YOHAN ANDRES	1088297589	MANTENIMIENTO DE VIAS	ACTIVO	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA

Total, personal: 12

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

4.2 INSPECIONES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA COMUNEROS

Se realiza ATS de las actividades semanalmente o si cambiara la actividad. Se realiza antes de iniciar la labor planteada donde se evalúa las condiciones de salud del trabajador, EPP, factores de riesgo, estado del área de trabajo, herramientas etc.

SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION SST		
FORMATO ENTREGADO.	**FECHA**	**CANTIDAD**
1. PRE OPERACIONAL GUADAÑA	01 al 31 de marzo	2
2. CONDICIONES DE SALUD	01 al 31 de marzo	1
3. ANALISIS DE TABAJO ATS	01 al 31 de marzo	1
4. MOTOSIERRRA	01 al 31 de marzo	1
5. SOPLADORA	01 al 31 de marzo	2
6. PRE OPERACIONAL DE VEHICULO	01 al 31 de marzo	2
7. CHARLAS 5 MIN	01 al 31 de marzo	2
8. PRE OPERACIONAL DE MOTO	01 al 31 de marzo	2

4.3 VERIFICACION DE CONDICIONES DIARIAS

Se verifico las condiciones diarias de todo el mes de marzo dando cumplimiento a : “resolución 1016 de 1989 artículo 10, resolución 2346 del 2007 artículo 18 , el decreto 1072 del 2015, para conocer la condición de salud de los trabajadores.
y de acuerdo con formato diligenciado se verifico que:

4.4 INCAPACIDADES MÉDICAS

Durante el mes se presentó incapacidad médica por parte del trabajador José Martin Bernal

NOMBRE	CC	CARGO	Fecha	Días de Incapacidad	Observaciones
José Martin Bernal	10125400	Mantenimiento	22/03/2025	5	Herida en pierna, se anexa incapacidad medica en los anexos

ELABORO:



Inspector siso
Yuliana Reyes Hernández

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

ANEXOS

CONSORCIO ADMON 143

ANEXO 01- PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO ADMON 143

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838591	7	CONSORCIO ADMON 143	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 113 7 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3216526892	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1307270251	9482589188	E	2025/03/21	2025/03/03	BANCO DE BOGOTA		$8,364,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1089719143	BALLESTEROS EDIRLANDO																		25-14	30	$1,590,000	$254,400	EPS037	30	$1,590,000	$198,800	CCF44	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	6.960%	$110,700	30	$1,590,000	$79,500	No	$707,000
2	CC	1088037919	BUITRAGO MAIRA		X															X	230301	23	$1,571,667	$251,500	EPS005	23	$1,571,667	$196,500	CCF44	23	$1,939,300	$77,600	14-11	23	$1,571,667	6.960%	$109,400	23	$1,939,300	$97,000	No	$732,000
3	CC	1085245598	MORIANO JAEL									X									25-14	30	$7,840,000	$1,332,800	EPS037	30	$7,840,000	$980,000	CCF44	30	$7,840,000	$313,600	14-11	30	$7,840,000	6.960%	$545,700	30	$7,840,000	$392,000	No	$3,564,100
4	CC	1088007166	RAMIREZ KELLY									X									230201	30	$5,140,000	$822,400	EPS002	30	$5,140,000	$642,500	CCF44	30	$5,140,000	$205,600	14-11	30	$5,140,000	6.960%	$357,800	30	$5,140,000	$257,000	No	$2,285,300
5	CC	1088267280	REYES YULIANA																		230301	30	$2,420,000	$387,200	EPS018	30	$2,420,000	$302,500	CCF44	30	$2,420,000	$96,800	14-11	30	$2,420,000	6.960%	$168,500	30	$2,420,000	$121,000	No	$1,076,000
Total			**Afiliados(5)**																				$18,561,667	$3,048,300			$18,561,667	$2,320,300			$18,929,300	$757,200			$18,561,667		$1,292,100		$18,929,300	$946,500		$8,364,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$3,048,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,587,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$638,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$822,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,292,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$1,292,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$757,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	$757,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$2,320,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,178,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$302,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$642,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$196,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$567,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$567,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$378,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$378,600
TOTAL				**5**	**$8,364,400**

ANEXO 02- ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) CONSORCIO ADMON143

AAD / GOC / CINCOL / CC	**CONSORCIO ADMON143**		Cod ADMON143 Version 001 fecha de creacion 4/7/2024

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Empresa: CONSORCIO ADMON 143		**Ciudad:** Dosquebradas		**Numero de orden de Trabajo:**	001
Área/Proceso:	Administracion mantenimiento vial	**Ubicación donde se realiza el trabajo:**		Av simon bolivar, anserma, apia-la virginia, paso nacional la virginia, viaducto y orejas, variante galicia, viterbo-apia	
Fecha de realización del Trabajo	De: 01/03/2025 Hasta: 15/03/2025.	**Hora de Inicio (am/pm):**	7:30 a. m.	**Hora de Finalización (am/pm):**	7:00:00 p. m. Jornada variable

Descripción de las tareas que se realizan:

Recorrido en vehiculo del consorcio por todas las rutas de la administracion vial (AMV2)

Inspeccion y supervision de todas las vias

Acompañamiento de actividades de alto riesgo a las cooperativas

Supervicion y acompañamiento semanal del area SST

Supervision y acompañamiento semanal de ingeniera residente y auxiliar ingeniera en las vias

Reuniones en municipios
Inspeccion de puentes, alcantarilla, taludes encole, desrole, bavianes
Atencion a la comunidad en las vias o colgo
Inspeccion de senalizacion vial, horizontal y vertical
Inspeccion jornada tapo huecos
Supervicion en atencion a emergencias.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	OTRO, CUAL? _____		No aplica:	X

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Eqipos y herramientas utilizadas	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*	*Estado de Herramientas /Equipos (B/M)*	*Ultima Revision*
Manuales			
Electricas			
~~Neumáticas~~			
~~Hidráulicas~~			
Mecánicas			
Materiales e Insumos	Cinta plastica de precaución	Buena	
Otras Vehiculo	Camioneta doble cabina con platon	Buena	

ANALISIS DE LA TAREA ***(Describa detalladamente cada respuesta)***

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Induccion sst, conocimiento de la labor,cumplir con normas de seguridad vial
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Botas de seguridad, chalecos reflectivos, cascos de seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	5
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Cinta de precaucion, conos de señalizacion, señalizacion informativa
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	Si
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Ramas, derrumbes de tierra, piedras, vegetacion alta, altas temperaturas (sol)

Powered by CamScanner

AAD	CONSORCIO ADMON143	GISCOL	Cod ADMON143
GOC			Version 001
			fecha de creacion 9/7/2024

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Empresa: CONSORCIO ADMON 143		**Ciudad:** Dosquebradas		**Numero de orden de Trabajo:**	001
Área/Proceso:	Administracion mantenimiento vial	**Ubicación donde se realiza el trabajo:**		Av simon bolivar, anserma, apia-la virginia, paso nacional la virginia, viaducto y orejas, variante galicia, viterbo-apia	
Fecha de realización del Trabajo	De: 01-03-2025. Hasta: 15-03-2025.	**Hora de Inicio (am/pm):**	7:30 a. m.	**Hora de Finalización (am/pm):**	7:00:00 p. m. Jornada variable

Pasos detallados de la tarea	Peligros e Impactos Ambientales existentes y potenciales	Riesgo	Consecuencias	Controles Requeridos
traslado en la camioneta por carretera	choque con otros vehiculos,volcamiento,caida de derrumbe sobre el vehiculo	mecanico,fisico ,quimico,s-vial,	muerte,perdida de algun miembro,discapacidad motora,lesiones en piel ,huesos y musculos	tener conocimiento en seguridad vial,usar cinturon de seguridad,conducir a una velocidad moderada
supervisar las vias	resbalones,caidas leves,golpes de calor	fisico,biologico, locativo	agotammiento,insolacion ,raspones,contracturas	usar gorra o pava, usar camisa manga larga, precaucion al momento de parquear el vehiculo, usar siempre botas de seguridad,observar el area donde se paran, usar protector solar
bajar a tomar registro fotografico	resbalones,caidas leves,golpes de calor,picaduras de algun insecto(zancudos,abejas,hormigas etc.), rosadura por la vegetacion	fisico,biologico, locativo,ergonomico.	agotammiento,insolacion ,raspones,contracturas,picaduras,infalmacion,cortes leves,dolor muscular	usar gorra o pava,usar camisa manga larga, precaucion al momento de parquear el vehiculo, usar siempre botas de seguridad,observar el area donde se paran, usar protector solar, tener una buena postura,hidratarse
señalizar areas con cinta de precaucion	resbalones,caidas leves,golpes de calor,picaduras de algun insecto(zancudos,abejas,hormigas etc.), rosadura por la vegetacion	fisico,biologico, locativo.	agotammiento,insolacion ,raspones,contracturas,picaduras,infalmacion,cortes leves,dolor muscular	usar gorra o pava,usar camisa manga larga, precaucion al momento de parquear el vehiculo, usar siempre botas de seguridad,observar el area donde se paran, usar protector solar, tener una buena postura,hidratarse
ubicar conos o colombinas para señalizar	resbalones,caidas leves,golpes de calor,picaduras de algun insecto(zancudos,abejas,hormigas etc.), rosadura por la vegetacion	fisico,biologico, locativo.	agotammiento,insolacion ,raspones,contracturas,picaduras,infalmacion,cortes leves,dolor muscular	usar gorra o pava,usar camisa manga larga, precaucion al momento de parquear el vehiculo, usar siempre botas de seguridad,observar el area donde se paran, usar protector solar, tener una buena postura,hidratarse

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

[X] Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

[ ] No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

[X] Si, proceda con la tarea.

[ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

No	Nombre y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor) y Personal que participó de la evaluación del ATS	Cedula	Firma	Actividad de alto riesgo	Fecha
1	JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES	1.085.245.598		N/A	01-03-2025
2	KELLY JOHANNA RAMIREZ CUERVO	1.088.007.166	Kelly Ramirez	N/A	01-03-2025
3	YULIANA REYES HERNANDEZ	1.088.267.280	Yuliana Reyes	N/A	01-03-2025.
4	EDIRLANDO BALLESTEROS MAYA	1.089.719.143	EDIRLANDO BM	N/A	01-03-2025
5				N/A	

Nombre y Apellido de la persona (inspeccion AREA SST)		Firma	Fecha
Yuliana Reyes Hernandez	CC 1088267280	Yuliana Reyes	01-03-2025.

Nota : Emisor y Autoridad de Area: Hemos verificado en el sitio de trabajo junto al Ejecutor la implementación al 100% de los controles existentes y adicionales para eliminar o minimizar los peligros y los riesgos asociados a este trabajo y consideramos seguro proceder con la ejecución del mismo.

Powered by CamScanner

CONSORCIO ADMON143

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Empresa: CONSORCIO ADMON 143		**Ciudad: Dosquebradas**		**Numero de orden de Trabajo:**			001
Área/Proceso:	**Administracion mantenimiento vial**	**Ubicación donde se realiza el trabajo:**		**Av simon bolivar, anserma, apia-la virginia, paso nacional la virginia, viaducto y orejas, variante galicia, viterbo-apia**			
Fecha de realización del Trabajo desde	16 - 03 - 2025	**Hasta**	31-03-2025	**Hora de Inicio (am/pm):**	7:30 a. m.		7:00:00 p. m. jornada variable

Descripción de las tareas que se realizan:

Recorrido en vehiculo del consorcio por todas las rutas de la administracion vial (AMV2)

Inspeccion y supervision de todas las vias

Acompañamiento de actividades de alto riesgo a las cooperativas

Supervicion y acompañamiento semanal del area SST

Supervision y acompañamiento semanal de ingeniera residente y auxiliar ingeniera en las vias

Reuniones en municipios
Inspeccion de puentes, alcantarillo, taludes, encoles, descole, gaviones
Atencion a la comunidad en las vias a cargo.
Inspeccion de señalizacion vial, horizontal y vertical.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA : N/A ESPACIO CONFINADO: N/A ENERGIA PELIGROSAS : N/A

Equipos y herramientas utilizadas	***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	***Estado de Herramientas /Equipos (B/M)***
Manuales		N/A
Electricas		N/A
Neumáticas		N/A
Hidráulicas		N/A
Mecanicas		N/A
Materiales e insumos	Cinta plastica de precaución	Buena
Otras Vehiculo	Camioneta doble cabina con platon	Buena

ANALISIS DE LA TAREA ***(Describa detalladamente cada respuesta)***

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los calculos de la distancia de caida?	N/A
¿Cuales son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Induccion sst, conocimiento de la labor,cumplir con normas de seguridad vial
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Botas de seguridad, chalecos reflectivos, cascos de seguridad
¿Cuántos trabajadores se requieren?	5
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Cinta de precaucion, conos de señalizacion, señalizacion informativa
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	Si
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Ramas, derrumbes de tierra, piedras, vegetacion alta, altas temperaturas (sol)

Powered by CamScanner

	CONSORCIO ADMON143			Cod ADMON143 Version 001 fecha de creacion 9/7/2024

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Empresa: CONSORCIO ADMON 143	**Ciudad: Dosquebradas**	**Numero de orden de Trabajo:**	001

Área/Proceso:	**Administracion mantenimiento vial**	**Ubicación donde se realiza el trabajo:**		**Av simon bolivar, anserma, apia-la virginia, paso nacional la virginia, viaducto y orejas, variante galicia, viterbo-apia**		
Fecha de realización del Trabajo desde		**Hasta**		**Hora de inicio (am/pm):**	7:30 a. m.	7:00 00 p. m. jornada variable

Pasos detallados de la tarea	Peligros e Impactos Ambientales existentes y potenciales	Riesgo	Consecuencias	Controles Requeridos
Traslado en la camioneta por carretera	Choque con otros vehiculos,volcamiento,caida de derrumbe sobre el vehiculo	Mecanico,fisico, quimico,señalizacion vial	Muerte,perdida de algun miembro,discapacidad motora,lesiones en piel ,huesos y musculos	Tener conocimiento en seguridad vial,usar cinturon de seguridad,conducir a una velocidad moderada
Supervisar las vias	Resbalones,caidas leves,golpes de calor	Fisico,biologico, locativo	Agotammiento,insolacion,raspones,contracturas	Usar gorra o pava, usar camisa manga larga, precaucion al momento de parquear el vehiculo, usar siempre botas de seguridad,observar el area donde se paran, usar protector solar
Bajar a tomar registro fotografico	Resbalones,caidas leves,golpes de calor,picaduras de algun insecto(zancudos,abejas,hormigas etc.), rosadura por la vegetacion	Fisico,biologico,locativo,ergonomico.	Agotamiento,insolacion,raspones,contracturas,picaduras,infalmacion,cortes leves,dolor muscular	Usar gorra o pava,usar camisa manga larga, precaucion al momento de parquear el vehiculo, usar siempre botas de seguridad,observar el area donde se paran, usar protector solar, tener una buena postura,hidratarse
Señalizar areas con cinta de precaucion	Resbalones,caidas leves,golpes de calor,picaduras de algun insecto(zancudos,abejas,hormigas etc.), rosadura por la vegetacion	Fisico,biologico, locativo.	Agotammiento,insolacion,raspones,contracturas,picaduras,infalmacion,cortes leves,dolor muscular	Usar gorra o pava,usar camisa manga larga, precaucion al momento de parquear el vehiculo, usar siempre botas de seguridad,observar el area donde se paran, usar protector solar, tener una buena postura,hidratarse
Ubicar conos o colombinas para señalizar	Resbalones,caidas leves,golpes de calor,picaduras de algun insecto(zancudos,abejas,hormigas etc.), rosadura por la vegetacion	Fisico,biologico, locativo.	Agotammiento,insolacion,raspones,contracturas,picaduras,infalmacion,cortes leves,dolor muscular	Usar gorra o pava,usar camisa manga larga, precaucion al momento de parquear el vehiculo, usar siempre botas de seguridad,observar el area donde se paran, usar protector solar, tener una buena postura,hidratarse

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

x Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

x Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

No	Nombre y Apellidos de los trabajador	Cedula	Firma	Observaciones
1	JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES	1.085.245.598		
2	KELLY JOHANNA RAMIREZ CUERVO	1.088.007.166		
3	YULIANA REYES HERNANDEZ	1.088.267.280	Yuliana R.	
4	EDIRLANDO BALLESTEROS MAYA	1.089.719.143		
5	NEYDAR DAVID JARAMILLO	1.012.447.344		

Nombre y Apellido de la persona (Inspeccion AREA SST)		Firma
Yuliana Reyes Hernandez	CC 1088267280	Yuliana Reyes

Nota . Emisor y Autoridad de Area Hemos verificado en el sitio de trabajo junto al Ejecutor la implementación al 100% de los controles existentes y adicionales para eliminar o minimizar los peligros y los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

Powered by CamScanner

ANEXO 03 – CONDICIONES DIARIAS DE SALUD CONSORCIO ADMON 143

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CONDICIONES DIARIAS DE SALUD

Vigente del 06/03/2025

Versión 1

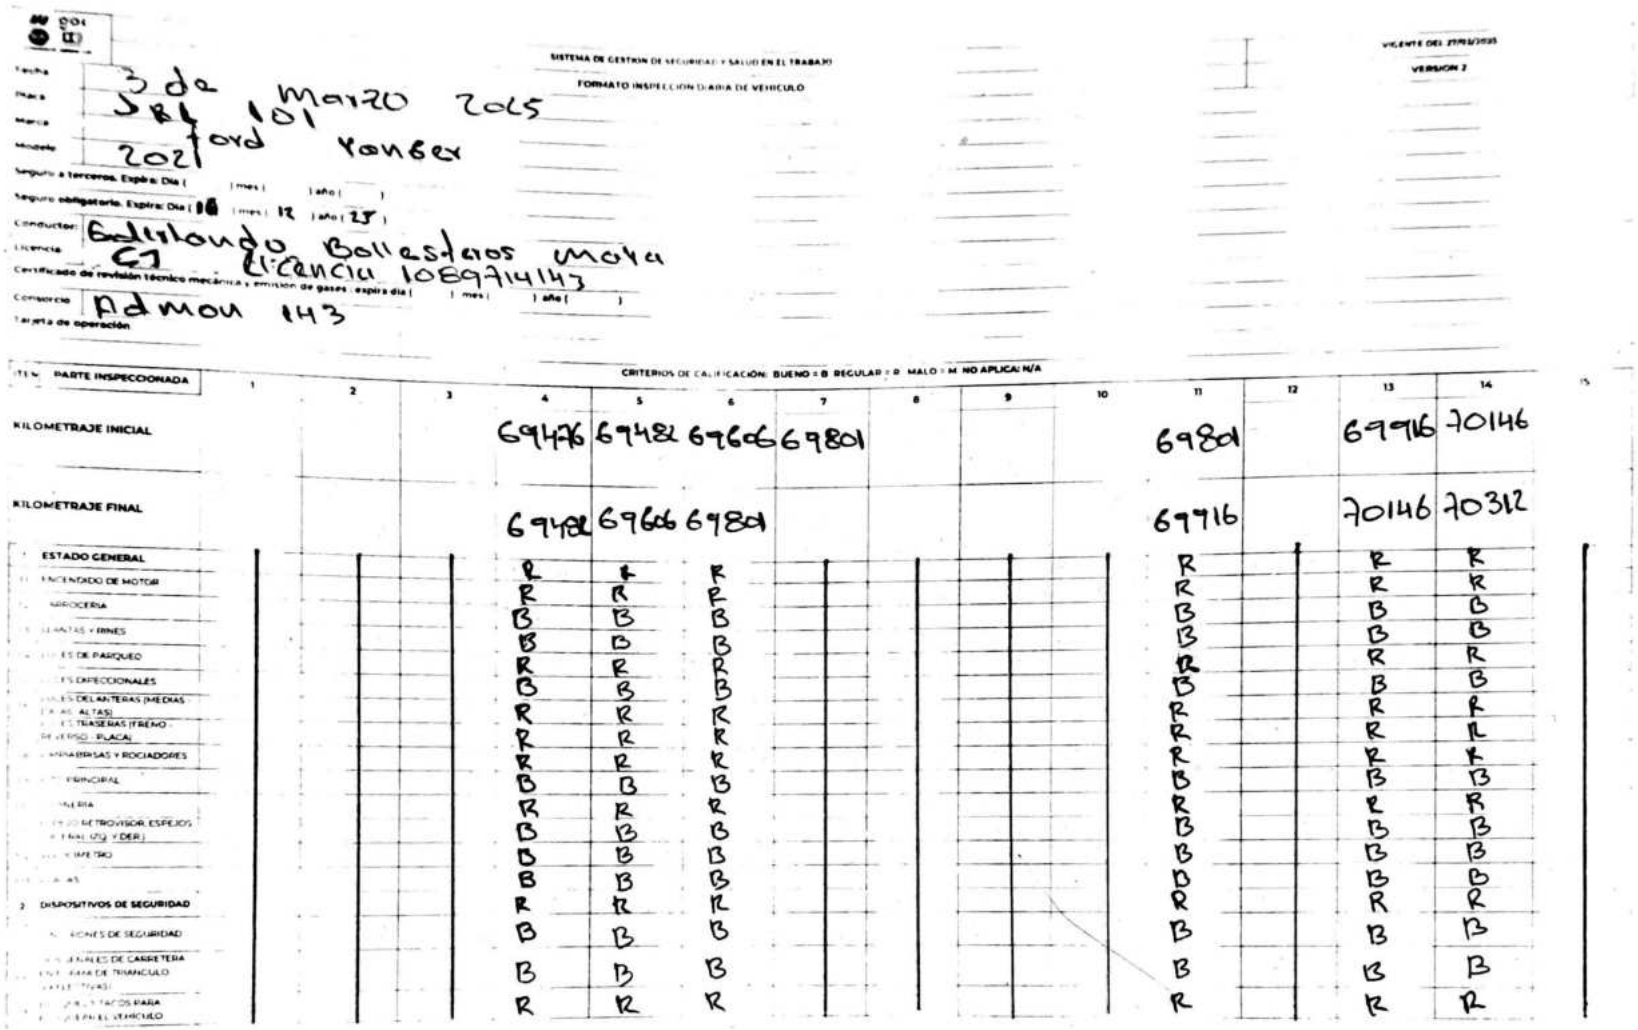
HE: HORA ENTRADA HS: HORA SALIDA B: BIEN M: MAL

DETALLE		MAEL MORIANO CC 1088346808	KELLY RAMIREZ CC 1088087388	YULIANA REYES CC 1088267280	EDIRLANDO BALLESTEROS CC 1088710543	DAVID ARAMILLO CC 1012667366
FECHA	CONDICIONES DE SALUD					
03/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R.	HE 7:30 X Edirlando / HS 5:00 X Edirlando	
04/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R.	HE 7:30 X Edirlando / HS 5:00 X Edirlando	
05/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
06/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
07/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
10/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
11/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
12/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
13/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
14/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
17/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
18/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	
19/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	HE 7:30 / HS 5:00
20/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	HE 7:30 / HS 5:00
21/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	Incapacidad
25/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	Incapacidad
26/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	HE 7:30 / HS 5:00
27/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	HE 7:30 / HS 5:00
28/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	HE 7:30 / HS 5:00
31/03/25		HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE 7:30 B Kelly / HS 5:00 B Kelly	HE 7:30 X Yuli R / HS 5:00 X Yuli R.	HE 7:30 X Edy B / HS 5:00 X Edy B	HE 7:30 / HS 5:00
FECHA	CONDICIONES DE SALUD	HE 7:30 B Jm / HS 5:00 B Jm	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M
FECHA	CONDICIONES DE SALUD	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M
FECHA	CONDICIONES DE SALUD	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M	HE B M / HS B M
OBSERVACIONES						Incapacidad 21-25

Powered by CamScanner

ANEXO 04- PRE OPERACIONAL DEL VEHICULO CONSORCIO ADMON 143

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCION DIARIA DE VEHICULO

VIGENTE DEL 27/03/2015

VERSION 2

Fecha: 3 de marzo 2015

Placa: SBL 101

Marca: Ford

Modelo: 2021 Yonger

Seguro a terceros. Expira: Día ( ) mes ( ) año ( )

Seguro obligatorio. Expira: Día (16) mes (12) año (25)

Conductor: Edilsondo Bolaños Mora

Licencia: C1 Licencia 1089714143

Certificado de revisión técnico mecánica y emisión de gases. expira día ( ) mes ( ) año ( )

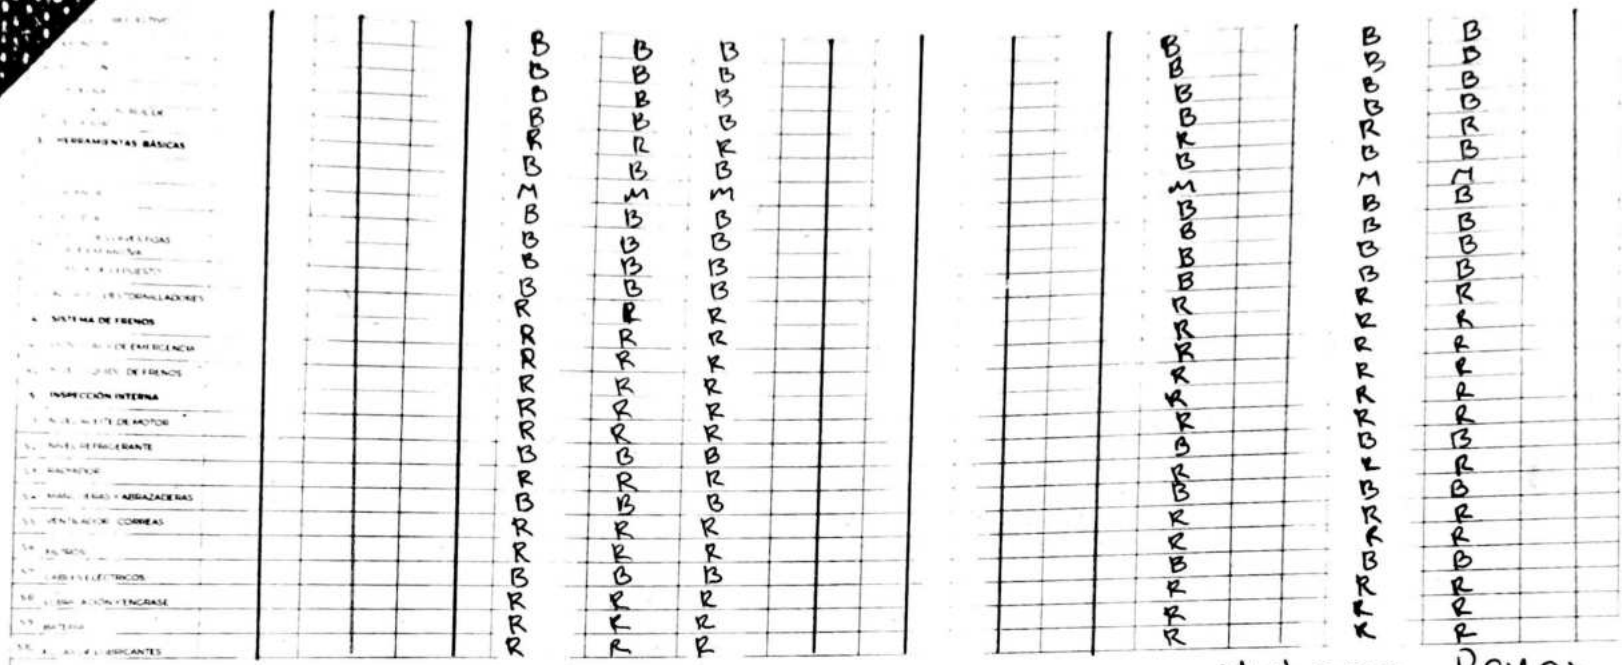
Consecutivo: Admon 143

Tarjeta de operación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M NO APLICA: N/A

ITEM	PARTE INSPECCIONADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	KILOMETRAJE INICIAL				69476	69482	69666	69801				69801		69916	70146	
	KILOMETRAJE FINAL				69482	69666	69801					69916		70146	70312	
1	ESTADO GENERAL				R	R	R					R		R	R	
1.1	ENCENDIDO DE MOTOR				R	R	R					R		R	R	
1.2	CARROCERIA				B	B	B					B		B	B	
1.3	LLANTAS Y RINES				B	B	B					B		B	B	
1.4	FRENOS DE PARQUEO				R	R	R					R		R	R	
1.5	LUCES DIRECCIONALES				B	B	B					B		B	B	
1.6	LUCES DELANTERAS (MEDIAS Y ALTAS)				R	R	R					R		R	R	
1.7	LUCES TRASERAS (FRENO - REVERSO - PLACA)				R	R	R					R		R	R	
1.8	LIMPIABRISAS Y ROCIADORES				R	R	R					R		R	R	
1.9	FRENO PRINCIPAL				B	B	B					B		B	B	
1.10	PITO				R	R	R					R		R	R	
1.11	ESPEJOS RETROVISOR (ESPEJOS LATERALES IZQ Y DER)				B	B	B					B		B	B	
1.12	CINTURON				B	B	B					B		B	B	
1.13	EXTINTOR				B	B	B					B		B	B	
2	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD				R	R	R					R		R	R	
2.1	CONOS DE SEGURIDAD				B	B	B					B		B	B	
2.2	TRIANGULOS DE CARRETERA				B	B	B					B		B	B	
2.3	CINTA DE TRIANGULO REFLECTIVA				R	R	R					R		R	R	
2.4	ELEMENTOS PARA CARGUE EL VEHICULO															

Powered by CamScanner



FIRMA CONDUCTOR RESPONSABLE Edilsando IB

CC 1089714143

FIRMA HSEQ Yuliona Reyes.

OBSERVACIONES

NO Sali hacer recorridos los dias 1-2-3-8-9-10-12-15

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	FORMATO INSPECCION DIARIA DE VEHICULO	VERSION 2

Fecha	3 de Marzo 2025
Placa	JKL 101
Marca	ford Yonger
Modelo	2021
Seguro a terceros. Expira Dia ( ) mes ( ) año ( )	
Seguro obligatorio. Expira Dia (16) mes (12) año (25)	
Conductor:	Edinondo Ballesteros MAYA
Licencia:	C1- licencia 1089719143
Certificado de revisión técnico mecánica y emisión de gases : expira dia ( ) mes ( ) año ( )	
Consorcio	Admon 143
Tarjeta de operación	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M NO APLICA: N/A

ITEM	PARTE INSPECCIONADA	FECHA REVISIÓN: 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KILOMETRAJE INICIAL		70311	70430	70485	70668	70890					70927	70929	70984				71184
KILOMETRAJE FINAL		70430	70485	70668	70890	70927					70929	70984	71184				71206
1	ESTADO GENERAL	R	R	R	R	R					R	R	R				R
11	ENCENDIDO DE MOTOR	R	R	R	R	R					R	R	R				R
12	CARROCERÍA	B	B	B	B	B					B	B	B				B
13	LLANTAS Y RINES	B	B	B	B	B					B	B	B				B
14	LUCES DE PARQUEO	R	R	R	R	R					R	R	R				R
15	LUCES DIRECCIONALES	B	B	B	B	B					B	B	B				B
16	LUCES DELANTERAS (MEDIAS BAJAS-ALTAS)	R	R	R	R	R					R	R	R				R
17	LUCES TRASERAS (FRENO REVERSO-PLACA)	R	R	R	R	R					R	R	R				R
18	LIMPIABRISAS Y ROCIADORES	R	R	R	R	R					R	R	R				R
19	PITO PRINCIPAL	B	B	B	B	B					B	B	B				B
110	COJINERÍA	R	R	R	R	R					R	R	R				R
111	ESPEJO RETROVISOR ESPEJOS (LATERAL IZQ Y DER)	B	B	B	B	B					B	B	B				B
112	VELOCIMETRO	B	B	B	B	B					B	B	B				B
113	PLACAS	B	B	B	B	B					B	B	B				B
2	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	R	R	R	R	R					R	R	R				R
21	CINTURONES DE SEGURIDAD	B	B	B	B	B					B	B	B				B
22	DOS SEÑALES DE CARRETERA EN FORMA DE TRIANGULO (REFLECTIVAS)	B	B	B	B	B					B	B	B				B
23	BLOQUES Y TACOS PARA BLOQUEAR EL VEHÍCULO	R	R	R	R	R					R	R	R				R
24	CHALECO REFLECTIVO	B	B	B	B	B					B	B	B				B
25	EXTINTOR	B	B	B	B	B					B	B	B				B
26	BOTIQUIN	B	B	B	B	B					B	B	B				B
27	LINTERNA	B	B	B	B	B					B	B	B				B
28	DISP DE CONTROL DE VELOCIDAD	R	R	R	R	R					R	R	R				R

Powered by CamScanner

| | | |

ANEXO 05- INSPECCION DE EPP

CONSORCIO ADMON 143

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

CONSORCIO ADMON 143	INSPECCIÓN USO Y ESTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FR-SST-026	
	CONTRATO INVIAS 2024: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2." Rutas 5003 - 2507 - 2902 - 25RSA - 50RS01 - 29RSB - 29RSA	Versión:	1
		Fecha:	20/01/2025

INSPECCIÓN REALIZADA POR

Nombre Responsable SST	Responsable de la inspeccion	Entidad/Empresa
Yuliana Reyes	Yuliana Reyes	Consorcio ADMON 143 AMV2

Marcar los elementos de Protección Personal que el trabajador está utilizando, verificando el estado del EPP Bueno: B, Malo: M, No aplica: N/A , R : Regular			EPP			Dotación				Fecha de inspeccción
			Casco de seguridad	Tapabocas	Tapa oidos de inserción	Camisa manga larga	Pantalón	Chaleco reflectivo	Botas de seguridad	31 de marzo de 2025
Nombre	Cargo	Criterio								Firma del trabajador
JAEL MORIANO	INGENIERA RESIDENTE	ESTADO	B	N/A	B	R	R	B	B	
KELLY JOHANA RAMIREZ	INGENIERA AUXILIAR	ESTADO	B	N/A	B	R	R	B	B	
YULIANA REYES	INSPECTOR SISO	ESTADO	B	N/A	B	N/A	N/A	B	B	Yuliana Reyes.
NEYDAR DAVID JARAMILLO	INSPECTOR VIAL	ESTADO	B	N/A	B	N/A	N/A	B	B	
EDIRLANDO BALLESTEROS	CONDUCTOR	ESTADO	B	N/A	B	N/A	N/A	B	B	

Observaciones

La dotación se encuentra desgastada y la camisa fue manchada por las mangas de la chaqueta color naranja, un día de labores bajo la lluvia en ruta 5052, levantamiento SIGPAR.

Powered by CamScanner

ANEXO 06- INSPECCION LOCATIVA

CONSORCIO ADMON 143

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

CONSORCIO ADMON 143	LISTA CHEQUEO INSPECCIONES LOCATIVAS	FR-SST-002
	CONTRATO INVIAS 2024: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2." Rutas 5003 - 2507 - 2902 - 25RSA - 50RS01 - 29RSB - 29RSA	Versión: 0
		Fecha: 13/01/2025

Ubicación	Risaralda - Dosquebradas	**Contratista**	Consorcio ADMON 143	**Cantidad Personal**	5
Actividades desarrolladas	Administrativas			**Fecha Inspección**	31 de marzo de 2025

1	CONDICIONES LOCATIVAS	CUMPLE			Observaciones
		SI	NO	N.A.	
1.1	Orden y aseo en frente de obra o lugar de trabajo	X			
1.2	Distribución de maquinaria y equipos			X	
1.3	Distribución de espacios	X			
1.4	Insumos de cafeteria ordenados y en buen estado	X			
2.1	Se clasifican y se disponen los residuos de forma adecuada	X			
2.2	Pisos, superficies adecuadas en buen estado y libres de obstaculos	X			
2.3	Baño adecuado y en buen estado	X			
2.4	Iluminacion y ventilación de areas de trabajo en buenas condiciones	X			
2.5	Los puestos de trabajo son adecuados para la labor	X			
4	**SEÑALIZACIÓN**	**CUMPLE**			**Observaciones**
		SI	**NO**	**N.A.**	
4.1	Se encuentra señalizada el área de trabajo	X			
4.1	Se encuentra señalizada la ruta de evacuación	X			
4.2	Se tiene señalizadas y demarcadas las áreas de alto riesgo	X			
4.3	Se cuenta con pasos peatonales			X	
6	**ELEMENTOS DE EMERGENCIA**	**CUMPLE**			**Observaciones**
		SI	**NO**	**N.A.**	
6.2	Se cuenta con botiquin de primeros auxilios	X			
6.3	Se cuenta con camilla de emergencia	X			
6.5	Se cuenta con extintores multiproposito	X			
7	**RIESGO ELÉCTRICO**	**CUMPLE**			**Observaciones**
		SI	**NO**	**N.A.**	
7.1	Se diligencio permiso de trabajo	X			
7.3	El cableado se encuentra en buen estado	X			
7.5	Se cuenta con tablero eléctrico en buen estado	X			

Observaciones complementarias

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	
Nombre	**Yuliana reyes**
Cargo	**Inspector siso**

ANEXO 07- CHARLAS 5 MINUTOS

CONSORCIO ADMON 143

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

GOC	**REGISTRO DE ASISTENCIA** CONTRATO INVIAS 2024 "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2" Rutas 5003 - 2507 - 2902 - 25RSA - 50RS01 - 29RSB - 29RSA	FR-CAL-002 Fecha 13/01/2025 Versión 0/01/1900

Lugar	Dosquebradas	Fecha	12 - 03 - 2025
Temas	Posturas Ergonomicas		

Hora Inicio	8:00 AM
Hora Fin	8:15 AM

Tipo Actividad

Divulgación	
Capacitación	X
Otro	

Nombre responsable de la actividad	Cargo	Empresa / Entidad	Firma
Yuliana Reyes	Inspector SISO	AMV2	Yuliana

Cobertura	Colaboradores	X	Proveedores / Contratistas		No. Personas convocadas	4

Observaciones

No.	Nombres y Apellidos	Ocupación / Cargo	No. Identificación	Cooperativa	Entidad / Empresa	Firma
1	EDWIN ALVARO BALLESTEROS	Conductor	1089719143	AMV2	Consorcio	
2	Kelly J. Ramirez C	Ax Ing	1088007166	AMV2	Consorcio	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

De acuerdo con la Ley estatutaria 1581 del 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, le informamos que sus datos personales serán ingresados en la base de datos de empleados comunidad usuarios finales y/o proveedores de la cual la GOC S.A. es responsable, sus datos serán tratados con la finalidad según las bases de datos mencionadas, y podra tener acceso a través del siguiente correo electrónico info@gocsa.es a sus derechos de acceso corrección suspensión, revocación o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Av Carrera 45 # 100 - 12, Edificio Panorama 100 Bogotá

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FR-CAL-002
GOC	CONTRATO INVIAS 2024: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2"	Fecha: 13/01/2025
	Rutas 5003 - 2507 - 2902 - 26RSA - 50RS01 - 29RSB - 29RSA	Versión: 0/01/1900

Lugar	Consorcio Admon 743 - Dosquebradas	Fecha	07 - marzo - 2025.	Hora Inicio	8:00 Am.
Temas	Capacitación semanal, pausas activas, estiramientos			Hora Fin	8:15 Am.

Nombre responsable de la actividad	Cargo	Empresa / Entidad	Firma	Tipo Actividad	
Yuliano Reyes	Inspector SISO	AMV2	Yuliano R.	Divulgación	
				Capacitación	X
Cobertura: Colaboradores X	Proveedores / Contratistas		No. Personas convocadas: 4	Otro	

Observaciones

No.	Nombres y Apellidos	Ocupación / Cargo	No. Identificación	Cooperativa	Entidad / Empresa	Firma
1	EDWIN ANDRES BALLESTEROS	conductor	1088197191143	AMV2.	Consorcio 743	
2	Kelly Ramirez	Auxiliar Inq	1088009166	—	Consorcio Admon 743	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

De acuerdo con la Ley estatutaria 1581 del 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, le informamos que sus datos personales serán ingresados en la base de datos de empleados comunidad usuarios finales y/o proveedores de la cual la GOC S.A. es responsable, sus datos serán tratados con la finalidad según las bases de datos mencionadas, y podrá tener acceso a través del siguiente correo electrónico info@gocsa.es a sus derechos de acceso corrección suspensión, revocación, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Av. Carrera 45 # 100 - 12, Edificio Panorama 100. Bogotá

Powered by CamScanner

GOC CONSORCIO AMVOS 143	**REGISTRO DE ASISTENCIA** CONTRATO INVIAS 2024: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2." Rutas 5003 - 2607 - 2902 - 25RSA - 50RS01 - 29RSB - 29RSA	FR-CAL-002 Fecha 13/01/2025 Versión 0/01/1900

Lugar	Dosquebradas		Fecha	21-03-2025			Hora Inicio	8:00 am
Temas	Pausas Activas						Hora Fin	8:15 am
							Tipo Actividad	
Nombre responsable de la actividad		Cargo		Empresa / Entidad		Firma	Divulgación	
Yuliana Reyes		Insp. SISO		AMV2		Yuliana	Capacitación	X
Cobertura	Colaboradores	X	Proveedores / Contratistas		No. Personas convocadas	4.	Otro	
Observaciones								

No.	Nombres y Apellidos	Ocupación / Cargo	No. Identificación	Cooperativa	Entidad / Empresa	Firma
1	EDIRIANDO BALLESTEROS	Conductor	1089719143	AMV2	Consorcio	
2	DAVID JARAMILLO	inspector vial	1027477344	AMV2	Consorcio	
3	Kelly Ramirez C.	Aux ing.	1088007166	AMV2	Consorcio.	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

De acuerdo con la Ley estatutaria 1581 del 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, le informamos que sus datos personales serán ingresados en la base de datos de empleados, comunidad, usuarios finales y/o proveedores de la cual la GOC S.A. es responsable, sus datos serán tratados con la finalidad según las bases de datos mencionadas, y podrá tener acceso a través del siguiente correo electrónico info@gocsa.es, a sus derechos de acceso, corrección, suspensión, revocación o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Av. Carrera 45 # 100 - 12, Edificio Panorama 100, Bogotá.

Powered by CamScanner

ANEXO 08- CAPACITACIÓN MENSUAL INVIAS

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

FORMATO CAPACITACIONES

Versión: 1.0

CONSORCIO ADMON 143

DEPARTAMENTO: RISARALDA CIUDAD: DOSQUEBRADAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO VIAL FECHA DILIGENCIAMIENTO: 14-03-2025

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO ADMON 143

Tema: Seguridad Social y Pensional DIRIGIDA POR: Cooperativa Comuneras Jorge Andres Holguin

TEMA: CHARLAS 5 MIN : seguridad vial

HORA INICIO: 2:00 pm

HORA FIN: 4:30 pm

Nº	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
	Yohan Andrez Ramirez Giraldo	Andrez Ramirez Giraldo	
	Juan Jaile Guapacha Ramirez		
	Carlos Alberto Medina		
	Ruben Dario Ramirez Giraldo	Ruben Dario Ramirez	
	Jose Rodrigo Montoya Gomez		
	Felix Alejandro Rivera Aguirre		
	Sebastian Parra Soto	Sebastian Parra	
	Jose Mauricio Duval A.		
	Juan Carlos Franco	Nelson Ramirez	
	Jhon Anderson Lopez B.	Jhon Anderson	

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FR-CAL-002
GOC CONSORCIO AMIV 143	CONTRATO INVIAS 2024: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2." Rutas 5003 - 2507 - 2902 - 25RSA - 50RS01 - 29RSB - 29RSA	Fecha: 13/01/2025
		Versión: 0/01/1900

Lugar	Sede centro	Fecha	14 marzo 2025.	Hora Inicio: 2:00 pm
Temas: Seguridad social y pensional				Hora Fin: 4:30 pm

Nombre responsable de la actividad	Cargo	Empresa / Entidad	Firma	Tipo Actividad	
Jorge Andres Holguin	Abogado	AMV2	Jorge A.	Divulgación	
				Capacitación	X
				Otro	

Cobertura	Colaboradores	X	Proveedores / Contratistas		No. Personas convocadas	33

Observaciones

No.	Nombres y Apellidos	Ocupación / Cargo	No. Identificación	Cooperativa	Entidad / Empresa	Firma
1	Luis fernando Cardona	Mantenimiento de	10.022455	Altagracia	AMV2	
2	Daniel Buitrago	Mto Vias	1014258	Altagracia	AMV2	
3	Reinel Rios	mto Vias	9920147	Altagracia	AMV2	Reinel
4	Luis Fernando Alzate	Mant. Vias	10023047	altagracia	AMV2	
5	Hernando Murcia	Mant. Vias	10006723	altagracia	AMV2	William G:l
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

De acuerdo con la Ley estatutaria 1581 del 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, le informamos que sus datos personales serán ingresados en la base de datos de empleados, comunidad, usuarios finales y/o proveedores, de la cual la GOC S.A. es responsable, sus datos serán tratados con la finalidad según las bases de datos mencionadas, y podrá tener acceso a través del siguiente correo electrónico: info@gocsa.es, a sus derechos de acceso, corrección, suspensión, revocación, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Av. Carrera 45 # 100 - 12, Edificio Panorama 100, Bogotá

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO INVIAS 2024: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2."
Rutas 5003 - 2507 - 2902 - 25RSA - 50RS01 - 29RSB - 29RSA

FR-CAL-002
Fecha: 13/01/2025
Versión: 0/01/1900

Lugar: Sede centro | Fecha: 14 marzo 2025

Tema(s): Seguridad Social y Pensional

Hora Ini: 2. am
Hora Fin: 4.30 pm

Nombre responsable de la actividad	Cargo	Empresa / Entidad	Firma
Jorge Andres Holguin	Abogado	AMV2	

Tipo Actividad: Divulgación: ; Capacitación: X ; Otro:

Cobertura: Colaboradores X | Proveedores / Contratistas | No. Personas convocadas: 33

Observaciones:

No.	Nombres y Apellidos	Ocupación / Cargo	No. Identificación	Cooperativa	Entidad / Empresa	Firma
1	Rosembert S.	cordinador	79960082	centro	AMV2	Rosembert S
2	Jhon freddy	M. T. R	4538974	centro	AMV2	
3	CARLOS A REYES	M. T. R	9892971	centro	AMV2	
4	Nelson Acosta	M. T. R	4456967	centro	AMV2	
5	JAVIER MOYANO	M. T. R	1001 9206	centro	AMV2	
6	Alejandro Diaz Garcia	M. T. R	1088255117	centro	AMV2	
7	Ruben Dario Tre	M. T. R	1003017 72	centro	AMV2	
8	Edwin BUENO	M. T. R	1089718578	centro	AMV2	
9						
10						
11						
12						

De acuerdo con la Ley estatutaria 1581 del 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, le informamos que sus datos personales serán ingresados en la base de datos de empleados, comunidad, usuarios finales y/o proveedores, de la cual la GOC S A es responsable, sus datos serán tratados con la finalidad según las bases de datos mencionadas, y podrá tener acceso a través del siguiente correo electrónico info@gocsa es, a sus derechos de acceso, corrección, suspensión, revocación, o mediante correo ordinario remitido a la dirección Av. Carrera 45 # 100 - 12, Edificio Panorama 100, Bogotá

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	FR-CAL-002
	CONTRATO INVIAS 2024: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2." Rutas 5003 - 2507 - 2902 - 25RSA - 50RS01 - 29RSB - 29RSA	Fecha: 13/01/2025
		Versión: 0/01/1900

Lugar	Sede centro	Fecha	14 - marzo - 2025

Temas: Seguridad social y Pensional

Hora Inicio: 2:00 pm
Hora Fin: 4:30 pm

Nombre responsable de la actividad	Cargo	Empresa / Entidad	Firma
Jorge Andres Holguin	Abogado	AMV2	

Cobertura	Colaboradores	X	Proveedores / Contratistas		No. Personas convocadas	3.

Tipo Actividad: Divulgación ; Capacitación X ; Otro

Observaciones

No.	Nombres y Apellidos	Ocupación / Cargo	No. Identificación	Cooperativa	Entidad / Empresa	Firma
1	Edwin londo Ballesteros	Conductor	1089719143	—o—	Consorcio 143.	
2	Kelly J Ramirez	Aux ing	1088007166	—o—	Consorcio 143	
3	Jael Moriano	Ingeniera.	1085245598	—o—	Consorcio 143.	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

De acuerdo con la Ley estatutaria 1581 del 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, le informamos que sus datos personales serán ingresados en la base de datos de empleados, comunidad, usuarios finales y/o proveedores, de la cual la GOC S.A. es responsable, sus datos serán tratados con la finalidad según las bases de datos mencionadas, y podrá tener acceso a través del siguiente correo electrónico info@gocsa.es, a sus derechos de acceso, corrección, suspensión, revocación, o mediante correo ordinario remitido a la dirección: Av. Carrera 45 # 100 - 12, Edificio Panorama 100, Bogotá.

Powered by CamScanner

ANEXO 09 – REGISTRO FOTOGRAFICO SST

CONSORCIO ADMON 143

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

CONSORCIO ADMON 143	REGISTRO FOTOGRÁFICO	FR-CAL-003
	CONTRATO INVIAS 2024: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL RISARALDA, GRUPO AMV 2 LOTE 2." Rutas 5003 - 2507 - 2902 - 25RSA - 50RS01 - 29RSB - 29RSA	**Versión:** 0
		Fecha: 13/01/2025

Actividades desarrolladas	Capacita microempresas			**Fecha**	14/03/2025
Ubicación	Sede centro - Cerritos	**Entidad**	Consorcio ADMON 143 AMV2	**Cantidad Personal**	34

Fotografía No. 1	**Fotografía No. 2**
	
capacitacion microempresa	capacitacion microempresa
Fotografía No. 3	**Fotografía No. 4**
	
capacitacion microempresa	capacitacion microempresa
Fotografía No. 5	**Fotografía No. 6**
	
capacitacion microempresa	capacitacion microempresa

ESE HOSPITAL SANTA MONICA
NIT - 891411663-1
Viviendo la calidad para llegar a la excelencia
HOSPITAL Cll 18 Cra 19 - 3302507 - Dos Quebradas - COLOMBIA

Fecha impresión: 21/03/2025 10:40

Orden N°: 104705

Orden Egreso de pacientes **Código:** 1737 **Fecha y hora:** 21/03/2025 10:40

Apellidos:	JARAMILLO SALAMANCA	**Nombres:**	NEYDER DAVID
Tipo Identificación:	CC	**Número documento:**	1012447344
Fecha de Nacimiento:	06/11/1997	**Edad:**	27 Años/4 Meses/15 Dias
Género:	Masculino	**Ocupación:**	PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION
Dirección:	CCR 15 18 29 SANTA TERESITA	**Teléfono:**	3147369588
Nombre del Cliente:	NUEVA EPS	**Convenio:**	1152-1 CAPITADO SUB NUEVA EPS
Fecha registro :	21/03/2025 10:40	**Fecha atención:**	21/03/2025 10:40

Estado de autorización: Ordenada **Estado de la orden:** Ordenado
Tipo: Egreso Cirugia
Estado salida: Vivo
Tipo de usuario: Subsidiado
Vía de ingreso: Atención inicial de urgencias
Categoria: NIVEL 1

Observaciones:

VICTOR SAMUEL MOSQUERA ARTAMONOV
CC 1087998004
N° de registro: 1087998004
MEDICINA GENERAL

Firma usuario

Powered by CamScanner

	TÍTULO		CÓDIGO
Santa Mónica	**PLAN DE ALTA EXTRACCIÓN DE LIPOMA**		**10U712 – F48**
	TIPO DOCUMENTO	RESPONSABLE	VERSIÓN
	FORMATO	**12.CIRUGÍA**	**3.0**
			FECHA VIGENCIA
			15/07/2024

DEFINICIÓN: Extracción de cualquier protuberancia anormal de grasa debajo de la piel

NOMBRE DEL USUARIO: Neyder Jaramillo

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

DIETA: rica en fibra, y proteínas. Consumir abundantes líquidos. favorecen a la recuperación y cicatrización

CUIDADOS ESPECÍFICOS:

- ✓ Administrar adecuadamente los medicamentos formulados por el médico.
- ✓ No tome baños en tina ni se meta a piscinas durante 4 semanas. Estas acciones pueden causar una infección.
- ✓ Asistir puntualmente a los controles ordenados por el médico
- ✓ Aplique hielo en la incisión (Cúbralo con una toalla antes de aplicarlo sobre su piel) 20 minutos cada hora.
- ✓ Retirar el Micropore de la herida después de 5 días, ya que este protege la herida de infecciones y ayuda a la cicatrización.
- ✓ Asistir al centro de salud para el retiro de puntos en 7 días.
- ✓ Llevar muestra a patología si es el caso y consultar al médico con el reporte.
- ✓ No se auto medique

EJERCICIO: Realice las actividades normalmente.

MEDIDAS GENERALES:

- ✓ Las protuberancias en la piel ocasionadas por trauma se pueden tratar con descanso, hielo, compresión y elevación del área afectada. Las demás deben, en su mayoría, ser examinadas por el médico antes de ensayar cualquier tipo de tratamiento casero.
- ✓ Vigilar signos de infección en el lugar de la herida como: fiebre, dolor intenso, enrojecimiento, salida de material purulento. En caso de presentarlo consultar por urgencias.
- ✓ Si existe una protuberancia o hinchazón inexplicable, consulte al médico.
- ✓ En caso de cualquier eventualidad o duda que tenga, comuníquese inmediatamente con la oficina de atención al usuario, o con la enfermera de cirugía a los siguientes teléfonos: 3302507,3302508 ,3302482 Ext. 126, 229.

RECUERDE SU CONTROL POST QUIRURGICO: Venir el día 22-3-25 a las 8:00 Am en consulta externa a curación

AUXILIAR DE ENFERMERIA:

Powered by CamScanner

ESE HOSPITAL SANTA MONICA
NIT - 891411663-1
Viviendo la calidad para llegar a la excelencia
HOSPITAL Cll 18 Cra 19 - 3302507 - Dos Quebradas - COLOMBIA

Fecha impresión: 21/03/2025 10:42

Orden N°: 56989 **Orden Incapacidades y/o licencias** **Código:** 1778 **Fecha y hora:** 21/03/2025 10:42

Apellidos:	JARAMILLO SALAMANCA	**Nombres:**	NEYDER DAVID
Tipo Identificación:	CC	**Número documento:**	1012447344
Fecha de Nacimiento:	06/11/1997	**Edad:**	27 Años/4 Meses/15 Dias
Género:	Masculino	**Ocupación:**	PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION
Dirección:	CCR 15 18 29 SANTA TERESITA	**Teléfono:**	3147369588
Nombre del Cliente:	NUEVA EPS	**Convenio:**	1152-1 CAPITADO SUB NUEVA EPS
Fecha registro :	21/03/2025 10:42	**Fecha atención:**	21/03/2025 10:42

Vigencia: 21/03/2025 - 25/03/2025
Tipo de usuario: Subsidiado
Vía de ingreso: Atención inicial de urgencias
Categoria: NIVEL 1

Diagnósticos
Principal Ingreso: L059 - QUISTE PILONIDAL SIN ABSCESO **Tipo principal:** Impresión diagnóstica.

Causa externa: Enfermedad general **Ocupación:** PERSONAS QUE NO HAN DECLARADO OCUPACION **Tipo vinculación:** Subsidiado

Días de incapacidad: 5 **Prórroga:** No
Diagnóstico: L059 QUISTE PILONIDAL SIN ABSCESO
Observaciones: reposo en casa

VICTOR SAMUEL MOSQUERA ARTAMONOV
CC 1087998004
N° de registro: 1087998004
MEDICINA GENERAL

Firma usuario

Powered by CamScanner

ANEXOS

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

CENTRO

ANEXO 10- LISTA DE CHEQUEO SGSST

FORMATO SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Informe de obra N°:	2	Período	DEL 01/03/2025	Al	31/03/2025
Tipo de Informe SST:		MENSUAL			
Fecha de Inspección:		31 de marzo del 2025			
Nombre del Proyecto:		Administracion vial 2			
Contrato de obra No.		1455			
Departamento:		RISARALDA			
Municipio:		DOSQUEBRADAS			
Nombre del Contratante de Obra:		INVIAS			
Nombre Contratista de Obra:		COOPERATIVA ASOCIADA CENTRO			
Residente AMV2:		JAEL MORIANO			
Plazo de ejecución:		2 AÑOS			
Nombre de la persona que realiza la inspección:		YULIANA REYES			
Cargo de la persona que realiza la inspección:		INSPECTOR SST			

	Característica a Inspeccionar	SE IMPLEMENTO 1-0	OBSERVACIONES	ACCIONES A IMPLEMENTAR
A)	**EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST**			
1	Listado de equipo, vehiculo	1		
2	Tarjeta de propiedad, SOAT, tecnomecanica, licencia de conducción	1		
3	Del equipo, caracteristicas, motor y serial del mismo	1		
4	Se alquila baños portatiles? Se arrenda una casa?	0		
5	Listado de personal obra, medevac	1		
6	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social: ARL, EPS y AFP?.	1		
7	Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago efectuado.	1		
8	Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?.	1		
9	Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?	1		
10	Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?	1		
11	Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud en el trabajo? Se encuentran las evidencias y constancia escrita y firmada por los trabajadores	1	Pausas activas charlas de 5 minutos capacitaciones mensuales	
12	Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?	1		
14	El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?. Se ha establecido control de cambios cuando se requiera?	1		
15	El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado?	1		
16	Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso?	1		
17	El personal de obra utiliza los elementos de protección personal?	1		
18	Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el proyecto? Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas.	0		
19	Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de pacientes, inmovilizadores de cuello	1		
20	Se tiene publicado el MEDEVAC en los frentes de obra?. El personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado?	0		
21	Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos identificados en obra?.	1		
22	Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?	0	Realizar simulacro de emergencia con la cooperativa	
23	Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el proyecto? Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación?	1		
24	Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial. Se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos	1		
25	Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1		
26	Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores?	1		
27	Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas . Son socializadas con el personal involucrado en su manejo?.	0	Realizar fichas de seguridad paa todas las sustancias quimicas	
28	Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?	0	Pendiente realizar rotulacion de las sustancias quimicas	
29	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?.	0		
30	Se realizan simulacros de emergencia?.	1		
31	Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados?	0	NA	solo si realiza dicha actividad
	El personal presenta curso de alturas/espacios confinados para trabajos de alto riesgo?	0	NA	se anexa ATS en caso de realizar dichas actividades
33	El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley?.	1		
34	Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos?	1		
35	Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el proyecto?	0		
36	Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa?	0		
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST		24		
TOTAL VALORACIÓN SST		**67%**	**DE**	**100%**

Se tiene nivel de implementación de SST acorde a:

100%	Cumple
< 80%	Cumple parcialmente y mejoramiento
50%	Aplicar mejoramiento
> 10	No cumple

Observaciones:

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

N°	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI/NO	OBSERVACIÓN
1					
2					

PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN
NOMBRE: YULIANA REYES
CARGO: INSPECTOR SST ADMV2

ANEXO 11 - PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL COOPERATIVA DE TRABAJO EL CENTRO

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816004084	7	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CENTRO	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	9499	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	MANZANA 46 CASA 1 BARRIO ELREM	3355969	COOTRACENTRO@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	32988956	E	2025-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.377.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	32988956	2025-04-22	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 4456963	HERRERA SERNA NELSON	1.900.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	76.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.900.000	76.000	1.900.000	132.300	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	588.300	S	5813001
2	CC 4538974	BECERRA ARICAPA JHON FREDY DE JESUS	1.423.500																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5813001
3	CC 9892971	RESTREPO LADINO CARLOS ARTURO	1.900.000																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	76.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.900.000	76.000	1.900.000	132.300	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	588.300	S	5813001
4	CC 10019206	MORALES RESTREPO FRANCISCO JAVIER	1.900.000																	0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	1.583.334	253.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.583.334	63.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.583.334	63.400	1.583.334	110.300	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	490.500	S	5813001
5	CC 10019206	MORALES RESTREPO FRANCISCO JAVIER	1.900.000												X					0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	316.667	50.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	316.667	12.700	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	0	0	316.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	31	0	63.400	S	5813001
6	CC 10030172	TREJOS TREJOS RUBEN DARIO	1.900.000																	0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	76.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.900.000	76.000	1.900.000	132.300	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	588.300	S	5813001
7	CC 79961082	SANCHEZ ROSEMBERT	1.900.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	76.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.900.000	76.000	1.900.000	132.300	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	588.300	S	5813001
8	CC 1088255117	DIAZ BERMUDEZ JONNY ALEJANDRO	1.900.000																	0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.900.000	304.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.900.000	76.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.900.000	76.000	1.900.000	132.300	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	588.300	S	5813001
9	CC 1089718578	BUENO GALLEGO EDUARD ARBEY	1.423.500																	0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5813001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816004084	7	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CENTRO	B	0	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	MANZANA 46 CASA 1 BARRIO ELREM		3355969			COOTRACENTRO@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	32988956	E	2025-04-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.377.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	32988956	2025-04-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
14.247.001	14.247.001	14.247.001	13.930.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	2.279.700	0	0	0	2.279.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	304.000	0	0	0	304.000
PROTECCION	230201	800229739	0	3	835.800	0	0	0	835.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.139.900	0	0	0	1.139.900
EPS(Administradoras: 3)				8	570.100	0	0	0	570.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	456.100	0	0	0	456.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				8	970.000	0	0	0	970.000
LA EQUIDAD	14-29	830008686	1	8	970.000	0	0	0	970.000
CCF(Administradoras: 1)				8	557.400	0	0	0	557.400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	8	557.400	0	0	0	557.400
Gran Total					4.377.200	0	0	0	4.377.200

ANEXO 12- CONDICIONES DIARIAS DE SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA CENTRO

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENCIA 14 MARZO 2025
	CONDICIONES DIARIAS DE SALUD	VERSION 1

Fecha desde : 1 DE MARZO 2025 **Hasta : 31 DE MARZO 2025**

Cooperativa: centro

Confirma que ingresa y sale de obra en buenas condiciones

Criterios de calificacion B: bien M: mal

Nombre del trabajador	C.C.	CONDICION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma	Observaciones
		C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
eduar arbey bueno galeano	1.089.718.578	C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
jhon fredy de jesus becerra aricapa	4.538.974	C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
carlos arturo resrepo ladino	9.892.971	C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
rosembert sanchez	79.961.082	C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
nelson herrera serna	4.456.963	C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
jhony alejandro diaz bermudez	1.088.255.117	C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
francicso javiermoralez restrepo	10.019.206	C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
ruben dario trejos trejos	10.030.172	C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		

Profesional SST **Nombre : Eliud Murillo Ocampo**

CC : 79052528

Firma

ANEXO 13- PRE PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y VEHICULO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA CENTRO

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR GUADAÑA	Versión: 01 Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: EL CENTRO	
RUTAS DE TRABAJO : 50RS01 25RSA	**TRABAJO/ACTIVIDAD: ROCERIA**
FECHA DE INSPECCION DESDE : DEL 16 DE MARZO 2025	**HASTA: 31 DE MARZO 2025**
HORA INICIAL DE ACTIVIDAD : 7:30 am	**HORA FINAL DE ACTIVIDAD: 3:00 pm**
N° MOTOR :	**N° SERIE/REFERENCIA 43.R**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA	
		MALO	OBSERVACIONES
	Motor	x	
	Encendido	x	
	Sistema antivibración	x	
	Soporte ergonómico	x	
	Acelerador gatillo	x	
	Estructura en tubo	x	
	Protector	x	

3. ACCESORIOS:

	Cuchilla	x	
	Yoyo mecánico	x	
	Nylon	x	
	Yoyo manual	x	
	combutible (gasolina + aceite)	x	

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		SI	NO
	Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
	Careta de malla o acrilico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Delantal en carnasa	X	
	Canilleras	X	
	Bota protectora	X	
	Arnes de sujeción de guadaña	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a núméral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a núméral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales
9	Roseria del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR GUADAÑA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL



COOPERATIVA DE TRABAJO: EL CENTRO	
RUTAS DE TRABAJO : 50RS01 25RSA	**TRABAJO/ACTIVIDAD: ROCERIA**
FECHA DE INSPECCION DESDE : DEL 1 DE MARZO 2025	**HASTA: 15 DE MARZO 2025**
HORA INICIAL DE ACTIVIDAD : 7:30 am	**HORA FINAL DE ACTIVIDAD: 3:00 pm**
N° MOTOR :	**N° SERIE/REFERENCIA 43.R**

2. PRE-OPERACIONAL

8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales
9	Roseria del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la roceria	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Eduar Arbey Bueno Galeano	1089718578	
2	Jhon Fredy de Jesus Becerra Aricpa	4.538.974	
3	Carlos Arturo Restrepo Ladino	9.892.971	
4	Rosembert Sanchez	79.961.082	
5	Nelson Herrera Serna	4.456.963	
6	Jhony Alejandro Diaz Bermudez	1.088.255.117	
7	Francisco Javier Morales Restrepo	10.019.206	
8	Ruben Dario Trejos Trejos	10.030.172	
9			
10			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR GUADAÑA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: EL CENTRO	
RUTAS DE TRABAJO : 50RS01 25RSA	**TRABAJO/ACTIVIDAD: ROCERIA**
FECHA DE INSPECCION DESDE : DEL 1 DE MARZO 2025	**HASTA: 15 DE MARZO 2025**
HORA INICIAL DE ACTIVIDAD : 7:30 am	**HORA FINAL DE ACTIVIDAD: 3:00 pm**
N° MOTOR :	**N° SERIE/REFERENCIA 43.R**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA	
		MALO	OBSERVACIONES
	Motor	x	
	Encendido	x	
	Sistema antivibración	x	
	Soporte ergonómico	x	
	Acelerador gatillo	x	
	Estructura en tubo	x	
	Protector	x	

3. ACCESORIOS:

	Cuchilla	x	
	Yoyo mecánico	x	
	Nylon	x	
	Yoyo manual	x	
	combutible (gasolina + aceite)	x	

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		SI	NO
	Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
	Careta de malla o acrilico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Delantal en carnasa	X	
	Canilleras	X	
	Bota protectora	X	
	Arnes de sujeción de guadaña	X	



5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a númeral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a númeral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI


10	Finalización de la roceria	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Eduar Arbey Bueno Galeano	1089718578	
2	Jhon Fredy de Jesus Becerra Aricpa	4.538.974	
3	Carlos Arturo Restrepo Ladino	9.892.971	
4	Rosembert Sanchez	79.961.082	
5	Nelson Herrera Serna	4.456.963	
6	Jhony Alejandro Diaz Bermudez	1.088.255.117	
7	Francisco Javier Morales Restrepo	10.019.206	
8	Ruben Dario Trejos Trejos	10.030.172	
9			
10			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL SOPLADORA	Versión: 01 Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: EL CENTRO		
RUTAS DE TRABAJO	**50RS01 25RSA**	**ACTIVIDAD : RETIRO DE MATERIAL LIVIANO**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**1 DE MARZO 2025**	**HASTA: 15 DE MARZO 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**7:30:00 A M**	**HORA FINAL ACTIVIDAD: 3: 00 PM**
N° MOTOR	**N/A**	**N° SERIE/REFERENCIA: BR.600**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Bloqueo del acelerador	X		
	Acelerador	X		
	Palanca del mando indicado	X		
	Carburador	X		
	Pistón	X		
	Filtro de aire	X		
	Empuñadira de arranque	X		
	Bujia	X		
	Cilindro	X		
	Manillar tubular	X		



4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI		SE CUENTA PARA LA ACTIVIDAD	
		SI	NO
	Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
	Careta de malla o acrilico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Bota protectora	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ROCERIA

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a núméral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a núméral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
9	Sopladora	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la actividad	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Eduar Arbey Bueno Galeano	1089718578	
2	Jhon Fredy de Jesus Becerra Aricpa	4.538.974	
3	Carlos Arturo Restrepo Ladino	9.892.971	
4	Rosembert Sanchez	79.961.082	
5	Nelson Herrera Serna	4.456.963	
6	Jhony Alejandro Diaz Bermudez	1.088.255.117	
7	Francisco Javier Morales Restrepo	10.019.206	
8	Ruben Dario Trejos Trejos	10.030.172	
9			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

PREOPERACIONAL SOPLADORA

Versión: 01

Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: EL CENTRO		
RUTAS DE TRABAJO	**50RS01 25RSA**	**ACTIVIDAD : RETIRO DE MATERIAL LIVIANO**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**16 DE MARZO 2025**	**HASTA: 31 DE MARZO 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**7:30 a. m.**	**HORA FINAL ACTIVIDAD: 3:00 PM**
N° MOTOR		**N° SERIE/REFERENCIA: BR.600**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Bloqueo del acelerador	X		
	Acelerador	X		
	Palanca del mando indicado	X		
	Carburador	X		
	Pistón	X		
	Filtro de aire	X		
	Empuñadira de arranque	X		
	Bujia	X		
	Cilindro	X		
	Manillar tubular	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI	SE CUENTA PARA LA ACTIVIDAD	
	SI	NO
 Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
Careta de malla o acrilico	X	
Tapaoidos	X	
Gafas lente oscuro	X	
Bota protectora	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ROCERIA

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a núneral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a núneral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
9	Sopladora	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la actividad	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Eduar Arbey Bueno Galeano	1089718578	
2	Jhon Fredy de Jesus Becerra Aricpa	4.538.974	
3	Carlos Arturo Restrepo Ladino	9.892.971	
4	Rosembert Sanchez	79.961.082	
5	Nelson Herrera Serna	4.456.963	
6	Jhony Alejandro Diaz Bermudez	1.088.255.117	
7	Francisco Javier Morales Restrepo	10.019.206	
8	Ruben Dario Trejos Trejos	10.030.172	
9			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR PODADORA DE ALTURAS	Versión: 01 Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE ATRABAJO ASOCIADO EL CENTRO

RUTAS DE TRABAJO	**50RS01 25RSA**	**ACTIVIDAD:**	**CORTE DE RAMAS**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**del 1 de marzo 2025**	**HASTA**	**31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:		**HORA FINAL ACTIVIDAD:**	
N° MOTOR		**N° SERIE/REFERENCIA:**	**40.R**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Motor	X		
	Encendido	X		
	Sistema antivibración	X		
	Soporte ergonómico	X		
	Acelerador gatillo	X		
	Estructura en tubo	X		
	Protector	X		

3. ACCESORIOS:

	Cuchilla	X		
	Yoyo mecánico	X		
	Nylon	X		
	Yoyo manual	X		
	combutible (gasolina + aceite)	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI		SI	NO
	Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
	Careta de malla o acrilico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Delantal en carnasa	X	
	Canilleras	X	
	Bota protectora	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ROCERIA

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,físico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,físico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,físico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,físico, químico, psicosociall,	De acuerdo a número 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a número 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,físico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,físico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR PODADORA DE ALTURAS	Versión: 01 Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL






COOPERATIVA DE ATRABAJO ASOCIADO EL CENTRO

RUTAS DE TRABAJO	**50RS01 25RSA**	**ACTIVIDAD:**	**CORTE DE RAMAS**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**del 1 de marzo 2025**	**HASTA**	**31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:		**HORA FINAL ACTIVIDAD:**	
N° MOTOR		**N° SERIE/REFERENCIA:**	**40.R**

8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales
9	Roseria del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la roceria	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Eduar Arbey Bueno Galeano	1089718578	
2	Jhon Fredy de Jesus Becerra Aricpa	4.538.974	
3	Carlos Arturo Restrepo Ladino	9.892.971	
4	Rosembert Sanchez	79.961.082	
5	Nelson Herrera Serna	4.456.963	
6	Jhony Alejandro Diaz Bermudez	1.088.255.117	
7	Francisco Javier Morales Restrepo	10.019.206	
8	Ruben Dario Trejos Trejos	10.030.172	
9			
10			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR MOTOSIERRA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO CENTRO

RUTAS DE TRABAJO	**50RS01 25RSA**	**TRABAJO/ACTIVIDAD**	**CORTE Y PODA DE ARBOLES**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**1 DE MARZO 2025**	**HASTA**	**31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**7:30:00 A.M**	**HORA FINAL ACTIVIDAD**	**3:00:00 P.M**
N° MOTOR		**N° SERIE/REFERENCIA**	

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Bloqueo del acelerador	X		
	Acelerador	X		
	Palanca del mando indicado	X		
	Carburador	X		
	Pistón	X		
	Filtro ded aire	X		
	Empuñadira de arranque	X		
	Bujia	X		
	Cilindro	X		
	Manillar tubular	X		
	Cadena	X		
	Espada	X		
	Dospositivo tensor de la cadena	X		
	Cinta de freno	X		
	Resorte de tracción (freno de cadena)	X		
	Cigüeñal	X		
	Piñon de cadena	X		
	Embragüe	X		
	Filtro de combustible	X		

3. ACCESORIOS:

	Espada	X		
	Cadena	X		
	Lima	X		
	Llave de copa	X		
	combutible (gasolina + aceite)	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI		SI	NO
	Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
	Careta de malla o acrilico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Delantal en carnasa	X	
	Canilleras	X	
	Bota protectora	X	

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR MOTOSIERRA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO CENTRO



RUTAS DE TRABAJO	**50RS01 25RSA**	**TRABAJO/ACTIVIDAD**	**CORTE Y PODA DE ARBOLES**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**1 DE MARZO 2025**	**HASTA**	**31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**7:30:00 A.M**	**HORA FINAL ACTIVIDAD**	**3:00:00 P.M**
N° MOTOR		**N° SERIE/REFERENCIA**	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a númeral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a númeral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales
9	Roseria del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la roceria	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Eduar Arbey Bueno Galeano	1.089.718.578	
2	Jhon Fredy de Jesus Becerra Aricpa	4.538.974	
3	Carlos Arturo Restrepo Ladino	9.892.971	
4	Rosembert Sanchez	79.961.082	
5	Nelson Herrera Serna	4.456.963	
6	Jhony Alejandro Diaz Bermudez	1.088.255.117	
7	Francisco Javier Morales Restrepo	10.019.206	
8	Ruben Dario Trejos Trejos	10.030.172	
9			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE VEHICULO	VERSION 2

Fecha desde:	**1 AL 15 DE MARZO 2025**	**Hasta : 31 de marzo 2025**	
Placa	**WAA397**		
Marca	**JEEP**		
Modelo	**1961**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (30) mes (05) año (2025)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(03) Mes (04) Año (2025)**		
Área de trabajo	**50RS01 Y 25RSA**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**														
ESTADO GENERAL	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
ENCENDIDO DE MOTOR			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
CARROCERÍA			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
LLANTAS Y RINES			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
luces de parqueo y direccionales			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
LUCES DELANTERAS y traceras			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
LIMPIABRISAS			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
PITO PRINCIPAL			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
COJINERÍA			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
espejos en general			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
VELOCIMETRO			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
cinturon de seguridad			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
conos refectivos y tacos y chaleco			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
Botiquin, linterna y extintor			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
HERRAMOENTAS BASICAS			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
gato ,palca,cruceta			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
kit de herramientas vacicas			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
llanta de repuesto			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
SISTEMA DE FRENOS			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
PRINCIPAL Y DE EMERGENCIA			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
nivel de liquido de frenos			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
INSPECCIÓN INTERNA			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
aceite motor y lubricacion			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
radiador y filtros			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
ventilador, correas y mangueras			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
cables electricos			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	
bateria			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA**

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**FIRMA**
NELSON HERRERA SERNA	4.456.963	
JHONY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ	1.088.255.117	
RUBEN DARIO TREJOS TREJOS	10.030.172	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE VEHICULO	VERSION 2

Fecha desde:	**1 DE MARZO 2025**	**Hasta: 31 DE MARZO 2025**	
Placa	**WAA397**		
Marca	**JEEP**		
Modelo	**1961**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (30) mes (05) año (2025)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(03) Mes (04) Año (2025)**		
Área de trabajo	**50RS01 Y 25RSA**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**															
ESTADO GENERAL	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
ENCENDIDO DE MOTOR	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
CARROCERÍA	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
LLANTAS Y RINES	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
luces de parqueo t direccionales	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
luces traceras y delanteras	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
LIMPIABRISAS	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
PITO PRINCIPAL	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
COJINERÍA	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
espejos en general	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
VELOCIMETRO	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
CINTURONES DE SEGURIDAD	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
conos ,tacos ,chaleco reflctivo	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
botiquin linterna y extintor	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
HERRAMIENTAS BÁSICAS	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
gato palalca cruceta	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
kit de herramientas basicas	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
LLANTA DE REPUESTO	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
SISTEMA DE FRENOS	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
PRINCIPAL Y DE EMERGENCIA	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
INSPECCIÓN INTERNA	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
aceite motor y lubricacon	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
radiador y filtros	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
vetilador ,correas y manqueras	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
CABLES ELÉCTRICOS	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
BATERIA	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B
FUGAS DE LUBRICANTES	B	B	B	B	B	B				B	B	B	B			B

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA:**

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**FIRMA**
NELSON HERRERA SERNA	4.456.963	
JHONY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ	1.088.255.117	
RUBEN DARIO TREJOS TREJOS	10.030.172	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	FORMATO INSPECCION DIARIA DE MOTO	VERSION 2

Fecha desde:	**16 DE MARZO 2025**	**HASTA : 31 DE MARZO 2025**	
Placa:	**NHK83E**		
Marca:	**AUTECO.CT.100**		
Modelo:	**2019**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (	**02**	**) mes 04**	**) año (2025)**
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(05) Mes (06) Año (2025)**		
Área de trabajo	**50RS01 y 25RSA**		



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**															
VERIFICACION DE DOCUMENTOS	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
LICENCIA CESURO Y TECNO MECANICA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
VERIFICACION MOTOCICLETA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NIVEL DE ACEITE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESTADO DE LUCES EN GENERAL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
REPOSA PIES Y MANIQUETAS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CHACIS Y SILLIN	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SUSPENSION (AMORTIGUADORES)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
YANTAS Y RINES	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TABLERO-VELOCIMETRO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESPEJOS Y PITO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EPP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CASCO CHALECO R IMPERMEABLE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA** 

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**FIRMA**
EDUAR ARBEY BUENO GALEANO	1.089.718.578	
JHON FREDY DE JESUS BECERRA ARICAPA	4.538.974	
CARLOS ARTURO RESTREPO LADINO	9.892.971	
ROSEMBERT SANCHEZ	79.961.182	
NELSON HERRERA SERNA	4.456.963	
JHONY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ	1.088.255.117	
FRANCISCO JAVIER MORALEZ RESTREPO	10.019.206	
RUBEN DARIO TREJOS TREJOS	10.030.172	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	FORMATO INSPECCION DIARIA DE MOTO	VERSION 2

Fecha desde	**1 de marzo 2025**	**Hasta : 31 de marzo 2025**	
Placa	**NHK83E**		
Marca	**AUTECO .CT.100**		
Modelo	**2019**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (02) mes (04) año (2025)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(05) Mes (06) Año (2025)**		
Área de trabajo	**25RSA y 50RS01**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**														
VERIFICACION DE DOCUMENTOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
LICENCIA CEGURO Y TECNO MECANICO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
VERIFICACION MOTOCICLETA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NIVEL DE ACEITES	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESTADO DE LUCES EN GENERAL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
REPOSA PIES Y MANIQUETAS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CHASIS Y COJINERIA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SUSPENSION (AMORTIGUADORES)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
YANTAS Y RINES	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TABLERO-VELOCIMETRO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESPEJOS Y PITOS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EPP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CASCO Y CHALECO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA**

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
EDUAR ARBEY BUENO GALEANO	1.089.718.578	
JHON FREDY DE JESUS BECERRA ARICAPA	4.538.974	
CARLOS ARTURO RESTREPO LADINO	9.892.971	
ROSEMBERT SANCHEZ	79.961.182	
NELSON HERRERA SERNA	4.456.963	
JHONY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ	1.088.255.117	
FRANCISCO JAVIER MORALEZ RESTREPO	10.019.206	
RUBEN DARIO TREJOS TREJOS	10.030.172	

ANEXO 14- SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN SGSST COOPERATIVA ASOCIADA EL CENTRO

	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CENTRO	VIGENCIA 25 DE MARZO DE 2025
	FORMATO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	VERSION 1

DEPARTAMENTO:	**RISARALDA**
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	**DEL 1 DE MAZO HASTA -EL 31 DE MARZO 2025**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
SUPERVISION ASIGNADA	**AMV2**

N°	**AREA DE TRABAJO**					
	INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS	**ROTULO**		**FICHA TECNICA**		**FECHA DE INSPECCION**
		SI	**NO**	**SI**	**NO**	
1	GASOLINA	X		X		08/03/2025
2	ACEITE	X		X		08/03/2025
3	ACPM	X		X		8703/2025
4	DISOLVENTE	X		X		08/03/2025
5	PINTURAS	X		X		08/03/2025
6	PINTURA EN FRIO	X		X		08/03/2025
7	ASFALTO EN FRIO	X		X		08/03/2025
8	GRASA	X		X		08/03/2025
9						
10						
11						
12						

PROFESIONAL SST:

FIRMA 

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024
DEPARTAMENTO	**RISARALDA**	
COOPERATIVA	**DE TRABAJO ASOCIADO EL CENTRO**	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	**31 DE MARZO 2025**	
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**	
INTERVENTORIA:	**AMV2**	

LISTA EQUIPO/MAQUINARIA/VEHICULO

N°	EQUIPO	INFORMACION GENERAL							PREOPERACIONAL SI/NO	OBSERVACIONES
		MARCA	REFERENCIA	SERIAL/ PLACA	CAPACIDAD	SOAT	TECNOMECANICA	KIT ANTIDERRAMES		
1	VEHICULO	JEEP	1961	WAA397	9	SI	SI	N/A	SI	se utilizo
2	MOTO	AUTECO	CT.100	NHK83E	2	SI	SI	N/A	SI	se utilizo
3	MOTOCIERRA	STHIL	250.R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	se utilizo
4	GUADAÑAS	HUSGVARNA	43.R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	se utilizo
5	SOPLADORA	STHIL	BR.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	se utilizo
6	PODADORA DE ALTURAS	STHIL	40.R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	se utilizo
7	BOMBA DE AGUA	SHIDAWA	35.R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	no se utilizo
8										
9										

REVISÓ:

PROFESIONAL SST:

FIRMA 

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO



C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024

DEPARTAMENTO:	**RISARALDA**
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	**31 de marzo 2025**
COOPERATIVA	**DE TRABAJO ASOCIADO EL CENTRO**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
INTERVENTORIA:	**AMV2**

INFORMACIÓN DEL PERSONAL PARA EVACUACIÓN MÉDICA (MEDEVAC)

AVISO DE PRIVACIDAD: "Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada, que declaro conocer y estar informado de los canales de atención consignados en la misma a los que podré dirigirme para el ejercicio de mis derechos. Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento".

N°	DATOS DEL TRABAJADOR							DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO			FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	N° DE IDENTIFICACION	N° CELULAR	GRUPO SANGUINEO	ENTIDAD A LA CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO			NOMBRE	DIRECCION	CELULAR	
					SALUD	PENSION	ARL				
1	Eduar Arbey Bueno Galeano	1.089.718.578	3134770550	o+	salud total	proteccion	la equida	diana	pereira	3217051966	
2	Jhon Fredy de Jesus Becerra Aricapa	4.538.974	3127517682	o+	la nueva	colpenciones	la equidad	angela	pereira	3113287089	
3	Carlos Arturo Restrepo Ladino	9.892.971	3104904247	o+	la nueva	porvenir	la equidad	lucely restrepo	pereira	3128784991	
4	Rosembert Sanchez	79.961.082	3104564292	A+	la nueva	colpenciones	la equidad	fany castro	bogota	3107510611	
5	Nelson Herrera Serna	4.456.963	3116064315	o+	la nueva	colpenciones	la equidad	andres	santa rosa	3146082219	
6	Jhony Alejandro Dias Bermudes	1.088.255.117	3146017478	o+	la nueva	proteccion	la equidad	leidy torres	pereira	3212727337	
7	Francisco Javier Morales Restrepo	10.019.206	3143183423	o+	la nueva	colpenciones	la equidad	david morales	pereira	3136391003	
8	Ruben Dario Trejos Trejos	10.030.172	3136177903	A+	la nueva	proteccion	la equidad	diego fernando	pereira	3225565773	

REVISÓ: **PROFESIONAL SST:**

FIRMA 

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO




C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024

DEPARTAMENTO:	**RISARALDA**
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	**1 DE MARZO 2025 HATA - 15 DE MARZO 2025**
COOPERATIVA	**DE TRABAJO ASICIADO EL CENTRO**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
INTERVENTORIA	**AMV2**

CAPACITACIONES SST - CHARLAS DE 5 MINUTOS

HORA INICIO:	**8.00 am**	**HORA FIN:**	**8.05 am**

N°	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
1	EDUAR ARBEY BUENO GALEANO		
2	JHON FREDY DE JESUS BECERRA ARICAPA		
3	CARLOS ARTURO RESTREPO LADINO		
4	ROSEMBERT SANCHEZ		
5	NELSON HERRERA SERNA		
6	JHONY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ		
7	FRANCISCO JAVIER MORALEZ RESTREPO		
8	RUBEN DARIO TREJOS TREJOS		
9			
10			

PROFESIONAL SST

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C: 79052528





FIRMA 

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024

DEPARTAMENTO:	**RISARALDA**
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	**16 DE MARZO 2025 HASTA -31 DE MARZO 2025**
COOPERATIVA	**DE TRABAJO ASICIADO EL CENTRO**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
INTERVENTORIA	**AMV2**

CAPACITACIONES SST - CHARLAS DE 5 MINUTOS

HORA INICIO:	**8.00 am**	**HORA FIN:**	**8.05 am**

N°	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
1	EDUAR ARBEY BUENO GALEANO		
2	JHON FREDY DE JESUS BECERRA ARICAPA		
3	CARLOS ARTURO RESTREPO LADINO		
4	ROSEMBERT SANCHEZ		
5	NELSON HERRERA SERNA		
6	JHONY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ		
7	FRANCISCO JAVIER MORALEZ RESTREPO		
8	RUBEN DARIO TREJOS TREJOS		
9			
10			

PROFESIONAL SST

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C: 79052528

FIRMA 

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024

DEPARTAMENTO	**RISARALDA**
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	**31 DE MARZO 2025**
COOPERATIVA	**CENTRO**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
INTERVENTORIA:	**AMV2**

N°	**AREA DE TRABAJO**			**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	UNIDAD SANITARIA	**ORDEN Y ASEO**		
		S	**N**	
1	DISPENSADOR DE JABON	SI		
2	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	SI		
3	DEPOSITO DE RESIDUOS	SI		
4	AGUA PARA EVACUAR DESECHOS	SI		
5	SISTEMA DE ALCANRARILLADO	SI		
6				
7				
8				

REVISÓ:

PROFESIONAL SST:

FIRMA

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO
C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente: 13/03/2025
		Version:001

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS

Cooperativa : CENTRO		**Ciudad :PEREIRA**					
RUTAS :	**50RS01 y 25RSA**						
Fecha de realización del Trabajo desde	**1 DE MARZO 2025**	**Hasta**	**31 DE MARZO 2025**	**Hora de Inicio**	**7:30 a. m.**	**Hora final**	**3:00 p. m.**

Descripción de las tareas que se realizan:

roceria mecanica en las vias a cargo (50RS01 y 25RSA)	instalacion de tachas
limpieza de cunetas	intalacion de defenzaz, señales, mojones, delineadores
despeje de bermas	despeje de señales
barrido mecanico de calzada	vigilacia y recorrido de las vias
realce manual	atencion de emergencias
desmonte mecanico de talues	poda y corte de arboles
limieza de obras sumideros y regillas	retiro de derrumbes
bacheo	recoleccion de basuras
lavado de defensas, señales , mojones, delineadores	limpieza de sanjas de coronacion

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA : N/A	ESPACIO CONFINADO: SI	CALIENTE : N/A




EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Eqipos y herramientas utilizadas	***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	***Estado de Herramientas /Equipos (B/M)***	***obcervasiones***
Manuales	palas,machete,carreta,palin,cepillos, picas,barra, rastrillo, pala draga,martillo, alicate,	bueno	
Hidráulicas	fumigadora , bonba de agua	bueno	
maquinaria :	guadañas, motocieras, sopladora, podadora	bueno	
equipo de prevencion	conos de prevencion, mamparas,cinta de prevencion ect.	bueno	
vehiculos :	carro y moto	bueno	

ANALISIS DE LA TAREA (*Describa detalladamente cada respuesta)*

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A					
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A					
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A					
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A					
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N/A					
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	N/A					
¿Cuántos trabajadores se requieren?	N/A					
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	N/A					
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A					
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A					
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A					

Pasos detallados de la tarea	Peligros e Impactos Ambientales existentes y potenciales	Riesgo	Consecuencias	Controles Requeridos
roceria mecanica	cortes y heridas, procheccion de particulas, espocicion al ruido y vibraciones, decidratacion	mecanico, ficico , hergonomico y ambieltal	Muerte,perdida de algun miembro del cuerpo lecciones osteomuscular	sertificacion y capacitacion en manejo de equipos el uso de los epp señalizacion suprvion del trabajo deligensamiento de ats
recorido alas vias a cargo	accidente,riesgo de robo espocicion climaticas	riesgo ficico mecanico y humano micro sueño	muerte lecciones en cuerpo acotamiento insolacion	uso de epp, uso de bloqueador solar respetar las normas de seguridad vial, diligensamiento de ats
poda y corte de arboles	caida de altura, caida de odjetos, fatica y sobre esfurzo, espocion a condiciones climaticas, proyeccion de particulas	mecanico, ficico , hergonomico y ambieltal	Muerte,perdida de algun miembro del cuerpo lecciones osteomuscular	uso de equipos de altura, demarcacion y señalisacion del aea de trabajo, pausas activas,hidratacion, uso de bloqueador solar, y uso de epp
limpieza de cunetas, de bermas,y de obras	Resbalones,caidas leves,golpes de calor,picaduras de algun insecto(zancudos,abejas,hormigas etc.), rosadura por la vegetacion	Fisico,biologico, locativo.	Agotammiento,insolacion,raspones,,picaduras,infalmacion,cortes leves,dolor muscular	Usar gorra o pava,usar camisa manga larga, usar siempre botas de seguridad, y epp observar el area de trabajo, usar protector solar, tener una buena postura, e hidratacion
recoleccion de basuras	infecciones, caidas colpes,cortes y laseraciones	Fisico,biologico, mecanico.ergonomico,y quimicos	infeccion respiratoria, infeccion en la piel,virus entoxicacion	uso de epp, uso de tapabocas, capacitaciones en manejo de reciduos, bacunacion,exsamenes periodicos, lavado de manos

No	Nombre y Apellidos de los trabajador	Cedula	Cargo	Firma
1	EDUAR ARBEY BUENO GALEANO	1.089.718.578	MANTENIMIENTO RUTINARIO	
2	JHON FREDY DE JESUS BECERRA ARICAPA	4.538.974	MANTENIMIENTO RUTINARIO	
3	CARLOS ARTURO RESTREPO LADINO	9.892.971	MANTENIMIENTO RUTINARIO	
4	ROSEMBERT SANCHEZ	79.961.082	CORDINADOR DE TRABAJO	
5	NELSON HERREERA SERNA	4.456.963	MANTENIMIENTO RUTINARIO	
6	JHONY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ	1.088.255.117	MANTENIMIENTO RUTINARIO	
7	FRANCISCO JAVIER MORALEZ RESTREPO	10.019.206	MANTENIMIENTO RUTINARIO	
8	RUBEN DARIO TREJOS TREJOS	10030 172	MANTENIMIENTO RUTINARIO	
9				
10				




Nombre y Apellido de la persona (inspeccion AREA SST)	**Eliud Murillo Ocampo**
Firma	

Nota : Emisor y Autoridad de Area Hemos verificado en el sitio de trabajo junto al Ejecutor la implementación al 100% de los controles existentes y adicionales para eliminar o minimizar los peligros y los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-026
		Versión: 1
		Vigencia 10/03/2025

INSPECCIÓN REALIZADA POR

Nombre Responsable SST	Responsable de la inspeccion	cooperativa
eliud murillo	rosembert sanchez	centro

Marcar los elementos de Protección Personal que el trabajador está utilizando, verificando su uso y el estado del EPP (Cumple: C; No Cumple: NC Bueno: B, Malo: M)			CABEZA		ROSTRO		CUERPO						FECHA INSPECCIÓN
			Casco y barbuquejo	Gorra o pava	Gafas de Seguridad (Lente Oscuro)	Careta y tapaoidos de insercion	Guantes de Vaqueta	Botas de seguridad en caucho	Camisa manga larga con reflectivo	Pantalón con reflectivo	Polainas, delantal de carnaza	Botas de seguridad	31 DE MARZO 2025
NOMBRE	**CC**	**EVALUACIÓN**											**FIRMA COLABORADOR**
EDUAR ARBEY BUENO G	1.089.718.578	Estado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
JHON FREDY DE JESUS B.A	4.538.974	Estado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
CARLOS ARTURO R.L	9.892.971	Estado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
ROSEMBERT SANCHEZ	79.961.082	Estado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
NELSON HERRERA .S	4.456.963	Estado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
FRANCISCO JAVIER.M.R	10.019.206	Estado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
RUBEN DARIO TREJOS T	10.030.172	Estado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
JHONY ALEJANDRO DIAZ .B	1088255117	Estado	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		VERSION 1
	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN Y CAMILLA		Fecha: 25/03/2025
COOPERATIVA	CENTRO	FECHA	28 DE MARZO 2025

PARAMETRO	CANT. EXISTENTE	CANT. REQUERIDA	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
			B	R	M		
Señalización botiquín	SI	SI	B				N/A
Maletín botiquín	SI	SI	B				N/A
Manual de primeros auxilios	SI	SI	B				N/A
Yodopovidona	SI	SI	B				15/12/2025
Solución salina 250 cc ó 500 cc	SI	SI	B				20/08/2025
Alcohol antiséptico	SI	SI	B				30712/2025
Gasas estériles Paquete por 3 unds	SI	3	B				15/01/2026
Adhesivo micropore	SI	1	B				01/02/2026
Esparadrapo de tela	SI	1	B				N/A
Venditas (tipo cura)	SI	5	B				15702/2026
Venda de algodón 3 x 5 yardas	SI	1	B				25/02/2026
Tijeras punta roma	SI	1	B				N/A
Baja lenguas	SI	6	B				30/11/2025
Guantes de látex	SI	5	B				N/A
Mascarilla desechable (Tapa bocas)	SI	5	B				N/A
Gafas de seguridad	SI	1	B				N/A
Termómetro digital	SI	1	B				N/A
Linterna pequeña (con baterías)	SI	1	B				N/A
Pito	SI	1	B				N/A
Camilla plástica polietileno con araña	SI	1	B				N/A
Collar cervical adulto	SI	1	B				N/A
NOMBRE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN	ROSEMBERT SANCHEZ						

	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CENTRO	VIGENCIA 25 DE MARZO DE 2025
	FORMATO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	VERSION 1

DEPARTAMENTO:	**RISARALDA**
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	**DEL 1 DE MAZO HASTA -EL 31 DE MARZO 2025**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**
SUPERVISION ASIGNADA	**AMV2**

N°	**AREA DE TRABAJO**					
	INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS	**ROTULO**		**FICHA TECNICA**		**FECHA DE INSPECCION**
		SI	**NO**	**SI**	**NO**	
1	GASOLINA	X		X		08/03/2025
2	ACEITE	X		X		08/03/2025
3	ACPM	X		X		8703/2025
4	DISOLVENTE	X		X		08/03/2025
5	PINTURAS	X		X		08/03/2025
6	PINTURA EN FRIO	X		X		08/03/2025
7	ASFALTO EN FRIO	X		X		08/03/2025
8	GRASA	X		X		08/03/2025
9						
10						
11						
12						

PROFESIONAL SST:

FIRMA 

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C.: 79052528

Paciente: JONNY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ
Documento: 1088255117

Ahora consulta tu resultado en línea

Conserva este instructivo: tu médico lo necesitará para ver tu resultado.

Desde tu celular.





1. Escanéa este código QR o haz clic en el enlace que te enviamos por mensaje de texto.
2. Ingresa el número de teléfono que diste en recepción el día del examen.
3. En pantalla podrás ver tus imágenes.

CC 314-601-7478

Desde un computador y para médicos.



1. Entra a **https://sanpedro.qpasa.com.co**
2. Escribe en orden estas tres palabras:

jaguar - javier - haber

3. Ingresa el número de teléfono que diste en recepción el día del examen.
4. En pantalla podrás ver el resultado.

LOS RESULTADOS DE EXAMENES DE IMAGENES DIAGNOSTICAS(RADIOGRAFIAS) COSNTA DE 2 PARTES, A) LAS IMAGENES Y B) LA LECTURA O INFORME, LAS IMAGENES LAS TENDRAS POCOS MINUTOS DESPUES DE SALIR DEL EXAMEN Y LA LECTURA ENTRE 8 Y 10 DIAS. SI TIENES PROBLEMAS PARA VER SUS RESULTADOS COMUNIQUESE AL TELEFONO 3175744169 O AL CORREO sistemas@ese-lavirginia-risaralda.gov.co TENDRA RESPUESTA MAXIMO EN 1 DÍA HABIL. PUEDE DESCARGAS LAS IMAGENES Y RESULTADOS DESDE ESTA PLATA FORMA DURANTE MESES. ENTREGUE ESTA INFORMACION A SU MEDICO, PARA TENGA ACCESO A SUS EXAMENES...ESTOS ESTARÁN DISPONIBLES DURANTE 6 MESES.

Powered by CamScanner

ORDEN DE MEDICAMENTOS

ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA
Nit. 891401643
Dir. Calle 13 No 11-49 B Balsillas - Tel. 3682014

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 31/03/2025 07:00:56p.m. Lugar y Fecha: LA VIRGINIA, RISARALDA 31/03/2025 07:00:56p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1088255117 JONNY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ
Administradora: LA EQUIDAD ARP Convenio: COTROSI2013ARP Tipo de Usuario: SOAT Y ARP
No Historia: 1088255117 Orden N°: 2769422

R/.

Código: N02BE71 **Medicamento:** ACETAMINOFEN 325 MG + HIDROCODONA 5 MG
CUM: **Invima:** **Medida:** UNIDAD **Concentración:** 330 MG **Via Administración:** Oral
Cantidad: 20 (VEINTE) **Forma Farmaceutica:** TABLETA **Cantidad Entregada:**
Dosis y Frecuencia de Administración: TOMAR 1 CDA 12H
Periodo Duración Tratamiento: 10 Días

Código: M01AN002141 **Medicamento:** NAPROXENO TAB O CAP250 MG
CUM:17145-18 **Invima:**2015M- 002839 -R2 **Medida:** UNIDAD **Concentración:** 250 MG **Via Administración:** Oral
Cantidad: 20 (VEINTE) **Forma Farmaceutica:** TABLETA **Cantidad Entregada:**
Dosis y Frecuencia de Administración: TOMAR 1 TABLETA CADA 8 HORAS .(ENCIMA DE DESAYUNO* ALMUERZO Y DE COMIDA)
Periodo Duración Tratamiento: 7 Días

Indicaciones a juicio del Prescriptor:

DX Principal: S400

Tipo de DX Principal: 2 CONFIRMADO NUEVO

DR. MOSQUERA MOSQUERA CARLOS WILLIAM
CC 80767719 Registro. 80767719
Especialidad: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Vigencia de la Orden: Vigente por 72 Horas

Powered by CamScanner

Paciente: 1088255117 JONNY ALEJANDRO DIAZ Usuario: JOSE BEDOYA Fecha Impresión: 31/03/2025 19:42 Pagina N°:

ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO

ORDEN DE CONSULTAS O INTERCONSULTAS
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA
Nit. 891401643
Dir. Calle 13 No 11-49 B Balsillas - Tel. 3682014

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 31/03/2025 07:00:56p.m.
Lugar y Fecha: LA VIRGINIA, RISARALDA 31/03/2025 07:00:56p.m.
Documento y Nombre del Paciente: Paciente: 1088255117 JONNY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ
Administradora: LA EQUIDAD ARP **Convenio:** COTROSI2013ARP **Tipo de Usuario:**SOAT Y ARP
No Historia: 1088255117 **Orden N°:** 2769423

- Procedimiento: 890380 - CONSULTA DE CONTROL POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOG
Especialidad: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA **Indicaciones:** CONTROL EN 1 MES

DX Principal: S400
Tipo de DX Principal: 2 CONFIRMADO NUEVO

DR. MOSQUERA MOSQUERA CARLOS WILLIAM
CC 80767719
Especialidad. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro. 80767719

Powered by CamScanner

CC 1088255117 JONNY ALEJANDRO DIAZ Usuario: JOSE BEDOYA Fecha Impresión: 31/03/2025 19:42 Pagina N°: 1

ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO

ORDEN DE PROCEDIMIENTOS O SERVICIOS
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA
Nit. 891401643
Dir. Calle 13 No 11-49 B Balsillas - Tel. 3682014

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 31/03/2025 07:00:56p.m.
Lugar y Fecha: LA VIRGINIA, RISARALDA 31/03/2025 07:00:56p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1088255117 JONNY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ
Administradora: LA EQUIDAD ARP **Convenio:** COTROSI2013ARP **Tipo de Usuario:**SOAT Y ARP
No Historia: 1088255117 **Orden N°:** 2769424

- **Procedimiento:** 931001 - TERAPIA FISICA INTEGRAL
Cantidad: 10.00 **Indicaciones:** SEDATVIA EN BRAZO Y CODO IZQUIERDO

DX Principal: S400
Tipo de DX Principal: 2 CONFIRMADO NUEVO

DR. MOSQUERA MOSQUERA CARLOS WILLIAM
CC 80767719
Especialidad. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro. 80767719

Powered by CamScanner

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA

Nit. 891401643 - IPS: 664000071601

Dir. Calle 13 No 11-49 B Balsillas - Tel. 3682014

Registro de Calidad:
Fecha Historia: 31/03/2025 07:00:56p.m.
Lugar y Fecha: LA VIRGINIA, RISARALDA 31/03/2025 07:00:56p.m.
Documento y Nombre del Paciente: CC 1088255117 JONNY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ
Administradora: LA EQUIDAD ARP **Convenio:** COTROSI2013ARP **Tipo de Usuario:**SOAT Y ARP
No Historia: 1088255117 **Incapacidad N°:** 139,053
Causa Externa: 1 ACCIDENTE DE TRABAJO
Descripción: .

Fecha de Inicio: 31/03/2025
Dias: 10 (DIEZ DIAS)

Fecha de Terminación: 09/04/2025
Prorroga: No

Modalidad de la tecnologia: Intramural
Origen de la Incapacidad: Laboral
Incapacidad Retroactiva: Urgencias o internación del paciente
Grupo de Servicio: Atención Inmediata

DX Principal: S400
Tipo de DX Principal: 2 CONFIRMADO NUEVO



DR. MOSQUERA MOSQUERA CARLOS WILLIAM
CC 80767719
Especialidad. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro. *80767719*

Powered by CamScanner

HISTORIA CLINICA
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA VIRGINIA
Nit. 891401643
Dir. Calle 13 No 11-49 B Balsillas - Tel. 3682014

Código Plantilla:HC ESP1
Fecha Historia:31/03/2025 19:00
Lugar y Fecha:LA VIRGINIA,RISARALDA 31/03/2025 19:00
Documento y Nombre del Paciente: CC 1088255117 JONNY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ
Administradora: LA EQUIDAD ARP Convenio: COTROSI2013ARP Tipo de Usuario: SOAT Y ARP
No Historia: 1088255117 Cons. Historia: 4131521
Atención: Urgencias

FORMATO
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA:

FORMATO
INGRESO DEL USUARIO
Historia: 1088255117
Nombre: JONNY ALEJANDRO DIAZ BERMUDEZ
Direccion: VARIANTE LA CONDINA PEREIRA
Telefono: 3146017478
Estado Civil: Soltero
Sexo: Masculino
Edad: *38 Años*
E.A.P.B.: NUEVA EPS S.A
Natural de: *RISARALDA*
DATOS DE CONSULTA
Fecha: 31/03/2025
Hora: 18:56
Datos Generales
Enfermedad Actual: PACIENTE MASCULINO DE 38 AÑOS DE EDAD SIN ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA ASISTE EN EL CONTEXTTO DE ACCIDENTE LABORAL A LAS 13+05 DEL DIA DE HOY MIENTRAS TRABAJA PARA COOPERTATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CENTRO, EN AREA MANTENIMIENTO RUTINARIO REFIERE QUE CORTABA LAS RAMAS DE UN ARBOL Y ESTE AL CAER GENERA TRAUMATISMO CONTUSO A NIVEL DEL BRAZO IZQUIERDO Y PIERNA IZQUIERDA CON POSTERIOR DOLOR EDEMA Y LIMITACION FUNCIONAL RAZON POR LA CUAL ASISTE, NIEGA OTROS SINTOMAS ASOCIADOS
Motivo de la Consulta: TRAUMA EN BRAZO IZQ

ANTECEDENTES PERSONALES
ANTECEDENTES PATOLOGICOS
Alergico Patologio: NO
Asma Bronquial Patologico: NO
Cancer Patologico: NO
Diabetes Mellitus Patologico: NO
Enfermedad Coronaria Patologico: NO
Epilepsia Patologico: NO
Hipertension Arterial Patologico: NO
Siquiatrico Patologico: NO
Tuberculosis Patologico: NO
Quirurgico Patologico: NO
Otros: -
ANTECEDENTES FAMILIARES
Alergico Familiar: NO
Asma Bronquial Familiar: NO
Cancer Familiar: NO
Diabetes Mellitus Familiar: NO
Enfermedad Coronaria Familiar: NO
Epilepsia Familiar: NO
Hipertension Arterial Familiar: NO
Siquiatrico Familiar: NO
Tuberculosis Familiar: NO
Quirurgico Familiar: NO
Otros Familiares: -
ANTECEDENTES SOCIOCULTURALES
Licor: NO
Ejercicio: NO
Tabaquismo: NO
Otros Socioculturales: -

EXAMEN FISICO DEL USUARIO
Estado General
Describir lo anormal: BRZO IZQ CON EDEA EN TERCIO MEDIO Y DISTAL CON FLEXO EXTESNION DE CODO DOLOROSA RX DE HUEMOR Y CODO NO EVIDENCIO FRACTURAS
DIAGNOSTICO
Dx. Principal: S400-CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO
Tipo de Diagnostico Principal: 2 CONFIRMADO NUEVO
Causa Externa: 1 ACCIDENTE DE TRABAJO
Finalidad de la Consulta: 10 NO APLICA
PRIMER NIVEL
Se contra remite a primer nivel: NO
Plan de manejo en primer nivel: -
SEGUNDO NIVEL

Se remite a tercer nivel: NO

Motivo de remision.: -

PLan de Manejo

Observaciones: PACINETE CON CUADRO DE TRAUMA EN BRAZO IZQ SE DESCARTA FRACTRUA
REQUIERE DE MANJO CON MEDIOS FISICOS Y TERAPIA FISICA
INCAPACIDAD 10 DIAS
ANALGESICOS



DR. MOSQUERA MOSQUERA CARLOS WILLIAM
CC 80767719
Especialidad. ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
Registro. 80767719

Powered by CamScanner

ANEXOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALTAGRACIA

ANEXO 15- LISTA DE CHEQUEO SGSST

FORMATO SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Informe de obra Nº:	2	Período	DEL 01/03/2025	Al	31/03/2025
Tipo de Informe SST:		MENSUAL			
Fecha de Inspección:		31 de marzo del 2025			
Nombre del Proyecto:		Administracion vial 2			
Contrato de obra No.		1453			
Departamento:		RISARALDA			
Municipio:		DOSQUEBRADAS			
Nombre del Contratante de Obra:		INVIAS			
Nombre Contratista de Obra:		COOPERATIVA ASOCIADA ALTAGRACIA			
Residente AMV2:		JAEL MORIANO			
Plazo de ejecución:		2 AÑOS			
Nombre de la persona que realiza la inspección:		YULIANA REYES			
Cargo de la persona que realiza la inspección:		INSPECTOR SST			

	Característica a Inspeccionar	SE IMPLEMENTO 1-0	OBSERVACIONES	ACCIONES A IMPLEMENTAR
A)	**EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST**			
1	Listado de equipo, vehiculo	1		
2	Tarjeta de propiedad, SOAT, tecnomecanica, licencia de conducción	1		
3	Del equipo, caracteristicas, motor y serial del mismo	1		
4	Se alquila baños portatiles? Se arrenda una casa?	0		
5	Listado de personal obra, numero de cedula	1		
6	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social: ARL, EPS y AFP?.	1		
7	Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago efectuado.	1		
8	Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?.	1		
9	Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?	1		
10	Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?	1		
11	Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud en el trabajo? Se encuentran las evidencias y constancia escrita y firmada por los trabajadores	1	Pausas activas charlas de 5 minutos capacitaciones mensuales	
12	Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?	1		
14	El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?	1		
15	El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado?	1		
16	Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso?	1		
17	El personal de obra utiliza los elementos de protección personal?	1		
18	Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias especifico para el proyecto? Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas.	1		
19	Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de pacientes, inmovilizadores de cuello	1		
20	Se tiene publicado el MEDEVAC en los frentes de obra?. El personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado?	1		
21	Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos identificados en obra?.	1		
22	Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?	0	programar simulacro de emergencia	
23	Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el proyecto? Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación?	1		
24	Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial. Se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos	1		
25	Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1		
26	Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores?	1		
27	Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas . Son socializadas con el personal involucrado en su manejo?.	1	Realizar fichas de seguridad paa todas las sustancias quimicas	
28	Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?	0	Pendiente realizar rotulacion de las sustancias quimicas	
29	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?.	0		
30	Se realizan simulacros de emergencia?.	1		
31	Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados?		NA	solo si realiza dicha actividad
32	El personal presenta curso de alturas/espacios confinados para trabajos de alto riesgo?		NA	se anexa ATS en caso de realizar dichas actividades
33	El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley?.	1		
34	Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos?	1		
35	Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el proyecto?	1		
36	Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa?	1		
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST		29		
TOTAL VALORACIÓN SST		**81%**	**DE**	**100%**

Se tiene nivel de implementación de SST acorde a:

100%	Cumple
< 80%	Cumple parcialmente y mejoramiento
50%	Aplicar mejoramiento
> 10	No cumple

Observaciones:

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Nº	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI/NO	OBSERVACIÓN
1					
2					

PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN
NOMBRE: YULIANA REYES
CARGO: INSPECTOR SST ADMV2

ANEXO 16- PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA ALTAGRACIA

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816002975	5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALTAGRACIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	MANZANA 5 CASA 15 BARRIO LCUBA	3113157707	COOTRALTAGRACIA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33055188	E	2025-04-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.687.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	33055188	2025-04-16	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 4379598	GIL WILLIAM DE JESUS	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	383.900	S	5813001
2	CC 9920147	RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	383.900	S	5813001
3	CC 10006723	MARIN TORO LUIS HERNANDO	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	383.900	S	5813001
4	CC 10021750	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SOS-EPS-EPS018	1.423.500	57.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	383.900	S	5813001
5	CC 10022455	CARDONA CASTRILLON LUIS FERNANDO	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	383.900	S	5813001
6	CC 10023047	ALZATE VALENCIA LUIS FERNANDO	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	383.900	S	5813001
7	CC 10144258	BUITRAGO MORALES DANIEL	1.423.500																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	383.900	S	5813001

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816002975	5	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ALTAGRACIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	MANZANA 5 CASA 15 BARRIO LCUBA		3113157707			COOTRALTAGRACIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33055188	E	2025-04-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.687.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	33055188	2025-04-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.964.500	9.964.500	9.964.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				7	1.594.600	0	0	0	1.594.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.594.600	0	0	0	1.594.600
EPS(Administradoras: 4)				7	399.000	0	0	0	399.000
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	57.000	0	0	0	57.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	228.000	0	0	0	228.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ARP(Administradoras: 1)				7	693.700	0	0	0	693.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	693.700	0	0	0	693.700
Gran Total					2.687.300	0	0	0	2.687.300

SEGURO DE MODULAR SEGUROS DE PERSONAS

MERCADO EMPRESARIAL FAMILIAR

Tomador: COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ALTAGRACIA | NIT/CC: 816.002.975-5 | Número Póliza: 4000538 | Certificado de: EXPEDICION

Centro de Costo: 1 - COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ALTAGRACIA | Anexo: 0 | Sucursal: PEREIRA

Item	Asegurado		Parentesco	Tipo Mov	Período de Cobro	SUMAS ASEGURADAS								Prima Total
						VIDA GRUPO					ACCIDENTES PERSONALES			
	Nro Documento	Nombre				Vida	Incapacidad	Enf. Graves	Renta Hogar	Exequias	Básico Accidentes	Renta Hogar	Renta Diaria	
6-0	CC-1088323556	CRISTIAN FERNANDO CARDONA TABAR	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 28.265
													Subtotal Item 6	$ 28.265
2-0	CC-10144258	DANIEL BUITRAGO MORALES	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 28.265
2-1	TI-1090050177	LUIS FERNANDO BUITRAGO LOAIZA	HIJO (A)	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.777
2-2	CC-1088252731	LORENA LOAIZA LEON	CONYUGE	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 28.265
													Subtotal Item 2	$ 63.308
8-0	CC-1225090972	JHON ERIC CARDONA TABARES	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 28.265
													Subtotal Item 8	$ 28.265
10-0	CC-1088318641	JHON JAIRO PARRA ESCOBAR	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 22.671
													Subtotal Item 10	$ 22.671
9-0	CC-42136555	LEICY NEWMAN LOPEZ MONTOYA	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 22.671
													Subtotal Item 9	$ 22.671
4-0	CC-10023047	LUIS FERNANDO ALZATE VALENCIA	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 6.600.000	$ 6.600.000	$ 0	$ 66.000	$ 0	$ 3.300.000	$ 66.000	$ 0	$ 3.952
													Subtotal Item 4	$ 3.952
3-0	CC-10022455	LUIS FERNANDO CARDONA	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 28.265
3-1	CC-42112874	ROSA MILENA TABAREZ	CONYUGE	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 25.000.000	$ 500.000	$ 0	$ 28.265
													Subtotal Item 3	$ 56.531
7-0	CC-10006723	LUIS HERNANDO MARIN TORO	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 22.671
7-1	CC-40732197	LUZ ADRIANA GUTIERREZ ARAGONEZ	CONYUGE	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 22.671
													Subtotal Item 7	$ 45.343
1-0	CC-10021750	MARCO ANTONIO MEJIA MARIN	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 22.671
1-1	RC-1090050320	MARCO MEJIA VELASQUEZ	HIJO (A)	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.422
1-2	RC-1090050516	ANTONIO MEJIA VELASQUEZ	HIJO (A)	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.422
1-3	SI-10021750001	ISABELA MEJIA VELASQUEZ	HIJO (A)	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.422
1-4	RC-1089632681	LUCIANA MEJIA GUEVARA	HIJO (A)	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.422
													Subtotal Item 1	$ 44.359
5-0	CC-4379598	WILLIAM DE JESUS GIL	ASEGURADO PR	ALT	01/03/2025-01/04/2025	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 10.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 10.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 11.484
													Subtotal Item 5	$ 11.484
													Total para 1 - COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ALTAGRACIA	**$ 326.850**

Total de primas asegurados sin modificar	$ 0
Total de primas por inclusión de asegurados	$ 326.850
Total de primas por modificaciones de asegurados	$ 0
Total de primas por exclusiones de asegurados	$ 0
Total facturado	$ 326.849,88

(*) VER EXCLUSIONES Y/O LIMITACIONES EN LA POLIZA

ESTE CUADRO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CARATULA DE LA PÓLIZA

Paga seguro con:

PayU

Fecha: 2025-04-03 19:28:07

Tu transacción ha sido aprobada

Número de orden: **3756988266**

Con esta referencia puedes hacer seguimiento a tu transacción en la página de Consulta de Transacciones de PayU o con nuestro equipo de servicio al cliente

Medio de pago

BANCO: **BANCOLOMBIA**
CUS: 1386130218
Dirección IP: 201.236.208.67
Estado : **APROBADA**

Datos de contacto de la tienda

HDI SEGUROS SA
NIT: 8600048756

Dirección: CARRERA 7 # 72-13 PISO 8
Teléfono: 3468888ext9382Directo3198279

Resumen de la compra

Referencia: 0100180554960121
Descripción: END|VID

Total pagado..... $340,971.00

Toda la información se encuentra encriptada para tu privacidad y seguridad © PayU.

ANEXO 17-CONDICIONES DIARIAS DE SALUD COOPERATIVA ASOCIADA ALTAGRACIA

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com



	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENCIA 14 MARZO 2025
	CONDICIONES DIARIAS DE SALUD	VERSION 1

Fecha desde : 1 de marzo de 2025 — **Hasta : 31 de marzo de 2025**

Cooperativa : altagracia

Confirma que ingresa y sale de obra en buenas condiciones

Criterios de calificacion B: bien M: mal

Nombre del trabajador	C.C.	CONDICION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma	Observaciones
WILLIAN DE JESUS GIL	4.379.598	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
LUIS FERNANDO ALZATE	10.023.047	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
LUIS HERNANDO MARIN	10.006.723	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
MARCO ANTONIO MEJIA	10.021.750	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
REINEL DE JESUS RIOS	9.920.147	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
DANIEL BUITRAGO MORALES	10.144.258	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
LUIS FERNANDO CARDONA	10.022.455	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B		
		C.E																																	
		C.S																																	
		C.E																																	
		C.S																																	

Profesional SST

Nombre : Eliud Murillo Ocampo
CC : 79052528
Firma

ANEXO 18-PRE OPERACIONALES MAQUINARIA Y VEHICULO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA ALTAGRACIA

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR GUADAÑA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: ALTAGRACIA	
RUTAS DE TRABAJO : 2902, 29RSA, 29RSB	**TRABAJO/ACTIVIDAD: ROCERIA**
FECHA DE INSPECCION DESDE : 1 DE MARZO DE 2025	**HASTA: 15 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL DE ACTIVIDAD : 8:00 AM	**HORA FINAL DE ACTIVIDAD: 3:30 PM**
N° MOTOR : N/A	**N° SERIE/REFERENCIA: 43R**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Motor	X		
	Encendido	X		
	Sistema antivibración	X		
	Soporte ergonómico	X		
	Acelerador gatillo	X		
	Estructura en tubo	X		
	Protector	X		

3. ACCESORIOS:

	Cuchilla	X		
	Yoyo mecánico	X		
	Nylon	X		
	Yoyo manual	X		
	combutible (gasolina + aceite)	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	NO
	Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
	Careta de malla o acrilico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Delantal en carnasa	X	
	Canilleras	X	
	Bota protectora	X	
	Arnes de sujeción de guadaña	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a númeral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a número 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR GUADAÑA	Versión: 01 Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL




COOPERATIVA DE TRABAJO: ALTAGRACIA	
RUTAS DE TRABAJO : 2902, 29RSA, 29RSB	**TRABAJO/ACTIVIDAD: ROCERIA**
FECHA DE INSPECCION DESDE : 1 DE MARZO DE 2025	**HASTA: 15 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL DE ACTIVIDAD : 8:00 AM	**HORA FINAL DE ACTIVIDAD: 3:30 PM**
N° MOTOR : N/A	**N° SERIE/REFERENCIA: 43R**

2. PRE-OPERACIONAL

9	Roseria del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la roceria	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	GIL WILLIAM DE JESUS	4379598	
2	RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS	9920147	
3	MARIN TORO LUIS HERNANDO	10006723	
4	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO	10021750	
5	CARDONA LUIS FERNANDO	10022455	
6	ALZATE VALENCIA LUIS FERNANDO	10023047	
7	BUITRAGO MORALES DANIEL	10144258	
8			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR GUADAÑA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: ALTAGRACIA	
RUTAS DE TRABAJO : 2902, 29RSA, 29RSB	**TRABAJO/ACTIVIDAD: ROCERIA**
FECHA DE INSPECCION DESDE : 16 DE MARZO DE 2025	**HASTA: 31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL DE ACTIVIDAD : 8:00 AM	**HORA FINAL DE ACTIVIDAD: 3:30 PM**
N° MOTOR : N/A	**N° SERIE/REFERENCIA: 43R**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Motor	X		
	Encendido	X		
	Sistema antivibración	X		
	Soporte ergonómico	X		
	Acelerador gatillo	X		
	Estructura en tubo	X		
	Protector	X		

3. ACCESORIOS:

	Cuchilla	X		
	Yoyo mecánico	X		
	Nylon	X		
	Yoyo manual	X		
	combutible (gasolina + aceite)	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	NO
	Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
	Careta de malla o acrilico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Delantal en carnasa	X	
	Canilleras	X	
	Bota protectora	X	
	Arnes de sujeción de guadaña	X	




5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a númeral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a númeral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales

9	Roseria del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la roceria	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	GIL WILLIAM DE JESUS	4379598	
2	RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS	9920147	
3	MARIN TORO LUIS HERNANDO	10006723	
4	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO	10021750	
5	CARDONA LUIS FERNANDO	10022455	
6	ALZATE VALENCIA LUIS FERNANDO	10023047	
7	BUITRAGO MORALES DANIEL	10144258	
8			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

PREOPERACIONAL SOPLADORA

Versión: 01

Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: ALTAGRACIA		
RUTAS DE TRABAJO	**2902, 29RSA, 29RSB**	**TRABAJO/ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE RESIDUOS LIVIANOS**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**1 DE MARZO DE 2025**	**HASTA: 15 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**8:00 a. m.**	**HORA FINAL ACTIVIDAD: 3:30 PM**
N° MOTOR	**N/A**	**N° SERIE/REFERENCIA: BR600**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Bloqueo del acelerador	X		
	Acelerador	X		
	Palanca del mando indicado	X		
	Carburador	X		
	Pistón	X		
	Filtro de aire	X		
	Empuñadira de arranque	X		
	Bujia	X		
	Cilindro	X		
	Manillar tubular	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI	SE CUENTA PARA LA ACTIVIDAD	
	SI	NO
 Guantes de vaqueta	X	
Careta de malla o acrilico	X	
Tapaoidos	X	
Gafas lente oscuro	X	
Bota protectora	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ROCERIA

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a número 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a número 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
9	Sopladora	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la actividad	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	GIL WILLIAM DE JESUS	4379598	
2	RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS	9920147	
3	MARIN TORO LUIS HERNANDO	10006723	
4	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO	10021750	
5	CARDONA LUIS FERNANDO	10022455	
6	ALZATE VALENCIA LUIS FERNANDO	10023047	
7	BUITRAGO MORALES DANIEL	10144258	
8			
9			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL SOPLADORA	Versión: 01 Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: ALTAGRACIA		
RUTAS DE TRABAJO	**2902, 29RSA, 29RSB**	**TRABAJO/ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE RESIDUOS LIVIANOS**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**16 DE MARZO DE 2025**	**HASTA: 31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**8:00 a. m.**	**HORA FINAL ACTIVIDAD: 3:30 PM**
N° MOTOR	**N/A**	**N° SERIE/REFERENCIA: BR600**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Bloqueo del acelerador	X		
	Acelerador	X		
	Palanca del mando indicado	X		
	Carburador	X		
	Pistón	X		
	Filtro de aire	X		
	Empuñadira de arranque	X		
	Bujia	X		
	Cilindro	X		
	Manillar tubular	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI	SE CUENTA PARA LA ACTIVIDAD	
	SI	NO
 Guantes de vaqueta	X	
Careta de malla o acrilico	X	
Tapaoidos	X	
Gafas lente oscuro	X	
Bota protectora	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ROCERIA

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a númeral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a númeral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
9	Sopladora	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la actividad	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	GIL WILLIAM DE JESUS	4379598	William Gil
2	RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS	9920147	Reinel Rios
3	MARIN TORO LUIS HERNANDO	10006723	Hernando Marin
4	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO	10021750	
5	CARDONA LUIS FERNANDO	10022455	
6	ALZATE VALENCIA LUIS FERNANDO	10023047	
7	BUITRAGO MORALES DANIEL	10144258	
8			
9			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR MOTOSIERRA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL


COOPERATIVA DE TRABAJO: ALTAGRACIA

RUTAS DE TRABAJO	**2902, 29RSA, 29RSB**	**TRABAJO/ACTIVIDAD:**	**CORTE DE MADERA**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**1 DE MARZO DE 2025**	**HASTA**	**31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**8:00 a. m.**	**HORA FINAL ACTIVIDAD:**	**3:30 p. m.**
N° MOTOR	**N/A**	**N° SERIE/REFERENCIA:**	**381R**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Bloqueo del acelerador	X		
	Acelerador	X		
	Palanca del mando indicado	X		
	Carburador	X		
	Pistón	X		
	Filtro de aire	X		
	Empuñadira de arranque	X		
	Bujia	X		
	Cilindro	X		
	Manillar tubular	X		
	Cadena	X		
	Espada	X		
	Dospositivo tensor de la cadena	X		
	Cinta de freno	X		
	Resorte de tracción (freno de cadena)	X		
	Cigüeñal	X		
	Piñon de cadena	X		
	Embragüe	X		
	Filtro de combustible	X		

3. ACCESORIOS:

	Espada	X		
	Cadena	X		
	Lima	X		
	Llave de copa	X		
	combutible (gasolina + aceite)	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI		SI	NO
	Careta de malla o acrilico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Delantal en carnasa	X	
	Bota protectora	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR MOTOSIERRA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL


COOPERATIVA DE TRABAJO: ALTAGRACIA

RUTAS DE TRABAJO	**2902, 29RSA, 29RSB**	**TRABAJO/ACTIVIDAD:**	**CORTE DE MADERA**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**1 DE MARZO DE 2025**	**HASTA**	**31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**8:00 a. m.**	**HORA FINAL ACTIVIDAD:**	**3:30 p. m.**
N° MOTOR	**N/A**	**N° SERIE/REFERENCIA:**	**381R**

3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a númeral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a númeral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales
9	Roseria del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la roceria	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO	10021750	
2	MARIN TORO LUIS HERNANDO	10006723	
3	CARDONA LUIS FERNANDO	10022455	
4			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	


	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE VEHICULO	VERSION 2


Fecha Desde	**1 DE MARZO DE 2025**	**HASTA : 15 DE MARZO DE 2025**	
Placa	**ITN 334**		
Marca	**NISSAN 4X4**		
Modelo	**1993**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (21) mes (02) año (2026)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(03) Mes (03) Año (2026)**		
Área de trabajo	**2902, 29RSA, 29RSB**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**														
ESTADO GENERAL	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
ENCENDIDO DE MOTOR					B		B								
CARROCERÍA					B		B								
LLANTAS Y RINES					B		B								
LUCES DE PARQUEO Y DIRECCIONALES					B		B								
LUCES DELANTERAS Y TRASERAS					B		B								
LIMPIABRISAS					B		B								
PITO PRINCIPAL					B		B								
COJINERÍA					B		B								
ESPEJOS					B		B								
VELOCIMETRO					B		B								
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD					B		B								
CINTURONES DE SEGURIDAD					B		B								
CONOS REFLECTIVOS , TACOS Y CHALECO					B		B								
BOTIQUIN, LINTERNA, EXTINTOR					B		B								
HERRAMIENTAS BÁSICAS					B		B								
GATO, PLANCA, CRUCETA					B		B								
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS					B		B								
LLANTA DE REPUESTO					B		B								
SISTEMA DE FRENOS					B		B								
PRINCIPAL Y DE EMERGENCIA					B		B								
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS					B		B								
INSPECCIÓN INTERNA					B		B								
ACEITE DE MOTOR Y LUBRICACION					B		B								
RADIADOR Y FILTROS					B		B								
VENTILADOR, CORREAS,MANGUERAS					B		B								
CABLES ELÉCTRICOS					B		B								
BATERIA					B		B								

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA** 

TRABAJADORES RESPONSABLES		
NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**FIRMA**
RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS	9920147	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE VEHICULO	VERSION 2

Fecha desde	**16 DE MARZO de 2025**	**Hasta : 31 de marzo de 2025**	
Placa	**ITN 334**		
Marca	**NISSAN 4X4**		
Modelo	**1993**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (21) mes (02) año (2026)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(03) Mes (03) Año (2026)**		
Área de trabajo	**2902, 29RSA, 29RSB**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**															
ESTADO GENERAL	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
ENCENDIDO DE MOTOR												B				
CARROCERÍA												B				
LLANTAS Y RINES												B				
LUCES DE PARQUEO Y DIRECCIONALES												B				
LUCES DELANTERAS Y TRASERAS												B				
LIMPIABRISAS												B				
PITO PRINCIPAL												B				
COJINERÍA												B				
ESPEJOS												B				
VELOCIMETRO												B				
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD												B				
CINTURONES DE SEGURIDAD												B				
CONOS REFLECTIVOS , TACOS Y CHALECO												B				
BOTIQUIN, LINTERNA, EXTINTOR												B				
HERRAMIENTAS BÁSICAS												B				
GATO, PALANCA, CRUCETA												B				
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS												B				
LLANTA DE REPUESTO												B				
SISTEMA DE FRENOS												B				
PRINCIPAL Y DE EMERGENCIA												B				
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS												B				
INSPECCIÓN INTERNA												B				
ACEITE DE MOTOR Y LUBRICACION												B				
RADIADOR Y FILTROS												B				
VENTILADOR , CORREAS , MANGUERAS												B				
CABLES ELÉCTRICOS												B				
BATERIA												B				

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA:**

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS	9920147	Reinel Rios

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE MOTO	VERSION 2

Fecha desde	**1 de marzo de 2025**	**Hasta: 15 de marzo de 2025**	
Placa	**SXH06**		
Marca	**AUTECO**		
Modelo	**2014**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (28) mes (09) año (2025)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(28) Mes (09) Año (2025)**		
Área de trabajo	**2902, 29RSA, 29RSB**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**														
VERIFICACION DE DOCUMENTOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
LIENCIA, SEGURO, TECNOMECANICA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
VERIFICACION MOTOCICLETA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NIVEL DE ACEITE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESTADO DE LUCES EN GENERAL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
REPOSAPIES Y MANIGUETAS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CHASIS Y SILLIN	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SUSPENSION (AMORTIGUADORES)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
LLANTAS Y RINES	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TABLERO-VELOCIMETRO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
PITO Y ESPEJOS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EPP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CASCO, CHALECO E IMPERMEABLE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA**

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**FIRMA**
LUIS FERNANDO CARDONA	10022455	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE MOTO	VERSION 2

Fecha	**16 DE MARZO DE 2025**	**HASTA: 31 DE MARZO DE 2025**	
Placa	**SXH06**		
Marca	**AUTECO**		
Modelo	**2014**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (28) mes (09) año (2025)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Día(28) Mes (09) Año (2025)**		
Área de trabajo	**2902, 29RSA, 29RSB**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**															
VERIFICACION DE DOCUMENTOS	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
LIENCIA, SEGURO, TECNOMECANICA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
VERIFICACION MOTOCICLETA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NIVEL DE ACEITE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESTADO DE LUCES EN GENERAL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
REPOSAPIES Y MANIGUETAS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CHASIS Y SILLIN	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SUSPENSION (AMORTIGUADORES)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
LLANTAS Y RINES	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TABLERO-VELOCIMETRO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
PITO Y ESPEJOS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EPP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CASCO, CHALECO E IMPERMEABLE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA**

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**FIRMA**
LUIS FERNANDO CARDONA	10022455	

ANEXO 19- SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN SGSST COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA ALTAGRACIA

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024
DEPARTAMENTO	PEREIRA - RISARALDA	
COOPERATIVA	ALTAGRACIA	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	31 DE MARZO DE 2025	
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS	
INTERVENTORIA:	AMV2	

LISTA EQUIPO/MAQUINARIA/VEHICULO

N°	EQUIPO	INFORMACION GENERAL							CUENTA CON PREOPERACIONAL SI/NO	OBSERVACIONES
		MARCA	REFERENCIA	SERIAL/PLACA	CAPACIDAD	SOAT	TECNOMECANICA	KIT ANTIDERRAMES		
1	GUADAÑAS	HUSGVARNA	43R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	
2	SOPLADORA	STHIL	BR600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	
3	MOTOSIERRA	STHIL	381R	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	
4	MOTO	AUTECO	PULSAR	SXH06	200CMC	SI	SI	N/A	SI	
5	VEHICULO	NISSAN	4X4	ITN334	1800	SI	SI	N/A	SI	
6										
7										

REVISÓ:

PROFESIONAL SST:

FIRMA 

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024

DEPARTAMENTO	PEREIRA - RISARALDA
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	31 DE MARZO DE 2025
COOPERATIVA	ALTAGRACIA
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS
INTERVENTORIA:	AMV2

N°	AREA DE TRABAJO			REGISTRO FOTOGRAFICO
	UNIDAD SANITARIA	ORDEN Y ASEO		
		S	N	
1	DISPENSADOR DE JABON	X		
2	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	X		
3	DEPOSITO DE RESIDUOS	X		
4	AGUA PARA EVACUAR DESECHOS	X		
5	SISTEMA DE ALCANRARILLADO	X		
6				
7				
8				

REVISÓ:

PROFESIONAL SST:



FIRMA

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO
C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1 VIGENTE 28/05/2024
DEPARTAMENTO:	PEREIRA - RISARALDA	
FECHA DILIGENCIAMIENTO	31 DE MARZO DE 2025	
COOPERATIVA	ALTAGRACIA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS	
INTERVENTORIA:	AMV2	

INFORMACIÓN DEL PERSONAL PARA EVACUACIÓN MÉDICA (MEDEVAC)

AVISO DE PRIVACIDAD: "Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada, que declaro conocer y estar informado de los canales de atención consignados en la misma a los que podré dirigirme para el ejercicio de mis derechos. Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento".

N°	DATOS DEL TRABAJADOR							DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO			FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	CC	N° CELULAR	GRUPO SANGUINEO	ENTIDAD A LA CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO			NOMBRE	DIRECCION	CELULAR	
					SALUD	PENSION	ARL				
1	GIL WILLIAM DE JESUS	4.379.598	3108410159	O+	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA	VIVIANA GIL	ALTAGRACIA	3108410159	
2	RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS	9.920.147	3117930584	A+	SANITAS	COLPENSION	POSITIVA	MARIBEL PINO	DOSQUEBRADAS	3143228845	
3	MARIN TORO LUIS HERNANDO	10.006.723	3113791572	0+	NUEVA EPS	COLPENSION	POSITIVA	ALFREDO MARIN	PARQUE INDUSTRIAL	3116535486	
4	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO	10.021.750	3234851424	O+	SOS	COLPENSION	POSITIVA	PAULA GUEVARA	ALTAGRACIA	3232108100	
5	CARDONA LUIS FERNANDO	10.022.455	3113157707	O+	SALUD TOTAL	COLPENSION	POSITIVA	ROSA MILENA TABARES	CUBA	3126451487	
6	ALZATE VALENCIA LUIS FERNANDO	10.023.047	3105363396	O+	SALUD TOTAL	COLPENSION	POSITIVA	MARIA DEL CARMEN VALENCIA	CUBA	3207427226	
7	BUITRAGO MORALES DANIEL	10.144.258	3018546243	A+	SALUD TOTAL	COLPENSION	POSITIVA	LORENA LOAIZA LEON	ALTAGRACIA	3006154160	
8											
9											

REVISÓ: **PROFESIONAL SST:**

FIRMA 

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO



C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

DEPARTAMENTO:	PEREIRA-RISARALDA
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	1 DE MARZO DE 2025 - HASTA 15 DE MARZO DE 2025
COOPERATIVA	ALTAGRACIA
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS
INTERVENTORIA	AMV2

CAPACITACIONES SST - CHARLAS DE 5 MINUTOS

TEMA CAPACITACION:	HORA INICIO:	8:00	HORA FIN:	8:30

N°	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
1	GIL WILLIAM DE JESUS		
2	RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS		
3	MARIN TORO LUIS HERNANDO		
4	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO		
5	CARDONA LUIS FERNANDO		
6	ALZATE VALENCIA LUIS FERNANDO		
7	BUITRAGO MORALES DANIEL		
8			

PROFESIONAL SST

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO



C.C: 79052528

FIRMA 

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
DEPARTAMENTO:	PEREIRA-RISARALDA	
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	16 DE MARZO DE 2025 - HASTA 31 DE MARZO DE 2025	
COOPERATIVA	ALTAGRACIA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS	
INTERVENTORIA	AMV2	

CAPACITACIONES SST - CHARLAS DE 5 MINUTOS

TEMA CAPACITACION:	HORA INICIO:	8:00	HORA FIN:	8:30

Nº	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
1	GIL WILLIAM DE JESUS		
2	RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS		
3	MARIN TORO LUIS HERNANDO		
4	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO		
5	CARDONA LUIS FERNANDO		
6	ALZATE VALENCIA LUIS FERNANDO		
7	BUITRAGO MORALES DANIEL		
8			

PROFESIONAL SST

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C: 7905[illegible]

FIRMA 

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente: 13/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Version:001

Cooperativa : Altagracia		**Ciudad: Pereira**					
Rutas:	**2902, 29RSA, 29RSB**						
Fecha de realización del Trabajo desde	**1 DE MARZO DE 2025**	**Hasta**	**31 DE MARZO DE 2025**	**Hora de Inicio**	**8:00 a. m.**	**Hora final**	**3:30 p. m.**

Descripción de las tareas que se realizan:	
Roceria mecanica sobre las vias a cargo	Atencion de emergencias
Limpieza de cuneta	Bacheo
Limpieza de señales verticales	Poda y corta de arboles
Realce de talu manual y mecanico	Retiro de derrumbes
Limpieza de bordillo, cuneta, bermas	Recoleccion de basura
instalacion de señalizacion	
Despeje de señales	
Trabajo en pintura	
Recorrido a las vias	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:		
Trabajo en ealtura: N/A	Espacio confinado : SI	Trabajo en caliente: N/A



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Eqipos y herramientas utilizadas	***Indique cada una de las herramientas a utilizar.***	***Estado de Herramientas /Equipos (B/M)***	***Observaciones***
Manuales	palas, machete, carreta, palin, barras, pica,pala draga, cepillos, asadonetas, martillo, almadana, rastrillos, alicates	Bueno	
Hidráulicas	fumigadora	Bueno	
Maquinaria	Guadaña, motocierra, sopladora	Bueno	
Equipos de prevencion	señales de prevencion, conos, mampara, cinta de prevencion	Bueno	
vehiculos	Carro y moto	Bueno	

ANALISIS DE LA TAREA (*Describa detalladamente cada respuesta)*

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	N/A
¿Cuántos trabajadores se requieren?	N/A
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	N/A
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros e Impactos Ambientales existentes y potenciales	Riesgo	Consecuencias	Controles Requeridos
Roceria mecanica y manual	cortes y heridas, proyeccion de particulas , expoción a ruido y vibraciones, desidratacion	Mecanico,fisico, ergonomico, ambiental.	Muerte,perdida de algun miembro del cuerpo,discapacidad, lesiones osteomusculares	capacitacion y certificacion en manejo de equipo, uso de EPP, Señalizacion, Supervicion del trabajo, diligenciamiento de ATS
Recorrido a las vias	accidentes, riesgo de robo, exposicion a condiciones climaticas.	Fisico,mecanicos y humanos	muerte, lesiones en el cuerpo, agotamiento, insolacion	uso de EPP, uso de bloquear solar, normas de seguridad vial, diligenciamiento de ATS
Poda y corte de arboles	caida de altura, caida de objetos, fatiga y sobre esfuerzo, exposicion a condiciones climaticas, proyeccion de particulas	Mecanico,fisico, ergonomico, ambiental.	Muerte,perdida de algun miembro del cuerpo,discapacidad, lesiones osteomusculares	uso de equipos de altura, demarcacion y señalizacion del area de trabajo, pausas activas, hidratacion , uso de bloqueador solar, uso de EPP
Limpieza de cunetas, bermas y obras	Resbalones,caidas leves,golpes de calor,picaduras de algun insecto(zancudos,abejas,hormigas etc.), rosadura por la vegetacion	Fisico,biologico, locativo.	Agotammiento,insolacion,raspone,picaduras,infalmacion,cortes leves,dolor muscular	Usar gorra o pava,usar camisa manga larga, usar siempre botas de seguridad y EPP observar el area de trabajo, usar protector solar, tener una buena postura,hidratacion
Recoleccion de basuras	Infecciones, caidas, golpes, cortes, laceraciones	Fisico,ergonomico, biologico ,quimicos, mecanico	infeccion respiratoria, infecciones en la piel, virus, entoxicacion,	uso de EPP, uso de tapabocas, capacitacion en manejo de residuos, vacunacion, examenes periodicos, lavado adecuado de manos



No	Nombre y Apellidos de los trabajador	Cedula	Cargo	Firma
1	GIL WILLIAM DE JESUS	4.379.598	Mantenimiento vial	
2	RIOS VALENCIA REINEL DE JESUS	9.920.147	Mantenimiento vial	
3	MARIN TORO LUIS HERNANDO	10006723	Mantenimiento vial	
4	MEJIA MARIN MARCO ANTONIO	10021750	Mantenimiento vial	
5	CARDONA LUIS FERNANDO	10.022.455	Mantenimiento vial	
6	ALZATE VALENCIA LUIS FERNANDO	10.023.047	Mantenimiento vial	
7	BUITRAGO MORALES DANIEL	10.144.258	Mantenimiento vial	
8				
9				

Nombre y Apellido de la persona (inspeccion AREA SST)	**Eliud Murillo Ocampo**
Firma	

Nota : Emisor y Autoridad de Area Hemos verificado en el sitio de trabajo junto al Ejecutor la implementación al 100% de los controles existentes y adicionales para eliminar o minimizar los peligros y los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-026
	INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1

INSPECCIÓN REALIZADA POR		
Nombre Responsable SST	**Responsable de la inspeccion**	**cooperativa**
ELIUD MURILLO	LUIS FERNANDO CARDONA CASTRILLON	ALTAGRACIA

verificando Y estado de EPP Bueno: B, Malo: M)		**CABEZA**		**OJOA - OIDOS**		**CUERPO**							**FECHA INSPECCIÓN**
		Casco de seguridad y barbuquejo	Gorra y pava	Gafas de Seguridad lente Oscuro	Careta y tapaoidos de insercion	Guantes de Vaqueta	Guantes de Caucho	Botas de seguridad en caucho	Camisa manga larga con reflectivo	Pantalón con reflectivo	Polainas y delantal de carnaza	Botas de seguridad	31 DE MARZO DE 2025
NOMBRE	**EVALUACIÓN**												**FIRMA COLABORADOR**
WILLIAN DE JESUS GIL	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
LUIS FERNANDO ALZATE	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
LUIS HERNANDO MARIN	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
MARCO ANTONIO MEJIA	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
REINEL DE JESUS RIOS	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
DANIEL BUITRAGO MORALES	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
LUIS FERNANDO CARDONA	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	ESTADO												

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE 25 MARZO 2025
	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN Y CAMILLA	VERSION 1
COOPERATIVA	ALTAGRACIA	Fecha inspeccion: 31 de marzo de 2025

PARAMETRO	CANT. EXISTENT	CANT. REQUERIDA	ESTADO			FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
			B	R	M		
Señalización botiquín	SI	1	X			N/A	
Maletín botiquín	SI	1	X			N/A	
Manual de primeros auxilios	SI	1	X			N/A	
Yodopovidona	SI	1	X			15/12/2025	
Solución salina 250 cc ó 500 cc	SI	1	X			20/08/2025	
Alcohol antiséptico	SI	1	X			30/12/2025	
Gasas estériles Paquete por 3 unds	SI	3	X			15/01/2026	
Adhesivo micropore	SI	1	X			01/02/2026	
Esparadrapo de tela	SI	1	X			N/A	
Venditas (tipo cura)	SI	5	X			15/02/2026	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	SI	1	X			30 FEBRERO 2026	
Tijeras punta roma	SI	1	X			N/A	
Baja lenguas	SI	1	X			30/11/2026	
Guantes de látex	SI	2	X			N/A	
Mascarilla desechable (Tapa bocas)	SI	5	X			N/A	
Gafas de seguridad	SI	1	X			N/A	
Termómetro digital	SI	1	X			N/A	
Linterna pequeña (con baterías)	SI	1	X			N/A	
Pito	SI	1	X			N/A	
Camilla plástica polietileno con araña	SI	1	X			N/A	
Collar cervical adulto	SI	1	X			N/A	
NOMBRE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	Luis fernando cardona						

ANEXOS

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS

ANEXO 20- LISTA DE CHEQUEO SGSST

FORMATO SEGUIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Informe de obra Nº:	2	Período	DEL 01/03/2025	Al	31/03/2025
Tipo de Informe SST:		MENSUAL			
Fecha de Inspección:		31 de marzo del 2025			
Nombre del Proyecto:		Administracion vial 2			
Contrato de obra No.		1455			
Departamento:		RISARALDA			
Municipio:		DOSQUEBRADAS			
Nombre del Contratante de Obra:		INVIAS			
Nombre Contratista de Obra:		COOPERATIVA ASOCIADA COMUNEROS			
Residente AMV2:		JAEL MORIANO			
Plazo de ejecución:		2 AÑOS			
Nombre de la persona que realiza la inspección:		YULIANA REYES			
Cargo de la persona que realiza la inspección:		INSPECTOR SST			

	Característica a Inspeccionar	SE IMPLEMENTO 1-0	OBSERVACIONES	ACCIONES A IMPLEMENTAR
A)	**EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST**			
1	Listado de equipo, vehiculo	1		
2	Tarjeta de propiedad, SOAT, tecnomecanica, licencia de conducción	1		
3	Del equipo, caracteristicas, motor y serial del mismo	1		
4	Se alquila baños portatiles? Se arrenda una casa?	0		
5	Listado de personal obra, numero de cedula	1		
6	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley al Sistema General de Seguridad Social: ARL, EPS y AFP?.	1		
7	Se encuentran en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? Indique la fecha del último pago efectuado.	1		
8	Al personal que labora en el proyecto se le ha efectuado valoración médica ocupacional de ingreso, post incapacidad, reintegro, periódico y/o egreso?.	1		
9	Se ha documentado, implementado y ha efectuado seguimiento del plan de trabajo específico para el proyecto, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?	1		
10	Se encuentra documentada la matriz de peligros y riesgos con sus respectivos controles y se efectúa el seguimiento conforme a lo establecido?	1		
11	Se han efectuado las inducciones y capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas de Seguridad y Salud en el trabajo? Se encuentran las evidencias y constancia escrita y firmada por los trabajadores	1	Pausas activas charlas de 5 minutos capacitaciones mensuales	
12	Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes (casi accidentes o accidentes) de trabajo deben ser reportados en un término máximo de 48 horas hábiles, ante quién se reporta, con qué medio se reporta y quién o quienes son las personas encargadas de reportarlo y el procedimiento que se realiza en caso de presentarse?	1		
14	El personal cuenta con la dotación (calzado y vestido) requerida de acuerdo con los riesgos y actividad contratada?. Se ha establecido control de cambios cuando se requiera?	1		
15	El personal porta adecuadamente la dotación suministrada por el contratista y ésta se encuentra en buen estado?	1		
16	Se ha dotado al personal con los Elementos de Protección Personal - E.P.P. requeridos para la ejecución segura de las labores en obra y se capacita sobre su uso?	1		
17	El personal de obra utiliza los elementos de protección personal?	1		
18	Se encuentra documentado y verificado el plan de emergencias específico para el proyecto? Se encuentra dentro del plan de emergencias la valoración de vulnerabilidad de acuerdo a las amenazas identificadas.	0		
19	Todos los frentes de obra cuentan con los elementos necesarios (definidos en el plan de emergencias) Botiquín, extintores multipropósito, camilla de traslado o inmovilización de pacientes, inmovilizadores de cuello	1		
20	Se tiene publicado el MEDEVAC en los frentes de obra?. El personal conoce el procedimiento en caso de contar con un compañero accidentado?	1		
21	Todos los frente de obra cuentan con la señalización de acuerdo a los riesgos identificados? Cuentan con señales de prevención, informativas, de advertencia entre otras de acuerdo a la normatividad legal vigente y los riesgos identificados en obra?.	1		
22	Se han realizado simulacros de emergencias? Se ha realizado la planificación del tipo de simulacro que se implementará, se evalúa el simulacro, se retroalimenta al personal y se analiza su efectividad?	0	programar simulacro de emergencia	
23	Se verifica que se realizan las inspecciones preoperacionales de los vehículos, equipos, herramientas usadas en el proyecto? Se verifica que los vehículos y equipos cuenten con toda la documentación necesaria para su operación?	1		
24	Se socializa a todo el personal de la obra la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial. Se encuentran en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos	1		
25	Los miembros del COPASST o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión.	1		
26	Se realizan actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores?	1		
27	Todas las sustancias químicas están inventariadas, cuentan con ficha de seguridad y son etiquetadas . Son socializadas con el personal involucrado en su manejo?.	1		
28	Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que dictan las hojas de seguridad, están rotuladas y se encuentra señalizado el sitio de almacenamiento?	0	Pendiente realizar rotulacion de las sustancias quimicas	
29	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes?.	0		
30	Se realizan simulacros de emergencia?	1		
31	Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente, alturas, espacios confinados?		NA	solo si realiza dicha actividad
32	El personal presenta curso de alturas/espacios confinados para trabajos de alto riesgo?		NA	se anexa ATS en caso de realizar dichas actividades
33	El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección personal y colectivo requeridos por ley?.		NA	
34	Se cuenta con procedimientos / instructivos / ATS para actividades de riesgos prioritarios y/o críticos?	1		
35	Se ejecutan las actividades según el cronograma o plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el proyecto?	1		
36	Se elabora y se cumple con un sistema de archivo o retención documental, acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa?	1		
SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST		27		
TOTAL VALORACIÓN SST		**75%**	**DE**	**100%**

Se tiene nivel de implementación de SST acorde a:

100%	Cumple
< 80%	Cumple parcialmente y mejoramiento
50%	Aplicar mejoramiento
> 10	No cumple

Observaciones:

PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR

Nº	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	CUMPLIÓ SI/NO	OBSERVACIÓN
1					
2					

PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN
NOMBRE: YULIANA REYES
CARGO: INSPECTOR SST ADMV2

ANEXO 21- PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA COMUNEROS

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800017418	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COMUNEROS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-318	CR 8 23 09 OFC 901		3355969			COOPCOMUNEROS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	32996057	E	2025-04-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.625.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	32996057	2025-04-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 10125400	BERNAL AGUDELO JOSE MARTIN	1.600.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	495.400	S	5813001
2	CC 15922888	ANDICA GAÑAN LUIS AUDONEY	1.423.500												X					0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	0	0	1.423.500	0	0,00000	0	0	0	0	0	31	0	284.800	S	5813001
3	CC 16547419	MEDINA CARLOS ALBERTO	1.600.000																	0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	495.400	S	5813001
4	CC 18599978	MONTOYA GOMEZ JOSE RODRIGO	1.600.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	495.400	S	5813001
5	CC 18600327	RAMIREZ QUIROZ RUBEN DARIO	1.600.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	495.400	S	5813001
6	CC 18600922	LOPEZ VELEZ HECTOR FABIO	1.600.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	495.400	S	5813001
7	CC 18601150	RAMIREZ JARAMILLO NELSON DE JESUS	1.600.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	495.400	S	5813001
8	CC 71785005	GUAPACHA RAMIREZ JHON JAIRO	1.600.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	495.400	S	5813001
9	CC 1004688954	FRANCO MANSO JUAN CARLOS	1.600.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	495.400	S	5813001
10	CC 1004766831	LOPEZ BEDOYA YHON ANDERSON	1.423.500																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5813001
11	CC 1004766928	OLIVERAS AGUIRRE FELIX ALEJANDRO	1.600.000																	0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	495.400	S	5813001
12	CC 1088297589	RAMIREZ GIRALDO YOHAN ANDRES	1.423.500																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	31	0	440.900	S	5813001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800017418	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COMUNEROS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
66-318	CR 8 23 09 OFC 901		3355969			COOPCOMUNEROS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	32996057	E	2025-04-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.625.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	32996057	2025-04-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.670.500	18.670.500	18.670.500	17.247.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	2.987.400	0	0	0	2.987.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	9	2.275.800	0	0	0	2.275.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	256.000	0	0	0	256.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	455.600	0	0	0	455.600
EPS(Administradoras: 2)				12	747.000	0	0	0	747.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	64.000	0	0	0	64.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	683.000	0	0	0	683.000
ARP(Administradoras: 1)				12	1.200.800	0	0	0	1.200.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	1.200.800	0	0	0	1.200.800
CCF(Administradoras: 1)				12	690.000	0	0	0	690.000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	12	690.000	0	0	0	690.000
Gran Total					5.625.200	0	0	0	5.625.200

SEGURO DE MODULAR SEGUROS DE PERSONAS

MERCADEO EMPRESARIAL 2014

Tomador: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COMUNEROS LTDA | NIT/CC: 800.017.418-1 | Número Póliza: 4000496 | Certificado de: FACTURACION MANUAL

Centro de Costo: 1 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COMUNEROS LTDA | Anexo: 106 | Sucursal: PEREIRA

Item	Asegurado		Parentesco	Tipo Mov	Período de Cobro	SUMAS ASEGURADAS								Prima Total
						VIDA GRUPO					ACCIDENTES PERSONALES			
	Nro Documento	Nombre				Vida	Incapacidad	Enf. Graves	Renta Hogar	Exequias	Básico Accidentes	Renta Hogar	Renta Diaria	
7-0	CC-16547419	CARLOS ALBERTO MEDINA OSORIO	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 7	$ 28.589
14-0	CC-1004766928	FELIX ALEJANDRO OLIVEROS AGUIRRE	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 14	$ 28.589
5-0	CC-18600922	HECTOR FABIO LOPEZ VELEZ	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 5	$ 28.589
15-0	CC-1004766831	JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 15	$ 28.589
8-0	CC-71785005	JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 8	$ 28.589
3-0	CC-10125400	JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 3	$ 28.589
2-0	CC-18599978	JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 2	$ 28.589
18-0	TI-1004688954	JUAN CARLOS FRANCO MANSO	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 25.990
													Subtotal Item 18	$ 25.990
13-0	CC-15922888	LUIS AUDONEY ANDICA GAÑAN	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 13	$ 28.589
1-0	CC-18601150	NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILL	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 1	$ 28.589
4-0	CC-18600327	RUBEN DARIO RAMIREZ QUIROZ	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 4	$ 28.589
16-0	CC-1088297589	YOHAN ANDRES RAMIREZ GIRALDO	ASEGURADO PR	COB	01/03/2025-01/04/2025	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 20.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 28.589
													Subtotal Item 16	$ 28.589
													Total para 1 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COMUNEROS LTDA	**$ 340.471**

Total de primas asegurados sin modificar	$ 340.471
Total de primas por inclusión de asegurados	$ 0
Total de primas por modificaciones de asegurados	$ 0
Total de primas por exclusiones de asegurados	$ 0
Total facturado	$ 340.471,03

(*) VER EXCLUSIONES Y/O LIMITACIONES EN LA POLIZA

ESTE CUADRO FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CARATULA DE LA PÓLIZA

ANEXO 22- CONDICIONES DIARIAS DE SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA COMUNEROS

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com



	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENCIA 14 MARZO 2025
	CONDICIONES DIARIAS DE SALUD	VERSION 1

Fecha desde : 1 de marzo de 2025 **Hasta : 28 de marzo de 2025**

Cooperativa : LOS COMUNEROS

Confirma que ingresa y sale de obra en buenas condiciones

Criterios de calificacion B: bien M: mal

Nombre del trabajador	C.C.	CONDICION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Firma	Observaciones
CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
HECTOR FAVIO LOPEZ VELES	18.600.922	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
RUBEN DARIO RAMIREZ	18.600.327	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	10.125.400	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					el dia 18 de marzo se presento un accidente con un machete todo se reporto y le dieron 5 dias de incapacidad.
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	M	B	B	B				B	B	B	B					
NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO	18.601.150	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	1.004.766.928	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA	1.004.766.831	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	1.088.297.589	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	18.599.978	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
JUAN CARLOS FRANCO MANSO	1.004.688.954	C.E			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					
		C.S			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B			B	B	B	B	B				B	B	B	B					

ANEXO 23- PRE OPERACIONALES MAQUINARIA Y VEHICULO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA COMUNEROS


Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR GUADAÑA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: LOS COMUNEROS	
RUTAS DE TRABAJO : 5003 Y 2507	**TRABAJO/ACTIVIDAD: ROCERIA**
FECHA DE INSPECCION DESDE : 1 DE MARZO DE 2025	**HASTA: 15 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL DE ACTIVIDAD : 8:00 AM	**HORA FINAL DE ACTIVIDAD: 3:00 PM**
N° MOTOR : N/A	**N° SERIE/REFERENCIA: 43R**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Motor	X		
	Encendido	X		
	Sistema antivibración	X		
	Soporte ergonómico	X		
	Acelerador gatillo	X		
	Estructura en tubo	X		
	Protector	X		

3. ACCESORIOS:

	Cuchilla	X		
	Yoyo mecánico	X		
	Nylon	X		
	Yoyo manual	X		
	combutible (gasolina + aceite)	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	**SI**	**NO**
 Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
Careta de malla o acrilico	X	
Tapaoidos	X	
Gafas lente oscuro	X	
Delantal en carnasa	X	
Canilleras	X	
Bota protectora	X	
Arnes de sujeción de guadaña	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fisico, quimico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,fisico, quimico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fisico, quimico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fisico, quimico, psicosocial,	De acuerdo a número 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a número 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fisico, quimico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fisico, quimico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fisico, quimico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales
9	Rosería del área de trabajo	Biologico,fisico, quimico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la rocería	Biologico,fisico, quimico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fisico, quimico, psicosocial.	
12	Se retira los EPI	Biologico,fisico, quimico, psicosocial,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fisico, quimico, psicosocial,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fisico, quimico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fisico, quimico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fisico, quimico, psicosocial,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	
2	JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	
3	HECTOR FAVIO LOPEZ VELES	18.600.922	
4	RUBEN DARIO RAMIREZ	18.600.327	
5	JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	10.125.400	
6	NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO	18.601.150	
7	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	1004766928	
8	JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA	1004766831	
9	YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	1088297589	
10	JUAN CARLOS FRANCO MANSO	1004688954	
11			
12			

8. FIRMA SST RESPONSABLE


NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR GUADAÑA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: LOS COMUNEROS	
RUTAS DE TRABAJO : 5003 Y 2507	**TRABAJO/ACTIVIDAD: ROCERIA**
FECHA DE INSPECCION DESDE : 16 DE MARZO DE 2025	**HASTA: 28 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL DE ACTIVIDAD : 8:00 AM	**HORA FINAL DE ACTIVIDAD: 3:00 PM**
N° MOTOR : N/A	**N° SERIE/REFERENCIA: 43R**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Motor	X		
	Encendido	X		
	Sistema antivibración	X		
	Soporte ergonómico	X		
	Acelerador gatillo	X		
	Estructura en tubo	X		
	Protector	X		

3. ACCESORIOS:

	Cuchilla	X		
	Yoyo mecánico	X		
	Nylon	X		
	Yoyo manual	X		
	combutible (gasolina + aceite)	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL		SI	NO
	Guantes de vaqueta (tipo ingeniero)	X	
	Careta de malla o acrilico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Delantal en carnasa	X	
	Canilleras	X	
	Bota protectora	X	
	Arnes de sujeción de guadaña	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiisico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,fiisico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiisico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiisico, químico, psicosociall,	De acuerdo a núméral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a núméral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales
9	Roseria del área de trabajo	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la roceria	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiisico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiisico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiisico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiisico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	
2	JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	
3	HECTOR FAVIO LOPEZ VELES	18.600.922	
4	RUBEN DARIO RAMIREZ	18.600.327	
5	JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	10.125.400	
6	NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO	18.601.150	
7	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	1004766928	
8	JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA	1004766831	
9	YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	1088297589	
10	JUAN CARLOS FRANCO MANSO	1004688954	
11			
12			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL SOPLADORA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: LOS COMUNEROS		
RUTAS DE TRABAJO	**5003 Y 2507**	**TRABAJO/ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE RESIDUOS LIVIANOS**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**1 DE MARZO DE 2025**	**HASTA: 15 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**8:00 a. m.**	**HORA FINAL ACTIVIDAD: 3:00 PM**
N° MOTOR	**N/A**	**N° SERIE/REFERENCIA: BR600**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Bloqueo del acelerador	X		
	Acelerador	X		
	Palanca del mando indicado	X		
	Carburador	X		
	Pistón	X		
	Filtro de aire	X		
	Empuñadira de arranque	X		
	Bujia	X		
	Cilindro	X		
	Manillar tubular	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI	SE CUENTA PARA LA ACTIVIDAD	
	SI	NO
 Guantes de vaqueta	X	
Careta de malla o acrilico	X	
Tapaoidos	X	
Gafas lente oscuro	X	
Bota protectora	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ROCERIA

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a número 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a número 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
9	Sopladora	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la actividad	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	
2	JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	
3	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	1004766928	
4	YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	1088297589	
5	JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	18.599.978	
6			
7			
8			
9			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL SOPLADORA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: LOS COMUNEROS		
RUTAS DE TRABAJO	**5003 Y 2507**	**TRABAJO/ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE RESIDUOS LIVIANOS**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**16 DE MARZO DE 2025**	**HASTA: 31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**8:00 a. m.**	**HORA FINAL ACTIVIDAD: 3:00 PM**
N° MOTOR	**N/A**	**N° SERIE/REFERENCIA: BR600**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Bloqueo del acelerador	X		
	Acelerador	X		
	Palanca del mando indicado	X		
	Carburador	X		
	Pistón	X		
	Filtro de aire	X		
	Empuñadira de arranque	X		
	Bujia	X		
	Cilindro	X		
	Manillar tubular	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI	SE CUENTA PARA LA ACTIVIDAD	
	SI	NO
 Guantes de vaqueta	X	
Careta de malla o acrilico	X	
Tapaoidos	X	
Gafas lente oscuro	X	
Bota protectora	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ROCERIA

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	De acuerdo a número 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a número 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
9	Sopladora	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la actividad	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiísico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiísico, químico, psicosociall,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	
2	JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	
3	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	1004766928	
4	YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	1088297589	
5	JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	18.599.978	
6			
7			
8			
9			

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	

	PREOPERACIONAL/ATS HERRAMIENTA MENOR MOTOSIERRA	Versión: 01
		Vigente desde: 28/05/2024



1. INFORMACIÓN GENERAL

COOPERATIVA DE TRABAJO: ALTAGRACIA			
RUTAS DE TRABAJO	**2902, 29RSA, 29RSB**	**TRABAJO/ACTIVIDAD:**	**CORTE DE MADERA**
FECHA DE INSPECCION DESDE	**1 DE MARZO DE 2025**	**HASTA**	**31 DE MARZO DE 2025**
HORA INICIAL ACTIVIDAD:	**8:00 a. m.**	**HORA FINAL ACTIVIDAD:**	**3:30 p. m.**
N° MOTOR	**N/A**	**N° SERIE/REFERENCIA:**	**381R**

2. PRE-OPERACIONAL

PARTES DE LA HERRRAMIENTA	PARTES A INSPECCIONAR	ESTADO DE LA HERRAMIENTA		
		BUENO	MALO	OBSERVACIONES
	Bloqueo del acelerador	X		
	Acelerador	X		
	Palanca del mando indicado	X		
	Carburador	X		
	Pistón	X		
	Filtro de aire	X		
	Empuñadira de arranque	X		
	Bujia	X		
	Cilindro	X		
	Manillar tubular	X		
	Cadena	X		
	Espada	X		
	Dospositivo tensor de la cadena	X		
	Cinta de freno	X		
	Resorte de tracción (freno de cadena)	X		
	Cigüeñal	X		
	Piñon de cadena	X		
	Embragüe	X		
	Filtro de combustible	X		

3. ACCESORIOS:

	Espada	X		
	Cadena	X		
	Lima	X		
	Llave de copa	X		
	combutible (gasolina + aceite)	X		

4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL/EPI		SI	NO
	Careta de malla o acrílico	X	
	Tapaoidos	X	
	Gafas lente oscuro	X	
	Delantal en carnasa	X	
	Bota protectora	X	

5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

N°	DETALLE	RIESGOS/PELIGROS	OBSERVACIONES
1	Se verifica el estado de la máquina	Biologico,fiisico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina
2	Engrase de rodamientos	Biologico,fiisico, químico, psicosocial.	Leer la ficha técnica de la máquina, uso EPP
3	Cargue de combustible (mezcla de aceite y gasolina)	Biologico,fiisico, químico, psicosocial.	Precaución de incendio, extintor
4	Verificación de estado EPP y EPI	Biologico,fiisico, químico, psicosocial,	De acuerdo a núméral 2.
5	Uso y vestido de los EPP y EPI	Golpe de calor, stress, ansiedad, dolor de cabeza, visión borrosa	De acuerdo a núméral 2.
6	Inspección del área de trabajo	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
7	Señalizacion de área de trabajo	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
8	Instalación y uso de la malla de protección (mampara)	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI, recomendaciones médicas/laborales
9	Roseria del área de trabajo	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, biomecánica y fenómeno natural	- Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina. - Calestenia - Pausas activas - Hidratación constante
10	Finalización de la rocería	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
11	Se apaga la máquina	Biologico,fiisico, químico, psicosocial.	Uso de EPP/EPI, recomendaciones fabricante máquina
12	Se retira los EPI	Biologico,fiisico, químico, psicosocial,	Precaución cambios de temperatura, hidratación
13	Se guarda la máquina	Biologico,fiisico, químico, psicosocial,	Recomendaciones fabricante máquina
14	Se verifica el área de trabajo	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
15	Se retira señalización de área	Biologico,fiisico, químico, psicosocial, condiciones de seguridad, y fenómeno natural	Uso de EPP/EPI
16	Se retira EPP	Biologico,fiisico, químico, psicosocial,	Precaución cambios de temperatura, hidratación

6. RECOMENDACIONES GENERALES

7. TRABAJADORES RESPONSABLES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FIRMA
1	JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	10.125.400	
2	NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO	18.601.150	
3	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	1004766928	
4	JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	18.599.978	

8. FIRMA SST RESPONSABLE

NOMBRE Y APELLIDO:	ELIUDH MURILLO OCAMPO
N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	79052528
FIRMA	


	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE VEHICULO	VERSION 2

Fecha Desde	**1 DE MARZO DE 2025**	**HASTA : 15 DE MARZO DE 2025**	
Placa	**KAG253**		
Marca	**DODGE**		
Modelo	**1954**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (19) mes (03) año (2026)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(02) Mes (11) Año (2025)**		
Área de trabajo	**5003 Y 2507**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**														
ESTADO GENERAL	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
ENCENDIDO DE MOTOR					B		B								
CARROCERÍA					B		B								
LLANTAS Y RINES					B		B								
LUCES DE PARQUEO Y DIRECCIONALES					B		B								
LUCES DELANTERAS Y TRASERAS					B		B								
LIMPIABRISAS					B		B								
PITO PRINCIPAL					B		B								
COJINERÍA					B		B								
ESPEJOS					B		B								
VELOCIMETRO					B		B								
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD					B		B								
CINTURONES DE SEGURIDAD					B		B								
CONOS REFLECTIVOS , TACOS Y CHALECO					B		B								
BOTIQUIN, LINTERNA, EXTINTOR					B		B								
HERRAMIENTAS BÁSICAS					B		B								
GATO, PLANCA, CRUCETA					B		B								
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS					B		B								
LLANTA DE REPUESTO					B		B								
SISTEMA DE FRENOS					B		B								
PRINCIPAL Y DE EMERGENCIA					B		B								
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS					B		B								
INSPECCIÓN INTERNA					B		B								
ACEITE DE MOTOR Y LUBRICACION					B		B								
RADIADOR Y FILTROS					B		B								
VENTILADOR, CORREAS,MANGUERAS					B		B								
CABLES ELÉCTRICOS					B		B								
BATERIA					B		B								

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA** 

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	
JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	

JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	18.599.978



	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE VEHICULO	VERSION 2

Fecha desde	**16 DE MARZO de 2025**	**Hasta : 28 de marzo de 2025**	
Placa	**KAG253**		
Marca	**DODGE**		
Modelo	**1954**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (19) mes (03) año (2026)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(02) Mes (11) Año (2025)**		
Área de trabajo	**5003 Y 2507**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISION:**															
ESTADO GENERAL	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
ENCENDIDO DE MOTOR												B				
CARROCERÍA												B				
LLANTAS Y RINES												B				
LUCES DE PARQUEO Y DIRECCIONALES												B				
LUCES DELANTERAS Y TRASERAS												B				
LIMPIABRISAS												B				
PITO PRINCIPAL												B				
COJINERÍA												B				
ESPEJOS												B				
VELOCIMETRO												B				
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD												B				
CINTURONES DE SEGURIDAD												B				
CONOS REFLECTIVOS , TACOS Y CHALECO												B				
BOTIQUIN, LINTERNA, EXTINTOR												B				
HERRAMIENTAS BÁSICAS												B				
GATO, PALANCA, CRUCETA												B				
KIT DE HERRAMIENTAS BASICAS												B				
LLANTA DE REPUESTO												B				
SISTEMA DE FRENOS												B				
PRINCIPAL Y DE EMERGENCIA												B				
NIVEL LIQUIDO DE FRENOS												B				
INSPECCIÓN INTERNA												B				
ACEITE DE MOTOR Y LUBRICACION												B				
RADIADOR Y FILTROS												B				
VENTILADOR , CORREAS , MANGUERAS												B				
CABLES ELÉCTRICOS												B				
BATERIA												B				

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA:**

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	FIRMA
CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	
JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	
JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	18.599.978	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE MOTO	VERSION 2

Fecha desde	**1 de marzo de 2025**	**Hasta: 15 de marzo de 2025**	
Placa	**YCZ59D**		
Marca	**HONDA**		
Modelo	**2016**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (27) mes (11) año (2025)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(08) Mes (07) Año (2025)**		
Área de trabajo	**5003 Y 2507**		

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**														
VERIFICACION DE DOCUMENTOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
LIENCIA, SEGURO, TECNOMECANICA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
VERIFICACION MOTOCICLETA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NIVEL DE ACEITE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESTADO DE LUCES EN GENERAL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
REPOSAPIES Y MANIGUETAS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CHASIS Y SILLIN	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SUSPENSION (AMORTIGUADORES)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
LLANTAS Y RINES	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TABLERO-VELOCIMETRO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
PITO Y ESPEJOS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EPP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CASCO, CHALECO E IMPERMEABLE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA**

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**FIRMA**
CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	
JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	
HECTOR FAVIO LOPEZ VELES	18.600.922	
JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	10.125.400	
NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO	18.601.150	
FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	1004766928	
JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA	1004766831	
YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	1088297589	
JUAN CARLOS FRANCO MANSO	1004688954	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE DEL 27/02/2025
	INSPECCION DE MOTO	VERSION 2

Fecha	**16 DE MARZO DE 2025**	**HASTA: 31 DE MARZO DE 2025**	
Placa	**YCZ59D**		
Marca	**HONDA**		
Modelo	**2016**		
Seguro obligatorio. Expira: Día (27) mes (11) año (2025)			
Certificado técnico mecánica y emisión de gases	**Expira Dia(08) Mes (07) Año (2025)**		
Área de trabajo	**2902, 29RSA, 29RSB**		








CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: BUENO = B REGULAR = R MALO = M

PARTE INSPECCIONADA	**FECHA REVISIÓN:**															
VERIFICACION DE DOCUMENTOS	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
LIENCIA, SEGURO, TECNOMECANICA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
VERIFICACION MOTOCICLETA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
NIVEL DE ACEITE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
ESTADO DE LUCES EN GENERAL	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
REPOSAPIES Y MANIGUETAS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CHASIS Y SILLIN	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
SUSPENSION (AMORTIGUADORES)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
LLANTAS Y RINES	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TABLERO-VELOCIMETRO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
PITO Y ESPEJOS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
EQUIPO DE PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL EPP	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
CASCO, CHALECO E IMPERMEABLE	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

OBSERVACIONES:

RESPONSABLE SST : ELIUD MURILLO OCAMPO	**CC: 79.052.528**	**FIRMA** 

TRABAJADORES RESPONSABLES

NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**FIRMA**
CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	
JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	
HECTOR FAVIO LOPEZ VELES	18.600.922	
JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	10.125.400	
NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO	18.601.150	
FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	1004766928	
JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA	1004766831	
YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	1088297589	
JUAN CARLOS FRANCO MANSO	1004688954	

ANEXO 24- SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACION SGSST COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADA COMUNEROS

Oficina: Cra 13 Bis No. 38-48 Barrio Guadalupe/Dosquebradas
Correo principal: consorcioadmon143@gmail.com
Correo atención al usuario: atencionalusuariocadmon143@gmail.com

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Vigente : 13/03/2025
	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO ATS	Version:001

Cooperativa : LOS COMUNEROS		**Ciudad: Pereira**					
Rutas:	**5003 Y 2507**						
Fecha de realización del Trabajo desde	**1 DE MARZO DE 2025**	**Hasta**	**28 DE MARZO DE 2025**	**Hora de Inicio**	**8:00 a. m.**	**Hora final**	**3:00 p. m.**

Descripción de las tareas que se realizan:

Roceria mecanica sobre las vias a cargo	Atencion de emergencias
Limpieza de cuneta	Bacheo
Limpieza de señales verticales	Poda y corta de arboles
Realce de talu manual y mecanico	Retiro de derrumbes
Limpieza de bordillo, cuneta, bermas	Recoleccion de basura
instalacion de señalizacion	
Despeje de señales	
Trabajo en pintura	
Recorrido a las vias	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

Trabajo en ealtura: N/A	Espacio confinado : SI	Trabajo en caliente: N/A

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Eqipos y herramientas utilizadas	*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*	*Estado de Herramientas /Equipos (B/M)*	*Observaciones*
Manuales	palas, machete, carreta, palin, barras, pica,pala draga, cepillos, asadonetas, martillo, almadana, rastrillos, alicates	Bueno	
Hidráulicas	fumigadora	Bueno	
Maquinaria	Guadaña, motocierra, sopladora	Bueno	
Equipos de prevencion	señales de prevencion, conos, mampara, cinta de prevencion	Bueno	
vehiculos	Carro y moto	Bueno	

ANALISIS DE LA TAREA (*Describa detalladamente cada respuesta)*

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	N/A
¿Cuántos trabajadores se requieren?	N/A
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	N/A
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	N/A

Pasos detallados de la tarea	Peligros e Impactos Ambientales existentes y potenciales	Riesgo	Consecuencias	Controles Requeridos
Roceria mecanica y manual	cortes y heridas, proyeccion de particulas , expoción a ruido y vibraciones, desidratacion	Mecanico,fisico, ergonomico, ambiental.	Muerte,perdida de algun miembro del cuerpo,discapacidad, lesiones osteomusculares	capacitacion y certificacion en manejo de equipo, uso de EPP, Señalizacion, Supervicion del trabajo, diligenciamiento de ATS
Recorrido a las vias	accidentes, riesgo de robo, exposicion a condiciones climaticas.	Fisico,mecanicos y humanos	muerte, lesiones en el cuerpo, agotamiento, insolacion	uso de EPP, uso de bloquear solar, normas de seguridad vial, diligenciamiento de ATS
Poda y corte de arboles	caida de altura, caida de objetos, fatiga y sobre esfuerzo, exposicion a condiciones climaticas, proyeccion de particulas	Mecanico,fisico, ergonomico, ambiental.	Muerte,perdida de algun miembro del cuerpo,discapacidad, lesiones osteomusculares	uso de equipos de altura, demarcacion y señalizacion del area de trabajo, pausas activas, hidratacion , uso de bloqueador solar, uso de EPP
Limpieza de cunetas, bermas y obras	Resbalones,caidas leves,golpes de calor,picaduras de algun insecto(zancudos,abejas,hormigas etc.), rosadura por la vegetacion	Fisico,biologico, locativo.	Agotammiento,insolacion,raspone,picaduras,infalmacion,cortes leves,dolor muscular	Usar gorra o pava,usar camisa manga larga, usar siempre botas de seguridad y EPP observar el area de trabajo, usar protector solar, tener una buena postura,hidratacion
Recoleccion de basuras	Infecciones, caidas, golpes, cortes, laceraciones	Fisico,ergonomico, biologico ,quimicos, mecanico	infeccion respiratoria, infecciones en la piel, virus, entoxicacion,	uso de EPP, uso de tapabocas, capacitacion en manejo de residuos, vacunacion, examenes periodicos, lavado adecuado de manos

No	Nombre y Apellidos de los trabajador	Cedula	Cargo	Firma
1	CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	Mantenimiento vial	
2	JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	Mantenimiento vial	
3	HECTOR FAVIO LOPEZ VELES	18.600.922	Mantenimiento vial	
4	RUBEN DARIO RAMIREZ	18.600.327	Mantenimiento vial	
5	JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	10.125.400	Mantenimiento vial	
6	NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO	18.601.150	Mantenimiento vial	
7	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	1004766928	Mantenimiento vial	
8	JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA	1004766831	Mantenimiento vial	
9	YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	1088297589	Mantenimiento vial	
10	JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	18.599.978	Mantenimiento vial	
11	LUIS AUDONAY ANDICA GAÑAN	15922888	Mantenimiento vial	
9	JUAN CARLOS FRANCO MANSO	1004688954	Mantenimiento vial	

Nombre y Apellido de la persona (inspeccion AREA SST)	**Eliud Murillo Ocampo**
Firma	

Nota : Emisor y Autoridad de Area Hemos verificado en el sitio de trabajo junto al Ejecutor la implementación al 100% de los controles existentes y adicionales para eliminar o minimizar los peligros y los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024

DEPARTAMENTO	PEREIRA - RISARALDA
COOPERATIVA	LOS COMUNEROS
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	31 DE MARZO DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS
INTERVENTORIA:	AMV2

LISTA EQUIPO/MAQUINARIA/VEHICULO

N°	EQUIPO	INFORMACION GENERAL							CUENTA CON PREOPERACIONAL SI/NO	OBSERVACIONES
		MARCA	REFERENCIA	SERIAL/PLACA	CAPACIDAD	SOAT	TECNOMECANICA	KIT ANTIDERRAMES		
1	Moto	HONDA	2016	YCZ59D	2	14/11/2024	27/11/2025	NA	SI	COOPERATIVA
2	Moto	HONDA	2011	DBP23C	2	07/15/2025	6/07/2025	NA	SI	CARLOS MEDINA
3	Moto	PULSAR	2013	DZR25	2	01/23/2025	7/08/2025	NA	SI	NELSON
4	Moto	PULSAR	2013	NUA90C	2	7/02/2025	7/02/2025	NA	SI	JHON JAIRO
5	Moto	LIBERO	2011	DCP73C	2	2/05/2025	2/05/2025	NA	SI	FELIX
6	Moto	AKT	2025	APP89H	2	NUEVA	NUEVA	NA	SI	ANDRES
7	Moto	HONDA	2016	YCZ59D	2	14/11/2024	7/08/2025	NA	SI	
8	CARRO CHIVA	DODGE	1954	KAG253	15	8/03/2025	2/11/2025	NA	SI	
9	MOTOSIERRA	STIHL	2012	0000658	NA	NA	NA	NA	SI	
10	GUADAÑA	HUSQVARNA	2022	G45L192-D	NA	NA	NA	NA	SI	
11	GUADAÑA	HUSQVARNA	2022	G45L197-D	NA	NA	NA	NA	SI	
12	GUADAÑA	HUSQVARNA	2023	G45L193-D	NA	NA	NA	NA	SI	
13	GUADAÑA	HUSQVARNA	2023	G45L191-D	NA	NA	NA	NA	SI	
14	GUADAÑA	HUSQVARNA	2022	G45L195-D	NA	NA	NA	NA	SI	NO SE UTILIZA PRESENTE MES
15	GUADAÑA	HUSQVARNA	2020	G45L185-D	NA	NA	NA	NA	SI	NO SE UTILIZA PRESENTE MES
16	SOPLADORA	HUSQVARNA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NO	

REVISÓ:

PROFESIONAL SST:

FIRMA 

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024

DEPARTAMENTO	PEREIRA - RISARALDA
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	31 DE MARZO DE 2025
COOPERATIVA	LOS COMUNEROS
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS
INTERVENTORIA:	AMV2

N°	AREA DE TRABAJO			REGISTRO FOTOGRAFICO
	UNIDAD SANITARIA	ORDEN Y ASEO		
		S	N	
1	DISPENSADOR DE JABON	X		
2	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	X		
3	DEPOSITO DE RESIDUOS	X		
4	AGUA PARA EVACUAR DESECHOS	X		
5	SISTEMA DE ALCANRARILLADO	X		
6				
7				
8				

REVISÓ:

PROFESIONAL SST:










FIRMA

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO
C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VERSION 1
		VIGENTE 28/05/2024
DEPARTAMENTO:	PEREIRA - RISARALDA	
FECHA DILIGENCIAMIENTO	31 DE MARZO DE 2025	
COOPERATIVA	LOS COMUNEROS	
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS	
INTERVENTORIA:	AMV2	

INFORMACIÓN DEL PERSONAL PARA EVACUACIÓN MÉDICA (MEDEVAC)

AVISO DE PRIVACIDAD: "Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, para que sean almacenados, usados, circulados o suprimidos, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada, que declaro conocer y estar informado de los canales de atención consignados en la misma a los que podré dirigirme para el ejercicio de mis derechos. Así mismo, declaro que se me ha advertido la posibilidad de oponerme al tratamiento de datos sensibles, a lo cual manifiesto mi autorización expresa para su tratamiento".

N°	DATOS DEL TRABAJADOR							DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO			FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	CC	N° CELULAR	GRUPO SANGUINEO	ENTIDAD A LA CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO						
					SALUD	PENSION	ARL	NOMBRE	DIRECCION	CELULAR	
1	CARLOS ALBERTO MEDINA	16.547.419	3116240756	O+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Esposa	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3122390151	
2	JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	71.785.005	3116257313	B+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Esposa	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3207024670	
3	HECTOR FAVIO LOPEZ VELES	18.600.922	3128181548	O-	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Esposa	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3136361799	
4	RUBEN DARIO RAMIREZ	18.600.327	3207942063	O+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Madre	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3122585691	
5	JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	10.125.400	3232892420	O+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Madre	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3233854752	
6	NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILL	18.601.150	3147593460	O+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Esposa	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3148521865	
7	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRR	1004766928	3207133292	O+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Padre	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3145526276	
8	JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA	1004766831	3207952574	O-	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Madre	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3136361799	
9	YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	1088297589	3132207946	O+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Esposa	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3132189812	
10	JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	18.599.978	3128074408	O+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	Esposa	CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE	3127884436	
11	LUIS AUDONAY ANDICA GAÑAN	15922888	3012660021	O+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	HIJA	VEREDA CHAPATA	3209968112	
12	JUAN CARLOS FRANCO MANSO	1004688954	3126524764	O+	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	NOVIA	GUATICA	3146238555	

REVISÓ: **PROFESIONAL SST:**

FIRMA 

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C.: 79052528

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
DEPARTAMENTO:	PEREIRA-RISARALDA	
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	1 DE MARZO DE 2025 - HASTA 15 DE MARZO DE 2025	
COOPERATIVA	LOS COMUNEROS	
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS	
INTERVENTORIA	AMV2	

CAPACITACIONES SST - CHARLAS DE 5 MINUTOS

TEMA CAPACITACION:	HORA INICIO:	8:00	HORA FIN:	8:30

Nº	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
1	CARLOS ALBERTO MEDINA		
2	JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ		
3	HECTOR FAVIO LOPEZ VELES		
4	RUBEN DARIO RAMIREZ		
5	JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO		
6	NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO		
7	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE		
8	JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA		
9	YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO		
10	JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ		
11	JUAN CARLOS FRANCO MANSO		

PROFESIONAL SST

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C: 79052528

FIRMA

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	

DEPARTAMENTO:	PEREIRA-RISARALDA
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	16 DE MARZO DE 2025 - HASTA 31 DE MARZO DE 2025
COOPERATIVA	LOS COMUNEROS
ENTIDAD CONTRATANTE:	INVIAS
INTERVENTORIA	AMV2

CAPACITACIONES SST - CHARLAS DE 5 MINUTOS


TEMA CAPACITACION:	HORA INICIO:	8:00	HORA FIN:	8:30

Nº	NOMBRE Y APELLIDO TRABAJADOR	FIRMA DEL TRABAJADOR	OBSERVACIONES
1	CARLOS ALBERTO MEDINA		
2	JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ		
3	HECTOR FAVIO LOPEZ VELES		
4	RUBEN DARIO RAMIREZ		
5	JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO		
6	NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAMILLO		
7	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE		
8	JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA		
9	YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO		
10	JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ		
11	JUAN CARLOS FRANCO MANSO		

PROFESIONAL SST

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C: 79052528

FIRMA 

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-026
	INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	Versión: 1

INSPECCIÓN REALIZADA POR		
Nombre Responsable SST	**Responsable de la inspeccion**	**cooperativa**
ELIUD MURILLO	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE	LOS COMUNEROS

verificando Y estado de EPP Bueno: B, Malo: M)		CABEZA		OJOA - OIDOS		CUERPO							FECHA INSPECCIÓN
		Casco de seguridad y barbuquejo	Gorra y pava	Gafas de Seguridad lente Oscuro	Careta y tapaoidos de insercion	Guantes de Vaqueta	Guantes de Caucho	Botas de seguridad en caucho	Camisa manga larga con reflectivo	Pantalón con reflectivo	Polainas y delantal de carnaza	Botas de seguridad	31 DE MARZO DE 2025
NOMBRE	**EVALUACIÓN**												**FIRMA COLABORADOR**
CARLOS ALBERTO MEDINA	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
JHON JAIRO GUAPACHA RAMIREZ	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
HECTOR FAVIO LOPEZ VELES	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
RUBEN DARIO RAMIREZ	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
JOSE MARTIN BERNAL AGUDELO	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
NELSON DE JESUS RAMIREZ JARAN	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGU	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
JHON ANDERSON LOPEZ BEDOYA	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
YHOAN ANDRE RAMIREZ GIRALDO	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
JOSE RODRIGO MONTOYA GOMEZ	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
LUIS AUDONAY ANDICA GAÑAN	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
JUAN CARLOS FRANCO MANSO	ESTADO	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

Observaciones:

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	VIGENTE 25 MARZO 2025
	INSPECCIÓN A BOTIQUÍN Y CAMILLA	VERSION 1
COOPERATIVA	LOS COMUNEROS	Fecha inspeccion: 28 de marzo de 2025

PARAMETRO	**CANT. EXISTENTE**	**CANT. REQUERIDA**	**ESTADO**			**FECHA DE VENCIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
			B	**R**	**M**		
Señalización botiquín	SI	1	X			N/A	
Maletín botiquín	SI	1	X			N/A	
Manual de primeros auxilios	SI	1	X			N/A	
Yodopovidona	SI	1	X			15/12/2025	
Solución salina 250 cc ó 500 cc	SI	1	X			20/08/2025	
Alcohol antiséptico	SI	1	X			30/12/2025	
Gasas estériles Paquete por 3 unds	SI	3	X			15/01/2026	
Adhesivo micropore	SI	1	X			01/02/2026	
Esparadrapo de tela	SI	1	X			N/A	
Venditas (tipo cura)	SI	5	X			15/02/2026	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	SI	1	X			30 FEBRERO 2026	
Tijeras punta roma	SI	1	X			N/A	
Baja lenguas	SI	1	X			30/11/2026	
Guantes de látex	SI	2	X			N/A	
Mascarilla desechable (Tapa bocas)	SI	5	X			N/A	
Gafas de seguridad	SI	1	X			N/A	
Termómetro digital	SI	1	X			N/A	
Linterna pequeña (con baterías)	SI	1	X			N/A	
Pito	SI	1	X			N/A	
Camilla plástica polietileno con araña	SI	1	X			N/A	
Collar cervical adulto	SI	1	X			N/A	
NOMBRE QUIEN REALIZA LA INSPECCION	FELIX ALEJANDRO OLIVERAS AGUIRRE						

	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COMUNEROS	VIGENCIA 25 DE MARZO DE 2025
	FORMATO DE SUSTANCIAS QUIMICAS	VERSION 1
DEPARTAMENTO:	**RISARALDA**	
FECHA DILIGENCIAMIENTO:	**28 DE MARZO DE 2025**	
ENTIDAD CONTRATANTE:	**INVIAS**	
SUPERVISION ASIGNADA	**AMV2**	

N°	AREA DE TRABAJO					
	INVENTARIO SUSTANCIAS QUIMICAS	ROTULO		FICHA TECNICA		FECHA DE INSPECCION
		SI	NO	SI	NO	
1	GASOLINA	X		X		14-mar-25
2	ACEITE	X		X		15-mar-25
4	DISOLVENTE	X		X		16-mar-25
5	PINTURAS	X		X		17-mar-25
6	PINTURA EN FRIO	X		X		18-mar-25
7	ASFALTO EN FRIO	X		X		19-mar-25
8	GRASA	X		X		20-mar-25
9	ASFALTO EN CALIENTE	X		X		21-mar-25
10						

PROFESIONAL SST:

FIRMA 

NOMBRE: ELIUDH MURILLO OCAMPO

C.C.: 79052528



E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA - GUATICA RDA
Nit: 891410661 Dirección: CRA. 5A NO. 14-58 Tel: 3539093

INCAPACIDAD MEDICA

Paciente	BERNAL AGUDELO JOSE MARTIN		**Eps**	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	
Identificacion	CC 10125400	**Fecha de Nac** 31/03/1967	**Edad** 57 A	***Genero*** M	**Historia** 10125400
Direccion	BARRIO GALAN	**Ciudad** GUATICA	**Barrio** SAN CLEMENTE		**Fecha Atención** 18/03/2025 12:27
Etnia	Otras etnias		**Zona** R		
Teléfono	3232892420 - 3232892420	**Admision** A1775805			

Dx 1: S819 HERIDA DE LA PIERNA, PARTE NO ESPECIFICADA

Código habilitador del hospital :	**663180079901**
Puede Desarrollar Activades de la vida diaria:	Incapacidad Parcial
Puede Desarrollar Activades Laborales:	Incapacidad Total
Puede Desarrollar Activades de Ocio:	Incapacidad parcial
Grado Incapacidad:	Parcial
Causa de la Incapacidad:	Accidental
PRORROGA	**NO**

Fecha de Inicio Incapacidad: 18/03/2025 **Tiempo Incapacidad:** 5 DIAS **Fecha Finalización :** 22/03/2025

Recomendaciones :

Observaciones :

YESIT BOLAÑOS MORENO
Especialidad: Medico General
Registro médico: 66401-15
Documento de identidad: 1151935559

Usuario: YESIT BOLAÑOS MORENO **Impreso el:** 18/3/2025 13:30 www.puntoexe.com.co Página 1 de 1

Powered by CamScanner

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

ENTIDAD: NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO
CIUDAD: CHINCHINA

INCAPACIDAD POR				COTIZANTE	
Accidente de Tránsito:		ATEP:		Dependiente:	X
Enfermedad General:	X	Maternidad:		Independiente:	
Edad gestacional Recién nacido:	SEMANAS				

25	02	2025
Día	Mes	Año

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ — NIT: 900198012

NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	EDAD(AÑOS)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
ANDICA GAÑAN LUIS AUDONEY	47	15922888

Nro. DIAS	LETRAS	DEL	25 Día	02 Mes	2025 Año	AL	11 Día	03 Mes	2025 Año
15	QUINCE								

PRÓRROGA: ☐ No. DIAS ACUMULADOS: TRANSCRIPCIÓN: ☐ AMBULATORIO: ☐ HOSPITALIZACIÓN: ☐

DIAGNÓSTICOS C.I.E. 10	NOMBRE DEL MEDICO
DX: S220 FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA	Juan Pablo Herrera Médico General No. 75.101.758 Universidad de Manizales JUAN PABLO HERRERA REYES Registro Médico : 75101758

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

HISTORIA CLINICA
15922888

HISTORIA CLINICA DE MEDICINA GENERAL

FECHA 25/02/2025

TIPO DE VINCULACION :	CONTRIBUTIVO	HORA INGRESO :	09:47
NOMBRE DEL PACIENTE :	LUIS AUDONEY ANDICA GAÑAN	DIRECCION :	VDA CHAPATA
DOCUM. DE IDENTIDAD :	CC - 15922888 SEXO : MASCULINO		
E.P.S.	NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO	TELEFONO :	3012660021
F.NACIMIENTO :	28/04/1977 EDAD : 47 Años - 9 Meses - 29 Dias	ESTADO CIVIL :	SOLTERO(A)

SOLICITUD DE EXAMENES

PARACLINICOS: NO REFER

Juan Pablo Herrera
Médico General
No. 75.101.758
Universidad de Manizales

JUAN PABLO HERRERA REYES
Registro Médico : 75101758
Especialidad : MEDICINA GENERAL

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

HISTORIA CLINICA
15922888

HISTORIA CLINICA DE MEDICINA GENERAL

FECHA 25/02/2025

TIPO DE VINCULACION :	CONTRIBUTIVO	HORA INGRESO :	09:47
NOMBRE DEL PACIENTE :	LUIS AUDONEY ANDICA GAÑAN	DIRECCION :	VDA CHAPATA
DOCUM. DE IDENTIDAD :	CC - 15922888 SEXO : MASCULINO		
E.P.S.	NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO	TELEFONO :	3012660021
F.NACIMIENTO :	28/04/1977 EDAD : 47 Años - 9 Meses - 29 Dias	ESTADO CIVIL :	SOLTERO(A)

MOTIVO DE CONSULTA:

PARA PRORROGA DE INCAPCIDADA

ENFERMEDAD ACTUAL:

PACIENTE DE 47 AÑOS DE EDAD CON ANTYECEDTENS DE FZX DE VERETEBRA, ADEMAS DE ANBTEBRAZOP QUIENCENLEMOEMTNOSE ENCUENTRA ESTABLE PENDIETNE DE VALROAICONPOR PARTTE DE ORTOEPEIA Y DE NEURCX PORLOCUAL OCNSUTLA PARA PRORROGA DE INCAPACITADO

REVISION POR SISTEMAS:

NORMAL

ANTECEDENTES PERSONALES

PATOLOGICOS :	FX DE ANTEBRAZO IZQUIERDO. FX COLUMNA DORSAL.
HOSPITALARIOS :	NINGUNO
QUIRURGICOS :	MOS DE MIEMBRO SUPERIRO IZQUIERDO. OSTEOSINTESIS ANCLAJE? VERTEBRAS TORACICAS (AGOSTO 2023)
TOXICO-ALERG :	NEG
HABITOS :	N
MEDICAMENTOSOS :	NINGUNO
TRAUMATICOS :	NINGUNO
INMUNIZACION :	VACUNACION COVID 19 3 DOSIS

ANTECEDENTES FAMILIARES

N/A

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

HISTORIA CLINICA
15922888

HISTORIA CLINICA DE MEDICINA GENERAL

FECHA 25/02/2025

TIPO DE VINCULACION :	CONTRIBUTIVO	HORA INGRESO :	09:47
NOMBRE DEL PACIENTE :	LUIS AUDONEY ANDICA GAÑAN	DIRECCION :	VDA CHAPATA
DOCUM. DE IDENTIDAD :	CC - 15922888 SEXO : MASCULINO		
E.P.S.	NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO	TELEFONO :	3012660021
F.NACIMIENTO :	28/04/1977 EDAD : 47 Años - 9 Meses - 29 Dias	ESTADO CIVIL :	SOLTERO(A)

EXAMEN FISICO

T.A: 110/70 **F.C:** 80 **F.R:** 16 **TEMP:** 36.5 **P.CEFALICO:** **TALLA(m):** 1.58 **PESO(Kg):** 59 **IMC:** 23.63

E.GENERAL :

PACIENTE EN APRENTE BUENAS CODNEISONGENERE DE SALUD SINSRIS CLINICO

CABEZA :

SIN ALTERACIONES

OJOS :

SIN ALTERACIONES

ORL :

SIN ALTERACIONES

CUELLO:

SIN ALTERACIONES

CARDIOPULMONAR:

RUIDOS CARDIACOS RITMCISODE BUEN TONO NOSE ASUSUTLA SOPLOSCAMPOSPULMOANRES LIMPIOS SI SOBREAGREGADOSMURMULL OVESICUALR PRESEN

ABDOMEN:

SIN ALTERACIONES

GENITOURINARIO/MAMAS/ANO/RECTO:

SIN ALTERACIONES

OSTEOMUSCULAR:

PUNTOS PARAVERTEBRALES POSITIVOS SINGOS DE IRRITACION RADICUALR

PIEL Y FANERAS:

SIN ALTERACIONES

NEUROLOGICO:

SIN ALTERACIONES

MENTAL:

SIN ALTERACIONES

IMPRESION DIAGNOSTICA

C. EXTERNA : 13-ENFERMEDAD GENERAL FINALIDAD : 10-NO APLICA TIPO DX: 2-CONFIRMADO NUEVO

DX PRINCIPAL : S220 - FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA

DX RELACIONADO 1 : S529 - FRACTURA DEL ANTEBRAZO PARTE NO ESPECIFICADA

DX RELACIONADO 2 : -

DX RELACIONADO 3 : -

PLAN DE MANEJO

FORMULACION: NO SE FORMULA

MEDIDAS COMPLEMENTAR: PACIENTE DE 47 AÑOS DE EDAD CON ANTYECEDTENS DE FZX DE VERETEBRA, ADEMAS DE ANBTEBRAZOP QUIENCENLEMOEMTNOSE ENCUENTRA ESTABLE PENDIETNE DE VALROAICONPOR PARTTE DE ORTOEPEIA Y DE NEURCX PORLOCUAL OCNSUTLA PARA PRORROGA DE INCAPACITADO

Clínica Roque Armando López

ASIGNACION DE CITAS

FECHA: 11-04-25

HORA: 10:40 a/s

MÉDICO: INCAPACIDAD

RECUERDE ESTAR 20 MINUTOS ANTES

SI LA VA A CANCELAR DEBE HACERLO 12 HORAS ANTES

TELEFONO (3336025679)

WHATSAPP (3146958084)

QUE ARMANDO LOPEZ

T 900198012-3

INCAPACIDAD POR				COTIZANTE		
e de Tránsito:		ATEP:		Dependiente:	X	
edad General:	X	Maternidad:		Independiente:		
estacional / nacido:	SEMANAS			27 Día	03 Mes	2025 Año

NIT: 900198012

EDAD(AÑOS)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
47	15922888

DEL	27 Día	03 Mes	2025 Año	AL	10 Día	04 Mes	2025 Año

PCIÓN [ ] AMBULATORIO [ ] HOSPITALIZACIÓN [ ]

DIAGNÓSTICOS C.I.E. 10	NOMBRE DEL MEDICO
DX: S220 FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA DX R1: S525 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	Juan Pablo Herrera Médico General No. 75.101.758 Universidad de Manizales JUAN PABLO HERRERA REYES Registro Médico : 75101758

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

HISTORIA CLINICA
15922888

HISTORIA CLINICA DE MEDICINA GENERAL

FECHA 27/03/2025

TIPO DE VINCULACION :	CONTRIBUTIVO	HORA INGRESO :	12:08
NOMBRE DEL PACIENTE :	LUIS AUDONEY ANDICA GAÑAN	DIRECCION :	VDA CHAPATA
DOCUM DE IDENTIDAD :	CC - 15922888 SEXO : MASCULINO		
E.P.S :	NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO	TELEFONO :	3012660021
F.NACIMIENTO :	28/04/1977 EDAD : 47 Años - 10 Meses - 29 Dias	ESTADO CIVIL :	SOLTERO(A)

MOTIVO DE CONSULTA:

PARA PRORROGA DE INCAPCIDAD O

ENFERMEDAD ACTUAL:

PAACIENTE DE 47 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDETENS DE FX DE VERTEBRA TORACICA TY ADEMAS DE EPIFISIS DEL RADIOQUEINSE ENCUENTRA EN EWL MOMENTO PENIENTE DE VALROAICVON POR PARTE DE ORTOPEDIA Y NEUROCX EN EL MOEMTNO COEMTNA QUE EL DOLOR ES PCOOTLERABLE PORLOCUALDECIDEOCSNTAR

REVISION POR SISTEMAS:

NORMAL

ANTECEDENTES PERSONALES

PATOLOGICOS : FX DE ANTEBRAZO IZQUIERDO. FX COLUMNA DORSAL.
HOSPITALARIOS : NINGUNO
QUIRURGICOS : MOS DE MIEMBRO SUPERIRO IZQUIERDO. OSTEOSINTESIS ANCLAJE? VERTEBRAS TORACICAS (AGOSTO 2023)

TOXICO-ALERG : NEG
HABITOS : N
MEDICAMENTOSOS : NINGUNO

TRAUMATICOS : NINGUNO
INMUNIZACION : VACUNACION COVID 19 3 DOSIS

ANTECEDENTES FAMILIARES

N/A

EXAMEN FISICO

T.A: 110/70 F.C: 80 F.R: 16 TEMP: 36.5 P.CEFALICO: TALLA(m): 1.58 PESO(Kg): 59 IMC: 23.63

E.GENERAL : PACIENTE ENAPRENTE ACEPTABLES CODNEIOSNGENERES DE SALUD SINSRIS, CLINICO
CABEZA : SIN ALTERACIOENS

OJOS : SIN ALTERACIOENS

ORL : SIN ALTERACIOENS

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

HISTORIA CLINICA
15922888

HISTORIA CLINICA DE MEDICINA GENERAL

FECHA 27/03/2025

UELLO:
SIN ALTERACIOENS

CARDIOPULMONAR:
SIN ALTERACIOENS

ABDOMEN:
SIN ALTERACIOENS

GENITOURINARIO/MAMAS/ANO/RECTO:
SIN ALTERACIOENS

OSTEOMUSCULAR:
DOLOR PALCI OEN REGION DORSA ADEMAS EN CODO DERECHO

PIEL Y FANERAS:
SIN ALTERACIOENS

NEUROLOGICO:
SIN ALTERACIOENS

MENTAL:
SIN ALTERACIOENS

IMPRESION DIAGNOSTICA

C. EXTERNA : 13-ENFERMEDAD GENERAL FINALIDAD : 10-NO APLICA TIPO DX: 2-CONFIRMADO NUEVO

DX PRINCIPAL : S220 - FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA

DX RELACIONADO 1 : S525 - FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO

DX RELACIONADO 2 : -

DX RELACIONADO 3 : -

PLAN DE MANEJO

FORMULACION: SE FORMULA

MEDIDAS COMPLEMENTAR: PAACIENTE DE 47 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDETENS DE FX DE VERTEBRA TORACICA TY ADEMAS DE EPIFISIS DEL RADIOQUEINSE ENCUENTRA EN EWL MOMENTO PENIENTE DE VALROAICVON POR PARTE DE ORTOPEDIA Y NEUROCX EN EL MOEMTNO COEMTNA QUE EL DOLOR ES PCOOTLERABLE PORLOCUALDECIDEOCSNTAR

SOLICITUD DE EXAMENES

PARACLINICOS: SE FORMULA

Juan Pablo Herrera
Médico General
No. 75.101.758
Universidad de Manizales

JUAN PABLO HERRERA REYES
Registro Médico : 75101758
Especialidad : MEDICINA GENERAL

RAL

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

INCAPACIDAD POR				COTIZANTE		
Accidente de Tránsito:		ATEP:		Dependiente:	X	
Enfermedad General:	X	Maternidad:		Independiente:		

ENTIDAD: NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO

CIUDAD: CHINCHINA

Edad gestacional Recién nacido: SEMANAS

10	03	2025
Día	Mes	Año

IPS: CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ — NIT: 900198012

NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO	EDAD(AÑOS)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
ANDICA GAÑAN LUIS AUDONEY	47	15922888

Nro. DIAS	LETRAS	DEL	12 Día	03 Mes	2025 Año	AL	26 Día	03 Mes	2025 Año
15	QUINCE								

PRÓRROGA [ ] No. DIAS ACUMULADOS: TRANSCRIPCIÓN [ ] AMBULATORIO [ ] HOSPITALIZACIÓN [ ]

DIAGNÓSTICOS C.I.E. 10	NOMBRE DEL MEDICO
DX: S220 FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA DX R1: S525 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	Juan Pablo Herrera Médico General No. 75.101.758 Universidad de Manizales JUAN PABLO HERRERA REYES Registro Médico : 75101758

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3
TEL 8400430 Carrera 9 #10-41

DOCUMENTO : CC 15922888
NOMBRE : ANDICA GAÑAN LUIS AUDONEY
E.P.S. NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO
TIPO USUARIO : CONTRIBUTIVO

FÓRMULA NRO. **70350**
FECHA: 10/03/2025
VIGENCIA: 7 horas

DIAGNÓSTICO : S220 - FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA

MEDICAMENTO	Cantidad	POSOLOGIA
CLORFENIRAMINA MALEATO TAB 4 MG	30 (TREINTA)	1 TABCAD A8 HORAS
Duración del Tratamiento: 10 dias	Via Admin:ORAL	Obser:

JUAN PABLO HERRERA REYES
Registro Médico : 75101758
Especialidad : MEDICINA GENERAL

Firma del Paciente

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

HISTORIA CLINICA
15922888

HISTORIA CLINICA DE MEDICINA GENERAL

FECHA 10/03/2025

TIPO DE VINCULACION :	CONTRIBUTIVO	HORA INGRESO :	10:39
NOMBRE DEL PACIENTE :	LUIS AUDONEY ANDICA GAÑAN	DIRECCION :	VDA CHAPATA
DOCUM. DE IDENTIDAD :	CC - 15922888 SEXO : MASCULINO		
E.P.S.	NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO	TELEFONO :	3012660021
F.NACIMIENTO :	28/04/1977 EDAD : 47 Años - 10 Meses - 12 Dias	ESTADO CIVIL :	SOLTERO(A)

MOTIVO DE CONSULTA:

PARA PRORROGA DE NCAPCIDAD

ENFERMEDAD ACTUAL:

PACIENTE DE 47 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDETENS DE FX DE VERTEBRATORACICA , ADEMAS DE FX DE EPISIF DE RADIO QUIENCONSUTLA ELDIA DE HOY POR CVUAL CONSUTOLA WEN ELMOMENTO SE ENCUENTRA ESTABLE SINALTERACIOESNASODIADAS

REVISION POR SISTEMAS:

NORMAL

ANTECEDENTES PERSONALES

PATOLOGICOS : FX DE ANTEBRAZO IZQUIERDO. FX COLUMNA DORSAL.

HOSPITALARIOS : NINGUNO

QUIRURGICOS : MOS DE MIEMBRO SUPERIRO IZQUIERDO. OSTEOSINTESIS ANCLAJE? VERTEBRAS TORACICAS (AGOSTO 2023)

TOXICO-ALERG : NEG

HABITOS : N

MEDICAMENTOSOS : NINGUNO

TRAUMATICOS : NINGUNO

INMUNIZACION : VACUNACION COVID 19 3 DOSIS

ANTECEDENTES FAMILIARES

N/A

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

HISTORIA CLINICA
15922888

HISTORIA CLINICA DE MEDICINA GENERAL

FECHA 10/03/2025

TIPO DE VINCULACION :	CONTRIBUTIVO	HORA INGRESO :	10:39
NOMBRE DEL PACIENTE :	LUIS AUDONEY ANDICA GAÑAN	DIRECCION :	VDA CHAPATA
DOCUM. DE IDENTIDAD :	CC - 15922888 SEXO : MASCULINO		
E.P.S.	NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO	TELEFONO :	3012660021
F.NACIMIENTO :	28/04/1977 EDAD : 47 Años - 10 Meses - 12 Dias	ESTADO CIVIL :	SOLTERO(A)

EXAMEN FISICO

T.A: 120/70 **F.C:** 80 **F.R:** 16 **TEMP:** 36.5 **P.CEFALICO:** **TALLA(m):** 1.58 **PESO(Kg):** 59 **IMC:** 23.63

E.GENERAL :
PACIENTE ENAPRENTE BUENA SCODNEISON GENERES DE SALUD SINSRIS CINICO

CABEZA :
SIN ALTERACIOESN

OJOS :
SIN ALTERACIOESN

ORL :
SIN ALTERACIOESN

CUELLO:
SIN ALTERACIOESN

CARDIOPULMONAR:
SIN ALTERACIOESN

ABDOMEN:
SIN ALTERACIOESN

GENITOURINARIO/MAMAS/ANO/RECTO:
SIN ALTERACIOESN

OSTEOMUSCULAR:
PUNTOS PARAVERTEBRALES POSTIVOS IMPREION SINGODE IRRTACION RADICUALR

PIEL Y FANERAS:
SIN ALTERACIOESN

NEUROLOGICO:
SIN ALTERACIOESN

MENTAL:
SIN ALTERACIOESN

IMPRESION DIAGNOSTICA

C. EXTERNA : 13-ENFERMEDAD GENERAL FINALIDAD : 10-NO APLICA TIPO DX: 2-CONFIRMADO NUEVO

DX PRINCIPAL : S220 - FRACTURA DE VERTEBRA TORACICA

DX RELACIONADO 1 : S525 - FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO

DX RELACIONADO 2 : -

DX RELACIONADO 3 : -

PLAN DE MANEJO

FORMULACION: SE FORMULA

MEDIDAS COMPLEMENTAR: PACIENTE DE 47 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDETENS DE FX DE VERTEBRATORACICA , ADEMAS DE FX DE EPISIF DE RADIO QUIENCONSUTLA ELDIA DE HOY POR CVUAL CONSUTOLA WEN ELMOMENTO SE ENCUENTRA ESTABLE SINALTERACIOESNASODIADAS

IPS CLINICA ROQUE ARMANDO LOPEZ

NIT 900198012-3

HISTORIA CLINICA
15922888

HISTORIA CLINICA DE MEDICINA GENERAL

FECHA 10/03/2025

TIPO DE VINCULACION :	CONTRIBUTIVO	HORA INGRESO :	10:39
NOMBRE DEL PACIENTE :	LUIS AUDONEY ANDICA GAÑAN	DIRECCION :	VDA CHAPATA
DOCUM. DE IDENTIDAD :	CC - 15922888 SEXO : MASCULINO		
E.P.S.	NUEVA EPS S.A.S CONTRIBUTIVO	TELEFONO :	3012660021
F.NACIMIENTO :	28/04/1977 EDAD : 47 Años - 10 Meses - 12 Dias	ESTADO CIVIL :	SOLTERO(A)

SOLICITUD DE EXAMENES

PARACLINICOS: NO REQUIERE

Médico General
No. 75.101.758
Universidad de Manizales

JUAN PABLO HERRERA REYES
Registro Médico : 75101758
Especialidad : MEDICINA GENERAL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
NIT 860.011.153-6

Línea segura ARL
Bogotá 3307000
Resto del pais 01 8000 111170
Desde su Celular #533

Fecha de reporte : 18/03/2025 Estado : Procesado
Fecha de impresión : 18/03/2025
Número de radicación : 8395094
Id Accidente de Trabajo : -
Id del Siniestro : -

FORMATO DE INFORME PARA ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Diligenciado Por: Formulario Web - EMPRESA | EPS: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES E.P.S.
AFP: COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS | ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A./ARL

I IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR CONTRATANTE O COOPERATIVA

No documento	Tipo de Doc	Nombre o razon social	Tipo de vinculación
800017418	N	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COMUNEROS LTDA	Empleador

Dirección sede principal	Dirección reportada
CORREGIMIENTO DE SAN CL EMENTE GUATICA	

Actividad económica (Sede principal)	Código
CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LAS OBRAS DE SUPERFICIE EN CALLES, CARRETERAS, AUTOPISTAS, PUENTES O TUNELES COMO ASFALTADO, PINTURA Y OTROS TIPOS DE MARC	5421002

Teléfono	Fax	E-mail	Departamento	Municipio	Zona
3206941859	0	coopcomuneros@gmail.com	RISARALDA	GUATICA	Urbana

Son los datos del C.T. los mismos de la sede principal?	Dirección del centro de trabajo
SI	CORREGIMIENTO DE SAN CL EMENTE GUATICA

Actividad económica del centro de trabajo	Código
CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LAS OBRAS DE SUPERFICIE EN CALLES, CARRETERAS, AUTOPISTAS, PUENTES O TUNELES COMO ASFALTADO, PINTURA Y OTROS TIPOS DE MARC	5421002

Teléfono	Fax	E-mail	Departamento	Municipio	Zona
3206941859	0		RISARALDA	GUATICA	Urbana

II INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

No documento	Tipo de Doc	Fecha de nacimiento	Sexo	Tipo de vinculación
10125400	C	31/03/1967	M	(1) Dependiente

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
BERNAL	AGUDELO	JOSE	MARTIN

Dirección	Correo electrónico	Teléfono	Fax
CORREG. DE S		7654321	

Departamento	Municipio	Zona	Fecha de ingreso a la empresa	Salario mensual	Jornada habitual
RISARALDA	GUATICA	Urban	01/06/1997	1.600.000	(1) Diurna

Ocupación	Código
OTRAS OCUPACIONES	9999

III INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)

Fecha del accidente	Hora del accidente	Dia de la semana	Jornada en que sucede	Realiza su labor
18/03/2025	10:00	Martes	(1) Normal	(1) Si

Ocupación no habitual	Tiempo laborado	Lugar donde ocurre el AT
SIN INFORMACIÓN	03:00	(2) Fuera de la empresa

Mecanismo o forma del AT	Tipo de lesión	Sitio	Tipo de accidente
(3) Pisadas, choques o golpes	(41) Herida	(6) Paqueaderos o areas de cu	(5) Propios del trabajo

Parte del cuerpo afectada	Agente del accidente
(5) Miembros inferiores	(336) Herramientas, implementos o utensilios

Departamento	Municipio	Zona AT	Mortal	Fecha mortal
RISARALDA	GUATICA	Rural	(2)No	

IV DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

AL MOMENTO DE REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA Y DESYERBADO CON MACHETE, DE LA CUNETA O ZANJA DE LA VÍA ENTRE LA VIRGINIA Y ANSERMA, A LA ALTURA DEL PR 45 + 600 SECTOR DE PUENTE LÁZARO, AL COMPAÑERO LE REBOTO EL MACHETE GENERÁNDOLE UNA HERIDA EN LA PIERNA DERECHA A LA ALTURA DE LA CANILLA

Datos del jefe inmediato

Nombres	Apellidos	Correo electrónico	Teléfono

Hubo personas que presenciaron el accidente? No

	Tipo Doc	N° Doc
Testigos 1		
Testigos 2		
Responsable MURILLO OCAMPO ELIUDH Firma	Tipo Doc C	N° Doc 79052528

Si usted requiere actualizar información relacionada con los módulos I y II del formulario, por favor acérquese al punto de atención más cercano y solicite el 'Formulario de novedades de ingreso del trabajador dependiente a la administradora de riesgos laborales', marcando el campo actualización y diligenciando los datos correctos. O a través del portal web de afiliaciones.

En cumplimiento del art. 14 Ley 472 de 2015 se recuerda la obligatoriedad de reporte de accidentes graves y mortales y de enfermedades laborales directamente a la Dirección Territorial y oficinas especiales correspondientes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad

Emergencias: tel 018000 51 1414 (todo el país). Servicio 24 horas
Centro de Informacion de Sustancias Quimicas, Emergencias y Medio Ambiente

ARP | sura
Cistema

HOJA DE SEGURIDAD

ACPM



1202

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO

Sinónimos: Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N°2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel.
Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo.
Puede estar coloreado para identificación.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Líquido inflamable, peligro moderado de incendio o explosión del líquido o el vapor en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Algunos de sus componentes pueden causar cáncer según ensayos en animales.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C20, principalmente alifáticos y en menor proporción olefínicos, nafténicos y aromáticos.
CAS [68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias; provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal capacitado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato.
Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste irritación.
Ingestión: Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido, dele a beber dos vasos de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga la víctima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato.
Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Consideraciones especiales: Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión.
Procedimiento: Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío, y retírelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores.
Utilice equipo de respiración autocontenido. La ropa normal de bomberos proporciona protección limitada para este producto y sólo se recomienda para operaciones rápidas de entrada-salida en casos especiales.
Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular.
Fuegos grandes: espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma de chorro.
NFPA: Salud **1**; Inflamabilidad **2**; Inestabilidad **0** (clasificación oficial según la NFPA).

SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.
Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita.
NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.
Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Active su plan de emergencias.
Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Consulte con las autoridades ambientales sobre la posibilidad de utilizar agentes dispersantes o de hundimiento.
Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas y Tapetes.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO


Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos o brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con ojos, piel y ropa.
Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25 ℃).
El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

TWA: 100 mg/m^3, fracción inhalable y vapor (ACGIH). **IDLH:** 1300 ppm

Elementos de protección personal sugeridos:


>8hr: Caucho de nitrilo, viton.


>8hr: Caucho de nitrilo


Si la protección respiratoria no incluye pieza facial completa, gafas de seguridad para químicos a prueba de salpicaduras, o monogafas


De 50 a 1000 mg/m^3: respirador purificador de aire con media máscara y cartucho para vapores orgánicos.
1000 mg/m^3: respirador con línea de aire (SAR) en flujo continuo.
Mayores que 1000 mg/m^3 o desconocidas: Equipo de respiración autocontenido.


Para evitar contacto prolongado o repetido: **>8hr:** Viton.
Riesgo leve o moderado de salpicaduras: traje en Tychem o equivalentes;
Emergencias: Tyvek-SL, CPF 3 ó 4, Responder, Reflector o equivalentes.


Ducha


Lavaojos

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Intervalo de ebullición: Oscila entre 215 y 380 ℃ dependiendo del fabrican te.
Gravedad específica: 0,83-0,88 a 15℃ (agua=1) Menos pesado que el agua . **Temperatura de autoignición:** 230 ℃.
Velocidad de evaporación: Baja. < 0,1 (Acetato de butilo=1) **Valor de pH:** Neutro. Puede contener aditivos que afecten este valor.
Temperatura de inflamación: 54 ℃. **Densidad del vapor:** 3 a 4 (aire=1). Más pesado que el aire
Límites de explosividad: Inferior: 1,3 %. Superior: 6% **Umbral de olor:** 0,1 ppm.
Solubilidad: Solubilidad en agua despreciable (<0.1%). Soluble en éter, cloroformo y solventes derivados del petróleo.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento.
Incompatibilidades: Incompatible con oxidantes fuertes (como ácido nítrico, hipoclorito de sodio). No corrosivo a los metales.
Condiciones a evitar: Fuentes de ignición como chispas, llamas abiertas y calor intenso. Acumulación de cargas electrostáticas.
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos reactivos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38℃). Concentraciones altas del vapor producen Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte.
Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación.
Contacto con los ojos: Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo.
Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central, presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía.
Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, resquebrajamiento y posible infección secundaria. Reacciones alérgicas en algunos individuos. **Carcinogenicidad:** Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (**clase A1**) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Recupérelo y reutilícelo o envíelo a incineración en un horno adecuado, que tenga Licencia Ambiental.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

La etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 cm de lado. Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer.
Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases (clase 2), oxidantes (clase 5.1), ni con tóxicos (clase 6.1). Puede transportarse con sustancias de la clase 9, solo si están separados de tal manera que no se mezclen en caso de derrame. Apague el motor cuando cargue y descargue (aún si no requiere poner a funcionar la bomba de carga). No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el contenedor. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiquetado según directivas de la UE:
F - Inflamable
Xn - Nocivo





Sistema Globalmente Armonizado:



Atención
Líquido y vapor inflamables

Atención
Nocivo por ingestión, contacto e inhalación

Líquido y vapor combustibles. Peligro de incendio o explosión
Frases R: 40, 51/53, 65, 66 - Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Frases S: 2, 29, 36/37, 61, 62 - Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instruccciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL

BIBLIOGRAFIA:

1. NFPA, Fire protection guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.
2. Forsberg, K., et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3a edición. Van Nostrand Reinhold, 1997. p. 67
3. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 15 edición. USA. 2007.
4. CCOHS. Base de datos MSDS (08-4) en CD-ROM. Canadá. Noviembre de 2008. Registros 1201117, 542527, 503831, 421419.
5. ACGIH. Threshlold Limit Values for Chemical Substances (TLVs). USA. 2008.
6. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Bogotá. MinTransporte. 2002.

FECHA DE EMISIÓN: Enero de 2009 **ACPM**

Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se dé a esta información.

Mobil Super™ 1000 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Lubricante Mobil para vehículos de pasajeros

Descripción del producto

Mobil Super™ 1000 20W-50 le llega a usted de la mano de los fabricantes de Mobil 1. Este aceite mineral premium para motores está diseñado para prolongar la vida útil del motor y satisfacer las necesidades de mantenimiento más exigentes de su vehículo.

Propiedades y beneficios

- Apto para la mayoría de los motores de gasolina japoneses y coreanos
- Mejora la eficiencia del motor reduciendo el preencendido a bajas revoluciones (LSPI)
- Protección prolongada contra la formación de depósitos
- Protección del motor durante el arranque
- Ayuda a combatir los lodos

Aplicaciones

Mobil Super 1000 20W-50 ha sido formulado para usarse en casi todos los tipos de vehículos. ExxonMobil recomienda el aceite Mobil Super 1000 Everyday Protection especialmente para la conducción diaria en condiciones normales.

- Casi todas las tecnologías de motores de gasolina
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Condiciones de operación normales
- Aptos para utilizarse en una amplia gama de condiciones de temperatura

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SM
API SN

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SN PLUS
API SP

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 20W-50
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	167
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	19,5
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	252
Densidad @ 15 C g/ml, ASTM D4052	0,87

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

06-2023
Organización Terpel S.A.
Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil
Exxon Mobil Esso XTO ENERGY
© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved

Terpel Celerity FB
JASO FB/ API TC

Lubricantes para motos de dos tiempos a gasolina.

1. DESCRIPCIÓN



El **Terpel Celerity JASO FB** es un lubricante de bajo contenido de cenizas, formulado para motocicletas de dos tiempos que requieran un lubricante de baja producción de carbón y de efectiva protección contra el desgaste y ralladuras.

2. BENEFICIOS

- Efectiva protección contra ralladuras y desgaste.
- Evita el ataque corrosivo y la herrumbre.
- Mantiene el motor limpio, evita la formación de depósitos, pegamiento de anillos y taponamiento del sistema de escape.
- Mejor encendido, manteniendo las bujías completamente limpias.
- Miscibilidad instantánea con el combustible.

3. APLICACIONES

- El lubricante **Terpel Celerity JASO FB** se emplea en gran variedad de equipos que utilizan motores de dostiempos a gasolina enfriados por aire o con sistema de refrigeración como: motocicletas, cortadoras de césped, sierras de cadena, etc.
- Se utiliza en motores fuera de borda enfriados por agua hasta 65 HP y donde el fabricante no exija aceites lubricantes calidad TC-W.
- Se emplea en diferentes relaciones de mezcla combustible / aceite de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de equipos, especialmente 50/1.

4. NIVEL DE CALIDAD

- Supera los niveles de servicio JASO FB/API TC.
- **Producto certificado con SELLO DE CALIDAD ICONTEC 2218**

5. INSPECCIONES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	
Viscosidad, cSt a 100 °C, mínimo	6,5 – 8,3
Índice de viscosidad	100
T.B.N. ASTM D - 2896	0,5 – 1,5
Punto de inflamación, °C mínimo	88
Punto de fluidez, °C máximo	-6
Cenizas sulfatadas, % W (peso) máximo	0.18

NOTA: Estos valores son típicos del producto, si se requieren los valores específicos del lote de producción solicite el Certificado de Calidad y/o consulte con el Departamento Técnico.

6. RECOMENDACIONES

- Mantenga en perfecto estado el sistema de inyección de aceite / combustible. Nunca adicione aceite al tanque de gasolina, el excedente de aceite genera carbonado prematuro.
- En los sistemas donde se agrega el aceite manualmente al combustible, utilice la proporción exacta recomendada por el fabricante.
- Mantenga sincronizado el motor, Relación: aire – combustible y aceite.
- Los lubricantes están desarrollados para cumplir con todos los requerimientos de funcionamiento del motor, por lo tanto no requieren adivinación extra. No los contamine durante la aplicación.
- Cuide el aceite, valiosa inversión en su vehículo.

7. ADVERTENCIAS

- Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
- Lávese con abundante agua y jabón.
- No arroje residuos aceitosos.

	Especificación Técnica del Catálogo de Productos de Ecopetrol S.A. Gasolina Básica Corriente (Gasolina Motor Regular)		
	Gestión Cadena de Suministro Departamento de Medición y Balance de Hidrocarburos		
	CODIGO GCS-ET-026	**Elaborado 08/06/2021**	**Versión: 4**

TABLA DE CONTENIDO

1. NOMBRE 2
2. DESCRIPCIÓN 2
3. USOS 2
4. PRECAUCIONES DE USO Y MANEJO 2
5. LOGÍSTICA DE VENTA 3
6. SITIO DE PRODUCCIÓN 3
7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3

El catálogo de productos de Ecopetrol tiene por finalidad brindar al usuario información general relacionada con el portafolio de productos comercializados por Ecopetrol S.A. La información provista no es una oferta en los términos del Código de Comercio Colombiano. Su propósito es únicamente informativo. Ecopetrol S.A. no se hace responsable por el uso o interpretación realizada por terceros.

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

	Especificación Técnica del Catálogo de Productos de Ecopetrol S.A. Gasolina Básica Corriente (Gasolina Motor Regular)		
	Gestión Cadena de Suministro Departamento de Medición y Balance de Hidrocarburos		
	CODIGO GCS-ET-026	Elaborado 08/06/2021	Versión: 4

1. NOMBRE

Nombre por Resolución: Gasolina Básica Corriente.
Nombre común: Gasolina Motor Regular o Gasolina Corriente.

2. DESCRIPCIÓN

La gasolina es una mezcla compleja que tiene de 200 a 300 diferentes tipos de hidrocarburos, formada por fracciones de combustibles provenientes de distintos procesos de refinación de petróleo, como la destilación atmosférica, craqueo catalítico, craqueo térmico, alquilación, reformado catalítico y polimerización, entre otros. La mezcla físicamente consiste, en reunir dos o más componentes en tales proporciones, que el resultado final cumpla con las especificaciones de calidad requeridas, que no reúne ninguna base o componente individualmente.

3. USOS

La Gasolina Básica Corriente es suministrada a los distribuidores mayoristas de combustibles, los cuales luego de mezclarla con alcohol etílico combustible y un paquete de aditivos detergente dispersante – controlador de formación de depósitos, la pueden suministrar al usuario final como Gasolina Corriente Oxigenada, siempre que cumpla con las especificaciones establecidas en la Tabla 2B de la Resolución 1180 del 21 de junio de 2006.

4. PRECAUCIONES DE USO Y MANEJO

La gasolina se clasifica como un líquido inflamable Clase IA de acuerdo con la NFPA 30, siendo esta la categoría que tiene los mayores riesgos inherentes. Se debe tener especial cuidado en cumplir los estándares para tanques de almacenamiento, tuberías, sistemas de llenaderos, carrotanques, estaciones de servicio y usuarios finales en general.

Cuando se diseñen plantas de almacenamiento, estaciones de servicio o cualquier otra instalación para el manejo de la gasolina, deben aplicarse las normas NFPA en lo relacionado y con la protección contra incendios, las normas API (American Petroleum Institute) y las reglamentaciones expedidas por las autoridades de control, tanto nacionales como regionales y locales.

No es recomendable dar a este producto usos diferentes del mencionado, debido a que los vapores que genera son más pesados que el aire, por lo tanto, tienden a depositarse en lugares bajos donde están localizadas normalmente las fuentes de ignición tales como pilotos de estufas, interruptores de corriente eléctrica, tomas de corriente y puntos calientes tales como lámparas incandescentes, los cuales pueden producir incendios y explosiones.

Debe evitarse el contacto con la piel y la inhalación de vapores debido a que éstos son tóxicos y en concentraciones altas pueden causar mareos, pérdida del conocimiento y, en casos extremos, la muerte. Si ocurre un accidente de esta naturaleza, consiga lo antes posible atención médica. No debe usarse para limpieza de manos o cualquier otra parte del cuerpo humano.

El catálogo de productos de Ecopetrol tiene por finalidad brindar al usuario información general relacionada con el portafolio de productos comercializados por Ecopetrol S.A. La información provista no es una oferta en los términos del Código de Comercio Colombiano. Su propósito es únicamente informativo. Ecopetrol S.A. no se hace responsable por el uso o interpretación realizada por terceros.

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

Por ningún motivo almacene gasolina en una casa, apartamento o en cualquier recinto cerrado. El combustible se evapora continuamente y, además de generar una atmósfera de vapores tóxicos, puede causar un incendio o una explosión. Para su manejo seguro utilice ropa impermeable adecuada, gafas y guantes de seguridad.

Número CAS (Chemical Abstracts Service): 8006-61-9.
Número UN (Naciones Unidas): 1203.

5. LOGÍSTICA DE VENTA

Puede ser entregada a distribuidores mayoristas por tubería desde las refinerías, carrotanques en estaciones de servicio, buques a puertos alternos, botes desde - hacia Barrancabermeja y exportaciones a buquetanques. De igual forma por poliductos a plantas almacenadoras.

6. SITIO DE PRODUCCIÓN

Se produce en las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS		UNIDADES	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	
				Mínimo	Máximo
1	IAD (Índice antidetonante)(1)		ASTM D2699 & ASTM D2700	Reportar	
2	RON (Research Octane Number)		ASTM D2699	84	
3	Plomo	g/l	ASTM D3237 ó ASTM D5059		0,013
4	RVP(2)	kPa / psi	ASTM D 5191		55 / 8,0
5	Aromáticos	%(v/v)	ASTM D5580 ó ó D1319		28
6	Benceno	%(v/v)	ASTM D5580 ó ASTM D3606 ó ASTM D6729		1,0
7	Azufre	mg/kg (ppm)	ASTM D2622 ó ASTM D4294		50(3)
8	Corrosión al cobre, 3h a 50ºC	Clase	ASTM D 130		1
9	Contenido de Gomas (lavables)	mg/100mL	ASTM D 381		5

El catálogo de productos de Ecopetrol tiene por finalidad brindar al usuario información general relacionada con el portafolio de productos comercializados por Ecopetrol S.A. La información provista no es una oferta en los términos del Código de Comercio Colombiano. Su propósito es únicamente informativo. Ecopetrol S.A. no se hace responsable por el uso o interpretación realizada por terceros.

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

10	Estabilidad a la Oxidación a 100 °C	minutos	ASTM D 525	240	
11	Destilación	°C	ASTM D 86 ó ASTM D 7345		
	10% Vol. Evaporado				70
	50% Vol. Evaporado			77	121
	90% Vol. Evaporado				190
	Punto Final de Ebullición				225

Notas:

(1) Índice Antidetonante: IAD = (RON+MON)/2
(2) RVP: Presión de Vapor Reíd, a 37,8 °C"
(3) Valor promedio de entregas mensuales por refinería permitiendo picos de hasta 65 ppm.
(4) La presente ficha técnica especifica los parámetros de calidad establecidos por Ecopetrol a partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40103 expedida por el Ministerio de Minas y Energía el 7 de abril de 2021, no obstante, la resolución 40103 confiere un término de 6 meses contados a partir de su vigencia para consumir hasta agotar los inventarios existentes de combustible que hayan sido producidos, importados o distribuidos con los parámetros y requisitos establecidos en la normatividad anterior. Lo anterior sin perjuicio, de los periodos de transición previstos en las tablas 3B de la resolución 40103 del MME para ciertos requisitos. Ecopetrol se reserva el derecho de entregar sus productos de acuerdo a las especificaciones mínimas de calidad establecidas en la regulación nacional vigente, sus modificaciones, sustituciones y/o adiciones que establezcan los Ministerios de Minas y Energía y/o Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El catálogo de productos de Ecopetrol tiene por finalidad brindar al usuario información general relacionada con el portafolio de productos comercializados por Ecopetrol S.A. La información provista no es una oferta en los términos del Código de Comercio Colombiano. Su propósito es únicamente informativo. Ecopetrol S.A. no se hace responsable por el uso o interpretación realizada por terceros.

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

	Especificación Técnica del Catálogo de Productos de Ecopetrol S.A. Gasolina Básica Corriente (Gasolina Motor Regular)		
	Gestión Cadena de Suministro Departamento de Medición y Balance de Hidrocarburos		
	CODIGO **GCS-ET-026**	**Elaborado** **08/06/2021**	**Versión: 4**

RELACIÓN DE VERSIONES

Documento Anterior			
Versión	**Fecha**	**Código y Título del Documento**	**Cambios**
1	6/07/2015	GCS-FT-005 Ficha Técnica del Catálogo de productos Ecopetrol S.A. Gasolina Básica Corriente.	Cambio del proceso emisor Cambio del código Actualización con base en la resolución 1180 Actualización del formato y del contenido
2	5/09/2019	GCS-ET-027 Ficha Técnica del Catálogo de productos Ecopetrol S.A. Gasolina Básica Corriente.	Cambio del código Actualización del formato y del contenido
3	03/02/2021	GCS- ET-027 Ficha Técnica del Catálogo de productos Ecopetrol S.A. Gasolina Básica Corriente.	Se ajusta el parámetro de contenido de Azufre de acuerdo a lo comprometido en la Senda de Calidad de combustibles de Ecopetrol.
Documento Nuevo			
Versión	**Fecha**	**Cambios**	
4	08/06/2021	Ajustes e inclusión de parámetros de calidad, de acuerdo con la Resolución 40103 emitida por el Ministerio de Minas y Energía el 07 de abril de 2021.	

Para mayor información dirigirse a:

Elaboró:
Alejandro Jose Ulloque/ Darío Iván Duarte/ Javier Gómez Del Portillo/ Wilson Ariel Castellanos / Astrid Acevedo / Rosangela Pacheco
Teléfono: 45812 / 52004 / 45631 Buzón: alejandro.ulloque@Ecopetrol.com.co/ dario.duarte@ecopetrol.com.co/ javier.gomez@ecopetrol.com.co/ wilson.castellanos@ecopetrol.com.co/ astrid.acevedo@ecopetrol.com.co / rosangela.pacheco@ecopetrol.com.co

Dependencia: Departamento de Medición y Balance de Hidrocarburos

Revisado electrónicamente por:	Aprobado electrónicamente por:
OSWALDO ANDRES MUÑOZ ESPINOZA Jefe Cédula de Ciudadanía No. 71.396.944 Departamento Ingeniería De Proceso GRB	**NYDIA JOHANNA REY QUIÑONEZ** Jefe (e) Cédula de Ciudadanía No. 37.750.198 Departamento de Medición y Balance de Hidrocarburos

El catálogo de productos de Ecopetrol tiene por finalidad brindar al usuario información general relacionada con el portafolio de productos comercializados por Ecopetrol S.A. La información provista no es una oferta en los términos del Código de Comercio Colombiano. Su propósito es únicamente informativo. Ecopetrol S.A. no se hace responsable por el uso o interpretación realizada por terceros.

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

RONALD PATERNINA URIBARREN Jefe Cédula de Ciudadanía No. 73.569.649 Departamento Ingeniería De Proceso RCSA	

Documento firmado electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.
Para verificar el cumplimiento de este mecanismo, el sistema genera un reporte electrónico que evidencia la trazabilidad de las acciones de revisión y aprobación por los responsables. Si requiere verificar esta información, solicite dicho reporte a Service Desk.

El catálogo de productos de Ecopetrol tiene por finalidad brindar al usuario información general relacionada con el portafolio de productos comercializados por Ecopetrol S.A. La información provista no es una oferta en los términos del Código de Comercio Colombiano. Su propósito es únicamente informativo. Ecopetrol S.A. no se hace responsable por el uso o interpretación realizada por terceros.

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

GRASA RODAMIENTOS

DESCRIPCIÓN

La **GRASA RODAMIENTO** es una grasa fabricada a base de jabón de sodio de textura fibrosa y aceites minerales lubricantes de alta viscosidad, diseñada para la lubricación de rodamientos como los que se encuentran en equipos automotores y rodantes, para los rodamientos de las ruedas de vehículos livianos que no estén equipados con frenos de disco, acoples tipo engranajes, máquinas de estampados o calandria que operan en un rango de temperatura entre -5°C y 120°C en ambientes secos.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La formulación de la **GRASA RODAMIENTO** le brinda las siguientes características:

- Resistente a temperaturas moderadamente altas.
- Su naturaleza fibrosa le permite adherirse fuertemente a los rodamientos.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- Grado NLGI: 2.5

PRESENTACIÓN

- Tambor por 360 Libras.
- Balde Cuñete por 35 Libras.
- Caja de 12 Unidades de Tarrina.
- Caja de 24 unidades.

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS TÍPICAS

Característica	Método	Unidades	GRASA RODAMIENTOS
Apariencia			Marrón
Penetración a 25°C (a 60 golpes)	ASTM D217	mm/10	260
Punto de Goteo	ASTM D2265	°C	180
Viscosidad Cinemática @ 40°C	ASTM D445	cSt	400
Separación de Aceite	IP 121	% peso	1,5
Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración 10.000 y 60 golpes)	NTC 1731	%	10
Acido Libre	ASTM D664	G ácido oleico/100 g muestra	0,2
Corrosión en Lamina de Cobre	ASTM D4048		1a

Los datos de estas pruebas típicas son valores promedio. Pueden presentarse ligeras variaciones en cada producción respecto a los valores indicados que no afectan el buen desempeño del producto.

RECOMENDACIONES

Salud y seguridad: Es recomendable durante la manipulación del aceite evitar el contacto prolongado o repetitivo con la piel, use guantes. En caso de contacto lave inmediatamente con abundante agua y jabón.
Proteja el ambiente: No contamine los drenajes, suelos o aguas con el aceite, su disposición debe estar de acuerdo a las regulaciones de la autoridad local.
Para mayor información sobre manejo seguro del producto es recomendable seguir las recomendaciones dadas en la **"Ficha de datos de seguridad (Grasas Lubricantes) CCF-PI-LI-41" de GLOBAL OIL LUBRICANTES S.A.S.**
