
INFORME MENSUAL No.9 AVANCE DE OBRA

Periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025

CONTRATO N° 1935 del 2024

ORIP PUERTO TEJADA – CAUCA



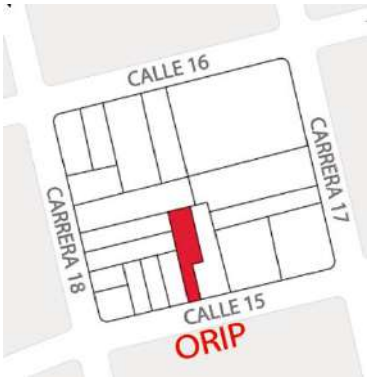

5 DE MAYO DE 2025

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar el avance general de las actividades ejecutadas por el contratista **Unión Temporal Soluciones** contrato N° 1935 del 2024 para la construcción de la ORIP de Puerto Tejada – Cauca durante el mes de abril del 2025.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Descripción del avance general del contrato.
2 Actividades ejecutadas a la fecha.
3 Ejecutado vs programado.
4 Tiempo transcurrido del contrato.
5 Informes semanales.
6 Actividades adicionales.
7 Relación actas mayores y menores cantidades.
8 Solicitudes de prórroga.
9 Relación de APUS no previstos o complementarios.
10 Equilibrio económico o financiero del contrato
11 Certificados de calidad.
12 Control de Ensayos
13 Especificaciones técnicas.
14 Correspondencia enviada y recibida.
15 Inconvenientes presentados durante la ejecución de la obra.
16 Seguridad y salud en el trabajo.
17 Manejo de RCD.
18 Certificaciones ambientales.
19 Control y manejo de equipos.

20 Información del clima que pudo haber afectado el avance de la obra.

21 Impactos generados.

22 Control del personal.

23 Otras actividades realizadas

24 Anexos

2. ALCANCE

Este informe contiene el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025.

3. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Las actividades ejecutadas durante este mes de abril de 2025, fueron las siguientes:

- **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ELECTRICAS:** Se continua las actividades de regatas en muros para instalaciones de tuberías conduit, así como también la instalación de tuberías EMT que van descolgadas por losa en piso 2 y 3. Una vez realizada la instalación de tuberías conduit en muros con sus respectivos anclajes y cajas, se procede a resanar.

- **INSTALACIÓN CABLEADO ELECTRICO:** Se realiza la instalación de cableado eléctrico en primer piso y zona de contratistas en segundo piso, ejecutando la instalación del sistema de iluminación, toma corrientes normales, Voz y datos, detección y acometida.

- **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS:** Se realiza ensayo de presión para tubería hidráulica, en el momento se está la espera de los resultados.

- **MAMPOSTERÍA:** Se continua la construcción de los muros en fachada principal y buitrón de fachada posterior alcanzando el 94% de la ejecución en la actividad, se toma en cuenta el diseño de mezcla para mortero de pega y el grouting para las dovelas suministrado por el contratista de obra. Dentro de la actividad de mampostería se toma en cuenta los detalles técnicos constructivos suministrados en los planos estructurales tales como: el anclaje con epóxico para las dovelas (refuerzo vertical) tanto en la parte superior como en inferior, con separación cada 1.20m, la instalación de grafil (refuerzo horizontal) cada 0.80m máximo y las dilataciones verticales en los extremos de muros con icopor a 1cm. Se realiza adición de dovelas en muros laterales de terraza en piso 3 para elevación de muros a h:1.80m. Se realiza columneta en piso 3 y dinteles en área de funcionarios, salida a terraza, contratistas y pasillo piso1.

- **VIGAS CINTA:** Se realiza fundición de viga cinta en muros de cubierta y muros laterales de terraza con concreto fabricado en sitio.

- **PAÑETES:** Se continua con la actividad de repellos de muros en fachada principal, buitrón de fachada posterior, cara exterior de muro en zona de aseo piso 1 y laterales de escaleras, llegando al 97% de la ejecución en la actividad de repellos, finiquitado zonas como pasillo piso 1 y fachada principal. Se realizan filos de carteras en puertas de aseo en piso 1, dinteles de puertas y ventanas de piso 3, fachada posterior y viga en cocina piso 1.

- **ESTUCOS:** Se continua con la actividad de estuco con estuco plástico para interiores realizando segunda capa en muros y carteras de piso 1, 2 y 3 instalando perfiles plásticos para bordes de muros y columnas en zona de sala de espera, pasillo piso 1, 2 y 3, vacío de escaleras piso 2 y 3, vacío de cocina desde piso 2 a piso 3, despacho registradora, sala de juntas, contratistas, funcionarios y bodega. Se inicia con la actividad de estuco con estuco plástico para exteriores realizando primera capa en muros y carteras de fachada principal, fachada posterior y cubierta, instalando perfiles plásticos para bordes de muros.

- **INSTALACIÓN MARCOS:** Se inicia con la instalación de marcos metálicos de puertas y ventanas en piso 1, 2 y 3, siguiendo las especificaciones del cuadro de puertas y ventanas sugerido, el cual incluye la numeración correspondiente de cada elemento y su respectivo espacio asignado. Se han instalado marcos de puertas en Aseo y marcos de ventanas en archivo, despacho reistradora, sala de juntas, contratistas y funcionarios.

- **ALISTADOS DE PISOS:** Se realiza la actividad de alistados de pisos 3 cm con mortero 1:3 en niveles 1, 2 y 3 terminando funcionarios, pasillos piso 3 y escaleras tramo piso 2 a 3. También se toma en cuenta la protección de los mismos con la utilización de triplex.

- **CARCAMO:** Se realiza construcción de cárcamo en patio en piso 1 y allanado mecánico de plataforma de pedestal con su respectivo curado.

- **INSTALACIÓN DE PISOS:** Se realiza la instalación de piso Vancouver gris 60*60cm en pasillo piso 1, 2 y 3, sala de espera-caja y funcionarios, posteriormente disponiendo láminas de madera para protección de pisos. Se continuación con la instalación de piso cerámico Mikonos alta resistencia al deslizamiento 33.8*33.8 cm en baño PMR, cuarto de aseo y bodega. Se realiza

instalación de piso Belfort 23.8*119.2cm en terraza. Para todos los anteriores pisos se realiza el planteo del arranque según lo acordado con interventoría y supervisión técnica.

- **INSTALACIÓN CIELORASO PLANO:** Se continua con la actividad de cielorraso plano, instalando estructura en perfiles metálicos, omegas con separación cada 40 cm, viguetas con separación cada 60cm, ángulos y cuelgas con separación cada 90 cm y láminas de drywall en piso 1, 2 y 3 en zona almacén, archivo, libros antiguos, sala de espera, contratistas, despacho registradora, sala de juntas, funcionarios y bodega, con su respectivo nivel.

- **CUBIERTA:** El día 10 de abril se finaliza la instalación de manto asfaltico 3,6mm para cubierta de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se realiza flanches metálicos perimetral contra predios vecinos.

- **ENCHAPE DE MUROS:** Se realiza la actividad de enchape de muros con piso pared natal blanco 30*60cm piso 1 y 3 en aseo y baño tercer piso. También se realiza la actividad de enchape de muro con piso Vancouver 60*60cm en cocina piso 1.

- **MUROS EN SUBERBOARD:** Se fabrica muro una cara superboard con estructura metálica en almacén piso 1 y baño registradora en piso 2. Se dio acabado en estuco en cara exterior.

- **RED CONTRA INCENDIOS (R.C.I.):** Se realiza la instalación de tubería RCI en piso 1, 2 y 3.

- **PLANTA ELECTRICA:** El día 11 de abril llega la planta eléctrica Fawde 4DW91-38D, se hace el descargue con montacarga y se ubica en sala de espera, el día

23 de abril se realiza montaje de planta en cárcamo desplazándola desde la sala de espera al patio piso 1 con estibador.

4. PROGRAMADO VS EJECUTADO

Según el programa de obra, al 30 de abril/25 el % de ejecución sería del 71,85% y el % de programación seria del 76,97%, para un atraso del 5,12%. Cabe anotar que estos datos se sacaron con base en la nueva reprogramación de acuerdo a la solicitud de prórroga y adición que se entregó.

GRAFICO PROGRAMADO VS EJECUTADO PROGRAMA GENERAL


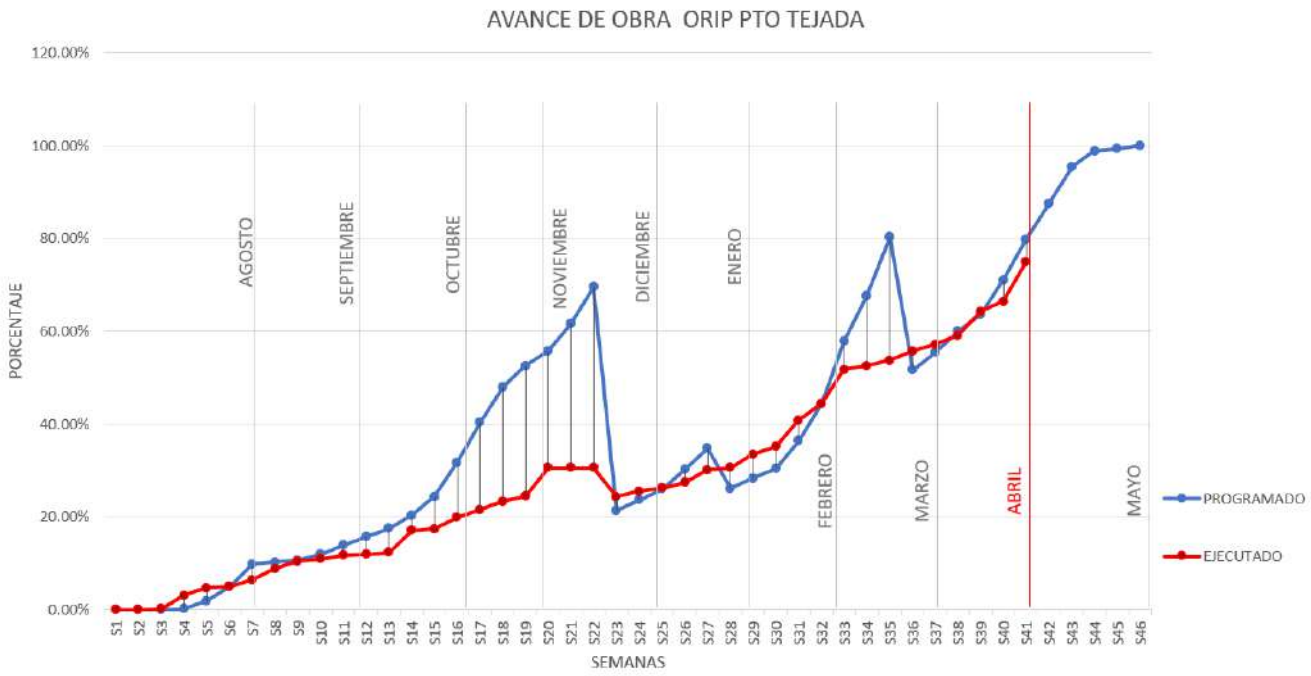


GRAFICO PROGRAMADO VS EJECUTADO MES ABRIL 2025



5. REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA



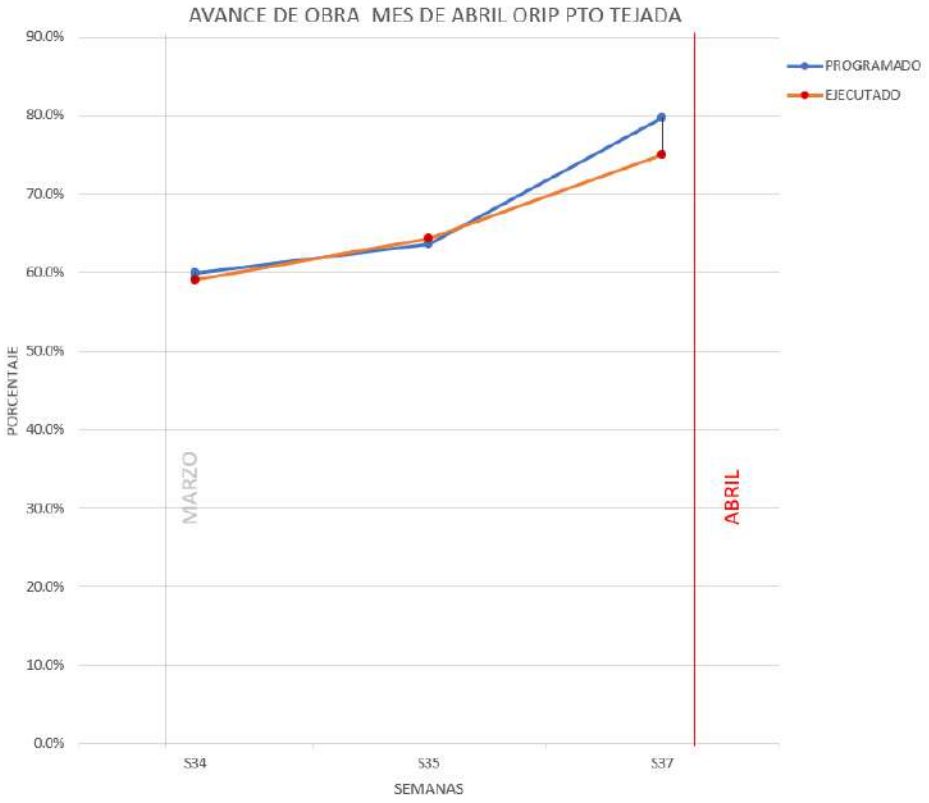














29/04/2025, 16:22












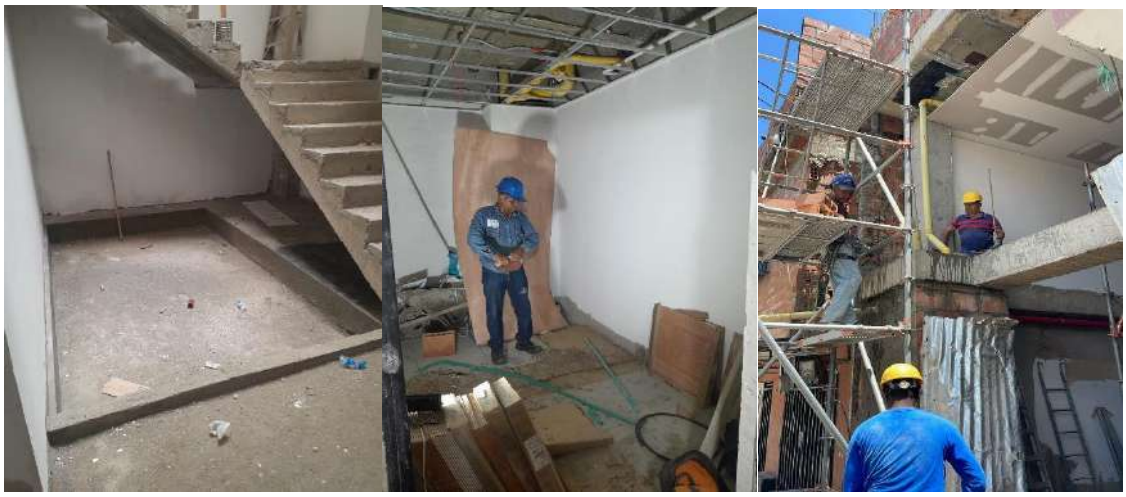




4/04/25 08:45
Constr. ORIP Puerto Tejada Contrato Int. 1963-2024

6. RELACION DE INFORMES SEMANALES

Durante el mes de abril del 2025, se entregaron 4 informes:

- **INFORME No. 36:** Periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 06 de abril del 2025.
- **INFORME No. 37:** Periodo comprendido entre el 07 de abril y el 13 de marzo del 2025.
- **INFORME No. 38:** Periodo comprendido entre el 14 de abril y el 20 de abril del 2025.
- **INFORME No. 39:** Periodo comprendido entre el 21 de abril y el 27 de abril del 2025.

A la fecha desde el inicio de la obra, se han entregado 39 informes semanales.

7. CONTROL MANEJO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA.

Durante el mes de Abril se continúa realizando trabajos de encofre y fundición de viga cintas, alfajías cortes de varillas, Cortes de madera, Flejado y amarre de hierro, instalación de mampostería, empañetados de muros, cortes de muros, instalación de tubería eléctrica, tubería hidrosanitaria, estructura de cielo falso, estucado de muros, alistado de pisos, enchape de pisos y se usaron las siguientes herramientas.

- Palas
- Barras
- Picas
- Cincel
- Palustre
- Alicater
- Destornilladores
- Porra Grande
- Porra Pequeña
- Pulidora Makita

- Pulidora Dewalt
- Pulidora inalámbrica total
- Pulidora inalámbrica Dewalt
- Taladro Percutor Dewalt
- Taladro demoledor total
- Taladro Percutor Hilti
- Taladros inalámbricos total
- Pistolas de impacto
- Dobla tubo ¾ Truper
- Dobla tubo 1” Truper
- Dobla tubo ½ Truper
- Juego de llaves
- Laser Dewalt
- Cortadora de cerámica
- Chiroque
- Codal
- Yana
- Andamios multidireccional
- Arnés de seguridad
- Eslingas en Y con absorbedor

8. INFORMACION CLIMATICA

Durante el mes de abril/25 se presentaron lluvias, en jornada laboral que afectaron la ejecución de diferentes actividades. Durante la noche también se presentaros fuertes lluvias las cuales afectaron las actividades del siguiente día.



1 de abril/25



11 de abril/25

9. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

Los certificados de calidad que se anexan en este informe corresponde a lo siguiente:

- **INTALACIONES ELECTRICAS:** Certificados de calidad de la tubería, cableado eléctrico, tableros, aparatos eléctricos y demás que hacen parte de esta actividad.

Se adjuntan los respectivos certificados de calidad.

10. REVISION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Durante el presente periodo no se realizo cambio, ni se presentaron solicitudes en este aspecto

11. CONTROL DE PERSONAL

Para este proyecto, durante el mes de abril se contó con un total de 43 trabajadores afiliados a la seguridad social.

El personal que se encuentra subrayado en la siguiente tabla ya NO se encuentran en el proyecto laborando debido a que son Subcontratistas flotantes o término de labor como:

- Ingestructuras
- Joint Soluciones Integrales SAS.
- Redes del pacifico
- Grc Montajes y Mantenimiento

Contando con un total de 33 colaboradores fijos entre las empresas de Ingestructuras (22) y Unión Temporal Soluciones (4) Redes del pacifico (7)

NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE CEDULA	EMPRESA	ARL	AFP	EPS
Jimmy Fernando Cárdenas	1085635381	Uts	Sura	Porvenir	Sura
Carlos Alberto Patiño	16775193	Uts	Sura	Colpensiones	Sanitas
Leidy Viviana Cosme	1112476700	Uts	Sura	Colpensiones	Asmet Salud
Karol Michell Rodríguez Ordoñez	1144092311	Uts	Sura	Porvenir	Sura
German Mora Velásquez	19390341	Ingestructuras	Sura	Colpensiones	Compensar
Jordy Armando Cantoñi Banguero	1062313919	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Sos
José Jesús Morales	16277449	Ingestructuras	Sura	Colpensiones	Sos
Wilmer Caicedo Carabali	76044961	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Fredy Castro Chalar	76.044.048	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Sos
José Elny Saa Núñez	1.059.984.107	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Asmet Salud
Hernan Rivas Vidal	1.059.984.107	Inge Estructura	Sura	N/A	Nueva Eps
Luis Eduardo Amaya Enciso	16675873	Inge Estructura	Sura	N/A	Salud Total
Sandra Patricia Fory Balanta.	34.374.438	Inge Estructura	Sura	Colfondos	Nueva Eps
Williams Antonio Arrenchedera	C.E 6.120.861	Inge Estructura	Sura	Colpens	Nueva Eps
Javier Martínez	94.294.650	Inge Estructura	Sura	Colpens	Asmet Salud
Luis Ángel Angulo	1.076.324.210	Redes Eléctricas	Sura	Colpens	Sos
Jesús Elías Molina Espina	10.537.748	Redes Eléctricas	Sura	N/A	Asmet Salud
Cristian Camilo Murillo Osorio	1.113.309.616	Redes Eléctricas	Sura	Porvenir	Salud Total
Luis Alfredo Mera Velasco	16.499.675	Redes Eléctricas	Sura	Colpens	Sanitas
Dani Fernández	10.754.156	Redes Eléctricas	Sura	Colpens	Delagente

Jhon Anderson Delgado	1.007.380.396	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Asmet Salud
Cesar Augusto Ortiz Lozano	1022940462	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Edison Fabian Poblador Ochoa	1.023.024.591	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Compensar
Edwar Mora	1.032.395.392	Ingestructuras	Sura	Colpens	Compensar
Jhon Jairo Rivera Rivera	94.373.857	Ingestructuras	Sura	Colpens	Coosalud
Eduar Guaza Murillo	76.042.045	Ingestructuras	Sura	Colpens	Sos
José Luis Hidalgo Mina	10.558.135	Ingestructuras	Sura	Colpens	Nueva Eps
Miguel Alfredo Caicedo	11.935.849	Redes Eléctricas	Sura	Colpens	Sanitas
Andrés Felipe Ortiz Lozano	1.006.088.052	Inge Estructura	Sura	Povenir	Emssanar
Iván Gonzáles	10.553.312	Inge Estructura	Sura	NA	Asmet Salud
Jeison Fernando Nocua Vargas	1.122.647.828	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Famisanar
Rubiela Castillo Landázuri	1.143.943.273	Redes Del Pacifico	Sura	Porvenir	Salud Total
Emilio Castillo Cuadrado	80.114.321	Grc Montaje Y Mante	Sura	Protección	Famisanar Eps
Miguel Antonio Montaño López	79.236.381	Grc Montaje Y Mante	Sura	Skandia	Salud Total
Gerson Ruiz Chocontá	80.720.750	Grc Montaje Y Mante	Sura	Old Mutual Skandia	Sanitas
Andrés Arturo García Vega	1.031.135.556	Grc Montaje Y Mante	Sura	Porvenir	Sanitas
Kevin Andrés Caicedo	1007412746	Ingestructuras	Sura	Sura	Nueva Eps
Ricardo Diaz Hurtado	76045491	Inge Estructura	Sura	Sura	Salud Total
Hosffman Alberto Márquez Baez	1.020.848.061	Joint Soluciones Integrales	Sura	Porvenir	Famisanar Eps
Deivi Alejandro Vera Rueda	1.000.784.432	Joint Soluciones Integrales	Sura	Porvenir	Famisanar Eps
John Jairo Esguerra Fajardo	80.029.985	Joint Soluciones Integrales	Sura	Porvenir	Famisanar Eps
Wilmar Eduardo Mogollón Pulido	1.014.214.542	Joint Soluciones Integrales	Sura	Porvenir	Famisanar Eps

12. CONTROL DE ENSAYOS

Durante este mes de abril/2025 no se realizaron ensayos de resistencia a la compresión.

13. RELACION DE COMITES DE OBRA

Todos los comités de obra se realizan los días viernes a las 11:00am. Durante este mes de abril/25, se efectuaron 4 comités y en total con corte al 30 de abril-25 se han realizado 55 comités de obra:

- COMITÉ No. 52: Efectuado el día 04 de abril-25.
- COMITÉ No. 53: Efectuado el día 11 de abril-25.
- COMITÉ No. 54: Efectuado el día 21 de abril-25.
- COMITÉ No. 55: Efectuado el día 25 de abril-25.

14. RELACION DE APUS NO PREVISTOS O COMPLEMENTARIOS

Durante el periodo de marzo se presentó balance de mayores y menores cantidades e ítems no previstos (NP 41 AL 60). Esta fue avalado y legalizado.

15. SOLICITUD DE PRORROGA

Durante el mes de marzo se realizó tramite de prorroga el cual fue avalado. Se aprobaron 69 días para una nueva fecha de entrega del proyecto mayo 31 de 2025.

16. SOLICITUD DE ADICIONALES

Durante el periodo del presente informe se tramitaron adicionales, mayores y menores cantidades e ítems no previstos. Los cuales fueron avalados. Se hace claridad que el valor del contrato se mantiene, de acuerdo con la adicion 01 aprobada en diciembre de 2024

17. SOLICITUD DE SUSPENSIONES

A la fecha no se ha tramitado suspensiones al contratoç

18. PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO

FECHA FIRMA ACTA DE INICIO	18 de julio de 2024
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	22 de marzo de 2025
TOTAL DIAS	316
FECHA DE CORTE	30 de abril de 2025
Prorroga No. 1 (DÍAS)	2 MESES Y 21 DÍAS
Prorroga No. 2 (DÍAS)	69
DIAS TRANSCURRIDOS AL CORTE	286
PORCENTAJE TIEMPO TRANSCURRIDO AL CORTE	91%

19. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

A la fecha de corte del presente informe se ha remitido la siguiente correspondencia

ORIP PTEJ	123	25	01/04/2025	CONSORCIO 310	Remisión Informe Mensual
ORIP PTEJ	124	25	03/04/2025	CONSORCIO 310	Solicitud COPIA cedula apoderado para tramites ante EMCALI
ORIP PTEJ	125	25	04/04/2025	CONSORCIO 310	Aclaración Documentos RETIE RETILAP
ORIP PTEJ	126	25	07/04/2025	CONSORCIO 310	Remisión informe mensual
ORIP PTEJ	127	25	07/04/2025	CONSORCIO 310	Remisión diseño barandas y pasamanos
ORIP PTEJ	128	25	08/04/2025	CONSORCIO 310	Remisión informe mensual
ORIP PTEJ	129	25	08/04/2025	CONSORCIO 310	Respuesta estado tramite EMCALI y bomberos
ORIP PTEJ	130	25	11/04/2025	CONSORCIO 310	Revisión corte 2 y anexos
ORIP PTEJ	131	25	12/04/2025	CONSORCIO 310	Plan de trabajo
ORIP PTEJ	132	25	15/04/2025	CONSORCIO 310	Revisión corte 2 y anexos
ORIP PTEJ	133	25	16/04/2025	CONSORCIO 310	Respuesta comunicado 1963_226_2024 Plan de trabajo de semana santa
ORIP PTEJ	134	25	16/04/2025	CONSORCIO 310	Revisión corte 2 y anexos – correcciones – respuesta comunicado 1963_230_2024
ORIP PTEJ	135	25	23/04/2025	CONSORCIO 310	Respuesta comunicado 1963_229_2024 – Observaciones visita Contraloría.
ORIP PTEJ	136	25	23/04/2025	CUERPO DE BOMBEROS	Solicitud de inspección de seguridad para certificación de red seca ORIP
ORIP PTEJ	137	25	23/04/2025	CONSORCIO 310	Respuesta tramite bomberos – respuesta comunicado 1963_231_2024
ORIP PTEJ	138	25	23/04/2025	CONSORCIO 310	Respuesta comunicado 1963_239_2024 Nota crédito factura UT2
ORIP PTEJ	139	25	23/04/2025	CONSORCIO 310	Remisión corte 2 y anexos – correcciones vr 3– respuesta comunicado CONSORCIO 310 1963_237_2024 y SNR2025EE-052087-1
ORIP PTEJ	140	25	25/04/2025	CONSORCIO 310	Remisión corte 2 y anexos – correcciones vr 4– respuesta comunicadoCONSORCIO 310 1963_237_2024 y SNR de fecha 22 de abril de 2025
ORIP PTEJ	141	25	24/04/2025	CONSORCIO 310	Respuesta comunicados 1963_234_2024, 1963_236_2024 , 1963_242_2024 – Acciones de contingencia para mejora tiempos de ejecución
ORIP PTEJ	142	25	25/04/2025	CONSORCIO 310	Remisión diseño y APU baranda y pasamanos escalera
ORIP PTEJ	143	25	28/04/2025	CONSORCIO 310	Aclaración APU baranda y pasamanos escalera
ORIP PTEJ	144	25	29/04/2025	CONSORCIO 310	Estado tramite servicios públicos - Respuesta comunicado 1963_246_2024

20. PROGRAMACION FINANCIERA

En el mes de abril se radicó el corte 2 y sus anexos correspondientes al segundo avance del 60% .

Se tiene proyectado para el mes de mayo estar radicando el corte 3 para llegar al 90% de avance y corte.

21. RELACION DE PAGOS REALIZADOS

El día 13 de diciembre se recibió el pago del primer corte correspondiente al avance del 30%.

22. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DEL CONTRATO

Con la aprobación de la prórroga y adición e ítems no previstos descrita anteriormente, quedaría pendiente la revisión del capitulo AIRES

ACONDICIONADOS para dar por concluido el balance presupuestal del proyecto. No se descarta que se pueda requerir una segunda adición, teniendo en cuenta ítems adicionales y/o no previstos en este capitulo o que en alguno otros surja

23. RELACION DE ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

Se cuenta con el acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos aprobado a la fecha.

24. RELACION DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y/O FINAL

Se relaciona actas de corte tramitada a la fecha

FECHA	CONCEPTO	COSTO DIRECTO	ADMIN+IMPREV	UTILIDAD	IVA/UTILIDAD	TOTAL
nov-24	CORTE AVANCE 1 30%	$ 290,064,383	$ 69,607,226	$ 14,503,219	$ 2,755,612	$ 376,930,440

25. ACTUALIZACION DEL ESTADO DE LAS POLIZAS

Con la aprobación de la prórroga se procedió a la actualización correspondiente a las pólizas del contrato.

AMPARO	VIGENCIA		PRORROGA 1	VR ASEGURADO	VR ASEGURADO	ESTADO	PRORROGA 2
	DESDE	HASTA	HASTA	INICIAL	ADICION		HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18 de julio de 2024	27 de julio de 2025	30 de septiembre de 2025	$ 251,286,959.00	$ 341,406,567.00	VIGENTE	30 de noviembre de 2025
SALARIOS, PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES	18 de julio de 2024	27 de enero de 2028	31 de marzo de 2028	$ 62,821,739.00	$ 85,351,641.00	VIGENTE	30 de mayo de 2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD	SI AMPARA 5 AÑOS		SI AMPARA 5 AÑOS	$ 251,286,959.00	$ 341,406,567.00	VIGENTE	SI AMPARA 5 AÑOS
RCE	18 de julio de 2024	27 de enero de 2025	31 de marzo de 2025	$ 260,000,000.00	$ 260,000,000.00	VIGENTE	31 de mayo de 2025

26. IMPACTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

En el mes de Abril, los impactos generados en la obra cada vez son mínimos ya que estamos casi en su etapa final, el acopio de escombros por fuera de la obra se realiza para poder retirarlos más fácilmente he ir desalojando ciertas zonas, estos escombros son acopiados sombre el andén del predio y cada ocho días sábados según su cantidad se retiran a la escombrera; son delimitados y encerrados con maletines de seguridad y cinta de precaución para así advertir a la comunidad de una fuente de peligro y evitar accidentes a terceros.

Otros de los impactos que se ha podido ver reflejados ha sido la humedad que se ha generado entre viviendas ya que la nueva construcción quedo separa de las viviendas y al llover se filtra el agua entre los dos predios, pero para eliminar esas filtraciones entre predio y predio se están instalando flanches que harán que el agua no se filtre si no que haga su proceso de desagüe por las tejas. y posteriormente en la canal de desagüe.













27. TRATAMIENTO Y MANEJO DE RCD EVIDENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y CERTIFICADOS DE LA DISPOSICIÓN FINAL, CERTIFICADO DE LUGARES AUTORIZADOS PARA DICHA DISPOSICIÓN

Durante el mes de Abril, los residuos generados en la obra fueron producto de actividades de Mampostería (retales de ladrillos) empañetados de muros (arena con cemento), rebabas de fundición y retazos de tuberías, retazos de esquineros plástico, rebabas de estuco y masilla estos residuos se enviaron a la escombrera como normalmente se hace.

Anexos. Recibo de escombrera.

28. CONTROL CONSERVACION DE MATERIALES ORDEN Y ASEO

NOMBRES	L	M	M	J	V	S
Jhon Anderson Delgado	X	X	X	X	X	X

Durante el mes de Abril se destinó a un colaborador para que se encargara del orden y aseo de la obra y la limpieza de baños, pero todo el personal está comprometido en realizar aseo al finalizar labores.









29. SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO

Durante el mes de abril se refuerzan las señalizaciones con cinta de precaución delimitando todos los vacíos existentes para prevenir caídas en alturas del personal, se realiza capacitación de manejo de extintor realizando con los colaboradores una práctica de su uso en caso de emergencia; debido a las altas temperaturas que hemos presentado en este mes se hidrata permanentemente el personal para evitar golpes de calor, se inspeccionan algunas herramientas entre esas extensiones dúplex, No aptas para trabajar y se sacan de circulación, solicitándole al contratista Ingestructuras vía correo electrónico el cambio de extensiones por encauchetadas y de mejor calibre, diariamente al personal se le realiza charlas de seguridad y pausas activas antes del inicio de actividades.

Debido a la alta demanda que se ha presentado en el país por casos del virus de fiebre Amarilla, se le ha dado charla a los colaboradores sobre el tema y se les realizo un sondeo de quienes no están vacunados y si estarían interesados en que se realice una jornada de vacunación, el cual todos estuvieron de acuerdo y se está haciendo la gestión con el Hospital de Puerto Tejada para la jornada de vacunación, se espera la respuesta de ellos.

Durante el mes, 2 veces por semana se hace la recolección y separación de residuos para su disposición final.

Se anexa evidencias fotográficas.





30. LISTAS DE CHEQUEO

Anexo Preoperacionales de Pulidoras eléctricas he inalámbricas, Taladros eléctricos he inalámbrico, andamios, y herramientas menores

31. CHARLA AMBIENTAL

Durante todo el mes de abril se les recalcó mucho a los trabajadores la importancia de cuidar el medio ambiente, y de empezar por el tema de separación de residuos para así ser reutilizado según lo que saquemos de ellos, nuevamente se le realizo la charla colocando como ejemplo el punto ecológico que se instaló ahora si dentro de la obra,

de cómo se deben hacer las separaciones y como creamos conciencia si lo hacemos de buena manera.





32. EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO DEL MANEJO ADECUADO DE QUÍMICOS, ALMACENAMIENTO, ROMBOS DE SEGURIDAD, HOJA DE SEGURIDAD, TODO LO APLICABLE SEGÚN EL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO, CUANDO APLIQUE

Durante el mes de abril se continúan con las actividades de fundición de vigas cinta se utilizan productos de sika, para la estucada de muros se utiliza Masilla premezclada estos productos vienen en cuñetes y son almacenados en un lugar

amplio, ventilado y seco, enchapado de pisos y muros se utilizan bultos de pegacolor y pegamax, para la impermeabilización de loza de 4 piso se utilizan productos de sika cada uno de estos químicos cuentan con fichas de seguridad que ya han sido suministras, el subcontratista suministra los epp para el uso de estas sustancias como: Guantes de caucho, tapabocas gafas de seguridad.

33. INVENTARIO DE USO DE BOTIQUÍN (SI SE USA REPORTAR EN TABLA EL MOTIVO)

En el mes de Abril se usaron 3 unidades de acetaminofén entre el personal administrativo y operativo por dolores de cabeza y malestar general

34. ANEXOS

- Comités de obra.
- Informes semanales de obra.
- Oficios enviados a interventoría.
- Informe mensual de SST.
- Seguridad social del personal
- Recibos de escombreras
- Preoperacional de herramientas
- Fichas de seguridad
- Nuevos certificados de alturas
- Certificación de materiales

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **52**

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Dr. Alvaro Lozano	SNR	Supervisor	
Dr. Javier Bedon	SNR	Abogado	
Arq. Guido Garcia	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Felipe Rios	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Magaly Caicedo	SNR	Apoyo técnico	
Jhon Freddy Ramirez	UT Soluciones	RL	
Arq. Carlos Osorio	UT Soluciones	Gerente de proyectos	
Ing. Jefferson Dejó	UT Soluciones	Apoyo administrativo	
Ing. Jaime Molano	UT Soluciones	Coordinador Administrativo	
Arq. Carlos Patiño	UT Soluciones	Director de obra	
Arq. Jimmy Cardenas	UT Soluciones	Residende de obra	
Ing. Ramon Lizarazo	Consorcio 310	Director de interventoría	
Ing. David Herrera	Consorcio 310	Residente de interventoría	

II. AGENDA O TEMARIO

Acta de seguimiento y control al contrato de obra

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48** **HORA** 11:00 Am Fecha: 04-04-2025

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

RCI INICIO ACTIVIDAD (31-03-2025)
•Contratista inicio la actividad con la fecha acordada, el material para la RCI llego el dio sábado 29-03-2025
•Contratista se comprometió a terminar la actividad de RCI para el día viernes 04-04-2025 (sin gabinetes)
•Contratista reitera su compromiso con terminar la actividad de instalación de la red el día de hoy.

MAMPOSTERIA FACHADA PRINCIPAL (07-04-2025)
Contratista manifiesta que hoy inicio con la actividad de buitrón en fachada principal, adelantándose a la fecha prevista.

INSTALACION DE FACHADA METALICA Y ELEMENTOS DE VENTANERIA (09-04-2025)
Contratista informa que el material llegara el día lunes 07-04-2025 e iniciara actividades el día miércoles 09-04-2025

CRONOGRAMA DE TRABAJO SEMANA SANTA (01-04-2025)
•Interventoría realizo solicitud de cronograma de trabajo mediante oficio 1963_207_2024 del 28-03-2025.
•Contratista informa que entregara cronograma de trabajo para el día lunes 07-04-2025

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **52**

PLAN DE TRABAJO POR PISO, ESPACIO, # DE CUADRILLAS (01-04-2025)
Interventoría ha venido solicitando plan de trabajo en:
•Comité de obra No.50 del 21-03-2025
•Oficio 1963_197_2024 del 25-03-2025
•Oficio 1963_204_2024 del27-03-2025
•Comité de obra No.51 del 28-03-2025
A la fecha no se ha radico por parte del contratista de obra.
Contratista de obra informa que entregara plan de trabajo por semana para el día martes 08-04-2025.

CUADRILLA DE ESTUCO (ESTA SEMANA)
Contratista de obra informa que ingreso cuadrilla de enchape, y que esta a la espera de la consecución de una cuadrilla de estuco, se espera que para la próxima semana se consiga.

AIRES ACONDICIONADOS (jueves 03-04-2025)
Contratista de obra informa que iniciara actividad de acuerdo a la programación vigente 30-04-2025.

ACCESO ESCALERA CUBIERTA
Contratista informa que entregara propuesta de acceso de acuerdo a normatividad para el día lunes 07-04-2025

FLANCHES METALICOS (lunes 31-03-2024)
•Interventoría informa que la actividad de acuerdo a la programación vigente inicio el día 18-03-2025 (no se cumplió) y finaliza el día 12-05-2025.
•Contratista de obra informa que hoy llega material y el día lunes 07-04-2025 inicia con la actividad de instalación.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

AVANCE DE OBRA (COSTOS DIRECTOS)-Semana No.38 del 31 de marzo al 06 de abril 2025


% Programado: 60,00% $ 788.139.917

% Ejecutado: 59,15% $ 777.034.123

Adelanto 0,85%


Se anexa programación vs ejecución de obra de la actividades a la fecha. (Las actividades en rojo son actividades que debieron iniciarse o presentan atrasos despecto a la programación).


Interventoría manifiesta de acuerdo a la reprogramación presentada para el modificatorio No.2 al contrato de obra No.1935 de 2024 los porcentajes de avance programados se presentan de la siguiente manera. Es importante señalar que entre las semanas del 40 al 43 presentan avances significativos entre dichas semanas por lo que desde ahora el contratista de obra deberá tomar todas las medidas necesarias que permitan cumplir con los avances programados

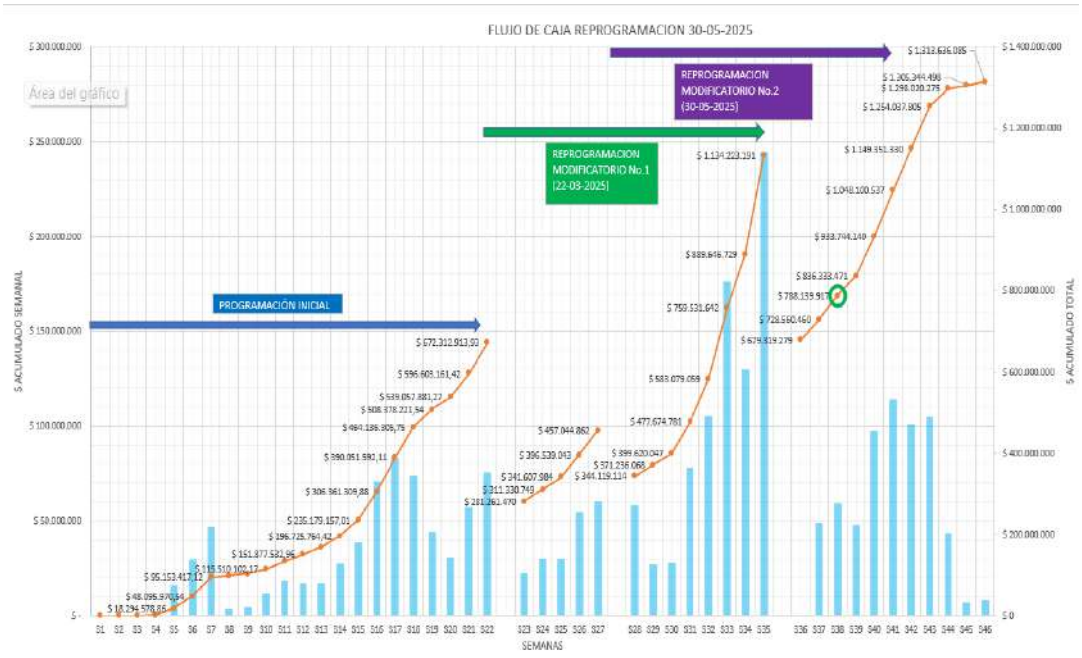



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES


CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **52** Página _____ de _____

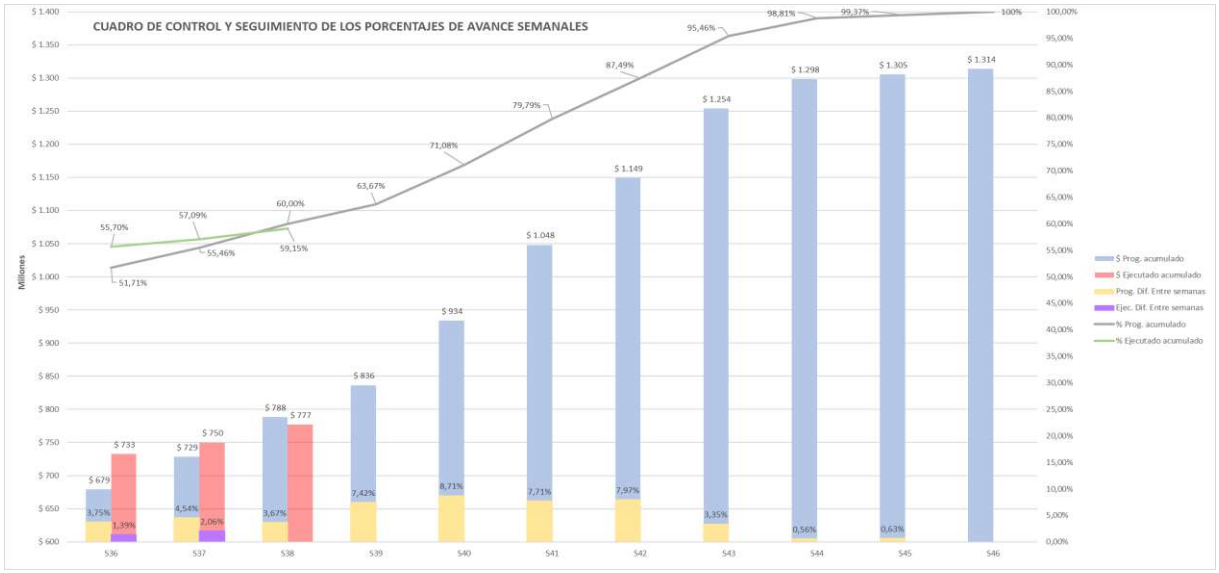

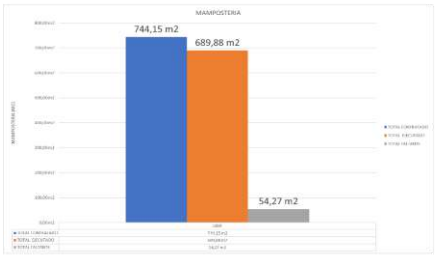

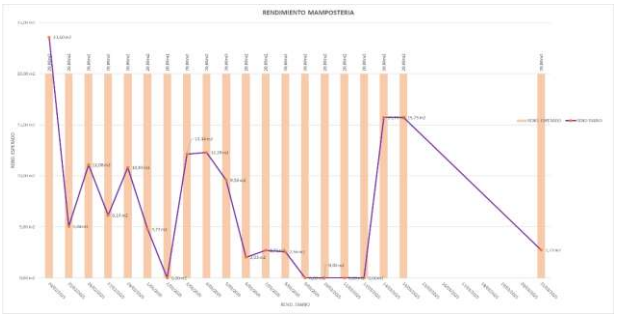

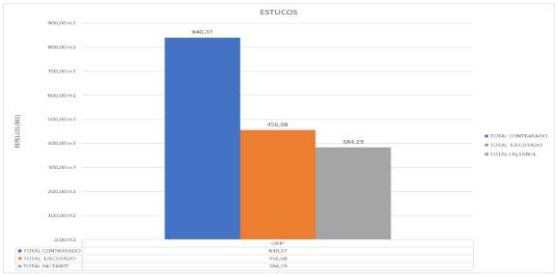

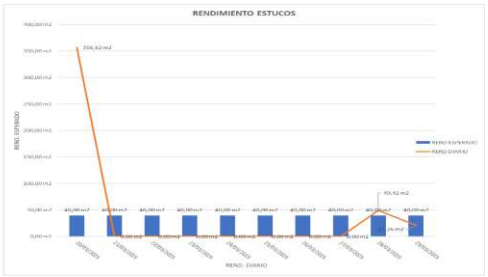



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES


CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **52** Página _____ de _____






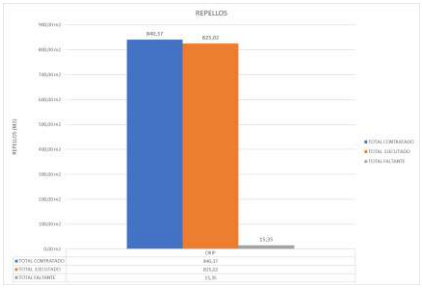

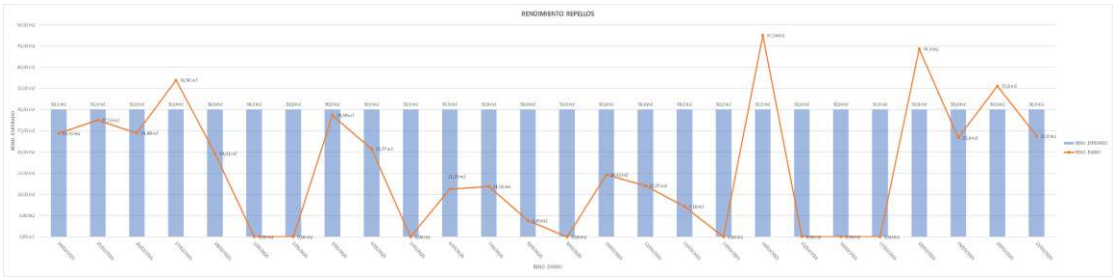


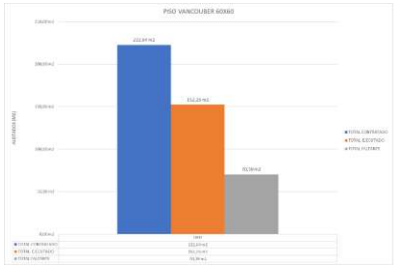


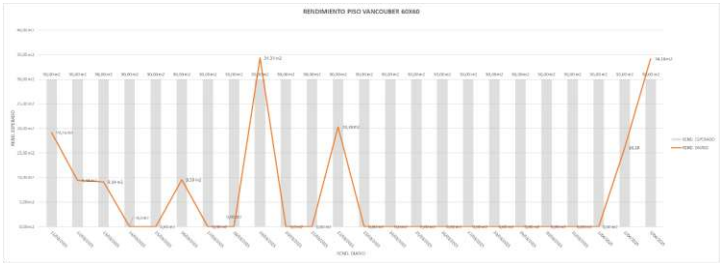



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 52

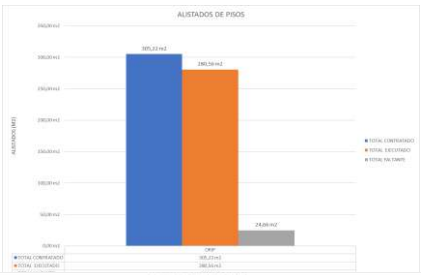

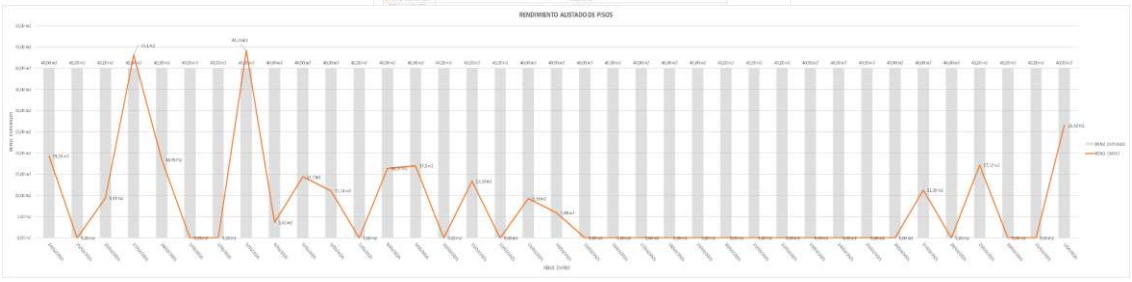

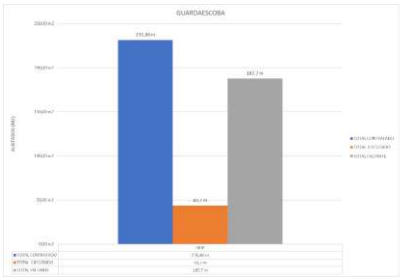

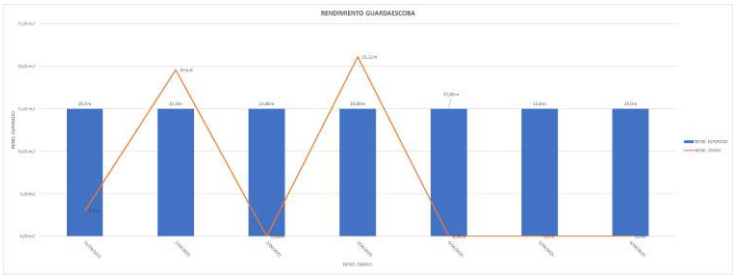








DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES


CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 52

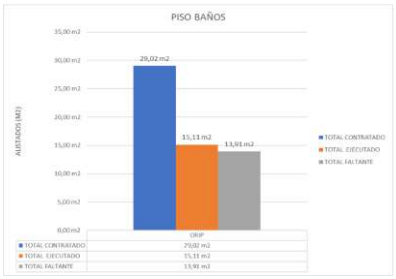




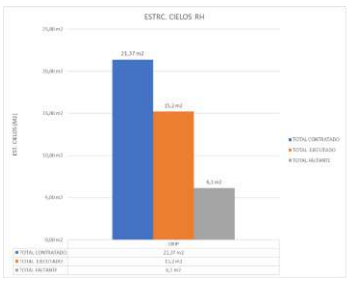

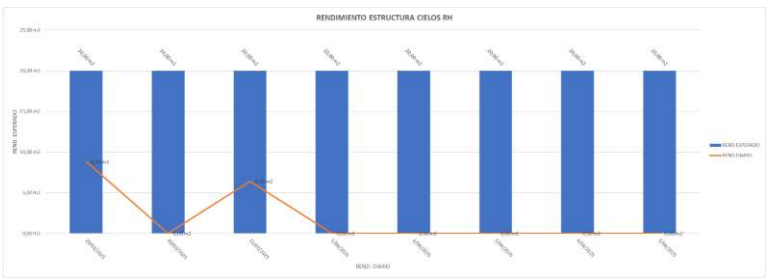


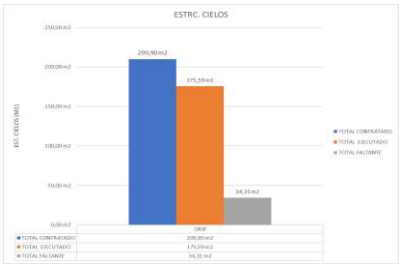


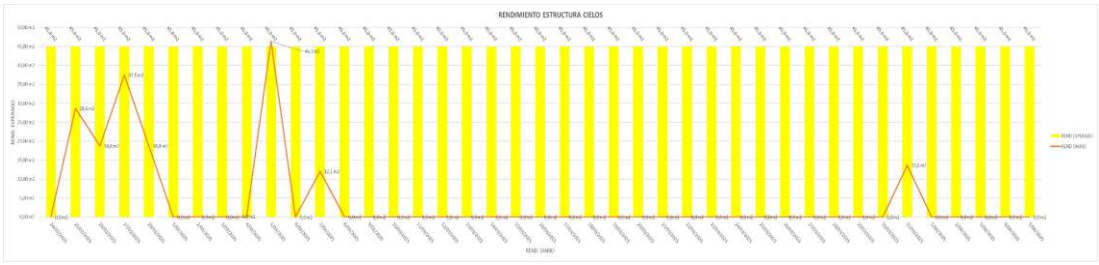


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES


CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **52**



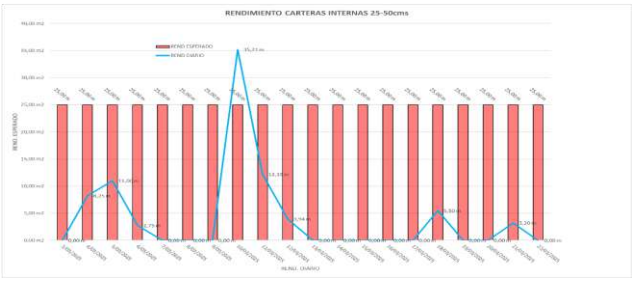



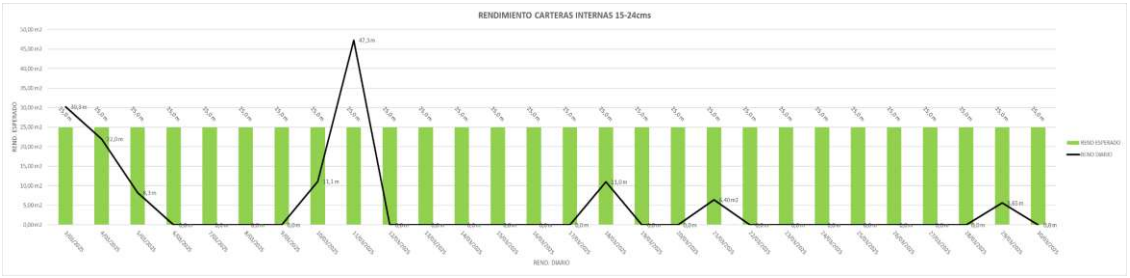

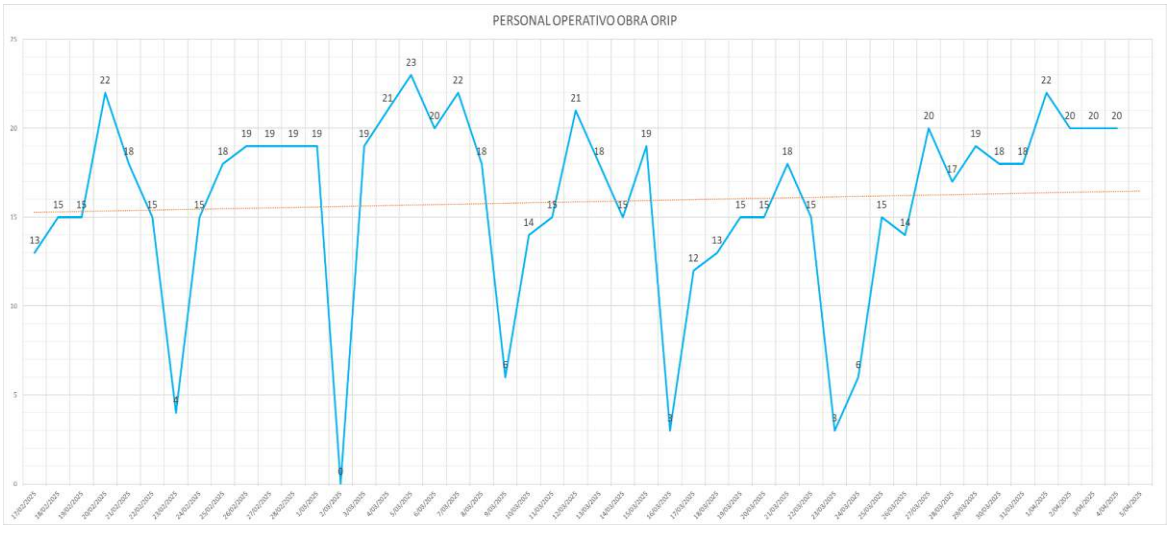

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 52

Supervisión solicita que para el día de la visita programada para el día lunes 07-04-2025 por parte de la contralaría se necesita tener impreso planos acotados, especificaciones técnicas, actas de comité, actas parciales de pago, ítems no previstos, modificatorios al contrato, entre otras.

Interventoría en cabeza del ing. Ramon Lizarazo indica que la próxima semana es critica para el proyecto ya que es donde inicia los porcentajes de avances significativos en programación, por tanto, es importante que el contratista de obra tome las medidas necesarias basados en la programación vigente y cuente con los recursos, insumos y personal para no entrar en atrasos.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Mamposteria fachada principal	7/04/2025	UT SOLUCIONES
Instalacion de fachada metalica y elementos de ventaneria	9/04/2025	UT SOLUCIONES
Cronograma de trabajo semana santa	7/04/2025	UT SOLUCIONES
PLAN DE TRABAJO POR PISO, ESPACIO, # CUADRILLAS	8/04/2025	UT SOLUCIONES
Propuesta acceso a escalera cubierta	7/04/2025	UT SOLUCIONES
Flanches perimetrales	7/04/2025	UT SOLUCIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 11 **MES** abril **AÑO** 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Bogotá, D.C., a los Cuatro (Día en letras) (4) (Día en números) días del mes de abril (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING. DAVID HERRERA MURIEL

Residente de interventoría

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **53**

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Dr. Alvaro Lozano	SNR	Supervisor	
Dr. Javier Bedon	SNR	Abogado	
Arq. Guido Garcia	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Felipe Rios	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Magaly Caicedo	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Juan Leon	SNR	Apoyo técnico	
Jhon Freddy Ramirez	UT Soluciones	RL	
Arq. Carlos Osorio	UT Soluciones	Gerente de proyectos	
Ing. Jefferson Dejó	UT Soluciones	Apoyo administrativo	
Ing. Jaime Molano	UT Soluciones	Coordinador Administrativo	
Arq. Carlos Patiño	UT Soluciones	Director de obra	
Arq. Jimmy Cardenas	UT Soluciones	Residende de obra	
Ing. Ramon Lizarazo	Consorcio 310	Director de interventoría	
Ing. David Herrera	Consorcio 310	Residente de interventoría	

II. AGENDA O TEMARIO

Acta de seguimiento y control al contrato de obra

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48** **HORA** 11:00 Am Fecha: 11-04-2025

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

MAMPOSTERIA FACHADA PRINCIPAL (07-04-2025 UT SOLUCIONES)
Contratista inicio con la actividad el día 07-04-2025 a la fecha se tiene total un total ejecutado de 711.83m2 de 744.15m2 pendientes por ejecutar 32.32m2

INSTALACION DE FACAHADA METALICA Y ELEMENTOS DE VENTANERIA (09-04-2025 UT SOLUCIONES)
•Llego estructura metálica para fachada principal el día martes 08-04-2025, se ensamblo el día miércoles.
•Contratista de obra informa que el día de hoy queda instalada.

CRONOGRAMA DE TRABAJO SEMANA SANTA (07-04-2025 UT SOLUCIONES)
•A la fecha no se ha cumplido con la entrega de esta solicitud realizada mediante oficio 1963_207_2024 del 28-03-2025
•Contratista de obra informa que será entregada a mas tardar el día sábado 12-04-2025 debido a que no ha tenido tiempo de realizarlo por temas de consolidación del acta parcial de pago No.2.

PLAN DE TRABAJO POR PISO, ESPACIO, # DE CUADRILLAS (08-04-2025 UT SOLUCIONES)
A la fecha el contratista no ha entregado el plan de trabajo, pero a partir de esta semana se evidencia que inicio con revisión por espacios e intervención para correcciones (ejemplo piso 3 espacio funcionarios).

FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA			
CODIGO	**PROCESO** EJECUCION DE OBRAS	**VERSIÓN** 1.0	


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **53** Página _____ de _____

FLANCHE PERIMETRALES (07-04-2025 UT SOLUCIONES)
•El contratista inicio con la actividad con la actividad el día 05-04-2002, pero no ha sido constante se han instalado 12m de 108.51m contratados, se solicita al contratista de obra reiniciar con las actividades y finalizar la actividad ya que se durante la noche se están presentado lluvias que pueden afectar los muros internos ya estucas e igualmente pueden perjudicar a los propietarios vecinos.
•Contratista informa que hoy retoma la instalación de flanches perimetrales.


V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)


AVANCE DE OBRA (COSTOS DIRECTOS)-Semana No.39 del 07-13 abril de 2025
% Programado: 62,83% $ 825.420.476
% Ejecutado: 63,86% $ 838.950.117
Adelanto 1,03% al 10-04-2025
Se anexa programación vs ejecución de obra de la actividades a la fecha. (Las actividades en rojo son actividades que debieron iniciarse o presentan atrasos despecto a la programación).
Interventoría manifiesta de acuerdo a la reprogramación presentada para el modificatorio No.2 al contrato de obra No.1935 de 2024 los porcentajes de avance programados se presentan de la siguiente manera. Es importante señalar que entre las semanas del 40 al 43 presentan avances significativos entre dichas semanas por lo que desde ahora el contratista de obra deberá tomar todas las medidas necesarias que permitan cumplir con los avances programados

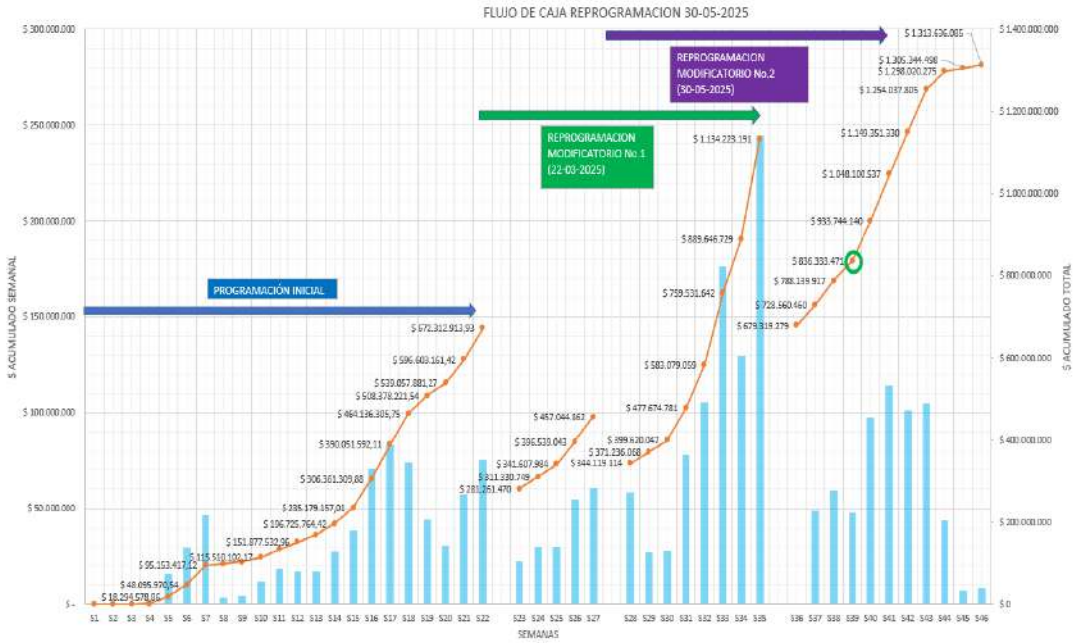

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **53**

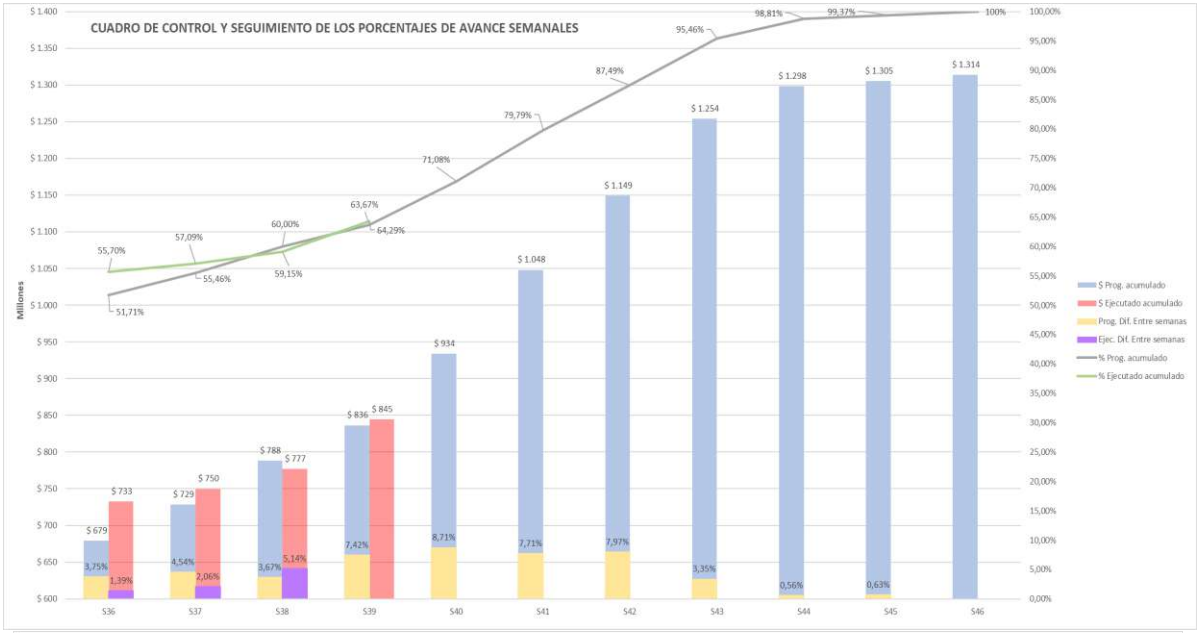

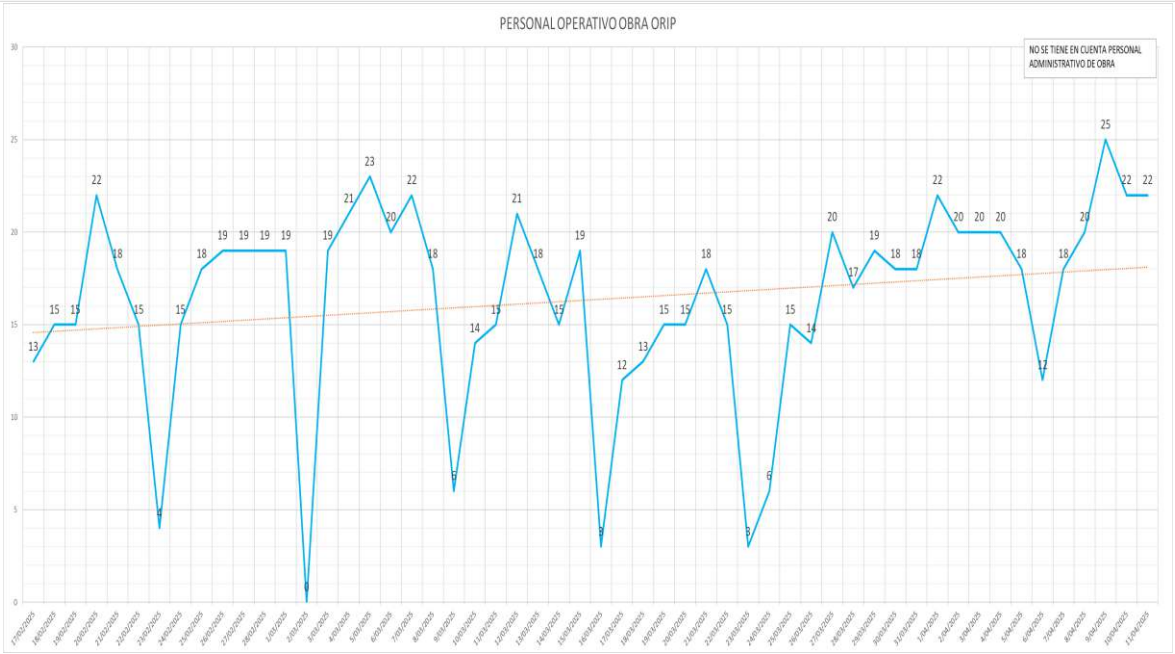

Supervisión presento informe de la visita realizada por parte de la contraloría de donde se resume lo siguiente:
•Planos récord deben coincidir con lo ejecutado (2 visita para mediados de mayo) y deben coincidir con las memorias de cálculo. Esto debe estar corregido para la segunda visita por parte de la contraloría.
•Vincular más cantidad de personal operativo para agilizar la construcción y terminación de la misma.
•Mantener la obra limpia y evitar retrocesos en la ejecución de las actividades.
•Se observo el buitrón en mampostería de fachada donde se solicitó corregir plomos, niveles y pega.
•Limpiar techos vecinos e instalación de flanches para mitigar las afectaciones por la ola invernal sobre los muros internos.
•Proteger pisos el piso no es anti rayones.
Supervisión radicara informe para ser tenido en cuenta tanto por la interventoría como por el contratista de obra para su corrección.

Llego planta eléctrica a obra.
Se aclara que los equipos se aprueban energizados. Planta eléctrica funcional con la transferencia.
El valor de la certificación RETILAP esta por definir.
Se coordinara reunión la próxima semana en Bogotá para definir fachada principal (formato, color, aviso), certificación RETILAP y certificación de bomberos para la ORIP.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 53 Página ____ de ____

Contratista de obra radico oficio ORIP PTEJ 127-2025 con fecha del 07-04-2025 con asunto remisión diseño barandas y pasamanos, donde se presentó diseño y hubo un incremento en el costo de la actividad. Se programó reunión para el día martes 9:00 am para definir el tema contratista de obra deberá presentar para dicha reunión los APU´S tanto de barandas como de pasamanos en tubería de aguas negras para su revisión.
Supervisión solicita al contratista de obra se instalen todos los flanches perimetrales contra los predios vecinos para el próximo comité de obra.
Supervisión solicita los informes de inspectoría donde se evidencia el control de la calidad de la ejecución de las actividades diarias.
Interventoría solicita al contratista de obra la presentación del balance general del proyecto, ya que durante el ejercicio de la elaboración del acta parcial de pago No.2 se evidenciaron mayores y menores cantidades en algunas actividades. Esto debe ser presentado de manera perentoria. Contratista de obra indica que esto será entregado entre el día 22-25 de abril.
Contratista de obra indica que iniciara actividad de aires acondicionados para el día lunes 14-04-2025 con temas de ductos.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Balance general de obra	25/04/2025	UT SOLUCIONES/ INTERVENTORIA
Instalacion de fachada metalica y elementos de ventaneria	11/04/2025	UT SOLUCIONES
Cronograma de trabajo semana santa	12/04/2025	UT SOLUCIONES
PLAN DE TRABAJO POR PISO, ESPACIO, # CUADRILLAS	8/04/2025	UT SOLUCIONES
Mesa tecnica para abordar temas de RETIE, RETILAP, BOMBEROS	POR DEFINIR BOGOTA	UT SOLUCIONES, INTERVENTORIA, SUPERVISION
Mesa de trabajo barandas y pasamanos	15/04/2025	UT SOLUCIONES
Flanches perimetrales	12/04/2025	UT SOLUCIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 11 **MES** abril **AÑO** 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Bogotá, D.C., a los Cuatro (Día en letras) (4) (Día en números) días del mes de abril (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING. DAVID HERRERA MURIEL

Residente de interventoría

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **54**

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Dr. Alvaro Lozano	SNR	Supervisor	
Dr. Javier Bedon	SNR	Abogado	
Arq. Guido Garcia	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Felipe Rios	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Magaly Caicedo	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Juan Leon	SNR	Apoyo técnico	
Jhon Freddy Ramirez	UT Soluciones	RL	
Arq. Carlos Osorio	UT Soluciones	Gerente de proyectos	
Ing. Jefferson Dejó	UT Soluciones	Apoyo administrativo	
Ing. Jaime Molano	UT Soluciones	Coordinador Administrativo	
Arq. Carlos Patiño	UT Soluciones	Director de obra	
Arq. Jimmy Cardenas	UT Soluciones	Residende de obra	
Ing. Ramon Lizarazo	Consorcio 310	Director de interventoría	
Ing. David Herrera	Consorcio 310	Residente de interventoría	

II. AGENDA O TEMARIO

Acta de seguimiento y control al contrato de obra

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48** **HORA** 11:00 Am Fecha: 21-04-2025

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

INSTALACION DE FACHADA MTETALICA ELEMENTOS VENTANERIA (11-04-2025 UT SOLUCIONES)
•Contratista inicio con su instalación de acuerdo a la fecha prevista, falta por instalar segundo tramo parte inferior.

CRONOGRAMA DE TRABAJO SEMANA SANTA (12-04-2025 UT SOLUCIONES)
•Contratista radico oficio ORIP PTEJ 131-2025 con fecha del 12-04-2025 y asunto plan de trabajo durante semana santa.
•Interventoría radico oficio 1963_226_2024 con fecha 14-04-2025 y asunto respuesta oficio ORIP PTEJ 131-2025 con asunto plan de trabajo durante la semana santa, solicitando de acuerdo a los avances programados de la semana 40 (71.08%) y semana 41 (79.8%) la entrega de un plan de trabajo alineado a la programación vigente del modificatorio No.2 para el día 15-04-2025 a las 10:00 am.
•Contratista de obra dio alcance al oficio radicado por parte de la interventoría mediante oficio ORIP PTEJ 133-2024 con fecha del 16-04-2025 con asunto: respuesta comunicado 1963_226_2024 plan de trabajo semana santa, reiterando que las actividades que se ejecutaran en semana santa corresponden al 7.42% que equivalen a lo programado durante la semana santa.
•Interventoría radico oficio 1963_234_2024 del 19-04-2025 con asunto requerimiento No.1 plan de contingencia contratista de obra con copia a la compañía de seguros, dado que se presentan atrasos en la ejecución de lagunas actividades (Ver programación vs ejecución de obra). Este plan de contingencia deberá ser entregado para el día martes 22-04-2025 a las 2:00 pm

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 54

MESA TÉCNICA PARA ABORDAR TEMAS DE RETIE, RETILAP Y BOMBEROS (POR DEFINIR)
•Supervisión informa que para coordinar la mesa técnica de trabajo es necesario la entrega del balance general de obra ya que de acuerdo a lo manifestado por la interventoría existen mayores y menores cantidades dentro del presupuesto.
•Contratista de obra informa que ya se esta trabajando sobre el mismo y que se tendrá listo para el día de mañana de acuerdo a lo solicitado por la interventoría en oficio.

MESA DE TRABAJO BARANDAS Y PASAMANOS (UT-SOLUCIONES)
•Interventoría informa que sea han realizado 2 mesas de trabajo donde se aprobó el esquema entregado por el contratista de obra, pero aún se está a la espera de la entrega de los apus y cotizaciones tanto de barandas como de pasamanos.
•Contratista de obra informa que serán radicados para el día martes 22-04-2025

FLANCHES PERIMETRALES (12-04-2025 UT SOLUCIONES)
•Interventoría informa que el contratista de obra retomo actividad de instalación de flanches metálicos perimetrales paso de 12 m instalados a 26.73m faltan por instalar 81.78m de un total de 108.51m
•Contratista de obra informa que esta semana quedara instalado el resto de flanches restantes contra los vecinos
•Se definirá el color para los flanches frontales en fachada principal con la supervisión.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

AVANCE DE OBRA (COSTOS DIRECTOS)-Semana No.40 del 14-20 abril de 2025


% Programado: 71,08% $ 933.744.140

% Ejecutado: 66,43% $ 872.677.865

Atraso del 4,65% al 21-04-2025

Se anexa programación vs ejecución de obra de la actividades a la fecha. (Las actividades en rojo son actividades que debieron iniciarse o presentan atrasos despecto a la programación).

Interventoría manifiesta de acuerdo a la reprogramación presentada para el modificatorio No.2 al contrato de obra No.1935 de 2024 los porcentajes de avance programados se presentan de la siguiente manera. Es importante señalar que entre las semanas del 41 al 43 presentan avances significativos entre dichas semanas por lo que desde ahora el contratista de obra deberá tomar todas las medidas necesarias que permitan cumplir con los avances programados

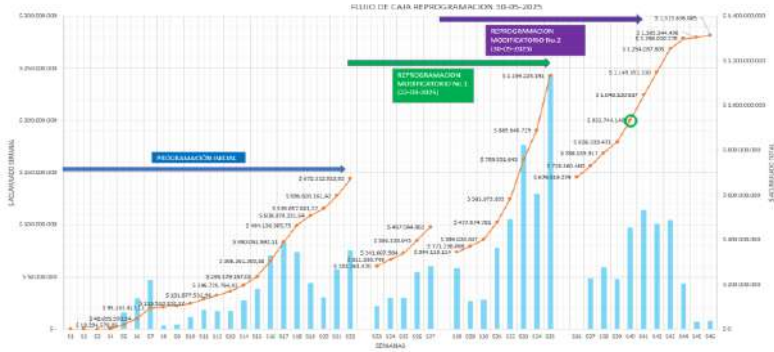

S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46
14 abr- 20 arb	21 abr- 27 abr	28 abr- 4 may	5 may- 11 may	12 may- 18 may	19 may- 25 may	26 may- 30 may
$ 97.410.669,00	$ 114.356.197,00	$ 101.250.793,00	$ 104.686.475,00	$ 43.982.470,00	$ 7.324.223,00	$ 8.291.587,00
7,42%	8,71%	7,71%	7,97%	3,35%	0,56%	0,63%
$ 933.744.140	$ 1.048.100.537	$ 1.149.351.330	$ 1.254.037.805	$ 1.298.020.275	$ 1.305.344.498	$ 1.313.636.085
71,1%	79,8%	87,5%	95,5%	98,8%	99,4%	100,0%

Cabe resaltar que la interventoría en ejercicio realizado durante la reunión del acta parcial de pago No.2 evidencio mayores y menores cantidades por lo que mediante oficio 1963_233_2024 con fecha del 15-04-2025 solicitado a el contratista de obra Balance general de obra para el día martes 22-04-2025

A continuación se presenta el listado de personal operativo en obra hasta la fecha:




FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 54

A continuación se presenta el cuadro de control de seguimiento semanal a partir del modificatorio No.2 al contrato de obra:

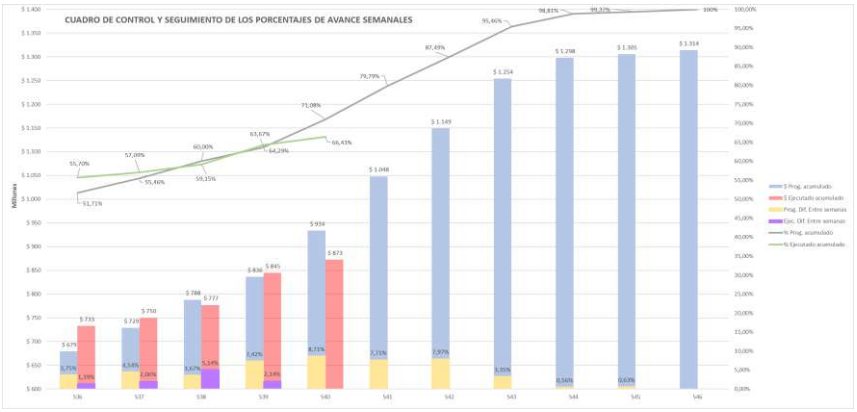

Interventoría informa que el peso dentro del contrato se encuentre en los capitulo eléctricos, aires acondicionados, carpintería metálica-vidrio, pinturas e ítems no previstos (revisar programación vs ejecución)
Interventoría radico oficio 1963_229_2024 con fecha del 15-04-2025 y asunto informe visita Contraloría General de la Nación para ser subsanado por parte del contratista de obra para el día martes 22-04-2025.
Contratista de obra informa que los equipos de aires acondicionados llegan el día de hoy 21-04-2025 y se iniciara instalación de ducteria y tuberia el dia miercoles 23-04-2025
Contratista de obra informa que la muestra de la lámina microperforada (Color y perforaciones) será enviada el día miércoles 23-04-2025 para su revisión y posterior
Contratista de obra informa que mañana se iniciara traslado e instalación de planta eléctrica en patio.
Interventoría solicita al contratista de obra realizar la prueba de presión de la red hidráulica y RCI antes de instalar cielos rasos. Contratista de obra informa que esta semana se realizaran las pruebas de presión de las redes.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
PLAN DE CONTINGENCIA	22/04/2025	UT SOLUCIONES
MESA TÉCNICA PARA RETIE, RETILAP Y BOMBEROS	DEPENDE DEL BALANCE GENERAL	SUPERVISIÓN, UT-SOLUCIONES, INTERVENTORIA
APU´S Y COTIZACIONES BARANDAS Y PASAMANOS	22/04/2025	UT SOLUCIONES
BALANCE GENERAL DE OBRA	22/04/2025	UT SOLUCIONES
SUBSANACION INFORME DE CONTRALORIA	22/04/2025	UT SOLUCIONES
PRUEBA DE PRESION DE TUBERIA HIDRAULICA Y RCI	ESTA SEMANA	UT SOLUCIONES
INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA PATIO	22/04/2025	UT SOLUCIONES
LLEGADA DE EQUIPO DE A.A.	21/04/2025	UT SOLUCIONES
INICIO INSTALACION DE DUCTERIA Y TUBERIA A.A.	23/04/2025	UT SOLUCIONES
MUESTRA LAMINA MICROPERFORADA (COLOR Y PERFORACIONES)	23/04/2025	UT SOLUCIONES
INSTALACION DE FLANCHES PERIMETRALES VECINOS	ESTA SEMANA	UT SOLUCIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 25 **MES** abril **AÑO** 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Bogotá, D.C., a los Veinti uno (Día en letras) (21) (Día en números) días del mes de abril (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING. DAVID HERRERA MURIEL

Residente de interventoría

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **54**

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Dr. Alvaro Lozano	SNR	Supervisor	
Dr. Javier Bedon	SNR	Abogado	
Arq. Guido Garcia	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Felipe Rios	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Magaly Caicedo	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Juan Leon	SNR	Apoyo técnico	
Jhon Freddy Ramirez	UT Soluciones	RL	
Arq. Carlos Osorio	UT Soluciones	Gerente de proyectos	
Ing. Jefferson Dejó	UT Soluciones	Apoyo administrativo	
Ing. Jaime Molano	UT Soluciones	Coordinador Administrativo	
Arq. Carlos Patiño	UT Soluciones	Director de obra	
Arq. Jimmy Cardenas	UT Soluciones	Residende de obra	
Ing. Ramon Lizarazo	Consorcio 310	Director de interventoría	
Ing. David Herrera	Consorcio 310	Residente de interventoría	

II. AGENDA O TEMARIO

Acta de seguimiento y control al contrato de obra

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48** **HORA** 11:00 Am Fecha: 21-04-2025

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

INSTALACION DE FACHADA MTETALICA ELEMENTOS VENTANERIA (11-04-2025 UT SOLUCIONES)
•Contratista inicio con su instalación de acuerdo a la fecha prevista, falta por instalar segundo tramo parte inferior.

CRONOGRAMA DE TRABAJO SEMANA SANTA (12-04-2025 UT SOLUCIONES)
•Contratista radico oficio ORIP PTEJ 131-2025 con fecha del 12-04-2025 y asunto plan de trabajo durante semana santa.
•Interventoría radico oficio 1963_226_2024 con fecha 14-04-2025 y asunto respuesta oficio ORIP PTEJ 131-2025 con asunto plan de trabajo durante la semana santa, solicitando de acuerdo a los avances programados de la semana 40 (71.08%) y semana 41 (79.8%) la entrega de un plan de trabajo alineado a la programación vigente del modificatorio No.2 para el día 15-04-2025 a las 10:00 am.
•Contratista de obra dio alcance al oficio radicado por parte de la interventoría mediante oficio ORIP PTEJ 133-2024 con fecha del 16-04-2025 con asunto: respuesta comunicado 1963_226_2024 plan de trabajo semana santa, reiterando que las actividades que se ejecutaran en semana santa corresponden al 7.42% que equivalen a lo programado durante la semana santa.
•Interventoría radico oficio 1963_234_2024 del 19-04-2025 con asunto requerimiento No.1 plan de contingencia contratista de obra con copia a la compañía de seguros, dado que se presentan atrasos en la ejecución de lagunas actividades (Ver programación vs ejecución de obra). Este plan de contingencia deberá ser entregado para el día martes 22-04-2025 a las 2:00 pm

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 54

MESA TÉCNICA PARA ABORDAR TEMAS DE RETIE, RETILAP Y BOMBEROS (POR DEFINIR)
•Supervisión informa que para coordinar la mesa técnica de trabajo es necesario la entrega del balance general de obra ya que de acuerdo a lo manifestado por la interventoría existen mayores y menores cantidades dentro del presupuesto.
•Contratista de obra informa que ya se esta trabajando sobre el mismo y que se tendrá listo para el día de mañana de acuerdo a lo solicitado por la interventoría en oficio.

MESA DE TRABAJO BARANDAS Y PASAMANOS (UT-SOLUCIONES)
•Interventoría informa que sea han realizado 2 mesas de trabajo donde se aprobó el esquema entregado por el contratista de obra, pero aún se está a la espera de la entrega de los apus y cotizaciones tanto de barandas como de pasamanos.
•Contratista de obra informa que serán radicados para el día martes 22-04-2025

FLANCHES PERIMETRALES (12-04-2025 UT SOLUCIONES)
•Interventoría informa que el contratista de obra retomo actividad de instalación de flanches metálicos perimetrales paso de 12 m instalados a 26.73m faltan por instalar 81.78m de un total de 108.51m
•Contratista de obra informa que esta semana quedara instalado el resto de flanches restantes contra los vecinos
•Se definirá el color para los flanches frontales en fachada principal con la supervisión.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

AVANCE DE OBRA (COSTOS DIRECTOS)-Semana No.40 del 14-20 abril de 2025


% Programado: 71,08% $ 933.744.140

% Ejecutado: 66,43% $ 872.677.865

Atraso del 4,65% al 21-04-2025

Se anexa programación vs ejecución de obra de la actividades a la fecha. (Las actividades en rojo son actividades que debieron iniciarse o presentan atrasos despecto a la programación).

Interventoría manifiesta de acuerdo a la reprogramación presentada para el modificatorio No.2 al contrato de obra No.1935 de 2024 los porcentajes de avance programados se presentan de la siguiente manera. Es importante señalar que entre las semanas del 41 al 43 presentan avances significativos entre dichas semanas por lo que desde ahora el contratista de obra deberá tomar todas las medidas necesarias que permitan cumplir con los avances programados

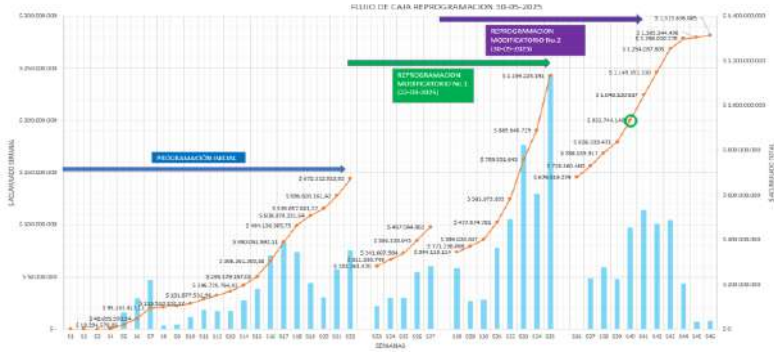

S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46
14 abr- 20 arb	21 abr- 27 abr	28 abr- 4 may	5 may- 11 may	12 may- 18 may	19 may- 25 may	26 may- 30 may
$ 97.410.669,00	$ 114.356.197,00	$ 101.250.793,00	$ 104.686.475,00	$ 43.982.470,00	$ 7.324.223,00	$ 8.291.587,00
7,42%	8,71%	7,71%	7,97%	3,35%	0,56%	0,63%
$ 933.744.140	$ 1.048.100.537	$ 1.149.351.330	$ 1.254.037.805	$ 1.298.020.275	$ 1.305.344.498	$ 1.313.636.085
71,1%	79,8%	87,5%	95,5%	98,8%	99,4%	100,0%

Cabe resaltar que la interventoría en ejercicio realizado durante la reunión del acta parcial de pago No.2 evidencio mayores y menores cantidades por lo que mediante oficio 1963_233_2024 con fecha del 15-04-2025 solicitado a el contratista de obra Balance general de obra para el día martes 22-04-2025

A continuación se presenta el listado de personal operativo en obra hasta la fecha:




FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 54

A continuación se presenta el cuadro de control de seguimiento semanal a partir del modificatorio No.2 al contrato de obra:

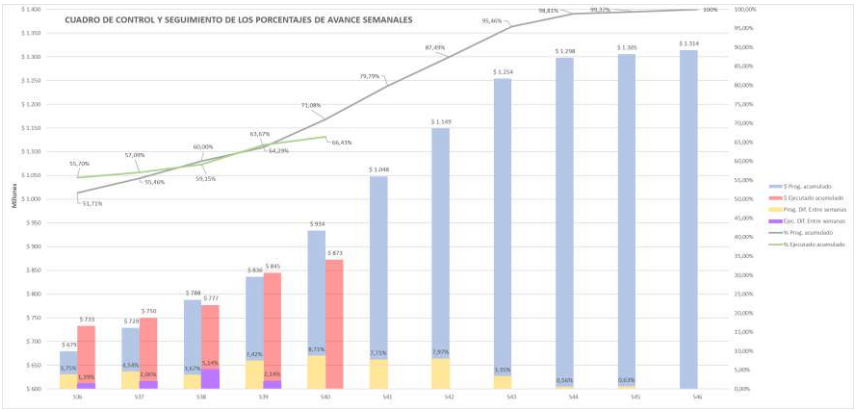

Interventoría informa que el peso dentro del contrato se encuentre en los capitulo eléctricos, aires acondicionados, carpintería metálica-vidrio, pinturas e ítems no previstos (revisar programación vs ejecución)
Interventoría radico oficio 1963_229_2024 con fecha del 15-04-2025 y asunto informe visita Contraloría General de la Nación para ser subsanado por parte del contratista de obra para el día martes 22-04-2025.
Contratista de obra informa que los equipos de aires acondicionados llegan el día de hoy 21-04-2025 y se iniciara instalación de ducteria y tuberia el dia miercoles 23-04-2025
Contratista de obra informa que la muestra de la lámina microperforada (Color y perforaciones) será enviada el día miércoles 23-04-2025 para su revisión y posterior
Contratista de obra informa que mañana se iniciara traslado e instalación de planta eléctrica en patio.
Interventoría solicita al contratista de obra realizar la prueba de presión de la red hidráulica y RCI antes de instalar cielos rasos. Contratista de obra informa que esta semana se realizaran las pruebas de presión de las redes.
Supervisión indica que para realizarse la mesa técnica de RETIE, RETILAP y bomberos es necesario que el contratista de obra presente previamente balance general de obra para coordinar dicha reunión.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
PLAN DE CONTINGENCIA	22/04/2025	UT SOLUCIONES
MESA TÉCNICA PARA RETIE, RETILAP Y BOMBEROS	DEPENDE DEL BALANCE GENERAL	SUPERVISIÓN, UT-SOLUCIONES, INTERVENTORIA
APU´S Y COTIZACIONES BARANDAS Y PASAMANOS	22/04/2025	UT SOLUCIONES
BALANCE GENERAL DE OBRA	22/04/2025	UT SOLUCIONES
SUBSANACION INFORME DE CONTRALORIA	22/04/2025	UT SOLUCIONES
PRUEBA DE PRESION DE TUBERIA HIDRAULICA Y RCI	ESTA SEMANA	UT SOLUCIONES
INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA PATIO	22/04/2025	UT SOLUCIONES
LLEGADA DE EQUIPO DE A.A.	21/04/2025	UT SOLUCIONES
INICIO INSTALACION DE DUCTERIA Y TUBERIA A.A.	23/04/2025	UT SOLUCIONES
MUESTRA LAMINA MICROPERFORADA (COLOR Y PERFORACIONES)	23/04/2025	UT SOLUCIONES
INSTALACION DE FLANCHES PERIMETRALES VECINOS	ESTA SEMANA	UT SOLUCIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 25 **MES** abril **AÑO** 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Bogotá, D.C., a los Veinti uno (Día en letras) (21) (Día en números) días del mes de abril (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING. DAVID HERRERA MURIEL

Residente de interventoría

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 55

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA (Cauca)

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Arq. Guido Garcia	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Felipe Rios	SNR	Apoyo técnico	
Ing. Juan Leon	SNR	Apoyo técnico	
Jhon Freddy Ramirez	UT Soluciones	RL	
Arq. Carlos Osorio	UT Soluciones	Gerente de proyectos	
Ing. Jefferson Dejó	UT Soluciones	Apoyo administrativo	
Ing. Jaime Molano	UT Soluciones	Coordinador Administrativo	
Arq. Carlos Patiño	UT Soluciones	Director de obra	
Arq. Jimmy Cardenas	UT Soluciones	Residende de obra	
Ing. Ramon Lizarazo	Consorcio 310	Director de interventoría	
Ing. David Herrera	Consorcio 310	Residente de interventoría	

II. AGENDA O TEMARIO

Acta de seguimiento y control al contrato de obra

III. LUGAR Y HORA

LUGAR **ORIP Puerto Tejada (Cauca) - Calle 15 No.17-48** **HORA** 11:00 Am Fecha: 25-04-2025

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

PLAN DE CONTINGENCIA (22-04-2025 UT-SOLUCIONES)

TRAZABILIDAD

•Interventoría radico oficio 1963_234_2024 con fecha 19-04-2025 y asunto requerimiento No.1 plan de contingencia con copia a la compañía de seguros para ser entregado el 22-04-2025.

•Interventoría radico oficio 1963_236_2024 con fecha 22-04-2025 y asunto requerimiento No.2 plan de contingencia y balance general con copia a la compañía de seguros para ser entregado el 240-04-2025

•Superintendencia emitió comunicado el día 23-04-2025 con asunto: observaciones al plan de contingencia y reiteración balance general donde se informa que se debe dar cumplimiento al cronograma establecido y no se podrá ser modificado.

•Interventoría dio traslado a oficio radicado por la entidad de observaciones al plan de contingencia solicitado y reiteración balance general de 23-04-2025 con oficio 1963_242_2025 a el contratista de obra.

•Contratista de obra radico oficio ORIP PTEJ 141-2025 con fecha del 24-04-2025 y asunto: respuesta comunicado 1963_234_2024, 1963_236_2024, 1963_242_2024-Acciones de contingencia para mejorar tiempos de ejecución con copia a la compañía de seguros le doy la palabra a el contratista (Ver oficio anexo)

•Interventoría dará alcance oficio emitido y solicita a el contratista de obra aclarar cuantas cuadrillas piensa emplear y fechas de entrega de espacios que permitan entrar dentro de la programación vigente respecto a las actividades atrasadas.

MESA TECNICA PARA RETIE, RETILAO Y BOMBEROS (DEPENDE DE BALANCE GENERAL)

•Interventoría informa que a la fecha no se ja radicado por parte del contratista de obra balance general para coordinar la mesa técnica

•Contratista de obra manifiesta que el balance general será radicado el día martes 29-04-2025

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **55** Página _____ de _____

APUS Y COTIZACIONES BARANDAS Y PASAMANOS (22-04-2025 UT SOLUCIONES)
•Contratista de obra radico oficio ORIP PTEJ 142-2025 con fecha del 25-04-2025 y asunto: remisión diseño y APU baranda y pasamanos para escaleras
•Interventoría informa que realizo una revisión parcial y le realizo unas observaciones a los APU´s presentados para que sean corregidos por el contratista de obra.

BALANCE GENERAL DE OBRA (22-04-2025 UT-SOLUCIONES)
Contratista de obra informa que será radicado el día martes 29-04-2025

SUBSANACION INFORME CONTRALORIA (22-04-2025 UT-SOLUCIONES)
Contratista de obra dio alcance al informe en mención mediante oficio ORIP PTEJ 135-2025 con fecha del 23-04-202 con asunto respuesta comunicado 1963_229_2024-obervaciones visita contraloría
Interventoría dio alcance previa revisión de la subsanación de las observaciones emitidas y le radico a la entidad mediante oficio 1963_238_2024 con fecha 23-04-2025

PRUEBA DE PRESION DE TUBERIA HIDRAULICA Y RCI (ESTA SEMANA)
Contratista de obra informa que el día de hoy se realizara la prueba de presión de la tubería hidráulica.

INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA PATIO (22-04-2025 UT SOLUCIONES)
•Interventoría informa que esta actividad se realizo el día 23-04-2025 pero falta su respectiva instalación
•Contratista de obra informa que se encuentran en la consecución de las curvas para la instalación del exosto de la planta.

LLEGADA DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS (21-04-2025 UT-SOLUCIONES)
Interventoría informa que los equipos de aires acondicionados llegaron a obra el día 23-04-2025. 7 en total y se revisaron sus respectivas especificaciones para validar que correspondían a los contratados.

INICIO INSTALACION DE DUCTERIA Y TUBERIA A.A (23-04-2025 UT-SOLUCIONES)
•Interventoría informa que no se cumplido con el compromiso pactado 23-04-2025
•Contratista de obra informa que ya llego material para fabricación de la ductería e informa que las cuadrillas son independientes para esta actividad.

MUESTRA DE LAMINA MICROPERFORADA (COLOR Y PERFORACIONES)
•Interventoría informa que contratista hizo llegar muestra la cual será presentada el día de hoy en el comité que se realizaría en las oficinas de la Superintendencia en Bogotá para su revisión.
•Contratista de obra informa que la producción de la lamina dura 1 semana y su instalación 3 dias.

V. TEMAS TRATADOS (Seguimiento al Cronograma)

AVANCE DE OBRA (COSTOS DIRECTOS)-Semana No.41 del 21-27 abril de 2025


% Programado: 76,97% $ 1.011.103.651

% Ejecutado: 71.85% $ 943.804.469

Atraso del 5,12% al 25-04-2025

Se anexa programación vs ejecución de obra de la actividades a la fecha. (Las actividades en rojo son actividades que debieron iniciarse o presentan atrasos despecto a la programación).

Interventoría manifiesta de acuerdo a la reprogramación presentada para el modificatorio No.2 al contrato de obra No.1935 de 2024 los porcentajes de avance programados se presentan de la siguiente manera. Es importante señalar que entre las semanas del 41 al 43 presentan avances significativos entre dichas semanas por lo que desde ahora el contratista de obra deberá tomar todas las medidas necesarias que permitan cumplir con los avances programados

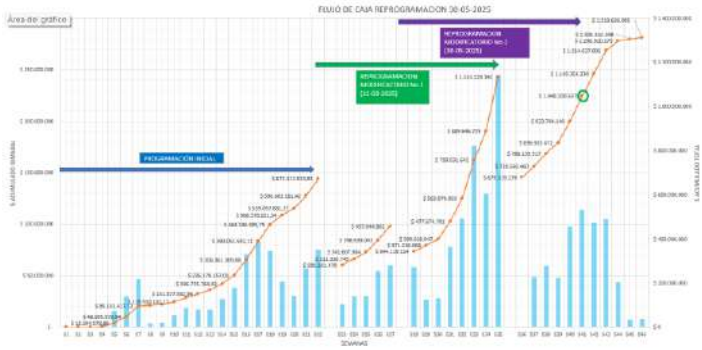

S41	S42	S43	S44	S45	S46
21 abr- 27 abr	28 abr- 4 may	5 may- 11 may	12 may- 18 may	19 may- 25 may	26 may- 30 may
$ 114.356.397,00	$ 101.250.793,00	$ 104.686.475,00	$ 43.982.470,00	$ 7.324.223,00	$ 8.291.587,00
8,71%	7,71%	7,97%	3,35%	0,56%	0,63%
$ 1.048.100.537	$ 1.149.351.330	$ 1.254.037.805	$ 1.298.020.275	$ 1.305.344.498	$ 1.313.636.085
79,8%	87,5%	95,5%	98,8%	99,4%	100,0%

Estos atrasos son debidos principalmente a:
•El no cumplimiento del plan de trabajo presentado por el contratista de obra para semana santa mediante oficio ORIP PTEJ 131-2025 del 12-04-2025.
•La no continuación de la instalación del cableado eléctrico en piso 2 y piso 3 para los diferentes sistemas y que durante semana santa y prácticamente toda esta semana no se retomaron hasta el día de hoy.
•La no iniciación de las actividades de ducterias e instalación de tubería de cobre y de refrigeración de los sistemas de aires acondicionados previstas dentro de la programación de obra con fecha del 12-04-2025, los cuales han impedido la instalación del cielo falso en la mayoría de espacios, instalación de luminarias entre otras.
Así las cosas y de acuerdo a los dos requerimientos realizados por esta interventoría y a los atrasos presentados a la fecha, se presentara informe a la entidad contratante de solicitud para iniciar el proceso administrativo correspondiente.


DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** **55**

A continuación se presenta el listado de personal operativo en obra hasta la fecha:



A continuación se presenta el cuadro de control de seguimiento semanal a partir del modificatorio No.2 al contrato de obra:

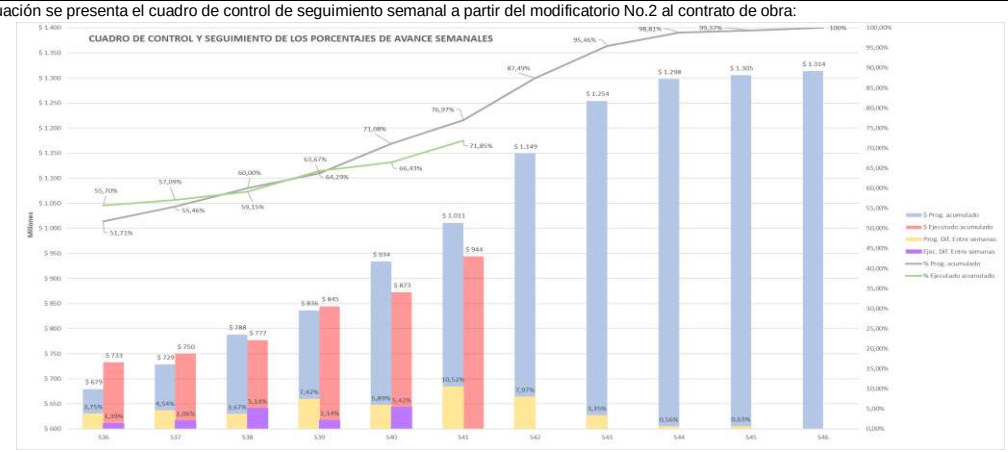

Interventoría informa que el peso dentro del contrato se encuentre en los capitulo eléctricos, aires acondicionados, carpintería metálica-vidrio, pinturas e ítems no previstos (revisar programación vs ejecución)

BOMBEROS

•Contratista de obra radico oficio ORIP PTEJ 136-2025 con fecha del 23-04-2025 y asunto: solicitud de inspección de seguridad para certificación de red seca ORIP a el cuerpo de bomberos voluntarios de Puerta Tejada y donde se anexo diseños (Planos) en PDF y autocad, así como memorias de calculo entregados por los consultores de diseño.
•Contratista de obra radico oficio a la interventoría oficio con numero de radicado ORIP PTEJ 137-2025 con fecha del 23-04-2025 con asunto respuesta tramite bomberos-respuesta comunicado 1963_231_2024 (Ver oficio anexo).
•Se esta a la espera por parte de bomberos del oficio radicado por parte del contratista de obra.

Acta parcial de pago No.2

Contratista informa que ya se están subsanando las observaciones emitidas por la supervisión y quedara el día de hoy quedara radicada en debida forma.

TRAMITE AUMENTO DE CARGA EMCALI

Contratista de obra informa que hoy se radica en las horas de la tarde ante EMCALI.

FORMATO		
ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO - OBRA		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
	EJECUCION DE OBRAS	1.0

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CIVILES

CONTRATO DEOBRA No 1935 (Numero de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción) **ACTA No** 55

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
ALCANCE PLAN DE CONTINGENCIA	26/04/2025	INTERVENTORIA
MESA TÉCNICA PARA RETIE, RETILAP Y BOMBEROS	DEPENDE DEL BALANCE GENERAL	SUPERVISIÓN, UT-SOLUCIONES, INTERVENTORIA
APU´S Y COTIZACIONES BARANDAS Y PASAMANOS	22/04/2025	UT SOLUCIONES
BALANCE GENERAL DE OBRA	29/04/2025	UT SOLUCIONES
PRUEBA DE PRESION DE TUBERIA HIDRAULICA Y RCI	25/04/2025	UT SOLUCIONES
INICIO INSTALACION DE DUCTERIA Y TUBERIA A.A.	25/04/2025	UT SOLUCIONES
RACIDACION TRAMITE EMCALI AUMENTO DE CARGA	25/04/2025	UT SOLUCIONES
ACTA PARCIAL DE PAGO No.2	25/04/2025	UT SOLUCIONES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 2 **MES** mayo **AÑO** 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría,

en Bogotá, D.C., a los Veinti cinco (Día en letras) (25) (Día en números) días del mes de abril (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) ING. DAVID HERRERA MURIEL

Residente de interventoría

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04656

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CAJAS DE CONEXIÓN (CONDUIT)	**METÁLICAS**	**2400, 5800, 10 X 10, OCTAGONAL**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

SOLUCIONES MDS S.A.S.

Calle 12A No. 21 - 21, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.5)

Fecha de Certificación: 2012/07/27
Fecha de Renovación: 2024/02/23
Fecha de Vencimiento: 2027/02/23

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/02/23 y 2026/02/23

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04656

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2012/07/27
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/02/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/02/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CAJAS DE CONEXIÓN (CONDUIT)

Tipo		Metálicas			
Referencia		2400	5800	10 x 10	Octagonal
Material de construcción y Calibre		Lamina cold rolled calibre 20 BWG (0.9 mm)			
Geometría		Cuadrado	Rectangular	Cuadrada	Octagonal
Dimensiones Internas	**Ancho**	101.0 mm	53.9 mm	102.6 mm	89.5 mm
	Largo	101.0 mm	101.8 mm	102.6 mm	89.5 mm
	Profundo	35.8 mm	47.6 mm	66 mm	38 mm
Volumen interno		376.52 cm^3	241.70 cm^3	660 cm^3	241.70 cm^3
Grado de protección		IK 05			
Característica de la pintura (Tipo, Color)		Zincadas y galvanizadas			
Resistencia a cámara salina		Mínimo 12 horas			
Montaje		Superficial, semiempotrado o empotrado			
Uso		Para instalaciones eléctricas			
Referencial		RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.5)			

Fábrica	**Planta**
SOLUCIONES MDS S.A.S.	BOGOTÁ, COLOMBIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-14239-2022S2E10/095

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS) TUBOS O TUBERÍAS	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1 Ver Anexo No. 2

Titular del Certificado

INDUSTRIA ELECTRICA DEL CAUCA S.A.S.

IMPORTADOR

Cl 15 26 101 Bg 36 Complejo Industrial Y Comercial CIC 1,Yumbo

NIT: 817.000.513-0

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE: Resoluciones 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre de 2013, 90795 del 25 de Julio de 2014 y 40492 del 24 de abril de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.
Artículos 20.5 y 20.6.1

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en los documentos Anexos que hacen parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de dos (2) páginas y ANEXO No. 2 que consta de tres (3) páginas.

Fecha de Emisión: 14 de Julio de 2022
Fecha de Reexpedición: 01 de Marzo de 2024
Fecha de Expiración: 14 de Julio de 2025
Fecha próximo seguimiento: 13 de Julio de 2024**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos
**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Director de Certificación

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14239-2022S2E10/095
CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	Conduleta forma LB 1/2"	LB050
2	Conduleta forma LB 3/4"	LB075
3	Conduleta forma LB 1"	LB100
4	Conduleta forma LB 1-1/4"	LB125
5	Conduleta forma LB 1-1/2"	LB150
6	Conduleta forma LB 2"	LB200
7	Conduleta forma LR 1/2"	LR050
8	Conduleta forma LR 3/4"	LR075
9	Conduleta forma LR 1"	LR100
10	Conduleta forma LR 1-1/4"	LR125
11	Conduleta forma LR 1-1/2"	LR150
12	Conduleta forma LR 2"	LR200
13	Conduleta forma LL 1/2"	LL050
14	Conduleta forma LL 3/4"	LL075
15	Conduleta forma LL 1"	LL100
16	Conduleta forma LL 1-1/4"	LL125
17	Conduleta forma LL 1-1/2"	LL150
18	Conduleta forma LL 2"	LL200
19	Conduleta forma C 1/2"	LC050
20	Conduleta forma C 3/4"	LC075
21	Conduleta forma C 1"	LC100
22	Conduleta forma C 1-1/4"	LC125
23	Conduleta forma C 1-1/2"	LC150
24	Conduleta forma C 2"	LC200
25	Conduleta forma T 1/2"	LT050
26	Conduleta forma T 3/4"	LT075
27	Conduleta forma T 1"	LT100
28	Conduleta forma T 1-1/4"	LT125
29	Conduleta forma T 1-1/2"	LT150
30	Conduleta forma T 2"	LT200
31	Caja en fundición de aluminio 2x4" con 3 salidas de 1/2"	SG503
32	Caja en fundición de aluminio 2x4" con 3 salidas de 3/4"	SG753
33	Caja en fundición de aluminio 2x4" con 3 salidas de 1"	SG103
34	Caja en fundición de aluminio 2x4" con 4 salidas de 1/2"	SG504
35	Caja en fundición de aluminio 2x4" con 4 salidas de 3/4"	SG754
36	Caja en fundición de aluminio 2x4" con 4 salidas de 1"	SG104
37	Caja en fundición de aluminio 2x4" con 5 salidas de 1/2"	SG505
38	Caja en fundición de aluminio 2x4" con 5 salidas de 3/4"	SG755

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14239-2022S2E10/095
CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
39	Caja en fundición de aluminio 2x4"x2-5/8"con 3 salidas de 1/2"	SDG503
40	Caja en fundición de aluminio 2x4"x2-5/8" con 3 salidas de 3/4"	SDG753
41	Caja en fundición de aluminio 4x4" con 3 salidas de 1/2"	DG503
42	Caja en fundición de aluminio 4x4" con 3 salidas de 3/4"	DG753
43	Caja en fundición de aluminio 4x4" con 3 salidas de 1"	DG103
44	Caja en fundición de aluminio 4x4" con 4 salidas de 1/2"	DG504
45	Caja en fundición de aluminio 4x4" con 4 salidas de 3/4"	DG754
46	Caja en fundición de aluminio 4x4" con 5 salidas de 1/2"	DG505
47	Caja en fundición de aluminio 4x4" con 5 salidas de 3/4"	DG755
48	Caja en fundición de aluminio 4x4" con 7 salidas de 1/2"	DG507
49	Caja en fundición de aluminio 4x4" con 7 salidas de 3/4"	DG757
50	Caja en fundición de aluminio redonda con 5 salidas de 1/2"	RB505
51	Caja en fundición de aluminio redonda con 5 salidas de 3/4'	RB755
52	Tapa caja FS 2x4" en Aceo	1BC
53	Tapa caja FS 4x4" en Acero	2BC
54	Tapa caja FS redonda en Acero	RBC
55	Caja metálica en acero 2x4"	HB Series
56	Caja metálica en acero 4x4"	SB series
57	Caja metálica en acero octagonal	OB series
58	Tapa caja metálica en acero 2x4"	HC series
59	Tapa caja metálica en acero 4x4"	SC series
60	Tapa caja metálica en acero octagonal"	OC series

FIN DEL ANEXO No. 1

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14239-2022S2E10/095
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
1	Tubería Eléctrica EMT 1/2"	EPS050
2	Tubería Eléctrica EMT 3/4"	EPS075
3	Tubería Eléctrica EMT 1"	EPS100
4	Tubería Eléctrica EMT 1-1/4"	EPS125
5	Tubería Eléctrica EMT 1-1/2"	EPS150
6	Tubería Eléctrica EMT 2"	EPS200
7	Tubería Eléctrica EMT 2-1/2"	EPS250
8	Tubería Eléctrica EMT 3"	EPS300
9	Tubería Eléctrica EMT 4"	EPS400
10	Tubería Eléctrica IMC 1/2"	IPH050
11	Tubería Eléctrica IMC 3/4"	IPH075
12	Tubería Eléctrica IMC 1"	IPH100
13	Tubería Eléctrica IMC 1-1/4"	IPH125
14	Tubería Eléctrica IMC 1-1/2"	IPH150
15	Tubería Eléctrica IMC 2"	IPH200
16	Tubería Eléctrica IMC 2-1/2"	IPH250
17	Tubería Eléctrica IMC 3"	IPH300
18	Tubería Eléctrica IMC 4"	IPH400
19	Curva tubo EMT 1/2"	EE050
20	Curva tubo EMT 3/4"	EE075
21	Curva tubo EMT 1"	EE100
22	Curva tubo EMT 1-1/4"	EE125
23	Curva tubo EMT 1-1/2"	EE150
24	Curva tubo EMT 2"	EE200
25	Curva tubo EMT 2-1/2"	EE250
26	Curva tubo EMT 3"	EE300
27	Curva tubo EMT 4"	EE400
28	Curva tubo IMC 1/2"	IRE050
29	Curva tubo IMC 3/4"	IRE075
30	Curva tubo IMC 1"	IRE100
31	Curva tubo IMC 1-1/4"	IRE125
32	Curva tubo IMC 1-1/2"	IRE150
33	Curva tubo IMC 2"	IRE200
34	Curva tubo IMC 2-1/2"	IRE250
35	Curva tubo IMC 3"	IRE300

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14239-2022S2E10/095
TUBOS O TUBERIAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
36	Curva tubo IMC 4"	IRE400
37	Conector tubo EMT 1/2"	S3050
38	Conector tubo EMT 3/4"	S3075
39	Conector tubo EMT 1"	S3100
40	Conector tubo EMT 1-1/4"	S3125
41	Conector tubo EMT 1-1/2"	S3150
42	Conector tubo EMT 2"	S3200
43	Conector tubo EMT 2-1/2"	S3250
44	Conector tubo EMT 3"	S3300
45	Conector tubo EMT 4"	S3400
46	Unión tubo EMT 1/2"	S4050
47	Unión tubo EMT 3/4"	S4075
48	Unión tubo EMT 1"	S4100
49	Unión tubo EMT 1-1/4"	S4125
50	Unión tubo EMT 1-1/2"	S4150
51	Unión tubo EMT 2"	S4200
52	Unión tubo EMT 2-1/2"	S4250
53	Unión tubo EMT 3"	S4300
54	Unión tubo EMT 4"	S4400
55	Unión tubo IMC 1/2"	IC050
56	Unión tubo IMC 3/4"	IC075
57	Unión tubo IMC 1"	IC100
58	Unión tubo IMC 1-1/4"	IC125
59	Unión tubo IMC 1-1/2"	IC150
60	Unión tubo IMC 2"	IC200
61	Unión tubo IMC 2-1/2"	IC250
62	Unión tubo IMC 3"	IC300
63	Unión tubo IMC 4"	IC400
64	Conector recto coraza LT 1/2"	47050
65	Conector recto coraza LT 3/4"	47075
66	Conector recto coraza LT 1"	47100
67	Conector recto coraza LT 1-1/4"	47125
68	Conector recto coraza LT 1-1/2"	47150
69	Conector recto coraza LT 2"	47200
70	Conector recto coraza LT 2-1/2"	47250
71	Conector recto coraza LT 3"	47300
72	Conector recto coraza LT 4"	47400
73	Conector curvo coraza LT 1/2"	49050
74	Conector curvo coraza LT 3/4"	49075

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 2 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-14239-2022S2E10/095 TUBOS O TUBERIAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS	REFERENCIA
75	Conector curvo coraza LT 1"	49100
76	Conector curvo coraza LT 1-1/4"	49125
77	Conector curvo coraza LT 1-1/2"	49150
78	Conector curvo coraza LT 2"	49200
79	Conector curvo coraza LT 2-1/2"	49250
80	Conector curvo coraza LT 3"	49300
81	Conector curvo coraza LT 4"	49400

FIN DEL ANEXO No. 2

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 06160

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
INTERRUPTORES TOMACORRIENTES COMBINACIONES	**VER ANEXO**	**VER ANEXO**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 12 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

LEGRAND COLOMBIA S.A

Calle 65A No. 93–91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.10 y 20.16.3)

Fecha de Certificación: 2015/10/20
Fecha de Actualización: 2023/10/18
Fecha de Vencimiento: 2024/12/23

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2024/12/23

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Tipo	**Línea Living Light**
TOMACORRIENTES	
Tensión	250 V
Corriente	16 A
Referencias	**Descripción**
L4001/0	Interruptor sencillo 1 modulo, sin tapa
L4003/0	Interruptor conmutable, 3 vías, 1 módulo, sin tapa
L4005/0	Pulsador, 1 módulo, sin tapa
L4001N	Interruptor sencillo 1 modulo
LN4004	Interruptor conmutable, 4 vías, 1 módulo, sin tapa
L4005	Pulsador sencillo
L4005/2	Pulsador 2 módulos
L4042/2	Pulsador con símbolo de campana y luz
L4042	Pulsador con símbolo de campana y luz
L4043	Pulsador con símbolo de campana y luz
L4043/2	Pulsador con símbolo de campana y luz
L4044	Pulsador con contacto independiente para sistemas de señalización
L4040	Pulsador Unipolar con tarjetero iluminable
L4033	Pulsador por tirador unipolar
L4038V	Pulsador Unipolar con difusor iluminable color verde
L4038R	Pulsador Unipolar con difusor iluminable color rojo
L4036	Pulsador doble unipolar
L4037	Pulsador doble unipolar
L4034	Unipolar iluminable con contacto cerrado
L4005/0W	Pulsador sencillo
L4005/2W	Pulsador sencillo
L4001	Interruptor sencillo
L4002	Interruptor bipolar cuerpo iluminable
L4003	Interruptor conmutable
L4004	Interruptor conmutable, 4 vías, 1 módulo
L4004N	Interruptor conmutable, 4 vías, 1 módulo
N4004N	Interruptor conmutable, 4 vías, 1 módulo, blanco
N4004	Interruptor conmutable, 4 vías, 1 módulo
L4027	Conmutador unipolar doble tecla con enclavamiento
NT404	Interruptor conmutable 4 vías, 1 módulo
SN1-4911/3	Interruptor sencillo con luz piloto, 3 módulos
SN4001LL	Interruptor sencillo con luz piloto, 3 módulos
SN1/2-4911	Interruptor doble con luz piloto
SN4001X2LL	Interruptor doble con luz piloto
SN1/3-4911	Interruptor triple con luz piloto
SN4001X3LL	Interruptor triple con luz piloto
SN3-4911/3	Interruptor sencillo conmutable con luz piloto, 3 módulos
SN4003LL	Interruptor sencillo conmutable con luz piloto, 3 módulos

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Tipo	**Línea Living Light**
SN3/2-4911	Interruptor doble, conmutable con luz piloto
SN4003X2LL	Interruptor doble, conmutable con luz piloto
SN3/3-4911	Interruptor triple conmutable con luz piloto
SN4003X3LL	Interruptor triple conmutable con luz piloto
SN5-4911/3	Pulsador con luz piloto
SN4005LL	Pulsador con luz piloto
TOMACORRIENTES	
Tensión	127 V max
Corriente	15 A
Referencias	**Descripción**
L4129S	Tomacorriente de dos polos y tierra, 1 módulo
L4188S	Tomacorriente dúplex de dos polos y tierra, 2 módulos
SL4188	Tomacorriente dúplex con polo a tierra
L4188STA	Tomacorriente de dos polos y tierra, 2 módulos Con indicador de polo a tierra aislado
N4129S	Tomacorriente de dos polos y tierra, 1 módulo
N4188S	Tomacorriente dúplex 2 polos y tierra, 3 módulos
SN4188	Tomacorriente dúplex con polo a tierra
N4188STA	Tomacorriente dúplex 2 polos y tierra, 3 módulos. Con indicador de polo a tierra aislado
NT 4129S	Tomacorriente de dos polos y tierra, 15 A, 1 módulo
NT 4188S	Tomacorriente Dúplex 2 polos y tierra, 3 módulos
L4188GF	Toma de corriente negra duplex con interruptor de circuito por falla a tierra GFCI, con botón de restablecimiento RESET y prueba de TEST.
N4188GF	Toma de corriente blanca duplex con interruptor de circuito por falla a tierra GFCI, con botón de restablecimiento RESET y prueba de TEST
N4188GFG6	Toma de corriente duplex ICFT con Protección infantil y autoprueba 15A, 127 V
L4188GFG6	
L4188AC	Tomacorriente Dúplex 2 polos y tierra, 2 cargadores USB AC de 3.1 A con protección infantil. 3 módulos. Incluye chasis, Color Negro
N4188AC	Tomacorriente Dúplex 2 polos y tierra, 2 cargadores USB AC de 3.1 A con protección infantil. 3 módulos. Incluye chasis, Color Blanco
L4188AA	Toma de corriente Duplex 2P+T con 2 USB A+A 3 mod. 3.1A incluye chasis, Color Negro
N4188AA	Toma de corriente Duplex 2P+T con 2 USB A+A 3 mod. 3.1A incluye chasis, Color Blanco
COMBINACIÓN INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE	
Tensión	127 V
Corriente	15 A
Referencias	**Descripción**
SL4911/28	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente
SN4911/28	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente
SL40014929SLL	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente con polo a tierra
SN40014929SLL	Interruptor sencillo con luz piloto más tomacorriente con polo a tierra

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

ACCESORIOS	
Referencias	**Descripción**
L4915N	Cubretecla 1 modulo para ref: LN4004
L4915M2N	Cubretecla 2 modulo para ref: LN4004
L4915M3N	Cubretecla 3 modulo para ref: LN4004
NT 4911	Cubretecla de 1 modulo
NT 4911/ 2	Cubretecla de 2 módulos
NT 4911/ 3	Cubretecla de 3 módulos
NT 4950	Módulo ciego, 1 módulo
NT 4953	Módulo con salida de cable, 1 módulo
NT 4803TH	Placa color LIGHT TECH 3 módulos
NT 4804TH	Placa color LIGHT TECH 4 módulos
NT 4807TH	Placa color LIGHT TECH 7 módulos
Materiales	• Partes plásticas en contacto con elementos conductores en material PC y polipropileno, otras partes plásticas en ABS. • Contactos de plata sobre aleación de cobre (latón). Tornillos, tuercas y resortes en acero
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10 y 20.16.3)

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Tipo	**Línea Living Now**
INTERRUPTORES	
Referencias	**Descripción**
K4027	CONMUTADOR 16A 250V 1M
K4018	CONTROL DE VENTILADOR 110-220V 15-160VA 50/60Hz
KM4002	INTERRUPTOR BIPOLAR 1VÍA 16AX 250Va.c 1M ARENA
KG4002	INTERRUPTOR BIPOLAR 1VÍA 16AX 250Va.c 1M NEGRO
KW4002	INTERRUPTOR BIPOLAR 1VÍA 16AX 250Va.c 1M BLANCO
K4003	INTERRUPTOR CONMUTABLE 1M 10AX 250Va.c 2 VIAS
K4004	INTERRUPTOR DE 4 VÍAS 1M 10AX 250Va.c
K4001	INTERRUPTOR SENCILLO 1M 10AX 250Va.c
K4549	INTERRUPTOR DE TARJETA 110/230Vac 2 A -60VA
K4005	PULSADOR 1M 10AX 250Va.c
K4027V127H	PULSADOR DOBLE HOTEL 10A 250Va.c
TOMACORRIENTES	
Tensión	125 V
Corriente	15 A
Referencias	**Descripción**
KM4188AC	Tomacorriente DÚPLEX + 2 USB A+C ARENA
KW4188AC	Tomacorriente DÚPLEX + 2 USB A+C BLANCO
KG4188AC	Tomacorriente DÚPLEX + 2 USB A+C NEGRO
KM4188	Tomacorriente DÚPLEX 2P+T 15A ARENA
KW4188	Tomacorriente DÚPLEX 2P+T 15A BLANCO
KG4188	Tomacorriente DÚPLEX 2P+T 15A NEGRO
KM4188GFG6	Tomacorriente GFCI 127V DÚPLEX GFC6 15A ARENA
KW4188GFG6	Tomacorriente GFCI 127V DÚPLEX GFC6 15A BLANCO
KG4188GFG6	Tomacorriente GFCI 127V DÚPLEX GFC6 15A NEGRO
KM4129	Tomacorriente SENCILLA 2P+T 2M ARENA
KW4129	Tomacorriente SENCILLA 2P+T 2M BLANCO
KG4129	Tomacorriente SENCILLA 2P+T 2M NEGRO
ACCESORIOS	
Referencias	**Descripción**
K4949	MEDIO MODULO CIEGO
KA4803ZG	PLACA 3M ACERO
KA4803KM	PLACA 3M ARENA
KA4803DM	PLACA 3M AURA
KA4803KW	PLACA 3M BLANCO
KA4803DA	PLACA 3M CIELO
KA4803ZM	PLACA 3M COBRE
KA4803DW	PLACA 3M HIELO
KA4803NW	PLACA 3M LUNA
KA4803KG	PLACA 3M NEGRO
KA4803DG	PLACA 3M NOCHE
KA4803LG	PLACA 3M NOGAL
KA4803MM	PLACA 3M OPTICO
KA4803ZW	PLACA 3M ORO
KA4803MW	PLACA 3M PIXEL

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Tipo	Línea Living Now
KA4803LM	PLACA 3M ROBLE
KA4803NG	PLACA 3M SPACE
KA4804ZG	PLACA 4M ACERO
KA4804KM	PLACA 4M ARENA
KA4804DM	PLACA 4M AURA
KA4804KW	PLACA 4M BLANCO
KA4804DA	PLACA 4M CIELO
KA4804ZM	PLACA 4M COBRE
KA4804DW	PLACA 4M HIELO
KA4804NW	PLACA 4M LUNA
KA4804KG	PLACA 4M NEGRO
KA4804DG	PLACA 4M NOCHE
KA4804LG	PLACA 4M NOGAL
KA4804MM	PLACA 4M ÓPTICO
KA4804ZW	PLACA 4M ORO
KA4804MW	PLACA 4M PIXEL
KA4804LM	PLACA 4M ROBLE
KA4804NG	PLACA 4M SPACE
KA4806ZG	PLACA 6M ACERO
KA4806KM	PLACA 6M ARENA
KA4806DM	PLACA 6M AURA
KA4806KW	PLACA 6M BLANCO
KA4806DA	PLACA 6M CIELO
KA4806ZM	PLACA 6M COBRE
KA4806DW	PLACA 6M HIELO
KA4806NW	PLACA 6M LUNA
KA4806KG	PLACA 6M NEGRO
KA4806DG	PLACA 6M NOCHE
KA4806LG	PLACA 6M NOGAL
KA4806MM	PLACA 6M OPTICO
KA4806ZW	PLACA 6M ORO
KA4806MW	PLACA 6M PIXEL
KA4806LM	PLACA 6M ROBLE
KA4806NG	PLACA 6M SPACE
K4703	SOPORTE 3 MOD
K4704L	SOPORTE 4 MOD
K4706	SOPORTE 6 MOD
Materiales	• Partes plásticas en contacto con elementos conductores en material PC y polipropileno, otras partes plásticas en ABS. • Contactos de aleación de cobre. Tornillos, tuercas y resortes en acero
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10 y 20.16.3)

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Tipo	Living Now Smart
Referencia	Descripcion
K4003C	INTERRUPTOR 2VÍAS 1M SMART
Accesorios	**Descripción**
KG42M2	CUBRETECLA INTERRUPTOR NEGRO SMART
KM42M2	CUBRETECLA INTERRUPTOR ARENA SMART
KW42M2	CUBRETECLA INTERRUPTOR BLANCO SMART
Tensión	100/ 240 Va.c
Corriente	Corriente: 2 A máx. bombilla Corriente: 0,4 A máx. LED Corriente: 1 A máx. CFL
Materiales	Partes plásticas en contacto con elementos conductores en material PC y polipropileno, otras partes plásticas en ABS. Contactos de plata sobre aleación de cobre (latón). Tornillos, tuercas y resortes en acero
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.16.3)

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Tipo	Línea Axolute
Tensión	127/ 250 V
Corriente	16 A (pulsadores 10 A)
INTERRUPTORES	
Referencias	**Descripción**
HC4051	Interruptor sencillo
HS4051	Interruptor sencillo
HC4053	Interruptor conmutable
HS4053	Interruptor conmutable
HC4001	Interruptor sencillo axial
HS4001	Interruptor sencillo axial
HC4003	Interruptor conmutable axial
HS4003	Interruptor conmutable axial
HC4027	Conmutador persianas doble
HS4027	Conmutador persianas doble
HC4054	Interruptor de 4 vías
HS4054	Interruptor de 4 vías
HC4004	Interruptor de 4 vías
HS4004	Interruptor de 4 vías
HC4001/2	Interruptor axial
HS4001/2	Interruptor axial
HC4051/2	Interruptor basculante
HS4051/2	Interruptor basculante
HC4003/2	Interruptor axial
HS4003/2	Interruptor axial
HC4053/2	Interruptor conmutador basculante
HS4053/2	Interruptor conmutador basculante
HC4004/2	Interruptor de 4 vías
HS4004/2	Interruptor de 4 vías
HC4054/2	Interruptor de 4 vías
HS4054/2	Interruptor de 4 vías
HC4027/2	Conmutador persianas doble
HS4027/2	Conmutador persianas doble
HC4055	Pulsador sencillo
HS4055	Pulsador sencillo
HC4033	Pulsador por tirador
HS4033	Pulsador por tirador
HC4005	Pulsador axial
HS4005	Pulsador axial
HC4044	Pulsador con contactos independientes
HS4044	Pulsador con contactos independientes
HC4055/2	Pulsador sencillo
HS4055/2	Pulsador sencillo
HD4055M2	Pulsador sencillo
HC4005/2	Pulsador axial
HS4005/2	Pulsador axial
HC4034/2	Pulsador contacto cerrado

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Tipo	Línea Axolute
HS4034/2	Pulsador contacto cerrado
HC4005/2W	Pulsador axial
HS4005/2W	Pulsador axial
HC4055	Pulsador basculante
HS4055	Pulsador basculante
HC4055/2	Pulsador basculante
HS4055/2	Pulsador basculante
HC4001/2	Interruptor Axial
HC4053/2	Interruptor conmutable basculante
HS4053/2	Interruptor conmutable basculante
HC4003/2	Interruptor conmutable axial
HS4003/2	Interruptor conmutable axial
TOMACORRIENTES	
HC4129S	Tomacorriente 2P+T 15 A - 1 módulo
HC4188S	Tomacorriente dúplex 2P + T, 3 módulos.
HS4129S	Tomacorriente 2P+T 15 A - 1 módulo
HS4188S	Tomacorriente dúplex 2P + T, 3 módulos.
HC4188GFG6	Tomacorriente Dúplex GFCI G6
HC4188GF	Tomacorriente Duplex 2p+T GFCI
HS4188GFG6	Tomacorriente Dúplex GFCI G6
HS4188GFWG6	Tomacorriente Dúplex GFCI G6
Materiales	• Partes plásticas en contacto con elementos conductores en material PC y polipropileno, otras partes plásticas en ABS. • Contactos de plata sobre aleación de cobre (latón). Tornillos, tuercas y resortes en acero
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10 y 20.16.3)

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Tipo				LÍNEA ARTEOR	
Referencia				**Corriente y tensión nominal**	**Descripción**
Cuadrada		**Redonda**			
Blanca	**Magnesio**	**Blanca**	**Magnesio**		
572038	572538	573063	573163	10AX / 250V	Interruptor de 4 vías 2 módulos
573294	573794	573295	573795	10AX / 250V	Interruptor para luces de cama 2 x 1 módulo
573382	573882	573383	573883	10AX / 250V	Interruptor para luces de mesa y entrada 2 x 1 módulo
572054	572554	572074	572574	10AX / 250V	Unidad control interno
573284	573784	573285	573785	20AX / 250V	Interruptor maestro conmutable 2 módulos
572046	572546	573075	573175	20AX / 250V	Interruptor bipolar 2 módulos
572042	572542	573071	573171	20AX / 250V	Interruptor conmutable con luz piloto
572044	572544	573073	573173	20AX / 250V	2 interruptores conmutables + 1 interruptor sencillo 3 bandas
573222	573722	573223	573723	10AX / 250V	Doble interruptor para control de persianas - 250 VA 2 módulos
573234	573734	573235	573735	10AX / 250V	Doble interruptor para control de cortina - 250 VA 2 módulos
572451	-	-	-	20AX / 250V	Interruptor bipolar 1 módulo
572013	572513	-	-	20AX / 250V	Interruptor bipolar 1 módulo
Referencial				RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16.3)	

NOTA:
Todas las referencias pueden ir o no acompañadas de uno o varios de los siguientes sufijos
S inicial o final: Autoservicio
N: 1 Módulos
M2N: 2 Modulos

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Tipo	Tomacorriente
Referencia	Descripcion
5351-I	Tomacorriente sencillo 20A 125V
5851-I	Tomacorriente Heavy Duty sencillo 20A 250V
26861W	Tomacorriente sencillo 20A 250V
TR26362HGW	Tomacorriente doble Heavy Duty Hospital Grade 20A 125V Blanco
TR26362HGRED	Tomacorriente doble Heavy Duty Hospital Grade 20A 125V Rojo
TRIG26362HGW	Tomacorriente doble TA Hospital Grade 20A 125V Blanco
TRIG26362HGRED	Tomacorriente doble TA Hospital Grade 20A 125V Rojo
TRIG26362HG	Tomacorriente doble TA Hospital Grade 20A 125V Naranja
TR8200WSP	Tomacorriente doble Extra Heavy Duty Hospital Grade 20A 125V Blanco
5362W	Tomacorriente sencillo 20A 125V
2097HGW	Tomacorriente doble GFCI Hospital Grade 20A 125V Blanco
2097HGRED	Tomacorriente doble GFCI Hospital Grade 15A 125V Rojo
8301RED	Tomacorriente Heavy Duty Hospital Grade sencillo 20A 125V Rojo
8301GRY	Tomacorriente Heavy Duty Hospital Grade sencillo 20A 125V Gris
8300GRY	Tomacorriente Extra Heavy Duty Hospital Grade doble 20A 125V Gris
8800GRY	Tomacorriente Extra Heavy Duty Hospital Grade doble 20A 250V Gris
5862W	Tomacorriente Heavy Duty Hospital Grade doble 20A 250V Blanco
5262RED	Tomacorriente doble 15A 125V Rojo
5262GRY	Tomacorriente doble 15A 125V Gris
2097HGNTLTRW	Tomacorriente doble GFCI Hospital Grade 20A 125V Blanco
PS5262	Tomacorriente doble 20A 125V Café
TM826USBW	Tomacorriente doble con puertos USB 15A 125V Blanco
8300	Tomacorriente doble 20A 125V Marfil
3232-W	Tomacorriente doble 15A 125V Blanco
3232-I	Tomacorriente doble 15A 125V Marfil
2097-WC	Tomacorriente doble GFCI 20A 125V Blanco
IG-5262	Tomacorriente doble TA 15A 125V Naranja
IG-5362	Tomacorriente doble TA 20A 125V Naranja
IG-8300	Tomacorriente doble TA 15A 125V Naranja
Materiales	Partes plásticas en contacto con elementos conductores en material PC y polipropileno, otras partes plásticas en ABS. Contactos de plata sobre aleación de cobre (latón). Tornillos, tuercas y resortes en acero
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10)

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06160

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/10/20
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023/10/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, COMBINACIONES

Nota:
Este certificado se unifica con los certificados de conformidad de productos 01652, 01655, 02041, 02267

Fábrica	Planta
BTICINO DE MÉXICO S.A. DE C.V.	QUERÉTARO, MÉXICO
BITICINO S.P.A	VARESE (VA) -ITALIA
LEGRAND COLOMBIA S.A	BOGOTÁ, COLOMBIA
DONGCUAN ROCOM ELECTRIC COMPANY LIMITED	GUANGDONG PROVINCE, P.R CHINA
LEGRAND FRANCE – SITE DE MALAUNAY	RUE PAUL NOUEL, 76770, MALAUNAY, FRANCE
NOVATEUR ELECTRICAL & DIGITAL SYSTEM PVT. LTD	D-4 MIDC AREA, AJANTA ROAD JALGAON INDIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number	20160824-E470406
Report Reference	E470406-20150129
Issue Date	2016-AUGUST-24

Issued to: DEXSON ELECTRIC S A S
Calle 19 No 70 - 41
Zona Industrial Montevideo
Bogota COLOMBIA

This is to certify that representative samples of POSITIONING DEVICES
Non Metallic Cable Ties, Ultralock Series

Cat Nos. DXN3004B, 3AMBLT4, DXN3004N, 3AMNET4, DXN3006B, 3AMBLT6, DXN3006N, 3AMNET6, DXN3008B, 3AMBLT8, DXN3008N, 3AMNET8, DXN3010B, 3AMBLT10, DXN3010N, 3AMNET10, DXN3012B, 3AMBLT12, DXN3012N, 3AMNET12 DXN3014B, 3AMBLT14, DXN3014N, 3AMNET14, DXN3014BH, 3AMBLT14HD, DXN3014NH, 3AMNET14HD, DXN3021B, 3AMBLT21, DXN3021N, 3AMNET21.

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 62275 & CSA-C22.2 No. 62275-10 Cable Management Systems – Cable Ties for Electrical Installations

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.

Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 00406

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	VER ANEXO	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S

Calle 10 No. 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2019, UL 83/2017 Rev. 2020, NTE INEN 2345/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2000/06/01
Fecha de Renovación: 2022/09/16
Fecha de Actualización: 2022/10/06
Fecha de Vencimiento: 2025/09/16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/09/16 y 2024/09/16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00406

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2000/06/01
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/16
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/10/06
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cobre y aluminio, aislados en material termoplástico, 600 V, tipos TW, THW,THW-2, THHN/THWN, THHN/THWN-2 Y THWN-2, aptos para uso en CT (Cable Tray) y Resistente a luz solar (SR)						
Referencia	Calibres desde 14 AWG hasta 2000 kcmil (2,08 mm² al 1010 mm²)						
Marca	CENTELSA y CENTELSA by NEXANS						
Material del conductor	Cobre o Aluminio (ACM), aleación serie AA 8000						
Tensión de aislamiento	600 V						
Aislamiento	**TW**	**THW**	**THHW**	**THW-2**	**THHN/THWN**	**THW-2 THHN/THWN-2**	**THWN-2**
Temperatura	60°C lugares secos o mojados	75 °C seco o mojado	90°C seco, 75 °C mojado	90°C seco, 90°C mojado	90°C seco, 75°C mojado	90°C seco, 90°C mojado	90°C seco, 90°C mojado
Conductor	Alambres o conductores cableado concéntrico de cobre suave o aluminio				**Monoconductor**: Alambres o conductores cableado concéntrico de cobre suave o aluminio **Multiconductor**: Conductores cableado concéntrico de cobre suave		
Calibres	Cobre: Del 14 AWG hasta el calibre 2000 kcmil Aluminio: Del 12 AWG hasta el calibre 2000 kcmil				**Monoconductor**: Cobre: Del 14 AWG hasta el calibre 2000 kcmil Aluminio: Del 12 AWG hasta el calibre 2000 kcmil **Multiconductor**: Del calibre 14 hasta el 500 kcmil y hasta 5 conductores		
Cubierta	No aplica				Monoconductor: Nylon Multiconductor: PVC		
Autorización	Aptos para uso en bandejas portacables (USE TC) y Resistente a la luz solar (SR)						
Aplicación	Cables para construcción "Building Wire" utilizados en instalaciones comerciales, industriales y residenciales. Cables para bombas sumergibles						
Referencial	NTC 1332/2019, UL 83/2017 Rev. 2020, NTE INEN 2345/2015 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)						

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00406

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2000/06/01
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/16
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/10/06
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Fábrica	Planta
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S	YUMBO, COLOMBIA

Atentamente,



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CAJAS METÁLICAS

Fabricado por **CU CONECTORES S.A.S.**, en la **Autopista a Medellín km 7, parque industrial CELTA TRADE PARK, bodega 152-3 Funza Cundinamarca,** identificada con **número de NIT 830.073.592-2.**

Manufactured by **CU CONECTORES S.A.S.**, in the **Autopista a Medellín km 7, parque industrial CELTA TRADE PARK, bodega 152-3 Funza Cundinamarca**, identified with **NIT number 830.073.592-2.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía

RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5
RETIE 2013 - Chapter 3, Article 20.5

SECTOR ICS 29.120.99

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR -CER945299
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-08-05
Approval Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha de Vencimiento: 2025-08-04
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CC2050	CAJA CUADRADA TIPO 2400 2 SALIDAS 1/2"; 51x115x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CC2075	CAJA CUADRADA TIPO 2400 2 SALIDAS 3/4"; 51x115x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CC3050	CAJA CUADRADA TIPO 2400 3 SALIDAS 1/2"; 51x115x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CC3075	CAJA CUADRADA TIPO 2400 3 SALIDAS 3/4"; 51x115x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CC4050	CAJA CUADRADA TIPO 2400 4 SALIDAS 1/2"; 51x115x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CC4075	CAJA CUADRADA TIPO 2400 4 SALIDAS 3/4"; 51x115x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CC5050	CAJA CUADRADA TIPO 2400 5 SALIDAS 1/2"; 51x115x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CC5075	CAJA CUADRADA TIPO 2400 5 SALIDAS 3/4"; 51x115x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UC2100	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 2 SALIDAS 1"; 59,50x116x117; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UC3100	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 3 SALIDAS 1"; 59,50x116x117; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UC4100	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 4 SALIDAS 1"; 59,50x116x117; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UC5100	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 5 SALIDAS 1"; 59,50x116x117; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UC0100	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 DE 1 A 8 SALIDAS DE 1/2 A 1"; 59,50x116x117; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UC0050	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 DE 1 A 11 SALIDAS 1/2"; 59,50x116x117; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UC0075	CAJA UNIVERSAL CUADRADA 2400 DE 1 A 8 SALIDAS DE 1/2 A 3/4"; 59,50x116x117; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CR2050	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 2 SALIDAS DE 1/2"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CR2075	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 2 SALIDAS DE 3/4"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CR3050	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 3 SALIDAS DE 1/2"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CR3075	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 3 SALIDAS DE 3/4"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CR4050	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 4 SALIDAS DE 1/2"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CR4075	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 4 SALIDAS DE 3/4"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CR5050	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 5 SALIDAS DE 1/2"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CR5075	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 5 SALIDAS DE 3/4"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UR2100	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 2 SALIDAS DE 1"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UR3100	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 3 SALIDAS DE 1"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UR4100	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 4 SALIDAS DE 1"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UR5100	CAJA RECTANGULAR TIPO 5800 5 SALIDAS DE 1"; 51x71x115; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UR0100	CAJA UNIVERSAL RECTANGULAR TIPO 5800 DE 1 A 7 SALIDAS DE 1/2 A 1"; 51x72x116; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UR0050	CAJA UNIVERSAL RECTANGULAR TIPO 5800 DE 1 A 7 SALIDAS DE 1/2"; 51x72x116; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UR0075	CAJA UNIVERSAL RECTANGULAR TIPO 5800 DE 1 A 7 SALIDAS DE 1/2 A 3/4"; 51x72x116; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CG5050	CAJA REDONDA SALIDA 1/2"; 42x88,60x3,00; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CG5075	CAJA REDONDA SALIDA 3/4"; 42x88,60x3,00; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32CG5100	CAJA REDONDA SALIDA 1"; 42x88,60x3,00; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N32UG0100	CAJA REDONDA SALIDA DE 1/2 A 1"; 42x101,60x3,00; ABIERTA SIN TAPA; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBL050	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 1/2"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBL075	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 3/4"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBL100	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 1"; 45x146x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBL125	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 1 1/4"; 63x196x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBL150	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 1 1/2"; 63x196x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBL200	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 2"; 79x243x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBL250	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 2 1/2"; 107x261x95; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBL300	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 3"; 107x261x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBL400	CONDULETA ALUMINIO LB LISA 4"; 117x332x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBR050	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 1/2"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBR075	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 3/4"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBR100	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 1"; 45x146x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBR125	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 1 1/4"; 63x196x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBR150	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 1 1/2"; 63x196x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBR200	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 2"; 79x243x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBR250	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 2 1/2"; 107x261x95; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBR300	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 3"; 107x261x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LBR400	CONDULETA ALUMINIO LB ROSCADA 4"; 117x332x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLL050	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 1/2"; 33x110x35; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLL075	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 3/4"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLL100	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 1"; 44x148x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLL125	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 1 1/4"; 63x196x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLL150	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 1 1/2"; 63x196x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLL200	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 2"; 79x247x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLL250	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 2 1/2"; 108x264x95; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLL300	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 3"; 108x264x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLL400	CONDULETA ALUMINIO LL LISA 4"; 117x332x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLR050	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 1/2"; 33x110x35; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLR075	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 3/4"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLR100	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 1"; 44x148x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLR125	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 1 1/4"; 63x196x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLR150	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 1 1/2"; 63x196x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLR200	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 2"; 79x247x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLR250	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 2 1/2"; 108x264x95; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLR300	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 3"; 108x264x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LLR400	CONDULETA ALUMINIO LL ROSCADA 4"; 117x332x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRL050	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 1/2"; 33x110x35; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRL075	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 3/4"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRL100	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 1"; 45x146x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRL125	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 1 1/4"; 63x197x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRL150	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 1 1/2"; 63x197x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRL200	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 2"; 79x246x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRL250	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 2 1/2"; 108x264x95; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRL300	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 3"; 108x264x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRL400	CONDULETA ALUMINIO LR LISA 4"; 117x331x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRR050	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 1/2"; 33x110x35; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRR075	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 3/4"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRR100	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 1"; 45x146x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRR125	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 1 1/4"; 63x197x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRR150	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 1 1/2"; 63x197x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRR200	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 2"; 79x246x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRR250	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 2 1/2"; 108x264x95; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRR300	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 3"; 108x264x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N32LRR400	CONDULETA ALUMINIO LR ROSCADA 4"; 117x331x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TL050	CONDULETA ALUMINIO T LISA 1/2"; 38x136x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TL075	CONDULETA ALUMINIO T LISA 3/4"; 38x136x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TL100	CONDULETA ALUMINIO T LISA 1"; 45x156x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TL125	CONDULETA ALUMINIO T LISA 1 1/4"; 63x209x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TL150	CONDULETA ALUMINIO T LISA 1 1/2"; 63x209x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TL200	CONDULETA ALUMINIO T LISA 2"; 79x252x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TL250	CONDULETA ALUMINIO T LISA 2 1/2"; 106x284x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TL300	CONDULETA ALUMINIO T LISA 3"; 107x284x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TL400	CONDULETA ALUMINIO T LISA 4"; 117x351x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TR050	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 1/2"; 38x136x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TR075	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 3/4"; 38x136x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TR100	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 1"; 45x156x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TR125	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 1 1/4"; 63x209x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TR150	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 1 1/2"; 63x209x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TR200	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 2"; 79x252x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TR250	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 2 1/2"; 106x284x95; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TR300	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 3"; 107x284x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320TR400	CONDULETA ALUMINIO T ROSCADA 4"; 117x351x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CL050	CONDULETA ALUMINIO C LISA 1/2"; 33x121x35; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CL075	CONDULETA ALUMINIO C LISA 3/4"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CL100	CONDULETA ALUMINIO C LISA 1"; 45x146x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CL125	CONDULETA ALUMINIO C LISA 1 1/4"; 63x196x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CL150	CONDULETA ALUMINIO C LISA 1 1/2"; 63x196x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CL200	CONDULETA ALUMINIO C LISA 2"; 79x247x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CL250	CONDULETA ALUMINIO C LISA 2 1/2"; 108x264x95; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CL300	CONDULETA ALUMINIO C LISA 3"; 108x264x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CL400	CONDULETA ALUMINIO C LISA 4"; 117x332x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CR050	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 1/2"; 33x121x35; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CR075	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 3/4"; 38x127x40,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CR100	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 1"; 45x146x45; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CR125	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 1 1/4"; 63x196x63; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CR150	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 1 1/2"; 63x196x67,5; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CR200	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 2"; 79x247x87; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CR250	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 2 1/2"; 108x264x95; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CR300	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 3"; 108x264x111; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N320CR400	CONDULETA ALUMINIO C ROSCADA 4"; 117x332x115; NEMA 3; ALUMINIO	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0111	CAJA SOBREPONER N4 10x10x10; 10x10x10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0332	CAJA SOBREPONER N4 30X30X20; 30X30X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0442	CAJA SOBREPONER N4 40X40X20; 40X40X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0542	CAJA SOBREPONER N4 50X40X20; 50X40X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0642	CAJA SOBREPONER N4 60X40X20; 60X40X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0652	CAJA SOBREPONER N4 60X50X20; 60X50X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0653	CAJA SOBREPONER N4 60X50X30; 60X50X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0L83	CAJA SOBREPONER N4 100X80X30; 100X80X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA221	CAJA SOBREPONER N4 20X20X15; 20X20X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0222	CAJA SOBREPONER N4 20X20X20; 20X20X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA331	CAJA SOBREPONER N4 30X30X15; 30X30X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA532	CAJA SOBREPONER N4 50X30X25; 50X30X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSC311	CAJA SOBREPONER N4 30X15X15; 30X15X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSC321	CAJA SOBREPONER N4 30X25X15; 30X25X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSE221	CAJA SOBREPONER N4 25x20x15; 25x20x15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSF111	CAJA SOBREPONER N4 15X15X10; 15X15X10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0331	CAJA SOBREPONER N4 30X30x10; 30X30x10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSF112	CAJA SOBREPONER N4 15X15X20; 15X15X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0333	CAJA SOBREPONER N4 30X30X30; 30X30X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0762	CAJA SOBREPONER N4 70X60X25; 70X60X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSC111	CAJA SOBREPONER N4 10X5X5; N4 10X5X5; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSG221	CAJA SOBREPONER N4 25X25X15; 25X25X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA222	CAJA SOBREPONER N4 20X20X25; 20X20X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0432	CAJA SOBREPONER N4 40X30X20; 40X30X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSB211	CAJA SOBREPONER N4 20X15X10; 20X15X10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0221	CAJA SOBREPONER N4 20X20X10; 20X20X10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSE331	CAJA SOBREPONER N4 35X30X15; 35X30X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA431	CAJA SOBREPONER N4 40X30X15; 40X30X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA442	CAJA SOBREPONER N4 40X40X25; 40X40X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0443	CAJA SOBREPONER N4 40X40X30; 40X40X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0532	CAJA SOBREPONER N4 50X30X20; 50X30X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0543	CAJA SOBREPONER N4 50X40X30; 50X40X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSB543	CAJA SOBREPONER N4 50X45X30; 50X45X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA551	CAJA SOBREPONER N4 50X50X15; 50X50X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0552	CAJA SOBREPONER N4 50X50X20; 50X50X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSB553	CAJA SOBREPONER N4 50X50X30; 50X50X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA651	CAJA SOBREPONER N4 60X50X15; 60X50X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0752	CAJA SOBREPONER N4 70X50X20; 70X50X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA852	CAJA SOBREPONER N4 80X50X25; 80X50X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0952	CAJA SOBREPONER N4 90X50X20; 90X50X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CSA962	CAJA SOBREPONER N4 90X60X25; 90X60X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0973	CAJA SOBREPONER N4 90X70X30; 90X70X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0L62	CAJA SOBREPONER N4 100X60X20; 100X60X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0L66	CAJA SOBREPONER N4 100X60X60; 100X60X60; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0L88	CAJA SOBREPONER N4 100X80X80; 100X80X80; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CS0L99	CAJA SOBREPONER N4 100X90X90; 100X90X90; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CI0552	CAJA DE HALADO N4 50X50X20; 50X50X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA532	CAJA DE HALADO N4 50X30X25; 50X30X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA662	CAJA DE HALADO N4 60X60X25; 60X60X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA663	CAJA DE HALADO N4 60X60X35; 60X60X35; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA863	CAJA DE HALADO N4 80X60X35; 80X60X35; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIC311	CAJA DE HALADO N4 30X15X15; 30X15X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIC321	CAJA DE HALADO N4 30x25x15; 30x25x15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIF321	CAJA DE HALADO N4 35X20X10; 35X20X10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIG442	CAJA DE HALADO N4 45X45X25; 45X45X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIG144	CAJA DE HALADO N4 1092X483X460; 2X483X460; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIG421	CAJA DE HALADO N4 474X254X180; 4X254X180; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIG682	CAJA DE HALADO N4 634X358X283; 4X358X283; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIG411	CAJA DE HALADO N4 403X151X153; 3X151X153; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA142	CAJA DE HALADO N4 15X41X20; 15X41X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA243	CAJA DE HALADO N4 26X48X30; 26X48X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA523	CAJA DE HALADO N4 54X20X30; 54X20X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA314	CAJA DE HALADO N4 100X35X45; 100X35X45; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA087	CAJA DE HALADO N4 1700X800X700; 0X800X700; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIB571	CAJA DE HALADO N4 570X785X1090; 570X785X1090; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIG632	CAJA DE HALADO N4 634X358X283 ; 634X358X283 ; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIG321	CAJA DE HALADO N4 35x25x15; 35x25x15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIG155	CAJA DE HALADO N4 1180X580X500; 1180X580X500; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA542	CAJA DE HALADO N4 50X40X20; 50X40X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA831	CAJA DE HALADO N4 80X30X15; 80X30X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA331	CAJA DE HALADO N4 30X30X15; 30X30X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CI0211	CAJA DE HALADO N4 20X10X10; 20X10X10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIB211	CAJA DE HALADO N4 20X15X10; 20X15X10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIC211	CAJA DE HALADO N4 20X15X15; 20X15X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIO221	CAJA DE HALADO N4 20X20X10; 20X20X10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIG211	CAJA DE HALADO N4 25X15X15; 25X15X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIE221	CAJA DE HALADO N4 25X20X15; 25X20X15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIE222	CAJA DE HALADO N4 25X20X25; 25X20X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIB322	CAJA DE HALADO N4 30X25X20; 30X25X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CI0332	CAJA DE HALADO N4 30X30X20; 30X30X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIF322	CAJA DE HALADO N4 35X25X20; 35X25X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIB432	CAJA DE HALADO N4 40X35X20; 40X35X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CI0442	CAJA DE HALADO N4 40X40X20; 40X40X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIF432	CAJA DE HALADO N4 45X35X20; 45X35X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIE442	CAJA DE HALADO N4 45X40X25; 45X40X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CI0532	CAJA DE HALADO N4 50X30X20; 50X30X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CI0553	CAJA DE HALADO N4 50X50X30; 50X50X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIE553	CAJA DE HALADO N4 55X55X30; 55X55X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA632	CAJA DE HALADO N4 60X30X25; 60X30X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA642	CAJA DE HALADO N4 60X40X25; 60X40X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIB652	CAJA DE HALADO N4 60X50X20; 60X50X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CI0663	CAJA DE HALADO N4 60X60X30; 60X60X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIB722	CAJA DE HALADO N4 70X25X20; 70X25X20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIB723	CAJA DE HALADO N4 70X25X30; 70X25X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CID743	CAJA DE HALADO N4 75X40X30; 75X40X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIC833	CAJA DE HALADO N4 80X35X35; 80X35X35; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CI0833	CAJA DE HALADO N4 80X30X30; 80X30X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA862	CAJA DE HALADO N4 80X60X25; 80X60X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIA882	CAJA DE HALADO N4 80X80X25; 80X80X25; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CID843	CAJA DE HALADO N4 85X40X30; 85X40X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CID833	CAJA DE HALADO N4 85X30X30; 85X30X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIF843	CAJA DE HALADO N4 85X45X30; 85X45X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CIBL53	CAJA DE HALADO N4 100X55X30; 100X55X30; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB0000	CAJA BOTONERA SENCILLA; 18x10x8; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB3000	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS; 18x10x9; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB2000	CAJA BOTONERA 2 SERVICIOS; 18x10x10; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB1000	CAJA BOTONERA 1 SERVICIOS; 18x10x11; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB3075	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 3S 3/4; 18x10x12; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB3050	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 3S 1/2; 18x10x13; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB3100	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 3S 1"; 18x10x14; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB2075	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 2S 3/4; 18x10x15; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB2050	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 2S 1/2; 18x10x16; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB2100	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 2S 1"; 18x10x17; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB1075	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 1S 3/4; 18x10x18; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB1050	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 1S 1/2; 18x10x19; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CB1100	CAJA BOTONERA 3 SERVICIOS 1S 1"; 18x10x20; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC0000	CAJA DOBLE FONDO 2400; 116x101x77; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC1075	CAJA DOBLE FONDO 2400 1S 3/4"; 116x101x78; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC1050	CAJA DOBLE FONDO 2400 1S 1/2"; 116x101x79; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC1100	CAJA DOBLE FONDO 2400 1S 1"; 116x101x80; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC2100	CAJA DOBLE FONDO 2400 2S 1"; 116x101x81; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC3100	CAJA DOBLE FONDO 2400 3S 1"; 116x101x82; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC4100	CAJA DOBLE FONDO 2400 4S 1"; 116x101x83; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC4075	CAJA DOBLE FONDO 2400 4S 3/4"; 116x101x84; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC3075	CAJA DOBLE FONDO 2400 3S 3/4"; 116x101x85; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC2075	CAJA DOBLE FONDO 2400 2S 3/4"; 116x101x86; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC4050	CAJA DOBLE FONDO 2400 4S 1/2"; 116x101x87; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC3050	CAJA DOBLE FONDO 2400 3S 1/2"; 116x101x88; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC2050	CAJA DOBLE FONDO 2400 2S 1/2"; 116x101x89; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC5050	CAJA DOBLE FONDO 2400 5S 1/2"; 116x101x90; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC5075	CAJA DOBLE FONDO 2400 5S 3/4"; 116x101x91; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC5100	CAJA DOBLE FONDO 2400 5S 1"; 116x101x92; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CCP100	CAJA DOBLE FONDO 2400 DE 1/2" A 1"; 116x101x93; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CT0000	CAJA DOBLE FONDO 2400 EN T; 116x101x94; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CT3075	CAJA DOBLE FONDO 2400 EN T SALIDA 3/4" Y 1"; 116x101x95; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CC1000	CAJA DOBLE FONDO 2400 1 SALIDA; 116x101x96; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR0000	CAJA DOBLE FONDO 5800 ; 50x100x50; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR2075	CAJA DOBLE FONDO 5800 2 S 3/4" ; 50x100x51; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR1075	CAJA DOBLE FONDO 5800 1S 3/4" ; 50x100x52; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR1050	CAJA DOBLE FONDO 5800 1S 1/2"; 50x100x53; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR1100	CAJA DOBLE FONDO 5800 1S 1" ; 50x100x54; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR2050	CAJA DOBLE FONDO 5800 2S 1/2" ; 50x100x55; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR2100	CAJA DOBLE FONDO 5800 2S 1" ; 50x100x56; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR3100	CAJA DOBLE FONDO 5800 3S 1" ; 50x100x57; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR3050	CAJA DOBLE FONDO 5800 3S 1/2" ; 50x100x58; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR3075	CAJA DOBLE FONDO 5800 3S 3/4" ; 50x100x59; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR4075	CAJA DOBLE FONDO 5800 4S 3/4" ; 50x100x60; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CRX075	CAJA DOBLE FONDO 5800 DE 1/2" A 1"; 50x100x61; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR4050	CAJA DOBLE FONDO 5800 4S 1/2" ; 50x100x62; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR4100	CAJA DOBLE FONDO 5800 4S 1" ; 50x100x63; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CRX050	CAJA DOBLE FONDO 5800 DE 1/2" A 1" ; 50x100x64; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR5050	CAJA DOBLE FONDO 5800 5S 1/2" ; 50x100x65; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR5075	CAJA DOBLE FONDO 5800 5S 3/4"; 50x100x66; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CR5100	CAJA DOBLE FONDO 5800 5S 1"; 50x100x67; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG0075	CAJA OCTOGONAL N4 3/4"; 102x102x43; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG0050	CAJA OCTOGONAL N4 1/2"; 102x102x44; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG0100	CAJA OCTOGONAL N4 1"; 102x102x45; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG1050	CAJA OCTOGONAL N4 1S 1/2"; 102x102x46; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG1075	CAJA OCTOGONAL N4 1S 3/4"; 102x102x47; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG1100	CAJA OCTOGONAL N4 1S 1"; 102x102x48; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG2050	CAJA OCTOGONAL N4 2S 1/2"; 102x102x49; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG2075	CAJA OCTOGONAL N4 2S 3/4"; 102x102x50; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG2100	CAJA OCTOGONAL N4 2S 1"; 102x102x51; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG3050	CAJA OCTOGONAL N4 3S 1/2"; 102x102x52; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG3075	CAJA OCTOGONAL N4 3S 3/4"; 102x102x53; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG3100	CAJA OCTOGONAL N4 3S 1"; 102x102x54; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG4050	CAJA OCTOGONAL N4 4S 1/2"; 102x102x55; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG4075	CAJA OCTOGONAL N4 4S 3/4"; 102x102x56; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG4100	CAJA OCTOGONAL N4 4S 1"; 102x102x57; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG5050	CAJA OCTOGONAL N4 5S 1/2"; 102x102x58; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG5075	CAJA OCTOGONAL N4 5S 3/4"; 102x102x59; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG5100	CAJA OCTOGONAL N4 5S 1"; 102x102x60; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CAJA ALUMINIO	3N42CG0000	CAJA OCTOGONAL N4 5; 102x102x61; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLC050	CONDULETA NEMA 4 TIPO C 1/2"; 35x121x 45; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLC075	CONDULETA NEMA 4 TIPO C 3/4"; 40x127x51; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLC100	CONDULETA NEMA 4 TIPO C 1"; 45x146x57; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLC150	CONDULETA NEMA 4 TIPO C 1 1/2"; 70x196x71; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLC200	CONDULETA NEMA 4 TIPO C 2"; 95x247x90; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLC300	CONDULETA NEMA 4 TIPO C 3"; 128x264x122; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLC400	CONDULETA NEMA 4 TIPO C 4"; 160x332x153; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLX050	CONDULETA NEMA 4 TIPO X 1/2"; 35x136x45; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLX075	CONDULETA NEMA 4 TIPO X 3/4"; 40x136x51; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLX100	CONDULETA NEMA 4 TIPO X 1"; 45x156x57; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLX150	CONDULETA NEMA 4 TIPO X 1 1/2"; 70x209x71; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLX200	CONDULETA NEMA 4 TIPO X 2"; 95x252x90; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLX300	CONDULETA NEMA 4 TIPO X 3"; 128x284x122; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLX400	CONDULETA NEMA 4 TIPO X 4"; 160x351x153; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLT050	CONDULETA NEMA 4 TIPO T 1/2"; 35x136x45; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLT075	CONDULETA NEMA 4 TIPO T 3/4"; 40x136x51; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLT100	CONDULETA NEMA 4 TIPO T 1"; 45x156x57; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLT150	CONDULETA NEMA 4 TIPO T 1 1/2"; 70x209x71; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLT200	CONDULETA NEMA 4 TIPO T 2"; 95x252x90; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLT300	CONDULETA NEMA 4 TIPO T 3"; 128x284x122; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLT400	CONDULETA NEMA 4 TIPO T 4"; 160x351x153; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLB050	CONDULETA NEMA 4 TIPO LB 1/2"; 35x127x45; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLB075	CONDULETA NEMA 4 TIPO LB 3/4"; 40x127x51; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLB100	CONDULETA NEMA 4 TIPO LB 1"; 45x146x57; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLB150	CONDULETA NEMA 4 TIPO LB 1 1/2"; 70x196x71; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLB200	CONDULETA NEMA 4 TIPO LB 2"; 95x243x90; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLB300	CONDULETA NEMA 4 LB DE 3"; 128x261x122; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S. **Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5**

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLB400	CONDULETA NEMA 4 LB DE 4"; 160x332x153; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLL050	CONDULETA NEMA4 TIPO LL 1/2"; 35x110x45; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLL075	CONDULETA NEMA4 TIPO LL 3/4"; 40x127x51; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLL100	CONDULETA NEMA 4 TIPO LL DE 1"; 45x148x57; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLL150	CONDULETA NEMA4 TIPO LL 1 1/2"; 70x196x71; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLL200	CONDULETA NEMA4 TIPO LL 2"; 95x247x90; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLL300	CONDULETA NEMA 4 TIPO LL 3"; 128x264x122; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLL400	CONDULETA NEMA 4 TIPO LL 4"; 160x332x153; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLR050	CONDULETA NEMA4 TIPO LR 1/2"; 35x110x45; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLR075	CONDULETA NEMA4 TIPO LR 3/4"; 40x127x51; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLR100	CONDULETA NEMA4 TIPO LR 1"; 45x146x57; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLR150	CONDULETA NEMA4 TIPO LR 1 1/2"; 70x197x71; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLR200	CONDULETA NEMA4 TIPO LR 2"; 95x246x90; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLR300	CONDULETA NEMA4 TIPO LR 3"; 128x264x122; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLR400	CONDULETA NEMA4 TIPO LR 4"; 160x331x153; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLE050	CONDULETA NEMA4 TIPO E 1/2"; 35x110x45; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLE075	CONDULETA NEMA4 TIPO E 3/4"; 40x127x51; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLE100	CONDULETA NEMA4 TIPO E 1"; 45x146x57; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLE150	CONDULETA NEMA4 TIPO E 1 1/2"; 70x197x71; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLE200	CONDULETA NEMA4 TIPO E 2"; 95x246x90; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLE300	CONDULETA NEMA4 TIPO E 3"; 128x264x122; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

CU CONECTORES S.A.S.

Resolución No. 9 0708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Capitulo 3, Artículo 20.5

Anexo Certificado **CSR -CER945299**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2022-08-05** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2025-08-04**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
CU CONECTORES S.A.S	CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	CONDULETA ALUMINIO	3N42CLE400	CONDULETA NEMA4 TIPO E 4"; 160x331x153; NEMA 4; ALUMINIO; y accesorios (tapa, boquilla, prensaestopa)	AUTOPISTA MEDELLÍN KM 7 PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK BODEGA 152-3, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA


CERTIFICADO DE CALIDAD VARILLA ROSCADA

Fecha de Actualización 01DD/04MM/13AA

Codigo:F-GQ-02

Ensayo realizado por:
Laboratorio de Calidad Tornillos
CA MEJIA – Planta Marinilla

Km 38 más 200 m, Autop. Med. – Bog.
Tel. 4440766

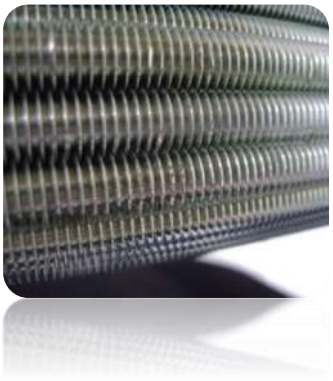

- Galvanizado electrolítico.
- Libre de malformaciones.
- Hilos x pulgada de acuerdo a la referencia.

Empresa: DISTRIBUCIONES ELECTRICAS AC S.A.S	**País y/o Ciudad:** COLOMBIA / PASTO / NARIÑO CL 22 20 B 21 AV SANTANDER

Producto: Varilla roscada zincada.

Fecha de emisión del certificado:


DIA 25 **MES** 01 **AÑO** 2024

Materia Prima: Acero bajo carbono

Ensayos Realizados: Resistencia a la tensión, dureza, tuercas y galgas.

Condiciones de ensayo: TEMPERATURA (C°) 25º **HUMEDAD RELATIVA (%)** 48

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS POR LOTE (Promedio)

Referencia	**Resistencia a la tensión Especificación mínimo 60000 Psi**	**Resistencia a la tensión ROSCA Especificación mínimo 30000 Psi**	**Dureza Especificación 69-100 HRB**	**RESULTADO**
	Resultado Tensión (Psi) 		**Resultado dureza (HRB)** 	
3/8-16 X 3 MT	72486	32358	84	**CUMPLE**

3/8-16 X 3 MT	**ENSAYO DE APLICACIÓN**  		**CUMPLE**
	Chequeo dimensional: **Longitud:** 3000mm $\pm$ 12.70 mm **Rosca:** UNC, de acuerdo a IFI 8va Edición		**CUMPLE**
	Inspección visual: Hilos de rosca bien formados, sin tallones, escamas, o cualquier defecto que afecte su comportamiento. Acabado homogéneo y uniforme.		**CUMPLE**
Número de factura: 01295718			
Cantidades Despachadas	Varilla roscada zincada 3/8-16 X 3 MT (Unidades)	100	**CUMPLE**

Elaborado por:

Santiago Alzate

SANTIAGO ALZATE C.
Inspector de Calidad

Aprobado por:

Juan David Echeverria
Ingeniero de Calidad

Fin del certificado.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ESQUEMA 5

CERTECNICA S.A.S. Certifica que el producto:

CAJAS, CONDULETAS PARA AREAS CLASIFICADAS

Referencias: Anexo 1

Fabricado por:

CU CONECTORES S.A.S

NIT: 830.073.592-2

Autopista Medellín km 7, Parque Industrial Celta Trade Park Bodega 152-3, Funza (Colombia)

Evaluado conforme a los requisitos de:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013 con sus ajustes, artículo 20 numerales, 20.5 (cajas y conduletas y 20.5.1 (requisitos de producto) y 20.28 (Productos utilizados en instalaciones especiales) bajo la norma NTC 3229:1991 numerales aplicables según los productos comercializados.

Nota:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulado en el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
3. CERTECNICA S.A.S. realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo a los estipulado el CER-DI-05 "Términos y Condiciones para certificación"
4. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.certecnica.com o a través de la consulta pública en SICERCO (SOLO PARA REGLAMENTOS TÉCNICOS)

Fecha de aprobación:09 de mayo 2022
Fecha del primer seguimiento: 09 de mayo 2023
Fecha del segundo seguimiento: 09 de mayo 2024
Fecha de vencimiento: 08 de mayo de 2025

Autorizado por

JORGE ALEJANDRO MORALES AVILA
Gerente, CERTECNICA S.A.S.
Carrera 66 No. 67A -05, Bogotá D.C., Colombia

CERTICIFADO No 1520
Version:0

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17065:2012
21-CPR-002

CERTECNICA Certificaciones Técnicas

PLANTA ELÉCTRICA
RDE20SS3

ADVANCE



SUPER SILENT



CONTROLADOR

V-HZ-Horas de trabajo-Auto Start

GENERADOR

Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	19 Kva - 15 Kw
Salida máxima	21 Kva - 17 Kw
Modo de regulación	i-AVR

SALIDA DE CORRIENTE

Configuración	Trifásica
Voltaje	127 - 220V
Salida de corriente	55,7 Amp

MOTOR

Modelo	RD485D	
Capacidad del tanque	68L	
Velocidad de rotación	1800 RPM	
Combustible	Diesel	
Sistema de refrigeración	Agua	
Sistema de arranque	Eléctrico - Automático	
Tipo de aceite	15W40	
Consumo de combustible aprox.	Litro/Hora	4,57

DIMENSIONES

Alto	1,05 Mts
Largo	1,60 Mts
Ancho	0,78 Mts
Peso	720 Kg

ACCESORIOS

- Batería y cable
- Clavijas de conexión
- Kit de herramientas básico
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento

NO INCLUYE

- Cargador de batería
- Mano de obra e instalación
- Transferencia automática
- Conexiones de sistema de escape
- Entrega en el sitio

SUPER SILENT

Entre 15 a 35 dB (decibeles) menos de ruido

*Comunicación a través de puerto RS232.
*Garantía: 1000 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.
*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.
*Las fotografías son ilustrativas.

Nueva Técnologia i-AVR:
Permite utilizar una mayor capacidad del equipo, mejor estabilidad en frecuencia y voltaje.
La mayor protección para su generador.

Planta Eléctrica Diésel Cabinada DEPCO 22kVA 127/220V 3F DPK-22SILENT




ENFRIAMIENTO POR AGUA

3 FASE

60HZ 220V

COMBUSTIBLE DIESEL



ESPECIFICAICONES DEL EQUIPO

1. MOTOR

MOTIR DIESEL INDUSTRIAL DE CUATRO TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO

2. ESISTEMA DE FILTRACIOND EL MOTOR

- FILTRO DE AIRE
- FILTRO DE COMBUSTIBLE
- FILTRO DE ACEITE DE ALTO FLUJO

TODOS LOS FILTROS SON REEMPLAZABLES

3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

EFFICIENT WATER-COOLED SYSTEM WITH COMPLETE SAFETY GUARDS, DESIGNED TO COOL THE ENGIXE AT HIGH AMBIENT TEMPERATURES (CONSULT US FOR DE-RATION FACTORS). SISTEMA EFICIENTE DE ENFRIAMIENTO CON GUARDAS DE SEGURIDAD, DISEÑADO PARA ENFRIAR EL MOTOR EN AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA.

4.SISTEMA DE ESCAPE

SILENCIADOR EN EL EXHOSTO TIPO INDUSTRIAL DE ALTO DESEMPEÑO.

5. CORTA CIRCUITOS DE PROTECCION DE SOBRECARGA.

DELIXI MCCB 3 POLOS

MODELO DE GENERACION ELECTRICA		DP-220(DPK-DFAW-22)
TIPO DE SALIDA	CONTINUA (PRIME)	EMERGENCIA
220v,3PH, 60HZ,1800RPM	20KVA	22KVA
	16KW	18KW

DATOS TECNICOS DEL MOTOR		
MODELO	4DW81-28D	
TIPO DE GOBERNADOR	Mecánico	
CILINDROS	4	
DISPOSICION CILINDROS	EN LÍNEA	
DIEMETRO Y CARRERA (mm)	85 X 100	
DESPLAZAMIENTO	2,27	L
TIPO ASPIRACION	NATURAL	
CICLOS	4 TIEMPOS	
RADIO DE COMPRESION	17:1	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	ENFRIAMIENTO POR AGUA	
VELOCIDAD Y FRECUENCIA DEL MOTOR	1800 RPM - 60HZ	
	PRIME	STANDBY
POTENCIA BRUTA DEL MOTOR KW	20kW	-
CONSUMO COMBUSTIBLE @ 100% L/hr	4,57	-
CONSUMO COMBUSTIBLE @ 50% L/hr	-	-

DATOS DEL GENERADOR	
FABRICANTE	DEPCO/MECC ALTE
MODELO	DPC184E/ECP28 3S4C
NÚMERO DE COJINETES	1
CLASE DE AISLAMIENTO	H
CABLES	12
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP23
SISTEMA DE EXCITACIÓN	SHUNT
VOLTAJE	±1%
DIMENSIONES Y PESO	
LARGO mm	1700
ANCHO mm	740
ALTO mm	960
PESO*kg	660
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	50L

PANEL DE CONTROL	
FABRICANTE	DEEPSEA
MODELO	DSE6120
	POR FAVOR CONSULTE EL FOLLETO DSE6120 PARA MÁS DETALLES

GRUPO ELÉCTROGENO

DEFINICIONES TIPO DE GENERACION

POTENCIA CONTINUA (PRIME)

ESTE TIPO DE GENERACION ES APLICABLE PARA SUMINSITRO CONTINUO DE ENERGIA ELECTRICA (CON CARGA VAIRABLE) EN LUGAR DE ENERGIA LECTRICA COMPRADA EN LA RED. 10% DE SOBRECARGA DE POTENCIA ESTA DISPONIBLE POR UN RANGO DE 1-12 HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN.

POTENCIA DE EMERGENCIA

ESTE TIPO DE GENERACION ES APLICABLE PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTINUA DURANTE UN TIEMPO LIMITADO (EN CARGA VARIABLE) EN UNA SITUACION DE REEMPLAZO DE LA ENERGIA PRIMARIA DE LA RED ELECTRICA. NO ES PERITIDO LA SOBRECARGA DE POTENCIA.

CONDICIONES ESTANDAR DE REFERENCIA

LOS TIPOS DE GENERACION SON PRESENTADOS A UNA TEMPERATURA AMBIENTE 27℃ , PRESION BAROMETRICA 100kPa Y HUMEDAD RELATIVA DE 30%. ESTE EQUIÓ ESTA DISEÑADO PARA OPERAR EN AMBIENTES AGRESIVOS CONN TEMPERATURAS POR ENCIMA DE 52℃, HUMEDAD ARRIBA DE 90% Y GRANDES ALTITUDES. PUEDE APLICARSE DERATEO, PARA LO CUAL DEBE CONSULTARSE PARA ESPECIFICAR EL DESEMPEÑO EN SITIO.

OPCIONES DISPONIBLES Y ACCESORIOS

OFRECEMOS UN RANGO DE CARRACTERISTICAS OPCIONALES Y ACCESORIOS PARA ADAPTAR NUESTROS EQUIPOS A SUS NECESIDADES. .

OPCIONES

- VARIEDAD DE COMPONENTES Y PANELES DE CONTROL Y PANELES DE SINCRONIACION
- PROTECCION ADICIONAL DE ALARMAS Y CORTACIRCUITOS
- SEPARADORES DE AGUA Y COMBUSTIBLE
- CALENTADORES DE REFRIGERANTE
- CARGADORES DE BATERIA

ACCESSORIOS

- REPUESTOS ORIGINALES
- TANQUES DE COMBUSTIBLE ADICIONALES
- TRANSFERENCIAS AUTOMATICA Y MANUALES

ENSAMBLADO Y DISTRIBUIDO POR

8.2 AMORTIGUADORES ANTIVIBRATORIOS.

LOS AMORTIGUADORES SE FIJAN ENTRE LAS PIES DEL MOTOR Y DEL ALTERNADOR Y EL CHASIS, ASEGURANDO EL AISLAMIENTO COMPLETO CONTRA LAS VIBRACIONES DEL CONJUNTO GIRATORIO.

8.3 ACOPLE

EL MOTOR Y EL ALTERNADOR ESTÁN ACOPLADOS DIRECTAMENTE MEDIANTE UNA BRIDA SAE. EL VOLANTE DEL MOTOR ESTÁ FLEXIBLEMENTE ACOPLADO AL ROTOR DEL ALTERNADOR.

8.4 GUARDAS DE SEGURIDAD

EL VENTILADOR Y EL IMPULSOR DEL VENTILADOR JUNTO CON EL ALTERNADOR DE CARGA DE LA BATERÍA ESTÁN PROTEGIDOS CON GUARDA DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS.

9.PRUEBAS

- EL EQUIPO SE LE HACECEN PRUEBAS DE CARGA ANTES DE SER ENVIADO
-

TODAS LAS FUNCIONES DE CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE

10. ACABADOS

TODOS LOS COMPONENTES DE ACERO ESTÁN COMPLETAMENTE DESENGRASADOS Y PINTADOS CON PINTURA EN POLVO PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA RESISTENCIA AL DESGASTE Y DURABILIDAD.

11. TECHNICAL INFORMATION

SE INCLUYEN DIAGRAMAS DE CABLEADO DEL CIRCUITO DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

12. ESTANDARES DE CALIDAD

LSO EQUIPOS CUMPLEN CON LOS SIGUIENTES ESTANDARES : 4999, BS5000, BS5514, IEC60034, VDE0530 YISO8528

13. GARANTIA

TODOS LOS EQUIPOS ESTÁN CUBIERTOS POR UNA PÓLIZA DE GARANTÍA POR UN PERÍODO DE 12 MESES O 1 AÑO (LO QUE OCURRA ANTES) DEL EQUIPO ESTÁ EN LÍNEA CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA DEL FABRICANTE.

ESPECIFICACIONES ESTANDAR

6.SISTEMA DE COMBUSTIBLE

PARA LA PUESTA EN MARCHA LA TORRE DE ILUMINACION, EL DISEÑO DE SU CHASIS TIENE INCORPORADO UN TANQUE DE COMBUSTIBLE QUE PUEDE MANTENER DURANTE 7-8 HORAS CONTINUAS LA OPERACION DE LAS LUMINARIAS. EL TANQUE VIENE CON SU TAPA RESPIRADERO, LIENAS DE ADMISION Y RETORNO DE COMBUSTIBLE AL MOTOR Y TAPON DE DRENAJE.

7. GENERADOR

7.1 SISTEMA DE AISLAMIENTO ELECTRICO

- EL SISTEMA DE AISLAMIENTO ES TIPO H

- TODOS LOS DEVANADOS ESTAN IMPREGNADOS Y SUMERGIDOS EN UN MATERIAL TERMOSELLANTE LIQUIDO DE TRIPLE CAPA, BARNIZ DE POLIÉSTER RESISTENTE AL ACEITE Y ÁCIDOS E IMPREGNADOS A PRESIÓN DE VACÍO CON UNA RESINA DE POLIÉSTER ESPECIAL.

- CAPA GRUESA DE BARNIZ ANTI HUELLAS CON PROTECCIÓN ADICIONAL CONTRA LA HUMEDAD Y LA CONDENSACIÓN

7.2REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO (AVR)

- TOTALMENTE SELLADO REGULADOR DE VIOLTAJE AUTOMATICO MANTIENE UNA REGULACION DE VOLTAJE EN UN MARGEN MAXIMO DE ±1%.

7.3 STARING ELECTRICO DEL MOTOR (OPCIONAL)

- UNA CAPACIDAD DE SOBRECARGA EQUIVALENTE AL 300% DE LA IMPEDENACIA A CARGA TOTALEN FACTOR DE POTENCIA CERO PUEDE SER SOSTENIDA POR 10 SEGUNDOS CUANDO LA OPCION AREP (DEVANADOS AUXILIARES) SON AJUSTADOS .

8. DISPOSICION DEL MONTAJE

8.1 CHASSIS

EL EQUIPO COMPLETO ESTÁ MONTADO EN CONJUNTO SOBRE UN CHASIS DE ACERO FABRICADO PARA TRABAJO PESADO

maquitecdecolombia.com

EN LÍNEA CON EL DESARROLLO CONTINUO DEL PRODUCTO, NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES SIN AVISO PREVIO.

MAQUITEC DE COLOMBIA SAS
NIT 900944793-8
Bogotá - Colombia
https://maquitecdecolombia.com

Cliente:
UNION TEMPORAL SOLUCIONES
CL 75 85 54
BOGOTÁ, D.C. Bogotá 110111
Colombia
NIT: 901845674-9

Cotización # S04672

Fecha de Cotización:
21-01-2025

Fecha de Vencimiento:
20-02-2025

Vendedor:
MARYURY ANDREA MARTINEZ BOGOYA

Términos de pago: Contado
Transferencia o PSE

ITEM	IMAGEN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		[1234] ARTICULO COTIZAR - OTROS PRODUCTOS	Planta Eléctrica Diésel Cabinada DEPCO 22kVA 127/220V 3F DPK-22SILENT	1,00 Unidades	26.297.143,00	$ 26.297.143,00
2		[RDE20SS3] Planta Eléctrica Diésel Cabinada Advance 21KVA 110/220V 3F RDE20SS3	[RDE20SS3] Potencia nominal: 19Kva (15.2 kw) Potencia máxima: 21kva (16.8kw) Marca: Yorking Cabina: Si Conexión: Trifásica Voltaje: 110/220V Amperaje: 55 Fuel tank: 17.9gal Motor: Advance RDE20SS3 Velocidad de Rotación: 1800 rpm Generador: Faraday Tipo de Tablero: Digital Modelo tablero de control:HGM4020NPlanta Eléctrica Diésel Advance 21KVA Trifásico 110/220V 17.9gal T.Digital, RDE20SS3	1,00 Unidades	25.500.000,00	$ 25.500.000,00
3		[FL] Flete Venta	[FL] De Bogota a PUERTO TEJADA Zona Urbana Asegurado por el 100%	1,00 Unidades	600.000,00	$ 600.000,00

Importe antes del descuento: $ 52.397.143,00
Descuento Total: $ 0,00

Subtotal	$ 52.397.143,00
IVA 19%	$ 9.955.457,17
Total	$ 62.352.600,17

127/220V 3F DPK-22SILENT




ENFRIAMIENTO POR AGUA

3 FASE

60HZ 220V

COMBUSTIBLE DIESEL







ESPECIFICAICONES DEL EQUIPO

1. MOTOR

MOTIR DIESEL INDUSTRIAL DE CVATRO TIEMPOS DE ALTO RENDIMIENTO

2. ESISTEMA DE FILTRACIOND EL MOTOR

- FILTRO DE AIRE
- FILTRO DE COMBUSTIBLE
- FILTRO DE ACEITE DE ALTO FLUJO

TODOS LOS FILTROS SON REEMPLAZABLES

3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

EFFICIENT WATER-COOLED SYSTEM WITH COMPLETE SAFETY GUARDS, DESIGNED TO COOL THE ENGINE AT HIGH AMBIENT TEMPERATURES (CONSULT US FOR DE-RATION FACTORS). SISTEMA EFICIENTE DE ENFRIAMIENTO CON GUARDAS DE SEGURIDAD, DISEÑADO PARA ENFRIAR EL MOTOR EN AMBIENTES DE ALTA TEMPERATURA.

4.SISTEMA DE ESCAPE

SILENCIADOR EN EL EXHOSTO TIPO INDUSTRIAL DE ALTO DESEMPEÑO.

5. CORTA CIRCUITOS DE PROTECCION DE SOBRECARGA.

DELIXI HCCB 3 POLOS

MODELO DE GENERACION ELECTRICA		DP-220(DPK-DFAW-22)
TIPO DE SALIDA	CONTINUA (PRIME)	EMERGENCIA
220v,3PH, 60HZ,1800RPM	20KVA	22KVA
	15KW	16KW

DATOS TECNICOS DEL MOTOR		
MODELO	4DW81-29D	
TIPO DE GOBERNADOR	Mecánico	
CILINDROS	4	
DISPOSICION CILINDROS	EN LÍNEA	
DIEMETRO Y CARRERA (mm)	85 X 100	
DESPLAZAMIENTO	2,27	L
TIPO ASPIRACION	NATURAL	
CICLOS	4 TIEMPOS	
RADIO DE COMPRESION	17:1	
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	ENFRIAMIENTO POR AGUA	
VELOCIDAD Y FRECUENCIA DEL MOTOR	1800 RPM - 60HZ	
	PRIME	STANDBY
POTENCIA BRUTA DEL MOTOR KW	20kW	-
CONSUMO COMBUSTIBLE @ 100% L/hr	4,57	-
CONSUMO COMBUSTIBLE @ 50% L/hr	-	-

DATOS DEL GENERADOR	
FABRICANTE	DEPCO/NECC ALTE
MODELO	DPC184E/ECP28 3S4C
NÚMERO DE COJINETES	1
CLASE DE AISLAMIENTO	H
CABLES	12
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP23
SISTEMA DE EXCITACIÓN	SHUNT
VOLTAJE	±1%
DIMENSIONES Y PESO	
LARGO mm	1700
ANCHO mm	740
ALTO mm	960
PESO*kg	660
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	50L

PANEL DE CONTROL	
FABRICANTE	DEEPSEA
MODELO	DSE6120
	POR FAVOR CONSULTE EL FOLLETO DSE6120 PARA MÁS DETALLES

Activar Windows
Ve a Configuración para ac

PLANTA ELÉCTRICA RDE20SS3

ADVANCE



SUPER SILENT



CONTROLADOR
V-HZ-Horas de trabajo-Auto Start

GENERADOR	
Frecuencia nominal	60 Hz
Salida nominal	19 Kva - 15 Kw
Salida máxima	21 Kva - 17 Kw
Modo de regulación	i-AVR

SALIDA DE CORRIENTE	
Configuración	Trifásica
Voltaje	127 - 220V
Salida de corriente	55,7 Amp

MOTOR		
Modelo	RD485D	
Capacidad del tanque	68L	
Velocidad de rotación	1800 RPM	
Combustible	Diesel	
Sistema de refrigeración	Agua	
Sistema de arranque	Eléctrico - Automático	
Tipo de aceite	15W40	
Consumo de combustible aprox.	Litro/Hora	4,57

DIMENSIONES	
Alto	1,05 Mts
Largo	1,60 Mts
Ancho	0,78 Mts
Peso	720 Kg

ACCESORIOS
- Batería y cable
- Clavijas de conexión
- Kit de herramientas básico
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento

NO INCLUYE
- Cargador de batería
- Mano de obra e instalación
- Transferencia automática
- Conexiones de sistema de escape
- Entrega en el sitio

SUPER SILENT
Entre 15 a 35 dB (decibeles) menos de ruido

*Comunicación a través de puerto RS232.
*Garantía: 1000 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.
*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.
*Las fotografías son ilustrativas.

Nueva Técnologia i-AVR:
Permite utilizar una mayor capacidad del equipo, mejor estabilidad en frecuencia y voltaje.
La mayor protección para su generador.

Certificados: 1. Certificado de Garantía 2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos 3. Certificado de Repuestos y Consumibles 4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información 5. Tratamiento de Datos (Versión 200424) Encuentre en este Link: https://maquitec.co/m/19

Seguro de Transporte: Para tu Compra Contamos con póliza de seguros SURA número: 900000924835 con vigencia Febrero 2025, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte. Certificado: https://bit.ly/4c7WLjk

SEGUROS | sura

Youtube Facebook Instagram Linkedin TikTok

Atentamente,



MARYURY ANDREA MARTINEZ BOGOYA
+57 317 2734572
asesor21.maquitec@gmail.com
asesor21@maquitecdecolombia.com

Términos y Condiciones

Los valores enunciados son antes del IVA correspondiente. La mercancía es puesta en BOGOTA.
El flete corre por cuenta y riesgo del cliente. La mercancía se asegura por el valor total de la factura.
Pague a MAQUITEC DE COLOMBIA SAS NIT900944793-8 En Bogotá consignar a las cuentas:
Corriente BANCOLOMBIA 23156473525
Corriente BANCO DE BOGOTA 057425555
En Medellín y Cali, consignar a la cuenta: Ahorro Bancolombia 23100002814
Link de pago: https://maquitecdecolombia.epayco.me

No. de Certificado
0464
Certificación tipo marca de conformidad **(Esquema 5)**

El organismo de certificación QCERT otorga a **TERMINALES COLOMBIANAS SAS** con identificacion **891301862** el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Tableros de baja tensión

Descripción cualitativa del producto: Tableros de circuitos en baja tensión para aplicaciones residenciales y similares

Referente reglamentario: Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE . Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013, Resolución 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía Numerales 20.23.1 y 20.23.3

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 24 páginas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos cerficados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento:	2012-09-06	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de vencimiento:	2024-10-24	**Seguimiento 1:**	2022-10-25
Fecha de renovación:	2021-10-25	**Seguimiento 2:**	2023-10-25
Fecha de última modificación:	2023-10-24		

_____
Directora de acreditación y gestión

No de certificado 0464 **Fecha última modificación** 2023-10-24
Dirección Calle 29B No 56-26

Aspecto	Descripción
Producto	Tableros eléctricos de baja tensión
Descripción cualitativa del producto	Tableros de circuitos en baja tensión para aplicaciones residenciales y similares
Referente reglamentario y normativo	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas- RETIE Numeral 20.23.1 Resolución 90708 del 30 agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.
Fabricante	TERCOL SAS
Planta de fabricación	Calle 29b No 56-26
Marca	TERCOL SAS
Barraje	Cobre ó aluminio estañado según referencia
Corriente del Barraje (A)	75/85/95/100/125/175/225 según referencia
Tensión nominal (V)	120/240
Corriente cortocircuito (kA)	10
Grado de proteccion IP/IK	2XC/05
Numero de fases de alimentación	1-2 ó 3
Numeros de circuitos	Desde 2 hasta 42 circuitos según referencia
Forma de instalación	Para empotrar o sobre poner
Construcion	Lámina cold rolled con aplicación de pintura electrostática o lámina galvanizada sin pintar
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Protección en sistemas de distribución de energía eléctrica en baja tensión

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
1	TE2	Tablero ecónomico de 2 Circuitos 75 Amperios	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X2.1 cm	28 mm	2XC	5	20.5X17.5X6 cm	*N.A*
2	TE3	Tablero ecónomico de 3 Circuitos 75 Amperios	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X2.1 cm	28 mm	2XC	5	20.5X19.5X6 cm	*N.A*
3	TE4	Tablero ecónomico de 4 circuitos 75 Amperios	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
4	TE6	Tablero ecónomico de 6 circuitos 75 Amperios	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X6.2X2.1 cm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
5	TE8	Tablero ecónomico de 8 circuitos 75 Amperios	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8X8.8X2.1cm	105 mm	2XC	5	20.5X32X6 cm	*N.A*
6	TE4P	Tablero ecónomico de 4 circuitos con puerta 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1 cm	52 mm	2XC	5	18.7X21.6X7.5	*N.A*
7	TE6P	Tablero ecónomico de 6 circuitos con puerta 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X6.2X2.1 cm	52 mm	2XC	5	18.7X26.5X7.5	*N.A*
8	TE2M	Tablero ecónomico de 2 circuitos monofásico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7x2.1	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6 cm	*N.A*
9	TE3M	Tablero ecónomico de 3 circuitos monofásico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6 cm	*N.A*
10	TE4M	Tablero ecónomico de 4 circuitos monofásico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
11	TE6M	Tablero ecónomico de 6 circuitos monofásico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1x2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
12	TE8M	Tablero ecónomico de 8 circuitos monofásico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8X2.1 cm	N.A	2XC	5	20.5X32X6 cm	*N.A*
13	TE4MP	Tablero ecónomico de 4 circuitos monofásico con puerta 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	*N.A*
14	TE6MP	Tablero ecónomico de 6 circuitos monofásico con puerta 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1x2.1	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	*N.A*

No de certificado 0464
Dirección Calle 29B No 56-26

Fecha de última modificación 2023-10-24

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
15	TTP4G	Tablero tapa plástica de 04 circuitos para 75 Amp galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
16	TTP4	Tablero tapa plástica de 04 circuitos para 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
17	TTP6	Tablero tapa plástica de 06 circuitos para 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	120/241	N.A	6.2X6.2X2.1 cm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
18	TTP6G	Tablero tapa plástica de 06 circuitos para 75 AMP galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	120/241	N.A	6.2X6.2X2.1 cm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
19	TTP8	Tablero tapa plástica bifásico de 8 circuitos para 95A	Tableros eléctricos de distribución de 95A marca TERCOL	120/240	95	10	120/241	N.A	DERECHO 11.7 IZQUIERDO 9.1	35 mm	2XC	6	20.5X27X6 cm	*N.A*
20	TTP12	Tablero tapa plástica bifásico de 12 circuitos para 95A	Tableros eléctricos de distribución de 95A marca TERCOL	120/240	95	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 IZQUIERDO 14.2	35 mm	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
21	TTP4M	Tablero monofásico tapa plástica de 4 circuitos para 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
22	TTP6M	Tablero monofásico tapa plástica de 6 circuitos para 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1 cm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6 cm	*N.A*
23	TTP8M	Tablero tapa plástica monofásico de 8 circuitos para 95A	Tableros eléctricos de distribución de 95A marca TERCOL	120/240	95	10	Marca Tercol	N.A	CENTRO 11.9 cm	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
24	TTP12M	Tablero tapa plástica monofásico de 12 circuitos para 95A	Tableros eléctricos de distribución de 95A marca TERCOL	120/240	95	10	Marca Tercol	N.A	CENTRO 17 cm	N.A	2XC	5	30X25X7.2 cm	*N.A*
25	TE2G	Tablero ecónomico de 2 Circuitos 75 Amperios galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X2.1 cm	28 mm	2XC	5	20.5X19.5X6 cm	*N.A*
26	TE3G	Tablero ecónomico de 3 circuitos 75 Amperios galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.2X3.2X2.1	28 mm	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
27	TE4G	Tablero ecónomico de 4 circuitos 75 Amperios galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1 cm	52 mm	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
28	TE6G	Tablero ecónomico de 6 circuitos 75 Amperios galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X6.2X2.1cm	52 mm	2XC	5	20.5X32X6 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
29	TE8G	Tablero ecónomico de 8 circuitos galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8X8.8X2.1 cm	105 mm	2XC	5	18.7X21.6X7.5	*N.A*
30	TE4PG	Tablero ecónomico de 4 circuitos con puerta galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1 cm	52 mm	2XC	5	18.7X26.5X7.5	*N.A*
31	TE6PG	Tablero ecónomico de 6 circuitos con puerta galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X6.2x2.1	52 mm	2XC	5	20.5X17.5X6 cm	*N.A*
32	TE2MG	Tablero ecónomico de 2 circuitos monofásico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6 cm	*N.A*
33	TE3MG	Tablero ecónomico de 3 circuitos monofásico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
34	TE4MG	Tablero ecónomico de 4 circuitos monofásico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
35	TE6MG	Tablero ecónomico de 6 circuitos monofásico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5X32X6 cm	*N.A*
36	TE8MG	Tablero ecónomico de 8 circuitos monofásico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	19.1X2.1cm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	*N.A*
37	TE4MPG	Tablero ecónomico de 4 circuitos monofásico con puerta galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	*N.A*
38	TE6MPG	Tablero ecónomico de 6 circuitos monofásico con puerta galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
39	TTP4MG	Tablero tapa Plástica de 04 circuitos monofásico galvanizado para 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
40	TTP6MG	Tablero tapa Plástica de 6 circuitos monofásico galvanizado para 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
41	TTP8MG	Tablero tapa Plástica de 8 circuitos monofásico galvanizado para 95A	Tableros eléctricos de distribución de 95A marca TERCOL	120/240	95	10	Marca Tercol	N.A	CENTRO 11.9 cm	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
42	TTP12MG	Tablero tapa Plástica de 12 circuitos monofásico galvanizado para 95A	Tableros eléctricos de distribución de 95A marca TERCOL	120/240	95	10	Marca Tercol	N.A	CENTRO 17 cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
43	TTP4-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 04 circuitos para 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
44	TTP6-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 04 circuitos para 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X6.2X2.1	52	2XC	5	25X25X7.2 cm	*N.A*
45	TTP8-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 8 circuitos para 85A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 85A marca TERCOL	120/240	85	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 IZQUIERDO 9.1	35 mm	2XC	5	30X25X7.2 cm	*N.A*
46	TTP12-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 12 circuitos para 85A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 85A marca TERCOL	120/240	85	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 IZQUIERDO 14.2	35 mm	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
47	TTP4G-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 04 circuitos para 75A bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
48	TTP6G-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 06 circuitos para 75A bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	25X25X7.2 cm	*N.A*
49	TTP8G-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 8 circuitos PARA 85A bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 85A marca TERCOL	120/240	85	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 IZQUIERDO 9.1	35 mm	2XC	5	30X25X7.2 cm	*N.A*
50	TTP12G-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 12 circuitos para 85A bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 85A marca TERCOL	120/240	85	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 IZQUIERDO 14.2	35 mm	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
51	TTP4MG-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 04 circuitos para 75A monofásico bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
52	TTP6MG-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 06 circuitos para 75A monofásico bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	25X25X7.2 cm	*N.A*
53	TTP8MG-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 08 circuitos para 75A monofásico bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 85A marca TERCOL	120/240	85	10	Marca Tercol	N.A	CENTRO 11.9 cm	N.A	2XC	5	30X25X7.2 cm	*N.A*
54	TTP12MG-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 12 circuitos para 75A monofásico bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 85A marca TERCOL	120/240	85	10	Marca Tercol	N.A	CENTRO 17 cm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6 cm	*N.A*
55	TE2-BIMETÁLICO	Tablero económico de 02 circuitos 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X2.1 cm	28 mm	2XC	5	20.5X19.5X6 cm	*N.A*
56	TE3-BIMETÁLICO	Tablero económico de 03 circuitos 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.2X3.2X2.1	28 mm	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
57	TE4-BIMETÁLICO	Tablero económico de 04 circuitos 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
58	TE6-BIMETÁLICO	Tablero económico de 06 circuitos 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X6.2X2.1	52 mm	2XC	5	20.5X32X6 cm	*N.A*
59	TE8-BIMETÁLICO	Tablero económico de 08 circuitos 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8X8.8X2.1 cm	105 mm	2XC	5	18.7X21.6X7.5	*N.A*
60	TE4P-BIMETÁLICO	Tablero económico de 04 circuitos con puerta 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	18.7X26.5X7.5	*N.A*
61	TE6P-BIMETÁLICO	Tablero económico de 06 circuitos con puerta 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	20.5X17.5X6 cm	*N.A*
62	TE2M-BIMETÁLICO	Tablero ecónomico de 02 circuitos 75A monofásico bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7x2.1	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6 cm	*N.A*
63	TE3M-BIMETÁLICO	Tablero ecónomico de 03 circuitos 75A monofásico bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
64	TE4M-BIMETÁLICO	Tablero ecónomico de 04 circuitos 75A monofásico bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
65	TE6M-BIMETÁLICO	Tablero ecónomico de 06 circuitos 75A monofásico bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5X32X6 cm	*N.A*
66	TE8M-BIMETÁLICO	Tablero ecónomico de 08 circuitos 75A monofásico bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	19.1X2.1cm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	*N.A*
67	TE4MP-BIMETÁLICO	Tablero ecónomico de 04 circuitos 75A monofásico con puerta bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	*N.A*
68	TE6MP-BIMETÁLICO	Tablero ecónomico de 06 circuitos 75A monofásico con puerta bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
69	TTP4M-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica monofásico de 04 circuitos para 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
70	TTP6M-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica monofásico de 06 circuitos para 75A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	25X25X7.2 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
71	TTP8M-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica monofásico de 08 circuitos para 85A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 85A marca TERCOL	120/240	85	10	Marca Tercol	N.A	CENTRO 11.9 cm	N.A	2XC	5	30X25X7.2 cm	*N.A*
72	TTP12M-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica monofásico de 12 circuitos para 85A bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 85A marca TERCOL	120/240	85	10	Marca Tercol	N.A	CENTRO 17 cm	N.A	2XC	5	20.5X17.5X6 cm	*N.A*
73	TE2G-BIMETÁLICO	Tablero económico de 02 circuitos galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X2.1	28 mm	2XC	5	20.5X19.5X6 cm	*N.A*
74	TE3G-BIMETÁLICO	Tablero económico de 03 circuitos galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.2X3.2X2.1	28 mm	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
75	TE4G-BIMETÁLICO	Tablero económico de 04 circuitos galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
76	TE6G-BIMETÁLICO	Tablero económico de 06 circuitos galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X6.2X2.1	52 mm	2XC	5	20.5X32X6 cm	*N.A*
77	TE8G-BIMETÁLICO	Tablero económico de 08 circuitos galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8X8.8X2.1 cm	105 mm	2XC	5	18.7X21.6X7.5	*N.A*
78	TE4PG-BIMETÁLICO	Tablero económico de 04 circuitos con puerta galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7X3.7X2.1	52 mm	2XC	5	18.7X26.5X7.5	*N.A*
79	TE6PG-BIMETÁLICO	Tablero económico de 06 circuitos con puerta galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X6.2X2.1	52 mm	2XC	5	20.5X17.5X6 cm	*N.A*
80	TE2MG-BIMETÁLICO	Tablero económico de 02 circuitos monofásico galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	3.7x2.1	N.A	2XC	5	20.5X19.5X6 cm	*N.A*
81	TE3MG-BIMETÁLICO	Tablero económico de 03 circuitos monofásico galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	6.2X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
82	TE4MG-BIMETÁLICO	Tablero económico de 04 circuitos monofásico galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	20.5X27X6 cm	*N.A*
83	TE6MG-BIMETÁLICO	Tablero económico de 06 circuitos monofásico galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5X32X6 cm	*N.A*
84	TE8MG-BIMETÁLICO	Tablero económico de 08 circuitos monofásico galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	19.1X2.1cm	N.A	2XC	5	18.7X21.6X7.5	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
85	TE4MPG-BIMETÁLICO	Tablero económico de 04 circuitos monofásico con puerta galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	8.8x2.1	N.A	2XC	5	18.7X26.5X7.5	*N.A*
86	TE6MPG-BIMETÁLICO	Tablero económico de 06 circuitos monofásico con puerta galvanizado bimetálico 75A	Tableros eléctricos de distribución de 75A marca TERCOL	120/240	75	10	Marca Tercol	N.A	14.1X2.1cm	N.A	2XC	5	20.5x22x6 cm	*N.A*
87	T8PG-BIMETÁLICO	Tablero tapa metálica de 08 circuitos galvanizado bimetálico 85A	Tableros eléctricos de distribución de 85A marca TERCOL	120/240	85	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 cm IZQUIERDO 9.1 cm	35 mm	2XC	5	30X25X8.7 cm	*N.A*
88	TTP8G	Tablero tapa plástica de 08 circuitos para 95A	Tableros eléctricos de distribución de 95A marca TERCOL	120/240	95	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 cm IZQUIERDO 9.1 cm	35 mm	2XC	5	30X25X7.2 cm	*N.A*
89	TTP12G	Tablero tapa plástica de 12 circuitos galvanizado para 95A	Tableros eléctricos de distribución de 95 A marca TERCOL	120/240	95	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.2 cm	35 mm	2XC	5	25X25X7.2 cm	*N.A*
90	TB8-BIMETÁLICO	Tablero tapa plástica de 08 circuitos monofásico bimetálico para 100A	Tableros eléctricos de distribución de 100 A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 cm IZQUIERDO 9.1 cm	45 mm	2XC	5	40X29X8 cm	*N.A*
91	TB12-BIMETÁLICO	Tablero bifásico de 12 circuitos bimetálico para 100A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.2 cm	45 mm	2XC	5	40X29X8 cm	*N.A*
92	TB8G-BIMETÁLICO	Tablero bifásico de 08 circuitos con puerta galvanizado bimetálico para 100A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 21.9 cm IZQUIERDO 19.2 cm	45 mm	2XC	5	34.5X29X8 cm	*N.A*
93	TB8PG-BIMETÁLICO	Tablero bifásico de 08 circuitos con puerta galvanizado bimetálico para 100A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 cm IZQUIERDO 9.1 cm	45 mm	2XC	5	34.5X29X10 cm	*N.A*
94	TB12PG-BIMETÁLICO	Tablero bifásico de 12 circuitos con puerta galvanizado bimetálico para 100A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.2 cm	45 mm	2XC	5	40X29X10 cm	*N.A*
95	TB18PG-BIMETÁLICO	Tablero bifásico de 18 circuitos con puerta galvanizado bimetálico para 100A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 21.9 cm IZQUIERDO 24.3 cm	45 mm	2XC	5	47.5X29X10 cm	*N.A*
96	TB8	Tablero bifásico de 08 circuitos para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 cm IZQUIERDO 9.1 cm	45 mm	2XC	5	40X29X8 cm	*N.A*
97	TB12	Tablero bifásico de 12 circuitos para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.2 cm	45 mm	2XC	5	40X29X8cm	*N.A*
98	TB8P	Tablero bifásico de 08 circuitos para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 cm IZQUIERDO 9.1 cm	45 mm	2XC	5	34X29X10 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
99	TB12P	Tablero bifásico de 12 circuitos para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.2 cm	45 mm	2XC	5	40X29X10 cm	*N.A*
100	TB18P	Tablero bifásico de 18 circuitos para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 21.9 cm IZQUIERDO 24.3 cm	45 mm	2XC	5	47.5X29X10 cm	*N.A*
101	TB8G	Tablero bifásico de 08 circuitos galvanizado para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 cm IZQUIERDO 9.1 cm	45 mm	2XC	5	40X29X8cm	*N.A*
102	TB12G	Tablero bifásico de 12 circuitos galvanizado para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.2 cm	45 mm	2XC	5	40X29X8cm	*N.A*
103	TB8PG	Tablero bifásico de 08 circuitos con puerta galvanizado para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 11.7 cm IZQUIERDO 9.1 cm	45 mm	2XC	5	34X29X10 cm	*N.A*
104	TB12PG	Tablero bifásico de 12 circuitos con puerta galvanizado para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.2 cm	45 mm	2XC	5	40X29X10 cm	*N.A*
105	TB18PG	Tablero bifásico de 18 circuitos con puerta galvanizado para 125A	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 21.9 cm IZQUIERDO 24.3 cm	45 mm	2XC	5	47.5X29X10 cm	*N.A*
106	TP306-100-BIMETÁLICO	Tablero 06 circuitos 100A trifásico bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 9.1 cm IZQUIERDO 6.0 cm CENTRO 8.5 cm	25 mm	2XC	5	32X29X9 cm	*N.A*
107	TP312-100-BIMETÁLICO	Tablero 12 circuitos 100A trifásico bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.7 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 16.0 cm	25 mm	2XC	5	40X29X9 cm	*N.A*
108	TP306-100G-BIMETÁLICO	Tablero 06 circuitos 100A trifásico bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 9.1 cm IZQUIERDO 6.0 cm CENTRO 8.5 cm	25 mm	2XC	5	32X29X9 cm	*N.A*
109	TP312-100G-BIMETÁLICO	Tablero 12 circuitos 100A trifásico bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.7 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 16.0 cm	25 mm	2XC	5	40X29X9 cm	*N.A*
110	TP318-100G-BIMETÁLICO	Tablero 18 circuitos 100A trifásico bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 100A marca TERCOL	120/240	100	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 24.5 cm IZQUIERDO 19.4 cm CENTRO 23.7 cm	25 mm	2XC	5	48X29X9 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
111	TP306-125	Tablero trifásico de 06 circuitos 125A	Tableros eléctricos de distribución de 125A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 9.1 cm IZQUIERDO 6.0 cm CENTRO 8.5 cm	25 mm	2XC	5	32X29X9 cm	*N.A*
112	TP312-125	Tablero trifásico de 12 circuitos 125A	Tableros eléctricos de distribución de 125A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.7 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 16.0 cm	25 mm	2XC	5	40X29X9 cm	*N.A*
113	TP306-125G	Tablero trifásico de 06 circuitos 125A Galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 125A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 9.1 cm IZQUIERDO 6.0 cm CENTRO 8.5 cm	25 mm	2XC	5	32X29X9 cm	*N.A*
114	TP312-125G	Tablero trifásico de 12 circuitos 125A Galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 125A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.7 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 16.0 cm	25 mm	2XC	5	40X29X9 cm	*N.A*
115	TP318-125G	Tablero trifásico de 18 circuitos 125A Galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 125A marca TERCOL	120/240	125	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 24.5 cm IZQUIERDO 19.4 cm CENTRO 23.7 cm	25 mm	2XC	5	48X29X9 cm	*N.A*
116	TRP212-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 12 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.1 cm	80 mm	2XC	5	48X33X11 cm	*N.A*
117	TRP218-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 18 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 23.1 cm IZQUIERDO 24.3 cm	80 mm	2XC	5	55.7X33X11 cm	*N.A*
118	TRP224-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 24 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 32.0 cm IZQUIERDO 29.3 cm	80 mm	2XC	5	63.3X33X11 cm	*N.A*
119	TRP230-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 30 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	73.4X33X11 cm	*N.A*
120	TRP236-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	81X33X11 cm	*N.A*
121	TRP212G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 12 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.1 cm	80 mm	2XC	5	48X33X11 cm	*N.A*
122	TRP218G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 18 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 23.1 cm IZQUIERDO 24.3 cm	80 mm	2XC	5	55.7X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
123	TRP224G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 24 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 32.0 cm IZQUIERDO 29.3 cm	80 mm	2XC	5	63.3X33X11 cm	*N.A*
124	TRP230G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 30 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	73.4X33X11 cm	*N.A*
125	TRP236G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado para 175A	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	81X33X11 cm	*N.A*
126	TRP218	Tablero reforzado puerta bifásico 18 circuitos para empotrar o sobreponer para 225A	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 23.1 cm IZQUIERDO 24.3 cm	80 mm	2XC	5	55.7X33X11 cm	*N.A*
127	TRP224	Tablero reforzado puerta bifásico 24 circuitos para empotrar o sobreponer para 225A	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 32.0 cm IZQUIERDO 29.3 cm	80 mm	2XC	5	63.3X33X11 cm	*N.A*
128	TRP236	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos para empotrar o sobreponer para 225A	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	81X33X11 cm	*N.A*
129	TRP218G	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos para empotrar o sobreponer para 225A Galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 23.1 cm IZQUIERDO 24.3 cm	80 mm	2XC	5	55.7X33X11 cm	*N.A*
130	TRP224G	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos para empotrar o sobreponer para 225A Galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 32.0 cm IZQUIERDO 29.3 cm	80 mm	2XC	5	63.3X33X11 cm	*N.A*
131	TRP236G	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos para empotrar o sobreponer para 225A Galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	81X33X11 cm	*N.A*
132	TRP306-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 06 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 9.0 cm IZQUIERDO 3.9 cm CENTRO 8.5 cm	40 mm	2XC	5	38X30X11 cm	*N.A*
133	TRP312-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 12 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.6 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 14.1 cm	40 mm	2XC	5	48X33X11 cm	*N.A*
134	TRP318-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 18 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO IZQUIERDO CENTRO	40 mm	2XC	5	55.7X33X11 cm	*N.A*
135	TRP324-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 24 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 31.7 cm IZQUIERDO 26.9 cm CENTRO 29.3 cm	40 mm	2XC	5	63.3X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
136	TRP330-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 30 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 39.4 cm IZQUIERDO 34.4 cm CENTRO 36.9 cm	40 mm	2XC	5	73.5X33X11 cm	*N.A*
137	TRP336-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 36 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.1 cm IZQUIERDO 42.1 cm CENTRO 44.5 cm	40 mm	2XC	5	81X33X11 cm	*N.A*
138	TRP342-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 42 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 54.8 cm IZQUIERDO 49.9 cm CENTRO 52.2 cm	40 mm	2XC	5	89.6X33X11 cm	*N.A*
139	TRP306G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 06 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 9.0 cm IZQUIERDO 3.9 cm CENTRO 8.5 cm	40 mm	2XC	5	38X30X11 cm	*N.A*
140	TRP312G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 12 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.6 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 14.1 cm	40 mm	2XC	5	48X33X11 cm	*N.A*
141	TRP318G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 18 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO IZQUIERDO CENTRO	40 mm	2XC	5	55.7X33X11 cm	*N.A*
142	TRP324G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 24 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 31.7 cm IZQUIERDO 26.9 cm CENTRO 29.3 cm	40 mm	2XC	5	63.3X33X11 cm	*N.A*
143	TRP330G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 30 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 39.4 cm IZQUIERDO 34.4 cm CENTRO 36.9 cm	40 mm	2XC	5	73.5X33X11 cm	*N.A*
144	TRP336G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 36 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.1 cm IZQUIERDO 42.1 cm CENTRO 44.5 cm	40 mm	2XC	5	81X33X11 cm	*N.A*
145	TRP342G-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 42 circuitos 175A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 54.8 cm IZQUIERDO 49.9 cm CENTRO 52.2 cm	40 mm	2XC	5	89.6X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
146	TRP306	Tablero reforzado con puerta 06 circuitos 225A trifásico para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 9.0 cm IZQUIERDO 3.9 cm CENTRO 8.5 cm	40 mm	2XC	5	38X30X11 cm	*N.A*
147	TRP312	Tablero reforzado con puerta 12 circuitos 225A trifásico para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.6 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 14.1 cm	40 mm	2XC	5	48X33X11 cm	*N.A*
148	TRP318	Tablero reforzado con puerta 18 circuitos 225A trifásico para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO IZQUIERDO CENTRO	40 mm	2XC	5	55.7X33X11 cm	*N.A*
149	TRP324	Tablero reforzado con puerta 24 circuitos 225A trifásico para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 31.7 cm IZQUIERDO 26.9 cm CENTRO 29.3 cm	40 mm	2XC	5	63.3X33X11 cm	*N.A*
150	TRP330	Tablero reforzado con puerta 30 circuitos 225A trifásico para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 39.4 cm IZQUIERDO 34.4 cm CENTRO 36.9 cm	40 mm	2XC	5	73.5X33X11 cm	*N.A*
151	TRP336	Tablero reforzado con puerta 36 circuitos 225A trifásico para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.1 cm IZQUIERDO 42.1 cm CENTRO 44.5 cm	40 mm	2XC	5	81X33X11 cm	*N.A*
152	TRP342	Tablero reforzado con puerta 42 circuitos 225A trifásico para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 54.8 cm IZQUIERDO 49.9 cm CENTRO 52.2 cm	40 mm	2XC	5	89.6X33X11 cm	*N.A*
153	TRP306G	Tablero reforzado puerta 06 circuitos 225 A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 9.0 cm IZQUIERDO 3.9 cm CENTRO 8.5 cm	40 mm	2XC	5	38X30X11 cm	*N.A*
154	TRP312G	Tablero reforzado puerta 12 circuitos 225 A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.6 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 14.1 cm	40 mm	2XC	5	48X33X11 cm	*N.A*
155	TRP318G	Tablero reforzado puerta 18 circuitos 225 A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO IZQUIERDO CENTRO	40 mm	2XC	5	55.7X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
156	TRP324G	Tablero reforzado puerta 24 circuitos 225 A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 31.7 cm IZQUIERDO 26.9 cm CENTRO 29.3 cm	40 mm	2XC	5	63.3X33X11 cm	*N.A*
157	TRP330G	Tablero reforzado puerta 30 circuitos 225 A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 39.4 cm IZQUIERDO 34.4 cm CENTRO 36.9 cm	40 mm	2XC	5	73.5X33X11 cm	*N.A*
158	TRP336G	Tablero reforzado puerta 36 circuitos 225 A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.1 cm IZQUIERDO 42.1 cm CENTRO 44.5 cm	40 mm	2XC	5	81X33X11 cm	*N.A*
159	TRP342G	Tablero reforzado puerta 42 circuitos 225 A trifásico para empotrar o sobreponer galvanizado.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 54.8 cm IZQUIERDO 49.9 cm CENTRO 52.2 cm	40 mm	2XC	5	89.6X33X11 cm	*N.A*
160	TRP212T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 12 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.1 cm	80 mm	2XC	5	73.6X33X11 cm	*N.A*
161	TRP218T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 18 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 23.1 cm IZQUIERDO 24.3 cm	80 mm	2XC	5	81.2X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
162	TRP224T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 24 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 32.0 cm IZQUIERDO 29.3 cm	80 mm	2XC	5	85.5X33X11 cm	*N.A*
163	TRP230T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 30 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	96.5X33X11 cm	*N.A*
164	TRP236T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	104.2X33X11 cm	*N.A*
165	TRP212TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 12 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.1 cm	80 mm	2XC	5	73.6X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
166	TRP218TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 18 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 23.1 cm IZQUIERDO 24.3 cm	80 mm	2XC	5	81.2X33X11 cm	*N.A*
167	TRP224TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 24 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 32.0 cm IZQUIERDO 29.3 cm	80 mm	2XC	5	85.5X33X11 cm	*N.A*
168	TRP230TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 30 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	96.5X33X11 cm	*N.A*
169	TRP236TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos 175A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer bimetálico galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	104.2X33X11 cm	*N.A*
170	TRP212T	Tablero reforzado puerta bifásico 12 circuitos 225A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.1 cm	80 mm	2XC	5	73.6X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
171	TRP218T	Tablero reforzado puerta bifásico 18 circuitos 225A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 23.1 cm IZQUIERDO 24.3 cm	80 mm	2XC	5	81.2X33X11 cm	*N.A*
172	TRP224T	Tablero reforzado puerta bifásico 24 circuitos 225A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 32.0 cm IZQUIERDO 29.3 cm	80 mm	2XC	5	85.5X33X11 cm	*N.A*
173	TRP230T	Tablero reforzado puerta bifásico 30 circuitos 225A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	96.5X33X11 cm	*N.A*
174	TRP236T	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos 225A con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	104.2X33X11 cm	*N.A*
175	TRP212TG	Tablero reforzado puerta bifásico 12 circuitos 225a con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.8 cm IZQUIERDO 14.1 cm	80 mm	2XC	5	73.6X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
176	TRP218TG	Tablero reforzado puerta bifásico 18 circuitos 225a con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 23.1 cm IZQUIERDO 24.3 cm	80 mm	2XC	5	81.2X33X11 cm	*N.A*
177	TRP224TG	Tablero reforzado puerta bifásico 24 circuitos 225a con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 32.0 cm IZQUIERDO 29.3 cm	80 mm	2XC	5	85.5X33X11 cm	*N.A*
178	TRP230TG	Tablero reforzado puerta bifásico 30 circuitos 225a con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	96.5X33X11 cm	*N.A*
179	TRP236TG	Tablero reforzado puerta bifásico 36 circuitos 225a con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.3 cm IZQUIERDO 44.6 cm	80 mm	2XC	5	104.2X33X11 cm	*N.A*
180	TRP312T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 12 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.6 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 14.1 cm	40 mm	2XC	5	73.6X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464
Dirección Calle 29B No 56-26

Fecha de última modificación 2023-10-24

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
181	TRP318T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 18 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO IZQUIERDO CENTRO	40 mm	2XC	5	81.2X33X11 cm	*N.A*
182	TRP324T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 24 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 31.7 cm IZQUIERDO 26.9 cm CENTRO 29.3 cm	40 mm	2XC	5	85.5X33X11 cm	*N.A*
183	TRP330T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 30 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 39.4 cm IZQUIERDO 34.4 cm CENTRO 36.9 cm	40 mm	2XC	5	96.5X33X11 cm	*N.A*
184	TRP336T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 36 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.1 cm IZQUIERDO 42.1 cm CENTRO 44.5 cm	40 mm	2XC	5	104.2X33X11 cm	*N.A*
185	TRP342T-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 42 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 54.8 cm IZQUIERDO 49.9 cm CENTRO 52.2 cm	40 mm	2XC	5	110.2X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464
Dirección Calle 29B No 56-26

Fecha de última modificación 2023-10-24

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
186	TRP312TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 12 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.6 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 14.1 cm	40 mm	2XC	5	73.6X33X11 cm	*N.A*
187	TRP318TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 18 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO IZQUIERDO CENTRO	40 mm	2XC	5	81.2X33X11 cm	*N.A*
188	TRP324TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 24 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 31.7 cm IZQUIERDO 26.9 cm CENTRO 29.3 cm	40 mm	2XC	5	85.5X33X11 cm	*N.A*
189	TRP330TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 30 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 39.4 cm IZQUIERDO 34.4 cm CENTRO 36.9 cm	40 mm	2XC	5	96.5X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464 **Fecha de última modificación** 2023-10-24

Dirección Calle 29B No 56-26

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
190	TRP336TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 360 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.1 cm IZQUIERDO 42.1 cm CENTRO 44.5 cm	40 mm	2XC	5	104.2X33X11 cm	*N.A*
191	TRP342TG-BIMETÁLICO	Tablero reforzado puerta 42 circuitos 175A trifásico bimetálico, con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 175A marca TERCOL	120/240	175	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 54.8 cm IZQUIERDO 49.9 cm CENTRO 52.2 cm	40 mm	2XC	5	110.2X33X11 cm	*N.A*
192	TRP312T	Tablero reforzado puerta 12 circuitos 225A trifásico con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.6 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 14.1 cm	40 mm	2XC	5	73.6X33X11 cm	*N.A*
193	TRP318T	Tablero reforzado puerta 18 circuitos 225A trifásico con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO IZQUIERDO CENTRO	40 mm	2XC	5	81.2X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464
Dirección Calle 29B No 56-26

Fecha de última modificación 2023-10-24

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
194	TRP324T	Tablero reforzado puerta 24 circuitos 225A trifásico con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 31.7 cm IZQUIERDO 26.9 cm CENTRO 29.3 cm	40 mm	2XC	5	85.5X33X11 cm	*N.A*
195	TRP330T	Tablero reforzado puerta 30 circuitos 225A trifásico con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 39.4 cm IZQUIERDO 34.4 cm CENTRO 36.9 cm	40 mm	2XC	5	96.5X33X11 cm	*N.A*
196	TRP336T	Tablero reforzado puerta 36 circuitos 225A trifásico con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.1 cm IZQUIERDO 42.1 cm CENTRO 44.5 cm	40 mm	2XC	5	104.2X33X11 cm	*N.A*
197	TRP342T	Tablero reforzado puerta 42 circuitos 225A trifásico con espacio para totalizador para empotrar o sobreponer.	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 54.8 cm IZQUIERDO 49.9 cm CENTRO 52.2 cm	40 mm	2XC	5	110.2X33X11 cm	*N.A*
198	TRP312TG	Tablero reforzado puerta 12 circuitos 225A trifásico con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 16.6 cm IZQUIERDO 11.7 cm CENTRO 14.1 cm	40 mm	2XC	5	73.6X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464
Dirección Calle 29B No 56-26

Fecha de última modificación 2023-10-24

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
199	TRP318TG	Tablero reforzado puerta 18 circuitos 225A trifásico con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO IZQUIERDO CENTRO	40 mm	2XC	5	81.2X33X11 cm	*N.A*
200	TRP324TG	Tablero reforzado puerta 24 circuitos 225A trifásico con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 31.7 cm IZQUIERDO 26.9 cm CENTRO 29.3 cm	40 mm	2XC	5	85.5X33X11 cm	*N.A*
201	TRP330TG	Tablero reforzado puerta 30 circuitos 225A trifásico con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 39.4 cm IZQUIERDO 34.4 cm CENTRO 36.9 cm	40 mm	2XC	5	96.5X33X11 cm	*N.A*
202	TRP336TG	Tablero reforzado puerta 36 circuitos 225A trifásico con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 47.1 cm IZQUIERDO 42.1 cm CENTRO 44.5 cm	40 mm	2XC	5	104.2X33X11 cm	*N.A*

No de certificado 0464
Dirección Calle 29B No 56-26

Fecha de última modificación 2023-10-24

Referencias particulares

Ítem	Referencia	Descripción	Tipo	Vn (V)	In (A)	Icc (kA)	Marca aisladores	Dist. max.de Aisls de la misma fase (mm)	Dim. barraje	Separación entre centros de barras (mm)	Grado IP	Grado IK	Dimensiones de la envolvente	Ventilación
203	TRP342TG	Tablero reforzado puerta 42 circuitos 225A trifásico con espacio totalizador para empotrar o sobreponer galvanizado	Tableros eléctricos de distribución de 225A marca TERCOL	120/240	225	10	Marca Tercol	N.A	DERECHO 54.8 cm IZQUIERDO 49.9 cm CENTRO 52.2 cm	40 mm	2XC	5	110.2X33X11 cm	*N.A*

Directora de acreditación y gestión

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04925

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS	ALAMBRES Y CABLES TERMOPLÁSTICOS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2013/04/11
Fecha de Renovación: 2022/04/26
Fecha de Actualización: 2024/04/27
Fecha de Vencimiento: 2025/04/26

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de renovación: 2025/04/26

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013/04/11
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/04/26
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2024/04/27
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/04/26

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Alambres y cables termoplásticos				
Referencia	Cobre: Calibres 14 AWG al 1000 kcmil AA Serie 8000: Calibres 12 AWG al 1000 kcmil				Calibres desde 6 mm^2 hasta 240 mm^2
Marca	PROCABLES				
Voltaje	600 V				
Conductor	Cobre suave o aluminio serie 8000				Cobre suave
Cableado	Concéntrico, comprimido, compactado o flexible, clases AA, B, C, D, J o K. Construcciones UDC y SIW No aplica para alambres.de cobre.				Compactado, clase 2
Designación	THW	THHW	THWN/THHN	THWN-2	
Aislamiento	PVC				
Máxima Temperatura	75°C Seco o mojado	90°C Seco, 75°C mojado		90°C Seco o mojado	
Cubierta	No aplica		Nylon		
Marcación adicional aprobado	Apto para uso en bandeja portacable: “Use CT” para THHW		Apto para uso en bandeja portacable: “Use CT”; Resistente a la intemperie: “SR”; Resistente a gasolina y aceite: “GR II” para THHN/THWN-2; Resistente al fuego: “VW-1” para THHN/THWN-2		
Norma	UL 83		UL 83 o ET-116	UL 83	E-BT-001
Aplicación	De conformidad con lo estipulado en el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) o NEC (National Electrical Code)				
Referencial:	NTC 1332/2011, UL 83/2017, ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011, CODENSA ET-116/2019 y la RESOLUCIÓN 90708 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)				

Notas:

- Este certificado unifica los certificados 02808, 02809, 03330, 03331 y 04808.
- Alcance Reglamentario y Alcance Voluntario y/o Normativo NTC 1332/2011, UL 83/2017, CODENSA ET-116/2019 con sello ONAC
- Alcance Voluntario y/o Normativo ENERSIS/ENDESA E-BT-001/Rev. 6 2011 con sello ANAB.

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04925

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013/04/11
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/04/26
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2024/04/27
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/04/26

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Fábrica	Planta
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 123 - 2025

Bogota, Abril 01 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca). Remisión informe mensual

Respetados señores

De acuerdo a compromisos contractuales, adjuntamos informe mensual 6 con fecha de corte enero 30 de 2025, con sus respectivos anexos

En los próximos días estaremos remitiendo informes pendientes (Febrero y marzo)

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular

John Ramirez Romero

JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 124 - 2025

Bogotá, Abril 03 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Solicitud COPIA cedula apoderado para trámites ante EMCALI

Respetados señores

Con el fin de continuar con el trámite de aumento de carga para la sede de la SNR en asunto, hemos venido solicitando a la persona apodera por el Registrador una copia de su cedula de ciudadanía, requisito indispensable para la radicación de la solicitud. Desafortunadamente su obtención no ha sido posible. Comedidamente solicitamos a ustedes gestionar ante quien corresponda este documento, reiterando la obligatoriedad del mismo para la gestión del tramite

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 125 - 2025

Bogota, Abril 04 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca). Aclaración documentos RETIE Y RETILAP y respuesta comunicados 1963_214_2024 de la firma interventora y documento de fecha abril 02 remitido por la Super de Notariado y Registro

Respetados señores

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el comité realizado en las oficinas de la Super Intendencia de Notariado y Registro en Bogotá el día 01 de abril de 2025 y haciendo claridad que en dicha reunión se realizaron una serie de planteamientos que dependiendo de las averiguaciones a realizar se daban por resueltas o no, a continuación, damos claridad a lo siguiente

Certificación RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricos):

Se enviarán al ente certificador (SERVIMETERS) encargado de realizar la inspección y la posterior emisión del certificado Retie de Uso Final, los siguientes documentos:

- Planos arquitectónicos de planta firmados por el diseñador. Ok existe
- Planos eléctricos en formato PDF firmados por el diseñador. Ok existe
- Diagrama unifilar en formato PDF firmado por el diseñador. Ok existe
- Memorias de cálculo firmadas ok existe
- Declaración de responsabilidad de entrega de entrega de documentos en medio magnético, firmada en original por el **INGENIERO DISEÑADOR**. No existe. Al realizar la consulta ante el ente certificador, se nos informa que esta será aceptada si es firmada por un profesional que avale estos diseños. Realizando la consulta con nuestro asesor especialista, el valor de esta revisión, concepto, aval y firma de documentos asciende a la suma de tres millones

quinientos mil pesos ($3.500.000). Si se avala esta propuesta, este valor se incluirá dentro de los costos del proyecto como un ITEM NO PREVISTO para poder ser cobrado

- Autodeclaración de cumplimiento firmada en original por el constructor del proyecto. Ok existe
- Certificados Retie de materiales eléctricos instalados en la obra. Ok existe
- Copia de cédula y matrículas encargados de la construcción del proyecto . Ok existe

Certificación RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público):

Tras realizar la consulta al ente certificador, se concluye que el proyecto será certificado bajo el reglamento vigente desde marzo 30 de 2010 (820.4.2) y de acuerdo con las características operativas, técnicas y de concentración de personas en el proyecto, se ratifica que este SI DEBE CERTIFICARSE.

No obstante, como lo manifestamos, esta certificación no es necesaria para realizar los trámites para la emisión del certificado Retie ni para los que actualmente se están llevando a cabo ante el Operador de Red (EMCALI). Pero sí resaltamos que ante una inspección realizada por la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) o por la ARL (Revisión ambiental de iluminación dentro del área) pueden llegar a generar multas por la no obtención del certificado. Por tal motivo queda a criterio de la entidad si UT Soluciones incluye este trámite dentro de su alcance en el proyecto. Reiteramos lo que se ha venido manifestando en los diferentes escenarios en el sentido que no existe diseño alguno y únicamente recibimos planos de planta esquemáticos con la ubicación de las luminarias y una potencia sugerida para cada una de ellas.

En caso de que se defina generar el certificado, los documentos a entregar para el trámite son los siguientes

- Planos arquitectónicos de planta firmados por el diseñador. Ok existe
- Planos eléctricos en formato PDF firmados por el diseñador. Ok existe
- Diagrama unifilar en formato PDF firmado por el diseñador. Ok existe
- Memorias de cálculo firmadas No existe
- Estudios y Simulaciones No existe
- Declaración de responsabilidad de entrega de entrega de documentos en medio magnético, firmada en original por el ingeniero diseñador. No existe
- Autodeclaración de cumplimiento firmada en original por el constructor del proyecto.
- Certificados Retie de materiales eléctricos y luminarias instaladas en la obra.
- Copia de cédula y matrículas encargados de la construcción del proyecto

Al no contar con este diseño, se debe tener en cuenta que se incurriría en un costo y tiempos adicionales, destinado a la elaboración del mismo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, quedamos atentos a sus conceptos y observaciones para proceder

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 126 - 2025

Bogota, Abril 07 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca). Remisión informe mensual

Respetados señores

De acuerdo a compromisos contractuales, adjuntamos informe mensual 7 con fecha de corte FEBRERO 28 de 2025, con sus respectivos anexos

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular

John Ramirez Romero

JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 127 - 2025

Bogotá, abril 07 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing. Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Remisión diseño barandas y pasamanos

Respetados señores

Con el presente remitimos diseño de pasamanos y baranda para su revisión y visto bueno. Cabe resaltar que, por necesidad constructiva de los espacios, surgen mayores y menores cantidades tanto de pasamanos como balance. A continuación, se describen las cantidades reales a ejecutar

ACTIVIDAD			CONTRACTUAL			REAL A EJECUTAR	
			CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
12.09	PASAMANOS ACERO INOXIDABLE DE 2" CONTRA MURO.	m	34.97	$ 180,446	$ 6,310,197	4.80	$ 866,141
12.10	BARANDA ESCALERA ACERO INOXIDABLE DE 2".	m	27.23	$ 645,711	$ 17,582,711	44.30	$ 28,604,997
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 23,892,907**		**$ 29,471,138**
						DIFERENCIA	$ 5,578,231

Quedamos atentos a su aprobación para dar inicio al proceso de fabricación e instalación, e incluir estas cantidades en el balance de cobro final

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular

John Ramirez Romero

JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

Anexo Planos de taller (fabricación)

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 128 - 2025

Bogota, Abril 08 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca). Remisión informe mensual

Respetados señores

De acuerdo a compromisos contractuales, adjuntamos informe mensual 8 con fecha de corte marzo 30 de 2025, con sus respectivos anexos

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 129 - 2025

Bogotá, abril 08 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing. Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta estado tramite EMCALI y bomberos – respuesta comunicado 1963_223_2024

Respetados señores

En respuesta al comunicado en asunto con el presente informamos a Ustedes el estado de los trámites relacionados a continuación

1. Aumento de carga EMCALI: Una vez recibido el documento de identificación del apoderado, se procedió al cargue de toda la información documental y técnica complementaria requerida en la plataforma de EMCALI (tramite virtual). Estamos a la espera de respuesta y/o solicitud de información adicional
2. Tramite BOMBEROS: como se indicó en el comité del viernes anterior, ese trámite no está a cargo nuestro como constructores del proyecto. Lo que se hizo, por solicitud de la entidad, fue incluir dentro del balance un valor estimado para el pago que eventualmente se deba realizar.

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

Anexo Planos de taller (fabricación)

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 130 - 2025

Bogota, abril 11 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Revisión corte 2 y anexos

Respetados señores

De acuerdo a reuniones sostenidas en conjunto con la interventoría y teniendo en cuenta las condiciones contractuales, adjuntamos la documentación relacionada a continuación

1. Acta de cobro parcial # 2 correspondiente al segundo avance del 60%.
2. Memorias descriptivas correspondientes al acta de cobro # 1.

También se adjuntan las cartillas de aceros

Lo anterior para su revisión y aval y continuar con el trámite de facturación y pago correspondiente

Quedamos atentos a sus observaciones o comentarios

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

ANEXO LO ENUNCIADO

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 131 - 2025

Bogotá, abril 12 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing. Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Plan de trabajo durante la semana desde el 12 de abril hasta el 20 de abril de 2025.

Respetados señores

De acuerdo al compromiso adquirido por nosotros de entregarlas el plan de trabajo donde aparezcan las actividades a ejecutar durante esta semana santa, a continuación, adjuntamos dicho plan donde se relacionan las actividades por espacio.

En este momento el avance de obra está en el 64,29% y el compromiso es estar a el 20 de abril-25, en un 71,1% tal como aparece en el programa de obra.

Cabe anotar que se llevan tres fines de semana programando al personal en varias actividades para suplir los días jueves, viernes, sábado y domingo santo.

Ratificamos nuestro compromiso para sacar adelante el proyecto y de nuestra parte acometer todo lo necesario para cumplir con los requerimientos contractuales.

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular

John Ramirez Romero

JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

Anexo Lo enunciado

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9
ORIP PTEJ 132 - 2025

Bogota, abril 15 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Revisión corte 2 y anexos – correcciones – respuesta comunicado SNR2025EE-046603-1

Respetados señores

En respuesta a comunicado en asunto, y subsanando las observaciones allí planteadas

1. Acta de cobro parcial # 2 correspondiente al segundo avance del 60%. Incluye Memorias descriptivas correspondientes al acta de cobro # 1. Y demás anexos

Se hace claridad que se realiza el cálculo del DESCUENTO AUSENCIA POR INCAPACIDAD DIRECTOR DE OBRA (2 MESES Y 22 DÍAS), teniendo en cuenta el valor total por 6 meses, presentado en el archivo adjunto "ANALISIS A.I.U. (Administracion, Imprevistos y Utilidades) - VIGENCIA 2024" del Personal Directivo

- Director Técnico de obra $21.593.495,00.

Tomando como referencia este y calculando el porcentaje de descuento de la siguiente manera:

6 meses → 180 días, asi el valor por día ($21.593.495,00/180días=$119.963,86 valor por día) y el tiempo de ausencia por incapacidad del Director fueron 2meses = 60 días + 22 días =82 días

$119.963,86(valor por día)*82 (Cant. Días ausencia)= $9.837.036,52

y obteniendo el porcentaje de descuento asi: 82días ausencia/180 días totales contractuales =46%

Lo anterior para su revisión y aval y continuar con el trámite de facturación y pago correspondiente

Sin otro particular

John Ramirez Romero

JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9
ORIP PTEJ 133 - 2024

Bogotá, abril 16 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramón Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicado 1963_226_2024 Plan de trabajo de semana santa

Cordial saludo,

En respuesta al comunicado en asunto con relación al plan de trabajo de semana santa, se aclara lo siguiente, nos permitimos dar claridad a lo siguiente:

1. En el oficio enviado por nosotros el día 12 de abril/25 se informa que al 20 de abril/25 se tendrá un avance del 71,1% tal como aparece en el programa de obra. En ningún momento se manifestó que ese programado se tendrá en la semana del 20 al 25 de abril-25.
2. En esta semana santa se ejecutarán varias actividades como son: cableado eléctrico, tubería eléctrica, estuco y pintura muros interiores, repellos y estuco acrílico fachadas, enchape de pisos, instalación de puertas y ventanas. Terminación de la red contraincendios, repello pisos y muretes patio interior.

Estas actividades ejecutadas corresponderán al 7,42% que equivale a lo programado durante la semana del 14 al 20 de abril/25.

Ratificamos nuestro compromiso para sacar adelante el proyecto y de nuestra parte acometer todo lo necesario para cumplir con los requerimientos contractuales.

Sin otro particular

John Ramirez Romero

JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA

guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9
ORIP PTEJ 134 - 2025

Bogota, abril 16 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Revisión corte 2 y anexos – correcciones – respuesta comunicado 1963_230_2024

Respetados señores

En respuesta a comunicado en asunto, y subsanando las observaciones allí planteadas

1. Acta de cobro parcial # 2 correspondiente al segundo avance del 60%. Incluye Memorias descriptivas correspondientes al acta de cobro # 2. Y demás anexos

Lo anterior para su revisión y aval y continuar con el trámite de facturación y pago correspondiente

Sin otro particular

JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 135 - 2025

Bogotá, abril 23 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing. Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicado 1963_229_2024 – Observaciones visita Contraloría.

Respetados señores

De acuerdo al compromiso adquirido y en respuesta al comunicado en asunto, remitimos nuestras respuestas a las observaciones planteadas durante la visita de la CONTRALORIA a las instalaciones de la obra

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

Anexo Lo enunciado

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9
ORIP PTEJ 136 - 2025

Bogota, abril 23 de 2025

Señores
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PUERTO TEJADA
Atn. Jefe cuerpo de Bomberos
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Solicitud de inspección de seguridad para certificación de red seca ORIP

Respetados señores

De acuerdo con solicitud realizada el pasado 28 de enero mediante comunicado 1963_126_2024 de la empresa CONSORCIO 310, firma interventora del proyecto, donde se remite información técnica del proyecto (planos, cálculos de red RCI) y teniendo en cuenta el estado actual de la obra comedidamente solicitamos a Ustedes realizar la inspección de seguridad para certificación de la red seca para el proyecto OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (ORIP) ubicada en la Calle 15 N° 17-48 del municipio de Puerto Tejada

Quedamos atentos a su pronta respuesta, para cualquier duda o inquietud favor remitirla a las siguientes direcciones

- Dirección Física Calle 15 N° 17-48 del municipio de Puerto Tejada
- Correos electrónicos construccion@jointsi.com.co, gerencia@jointsi.com.co

Sin otro particular

John Ramirez Romero

JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

Anexos planos de la RCI en AUTOCAD
Parámetros de diseño (cálculos) RCI

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 137 - 2025

Bogotá, abril 23 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing. Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta tramite bomberos – respuesta comunicado 1963_231_2024

Respetados señores

En respuesta al comunicado en asunto con el presente hacemos claridad que dentro de nuestras obligaciones contractuales no encontramos la realización del trámite ante bomberos como una de nuestras responsabilidades. Insistimos, como se ha indicado en los diferentes escenarios, que la inclusión de este rubro dentro del balance fue únicamente para efectos de un eventual pago a realizarse.

Con el fin de colaborar con esta gestión, el día lunes 21 del presente mes, nuestro director de obra Arq Carlos Patiño se acerco a la sede de Bomberos del municipio y allí fue informado que en efecto la documentación del proyecto ya había sido radicada por parte de la interventoría CONSORCIO 310 (Planos y memorias). El comandante de Bomberos informó que se había enviado cotizaciones para la revisión del diseño y determinar su viabilidad y que posterior a esta revisión y aprobado el diseño, se debía cancelar la suma de $3.000.000 para la visita e inspección de la red. Fue claro el señor comandante en el sentido que si no se hace previamente el pago para la revisión de los diseños no hacen la visita. En paralelo, el día de hoy remitimos, vía correo electrónico, nuevamente oficio al cuerpo de bomberos con el fin de que nos oficialicen estos costos y el procedimiento

Hacemos claridad, que esta gestión se hace a manera de colaboración sobre ese trámite, pero no es nuestra responsabilidad el resultado de la misma

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

Anexo Copia oficio ORIP PTEJ 136 - 2025

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 138 - 2025

Bogotá, abril 23 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramón Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicado 1963_239_2024 Nota crédito factura UT2

Cordial saludo,

En respuesta al comunicado en asunto se adjunta nota crédito correspondiente a la anulación de la factura UT2

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9
ORIP PTEJ 139 - 2025

Bogota, abril 23 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Remisión corte 2 y anexos – correcciones vr 3– respuesta comunicado CONSORCIO 310 1963_237_2024 y SNR2025EE-052087-1

Respetados señores

En respuesta a comunicado en asunto, y subsanando las observaciones allí planteadas mediante el presente se remite

1. Acta de cobro parcial # 2 correspondiente al segundo avance del 60%. Incluye Memorias descriptivas correspondientes al acta de cobro # 2. Y sus respectivos anexos

Con respecto al punto 1 del comunicado de la entidad, se hace claridad que se manejo la misma estructura y porcentajes planteados al momento del proceso licitatorio y aprobados mediante documento contractual inicial, así como la Adición 1 aprobada en diciembre de 2025 y Adición 2 Aprobada en marzo de 2025.

De otra parte, Tener en cuenta lo manifestado en nuestro comunicado ORIP PTEJ 132 – 2025 donde se explicó el descuento realizado por la ausencia por incapacidad del director de obra por el periodo expuesto y entendido por las partes

Lo anterior para su revisión y aval y continuar con el trámite de facturación y pago correspondiente

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 140 - 2025

Bogotá, abril 25 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca). Remisión corte 2 y anexos – correcciones vr 4– respuesta comunicado CONSORCIO 310 1963_237_2024 y SNR de fecha 22 de abril de 2025

Asunto: Respuesta Oficio1963_237_2024 de CONSORCIO 310 - Radicación del Acta Parcial de Pago No. 2 (60%) para VoBo y trámite – Respuesta al oficio SNR2025EE-052087-1 (Devolución del oficio 1963_232_2024 del 21/04/2025)

Respetados señores,

En respuesta a comunicado en asunto, en mesa de trabajo virtual del 24-04-25 con la interventoría se subsanan las observaciones allí planteadas mediante el presente se remite

1. Acta de cobro parcial # 2 correspondiente al segundo avance del 60%. Incluye Memorias descriptivas correspondientes al acta de cobro # 2. Y sus respectivos anexos

   Con respecto al punto 1 del comunicado de la entidad, se hace claridad que se manejó la misma estructura y porcentajes planteados al momento del proceso licitatorio y aprobados mediante documento contractual inicial, así como la Adición y prorroga 1 aprobada en diciembre de 2024 y prorroga Aprobada en marzo de 2025.


   Teniendo en cuenta lo anterior, cabe advertir entonces, que dicha estructura no ha sido objeto de modificación, por lo que ha de entenderse que la misma debe regirse por los términos que fueron fijados desde la etapa precontractual y contractual, a cuyas consideraciones nos remitimos, sabido que el régimen jurídico del contrato es el previsto en la Ley 80 de1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, en virtud del cual no pueden introducirse observaciones desde la actividad de la interventoría para revisar el clausulado del mismo, pues ello solo compete a las partes de negocio jurídico[1].

   De otra parte, Tener en cuenta lo manifestado en nuestro comunicado ORIP PTEJ 132 – 2025 donde se explicó el descuento realizado por la ausencia por incapacidad del director de obra por el periodo expuesto y entendido por las partes

[1] Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 202. Radicado No. 25000-23-36-000-2017-00442-01 (64165) CP Nicolás Yepes

2. En el Certificado de cumplimiento firmado por la Interventoría, es fundamental que se certifique la revisión del 100% de todas las actividades y documentos del consultor, así como hacer referencia que se revisó y se aprobó la información contenida en las memorias de cálculo, planos, APU´s, balance de obra, como también certificar el avance físico y financiero del proyecto, etc. De igual forma, se debe dejar constancia de haber verificado la totalidad de la información presentada por parte del contratista de obra para el segundo pago.

   Rta/: Se encuentran atendidas en el certificado de cumplimiento así:

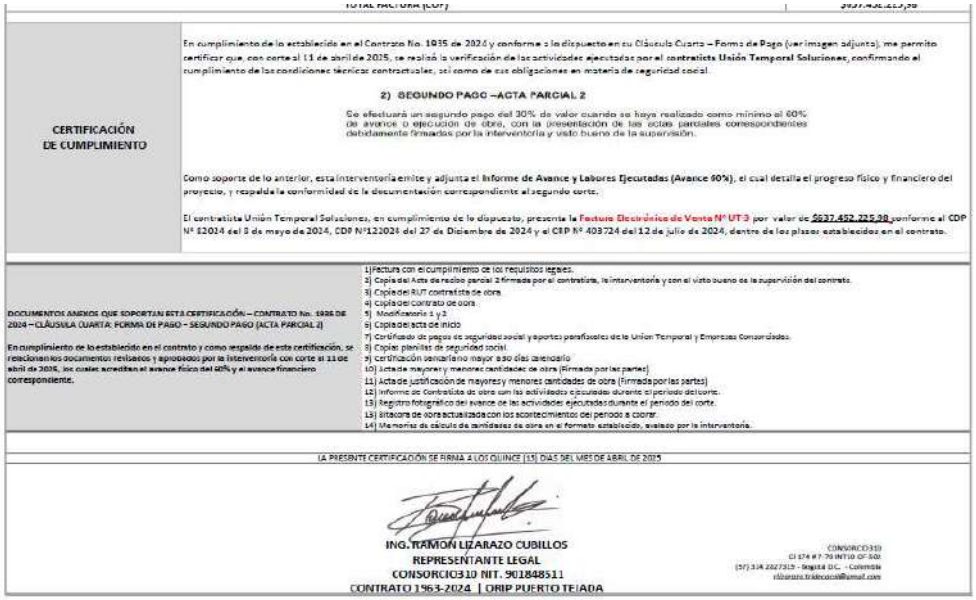


CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	En cumplimiento de lo establecido en el Contrato No. 1935 de 2024 y conforme a lo dispuesto en su Cláusula Cuarta – Forma de Pago (ver imagen adjunta), me permito certificar que, con corte al 11 de abril de 2025, se realizó la verificación de las actividades ejecutadas por el contratista **Unión Temporal Soluciones**, confirmando el cumplimiento de las condiciones técnicas contractuales, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social. **2) SEGUNDO PAGO –ACTA PARCIAL 2** Se efectuará un segundo pago del 30% de valor cuando se haya realizado como mínimo el 60% de avance o ejecución de obra, con la presentación de las actas parciales correspondientes debidamente firmadas por la interventoría y visto bueno de la supervisión. Como soporte de lo anterior, esta interventoría emite y adjunta el **Informe de Avance y Labores Ejecutadas (Avance 60%)**, el cual detalla el progreso físico y financiero del proyecto, y respalda la conformidad de la documentación correspondiente al segundo corte. El contratista Unión Temporal Soluciones, en cumplimiento de lo dispuesto, presenta la **Factura Electrónica de Venta N° UT-3** por valor de **$637.492.225,98** conforme al CDP N° 12014 del 3 de mayo de 2024, CDP N°122024 del 27 de Diciembre de 2024 y el CRP N° 408724 del 12 de julio de 2024, dentro de los plazos establecidos en el contrato.
DOCUMENTOS ANEXOS QUE SOPORTAN ESTA CERTIFICACIÓN – CONTRATO No. 1935 DE 2024 – CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO – SEGUNDO PAGO (ACTA PARCIAL 2) En cumplimiento de lo establecido en el contrato y como respaldo de esta certificación, se relacionan los documentos revisados y aprobados por la interventoría con corte al 11 de abril de 2025, los cuales acreditan el avance físico del 60% y el avance financiero correspondiente.	1) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales. 2) Copia del Acta de recibo parcial 2 firmada por el contratista, la interventoría y con el visto bueno de la supervisión del contrato. 3) Copia del RUT contratista de obra 4) Copia del Contrato de obra 5) Modificatorio 1 y 2 6) Copia del acta de inicio 7) Certificado de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de la Unión Temporal y Empresas Consorciadas. 8) Copias planillas de seguridad social 9) Certificación seriales no mayor a 90 días calendario 10) Acta de mayores y menores cantidades de obra (Firmada por las partes) 11) Acta de justificación de mayores y menores cantidades de obra (Firmada por las partes) 12) Informe de Contratista de obra con las actividades ejecutadas durante el periodo del corte. 13) Registro fotográfico del avance de las actividades ejecutadas durante el periodo del corte. 13) Bitacora de obra actualizada con los acontecimientos del periodo a cobrar. 14) Memorias de calculo de cantidades de obra en el formato establecido, avalado por la interventoría.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2025	
ING. RAMON LIZARAZO CUBILLOS **REPRESENTANTE LEGAL** **CONSORCIO310 NIT. 901848511** **CONTRATO 1963-2024 | ORIP PUERTO TEJADA**	CONSORCIO 310 CL 174 # 7-79 INT 10 OF 301 (57) 314 2327319 - Bogotá D.C. - Colombia rlizarazo.tridecocol@gmail.com

NOTA: Este certificado de cumplimiento es un borrador emitido por la interventoría, ya que dependemos de la aprobación y emisión de la factura electrónica definitiva, que será posterior a la aprobación por parte de la supervisión del ACTA DE CORTE 2.

3. RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYOS DE CONCRETO, se encuentra sin firma de recibido páginas 23 a 42.

   Rta/: Se realiza la firma en las páginas solicitadas (20-41) RESULTADOS DE LABORATORIO ENSAYOS DE CONCRETO por el director de Obra.

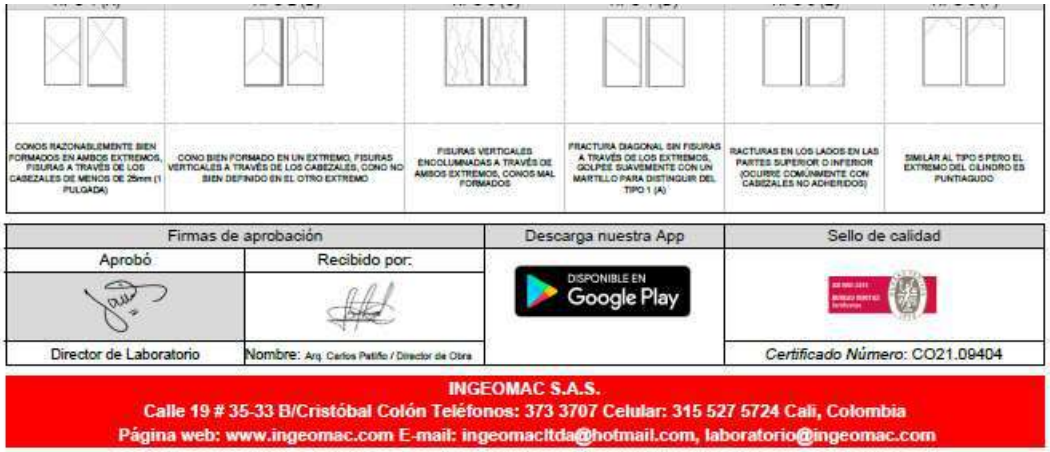


CONOS RAZONABLEMENTE BIEN FORMADOS EN AMBOS EXTREMOS, FISURAS A TRAVÉS DE LOS CABEZALES DE MENOS DE 25mm (1 PULGADA)	CONO BIEN FORMADO EN UN EXTREMO, FISURAS VERTICALES A TRAVÉS DE LOS CABEZALES, CONO NO BIEN DEFINIDO EN EL OTRO EXTREMO	FISURAS VERTICALES ENCOLUMNADAS A TRAVÉS DE AMBOS EXTREMOS, CONOS MAL FORMADOS	FRACTURA DIAGONAL SIN FISURAS A TRAVÉS DE LOS EXTREMOS, GOLPEE SUAVEMENTE CON UN MARTILLO PARA DISTINGUIR DEL TIPO 1 (A)	FRACTURAS EN LOS LADOS EN LAS PARTES SUPERIOR O INFERIOR (OCURRE COMUNMENTE CON CABEZALES NO ADHERIDOS)	SIMILAR AL TIPO 5 PERO EL EXTREMO DEL CILINDRO ES PUNTIAGUDO

Firmas de aprobación		Descarga nuestra App	Sello de calidad
Aprobó	Recibido por:	DISPONIBLE EN Google Play	
Director de Laboratorio	Nombre: Arq. Carlos Patiño / Director de Obra		*Certificado Número:* CO21.09404

INGEOMAC S.A.S.
Calle 19 # 35-33 B/Cristóbal Colón Teléfonos: 373 3707 Celular: 315 527 5724 Cali, Colombia
Página web: www.ingeomac.com E-mail: ingeomacltda@hotmail.com, laboratorio@ingeomac.com

4. Faltan las planillas de pago de seguridad social y parafiscales de UT SOLUCIONES correspondientes al mes de marzo de 2025 (pensión) y del mes de abril 2025 (salud), de las siguientes personas: Jimmy Cárdenas; Leydi Cosme y Carlos Patiño. Según fecha de pago máxima es aproximadamente el 18 del mes de abril.

   Rta/: Se incluyen las planillas faltantes a partir de la hoja 133 a la 160, cabe resaltar que el acta de corte 2 está comprendida entre el 23 de nov de 2024 al 11 de abril de 2025, y el acta fue radicada por primera vez el día 15 de abril, razón por la cual el paquete documental inicial no contemplaba el pago de la planilla del mes de abril, que como bien se indica este corresponde al 16 de abril.

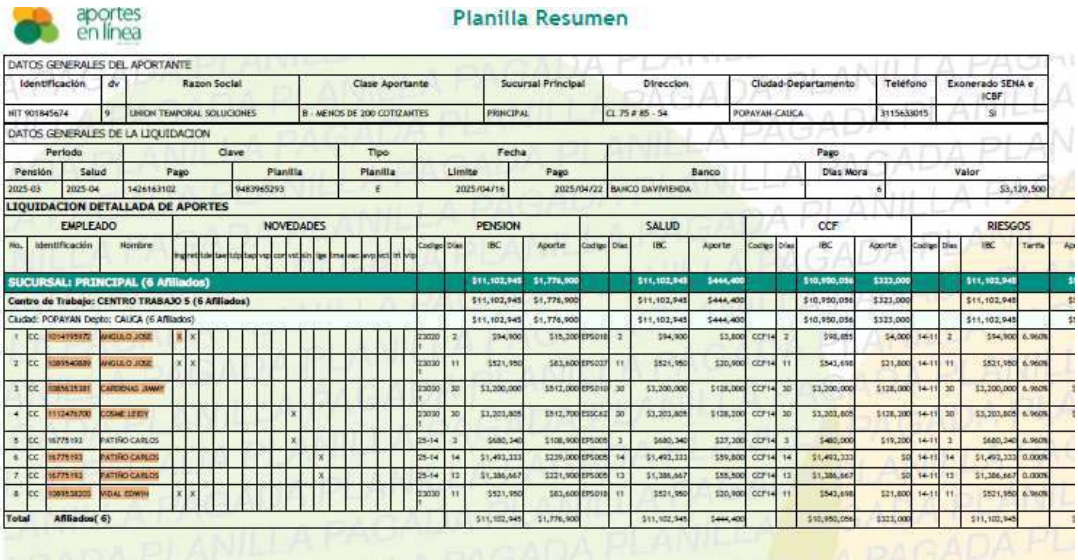

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901845674	9	UNION TEMPORAL SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 75 # 85 - 54	POPAYAN-CAUCA	3115633015	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1426163102	94839652 93	E	2025/04/16	2025/04/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$3,129,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																											PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre																													Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Ap
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																																	$11,102,945	$1,776,900			$11,102,945	$444,400			$10,950,056	$323,000			$11,102,945		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (6 Afiliados)																																	$11,102,945	$1,776,900			$11,102,945	$444,400			$10,950,056	$323,000			$11,102,945		
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)																																	$11,102,945	$1,776,900			$11,102,945	$444,400			$10,950,056	$323,000			$11,102,945		
1	CC	1054795972	ANGULO JOSE	X	X																										23020	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF14	2	$98,855	$4,000	14-11	2	$94,900	6.960%	
2	CC	1089540889	ANGULO JOSE	X	X																										23030	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$543,658	$21,800	14-11	11	$521,950	6.960%	
3	CC	1085615381	CARDENAS JIMMY																												23030	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF14	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	
4	CC	1112475700	COSME LEIDY															X													23030	30	$3,203,805	$512,700	ESSC62	30	$3,203,805	$128,200	CCF14	30	$3,203,805	$128,200	14-11	30	$3,203,805	6.960%	
5	CC	16775193	PATIÑO CARLOS															X													25-14	3	$680,340	$108,900	EPS005	3	$680,340	$27,200	CCF14	3	$680,000	$19,200	14-11	3	$680,340	6.960%	
6	CC	16775193	PATIÑO CARLOS																X												25-14	14	$1,493,333	$239,000	EPS005	14	$1,493,333	$59,800	CCF14	14	$1,493,333	$0	14-11	14	$1,493,333	0.000%	
7	CC	16775193	PATIÑO CARLOS																X												25-14	13	$1,386,667	$221,900	EPS005	13	$1,386,667	$55,500	CCF14	13	$1,386,667	$0	14-11	13	$1,386,667	0.000%	
8	CC	1089538205	VIDAL EDWIN	X	X																										23030	11	$521,950	$83,600	EPS018	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$543,658	$21,800	14-11	11	$521,950	6.960%	
Total	**Afiliados(6)**																																$11,102,945	$1,776,900			$11,102,945	$444,400			$10,950,056	$323,000			$11,102,945		

Rta/: Se incluye a partir de la hoja 224 (11. CONTROL DE PERSONAL.)

11. CONTROL DE PERSONAL

11.1. NOVIEMBRE 2024

A lo largo de este periodo, hemos contado con un total de 24 trabajadores afiliados a la seguridad social para este proyecto.

El personal que se encuentra subrayado en la siguiente tabla ya NO se encuentran en el proyecto laborando debido a que son Subcontratistas flotantes como:


- Conductores de Mixer de la empresa Polimix
- Operadores de Bomba de Concreto empresa Dalcon
- Analista de laboratorio de la empresa Ingeomac

Contando con un total de 13 colaboradores fijos: entre la empresa de Ingestructuras (10) y Unión Temporal Soluciones (3)

NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE CEDULA	EMPRESA	ARL	AFP	EPS
German Mora Velasquez	19390341	Ingestructuras	Sura	Colpensiones	Compensar
Jordy Armando Cantoñ Barguero	1062313919	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Sos
Pablo Nelson Balanta Caicedo	80810041	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Kevin Andres Caicedo	1007412746	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Delner Hurtado Arboleda	76047013	Ingestructuras	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Jimmy Fernando Cardenas	1085635391	Uts	Sura	Porvenir	Sura
Carlos Alberto Patiño	16775193	Uts	Sura	Colpensiones	Sanitas
Leidy Viviana Cosme	1112476700	Uts	Sura	Colpensiones	Asmet Salud
José Jesús Morales	16277449	Ingestructuras	Sura	Colpensiones	Sos
Wilmer Caicedo Carabali	76044961	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Nueva Eps
Fredy Castro Chalar	76.044.048	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Sos
José Elny Saa Nuñez	1.089.984.107	Inge Estructura	Sura	Porvenir	Asmet Salud
Hernan Rivas Vidal	1.089.984.107	Inge Estructura	Sura	N/A	Nueva Eps
Luis Eduardo Amaya Enciso	16.675.873	Inge Estructura	Sura	N/A	Nueva Eps
Lubinel Balanta Lasso	10566186	Inge Estructura	Sura	N/A	Asmet Salud


5. EL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA, debe dejarse el espacio para firma del visto bueno de los supervisores del contrato de interventoría.

   Rta/: Se incluye el espacio para la firma de los supervisores Dr. Álvaro Lozano Lopera - DIRECTOR REGIONAL PACIFICO Y Dra. Giselle Carolina Martínez Freiter - JEFE OFICINA-ASESORA JURIDICA - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO en la hoja 172.

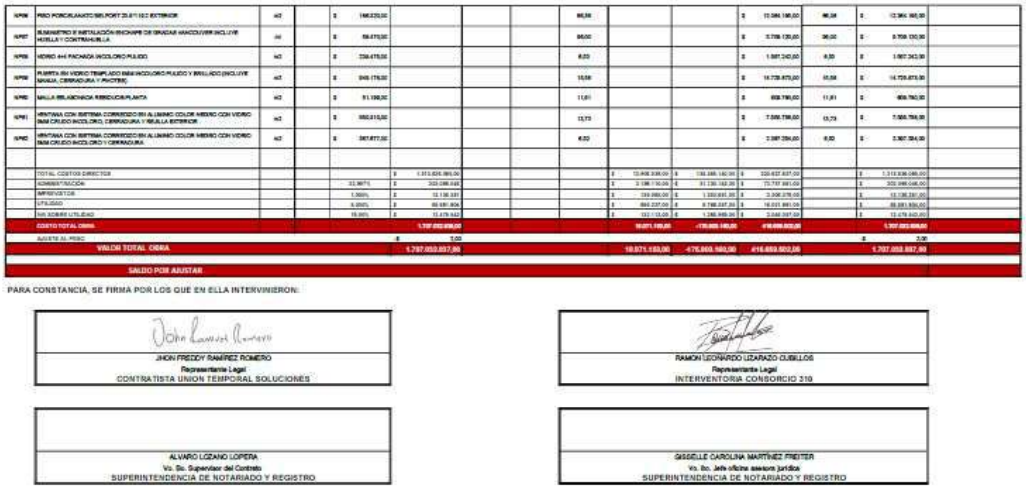

6. JUSTIFICACIÓN ACTA No.2 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA, debe dejarse el espacio para firma del visto bueno de los supervisores del contrato de interventoría.

   Rta/: Se incluye el espacio para la firma de los supervisores Dr. Álvaro Lozano Lopera - DIRECTOR REGIONAL PACIFICO Y Dra. Giselle Carolina Martínez Freiter - JEFE OFICINA-ASESORA JURIDICA - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO en la hoja 179.

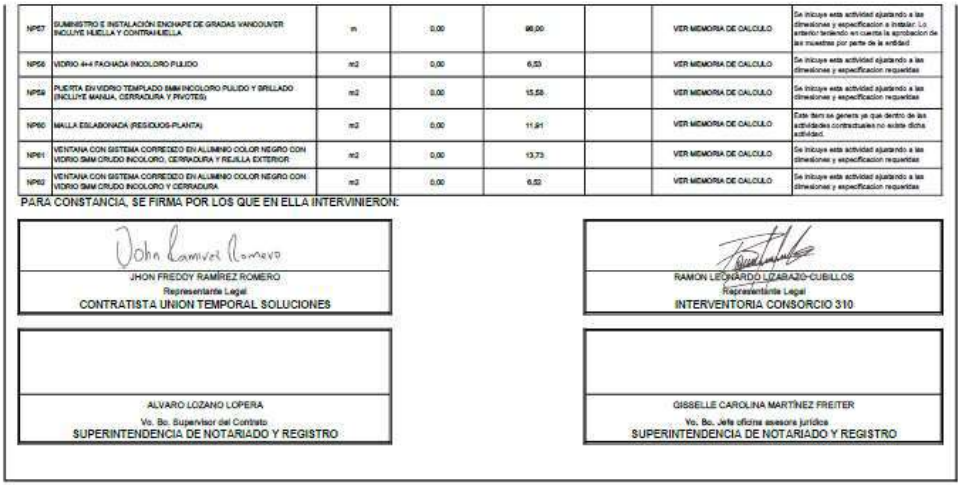

NP57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE DE GRADAS VANCOUVER INCLUYE HUELLA Y CONTRAHUELLA	m	0,00	66,00		VER MEMORIA DE CALCULO	Se incluye esta actividad ajustando a las dimensiones y especificacion a instalar. Lo anterior teniendo en cuenta la aprobacion de las muestras por parte de la entidad
NP58	VIDRIO 4+4 FACHADA INCOLORO PULIDO	m2	0,00	6,53		VER MEMORIA DE CALCULO	Se incluye esta actividad ajustando a las dimensiones y especificacion requeridas
NP59	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 5MM INCOLORO PULIDO Y BRILLADO (INCLUYE MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES)	m2	0,00	15,58		VER MEMORIA DE CALCULO	Se incluye esta actividad ajustando a las dimensiones y especificacion requeridas
NP60	MALLA ESLABONADA (RESIDUOS-PLANTA)	m2	0,00	11,91		VER MEMORIA DE CALCULO	Este item se genera ya que dentro de las actividades contractuales no existe dicha actividad.
NP61	VENTANA CON SISTEMA CORREDIZO EN ALUMINIO COLOR NEGRO CON VIDRIO 5MM CRUDO INCOLORO, CERRADURA Y REJILLA EXTERIOR	m2	0,00	13,73		VER MEMORIA DE CALCULO	Se incluye esta actividad ajustando a las dimensiones y especificacion requeridas
NP62	VENTANA CON SISTEMA CORREDIZO EN ALUMINIO COLOR NEGRO CON VIDRIO 5MM CRUDO INCOLORO Y CERRADURA	m2	0,00	6,52		VER MEMORIA DE CALCULO	Se incluye esta actividad ajustando a las dimensiones y especificacion requeridas

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

JHON FREDDY RAMÍREZ ROMERO
Representante Legal
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLUCIONES

RAMON LEONARDO LOZARZO-CUBILLOS
Representante Legal
INTERVENTORIA CONSORCIO 310

ALVARO LOZANO LOPERA
Vo. Bo. Supervisor del Contrato
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

GISSELLE CAROLINA MARTÍNEZ FREITER
Vo. Bo. Jefe oficina asesora jurídica
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

7. El INFORME FACTURA 02 – ACTA CORTE No.02 AVANCE DE OBRA (Páginas 184 a 235), viene sin la correspondiente firma del responsable del mismo.


   Rta/: Se incluyen la firma solicitada de nuestro director de Obra Arq. Carlos Patiño en la hoja 241.



En constancia firma,

ARQ. CARLOS PATIÑO
DIRECTOR DE OBRA

El citado informe menciona los siguientes anexos que no se encuentran:



24. ANEXOS

- Comités de obra.
- Informes semanales de obra.
- Oficios enviados a interventoría.
- Informe mensual de SST.
- Seguridad social del personal
- Recibos de escombreras
- Preoperacional de herramientas
- Fichas de seguridad
- Nuevos certificados de alturas
- Certificación de materiales

Rta/: Este numeral se elimina, dado que su inclusión fue producto de un error al haberse tomado como base el modelo de los informes mensuales. Agradecemos considerar el nuevo informe anexo, el cual incluye únicamente los documentos requeridos para el trámite del Acta de Cobro N.º 2.

8. Dando respuesta al oficio de la SNR - Observaciones técnicas al acta parcial No.2. en donde se solicita *"Es necesario justificar de manera clara por qué se están haciendo cobros parciales de ítem que son por unidades completas"*.
   Se realizo la revisión por parte del equipo técnico, y este porcentaje corresponde a un error de digitación, sin embargo, se revisan los valores de los ítems relacionados y se ajustan las cantidades según el estado de la actividad y los elementos instalados que corresponden al avance descrito.

9. Se adjunta archivo 1. DOCS ACTA PARCIAL DE PAGO No.2 AVANCE 60%, Excel de 2. Acta parcial de pago No.2 24-04-2025 RV-6 V3 y 3. CheckList del Acta de corte No. 2

Por otra parte, quedamos atentos ya que a la fecha se puede evidenciar que como contratista de obra se ha invertido un 80% y solamente se ha facturado un 22% del total del contrato, por lo cual solicitamos amablemente su apoyo y gestión a fin de lograr la facturación de este corte y así contar con los recursos necesarios para llevar a buen término la ORIP Puerto Tejada.

Lo anterior para su revisión, aval y continuar con el trámite de facturación y pago correspondiente.

Sin otro particular,



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 141 - 2025

Bogotá, abril 24 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing. Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Respuesta comunicados 1963_234_2024, 1963_236_2024 , 1963_242_2024 – Acciones de contingencia para mejora tiempos de ejecución
Copia a la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO Póliza No. 11-44-101230108 EXPEDIDA EL 15-07-2024

Respetados señores

En respuesta a los comunicados en asunto remitidos por la interventoría a continuación, describimos las acciones que se han venido tomando y que se tomaran a futuro, con el fin de continuar con la ejecución de obra

ACTIVIDADES A EJECUTAR POR CAPITULOS

PISOS BASES Y ACABADOS

Alistado de piso Impermeabilizado Esta actividad se encuentra finalizada,

Media caña en granito: El material se encuentra pagado y en producción. Se tiene una fecha estimada de despacho para el lunes 28 de abril. Iniciaremos su instalación el día martes 29

Allanado mecánico esmaltado: Esta pendiente realizar esta actividad en el cuarto del rack centro de cómputo. Una vez terminadas las actividades eléctricas se ejecutará este allanado en esa zona. En las demás zonas está concluido.

Para estas actividades de pisos y bases se cuenta con una cuadrilla (1 oficial y ayudante)

INSTALACIONES RED ELECTRICAS VOZ Y DATOS

En cuanto a tubería estamos en un avance del 95%. Se continua con la instalación de cableado. A la fecha presentamos un avance aproximado en Piso 1 al 90%, Piso 2 al 20%. El día sábado se tiene programado el despacho de otra parte de cable para culminar con esta actividad en las fechas establecidas en programación (mayo 15)

La planta eléctrica arribo a la obra y esta semana se esta trabajando en su instalación e Instalación de desfogue, se tiene proyectado culminación de esta actividad el 2 de mayo

Para estas actividades se cuenta con una cuadrilla (2 oficial y ayudante) que de manera flotante están disponibles en obra. En la medida de la necesidad se ira incrementado el personal para mejorar rendimientos

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Esta actividad presenta en la actualidad un avance aproximado del 90%, quedando por ejecutar actividades como sifones de equipos de aire, llaves de paso que se instalaran en el momento del equipamiento de baños y zonas donde aplique. A partir de mañana se va a realizar una nueva prueba de presión a la tubería hidráulica antes de tapar cielos para garantizar su funcionalidad.

Para estas actividades se cuenta con una cuadrilla (1 oficial y ayudante) que de manera flotante están disponibles en obra

INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO

Esta actividad presenta un avance aproximado del 98%. Quedando pendiente la instalación de los 3 gabinetes y la siamesa que va en fachada. Estos equipos/materiales ya se encuentran en la bodega de obra. Se realizará el día martes 29 prueba de presión de esta red, una vez culminada la prueba de la red hidráulica. Tan pronto se culmine pintura de muros, se procederá con la instalación de estos elementos

Para estas actividades se cuenta con una cuadrilla (1 oficial y ayudante) que de manera flotante están disponibles en obra

INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION

A la fecha nos encontramos en fabricación de ductería para iniciar con su instalación el día lunes 28 en paralelo con la tubería de cobre. Los equipos de aires ya llegaron a obra y se conservara la fecha de culminación establecida en el cronograma de obra

Para la actividad de ductos y tubería se contará con una cuadrilla (1 oficial y ayudante) y para la instalación de equipos será otra cuadrilla independiente

CARPINTERIA EN MADERA

Falta instalar la puerta corrediza de PMR, la puerta esta en sitio, una vez se instale guarda escoba y cenefa de transición de piso se proceder con su instalación

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO

Ventanería aluminio y vidrio Falta instalar dos ventanas, que estaban pendientes por sus respectivas carteras. Se tiene programado para la siguiente semana realizar la instalación de estas y toma de medidas de vidrios de ventanas y puertas para estar instalando la semana del 12 al 16 de mayo

Para esta instalación se envía una cuadrilla independiente

Carpintería metálica Ya se encuentran en obra las puertas metálicas para iniciar su instalación de acuerdo a programación. La estructura metálica de fachada también está en obra, instalada la del segundo piso y en proceso instalación la del primer piso. Toda esta actividad quedara de acuerdo a la programación (15 de mayo)

Para esta instalación se envía una cuadrilla independiente

CIELO RASOS

Se está adelantando actividades de estructurado, tapado de espacios, masillado. Se realizo un pedido de material que debe estar llegando el día de mañana para continuar con esta labor, incluyendo laminas RH para baños. Con la instalación de ductería de AA se procederá a cerrar espacios para dar acabado final. Esta actividad se culminará el 8 de mayo

Para estas actividades se cuenta con dos cuadrillas (1 oficial y ayudante c/u)

CUBIERTAS

Flanches en lamina Actividad en ejecución al 60% aproximado. Se estará concluyendo de acuerdo a la fecha de la programación (mayo 12)

Para estas actividades se cuenta con una cuadrilla (1 oficial y ayudante)

PINTURAS

Pintura tipo coraza Actividad en ejecución, se esta ejecutando la base en estuco exterior para posteriormente dar acabado en pintura coraza. Se estará concluyendo de acuerdo a la fecha de la programación (mayo 15)

Pintura epóxica Actividad pendiente por iniciar. Por temas constructivos, una vez se culmine con los cielos rasos, se procederá con este acabado. Se estará concluyendo de acuerdo a la fecha de la programación (mayo 15)

Para estas actividades se cuenta con una cuadrilla (1 oficial y ayudante)

PISOS Y ENCHAPES

Con el ingreso de planta eléctrica al patio, se inició con instalación de pisos en zonas de corredor en piso 1 y sala de hall de acceso. Se tiene en obra tanto el pirlan en bronce como el piso VANCOUVER para escaleras, por ser una zona de alto tráfico se está coordinando su ejecución para un fin de semana
Para estas actividades se cuenta con una cuadrilla (2 oficial y ayudante)

A la fecha hemos realizado como organización un enorme esfuerzo económico que nos permite estar con un avance de obra importante. Seguimos trabajando arduamente para disponer los recursos tanto económicos como de personal para realizar entrega del proyecto en los tiempos pactados. Estamos gestionando el trámite del corte de obra correspondiente al 60% que nos ayudará a contar con la caja suficiente para realizar consecución de materiales, equipos y mano de obra necesaria para la culminación de la obra. Contamos con su oportuna colaboración para darle celeridad a este tramite

Quedamos atentos a su concepto y observaciones

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Seguros del Estado Correspondenciacrp@segurosdelestado.com; juridico@segurosdelestado.com
Kevin.OspinaG@segurosdelestado.com
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 142 - 2025

Bogotá, abril 25 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing. Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Remisión diseño y APU baranda y pasamanos escalera

Respetados señores

De acuerdo a compromiso, se remite plano de diseño de propuesta para la baranda y pasamanos para la escalera del proyecto en asunto. Se adjunta los respectivos APUS (y cotizaciones soporte) teniendo en cuenta el cambio de material solicitado, ya que se pasó de Acero inoxidable a tubería Aguas negras 2" pintada

Quedamos atentos a su concepto y observaciones para proceder con su proceso de producción e instalación

Sin otro particular

JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 143 - 2025

Bogotá, abril 28 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing. Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Aclaración APU baranda y pasamanos escalera – respuesta comunicado 1963_243_2024

Respetados señores

En respuesta al comunicado en asunto, remitimos aclaraciones solicitadas a los APUS para la baranda y pasamanos del proyecto. Se anexa plano descriptivo de los elementos incluidos en los APU

Quedamos atentos a su concepto y observaciones para proceder con su proceso de producción e instalación

Sin otro particular



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

CC SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co
Dirección Contratos SNR direccion.contratos@Supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES
NIT 901.845.674-9

ORIP PTEJ 144 - 2025

Bogotá, abril 29 de 2025

Señores
CONSORCIO 310
Atn. Ing Ramon Lizarazo
Ciudad

Referencia: Contrato N°.1935 de 2024- construcción de la ORIP de Puerto Tejada (Cauca).
Estado tramite servicios públicos - Respuesta comunicado 1963_246_2024

Respetados señores,

En respuesta a comunicado en asunto, con el presente hacemos las siguientes precisiones

1. Tramite empresa de acueducto: como se ha mencionado en diferentes escenarios, el predio actualmente cuenta con una red y su respectivo medidor. Al momento de iniciar actividades en obra se realizó una visita a la sede de AFROCAUCANA DE AGUAS SAS ESP donde se nos manifestó que podíamos seguir con esta red y utilizarla para el servicio de obra y que posteriormente esta podría ser utilizada para la sede de la ORIP una vez culminada la etapa de obra y esta entrara en funcionamiento. Nuevamente se realizo visita a la empresa prestadora y nos ratificaron que con la red actual está disponible y se mantendrá para el predio, registrada mediante el número de matrícula 10151 a nombre de la Superintendencia de Notariado y Registro, el servicio esta disponible.

2. Tramite EMCALI aumento de carga como se informó en nuestro comunicado ORIP PTEJ 129-2025, la solicitud del trámite y la información complementaria fue cargada a la plataforma virtual de EMCALI


EMCALI
VALORAMOS LO ESENCIAL

Señor usuario.

Su solicitud de conexión ha sido registrada satisfactoriamente


Número de solicitud: 1447 (UPM)

Oportunamente le estaremos informando el estado de su solicitud (aprobada o rechazada).

Recuerde que usted puede ingresar al portal de EMCALI en cualquier momento a consultar el estado de su solicitud

CALLE 75 # 85 – 54 - BOGOTA
CEL 3153491478
Correo utsoluciones24@gmail.com, gerencia@jointsi.com.com

Posterior a esta radicación se realizó el envío de toda la información en forma física en la sede EMCALI en Puerto Tejada de la cual generaron el siguiente radicado

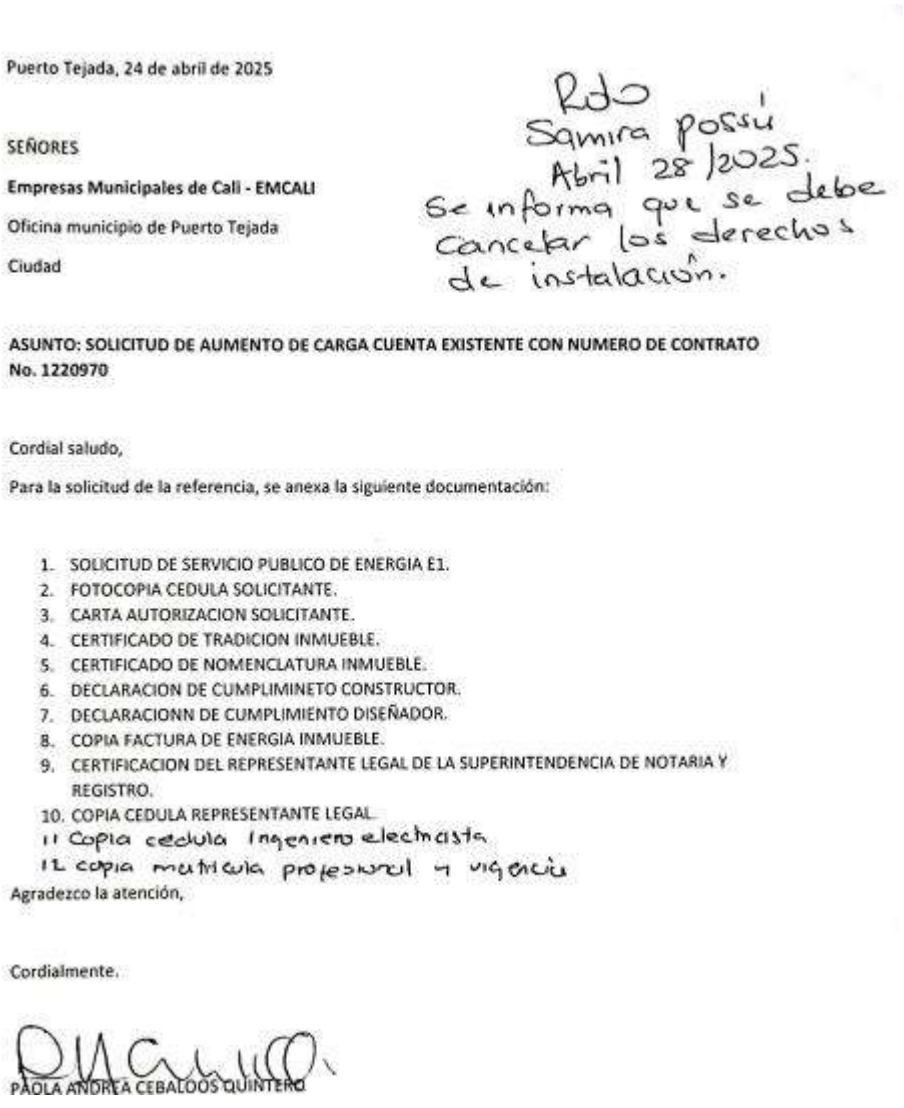

Puerto Tejada, 24 de abril de 2025

Rdo
Samira Possu
Abril 28 /2025.
Se informa que se debe cancelar los derechos de instalación.

SEÑORES

Empresas Municipales de Cali - EMCALI

Oficina municipio de Puerto Tejada

Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE AUMENTO DE CARGA CUENTA EXISTENTE CON NUMERO DE CONTRATO No. 1220970

Cordial saludo,

Para la solicitud de la referencia, se anexa la siguiente documentación:

1. SOLICITUD DE SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA E1.
2. FOTOCOPIA CEDULA SOLICITANTE.
3. CARTA AUTORIZACION SOLICITANTE.
4. CERTIFICADO DE TRADICION INMUEBLE.
5. CERTIFICADO DE NOMENCLATURA INMUEBLE.
6. DECLARACION DE CUMPLIMINETO CONSTRUCTOR.
7. DECLARACIONN DE CUMPLIMIENTO DISEÑADOR.
8. COPIA FACTURA DE ENERGIA INMUEBLE.
9. CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIA Y REGISTRO.
10. COPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.
11. Copia cedula Ingeniero electricista
12. copia matricula profesional y vigencia

Agradezco la atención,


Cordialmente.

PAOLA ANDREA CEBALLOS QUINTERO

Durante estos radicados se nos informaron varios temas a tener en cuenta

a. Se nos informará oportunamente el valor de los derechos de instalación. Este valor será socializado a la entidad para que realice el pago correspondiente
b. Nos solicitaron declaración de cumplimiento firmada por el diseñador del proyecto. Tal como se hizo para temas de RETIE, esta declaración fue firmada por nuestro asesor eléctrico. Estamos atentos a que no nos generen observación por no estar firmada por quien corresponde
c. Nos informaron que en los próximos días se haría una visita a la obra para ir validando la necesidad del servicio y condiciones de la zona

El día de hoy recibimos visita por parte de un funcionario de EMCALI, quien nos dejo el acta relacionada a continuación, donde nos manifiesta no tener red para el servicio solicitado y nos indica que con el acta entregada debemos visitar nuevamente a EMCALI para que nos indiquen el paso a seguir. Esta nueva visita se realizará el día de mañana

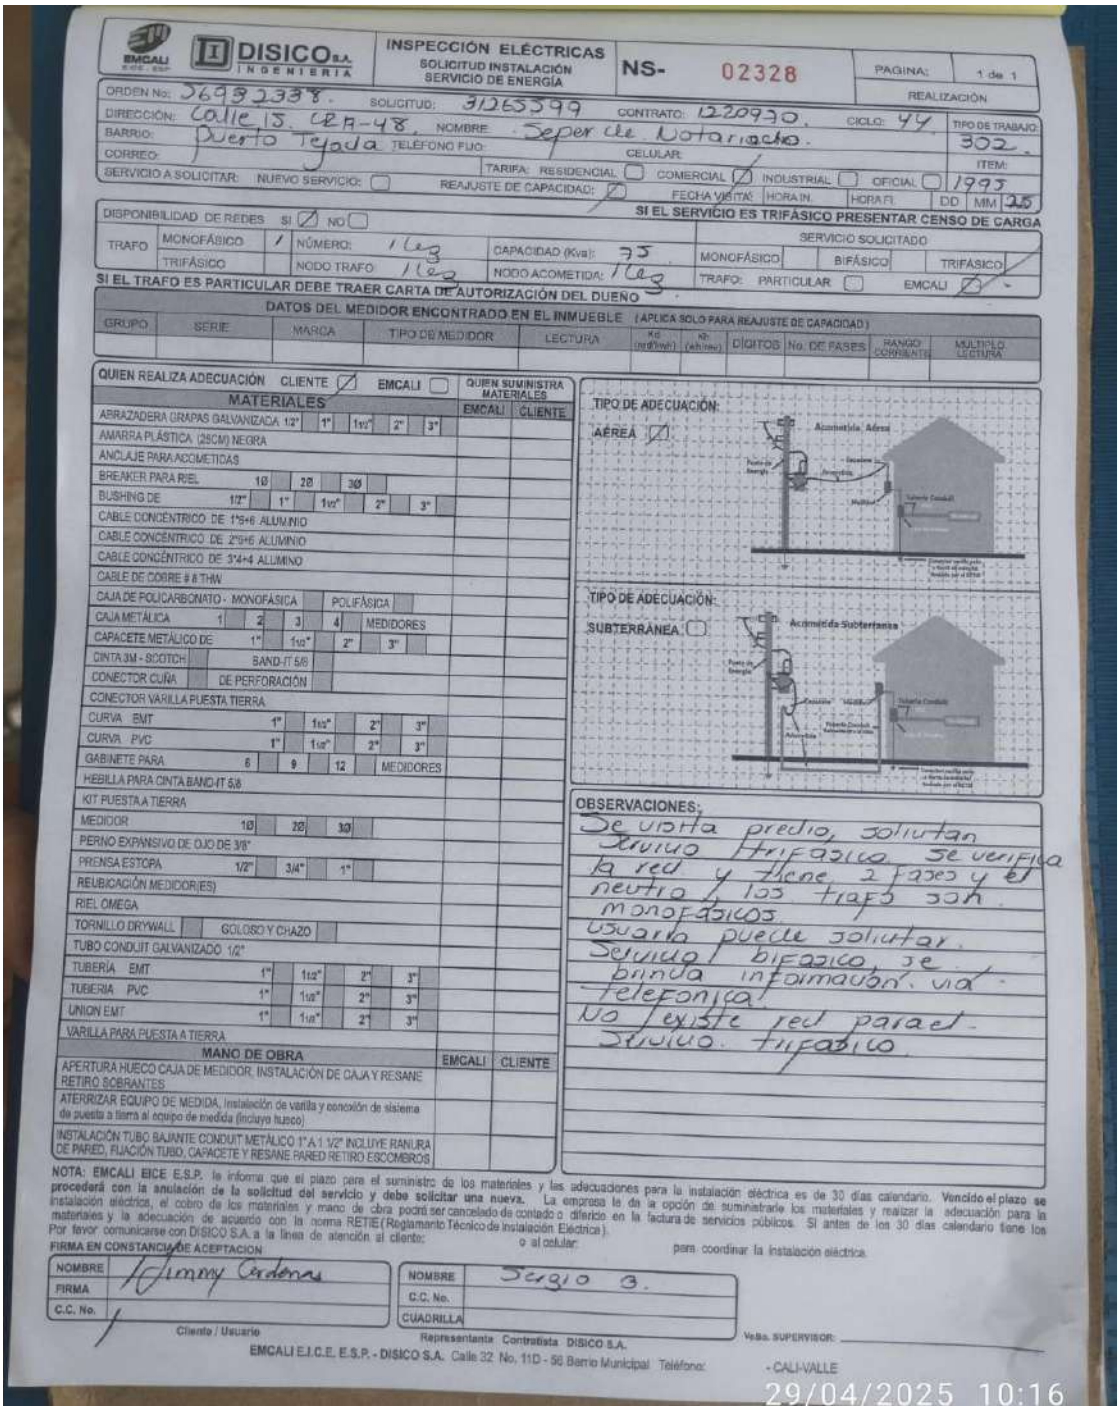

EMCALI DISICO S.A. INGENIERIA

INSPECCIÓN ELÉCTRICAS
SOLICITUD INSTALACIÓN SERVICIO DE ENERGÍA

NS- 02328

PAGINA: 1 de 1

ORDEN No: 56982338 SOLICITUD: 31265599 CONTRATO: 1220990 CICLO: 44 TIPO DE TRABAJO: 302

DIRECCIÓN: Calle 15 42A-48 NOMBRE: Seper de Notariado

BARRIO: Puerto Tejada TELÉFONO FIJO: CELULAR:

CORREO: TARIFA: RESIDENCIAL ☐ COMERCIAL ☒ INDUSTRIAL ☐ OFICIAL ☐ ITEM: 1993

SERVICIO A SOLICITAR: NUEVO SERVICIO: ☐ REAJUSTE DE CAPACIDAD: ☒ FECHA VISITA: HORA IN. HORA FI. DD MM 25

SI EL SERVICIO ES TRIFÁSICO PRESENTAR CENSO DE CARGA

DISPONIBILIDAD DE REDES SI ☒ NO ☐

TRAFO		NÚMERO:	CAPACIDAD (Kva): 75	SERVICIO SOLICITADO	
MONOFÁSICO	/			MONOFÁSICO	BIFÁSICO TRIFÁSICO
TRIFÁSICO		NODO TRAFO Neg	NODO ACOMETIDA: Neg	TRAFO: PARTICULAR ☐	EMCALI ☒

SI EL TRAFO ES PARTICULAR DEBE TRAER CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL DUEÑO

DATOS DEL MEDIDOR ENCONTRADO EN EL INMUEBLE (APLICA SOLO PARA REAJUSTE DE CAPACIDAD)

GRUPO	SERIE	MARCA	TIPO DE MEDIDOR	LECTURA	Kh (vatios/hora)	Kr (vatios/hora)	DÍGITOS	No. DE FASES	RANGO CORRIENTE	MULTIPLO LECTURA

QUIEN REALIZA ADECUACIÓN CLIENTE ☒ EMCALI ☐

MATERIALES						QUIEN SUMINISTRA MATERIALES EMCALI	CLIENTE
ABRAZADERA GRAPAS GALVANIZADA 1/2"	1"	1½"	2"	3"			
AMARRA PLÁSTICA (25CM) NEGRA							
ANCLAJE PARA ACOMETIDAS							
BREAKER PARA RIEL	1Ø	2Ø	3Ø				
BUSHING DE	1/2"	1"	1½"	2"	3"		
CABLE CONCENTRICO DE 1*5+6 ALUMINIO							
CABLE CONCENTRICO DE 2*5+6 ALUMINIO							
CABLE CONCENTRICO DE 3*4+4 ALUMINIO							
CABLE DE COBRE # 8 THW							
CAJA DE POLICARBONATO - MONOFASICA	POLIFÁSICA						
CAJA METÁLICA	1	2	3	4	MEDIDORES		
CAPACETE METÁLICO DE	1"	1½"	2"	3"			
CINTA 3M - SCOTCH	BAND-IT 5/8						
CONECTOR CUÑA	DE PERFORACIÓN						
CONECTOR VARILLA PUESTA TIERRA							
CURVA EMT	1"	1½"	2"	3"			
CURVA PVC	1"	1½"	2"	3"			
GABINETE PARA	6	9	12	MEDIDORES			
HEBILLA PARA CINTA BAND-IT 5/8							
KIT PUESTA A TIERRA							
MEDIDOR	1Ø	2Ø	3Ø				
PERNO EXPANSIVO DE OJO DE 3/8"							
PRENSA ESTOPA	1/2"	3/4"	1"				
REUBICACIÓN MEDIDOR(ES)							
RIEL OMEGA							
TORNILLO DRYWALL	GOLOSO Y CHAZO						
TUBO CONDUIT GALVANIZADO 1/2"							
TUBERÍA EMT	1"	1½"	2"	3"			
TUBERIA PVC	1"	1½"	2"	3"			
UNION EMT	1"	1½"	2"	3"			
VARILLA PARA PUESTA A TIERRA							

MANO DE OBRA	EMCALI	CLIENTE
APERTURA HUECO CAJA DE MEDIDOR, INSTALACIÓN DE CAJA Y RESANE RETIRO SOBRANTES		
ATERRIZAR EQUIPO DE MEDIDA, Instalación de varilla y conexión de sistema de puesta a tierra al equipo de medida (incluye tuseo)		
INSTALACIÓN TUBO BAJANTE CONDUIT METÁLICO 1" A 1 1/2" INCLUYE RANURA DE PARED, FIJACIÓN TUBO, CAPACETE Y RESANE PARED RETIRO ESCOMBROS		

TIPO DE ADECUACIÓN:
AÉREA ☒

TIPO DE ADECUACIÓN:
SUBTERRANEA ☐

OBSERVACIONES:
Se visita predio, solicitan Servicio Trifasico se verifica la red y tiene 2 fases y el neutro y los trafo son monofasicos usuario puede solicitar Servicio bifasico, se brinda informacion via telefonica No Existe red para el Servicio trifasico

NOTA: EMCALI EICE E.S.P. le informa que el plazo para el suministro de los materiales y las adecuaciones para la instalación eléctrica es de 30 días calendario. Vencido el plazo se procederá con la anulación de la solicitud del servicio y debe solicitar una nueva. La empresa le da la opción de suministrarle los materiales y realizar la adecuación para la instalación eléctrica, el cobro de los materiales y mano de obra podrá ser cancelado de contado o diferido en la factura de servicios públicos. Si antes de los 30 días calendario tiene los materiales y la adecuación de acuerdo con la norma RETIE (Reglamento Técnico de Instalación Eléctrica).
Por favor comunicarse con DISICO S.A. a la línea de atención al cliente: o al celular: para coordinar la instalación eléctrica

FIRMA EN CONSTANCIA DE ACEPTACION

NOMBRE	Jimmy Cardenas	NOMBRE	Sergio G.
FIRMA		C.C. No.	
C.C. No.		CUADRILLA	

Cliente / Usuario — Representante Contratista DISICO S.A. — Vo.Bo. SUPERVISOR:

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. - DISICO S.A. Calle 32 No. 11D - 96 Barrio Municipal Teléfono: - CALI-VALLE

29/04/2025 10:16

Una vez hagamos esta visita estaremos informando el resultado de esta y el paso a seguir

Sin otro particular,



JOHN FREDDY RAMIREZ ROMERO
UNION TEMPORAL SOLUCIONES

C.C SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ARQ. GUIDO GARCIA
guido.garcia@supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-087
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 31/03/2025

OBRA: OAP Pto Tejada.

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Geidy Vivian Cano Herrera

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas			✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Se inspeccionan las siguientes Hta: Palas, bolondo, pondo, seguetas, serrucho, cincel, codal, llave, Martillo, pistola de calafateo, Taladros electricos e inalambricos, juego de llaves Allen, destornilladores, cinta metrica todas se encuentran en buen estado. Proxima inspeccion 07/04/2025

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 02/04/2025

OBRA: Quiroga Tejada

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Leidi Orozco Cano

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas			✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	✓		
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Se inspecciona los siguientes ítems: palas, barras, ponsa, segueta, serrucho, cincel, codal, llana, plataformas, tubos, chaleco, andamios, juego de llaves, alicates, manguera. Todos estos ítems se encuentran en buenas condiciones, próxima inspección 02/04/25

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 01/04/2025

OBRA: CAP PTO TOLDADO ARCOS

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: LEIDY GRACIELA CORP.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	ESTADO NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias		✓	
2	Poseen guardas de seguridad		✓	
3	Se trabaja a las presiones indicadas		✓	

OBSERVACIONES Se inspeccionan las siguientes Herr, portátiles u fijadas: inalambrica y electrica, Pulso, taladro, ROMP, bayonetas, extensiones encauchetadas, contactores de seguridad. Bayonetas fuentes estas Herr se encuentran en buenas condiciones próxima inspección 07/04/25

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIÁMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LÍNEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS			N/A
EN BUEN ESTADO			N/A
LOS USAN LOS OPERARIOS		✓	
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS	✓		Solo es un andamio para Ascenso y descenso de personal a los siguientes Niveles

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias cada que se utilice para Ascenso y descenso o para trabajos.

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

31/03/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO		✓	
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES			

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS			N/A
EN BUEN ESTADO			N/A
LOS USAN LOS OPERARIOS		✓	
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS	✓		Se trabaja en Alturas de 1.20 mts.

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias sea para Ascenso descenso o para trabajar.

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

01/agosto/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		TODOS LOS DIAS ANTES DE SU USO. SEA PARA ASCENSO, DESCENSO O PARA TRABAJAR.

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

02/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIÁMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO		✓	
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNES DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		todos los días antes de su uso sea ascenso, descenso o en la tarde.

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

03/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNES DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS			N/A
EN BUEN ESTADO		✓	N/A
LOS USAN LOS OPERARIOS			
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS	✓		Se trabaja a la altura de 1.50.

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias antes de iniciar labores

Ascenso y descenso a los dos niveles o alturas entregados

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

04/09/2024
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS		✓	
EN NÚMERO SUFICIENTE		✓	

5. ARNES DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias antes de usarlos sea para ingreso, durante o para finalizar en ello

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

05/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 INSPECCIÓN DE PULIDORA INALAMBRICA	Código: UTS-SST-F-051 Version: 1 Fecha: 2/1/2025 Pagina 1 de 1

OBRA: Orin

PERIODO INSPECCIONADO DESDE 31-03 HASTA 6-04 DEL 2025

A Dan F. M. C. MARCA: Total

A Cristian C. SERIE: 24111602.1

CHEQUEO PREOPERACIONAL

DESCRIPCION	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
N°	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2	✓			✓			✓									✓					
3	✓			✓						✓			✓			✓					
4	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1. Disco de Corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2. Boton Traba de eje	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3. Interruptor de accionamiento	✓			✓			✓			✓			✓								
4. Bateria.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5. protector del Disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6. Manija Lateral	✓			✓			✓									✓					
7. Mango				✓			✓			✓			✓			✓					
Como operador he verificado la lista y certifico con mi firma que es seguro el uso del equipo que me encuentro en óptimas condiciones físicas y psicológicas para operarla.	DAN.			DAN.			DAN.			DAN.			ALEJ								

PARA DILIGENCIAR TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES SIGLAS: DIAS DE LA SEMANA PRIMERAS LETRAS / C=CUMPLE / N.C=NO CUMPLE

Nota: este documento debera permanecer diarimente en el sitio de labor y sera verificado por la persona de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBSERVACIONES GENERALES:

ELABORO (OPERADOR)	REVISÓ (INSPECTOR SST)
NOMBRE: DAN. FERNANDEZ	NOMBRE: Leidi Viviana Cano.
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner


UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1

OBRA: Drip

MARCA: TOTEN

SERIE: 24269505 23

INSPECCIONADO POR: Misi C. / Dani F. / Costa M.

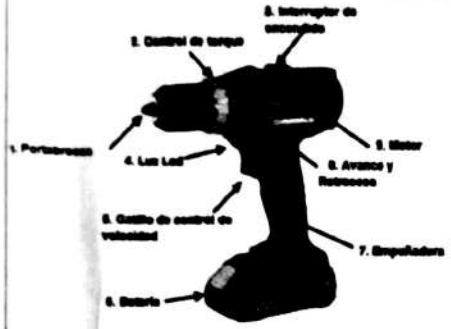DESCRIPCION	Nº	LUN 31-03-25			MAR 01-04-25			MIE 02-04-25			JUE 03-04-25			VIE 04-04-25			SAB 05-04-25			DOM		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	9	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1. Portabrocas 6. Bateria	10	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2. Control de Torque. 7. Empuñadura		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4. Luz Led. 9. Motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA DAN.			FIRMA DAN.			FIRMA DAN.			FIRMA APOYO			FIRMA APOYO			FIRMA		

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a

No operar herramientas si no se cuenta con

No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1


OBRA: O.I.P

INSPECCIONADO POR: M.Gil C.

MARCA: TOTAL

SERIE: 241215.466

Dani Fernandez - Cristian M.

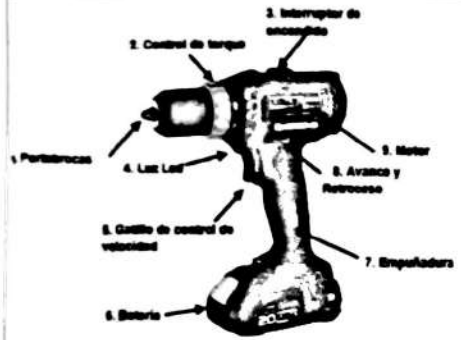DESCRIPCION	N°	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
		21-05-25			22-05-25			23-05-25			24-05-25			25-05-25			26-05-25					
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1	/			/			/			/			/			/					
	2	/			/			/			/			/			/					
	3	/			/			/			/			/			/					
	4	/			/			/			/			/			/					
	5	/			/			/			/			/			/					
	6	/			/			/			/			/			/					
	7	/			/			/			/			/			/					
	8	/			/			/			/			/			/					
	9	/			/			/			/			/			/					
1. Portabrocas 6. Bateria	10	/			/			/			/			/			/					
2. Control de Torque. 7. Empuñadura		/			/			/			/			/			/					
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso		/			/			/			/			/			/					
4. Luz Led. 9. Motor		/			/			/			/			/			/					
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.		/			/			/			/			/			/					
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA: DPN.			FIRMA: DPN.			FIRMA: DPN.			FIRMA: DPN.			FIRMA: ALFREDO			FIRMA: ALFREDO			FIRMA		

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a

No operar herramientas si no se cuenta con

No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1

OBRA: Dr.P

MARCA: Bauker

SERIE: CP5315-0

INSPECCIONADO POR: Cesar ORTIZ - Felipe ORTIZ

DESCRIPCION	N°	LUN 30-03-25			MAR 01-04-25			MIE 02-04-25			JUE 03-04-25			VIE 04-04-25			SAB 05-04-25			DOM		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6	✓			✓						✓			✓			✓					
	7	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8				✓			✓			✓			✓			✓					
	9	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1. Portabrocas 6. Bateria	10	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2. Control de Torque. 7. Empuñadura		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4. Luz Led. 9. Motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
CUMPLE: (C) **NO CUMPLE** : (C) **NO APLICA** :NA																						
OBSERVACIONES:																						

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a

No operar herramientas si no se cuenta con

No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1

OBRA: Orip Pto Tejada

MARCA: Bauker

SERIE: N/A.

INSPECCIONADO POR: Jhon Esguerra

DESCRIPCION	N°	LUN D-M-A			MAR D-M-A			MIE D-M-A			JUE D-M-A			VIE D-M-A			SAB D-M-A			DOM 13-4-25		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
1. Portabrocas 6. Bateria	10																					
2. Control de Torque. 7. Empuñadura																						
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso																						
4. Luz Led. 9. Motor																						
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.																						
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA Jhon Esguerra		

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a
No operar herramientas si no se cuenta con
No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901 845 674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 07/01/2025

OBRA: PTAR PTO TEJADA

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: [illegible] CAMPO MUÑOZ

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		✓
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		✓
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Se inspeccionan las siguientes Herr, palas, barra picos, cincel, cabel, martillo, pulidora, taladro extensiones empalmes, alicate, juego de llaves, barquis, todas estas Herr se encuentran en buenas condiciones pasamos inspeccion el operarios

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT 901.845.874-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 04/04/2025

OBRA: Oficinas de Tenido Cerca, Cerca Viviendas como Moreno

NOMBRE DE QUIEN REPORTA:

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada el trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Se inspeccionan las siguientes Herramientas, Taladro, Pulidora, Sierra, Segueta, Serrucho, Cincel, Cortel, Extensiones encauchetadas, Pulidora, Taladro Percutor, Cortadora ceramica, Alicate, Juego de llaves fijas. Se encuentran en buen Estado. Proxima inspeccion 11/04/2025

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA 11/04/2024

OBRA APE, PTO TEJADA CAUCA

NOMBRE DE QUIEN REPORTA Leidy Viviana Cacua

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓		✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Se inspecciona, pala, barretón, segueta, serrucho, cincel, cabal, martillo, pulidora, taladro, extensiones, cucharetas, alicates, cortadora de cerámica todo se encuentra en buenas condiciones para ser usadas 13/04/2024.

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 13/04/2025

OBRA: amp plo tagda.

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Leidi Viviana Cano.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas	✓		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			✓
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias	✓		
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			✓
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas			✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Se inspeccionan las siguientes Herr, pulidora, taladro, Rotomartillo, Cincel, segueta, Serrucho, juego de llaves, Cadal, Pinza, Martillos pulidoras (Electrico e inalambrica), todas estas Herr se encuentran en buen estado proxima inspección 14/04/2025.

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO			

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NUMERO SUFICIENTE		✓	

5. ARNES DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los días antes de iniciar labores sea para ascenso y descenso o para trabajar en ellos

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

01/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS	✓		

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNES DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS			N/A
EN BUEN ESTADO		✓	N/A
LOS USAN LOS OPERARIOS			
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS	✓		Solo lo usan para ascenso y descenso a los siguientes Niveles

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias antes de ser usados, asi sea para ascenso, descenso a los siguientes Niveles o para trabajar en ellos.

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

06/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LÍNEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los días antes de iniciar las labores y dejado a los trabajadores Nivel o área habilitar en el

Abril 08/2025

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIÁMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LÍNEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		todos los dias antes de usar los sistemas de ascenso y descenso de nuestro personal en altura.

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

09/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias antes de usarlos según norma

Acceso y descenso de los siguientes Materiales deben trabajar en alturas

10/04/2025

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No 1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS			N/A
EN BUEN ESTADO		✓	N/A
LOS USAN LOS OPERARIOS			
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS	✓		Solo trabajos a 1.50 mts.

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los días antes de iniciar las actividades para ascenso o descenso a los sitios donde deba trabajar en alturas

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

11/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT SST F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA	✓		
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS			N/A
EN BUEN ESTADO		✓	N/A
LOS USAN LOS OPERARIOS		✓	
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS	✓		solo x trabajo a 150 mts.

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		todos los dias antes de usarlos

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

12/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA	✓		
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECIÓN CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNES DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		N/A
EN BUEN ESTADO			N/A
LOS USAN LOS OPERARIOS		✓	
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS	✓		Solo se trabajo 1.50 mts.

6. PROTECCION DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias antes de iniciar

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

13/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner


UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047 Versión 1 01 Febrero de 2025 Pagina 1 de 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	

OBRA: O v. P

MARCA: TOTAL

SERIE: 24695823

INSPECCIONADO POR: Dani f. Cristian M - Miguel C.

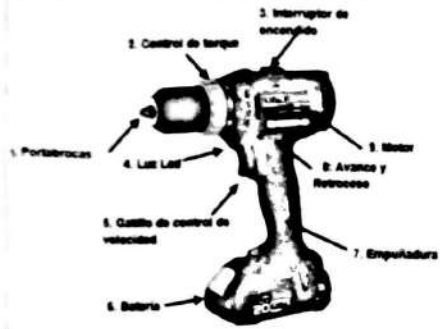DESCRIPCION	N°	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
		F: 04-25			08-04-25			09-04-25			10.04.25			11.04-25								
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	6	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	9	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1. Portabrocas 6. Bateria	10	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2. Control de Torque. 7. Empuñadura		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4. Luz Led. 9. Motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
CUMPLE: (C) NO CUMPLE: (C) NO APLICA :NA																						
OBSERVACIONES:																						

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a
No operar herramientas si no se cuenta con
No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner


UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1

Rubis

OBRA: Ovip

INSPECCIONADO POR: Dani F. - Cristian M - Miguel C.

MARCA: Total SERIE: 241214514664

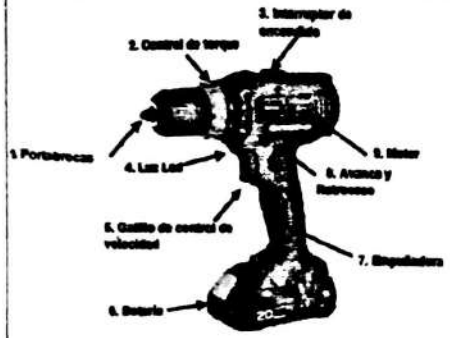DESCRIPCION	N°	LUN 7-04-25			MAR 08-04-25			MIE 09-04-25 a 16-04-25			JUE			VIE 11-04-25			SAB D.M.A			DOM D.M.A		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1	✓			✓			✓			✓			✓			✓					✓
	2	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	3	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	4	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	5	✓			✓						✓			✓			✓					
	6	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	7	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	8	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	9	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
1. Portabrocas 6. Batería	10	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2. Control de Torque. 7. Empuñadura		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4. Luz Led. 9. Motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		
CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA																						
OBSERVACIONES:																						

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a
No operar herramientas si no se cuenta con
No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)


Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 INSPECCIÓN DE PULIDORA INALAMBRICA	Código: UT3-SST-F-451 Version: 1 Fecha: 2/1/2025 Pagina 1 de 1

OBRA: Ovir
PERIODO INSPECCIONADO DESDE 07 HASTA 13-04 DEL 2025
MARCA: Total
SERIE: 24111 660702

CHEQUEO PREOPERACIONAL

DESCRIPCION	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
N°																					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
1. Disco de Corte																					
2. Boton Traba de eje																					
3. Interruptor de accionamiento																					
4. Bateria.																					
5. protector del Disco																					
6. Manija Lateral																					
7. Mango																					
Como operador he verificado la lista y certifico con mi firma que es seguro el uso del equipo que me encuentro en óptimas condiciones físicas y psicológicas para operarla.																					



PARA DILIGENCIAR TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES SIGLAS: DIAS DE LA SEMANA PRIMERAS LETRAS / C=CUMPLE / N.C=NO CUMPLE

Nota: este documento debera permanecer diarimente en el sitio de labor y sera verificado por la persona de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBSERVACIONES GENERALES:

Herramienta inspeccionada por Jigia.

ELABORO (OPERADOR)	REVISÓ (INSPECTOR SST)
NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1

OBRA: Orip Pto Tejada

MARCA: Bauker

SERIE: N/A.

INSPECCIONADO POR: Jhon Esguerra

DESCRIPCION	N°	LUN D-M-A			MAR D-M-A			MIE D-M-A			JUE D-M-A			VIE D-M-A			SAB D-M-A			DOM 13-4-25		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
1. Portabrocas 6. Bateria	10																					
2. Control de Torque. 7. Empuñadura																						
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso																						
4. Luz Led. 9. Motor																						
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.																						
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA Jhon Esguerra		

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a
No operar herramientas si no se cuenta con
No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UT-SST-F-045
		Versión 1
	INSPECCIÓN DE TALADRO PERCUTOR	7 DE ENERO DEL 2025
		PAGINA 1 DE 1

OBRA: Orip pto Tejada cauca

MARCA: Makita SERIE: 2560374

INSPECCIONADO POR: Jhon Figueroa

CONJUNTO	ITEM	LUN D M A			MAR D M A			MIE D M A			JUE D M A			VIE D M A			SAB D M A			DOM 13 y 25		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
SISTEMA ELÉCTRICO	El cable eléctrico de conexión está en buenas condiciones																			✓		
	Cuenta con enchufe macho para conexión a red																			✓		
	El enchufe o extensión se encuentra en buenas condiciones																			✓		
	El enchufe cuenta con cable a tierra																			✓		
	El gatillo interruptor de encendido funciona correctamente																			✓		
SISTEMA MECANICO	El mandril está en buen estado																			✓		
	La broca presenta desgaste o malformaciones																			✓		
	La broca se ajusta al calibre del mandril del equipo																			✓		
	Cuenta con llave para abrir y cerrar el madril																			✓		
	La llave para porta brocas se encuentra en buenas condiciones																			✓		
FISICO	El taladro cuenta con manilla de agarre																				✓	
	El mango principal y/o lateral se encuentra ajustado																			✓		
	Se encuentran ajustadas todas las partes del taladro (Tornillos)																			✓		
	El estado general del equipo es bueno																			✓		
	El colaborador cuenta con los Elementos de Protección Personal, de acuerdo a la actividad a ejecutar.																			✓		
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA Jhon Figueroa		

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a humedad o bajo la lluvia.
No operar herramientas si no se cuenta con entrenamiento ni experiencia.
No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1

OBRA: Orip Pto Tejada.

MARCA: UBeman.

SERIE: 0351459

INSPECCIONADO POR: Jhon Alejandro Vera Rivera

DESCRIPCION	N°	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
		D - M - A			N			D - M - A			10-4-25			11-4-25			D - M - A			D - M - A		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1										✓			✓								
	2										✓			✓								
	3										✓			✓								
	4										✓			✓								
	5										✓			✓								
	6										✓			✓								
	7										✓			✓								
	8										✓			✓								
	9										✓			✓								
1. Portabrocas 6. Bateria	10										✓											
2. Control de Torque. 7. Empuñadura																						
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso																						
4. Luz Led. 9. Motor																						
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.																						
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a

No operar herramientas si no se cuenta con

No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.074-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-...
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Version: 2
		Fecha: 06 de Febrero de ...
		Pagina 1 de 1

FECHA: 14/04/2025

OBRA: Lady Catalina Cajas: Hueco

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Oscar Pio Tacho Cajas

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	/		
2	Se encuentran en buen estado	/		
3	Se guardan y portan adecuadamento	/		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	/		/
5	Se usan prensas de banco para sujetas			
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	/		
2	Los cinceles se encuentran afilados	/		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	/		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	/		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			/
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	/		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			/
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	/		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	/		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	/		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			/
2	Se observan en la llave huellas y palancas			/
3	Se dispone de llaves para golpear	/		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	/		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	/		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	/		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	/		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	/		
3	Están limpia y lubricadas	/		
4	Tienen sus guardas	/		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	/		
6	El cable y enchufe no presentan daños	/		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	/		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	/		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	/		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	/		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	/		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	/		
2	Poseen guardas de seguridad	/		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	/		

OBSERVACIONES Se inspeccionan las siguientes ítem: pulas, bornes pomos, Segueta, serrucho, Cincel, Lima, cuchillo, Pulidoras, taladros electrico e inalambricos, juego de llaves, destornillador, brocheta, destornilladores, alicate. Todos se encuentran en buenas condiciones para esta inspección 14/04/2025

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 16/01/2025

OBRA: CIP PTO Tejada Cauca

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Leidy Oviedo Cano Nares

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓
2	Se observan en la llave huellas y palancas			✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Todas las Herramientas como palas, barras, pares, Segueta, Serrucho, Cincel, Cadal, Hacha, Cortadora de ceramica, martillo, pulidoras Electricas, pulidoras inalambricas, taladros Electricos taladros inalambricos, todo se encuentra en buen estado proxima inspeccion 21/01/2025

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 21/04/2025

OBRA: CUP PTO TEJADA CAUCA

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: LEIDY VIVIANA COSME.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas	.		✓
2	Se observan en la llave huellas y palancas			✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados			
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Se inspeccionan las siguientes Hdas: Palas, bermi Ponas, Seguetas, Picos, Polidora, Taladros electrico corta Ceramica, Extensiones bateria, Todos estos Hdas se encuen en buen Estado previa inspeccion 23/04/2025

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 23/04/2025

OBRA: ORIPTO TIGRE

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: [illegible]

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓
2	Se observan en la llave huellas y palancas			✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Todas las Herramientas Manuales, Seguetas, Serruchos, Cuchillos, Martillos, Taladros, Extensiones, Esmeriles, Cautines de Cerámica, todas estas Herramientas se encuentran en buenas condiciones para su Uso 23/04/2025

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 25/01/2025

OBRA: CAMPO TIGRE

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Leidi Viviana Cano Mesa

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las sequetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓
2	Se observan en la llave huellas y palancas			✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	✓		
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**	✓		
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES Se inspeccionan los siguientes ítems: Cinceles, Pulidoras, Esmeriles, Martillos, Cinceles, Cuchillos, Sierra, Martillos, pulidoras inalambrica, Electrica, taladros inalambricos, Electricos, extensiones encauchetadas. Proxima inspeccion 28/01/2025.

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA N° 1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-067
		Version: 2
	FORMATO INSPECCION DE HERRAMIENTAS	Fecha: 06 de Febrero del 2025
		Pagina 1 de 1

FECHA: 28/01/2025

OBRA: Orip pto Tejada Cauca.

NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Leidy V. Cosme.

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO B	M	NA
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**			
1	Se usa la adecuada al trabajo	✓		
2	Se encuentran en buen estado	✓		
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓		
5	Se usan prensas de banco para sujetas			✓
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**			
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo	✓		
2	Los cinceles se encuentran afilados	✓		
3	Las tarrajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	✓		
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	✓		
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			✓
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	✓		
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			✓
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**			
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	✓		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	✓		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	✓		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**			
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			✓
2	Se observan en la llave huellas y palancas	✓		✓
3	Se dispone de llaves para golpear	✓		
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas	✓		
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente	✓		
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado	✓		
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.	✓		
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**			
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	✓		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	✓		
3	Están limpia y lubricadas	✓		
4	Tienen sus guardas	✓		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓		
6	El cable y enchufe no presentan daños	✓		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	✓		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	✓		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	✓		
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve	✓		
11	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	✓		
12	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	✓		
F	**HERRAMIENTA INALAMBRICA**			
1	Estado de baterias	✓		
2	Poseen guardas de seguridad	✓		
3	Se trabaja a las presiones indicadas	✓		

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL AREA

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.843.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	FORMATO INSPECCION ANDAMIO		
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO			
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES			

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias cada que los obreros se debe inspeccionar antes

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

14/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS	✓		
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Antes de su uso se debe inspeccionar

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

15/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO		✓	
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES		✓	

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LÍNEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE			

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIES BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

22/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO		✓	
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES			

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LÍNEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS			
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

23/08/2024
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN			
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

24/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codigo	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LÍNEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS		✓	N/A
RODAPIES BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

25/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT. 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIAMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO			

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO		✓	
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES			

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LINEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS			
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN			N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		todos los dias

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

26/01/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 FORMATO INSPECCION ANDAMIO		SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Codido	Fecha	Version	
UT-SST-F-063	16 Agosto de 2024	1	Pagina 1 de 1

La siguiente lista contiene los principales aspectos que cualquier inspector de seguridad, capataz, supervisor , entre otros, debe controlar periódicamente.

1. TUBERIA	SI	NO	OBSERVACIONES
DIÁMETRO ADECUADO PARA ALTURA DEL ANDAMIO	✓		
ACOPLES EN BUEN ESTADO	✓		

2. TERRENO	SI	NO	OBSERVACIONES
NIVELADO	✓		
FIRME	✓		
NECESITA ZAPATAS DE APOYO	✓		
SON ADECUADAS LAS ZAPATAS EXISTENTES	✓		

3. ANDAMIOS COLGANTES	SI	NO	OBSERVACIONES
ANCLAJE ADECUADO A LA ESTRUCTURA			
CABLES OXIDADOS			
CABLES ENGRASADOS			
CABLES CON HILOS ROTOS			
CABLES CON TALLADURAS			
MAQUINAS DE ELEVACIÓN BIEN LUBRICADAS			
MAQUINAS CON UÑASDEL TRINQUETE EN BUEN ESTADO			
MAQUINAS CON RESORTES ADECUADOS			
MAQUINAS CON RUEDA DE MANDRIL ADECUADA			
GRAPAS DE SUJECIÓN EN NÚMERO SUFICIENTE			
GRAPAS DE SUJECION CORRECTAMENTE INSTALADAS			

4. LÍNEAS DE VIDA	SI	NO	OBSERVACIONES
BIEN INSTALADAS	✓		
EN NÚMERO SUFICIENTE	✓		

5. ARNÉS DE SEGURIDAD	SI	NO	OBSERVACIONES
ADECUADOS	✓		
EN BUEN ESTADO	✓		
LOS USAN LOS OPERARIOS	✓		
MOTIVOS QUE TIENE PARA NO USARLOS		✓	

6. PROTECCIÓN DE LAS PLATAFORMAS	SI	NO	OBSERVACIONES
BARANDAS EN LOS CUATRO COSTADOS	✓		
BARANDAS INTERNAS	✓		
BARANDAS UBICADAS A LA ALTURA ADECUADA	✓		
BARANDAS BIEN ASEGURADAS	✓		
RODAPIÉS EN LOS CUATRO COSTADOS			N/A
RODAPIÉS BIEN ASEGURADOS			N/A
PLATAFORMAS PROTEGIDAS CON MALLA ADECUADA	✓		

7. GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
CONEXIONE BIEN HECHAS Y SEGURAS	✓		
PROTECCION PARA EL ÁREA DE CIRCULACIÓN	✓		
TECHOS EN ANDAMIOS. LOS REQUIEREN			N/A
TECHOS EN ANDAMIOS. NO LOS REQUIEREN		✓	N/A
PERIODICIDAD DE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN	✓		Todos los dias

Firma del Inspector

Firma del residente

Firma del Maestro

28/04/2025
Fecha

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	Codigo: UTS-SST-F-047 Versión 1 01 Febrero de 2025 Pagina 1 de 1

Mill

OBRA: Oriel

INSPECCIONADO POR: Dani F, Cristian M, Miguel C.

MARCA: Yogo SERIE: 241645146



DESCRIPCION	N°	LUN 14.04.23			MAR 15.04.23			MIE 16.04.23			JUE D.M.A			VIE D.M.A			SAB D.M.A			DOM D.M.A		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1	/			/			/														
	2	/			/			/														
	3	/			/			/														
	4	/			/			/														
	5	/			/			/														
	6	/			/			//														
	7	/			/			/														
	8	/			/			/														
	9	/			/			/														
1. Portabrocas 6. Bateria	10	/			/			/														
2. Control de Torque. 7. Empuñadura		/			/			/														
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso		/			/			/														
4. Luz Led. 9. Motor		/			/			/														
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.		/			/			/														

NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.

FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a
No operar herramientas si no se cuenta con
No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 INSPECCIÓN DE PULIDORA INALAMBRICA	Código: UTS-SST-F-051 Version: 1 Fecha: 2/1/2025 Pagina 1 de 1

OBRA: OLIP

PERIODO INSPECCIONADO DESDE 14 HASTA 20 DEL 2025

MARCA: [illegible] MARCA: Total

SERIE: 241166-24

CHEQUEO PREOPERACIONAL

DESCRIPCION	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
N°	✓			✓			✓														
1	✓			✓			✓														
2	✓			✓			✓														
3	✓			✓			✓														
4	✓			✓			✓														
5	✓			✓			✓														
6	✓			✓			✓														
7	✓			✓			✓														
1. Disco de Corte	✓			✓			✓														
2. Boton Traba de eje	✓			✓			✓														
3. Interruptor de accionamiento	✓			✓			✓														
4. Bateria.	✓			✓			✓														
5. protector del Disco	✓			✓			✓														
6. Manija Lateral	✓			✓			✓														
7. Mango	✓			✓			✓														
Como operador he verificado la lista y certifico con mi firma que es seguro el uso del equipo que me encuentro en óptimas condiciones físicas y psicológicas para operarla.	[signature]			[signature]			[signature]														

PARA DILIGENCIAR TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES SIGLAS: DIAS DE LA SEMANA PRIMERAS LETRAS / C=CUMPLE / N.C=NO CUMPLE

Nota: este documento debera permanecer diariamente en el sitio de labor y sera verificado por la persona de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBSERVACIONES GENERALES:

ELABORO (OPERADOR)	REVISÓ (INSPECTOR SST)
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
FIRMA: [signature]	FIRMA: [signature]

Powered by CamScanner


UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1

(Mdj)

DBRA: OMP

INSPECCIONADO POR: Dagi F. Cristancho Miguel C.

MARCA: DEWALT SERIE: 2426502Z3

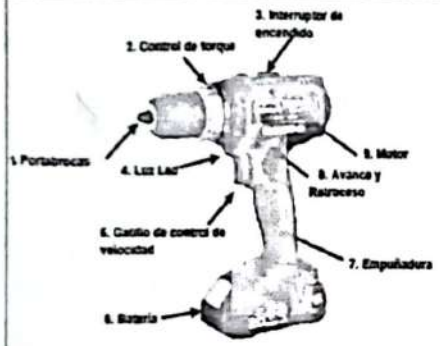DESCRIPCION	N°	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
		14-04-25			15-04-25			16-04-25			D-M-A			D-M-A			D-M-A			D-M-A		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1	✓			✓			✓														
	2	✓			✓			✓														
	3	✓			✓			✓														
	4	✓						✓														
	5	✓			✓			✓														
	6	✓			✓			✓														
	7	✓			✓			✓														
	8	✓			✓			✓														
	9	✓			✓			✓														
1. Portabrocas 6. Bateria	10	✓			✓			✓														
2. Control de Torque. 7. Empuñadura		✓			✓			✓														
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso		✓			✓			✓														
4. Luz Led. 9. Motor		✓			✓			✓														
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.		✓			✓			✓														
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a
No operar herramientas si no se cuenta con
No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1


OBRA: Ovio

MARCA: total

SERIE: 2426 93 - 423

INSPECCIONADO POR: M. Gm C.

Dgm F. Cmsm My Dikmk M

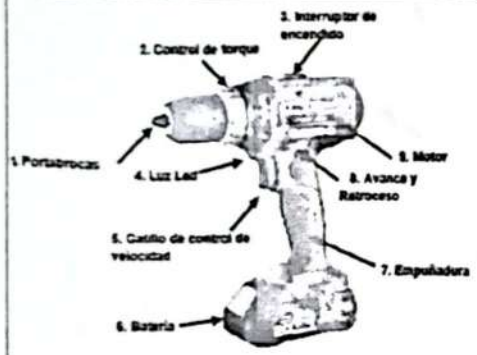DESCRIPCION	N°	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
		D - M - A			M			D - M - A			D - M - A			25-4-22			26-4-25			27-4-25		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1													/			/			/		
	2													/			/			/		
	3													/			/			/		
	4													/			/			/		
	5													/			/			/		
	6													/			/			/		
	7													/			/			/		
	8													/			/			/		
	9													/			/			/		
1. Portabrocas 6. Bateria	10													/			/			/		
2. Control de Torque. 7. Empuñadura														/			/			/		
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso														/			/			/		
4. Luz Led. 9. Motor														/			/			/		
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.														/			/			/		
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a

No operar herramientas si no se cuenta con

No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024	Codigo: UTS-SST-F-047
		Versión 1
	INSPECCION TALADRO INHALAMBRICO	01 Febrero de 2025
		Pagina 1 de 1

DOBRA: Dr N.8

INSPECCIONADO POR: Cristian M

MARCA: Total

SERIE: 24 RL145146

Alfredo M; Daniel F y Miguel C.

DESCRIPCION	N°	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
		21-04-25			N			D. M. A			D. M. A			25-4-25			26-4-25			27-4-25		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
	1	/												/			/			/		
	2	/												/			/			/		
	3	/												/			/			/		
	4	/												/			/			/		
	5	/												/			/			/		
	6	/															/			/		
	7	/												/			/			/		
	8	/												/			/			/		
	9	/												/			/			/		
1. Portabrocas 6. Batería	10	/												/			/			/		
2. Control de Torque. 7. Empuñadura		/												/			/			/		
3. Interruptor de encendido. 8. Avance y Retroceso		/												/			/			/		
4. Luz Led. 9. Motor		/												/			/			/		
5. Gatillo de Control de Velocidad. 10 Mango.		/															/			/		
NOTA IMPORTANTE: La inspección Pre Operacional debe realizarla el OPERARIO del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su Supervisor.		FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA			FIRMA		

CUMPLE: (C) NO CUMPLE : (C) NO APLICA :NA

OBSERVACIONES:

PROHIBICIÓN: No manipular herramientas eléctricas expuestos a
No operar herramientas si no se cuenta con
No cambiar elementos complementarios con las herramientas conectadas a la red (Brocas)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL SOLUCIONES NIT: 901.845.674-9	CONTRATO DE OBRA No.1935 DE 2024 INSPECCIÓN DE PULIDORA INALAMBRICA	Código: UTS-SST-F-001 Versión: 1 Fecha: 2/1/2025 Página 1 de 1

OBRA: Dril


PERIODO INSPECCIONADO DESDE 21 HASTA 27 DEL 2025

MARCA: total

SERIE: [illegible]

CHEQUEO PREOPERACIONAL

DESCRIPCION	LUN			MAR			MIE			JUE			VIE			SAB			DOM		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
N°																					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
1. Disco de Corte																					
2. Boton Traba de eje																					
3. Interruptor de accionamiento																					
4. Bateria.																					
5. protector del Disco																					
6. Manija Lateral																					
7. Mango																					
Como operador he verificado la lista y certifico con mi firma que es seguro el uso del equipo que me encuentro en optimas condiciones fisicas y psicológicas para operarla																					



PARA DILIGENCIAR TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES SIGLAS: DIAS DE LA SEMANA PRIMERAS LETRAS / C=CUMPLE / N.C=NO CUMPLE

Nota: este documento debera permanecer diariamente en el sitio de labor y sera verificado por la persona de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBSERVACIONES GENERALES:

ELABORO (OPERADOR)	REVISÓ (INSPECTOR SST)
NOMBRE: Cristian Murillo	NOMBRE:
FIRMA:	FIRMA:

Powered by CamScanner

ESAI S.A.S.
NIT. 901.079.339-1

CUPÓN PARA BOTADERO
Nº AL 1745

Calle 16 No. 13-48 Puerto Tejada, Cauca - Cels.: 318 829 4354 / 317 887 8299
escombreras01@gmail.com - josejalara01@hotmail.com

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL

6/4/2025 Destino:

CLASE DE MATERIAL - RCD

[X] Escombro [ ] Tierra [ ] Carpeta Asfaltica
[ ] Otros UNION TEMP SOLUCIONES
Obra: ORIP pto Tejada
Placas: NCB. 389
Cantidad: 7 M3
Pin Gestor Transporte:

ESAI S.A.S. NIT. 901.079.339-1 RECIBIDO
Recibido: Rosa

ORIGINAL PARA TRANSPORTADOR - COPIA PARA SITIO DE DISPOSICION FINAL

IMPRESO POR MIGUEL SARMIENTO - CEL. 317 567 3746

ESAI S.A.S.
NIT. 901.079.339-1

CUPÓN PARA BOTADERO
Nº AL 1744

Calle 16 No. 13-48 Puerto Tejada, Cauca - Cels.: 318 829 4354 / 317 887 8299
escombreras01@gmail.com - josejalara01@hotmail.com

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL

9/4/2025 Destino:

CLASE DE MATERIAL - RCD

[X] Escombro [ ] Tierra [ ] Carpeta Asfaltica
[ ] Otros UNION TEMP SOLUCIONES
Obra: ORIP pto Tejada
Placas: NCB. 389
Cantidad: 7 M3
Pin Gestor Transporte:

ESAI S.A.S. NIT. 901.079.339-1 RECIBIDO
Recibido: Rosa

ORIGINAL PARA TRANSPORTADOR - COPIA PARA SITIO DE DISPOSICION FINAL

IMPRESO POR MIGUEL SARMIENTO - CEL. 317 567 3746

ESAI S.A.S.
NIT. 901.079.339-1

CUPÓN PARA BOTADERO
Nº AL 1952

Calle 16 No. 13-48 Puerto Tejada, Cauca - Cels.: 318 829 4354 / 317 887 8299
escombreras01@gmail.com - josejalara01@hotmail.com

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL

14/4/2025 Destino:

CLASE DE MATERIAL - RCD

[X] Escombro [ ] Tierra [ ] Carpeta Asfaltica
[ ] Otros U. TEMPORAL SOLUCIONES
Obra: ORIP pto Tejada
Placas: NCB. 389
Cantidad: 7 M3
Pin Gestor Transporte:

ESAI S.A.S. NIT. 901.079.339-1 RECIBIDO
Recibido:

ORIGINAL PARA TRANSPORTADOR - COPIA PARA SITIO DE DISPOSICION FINAL

IMPRESO POR MIGUEL SARMIENTO - CEL. 317 567 3746

ESAI S.A.S.
NIT. 901.079.339-1

CUPÓN PARA BOTADERO
Nº AM 0014

Calle 16 No. 13-48 Puerto Tejada, Cauca - Cels.: 318 829 4354 / 317 887 8299
escombreras01@gmail.com - josejalara01@hotmail.com

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL

30/4/2025 Destino:

CLASE DE MATERIAL - RCD

[X] Escombro [ ] Tierra [ ] Carpeta Asfaltica
[ ] Otros U. TEMPORAL SOLUCIONES
Obra: ORIP pto Tejada
Placas: NCB. 389
Cantidad: 7 M3
Pin Gestor Transporte:

ESAI S.A.S. NIT. 901.079.339-1 RECIBIDO
Recibido: Rosa

ORIGINAL PARA TRANSPORTADOR - COPIA PARA SITIO DE DISPOSICION FINAL

IMPRESO POR MIGUEL SARMIENTO - CEL. 317 567 3746

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901845674	9	UNION TEMPORAL SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 75 # 85 - 54	POPAYAN-CAUCA	3115633015	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1426163102	9483965293	E	2025/04/16	2025/04/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$3,129,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																								**$11,102,945**	**$1,776,900**			**$11,102,945**	**$444,400**			**$10,950,056**	**$323,000**			**$11,102,945**		**$572,700**		**$0**	**$0**		**$3,117,000**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (6 Afiliados)																								**$11,102,945**	**$1,776,900**			**$11,102,945**	**$444,400**			**$10,950,056**	**$323,000**			**$11,102,945**		**$572,700**		**$0**	**$0**		**$3,117,000**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)																								**$11,102,945**	**$1,776,900**			**$11,102,945**	**$444,400**			**$10,950,056**	**$323,000**			**$11,102,945**		**$572,700**		**$0**	**$0**		**$3,117,000**
1	CC	1014195972	ANGULO MARQUINEZ JOSE MIGUEL	X	X																	23020 1	2	$94,900	$15,200	EPS018	2	$94,900	$3,800	CCF14	2	$98,855	$4,000	14-11	2	$94,900	6.960%	$6,700	2	$0	$0	Si	$29,700
2	CC	1089540889	ANGULO MARQUINEZ JOSE JUNIOR	X	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$543,698	$21,800	14-11	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	Si	$162,700
3	CC	1085635381	CARDENAS LOPEZ JIMMY FERNANDO																			23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF14	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	6.960%	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
4	CC	1112476700	COSME MORENO LEIDY VIVIANA									X										23030 1	30	$3,203,805	$512,700	ESSC62	30	$3,203,805	$128,200	CCF14	30	$3,203,805	$128,200	14-11	30	$3,203,805	6.960%	$223,000	30	$0	$0	Si	$992,100
5	CC	16775193	PATIÑO GONZALEZ CARLOS ALBERTO									X										25-14	3	$680,340	$108,900	EPS005	3	$680,340	$27,300	CCF14	3	$480,000	$19,200	14-11	3	$680,340	6.960%	$47,400	3	$0	$0	Si	$202,800
6	CC	16775193	PATIÑO GONZALEZ CARLOS ALBERTO											X								25-14	14	$1,493,333	$239,000	EPS005	14	$1,493,333	$59,800	CCF14	14	$1,493,333	$0	14-11	14	$1,493,333	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$298,800
7	CC	16775193	PATIÑO GONZALEZ CARLOS ALBERTO											X								25-14	13	$1,386,667	$221,900	EPS005	13	$1,386,667	$55,500	CCF14	13	$1,386,667	$0	14-11	13	$1,386,667	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$277,400
8	CC	1089538203	VIDAL CUERO EDWIN ESTIWAR	X	X																	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS018	11	$521,950	$20,900	CCF14	11	$543,698	$21,800	14-11	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	Si	$162,700
Total			**Afiliados(6)**																					$11,102,945	$1,776,900			$11,102,945	$444,400			$10,950,056	$323,000			$11,102,945		$572,700		$0	$0		$3,117,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901845674	9	UNION TEMPORAL SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 75 # 85 - 54	POPAYAN-CAUCA	3115633015	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1426163102	9483965293	E	2025/04/16	2025/04/22	BANCO DAVIVIENDA	6	$3,129,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,776,900	$7,100	$0	$1,784,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$569,800	$2,300	$0	$572,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,191,900	$4,700	$0	$1,196,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$15,200	$100	$0	$15,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$572,700	$2,300	$0	$575,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$572,700	$2,300	$0	$575,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$323,000	$1,300	$0	$324,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	$323,000	$1,300	$0	$324,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$444,400	$1,800	$0	$446,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$128,200	$500	$0	$128,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$128,000	$500	$0	$128,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,900	$100	$0	$21,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$24,700	$100	$0	$24,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$142,600	$600	$0	$143,200
TOTAL				**6**	**$3,117,000**	**$12,500**	**$0**	**$3,129,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901845674	9	UNION TEMPORAL SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 75 # 85 - 54	POPAYAN-CAUCA	3115633015	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1399340410	9483965691	Y	2025/04/16	2025/04/09	NEQUI	0	$99,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100
1	CC	1144092311	RODRIGUEZ ORDOÑEZ KAROL MICHELL																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(1)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$99,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901845674	9	UNION TEMPORAL SOLUCIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 75 # 85 - 54	POPAYAN-CAUCA	3115633015	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1399340410	9483965691	Y	2025/04/16	2025/04/09	NEQUI	0	$99,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
TOTAL				**1**	**$99,100**	**$0**	**$0**	**$99,100**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.020.848.061

MARQUEZ BAEZ

APELLIDOS

HOSFFMAN ALBERTO

NOMBRES

Hosffman A. Marquez B.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-AGO-1994

ESTADO TACHIRA-SAN CRISTOBAL
VENEZUELA

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

21-AGO-2019 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

ÍNDICE DERECHO

P-1500150 01000141-M-1020848061-20190923 0067726550A 1 52113366

MEDILABORAL

Certificado Médico

Informe seguridad y salud en el trabajo



EMPRESA	EMPRESA EN MISIÓN
JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS	JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO A INSTALACIONES

NO. CERTIFICADO	1.762.491				
CIUDAD	BOGOTÁ - MEDICINA LABORAL S.A.S				
FECHA	21/01/2025	**TIPO DE EXAMEN**	PERIODICO		
NO. DOCUMENTO	CC. 1.020.848.061	**EDAD**	30	**GENERO**	M
NOMBRES Y APELLIDOS:	MARQUEZ BAEZ HOSFFMAN ALBERTO				
TIPO DE CARGO	OPERATIVO	**CARGO U OFICIO**	COORDINADOR DE PRODUCCIÓN E INSTALACIONES		

EXÁMENES REALIZADOS

ANEXO TRABAJO EN ALTURA - AUDIOMETRÍA - COLESTEROL HDL - COLESTEROL LDL - COLESTEROL TOTAL - ENFASIS OSTEOMUSCULAR - EXAMEN MEDICO PERIODICO - GLICEMIA PRE - TEST PSICOLÓGICO PARA TRABAJO EN ALTURAS/ESPACIOS CONFINADOS - TRIGLICÉRIDOS - VISIOMETRÍA

CONCEPTO DE APTITUD	OTROS CONCEPTOS
Apto sin restricciones para el cargo	Apto para trabajar en alturas

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA - HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICION DE RIESGO

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA 150 MINUTOS A LA SEMANA DE ACUERDO A INDICACIÓN MEDICA Y TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD - MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA

RECOMENDACIONES AUDIOMETRIA

CONTROL PERIÓDICO - DETERMINADO POR LA EMPRESA ,POR SALUD OCUPACIONAL - PAUTAS DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN AUDITIVA - REPOSO AUDITIVO EXTRALABORAL,EVITAR RUIDOS FUERTES,MÚSICA A ALTO VOLUMEN, NO USO DE AUDÍFONOS DE RECREACIÓN - USO DE EPPA (PROTECCIÓN AUDITIVA) - SEGUN RIESGO DE EXPOSICION

RECOMENDACIONES VISIOMETRIA

CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA - NO USO DE CORRECCION OPTICA - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS VISUALES DURANTE LA JORNADA SIGUIENDO LA REGLA 20-20-20 - USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION OCULAR

Consentimiento informado del aspirante o trabajador

Yo MARQUEZ BAEZ HOSFFMAN ALBERTO identificado con CC No. 1.020.848.061. Autorizo al profesional abajo mencionado, a que se me realice de manera voluntaria el exámen médico ocupacional y/o exámenes complementarios y dejo constancia de que tuve la oportunidad de manifestar mi consentimiento para la realización de exámen médico ocupacional y/o exámenes complementarios necesarios y referenciados en este documento. Comprendo el propósito, los beneficios, la interpretación, limitaciones y riesgos del exámen médico ocupacional y/o exámenes complementarios, a partir de la información recibida por el profesional abajo mencionado. Certifico que la información que he suministrado es verdadera, completa y acepto el manejo de confidencialidad que Medicina Laboral S.A.S. dé a la misma, autorizo que la información recopilada en las bases de datos puede ser utilizada para la implementación de los Sistemas de Vigilancia Epidemiologica de las empresas y la realización de estudios de investigación con fines científicos. (Ley 1581 de 2012). Suministre la información necesaria a las personas o entidades contempladas en la legislación para el desarrollo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

Profesional

Dr. Luis Luis
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
4183/2023

DR. LUIS ENRIQUE LUIS HERNÁNDEZ LSST: 4183 DEL 14/06/2023

Aspirante o trabajador

CC. 1.020.848.061

Medellín, 07 de Abril de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS, en el centro de trabajo 0000000005 - OPERATIVO NIVEL V, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1020848061	MARQUEZ BAEZ HOSFFMAN ALBERTO	24/11/2023		12963ud2	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10141884172509758391

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/04/2025 16:13:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.145.4.109, 198.143.41.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900830800-1	JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CL 75 85 54	3142154018	administracion@jointsi.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	BOGOTA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	01/04/2025	85429980	$11.904.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	403.800	0		0		0	0	0	0	403.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	165.000	0		0		0	0	0	0	165.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	224.200	0		0		0	0	0	0	224.200	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	355.500	0		0		0	0	0	0	355.500	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	58.500	0		0		0	0	0	0	58.500	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	100.700	0		0		0	0	0	0	100.700	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	249.600	0		0		0	0	0	0	249.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.072.800	0	0	0	0	0	0		1.072.800	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.387.500	0	0	0	0	0	0		2.387.500	12
231001	Colfondos	800227940-6	666.000	0	0	0	0	0	0		666.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.283.300	0	0	0	0	0	0		2.283.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.178.000				2.178.000	0	0	2.178.000			21.780	2.178.000	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	835.500	0	0	835.500	9
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	852.300	0	0	852.300	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900830800-1	JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CL 75 85 54	3142154018	administracion@jointsi.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	BOGOTA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	01/04/2025	85429980	$11.904.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.629.300	1.629.300
Pensión	4	6.409.600	6.409.600
Riesgos Laborales	1	2.178.000	2.178.000
CCF	2	1.687.800	1.687.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	11.904.700	11.904.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900830800-1	JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CL 75 85 54	3142154018	administracion@jointsi.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	BOGOTA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	01/04/2025	85429980	$11.904.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1087672958	ASCUNTAR MORILLO ALVARO JULIAN	1	0			S	X																25-14	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC18	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
2	CC	1085249690	SANTOS MARTINEZ ANGELA MARIA	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF35	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
3	CC	5995711	RODRIGUEZ REYES CAMPO ELIAS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	98370618	CUASPA FLOREZ CARLOS ALBERTO	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPSIC5	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
5	CC	5997034	CONDE RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO	1	0			S								X									230301	2.462.348	394.000	0	0	0	0	EPS037	2.462.348	98.500	14-11	2.462.348	5	171.400	CCF35	2.462.348	98.500	0	0	0	0	0
6	CC	1030664487	RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN FERNANDO	1	0			S								X									231001	1.462.182	234.000	0	0	0	0	EPSC34	1.462.182	58.500	14-11	1.462.182	5	101.800	CCF22	1.462.182	58.500	0	0	0	0	0
7	CC	1000784432	VERA RUEDA DEIVI ALEJANDRO	1	0			S	X							X									230301	1.489.517	238.400	0	0	0	0	EPS017	1.489.517	59.600	14-11	1.489.517	2	15.600	CCF22	1.489.517	59.600	0	0	0	0	0
8	CC	98370778	ARCE GERMAN ALBERTO	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC18	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
9	CC	59827130	RIASCOS VILLARREAL GLORIA LUCIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS037	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF35	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
10	CC	79104187	MORA VELASQUEZ HECTOR JULIO	1	0			S	X																230201	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS017	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF35	664.300	26.600	0	0	0	0	0
11	CC	98360493	MORALES CARDENAS HECTOR ORLANDO	1	0			S	X																230301	664.300	106.300	0	0	0	0	ESSC18	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF35	664.300	26.600	0	0	0	0	0
12	CC	1020848061	MARQUEZ BAEZ HOSFFMAN ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	5	121.800	CCF22	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
13	CC	80503999	MOLANO ARIAS JAIME ALBERTO	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS001	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
14	CC	1004632269	CUASPA CUASANCHIR JAMID HERNEY	1	0			S	X																230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPSIC5	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF35	664.300	26.600	0	0	0	0	0
15	CC	98371613	MORILLO SANCHEZ JESUS ANIVAL	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPSIC5	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
16	CC	5305810	MEZA SALAZAR JESUS ANTONIO	1	5			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF35	664.300	26.600	0	0	0	0	0
17	CC	1014210417	RAMIREZ ROMERO JOHN FREDDY	1	0			S																	25-14	3.430.000	548.800	0	0	0	0	EPS005	3.430.000	137.200	14-11	3.430.000	5	238.800	CCF22	3.430.000	137.200	0	0	0	0	0
18	CC	98371002	LUCERO JUAN PABLO	1	0			S	X																230201	616.850	98.700	0	0	0	0	EPSIC5	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
19	CC	1023868145	CARRASCO CAMARGO JULY ANDREA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1032441364	MARTINEZ CASTRO KAREN ANDREA	1	0			S																	231001	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS008	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	2	28.200	CCF22	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
21	CC	1020757351	AREVALO TAPIAS MICHAEL STEVE	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
22	CC	1014188417	BERNAL RAMIREZ MONICA ANDREA	1	0			S		X															25-14	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF22	5.130.000	205.200	0	0	0	0	0
23	CC	27108912	MELO TRUJILLO OLIVA MARLENI	1	0			S	X																230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	ESSC18	1.260.000	50.400	14-11	1.260.000	5	87.700	CCF35	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
24	CC	1085248390	GUEVARA BASTIDAS OSCAR ALEXANDER	1	0			S	X																230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	ESSC18	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	5	181.000	CCF35	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
25	CC	1085284361	MOLINA GOMEZ WILMER ALEJANDRO	1	0			S		X															230301	480.000	76.800	0	0	0	0	ESSC18	480.000	19.200	14-11	480.000	5	33.500	CCF35	612.500	24.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACTIVIDADES DE RIESGO SAS
NIT 901.787.183-5

Licencia SST Res. No. 15150 23/04/2024 SDB
Avalado por la resolución 4272 de 2021 del Ministerio de trabajo
Código de acreditación BUREAU VERITAS N° C024.00545, bajo el esquema 6, según ISO/IEC 17067 versión 2013

CEAR S.A.S.
CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE RIESGO

TSA - 15116

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:

HOSFFMAN ALBERTO MARQUEZ BAEZ

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1020848061

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

Curso realizado en Bogotá el 01 abril 2025, se expide en Bogotá el 01 abril 2025

Angie Paola Espitia Restrepo
REPRESENTANTE LEGAL

ANGELA MABEL GONZALEZ LONDOÑO
RES No. 8154 05/09/2022

EMPRESA: JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
REP. John Freddy Ramirez Romero
NIT: 900830800-1
ARL: SURA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.000.784.432**

VERA RUEDA

APELLIDOS

DEIVI ALEJANDRO

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-NOV-1998**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO


14-DIC-2016 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01275306-M-1000784432-20220106 **0077734532A 1** 9918050415

Certificado Médico

Informe seguridad y salud en el trabajo



EMPRESA	EMPRESA EN MISIÓN
JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS	JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO A INSTALACIONES

NO. CERTIFICADO	1.798.905				
CIUDAD	BOGOTÁ - MEDICINA LABORAL S.A.S				
FECHA	27/02/2025	**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO		
NO. DOCUMENTO	CC. 1.000.784.432	**EDAD**	26	**GENERO**	M
NOMBRES Y APELLIDOS:	VERA RUEDA DEIVI ALEJANDRO				
TIPO DE CARGO	OPERATIVO	**CARGO U OFICIO**	INSTALADOR		

EXÁMENES REALIZADOS

AUDIOMETRÍA - ENFASIS OSTEOMUSCULAR - ESPIROMETRÍA - EXAMEN MEDICO DE INGRESO - OPTOMETRIA

CONCEPTO DE APTITUD	OTROS CONCEPTOS
Apto sin restricciones para el cargo	NA

OBSERVACIONES

USO DE CORRECCIÓN ÓPTICA PARA ESFUERZOS VISUALES

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA - CONTINUAR REALIZANDO EXÁMENES MÉDICOS PERIÓDICOS - SE ACONSEJA CAPACITACIÓN RESPECTO ADECUADO USO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA USADAS POR EL TRABAJADOR PARA LA EJECUCIÓN DE SUS TAREAS - HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICION DE RIESGO - SE RECOMIENDA REALIZAR CAPACITACIONES PARA MANTENER Y MEJORAR HIGIENE POSTURAL - REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON TÉCNICA APROPIADA Y DE ACUERDO A LOS LIMITES PERMISIBLES ESTABLECIDOS

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA 150 MINUTOS A LA SEMANA DE ACUERDO A INDICACIÓN MEDICA Y TOLERANCIA A LA ACTIVIDAD - MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA - SE ACONSEJA MANTENER ADECUADOS HÁBITOS POSTURALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS - VALORACIÓN POR OPTOMETRÍA

RECOMENDACIONES AUDIOMETRIA


CONTROL EN UN AÑO - POR AUDIOLOGIA OCUPACIONAL - PAUTAS DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN AUDITIVA - REPOSO AUDITIVO POSTERIOR A JORNADA LABORAL, USO ALTERNO DEL TELÉFONO EN AMBOS OÍDOS, NO INTRODUCIR HISOPOS DENTRO DEL CONDUCTO AUDITIVO, NO USO DE DISPOSITIVOS DE AUDIO - USO DE EPPA (PROTECCIÓN AUDITIVA) - DE ACUERDO AL NIVEL DE EXPOSICION A RUIDO

RECOMENDACIONES OPTOMETRIA

CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA - CORRECCIÓN OPTICA PARA ESFUERZO VISUAL PROLONGADO - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS VISUALES DURANTE LA JORNADA SIGUIENDO LA REGLA 20-20-20 - REMISION VALORACION OPTOMETRIA FORMULAR CORRECION OPTICA - USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION OCULAR

Certificado Médico

Informe seguridad y salud en el trabajo



EMPRESA	EMPRESA EN MISIÓN
JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS	JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS

ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO A INSTALACIONES

NO. CERTIFICADO	1.798.905				
CIUDAD	BOGOTÁ - MEDICINA LABORAL S.A.S				
FECHA	27/02/2025	**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO		
NO. DOCUMENTO	CC. 1.000.784.432	**EDAD**	26	**GENERO**	M
NOMBRES Y APELLIDOS:	VERA RUEDA DEIVI ALEJANDRO				
TIPO DE CARGO	OPERATIVO	**CARGO U OFICIO**	INSTALADOR		

Autorización de datos personales

Yo, VERA RUEDA DEIVI ALEJANDRO, identificado(a) con el documento de identidad CC No. 1.000.784.432, en mi calidad de titular de los datos personales, manifiesto que he sido informado(a) y entiendo que el tratamiento de mis datos personales por parte de Medilaboral SAS, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las reglamenten o modifiquen. En virtud de lo anterior, autorizo de manera libre, previa, expresa e informada a Medilaboral SAS para recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir mis datos personales, incluyendo datos sensibles como información biométrica y datos relacionados con mi salud, con las siguientes finalidades: 1. Brindar una atención óptima, eficiente y personalizada en la prestación de servicios de salud ocupacional y medicina laboral. 2. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 3. Implementar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de las empresas con las cuales se tiene una relación contractual. 4. Realizar estudios de investigación con fines científicos, garantizando el anonimato de los datos personales cuando corresponda. 5. Cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes en el marco de la normatividad vigente.

Derechos del titular: De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, como titular de los datos personales, tengo derecho a: 1. Conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar supresión de mis datos personales. 2. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 3. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio si considero que se han vulnerado mis derechos.

La Política de Tratamiento de Datos Personales de Medilaboral SAS está disponible en <https://medilaboral.com/documentacion/> donde se especifican los mecanismos y canales para ejercer mis derechos como titular de los datos personales.

Declaro que la información suministrada es veraz, completa y correcta, y manifiesto mi autorización para el tratamiento de mis datos personales conforme a los términos aquí establecidos.
En constancia, firmo:



CC. 1.000.784.432

Profesional



DRA DIANA LA TORRE LSO 25-5569

Medellín, 08 de Abril de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS, en el centro de trabajo 0000000005 - OPERATIVO NIVEL V, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1000784432	VERA RUEDA DEIVI ALEJANDRO	15/03/2025		146196l2	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10141884172509865982

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/04/2025 18:19:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.107.21.237, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900830800-1	JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CL 75 85 54	3142154018	administracion@jointsi.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	BOGOTA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	01/04/2025	85429980	$11.904.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	403.800	0		0		0	0	0	0	403.800	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	165.000	0		0		0	0	0	0	165.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	224.200	0		0		0	0	0	0	224.200	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	355.500	0		0		0	0	0	0	355.500	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	58.500	0		0		0	0	0	0	58.500	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	100.700	0		0		0	0	0	0	100.700	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	249.600	0		0		0	0	0	0	249.600	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.072.800	0	0	0	0	0	0		1.072.800	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.387.500	0	0	0	0	0	0		2.387.500	12
231001	Colfondos	800227940-6	666.000	0	0	0	0	0	0		666.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.283.300	0	0	0	0	0	0		2.283.300	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.178.000				2.178.000	0	0	2.178.000			21.780	2.178.000	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	835.500	0	0	835.500	9
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	852.300	0	0	852.300	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900830800-1	JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CL 75 85 54	3142154018	administracion@jointsi.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	BOGOTA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	01/04/2025	85429980	$11.904.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1.629.300	1.629.300
Pensión	4	6.409.600	6.409.600
Riesgos Laborales	1	2.178.000	2.178.000
CCF	2	1.687.800	1.687.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	11.904.700	11.904.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900830800-1	JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CL 75 85 54	3142154018	administracion@jointsi.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL BOGO	BOGOTA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	01/04/2025	85429980	$11.904.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1087672958	ASCUNTAR MORILLO ALVARO JULIAN	1	0			S	X																25-14	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC18	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
2	CC	1085249690	SANTOS MARTINEZ ANGELA MARIA	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF35	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
3	CC	5995711	RODRIGUEZ REYES CAMPO ELIAS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	98370618	CUASPA FLOREZ CARLOS ALBERTO	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPSIC5	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
5	CC	5997034	CONDE RODRIGUEZ CARLOS ALFONSO	1	0			S								X									230301	2.462.348	394.000	0	0	0	0	EPS037	2.462.348	98.500	14-11	2.462.348	5	171.400	CCF35	2.462.348	98.500	0	0	0	0	0
6	CC	1030664487	RAMIREZ HERNANDEZ CRISTIAN FERNANDO	1	0			S								X									231001	1.462.182	234.000	0	0	0	0	EPSC34	1.462.182	58.500	14-11	1.462.182	5	101.800	CCF22	1.462.182	58.500	0	0	0	0	0
7	CC	1000784432	VERA RUEDA DEIVI ALEJANDRO	1	0			S	X							X									230301	1.489.517	238.400	0	0	0	0	EPS017	1.489.517	59.600	14-11	1.489.517	2	15.600	CCF22	1.489.517	59.600	0	0	0	0	0
8	CC	98370778	ARCE GERMAN ALBERTO	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC18	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
9	CC	59827130	RIASCOS VILLARREAL GLORIA LUCIA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS037	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF35	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
10	CC	79104187	MORA VELASQUEZ HECTOR JULIO	1	0			S	X																230201	664.300	106.300	0	0	0	0	EPS017	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF35	664.300	26.600	0	0	0	0	0
11	CC	98360493	MORALES CARDENAS HECTOR ORLANDO	1	0			S	X																230301	664.300	106.300	0	0	0	0	ESSC18	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF35	664.300	26.600	0	0	0	0	0
12	CC	1020848061	MARQUEZ BAEZ HOSFFMAN ALBERTO	1	0			S																	230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS017	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	5	121.800	CCF22	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
13	CC	80503999	MOLANO ARIAS JAIME ALBERTO	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS001	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
14	CC	1004632269	CUASPA CUASANCHIR JAMID HERNEY	1	0			S	X																230301	664.300	106.300	0	0	0	0	EPSIC5	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF35	664.300	26.600	0	0	0	0	0
15	CC	98371613	MORILLO SANCHEZ JESUS ANIVAL	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPSIC5	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
16	CC	5305810	MEZA SALAZAR JESUS ANTONIO	1	5			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	664.300	26.600	14-11	664.300	5	46.300	CCF35	664.300	26.600	0	0	0	0	0
17	CC	1014210417	RAMIREZ ROMERO JOHN FREDDY	1	0			S																	25-14	3.430.000	548.800	0	0	0	0	EPS005	3.430.000	137.200	14-11	3.430.000	5	238.800	CCF22	3.430.000	137.200	0	0	0	0	0
18	CC	98371002	LUCERO JUAN PABLO	1	0			S	X																230201	616.850	98.700	0	0	0	0	EPSIC5	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF35	616.850	24.700	0	0	0	0	0
19	CC	1023868145	CARRASCO CAMARGO JULY ANDREA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	2	14.900	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1032441364	MARTINEZ CASTRO KAREN ANDREA	1	0			S																	231001	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS008	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	2	28.200	CCF22	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
21	CC	1020757351	AREVALO TAPIAS MICHAEL STEVE	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	68.000	14-11	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
22	CC	1014188417	BERNAL RAMIREZ MONICA ANDREA	1	0			S		X															25-14	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-11	3.800.000	2	39.700	CCF22	5.130.000	205.200	0	0	0	0	0
23	CC	27108912	MELO TRUJILLO OLIVA MARLENI	1	0			S	X																230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	ESSC18	1.260.000	50.400	14-11	1.260.000	5	87.700	CCF35	1.260.000	50.400	0	0	0	0	0
24	CC	1085248390	GUEVARA BASTIDAS OSCAR ALEXANDER	1	0			S	X																230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	ESSC18	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	5	181.000	CCF35	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
25	CC	1085284361	MOLINA GOMEZ WILMER ALEJANDRO	1	0			S		X															230301	480.000	76.800	0	0	0	0	ESSC18	480.000	19.200	14-11	480.000	5	33.500	CCF35	612.500	24.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **80.029.985**

ESGUERRA FAJARDO

APELLIDOS

JOHN JAIRO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-MAR-1981**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

08-ABR-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-01052141-M-0080029985-20181220 **00638**40547A 1 9906923218

Medellín, 09 de april de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que JOHN JAIRO ESGUERRA FAJARDO identificado(a) con cédula de ciudadanía 80029985 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 11/04/2025 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

JOINT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
N 9 0 0 8 3 0 8 0 0

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
2311002 - FABRICACIÓN DE MUEBLES, INCLUYE LA FABRICACIÓN ARTESANAL O MANUAL DE MUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES, AUTOSERVICIOS, BARES, RESTAURANTES, HOTELES, TEATROS, COLEGIOS, IGLESIAS Y SITIOS SIMILARES

CLASE DE RIESGO: 2 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 1.044%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - OPERATIVO NIVEL V

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:


1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 09/04/2025 9.40 AM

MYM ALTURAS

CENTRO DE FORMACION PARA EL EMPLEO S.A.S.

NIT 901.103.169-7

LIC. SST N°14956 del 28 de noviembre de 2018

Certificación NTC 6072:2014 otorgada por CELAC CERT N°30.502-1

Autorización de Min Trabajo N°08SE2019220000000006629 del 1 de marzo de 2019

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

ESGUERRA FAJARDO JOHN JAIRO

Cédula No. 80029985

Cursó y aprobó la acción de formación

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL: TRABAJADOR AUTORIZADO

Realizado del 12/02/2024 - 15/02/2024 en la ciudad de Bogotá D.C.
con una intensidad de 32 horas

Empresa: JOINT SOLUCIONES INTEGRALES SAS

NIT: 900830800

Representante Legal: RAMIREZ ROMERO JOHN FREDDY

ARL: SURA


En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá a los 15/02/2024
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución 4272 del 27 de diciembre de 2021

Registro bajo consecutivo No.- C52921

BERONICA MAYA RODRIGUEZ
C.C. 52429692
Representante Legal

LUIS ERNESTO LOPEZ ROJAS
C.C. 80173859
Lic. SST 6728 - 2022

ACCEI
Asociación Colombiana de Centros de Entrenamiento Integral
Asociado No. ACC-AS-012

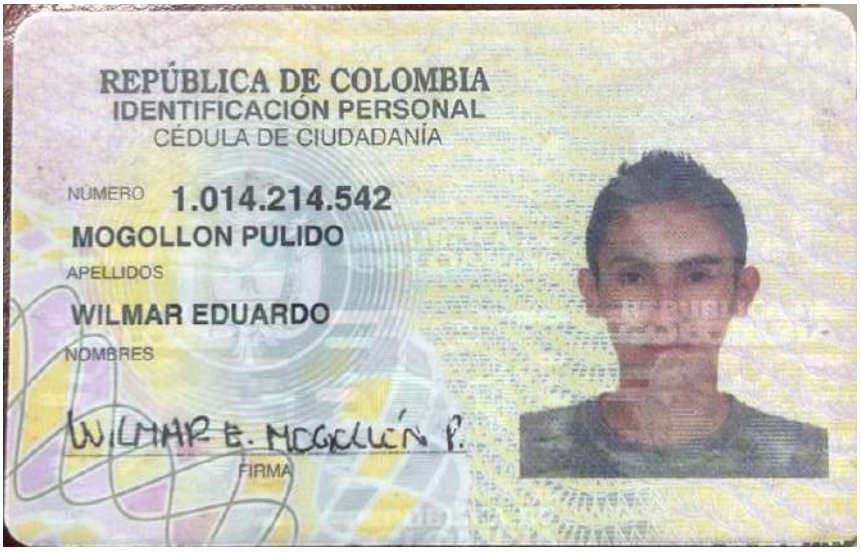

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.014.214.542

MOGOLLON PULIDO

APELLIDOS

WILMAR EDUARDO

NOMBRES

WILMAR E. MOGOLLÓN P.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1990

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

23-SEP-2008 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-01008808-M-1014214542-20180511 0061162064A 1 9904330327

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Medellín, 09 de april de 2025

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que WILMAR EDUARDO MOGOLLON PULIDO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1014214542 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 11/04/2025 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

JOINT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
N 9 0 0 8 3 0 8 0 0

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
2311002 - FABRICACIÓN DE MUEBLES, INCLUYE LA FABRICACIÓN ARTESANAL O MANUAL DE MUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES, AUTOSERVICIOS, BARES, RESTAURANTES, HOTELES, TEATROS, COLEGIOS, IGLESIAS Y SITIOS SIMILARES

CLASE DE RIESGO: 2 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 1.044%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000005 - OPERATIVO NIVEL V

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:


1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 09/04/2025 10.08 AM

MYM ALTURAS

CENTRO DE FORMACION PARA EL EMPLEO S.A.S.

NIT 901.103.169-7

LIC. SST N°14956 del 28 de noviembre de 2018

Certificación NTC 6072:2014 otorgada por CELAC CERT N°30.502-1

Autorización de Min Trabajo N°08SE2019220000000006629 del 1 de marzo de 2019

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS

MOGOLLON PULIDO WILMAR EDUARDO

Cédula No. 1014214542

Cursó y aprobó la acción de formación

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL: REENTRENAMIENTO

Realizado del 09/04/2025 - 09/04/2025 en la ciudad de Bogotá D.C.
con una intensidad de 8 horas

Empresa: INDEPENDIENTE

NIT: 1014214542

Representante Legal: MOGOLLON PULIDO WILMAR EDUARDO

ARL: SURA

En testimonio de lo anterior se firma el presente en Bogotá a los 09/04/2025
Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Resolución 4272 del 27 de diciembre de 2021

Registro bajo consecutivo No.- 73AF8E

BERONICA MAYA RODRIGUEZ
C.C. 52429692
Representante Legal

LEAN JUSETH RODRIGUEZ JARAMILLO
C.C. 1054548240
Lic. SST - 25-00857 - 2023

ACCEI
Asociación Colombiana de Centros de Entrenamiento Integral
Asociado No. ACC-AS-012

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-14, 11:42:22 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1070859945

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 14/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRC MONTAJES Y MANTENIMIENTO SAS		
Documento	NI900695015	**Dirección**	CL 14C SUR #69 D - 03
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3112524559
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	RUIZ CHOCONTA GERSON	**Identificación**	CC 80720750
Total Afiliados	5	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1031135556	ANDRES ARTURO GARCIA VEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.105.000	$ 336.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.105.000	$ 84.200	6,960	$ 2.105.000	$ 146.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.105.000	$ 84.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 651.800
CC 52517720	LUZ ANGELA MOLINA MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.500
CC 79236381	MIGUEL ANTONIO MONTAÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 1.779.000	$ 284.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.779.000	$ 71.200	6,960	$ 1.779.000	$ 123.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.779.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.000
CC 80114321	EMILIO CASTILLO CUADRADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.565.000	$ 410.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.565.000	$ 102.600	6,960	$ 2.565.000	$ 178.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.565.000	$ 102.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 794.200
CC 80720750	GERSON RUIZ CHOCONTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 2.022.000	$ 323.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.022.000	$ 80.900	6,960	$ 2.022.000	$ 140.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.022.000	$ 80.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.894.500	$ 9.894.500	$ 9.894.500	$ 9.894.500	$ 1.583.300	$ 395.900	$ 624.600	$ 395.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.999.700	$ 19.800	$ 3.019.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-24, 06:22:51 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 77203916

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 23/04/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELECTRO REDES DEL PACIFICO Y REPRESENTACIONES SAS		
Documento	NI901029682	**Dirección**	CR 90 SUR #54 C - 65
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3103952021
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	ANGULO MANCILLA LUIS ANGEL	**Identificación**	CC 94418488
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10537748	JESUS ELIAS MOLINA OSPINA	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 10754156	DANI FERNANDEZ OTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1113309616	CHRISTIAN CAMILO MURILLO OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 1143943273	RUBIELA CASTILLO LANDAZURY	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.233.700	$ 197.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.233.700	$ 49.400	6,960	$ 1.233.700	$ 85.900	(CCF57) COMFANDI	$ 1.233.700	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100
CC 11935849	MIGUEL ALFREDO CAICEDO QUEJADA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 569.400	$ 91.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 569.400	$ 22.800	6,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF57) COMFANDI	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500
CC 16499675	LUIS ALFREDO MERA VELASCO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.500	$ 57.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(CCF57) COMFANDI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900
CC 94418488	LUIS ANGEL ANGULO MANCILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.900.000	$ 624.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.900.000	$ 156.000	6,960	$ 3.900.000	$ 271.500	(CCF57) COMFANDI	$ 3.900.000	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.207.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.973.600	$ 11.397.100	$ 11.397.100	$ 11.397.100	$ 1.596.000	$ 456.200	$ 793.500	$ 456.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.301.900	$ 4.600	$ 3.306.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Medellín, 08 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1122647828	NOCUA VARGAS JEISON FERNANDO	09/04/2025		20482406	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/04/2025 15:47:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.32.203.196, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1006088052	ORTIZ LOZANO ANDRES FELIPE	27/04/2025		16816592	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 21:21:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C19390341	MORA VELASQUEZ GERMAN	27/04/2025		16023013	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 21:29:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C10552574	RIVAS VIDAL HERNAN	27/04/2025		17022015	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 21:42:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C10553312	GONZALEZ RODRIGUEZ IVAN	27/04/2025		1132X143	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 21:47:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1007380396	DELGADO LASSO JHON ANDERSON	27/04/2025		13217462	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 21:49:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1062313919	CANTOÑI BANGUERO JORDY ARMANDO	27/04/2025		180C1631	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 21:56:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C16675873	AMAYA ENCISO LUIS EDUARDO	27/04/2025		89113514	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 22:06:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C34374438	FORY BALANTA SANDRA PATRICIA	27/04/2025		11[13]B292	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 22:13:55 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
X6120861	ARRECHEDERA RIVAS WILLIAMS ANTONIO	27/04/2025		k1511574	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 22:19:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Medellín, 26 de April de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INGESTRUCTURAS E&G S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000060 PUERTO TEJADA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C94373857	RIVERA RIVERA JHON JAIRO	27/04/2025		33240324	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/04/2025 21:53:24 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 161.10.164.92, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901199471	9	INGESTRUCTURAS E&G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 94 M 91A 82,	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108736740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1426881972	9484995938	E	2025/04/16	2025/04/22	BANCOLOMBIA	6	$5,178,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$14,398,250	$2,303,900			$14,398,250	$576,400			$14,398,250	$576,400			$14,398,250	$1,003,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$14,398,250	$2,303,900			$14,398,250	$576,400			$14,398,250	$576,400			$14,398,250	$1,003,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$14,398,250	$2,303,900			$14,398,250	$576,400			$14,398,250	$576,400			$14,398,250	$1,003,100		$0	$0
1	CC	80096022	AHUMADA CAMILO	230301	30	$2,040,000	$326,400	EPS008	30	$2,040,000	$81,600	CCF24	30	$2,040,000	$81,600	14-11	30	$2,040,000	$142,000	30	$0	$0
2	CC	98370618	CUASPA CARLOS	230301	2	$95,500	$15,300	EPSIC5	2	$95,500	$3,900	CCF24	2	$95,500	$3,900	14-11	2	$95,500	$6,700	2	$0	$0
3	CC	1004632269	CUASPA JAMID	230301	2	$95,500	$15,300	EPSIC5	2	$95,500	$3,900	CCF24	2	$95,500	$3,900	14-11	2	$95,500	$6,700	2	$0	$0
4	CC	8801496	DIAZ GEOVANY	231001	30	$1,432,500	$229,200	EPS017	30	$1,432,500	$57,300	CCF24	30	$1,432,500	$57,300	14-11	30	$1,432,500	$99,800	30	$0	$0
5	CC	1001806237	LOPEZ EYBIS	230301	12	$573,000	$91,700	EPS002	12	$573,000	$23,000	CCF24	12	$573,000	$23,000	14-11	12	$573,000	$39,900	12	$0	$0
6	CC	79872823	MARTINEZ JHON	230201	30	$1,432,500	$229,200	EPS017	30	$1,432,500	$57,300	CCF24	30	$1,432,500	$57,300	14-11	30	$1,432,500	$99,800	30	$0	$0
7	CC	79868027	MARTINEZ NELSON	230201	30	$1,432,500	$229,200	EPS002	30	$1,432,500	$57,300	CCF24	30	$1,432,500	$57,300	14-11	30	$1,432,500	$99,800	30	$0	$0
8	CC	5256324	MELO PAULO	230301	1	$47,750	$7,700	EPS017	1	$47,750	$2,000	CCF24	1	$47,750	$2,000	14-11	1	$47,750	$3,400	1	$0	$0
9	CC	1000620389	MORA HECTOR	230301	30	$1,432,500	$229,200	EPS017	30	$1,432,500	$57,300	CCF24	30	$1,432,500	$57,300	14-11	30	$1,432,500	$99,800	30	$0	$0
10	CC	1022940462	ORTIZ CESAR	230301	30	$1,432,500	$229,200	EPS037	30	$1,432,500	$57,300	CCF24	30	$1,432,500	$57,300	14-11	30	$1,432,500	$99,800	30	$0	$0
11	CC	96186921	PEREZ LUIS	230301	30	$1,432,500	$229,200	EPS037	30	$1,432,500	$57,300	CCF24	30	$1,432,500	$57,300	14-11	30	$1,432,500	$99,800	30	$0	$0
12	CC	1023024591	POBLADOR EDISON	230301	30	$1,432,500	$229,200	EPS037	30	$1,432,500	$57,300	CCF24	30	$1,432,500	$57,300	14-11	30	$1,432,500	$99,800	30	$0	$0
13	CC	1014206764	TRIANA JOHN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
14	PT	5256324	URDANETA GUIDO	230301	2	$95,500	$15,300	EPS017	2	$95,500	$3,900	CCF24	2	$95,500	$3,900	14-11	2	$95,500	$6,700	2	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
15	CC	1070950510	CARDENAS DIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
16	CC	1032395392	MORA EDUART	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(15)**					$17,245,250	$2,759,500			$17,245,250	$690,400			$17,245,250	$690,400			$17,245,250	$1,018,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901199471	9	INGESTRUCTURAS E&G SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 94 M 91A 82,	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108736740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1426881972	9484995938	E	2025/04/16	2025/04/22	BANCOLOMBIA	6	$5,178,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$2,759,500	$10,800	$0	$2,770,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$229,200	$900	$0	$230,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,071,900	$8,100	$0	$2,080,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$458,400	$1,800	$0	$460,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,018,100	$4,000	$0	$1,022,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,018,100	$4,000	$0	$1,022,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$690,400	$2,700	$0	$693,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$690,400	$2,700	$0	$693,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$690,400	$2,900	$0	$693,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$252,600	$1,000	$0	$253,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$177,800	$700	$0	$178,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$7,800	$100	$0	$7,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,900	$700	$0	$172,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$80,300	$400	$0	$80,700
TOTAL				**16**	**$5,158,400**	**$20,400**	**$0**	**$5,178,800**
