	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN A CONVENIOS E INTERVENTORIAS	Código: GP-F101 Versión: 5 Fecha: 04/06/2024

INFORMACIÓN CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: N/A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: N/A

OBJETO: N/A

MUNICIPIO: N/A **PROVINCIA:** N/A

CONTRATANTE: N/A

PROFESIONAL DE APOYO DE SUPERVISIÓN DELEGADO: N/A

DATOS DE CONTACTO: N/A **FECHA DE DESIGNACIÓN:** N/A

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

RAZÓN SOCIAL: N/A

REPRESENTANTE LEGAL: N/A

DATOS DE CONTACTO:

PLAZO DEL CONVENIO: N/A **MESES** **DÍAS**

FECHA DE INICIO: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: N/A

VALOR INICIAL: N/A

MODIFICACIONES AL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

OTROSÍ /MODIFICATORIO	MOTIVO	FECHA
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

PRORROGA Y/O SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRORROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRORROGA	FECHA DE REINICIO (CUANDO APLIQUE)	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

ADICIÓN Nº	FECHA	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: N/A **MESES** **DÍAS**

FECHA FINAL DEL CONTRATO: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: N/A

ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONVENIO INTERADMINSTRATIVO

MODIFICACIÓN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
				DESDE	HASTA		
N/A							

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

COMPONENTE	FUENTES DE FINANCIACIÓN					SOPORTES				
	1. PA FIA - REGALIAS DEPARTAMENTO	2. PA FIA- SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO MUNICIPIO	3.	4.	5.	CDP	RP	CDR	CERTIFICADO DE AFECTACIÓN PARCIAL DE CDR	OTROS: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL FIDEICOMISO EPC PARA PROYECTOS PAR-PDA
SUMINISTRO DE AGUA A TRAVÉS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS (COMO LOS CARROTANQUES), CUANDO LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO AFECTADA O EL CAUDAL DE LA FUENTE LIMITAN O INTERRUMPEN EL ABASTECIMIENTO; Y PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PREVENIR O MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	$ 800.954.197,00							X	15455	
INVERSIONES QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO	$ 2.244.962.318,00							X	15067	

SUMINISTRO DE AGUA A TRAVÉS DE MECANISMOS ALTERNATIVOS (COMO LOS CARROTANQUES), CUANDO LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO AFECTADA O EL CAUDAL DE LA FUENTE LIMITAN O INTERRUMPEN EL ABASTECIMIENTO; Y PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PREVENIR O MITIGAR LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	$ 400.477.098							X	17434	
TOTALES										

INFORMACIÓN CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

CONTRATO Nº: EPC-PDA-O-500-2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29/09/2023
OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA PARA ATENDER EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO O LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO, INCLUIDA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN, CARROTANQUES, Y EN GENERAL MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA MITIGAR, LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTUCTURA DEL SECTOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
CLASE DEL CONTRATO: **Obra Publica**
MUNICIPIO: N/A **PROVINCIA:** N/A
CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P
SUPERVISOR: MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ
DEPENDENCIA: Direccion Operativa y de proyectos especiales
DATOS DE CONTACTO: mayra.solano@epc.com.co **FECHA DE DESIGNACIÓN:** 21/5/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

CONTRATISTA: PARQUE DE MAQUINARIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA PATRICIA MARIN MUÑOZ
DATOS DE CONTACTO: 6013688777
PLAZO DEL CONTRATO: NUEVE (9) **MESES** 0 **DÍAS**
FECHA DE INICIO: 27/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 26/08/2024
VALOR INICIAL: $ 3.045.916.515,00
PORCENTAJE DEL ANTICIPO (Cuando aplique): N/A
VALOR DEL ANTICIPO (Cuando aplique): N/A

MODIFICACIONES AL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

OTROSÍ /MODIFICATORIO	MOTIVO	FECHA
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

PRORROGA Y/O SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	FECHA DE REINICIO (CUANDO APLIQUE)	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
PRORROGA 1	Se requiere prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría en CUATRO (04) MESES más, es necesario precisar que esta modificación es indispensable, dado que debe darse continuidad a la Interventoría, toda vez que en cuanto a los recursos del Contrato de Obra, se requiere mayor plazo a los dos negocios jurídicos para continuar con la ejecución de las obras la variabilidad de las condiciones climáticas afecta las proyecciones para su destinación y no es fácilmente previsible establecer montos exactos para ejecución en plazos determinados, siendo así que para asegurar la continuidad del cumplimiento del objeto contractual de Obra	26/08/2024	4 (Meses)	N/A	26/12/2024
PRORROGA 2	Actualmente se tienen requerimientos en curso que deben ser atendidos y se proyecta la perentoriedad de otros por la continuidad de la variación de las condiciones climáticas, es necesario asegurar la atención y el cubrimiento de las actuales y futuras emergencias en el departamento, en el sector de agua potable y saneamiento básico, toda vez que tales modificaciones permitirán la satisfacción de las necesidades que originaron la contratación.	26/12/2024	2 (Meses)	N/A	26/02/2025

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

ADICIÓN Nº	FECHA	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
1	26/12/2024	Actualmente se tienen requerimientos en curso que deben ser atendidos y se proyecta la perentoriedad de otros por la continuidad de la variación de las condiciones climáticas, es necesario asegurar la atención y el cubrimiento de las actuales y futuras emergencias en el departamento, en el sector de agua potable y saneamiento básico, toda vez que tales modificaciones permitirán la satisfacción de las necesidades que originaron la contratación.	$ 400.477.098,000

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: QUINCE (15) **MESES** 0 **DÍAS**
FECHA FINAL DEL CONTRATO: 26/02/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 3.446.393.613

ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO


MODIFICACIÓN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
				DESDE	HASTA		
SERIEDAD DE LA OFERTA							
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101207684 ANEXO 0	SERIEDAD DE LA OFERTA	18/9/2023	18/1/2024	$ 304.591.651,50	8/9/2023
INICIO DE CONTRATO							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	2/11/2023	2/8/2024	$ 348.000.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 1	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2/11/2023	2/8/2024	$ 104.400.000,00	23/11/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/11/2023	2/12/2024	$ 609.183.303,00	23/11/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 1	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	2/11/2023	2/8/2027	$ 152.295.826,00	23/11/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 1	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS	5 AÑOS	$ 913.774.955,00	23/11/2023
ACTA DE INICIO							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	AMPARO BASICO PREDIOS LABORES	27/11/2023	27/8/2024	$ 348.000.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 4	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/11/2023	27/8/2024	$ 104.400.000,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 4	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	27/12/2024	$ 609.183.303,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 4	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	2/11/2023	27/8/2027	$ 152.295.826,00	5/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 4	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	5 AÑOS	$ 913.774.955,00	5/12/2023
PRORROGA 1							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 5	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27/11/2023	27/12/2024	$ 348.000.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 5	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/11/2023	27/12/2024	$ 104.400.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 5	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/11/2023	27/12/2024	$ 104.400.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 5	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	27/11/2023	27/12/2024	$ 104.400.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 5	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/11/2023	27/12/2024	$ 104.400.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056589 ANEXO 5	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/11/2023	27/12/2024	$ 104.400.000,00	poliza rechazada por epc
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 5	CUMPLIMINENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	27/4/2025	$ 609.183.303,00	poliza rechazada por epc
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 5	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	27/11/2023	27/12/2027	$ 152.295.826,00	poliza rechazada por epc
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 5	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS	5 AÑOS	$ 913.774.955,00	poliza rechazada por epc
ADICION 1 PRORROGA 2							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 8	AMPARO BASICO PREDIOS LABORES	27/11/2023	26/2/2025	$ 390.000.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 8	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/11/2023	26/2/2025	$ 117.000.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 8	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/11/2023	26/2/2025	$ 117.000.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 8	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	27/11/2023	26/2/2025	$ 117.000.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 8	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/11/2023	26/2/2025	$ 117.000.000,00	poliza rechazada por epc
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	1140-101056589 ANEXO 8	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/11/2023	26/2/2025	$ 117.000.000,00	poliza rechazada por epc

DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 7	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	27/4/2025	$ 689.278.722,00	poliza rechazada por epc
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 7	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	27/11/2023	27/12/2027	$ 172.319.680,00	poliza rechazada por epc
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210834 ANEXO 7	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	5 AÑOS	5 AÑOS	$ 1.033.918.083,00	poliza rechazada por epc

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (cuando aplica)	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DESDE	HASTA					
ACTA DE PAGO PARCIAL No.1	27/11/2023	4/12/2023	$ 80.116.687,24	$ -	$ 80.116.687,24	$ 2.965.799.827,76	20/2/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.2	5/2/2024	12/2/2024	$ 135.966.215,36	$ -	$ 135.966.215,36	$ 2.829.833.612,40	19/2/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.3	13/2/2024	2/5/2024	$ 183.623.721,87	$ -	$ 183.623.721,87	$ 2.646.209.890,54	17/5/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.4	30/4/2024	10/5/2024	$ 43.121.097,47	$ -	$ 43.121.097,47	$ 2.603.088.793,07	18/6/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.5	3/5/2024	4/6/2024	$ 55.110.710,89	$ -	$ 55.110.710,89	$ 2.548.078.092,18	18/6/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.6	5/6/2024	7/7/2024	$ 49.152.686,24	$ -	$ 49.152.686,24	$ 2.498.838.395,93	12/7/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.7	11/5/2024	11/6/2024	$ 133.226.835,54	$ -	$ 133.226.835,54	$ 2.365.598.560,39	19/7/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.8	8/7/2024	30/7/2024	$ 62.798.144,55	$ -	$ 62.798.144,55	$ 2.302.800.415,84	21/8/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.9	12/6/2024	15/7/2024	$ 191.033.774,76	$ -	$ 191.033.774,76	$ 2.111.766.641,08	21/8/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.10	31/7/2024	29/8/2024	$ 107.959.670,00	$ -	$ 107.959.670,00	$ 2.003.806.971,08	18/9/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.11	16/7/2024	20/8/2024	$ 175.143.673,00	$ -	$ 175.143.673,00	$ 1.828.663.298,08	18/9/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.12	2/9/2024	28/9/2024	$ 27.455.702,51	$ -	$ 27.455.702,51	$ 1.801.207.595,57	22/10/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.13	21/8/2024	30/9/2024	$ 174.801.299,34	$ -	$ 174.801.299,34	$ 1.626.406.296,23	21/10/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.14	1/10/2024	7/11/2024	$ 155.331.580,30	$ -	$ 155.331.580,30	$ 1.471.074.715,93	6/12/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.15	8/11/2024	30/11/2024	$ 278.531.334,11	$ -	$ 278.531.334,11	$ 1.192.543.381,82	6/12/2024

CURVA "S" AVANCE DE OBRA (Obra % Programado Acumulado VS Obra % Ejecutado Acumulado)

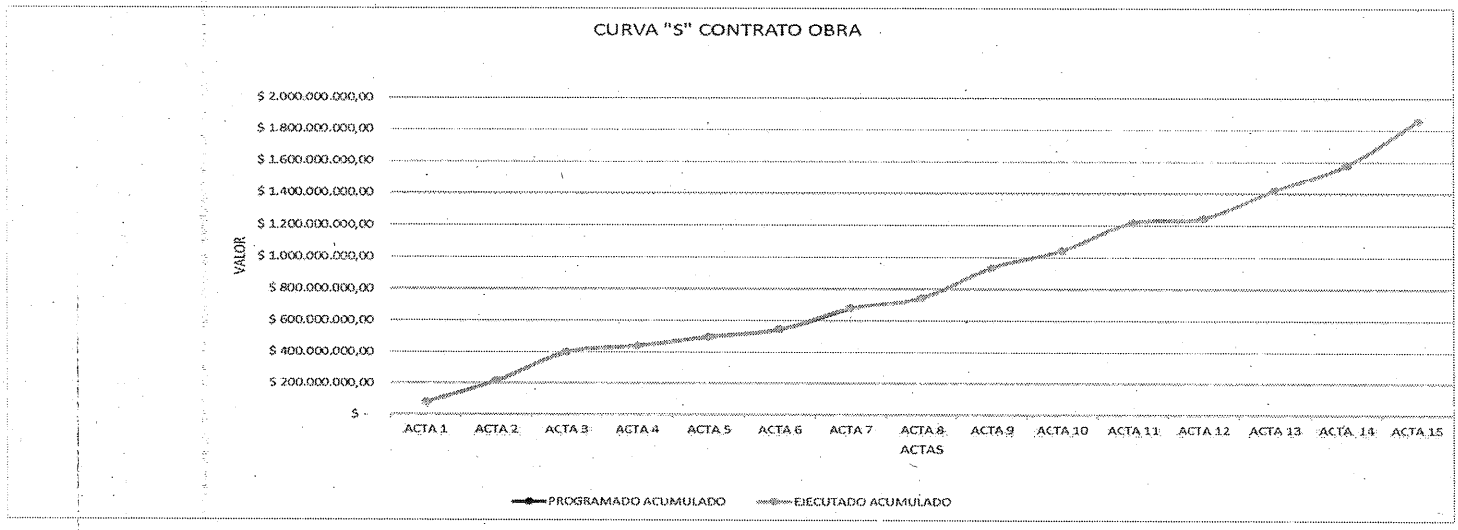

ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

FRENTE	OBRAS EJECUTADAS
SILVANIA	Avance de obra de rehabilitación red de acueducto veredal excavaciones, instalación de tubería en polietileno
TABIO	Avance de obra de rehabilitación por emergencias alcantarillado en el sector los pinos, excavaciones, rellenos en sitio, instalación de tuberías
GUADUAS	Avance de obra rehabilitación de red de acueducto municipal, se adelantan excavaciones iniciales
ARBELAEZ	Avance de obra rehabilitación de red de alcantarillado y acueducto se adelantan localizaciones y replanteos, y excavaciones iniciales
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Inicio de obra alcantarillado rehabilitación por emergencia, localización y replanteo de redes, demolición de concreto estructural y excavaciones varias en el sector Villa China, entibados de tubería
PAIME	Entrega de obra de rehabilitación de alcantarillado sector Tudela.
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	Entrega de obra rehabilitación alcantarillado Santandercito - Villa China.

CAPARRAPÍ	Entrega por rehabilitación motobomba municipio de Caparrapí.
VERGARA	Entrega rehabilitación motobomba municipio de Vergara
SUESCA	Entrega rehabilitación motobomba municipio de Suesca
CHOCONTÁ	Entrega rehabilitación motobomba Chocontá
BELTRAN	Entrega rehabilitación motobomba Beltrán, Gramalotal y rebombeo la popa.

OBSERVACIONES IMPORTANTES DEL CONTRATO DERIVADO O DIRECTO

FRENTE	OBSERVACIONES
INTERVENTORIA	Se recomienda al contratista la importancia de agilizar los trámites en cuanto a atención de las emergencias en las fechas planteadas según comités y los lineamientos del contrato EPC-PDA-O-500-2023.
INTERVENTORIA	Se recomienda al contratista la importancia de agilizar los tramites en cuanto a atención de las emergencias en las fechas planteadas según comites y los lineamientos del contrato EPC-PDA-O-500-2023. semana del 6 al 12 de enero 2025
INTERVENTORIA	Se aprobó y público el modificatorio #2 con la adición #1 y prórroga #2 del contrato de obra EPC-PDA-O-500-2023. Basado en los temas revisados en las actas de comité, es importante la entrega oportuna de los compromisos en las obras de emergencia y el inicio de obras en las fechas programadas.

INFORMACIÓN DE CONVENIO DE INTERVENTORÍA DE LA OBRA (CUANDO APLICA)

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº: N/A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: N/A

OBJETO: N/A

MUNICIPIO: N/A **PROVINCIA:** N/A

CONTRATANTE: N/A

PROFESIONAL DE APOYO DE SUPERVISIÓN DELEGADO DE EPC: N/A

DATOS DE CONTACTO: N/A **FECHA DE DESIGNACION:**

FECHA DE INICIO: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: N/A

VALOR INICIAL: N/A

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA DE OBRA

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO JUNIN NIT 901.766.139-0

REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN ANDRES VALLEJO PACHÓN

DATOS DE CONTACTO: 3214517250

PLAZO DEL CONVENIO: DIEZ (10) **MESES** 0 **DIAS**

CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.

PROFESIONAL DE APOYO DE SUPERVISIÓN DELEGADO DE EPC: MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ

DATOS DE CONTACTO: mayra.solano@epc.com.co **FECHA DE DESIGNACIÓN:** 21/05/2024

FECHA DE INICIO: 27/11/2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 26/09/2024

VALOR INICIAL: $ 295.584.219,00

MODIFICACIONES AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

OTROSI /MODIFICATORIO	MOTIVO	FECHA

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

PRORROGA SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	FECHA DE REINICIO (CUANDO APLIQUE)	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
PRORROGA No.1	Se requiere prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría en CUATRO (04) MESES más, es necesario precisar que esta modificación es indispensable, dado que debe darse continuidad a la Interventoría, toda vez que en cuanto a los recursos del Contrato de Obra, se requiere mayor plazo a los dos negocios jurídicos para continuar con la ejecución de las obras la variabilidad de las condiciones climáticas afecta las proyecciones para su destinación y no es fácilmente previsible establecer montos exactos para ejecución en plazos determinados, siendo así que para asegurar la continuidad del cumplimiento del objeto contractual de Obra.	16/09/2024	4 (Meses)	27/09/2024	26/01/2025

PRORROGA No.2	Se requiere prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría en un (01) MESES más, Actualmente se tienen requerimientos en curso que deben ser atendidos y se proyecta la perentoriedad de otros por la continuidad de la variación de las condiciones climáticas, es necesario asegurar la atención y el cubrimiento de las actuales y futuras emergencias en el departamento, en el sector de agua potable y saneamiento básico, toda vez que tales modificaciones permitirán la satisfacción de las necesidades que originaron la contratación.	26/01/2025	1 (Meses)	27/01/2025	26/02/2025

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORÍA DE OBRA

ADICIÓN Nº	FECHA	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
N/A	N/A	N/A	$ 0,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORÍA DE OBRA

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: QUINCE (15) **MESES** **0** **DIAS**
FECHA FINAL DEL CONTRATO: 26/02/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 295.584.219,00


ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORÍA DE OBRA

MODIFICACIÓN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
				DESDE	HASTA		
SUSCRIPCCION DEL CONTRATO							
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2/11/2023	2/1/2025	$ 29.558.421,90	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 0	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	2/11/2023	2/9/2027	$ 29.558.421,90	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 0	CALIDAD DEL SERVICIO	2/9/2024	2/9/2029	$ 88.675.265,70	15/12/2023
ACTA DE INICIO							
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	2/1/2025	$ 29.558.421,90	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 1	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	27/11/2023	2/9/2027	$ 29.558.421,90	15/12/2023
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 1	CALIDAD DEL SERVICIO	2/9/2024	2/9/2029	$ 88.675.265,70	15/12/2023
PRORROGA 1							
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	26/5/2025	$ 29.558.421,90	polizas no aprobadas por EPC
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 3	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,	27/11/2023	26/1/2028	$ 29.558.421,90	polizas no aprobadas por EPC
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 3	CALIDAD DEL SERVICIO	27/9/2024	27/9/2029	$ 88.675.265,70	polizas no aprobadas por EPC
PRORROGA 2							
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 4	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2023	26/6/2025	$ 29.558.421,90	polizas no aprobadas por EPC
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 4	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES	27/11/2023	26/6/2028	$ 29.558.421,90	polizas no aprobadas por EPC
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101197182 ANEXO 4	CALIDAD DEL SERVICIO	27/9/2024	27/9/2029	$ 88.675.265,70	polizas no aprobadas por EPC

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORÍA DE OBRA

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	VALOR A PAGAR	SALDO	FECHA DE PAGO / ORDEN DE DESEMBOLSO
	DESDE	HASTA					
ACTA DE PAGO PARCIAL No.1	27/11/2023	12/2/2024	$ 20.956.921,13	$ -	$ 20.956.921,13	$ 274.627.297,87	19/2/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.2	13/2/2024	6/6/2024	$ 23.173.802,77	$ -	$ 23.173.802,77	$ 251.453.495,10	18/6/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.3	30/4/2024	10/5/2024	$ 4.197.295,91	$ -	$ 4.197.295,91	$ 247.256.199,19	18/6/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.4	5/6/2024	30/7/2024	$ 10.847.940,84	$ -	$ 10.847.940,84	$ 236.408.258,35	21/8/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.5	11/6/2024	15/7/2024	$ 31.450.160,90	$ -	$ 31.450.160,90	$ 204.958.097,45	21/8/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.6	31/072024	29/8/2024	$ 10.463.681,35	$ -	$ 10.463.681,35	$ 194.494.416,10	19/9/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.7	16/7/2024	20/8/2024	$ 16.996.092,59	$ -	$ 16.996.092,59	$ 177.498.323,51	19/9/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.8	2/9/2024	28/9/2024	$ 2.660.257,97	$ -	$ 2.660.257,97	$ 174.838.065,54	15/10/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.9	21/8/2024	30/9/2024	$ 16.966.534,17	$ -	$ 16.966.534,17	$ 157.871.531,37	21/10/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.10	1/10/2024	7/11/2024	$ 15.074.795,17	$ -	$ 15.074.795,17	$ 142.796.736,20	6/12/2024
ACTA DE PAGO PARCIAL No.11	8/11/2024	30/11/2024	$ 27.016.397,62	$ -	$ 27.016.397,62	$ 115.780.338,58	6/12/2024

AVANCE FINANCIERO AL CONTRATO O COVENIO DE INTERVENTORIA DE OBRA

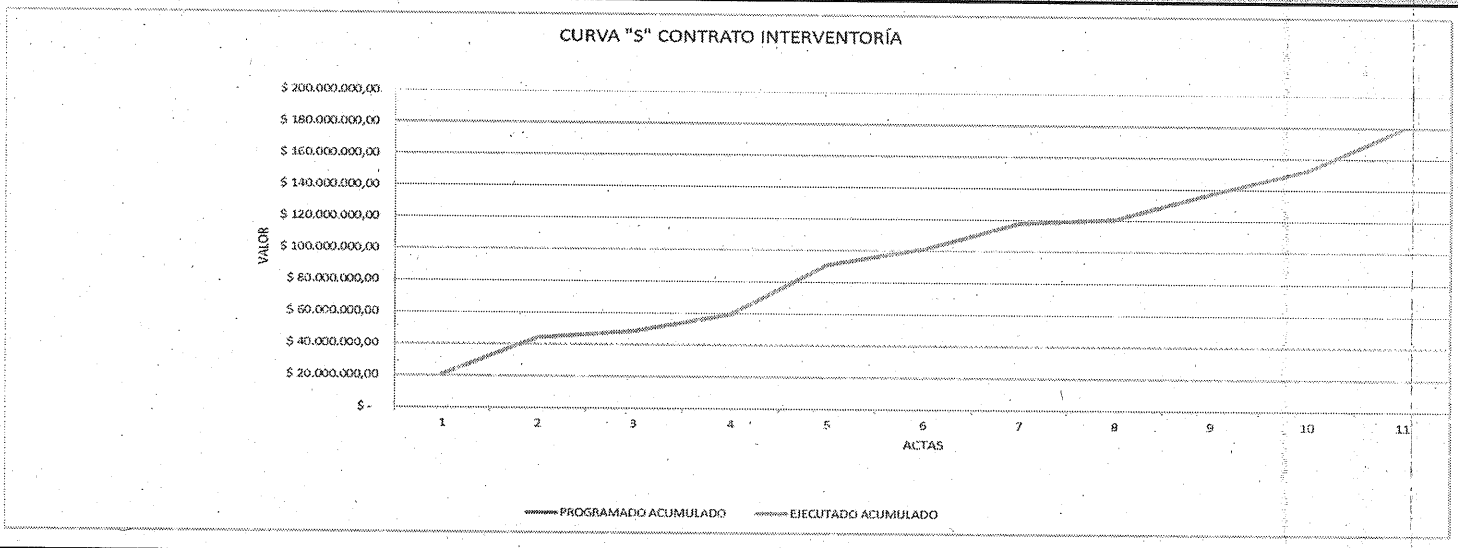

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

MES Nº: 14 **FECHA DE CORTE:** **DESDE:** **01/01/2025** **HASTA:** **31/01/2025**

ESTADO DEL CONTRATO (POR INICIAR/EN EJECUCIÓN/SUSPENDIDO/TERMINADO/LIQUIDADO): EJECUCIÓN

PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO	% VALOR EJECUTADO	% PROGRAMACIÓN APROBADA	PLAZO DE OBRA (MESES)	TIEMPO TRANSCURRIDO (MESES)	ATRASO
$ 3.446.393.613	$ 2.357.663.861,79	68,41%	68,41%	15	14	0,00%

OBSERVACIONES IMPORTANTES

FRENTE	OBSERVACIONES
INTERVENTORIA	Se recomienda al contratista la importancia de agilizar los trámites en cuanto a atención de las emergencias en las fechas planteadas según comités y los lineamientos del contrato EPC-PDA-O-500-2023.
INTERVENTORIA	Se recomienda al contratista la importancia de agilizar los tramites en cuanto a atención de las emergencias en las fechas planteadas según comites y los lineamientos del contrato EPC-PDA-O-500-2023. semana del 6 al 12 de enero 2025
INTERVENTORIA	Se aprobó y público el modificatorio #2 con la adición #1 y prórroga #2 del contrato de obra EPC-PDA-O-500-2023. Basado en los temas revisados en las actas de comité, es importante la entrega oportuna de los compromisos en las obras de emergencia y el inicio de obras en las fechas programadas.


RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PERIODO

FECHA	CONSECUTIVO No.	ASUNTO	DESTINATARIO
03/01/2025		Aprobación de presupuesto posterior a ajuste de observaciones San Antonio del Tequendama alcantarillado 2.	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
08/01/2025		Remisión desde la interventoría propuesta aprobada Municipio del Chocontá	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
09/01/2025		Aprobación de presupuesto posterior a ajuste de observaciones El Colegio- alcantarillado el Mohán.	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
09/01/2025		Remisión de concepto de aprobación #45- Motobomba Chocontá	Contratista: Parques de Maquinaria Interventoría: Consorcio Junín
09/01/2025		Remisión desde la interventoría propuesta aprobada para la obra de rehabilitación alcantarillado el Mohán Municipio del colegio.	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
10/01/2025		Remisión desde la interventoría a Empresas públicas de Cundinamarca la programación de entregas de obras a los municipios Paime 17 de enero, Caparrapí y Vergara martes 21 de enero 2025.	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
27/01/2025		Remisión de concepto de aprobación PTAP municipio de Supatá.	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
31/01/2025		Remisión de cronograma para entrega de obras en los municipios de San Antonio del Tequendama, Chocontá, Beltrán motobombas.	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
31/01/2025		Respuesta a requerimiento obra de alcantarillado municipio de Paime	Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.


INFORME SOCIAL MENSUAL

Informe Mensual Social formato SAC-F421	PERIODO		FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	PROFESIONAL SOCIAL DE INTERVENTORÍA	PROFESIONAL SOCIAL QUE APRUEBA POR PARTE DE EPC
	DESDE	HASTA:				
	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	N/A	N/A	N/A	N/A


REGISTRO FOTOGRÁFICO

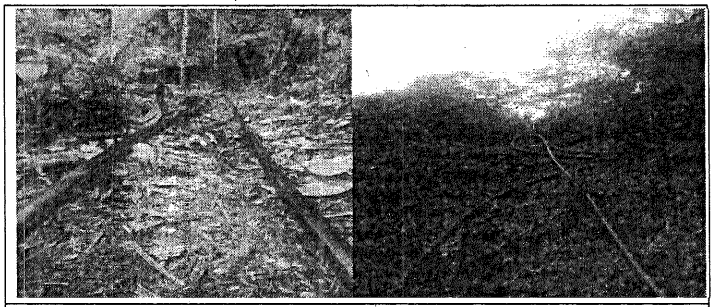


Fotografía No 1. avance de obra rehabilitacion Acueducto silvania

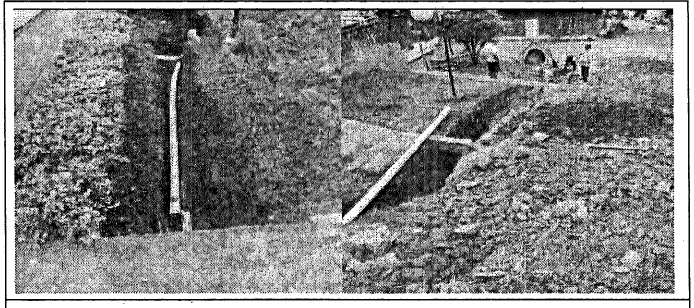

Fotografía No 2. Avance de obra- rehabilitacion red agua potable - Arbelaéz

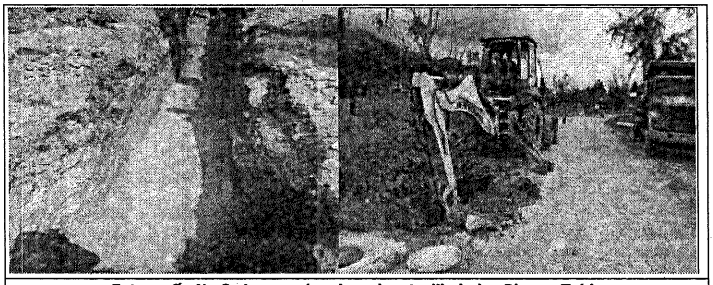

Fotografía No 3. Avance de obra alcantarillado los Pinos - Tabio

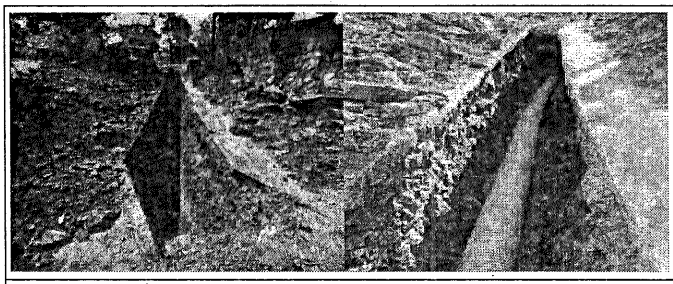

Fotografía No 4- Avance de obra - red de alcantarillado Santandercito

FIRMA

NOMBRE NELSON LEONARDO SANTIAGO URREGO

Elaboró: Profesional de apoyo a la supervisión de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A E.S.P.

FIRMA

NOMBRE MAYRA ALEJANDRA SOLANO GAMEZ

Aprobo: DIRECTORA OPERATIVA Y DE PROYECTOS ESPECIALES
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

FIRMA

NOMBRE NOHORA VIVIANA MARTINEZ RODRIGUEZ

Revisó: SUPERVISOR O COORDINADOR
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P
