INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

La Jagua de Ibirico, Junio 9 de 2025

Doctora
MARIA DEL PILAR URECHE COBO
Jefa Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2
CONTRATO 163 DE 2025
PERIODO No 2
del 01 de Mayo del 2025 al 31 de Mayo del 2025

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	163 DEL 27 DE MARZO DE 2025		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATISTA:	ITACA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HORAS DE MAQUINARÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO VILLA ESPERANZA POR EL SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y SIETE M/CTE ($ 309.455.433,77)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	27 DE MARZO DE 2025		
FECHA DE INICIO:	1 DE ABRIL DE 2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
PRORROGAS	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE JULIO DE 2025		

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA SEPTIMA (7) fui designado como Supervisor del contrato objeto de este informe; así, en cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO No 2 en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo fueron las siguientes:

SUMINISTRO DE MATERIALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES			
			CANTIDAD CONTRATO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUM.
1.	SUMINISTRO DE MATERIALES					
1.1	DERECHO DE CANTERA	M3	607,50	202,50	302,50	508,00
1.2	AGUA	LT	130.551,75	48.677,00	52.134,00	100.811,00
1.3	SUBBASE GRANULAR	M3	614,25	244,75	369,50	614,25
1.4	Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)	M3	406,35	221,63	112,40	334,03
1.5	Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)	M3	402,57	196,82	185,60	382,42
1.6	ANTISOL ROJO	KG	590,63	0,00	380,00	380,00
1.9	ALAMBRE NEGRO NO.18	KG	352,14	176,07	105,00	281,07
1.10	SOLDADURA 6011X1/8	KG	47,25	23,63	20,90	44,53

SUMINISTRO ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES			
			CANTIDAD CONTRATO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUM.
2	SUMINISTRO ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS					
2.1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HM	18,00	10,00	7,00	17,00
2.2	MOTONIVELADORA	HM	31,50	17,00	12,00	29,00
2.3	Compactador de rodillo potencia: 80hp, peso 7Ton	HM	31,50	15,00	12,00	27,00
2.4	CARRO TANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	HM	9,00	9,00	0,00	9,00
2.6	PERFILES PARA CONSTRUCCIÓN (RIELES DE PAVIMENTO Y GUARDERAS .40 X 1.40)	MES	2,50	1,00	1,00	2,00
2.7	VIBRADOR DE CONCRETO CON OPERADOR	MES	3,00	1,00	1,00	2,00
2.8	REGLA VIBRATORIA PARA PAVIMENTO	MES	3,00	1,00	1,00	2,00
2.9	CORTADORA DE PAVIMENTO CAPACIDAD DE DISCO: DESDE 12" HASTA 20" DE DIAMETRO	MES	2,00	0,00	1,00	1,00
2.10	COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO)	MES	2,50	0,50	1,00	1,50
2.11	EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	MES	1,50	1,00	0,50	1,50
2.12	EQUIPO TOPOGRAFICO	MES	3,00	1,00	1,00	2,00
2.13	HERRAMIENTA MENOR	MES	3,00	1,00	1,00	2,00

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

TRANSPORTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES			
			CANTIDAD CONTRATO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUM.
3.	**TRANSPORTE**					
3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3-KM	11.700,00	4.200,00	7.500,00	11.700,00
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO (TRITURADO, SUBBASE Y ARENA)	M3-KM	26.366,40	8.788,00	12.202,00	20.990,00
3.3	TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS VARIOS	MES	3,00	1,00	1,00	2,00

Durante el desarrollo del período reportado en el presente informe, ITACA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S., en su calidad de contratista, llevó a cabo la entrega de los materiales especificados en el contrato, garantizando que las cantidades suministradas cumplieran con los requerimientos establecidos para la ejecución del proyecto.

Asimismo, se prestó el servicio de alquiler de maquinaria y equipos, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades programadas. En paralelo, se efectuó el transporte de materiales pétreos, incluyendo agregados, residuos provenientes de excavaciones y explanaciones, además de equipos y elementos esenciales para el desarrollo de la obra.

Todas estas acciones se llevaron a cabo bajo la modalidad de autoconstrucción, permitiendo que el proyecto avanzara conforme a lo estipulado en el contrato. Como resultado, se cumplió en su totalidad con las obligaciones contractuales, asegurando que el municipio recibiera los bienes y servicios pactados de manera eficiente y dentro de los plazos establecidos, contribuyendo así al mejoramiento de la infraestructura vial del sector.

Es importante destacar que el Contrato 163 de 2025, cuya ejecución correspondiente al Período N.º 2 se detalla en el presente informe, representa un componente esencial dentro del Acuerdo de Colaboración Comunitaria para el Mejoramiento de la Malla Vial en el Municipio de La Jagua de Ibirico, establecido en conjunto con la empresa privada Drummond Ltd.

Este acuerdo tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación entre la comunidad, el gobierno municipal y Drummond Ltd., con el propósito de optimizar la infraestructura vial del municipio. A través de este esfuerzo conjunto, se busca garantizar un sistema de transporte seguro y eficiente, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico y social de la región.

Gracias a la ejecución de este contrato, se han implementado mejoras que no solo favorecen la movilidad, sino que también facilitan el acceso a servicios básicos, promoviendo así el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de La Jagua de Ibirico. La correcta aplicación de estos recursos evidencia el compromiso de todas las partes involucradas en consolidar un entorno urbano más seguro, funcional y sostenible para la comunidad.

PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 66,66%

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co



3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

MAYO

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASIGNACIÓN	IBC VERIFICADO
OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA	REPRESENTANTE LEGAL	$ 0,00	$ 1.423.500,00

IBC	$ 1.423.500,00
SALUD	$ 178.000,00
PENSIÓN	$ 227.800,00
N° DE PLANILLA	**7970393778**

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASIGNACIÓN	IBC VERIFICADO
RODOLFO RUIZ GONZALEZ	OPERADOR	$ 379.500	$ 379.500

IBC	$ 379.500
SALUD	$ 15.200,00
PENSIÓN	$ 60.800,00
RIESGOS	$ 26.500,00
N° DE PLANILLA	**7974289754**

Nota: corresponde a 8 días laborados.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASIGNACIÓN	IBC VERIFICADO
ANTONIO MARIA PERTUZ PEINADO	OPERADOR	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

IBC	$ 1.423.500,00
SALUD	$ 57.000,00
PENSIÓN	$ 227.800,00
RIESGOS	$ 99.100,00
N° DE PLANILLA	**7974289754**

Nota: corresponde a 30 días laborados.

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ASIGNACIÓN	IBC VERIFICADO
EDUARDO JOSE CERPA FLORIAN	OPERADOR	$ 47.450,00	$ 47.450,00


IBC	$ 47.450,00
SALUD	$ 1.900,00
PENSIÓN	$ 7.600,00
RIESGOS	$ 2.100,00
N° DE PLANILLA	**7974289754**

4 AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 309.455.433,77	100,00 %
ANTICIPO	$ 0,00	
ACTA PARCIAL N° 1	$ 100.125.869,72	32,36%
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL N° 1	$ 0,00	0,00%
ACTA PARCIAL N° 2	$ 131.737.839,85	42,57%
AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL N° 2	$ 0,00	0,00%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 131.737.839,85	42,57%
VALOR EJECUTADO	**$ 231.863.709,57**	**74,93%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 77.591.724,20**	**25,07%**
VALOR TOTAL AMORTIZACIÓN	$ 0,00	0,00%

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 74,93%

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

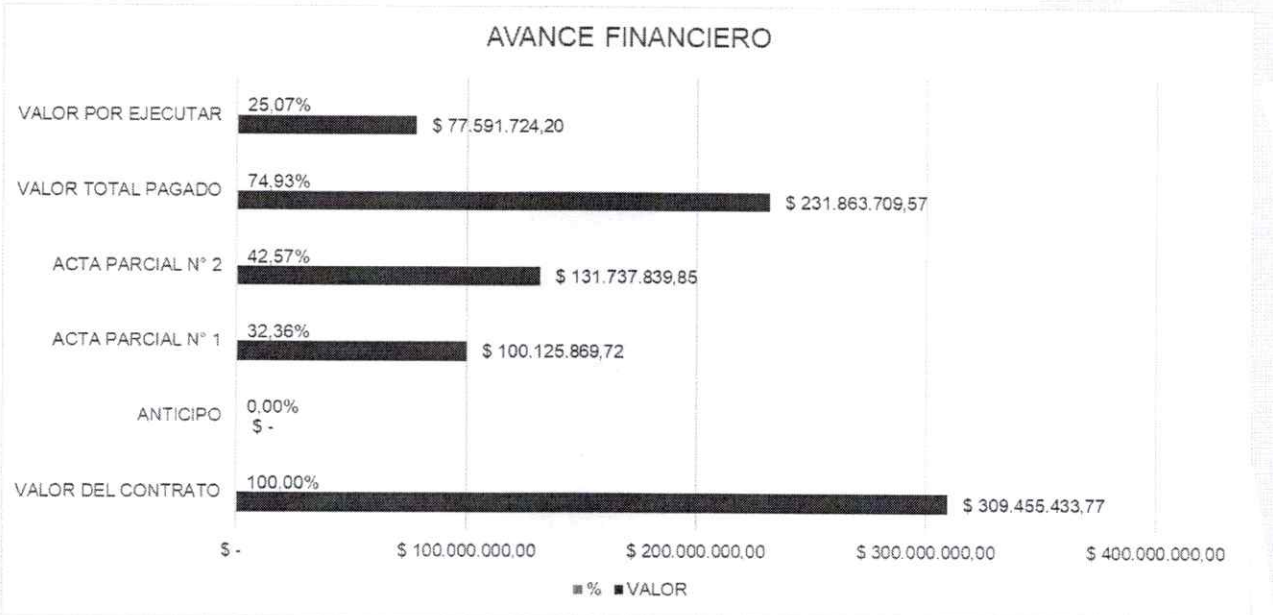

SEGUIMIENTO DE POLIZAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO – SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO			
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL – ANEXO 0			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	27/03/2025	27/10/2025	$ 30.945.543,40
PRESTACIONES SOCIALES	27/03/2025	27/06/2028	$ 15.472.771,70
CALIDAD DEL SERVICIO	27/03/2025	27/12/2025	$ 30.945.543,40
POLIZA DE CUMPLIMIENTO – SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO			
ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL – ANEXO 0			
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27/03/2025	27/12/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/03/2025	27/12/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/03/2025	27/12/2025	$ 284.700.000,00

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO No 2** comprendido entre el **01 de Mayo del 2025 al 31 de Mayo del 2025** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MDA CTE ($ 131.737.839,85).**

ANEXOS:

Informe de actividades del contratista.
Soportes pago de seguridad social.
Documentos relacionados con el Objeto.

LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
Supervisor

Proyectó: STANLEE L. CAMARGO VEGA – PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Revisó: LUIS MIGUEL GALLEGO MEJIA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Calle 5 No. 5-35 - La Jagua de Ibirico – Cesar
alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
