Informe Mensual
Contrato Electrónico No 163 - 2025
Contratista:
ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S







SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HORAS DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO VILLA ESPERANZA POR EL SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Del 01 al 31 de Mayo de 2025
Municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar

LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR – 03 DE JUNIO 2025

SEÑORES:
MARIA DEL PILAR URECHE COBO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION
LUIS MIGUEL GALLEGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS - SUPERVISOR

REF: Remisión de documentos del INFORME DE ACTIVIDADES No.2 COMPRENDIDO DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 del contrato de prestación de servicios No. 163 – 2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HORAS DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO VILLA ESPERANZA POR EL SISTEMA DE AUTOCONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".**

Cordial saludo,

A través de la presente hacemos entrega de la documentación requerida para llevar a cabo el trámite de cobro correspondiente al ACTA MENSUAL No. 2 COMPRENDIDO DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025, donde se entregan los siguientes documentos:

1. Informe de actividades realizadas desde el 01 al 31 de mayo.
2. Seguridad social.
3. Factura o documento equivalente.

Atentamente,

OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA
R.L. ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS No.2

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Por medio del presente informe se dará a conocer las actividades realizadas por el contratista **ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS** en el marco del contrato anteriormente mencionado.

Actividades realizadas durante el periodo de 01 al 31 de Mayo:

- DERECHO A CANTERA
- AGUA
- SUBBASE GRANULAR
- AGREGADO GRUESO (GRAVA, GRAVA TRITURADA Y/O ROCA TRITURADA)
- AGREGADO FINO PARA CONCRETO (TAMANO MAXIMO 4,75 MM – ARENA NATURAL O TRITURACION DE ROCA, GRAVAS Y/O ESCORIAS)
- ANTISOL ROJO
- ALAMBRE NEGRO NO.18
- SOLDADURA 6011X1/8
- RETROEXCAVADORAS SOBRE LLANTAS
- MOTONIVELADORA
- COMPACTADOR DE RODILLO POTENCIA: 80HP, PESO 7 TON
- MEZCLADORA CON OPERADOR
- REGLA VIBRATORIA PARA PAVIMENTO
- CORTADORA DE PAVIMENTO
- COMPRESOR DE AIRE
- PERFILES PARA CONSTRUCCION (RIELES DE PAVIMENTO Y GUARDERAS .40 X 1.40)
- EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA
- EQUIPO TOPOGRAFICO
- HERRAMIENTA MENOR

- TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION
- TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO (TRITURADO, SUBBASE Y ARENA)
- TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS VARIOS

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES


ACTIVIDAD: ***SUBBASE GRANULAR.***





ACTIVIDAD: ***AGREGADO GRUESO (GRAVA, GRAVA TRITURADA Y/O ROCA TRITURADA).***



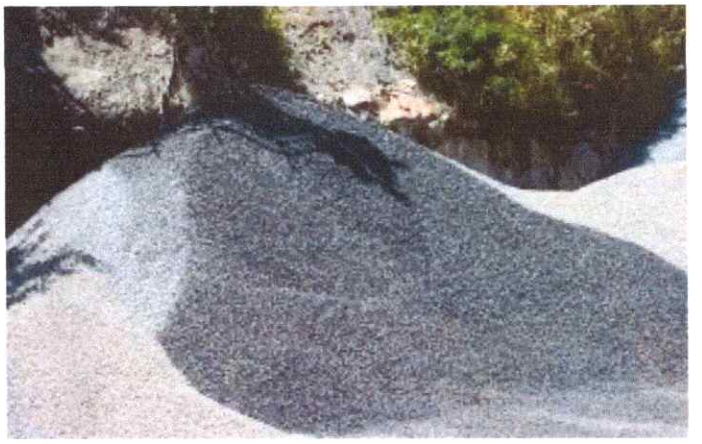

ACTIVIDAD: *AGREGADO FINO PARA CONCRETO (TAMANO MAXIMO 4,75 MM – ARENA NATURAL O TRITURACION DE ROCA, GRAVAS Y/O ESCORIAS)*



ACTIVIDAD: *ANTISOL ROJO*



ACTIVIDAD: *ALAMBRE NEGRO NO.18*





ACTIVIDADES: *SOLDADURA 6011X1/8 y EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA*





ACTIVIDAD: *RETROEXCAVADORAS SOBRE LLANTAS*









ACTIVIDAD: *MOTONIVELADORA*







ACTIVIDAD: *COMPACTADOR DE RODILLO POTENCIA: 80HP, PESO 7 TON*









ACTIVIDAD: *MEZCLADORA CON OPERADOR 9 P3*





ACTIVIDAD: *VIBRADOR DE CONCRETO*




ACTIVIDAD: *REGLA VIBRATORIA PARA PAVIMENTO*




ACTIVIDAD: *CORTADORA DE PAVIMENTO*



ACTIVIDAD: *COMPRESOR DE AIRE*

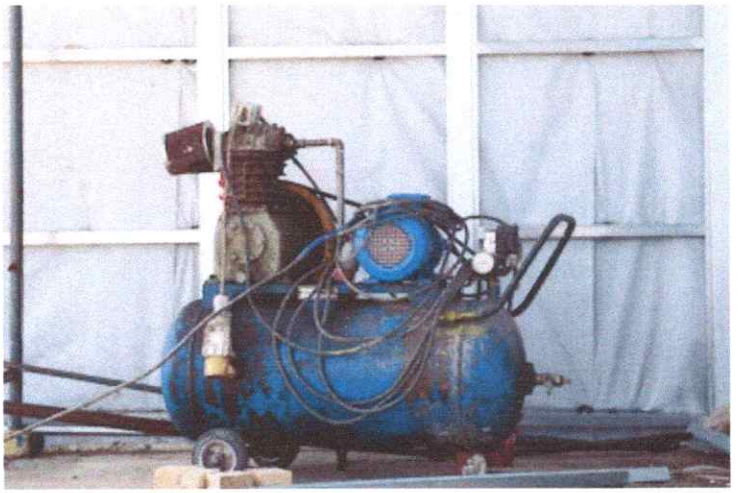

ACTIVIDAD: *CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)*

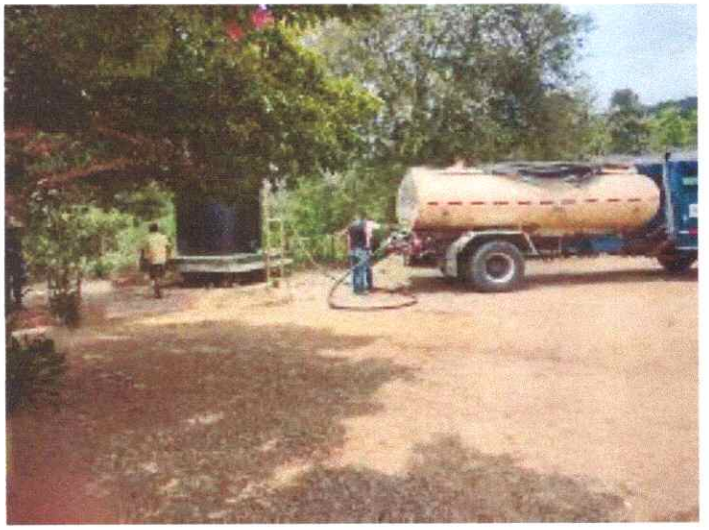





ACTIVIDAD: ***PERFILES PARA CONSTRUCCION (RIELES DE PAVIMENTO Y GUARDERAS .40 X 1.40)***







ACTIVIDAD: *EQUIPO TOPOGRAFICO*









ACTIVIDAD: *HERRAMIENTA MENOR*





ACTIVIDAD: *TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION*





ACTIVIDAD: ***TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO (TRITURADO, SUBBASE Y ARENA)***




ACTIVIDAD: *TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS VARIOS*









CANTIDADES SUMINISTRADAS Y/O EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES	VALORES
			PRESENTE MES	PRESENTE MES
1.	**SUMINISTRO DE MATERIALES**			
1.1	DERECHO DE CANTERA	M3	302,50	1.663.447,50
1.2	AGUA	LT	52.134,00	5.724.313,20
1.3	SUBBASE GRANULAR	M3	369,50	15.933.579,00
1.4	Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)	M3	112,40	8.248.249,20
1.5	Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)	M3	185,60	9.960.409,60
1.6	ANTISOL ROJO	KG	380,00	9.689.620,00
1.7	SELLADOR ELASTICO MONOCOMPONENTE CON ALTA RESISTENCIA MECÁNICA	KG		-
1.8	CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM	ML		-
1.9	ALAMBRE NEGRO NO.18	KG	105,00	682.395,00
1.10	SOLDADURA 6011X1/8	KG	20,90	480.679,10
2	**SUMINISTRO ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS**			
2.1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	HM	7,00	1.436.288,00
2.2	MOTONIVELADORA	HM	12,00	2.879.988,00
2.3	Compactador de rodillo potencia: 80hp, peso 7Ton	HM	12,00	1.559.988,00
2.4	CARRO TANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	HM		-
2.5	MEZCLADORA CON OPER. 9 P3	MES	1,00	2.849.999,00
2.6	PERFILES PARA CONSTRUCCIÓN (RIELES DE PAVIMENTO Y GUARDERAS .40 X 1.40)	MES	1,00	1.365.439,00
2.7	VIBRADOR DE CONCRETO CON OPERADOR	MES	1,00	4.317.599,00
2.8	REGLA VIBRATORIA PARA PAVIMENTO	MES	1,00	2.220.479,00
2.9	CORTADORA DE PAVIMENTO. CAPACIDAD DE DISCO: DESDE 12" HASTA 20" DE DIÁMETRO	MES	1,00	1.799.999,00
2.10	COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO)	MES	1,00	119.999,00
2.11	EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	MES	0,50	1.399.999,50
2.12	EQUIPO TOPOGRAFICO	MES	1,50	6.373.500,00
2.13	HERRAMIENTA MENOR	MES	1,50	3.585.000,00
3.	**TRANSPORTE**			
3.1	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	M3-KM	7.500,00	10.492.500,00

3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL AGREGADO (TRITURADO, SUBBASE Y ARENA)	M3-KM	12.202,00	17.070.598,00
3.3	TRANSPORTE MATERIALES Y EQUIPOS VARIOS	MES	1,00	849.999,00
SUB TOTAL CONTRATO				**110.704.067,10**
VALOR DE IVA				
	IVA	**19,00%**		21.033.772,75
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**131.737.839,85**

*En **ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS**, buscamos ser sus aliados estratégicos en cualquier operación donde se requiera la necesidad de equipos y maquinaria, buscando generar un crecimiento rentable y sostenible, no impactando el medio y siendo eficaz en todo proceso.*

Responsable de informe,

OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA
R.L. ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
