6129

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Angela Rodriguez
Fecha: 13-3-24 Hora: 2:30 PM

REMISIÓN DOCUMENTOS PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

520.85 – 0067

Yopal, 13 de marzo de 2024

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022 Y No. INTERNO 2622 de 2022-12-27
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2022-12-27
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
NOMBRE CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1.	Informe Mensual de Interventoría No. 7	184
2.	Oficio de Interventoría No. CNS-YOP-150-2024 del 30/01/2024 Demolición de Pavimento rígido (inc. Retiro) e= 0.15 m losas de pavimento en concreto rígido MR 41Kg/cm2 e= 0.18 m. Recibido por Correo electrónico Institucional DTC	2
3.	Oficio de Interventoría No. CNS-YOP-151-2024 del 09/02/2024 Demolición de Pavimento rígido (inc. Retiro) e= 0.15 m losas de pavimento en concreto rígido MR 41Kg/cm2 e= 0.18 m, solicitud certificados de calidad pintura acrílica Recibido por Correo electrónico Institucional DTC	2
4.	Oficio de supervisión No. 520.85.0049 del 13/02/2024 Invitación Mesa Técnica de trabajo	1
5.	Acta de Comité del 14/02/2024	3
TOTAL, FOLIOS REMITIDOS		192

Cordialmente,

ROBERT ASÍS HERNÁNDEZ CACHAY
DIRECTOR TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Supervisor

Proyectó: Erika J. Castiblanco García
Profesional de Apoyo Técnico DTC

Revisó: Viviana Campos
Profesional de Apoyo Jurídico DTC

6130

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



TOMO I

GOBERNACION DE CASANARE

Secretaria de Infraestructura

oct-23



6131

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORIA 2622 DE 2022

INFORME MENSUAL No. 7

R./L. GILBERTO GALINDO ALVARADO

Contratista

BRENDA RORAIMA BARRERA

Supervisor

YOPAL-CASANARE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

oct-23

6132

3

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 7
CONTRATO No. 2622 DE 2022

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2622 DE 2022
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD / MM / 2023
		AA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 7
CONTRATO No. 2622 DE 2022

6133

4

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

INTRODUCCIÓN

Actualmente la malla vial del área urbana del municipio de Yopal requiere de un mantenimiento periódico y rutinario teniendo en cuenta el estado actual en que se encuentran las vías del municipio; por tal razón la gobernación de Casanare vio la viabilidad de ejecutar un proyecto que tiene como alcance realizar el mantenimiento y la conservación de la capa de rodadura con lechada asfáltica de la calle 9 desde carrera 15 hasta diagonal 9 ambas calzadas, calle 10 desde transversal 18 hasta diagonal 9 ambas calzadas, calle 24 desde carrera 5 hasta carrera 50 ambas calzadas y carrera 18 (caño seco) desde calle 9 hasta calle 30 del municipio de Yopal.

Con el propósito de ejecutar el proyecto de **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL,** el departamento de Casanare, adelantó el proceso de licitación pública No **CAS-OAJ-LP-023-2022**, el cual fue adjudicado mediante la suscripción del contrato No. 2627 del 28 de diciembre de 2022 al **CONSORCIO FENIX,** representado legalmente por DANIEL ALEJANDRO ENGATIVÁ RODRIGUEZ con Nit. 901.666.131-3. Este contrato tiene un valor inicial de siete mil quinientos trece millones, ochocientos veinte mil trecientos ochenta y dos pesos ($7.513.820.382.00).

El Acta de Inicio de la ejecución contractual del Contrato de Obra, se firmó el 23 de Marzo de 2023; El plazo inicial para la ejecución del contrato de obra es de tres (3) meses, con fecha de terminación inicial el día 22 de Junio de 2023.

Para el contrato de Obra, se firmó la prorroga No.1 el día 21 de junio de 2023; La prorroga No. 1 es de tres (03) meses y el nuevo plazo de ejecución del Contrato de obra es de seis (6) meses, con fecha de terminación el dia 22 de septiembre de 2023.

Para el contrato de Obra, se firmó la prorroga No.2 el día 22 de septiembre de 2023; La prorroga No. 2 es de dos (02) meses y el nuevo plazo de ejecución del Contrato de obra es de ocho (8) meses, con fecha de terminación el dia 22 de noviembre de 2023.

Para Contratar la Interventoría, el Departamento de Casanare, adelanto el Concurso de Méritos Abierto CAS-OAJ-CMA-022-2022 el cual fue adjudicado mediante la suscripción del contrato No. 2622 del 27 de diciembre de 2022 al señor **GILBERTO GALINDO ALVARADO,** y cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Este contrato tiene un valor inicial de doscientos noventa y seis millones, quinientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta pesos ($296.568.860.00).

Para el desarrollo del contrato de consultoría, se firmó el Acta de Inicio el día 01 de Febrero de 2023; El plazo inicial para la ejecución del Contrato de Interventoria es de cuatro (4) meses, con fecha de terminación inicial el dia 31 de mayo de 2023.

Para el contrato de consultoría, se firmó la prorroga No.1 el día 25 de abril de 2023; La prorroga No. 1 es de dos (2) meses y el nuevo plazo de ejecución del Contrato de Interventoria es de seis (6) meses, con fecha de terminación el dia 31 de julio de 2023.

Para el contrato de consultoría, se firmó la prorroga No.2 el día 28 de julio de 2023; La prorroga No. 2 es de dos (2) meses y el nuevo plazo de ejecución del Contrato de Interventoria es de ocho (8) meses, con fecha de terminación el dia 30 de septiembre de 2023.

Para el contrato de consultoría, se firmó la prorroga No.3 el día 22 de septiembre de 2023; La prorroga No. 3 es de dos (2) meses y el nuevo plazo de ejecución del Contrato de Interventoria es de diez (10) meses, con fecha de terminación el dia 30 de noviembre de 2023.

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2022 DE 2022
1 DE OCTUBRE DE 2022 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD MM AA	

6134
5

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA No. 2627 DEL 2022

6135

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA


1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Yopal es un municipio colombiano, y la capital del Departamento de Casanare. Su extensión es de 2.595 km², y está localizado a 335 km del Distrito Capital de Bogotá.

Yopal está ubicada cerca del río Cravo Sur, en el piedemonte de la Cordillera Oriental, por su topografía el municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1.906 Km², Medio 106 Km² y Frío 25 Km².

Yopal se encuentra dividida en Diez (10) corregimientos denominados El Morro con 18 veredas, El Charte con 12, Mata de Limón con 6, La Chaparrera con 10, Alcaraván La Niata con 10, Tilodirán con 7, Morichal con 12, Tacarimena con 8, Punto Nuevo con 6 y Quebrada Seca con 3 veredas.

La localización especifica del proyecto de acuerdo con los estudios se encuentra ubicada principalmente sobre la calle 9 desde transversal 18 hasta diagonal 9 ambas calzadas, calle 10 desde carrera 18 hasta diagonal 9 ambas calzadas, calle 24 desde carrera 5 hasta carrera 50 ambas calzadas y carrera 18 (caño seco) desde calle 9 hasta calle 30.

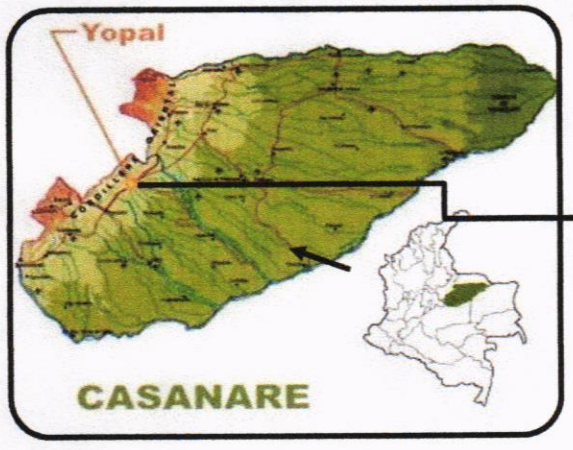




Con la ejecución del proyecto se beneficiarán de manera directa 180.513 personas residentes y habitantes del municipio de Yopal, Casanare. (Fuente. Resultados y proyecciones (2022) DANE).

	INFORME MENSUAL No. 7		CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA
		1	11	2023

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



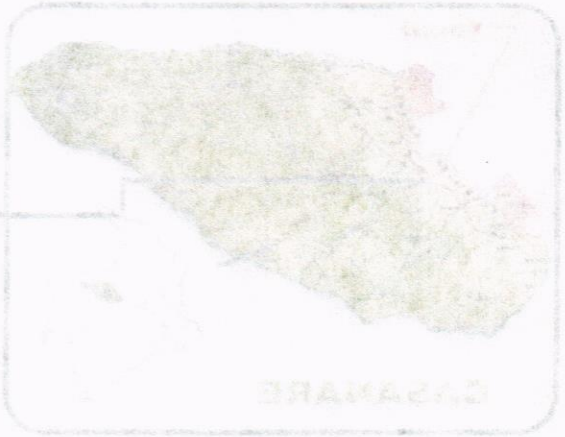

6136

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

1.1.1 ANTECEDENTES

En los ultimos años la malla vial urbana a venido presentando dos aspectos técnicos particulares, el primero, tiene que ver con las vías pavimentadas, la cual, presenta condiciones de marcado deterioro, situación que se ve reflejada con la presencia de fallas como baches, piel de cocodrilo, ojos de pescado, pérdida de material fino, entre otros de carácter funcional más no estructural, debido a que las superficies de rodadura se ven expuestas al uso y a las condiciones climáticas, en las principales vías, viéndose acelerada e incrementada tal situación por ser de alto tránsito, principalmente; el segundo, corresponde al estado de las vías en afirmado, localizadas en varias comunas, principalmente en zonas periféricas donde aún no se ha logrado consolidar un proceso urbanístico.

Dentro de las principales vías del área urbana del municipio de Yopal, se encuentran las calles 9, 10, y 24, y la carrera 18, estas vías son de gran importancia, pues hacen parte de la malla vial que pretende garantizar mayor fluidez a la ciudad, permitir una buena distribución del tráfico, reducir tiempos de transitabilidad, sin embargo, hoy en día se encuentra en mal estado parte de la infraestructura vial urbana, las condiciones de movilidad, transitabilidad y seguridad vial se ven gravemente afectadas por las escasas acciones de mantenimiento preventivo y rutinario.

En el diagnostico de las vías mediante la metodología PCI (índice de condición del pavimento) se pudo evidenciar fallas de tipo funcional tales como: fisuras en bloque, piel de cocodrilo, ojos de pescado huecos o baches, que a largo plazo sin las acciones de mantenimiento causan el deterioro y afectación de la vida útil de estas vías. Adicionalmente, estas condiciones han incidido en un aumento en el riesgo por accidentalidad, lo cual se puede observar en el boletín estadístico para Casanare, de fallecidos y lesionados de la Agencia de Seguridad Vial, del año 2022; cifras que se pueden disminuir al garantizar acciones de mantenimiento de las condiciones de las vías objeto del proyecto. Actualmente 28,83 km de las principales vías de la malla vial del área urbana del municipio de Yopal requiere de mantenimiento periódico y rutinario.

Para avanzar en la ejecución de proyectos de inversión se realizarán actividades de estudio técnicos y complementarios, estudios y diseños e investigaciones, gestiones y estructuración a los procesos de pre-inversión e inversión para el mantenimiento, rehabilitación y/o mantenimiento, para las vias.

Atendiendo a esto, el Departamento de Casanare en cabeza del señor Gobernador, ha tomado la decisión de realizar el mantenimiento y mejoramiento de las vías urbanas del municipio de Yopal y para esto decidió financiar el proyecto de "Mantenimiento y conservación a nivel de capa de rodadura con lechada asfáltica en la carrera 18 y las calles 9, 10, 24, del área urbana del municipio de Yopal".

Con el objeto de responder y dar cumplimiento a la necesidad, la administración departamental publicó terminos de referencia para el proyecto: " MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL".

Para vigilancia y control de la obra, tambien publicó términos de referencia para contratar "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2022 DE 2022
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD MM AA

6137

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

1.2 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 2627 DE 2022	
Nombre del Contratante	DEPARTAMENTO DE CASANARE
Nombre del Contratista	CONSORCIO FENIX. R/L DANIEL ALEJANDRO ENGATIVÁ RODRIGUEZ.
Interventor	GILBERTO GALINDO ALVARADO
Numero del Contrato de obra	2627 DE 2022
Fecha del Contrato	DICIEMBRE 28 DE 2022
Plazo inicial Contractual (Meses)	TRES (3) MESES
Plazo Actual (Meses)	OCHO (8) MESES
Valor Inicial	$7.513.820.382,00
Valor Anticipo	$2.791.579.818,03
Fecha de Iniciación	23 DE MARZO DE 2023
Fecha de terminación contractual	22 DE JUNIO DE 2023
Fecha de terminación actual	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
Objeto	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS		
DESCRIPCIÓN	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**
PRÓRROGA No. 1	TRES (03) MES	21 DE JUNIO DE 2023
PRÓRROGA No. 2	DOS (02) MESES	22 DE SEPT. DE 2023

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor Ejecutado Acumulado	$4.705.729.998,04	62,63%
Valor Ejecutado Presente Período	$1.075.833.547,16	14,32%
Por ejecutar	$2.808.090.383,96	37,37%
TOTAL ACUMULADO	**$4.705.729.998,04**	**62,63%**

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
		2822 DE 2022
		1 | 11 | 2023
	7 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	LG | MM | AA

2. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 2827 DE 2022

Acordeón de Contratista	DEPARTAMENTO DE CASANARE
Nombre del Contratista	CONSORCIO PRADO DAVID ALEJANDRO PINGATIVA ROMERO
Supervisor	GILBERTO GALINDO ALVARADO
Número del Contrato de obra	2827 DE 2022
Fecha del Contrato	DICIEMBRE 28 DE 2022
Plazo (Fecha Contractual ; Meses)	TRES (3) MESES
Plazo Actual (Meses)	OCHO (8) MESES
Valor Contrato	$7 613 850.382,00
Valor Adicion	$2.795.879.819,02
Fecha de Inicio	23 DE MARZO DE 2023
Fecha de Suscripción contractual	22 DE JUNIO DE 2023
Fecha de Terminación actual	22 DE NOVIEMBRE DE 2023
Obra	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE SABA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 19 Y LAS CALLES 9 Y 24 DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

PLAZOS O PRORROGAS Y ADENDAS

DESCRIPCION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCION
PRORROGA No. 1	TRES (03) MES	21 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA No. 2	DOS (02) MESES	22 DE SEPT DE 2023

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor Ejecutado Acumulado	$4 705 729 598,04	62,03%
Valor Ejecutado Periodo Periodo	$1 075 833.847 16	14,32 %
Por ejecutar	$2 808 050 383,96	37,37%
TOTAL ACUMULADO	$4.705.729.598,04	62,63%

6138

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

1.3 CONTROL CONTRACTUAL

ACTAS	
Acta de inicio	23 de marzo de 2023
Acta de entrega de anticipo	11 de abril de 2023
Acta Parcial No. 1	16 de junio de 2023
Acta de fijación de precios no previstos	06 de julio de 2023
Acta de modificación de cantidades de obra	06 de julio de 2023
Acta Parcial No. 2	31 de agosto de 2023
Acta Parcial No. 3	11 de Octubre de 2023
PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS	
Prórroga No. 1 (3 meses)	21 de junio de 2023
Prórroga No. 2 (2 meses)	22 de septiembre de 2023
OTROSI	
MODIFICATORIA No 1	28 de julio de 2023
VALORES	
Valor inicial del contrato	$ 7.513.820.382,00
Valor anticipo	$ 2.791.579.818,03
Pago Acta Parcial No. 1	$ 1.259.437.210,58
Valor Amortizado Acta Parcial No. 1	$ 467.913.700,41
Valor Girado Acta Parcial No. 1	$ 791.523.510,17
Pago Acta Parcial No. 2	$ 1.335.803.247,35
Valor Amortizado Acta Parcial No. 2	$ 496.285.670,48
Valor Girado Acta Parcial No. 2	$ 839.517.576,87
Pago Acta Parcial No. 3	$ 749.520.491,66
Valor Amortizado Acta Parcial No. 3	$ 278.466.368,82
Valor Girado Acta Parcial No. 3	$ 471.054.122,84
Valor Total Actualizado del Contrato	$ 7.513.820.382,00

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26.22 DE 2022
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	03 / 11 / 2023
		DD / MM / AA

6139

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

2. INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022

2. INFORME JURIDICO DEL CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022

6140

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

2.1 CONTROL DE POLIZAS

LA INTERVENTORÍA HA REVISADO Y VERIFICADO QUE EL CONTRATISTA CONSTITUYA LAS GARANTIAS SEGÚN CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA DEL CONTRATO 2627 DE 2022 Y QUE HAYAN SIDO APROBADAS POR LA OFICINA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

POLIZAS INICIALES

FECHA DE APROBACIÓN: 12/01/2023

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HDI SEGUROS	4000723	28-dic-2022	28-jul-2023	$751.382.039,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	HDI SEGUROS	4000723	28-dic-2022	28-jul-2023	$2.791.579.819,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	HDI SEGUROS	4000723	28-dic-2022	28-mar-2026	$375.691.020,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	HDI SEGUROS	4000723	28-dic-2022	28-dic-2025	$751.382.039,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	HDI SEGUROS	4000214	28-dic-2022	28-mar-2023	$580.000.000,00

ACTUALIZACIONES 1 (ACTA DE INICIO)

FECHA DE APROBACIÓN: 31/03/2023

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HDI SEGUROS	4000723	23-mar-2023	23-oct-2023	$751.382.039,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	HDI SEGUROS	4000723	23-mar-2023	23-oct-2023	$2.791.579.819,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	HDI SEGUROS	4000723	23-mar-2023	23-jun-2026	$375.691.020,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	HDI SEGUROS	4000723	28-dic-2022	28-dic-2025	$751.382.039,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	HDI SEGUROS	4000214	28-dic-2022	23-jun-2023	$580.000.000,00

ACTUALIZACIONES 2 (PRÓRROGA No. 1)

FECHA DE APROBACIÓN: 28/06/2023

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HDI SEGUROS	4000723	23-mar-2023	23-ene-2024	$751.382.039,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	HDI SEGUROS	4000723	23-mar-2023	23-ene-2024	$2.791.579.819,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	HDI SEGUROS	4000723	23-mar-2023	23-sep-2026	$375.691.020,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	HDI SEGUROS	4000723	28-dic-2022	28-dic-2025	$751.382.039,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	HDI SEGUROS	4000214	23-jun-2023	23-sep-2023	$580.000.000,00

6141

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

ACTUALIZACIONES 2 (PRÓRROGA No. 2)

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2023

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HDI SEGUROS	4000723	23-mar-2023	23-mar-2024	$751.382.039,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	HDI SEGUROS	4000723	23-mar-2023	23-mar-2024	$2.791.579.819,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	HDI SEGUROS	4000723	23-mar-2023	22-nov-2026	$375.691.020,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	HDI SEGUROS	4000723	28-dic-2022	28-dic-2027	$751.382.039,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	HDI SEGUROS	4000214	28-dic-2022	23-nov-2023	$580.000.000,00

6142 3



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4000723 Anexo: 7 Sucursal: YOPAL C.N.H 31

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de
010093007020-62	26/09/2023	28/12/2022	28/12/2027	7	23/09/2026	28/12/2027	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA	4003384	100,00		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO FENIX	901.666.131-3	CR 5 NO. 24 - 50	YOPAL.CASANARE	3106965106

Asegurado	NIT
DEPARTAMENTO DE CASANARE	892.099.216-6

Beneficiario	NIT
DEPARTAMENTO DE CASANARE	892.099.216-6

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CL 12 NO. 25 - 46 Ciudad: YOPAL Total Suma Asegurada $ 4.670.034.917,00

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
CUMPLIMIENTO	23/03/2023	23/03/2024	$ 751.382.039,00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	28/12/2022	28/12/2027	$ 751.382.039,00
MANEJO DEL ANTICIPO	23/03/2023	23/03/2024	$ 2.791.579.819,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	23/03/2023	22/11/2026	$ 375.691.020,00

Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	10/11/2023

PRIMA	$ 1.417.170,00
Otros conceptos	$ 0,00
Gastos de expedición	$ 7.000,00
IVA	$ 270.592,30
Prima total:	$ 1.694.762,30

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA. ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL $ 1.694.762,30

HDI SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

(415)7702963000020(8020)0100930070206 2(3900)000001694762(96)20231110

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.



6143

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4000723 Anexo: 7 Sucursal: YOPAL C.N.H 31

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de
010093007020-62	26/09/2023	28/12/2022	28/12/2027	7	23/09/2026	28/12/2027	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA	4003384	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO FENIX	901.666.131-3	CR 5 NO. 24 - 50	YOPAL,CASANARE	3106965106

Asegurado	Beneficiario
DEPARTAMENTO DE CASANARE	VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1	Ciudad:	Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
DEPARTAMENTO DE CASANARE	NIT	892.099.216-6

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLimite	Indice Variable %	Indice Variable Valor
CONTRATO		**$ 4.670.034.917,00**			
CUMPLIMIENTO		$ 4.670.034.917,00			
MANEJO DEL ANTICIPO		$ 2.791.579.819,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		$ 375.691.020,00			
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO		$ 751.382.039,00			
CUMPLIMIENTO		$ 751.382.039,00			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

6144

HDI SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO FENIX — Número de identificación: 901.666.131-3

Número Póliza: 4000723 Anexo: 7 Sucursal: YOPAL C.N.H 31 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

OBJETO DEL ANEXO:

SEGUN PRORROGA N° 02 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS EN DOS (02) MESES MAS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL CONTRACTUAL, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION DE CONFORMIDAD A LA PRORROGA ACA SUSCRITA ES EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

****

OBJETO DEL ANEXO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

****

OBJETO DEL ANEXO

SEGUN PRORROGA N°. 01 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS EN TRES (03) MESES MAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

****

OBJETO DEL ANEXO:

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28, SE TRASLADA LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL 23 DE MARZO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

****

OBJETO DEL ANEXO:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

****

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN ADELANTE EL "CONTRATO".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO FENIX NIT.: 901.666.131-3

INTEGRANTES DEL CONSORCIO FENIX NIT.: 901.666.131-3

DIAMANTE SAS NIT.900.303.143-0 PARTICIPACION 20%
CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. NIT. 844.002.568-2 PARTICIPACION 30%
CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT.900.308.912-0 PARTICIPACION 45%
MURCIA CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830.029.582-2 PARTICIPACION 5%

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FENIX DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ CC 74.814.388 DE YOPAL

DIRECCION DEL CONSORCIO:

DIRECCION DE CORREO: CARRERA 5 N° 24-50

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6145

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO FENIX — Número de identificación: 901.666.131-3

Número Póliza: 4000723 — Anexo: 7 — Sucursal: YOPAL C.N.H 31 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

DIRECCION ELECTRONICA: GERENCIA@CAMELINGENEIRIA.COM <mailto:GERENCIA@CAMELINGENEIRIA.COM>
TELEFONO: 3106965106
TELEFAX 6328605
CIUDAD: YOPAL CASANARE

ASEGURADO/BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DE CASANARE NIT.: 892.099.216-6

**** ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION: VIGENCIA TRES (3) AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA OBRA.

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6146



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4000214 Anexo: 6 Sucursal: YOPAL C.N.H 31

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	Hasta [d-m-a]	Certificado de
010093007021-83	26/09/2023	28/12/2022	23/11/2023	6	23/09/2023	23/11/2023	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA	4003384	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO FENIX	901.666.131-3	CR 5 NO. 24 - 50	YOPAL,CASANARE	3106965106

Asegurado	NIT
CONSORCIO FENIX	901.666.131-3

Beneficiario	NIT
TERCEROS AFECTADOS	999.999.989-0

PRODUCTO Y PRIMA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Código CIIU 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN...	TOTAL SUMA ASEGURADA $ 580.000.000,00	CONDUCTO DE PAGO CONTADO - CONTADO 45 DIAS
VALORES ASEGURADOS POR RAMO TÉCNICO	FECHA MÁXIMA PAGO PRIMA 10/11/2023	
RESP CIVIL EXT. $ 580.000.000,00	PRIMA NETA $ 0,00	PRIMA $ 242.328,77
	OTROS CONCEPTOS $ 0,00	OTROS CONCEPTOS $ 0,00
	GASTOS DE EXPEDICIÓN $ 0,00	GASTOS DE EXPEDICIÓN $ 7.000,00
	IVA $ 0,00	IVA $ 47.372,47
	PRIMA TOTAL: $ 0,00	PRIMA TOTAL: $ 296.701,24

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente poliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	www.hdi.com.co/pagos-en-linea/ PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL $ 296.701,24

HDI SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

(415)7702963000020(8020)010093007021 83(3900)000000296701(96)20231110

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.



6147

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

HDI SEGUROS

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Número Póliza: 4000214 Anexo: 6 Sucursal: YOPAL C.N.H 31

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	VIGENCIA SEGURO Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	VIGENCIA ANEXO Hasta [d-m-a]	Certificado de
010093007021-83	26/09/2023	28/12/2022	23/11/2023	6	23/09/2023	23/11/2023	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA	4003384	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO FENIX	901.666.131-3	CR 5 NO. 24 - 50	YOPAL,CASANARE	3106965106

Asegurado	Beneficiario
CONSORCIO FENIX	VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1 | Ciudad: YOPAL | Departamento: CASANARE

Dirección: MUNICIPIO DE YOPAL

Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
TERCEROS AFECTADOS	NIT	999.999.989-0

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLimite	Indice Variable	
				%	Valor
OBJETO GENERAL		**$ 580.000.000,00**			
RESP CIVIL EXT.		$ 580.000.000,00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO		$ 580.000.000,00			

DEDUCIBLES: 10.00% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00SMMLV - No Inferior A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

FIRMA AUTORIZADA

6148

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO FENIX — Número de identificación: 901.666.131-3

Número Póliza: 4000214 Anexo: 6 Sucursal: YOPAL C.N.H 31 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

OBJETO DEL ANEXO:

SEGUN PRORROGA N° 02 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS EN DOS (02) MESES MAS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL CONTRACTUAL, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION DE CONFORMIDAD A LA PRORROGA ACA SUSCRITA ES EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

****

OBJETO DEL ANEXO:

SEGUN PRORROGA N° 01 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS EN TRES (03) MESES MAS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

****

OBJETO DEL ANEXO:

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28, SE TRASLADA LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA A PARTIR DEL 23 DE MARZO DE 2023.

INICIO DE VIGENCIA DESDE EL 23/03/2023 HASTA EL 23/06/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

****

OBJETO DEL ANEXO:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO A 500 SMMLV AÑO 2023, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFICACION.

****

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 4000723.

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACORDE CON EL DECRETO 1082 DE 2015, POR DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES QUE SE OCASIONEN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y N° INTERNO 2627 DE 2022-12-28, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN ADELANTE EL "CONTRATO".

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO FENIX NIT.: 901.666.131-3

INTEGRANTES DEL CONSORCIO FENIX NIT.: 901.666.131-3

DIAMANTE SAS NIT.900.303.143-0 PARTICIPACION 20%
CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. NIT. 844.002.568-2 PARTICIPACION 30%
CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT.900.308.912-0 PARTICIPACION 45%
MURCIA CONSTRUCCIONES SAS NIT. 830.029.582-2 PARTICIPACION 5%

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO FENIX DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ CC 74.814.388 DE YOPAL

DIRECCION DEL CONSORCIO:

DIRECCION DE CORREO: CARRERA 5 N° 24-50
DIRECCION ELECTRONICA: GERENCIA@CAMELINGENEIRIA.COM <mailto:GERENCIA@CAMELINGENEIRIA.COM>
TELEFONO: 3106965106
TELEFAX 6328605

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HDI

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

6149

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Tomador: CONSORCIO FENIX — Número de identificación: 901.666.131-3

Número Póliza: 4000214 Anexo: 6 Sucursal: YOPAL C.N.H 31 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

CIUDAD: YOPAL CASANARE

ASEGURADO: CONSORCIO FENIX NIT.: 901.666.131-3/DEPARTAMENTO DE CASANARE NIT.: 892.099.216-6

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS/DEPARTAMENTO DE CASANARE NIT.: 892.099.216-6

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6150

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

2.2. ADICIONALES - SANCIONES Y ACTAS

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN PRESENTADO LOS SIGUIENTES TRÁMITES ANTE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022.

2.2.1 CONTROL ADICIONALES AL PLAZO

TIEMPO PRÓRROGA	NÚMERO	CAUSALES	FECHA PERFEC.
TRES (03) MESES	1	Atraso en obra debido a condiciones climaticas, demora en el despacho de emulsión.	21/06/2023
DOS (02) MESES	2	Atraso en obra debido a condiciones climáticas e inconvenientes con el despacho de emulsión.	22/09/2023

2.2.2 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

VALOR ADICIÓN	NÚMERO	CAUSALES	FECHA PERFEC.

2.2.3 SANCIONES

RESOLUCIÓN No	OBJETO	VALOR	FECHA
	En la ejecución de este contrato no se han presentado sanciones		

2.2.4 ACCIONES LEGALES

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE
Posible incumplimiento	El día 12/09/2023 se solicitó mediante oficio No. CNS-YOP-107-2023 las sanciones respectivas para un posible incumplimiento por parte del contratista de obra debido a los atrasos evidenciados en la obra. Dicha solicitud no surgió efecto teniendo en cuenta que la fecha en que se solicitó este posible incumplimiento era insuficiente y no se le garantizaba al contratista de obra el derecho a la defensa y contradicción como pilares fundamentales del derecho del debido proceso, en vista que el contrato tenía como fecha de terminación el día 22/09/2023, de acuerdo a memorando No. 0555, emitido por la Gobernación de Casanare mediante oficio No. 520.85-628 el día 13/09/2023.	12/09/2023	Direccion Tecnica de Construcciones	982-12-09-2023

2.2.5 ACTAS TRAMITADAS

NUMERO	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO DE OBRA	23/03/2023	N/A	
2	ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	11/04/2023	$ 2.791.579.818,03	
3	ACTA PARCIAL No. 1	16/06/2023	$ 1.259.437.210,58	
4	ACTA PARCIAL No. 2	31/08/2023	$ 1.335.803.247,35	
5	ACTA PARCIAL No. 3	11/10/2023	$ 749.520.491,66	

2.2.6 PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS

NUMERO	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	PRORROGA No. 1	21/06/2023	N/A	
2	PRORROGA No. 2	22/09/2023	N/A	

FIRMA

NOMBRE GILBERTO GALINDO ALVARADO
R/L CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORIA
		3572 DE 2022
	1 DE OCTUBRE DE 2023 A 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD / MM / AA

6157

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3. INFORME ADMINISTRATIVO

5. INFORME ADMINISTRATIVO

6152

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.1 CONTROL DE PERSONAL

Esta Interventoría realizó la verificó del cumplimiento por parte del contratista de obra respecto al personal propuesto en el contrato de obra No 2627 de 2022; así mismo se realizo la verificación del cumplimiento de pago de la seguridad social del personal de obra presente en este período.

3.1.1 CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

No.	Nombre Personal profesional propuesto	Cargo	Dedicación	Estado		Fecha Retiro
1	Carlos William Diaz Agudelo	Director de obra	50%	Afiliado	Activo	
2	Rafael Alberto Barragan Castro	Residente de obra	100%	Afiliado	Activo	
3	Orlando Javier Gonzalez Castiblanco	Especialista en pavimentos	50%	Afiliado	Activo	
4	Victor Alejandro Munevar Plazas	Especialista en gerencia de proyectos	100%	Afiliado	Activo	
5	Carlos Fernando Bohorquez Vargas	Inspector 1	100%	Afiliado	Activo	
6	Joselin Alarcon Torres	Inspector 1	100%	Afiliado	Activo	
7	Wilmar Quintana	Inspector 1	100%	Afiliado	Activo	
8	Luz Ayda Perilla Segura	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Afiliado	Activo	
9	Roque Eliecer Alba Gonzalez	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Afiliado	Activo	
10	William Ernesto Zafra Pardo	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Afiliado	Activo	
11	Yessika Patricia Urrego Sanchez	Auxiliar profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Desafiliado	Inactivo	18/07/2023
12	Yesenia Leal Camargo	Auxiliar profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Afiliado	Activo	
13	Diego Jose Vargas Mendez	Topografo	100%	Afiliado	Activo	
14	Jorge Enrique Gutierrez Engativa	Topografo	100%	Afiliado	Activo	
15	John Jairo Fuentes Fuentes	Topografo	100%	Afiliado	Activo	
16	Michel Janier Salazar Rivera	Topografo	100%	Afiliado	Activo	

CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL HOMOLOGADO

No.	Nombre Personal profesional propuesto	Cargo	Dedicación	Estado		Fecha Ingreso
1	Ruben Dario Bolaños Aguilar	Auxiliar profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Afiliado	Activo	19/07/2023

	INFORME MENSUAL No. 7		CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2822 DE 2022
1 DE OCTUBRE DE 2022 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3. CONTROL DE PERSONAL

Para la interventoría realizó la verificó del cumplimiento por parte del contratista de obra respecto al personal propuesto en el contrato de obra No 2827 de 2022, así mismo se realizo la verificación del cumplimiento de pago de la seguridad social del personal de obra presente en este periodo

3.1 CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

No.	Nombre Personal profesional propuesto	Cargo	Dedicación	Estado		Fecha Retiro
1	Carlos William Díaz Agudelo	Director de obra	50%	Aprobado	Activo	
2	Rafael Alberto Barragán Castro	Residente de obra	100%	Aprobado	Activo	
3	Cesar Javier Fonseca Castellanos	Residente en pavimentos	50%	Aprobado	Activo	
4	Víctor Alejandro Moreno Plazas	Especialista en gerencia de proyectos	100%	Aprobado	Activo	
5	Carlos Fernando Sotomayor Vargas	Ingeniero 1	100%	Aprobado	Activo	
6	Joselin Alemon Torres	Ingeniero 1	100%	Aprobado	Activo	
7	Wilmo Cardona	Ingeniero 1	100%	Aprobado	Activo	
8	Luz Ayde Peña Segura	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Aprobado	Activo	
9	Raque Eliecer Vela Gonzalez	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Aprobado	Activo	
10	William Ernesto Cañe Parra	Profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Aprobado	Activo	
11	Yeseka Ramos Urrego Sanchez	Auxiliar profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Desaprobado	Inactivo	15/07/2023
12	Yeimila Ruiz Camargo	Auxiliar profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Aprobado	Activo	
13	Oleg Jose Vargas Mendez	Topografo	100%	Aprobado	Activo	
14	Jorge Enrique Gutierrez Espitia	Topografo	100%	Aprobado	Activo	
15	Julio Jose Fuentes Fuentes	Topografo	100%	Aprobado	Activo	
16	Michel Javier Salazar Rivera	Topografo	100%	Aprobado	Activo	

3.2 CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL NO/OFICIO OBLIGATO

No.	Nombre Personal profesional propuesto	Cargo	Dedicación	Estado		Fecha Retiro
1	Ruben Dario Bolaños Aguilar	Auxiliar profesional en seguridad y salud en el trabajo	100%	Aprobado	Activo	15/07/2023

6153

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.1.2 CONTROL DE PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA/NO CALIFICADA

Se reporta el personal de obra que se tuvo en el período de ejecución de las actividades comprendido entre el 1 de octubre al 31 de octubre de 2023.

PERSONAL DE OBRA

No	NOMBRES	CEDULA	CARGO
1	ARIEL ALFONSO TORRES RODRIGUEZ	1.118.534.829	AYUDANTE TECNICO DE MICROPAVIMENTO/PATIERO
2	CARLOS ALBERTO ADAME VARGAS	4.214.374	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA GRADO 4
3	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	1.006.555.613	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
4	HERNAN DAZA BARRANTES	80.385.010	CONDUCTOR CAMION MICROPAVIMENTO
5	IRIS ANDREA BLANCO BERDUGO	1.118.557.770	CONTROLADOR VIAL
6	JEISSON FELIPE BONILLA CAMARGO	1.057.602.792	CADENERO
7	JUVENAL CHICO BOCANEGRA	6.801.937	AYUDANTE TECNICO DE MICROPAVIMENTO / PATIERO
8	MAGDALENA NIÑO CASTRO	1.024.567.502	CONTROLADOR VIAL
9	MARIA ISABEL ACHAGUA PIDIACHE	1.118.572.733	CONTROLADOR VIAL
10	JORGE ALEXIS GRANADOS CALDERON	4.284.998	CONTROLADOR VIAL
11	JURLEY ELIANA GOMEZ ADAME	1.118.561.674	INGENIERO AMBIENTAL
12	CRISTIAN YAMID PARRA MALDONADO	1.006.558.110	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
13	OSCAR JAVIER SUELTA BARRERA	1.007.703.698	PROFESIONAL DE APOYO TECNICO Y ADMON
14	SAUL ALBERTO RAMOS SIERRA	78.296.459	CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA
15	MARIA ELIZABETH OJEDA TORRES	1.116.642.196	CONTROLADOR VIAL
16	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA GARZON	4.193.974	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
17	HECTOR FORERO	17.548.074	OPERADOR MAQUINARIA PESADA GRADO 2
18	MARY LIZBETH SIERRA PINZON	1.118.531.636	CONTROLADOR VIAL
19	MARIA MAGDALENA DIAZ GALAN	1.117.324.520	CONTROLADOR VIAL
20	CARLOS JULIO GUEVARA CRIOLLO	11.251.123	CONDUCTOR
21	WISTON JAIRSON DAJOME CORTES	98.427.898	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
22	EDGAR PINZON SALCEDO	1.118.539.551	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA GRADO 4
23	ANGELICA ANDREA GUERRERO MONTES	1.006.456.346	CONTROLADOR VIAL
24	FABIO EMILIO CABRA SARMIENTO	9.431.049	CONTROLADOR VIAL
25	INOCENCIO VEGA GARCIA	1.118.538.710	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
26	YONNE ALEXANDER RUIZ OSTOS	1.116.785.840	AYUDANTE DE CONSTRUCCION

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26/22 DE 2022
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD / MM / AA

2. CONTROL DE PERSONAL MANO DE OBRA CALIFICADA

De reporta el (personal) de obra que se tuvo en el periodo de ejecución de las actividades comprendido entre el 1 de octubre al 31 de octubre de 2023.

PERSONAL DE OBRA

No.	NOMBRES	CEDULA	CARGO
1	ARIEL ALFONSO TORRES ROURIGUEZ	1.118.834.829	AYUDANTE TECNICO DE MICROPAVIMENTOPAVIMENTO
2	CARLOS ALBERTO ADAME VARGAS	1.234.374	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA GRADO A
3	HENRY DANIEL CAMPOS TARAZONE	1.008.058.813	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
4	HERNAN DAZA BARRANTES	80.368.070	CONDUCTOR DE MICROPAVIMENTO
5	LUIS ANDRES BUENO CERQUERA	1.118.857.270	CONTROLADOR VIAL
6	JEISSON STIBE MONILLA CAMARGO	1.007.302.702	CADENERO
7	JUVENAL CHICO BOCANEGRA	5.801.937	AYUDANTE TECNICO DE MICROPAVIMENTO (CADENERO)
8	MAGDALENA NIÑO CASTRO	1.020.857.202	CONTROLADOR VIAL
9	MARIA ISABEL ACEVEDO PINZON	1.118.872.733	CONTROLADOR VIAL
10	JORGE ALEXIS GRANADOS CALDERON	4.258.998	CONTROLADOR VIAL
11	YURLEY ELIANA GOMEZ ADAME	1.118.561.614	INGENIERO AMBIENTAL
12	CRISTIAN YAMID PARRA MALDONADO	1.006.856.110	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
13	OSCAR JAVIER SUELTA BARRERA	1.007.702.698	PROFESIONAL DE APOYO TECNICO Y ADMON
14	SAUL ALBERTO RAMOS SIERRA	79.468.468	CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA
15	MARIA ELIZABETH OJEDA TORRES	1.118.842.198	CONTROLADOR VIAL
16	LUIS ANTONIO CASTANEDA BARRON	4.795.374	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
17	NELSON FORERO	79.946.974	OPERADOR MAQUINARIA PESADA GRADO A
18	HENRY ELIZEETH RINCON	1.118.843.636	CONTROLADOR VIAL
19	MARIA MAGDALENA DIAZ CALAN	1.118.824.529	CONTROLADOR VIAL
20	CARLOS JULIO GUEVARA CHIQUITO	11.281.129	CONDUCTOR
21	WILTON JARISON GALONE CORTES	96.427.858	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
22	EDGAR RINZON SALCEDO	1.118.839.564	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA GRADO A
23	ANGELICA ANDREA GUERRERO MONTES	1.006.409.346	CONTROLADOR VIAL
24	FABIO EMILIO CABRA SARMIENTO	2.437.048	CONTROLADOR VIAL
25	INOCENCIO VEGA GARCIA	1.118.838.710	AYUDANTE DE CONSTRUCCION
26	YOHNE ALEXANDER RUIZ OSTOS	1.118.276.840	AYUDANTE DE CONSTRUCCION

6154

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.2 NOMINAS CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

6155

Nómina Detallada CONSORCIO FENIX

Nómina: Nomina Octubre

Periodo: 01/10/2023 - 30/10/2023

Datos empleados					Ingresos								Deducciones					
Item	Nombre y Apellidos	Cargo	Cedula	Dias	Sueldo	Auxilio de transporte	Horas extras diurnas 125%	Hora extra diurna dominical o festiva	Incapacidad por enfermedad general	Recargo nocturno	Recargo dominical o festivo	Total Ingresos	IBC	Fondo de salud	Fondo de pensión	Licencia no remunerada	Total deduccion	Neto a Pagar	Firma Empleado
1	ANGELICA ANDREA GUERRERO MONTES	CONTROLADOR VIAL	1006456346	30	1.044.000	126.546	154.256	49.362			138.213	1.512.377	1.540.499	55.500	63.400	154.668	118.900	1.393.477	
2	ARIEL ALFONSO TORRES RODRIGUEZ	AYUDANTE TECNICO DE MICROPAVIMENTO	1118534829	30	1.559.394	140.606						1.700.000	1.559.394	62.400	62.400		124.800	1.575.200	
3	CARLOS ALBERTO ADAME VARGAS	OPERADOR DE MINICARGADOR	4214374	30	1.160.000	140.606					138.213	1.438.819	1.298.213	52.000	52.000		104.000	1.334.819	
4	CARLOS FERNANDO BOHORQUEZ VARGAS	SUPERVISOR DE OBRA	80385694	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
5	CARLOS JULIO GUEVARA CRIOLLO	CONDUCTOR	11251123	30	1.500.000	140.606	359.043	63.830		4.468	357.447	2.425.394	2.284.788	91.400			91.400	2.333.994	
6	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA	7552750	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
7	CRISTIAN YAMID PARRA MALDONADO	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	1006558110	30	1.198.667	140.606	178.936	49.362		1.728	138.213	1.707.512	1.566.906	62.700	62.700		125.400	1.582.112	
8	DIEGO JOSE VARGAS MENDEZ	TOPOGRAFO	91496073	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
9	EDGAR PINZON SALCEDO	OPERADOR	1118539551	30	1.160.000	140.606					69.106	1.369.712	1.229.106	49.200	49.200		98.400	1.271.312	
10	FABIO EMILIO CABRA SARMIENTO	CONTROLADOR VIAL	9431049	30	1.198.667	140.606	265.319	49.362		3.455	138.213	1.795.622	1.655.016	66.300	66.300		132.600	1.663.022	
11	HECTOR FORERO	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	17548074	30	1.656.000	140.606						1.796.806	1.656.000	66.300	66.300		132.600	1.664.006	

6156

12	HENRY DANIEL CAMPOS TARACHE	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	1006555613	30	812.000	98.424	154.255		309.335		69.106	1.443.120	1.422.031	53.800	58.300	77.334	112.100	1.331.020	
13	HERNAN DAZA BARRANTES	CONDUCTOR VOLQUETA	80385010	30	1.559.394	140.606					185.800	1.885.800	1.745.194	69.900	69.900		139.800	1.746.000	
14	IRIS ANDREA BLANCO BERDUGO	CONTROLADOR VIAL	1118557770	30	1.198.667	140.606	240.638	49.362		3.455	207.319	1.840.047	1.699.441	68.000	68.000		136.000	1.704.047	
15	JOHN JAIRO FUENTES FUENTES	TOPOGRAFO	1118535656	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
16	JORGE ENRIQUE GUTIERREZ ENGATIVA	TOPOGRAFO	4179150	30	1.800.000	140.606						1.940.606	1.800.000	72.000	72.000		144.000	1.796.606	
17	JOSELIN ALARCON TORRES	SUPERVISOR DE OBRA	74183936	30	2.500.000			106.383			595.745	3.202.128	3.202.128	128.100	128.100		256.200	2.945.928	
18	JURLEY ELIANA GOMEZ ADAME	INGENIERA AMBIENTAL	1118561674	30	1.759.000	140.606		74.851			209.583	2.184.040	2.043.434	81.800	81.800		163.600	2.020.440	
19	JUVENAL CHICO BOCANEGRA	AYUDANTE TECNICO DE MICROPAVIMENTO	6801937	30	1.559.394	140.606						1.700.000	1.559.394	62.400	62.400		124.800	1.575.200	
20	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA GARZON	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	4193974	30	1.198.667	140.606	505.957	217.191		1.728	345.532	2.409.681	2.269.075	90.800	90.800		181.600	2.228.081	
21	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	SUPERVISOR HSE	1118539218	30	1.314.081	135.919					161.970	1.611.970	1.521.364	59.100	61.300	45.313	120.400	1.491.570	
22	MAGDALENA NIÑO CASTRO	CONTROLADOR VIAL	1024567502	30	1.198.667	140.606	252.979	69.106		3.455	138.213	1.803.026	1.662.420	66.500	66.500		133.000	1.670.026	
23	MARIA ELIZABETH OJEDA TORRES	CONTROLADOR VIAL	1116642196	30	1.121.334	135.919	265.319			3.455	69.106	1.595.133	1.536.548	58.400	63.200	77.334	121.600	1.473.533	
24	MARIA ISABEL ACHAGUA PIDIACHE	CONTROLADOR VIAL	1118572733	30	1.082.667	131.232	197.447			3.455	69.106	1.483.907	1.468.675	54.200	60.500	118.000	114.700	1.369.207	
25	MARIA MAGDALENA DIAZ GALAN	CONTROLADOR VIAL	1117324520	30	1.044.000	126.546	215.957	49.362		3.455	138.213	1.577.533	1.605.656	58.100	66.100	154.668	124.200	1.453.333	
26	MARY LIZBETH SIERRA PINZON	CONTROLADOR VIAL	1118531636	30	1.082.667	131.232	234.468	49.362		3.455	138.213	1.639.397	1.624.166	60.400	66.400	116.001	126.800	1.512.597	

6157

27	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO	1118531138	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
28	OSCAR JAVIER SUELTA BARRERA	PROFESIONAL DE APOYO	1007703698	30	1.459.000	140.606		12.417			173.838	1.785.861	1.645.255	65.900	65.900		131.800	1.654.061	
29	ROQUE ELIECER ALBA GONZALEZ	PROFESIONAL SISO	7165705	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
30	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	AUXILIAR SISO	19499531	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
31	SAUL ALBERTO RAMOS SIERRA	CONDUCTOR CAMION MICROPAVIMENTO	78296459	30	1.559.394	140.606						1.700.000	1.559.394	62.400	62.400		124.800	1.575.200	
32	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	1057585115	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
33	WILLIAM ERNESTO ZAFRA PARDO	PROFESIONAL SISO	79918963	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
34	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR DE OBRA	74859308	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
35	WISTON JAIRSON DAJOME CORTES	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	98427898	30	1.198.667	140.606						1.339.273	1.198.667	48.000	48.000		96.000	1.243.273	
36	YESENIA LEAL CAMARGO	AUXILIAR SISO	1118541314	30	1.160.000	140.606						1.300.606	1.160.000	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
TOTALES					46.684.327	4.822.786	3.024.574	839.950	309.335	32.109	3.481.149	59.194.230	55.112.764	2.176.000	2.124.300	741.318	4.300.300	53.686.124	

NETO A PAGAR	$ 53.686.124

Observaciones:
CARLOS GUEVARA NO REALIZA APORTE A PENSION POR DEVOLUCION DE SALDO
MARIA ACHAGUA PNR DIAS 23 AL 25 OCTUB-23
HENRY CAMPOS PNR 18 Y 23 OCTUBRE 2023
HENRY CAMPOS INCAP DIAS 16,17,19,20,27 AL 30 OCTUB-23
MARY SIERRA PNR DIAS 9,27 Y 28 OCTUB-23
LUZ PERILLA PNR DIA 9 OCTUB-23
MARIA OJEDA PNR 5 Y 10 OCTUBRE-23
MARIA DIAZ PNR 12,27,28 Y 30 OCTUBRE-23
ANGELICA GUERRERO PNR 20,21 Y 29,30 OCTUBRE-23

Elaboro:	Aprobo:
Johana Cardenas	

629
6158

Nómina detallada por concepto

CONSORCIO FENIX

Nómina: Liquidaciones Octubre

Periodo: 01/10/2023 - 30/10/2023

Datos empleados			Ingresos												Deducciones				
Item	Nombre	Identificación	Sueldo	Dias	Auxilio de transporte	Horas extras diurnas 125%	Hora extra diurna dominical o festiva	Recargo dominical o festivo	Cesantías liquidación contrato	Intereses cesantías liquidación contrato	Prima liquidación contrato	Vacaciones liquidación contrato	Total Ingresos	IBC	Fondo de salud	Fondo de pensión	Total deducciones	Neto a Pagar	Firma empleado
1	JORGE ALEXIS GRANADOS CALDERON	4284998	$ 425.334	11	$ 51.557	$ 67.872			$ 655.884	$ 33.423	$ 393.110	$ 295.820	$ 1.923.000	$ 493.206	$ 19.800	$ 19.800	$ 39.600	$ 1.883.400	
2	JEISSON FELIPE BONILLA CAMARGO	1057602792	$ 1.121.334	29	$ 135.924	$ 148.085			$ 892.238	$ 61.601	$ 484.314	$ 402.353	$ 3.245.849	$ 1.269.419	$ 50.800	$ 50.800	$ 101.600	$ 3.144.249	
3	YONNE ALEXANDER RUIZ OSTOS	1116785840	$ 116.000	3	$ 14.061	$ 30.851			$ 65.591	$ 323	$ 66.502	$ 29.982	$ 323.310	$ 146.851	$ 5.900	$ 5.900	$ 11.800	$ 311.510	
4	INOCENCIO VEGA GARCIA	1118538710	$ 1.121.334	29	$ 135.924	$ 154.255	$ 49.362	$ 207.319	$ 222.149	$ 3.287	$ 225.235	$ 102.156	$ 2.221.021	$ 1.532.270	$ 61.300	$ 61.300	$ 122.600	$ 2.098.421	
TOTALES			**$ 2.784.002**	**72**	**$ 337.466**	**$ 401.063**	**$ 49.362**	**$ 207.319**	**$ 1.835.862**	**$ 98.634**	**$ 1.169.161**	**$ 830.311**	**$ 7.713.180**	**$ 3.441.746**	**$ 137.800**	**$ 137.800**	**$ 275.600**	**$ 7.437.580**	

Observacion: Yone Ruiz renuncio 03 Octubre 2023
Jeisson Bonilla Terminacion Obra 29 Octubre 2023
Inocencio vega Renuncia 29 Octubre 2023
Jorge Granados Renuncia 11 octubre 2023

Elaboro:	Aprobó:
Johana Cardenas	

6159

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.3 PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

A continuación se relaciona el número de planilla y valor pagado por el contratista por concepto de seguridad durante la ejecucion del Contrato de Obra y se anexan el soportes de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Obra correspondientes al período del presente informe.

Nº	MES	FECHA PAGO	Nº PLANILLA	VR PAGADO
1	OCTUBRE DE 2023	7/11/2023	9458735132	$ 17.658.300,00
2	OCTUBRE DE 2023	8/11/2023	9458768678	$ 2.612.000,00
3	OCTUBRE DE 2023	8/11/2023	7898068538	$ 371.600,00
TOTAL APORTES				**$ 21.022.000,00**

			INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORIA 2022 DE 2022
			1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD MM AA

aportes en línea

Planilla Resumen

6160

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844002568	2	CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 24-50	YOPAL-CASANARE	6328506	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	266099030	9458768678	E	2023/11/17	2023/11/08	BANCO DE BOGOTA	0	$2,612,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)							$8,679,394	$1,453,800			$8,679,394	$347,200			$8,679,394	$347,200			$8,679,394		$463,800		$0	$0		$2,612,000
Centro de Trabajo: RIESGO TRABAJO 5 (1 Afiliados)							$6,500,000	$1,105,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,400		$0	$0		$2,077,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$6,500,000	$1,105,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,400		$0	$0		$2,077,400
1	CC	74381373	BARRAGAN CASTRO RAFAEL ALBERTO		230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400
Centro de Trabajo: RIESGO TRABAJO 1 (1 Afiliados)							$2,179,394	$348,800			$2,179,394	$87,200			$2,179,394	$87,200			$2,179,394		$11,400		$0	$0		$534,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)							$2,179,394	$348,800			$2,179,394	$87,200			$2,179,394	$87,200			$2,179,394		$11,400		$0	$0		$534,600
2	CC	74814388	ENGATIVA RODRIGUEZ DANIEL ALEJANDRO		230301	30	$2,179,394	$348,800	EPS005	30	$2,179,394	$87,200	CCF69	30	$2,179,394	$87,200	14-25	30	$2,179,394	0.522%	$11,400	30	$0	$0	SI	$534,600
Total Afiliados(2)							$8,679,394	$1,453,800			$8,679,394	$347,200			$8,679,394	$347,200			$8,679,394		$463,800		$0	$0		$2,612,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844002568	2	CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 24-50	YOPAL-CASANARE	6328506	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	266099030	9458768678	E	2023/11/17	2023/11/08	BANCO DE BOGOTA	0	$2,612,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,453,800	$0	$0	$1,453,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,453,800	$0	$0	$1,453,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$463,800	$0	$0	$463,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$463,800	$0	$0	$463,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$347,200	$0	$0	$347,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$347,200	$0	$0	$347,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$347,200	$0	$0	$347,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$347,200	$0	$0	$347,200
TOTAL				2	$2,612,000	$0	$0	$2,612,000

2023/11/09 12:47 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

61572

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666131	3	CONSORCIO FENIX	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO FENIX	CR 05 24 50	YOPAL-CASANARE	3184732061	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	263918071	9458735132	E	2023/11/09	2023/11/07	BANCO DE BOGOTA	0	$17,658,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118572733	ACHAGUA PIDIACHE MARIA ISABEL									X									230301	27	$1,352,675	$216,500	EPSC25	27	$1,352,675	$54,200	CCF69	27	$1,352,675	$54,200	14-25	27	$1,352,675	$94,200	27	$0	$0	SI	$419,100
2	CC	1118572733	ACHAGUA PIDIACHE MARIA ISABEL										X								230301	3	$116,000	$18,600	EPSC25	3	$116,000	$0	CCF69	3	$116,000	$0	14-25	3	$116,000	$0	3	$0	$0	SI	$18,600
3	CC	4214374	ADAME VARGAS CARLOS ALBERTO									X									230301	30	$1,298,213	$207,800	EPS005	30	$1,298,213	$52,000	CCF69	30	$1,298,213	$52,000	14-25	30	$1,298,213	$90,400	30	$0	$0	SI	$402,200
4	CC	74183936	ALARCON TORRES JOSELIN									X									230301	30	$3,202,128	$512,400	EPS037	30	$3,202,128	$128,100	CCF69	30	$3,202,128	$128,100	14-25	30	$3,202,128	$222,900	30	$0	$0	SI	$991,500
5	CC	7165705	ALBA GONZALEZ ROQUE ELIECER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1118557770	BLANCO BERDUGO IRIS ANDREA									X									230301	30	$1,699,441	$272,000	EPSC25	30	$1,699,441	$68,000	CCF69	30	$1,699,441	$68,000	14-25	30	$1,699,441	$118,300	30	$0	$0	SI	$526,300
7	CC	80385694	BOHORQUEZ VARGAS CARLOS FERNANDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
8	CC	19499531	BOLAÑOS AGUILAR RUBEN DARIO																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1057602792	BONILLA CAMARGO JEISSON FELIPE		X							X								X	230301	29	$1,269,419	$203,200	EPS037	29	$1,269,419	$50,800	CCF69	29	$1,671,772	$66,900	14-25	29	$1,269,419	$88,400	29	$0	$0	SI	$409,300
10	CC	9431049	CABRA SARMIENTO FABIO EMILIO									X									230301	30	$1,655,016	$264,900	EPS005	30	$1,655,016	$66,300	CCF69	30	$1,655,016	$66,300	14-25	30	$1,655,016	$115,200	30	$0	$0	SI	$512,700
11	CC	1006555613	CAMPOS TARACHE HENRY DANIEL									X									230301	20	$1,035,362	$165,700	EPSC25	20	$1,035,362	$41,500	CCF69	20	$1,035,362	$41,500	14-25	20	$1,035,362	$72,100	20	$0	$0	SI	$320,800
12	CC	1006555613	CAMPOS TARACHE HENRY DANIEL											X							230301	2	$77,334	$12,400	EPSC25	2	$77,334	$3,100	CCF69	0	$0	$0	14-25	2	$77,334	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
13	CC	1006555613	CAMPOS TARACHE HENRY DANIEL											X							230301	2	$77,334	$12,400	EPSC25	2	$77,334	$3,100	CCF69	0	$0	$0	14-25	2	$77,334	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
14	CC	1006555613	CAMPOS TARACHE HENRY DANIEL											X							230301	4	$154,667	$24,800	EPSC25	4	$154,667	$6,200	CCF69	0	$0	$0	14-25	4	$154,667	$0	0	$0	$0	SI	$31,000
15	CC	1006555613	CAMPOS TARACHE HENRY DANIEL										X								230301	1	$38,667	$6,200	EPSC25	1	$38,667	$0	CCF69	1	$38,667	$0	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0	SI	$6,200
16	CC	1006555613	CAMPOS TARACHE HENRY DANIEL										X								230301	1	$38,667	$6,200	EPSC25	1	$38,667	$0	CCF69	1	$38,667	$0	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0	SI	$6,200
17	CC	4193974	CASTAÑEDA GARZON LUIS ANTONIO									X									230301	30	$2,269,075	$363,100	EPS041	30	$2,269,075	$90,800	CCF69	30	$2,269,075	$90,800	14-25	30	$2,269,075	$158,000	30	$0	$0	SI	$702,700
18	CC	6801937	CHICO BOCANEGRA JUVENAL																		230301	30	$1,559,394	$249,600	EPS037	30	$1,559,394	$62,400	CCF69	30	$1,559,394	$62,400	14-25	30	$1,559,394	$108,600	30	$0	$0	SI	$483,000
19	CC	98427898	DAJOME CORTES WISTON JAIRSON									X									230301	30	$1,198,667	$191,800	EPS037	30	$1,198,667	$48,000	CCF69	30	$1,198,667	$48,000	14-25	30	$1,198,667	$83,500	30	$0	$0	SI	$371,300
20	CC	80385010	DAZA BARRANTES HERNAN									X									230201	30	$1,745,194	$279,300	ESSC24	30	$1,745,194	$69,900	CCF69	30	$1,745,194	$69,900	14-25	30	$1,745,194	$121,500	30	$0	$0	SI	$540,600
21	CC	7552750	DIAZ AGUDELO CARLOS WILLIAM																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
22	CC	1117324520	DIAZ GALAN MARIA MAGDALENA									X									230301	26	$1,450,988	$232,200	EPSC25	26	$1,450,988	$58,100	CCF69	26	$1,450,988	$58,100	14-25	26	$1,450,988	$101,000	26	$0	$0	SI	$449,400
23	CC	1117324520	DIAZ GALAN MARIA MAGDALENA										X								230301	1	$38,667	$6,200	EPSC25	1	$38,667	$0	CCF69	1	$38,667	$0	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0	SI	$6,200
24	CC	1117324520	DIAZ GALAN MARIA MAGDALENA										X								230301	2	$77,334	$12,400	EPSC25	2	$77,334	$0	CCF69	2	$77,334	$0	14-25	2	$77,334	$0	2	$0	$0	SI	$12,400
25	CC	1117324520	DIAZ GALAN MARIA MAGDALENA										X								230301	1	$38,667	$6,200	EPSC25	1	$38,667	$0	CCF69	1	$38,667	$0	14-25	1	$38,667	$0	1	$0	$0	SI	$6,200
26	CC	17548074	FORERO HECTOR																		25-14	30	$1,656,000	$265,000	EPS005	30	$1,656,000	$66,300	CCF69	30	$1,656,000	$66,300	14-25	30	$1,656,000	$115,300	30	$0	$0	SI	$512,900
27	CC	1118535656	FUENTES FUENTES JOHN JAIRO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
28	CC	1118561674	GOMEZ ADAME JURLEY ELIANA									X									230301	30	$2,043,434	$327,000	EPS005	30	$2,043,434	$81,800	CCF69	30	$2,043,434	$81,800	14-25	30	$2,043,434	$142,300	30	$0	$0	SI	$632,900
29	CC	4284998	GRANADOS CALDERON JORGE ALEXIS		X							X								X	230301	11	$493,206	$79,000	EPS005	11	$493,206	$19,800	CCF69	11	$789,026	$31,600	14-25	11	$493,206	$34,400	11	$0	$0	SI	$164,800
30	CC	1006456346	GUERRERO MONTES ANGELICA ANDREA									X									230301	26	$1,385,831	$221,800	EPS041	26	$1,385,831	$55,500	CCF69	26	$1,385,831	$55,500	14-25	26	$1,385,831	$96,500	26	$0	$0	SI	$429,300

2023/11/08 12:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

6162

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

6163

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666131	3	CONSORCIO FENIX	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO FENIX	CR 05 24 50	YOPAL-CASANARE	3184732061	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	263918071	9458735132	E	2023/11/09	2023/11/07	BANCO DE BOGOTA	0	$17,658,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$9,005,200	$0	$0	$9,005,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$924,200	$0	$0	$924,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$7,184,600	$0	$0	$7,184,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$710,800	$0	$0	$710,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$4,004,500	$0	$0	$4,004,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	40	$4,004,500	$0	$0	$4,004,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$2,334,700	$0	$0	$2,334,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	40	$2,334,700	$0	$0	$2,334,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				40	$2,313,900	$0	$0	$2,313,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	8	$468,800	$0	$0	$468,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$91,400	$0	$0	$91,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$69,900	$0	$0	$69,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$491,200	$0	$0	$491,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$204,700	$0	$0	$204,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$895,100	$0	$0	$895,100
TOTAL				40	$17,658,300	$0	$0	$17,658,300

2023/11/08 12:03 PM

6164

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901105420
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805	TELÉFONO:	4091821
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JGINGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7898068538	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			265417256

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCION	1	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 192.000	$ 200	$ 192.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 204.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 204.800	$ 300	$ 205.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 185.600	$ 200	$ 185.800
SUBTOTALES:										**$ 582.400**	**$ 700**	**$ 583.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 51.200	$ 100	$ 0	$ 51.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 94.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 94.400	$ 100	$ 0	$ 94.500
SUBTOTALES:													**$ 145.600**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 145.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 253.800	$ 253.800	$ 300	$ 0	$ 253.800
SUBTOTALES:									**$ 253.800**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 253.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 140.800	$ 200	$ 141.000
SUBTOTALES:			**$ 140.800**	**$ 200**	**$ 141.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																		

6165

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.4 SOPORTE PAGO FIC

A continuación relaciono el RESUMEN DE PAGOS FIC efectuado por el contratista del presente periodo y se anexan el soporte de pago correspondiente al presente período.

Nº	MES	FECHA PAGO	REFERENCIA	VR PAGADO
1	MARZO DE 2023	28/04/2023	88749787	$ 638.000,00
2	ABRIL DE 2023	28/04/2023	88760571	$ 899.000,00
3	MAYO DE 2023	5/06/2023	91035967	$ 1.218.000,00
4	JUNIO DE 2023	29/06/2023	92483133	$ 1.189.000,00
5	JULIO DE 2023	15/08/2023	95298007	$ 1.247.000,00
6	JULIO DE 2023	18/08/2023	95465191	$ 29.000,00
7	AGOSTO DE 2023	7/09/2023	96408564	$ 1.218.000,00
8	SEPTIEMBRE DE 2023	28/09/2023	97317110	$ 1.247.000,00
9	OCTUBRE DE 2023	7/11/2023	99346609	$ 1.160.000,00
TOTAL				**$ 8.845.000,00**



INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2822 DE 2022		
	7	2023
DD	MM	AA

3. SOPORTE PAGO RIC

A continuación relacionamos el RESUMEN DE PAGOS RIC elaborado por el contratista del presente periodo y se anexan el soporte de pago correspondiente al presente periodo

No.	MES	FECHA PAGO	REFERENCIA	VR. PAGADO
1	MARZO DE 2023	28/04/2023	88742787	$ 804.000,00
2	ABRIL DE 2023	29/05/2023	88.806271	$ 809.760,00
3	MAYO DE 2023	30/06/2023	91038907	$ 1.218.480,00
4	JUNIO DE 2023	28/07/2023	92483139	$ 1.189.000,00
5	JULIO DE 2023	18/08/2023	95298007	$ 1.247.630,00
6	JULIO DE 2023	18/08/2023	95488714	$ 29.950,00
7	AGOSTO DE 2023	27/09/2023	98406864	$ 1.278.000,00
8	SEPTIEMBRE DE 2023	26/10/2023	01217112	$ 1.247.000,00
9	OCTUBRE DE 2023	27/11/2023	05048606	$ 1.196.000,00
	TOTAL			$ 8.845.020,00

6166

El empleo es de todos | Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO FENIX identificado con el NIT 901666131, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
262702022-12-28	MTTO Y CONSER NIVEL CAPA	901666131	1,160,000	2023-10	07-NOV-2023	99346609
		Total	1,160,000			

Expedido por el SENA, a los siete (07) dias del mes de Noviembre de 2023

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-11-07

Generado por : EDWAR HERLEY MARTINEZ ROA

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 397207865 - 234192

SENA, MÁS TRABAJO

icontec ISO 9001 Certificado No. SC-CER339681-1

IQNet

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682
@SENAcomunica www.sena.edu.co

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el contratista con razón social CONSORCIO RENIX identificado con el NIT 901642317, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del portal electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Nº Liquidación Aportante	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
2402102022-12-2-8	MTTO Y CONSER NIVEL CAPA	90166131	1.160.000	2023-10	02-NOV-2023	6534402
		Total	1.160.000			

Expedido por el SENA, a los siete (07) días del mes de Noviembre de 2023

LA EXPEDICIÓN DE ESTA **CERTIFICACIÓN**, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE PAGOS Y QUE CONSTATE **EL CUMPLIMIENTO SIN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC**

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, **MAS TRABAJO**

Esta información no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades de derecho

La expedición de esta certificación no implica que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento de Contrato de Aprendizaje

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2023-11-02

Generado por : EDWAR HENRY MARTINEZ ROA

¿Desea saber si este certificado es auténtico? por favor ingrese a nuestro sitio de verificación de documentos electrónicos https://apps.sena.edu.co/ e ingrese el código de verificación: 6534402

SENA, **MAS TRABAJO**

Pag 1

6167

INFORME MENSUAL No. 7

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
1	11	2023
DD	MM	AA

3.5 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

GILBERTO GALINDO ALVARADO, identificado con CC 6.773.569 de Tunja (Boyacá), en mi condición de Representante legal y MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ, identificada con CC 23.810.112 de Nobsa (Boyacá) y con Tarjeta Profesional No. 60656-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora publica del contrato de Consultoría No 2622 de 2022. Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".
CERTIFICAMOS el pago de los aportes de la seguridad social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar; así como los pagos efectuados al FIC; montos contabilizados y pagados por el CONSORCIO FENIX NIT: Nit. 901.666.131-3, CAMEL INGENIERIA Y SEVICIOS LTDA: Nit: 844002568-2, quien hace parte de los consorciados del CONSORCIO FENIX y los aportes del señor ORLANDO JAVIER GONZALEZ CASTIBLANCO en calidad de especialista de pavimentos, quien pertenece a la empresa JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS NIT No 901105420-0, durante el periodo comprendido entre el 1 DE OCTUBRE Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2023, en desarrollo del contrato de Obra Pública No 2627, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL".

PERIODO	IBC	PENSION		SALUD		ARL		PARAFISCALES		CCF		No. PLANILLA	FIC	
		VR PAGADO	AFP	VR PAGADO	EPS	VR PAGADO	NOMBRE ARL	SENA VR PAGADO	ICBF VR PAGADO	VR PAGADO	NOMBRE CCF		VR PAGADO	REF. PAGO
OCTUBRE	$ 8.679.394,0	$ 1.453.800,0	Porvenir	$ 374.200,0	Sanitas	$ 463.800,0	Colmena	N.A.	N.A.	$ 374.200,0	Comfacasanare	9456958968	$ 1.160.000,0	99346609
	$ 58.554.510,0	$ 924.200,0	Colpensiones	$ 468.800,0	Capresoca	$ 4.004.500,0	Colmena	N.A.	N.A.	$2.334.700,0	Comfacasanare	9458768678		
				$ 91.400,0	Compensar									
		$ 7.184.600,0	Porvenir	$ 69.900,0	Coosalud movilidad									
				$ 46.400,0	Eps Sura									
		$ 710.800,0	Protección	$ 491.200,0	Nueva E.P.S.									
				$ 204.700,0	Nueva EPS Movil.									
		$ 185.600,0	Colfondos	$ 46.400,0	Salud Total									
				$ 895.100,0	Sanitas									
	$ 1.200.000,0	$ 192.000,0	Protección	$ 48.000,0	Compensar	$ 83.600,0	Sura	N.A.	N.A.	$ 48.000,0	Compensar	7895478549		

Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley 789/2002. Artículo 50 "Control a la evasión de los recursos parafiscales. La celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. Es importante resaltar lo establecido en el Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016. Adicionado al Artículo 114-1 del Estatuto Tributario: EXONERACIÓN DE APORTES. "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes"

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INTERVENTOR

MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ
T.P 60656-T

INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
2022 DE 2022		
[illegible]	[illegible]	2023
[illegible]	30th	AA

[illegible]

6168

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
		2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.6 CONTROL DE EQUIPOS

A continuacion se relaciona el equipo que dispuso el contratista de obra mes a mes, necesarios para garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales.

3.6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO PROPUESTO

No.	TIPO	CANTIDAD	REFERENCIA	CAPACIDAD EXIGIDA	ESTADO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	Excavadora de oruga	1	320 D	150 KN	Bueno	X		
2	Retrocargador 4x4 de llanta	1	416 E	134 hp	Bueno	X		
3	Retrocargador 4x4 de llanta	1	420 E	134 hp	Bueno	X		
4	Motoniveladora	2	120 K	140 kW	Bueno	X		
5	Motoniveladora	1	120M	141 kW	Bueno	X		
6	Vibrocompactador 15 Ton	3	CS-533E	150 Ton	Bueno	X		
7	Compactador neumatico	1	PT125R	98kW	Bueno	X		
8	Compactador neumatico	1	GRW 18	98kW	Bueno	X		
9	Carrotanque irrigador (Agua)	1	GD8JLSA	2000 Gl	Bueno	X		
10	Carrotanque irrigador (Imprimación)	1	7300	2000 Gl	Bueno	X		
11	Micro-pavimentadora	1	UHR-900	10 m^3	Bueno	X		
12	Micro-pavimentadora	1	T-800	10 m^3	Bueno	X		
13	Recicladora de Asfálto en sitio	2	WIRTGEN WR 2000	455 kW	Bueno	X		

A continuacion se relaciona el equipo necesario implementado para la ejecución de las actividades de obra del presente periodo.

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA (1 DE OCTUBRE - 31 DE OCTUBRE DE 2023)

No.	TIPO	CANTIDAD	REFERENCIA / PLACA	CAPACIDAD EXIGIDA	ESTADO	SI CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	Excavadora de oruga	1	320 D	150 KN	Bueno	X		
2	Retrocargador 4x4 de llanta	1	420 E	134 hp	Bueno	X		
3	Retrocargador 4x4 de llanta	0						
4	Motoniveladora	0						
5	Motoniveladora	1	120 M	141 kW	Bueno	X		
6	Vibrocompactador 15 Ton	2	CS-533E	150 Ton	Bueno	X		
7	Compactador neumatico	1	PT125R	98kW	Bueno	X		
8	Compactador neumatico	0						
9	Carrotanque irrigador (Agua)	1	GD8JLSA	2000 Gl	Bueno	X		
10	Carrotanque irrigador (Imprimación)	1	7300	3560 Gl	Bueno	X		
11	Micro-pavimentadora	1	UHR-900	10 m^3	Bueno	X		
12	Micro-pavimentadora	0						
13	Recicladora de Asfálto en sitio	2	WIRTGEN WR 2000	455 kW	Bueno	X		
14	Minicargador	1	603	680 Kg	Bueno	X		
15	Volqueta	1	SQW 155	8 Tn	Bueno	X		
16	Volqueta	1	WHF 556	8 Tn	Bueno	X		





	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.6 CONTROL DE EQUIPOS

Para la propuesta inicial del contrato de obra el contratista presento la disponibilidad de una maquinaria, la cual cumplía con las especificaciones exigidas dentro de los pliegos de condiciones.
Para llevar a cabo la ejecución de las actividades de bacheo (corte, demolición de pavimento, imprimación con emulsión, instalación de mezcla asfáltica, transporte de material), pavimento reciclado en frío en el lugar con emulsión asfáltica, y aplicación de lechada asfáltica con emulsión, se implemento solo una cantidad de la maquinaria propuesta, teniendo en cuenta que la disposicion de materia prima (emulsion asfaltica) no se produce en volumenes elevados y por ende no se puede desarrollar mayor cantidad de actividades de acuerdo a lo programado, lo cual genera el stand by de ciertos equipos y por consiguiente no es indispensable de toda la cantidad de maquinaria exigida por los pliegos de condiciones; de igual forma la maquinaria propuesta y que no está en operación aun cuenta con la disponibilidad para la ejecución de actividades dentro de la obra en caso de que se requiera.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA

Compactador Doble Rodillo	Motoniveladora	Carrotanque Agua
		
Recicladora	**Camión Micropavimento**	**Retrocargador**
		
Volqueta Sencilla SQW 155	**Volqueta Sencilla WHF 556**	**Carrotanque Emulsión**
		
Compactador Neumatico	**Minicargador**	**Recicladora**
		

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
		2402 DE 2022
		2039
		47

7 DE OCTUBRE DE 2022 a 31 DE OCTUBRE DE 2022

6170

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.7 CORRESPONDENCIA

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

3.7 CORRESPONDENCIA

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

6127

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.7.1 RESUMEN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA

RADICADO	FECHA DE EMISION	FECHA DE RECIBIDO	ASUNTO	DIRIGIDO A
11645	2/10/2023	3/10/2023	Solicitud de cumplimiento de reprogramación de obra.	CONSORCIO FENIX - ING DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ
11585	2/10/2023	3/10/2023	Entrega de informe de acta parcial No.3 contrato de obra No. 2627 de 2022	GOBERNACION DE CASANARE - ING BRENDA RORAIMA BARRERA
12257	13/10/2023	13/10/2023	Entrega de informes semanales No. 25, No. 26, No. 27, No. 28 y No.29	GOBERNACION DE CASANARE - ING BRENDA RORAIMA BARRERA
12258	12/10/2023	12/10/2023	Solicitud de cumplimiento de programación de obra.	CONSORCIO FENIX - ING DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ
12924	23/10/2023	25/10/2023	Citación a comité técnico de obra	GOBERNACION DE CASANARE - ING BRENDA RORAIMA BARRERA CONSORCIO FENIX - ING DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ
13315	28/10/2023	1/11/2023	Solicitud de cumplimiento de reprogramación de obra.	CONSORCIO FENIX - ING DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ

6172

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.7.2 RESUMEN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR INTERVENTORIA

RADICADO	FECHA DE EMISION	FECHA DE RECIBIDO	ASUNTO	REMITENTE	DIRIGIDO A	REQUIEREN CONTESTACION	
						SI	NO
	2/10/2023	2/10/2023	Entrega de certificados de calidad, informes de desempeño del cemento y caracterización de materiales	CONSORCIO FENIX - ING DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ	ING. GILBERTO GALINDO ALVARADO		X
	18/10/2023	#########	Solicitud sobre ejecución de contrato de obra pública 2672-2023 Gobernación de Casanare	COMUNIDAD	ING. GILBERTO GALINDO ALVARADO		X
	23/10/2023	#########	Respuesta a radicado 2023142856. Reiteración solicitud por parte del Consorcio FENIX. Referente a las construcciones (rampas de acceso)que causan obstrucciones sobre la cuneta	SECRETARIO(A) DE PLANEACIÓN MUNICIPAL SONIA SIDNEY RUIZ GARCIA	ING. GILBERTO GALINDO ALVARADO		X
	31/10/2023	#########	Entrega Informe Mensual Septiembre	CONSORCIO FENIX - ING DANIEL ENGATIVA RODRIGUEZ	ING. GILBERTO GALINDO ALVARADO		X

	INFORME MENSUAL No. 7		CONTRATO DE INTERVENTORIA
	7 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023		1582 DE 2022
	DD	MM	2023
			AA

7. RESUMEN DE CERTIFICACIÓN MENSUAL PRESENTADA POR EL INTERVENTOR

PAGADO	FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE RECIBIDO	CONCEPTO	REMITENTE	DESTINATARIO	SE ENCUENTRA EN LA CARPETA
						SI / NO
	27/10/2023	27/10/2023	Entrega de certificados de calidad, informe de desempeño de cemento y consola lectura de maquinas	CONSORCIO FENIX - ING DANIEL ENDIATIVA RODRIGUEZ	ING. GILBERTO SALCEDO LLAVARADO	X
	31/10/2023	31/10/2023	Solicitud sobre ejecución de contrato de obra Obra 2672 2023 Cobertización de Cabecera	COMUNIDAD	ING. GILBERTO SALCEDO A. LLAVARADO	X
	30/10/2023	30/10/2023	Respuesta a radicado 2023-7483860, Relacionado con la solicitud de parte del Consorcio FENIX Referente a la construcción de la obra de acceso(Vias internas)	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL SONIA SIOMEY RUIZ GARCIA	ING. GILBERTO SALCEDO LLAVARADO	X
	31/10/2023	31/10/2023	Entrega informe Mensual septiembre	CONSORCIO FENIX - ING DANIEL ENDIATIVA RODRIGUEZ	ING. GILBERTO SALCEDO LLAVARADO	X

3.8 COMITÉS DE OBRA

3.8 COMITÉS DE OBRA

6174

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

3.8.1 COMITÉS TÉCNICOS

No.	FECHA	DESCRIPCIÓN	TEMAS A TRATAR
-	-	-	-

Para el mes de octubre no se realizaron comités técnicos de obra.

6175

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

4. INFORME TÉCNICO DE OBRA 2627 DE 2022

4. INFORME TÉCNICO DE OBRA 26/27 DE 2022

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

A continuación se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO



Fig 1. Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m



Fig 2. Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m



Fig 3. Imprimación con Emulsión Asfáltica

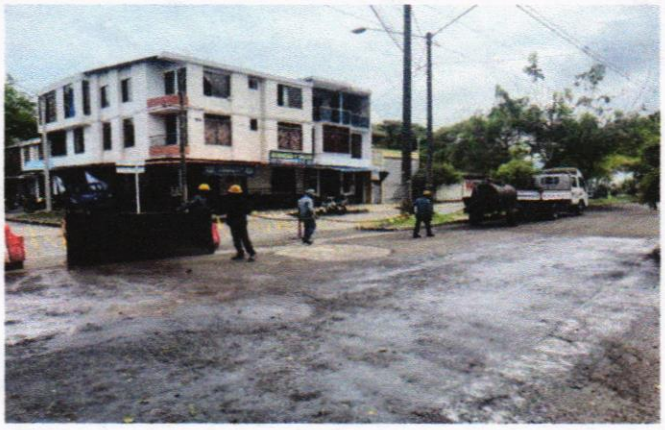


Fig 4. Imprimación con Emulsión Asfáltica



Fig 5.Imprimación con Emulsión Asfáltica



Fig 6. Imprimación con Emulsión Asfáltica













	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

A continuación se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

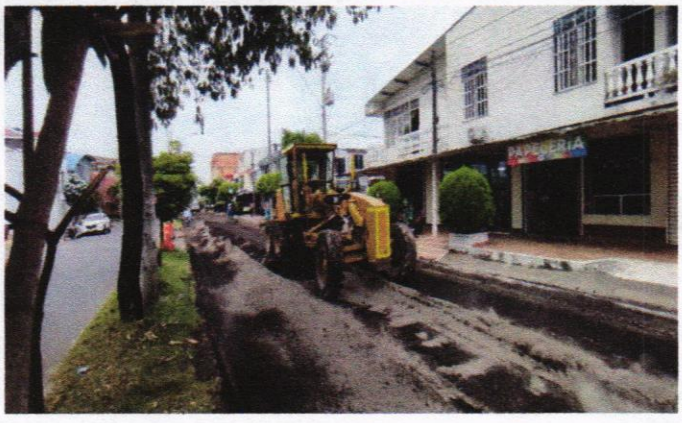


Fig 7. Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento.



Fig 8. Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento.

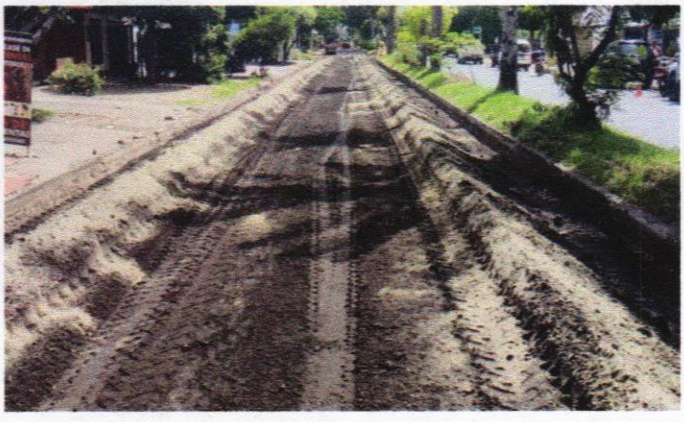


Fig 9.Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento.

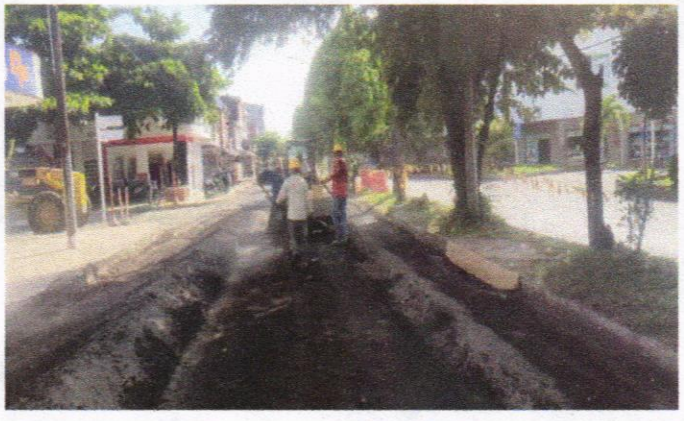


Fig 10. Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento.

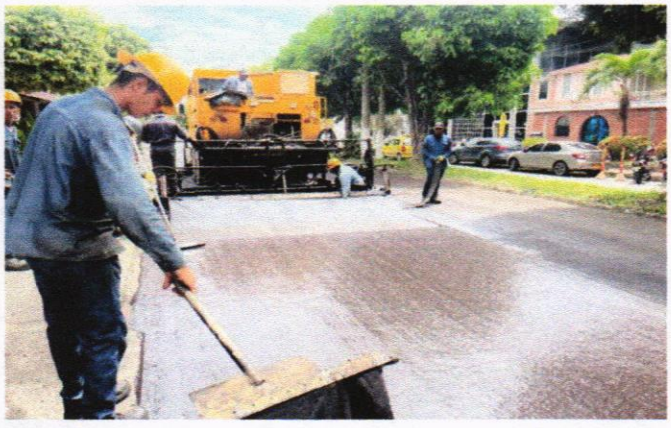


Fig 11. Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13



Fig 12. Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2022 DE 2022
	1 DE OCTUBRE DE 2022 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD MM AA 1 11 2023

A continuación se presenta las ACTIVIDADES REALIZADAS por el contratista en el periodo

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Fig 7. Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento

Fig 8. Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento

Fig 9. Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento

Fig 10. Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento

Fig 11. Lechada asfáltica con emulsión CRL-1hm, tipo LA-13

Fig 12. Lechada asfáltica con emulsión CRL-1hm, tipo LA-13

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

A continuación se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.

4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO



Fig 13. Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13



Fig 14. Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13



Fig 15. Implementación del PAGA

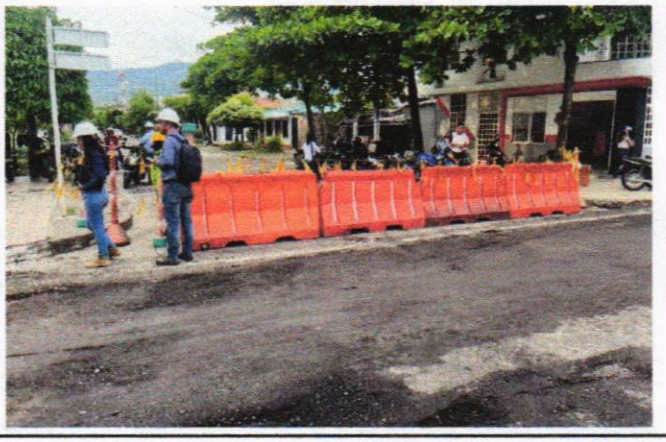


Fig 16. Implementación del PMT

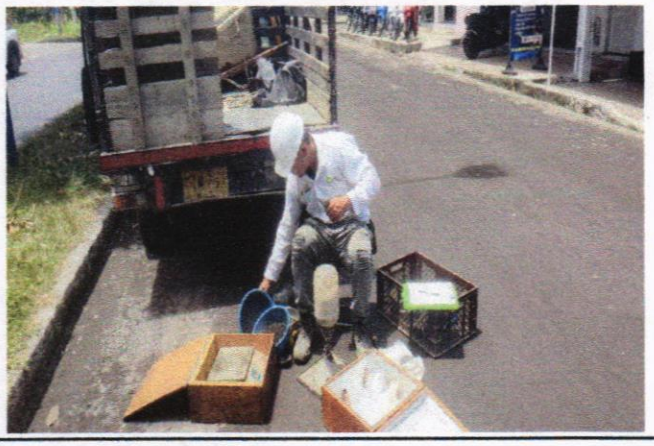


Fig 17. Toma de ensayos (densidad)

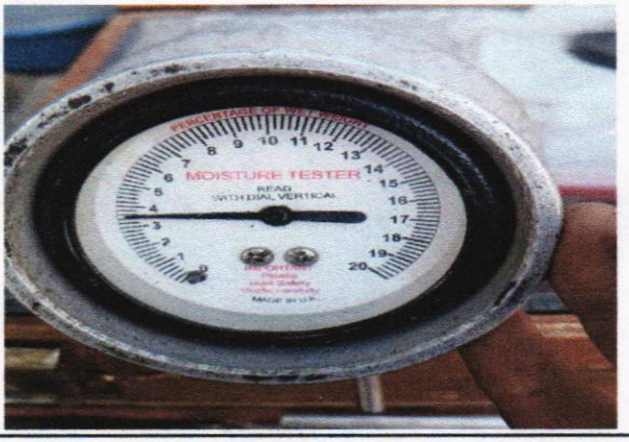


Fig 18. Toma de ensayos (Humedad)

6179

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

4.2 INCONVENIENTES Y DETERMINACIONES

A fecha de corte de este informe mensual se han presentado los siguientes inconvenientes y sus correspondientes determinaciones.

No.	INCONVENIENTE	DETERMINACIONES
1	Durante el mes de octubre de 2023 no se presentaron inconvenientes que afectaran el desarrollo del contrato.	

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2822 DE 2022
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD / MM / AA 1 / 11 / 2023

No.	INCONVENIENTE	DETERMINACIONES
	A fecha de corte de este informe mensual se han presentado los siguientes inconvenientes y sus correspondientes determinaciones.	
1	Durante el mes de octubre de 2023 no se presentaron inconvenientes que afectaran el desarrollo del contrato.	

6180

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

4.3 INFORMACIÓN AVANCE DE OBRA 2627 DE 2022

4.3 INFORMACION AVANCE DE OBRA 26/7 DE 2022

6181

	INFORME MENSUAL No. 7	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		1	11	2023
	1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023	DD	MM	AA

A continuación se presenta las ACTVIDADES REALIZADAS por el contratista en el presente periodo.

4.3.1 CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

1,12	Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m					UND	m2
Cantidades modificatoria N. 1	1136,48	*Cantidad ejecutada presente informe*	4,33	*Cantidad total ejecutada acumulada*	4,33		

Especificación Técnica: Esta actividad se realizó con el fin de demoler las losas de concreto que se encuentran en mal estado para su posterior reconstrucción, esta actividad se realiza de forma manual y mecanica de acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista.

2,02	Imprimación con Emulsión Asfáltica					UND	m2
Cantidades modificatoria N. 1	103267,72	*Cantidad ejecutada presente informe*	15244,78	*Cantidad total ejecutada acumulada*	89177,73		

Especificación Técnica: Esta actividad consiste en realizar la irrigación de un ligante "Emulsión asfáltica" sobre la carpeta de pavimento reciclado. Esta actividad se realiza con un equipo irrigador sobre todo el ancho de la vía intervenida con el fin de garantizar la impermeabilización del pavimento reciclado y evitar modificaciones en la estructura de la vía debido a la intrusión del agua.

2,04	Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm					UND	m2
Cantidades modificatoria N. 1	206535,44	*Cantidad ejecutada presente informe*	39298,22	*Cantidad total ejecutada acumulada*	126460,44		

Especificación Técnica: Para el desarrollo de esta actividad se está implementando la fórmula de trabajo entregada por el contratista de obra. La ejecución de esta actividad se está realizando con el camión Micropavimentador, el cual se encarga de aplicar una capa con espesor de 1cm; el diseño de la lechada se está llevando a cabo de acuerdo con las características solicitadas por el diseñador. Para el control de ensayos de esta actividad se está teniendo en cuenta las solicitudes y recomendaciones presentes en el artículo 433-22 de las especificaciones técnicas del INVIAS.

NP-01	Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento al 1%					UND	m3
Cantidades modificatoria N. 1	4341,23	*Cantidad ejecutada presente informe*	1062,18	*Cantidad total ejecutada acumulada*	3146,29		

Especificación Técnica: Para el desarrollo de esta actividad se está implementando la fórmula de trabajo entregada por el contratista de obra y los ajustes respectivos realizados por la firma encargada del diseño de la mezcla. Para el desarrollo de esta actividad se está implementando una maquina recicladora, la cual se encarga de frezar el pavimento existen e inyectarle emulsión asfáltica en proporciones del 2%, una vez finalizada esta actividad se realiza el cereado del material con motoniveladora y adición de cemento de acuerdo a la docificación establecida por el laboratorio (1%) y posterior compactación. Para el control de ensayos se está teniendo en cuenta las solicitudes presentes en el artículo 461-22 de las especificaciones técnicas del INVIAS.

3,01	Demolición de cunetas (Incl. Retiro)					UND	m3
Cantidades modificatoria N. 1	97,00	*Cantidad ejecutada presente informe*	1,75	*Cantidad total ejecutada acumulada*	8,79		

Especificación Técnica: Para el desarrollo de esta actividad se está implementando la fórmula de trabajo entregada por el contratista de obra y los ajustes respectivos realizados de acuerdo con el estado actual en que se encuentre la cuneta. El desarrollo de esta actividad se está realizando de forma manual y mecánica.



INFORME MENSUAL No. 7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
2022 DE 2022

1	17	2023
FO	MM	AA

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

6182

INFORME MENSUAL No. 7

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
2622 DE 2022		
1	11	2023
DD	MM	AA

4.4.1 -A RELACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN PERÍODO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	% EJECUTADO
1	BACHEO									
1,01	Corte en Carpeta Asfaltica	m	296,30	$ 11.749,00	$ 3.481.229,00	1523,25	$ 17.896.664,25	0,00	$ -	0,00%
1,02	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e. prom 0.10 m	m2	667,22	$ 30.652,00	$ 20.451.627,00	1.338,91	$ 41.040.269,32	0,00	$ -	0,00%
1,03	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1.569,75	$ 10.276,00	$ 16.130.751,00	1.569,75	$ 16.130.751,00	0,00	$ -	0,00%
1,04	Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m	m2	1.064,22	$ 153.272,00	$ 163.115.128,00	1.064,22	$ 163.115.127,84	0,00	$ -	0,00%
1,05	Acero de Transferencia liso de 60000 Psi	Kg	1.019,07	$ 9.765,00	$ 9.951.219,00	1.019,07	$ 9.951.218,55	0,00	$ -	0,00%
1,06	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	540,69	$ 45.797,00	$ 24.761.980,00	540,69	$ 24.761.979,93	0,00	$ -	0,00%
1,07	Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente manual con retiro	m3	133,44	$ 96.300,00	$ 12.850.272,00	233,21	$ 22.458.123,00	0,00	$ -	0,00%
1,08	Base granular (INV. 330.1)	m3	200,17	$ 123.954,00	$ 24.811.872,00	233,21	$ 28.907.312,34	0,00	$ -	0,00%
1,09	Imprimación con Emulsión Asfáltica	m2	667,22	$ 5.408,00	$ 3.608.326,00	1571,99	$ 8.501.321,92	0,00	$ -	0,00%
1,10	Mezcla Asfaltica MDC 2 o 19	m3	49,65	$ 1.089.166,00	$ 54.077.092,00	141,38	$ 153.986.289,08	0,00	$ -	0,00%
1,11	Transporte de material Petreo (vía pavimentada)	m3Km	2.353,31	$ 2.065,00	$ 4.859.585,00	3506,14	$ 7.240.179,10	0,00	$ -	0,00%
1,12	Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m	m2	1.064,22	$ 52.223,00	$ 55.576.761,00	1136,48	$ 59.350.395,04	4,33	$ 226.125,59	0,38%
1,13	Nivelacion de Pozos de Inspeccion (No incluye: Tapa ni aro)	Und	109,00	$ 233.815,00	$ 25.485.835,00	62,00	$ 14.496.530,00	0,00	$ -	0,00%
1,14	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa)	Und	109,00	$ 1.533.744,00	$ 167.178.096,00	62,00	$ 95.092.128,00	0,00	$ -	0,00%
1,15	Geomalla biaxial para refuerzo capas granulares 50 kn/m. Suministro e instal.	m2	667,22	$ 22.612,00	$ 15.087.179,00	777,53	$ 17.581.508,36	0,00	$ -	0,00%
2	ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA									
2,01	Sello de grietas	m	296,30	$ 5.441,00	$ 1.612.168,00	296,30	$ 1.612.168,30	0,00	$ -	0,00%
2,02	Imprimación con Emulsión Asfáltica	m2	111.014,92	$ 5.408,00	$ 600.368.687,00	103267,72	$ 558.471.829,76	15244,78	$ 82.443.770,24	14,76%
2,03	Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.187,93	$ 291.650,00	$ 2.096.359.785,00	2711,83	$ 790.905.219,50	0,00	$ -	0,00%
2,04	Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm	m2	222.029,84	$ 16.631,00	$ 3.692.578.269,00	206535,44	$ 3.434.890.902,64	39298,22	$ 653.568.696,82	19,03%
ITEMS NO PREVISTO										
NP-01	Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento al 1%	m3		$ 319.582,00	$ -	4341,23	$ 1.387.378.965,86	1062,18	$ 339.453.608,76	24,47%
3	ESTRUCTURAS DE DRENAJE									
3,01	Demolicion de cunetas (Incl. Retiro)	m3	163,69	$ 80.769,00	$ 13.221.078,00	97,00	$ 7.834.593,00	1,75	$ 141.345,75	1,80%
3,02	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	m	1.196,42	$ 55.002,00	$ 65.805.493,00	0,00	$ -		$ -	0,00%
ITEMS NO PREVISTO										
NP-02	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 PSI e=0.10m	m3		$ 749.711,00	$ -	115,98	$ 86.951.481,78		$ -	0,00%

6183

INFORME MENSUAL No. 7

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
2622 DE 2022		
1	11	2023
DD	MM	AA

4.4.1 -A RELACIÓN AVANCE DE EJECUCIÓN PERÍODO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	% EJECUTADO
4	**SEÑALIZACION**									
4,01	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	40.452,09	$ 4.519,00	$ 182.802.995,00	40452,09	$ 182.802.994,71	0,00	$ -	0,00%
4,02	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m2	4.012,36	$ 38.802,00	$ 155.687.593,00	4012,36	$ 155.687.592,72	0,00	$ -	0,00%
4,03	Estoperol metalico 14 x 4 cm	Und	1.000,00	$ 28.858,00	$ 28.858.000,00	1000,00	$ 28.858.000,00	0,00	$ -	0,00%
ÍTEMS NO PREVISTOS										
NP-03	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	ml		$ 76.411,00	$ -	300,00	$ 22.923.300,00	0,00	$ -	0,00%
NP-04	Resalto u ondulación (reductor de velocidad) concreto 4000 psi, 280 kg/cm2	ml		$ 564.652,00	$ -	54,00	$ 30.491.208,00	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL					**$ 7.438.721.020,00**		**$ 7.369.318.054,00**		**$ 1.075.833.547,16**	**14,60%**
PMT				$ 49.879.069,00	$ 49.879.069,00		$ 49.879.069,00	0,00	$ -	0,00%
PAGA				$ 25.220.293,00	$ 25.220.293,00		$ 25.220.293,00	0,00	$ -	0,00%
RECURSOS PENDIENTES DE INVERSIÓN							$ 69.402.966,00			
TOTAL					**$ 7.513.820.382,00**		**$ 7.513.820.382,00**		**$ 1.075.833.547,16**	**14,32%**

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

6184

INFORME MENSUAL No. 7

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
1	11	2023
DD	MM	AA

4.4.1 -B RELACION AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS POR MES							CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS (23 DE MARZO DE 2023 - 31 DE AGOSTO DE 2023)			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	MES 1 (23Marzo-30Abril)	MES 2 (1 mayo-31Mayo)	MES 3 (1 Junio-30Junio)	MES 4 (1 Julio-30Julio)	MES 5 (1 Agosto-31Agosto)	MES 6 (1 Sept.-30Sept.)	MES 7 (1 Oct.-31Oct.)	CANTIDAD	V. TOTAL	% EJECUTADO ACTIVIDAD	% INCIDENCIA
1	**BACHEO**																	
1,01	Corte en Carpeta Asfaltica	m	296,30	$ 11.749,00	$3.481.229,00	1523,25	$ 17.896.664,25	291,90	0,00	0,00	713,72	516,88	0,00	0,00	1.522,50	$ 17.887.852,50	99,95%	0,24%
1,02	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e. prom 0.10 m	m2	667,22	$ 30.652,00	$20.451.627,00	1.338,91	$ 41.040.269,32	235,79	0,00	0,00	519,48	310,95	0,00	0,00	1.066,22	$ 32.681.775,44	79,63%	0,43%
1,03	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1.569,75	$ 10.276,00	$16.130.751,00	1.569,75	$ 16.130.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
1,04	Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m	m2	1.064,22	$ 153.272,00	$163.115.128,00	1.064,22	$ 163.115.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
1,05	Acero de Transferencia liso de 60000 Psi	Kg	1.019,07	$ 9.765,00	$9.951.219,00	1.019,07	$ 9.951.218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
1,06	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	540,69	$ 45.797,00	$24.761.980,00	540,69	$ 24.761.979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
1,07	Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente manual con retiro	m3	133,44	$ 96.300,00	$12.850.272,00	233,21	$ 22.458.123,00	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	51,68	$ 4.976.784,00	22,16%	0,07%
1,08	Base granular (INV. 330.1)	m3	200,17	$ 123.954,00	$24.811.872,00	233,21	$ 28.907.312,34	0,00	0,00	0,00	51,68	0,00	0,00	0,00	51,68	$ 6.405.942,72	22,16%	0,09%
1,09	Imprimación con Emulsión Asfáltica	m2	667,22	$ 5.408,00	$3.608.326,00	1571,99	$ 8.501.321,92	235,79	0,00	0,00	519,48	310,95	0,00	0,00	1.066,22	$ 5.766.117,76	67,83%	0,08%
1,10	Mezcla Asfaltica MDC 2 o 19	m3	49,65	$ 1.089.166,00	$54.077.092,00	141,38	$ 153.986.289,08	19,92	0,00	0,00	49,61	28,66	0,00	0,00	98,19	$ 106.945.209,54	69,45%	1,42%
1,11	Transporte de material Petreo (vía pavimentada)	m3Km	2.353,31	$ 2.065,00	$4.859.585,00	3506,14	$ 7.240.179,10	186,52	0,00	0,00	948,03	268,17	0,00	0,00	1.402,72	$ 2.896.616,80	40,01%	0,04%
1,12	Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m	m2	1.064,22	$ 52.223,00	$55.576.761,00	1136,48	$ 59.350.395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33	4,33	$ 226.125,59	0,38%	0,00%
1,13	Nivelacion de Pozos de Inspeccion (No incluye: Tapa ni aro)	Und	109,00	$ 233.815,00	$25.485.835,00	62,00	$ 14.496.530,00	0,00	6,00	1,00	12,00	15,00	5,00	0,00	39,00	$ 9.118.785,00	62,90%	0,12%
1,14	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa)	Und	109,00	$ 1.533.744,00	$167.178.096,00	62,00	$ 95.092.128,00	0,00	6,00	1,00	10,00	17,00	5,00	0,00	39,00	$ 59.816.016,00	62,90%	0,80%
1,15	Geomalla biaxial para refuerzo capas granulares 50 kn/m. Suministro e instal.	m2	667,22	$ 22.612,00	$15.087.179,00	777,53	$ 17.581.508,36	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00	105,41	$ 2.383.530,92	13,56%	0,03%
2	**ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA**																	
2,01	Sello de grietas	m	296,30	$ 5.441,00	$1.612.168,00	296,3	$ 1.612.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
2,02	Imprimación con Emulsión Asfáltica	m2	111.014,92	$ 5.408,00	$600.368.687,00	103267,72	$ 558.471.829,76	0,00	29083,72	10189,38	22333,90	1808,61	10517,34	15244,78	89.177,73	$ 482.273.163,84	86,36%	6,42%
2,03	Pavimento Reciclado en frio en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	7.187,93	$ 291.650,00	$2.096.359.785,00	2711,83	$ 790.905.219,50	613,76	1563,97	530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,32	$ 789.881.528,00	99,87%	10,51%
2,04	Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm	m2	222.029,84	$ 16.631,00	$3.692.578.269,00	206535,44	$ 3.434.890.902,64	0,00	29083,72	10189,38	22333,90	0,00	25555,22	39298,22	126.460,44	$ 2.103.163.577,64	61,23%	27,99%
ITEMS NO PREVISTO																		
NP-01	Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento al 1%	m3		$ 319.582,00	$ -	4341,23	$ 1.387.378.965,86	0,00	0,00	0,00	1344,55	134,53	605,03	1062,18	3.146,29	$ 1.005.497.650,78	72,47%	13,38%
3	**ESTRUCTURAS DE DRENAJE**																	
3,01	Demolicion de cunetas (Incl. Retiro)	m3	163,69	$ 80.769,00	$13.221.078,00	97,00	$ 7.834.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	1,75	8,79	$ 709.959,51	9,06%	0,01%
3,02	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	m	1.196,42	$ 55.002,00	$65.805.493,00	0,00	$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
ITEMS NO PREVISTO																		
NP-02	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 PSI e=0.10m	m3		$ 749.711,00	$ -	115,98	$ 86.951.481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%



6185

INFORME MENSUAL No. 7

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
1	11	2023
DD	MM	AA

4.4.1 -B RELACION AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 1		CANTIDADES EJECUTADAS POR MES							CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS (23 DE MARZO DE 2023 - 31 DE AGOSTO DE 2023)			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	MES 1 (23Marzo-30Abril)	MES 2 (1 mayo-31Mayo)	MES 3 (1 Junio-30Junio)	MES 4 (1 Julio-30Julio)	MES 5 (1 Agosto-31Agosto)	MES 6 (1 Sept.-30Sept.)	MES 7 (1 Oct.-31Oct.)	CANTIDAD	V. TOTAL	% EJECUTADO ACTIVIDAD	% INCIDENCIA
4	SEÑALIZACIÓN																	
4,01	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	40452,09	$ 4.519,00	$182.802.995,00	40452,09	$ 182.802.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
4,02	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m2	4.012,36	$ 38.802,00	$155.687.593,00	4012,36	$ 155.687.592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
4,03	Estoperol metalico 14 x 4 cm	Und	1.000,00	$ 28.858,00	$28.858.000,00	1000,00	$ 28.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
ÍTEMS NO PREVISTOS																		
NP-03	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	ml		$ 76.411,00	$ -	300,00	$ 22.923.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
NP-04	Resalto u ondulación (reductor de velocidad) concreto 4000 psi, 280 kg/cm2	ml		$ 564.652,00	$ -	54,00	$ 30.491.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	0,00%	0,00%
SUBTOTAL					$7.438.721.020,00		$7.369.318.054,00									$4.630.630.636,04	62,84%	61,63%
PMT				$ 49.879.069,00	$ 49.879.069,00		$ 49.879.069,00									$ 49.879.069,00	100,00%	0,66%
PAGA				$ 25.220.293,00	$ 25.220.293,00		$ 25.220.293,00									$ 25.220.293,00	100,00%	0,34%
RECURSOS PENDIENTES DE INVERSIÓN							$ 69.402.966,00											
TOTAL					$7.513.820.382,00		$7.513.820.382,00									$ 4.705.729.998,04		62,63%

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
