6186

# INFORME MENSUAL No. 7

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 2023 |
| DD | MM | AA |

## 4.4.2 AVANCE OBRA EJECUTADA

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 1 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE INFORME (01 DE SEPT. - 30 DE SEPT. DE 2023) | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD | VR TOTAL | CANTIDAD | V.R EJECUTADO | CANTIDAD | V.R EJECUTADO |
| 1 | **BACHEO** | | | | | | | | | | |
| 1,01 | Corte en Carpeta Asfaltica | m | 296,30 | $ 11.749,00 | $3.481.229,00 | 1523,25 | $ 17.896.664,25 | - | $0,00 | 1.522,50 | $17.887.852,50 |
| 1,02 | Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e. prom 0.10 m | m2 | 667,22 | $ 30.652,00 | $20.451.627,00 | 1.338,91 | $ 41.040.269,32 | - | $0,00 | 1.066,22 | $32.681.775,44 |
| 1,03 | Acero de Refuerzo Grado 60 | Kg | 1.569,75 | $ 10.276,00 | $16.130.751,00 | 1.569,75 | $ 16.130.751,00 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| 1,04 | Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m | m2 | 1.064,22 | $ 153.272,00 | $163.115.128,00 | 1.064,22 | $ 163.115.127,84 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| 1,05 | Acero de Transferencia liso de 60000 Psi | Kg | 1.019,07 | $ 9.765,00 | $9.951.219,00 | 1.019,07 | $ 9.951.218,55 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| 1,06 | Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada) | m | 540,69 | $ 45.797,00 | $24.761.980,00 | 540,69 | $ 24.761.979,93 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| 1,07 | Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente manual con retiro | m3 | 133,44 | $ 96.300,00 | $12.850.272,00 | 233,21 | $ 22.458.123,00 | - | $0,00 | 51,68 | $4.976.784,00 |
| 1,08 | Base granular (INV. 330.1) | m3 | 200,17 | $ 123.954,00 | $24.811.872,00 | 233,21 | $ 28.907.312,34 | - | $0,00 | 51,68 | $6.405.942,72 |
| 1,09 | Imprimación con Emulsión Asfáltica | m2 | 667,22 | $ 5.408,00 | $3.608.326,00 | 1571,99 | $ 8.501.321,92 | - | $0,00 | 1.066,22 | $5.766.117,76 |
| 1,10 | Mezcla Asfaltica MDC 2 o 19 | m3 | 49,65 | $ 1.089.166,00 | $54.077.092,00 | 141,38 | $ 153.986.289,08 | - | $0,00 | 98,19 | $106.945.209,54 |
| 1,11 | Transporte de material Petreo (vía pavimentada) | m3Km | 2.353,31 | $ 2.065,00 | $4.859.585,00 | 3506,14 | $ 7.240.179,10 | - | $0,00 | 1.402,72 | $2.896.616,80 |
| 1,12 | Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m | m2 | 1.064,22 | $ 52.223,00 | $55.576.761,00 | 1136,48 | $ 59.350.395,04 | 4,33 | $226.125,59 | 4,33 | $226.125,59 |
| 1,13 | Nivelacion de Pozos de Inspeccion (No incluye: Tapa ni aro) | Und | 109,00 | $ 233.815,00 | $25.485.835,00 | 62,00 | $ 14.496.530,00 | - | $0,00 | 39,00 | $9.118.785,00 |
| 1,14 | Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa) | Und | 109,00 | $ 1.533.744,00 | $167.178.096,00 | 62,00 | $ 95.092.128,00 | - | $0,00 | 39,00 | $59.816.016,00 |
| 1,15 | Geomalla biaxial para refuerzo capas granulares 50 kn/m. Suministro e instal. | m2 | 667,22 | $ 22.612,00 | $15.087.179,00 | 777,53 | $ 17.581.508,36 | - | $0,00 | 105,41 | $2.383.530,92 |
| 2 | **ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA** | | | | | | | | | | |
| 2,01 | Sello de grietas | m | 296,30 | $ 5.441,00 | $1.612.168,00 | 296,3 | $ 1.612.168,30 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| 2,02 | Imprimación con Emulsión Asfáltica | m2 | 111.014,92 | $ 5.408,00 | $600.368.687,00 | 103267,72 | $ 558.471.829,76 | 15.244,78 | $82.443.770,24 | 89.177,73 | $482.273.163,84 |
| 2,03 | Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica. | m3 | 7.187,93 | $ 291.650,00 | $2.096.359.785,00 | 2711,83 | $ 790.905.219,50 | - | $0,00 | 2.708,32 | $789.881.528,00 |
| 2,04 | Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm | m2 | 222.029,84 | $ 16.631,00 | $3.692.578.269,00 | 206535,44 | $ 3.434.890.902,64 | 39.298,22 | $653.568.696,82 | 126.460,44 | $2.103.163.577,64 |
| ITEMS NO PREVISTO | | | | | | | | | | | |
| NP-01 | Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento al 1% | m3 | | $ 319.582,00 | $ - | 4341,23 | $ 1.387.378.965,86 | 1.062,18 | $339.453.608,76 | 3.146,29 | $1.005.497.650,78 |

6787

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 4.4.2 AVANCE OBRA EJECUTADA

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 1 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE INFORME (01 DE SEPT. - 30 DE SEPT. DE 2023) | | CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD | VR TOTAL | CANTIDAD | V.R EJECUTADO | CANTIDAD | V.R EJECUTADO |
| 3 | ESTRUCTURAS DE DRENAJE | | | | | | | | | | |
| 3,01 | Demolicion de cunetas (Incl. Retiro) | m3 | 163,69 | $ 80.769,00 | $13.221.078,00 | 97,00 | $ 7.834.593,00 | 1,75 | $141.345,75 | 8,79 | $709.959,51 |
| 3,02 | Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m) | m | 1196,42 | $ 55.002,00 | $65.805.493,00 | 0,00 | $ - | - | $0,00 | - | $0,00 |
| ITEMS NO PREVISTO | | | | | | | | | | | |
| NP-02 | Cuneta tipo C-1 concreto 3000 PSI e=0.10m | m3 | | $ 749.711,00 | $ - | 115,98 | $ 86.951.481,78 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| 4 | SEÑALIZACIÓN | | | | | | | | | | |
| 4,01 | Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1) | m | 40452,09 | $ 4.519,00 | $182.802.995,00 | 40452,09 | $ 182.802.994,71 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| 4,02 | Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros) | m2 | 4012,36 | $ 38.802,00 | $155.687.593,00 | 4012,36 | $ 155.687.592,72 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| 4,03 | Estoperol metalico 14 x 4 cm | Und | 1000,00 | $ 28.858,00 | $28.858.000,00 | 1000,00 | $ 28.858.000,00 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| ÍTEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | |
| NP-03 | Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m | ml | | $ 76.411,00 | $ - | 300,00 | $ 22.923.300,00 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| NP-04 | Resalto u ondulación (reductor de velocidad) concreto 4000 psi, 280 kg/cm2 | ml | | $ 564.652,00 | $ - | 54,00 | $ 30.491.208,00 | - | $0,00 | - | $0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | $7.438.721.020,00 | | $ 7.369.318.054,00 | | $1.075.833.547,16 | | $4.630.630.636,04 |
| PMT | | | | $ 49.879.069,00 | $49.879.069,00 | | $ 49.879.069,00 | - | $0,00 | - | $49.879.069,00 |
| PAGA | | | | $ 25.220.293,00 | $25.220.293,00 | | $ 25.220.293,00 | - | $0,00 | - | $25.220.293,00 |
| RECURSOS PENDIENTES DE INVERSIÓN | | | | | | | $ 69.402.966,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | $7.513.820.382,00 | | $ 7.513.820.382,00 | | $1.075.833.547,16 | | $4.705.729.998,04 |

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

6188

# INFORME MENSUAL No. 7

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 2023 |
| DD | MM | AA |

**1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023**

## 4.4.3 AVANCE DE OBRA EJECUTADA POR CAPITULOS

| ITEM | CAPITULO | TOTAL CONDICIONES CONTRACTUALES | TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS | PORCENTAJE CONDICIONES ACTUALIZADAS | EJECUTADO PRESENTE PERÍODO | | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACHEO | $ 601.426.952,00 | $ 680.509.797,73 | 9,06% | $ 226.125,59 | 0,00% | $ 249.104.756,27 | 3,32% |
| 2 | ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA | $ 6.390.918.909,00 | $ 6.173.259.086,06 | 82,16% | $ 1.075.466.075,82 | 14,31% | $ 4.380.815.920,26 | 58,30% |
| 3 | ESTRUCTURAS DE DRENAJE | $ 79.026.571,00 | $ 94.786.074,78 | 1,26% | $ 141.345,75 | 0,00% | $ 709.959,51 | 0,01% |
| 4 | SEÑALIZACION | $ 367.348.588,00 | $ 367.348.587,43 | 4,89% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| ÍTEMS NO PREVISTOS | | $ - | $ 53.414.508,00 | 0,71% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| PMT | | $ 49.879.069,00 | $ 49.879.069,00 | 0,66% | $ - | 0,00% | $ 49.879.069,00 | 0,66% |
| PAGA | | $ 25.220.293,00 | $ 25.220.293,00 | 0,34% | $ - | 0,00% | $ 25.220.293,00 | 0,34% |
| RECURSOS PENDIENTES DE INVERSIÓN | | - | $ 69.402.966,00 | 0,92% | | | | |
| **TOTAL COSTO DIRECTO** | | **$ 7.513.820.382,00** | **$ 7.513.820.382,00** | **100,0%** | **$ 1.075.833.547,16** | **14,32%** | **$ 4.705.729.998,04** | **62,63%** |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | INFORME MENSUAL No. 7 | |
|---|---|---|
| 2022 DE 2022 | | |
| 23 | | 2022 |
| DD | MM | AA |

| ITEM | CAPITULO | TOTAL CONDICIONES CONTRACTUALES | TOTAL CONDICIONES ACTUALIZADAS | PORCENTAJE CONDICIONES ACTUALIZADAS | EJECUTADO PRESENTE PERIODO | | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCHEO | $ 891.128.952,00 | $ 960.509.797,72 | 0,00% | $ 236.125,85 | 0,00% | $ 249.704.189,27 | 3,32% |
| 2 | ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA | $ 6.330.918.909,00 | $ 6.172.289.088,00 | 72,19% | $ 1.075.466.075,82 | 14,31% | $ 4.730.818.920,29 | 62,90% |
| 3 | RESTRUCTURAS DE DRENAJE | $ 79.026.871,00 | $ 94.758.074,78 | 1,23% | $ 141.415,73 | 0,00% | $ 736.709,71 | 0,01% |
| 4 | SEÑALIZACION | $ 367.349.069,00 | $ 397.849.087,42 | 4,89% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| ITEMS NO PREVISTOS | | $ - | $ 52.414.602,00 | 0,71% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| PMT | | $ 49.879.050,00 | $ 49.879.050,00 | 0,56% | $ - | 0,00% | $ 49.879.050,00 | 0,66% |
| PASA | | $ 29.220.293,00 | $ 29.220.293,00 | 0,34% | $ - | 0,00% | $ 29.220.293,00 | 0,39% |
| RECUPERDO REMANENTES DE DEVENACION | | $ - | $ 69.402.396,00 | 0,95% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ 7.847.830.342,00 | $ 7.613.850.382,00 | 100,00% | $ 1.075.843.541,16 | 14,32% | $ 4.765.728.908,04 | 62,92% |

6189

# INFORME MENSUAL No. 7

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 2023 |
| DD | MM | AA |

**1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023**

## 4.4.4 RELACION AVANCE DE ACTAS

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA DE OBRA** | CONSORCIO FENIX |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTOR** | GILBERTO GALINDO ALVARADO |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2622 DE 2022** | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 296.568.860,00** |
| **VALOR ANTICIPO 37%** | $ 109.730.478,20 |


| **CONTRATO DE OBRA No. 2627 DE 2022** | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 7.513.820.382,00** |
| **VALOR ANTICIPO 37%** | $ 2.791.579.818,03 |

| ACTA DE OBRA No | FECHA | RESUMEN SEGÚN ACTAS | | | RESUMEN DE ACTAS ACUMULADO A LA FECHA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR ACTA | VALOR AMORTIZACION ANTICIPO | VALOR NETO PAGADO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | VALOR AMORTIZACION ACUMULADA | VALOR NETO PAGADO ACUMULADO | ANTICIPO POR AMORTIZAR | VALOR FALTANTE POR PAGAR |
| 1 | 16-jun-23 | $ 1.259.437.210,58 | $ 467.913.700,41 | $ 791.523.510,17 | $1.259.437.210,58 | $ 467.913.700,41 | $ 791.523.510,17 | $ 2.323.666.117,62 | $ 6.254.383.171,42 |
| 2 | 31-ago-23 | $ 1.335.803.247,35 | $ 496.285.670,48 | $ 839.517.576,87 | $2.595.240.457,93 | $ 964.199.370,89 | $ 1.631.041.087,04 | $ 1.827.380.447,14 | $ 4.918.579.924,07 |
| 3 | 11-oct-23 | $ 749.520.491,66 | $ 278.466.368,82 | $ 471.054.122,84 | $3.344.760.949,59 | $ 1.242.665.739,71 | $ 2.102.095.209,88 | $ 1.548.914.078,32 | $ 4.169.059.432,41 |

6190


| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |


4.4.5-A GRAFICO AVANCE DE OBRA EJECUTADO PERIODO

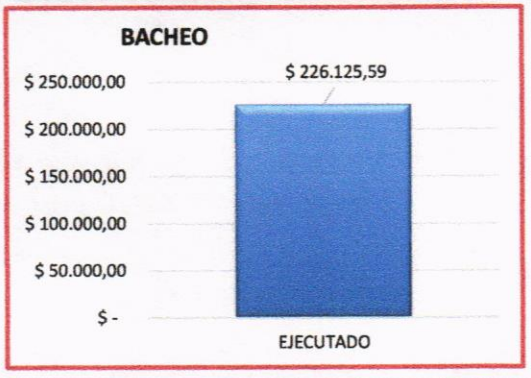








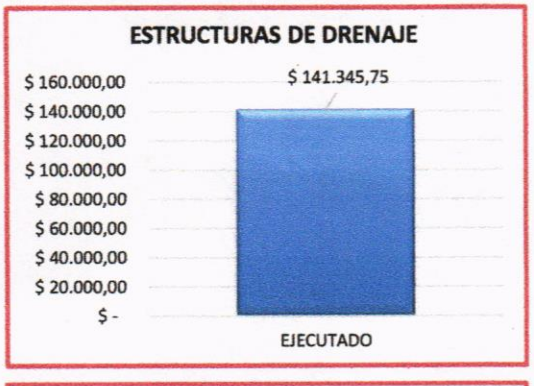





| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

4.4.5 GRAFICO AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS. EJECUTADO



6192
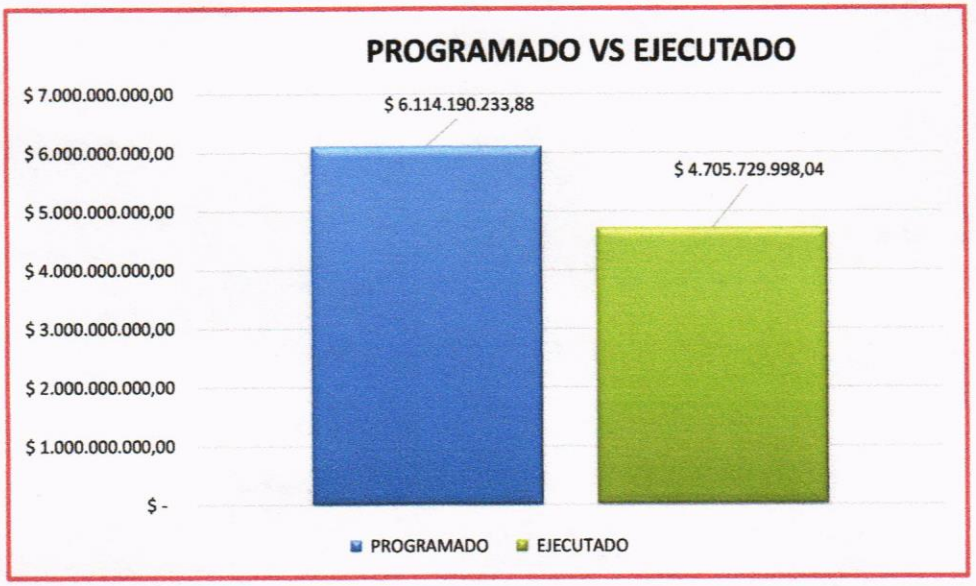
# INFORME MENSUAL No. 7

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 2023 |
| DD | MM | AA |

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

## 4.4.5-B GRAFICO AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO

### BACHEO




### ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA




### ESTRUCTURAS DE DERNAJE




### SEÑALIZACIÓN





### ÍTEMS NO PREVISTOS




### PMT




### PAGA

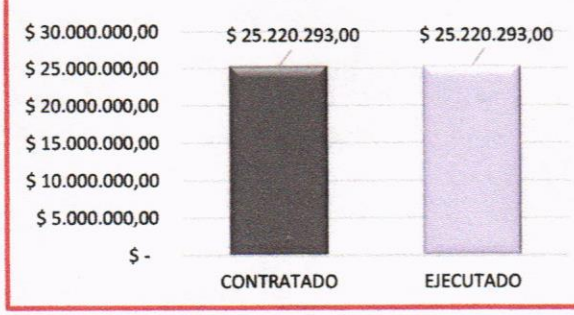

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2822 DE 2022

# INFORME MENSUAL No. 7

1 DE OCTUBRE DE 2024 A 31 DE OCTUBRE DE 2024


AA | MM | DD | 2024

## 2.2.3 SEGUIMIENTO AVANCES DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO

6193

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 4.4.5 GRAFICO AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO

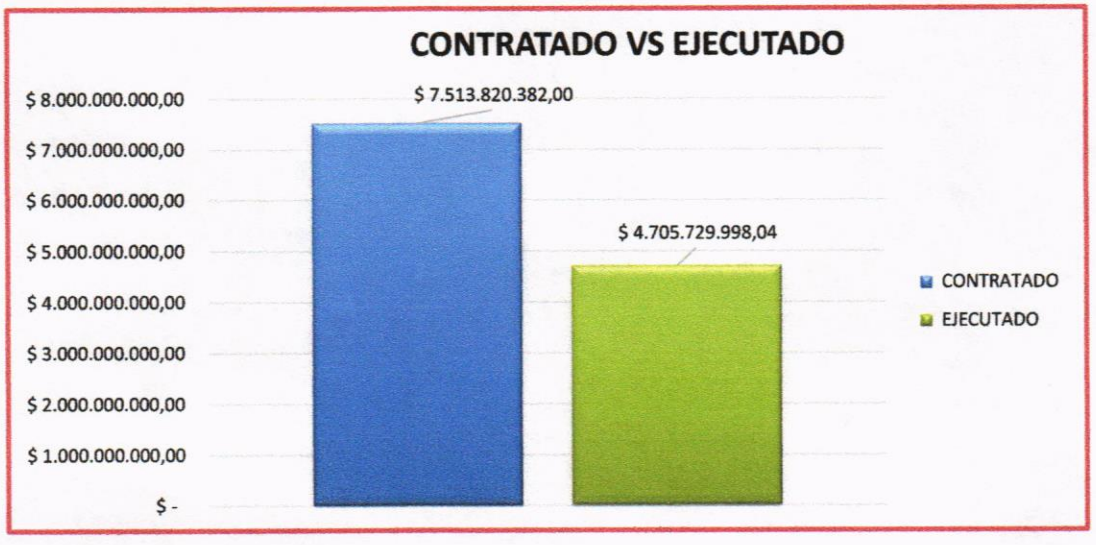


| | | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2022 DE 2022 |
| DEL 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | | |
| DD | MM | AA |


4.1 GRÁFICO AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2627 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 4.4.6 GRAFICO DE EJECUCIÓN SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA

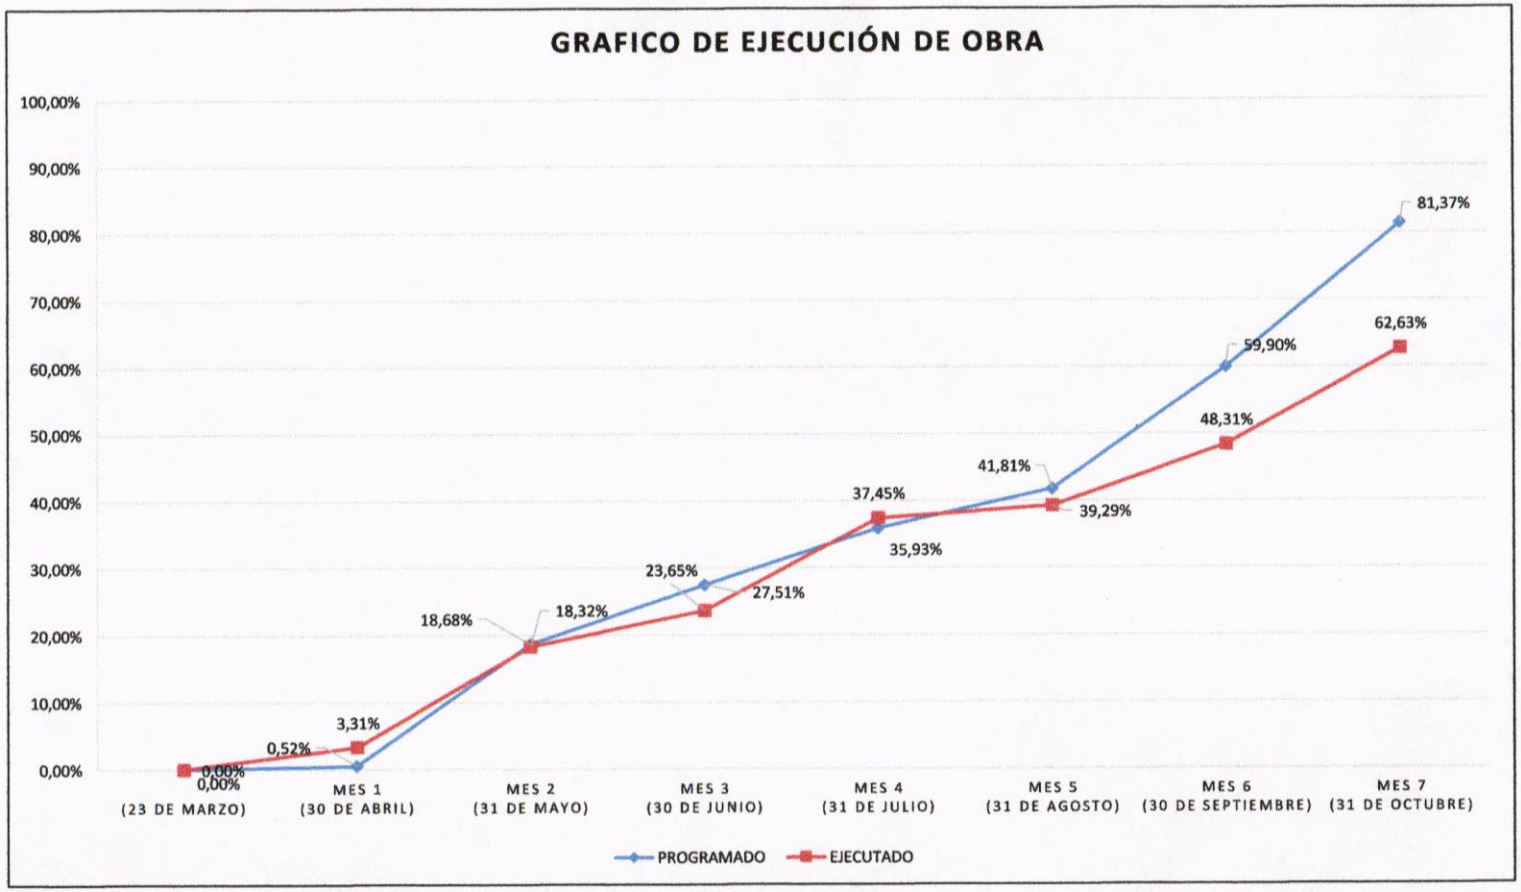



LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO DEL 61,93%, FRENTE A UN 81,37% PROGRAMADO AL DIA DE CORTE DE INFORME MENSUAL No. 07, 31 DE OCTUBRE DE 2023, LO QUE EVIDENCIA UN ATRASO DE 18.74% EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 2627 DE 2022.

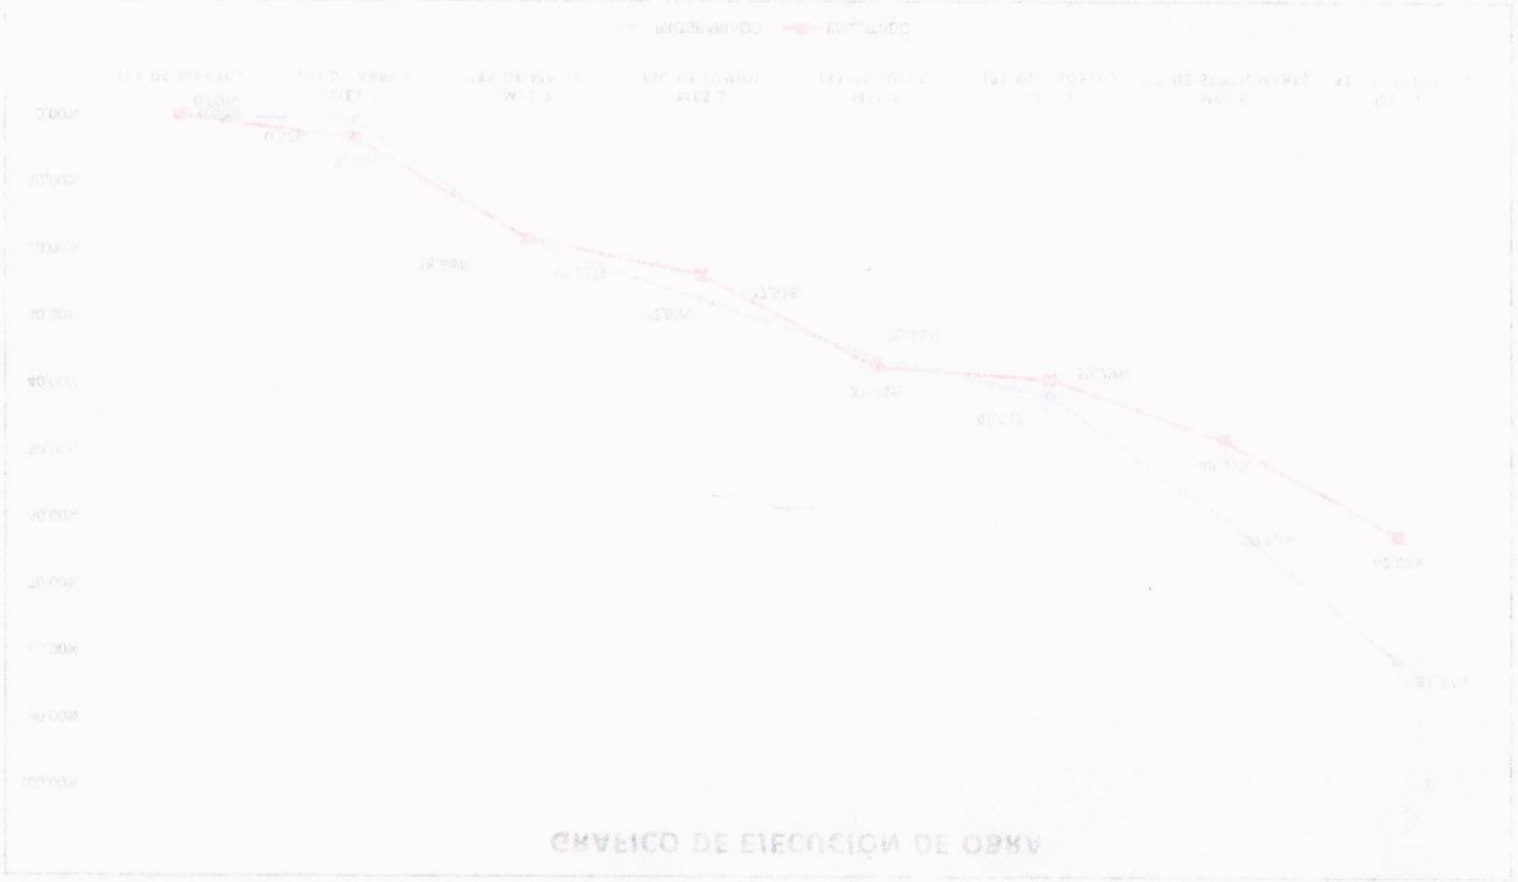


6195

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 4.4.7 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

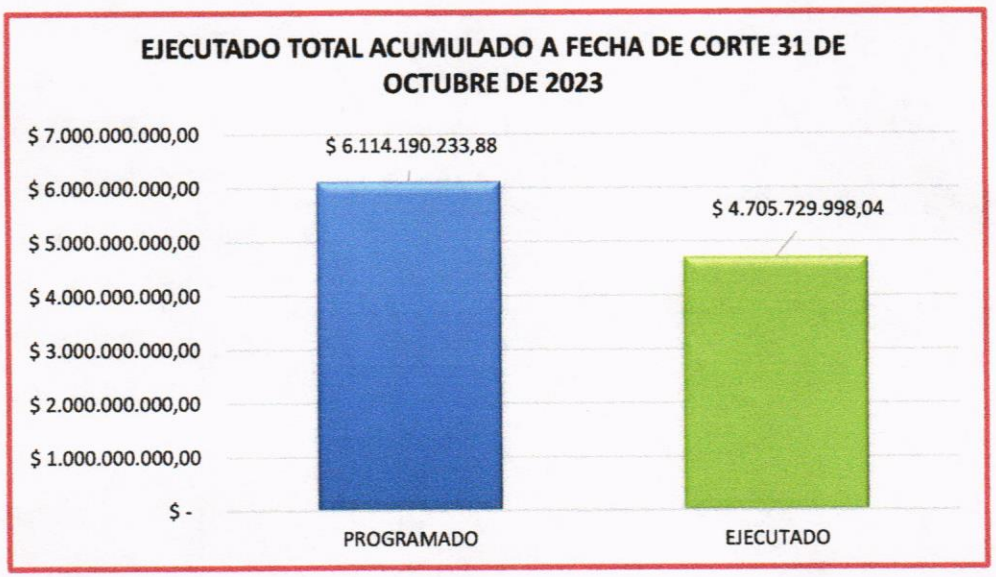

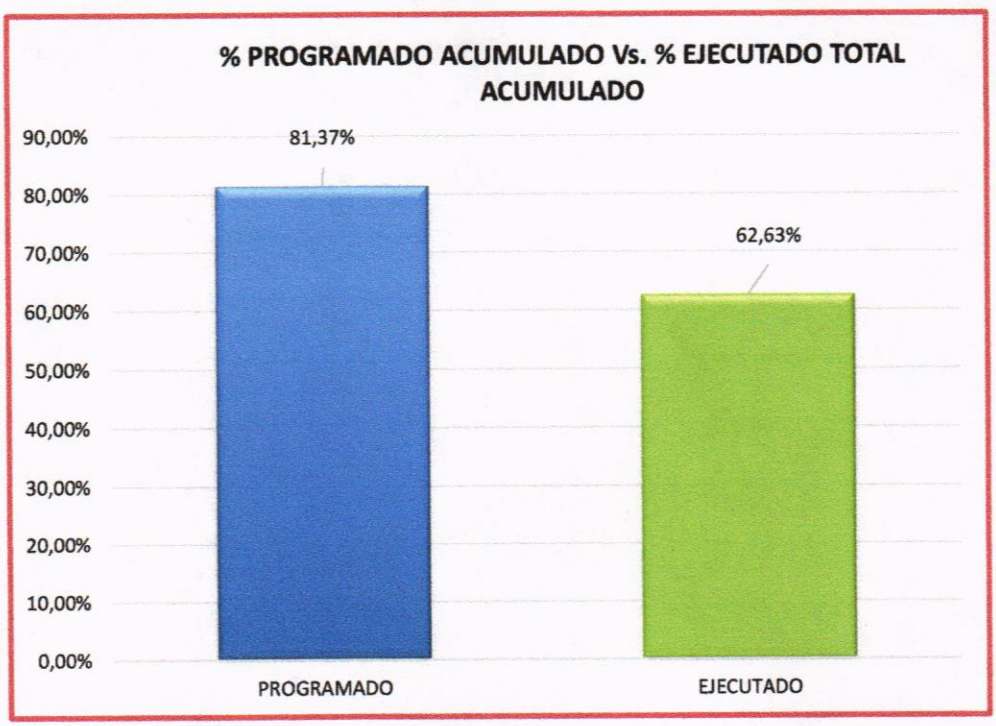



| | | |
|---|---|---|
| | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26 22 DE 2022 |
| | INFORME MENSUAL No. 7 | |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | |

6196

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 4.4.7 AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

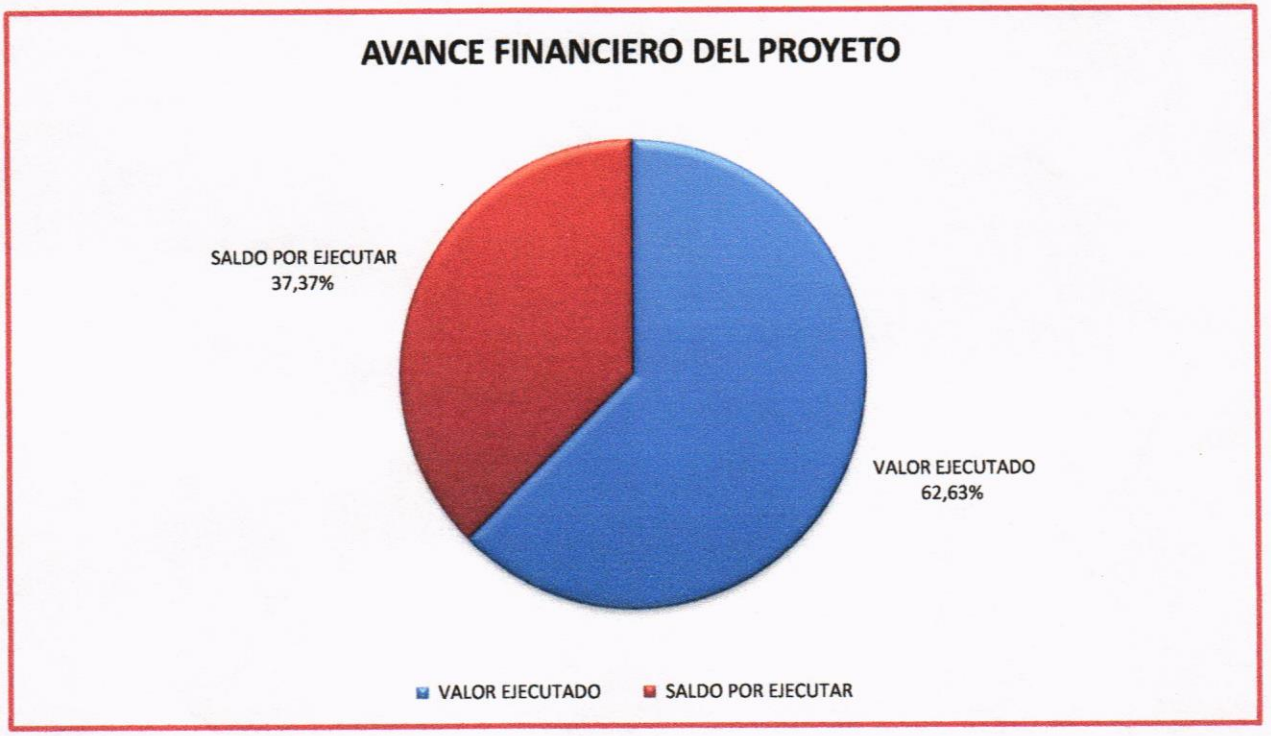


En el gráfico podemos apreciar la ejecución del contrato de obra No 2627 de 2022, el cual tiene un valor contractual de $7.513.820.382,00 pesos M/Cte, que a fecha de corte del presente informe presenta un avance de ejecución de actividades del 62,63% que corresponde a $4.705.729.998,04 pesos M/Cte, quedando pendiente por ejecutar el 37,37% de los recursos actuales, el cual corresponde a $2.808.090.383,96 pesos M/Cte.

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL No. 7** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26/22 DE 2022 |
| | DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD / MM / AA |

## 1.4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

6197



## 4.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

**4.5.1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. OBRAS CIVILES.**

Para el proyecto y para la etapa de construcción se tienen en cuenta las normas y especificaciones de construcción del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

**ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS INVIAS**

ARTICULO 230-22: MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES
ARTICULO 231-22: SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTIL.
ARTICULO 232-22: ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE CON GEOTEXTIL.
ARTICULO 320-22: SUB BASE GRANULAR
ARTICULO 330-22: BASE GRANULAR
ARTICULO 400-22: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, LIGA Y CURADO, TRATAMIENTO SUPERFICIAL, SELLOS DE ARENA-ASFALTO, LECHADAS ASFALTICAS, MEZCLAS ASFÁLTICAS EN FRÍO Y EN CALIENTE Y RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS.
ARTICULO 420-22: RIEGO DE IMPRIMACIÓN
ARTICULO 433-22: LECHADA ASFALTICA
ARTICULO 461-22: RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO IN SITU EMPLEANDO LIGANTES BITUMINOSOS
ARTICULO 450-22: MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA (CONCRETO ASFÁLTICO)
ARTICULO 630-22: CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTICULO 640-22: ACERO DE REFUERZO
ARTICULO 671-22: CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO
ARTICULO 700-22: LINEAS DE DEMARCACIÓN Y MARCAS VIALES
INV. 410-22 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV. 201-22 MUESTREO DE AGREGADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
INV. 500-22 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
INV. 466-22 SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTOS ASFALTICOS
INV. 230-22 DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS AGREGADOS PETREOS
INV. 701-22 TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES BITUMINOSOS

**MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL**

PARTICULAR 10: LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO
PARTICULAR 30: SOBREACARREOS O TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS
PARTICULAR 71: DISPOSICIÓN DE MATERIALES O BOTADEROS

***NOTA:*** Además de las especificaciones técnicas mencionadas, el CONTRATISTA, cumple con los procesos constructivos para la ejecución de las actividades.

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL No. 7** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 0822 DE 2022 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 A 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD MM AA |

6198

# INFORME MENSUAL No. 7

1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 2023 |
| DD | MM | AA |

## 4.6 ESTADO DEL TIEMPO

**A CONTINUACION SE PRESENTA EL ESTADO DEL TIEMPO EN EL TRAMO DE VÍA OBJETO DEL CONTRATO**

| MES | OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA / DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | TOTAL | |
| 06:00 AM - 07 : 00 AM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 07:00 AM - 08 : 00 AM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 08:00 AM - 09 : 00 AM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 09:00 AM - 10 : 00 AM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 10:00 AM - 11 : 00 AM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 11:00 AM - 12 : 00 M | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 12:00 M - 01: 00 PM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 01:00 PM - 02: 00 PM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 02:00 PM - 03: 00 PM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 03:00 PM - 04: 00 PM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 04:00 PM - 05: 00 PM | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 0 | |
| 05:00 PM - 06: 00 PM | LLUVIA | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | SOL | | 1 | |
| TOTAL HORAS LLUVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HORAS PERDIDAS DE TRABAJO ACUMULADAS (Contrato Total) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | TOTAL | 250 |

6199

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

# 5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA

Contiene: Balance financiero, seguimiento inversión del anticipo, fiducia e información presupuestal.

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA

Contiene: Balance financiero, seguimiento inversión del anticipo, fiducia e información presupuestal.

6200

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | 1 DD | 11 MM | 2023 AA |

## 5.1 SEGUIMIENTO PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

A continuación se presenta el resúmen por ÍTEMS del plan de inversión del anticipo del contrato 2627 de 2023.

**RESUMEN POR ITEMS- PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DEL ANTICIPO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 1 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 2 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 3 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | $ 53.869.607,00 | 62,47% | $ 5.400.000,00 | 6,26% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,22 | 13,83% | | 0,00% | | 0,00% | $ 5.865.000,00 | 1,52% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,67 | 51,78% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 53.869.607,00 | 1,93% | $ 5.400.000,00 | 0,19% | $ 5.865.000,00 | 0,21% |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 4 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 5 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 6 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,22 | 13,83% | $ 35.448.874,00 | 9,18% | $ 10.428.600,00 | 2,70% | $ 12.033.000,00 | 3,12% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,67 | 51,78% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 35.448.874,00 | 1,27% | $ 10.428.600,00 | 0,37% | $ 12.033.000,00 | 0,43% |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 7 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 8 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 9 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,22 | 13,83% | $ 5.575.200,00 | 1,44% | $ 13.465.500,00 | 3,49% | | 0,00% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,67 | 51,78% | | 0,00% | | 0,00% | $ 559.786.518,00 | 38,73% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 5.575.200,00 | 0,20% | $ 13.465.500,00 | 0,48% | $ 559.786.518,00 | 20,05% |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 10 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 11 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 12 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,22 | 13,83% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,67 | 51,78% | $ 3.079.125,00 | 0,21% | $ 18.232.336,00 | 1,26% | $ 71.162.000,00 | 4,92% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 3.079.125,00 | 0,11% | $ 18.232.336,00 | 0,65% | $ 71.162.000,00 | 2,55% |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 13 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 14 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 15 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,22 | 13,83% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,67 | 51,78% | $ 7.784.968,00 | 0,54% | $ 18.321.660,00 | 1,27% | | 0,00% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | $ 3.009.600,00 | 0,34% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 7.784.968,00 | 0,28% | $ 18.321.660,00 | 0,66% | $ 3.009.600,00 | 0,11% |

6201

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 16 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 17 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 18 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,22 | 13,83% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,67 | 51,78% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | $ 18.043.310,00 | 2,07% | $ 10.353.000,00 | 1,18% | $ 2.574.000,00 | 0,29% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 18.043.310,00 | 0,65% | $ 10.353.000,00 | 0,37% | $ 2.574.000,00 | 0,09% |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 19 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 20 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 21 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,22 | 13,83% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,67 | 51,78% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | $ 19.720.000,00 | 2,26% | $ 400.000.000,00 | 45,78% | $ 419.981.871,34 | 48,07% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 19.720.000,00 | 0,71% | $ 400.000.000,00 | 14,33% | $ 419.981.871,34 | 15,04% |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 22 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 23 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 24 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,22 | 13,83% | $ 60.428.004,00 | 15,65% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,67 | 51,78% | | 0,00% | $ 176.179.533,00 | 12,19% | $ 98.046.154,00 | 6,78% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 60.428.004,00 | 2,16% | $ 176.179.533,00 | 6,31% | $ 98.046.154,00 | 3,51% |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 25 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 26 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 27 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,22 | 13,83% | | 0,00% | $ 100.000.000,00 | 25,89% | $ 8.022.000,00 | 2,08% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,67 | 51,78% | $ 9.749.474,00 | 0,67% | | 0,00% | | 0,00% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 9.749.474,00 | 0,35% | $ 100.000.000,00 | 3,58% | $ 8.022.000,00 | 0,29% |

EL DÍA 04 DE MAYO DE 2023 SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 28 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 29 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 30 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | $ 26.958.999,80 | 31,26% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,23 | 13,83% | $ 4.588.800,00 | 1,19% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,66 | 51,78% | | 0,00% | | 0,00% | $ 81.276.336,66 | 5,62% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 4.588.800,00 | 0,16% | $ 26.958.999,80 | 0,97% | $ 81.276.336,66 | 2,91% |

6202

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 31 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 32 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 33 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,23 | 13,83% | $ 130.343.895,23 | 33,75% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,66 | 51,78% | | 0,00% | $ 200.000.000,00 | 13,84% | $ 24.800.000,00 | 1,72% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 130.343.895,23 | 4,67% | $ 200.000.000,00 | 7,16% | $ 24.800.000,00 | 0,89% |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 34 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 35 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 36 | % |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,23 | 13,83% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,66 | 51,78% | $ 18.270.615,00 | 1,26% | $ 11.296.092,00 | 0,78% | $ 7.906.755,00 | 0,55% |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 18.270.615,00 | 0,65% | $ 11.296.092,00 | 0,40% | $ 7.906.755,00 | 0,28% |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMADO | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALOR | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 37 | % | SOLICITUD DE DESEMBOLSO 38 | % | | |
| 1 | Pago de salarios, nominas y jornales | $ 86.228.606,80 | 3,09% | | 0,00% | | 0,00% | | |
| 2 | Alquiler de Maquinaria y arrendamiento | $ 386.198.873,23 | 13,83% | | 0,00% | | 0,00% | | |
| 3 | Compra de materiales e insumos | $ 1.445.470.556,66 | 51,78% | $ 50.809.938,32 | 3,52% | $ 88.769.051,68 | 6,14% | | |
| 4 | Transporte de materiales | $ 873.681.781,34 | 31,30% | | 0,00% | | 0,00% | | |
| TOTALES | | $ 2.791.579.818,03 | 100,00% | $ 50.809.938,32 | 1,82% | $ 88.769.051,68 | 3,18% | | |

6203

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 5.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| CONCEPTO | CONTRATO INICIAL | |
|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No. | 2203749 |
| | Fecha | 29/10/2022 |
| | Valor | $ 2.791.579.818,03 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIAS FUTURAS | No. | 2300009 |
| | Fecha | 4/01/2023 |
| | Valor | $ 4.722.240.563,97 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | Registro | 2202627 |
| | Fecha | 30/12/2022 |
| | Valor | $ 2.791.579.818,03 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | Registro | 2302627 |
| | Fecha | 4/01/2023 |
| | Valor | $ 4.722.240.563,97 |

## 5.2.1 INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS.

| CONCEPTO | DILIGENCIAR PARA CONTRATO INICIAL, ADICIONALES, OTRO SI Y DEMÁS SEGÚN NECESIDAD. | | |
|---|---|---|---|
| | | CONTRATO INICIAL | ADICIONAL No. |
| Estampilla Unitropico vigente código 410576005 | Registro | 23000021 | - |
| | Fecha | 16/01/2023 | - |
| | Valor | $ 112.707.306,00 | - |
| Estampilla proadulto mayor vigente código 410576002 | Registro | 23000520 | - |
| | Fecha | 17/01/2023 | - |
| | Valor | $ 225.414.600,00 | - |
| Estampilla procultura vigente código 410576001 | Registro | 23000518 | - |
| | Fecha | 17/01/2023 | - |
| | Valor | $ 75.138.200,00 | - |
| Estampilla prodeporte vigente código 131101005 | Registro | 23000019 | - |
| | Fecha | 16/01/2023 | - |
| | Valor | 187,845,510.00 | - |
| Estampilla prodesarrollo vigente código 410576003 | Registro | 23000519 | - |
| | Fecha | 17/01/2023 | - |
| | Valor | $ 75.138.200,00 | - |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL No. 7** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2822 DE 2022 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | ED \| MM \| AA |
| | | 1 \| 11 \| 2023 |

## 4.2 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| CONCEPTO | CONTRATO INICIAL | |
|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No | 2300744 |
| | Fecha | 20/01/2023 |
| | Valor | $ 2.191.029.512,00 |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIAS FUTURAS | No | 2300029 |
| | Fecha | 10/12/2023 |
| | Valor | $ 4.722.243.183,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | Registro | 2300227 |
| | Fecha | 30/12/2023 |
| | Valor | $ 2.191.029.512,00 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | Registro | 2300227 |
| | Fecha | 30/12/2023 |
| | Valor | $ 4.722.243.183,00 |

## 4.3 INFORMACIÓN REFERIDO DE CLAUSULA DE PAGO DE IMPUESTOS (DEDUCCIONES DE LEY)

| CONCEPTO | CONTRATO INICIAL | | ADICIONALES. DILIGENCIAR PARA CONTRATO INICIAL ADICIONALES, OTRO SI Y PRÓRROGAS EN EL PROCESO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Estampilla Distrital vigente codigo 4105760 | Registro | 2300021 | | |
| | Fecha | 19/01/2023 | | |
| | Valor | $ 12.707.308,00 | | |
| Estampilla procultura mayor vigente codigo 4105760 | Registro | 2300052 | | |
| | Fecha | 19/01/2023 | | |
| | Valor | $ 225.441.300,00 | | |
| Estampilla procultura vigente codigo 4105760 | Registro | 2300052 | | |
| | Fecha | 19/01/2023 | | |
| | Valor | $ 75.138.200,00 | | |
| Estampilla prodesarrollo vigente codigo 4105760 | Registro | 2300052 | | |
| | Fecha | 19/01/2023 | | |
| | Valor | $ 75.138.200,00 | | |
| Estampilla prodesarrollo vigente codigo 4105760 | Registro | 2300052 | | |
| | Fecha | 19/01/2023 | | |
| | Valor | $ 75.138.200,00 | | |

6204

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 5.3 INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | VALOR POR EJECUTAR | VALOR PPRESENTE INFORME |
|---|---|---|---|
| $ 7.513.820.382,00 | $ 4.705.729.998,04 | $ 2.808.090.383,96 | $ 1.075.833.547,16 |

| RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO | | | ANTICIPO Y AMORTIZACIONES | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 7.513.820.382,00 | | VALOR ANTICIPO CONTRATO 37% | $ 2.791.579.818,03 |
| VALOR ACTAS PARCIALES | $ 2.595.240.457,93 | | AMORTIZACIÓN | $ 964.199.370,89 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO | | $ 4.705.729.998,04 | | |
| VALOR POR EJECUTAR | | $ 2.808.090.383,96 | SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 37% DEL VALOR POR EJECUTAR | $ 1.827.380.447,14 |
| SUMAS IGUALES | $ 7.513.820.382,00 | $ 7.513.820.382,00 | TOTAL ANTICIPO | $ 2.791.579.818,03 |

# INFORME MENSUAL No. 7

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2023 | |
| DD | MM | AA | |

4 DE OCTUBRE DE 2022 a 31 DE OCTUBRE DE 2023

## 1. INFORME DEL ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO | VALOR POR EJECUTAR | VALOR PRESENTE INFORME |
|---|---|---|---|
| $ 7.513.820.382,00 | $ 4.726.998.992,04 | $ 2.808.960.389,96 | $ 1.679.839.047,16 |

### RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | ANTICIPO Y AMORTIZACIONES | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 7.513.820.382,00 | VALOR ANTICIPO CONTRATO 37% | $ 2.779.913.542,03 |
| VALOR ADICIONES PARCIALES | $ 2.813.340.152,63 | AMORTIZACIÓN | $ 994.139.279,89 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO | $ 4.726.998.992,04 | | |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 2.808.960.389,96 | SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO 37% DEL VALOR POR EJECUTAR | $ 1.784.774.262,14 |
| SUMAS IGUALES | $ 7.813.820.382,00 | TOTAL ANTICIPO | $ 1.784.774.262,14 |

6205



# 6. INFORME AMBIENTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.2622 DE 2022

# 6. INFORME AMBIENTAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2622 DE 2022

6206



# 7. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6207

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 7.1 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE LA INTERVENTORÍA

| CONTRATO DE CONSULTORÍA 2622 DE 2022 | |
|---|---|
| *Nombre del Contratante* | DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| *Nombre del Contratista* | GILBERTO GALINDO ALVARADO |
| *Supervisor* | BRENDA RORAIMA BARRERA |
| *Numero del Contrato* | 2622 DE 2022 |
| *Fecha del Contrato* | DICIEMBRE 27 DE 2022 |
| *Plazo inicial Contractual ( Meses )* | CUATRO (4) MESES |
| *Valor Inicial* | $296.568.860,00 |
| *Valor Anticipo* | $109.730.478,20 |
| *Valor Adicional* | $0,00 |
| *VALOR ACTUAL DEL CONTRATO* | $296.568.860,00 |
| *Fecha de Iniciación* | 01 DE FEBRERO DE 2023 |
| *Fecha de terminación contractual* | 31 DE MAYO DEL 2023 |
| *Objeto* | INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE |

| PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS | |
|---|---|
| *Fecha autorización Prórroga No. 1* | 25 DE ABRIL DE 2023 |
| *Período autorizado* | DOS (02) MESES |
| *Motivo* | Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2622 de 2022 |
| *Fecha de terminación* | 31 DE JULIO DE 2023 |
| *Fecha autorización Prórroga No. 2* | 28 DE JULIO DE 2023 |
| *Período autorizado* | DOS (02) MESES |
| *Motivo* | Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2622 de 2022 |
| *Fecha de terminación* | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| *OTROSI* | 04 DE AGOSTO DE 2023 |
| *Motivo* | Forma de pago contrato de interventoria |
| *Fecha autorización Prórroga No. 3* | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| *Período autorizado* | DOS (02) MESES |
| *Motivo* | Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2622 de 2022 |
| *Nueva fecha de terminación* | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 |

| SUSPENSIONES Y REINICIOS | | |
|---|---|---|
| N/A | | |

| EL CONTRATO VENCE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $296.568.860,00 | % EJECUTADO |
| VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1 | $66.023.969,51 | 22,26% |
| VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2 | $49.244.211,16 | 16,60% |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME | $77.799.206,48 | 26,23% |
| **TOTAL ACUMULADO EJECUTADO** | **$193.067.387,15** | **65,10%** |

# 8. INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DEL 2022

## 3. INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26222 DEL 2022

6209

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 8.1 CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA

El contratista de interventoria presenta las garantias de acuerdo con la **CLAUSULA 18** del CONTRATO DE CONSULTORÍA 2622 DE 2022, pólizas que garantizan EL CUMPLIMIENTO; PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

**POLIZAS INICIALES CONTRATO DE CONSULTORÍA**

| GARANTÍAS | NOMBRE ASEGURADORA | POLIZA No | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIAL | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 27-dic-2022 | 27-ago-2023 | $ 29.656.886,00 | 20 de Enero de 2023 |
| ANTICIPO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 27-dic-2022 | 27-ago-2023 | $ 109.730.478,20 | 20 de Enero de 2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 27-dic-2022 | 27-abr-2026 | $ 14.828.443,00 | 20 de Enero de 2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 27-dic-2022 | 27-abr-2026 | $ 29.656.886,00 | 20 de Enero de 2023 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000021456 | 27-dic-2022 | 27-abr-2023 | $ 200.000.000,00 | 20 de Enero de 2023 |

**POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 22 DE MARZO DE 2019**

| GARANTÍAS | NOMBRE ASEGURADORA | POLIZA No | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIAL | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-oct-2023 | $ 29.656.886,00 | 15 de Febrero de 2023 |
| ANTICIPO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-oct-2023 | $ 109.730.478,20 | 15 de Febrero de 2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-jun-2026 | $ 14.828.443,00 | 15 de Febrero de 2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-jun-2023 | 1-jun-2026 | $ 29.656.886,00 | 15 de Febrero de 2023 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000021456 | 27-abr-2023 | 1-sep-2023 | $ 200.000.000,00 | 15 de Febrero de 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORIA |
| | | 2622 DE 2022 |
| | | |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | |

## 3. CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA

El contratista de interventoria presenta las garantias de acuerdo con lo OLAUSULA 12 - del CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022, polizas que garantizan: EL CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZAS INICIALES CONTRATO DE CONSULTORIA

| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | POLIZA N | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 27-dic-2022 | 27-ago-2023 | $ 28.806.984,00 | 20 de diciembre de 2022 |
| ANTICIPO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 27-dic-2022 | 27-ago-2023 | $ [illegible] | [illegible] |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 27-dic-2022 | 27-abr-2026 | $ [illegible] | 20 de Enero de 2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 27-dic-2022 | 27-dic-2025 | $ [illegible] | [illegible] |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 27-dic-2022 | 27-dic-2025 | $ 200.000.000,00 | 20 de Enero de 2023 |

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 23 DE MARZO DE 2023

| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | POLIZAS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | EL DIA APROBACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIAL | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 1-dic-2023 | 1-dic-2024 | $ 28.806.984,00 | 5 de Diciembre de 2023 |
| ANTICIPO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 1-dic-2023 | 1-dic-2024 | $ 179.729.430,00 | 5 de Diciembre de 2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 1-dic-2023 | 1-dic-2026 | $ 4.809.145,00 | 5 de Diciembre de 2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 1-dic-2023 | 1-dic-2024 | $ 28.806.984,00 | 5 de Diciembre de 2023 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 805-47-994000078152 | 27-dic-2023 | 27-dic-2025 | $ [illegible] | [illegible] |

6210

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 8.1 CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA

**POLIZAS SEGÚN PRORROGA NUMERO 1, DEL 25 DE ABRIL DE 2023**

| GARANTÍAS | NOMBRE ASEGURADORA | POLIZA No | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIAL | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-dic-2023 | $ 29.656.886,00 | 3 de Mayo de 2023 |
| ANTICIPO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-dic-2023 | $ 109.730.478,20 | 3 de Mayo de 2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-ago-2026 | $ 14.828.443,00 | 3 de Mayo de 2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-jun-2023 | 1-jun-2026 | $ 29.656.886,00 | 3 de Mayo de 2023 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000021456 | 1-jun-2023 | 1-ago-2023 | $ 232.000.000,00 | 4 de Mayo de 2023 |

**POLIZAS SEGÚN PRORROGA NUMERO 2, DEL 28 DE JULIO DE 2023**

| GARANTÍAS | NOMBRE ASEGURADORA | POLIZA No | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIAL | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-feb-2024 | $ 29.656.886,00 | 1 de Agosto de 2023 |
| ANTICIPO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-feb-2024 | $ 109.730.478,20 | 1 de Agosto de 2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-oct-2026 | $ 14.828.443,00 | 1 de Agosto de 2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-jun-2023 | 1-jun-2026 | $ 29.656.886,00 | 1 de Agosto de 2023 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000021456 | 1-ago-2023 | 1-oct-2023 | $ 232.000.000,00 | 1 de Agosto de 2023 |

| INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORIA |
|---|---|
| 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | 2202 DE 2022 |
| | 2023 |
| DD MM AA | |

82

6277

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 8.1 CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA

**POLIZAS SEGÚN AMPLIACIÓN NUMERO 3, DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

| GARANTÍAS | NOMBRE ASEGURADORA | POLIZA No | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIAL | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-abr-2024 | $ 29.656.886,00 | 25 de Sept. de 2023 |
| ANTICIPO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-abr-2024 | $ 109.730.478,20 | 25 de Sept. de 2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 1-feb-2023 | 1-dic-2026 | $ 14.828.443,00 | 25 de Sept. de 2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000099692 | 30-nov-2023 | 30-nov-2026 | $ 29.656.886,00 | 25 de Sept. de 2023 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 605-47-994000021456 | 1-oct-2023 | 1-dic-2023 | $ 232.000.000,00 | 25 de Sept. de 2023 |

NOMBRE GILBERTO GALINDO ALVARADO
FIRMA CONTARTISTA INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INFORME MENSUAL No. 7 | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
| | | | 2022 DE 2022 |
| | | | 2022 |
| | DEL 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | MES | AA |

## 8. CONTROL DE POLIZAS INTERVENTORIA

POLIZAS SEGÚN AMPLIACION NUMERO 3, DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| GARANTIAS | NOMBRE ASEGURADORA | POLIZA No | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA INICIAL | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 608-47-994000000001 | 1-Nov-2023 | 1-Nov-2024 | $ 29.988.840,00 | 29 de Sept. de 2023 |
| ANTICIPO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 608-47-994000000002 | 1-Nov-2023 | 1-Nov-2024 | $ 149.790.420,00 | 29 de Sept. de 2023 |
| PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 608-47-994000000003 | 1-Nov-2023 | 1-Oct-2026 | $ 7.489.521,00 | 29 de Sept. de 2023 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 608-47-994000000004 | 30-nov-2023 | 30-nov-2026 | $ 29.988.840,00 | 29 de Sept. de 2023 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 608-47-994000000005 | 1-oct-2023 | 1-oct-2027 | $ 74.972.100,00 | 29 de Sept. de 2023 |

NOMBRE GILBERTO ORLANDO ALVARADO

FIRMA CONTRATISTA INTERVENTORÍA

6212

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**6052729339**

## PÓLIZA No: 605-47-994000099692 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: **YOPAL** COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 22 | 09 | 2023 | 22 | 09 | 2023 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **GILBERTO GALINDO ALVARADO** IDENTIFICACIÓN: CC **6.773.569**

DIRECCIÓN: CL 24 F 85 B 84 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3123979455

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE CONSULTORIA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 01/02/2023 | 01/04/2024 | 29,656,886.00 |
| ANTICIPO | 01/02/2023 | 01/04/2024 | 109,730,478.20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 01/02/2023 | 01/12/2026 | 14,828,443.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | VER NOTA ACLARATORIA | 29,656,886.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA:
|
OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DOS (2) MESES SEGUN PRORROGA No. 3 DE FECHA 22/09/2023.

***OBJETO DE LA GARANTIA***
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No INTERNO 2622 DE FECHA 27/12/2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ***183,872,693.20 | $ **********51,546 | $*********0.00 | $ ********9,794 | $ **********61,340 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA | 7221 | 100.00 | | | |

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000605272933

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8257A070AF97D56

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
**Fax:** (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6213

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**6052729339**

## PÓLIZA No: 605 - 47 - 994000099692 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: **YOPAL** COD. AGENCIA: 605 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | | FECHA DE IMPRESIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 25 | 09 | 2023 | 25 | 09 | 2023 |

### DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **GILBERTO GALINDO ALVARADO** IDENTIFICACIÓN: CC **6.773.569**

DIRECCIÓN: CL 24 F 85 B 84 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3123979455

### DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

### AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE CONSULTORIA

| DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 01/02/2023 | 01/04/2024 | 29,656,886.00 |
| ANTICIPO | 01/02/2023 | 01/04/2024 | 109,730,478.20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 01/02/2023 | 01/12/2026 | 14,828,443.00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | VER NOTA ACLARATORIA | 29,656,886.00 |

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA:

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA FECHA DEL AMPARO DE CALIDAD PARA DAR ALCANCE AL ANEXO ANTERIOR.

***OBJETO DE LA GARANTIA***
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No INTERNO 2622 DE FECHA 27/12/2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA. VIGENCIA DE CALIDAD DESDE 30/11/2023 HASTA 30/11/2026

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0 | $*********0.00 | $ **********0 | $ **********0 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART | NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA | 7221 | 100.00 | | | |

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUÉLLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000605272933

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8257A070AFA7F58

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 458 7174
**Fax:** (601) 458 7174 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

6214

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 8.2 ADICIONALES - SANCIONES Y ACTAS

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES TRÁMITES ANTE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2622 DE 2022.

### 2.2. CONTROL ADICIONALES AL PLAZO

| TIEMPO PRÓRROGA | NÚMERO | CAUSALES | FECHA PERFEC. |
|---|---|---|---|
| DOS (2) MESES | 1 | Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2622 de 2022 | 25 DE ABRIL DE 2023 |
| DOS (2) MESES | 2 | Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2622 de 2023 | 28 DE JULIO DE 2023 |
| DOS (2) MESES | 3 | Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2622 de 2024 | 22 DE SEPT. DE 2023 |

### 2.3. CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR

| VALOR ADICIÒN | NÚMERO | CAUSALES | FECHA PERFEC. |
|---|---|---|---|
| | | | |

### 2.4. SANCIONES

| RESOLUCIÒN No | OBJETO | VALOR | FECHA |
|---|---|---|---|
| | En la ejecución de este contrato no se han presentado sanciones | | |
| | | | |

### 2.5. ACCIONES LEGALES

| CLASE | ETAPA PROCESAL | FECHA | DESPACHO | No EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| Posible incumplimiento | El día 12/09/2023 se solicitó mediante oficio No. CNS-YOP-107-2023 las sanciones respectivas para un posible incumplimiento por parte del contratista de obra debido a los atrasos evidenciados en la obra. Dicha solicitud no surgió efecto teniendo en cuenta que la fecha en que se solicitó este posible incumplimiento era insuficiente y no se le garantizaba al contratista de obra el derecho a la defensa y contradicción como pilares fundamentales del derecho del debido proceso, en vista que el contrato tenía como fecha de terminación el día 22/09/2023, de acuerdo a memorando No. 0555, emitido por la Gobernación de Casanare mediante oficio No. 520.85-628 el día 13/09/2023. | 12/09/2023 | Direccion Tecnica de Construcciones | 982-12-09-2023 |

### 2. 6. ACTAS TRAMITADAS

| NUMERO | OBJETO | FECHA | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA | 1/02/2023 | NA | |
| 2 | ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO | 28/02/2023 | $109.730.478,20 | |
| 3 | ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1 | 23/08/2023 | $ 66.023.969,51 | |
| 4 | ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.2 | 9/10/2023 | $ 49.244.211,16 | |

### 2. 7. PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS

| NUMERO | OBJETO | FECHA | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRÓRROGA No.1 | 25/04/2023 | NA | |
| 2 | PRÓRROGA No.2 | 28/07/2023 | NA | |
| 3 | PRÓRROGA No.3 | 22/09/2023 | NA | |

### 2. 8. OTROSI

| NUMERO | OBJETO | FECHA | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTROSI MODIFICATORIO No. 1 | 4/08/2023 | NA | |

FIRMA

NOMBRE GILBERTO GALINDO ALVARADO
INTERVENTOR

6215

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

# 9. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contiene: Personal, cumplimiento de obligaciones laborales, aportes parafiscales y control de equipos.

# 9. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contiene: Personal, cumplimiento de obligaciones laborales, aportes parafiscales y control de equipos.

6276

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2021 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 9.1 CONTROL DE PERSONAL

La interventoría mes a mes verifico su propio cumplimiento respecto al personal propuesto en el contrato de consultoría No. 2622 de 2022; así mismo verificó el cumplimiento del pago de la seguridad social de cada período para garantizar que todo el personal que labora en el proyecto por parte de la Interventoría tenga seguridad social.

### 9.1.1 CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO INICIALMENTE

| No. | Nombre Personal profesional propuesto | Cargo | Dedicación | Soporte de cambio de personal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROL NAYIVE RIVEROS BARRERA | DIRECTOR DE OBRA | 50% | N.A |
| 2 | GILBERTO GALINDO ALVARADO | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 75% | N.A |
| 3 | ALEXANDER GAITAN CUTA | INGENIERO AMBIENTAL | 60% | N.A |
| 4 | NANCY CONSUELO ANGEL ALVAREZ | PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL | 75% | N.A |
| 5 | PEDRO PABLO FONSECA CASTRO | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL | 37,5% | N.A |
| 6 | DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO | INSPECTOR 1 | 100% | N.A |
| 7 | MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ | CONTADOR PUBLICO | 10% | N.A |
| 8 | JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO | ABOGADO | 5% | N.A |
| 9 | MAGALIS LARGO CATAÑO | SECRETARIA | 100% | N.A |

### 9.1.1 CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL ACTUAL

| No. | Nombre Personal profesional propuesto | Nombre personal actual | Cargo | Dedicación | Estado | Fecha Retiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROL NAYIVE RIVEROS BARRERA | CAROL NAYIVE RIVEROS BARRERA | DIRECTOR DE OBRA | 50% | Activo | |
| 2 | GILBERTO GALINDO ALVARADO | GILBERTO GALINDO ALVARADO | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 75% | Activo | |
| 3 | ALEXANDER GAITAN CUTA | ALEXANDER GAITAN CUTA | INGENIERO AMBIENTAL | 60% | Inactivo | 30/07/2023 |
| 4 | NANCY CONSUELO ANGEL ALVAREZ | NANCY CONSUELO ANGEL ALVAREZ | PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL | 75% | Inactivo | 30/07/2023 |
| 5 | PEDRO PABLO FONSECA CASTRO | PEDRO PABLO FONSECA CASTRO | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL | 37,5% | Inactivo | 30/07/2023 |
| 6 | DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO | DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO | INSPECTOR 1 | 100% | Activo | |
| 7 | MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ | MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ | CONTADOR PUBLICO | 10% | Activo | |
| 8 | JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO | JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO | ABOGADO | 5% | Inactivo | 5/08/2023 |
| 9 | ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY | ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY | SECRETARIA | 100% | Activo | |
| 10 | MAGALIS LARGO CATAÑO | MAGALIS LARGO CATAÑO | SECRETARIA | 100% | Activo | |

6217

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 9.2 CONTROL DE EQUIPOS

A continuacion se relaciona el equipo de la interventoría, para el cumplimiento en la ejecución del contrato de consultoría No. 2622 de 2022

### TRANSPORTE

| No. | TIPO | Cantidad | Referencia | Capacidad exigida | Estado | SI CUMPLE | NO CUMPLE | Actuaciòn del interventor frente al incumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE CAMIONETA >2000 CC | 1 | CAMIONETA PRADO CAMPERO | >2000 CC | BUENO | X | | |

### TOPOGRAFÍA

| No. | TIPO | cantidad | referencia | capacidad exigida | Estado | SI CUMPLE | NO CUMPLE | Actuaciòn del interventor frente al incumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACIÓN-NIVEL-TRÁNSITO-TOPÓGRAFO Y CADENERO | 1 | | | BUENO | X | | |

### LABORATORIOS

| No. | TIPO | cantidad | referencia | capacidad exigida | Estado | SI CUMPLE | NO CUMPLE | Actuaciòn del interventor frente al incumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS | 1 | | | | X | | |

### OFICINA

| No. | TIPO | cantidad | referencia | capacidad exigida | Estado | SI CUMPLE | NO CUMPLE | Actuaciòn del interventor frente al incumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA (Cra 28 No. 17A-34) | 1 | Computadores, impresoras, scaner, fotocopiadora | | BUENO | X | | |

## 9.3 NÓMINAS Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

6219

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 9. 4 APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se anexan los soportes de pago de seguridad social, del personal de Interventoría, durante el período 1 DE OCTUBRE - 31 DE OCTUBRE DE 2023, y se anexa el soporte de pago del presente período.

| Nº | MES | FECHA PAGO | Nº PLANILLA | VR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTUBRE DE 2023 | 31/10/2023 | 7898971181 | $ 1.182.700,00 |
| 2 | OCTUBRE DE 2023 | 15/11/2023 | 7901390635 | $ 515.800,00 |
| 3 | OCTUBRE DE 2023 | 21/11/2023 | 7901389319 | $ 1.347.000,00 |
| | | | | |

6220

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NUMERO DE IDENTIFICACION: | 6773569 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | | | GILBERTO GALINDO ALVARADO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CRA 29 Nº 17 09 | TELÉFONO: | 6247018 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA: | 7898971181 | | | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES | | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES octubre | AÑO 2023 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES octubre | AÑO 2023 | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2023/11/01 | | | NUMERO AUTORIZACIÓN: | 260262425 | | |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 600.000 | $ 0 | $ 600.000 |
| **SUBTOTALES** | | | | | | | | | | **$ 600.000** | **$ 0** | **$ 600.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 468.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 468.800 | $ 0 | $ 0 | $ 468.800 |
| **SUBTOTALES** | | | | | | | | | | | | | **$ 468.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 468.800** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD RP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 91.400 | $ 91.400 | $ 0 | $ 0 | $ 91.400 |
| **SUBTOTALES** | | | | | | | | | **$ 91.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 91.400** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF69 | CCF69-COMFACASANARE | 1 | $ 22.500 | $ 0 | $ 22.500 |
| **SUBTOTALES** | | | **$ 22.500** | **$ 0** | **$ 22.500** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| 1 | CC 6773569 | GALINDO ALVARADO GILBERTO | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 3.750.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 3.750.000 | $ 600.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 600.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 3.750.000 | $ 468.800 | $ 0 | $ 468.800 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 3.750.000 | $ 6773569 | $ 91.400 | 30 | $ 3.750.000 | CCF69-COMFACASANARE | $ 22.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 1.182.700 |
|---|---|

6227

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 6773569 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | GILBERTO GALINDO ALVARADO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CRA 29 N 17-59 | TELÉFONO: | 6332721 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 020 - YOPAL |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7901389319 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre | AÑO 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre | AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 4 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/11/21 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 290533371 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 3 | $ 464.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.900 | $ 0 | $ 464.000 | $ 1.900 | $ 465.900 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 18.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 0 | $ 18.600 | $ 100 | $ 18.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 482.600** | **$ 2.000** | **$ 484.600** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 600 | $ 0 | $ 145.000 | $ 600 | $ 0 | $ 145.600 |
| EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 72.500 | $ 0 | $ 300 | $ 0 | $ 72.500 | $ 300 | $ 0 | $ 72.800 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 600 | $ 0 | $ 145.000 | $ 600 | $ 0 | $ 145.600 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 14.500 | $ 0 | $ 100 | $ 0 | $ 14.500 | $ 100 | $ 0 | $ 14.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 377.000** | **$ 1.600** | **$ 0** | **$ 378.600** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 4 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 210.100 | $ 210.100 | $ 900 | $ 0 | $ 211.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 210.100** | **$ 900** | **$ 0** | **$ 211.000** |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF69 | CCF69-COMFACASANARE | 4 | $ 120.700 | $ 500 | $ 121.200 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 120.700** | **$ 500** | **$ 121.200** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 4 | $ 90.900 | $ 400 | $ 90.900 |
| PASENA | PASENA - SENA | 4 | $ 60.400 | $ 300 | $ 60.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 150.900** | **$ 700** | **$ 151.600** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RÉGIMEN TRIBUTARIA | IGE | RET | TDE | TAE | TAP | VAC | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1062407847 | FONSECA PRIETO DAVID FERNANDO | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 186.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 186.600 | NUEVA EPS CM | 30 | $ 1.160.000 | $ 145.000 | $ 0 | $ 145.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | | $ 80.800 | 30 | $ 1.160.000 | SCCF69-COMFACASANARE | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 1118551487 | RODRIGUEZ CELY ANDERSON HENRY | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 186.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 186.600 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $ 145.000 | $ 0 | $ 145.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | | $ 80.800 | 30 | $ 1.160.000 | SCCF69-COMFACASANARE | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 23610112 | BARRAGAN HERNANDEZ MARIBLA JUDITH | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | NO | 03 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 116.000 | $ 18.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 18.600 | EPS037-NUEVA EPS | 3 | $ 116.000 | $ 14.500 | $ 0 | $ 14.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 3 | $ 116.000 | | $ 8.100 | 3 | $ 116.000 | CCF69-COMFACASANARE | $ 4.700 | $ 2.400 | $ 3.500 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 52390351 | RIVEROS BARRERA CAROL NAYIBE | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | NO | 01 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 15 | $ 580.000 | $ 92.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 92.800 | EPS017-FAMISANAR | 15 | $ 580.000 | $ 72.500 | $ 0 | $ 72.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 15 | $ 580.000 | | $ 40.400 | 15 | $ 580.000 | CCF69-COMFACASANARE | $ 23.200 | $ 11.600 | $ 17.400 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 1.347.000 |
|---|---|

6222

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 6773569 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | GILBERTO GALINDO ALVARADO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | YOPAL | DEPARTAMENTO: | CASANARE |
| DIRECCIÓN: | CRA 29 N 17-59 | TELÉFONO: | 6332721 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Construcción de edificios no residenciales. |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 004 - YOPAL 1 |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA: | | | 7901390635 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | octubre AÑO | 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | noviembre AÑO | 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2023/11/15 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 278293094 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301 PORVENIR | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| **SUBTOTALES** | | | | | | | | | | **$ 185.600** | **$ 0** | **$ 185.600** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 148.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 148.000 | $ 0 | $ 0 | $ 148.000 |
| **SUBTOTALES** | | | | | | | | | | | | | **$ 148.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 148.000** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO | |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 80.800 | $ 80.800 | $ 0 | $ 0 | $ 80.800 | |
| **SUBTOTALES** | | | | | | | | | **$ 80.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 80.800** | |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF69 | CCF69-COMFACASANARE | 1 | $ 46.400 | $ 0 | $ 46.400 |
| **SUBTOTALES** | | | **$ 46.400** | **$ 0** | **$ 46.400** |

### TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| PAICBF | PA ICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR | 1 | $ 34.800 | $ 0 | $ 34.800 |
| PASENA | PASENA - SENA | 1 | $ 23.200 | $ 0 | $ 23.200 |
| **SUBTOTALES** | | | **$ 58.000** | **$ 0** | **$ 58.000** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EN EL EXTERIOR | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | IND | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | CDP | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1118537705 | LARGO GALVANO MIGALIS | DEPEND | | $ 1.160.000 | FIJO | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 PORVENIR | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS005 SANITAS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | $ 148.000 | $ 0 | $ 148.000 | 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.160.000 | | $ 80.800 | 30 | $ 1.160.000 | CCF69 COMFACASANARE | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 515.800 |
|---|---|

6223



# 9.5 NÓMINA INTERVENTORÍA

6229

| GILBERTO GALINDO ALVARADO | NIT 6.773.569-7 | NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS | PERIDO DE PAGO AÑO 2023 | 1-30 OCTUBRE DE 2023 |
|---|---|---|---|---|
| R/L GILBERTO GALINDO C.C. 6773569<br>CONTRATO 2622 DE 2022 | | | | |

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO | SALARIO BASE COTIZACION | SALARIO BASICO | FECHA INGRESO Y RETIRO | DIAS LAB. | DEVENGADO | | | | TOTAL DEVENGADO | DEDUCCIONES | | | | | TOTAL DEDUCIDO | NETO A PAGAR | FIRMA | NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BASICO | EXTRAS Y REC. | COMISIONES $ | AUX. TRANSP. | | SALUD | PENSION | FONDO SOLIDAR | RTE. FUENTE | OTROS | | | | |
| 1 | CAROL NAYIBE RIVEROS BARRERA<br>C.C 52.390.351 DE BOGOTÁ | INGENIERA DIRECTORA | 1.160.000 | 38.667 | 1/10/2023<br>15/10/2023 | 15 | 580.000 | | | 70.303 | 650.303 | 23.200 | 23.200 | | | | 46.400 | 603.903 | | ING-RET |
| 2 | GILBERTO GALINDO ALVARADO<br>C.C 6.773.569 DE TUNJA | INGENIERO RESIDENTE | 3.750.000 | 125.000 | | 30 | 3.750.000 | | | | 3.750.000 | 150.000 | 150.000 | | | | 300.000 | 3.450.000 | | |
| 3 | DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO<br>C.C 1.052.407.847 DE DUITAMA | INSPECTOR | 1.160.000 | 38.667 | | 30 | 1.160.000 | | | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 46.400 | | | | 92.800 | 1.207.806 | | |
| 4 | MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ<br>C.C 23.810.112 DE NOBSA | CONTADORA | 1.160.000 | 38.667 | 3/10/2023<br>5/10/2023 | 3 | 116.000 | | | 14.061 | 130.061 | 4.640 | 4.640 | | | | 9.280 | 120.781 | | ING-RET |
| 5 | ANDERSON HENRY RODRIGUEZ CELY<br>C.C 1118.551.487 DE YOPAL | INSPECTOR | 1.160.000 | 38.667 | | 30 | 1.160.000 | | | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 46400 | | | | 92.800 | 1.207.806 | | |
| 6 | MAGALIS LARGO CATAÑO<br>C.C 1.118.537.706 DE YOPAL | SECRETARIA | 1.160.000 | 38.667 | | 30 | 1.160.000 | | | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 46.400 | | | | 92.800 | 1.207.806 | Magalis Largo | |
| | **TOTALES** | | | **318.333** | | | **7.926.000** | | | **506.182** | **8.432.182** | **317.040** | **317.040** | **-** | **-** | **-** | **634.080** | **7.798.102** | | |

| DEVENGADO | | | | | | | DEDUCIDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASICO | | | 7.926.000 | | | | SALUD | 317.040 |
| EXTRAS Y REC. | | | - | | | | PENSIONES | 317.040 |
| COMISIONES | | | - | | | | FONDO SOL. | - |
| AUX. TRANSP. | | | 506.182 | | | | RTE FTE | - |
| | | | | | | | OTROS | - |
| TOTAL DEVENGADO | | | 8.432.182 | | | | TOTAL DEDUCIDO | 634.080 |
| | | | | | | | | |
| NETO PAGADO | | | | | | 7.798.101,60 | | |

Autorizó:

| APORTES PARAFISCALES | % | VALOR | PROVISIONES | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salud | 12 | 673.710 | Cesantías | 1/12 | 702.681,80 |
| Pensión 75% | 16 | 951.120 | Int/cesantías | 1% | 84.321,82 |
| Riesgos profesionales | 6,96 | 551.650 | Prima de servicios | 1/12 | 702.681,80 |
| SENA | 2 | 158.520 | Vacaciones | 1/24 | 330.250,00 |
| Comcaja | 4 | 317.040 | | | |
| ICBF | 3 | 237.780 | | | |
| SUBTOTAL | | 2.889.820 | SUBTOTAL | | $ 1.819.935,42 |

TOTAL $ 3.523.900

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C 6.773.569 DE TUNJA

6225

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 10. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

**FUNCIONES ADMINISTRATIVAS**

i. Durante la etapa pre contractual, la interventoría realizó recolección de la información previa al inicio de obra, realizó la verificación de permisos, autorizaciones y licencias necesarias para llevar a cabo la ejecución de las obras.

ii. La interventoría realiza comités de obra para analizar el estado actual de ejecución y avance del contrato; y para informar y solucionar aspectos relacionados con la ejecución del proyecto.

iii. Se verifica el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, plan de manejo de transito y ambientes aplicables.

iv. Se garantiza la públicación de documentos del contrato y cumplimientos, de acuerdo a la ley.

**FUNCIONES TÉCNICAS**

i. Verificación de las condiciones técnicas para la ejecución de cada una de las actividades.

ii. Optimización de los diseños iniciales, avalados por los especialistas de la interventoría.

iii. Verificación del personal y equipo ofrecido por el contratista de obra, atendiendo las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente de éstos.

iv. Control y verificación de la calidad de los materiales, equipos y procedimientos utilizados por el contratista de obra en cada una de las actividades desarrolladas.

v. Mantener al día el libro de obra, donde se consigna las actividades ejecutadas por el contratista, el estado del tiempo y las actividades relevantes que ameriten su descripción.

vi. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico, justificando y solicitando a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.

**FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES**

i. Se realiza la verificación de los recursos y las fuentes asignadas por el contrato (REGISTRO PRESUPUESTAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)

La interventoría es una herramienta de gestión, que permite medir los resultados y el impacto de las acciones realizadas en la ejecución de los contratos y retroalimenta a la administración departamental en la toma de decisiones para mejorar su gestión y desempeño, que permite el logro de los siguientes objetivos: Evita la utilización indebida de los recursos públicos por parte de terceros y/o contratista y en caso de que ocurra es un medio para detectarla y canalizar a la sanción. Hacer un seguimiento técnico, financiero y administrativo, mediante la apliación de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos, monitorear el desarrollo de los procesos, evaluar el cumpliento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato, tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna, medir oportunamente los resultados; tomar decisiones relativas a la relación contractual; utilizar los resultados para evaluar el impacto de las acciones realizadas por el contratista sobre el comportamiento y evolución de las condiciones supervisadas.

La interventoria en este periodo de tiempo, realizó las siguientes acciones sobre las actividades en ejecución.

**Controlar:** Se realiza de manera permanente a todas y cada una de las obligaciones y productos mediante las cuales se cumple el contrato, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo ofrecido por las partes.

6226

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 10. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

**Solicitar y Orientar:** Facultad que se materializa cuando el Interventor pide al Contratista oportunamente que reoriente alguna acción, o subsane en forma inmediata algún vicio de forma o de fondo que no afecta la validez del contrato o su ejecución. La facultad de reorientar, esta privilegiada por los acuerdos concertados entre las partes, pretendiendo buscar mejores resultados frente a lo pactado. Cada vez que la Interventoría reoriente alguna acción deberá informar a la administración.

**Exigir**: La interventoria exigió al contratista estar al dia con los pagos de Seguridad Social y aportes parafiscales, y con los sueldos de los trabajadores, igualmente realizó exigencias sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.

**Colaborar**: Se prestó colaboración al contratista cuando fue necesario, de igual forma se dió respuestas oportunas sobre dudas o cualquier otra situación que el contratista requirió.

**Prevenir**: La Interventoría tuvo una actuación activa durante este periodo, no solo se dedicó a observar la ejecución del contrato sino que revisó cuidadosamente los diseños, planos, especificaciones técnicas, propuesta del contratista y el avacne de ejecuciòn de la obra para identificar posibles errores de las partes y advertir oportunamente o buscar soluciones.

**Verificar:** La interventoria verificó en terreno todas y cada una de las actividades ejecutadas, tanto para determinar cantidades de obra como la calidad de la obra.

El control de cada una de las actividades de la obra, se realiza en tiempo real revisando diariamente los procedimientos constructivos, aplicaciòn de especificaciones técnicas y cantidades ejecutadas.

### FUNCIONES AMBIENTALES

i. Verificación el cumplimiento de la implementación del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA.

ii. La interventoría evidencio los efectos negativos generados durante la ejecución de las diferentes actividades del proyecto que se está llevando a cabo y las acciones de mitigación, compensación, prevención y/o corrección que se están adelantando para manejar adecuadamente dichos impactos actuales o potenciales

iii. Se definen las medidas de acción a nivel de mitigabilidad que se deben aplicar en el proceso de mantenimiento y conservación de acuerdo a los alcances de este Proyecto, para minimizar las afectaciones ambientales de carácter perjudicial, lo que permita reducir y/o evitar los efectos adversos.

### FUNCIONES JURÍDICAS

i. Verificación de la vigencia de las garantías exigidas en la CLAUSULA 18 del contrato de obra 2627 de 2022

ii. Se verifica y se certifica que el contratista cumple con la obligaciones laborales y aportes de parafiscales exigidos y generados en el contrato de obra, según la Ley 789 de 2002 y la Ley 797 de 2003 y sus decretos complementarios.

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL No. 7** | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** |
| | | 2822 DE 2022 |
| | | 1 \| 1 \| 2024 |
| | | OD \| MM \| AA |

6227

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 10.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

**TOPOGRAFIA.**

- Replanteo inicial del proyecto. (Secciones del corredor vial existente)
- Verificación de los niveles y pendientes actuales de la carpeta asfaltica.
- Topografía de cada una de las actividades realizadas por el contratista en cada tramo, para establecer los volúmenes de reciclado de pavimento y de localizacion de cada uno de los bacheos.

**ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

La interventoría, a través de los especialistas en Geotecnia, Pavimentos e Hidráulica, realiza el aval y la Justificación de los Diseños, mediante la entrega del preconstructivo con el fin de garantizar la calidad de la obra y optimizar de esta manera los recursos asignados al proyecto.

**INFORMES**

La interventoría ha informado de manera periódica a la entidad contratante a cerca del desarrollo de las obras, en los aspectos Jurídicos, técnicos, contables, Administrativos, financieros y ambientales.

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA.**

- Coordinar las labores mismas de la consultoría y el cumplimiento de sus compromisos
- Asesorar técnicamente al personal en campo.
- Revisión y aprobación de informes de obra.
- Presidir los Comités de Seguimiento de Obra.
- Informar al Departamento sobre el estado del contrato.
- Verificar el cumplimiento del programa de trabajo, prorrogas y ampliaciones.
- Atender y solucionar dentro de los alcances y funciones de la consultoría las sugerencias,reclamaciones y consultas hechas por la entidad.
- Consignar en actas suscritas con el Departamento todos los acuerdos que se realicen para el beneficio del contrato.
- Controlar el avance del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades estipulado.
- Preparar los documentos de competencia para la liquidación del contrato.
- Estudio y justificación de los trabajos adicionales que surjan en el contrato.
- Revisión de reajustes, si lo hubiere en el contrato.

**RESIDENTES DE INTERVENTORIA**

Garantiza el óptimo desarrollo del objeto contractual estableciendo los requisitos y reglas de ejecución de la obra en cumplimiento de los lineamientos descritos por la empresa contratante.

Dentro de las actividades del residente de interventoría se destacan:

- ✓ El residente de interventoría efectúa los procesos de medición de las actividades constructivas ejecutadas y correctamente hechas en campo y, con base en dichas medidas, calcula las cantidades de obra ejecutadas.
- ✓ Verifica la calidad de los materiales.
- ✓ Revisa y elabora la documentación presentada y por realizar.
- ✓ Es el responsable de la información de campo.
- ✓ Hace los informes diarios, semanales pertinentes y requeridos; colabora en la elaboración de los informes mensuales.
- ✓ Recibe y analiza la información de las carteras topográficas para cálculo de cantidades de obra.
- ✓ Elabora un registro fotográfico del desenvolvimiento de las actividades constructivas; las fotos de dicho registro sirven para atestiguar y mostrar cómo se construye el proyecto; son usadas también para el informe mensual.
- ✓ Verifica las condiciones óptimas para una responsable entrega de obra, bajo parámetros de terminación a satisfacción para una liquidación viable.
- ✓ Da asesoría técnica para la resolución de los problemas que se presenten .
- ✓ Ayuda a calcular los porcentajes de ejecutado, programado y atraso de cada actividad y de todo el proyecto.
- ✓ Confronta el avance de la obra con la programación de obra vigente dada por el contratista.

**PROFESIONAL DE APOYO**

- ✓ El profesional de apoyo cumple las funciones de inspección , control y verificación de todos los procesos constructivos que se llevan a cabo en la ejecución de las obras, en las áreas de topografia, y demas actividades que se presenten.
- ✓ Verificar la veracidad de los datos obtenidos en campo, en cuanto a localizaciones y replanteos.
- ✓ Revisión y Calculo de carteras de topografía, con datos propios o entregados por el contratista.

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL No. 7** | CONTRATO DE INTERVENTORIA |
| | | 0527 DE 2022 |
| | | 2023 / 01 / 1 |
| | | AA / MM / DD |

6228

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 10.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

- ✓ Calculo de todos los movimientos de material de reciclado, bacheo, parcheo e imprimación y corte.
- ✓ Toma de medidas de campo.
- ✓ Corroborar los procesos constructivos, que permitan una excelente calidad de la obra.

**ESPECIALISTAS**

AMBIENTAL.

Realiza actividades de control, vigilancia y seguimiento de las normas generales de protección ambiental, y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en todas las actividades realizadas por el contratista, como cortes en carpeta asfaltica, demolición de pavimento, imprimación, reciclado de pavimento, movilización de maquinaria y equipo.

Informar acerca del manejo y control de todos los aspectos contemplados en el plan de manejo ambiental, para cada una de las actividades desarrolladas por el contratista.

PAVIMENTOS.

Realiza actividades de control y seguimiento de acuedo a las normas de Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 y verificacion de resultados de laboratorio

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL No. 7** | CONTRATO DE INTERVENTORIA 7822 DE 2022 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 A 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD MM AA |

6229



## 10.2 PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

## 10.2 PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

6230

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 10.2 PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

### CONDICIONES CONTRACTUALES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| **1.** | **ETAPA PRECONSTRUCCIÓN** | | **$ 16.474.615,00** |
| 1.1 | Revisión y verificacion en campo de los diseños | UND | $ 7.292.099,33 |
| 1.2 | Cumplimiento requerimientos ambientales | UND | $ 2.479.180,70 |
| 1.3 | Revisión predial | UND | $ 3.532.557,87 |
| 1.4 | Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos | UND | $ 1.517.990,35 |
| 1.5 | Permisos y/o Disponibilidad fuentes de materiales | UND | $ 1.652.787,13 |
| **2.** | **ETAPA CONSTRUCTIVA** | | **$ 232.742.914,00** |
| 2.1 | Interventoría Técnica | UND | $ 69.823.489,76 |
| 2.2 | Interventoría Ambiental | UND | $ 69.823.489,76 |
| 2.3 | Interventoría Administrativa | UND | $ 69.823.489,76 |
| 2.4 | Interventoría Financiera | UND | $ 9.299.966,81 |
| 2.5 | Interventoría Contable | UND | $ 9.183.966,81 |
| 2.6 | Interventoría Jurídica | UND | $ 4.788.510,74 |
| | **COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS** | | **$ 249.217.529,00** |
| | **IVA** | | **$ 47.351.331,00** |
| | **COSTO FINAL AJUSTADO AL PESO** | | **$ 296.568.860,00** |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | INFORME MENSUAL No. 7 | |
|---|---|---|
| 002 DE 2022 | | |
| 7 \| 11 \| 2022 | | |
| DD \| MM \| AA | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | |

## 10.2 PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CARPETA DE ROLADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 13 Y CALLES 9, 10 Y 11 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE

### CONDICIONES CONTRACTUALES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | ETAPA PRECONSTRUCCION | | $ 18.474.916,00 |
| 1.1 | Revision y verificacion en campo de los diseños | UND | $ 2.772.099,23 |
| 1.2 | Cumplimiento requerimientos ambientales | UND | $ 5.279.180,70 |
| 1.3 | Revision predial | UND | $ 5.279.180,70 |
| 1.4 | Presupuesto y disponibilidad de servicios publicos | UND | $ 1.266.403,37 |
| 1.5 | Permisos y disponibilidad buenos de materiales | UND | $ 3.877.152,00 |
| 2 | ETAPA CONSTRUCTIVA | | $ 2.217.717.676,00 |
| 2.1 | Interventoria Tecnica | UND | $ 88.708.707,04 |
| 2.2 | Interventoria Ambiental | UND | $ 66.531.529,78 |
| 2.3 | Interventoria Administrativa | UND | $ 88.708.707,04 |
| 2.4 | Interventoria Financiera | UND | $ 8.329.069,50 |
| 2.5 | Interventoria Contable | UND | $ 8.329.069,50 |
| 2.6 | Interventoria Juridica | UND | $ 4.798.810,24 |
| | COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS | $ | 2.19.272.592,00 |
| | IVA | $ | 47.751.234,00 |
| | COSTO FINAL AJUSTADO AL PESO | $ | 209.589.590,00 |

6231

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |


# 11 . INFORME FINANCIERO - CONTABLE DEL CONTRATO CONSULTORIA 2622 DE 2022

6232

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |


## 11.1 GRAFICOS AVANCE GENERAL DE INTERVENTORÌA

### GRÁFICO % - CONTRATADO VS % EJECUTADO

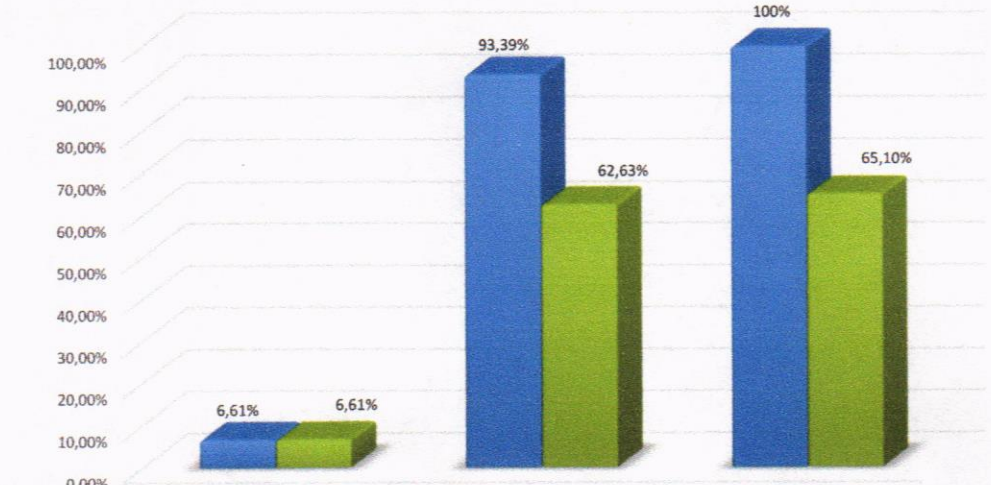



| | ACTIVIDADES ETAPA PRECONSTRUCCIÓN | ACTIVIDADES ETAPA CONSTRUCTIVA | TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| CONTRATADO | 6,61% | 93,39% | 100% |
| EJECUTADO | 6,61% | 62,63% | 65,10% |

### GRÁFICO % CONTRATADO VS % EJECUTADO

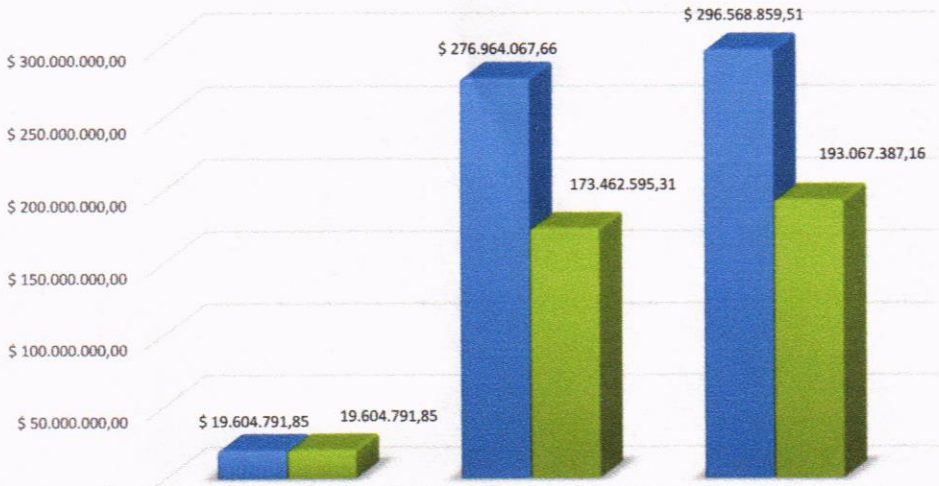


| | ACTIVIDADES ETAPA PRECONSTRUCCIÓN | ACTIVIDADES ETAPA CONSTRUCTIVA | TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| CONTRATADO | $ 19.604.791,85 | $ 276.964.067,66 | $ 296.568.859,51 |
| EJECUTADO | $ 19.604.791,85 | $ 173.462.595,31 | $ 193.067.387,16 |

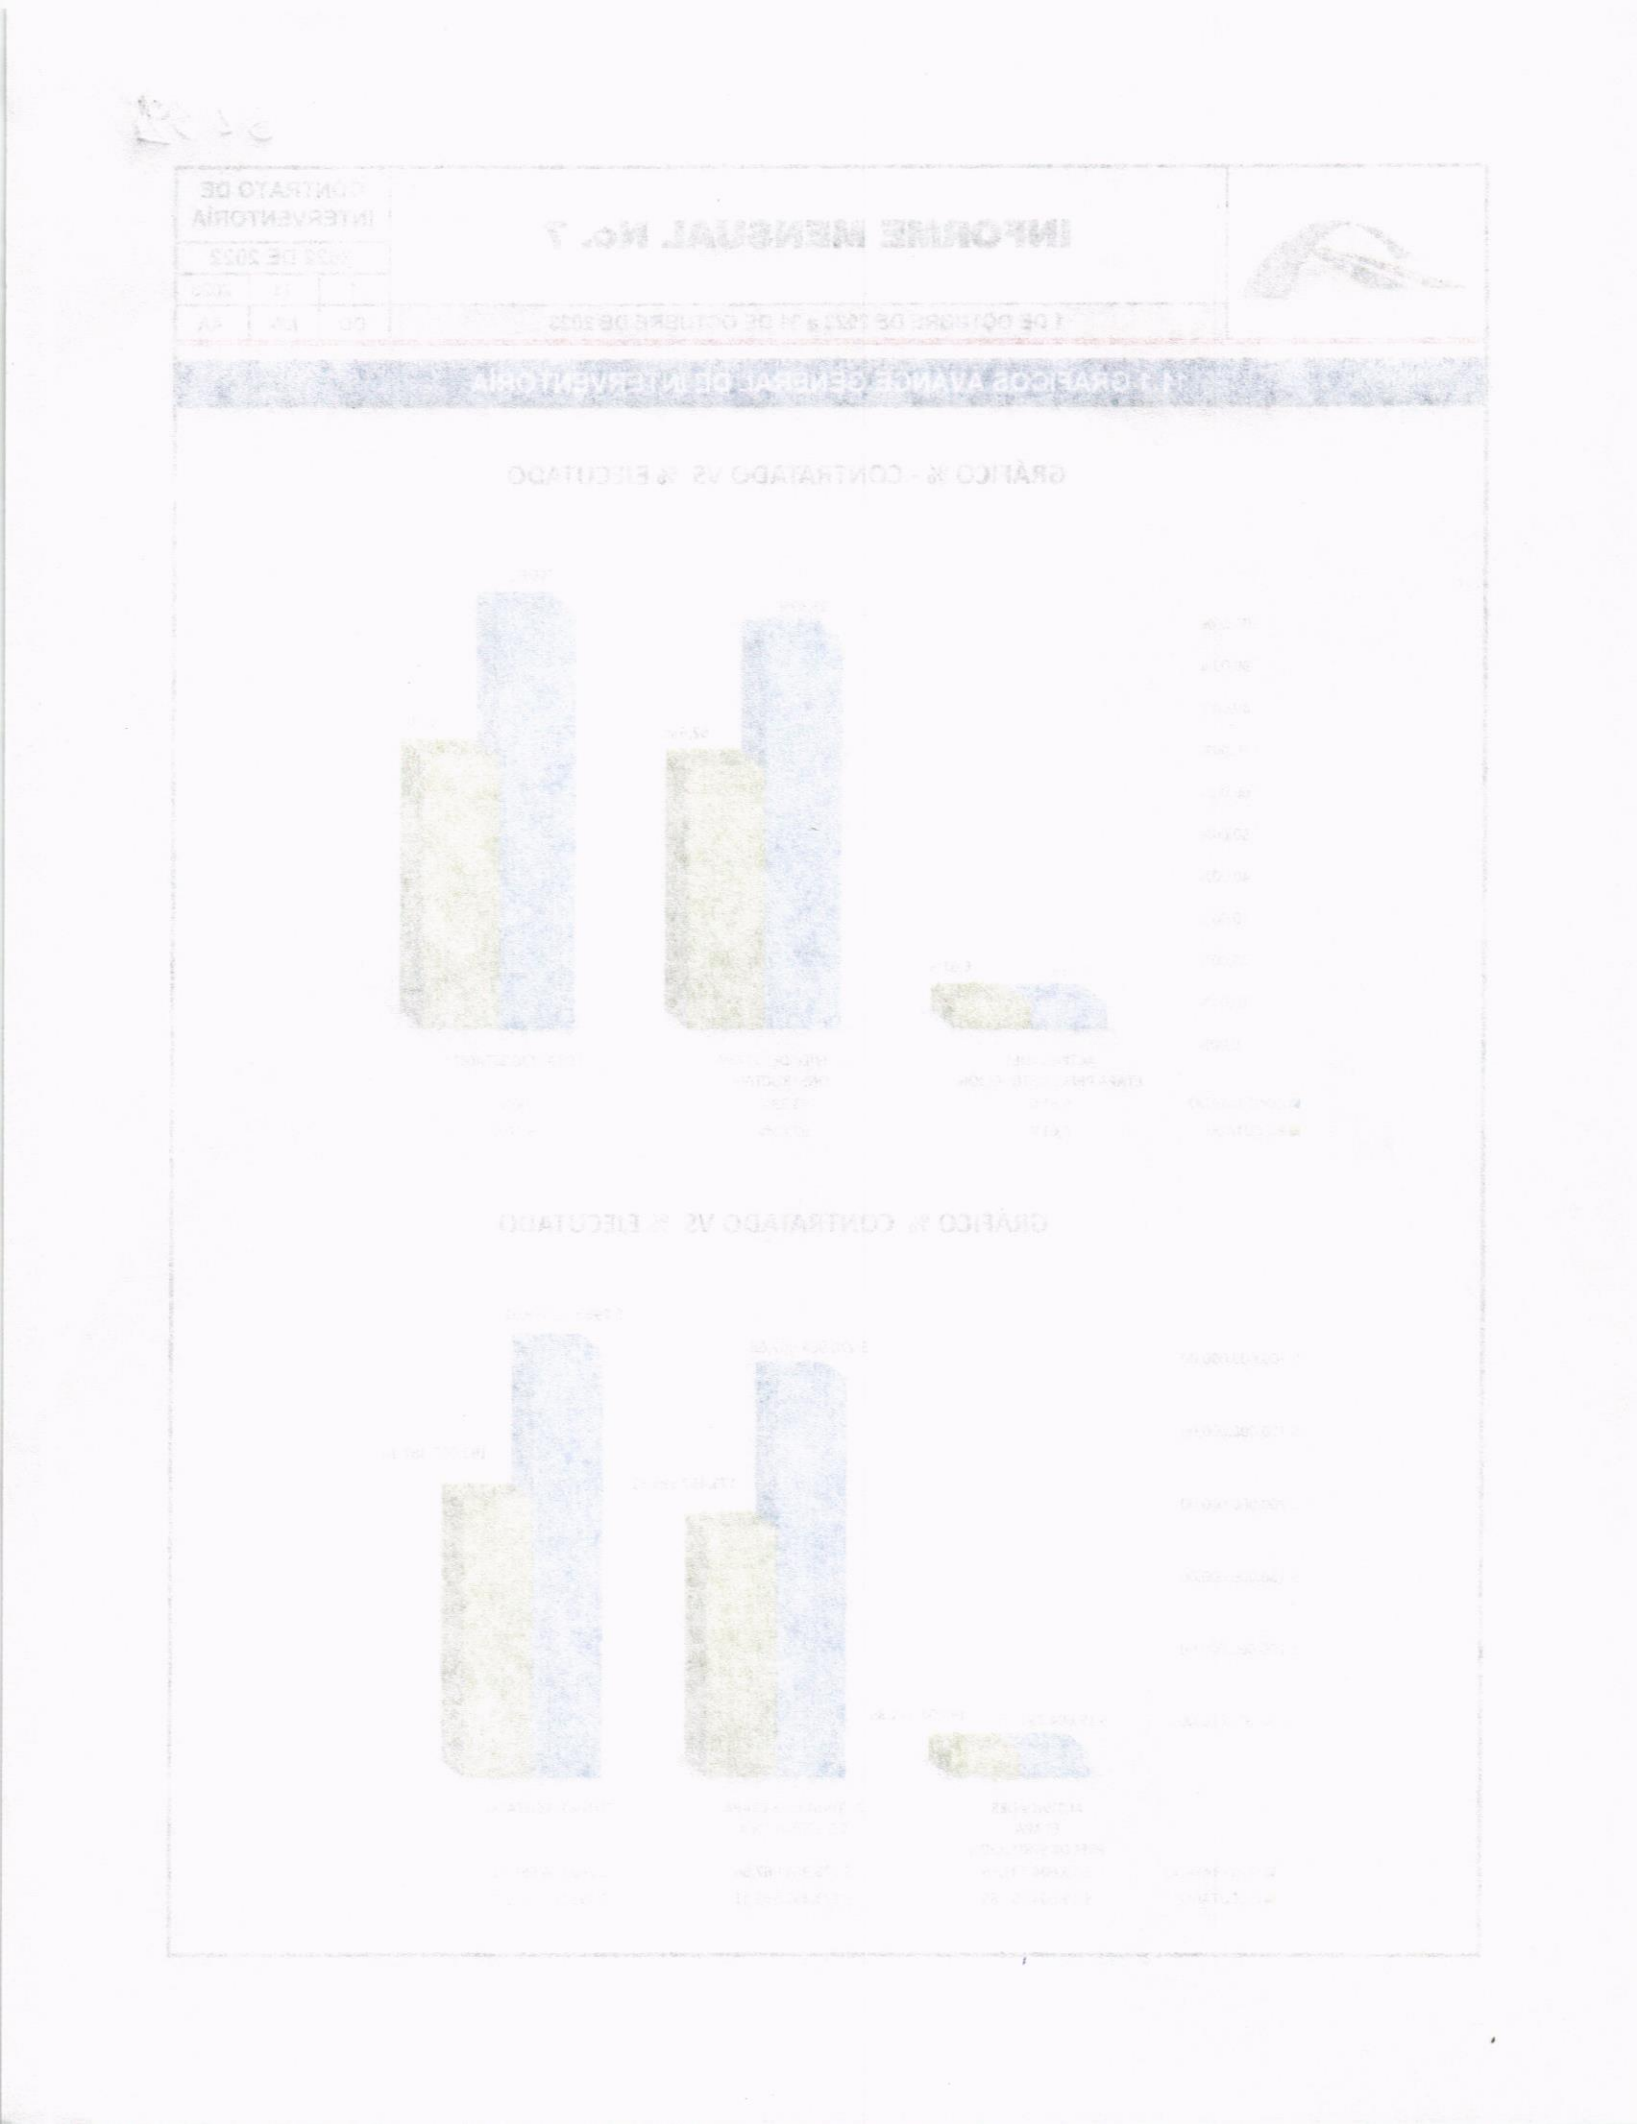


6233

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 11.1 GRAFICOS AVANCE GENERAL DE INTERVENTORÌA

Acorde con el avance de las obras ejecutadas el contrato de interventoría lleva una ejecución que corresponde al 65,10 %, quedando por ejecutar el 34,90%, que en terminos financieros correponde a una ejecución de $193.067.387,16 quedando por ejecutar $103.501.472,84.



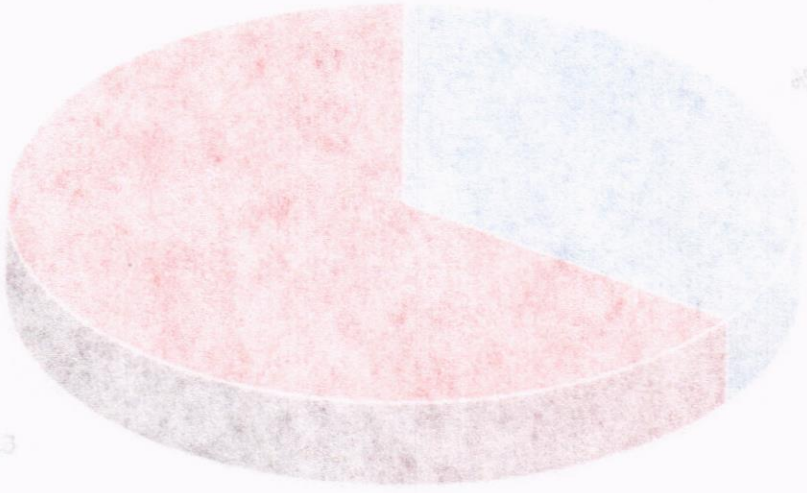

6234

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 11.2 INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 2622 DE 2022

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

### CONDICIONES CONTRACTUALES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VALOR | CANT. EJECUTADA | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **ETAPA PRECONSTRUCCIÓN** | | **$ 16.474.615,00** | | **$ 16.474.615,00** |
| 1.1 | Revisión y verificacion en campo de los diseños | UND | $ 7.292.099,33 | 1,0 | $ 7.292.099,33 |
| 1.2 | Cumplimiento requerimientos ambientales | UND | $ 2.479.180,70 | 1,0 | $ 2.479.180,70 |
| 1.3 | Revisión predial | UND | $ 3.532.557,87 | 1,0 | $ 3.532.557,87 |
| 1.4 | Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos | UND | $ 1.517.990,35 | 1,0 | $ 1.517.990,35 |
| 1.5 | Permisos y/o Disponibilidad fuentes de materiales | UND | $ 1.652.787,13 | 1,0 | $ 1.652.787,13 |
| **2.** | **ETAPA CONSTRUCTIVA** | | **$ 232.742.914,00** | | **$ 145.766.886,81** |
| 2.1 | Interventoría Técnica | UND | $ 69.823.489,76 | 62,63% | $ 43.730.451,64 |
| 2.2 | Interventoría Ambiental | UND | $ 69.823.489,76 | 62,63% | $ 43.730.451,64 |
| 2.3 | Interventoría Administrativa | UND | $ 69.823.489,76 | 62,63% | $ 43.730.451,64 |
| 2.4 | Interventoría Financiera | UND | $ 9.299.966,81 | 62,63% | $ 5.824.569,21 |
| 2.5 | Interventoría Contable | UND | $ 9.183.966,81 | 62,63% | $ 5.751.918,41 |
| 2.6 | Interventoría Jurídica | UND | $ 4.788.510,74 | 62,63% | $ 2.999.044,28 |

| | | |
|---|---|---|
| **COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS** | **$** | **162.241.501,81** |
| **IVA** | **$** | **30.825.885,34** |
| **COSTO FINAL AJUSTADO AL PESO** | **$** | **193.067.387,15** |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME MENSUAL No. 7** | CONTRATO DE INTERVENTORÍA |
| | | 2827 DE 2022 |
| | | |
| | DEL 05 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD MM AA |

## 1.2 INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 2827 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LEONHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 VIAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL BARRIO URBANIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

### CONDICIONES CONTRACTUALES

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | VALOR | CANT. EJECUTADA | VALOR EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETAPA PRECONSTRUCCION | | $ 16.474.619,00 | | $ 16.474.619,00 |
| 1.1 | Revisión y verificación en campo de los diseños | UNO | $ 2.252.099,33 | 1,0 | $ 2.252.099,33 |
| 1.2 | Cumplimiento requerimientos ambientales | UNO | $ 2.472.180,70 | 1,0 | $ 2.472.180,70 |
| 1.3 | Revision predial | UNO | $ 3.852.857,67 | 1,0 | $ 3.852.857,67 |
| 1.4 | Permisos y/o Disponibilidad de servicios públicos | UNO | $ 1.917.980,35 | 1,0 | $ 1.917.980,35 |
| 1.5 | Permisos y/o Disponibilidad Predios de materiales | UNO | $ 1.902.787,15 | 1,0 | $ 1.902.787,15 |
| 2 | ETAPA CONSTRUCTIVA | | $ 232.742.914,00 | | $ 146.759.860,67 |
| 2.1 | Intervención Técnica | UNO | $ 6.687.823,76 | 62,85% | $ 4.203.730,45 |
| 2.2 | Intervención Ambiental | UNO | $ 6.687.823,76 | 62,85% | $ 4.203.730,45 |
| 2.3 | Intervención Administrativa | UNO | $ 6.687.823,76 | 62,85% | $ 4.203.730,45 |
| 2.4 | Intervención Financiera | UNO | $ 9.299.968,67 | 62,85% | $ 5.844.880,21 |
| 2.5 | Intervención Contable | UNO | $ 9.163.968,67 | 62,85% | $ 5.759.019,41 |
| 2.6 | Intervención Jurídica | UNO | $ 4.786.510,74 | 62,85% | $ 3.008.044,28 |
| | COSTO PERSONAL - COSTOS DIRECTOS | | | | $ 163.234.479,67 |
| | IVA | | | | $ 30.914.551,33 |
| | COSTO FINAL AJUSTADO AL PESO | | | | $ 194.149.031,00 |

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 11.2 INFORMACION PRESUPUESTAL

| CONCEPTO | CONTRATO INICIAL | |
|---|---|---|
| Certificado de disponibilidad presupuestal | No: | 2203976 |
| | Fecha : | 23/11/2022 |
| | Valor: | $ 109.730.478,20 |
| Certificado de disponibilidad presupuestal Vigencias Futuras | No: | 2300032 |
| | Fecha : | 4/01/2023 |
| | Valor: | $ 186.838.381,80 |
| Registro Presupuestal | Registro | 2202622 |
| | Fecha | 29/12/2022 |
| | Valor | $ 109.730.478,20 |
| Registro Presupuestal Vigendias Futuras | Registro | 2302622 |
| | Fecha | 4/01/2023 |
| | Valor | $ 186.838.381,80 |

## INFORMACION RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y DERECHOS.

| CONCEPTO | CONTRATO INICIAL | |
|---|---|---|
| Estampilla Adulto Mayor vigente código 410576002 | No: | 23000198 |
| | Fecha : | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 7.476.500,00 |
| Estampilla prodeporte vigente código 131101005 | No: | 23000015 |
| | Fecha : | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 6.230.438,00 |
| Estampilla prounitropico vigente código 410576005 | No: | 23000016 |
| | Fecha : | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 3.738.263,00 |
| Estampilla prodesarrollo vigente código 410576003 | No: | 23000196 |
| | Fecha : | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 2.492.200,00 |
| Estampilla procultura vigente código 410576001 | No: | 23000195 |
| | Fecha : | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 2.492.200,00 |

# INFORME MENSUAL No. 7

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2022 DE 2022 | | |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 2023 |
| AA | MM | DD |

## 1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

| CONCEPTO | CONTRATO INICIAL | |
|---|---|---|
| Certificado de disponibilidad presupuestal | No: | 2289870 |
| | Fecha : | 23/11/2022 |
| | Valor: | $ 109.730.479,20 |
| Certificado de disponibilidad presupuestal Vigencias Futuras | No: | 2290032 |
| | Fecha: | 16/1/2023 |
| | Valor: | $ 158.839.381,60 |
| Registro Presupuestal | Registro | 2292022 |
| | Fecha | 29/12/2022 |
| | Valor | $ 109.730.479,20 |
| Registro Presupuestal Vigencias Futuras | Registro | 2292822 |
| | Fecha | 16/1/2023 |
| | Valor | $ 158.839.381,60 |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL DE PAGOS REALIZADOS (CONTRATISTA Y DEMÁS)

| CONCEPTO | CONTRATO INICIAL | |
|---|---|---|
| Estampilla Adulto Mayor vigente código 4105/7/2022 | No: | 2290018 |
| | Fecha : | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 7.478.000,00 |
| Estampilla procultura vigente código 131/10/1065 | No: | 2290019 |
| | Fecha : | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 8.230.426,00 |
| Estampilla pro universidad vigente código 4105/7/2005 | No: | 2290019 |
| | Fecha : | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 7.734.283,00 |
| Estampilla desarrollo vigente código 4105/7/2005 | No: | 2290019 |
| | Fecha | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 2.492.200,00 |
| Estampilla procultura vigente código 4105/7/2021 | No: | 2290019 |
| | Fecha: | 16/01/2023 |
| | Valor: | $ 2.492.200,00 |

6236
107

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

## 12. CONCLUSIONES

### CONCLUSIONES

| | |
|---|---|
| 1. | **AVANCE DE LAS OBRAS :** Para el presente INFORME No. 7 se tiene un avance de obra acumulado del 62,63%, y un avance en el contrato de interventoria del 65,10%, el cual corresponde a actividades de Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de cemento al 1%, instalación de lechada asfáltica, nivelación de pozos, demolición de cunetas y vaciado de concreto para cunetas. |
| 2 | **PLAZO DE EJECUCIÓN :** De acuerdo a la suscripción del Acta de Inicio fijada el dia 23 de marzo de 2023, el contrato de obra publica No. 2627 de 2022 tiene como fecha de terminación actual el día 22 de noviembre de 2023. |
| 3 | La INTERVENTORÍA , ha dado lugar al cumplimiento de todas sus obligaciones y funciones de acuerdo con el desarrollo de actividades realizadas por parte del contratista de obra, llevando seguimiento y riguroso control de cada una de las actividades ejecutadas. |
| 4 | Finalizado este periodo, se dan por terminadas las actividades de instalación de lechada asfáltica sobre las dos calzadas de la calle 10, de igual forma es importante tener en cuenta tres observaciones que se evidencien en este tramo: (i). Se presentan daños puntuales en la última capa de lechada asfáltica debido a que se evidencian roturas en la carpeta de lechada ocacionado por las patas de las motos las cuales generan un punzonamiento, estos desperfectos deben ser corregidas por el contratista de obra para poder avalar la entrega de la obra; (ii). Se evidencia que falta la instalación de las dos capas de lechada sobre los cruces de los intercambiadores viales, los cuales se deben realizar para avalar el acta de recibo del contrato; y (iii). Los pozos y encharcamientos que se presentaban inicialmente sobre la carpeta de rodadura de este tramo no se pudieron corregir en su totalidad, teniendo en cuenta que el objeto del contrato tiene como finalidad intervenir únicamente la carpeta de rodadura, lo que impide cambiar las pendientes de este tramo y por ende no se pudo garantizar la total evacuación de las aguas acumulados sobre la nueva carpeta; adicional a esto, y otro de los limitantes que impiden realizar las actividades de cambio de pendiente de la vía son las bajantes existente dentro de los andenes, las cuales son provenientes de las viviendas que se encuentran a los costados de la vía intervenida, teniendo en cuenta que, el nivel de la cota rasante de estos colectores se encuentra al mismo nivel de la cota final de la segunda capa de lechada lo que impidió cambiar los desniveles de la vía ya que al realizarlo se obstruiría la salida del agua dejando de esta manera selladas la gran mayoría de bajantes. |

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

6237



# 13. ANEXOS

## 15. ANEXOS

6238
109

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

# 13.1 INFORME DE OBRA

## 13.1 INFORME DE OBRA

6239

| | INFORME MENSUAL No. 7 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 11 | 2023 |
| | 1 DE OCTUBRE DE 2023 a 31 DE OCTUBRE DE 2023 | DD | MM | AA |

# 13.2 COPIA BITACORA DE OBRA

## 13.2 COPIA BITACORA DE OBRA

 6240

→ DOMINGO 01/10/2023.

→ CLIMA: Mañana Soleado ; Tarde: Soleado

→ PERSONAL

- Director (1).
- Residente (1)
- Prof. SISO (3).
- Aux SISO (2)
- Prof. APOYO (1)
- Inspector (1)
- Topografo (4)
- Esp. pavimento (1).
- Cadenero (3)
- Control vial (8)
- Ayudante (6).
- Ayudante Rodillo (6).
- Conductores (8).
- Operadores (8).
- Ing. Ambiental (1).
- Esp. Gerencia Proyectos (1).

→ MAQUINARIA.

- Recicladora (1)
- Motoniveladora (1).
- Compactador doble rodillo (1).
- Compactador de llanta (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora Sobre Oruga (1)
- Volqueta (2).
- Carro tanque (2)
- Camión Tubo (1).
- Camión Slurry (1)
- Herramienta Menor. (1).

→ ACTIVIDADES.

- El día de hoy se descanso, debido a los inconveniente con el insumo principal para el desarrollo de las actividade de pavimento reciclado
- Implementación de PMT y PSGS

Residente de Obra.

residente interventoria.

Powered by CamScanner

LUNES 02/10/2023.

→ CLIMA: Mañana Soleado ; Tarde: Soleado

→ PERSONAL.

- Director (1)
- Residente (1).
- Prof. SISO (3)
- NUE SISO (2)
- Prof. MPOYO (1)
- Inspector (1).
- Topografo (4)
- Esp. Pavimento (1)
- Cadenero (3).
- Control Vial (8).
- Ayudante (6).
- Ayudante Técnico (6).
- Conductores (8).
- Operadores (8).
- Ing Ambiental (1)
- Esp. Gerencia Proyectos (1)

→ MAQUINARIA.

- Recicladora (2).
- Motoniveladora (1)
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador de llanta (2).
- Minicargador (2).
- Excavadora Sobre Oruga (1)
- Volqueta (2)
- Carro tanque (2).
- Camión Tuba (1).
- Camion silo/y (1).
- Herramienta Menor.

⇒ ACTIVIDADES.

- Se reinian actividades de fresado en calle 24 desde la abscisa K2+540 hasta la abscisa K2+800.
- Implementación de PMT y PSGS.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

6247

MARTES 03/10/2023.

CLIMA: Nublado; Soleado ; Lluvia: Soleado

⇒ PERSONAL.

- Director (1).
- Residente (1).
- Prof. SISO (3).
- Aux. SISO (2).
- Prof. Apoyo (1)
- Inspector (1).
- Topografo (4).
- ESP. Pavimento (1).
- Cadenero (3).
- Control vial (8)
- Ayudante (c).
- Ayudante Tecnico (6).
- Conductores (6).
- Operadores (8).
- Ing Ambiental (1).
- Esp. Gerencia proyectos. (1)

⇒ MAQUINARIA.

- Recicladora. (2).
- Motoniveladora (1)
- Compactador de llanta (2).
- Compactador de doble rodillo (1).
- Mini cargador (1).
- Excavadora sobre Orugas (1).
- Volqueta (2)
- Carro tanque (2).
- Camión Tubo (1).
- Camión slurry (1)
- Herramienta Menor (1).

⇒. ACTIVIDADES.

- Se realizan actividades de reciclado de pavimento sobre calle 24 desde la abscisa K2+540 hasta la abscisa K2+880.
- Se realizan actividades de vaciado de concreto de 3000 PSI sobre calle 24 desde la abscisa K0+260 hasta la abscisa K0+365.
- Implementación del PMT y PASO.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner

MIERCOLES 04/10/2023.

→ CLIMA: Mañana: Soleado ; Tarde: Soleado

→ PERSONAL.

- Director (1).
- Residente (1).
- Prof. SISO (3).
- Aux. SISO (2).
- Prof. Apoyo (1).
- Inspector (1).
- Topografo (4).
- Esp. Pavimento (1)
- Cadenero (3).
- Control Vial (8).
- Ayudante (6)
- Ayudante Técnico (6).
- Conductores (6)
- Operadores (8)
- Ing. Ambiental (1)
- Esp. Gerencia Proyectos (1)

→ MAQUINARIA.

- Recicladora (1).
- Motoniveladora (1).
- Compactador doble rodillo (1)
- Compactador de llanta (2).
- Minicargador (2)
- Excavadora Sobre Oruga (1).
- Volqueta (2).
- Carro tanque (2).
- Camion Turbo (1).
- Camion Sluly (1).
- Herramienta Menor.

→ ACTIVIDADES.

- Fresado de Pavimento sobre calle 24 desde la abscisa K2+340 hasta la abscisa K2+540.
- Implementación de PMT y PSGS

Residente de Obra

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

 6242

JUEVES 05/10/2023.

⇒ CLIMA: Mañana Soleado ; Tarde: Soleado

⇒ PERSONAL.

- Director (1).
- Residente (1)
- Prof. SISO (3).
- Aux. SISO (2).
- Prof. Apoyo (1).
- Inspector (1).
- Topografo (4).
- Esp. Pavimento (1)
- Cadenero (3).
- Control vial (8).
- Ayudante (6).
- Ayudante Tecnico (6).
- Conductores (6).
- Operadores (8).
- Ing Ambiental (4).
- Esp. Gerencia Proyectos (1).

⇒. MAQUINARIA.

- Recicladora (2).
- Motoniveladora (1).
- Compactador doble rodillo (1).
- Compactador de llanta (2).
- Minicargador (2).
- Excavadora sobre Oruga (1)
- Volqueta (2).
- Carro tanque (2)
- Camion Tubo (1).
- Camion slurry (1)
- Herramienta Menor

⇒. ACTIVIDADES.

- Reciclado de pavimento con adicion de cemento sobre calle 24 desde la abscisa K2+340 hasta la abscisa K2+540
- Implementación de PMT y PASA.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Powered by CamScanner

VIERNES. 06/10/2023.

- CLIMA: Mañana Soleado ; Tarde: Soleado

→ PERSONAL.

- Director (1)
- Residente (1)
- Prof. SISO (3)
- Aux. SISO (2)
- Prof. Apoyo (1)
- Inspector (1)
- Topografo (4)
- Esp. Pavimento (1)
- Cadenero (3)
- Control vial (8)
- Ayudante (6)
- Ayudante Técnico (6)
- Operadores (8)
- Conductores (6)
- Ing. Ambiental (1)
- Esp. Gaceria Prefecto (1)

→ MAQUINARIA.

- Recicladora (1)
- Motoniveladora (1)
- Compactador doble rodillo (4)
- Compactador de llanta (2)
- Minicargador (2)
- Excavadora Sobre Orugas. (1)
- Volqueta (2)
- Carro Tanque (1)
- Camión Pluma (1)
- Camión slurry (1)
- Herramienta Menor.

→ ACTIVIDADES.

- Fresado y recidado de pavimento sobre calle 24 entre las abscisas K2+240 hasta la abscisa K+340.
- Implementación de PMT y PAGA.

Residente de Obra

Residente Interventoría

Powered by CamScanner
