CONSORCIO FENIX

7	OSCAR JAVIER SUELTA BARRERA	PROFESIONAL DE APOYO TECNICO Y ADMON	1.007.703.698	CONSORCIO FENIX	
8	SAUL ALBERTO RAMOS SIERRA	CONDUCTOR DE VOLQUETA SENCILLA	78.296.459	CONSORCIO FENIX	
9	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA GARZON	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	4.193.974	CONSORCIO FENIX	
10	MARY LIZBETH SIERRA PINZON	CONTROLADOR VIAL	1.118.531.636	CONSORCIO FENIX	16/01/2024
11	MARIA MAGDALENA DIAZ GALAN	CONTROLADOR VIAL	1.117.324.520	CONSORCIO FENIX	2/01/2024
12	EDGAR PINZON SALCEDO	OPERADOR COMPACTADOR	1.118.539.551	CONSORCIO FENIX	
13	WINSTON JAIRSON DAJOME CORTES	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	98.427.898	CONSORCIO FENIX	
14	FABIO EMILIO CABRA SARMIENTO	CONTROLADOR VIAL	9.431.049	CONSORCIO FENIX	16/01/2024
15	MARIA ELIZABETH OJEDA TORRES	CONTROLADOR VIAL	1.116.642.196	CONSORCIO FENIX	16/01/2024

Fuente: Elaboración propia

5.3. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES

A continuación, se relaciona el número de planilla y valor pagado por el concepto de seguridad social, salud, pensión, ARL y Caja de compensación durante la ejecución del Contrato de Obra por el Consorcio Fenix y se anexa los soportes de pago de seguridad social correspondientes al periodo del presente informe.

No.	MES	FECHA PAGO	No. PLANILLA	VALOR PAGADO
1	ENERO DE 2024	20/02/2024	9463220398	$8.525.000,00

Se relaciona los números de planilla por concepto de seguridad social para el Ingeniero Residente de Obra y el Ingeniero Especialista en Pavimentos

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO	IBC	PENSIÓN		SALUD		ARL		CAJA DE COMPENSACIÓN	PLANILLA
				Valor	AFP	Valor	EPS	ARL	Valor	Valor	
74.381.373	RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	ene-24	$ 6.500.000,00	$ 1.105.000,00	PORVENIR	$ 260.000,00	SANITAS	COLMENA	$ 452.400,00	$ 260.000,00	9463212771
80.727.921	ORLANDO JAVIER GONZALEZ CASTIBLANCO	ene-24	$ 1.300.000,00	$ 208.000,00	PROTECCION	$ 52.000,00	COMPENSAR	ARL SURA	$ 90.500,00	$ 48.000,00	7912030428

CONSORCIO FENIX

5.4. SOPORTES PAGOS FIC

A continuación, se relaciona el pago FIC efectuado por el contratista en el presente periodo y se anexa el soporte de pago correspondiente.

N°	MES	FECHA PAGO	REFERENCIA	VR PAGADO
1	ENERO DE 2024	20/02/2024	105019919	$715.000,00

Con lo anterior se informa el pago a los aportes de la seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, así como los pagos efectuados al FIC; montos contabilizados y pagados por el CONSORCIO FENIX NIT 901666131-3, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024, en desarrollo del contrato de obra pública No. 2627, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL."

8156

CONSORCIO FENIX

REPORTE MENSUAL DE OBRA

CÓDIGO	EJE-FTO-003
VERSIÓN	4
FECHA DE APROBACIÓN	13/9/2013

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Fecha	31/01/2024	N° Orden de Trabajo	2627 de 2022	PRY N.	3036009025	Cliente	Gobernacion Casanare
						Sector	Vias Urbanas

Resumen

Valor Ejecutado en el Mes:	$ 171.384.769,84	% Programado a la Fecha:		Fecha inicio:	23-mar-23	Plazo en Días:	351,00
Valor Total Acumulado:	$ 5.776.197.676,19	% Ejecutado a la Fecha:	76,87%	Fecha Terminación:	7-mar-24	Días en Obra:	314,00
Valor total del contrato	$ 7.513.820.382,00	Diferencia:	76,87%			Días para entregar:	-37,00

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad Acumulada mes Anterior	Cantidad Ejecutada presente Mes	Valor Ejecutado Mes	Cantidad Acumulada	Valor Total Acumulado	Incidencia	% Ejecución Item Acumulado Respecto a Incidencia	% Item Acumulado
	1.BACHEO												
1,01	Corte en Carpeta Asfaltica	m	1.523,25	$ 11.749,00	$ 17.896.664,25	1.522,50	-	$ -	1522,50	$ 17.887.852,50	0,24%	0,238%	99,95%
1,02	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e. prom 0.10 m	m2	1.338,91	$ 30.652,00	$ 41.040.269,32	1.066,22	-	$ -	1066,22	$ 32.681.775,44	0,55%	0,43%	79,63%
1,03	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	1.569,75	$ 10.276,00	$ 16.130.751,00	-	-	$ -	0,00	$ -	0,21%	0,00%	0,00%
1,04	Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m	m2	1.064,22	$ 153.272,00	$ 163.115.127,84	-	-	$ -	0,00	$ -	2,17%	0,00%	0,00%
1,05	Acero de Transferencia liso de 60000 Psi	Kg	1.019,07	$ 9.765,00	$ 9.951.218,55	-	-	$ -	0,00	$ -	0,13%	0,00%	0,00%
1,06	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	540,69	$ 45.797,00	$ 24.761.979,93	-	-	$ -	0,00	$ -	0,33%	0,00%	0,00%
1,07	Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente manual con retiro	m3	233,21	$ 96.300,00	$ 22.458.123,00	51,68	-	$ -	51,68	$ 4.976.784,00	0,30%	0,07%	22,16%
1,08	Base granular (INV. 330.1)	m3	233,21	$ 123.954,00	$ 28.907.312,34	51,68	-	$ -	51,68	$ 6.405.942,72	0,38%	0,09%	22,16%
1,09	Imprimación con Emulsión Asfáltica	m2	1.571,99	$ 5.408,00	$ 8.501.321,92	1.066,22	-	$ -	1066,22	$ 5.766.117,76	0,11%	0,08%	67,83%
1,1	Mezcla Asfaltica MDC 2 o 19	m3	141,38	$ 1.089.166,00	$ 153.986.289,08	98,19	-	$ -	98,19	$ 106.945.209,54	2,05%	1,42%	69,45%
1,11	transporte de material Petreo (via pavimentada)	m3Km	3.506,14	$ 2.065,00	$ 7.240.179,10	1.402,72	-	$ -	1402,72	$ 2.896.616,80	0,10%	0,04%	40,01%
1,12	Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m	m2	1.136,48	$ 52.223,00	$ 59.350.395,04	4,33	-	$ -	4,33	$ 226.125,59	0,79%	0,00%	0,38%
1,13	Nivelacion de Pozos de Inspeccion (No incluye: Tapa ni aro)	Und	62,00	$ 233.815,00	$ 14.496.530,00	39,00	-	$ -	39,00	$ 9.118.785,00	0,19%	0,12%	62,90%
1,14	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa)	Und	62,00	$ 1.533.744,00	$ 95.092.128,00	39,00	-	$ -	39,00	$ 59.816.016,00	1,27%	0,80%	62,90%
1,15	Geomalla biaxial para refuerzo capas granulares 50 kn/m. Suministro e instal.	m2	777,53	$ 22.612,00	$ 17.581.508,36	105,41	-	$ -	105,41	$ 2.383.530,92	0,23%	0,03%	13,56%
	2. ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA												
2,01	Sello de grietas	m	296,30	$ 5.441,00	$ 1.612.168,30	296,30	-	$ -	296,30	$ 1.612.168,30	0,02%	0,02%	100,00%
2,02	Imprimación con Emulsión Asfáltica	m2	103.267,72	$ 5.408,00	$ 558.471.829,76	89.177,73	-	$ -	89177,73	$ 482.273.163,84	7,43%	6,42%	86,36%
2,03	Pavimento Reciclado en frio en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	2.711,83	$ 291.650,00	$ 790.905.219,50	2.708,32	-	$ -	2708,32	$ 789.881.528,00	10,53%	10,51%	99,87%
2,04	Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm	m2	206.535,44	$ 16.631,00	$ 3.434.890.902,64	172.168,26	**7.121,84**	$ 118.443.321,04	179290,10	$ 2.981.773.653,10	45,71%	39,68%	86,81%
NP 01	Pavimento Reciclado en frio en el lugar con Emulsión asfáltica con adicion de 1% de cemento	m3	4.341,23000	$ 319.582,00	$ 1.387.378.965,86	3.146,29	-	$ -	3146,29	$ 1.005.497.650,78	18,46%	13,38%	72,47%

8157

CONSORCIO FENIX

REPORTE MENSUAL DE OBRA

CÓDIGO	EJE-FTO-003
VERSIÓN	4
FECHA DE APROBACIÓN	13/9/2013

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Fecha	31/01/2024	N° Orden de Trabajo	2627 de 2022	PRY N.	3036009025	Cliente	Gobernacion Casanare
						Sector	Vias Urbanas

Resumen

Valor Ejecutado en el Mes:	$ 171.384.769,84	% Programado a la Fecha:		Fecha inicio:	23-mar-23	Plazo en Días:	351,00
Valor Total Acumulado:	$ 5.776.197.676,19	% Ejecutado a la Fecha:	76,87%	Fecha Terminación:	7-mar-24	Días en Obra:	314,00
Valor total del contrato	$ 7.513.820.382,00	Diferencia:	76,87%			Días para entregar:	-37,00

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad Acumulada mes Anterior	Cantidad Ejecutada presente Mes	Valor Ejecutado Mes	Cantidad Acumulada	Valor Total Acumulado	Incidencia	% Ejecución Ítem Acumulado Respecto a Incidencia	% Ítem Acumulado
	3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE												
3,01	Demolicion de cunetas (Incl. Retiro)	m3	97,00	$ 80.769,00	$ 7.834.593,00	85,83	-	$ -	85,83	$ 6.932.403,27	0,10%	0,09%	88,48%
NP 02	CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSI e=0.10 M	m3	115,98	$ 749.711,00	$ 86.951.481,78	85,83	-	$ -	85,83	$ 64.347.695,13	1,16%	0,86%	74,00%
	4. SEÑALIZACION												
4,01	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	40.452,09	$ 4.519,00	$ 182.802.994,71	6.888,50	-	$ -	6888,50	$ 31.129.131,50	2,43%	0,41%	17,03%
4,02	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m2	4.012,36	$ 38.802,00	$ 155.687.592,72	917,60	1.364,40	$ 52.941.448,80	2282,00	$ 88.546.164,00	2,07%	1,18%	56,87%
4,03	Estoperol metalico 14 x 4 cm	Und	1.000,00	$ 28.858,00	$ 28.858.000,00	-	-	$ -	0,00	$ -	0,38%	0,00%	0,00%
	ITEM NO PREVISTO												
NP 03	Sardinel Prefabricado A-10 (0,80 x 0.20 x 0,50) incluye mortero de peque y nivelación.	m	300,00	$ 76.411,00	$ 22.923.300,00	-	-	$ -	0,00	$ -	0,31%	0,00%	0,00%
NP 04	Resalto u Ondulación (Reductor de Velocidad) Concreto 4000 psi, 280 Kg/cm2	m	54,00	$ 564.652,00	$ 30.491.208,00	-	-	$ -	0,00	$ -	0,41%	0,00%	0,00%
	PMT	Und	1,00	$ 49.879.069	$ 49.879.069,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 49.879.069	0,66%	0,66%	100,00%
	PAGA	Und	1,00	$ 25.220.293	$ 25.220.293,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 25.220.293	0,34%	0,34%	100,00%
RECURSOS PENDIENTES DE INVERSIÓN					$ 69.402.966,00						0,92%		
	Subtotal incluye AIU				**$ 7.513.820.382,00**			**$ 171.384.769,84**		**$ 5.776.197.676,19**			
	Administración	28,00%											
	Imprevistos	1,00%											
	Utilidad	5,00%											
	Total AIU												
	Valor Total				**$ 7.513.820.382,00**	**% Ejec.Mes**	2,28%	**$ 171.384.769,84**		**$ 5.776.197.676,19**	**100%**	**76,87%**	

CONSORCIO FENIX

6. INFORME TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERÍODO

CAPITULO 2 ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFÁLTICA

2.04 Lechada asfáltica con emulsión CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10 mm

Esta actividad consiste en aplicar la Lechada Asfáltica con emulsión CRL-1hm, tipo LA-13 con un espesor de 1 cm, es ejecutada teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Invias (INV 433-22), diseños, ensayos de laboratorio y/o recomendaciones por parte de los especialistas. Esta actividad en mención se realiza después de haber ejecutado reparcheo y/o bacheo, pavimento reciclado en frío en el lugar con emulsión asfáltica e imprimación con emulsión asfáltica, su ejecución se realizó en la calle 24 calzada derecha segunda capa (Entre carrera 20 y carrera 19 y entre carrera 10 y carrera 5), lechada asfáltica en las intersecciones de la calle 9, calle 10 y calle 24.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 1	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME MENSUAL	% ACUMULADO
2	2. ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA					
2,04	Lechada asfáltica con emulsión CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm	m2	222.029,84	206.535,45	7.121,84	86,81%

Lechada asfáltica con emulsión CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm









CONSORCIO FENIX

Lechada asfáltica con emulsión CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm	
	
	

CAPITULO 4 SEÑALIZACIÓN

4.02 Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)

Esta actividad consiste en la aplicación de pintura acrílica, retrorreflectiva con microesferas, es ejecutada teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Invias (INV 700.1), diseños, ensayos de laboratorio y recomendaciones por parte de interventoría, se realizó la demarcación vial de marcas viales (Cebras, y Líneas de delimitación a la intersección) en la calle 24 entre carrera 50 y carrera 20 calzada izquierda y Carrera 18 (Caño Seco) calzada subiendo y bajando.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 1	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME MENSUAL	% ACUMULADO
4	4. SEÑALIZACION					
4,02	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m2	4.012,36	4.012,36	1.364,40	56,87%

Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)



7. AVANCE DE OBRA Y VALOR EJECUTADO

En el presente informe mensual se ejecutó un valor de $ 171.384.769,84M/CTE, con un porcentaje de ejecución del 2.28 % para el presente informe mensual.

VALORES	VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME MENSUAL	EJECUTADO TOTAL
VALOR EJECUTADO	$ 171.384.769,84	$ 5.776.197.676,19
VALOR PRESUPUESTAL	$ 7.513.820.382,00	$ 7.513.820.382,00
% EQUIVALENCIA	2,28%	76,87%

Fuente: Elaboración Propia

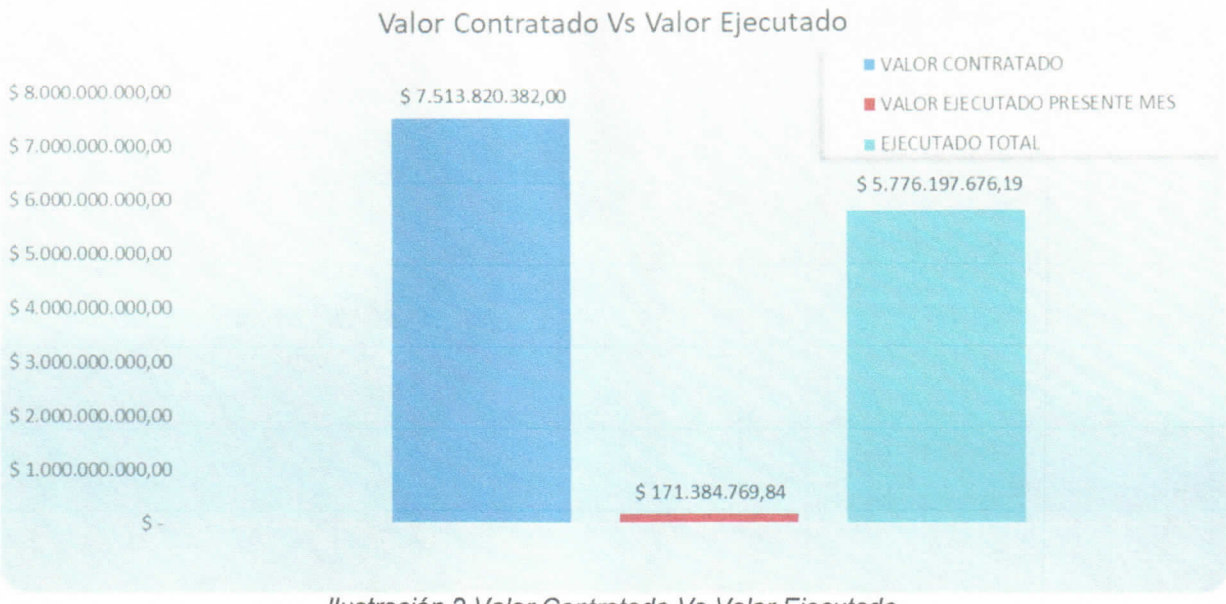


Ilustración 2 Valor Contratado Vs Valor Ejecutado

8. CONCLUSIONES

- El valor ejecutado del presente informe mensual es, ciento setenta y un millones trescinetos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve pesos con ochenta y cuatro centavos. $ 171.384.769,84M/CTE que corresponde al 2.28 % de ejecución para el presente mes. Se ha ejecutado un total de $ 5.776.197.676,19 M/CTE que corresponde a un 76.87 % en relación al valor del por un valor de $ 7.513.820.382,00 M/CTE.
- La ejecución de la obra, los materiales e insumos utilizados durante la obra cumplen con los estándares y certificados de calidad, normas técnicas, procesos constructivos vigentes y las especificaciones técnicas aplicadas al proyecto.
- La metodología implementada en el presente proyecto, optimizó los costos de ejecución en relación con las metodologías convencionales.
- Durante el presente periodo se llevó a cabo la prórroga No 4 al contrato de obra, de fecha 20 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
    - Persisten los bajos rendimientos en la aplicación de lechada asfáltica: toda vez que como lo manifiesta nuestro proveedor de emulsiones asfáltica MPI, se ha generado gran congestión en los despachos, debido a que MPI por ser temporada decembrina y fin de año **no produjo ni despachó pedidos de emulsiones asfálticas desde el día 21 de diciembre de 2023 al 09 de enero de 2024**, siendo un gran lapso de tiempo diecinueve (19) días que afectaron nuestra programación para el desarrollo de las actividades de aplicación de Lechada Asfáltica LA-13.
    - Este antecedente se presentó también en nuestro proveedor: Pétreos y Triturados del Oriente (Petrioriente), que al igual por ser temporada decembrina y vacaciones colectivas **no realizaron despachos de agregados y mezcla asfáltica MDC 19 desde el día 22 de diciembre de 2023 al día 09 de enero de 2024**, generando atrasos y complicaciones en la programación de obra para el desarrollo de las actividades de Bacheo en la calle 10 (Intersecciones) y en la calle 24 en la calzada izquierda desde la carrera 10 hasta la carrera 5 y la calzada derecha entre carrera 7 y carrera 18, por cual se requiere de mayor cantidad de tiempo para realizar la

CONSORCIO FENIX

intervención. Es de resaltar que la emulsión asfáltica y el asfalto MDC 19, son el insumo principal para la ejecución del objeto contractual, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto respecto a las dificultades en el suministro, solicitamos se realice ampliación del plazo de ejecución en 45 días adicionales, en vista que las actividades faltantes por ejecutar equivalen al 7% del contrato, como son: 368.89 m3 del ítem NP 01 Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión Asfáltica con adición de 1% de cemento en la calle 24 calzada izquierda entre carrera 10 y carrera 5. Falta por ejecutar 25.454,33 m2 de Lechada Asfáltica primera y segunda capa, correspondientes a los siguientes tramos: Calle 24 calzada izquierda desde la carrera 5 a la carrera 10, calle 24 calzada derecha de la carrera 10 a la carrera 18 y las áreas de los retornos en la calle 24, estas áreas equivalen al 12% del ítem 2.04 Lechada Asfáltica con emulsión CRL 1Hm, tipo LA-13….falta por realizar el bacheo y/o reparcheo (según aplique) en la calle 24 y en los retornos de la calle 10 con Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19. Esta cantidad de obra faltante por ejecutar requiere del despacho de 3 tractomulas con emulsión asfáltica, lo que equivale a 15 días calendario para obtener el 100% de la emulsión requerida. Adicional a esto y teniendo en cuenta los tiempos estimados de terminación de la instalación de la segunda capa de lechada se debe esperar un tiempo aproximado de 10 días para poder instalar señalización horizontal, dado que es necesario garantizar el curado de la carpeta para posteriormente proceder con las actividades de señalización.

9. ANEXOS

8165

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 957202

martes, 20 de febrero de 2024, 3:49:58 PM

Detalle

$8,525,000.00
Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******3213
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9463220398
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-20 3:47:48
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9463220398
Código Único de Seguimiento	466625791
Dirección IP:	181.225.76.107
Referencia 1:	181.225.76.107
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	901666131

aportes en línea

Planilla Resumen

8166

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666131	3	CONSORCIO FENIX	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO FENIX	CR 05 24 50	YOPAL-CASANARE	3184732061	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	466625791	9463220398	E	2024/02/08	2024/02/20	BANCO DE BOGOTA	12	$8,525,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118572733	ACHAGUA MARIA		X					X		X								X	230301	16	$946,972	$151,600	EPSC25	16	$946,972	$37,900	CCF69	16	$1,582,711	$63,400	14-25	16	$946,972	$66,000	16	$0	$0	SI	$318,900
2	CC	4214374	ADAME CARLOS							X		X									230301	30	$1,377,447	$220,400	EPS005	30	$1,377,447	$55,100	CCF69	30	$1,377,447	$55,100	14-25	30	$1,377,447	$95,900	30	$0	$0	SI	$426,500
3	CC	74183936	ALARCON JOSELIN		X															X	230301	4	$333,334	$53,400	EPS037	4	$333,334	$13,400	CCF69	4	$1,472,748	$59,000	14-25	4	$333,334	$23,300	4	$0	$0	SI	$149,100
4	CC	1118557770	BLANCO IRIS							X		X									230301	27	$1,395,887	$223,400	EPSC25	27	$1,395,887	$55,900	CCF69	27	$1,395,887	$55,900	14-25	27	$1,395,887	$97,200	27	$0	$0	SI	$432,400
5	CC	1118557770	BLANCO IRIS											X							230301	3	$130,000	$20,800	EPSC25	3	$130,000	$5,200	CCF69	0	$0	$0	14-25	3	$130,000	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
6	CC	19499531	BOLAÑOS RUBEN							X											231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC	9431049	CABRA FABIO		X					X		X								X	230301	16	$940,057	$150,500	EPS005	16	$940,057	$37,700	CCF69	16	$1,394,922	$55,800	14-25	16	$940,057	$65,500	16	$0	$0	SI	$309,500
8	CC	4193974	CASTAÑEDA LUIS							X		X									230301	28	$1,459,413	$233,600	EPS041	28	$1,459,413	$58,400	CCF69	28	$1,459,413	$58,400	14-25	28	$1,459,413	$101,600	28	$0	$0	SI	$452,000
9	CC	4193974	CASTAÑEDA LUIS										X								230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
10	CC	4193974	CASTAÑEDA LUIS										X								230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
11	CC	98427898	DAJOME WISTON							X		X									230301	30	$1,343,334	$215,000	EPS037	30	$1,343,334	$53,800	CCF69	30	$1,343,334	$53,800	14-25	30	$1,343,334	$93,500	30	$0	$0	SI	$416,100
12	CC	80385010	DAZA HERNAN																		230201	30	$1,559,394	$249,600	ESSC24	30	$1,559,394	$62,400	CCF69	30	$1,559,394	$62,400	14-25	30	$1,559,394	$108,600	30	$0	$0	SI	$483,000
13	CC	7552750	DIAZ CARLOS							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	1117324520	DIAZ MARIA		X					X										X	230301	2	$86,667	$13,900	EPSC25	2	$86,667	$3,500	CCF69	2	$602,333	$24,100	14-25	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	SI	$47,600
15	CC	1057585115	MUNEVAR VICTOR							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	1024567502	NIÑO MAGDALENA							X		X									230301	29	$1,524,043	$243,900	EPSC25	29	$1,524,043	$61,000	CCF69	29	$1,524,043	$61,000	14-25	29	$1,524,043	$106,100	29	$0	$0	SI	$472,000
17	CC	1024567502	NIÑO MAGDALENA										X								230301	1	$43,334	$7,000	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
18	CC	1116642196	OJEDA MARIA		X					X		X								X	230201	15	$896,723	$143,500	EPS041	15	$896,723	$35,900	CCF69	15	$1,336,484	$53,500	14-25	15	$896,723	$62,500	15	$0	$0	SI	$295,400
19	CC	1116642196	OJEDA MARIA										X								230201	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
20	CC	1118539218	PERILLA LUZ																		230301	30	$1,359,394	$217,600	EPS005	30	$1,359,394	$54,400	CCF69	30	$1,359,394	$54,400	14-25	30	$1,359,394	$94,700	30	$0	$0	SI	$421,100
21	CC	1118539551	PINZON EDGAR							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
22	CC	74859308	QUINTANA WILMAR							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
23	CC	78296459	RAMOS SAUL																		230301	30	$1,559,394	$249,600	EPS005	30	$1,559,394	$62,400	CCF69	30	$1,559,394	$62,400	14-25	30	$1,559,394	$108,600	30	$0	$0	SI	$483,000
24	CC	1118531138	SALAZAR MICHEL							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
25	CC	1118531636	SIERRA MARY		X					X		X								X	230301	16	$967,717	$154,900	EPSC25	16	$967,717	$38,800	CCF69	16	$1,539,495	$61,600	14-25	16	$967,717	$67,400	16	$0	$0	SI	$322,700
26	CC	1007703698	SUELTA OSCAR																		230301	30	$1,459,000	$233,500	EPS005	30	$1,459,000	$58,400	CCF69	30	$1,459,000	$58,400	14-25	30	$1,459,000	$101,600	30	$0	$0	SI	$451,900
27	CC	1118534829	TORRES ARIEL																		230301	30	$1,559,394	$249,600	EPS005	30	$1,559,394	$62,400	CCF69	30	$1,559,394	$62,400	14-25	30	$1,559,394	$108,600	30	$0	$0	SI	$483,000
Total	Afiliados(22)																						$26,871,506	$4,300,800			$26,871,506	$1,068,600			$30,498,729	$1,213,600			$26,871,506	$1,850,200		$0	$0		$8,433,200

2024/02/20 06:57 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

8167

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666131	3	CONSORCIO FENIX	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO FENIX	CR 05 24 50	YOPAL-CASANARE	3184732061	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	466625791	9463220398	E	2024/02/08	2024/02/20	BANCO DE BOGOTA	12	$8,525,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$4,300,800	$46,700	$0	$4,347,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$2,300	$0	$210,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,484,700	$37,700	$0	$3,522,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$400,100	$4,400	$0	$404,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,850,200	$20,100	$0	$1,870,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	$1,850,200	$20,100	$0	$1,870,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,213,600	$13,200	$0	$1,226,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	22	$1,213,600	$13,200	$0	$1,226,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$1,068,600	$11,800	$0	$1,080,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	$254,300	$2,800	$0	$257,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$62,400	$700	$0	$63,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$223,200	$2,500	$0	$225,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$94,300	$1,100	$0	$95,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$434,400	$4,700	$0	$439,100
TOTAL				22	$8,433,200	$91,800	$0	$8,525,000

aportes en línea

Planilla Resumen

8169

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844002568	2	CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 24-50	YOPAL-CASANARE	6328506	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	466566981	9463212771	E	2024/02/15	2024/02/20	BANCO DE BOGOTA	5	$2,624,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$8,679,394	$1,453,800			$8,679,394	$347,200			$8,679,394	$347,200			$8,679,394		$463,800		$0	$0		$2,612,000
Centro de Trabajo: RIESGO TRABAJO 5 (1 Afiliados)																						$6,500,000	$1,105,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,400		$0	$0		$2,077,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$6,500,000	$1,105,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000	$260,000			$6,500,000		$452,400		$0	$0		$2,077,400
1	CC	74381373	BARRAGAN RAFAEL																		230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS005	30	$6,500,000	$260,000	CCF69	30	$6,500,000	$260,000	14-25	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	Si	$2,077,400
Centro de Trabajo: RIESGO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$2,179,394	$348,800			$2,179,394	$87,200			$2,179,394	$87,200			$2,179,394		$11,400		$0	$0		$534,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$2,179,394	$348,800			$2,179,394	$87,200			$2,179,394	$87,200			$2,179,394		$11,400		$0	$0		$534,600
2	CC	74814388	ENGATIVA DANIEL																		230301	30	$2,179,394	$348,800	EPS005	30	$2,179,394	$87,200	CCF69	30	$2,179,394	$87,200	14-25	30	$2,179,394	0.522%	$11,400	30	$0	$0	Si	$534,600
Total	**Afiliados(2)**																					$8,679,394	$1,453,800			$8,679,394	$347,200			$8,679,394	$347,200			$8,679,394		$463,800		$0	$0		$2,612,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844002568	2	CAMEL INGENIERIA & SERVICIOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 5 # 24-50	YOPAL-CASANARE	6328506	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	466566981	9463212771	E	2024/02/15	2024/02/20	BANCO DE BOGOTA	5	$2,624,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,453,800	$6,700	$0	$1,460,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,453,800	$6,700	$0	$1,460,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$463,800	$2,100	$0	$465,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$463,800	$2,100	$0	$465,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$347,200	$1,600	$0	$348,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$347,200	$1,600	$0	$348,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$347,200	$1,600	$0	$348,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$347,200	$1,600	$0	$348,800
TOTAL				2	$2,612,000	$12,000	$0	$2,624,000

2024/02/20 07:02 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901105420
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805	TELÉFONO:	4091821
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JGINGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7912030428		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		432802493

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 0**	**$ 624.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 156.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.500	$ 271.500	$ 0	$ 0	$ 271.500
SUBTOTALES:									**$ 271.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 271.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 143.900	$ 0	$ 143.900
SUBTOTALES:			**$ 143.900**	**$ 0**	**$ 143.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE																									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1014265356	ROJAS CASALLAS MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 1.040.000	FIJO			SI								01-29									231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$ 901105420	$ 90.500	30	$ 1.117.334	SCCF24-COMPENSAR	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020778510	AVENDAÑO CONTRERAS YULIETH ADRIANA	DEPEND		$ 1.280.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$ 901105420	$ 90.500	30	$ 1.280.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 86727921	GONZALEZ CASTIBLANCO ORLANDO JAVIER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	$ 901105420	$ 90.500	30	$ 1.200.000	SCCF24-COMPENSAR	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.195.400**

8171

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 521202

martes, 20 de febrero de 2024, 3:35:23 PM

Detalle

$715,000.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	A SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******3213
Descripción:	Pago Ordinario - FIC
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-20 3:33:33
NIT del comercio	899999034
Número de factura	105019919
Código Único de Seguimiento	466589290
Dirección IP:	181.225.76.107
Referencia 1:	181.225.76.107
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9016661313

8173

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DE BOGOTA	105019919	466589290	20/02/2024

Número de Identificación
901666131

Primer Nombre ó Razón Social
CONSORCIO FENIX

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
3

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CASANARE

Ciudad Capital
YOPAL (CASANARE)

Dirección de Domicilio
CR 05 24 50

Ciudad de Domicilio
YOPAL

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,310 6965106

Correo electrónico
consorciofenix@camelingenieria.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Casanare

Regional Centros SIIF
36-02-00-085-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
262728122022

Nombre Obra
MTTO Y CONSERV NIVEL CAPA

Fecha Inicio Obra
23/03/2023

Fecha Terminación Obra
07/03/2024

Ciudad de Ejecución de la Obra
YOPAL

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2024

Mes Periodo a Pagar
1

Costo Total de Obra a Todo Costo
7513820382.00

Costo Total Mano de Obra
7513820382.00

Número de Trabajadores en el Periodo
22

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
715000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
715000.00

ecollect
Seguro para ti

8174

El empleo es de todos | Mintrabajo

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO FENIX identificado con el NIT 901666131, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
2627020221228	MTTO Y CONSERV NIVEL CAPA	YOPAL	520,000	2024-02	20-FEB-2024	105022217
262728122022	MTTO Y CONSERV NIVEL CAPA	YOPAL	715,000	2024-01	20-FEB-2024	105019919
262728122022	MTTO Y CONSERV NIVEL CAPA	YOPAL	957,000	2023-12	20-FEB-2024	105018823
		Total	2,192,000			

Expedido por el SENA, a los veintiun (21) dias del mes de Febrero de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-02-21

Generado por : YORLENY CAROLINA ROCHA PINEDA

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 3124651890 - 290713

SENA, MÁS TRABAJO

icontec ISO 9001 Certificado No. SC-CER339681-1

IQNet

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Nómina detallada por concepto

CONSORCIO FENIX

Nomina Enero

Periodo: 01/01/2024 - 30/01/2024

Datos empleados				Ingresos								Deducciones					
Item	Nombre	Cedula	Dias	Sueldo	Auxilio de transporte	Horas extras diurnas 125%	Hora extra recargo dominical o festivo	Incapacidad por enfermedad general	Recargo nocturno	Total Ingresos	IBC	Fondo de salud	Fondo de pensión	Licencia no remunerada	Total deducciones	Neto a Pagar	Firma Empleado
1	ARIEL ALFONSO TORRES RODRIGUEZ	1118534829	30	$ 1.559.394	$ 162.000					$ 1.721.394	$ 1.559.394	$ 62.400	$ 62.400		$ 124.800	$ 1.596.594	
2	CARLOS ALBERTO ADAME VARGAS	4214174	30	$ 1.300.000	$ 162.000		$ 77.447			$ 1.539.447	$ 1.377.447	$ 55.100	$ 55.100		$ 110.200	$ 1.429.247	
3	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	7552750	30	$ 1.300.000	$ 162.000					$ 1.462.000	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 52.000		$ 104.000	$ 1.358.000	
4	EDGAR PINZON SALCEDO	1118539551	30	$ 1.300.000	$ 162.000					$ 1.462.000	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 52.000		$ 104.000	$ 1.358.000	
5	HERNAN DAZA BARRANTES	80385010	30	$ 1.559.394	$ 162.000					$ 1.721.394	$ 1.559.394	$ 62.400	$ 62.400		$ 124.800	$ 1.596.594	
6	IRIS ANDREA BLANCO BERDUGO	1118557770	30	$ 1.213.334	$ 146.323	$ 172.872		$ 130.000	$ 9.681	$ 1.672.210	$ 1.525.887	$ 61.100	$ 61.100		$ 122.200	$ 1.550.010	
7	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA GARZON	4193974	30	$ 1.256.667	$ 151.548	$ 117.553	$ 77.447		$ 7.745	$ 1.610.960	$ 1.459.412	$ 58.400	$ 62.800	$ 86.668	$ 121.200	$ 1.489.760	
8	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	1118539218	30	$ 1.359.394	$ 162.000					$ 1.521.394	$ 1.359.394	$ 54.400	$ 54.400		$ 108.800	$ 1.412.594	
9	MAGDALENA NIÑO CASTRO	1024567502	30	$ 1.300.000	$ 156.774	$ 214.362			$ 9.681	$ 1.680.817	$ 1.524.043	$ 61.000	$ 63.200	$ 41.334	$ 124.200	$ 1.556.617	
10	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	1118531138	30	$ 1.300.000	$ 162.000					$ 1.462.000	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 52.000		$ 104.000	$ 1.358.000	
11	OSCAR JAVIER SUELTA BARRERA	1007703698	30	$ 1.459.000	$ 162.000					$ 1.621.000	$ 1.459.000	$ 58.400	$ 58.400		$ 116.800	$ 1.504.200	
12	RUBEN DARIO BOLAÑOS AGUILAR	19499531	30	$ 1.300.000	$ 162.000					$ 1.462.000	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 52.000		$ 104.000	$ 1.358.000	
13	SAUL ALBERTO RAMOS SIERRA	78296459	30	$ 1.559.394	$ 162.000					$ 1.721.394	$ 1.559.394	$ 62.400	$ 62.400		$ 124.800	$ 1.596.594	
14	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	1057585115	30	$ 1.300.000	$ 162.000					$ 1.462.000	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 52.000		$ 104.000	$ 1.358.000	
15	WILMAR QUINTANA	74859308	30	$ 1.300.000	$ 162.000					$ 1.462.000	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 52.000		$ 104.000	$ 1.358.000	
16	WISTON JAIRSON DAJOME CORTES	98427898	30	$ 1.343.334	$ 162.000					$ 1.505.334	$ 1.343.334	$ 53.600	$ 53.800		$ 107.600	$ 1.397.734	
TOTALES				$ 21.709.911	$ 2.560.645	$ 504.787	$ 154.894	$ 130.000	$ 27.107	$ 25.087.344	$ 22.526.699	$ 901.400	$ 908.000	$ 130.002	$ 1.809.400	$ 23.277.944	

Observaciones:
LUIS CASTAÑEDA PNR 03 Y 20 DE ENERO 2024
IRIS BLANCO INCAPACIDAD EG 12 AL 14 ENERO 24
MAGDALENA NIÑO PNR 26 ENERO 204

Elaboro:	Aprobo
Johana Cardenas	

Nómina detallada por concepto

CONSORCIO FENIX

Liquidaciones Enero

Periodo: 01/01/2024 - 30/01/2024

Datos empleados				Ingresos										Deducciones					
Item	Nombre	Cedula	Dias	Sueldo	Auxilio de transporte	Horas extras diurnas 125%	Recargo nocturno	Cesantías liquidación contrato	Intereses cesantías liquidación contrato	Prima liquidación contrato	Vacaciones liquidación contrato	IBC	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Licencia no remunerada	Total deducciones	Neto a Pagar	Firma Empleado
1	FABIO EMILIO CABRA SARMIENTO	9431049	16	$ 693.334	$ 83.613	$ 235.106	$ 11.617	$ 917.548	$ 49.476	$ 85.538	$ 454.865	$ 940.057	$ 2.531.097	$ 37.700	$ 37.700		$ 75.400	$ 2.455.697	
2	JOSELIN ALARCON TORRES	74183936	4	$ 333.334				$ 2.279.689	$ 215.300	$ 29.578	$ 1.139.414	$ 333.334	$ 3.997.315	$ 13.400	$ 13.400		$ 26.800	$ 3.970.515	
3	MARIA ELIZABETH OJEDA TORRES	1118642196	16	$ 650.000	$ 78.387	$ 235.106	$ 11.617	$ 891.602	$ 47.070	$ 81.477	$ 439.761	$ 940.057	$ 2.435.020	$ 35.900	$ 38.100	$ 43.334	$ 74.000	$ 2.361.020	
4	MARIA ISABEL ACHAGUA PIDIACHE	1118572733	16	$ 693.334	$ 83.613	$ 242.021	$ 11.617	$ 1.284.521	$ 107.720	$ 86.114	$ 635.739	$ 946.972	$ 3.144.679	$ 37.900	$ 37.900		$ 75.800	$ 3.068.879	
5	MARIA MAGDALENA DIAZ GALAN	1117324520	2	$ 86.667	$ 10.452			$ 1.038.363	$ 77.239	$ 8.122	$ 515.666	$ 86.667	$ 1.736.509	$ 3.500	$ 3.500		$ 7.000	$ 1.729.509	
6	MARY LIZBETH SIERRA PINZON	1118531636	16	$ 693.334	$ 83.613	$ 262.766	$ 11.617	$ 1.156.393	$ 80.995	$ 87.843	$ 571.778	$ 967.717	$ 2.948.239	$ 38.800	$ 38.800		$ 77.600	$ 2.870.739	
TOTALES				$ 3.150.003	$ 339.678	$ 974.999	$ 46.468	$ 7.568.116	$ 577.800	$ 378.672	$ 3.757.223	$ 4.214.804	$ 16.792.959	$ 167.200	$ 169.400	$ 43.334	$ 336.600	$ 16.456.359	

Observaciones:

FABIO CABRA RETIRO 16 ENERO 2024
JOSELIN ALARCON RETIRO 04 ENERO 2024
MARIA OJEDA RETIRO 16 ENERO 2024
MARIA ACHAGUA RETIRO 16 ENERO 2024
MARIA DIAZ RENUNCIA 02 ENERO 2024
MARY SIERRA RETIRO 16 ENERO 2024

Elaboro:	Aprobo:
Johana Cardenas	

8178

Nómina detallada por concepto

CAMEL INGENIERIA y SERVICIOS LTDA

Nómina Enero

Periodo: 01/01/2024 - 30/01/2024

Datos empleados				Ingresos			Deducciones							
Item	Nombres y Apellidos	Cedula	Dias	Sueldo	Auxilio de transporte	Total Ingresos	IBC	Fondo de salud	Fondo de pensión	Fondo de solidaridad pensional	Retefuente	Total deducciones	Neto a Pagar	Firma Empleado
1	DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ	74814388	30	$ 2.179.394	$ 162.000	$ 2.341.394	$ 2.179.394	$ 87.176	$ 87.176			$ 174.352	$ 2.167.042	
2	RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	74381373	30	$ 6.500.000		$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 260.000	$ 65.000	$ 93.000	$ 678.000	$ 5.822.000	
TOTALES				**$ 8.679.394**	**$ 162.000**	**$ 8.841.394**	**$ 8.679.394**	**$ 347.176**	**$ 347.176**	**$ 65.000**	**$ 93.000**	**$ 852.352**	**$ 7.989.042**	

Elaboro	*Aprobo*
Johana Cardenas	

8181

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-25
	ANALISIS GRANULOMETRICO,EXTRACCION CUANTITATIVA DE LECHADA ASFÁLTICA INVE 782 / 732 -13	Version 01
		Fecha de Emision - 26/04/2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

EMPRESA: CONSORCIO FENIX **Codigo:** FENIX-LE-119 **Localizacion:** YOPAL - CASANARE

Fecha de Ensayo: 10/01/2024 **T °C de salida:** **Planta:**

Muestra N° : 1 **Viaje :** **T °C en Via:** **Control en:** VIA

Tipo de Mezcla: Lechada LA-13 **Capa:** Rodadura **Margen:** EJE **Vehiculo :**

Calzada: Derecha Calle 24 **Lote:** km 00+731 - km 00+610*C.D. / C.I. **Abscisado:**

ANALISIS GRANULOMETRICO INVE 782-13

tamiz	abertura (mm)	peso retenido (g)	% retenido	% retenido acumuado	% PASA	Espec INVIAS art. 433-4-22		Tolerancia (Ft) INV- 433-4-22	
1/2"	12,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100
3/8"	9,5	110,4	6,1	6,1	93,9	85	100	91,3	99,3
No. 4	4,75	280,6	15,4	21,4	78,6	60	85	72,8	80,8
No. 8	2,36	381,9	20,9	42,4	57,6	40	60	54,0	60,0
No. 16	1,16	309,8	17,0	59,4	40,6	28	45	39,5	45,5
No. 30	0,600	235,4	12,9	72,3	27,7	19	34	27,1	33,1
No. 50	0,300	192,4	10,6	82,8	17,2	12	25	15,3	21,3
No. 80	0,180	139,0	7,6	90,5	9,5	7	18	7,0	13,0
No. 200	0,075	73,5	4,0	94,5	5,5	4	8	4,1	6,1
FONDO	-	100,6	5,5	100,0	0,0				
PESO MUESTRA		1823,6	100,0						


EXTRACCION CUANTITATIVA INVE 732-13

Peso Inicial Muestra de Asfalto g	1937,9
Peso Extraido Muestra de Asfalto g	1823,6
	15,5
Peso Final Filtro g	16,0
W1-W2	114,3
W4-W3	0,5
% Asfalto	5,87

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) INVE 122-13

Tara N°	T-208
T+S. Humedo (gr.)	2182,5
T+S Seco (gr.)	1937,9
Peso Tara (gr.)	0,0
Suelo Seco (gr.)	1937,9
% Humedad	12,62

Agregado Gruesos (%)	72,3
Agregado Finos (%)	22,2
Pasa tamiz·200 (%)	5,5

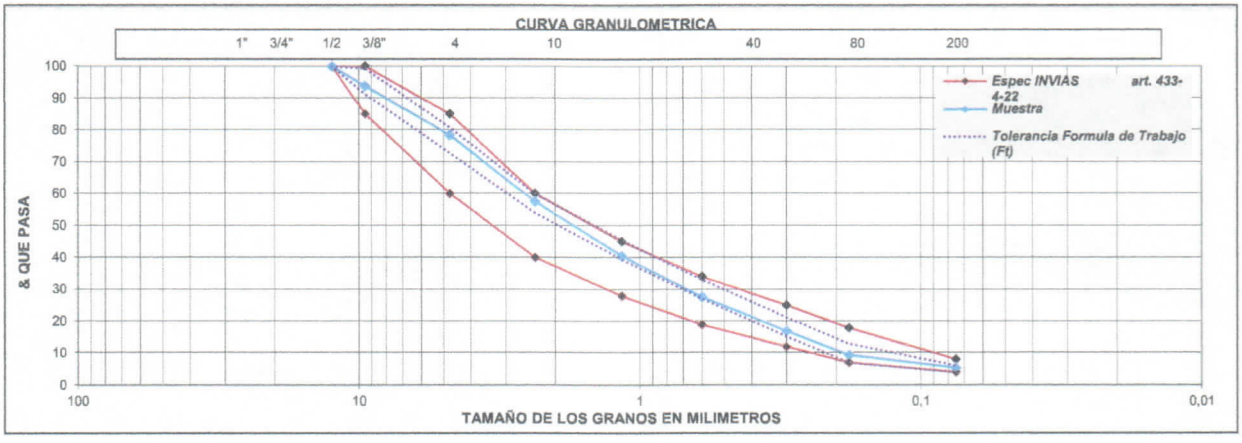

OBSERVACIONES: Emulsión Catiónica de Rompimiento Lento Modificada con Polímero, del tipo CRL-1hm.

Realizo: Gustavo R Reviso: Ing Jose Ibarra

TAURAMENA KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - CASANARE
TELEFONOS: 8-6257109 - 6333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - Email: joseibarra08@gmail.com

8182

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-25
	ANALISIS GRANULOMETRICO,EXTRACCION CUANTITATIVA DE LECHADA ASFÁLTICA INVE 782 / 732 -13	Version 01
		Fecha de Emision - 26/04/2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

EMPRESA: CONSORCIO FENIX **Codigo:** FENIX-LE-116 **Localizacion:** YOPAL - CASANARE

Fecha de Ensayo: 10/01/2024 **T °C de salida:** **Planta:**

Muestra N° : 1 **Viaje :** **T °C en Via:** **Control en:** VIA

Tipo de Mezcla: Lechada LA-13 **Capa:** Rodadura **Margen:** EJE **Vehiculo :**

Calzada: Derecha Calle 24 **Lote:** km 01+846 - km 01+750*C.D. / C.I. **Abscisado:**

ANALISIS GRANULOMETRICO INVE 782-13

tamiz	abertura (mm)	peso retenido (g)	% retenido	% retenido acumuado	% PASA	Espec INVIAS art. 433-4-22		Tolerancia (Ft) INV- 433-4-22	
1/2"	12,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100
3/8"	9,5	139,1	6,0	6,0	94,0	85	100	91,3	99,3
No. 4	4,75	432,2	18,7	24,7	75,3	60	85	72,8	80,8
No. 8	2,36	437,4	18,9	43,6	56,4	40	60	54,0	60,0
No. 16	1,16	327,4	14,2	57,8	42,2	28	45	39,5	45,5
No. 30	0,600	288,1	12,5	70,3	29,7	19	34	27,1	33,1
No. 50	0,300	273,6	11,8	82,1	17,9	12	25	15,3	21,3
No. 80	0,180	193,3	8,4	90,5	9,5	7	18	7,0	13,0
No. 200	0,075	108,2	4,7	95,1	4,9	4	8	4,1	6,1
FONDO	-	112,2	4,9	100,0	0,0				
PESO MUESTRA		2311,6	100,0						


EXTRACCION CUANTITATIVA INVE 732-13

Peso Inicial Muestra de Asfalto g	2464,8
Peso Extraido Muestra de Asfalto g	2311,6
	14,8
Peso Final Filtro g	15,5
W1-W2	153,2
W4-W3	0,7
% Asfalto	**6,19**

Agregado Gruesos (%)	70,3
Agregado Finos (%)	24,9
Pasa tamiz·200 (%)	4,9

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) INVE 122-13

Tara N°	T-208
T+S. Humedo (gr.)	2779,5
T+S Seco (gr.)	2464,8
Peso Tara (gr.)	0,0
Suelo Seco (gr.)	2464,8
% Humedad	12,77

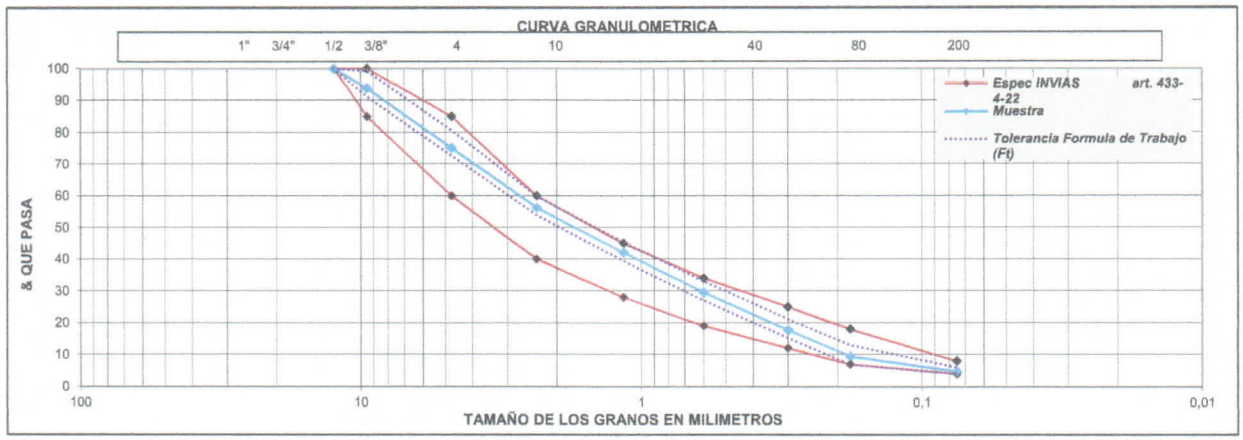

OBSERVACIONES: Emulsión Catiónica de Rompimiento Lento Modificada con Polímero, del tipo CRL-1hm.

Realizo: Gustavo R Reviso: Ing Jose Ibarra

TAURAMENA KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - CASANARE
TELEFONOS: 8-6257109 - 6333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - Email: joseibarra08@gmail.com

8183

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	**IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA**	Codigo: FT-GO-25
	ANALISIS GRANULOMETRICO,EXTRACCION CUANTITATIVA DE LECHADA ASFÁLTICA INVE 782 / 732 -13	Version 01
		Fecha de Emision - 26/04/2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

EMPRESA: CONSORCIO FENIX **Codigo:** FENIX-LE-120 **Localizacion:** YOPAL - CASANARE

Fecha de Ensayo: 11/01/2024 **T °C de salida:** **Planta:**

Muestra N° : 1 **Viaje :** **T °C en Via:** **Control en:** VIA

Tipo de Mezcla: Lechada LA-13 **Capa:** Rodadura **Margen:** EJE **Vehiculo :**

Calzada: Derecha Calle 24 **Lote:** km 00+610 - km 00+250*C.D. / C.I. **Abscisado:**

ANALISIS GRANULOMETRICO INVE 782-13

tamiz	abertura (mm)	peso retenido (g)	% retenido	% retenido acumuado	% PASA	Espec INVIAS art. 433-4-22		Tolerancia (Ft) INV- 433-4-22	
1/2"	12,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100
3/8"	9,5	85,7	4,9	4,9	95,1	85	100	91,3	99,3
No. 4	4,75	383,7	22,1	27,0	73,0	60	85	72,8	80,8
No. 8	2,36	293,3	16,9	43,8	56,2	40	60	54,0	60,0
No. 16	1,16	238,9	13,7	57,6	42,4	28	45	39,5	45,5
No. 30	0,600	249,1	14,3	71,9	28,1	19	34	27,1	33,1
No. 50	0,300	202,3	11,6	83,5	16,5	12	25	15,3	21,3
No. 80	0,180	120,4	6,9	90,4	9,6	7	18	7,0	13,0
No. 200	0,075	88,1	5,1	95,5	4,5	4	8	4,1	6,1
FONDO	-	78,2	4,5	100,0	0,0				
PESO MUESTRA		1739,7	100,0						


EXTRACCION CUANTITATIVA INVE 732-13

Peso Inicial Muestra de Asfalto g	1848,2
Peso Extraido Muestra de Asfalto g	1739,7
	16,6
Peso Final Filtro g	17,1
W1-W2	108,5
W4-W3	0,5
% Asfalto	**5,84**

Agregado Gruesos (%)	71,9
Agregado Finos (%)	23,6
Pasa tamiz 200 (%)	4,5

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) INVE 122-13

Tara N°	T-208
T+S. Humedo (gr.)	2062,9
T+S Seco (gr.)	1848,2
Peso Tara (gr.)	0,0
Suelo Seco (gr.)	1848,2
% Humedad	11,62

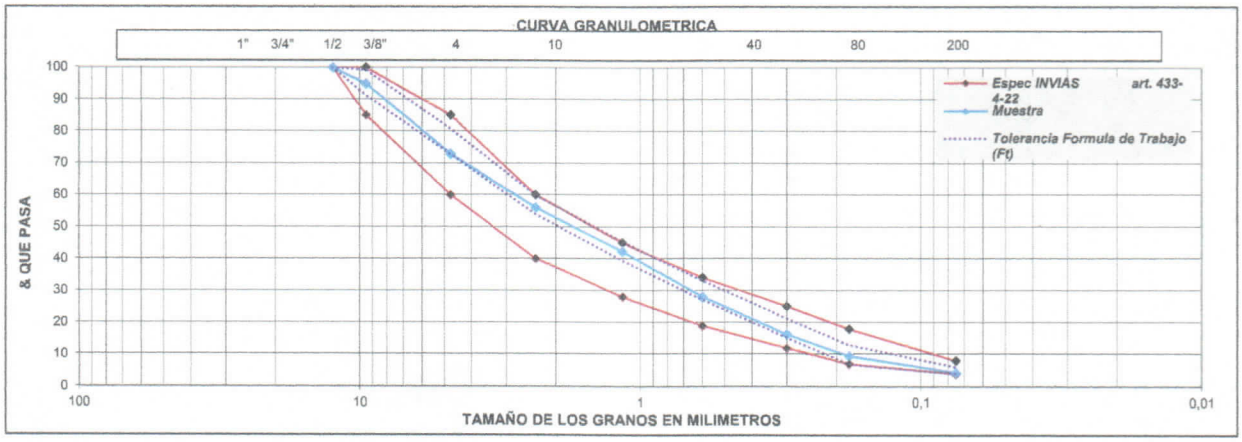

OBSERVACIONES: Emulsión Catiónica de Rompimiento Lento Modificada con Polímero, del tipo CRL-1hm.

Realizo: Gustavo R Reviso: Ing Jose Ibarra

TAURAMENA KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - CASANARE
TELEFONOS: 8-6257109 - 6333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - Email: joseibarra08@gmail.com

5184

IBARRA INGENIERIA & LABORATORIO S.A.S NIT. 901.032.837-3	IBARRA INGENIERIA Y LABORATORIO SAS GESTIÒN OPERATIVA	Codigo: FT-GO-25
	ANALISIS GRANULOMETRICO,EXTRACCION CUANTITATIVA DE LECHADA ASFÁLTICA INVE 782 / 732 -13	Version 01
		Fecha de Emision - 26/04/2023

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

EMPRESA: CONSORCIO FENIX **Codigo:** FENIX-LE-121 **Localizacion:** YOPAL - CASANARE

Fecha de Ensayo: 12/01/2024 **T °C de salida:** **Planta:**

Muestra N° : 1 **Viaje :** **T °C en Via:** **Control en:** VIA

Tipo de Mezcla: Lechada LA-13 **Capa:** Rodadura **Margen:** EJE **Vehiculo :**

Calzada: Derecha Calle 24 **Lote:** km 00+250 - km 00+000*C.D. / C.I. **Abscisado:**


ANALISIS GRANULOMETRICO INVE 782-13

tamiz	abertura (mm)	peso retenido (g)	% retenido	% retenido acumuado	% PASA	Espec INVIAS art. 433-4-22		Tolerancia (Ft) INV- 433-4-22	
1/2"	12,5	0,0	0,0	0,0	100,0	100	100	100	100
3/8"	9,5	142,1	6,0	6,0	94,0	85	100	91,3	99,3
No. 4	4,75	455,2	19,2	25,2	74,8	60	85	72,8	80,8
No. 8	2,36	408,8	17,2	42,4	57,6	40	60	54,0	60,0
No. 16	1,16	343,2	14,5	56,9	43,1	28	45	39,5	45,5
No. 30	0,600	348,6	14,7	71,6	28,4	19	34	27,1	33,1
No. 50	0,300	286,2	12,1	83,7	16,3	12	25	15,3	21,3
No. 80	0,180	166,3	7,0	90,7	9,3	7	18	7,0	13,0
No. 200	0,075	98,1	4,1	94,8	5,2	4	8	4,1	6,1
FONDO	-	123,1	5,2	100,0	0,0				
PESO MUESTRA		2371,6	100,0						

EXTRACCION CUANTITATIVA INVE 732-13	
Peso Inicial Muestra de Asfalto g	2525,9
Peso Extraido Muestra de Asfalto g	2371,6
	15,2
Peso Final Filtro g	15,6
W1-W2	154,3
W4-W3	0,4
% Asfalto	**6,09**

CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) INVE 122-13	
Tara N°	T-208
T+S. Humedo (gr.)	2825,9
T+S Seco (gr.)	2525,9
Peso Tara (gr.)	0,0
Suelo Seco (gr.)	2525,9
% Humedad	11,88

Agregado Gruesos (%)	71,6
Agregado Finos (%)	23,2
Pasa tamiz 200 (%)	5,2

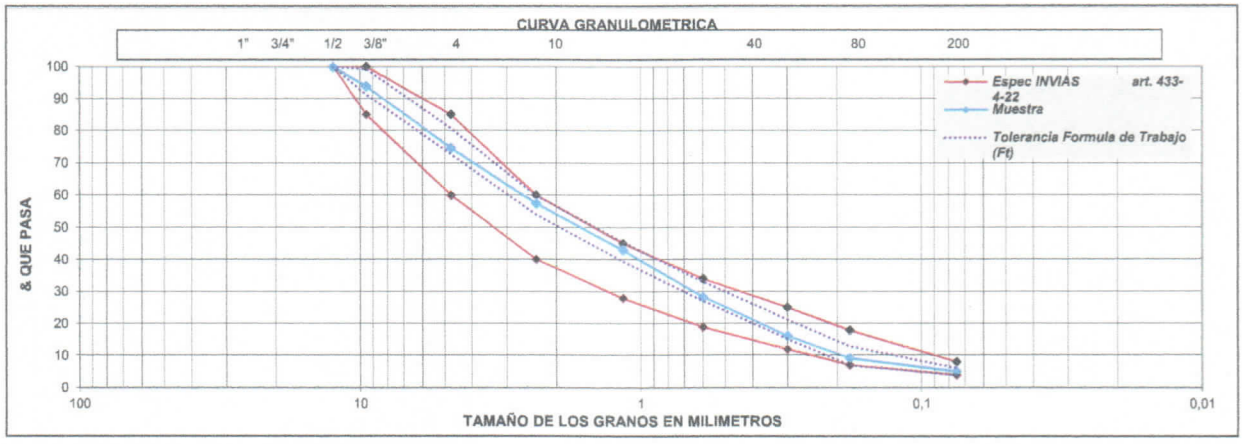

OBSERVACIONES: Emulsión Catiónica de Rompimiento Lento Modificada con Polímero, del tipo CRL-1hm.

Realizo: Gustavo R Reviso: Ing Jose Ibarra

TAURAMENA KRA 10 No. 2-30 - YOPAL CALLE 26 N° 10-91 - CASANARE
TELEFONOS: 8-6257109 - 6333046 - CEL: 3112100174 - 3208999784 - Email: joseibarra08@gmail.com

8185

	INFORME MENSUAL No. 10	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	2	2024
	1 DE ENERO DE 2024 a 31 DE ENERO DE 2024	DD	MM	AA

13.2 COPIA BITACORA DE OBRA.

Lunes 01/01/2019

Clima: Mañana Tarde:

· Personal

· Director
- Residente
- Prof. Sso
· Aux. Sso
- Prof. Apoyo
· Inspector
· Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
· Compactador doble rodillo
· Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volquetas
- Carrotanque
· Camión Turbo
· Camión Slurry
· Herramienta menor
· Actividades:

· Cadenero
· Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
· Conductor
· Operador
- Ing. Ambiental
· Esp Gerencia Proyectos

* Descanso fin de semana Celebración año nuevo

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 02/07/2024

Clima: Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Mezclargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry
- Herramienta menor:
- Actividades:
  - Cadenero
  - Control Vial
  - Ayudante
  - Ayudante Tecnico
  - Conductor
  - Operador
  - Ing. Ambiental
  - Esp. Gerencia Proyecto

* Descanso Fin de semana por Celebración año nuevo

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles 03/07/2024

Clima: Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry
- Herramienta menor
- Actividades.
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

* Implementación de poya y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) Carrera 78 bayanda
* actividades de lechada asfaltica, por Falta de suministro de emulsión.

Contratista radica en interventoria solicitud de modificatoria NO.2.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Viernes 09/07/2021

Clima. Mañana: Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sso
- Aux. Sso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Volqueter
- Carrotanque
- Camion Turbo
- Camion Slurry
- Herramienta menor
- Actividades:
- Cadenero
- Controlador Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (Cebras) carrera 78 bajando.
* actividades de lechada asfaltica, por falta de Suministro de emulsion.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 05/07/2024

Clima: Mañana: Tarde:

- Personal
  - Director
  - Residente
  - Prof. Sisa
  - Aux. Sisa
  - Prof. Apoyo
  - Inspector
  - Topografo
  - Esp. Pavimentos
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Gerencia Proyectos

- Maquinaria
  - Motoniveladora
  - Recicladora
  - Compactador doble rodillo
  - Compactador Neumatico
  - Minicargador
  - Excavadora sobre orugas
  - Herramienta menor
- Volquetas
- Carrotanque
- Camion Tanq.
- Camión Slurry

- Actividades:

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) Carrera 78 bajando.
* actividades de instalación de lechada asfaltica, por parte de suministro de emulsión.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 06/07/2024

Clima Mañana Tarde:

Personal

- Director	- Cadenero
- Residente	- Control Vial
- Prof. Siso	- Ayudante
- Aux. Siso	- Ayudante Tecnico
- Prof. Apoyo	- Conductor
- Inspector	- Operador
- Topografo	- Ing. Ambiental
- Esp Gerencia Proyectos	- Esp. Pavimentos
- Mayordomia	
- Motoniveladora	- Volquetas
- Recicladora	- Carrotanque
- Compactador doble rodillo	- Camión Tuneo
- Compactador Neumatico	- Camión Slurry
- Minicargador	-
- Excavadora sobre Orugas	
- Herramienta menor	
- Actividades:	

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcar viales (cebras) carrera 78 bajando.
* actividades de instalación de lechada asfaltica, por falta de suministro de emulsión.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Domingo 07/01/2024

Clima Mañana Tarde:

- Personal

· Director	· Cadenero
· Residente	· Control Vial
· Prof. Sisa	· Ayudante
· Aux. Sisa	· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo	· Conductor
· Inspector	· Operador
· Topografo	· Ing. Ambiental
· Esp Gerencia Proyectos	· Esp Pavimentos

· Maquinaria

· Motoniveladora	· Volquetas
· Recicladora	· Carrotanque
· Compactador doble rodillo	· Camión Turba
· Compactador Neumatico	· Camión Slurry

· Minicargador

· Excavadora sobre Orugas

· Herramienta menor

- Actividades:

* Descanso Fin de Semana por Celebración de reyes.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Lunes 08/01/2024

Clima Mañana Tarde

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sisa
- Aux. Sisa
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Esp. Pavimentos

Maquinaria

- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Cargador
- Excavadora sobre orugas
- Herramienta menor
- Actividades:
  - Volqueta
  - Carrotanque
  - Camión Tubo
  - Camión Sherg

* Descanso Fin de Semana por celebración de reyes:

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 09/07/2024

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof Siso
- Aux Siso
- Prof Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Gerencia Proyectos
- Esp Pavimentos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Herramienta menor
- Actividades

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry

* implementación de paga y PMT
* Continua actividades de marcas viales (cebras) Carrera 18 Subienéb
* actividades de instalación de lechada asfaltica, por falta de suministro de emulsión.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Miercoles 10/07/2024

Clima: Mañana Tarde:

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspect.
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyecto
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Microfresadora
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp Pavimentos
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Tanka
- Camión Sterling
- Actividades:

* implementación de poga y PMT.
* Continua demarcación (cebras) Carrera 18 Subiendo.
* actividades de lechada asfaltica en la calle 24 Calzada derecha Segunda capa desde el K1+846,7 a K1+750
* actividades de lechada asfaltica en la calle 24 Calzada derecha Segunda capa desde el K0+731,09 a K0+670.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

8196

Jueves 11/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		· Cadenero
· Residente		· Control Vial
· Prof. Suxo		· Ayudante
· Aux. Suxo		· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		· Ing. Ambiental
· Esp. Estructuras Puentes		· Esp. Pavimentos
· Maquinaria		
· Motoniveladora		· Volquetas
· Recicladora		· Carrotanque
· Compactador doble rodillo		· Camión Tudo
· Compactad. Neumatico		· Camión aluvy
· Minicargador		
· Excavadora sobre Orugas		
· Herramienta menor		
· Actividades:		

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) Carrera 78, Subiendo.
* actividad de lechada asfaltica en la calle 24 Calzada derecha Segunda capa dede KO+690 a KO+250,47

Residente de Obra

Residente de Interventoría

8197

274

Viernes 12/01/2024

Clima: Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Sivo
- Aux. Sivo
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Geotecnia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Topico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos
- Volqueta
- Cargalanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry

* Implementación de paga y PMT.
* Continua Actividades de marcas viales Cebras J 18 Subiendo.
* actividad de lechada asfaltica en la calle 24 Calzada derecha Segunda capa desde el KO+250,41 a KO+000.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

8198

Sábado 13/07/2024

Clima: Mañana Tarde

- Personal
  - Director
  - Residente
  - Prof. Suso
  - Aux Suso
  - Prof Apoyo
  - Inspector
  - Topografo
  - Esp. Gerencia Proyectos
  - Maquinaria
  - Motoniveladora
  - Recicladora
  - Compactador doble rodillo
  - Compactador Neumatico
  - Minicargador
  - Excavadora sobre Orugas
  - Herramienta menor
  - Actividades
  - Cadenero
  - Control Vial
  - Ayudante
  - Ayudante Tecnico
  - Conductor
  - Operador
  - Ing. Ambiental
  - Esp. Pavimentos
  - Volqueta
  - Carrotanque
  - Camion Tumba
  - Camión Slurry

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) Carrera 78 Subiendo.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 19/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
	· Director	· Cadenero
	· Residente	· Control Vial
	· Prof. Srso	· Ayudante
	· Aux Srso	· Ayudante Terreno
	· Prof. Apoyo	· Cadenero
	· Inspector	· Operador
	· Topografo	· Ing. Ambiental
	· Esp. Gerencia Proyectos	· Esp. Pavimentos
· Maquinaria		
	· Motoniveladora	· Volqueta
	· Recicladora	· Carrotanque
	· Compactador doble rodillo	· Camión Tolva
	· Compactador Neumatico	Camión Sluurry
	· Minicargador	
	· Excavadora sobre orugas	
	· Herramienta menor	
	· Actividades	

* Descanso Fin de Semana.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Lunes 15/07/2019

Clima: Mañana Tarde:

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux Siso
- Prof. Apoyo
- Inspectores
- Topografo
- Esp. Geotecnia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladoras
- Recicladoras
- Compactadores doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargadores
- Excavadoras sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Tumbo
- Camión Slurry

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) calle 24 calzada izquierda.

interventoria radica en gobernación de Casanare solicitud de modificatoria NO. 2.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Martes 16/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		· Cadenero
Residente		· Control Vial
· Prof. Siso		· Ayudante
· Aux. Siso		· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		· Ing. Ambiental
· Esp. Gerencia de Proyectos		· Esp. Pavimentos
· Motoniveladora		
· Motoniveladora		· Volqueta
· Recicladora		· Carrotanque
· Compactador doble rodillo		· Camión Turba
· Compactador Neumatico		· Camión Slurry
· Minidragador		
· Excavadora sobre Orugas		
· Herramienta menor		
· Actividades:		

* implementación de paga y PMT.
* Continua actividades de marcas viales (cebras) calle 24 Calzada izquierda.
* actividades de lechada asfaltica en las siguientes intersecciones: K4+020, K3+178, K3+581.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Miercoles 17/03/2021

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Prof. Siso
- Aux. Siso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre Orugas
- Herramienta menor
- Actividades
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos
- Volquetas
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry

Implementación de paga y pmt

-Continua actividades de marca viales (cebras) calle 24 calzada izquierda.
-Actividad de lechada asfáltica en las siguientes intersecciones: K3+342, K1+845, K2+079.
-interventoria radica en la gobernación de casanare solicitud de prorroga No 4.

Residente del Obra

Residente de Interventoría

280

Viernes 19/07/2024

Clima Mañana Tarde

Personal

· Director	· Cadenero
· Residente	· Control Vial
· Prof. Sisa	· Ayudante
· Aux. Sisa	· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo	· Conductor
· Inspector	· Operador
· Topografo	· Ing. Ambiental
· Esp. Gerencia Proyectos	· Esp. Pavimentos
· Maquinaria	
· Motoniveladora	· Volqueta
· Recicladora	· Carrotanque
· Compactador doble rodillo	· Camión Turbo
· Compactador Neumatico	· Camión Slurry
· Minicargador	
· Excavadora sobre Orugas	
· Herramienta menor	
· Actividades:	

Implementación de paga y pmt

-Continua actividades de marca viales (cebras) calle 24 calzada izquierda.
-Actividad de lechada asfaltica en las siguientes intersecciones: K1+560 K1+331, K1+082, K0+963, K0+226.
Gobernación de casanare aprueba solicitud de porroga No4.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Viernes 19/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		- Cadenero
· Residente		- Control Vial
- Prof. Syso		· Ayudante
· Aux Syso		· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		- Ing. Ambiental
· Esp. Gerencia Proyectos		· Esp. Pavimentos
· Maquinaria		
· Motoniveladora		- Volqueta
· Recicladora		- Carrotanque
· Compactador doble rodillo		- Camión Tumbo
· Compactador Neumatico		- Camión Sluvey
· Minicargador		
· Excavadora sobre Orugas		
· Herramienta menor		
· Actividades		

Implementación paga y pmt

-Continua actividades de marca viales (cebras) calle 24 calzada izquierda
-Actividades de lechada asfáltica en las siguientes intersecciones: K3+414 K3+296, K3+106, K2+520 y K2+420.
-Contratista solicitud a la aseguradora renovación de polizas de acuerdo con la porroga No 4.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Sabado 20/07/2024

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		· Cadenero
· Residente		· Control Vial
· Prof. Siso		· Ayudante
· Aux. Siso		· Ayudante Tecnico
· Prof. Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		· Ing. Ambiental
· Esp. Gerencia Proyectos		· Esp. Pavimentos
· Maquinaria		
· Motoniveladora		· Volqueta
· Recicladora		· Carrotanque
· Compactador doble rodillo		· Camión Tumbo
· Compactador Neumatico		· Camión Sluvay
· Minicargador		
· Excavadora sobre orugas		
· Herramienta menor		
· Actividades		

Implementación de paga y pmt

- Continua actividades de marcas viales (cebras) calle 24 calzada izquierda.
- Jornada de aseo y recolección de escombros en la calle 9.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 27/07/2024

Clima	Mañana	Tarde
· Personal		
· Director		· Cadenero
· Residente		· Control Vial
· Prof. Siso		· Ayudante
· Aux. Siso		· Ayudante Tecnico
· Prof Apoyo		· Conductor
· Inspector		· Operador
· Topografo		· Ing. Ambiental
· Esp Gerencia Proyectos		· Esp Pavimentos
· Maquinaria		
· Motoniveladora		· Volqueta
· Recicladora		· Carrotanque
· Compactador doble rodilla		· Camión Turbo
· Compactador Neumatico		· Camión Slurry
· Mincargador		
· Excavadora sobre Orugas		
· Herramienta menor		
· Actividades:		

-Descanso fin de semana.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Lunes 22/07/2019

Clima: Mañana Tarde.

Personal

- Director
- Residente
- Prof. Sso
- Aux. Sso
- Prof. Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora sobre orugas
- Herramienta menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Ayudante Tecnico
- Conductor
- Operador
- Ing. Ambiental
- Esp. Pavimentos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión Turbo
- Camión Slurry

- Actividades:

Implementación de paga y pmt

-Actividad de lechada asfáltica en la calle 29 en las siguientes intersecciones: K0+383, K0+600, K1+520, K1+840, K1+869, K2+880 K2+904.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Martes 23/01/2024

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional siso
- Auxiliar siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografia
- Esp Gerencia proyectos
- Maquinaria
- Motoniveladora
- Recicladora
- Compactador doble rodillo
- Compactador Neumatico
- Minicargador
- Excavadora Sobre Orugas
- Herramienta Menor
- Actividades
- Cadenero
- Control vial
- Ayudante
- Ayudante tecnico
- Conductor
- Operador
- Inge Ambiental
- Esp Pavimentos
- Volqueta
- Carrotanque
- Camión turbo
- Camión slurry

Implementación de paga y pmt

- Actividad de lechada asfáltica en la calle 9 en las siguientes intersecciones: K0 + 604,05.
- La resolución No 00006 de Enero de 2024 que autoriza los cierres viales de acuerdo con el pmt Vencido el dia 22 de Enero de 2024, por lo cual no se pueden adelantar actividades que impliquen Cierres viales, hasta tanto se cuente con nueva resolución de pmt.

Residente de Obra

Residente de interventoria

8209

Miércoles 24 /01 /2024

Clima	Mañana	Tarde
-Personal		-Auxiliar siso
-Director		-Cadenero
-Residente		-Control vial
- Profesional siso		-Ayudante
-Profesional Apollo		- Ayudante tecnico
-Inspector		-Conductor
-Topografia		-Operador
-Esp Gerencia proyectos		-Ing Ambiental
-Maquinaria		-Esp pavimentos
-Motoniveladora		-
-Recicladora		-Volqueta
-Compactador doble rodillo		-Carrotanque
-Compactador Neumatico		-Camión turbo
-Minicargador		-Camión slurry
-Excavadora sobre orugas		
-Herramientas menor		
-Actividades		

Implementación de Paga y Pmt

-Contratista recibe renovación de polizas contractuales por parte de aseguradora.
-Contratista radica en secretaria de trancito de yopal, solicitud de PMT de acuerdo con la porroga No 4 y poliza extracontractual renovada.

Residente de Obra

Residente de interventoria

8210

287

Jueves 25 / 01 / 2024

Clima	Mañana	Tarde
		- Auxiliar SISO
- Personal		- Cadenero
- Director		- control vial
- Residente		- Ayudante
- Profesional SISO		- Ayudante tecnico
- Profesional Apoyo		- conductor
- Inspector		- Operador
- Topografia		- Inge Ambiental
- Esp Gerencia Proyectos		- Esp pavimentos
- Maquinaria		
- Motoniveladora		
- Recicladora		- Volqueta
- Compactador doble rodillo		- carrotanque
- Compactador Neumatico		- camión turbo
- Minicargador		- Camión slurry
- Excavadora sobre Orugas		
- Herramienta menor		
- Actividades		

Implementación de paga y pmt

- Jornada de aseo y limpieza de pozos de inspección en la calle 21

Residente de Obra

Residente de Interventoria

8211

288

Viernes 26/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
	-Personal	-Auxiliar siso
	-Director	-Cadenero
	-Residente	-control vial
	-Profesional siso	-Ayudante
	-Profesional Apoyo	-Ayudante tecnico
	-Inspector	-Conductor
	-Topografia	-Operador
	-Esp Gerencia proyectos	-Inge Ambiental
	-Maquinaria	-Esp pavimentos
	-Motoniveladora	
	-Recicladora	-Volqueta
	-Compactador doble rodillo	-Carrotanque
	-compactador Neumatico	-Camión turbo
	-Minicargador	-Camión slurry
	-Excabadora sobre Orugas	
	-Herramienta menor	
	-Actividades	

Implementación de paga y pmt

-Jornada de aseo y limpieza de pozos de inspección en la calle 24

Residente de Obra

Residente de interventoria

8212

Sabado 27/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
-Personal		-Auxiliar siso
-Director		-Cadenero
-Residente		-Control vial
-Profesional siso		-Ayudante
-Profesional apoyo		-Ayudante tecnico
-Inspector		-Conductor
-Topografia		-Operador
-Esp Gerencia proyectos		-Inge Ambiental
-Maquinaria		-Esp pavimentos
-Motoniveladora		
-Recicladora		-Volqueta
-Compactador doble rodillo		-Carrotanque
-Compactador Neumatico		-Camión turbo
-Minicargador		-Camión slurry
-Excabadora sobre Orugas		
-Herramienta Menor		
-Actividades		

Implementación de paga y pmt

-Reparaciones por daños causados de propiedad en caño seco calzada subiendo.
-Reparaciones por afectación de pata de motos (carga puntuales) caño seco calzada subiendo frente a restaurante vaquita costeña.

Residente de Obra

Residente de interventoria

Domingo 28/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
- Personal		
- Director		- Cadenero
- Residente		- Control vial
- Profesional siso		- Ayudante
- Auxiliar siso		- Ayudante tecnico
- Profesional Apoyo		- Conductor
- Inspector		- Operador
- Topografia		- Inge Ambiental
- Esp Gerencia Proyectos		- Esp pavimentos
- Maquinaria		
- Motoniveladora		- Volqueta
- Fresadora		- Carrotanque
- Compactador doble rodillo		- Camión turbo
- Compactador neumatico		- Camión slurry
- Minicargador		
- Excavadora sobre orugas		
- Herramienta menor		
- Actividades		

- Descanso Fin de Semana.

Residente de obra

Residente de interventoria

Lunes 29 / 01 / 2024

Clima	Mañana	Tarde
-Personal		
-Director		
-Residente		-Cadenero
-Profesional siso		-Control vial
-Auxiliar siso		-Ayudante
-Profesional Apoyo		-Ayudante técnico
-Inspector		-Conductor
-Topografia		-Operador
-Esp Gerencia proyectos		-Inge Ambiental
-Maquinaria		-Esp pavimentos
-Motoniveladora		
-Fresicladora		-Volqueta
-Compactador doble rodillo		-Carrotanque
-Compactador Neumatico		-Camión turbo
-Minicargador		-Camión slurry
-Excabadora sobre Orugas		
-Herramienta menor		
-Actividades:		

Implementación de paga y Pmt

-Jornada de aseo de camión de slurry.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

B21J

292

Martes 30/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
-Personal		
-Director		-Cadenero
-Residente		-Control vial
-Profesional siso		-Ayudante
-Auxiliar siso		-Ayudante tecnico
-Profesional Apoyo		-Conductor
-Inspector		-Inge Ambiental
-Topografia		-Esp pavimento
-Esp Gerencia proyectos		-Operador
-Maquinaria		-Volqueta
-Motoniveladora		-Carrotanque
-Recicladora		-Camión turbo
-Compactador doble rodillo		-Camión slurry
-Compactador Neumatico		
-Minicargador		
-Excavadora sobre orugas		
-Herramientas menor		
-Actividades		
-Implementación de paga y pmt		

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Miercoles 31/01/2024

Clima	Mañana	Tarde
-Personal		
-Director		-Cadenero
-Residente		-Control vial
-Profesional siso		-Ayudante
-Auxiliar siso		-Ayudante tecnico
-profesional Apoyo		-Conductor
-Inspector		-Operador
-Topografia		-Ing Ambiental
-Esp Gerencia de proyectos		-Esp pavimento
-Maquinaria		
-Motoniveladora		-Volqueta
-Recicladora		-Carrotanque
-Compactador doble rodillo		-Camión turbo
-compactador neumatico		-Camión slurry
-Minicargador		
-Excavadora sobre orugas		
-Herramientas menor		
-Actividades.		
-Implementación de paga y pmt		

Residente de obra

Residente de Interventoria

13.3 COPIA CORRESPONDENCIA ENVIADA.

8218

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

ENVIADOS.

CNS -YOP -150-2024

Yopal, 30 de enero de 2024

Ingeniero,
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
Representante legal
CONSORCIO FÉNIX

Ref: Contrato de Consultoría No. 2622 de 2022-12-27 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Demolición de pavimento rígido (inc. Retiro) e=0.15m losas de pavimento en concreto rígido MR 41 kg/cm^2 e = 0.18m

Cordial saludo.

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, vigilancia y control ejercida por parte de esta interventoría al contrato en referencia; se solicita al contratista de obra "consorcio fénix" proseguir con las actividades de obra, ya que al día de hoy no se evidencia frentes de trabajo ni ejecución de actividades acorde a la programación adjunta en la prórroga N°4, donde se evidencia que lo programado debería ir en un avance del 92,22% y a la fecha lo ejecutado continua siendo desde el inicio de la prórroga el 90%, lo que evidencia un atraso del 2,22% que continuara en aumento progresivo si no se inicia con la ejecución de las actividades o el contratista presenta inmediatamente un plan de acción para superar estos atrasos. Así mismo se exige al contratista dar inicio con la ejecución de las actividades de demolición de pavimento rígido (inc. retiro) e=0.15m e instalación de las losas de pavimento en concreto rígido MR 41 kg/cm^2 e = 0.18m en la Carrera 18 "Caño seco" entre Calle 11 y Calle 12, Carrera 18 "Caño seco" entre Calle 29 y Calle 30 media calzada carril izquierdo e intersección Calle 24 con Carrera 16. Es de mencionar la importancia del inicio de esta actividad que en el momento es la ruta crítica del contrato; además de ello se requiere de

Carrera 29 No. 17-59 Valle de los Guarataros BLOQUE L INT. 3, Yopal - Casanare
Tel: 6332721 Cel: 3123979455, email_ gilbert569@hotmail.com

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

un tiempo prudencial para el curado del concreto instalado; dicha manifestación se le ha reiterado al contratista en los oficios CNS – YOP -119 -2023, CNS – YOP- 116 – 2023, CNS – YOP -97 -2023, CNS – YOP - 84- 2023, el cual ha hecho caso omiso al respecto, incurriendo en mora y/o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones.

Nuevamente se le recuerda al contratista de obra que está incumpliendo con las cláusulas y obligaciones estipuladas en la minuta del contrato de obra donde especifica lo siguiente: **CLAUSULA 10:** Obligaciones específicas del contratista – **obligaciones 5** ("… cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proyecto, el proceso de selección, la propuesta y el contrato se suscriba y dar a cabalidad de la programación de obra"), **obligación 15** ("… cumplimiento a cabalidad de la programación de obra"). Adicional a la cláusula 10 se tomarán las obligaciones y medidas respectivas en la cláusula 15 "multas" del contrato de obra.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista de consultoría No 2622

CC. Ing. Robert Asís Hernández Cachay – Director Técnico de Construcciones – Gobernación de Casanare

8220

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

18 ENE 2024
Hora: 10:41 am
No. de Radicación: 00545

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

CNS -YOP -149-2024

Yopal, 17 de enero de 2024

GOBERNACIÓN DE CASANARE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
RECIBIDO POR: Juan Herrera
FECHA: 17/01/24 HORA: 4:30

Ingeniero
ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Director Técnico de Construcciones
Gobernación de Casanare

Ref: Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022 con radicado interno N° 2622 de 2022-12-27 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Solicitud de aprobación prórroga No. 5 al Contrato de Consultoría No. 2622 de 2022.

Atento saludo.

Por medio de la presente me permito presentar ante usted la solicitud para aprobación de la prórroga No. 5 del contrato de Consultoría No. 2622 de 2022 cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**", por el término de Cuarenta y cinco (45) días lo anterior con sustento en las siguientes consideraciones:

1. El contrato de consultoría No. CONTRATO DE CONSULTORIA N° SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022 Y No. INTERNO 2622 DE 2022-12-27 inicio el día 01 de febrero de 2023, quedando con fecha de terminación inicial el día 31 de mayo de 2023 posterior al cumplimiento del tiempo de ejecución contractual y en vista que la meta física del contrato de obra no se alcanzaba se fijó una prórroga No. 1 por un periodo de dos (02) meses, la cual fue aprobada el día 25 de abril de 2023 y cuya fecha de terminación fue el día 31 de julio de 2023. Posterior a esto y en vista que la meta física del contrato de obra no se alcanzó se fijó una nueva prórroga No. 2 por un periodo de dos (02) meses, la cual fue aprobada el día 28 de julio de 2023 y cuya fecha de terminación fue el día 30 de septiembre de 2023. Teniendo en cuenta que, debido a la continuidad de los atrasos presentados en la obra, y que la meta física del contrato no se lograba se vio la necesidad de fijar una prórroga No. 3 por un periodo de dos (02) meses, la cual fue aprobada el día 22 de septiembre de 2023 y cuya fecha de terminación es el día 30 de noviembre de 2023. Adicional a ello, y en vista de que la meta física del contrato no se logró con esta prórroga, se vio la necesidad de fijar una Prorroga N° 4 por un periodo de dos (02) meses, la cual fue aprobada el 20 de noviembre de 2023, con fecha de terminación 30 de enero de 2024, y por consiguiente la prorroga No 5, tendría fecha de terminación el 15 de marzo de 2024 según lo manifestado.

8221

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

2. Se suscribe el día 23 de marzo de 2023 acta de inicio del CONTRATO DE OBRA: SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y No. INTERNO 2627 de 2022-12-28, por un plazo de tres (3) meses, y fecha de terminación inicial el día 22 de junio de 2023. El contratista de obra para poder cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y teniendo en cuenta que presentaba atrasos en la ejecución de la obra solicito una prórroga No. 1 por tres (03) meses la cual fue aprobada el día 21 de junio de 2023 quedando como nueva fecha de terminación el día 22 de septiembre de 2023; Posterior a esto y en vista que la meta física del contrato de obra no se alcanzaba se fijó una prórroga No. 2 por un periodo de dos (02) meses, la cual fue aprobada el día 22 de septiembre de 2023 y cuya nueva fecha de terminación es el día 22 de noviembre de 2023. Adicional a ello y en vista de que la meta física del contrato no se alcanzó con esta prórroga, se fijó una prorroga No. 3 por un periodo de dos (02) meses la cual fue aprobada el 20 de noviembre de 2023 con vigencia hasta el 22 de enero de 2024, y de acuerdo a la solicitud de prorroga No. 4 de obra, la fecha de terminación se extiende hasta el 7 de marzo de 2024. En vista que, debido a la continuidad de los atrasos en la ejecución de la obra, el contratista actualmente está solicitando una nueva prorroga No. 4 por un periodo de Cuarenta y cinco (45) dias, lo que motiva a esta interventoría a solicitar una prórroga por el mismo tiempo, ya que tiene como objeto principal realizar el seguimiento y control durante todo el plazo de ejecución del contrato de obra.

3. Por tal motivo está interventoría solicita sea viabilizada esta solicitud de prorroga No. 5 para el CONTRATO DE CONSULTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022 Y No. INTERNO 2622 DE 2022-12-27 por un plazo de Cuarenta y cinco (45) días, quedando como nueva fecha de terminación el 15 de marzo de 2024. La Interventoria manifiesta que con la prórroga No. 5 a suscribirse no se causa un mayor valor ni un reconocimiento extra económico por parte del Departamento de Casanare, por lo que se manifiesta que se declaran a paz y salvo de cualquier reclamación económica a futuro por la suscripción de dicha prorroga.

4. Que teniendo en cuenta que este es un contrato estructurado de acuerdo con la metodología del plan de cargas, se requiere que la supervisión avale esta solicitud realizada por esta interventoría, sustentada en el anexo de la metodología del plan de cargas, documento que hace parte contractual del CONTRATO DE CONSULTORIA Nº SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022 y No. INTERNO 2622 DE 2022-12-27.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

ING. ETREH.

ING. JUAN HERRERA.

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista
Anexo: (13) folios.

Carrera 29 No. 17-59 Valle de los Guarataros BLOQUE L INT. 3, Yopal - Casanare
Tel: 6332721 Cel: 3123979455, email_ gilbert569@hotmail.com

8222

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

CNS -YOP -148 -2024

Yopal, 17 de enero de 2024

GOBERNACIÓN DE CASANARE
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
RECIBIDO POR: Juan Herrera
FECHA 17/01/24 HORA 4:10 pm

Ingeniero
ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Director Técnico de Construcciones
Gobernación de Casanare

Ref: Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022 con radicado interno N° 2622 de 2022-12-27 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: Solicitud de aprobación prórroga No. 4 al Contrato de obra No. 2627 de 2022.

Atento saludo.

Por medio de la presente me permito presentar ante usted la solicitud para aprobación de la prórroga No. 4 del contrato de Obra No. 2627 de 2022 cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.**", por el término de Cuarenta y cinco (45) días, lo anterior con sustento en informe de justificación de Prorroga No. 4 de obra y de acuerdo a las siguientes consideraciones expuestas por el contratista de obra:

1. *Incidencia en los bajos rendimientos en la aplicación de lechada asfáltica, toda vez que como lo manifiesta nuestro proveedor de emulsiones asfálticas MPI, se ha generado gran congestión en los despachos, debido a que MPI por ser temporada decembrina y fin de año no produjo ni despachó pedidos de emulsiones asfálticas desde el día 21 de diciembre de 2023 al 09 de enero de 2024, siendo un gran lapso de tiempo diecinueve (19) días que han afectado nuestra programación para el desarrollo de las actividades de aplicación de Lechada Asfáltica LA-13.*

2. *Este antecedente se presentó también en nuestro proveedor: Pétreos y Triturados del Oriente (Petrioriente), que al igual por ser temporada decembrina y vacaciones colectivas no realizaron despachos de agregados y mezcla asfáltica MDC 19 desde el día 22 de diciembre de 2023 al día 09 de enero de 2024, generando atrasos y complicaciones en la programación de obra para el desarrollo de las actividades de Bacheo en la calle 10 (Intersecciones) y en la calle 24 en la calzada izquierda desde la carrera 10 hasta la carrera 5 y la calzada derecha entre carreras 7 y carrera 18, por lo cual se requiere de mayor cantidad de tiempo para realizar la intervención.*

Carrera 29 No. 17-59 Valle de los Guarataros BLOQUE L INT. 3, Yopal - Casanare
Tel: 6332721 Cel: 3123979455, email_ gilbert569@hotmail.com

8223

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

3. *Por otra parte, se requiere constantemente de emulsiones asfálticas y asfalto MDC 19, debido a esto solicitamos se realice ampliación del plazo de ejecución en 45 días adicionales, en vista que las actividades faltantes por ejecutar equivalen al 7% del contrato, como son:*

Falta ejecutar 368.89 m3 del ítem NP 01 Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de 1% de cemento en la calle 24 calzada izquierda entre carrera 10 y carrera 5.

Falta por ejecutar 25.454,33 m2 de Lechada Asfáltica primera y segunda capa, correspondientes a los siguientes tramos: Calle 24 Calzada Izquierda desde la Cra 5 la Cra 10, Calle 24 Calzada Derecha de la Cra 10 a la Cra 18 y las áreas de los retornos en Calle 24, estas áreas equivalen al 12% del ítem 2.04 Lechada asfáltica con emulsión CRL 1 Hm, tipo LA 13.

Falta por realizar el bacheo y/o reparcheo (según aplique) en la calle 24 y en los retornos de la calle 10 con Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19.

Esta cantidad de obra faltante por ejecutar requiere del despacho de 3 tractomulas con 32 toneladas de emulsión asfáltica, para lo cual, de acuerdo con lo manifestado en el mes de noviembre por nuestro proveedor MPI, podrá despachar 32 toneladas cada 5 días, lo que equivale a 15 días calendario para obtener el 100% de la emulsión asfáltica requerida. Adicional a esto y teniendo en cuenta los tiempos estimados de terminación de la instalación de la segunda capa de lechada se debe esperar un tiempo aproximado de 10 días para poder instalar la señalización horizontal, dado que es necesario garantizar el curado de la carpeta para posteriormente proceder con las actividades de señalización.

Por tal razón, esta Interventoria solicita comedidamente la ampliación de Cuarenta y cinco (45) días del plazo contractual al contrato de obra en referencia, teniendo en cuenta el informe anexo.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista Interventoria contrato 2622-2022

Anexo: (38) folios

Carrera 29 No. 17-59 Valle de los Guarataros BLOQUE L INT. 3, Yopal - Casanare
Tel: 6332721 Cel: 3123979455, email_ gilbert569@hotmail.com

8224

Nivelación De Pozos De Inspección.

gilberto galindo alvarado <gilbert569@hotmail.com>

Mar 16/01/2024 6:27 PM

Para:PROYECTOS CAMEL INGENIERIA <proyectos@camelingenieria.com>;Daniel Alejandro Engativá Rodriguez <gerencia@camelingenieria.com>;Obras Publicas - Dirección de Construcciones <construcciones@casanare.gov.co>

1 archivos adjuntos (527 KB)

OFICIO CNS-YOP-147-2023.pdf;

Atentamente

Ing. GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista de Interventoria CTRO 2622 de 2022

8225

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

CNS -YOP -147-2023

Yopal, 16 de enero de 2024

Ingeniero,
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
Representante legal
CONSORCIO FÉNIX

Ref. Contrato de Obra No. 2627 de 2022-12-28 cuyo objeto es " MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL ".

Asunto: Nivelación De Pozos De Inspección.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, vigilancia y control ejercida por parte de esta interventoría al contrato de la referencia; resulta que durante la finalización de la ejecución de las actividades de reciclado y aplicación de lechada asfáltica en la carrera 18 y las calles 9,10, y 24, se evidencia que gran cantidad de las tapas basculantes de los pozos de inspección se encuentran por debajo del nivel de la capa de rodadura, como se observa en las imágenes (1,2.3,4), generando cierto grado de peligro al tráfico en circulación. Por consiguiente, se solicita al contratista "Consorcio Fénix" realizar la nivelación correspondiente de los pozos de inspección, acatando los diseños y especificaciones constructivas. Es preciso recordar al contratista que esta actividad está contemplada en el ítem de acero de refuerzo el cual debe instalarse en las reparaciones de nivelación de las tapas basculantes de los pozos de inspección.

De igual manera se solicita al contratista realizar la limpieza de la parte superior de las tapas basculantes y de algunos pozos de inspección ocultas por la aplicación de las dos capas de lechada asfálticas, imágenes (5,6). Por lo tanto, ítem 1.13 Nivelación de Pozos de Inspección (No incluye: Tapa ni aro), no será tenido en cuenta para pago y/o se descontará, dependiendo exclusivamente de la terminación de la actividad a cabalidad.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista de consultoría No 2622 de 2022

CC. Ing. Robert Asis Hernández Cachay – Director Técnico de Construcciones – Gobernación de Casanare

Carrera 29 No. 17-58 Valle de los Guaraguaos BLOQUE 1 INT 3 Yopal - Casanare
Tel. 6332721 Cel. 3123979455. email: gilbert569@hotmail.com

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



Imagen 1. Bajo nivel del pozo de inspección, respecto capa rodadura. Cll 24 con Cra 26.

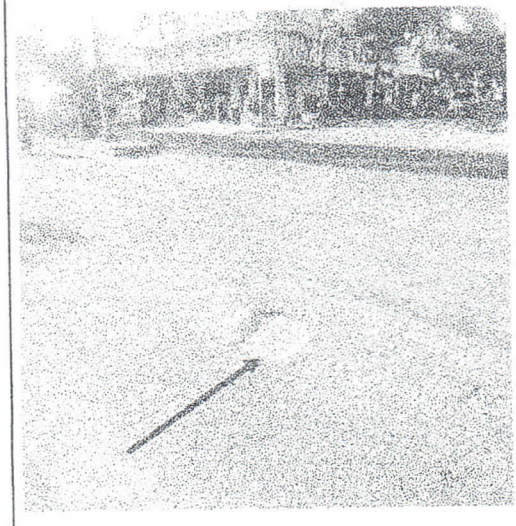


Imagen 2. bajo Nivel del pozo de inspección, respecto capa rodadura. Cll 24 con Cra 9.

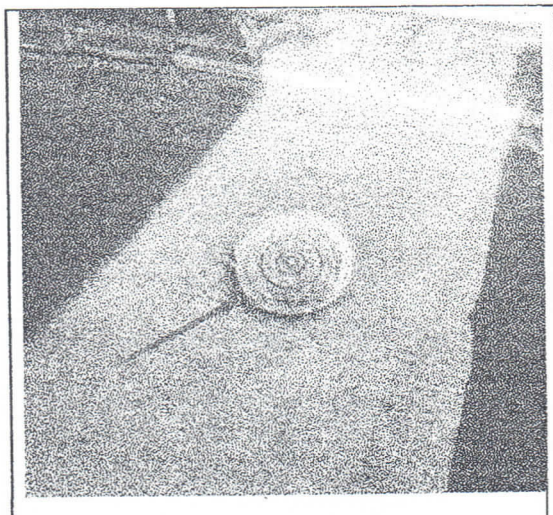


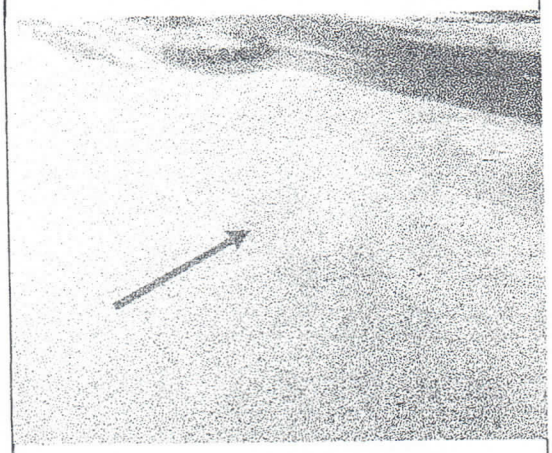
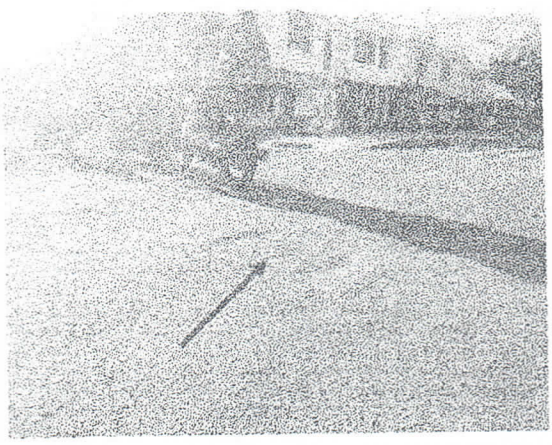
Imagen 3. bajo Nivel del pozo de inspección, respecto capa rodadura. Caño seco.



Imagen 4. bajo Nivel del pozo de inspección, respecto capa rodadura. Cll 10 con Cra 24.

Carrera 29 No. 17-58 Valle de los Guaduales ÁLCOVE LIMT 3 Yopal - Casanare
Tel. 8332721 Cel. 3123378455. e-mail: gilbert569@hotmail.com

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

	
Imagen 5. Lechada asfáltica sobre tapa basculante. Cll 24 con Cra 9.	Imagen 6. Lechada asfáltica sobre tapa basculante. Caño seco.

Carrera 29 No. 17-58 Valle de los Guarderos BLOQUE L INT 3 Yopal Casanare
Tel. 6332721 Cel. 3123379455 email: gilbert569@hotmail.com

8228

Aviso de posible CADUCIDAD del contrato de obra

gilberto galindo alvarado <gilbert569@hotmail.com>

Mar 16/01/2024 4:54 PM

Para:PROYECTOS CAMEL INGENIERIA <proyectos@camelingenieria.com>;Daniel Alejandro Engativá Rodriguez <gerencia@camelingenieria.com>;Obras Publicas - Dirección de Construcciones <construcciones@casanare.gov.co>

1 archivos adjuntos (115 KB)

OFICIO CNS-YOP-146-2023.pdf

Atentamente

Ing. GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista de Interventoria CTRO 2622 de 2022

8229

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

CNS -YOP -146-2023

Yopal, 16 de enero de 2024

Ingeniero,
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
Representante legal
CONSORCIO FÉNIX

Ref. Contrato de Obra No. 2627 de 2022-12-28 cuyo objeto es " MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL ".

Asunto: Aviso de posible CADUCIDAD del contrato de obra

Atento saludo

En cumplimiento de las funciones de seguimiento vigilancia y control ejercidas por parte de esta Interventoria al contrato de la referencia, esta Interventoria le informa que debido a que los plazos de ejecución contractuales están por agotarse y no se obtiene manifestación alguna por parte del contratista de obra al respecto, teniendo en cuenta que a la fecha solo restan 6 días para vencerse el plazo contractual del contrato de la referencia y el avance de obra es del 87.67% respecto a un avance programado del 98.58%, lo cual evidencia que no se va a lograr terminar totalmente la meta física del proyecto en el plazo restante, esta Interventoria no tiene otra opción que solicitar a la entidad la aplicación de la CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL, previa declaratoria de CADUCIDAD DEL CONTRATO, la cual se iniciará de inmediato, por presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial, por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones como en este caso que no se está cumpliendo con la ejecución de la obra en su totalidad, evidenciando atraso del 10,91% en su programa de ejecución de obra.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista de consultoría No 2622 de 2022

CC. Ing. Robert Asís Hernández Cachay – Director Técnico de Construcciones – Gobernación de Casanare

Carrera 29 No. 17-59 Valle de los Guarataros BLOQUE L INT. 3, Yopal - Casanare
Tel: 6332721 Cel: 3123979455, email_ gilbert569@hotmail.com

8230

Respuesta a oficio No. OF-CTO2627-140-2023 de fecha 29 de noviembre de 2023

gilberto galindo alvarado <gilbert569@hotmail.com>

Mar 16/01/2024 4:22 PM

Para:PROYECTOS CAMEL INGENIERIA <proyectos@camelingenieria.com>;Daniel Alejandro Engativá Rodriguez <gerencia@camelingenieria.com>

1 archivos adjuntos (217 KB)

[redacted]

Atentamente

Ing. GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista de Interventoria CTRO 2622 de 2023

8231

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

CNS -YOP -145-2023

Yopal, 16 de enero de 2024

Ingeniero,
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
Representante legal
CONSORCIO FÉNIX

Ref. Contrato de Obra No. 2627 de 2022-12-28 cuyo objeto es " MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL ".

Asunto: Respuesta a oficio No. OF-CTO2627-140-2023 de fecha 29 de noviembre de 2023

Atento saludo

En cumplimiento de las funciones de seguimiento vigilancia y control ejercidas por parte de esta Interventoria al contrato de la referencia y en respuesta al oficio No. OF-CTO2627-140-2023 en el cual el contratista de obra hace entrega de certificados de análisis de la pintura, la interventoría se permite manifestar que, de acuerdo a los soportes allegados, se evidencia que la pintura a utilizar a la fecha no cumple con las especificaciones técnicas del INVIAS Articulo **700-2. Materiales. 700.2.1.1. Características de la pintura liquida, literal g. Conservación del envase lleno: ...** "***En todo cuñete o envase de pintura debe aparecer la marca del fabricante y la fecha de producción. Nunca se aplicarán pinturas con más de un año de elaboración o sin etiqueta de fecha de producción.***"

Por lo anterior, se solicita al contratista de obra allegar los certificados de calidad del fabricante y los respectivos ensayos solicitados actualizados de acuerdo al oficio CNS -YOP -144-2023 y que correspondan a la pintura que se está utilizando en cumplimiento del ítem *4.01.9 Líneas de demarcación de ancho 12 cm con* ***pintura acrílica,*** *incluye micro esferas INV. 700.1 e ítem 4.02.9 Marcas viales con* ***pintura acrílica*** *para demarcación (símbolos y letreros).*

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista de consultoría No 2622 de 2022

Carrera 29 No. 17-59 Valle de los Guarataros BLOQUE L INT. 3, Yopal - Casanare
Tel: 6332721 Cel: 3123979455. email_ gilbert569@hotmail.com

8232

Solicitud de calidad líneas de demarcación con pintura acrílica

gilberto galindo alvarado <gilbert569@hotmail.com>

Lun 15/01/2024 11:56 AM

Para:PROYECTOS CAMEL INGENIERIA <proyectos@camelingenieria.com>;Daniel Alejandro Engativá Rodriguez <gerencia@camelingenieria.com>

1 archivos adjuntos (180 KB)

OFICIO CNS-YOP-144-2023.pdf;

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista de consultoría No 2622 de 2022

8233

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

CNS -YOP -144-2023

Yopal, 12 de enero de 2024

Ingeniero,
DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
Representante legal
CONSORCIO FÉNIX

Ref. Contrato de Obra No. 2627 de 2022-12-28 cuyo objeto es " MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL ".

Asunto: Solicitud de calidad líneas de demarcación con pintura acrílica

Atento saludo

En cumplimiento de las funciones de seguimiento vigilancia y control ejercidas por parte de esta Interventoria al contrato de la referencia y de acuerdo al *Ítem 4.01.9 Líneas de demarcación de ancho 12 cm con **pintura acrílica,** incluye micro esferas INV. 700.1 e ítem 4.02.9 Marcas viales con **pintura acrílica** para demarcación (símbolos y letreros)*, esta interventoría le solicita nos allegue la programación de instalación de dicha señalización con fecha, hora y lugar exactos teniendo en cuenta que se adelanta en horas nocturnas, a fin de realizar los respectivos controles a las pruebas de calidad de dichos materiales de acuerdo a las especificaciones mencionadas. Al igual se requiere nos allegue los certificados de calidad del fabricante donde se adquirieron dichos materiales y las pruebas de control de calidad que Ud. está obligado a adelantar a la instalación de las pinturas en mención, de acuerdo a CLUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA Numeral ***8. Efectuar el control de calidad de la obra por su cuenta***...

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito a los materiales (pinturas acrílicas de demarcación vial instaladas) se les debe adelantar los siguientes ensayos:

Articulo 700-22. Materiales

- Solventes empleados en pintura deben cumplir con la cantidad máxima indicada en la NTC1102
- Determinación de la estabilidad del color se debe hacer con base en la norma ASTM G154 y la diferencia de color se debe calcular con la norma ASTM D2244.
- En todo cuñete o envase de pintura debe aparecer la marca del fabricante y la fecha de producción, que no puede aplicarse pinturas con más de 1 año de elaboración o sin etiqueta de fecha de producción.
  La microesfera debe cumplir el mínimo de adhesión, refracción y reflexión.

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

- Una película delgada de pintura esparcida en una placa de vidrio y dejada secar completamente no debe oscurecerse, ni decolorarse cuando se someta a la acción de los rayos ultravioleta por un periodo de 60 minutos.

700-2.1.2. Características pintura

- Aspecto
- Color
- Flexibilidad
- Adherencia
- Sangrado
- Resistencia a la inmersión en agua
- Resistencia al Álcalis y resistencia a la abrasión

700.2.3

Microesfera de vidrio

700.2.3.1. Naturaleza

- Clasificación
- Composición
- Índice de refracción
- Densidad
- Granulometría
- Resistencia a la fractura
- Resistencia a la humedad
- Embalaje e identificación
- Propiedades de aplicación
- 400 gms/m2

De no ser entregada previamente a la instalación, la información de CERIFICACION DE CALIDAD DEL FABRICANTE a la Interventoria, no se tendrá en cuenta para el recibo de la obra terminada.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista de consultoría No 2622

CC. Ing. Robert Asís Hernández Cachay – Director Técnico de Construcciones – Gobernación de Casanare

8235

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CNS -YOP -143-2024

Yopal, 15 de enero de 2024

15 ENE 2024
Hora: 9:34 am.
No. de Radicación: 00371

Ingeniero.
ROBERT ASIS HERNADEZ CACHAY
Director Técnico de Construcciones
Gobernación de Casanare

Ref: Contrato de Consultoría SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022 con radicado interno N° 2622 de 2022-12-27 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: solicitud de modificatoria No. 2 del contrato de obra publica No. 2627 de 2022 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL"

Atento saludo.

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, vigilancia y control ejercida por parte de esta interventoría al contrato de obra pública No. 2627 de 2022 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL", me permito presentar y avalar la necesidad de la fijación de un acta modificatoria No. 2 al contrato en mención, teniendo en cuenta que se evidencian cambios en las cantidades de obra contractuales para cumplir con el alcance del contrato; anexo a esta se relacionan todos los documentos soporte para el trámite de acta de fijación de modificatoria y demás anexos técnicos que avalan y justifican la solicitud.

Agradeciendo la atención a la presente

Atentamente

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C. 6.773.569 de Tunja
Contratista de consultoría No 2622

Anexo (166) folios y (12) planos

CR 29 17 59 BL L INT 3 Yopal– Casanare Tel: 3123979455
gilbert569@hotmail.com

	INFORME MENSUAL No. 10	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	2	2024
	1 DE ENERO DE 2024 a 31 DE ENERO DE 2024	DD	MM	AA

13.4 COPIA CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

8237

RECIBIDO

CONSORCIO FENIX

Yopal, 17 de enero de 2024

OF-CTO2627-147-2024

R: Enero 17/2024

Ingeniero
GILBERTO GALINDO ALVARADO
Interventor
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública No 2627 de 2022 cuyo objeto es: **"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL".**

Asunto: Solicitud de plazo adicional o Prórroga No 4

Cordial Saludo

El Consorcio FENIX se permite manifestar que se siguen presentando una serie de antecedentes que afectan la continuidad de las obras de acuerdo a la reprogramación presentada el 15 de noviembre de 2023 entre las que se cuentan las siguientes:

Incidencia en los bajos rendimientos en la aplicación de lechada asfáltica, toda vez que como lo manifiesta nuestro proveedor de emulsiones asfálticas MPI, se ha generado gran congestión en los despachos, debido a que MPI por ser temporada decembrina y fin de año no produjo ni despachó pedidos de emulsiones asfálticas desde el día 21 de diciembre de 2023 al 09 de enero de 2024, siendo un gran lapso de tiempo diecinueve (19) días que han afectado nuestra programación para el desarrollo de las actividades de aplicación de Lechada Asfáltica LA-13.

Este antecedente se presentó también en nuestro proveedor: Pétreos y Triturados del Oriente (Petrioriente), que al igual por ser temporada decembrina y vacaciones colectivas no realizaron despachos de agregados y mezcla asfáltica MDC 19 desde el día 22 de diciembre de 2023 al día 09 de enero de 2024, generando atrasos y complicaciones en la programación de obra para el desarrollo de las actividades de Bacheo en la calle 10 (Intersecciones) y en la calle 24 en la calzada izquierda desde la carrera 10 hasta la carrera 5 y la calzada derecha entre carreras 7 y carrera 18, por lo cual se requiere de mayor cantidad de tiempo para realizar la intervención.

Por otra parte, se requiere constantemente de emulsiones asfálticas y asfalto MDC 19, debido a esto solicitamos se realice ampliación del plazo de ejecución en 45 días adicionales, en vista que las actividades faltantes por ejecutar equivalen al 7% del contrato, como son:

- Falta ejecutar 368.89 m3 del ítem *NP 01 Pavimento Reciclado en frio en el lugar con Emulsión asfáltica con adición de 1% de cemento* en la calle 24 calzada

izquierda entre carrera 10 y carrera 5.


- Falta por ejecutar 25.454,33 m2 de Lechada Asfáltica primera y segunda capa, correspondientes a los siguientes tramos: Calle 24 Calzada Izquierda desde la Cra 5 la Cra 10, Calle 24 Calzada Derecha de la Cra 10 a la Cra 18 y las áreas de los retornos en Calle 24, estas áreas equivalen al 12% del ítem *2.04 Lechada asfáltica con emulsión CRL 1 Hm, tipo LA 13.*

- Falta por realizar el bacheo y/o reparcheo (según aplique) en la calle 24 y en los retornos de la calle 10 con Mezcla densa en caliente Tipo MDC 19.

Esta cantidad de obra faltante por ejecutar requiere del despacho de 3 tractomulas con 32 toneladas de emulsión asfáltica, para lo cual, de acuerdo con lo manifestado en el mes de noviembre por nuestro proveedor MPI, podrá despachar 32 toneladas cada 5 días, lo que equivale a 15 días calendario para obtener el 100% de la emulsión asfáltica requerida. Adicional a esto y teniendo en cuenta los tiempos estimados de terminación de la instalación de la segunda capa de lechada se debe esperar un tiempo aproximado de 10 días para poder instalar la señalización horizontal, dado que es necesario garantizar el curado de la carpeta para posteriormente proceder con las actividades de señalización.

Tabla 1 Cantidad Ejecutada de Lechada vs Cantidad por Ejecutar

DESCRIPICIÓN	CANTIDAD	INCIDENCIA
Lechada Asfáltica Instalada	179.806,03	88%
Lechada Asfáltica por Instalar	25.454,33	12%
Total Ítem Lechada Asfáltica	**205.260,36**	**100%**

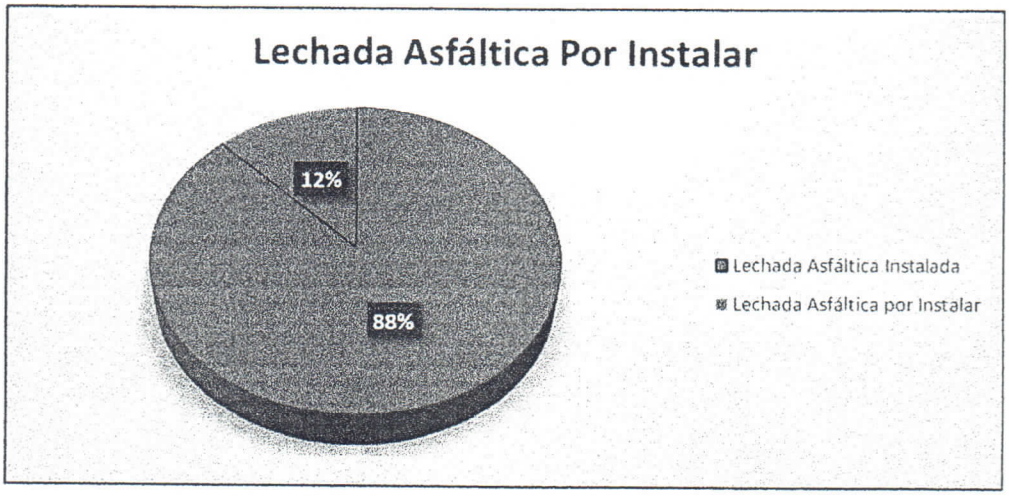


CONSORCIO FENIX

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2 Cantidad de Reciclado Realizado vs Cantidad de Reciclado faltante por ejecutar

DESCRIPICIÓN	CANTIDAD	INCIDENCIA
Pavimento Reciclado Realizado	3.146,29	90%
Pavimento Reciclado Faltante	368,89	10%
Total Ítem Pavimento Reciclado	**3.515,18**	**100%**

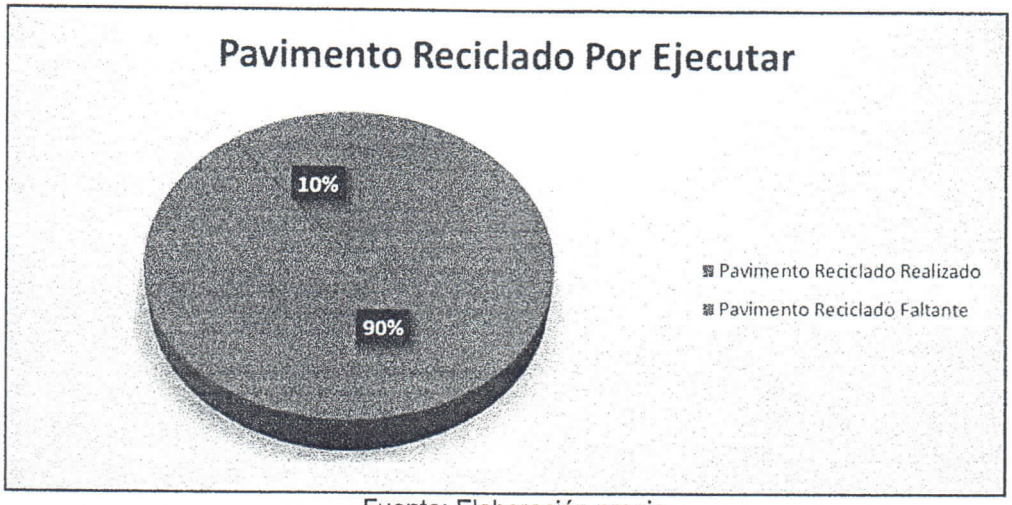

Fuente: Elaboración propia

Plan de Acción

En consecuencia, con lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente plan con el objetivo de desarrollar e implementar un Plan de Contingencia que nos permita la Recuperación del Cronograma de Obra a través del desarrollo e incorporación en obra de tácticas y técnicas ajustadas a las necesidades específicas de las actividades y la problemática existente asociada a los riesgos que afectan el tiempo de ejecución. Como objetivos específicos se pretende efectuar un estudio de diagnóstico que permita identificar las fortalezas y debilidades en los procesos y las actividades más impactantes en el cronograma. Igualmente, elaborar, socializar e implementar un plan de acción inicial basado en oportunidades y amenazas detectadas que nos permitan replantear el cronograma de obra.

Los riesgos asociados al no cumplimiento de los plazos programados son los siguientes:

ITEM	RIESGO	NIVEL
1	Incremento de las lluvias	Leve
2	Retrasos en la entrega de emulsiones asfálticas por restricción de Ecopetrol en suministros de asfaltos los días miércoles y sábados de cada semana.	Critica

Al determinar los riesgos asociados al tiempo de ejecución se pretende presentar un plan de acción basado en las oportunidades y amenazas detectadas, las cuales fueron soporte importante en la determinación de la acción a seguir.

Posteriormente, se presenta el plan de acción por ítems o actividades del contrato en el que se determina que el plazo contractual no es suficiente para finalizar y por lo tanto, es necesario contar con mayor tiempo de ejecución de obra.

El plan de acción que se propone se basa en la reprogramación de obra del 15 de noviembre de 2023 en la que se determina los tiempos de retraso en cada actividad del contrato y está asociado al plan de contingencia propuesto.

RIESGO	DESCRIPCION	ACCIONES	RECURSOS	PLAZO	RESPONSABLE
Incremento de las lluvias	Debido a la transición entre Fenómeno de la Niña y el fenómeno del niño no se descartan lluvias, lo cual implicaría un retraso en la ejecución de las actividades de reciclaje y lechada asfáltica	Dado que es un riesgo que se sale de cualquier gestión, se monitoreara constantemente los pronósticos del IDEAM para identificar de manera temprana la materialización del riesgo e iniciar el plan de acción.	Información del IDEAM	1,5 meses	Director de obra, residentes y personal de comunicaciones
Retrasos en entrega de las emulsiones asfálticas	Las restricciones de entrega de asfaltos por parte de Ecopetrol en la refinería Apiay a generado demoras en los despachos e emulsiones asfálticas por parte de MPI	Dado que es un riesgo que se sale de la gestión directa, pues se depende de ECOPETROL y MPI en definir tiempos que permitan el despacho de emulsiones, se debe monitorear las entregas de emulsiones para identificar la materialización del riesgo e iniciar el plan de acción.	Información de MPI	1,5 meses	Director de obra, Personal de comunicaciones

Como resultado de la reprogramación de obra, se determina un nuevo flujo de facturación diaria, semanal y mensual de acuerdo con la siguiente información:

CONSORCIO FENIX

ANALISIS DE FLUJO MENSUAL.

ID	Periodo	Facturacion Estimada Mes	FacturacionAcumulada mensual	Porcentaje de ejecucion
1	mar-23	$ 5.055.254	$ 5.055.254	0,1%
2	abr-23	$ 53.497.222	$ 58.552.477	0,8%
3	may-23	$ 514.818.616	$ 573.371.093	7,7%
4	jun-23	$ 835.891.492	$ 1.409.262.585	19,0%
5	jul-23	$ 870.261.352	$ 2.279.523.936	30,7%
6	ago-23	$ 695.218.562	$ 2.974.742.499	40,1%
7	sep-23	$ 672.792.157	$ 3.647.534.656	49,2%
8	oct-23	$ 695.416.631	$ 4.342.951.287	58,5%
9	nov-23	$ 699.849.062	$ 5.042.800.349	68,0%
10	dic-23	$ 731.859.687	$ 5.774.660.035	77,8%
11	ene-24	$ 833.861.576	$ 6.608.521.612	89,1%
12	feb-24	$ 713.273.818	$ 7.321.795.430	98,7%
13	mar-24	$ 96.701.958	$ 7.418.497.387	100,0%

8242

CONSORCIO FENIX

ANALISIS DEL FLUJO SEMANAL

	SEMANA	Facturacion Estimada por Semana	Facturacion acumulada semanal	Porcentaje de ejecucion
1	semana 1	$ 1.373.213	$ 1.373.213	0,0%
2	semana 2	$ 4.335.242	$ 5.708.455	0,1%
3	semana 3	$ 10.151.084	$ 15.859.539	0,2%
4	semana 4	$ 13.584.117	$ 29.443.656	0,4%
5	semana 5	$ 13.584.117	$ 43.027.772	0,6%
6	semana 6	$ 13.584.117	$ 56.611.889	0,8%
7	semana 7	$ 13.584.117	$ 70.196.005	0,9%
8	semana 8	$ 46.495.847	$ 116.691.852	1,6%
9	semana 9	$ 150.185.693	$ 266.877.546	3,6%
10	semana 10	$ 195.041.348	$ 461.918.894	6,2%
11	semana 11	$ 195.041.348	$ 656.960.242	8,9%
12	semana 12	$ 195.041.348	$ 852.001.590	11,5%
13	semana 13	$ 195.041.348	$ 1.047.042.938	14,1%
14	semana 14	$ 195.041.348	$ 1.242.084.286	16,7%
15	semana 15	$ 195.041.348	$ 1.437.125.634	19,4%
16	semana 16	$ 195.041.348	$ 1.632.166.982	22,0%
17	semana 17	$ 222.711.010	$ 1.854.877.992	25,0%
18	semana 18	$ 222.808.297	$ 2.077.686.289	28,0%
19	semana 19	$ 156.984.837	$ 2.234.671.126	30,1%
20	semana 20	$ 156.984.837	$ 2.391.655.963	32,2%
21	semana 21	$ 156.984.837	$ 2.548.640.799	34,4%
22	semana 22	$ 156.984.837	$ 2.705.625.636	36,5%
23	semana 23	$ 156.984.837	$ 2.862.610.473	38,6%
24	semana 24	$ 156.984.837	$ 3.019.595.309	40,7%
25	semana 25	$ 156.984.837	$ 3.176.580.146	42,8%
26	semana 26	$ 156.984.837	$ 3.333.564.983	44,9%
27	semana 27	$ 156.984.837	$ 3.490.549.819	47,1%
28	semana 28	$ 156.984.837	$ 3.647.534.656	49,2%
29	semana 29	$ 156.984.837	$ 3.804.519.492	51,3%
30	semana 30	$ 156.984.837	$ 3.961.504.329	53,4%
31	semana 31	$ 156.984.837	$ 4.118.489.166	55,5%
32	semana 32	$ 156.984.837	$ 4.275.474.002	57,6%
33	semana 33	$ 157.579.043	$ 4.433.053.045	59,8%
34	semana 34	$ 161.829.541	$ 4.594.882.586	61,9%
35	semana 35	$ 164.943.139	$ 4.759.825.726	64,2%
36	semana 36	$ 164.943.139	$ 4.924.768.865	66,4%
37	semana 37	$ 165.265.573	$ 5.090.034.438	68,6%
38	semana 38	$ 165.319.312	$ 5.255.353.750	70,8%
39	semana 39	$ 165.319.312	$ 5.420.673.062	73,1%
40	semana 40	$ 165.319.312	$ 5.585.992.374	75,3%
41	semana 41	$ 165.104.356	$ 5.751.096.730	77,5%
42	semana 42	$ 164.943.139	$ 5.916.039.869	79,7%
43	semana 43	$ 159.159.603	$ 6.075.199.472	81,9%
44	semana 44	$ 156.984.837	$ 6.232.184.309	84,0%
45	semana 45	$ 226.747.070	$ 6.458.931.379	87,1%
46	semana 46	$ 264.477.072	$ 6.723.408.451	90,6%
47	semana 47	$ 175.683.601	$ 6.899.092.052	93,0%
48	semana 48	$ 157.685.194	$ 7.056.777.246	95,1%
49	semana 49	$ 153.173.769	$ 7.209.951.015	97,2%
50	semana 50	$ 148.397.321	$ 7.358.348.336	99,2%
51	semana 51	$ 60.149.052	$ 7.418.497.388	100,0%

gerencia@camelingenieria.com
3106965106 o
3184732061
Carrera 5 No 24-50
Yopal, Casanare

8243

CONSORCIO FENIX

Basado en los riesgos asociados al objetivo de tiempo de ejecución del contrato de la referencia se planteó un plan de contingencia en el que se analizaron los rendimientos del equipo, del personal y del suministro de las emulsiones por parte del proveedor. Como conclusión general se determina que no es posible la recuperación de los tiempos contractuales por lo que se hace necesario plantear una nueva programación que permita cumplir con las actividades del contrato asociado a los tiempos reales de ejecución teniendo en cuenta los riesgos y los inconvenientes presentados al inicio y en el desarrollo del proyecto especialmente por la lluvia.

Por tal razón, el Consorcio Fénix solicita comedidamente la ampliación de cuarenta y cinco (45) días adicionales al plazo final del contrato para lograr ejecutar a cabalidad el 7% faltante por ejecutar, Manifestando el interés de realizar las respectivas actualizaciones de pólizas del contrato.

Atentamente

DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO FENIX

Anexos:

- Flujo de facturación diario semanal y mensual: 9 folios
- Reprogramación de obra: 1 folio
- Comunicado MPI: 1 folio
- Comunicado Petrioriente: 1 folio
- Plan de acción: 2 folios

8244

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P	COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	**Fecha Ultima Modificación** 2023-12-16	**Tipo de Documento:** FORMATO	
			Código: 51.29.01.01	
			Versión 07	

841-3.16.01.00148.24
Yopal, enero 09 de 2024

NOTIFICADO
FIRMA: _____
NOMBRE: _____
No. CEDULA: _____ HORA: _____
DEPÉNDENCIA: _____

Ingeniero:
GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contratista de consultoría No. 2622
Dirección: K-29-N-17-59 Valle de los Guarataros BLOQUE L INT. 3, Yopal – Casanare.
Celular: 3123979455
Email: gilbert569@hotmail.com

se visito inmueble vigilante no resibio oficio usuario no no se encontro en el inmueble 09/01/24 5:02 pm

REFERENCIA: RAD. 2023167542

ASUNTO: Respuesta a solicitud reparación estructura de pavimento reciclado y lechada asfáltica calle 9 con carrera 23.

Cordial saludo, Ingeniero Galindo.


Por medio de la presente informamos que la EAAAY está en el deber de proceder a reparar las fugas que sean reportadas, la empresa no asumió dicho reparcheo de la vía durante la reparación de la fuga teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con los materiales ni con las especificaciones técnicas que el interventor estaba solicitando, sin embargo, el contratista de la obra realizó el reparcheo de la vía donde se presentó la fuga con las especificaciones técnicas de la capa de rodadura construida dejando corregido y en óptimas condiciones la afectación realizada a esta vía.
Cabe resaltar que cuando se emitió la certificación de la disponibilidad del servicio para el proyecto de pavimentación se dejó en evidencia la existencia de redes antiguas que podrían presentar fallas por la vida útil de esta tubería y la responsabilidad del contratista de la obra frente al remplazo de las redes obsoletas.


De igual manera la EAAAY recalca que es nuestra obligación intervenir inmediatamente toda fuga reportada y así evitar la pérdida de agua potable y el incremento en los indicadores de agua no contabilizada.


Evidencia fotográfica reparación realizada en pavimento reciclado y lechada asfáltica calle 9 con carrera 23 por parte del contratista.


8245

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT 844001735-4	COMUNICACIONES OFICIALES ENVIADAS			
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	**Fecha Ultima Modificación** 2023-12-16	**Tipo de Documento:** FORMATO	
			Código: 51.29.01.01	
			Versión 07	

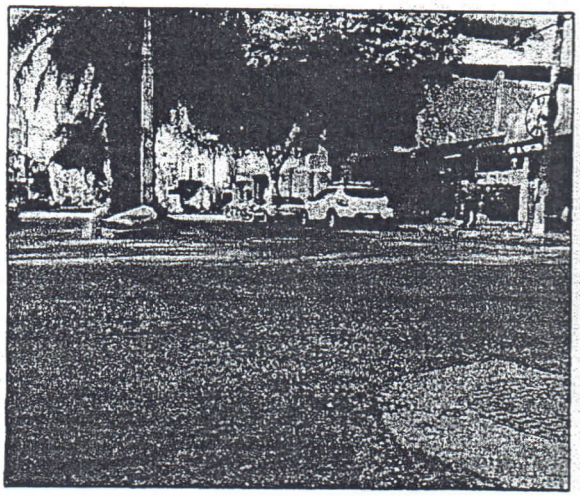

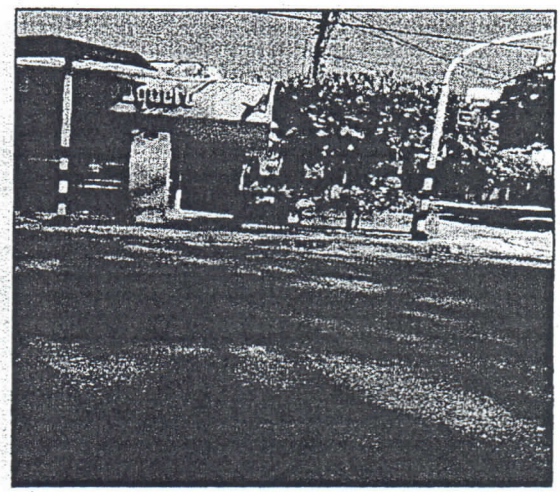

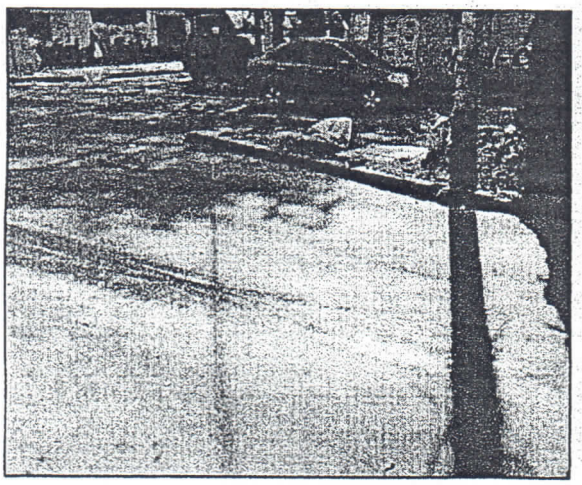

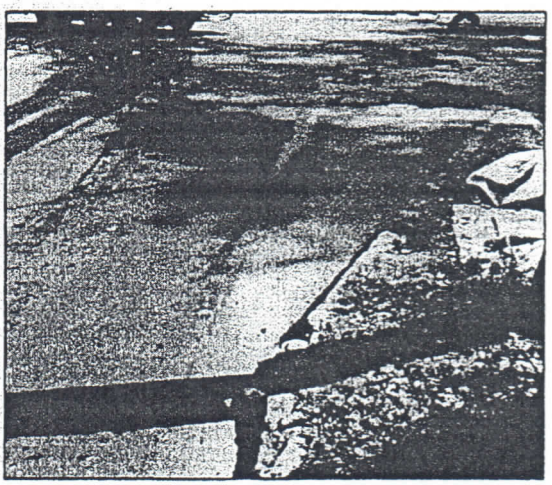

Agradecemos su atención y recuerde que la Empresa de Acueducto, Alcantarilla y Aseo de Yopal E.I.C.E. – E.S.P. está a su servicio.

Sin otro particular,

JHON FRANCISCO FLECHAS AVELLA
DIRECTOR OPERATIVO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EAAAY

Tania Josefina Mendez Arevalo TM
Técnica de Infraestructura y Perdidas
Responsable de Elaboración

Gestión Documental:
Original: Destinatario
Copia 1: Archivo Serie Documental

8246

CONSORCIO FENIX

Yopal, 03 de enero de 2024

OF-CTO2627-145-2023

R: 03-01-2024

Ingeniero
Gilberto Galindo
INTERVENTOR
Ciudad

Referencia: Contrato de Obra Pública No 2627 de 2022 cuyo objeto es: ""**MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL**".

Asunto: Entrega Informe Acta Modificatoria No. 2

Cordial Saludo Ingeniero

La presente tiene como finalidad entregar el informe correspondiente al acta modificatoria.

Para ello se anexan los siguientes documentos:

- Acta Modificatoria
- Informe Acta Modificatoria
- Memorias de Calculo
- Planos Losa en Concreto MR
- Planos Demarcación horizontal

Agradezco su atención y pronta respuesta.

Cordialmente

DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO FENIX
Contacto: 3106965106 o 3208820883
Carrera 5 No 24 -50 Yopal Casanare

	INFORME MENSUAL No. 10	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	2	2024
	1 DE ENERO DE 2024 a 31 DE ENERO DE 2024	DD	MM	AA

13.5 COPIA COMITES

14 ENSAYOS DE LABORATORIO - INTERVENTORÍA.

	INFORME MENSUAL No. 10	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	2	2024
	1 DE ENERO DE 2024 a 31 DE ENERO DE 2024	DD	MM	AA

14.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

TIPO DE ENSAYO

ANALISIS GRANULOMETRICO, EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO (INV. E-732-13) LECHADA LA-13
