9030

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

7.1 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE CONSULTORÍA 2622 DE 2022	
Nombre del Contratante	DEPARTAMENTO DE CASANARE
Nombre del Contratista	GILBERTO GALINDO ALVARADO
Supervisor	ING. ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Numero del Contrato	2622 DE 2022
Fecha del Contrato	DICIEMBRE 27 DE 2022
Plazo inicial Contractual (Meses)	CUATRO (4) MESES
Valor Inicial	$296,568,860.00
Valor Anticipo	$109,730,478.20
Valor Adicional	$0.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$296,568,860.00
Fecha de Iniciación	01 DE FEBRERO DE 2023
Fecha de terminación contractual	31 DE MAYO DEL 2023
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS	
Fecha autorización Prórroga No. 1	25 DE ABRIL DE 2023
Período autorizado	DOS (02) MESES
Motivo	Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2622 de 2022
Fecha de terminación	31 DE JULIO DE 2023
Fecha autorización Prórroga No. 2	28 DE JULIO DE 2023
Período autorizado	DOS (02) MESES
Motivo	Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2622 de 2022
Fecha de terminación	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OTROSI	04 DE AGOSTO DE 2023
Motivo	Forma de pago contrato de interventoria
Fecha autorización Prórroga No. 3	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Período autorizado (Plazo)	DOS (02) MESES
Motivo	Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2627 de 2022
Nueva fecha de terminación	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha autorización Prórroga No. 4	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
Período autorizado (Plazo)	DOS (02) MESES
Motivo	Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2627 de 2022
Nueva fecha de terminación	30 DE ENERO DE 2024
Fecha autorización Prórroga No. 5	18 DE ENERO DE 2024
Período autorizado (Plazo)	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
Motivo	Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2627 de 2022
Nueva fecha de terminación	15 DE MARZO DE 2024
Fecha autorización Prórroga No. 6	15 DE MARZO 2024
Período autorizado (Plazo)	DOS (2) MESES
Motivo	Seguimiento y control del Contrato de Obra No. 2627 de 2022
Nueva fecha de terminación	15 DE MAYO DE 2024
SUSPENSIONES Y REINICIOS	
N/A	

EL CONTRATO VENCE EL 15 DE MAYO DE 2024

VALOR CONTRATO	$296,568,860.00	% EJECUTADO
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1	$66,023,969.51	22.26%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2	$49,244,211.16	16.60%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 3	$77,771,510.07	26.22%
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	$77,549,938.83	26.15%
TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	**$270,589,629.57**	**91.24%**

8. INFORME JURÍDICO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 2622 DE 2022.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

8.1 CONTROL DE POLIZAS CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORIA.

El contratista de interventoria presenta las garantias de acuerdo con la **CLAUSULA 18** del CONTRATO DE CONSULTORÍA 2622 DE 2022, pólizas que garantizan EL CUMPLIMIENTO; PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, CALIDAD DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

POLIZAS INICIALES CONTRATO DE CONSULTORÍA

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	27-dic-2022	27-ago-2023	$ 29,656,886.00	20 de Enero de 2023
ANTICIPO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	27-dic-2022	27-ago-2023	$109,730,478.20	20 de Enero de 2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	27-dic-2022	27-abr-2026	$ 14,828,443.00	20 de Enero de 2023
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	27-dic-2022	27-abr-2026	$ 29,656,886.00	20 de Enero de 2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000021456	27-dic-2022	27-abr-2023	$200,000,000.00	20 de Enero de 2023

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO DEL 22 DE MARZO DE 2019

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-feb-2023	1-oct-2023	$ 29,656,886.00	15 de Febrero de 2023
ANTICIPO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-feb-2023	1-oct-2023	$109,730,478.20	15 de Febrero de 2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-feb-2023	1-jun-2026	$ 14,828,443.00	15 de Febrero de 2023
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-jun-2023	1-jun-2026	$ 29,656,886.00	15 de Febrero de 2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000021456	27-abr-2023	1-sep-2023	$200,000,000.00	15 de Febrero de 2023

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
		2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

8.1 CONTROL DE POLIZAS CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORIA.

POLIZAS SEGÚN AMPLIACIÓN NUMERO 5, DEL 18 DE ENERO DE 2024

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-feb-2023	16-jul-2024	$ 29,656,886.00	24/01/2024
ANTICIPO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-feb-2023	16-jul-2024	$109,730,478.20	24/01/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-feb-2023	18-mar-2027	$ 14,828,443.00	24/01/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-jun-2023	1-jun-2026	$ 29,656,886.00	24/01/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000021456	1-feb-2024	17-mar-2024	$260,000,000.00	24/01/2024

POLIZAS SEGÚN AMPLIACIÓN NUMERO 6, DEL 15 DE MARZO DE 2024

GARANTÍAS	NOMBRE ASEGURADORA	POLIZA No	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
			FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-feb-2023	16-sep-2024	$ 29,656,886.00	15/03/2024
ANTICIPO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-feb-2023	16-sep-2024	$109,730,478.20	15/03/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-feb-2023	18-may-2027	$ 14,828,443.00	15/03/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099692	1-jun-2023	1-jun-2026	$ 29,656,886.00	15/03/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000021456	1-feb-2023	17-may-2024	$260,000,000.00	15/03/2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO 15-03-2024 16:26

Id de la garantía CO1.WRT.13946611

Referencia de la garantía 605-47-994000099692- 605-74-994000021456

Estado Aceptado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- [ ] Contrato de seguro
- [ ] Patrimonio autónomo
- [x] Garantía bancaria

Garante ASEGURADORA SOLIDARIA

Sub-tipo de garantía Garantía bancaria

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	109.730.478,20 COP	16/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	29.656.886,00 COP	16/09/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	14.828.443,00 COP	18/05/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	29.656.886,00 COP	1/06/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	260.000.000,00 COP	17/05/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Polizas Prorroga N° 6 Interventoria .pdf	Polizas Prorroga N° 6 Interventoria .pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *GILBERTO GALINDO ALVARADO* 14/03/2024 5:22 PM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

9035

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT. 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052729339

PÓLIZA No: 605-47-994000099692 ANEXO: 8

AGENCIA EXPEDIDORA: YOPAL | COD. AGENCIA: 605 | RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA | TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	14	03	2024
FECHA DE IMPRESIÓN	14	03	2024

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **GILBERTO GALINDO ALVARADO** | IDENTIFICACIÓN: CC **6.773.569**

DIRECCIÓN: CL 24 F 85 B 84 | CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3123979455

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** | IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** | IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE CONSULTORIA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	01/02/2023	16/09/2024	29,656,886.00
ANTICIPO	01/02/2023	16/09/2024	109,730,478.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/02/2023	18/05/2027	14,828,443.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/06/2023	01/06/2026	29,656,886.00

BENEFICIARIOS
NIT 892099216 - DEPARTAMENTO DE CASANARE

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA:

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DOS (2) MESES SEGUN PRORROGA No. 06 DE FECHA 14/03/2024.

OBJETO DE LA GARANTIA
EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No INTERNO 2622 DE FECHA 27/12/2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE CALIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***183,872,693.20	$ **********51,546	$*********0.00	$ ********9,794	$ **********61,340

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	7221	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN. DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO. PARA FINES COMERCIALES, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_ HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000605272933

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8D8257A060BF97A5D

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

9036.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT 830.524.554-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6052729354

PÓLIZA No: 605 -74 - 994000021456 ANEXO:7

AGENCIA EXPEDIDORA: **YOPAL** COD. AGE: 605 RAMO: 74 PAP

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
14	03	2024		17	03	2024	23:59		17	05	2024	23:59		61	14	03	2024

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	A LAS	DIAS
	17	03	2024	23:59		17	05	2024	23:59		61

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **GILBERTO GALINDO ALVARADO** IDENTIFICACIÓN: CC **6.773.569**

DIRECCIÓN: CL 24 F 85 B 84 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3123979455

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **DEPARTAMENTO DE CASANARE** IDENTIFICACIÓN: NIT **892.099.216-6**

DIRECCIÓN: CARRERA 21 NO 8 32 CIUDAD: **YOPAL, CASANARE** TELÉFONO: 3142471554

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE CASANARE NIT : 892099216

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: CASANARE CIUDAD: YOPAL

DIRECCION: YOPAL

ACTIVIDAD: CONTRATO DE CONSULTORIA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: SERVICIOS MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 260,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DOS (2) MESES SEGUN PRORROGA No. 06 DE FECHA 14/03/2024.

VIGENCIA TOTAL DESDE 01/02/2023 HASTA 17/05/2024

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecucion DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No INTERNO 2622 DE FECHA 27/12/2022 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFALTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***260,000,000.00	$ **********108,630	$*********0.00	$ *******20,640	$ **********129,270

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
SEGUROS PACHECO ROJAS LTDA	7221	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000605272935

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

C8D8257A060BF97A5C CLIENTE EROJASPATRI 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * **Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * **Teléfono:** (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * **Celular:** 312 342 6229 * **Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

9037

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000021456 ANEXO: 7 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 2

TOMADOR: GILBERTO GALINDO ALVARADO IDENTIFICACION: 6.773.569

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	DEPARTAMENTO DE CASANARE	892099216-6	YOPAL	YOPAL	260,000,000.00	108,630	129,270

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
108,630	129,270

9038

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	5 DD	4 MM	2024 AA

8.2 ADICIONALES - SANCIONES Y ACTAS

A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME SE HAN REALIZADO LOS SIGUIENTES TRÁMITES ANTE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2622 DE 2022.

2.2. CONTROL ADICIONALES AL PLAZO

TIEMPO PRÓRROGA	NÚMERO	CAUSALES	FECHA PERFEC.
DOS (2) MESES	1	Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2622 de 2022	25 DE ABRIL DE 2023
DOS (2) MESES	2	Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2622 de 2023	28 DE JULIO DE 2023
DOS (2) MESES	3	Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2622 de 2024	22 DE SEPT. DE 2023
DOS (2) MESES	4	Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2627 de 2024	20 DE NOV. DE 2023
CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS	5	Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2627 de 2024	18 DE ENERO DE 2024
DOS (2) MESES	6	Seguimiento y control al Contrato de Obra No. 2627 de 2024	15 DE MARZO DE 2024

}

RESOLUCIÓN No	OBJETO	VALOR	FECHA
	En la ejecución de este contrato no se han presentado sanciones		

2.5. ACCIONES LEGALES

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No EXPEDIENTE
Posible incumplimiento	El día 12/09/2023 se solicitó mediante oficio No. CNS-YOP-107-2023 las sanciones respectivas para un posible incumplimiento por parte del contratista de obra debido a los atrasos evidenciados en la obra. Dicha solicitud no surgió efecto teniendo en cuenta que la fecha en que se solicitó este posible incumplimiento era insuficiente y no se le garantizaba al contratista de obra el derecho a la defensa y contradicción como pilares fundamentales del derecho del debido proceso, en vista que el contrato tenía como fecha de terminación el día 22/09/2023, de acuerdo a memorando No. 0555, emitido por la Gobernación de Casanare mediante oficio No. 520.85-628 el día 13/09/2023.	12/09/2023	Direccion Tecnica de Construcciones	982-12-09-2023
Posible incumplimiento	El día 8/11/2023 se solicitó mediante oficio No. CNS-YOP-128-2023 las sanciones respectivas para un posible incumplimiento por parte del contratista de obra debido a los atrasos evidenciados en la obra. Dicha solicitud se encuentra en proceso por parte de la entidad contratante Gobernación de Casanare.	8/11/2023	Direccion Tecnica de Construcciones	982-12-09-2023

2. 6. ACTAS TRAMITADAS

NUMERO	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA	1/02/2023	NA	
2	ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO	28/02/2023	$109,730,478.20	
3	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1	23/08/2023	$ 66,023,969.51	
4	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.2	9/10/2023	$ 49,244,211.16	
5	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.3	12/12/2023	$ 77,771,510.07	

2. 7. PLAZOS O PRORROGAS Y VIGENCIAS

NUMERO	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	PRÓRROGA No.1	25/04/2023	NA	
2	PRÓRROGA No.2	28/07/2023	NA	
3	PRÓRROGA No.3	22/09/2023	NA	
4	PRÓRROGA No.4	20/11/2023	NA	
5	PRÓRROGA No.5	18/01/2024	NA	
6	PRÓRROGA No.6	15/03/2024	NA	

2. 8. OTROSI

NUMERO	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	OTROSI MODIFICATORIO No. 1	4/08/2023	NA	

FIRMA

NOMBRE

GILBERTO GALINDO ALVARADO
R/L. CONTRATO DE CONSULTORÍA
T.P. 01198-0214 CPITVC
C.c. 6.773.569

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

9. INFORME ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORÍA.

Contiene: Personal, cumplimiento de obligaciones laborales, aportes parafiscales y control de equipos.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

9.1 CONTROL DE PERSONAL CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORIA.

La interventoría mes a mes verifico su propio cumplimiento respecto al personal propuesto en el contrato de consultoría No. 2622 de 2022; asÍ mismo verificó el cumplimiento del pago de la seguridad social de cada período para garantizar que todo el personal que labora en el proyecto por parte de la Interventoría tenga seguridad social.

9.1.1 CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO INICIALMENTE

No.	Nombre Personal profesional propuesto	Cargo	Dedicación	Soporte de cambio de personal
1	CAROL NAYIVE RIVEROS BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	50%	N.A
2	GILBERTO GALINDO ALVARADO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	75%	N.A
3	ALEXANDER GAITAN CUTA	INGENIERO AMBIENTAL	60%	N.A
4	NANCY CONSUELO ANGEL ALVAREZ	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	75%	N.A
5	PEDRO PABLO FONSECA CASTRO	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL	37.5%	N.A
6	DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO	INSPECTOR 1	100%	N.A
7	MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ	CONTADOR PUBLICO	10%	N.A
8	JESUS ANTONIO ALVAREZ ALFONSO	ABOGADO	5%	N.A
9	MAGALIS LARGO CATAÑO	SECRETARIA	100%	N.A

9.1.1 CONTROL DE PERSONAL PROFESIONAL ACTUAL

No.	Nombre Personal profesional propuesto	Nombre personal actual	Cargo	Dedicación	Estado	Fecha Retiro
1	CAROL NAYIVE RIVEROS BARRERA	CAROL NAYIVE RIVEROS BARRERA	DIRECTOR DE OBRA	50%	Activo	
2	GILBERTO GALINDO ALVARADO	GILBERTO GALINDO ALVARADO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	75%	Activo	
3	DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO	DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO	INSPECTOR 1	100%	Activo	
4	MAGALIS LARGO CATAÑO	MAGALIS LARGO CATAÑO	SECRETARIA	100%	Activo	

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE CONSULTORIA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

9.2 CONTROL DE EQUIPOS CONTRATO DE CONSULTORÍA 2622 DE 2022.

A continuacion se relaciona el equipo de la interventoría, para el cumplimiento en la ejecución del contrato de consultoría No. 2622 de 2022

TRANSPORTE

No.	TIPO	Cantidad	Referencia	Capacidad exigida	Estado	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Actuaciòn del interventor frente al incumplimiento
1	VEHICULO DE TRANSPORTE CAMIONETA >2000 CC	1	CAMIONETA PRADO CAMPERO	>2000 CC	BUENO	X		

TOPOGRAFÍA

No.	TIPO	cantidad	referencia	capacidad exigida	Estado	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Actuaciòn del interventor frente al incumplimiento
1	ESTACIÓN-NIVEL-TRÁNSITO-TOPÓGRAFO Y CADENERO	1			BUENO	X		

LABORATORIOS

No.	TIPO	cantidad	referencia	capacidad exigida	Estado	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Actuaciòn del interventor frente al incumplimiento
1	LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS	1				X		

OFICINA

No.	TIPO	cantidad	referencia	capacidad exigida	Estado	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Actuaciòn del interventor frente al incumplimiento
1	EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA (Cra 28 No. 17A-34)	1	Computadores, impresoras, scaner, fotocopiadora		BUENO	X		

9.3 NÓMINAS Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORIA.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

9. 3.1. APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORIA.

Se anexan los soportes de pago de seguridad social, del personal de Interventoría, durante el período 1 MARZO DE 2024 - 31 DE MARZO DE 2024. Se anexa el soporte de pago del presente período.

Nº	MES	FECHA PAGO	Nº PLANILLA	VR PAGADO
1	MARZO DE 2024	2/05/2024	7922800663	$ 586,500.00
2	MARZO DE 2024	15/04/2024	7922796437	$ 410,000.00
3	MARZO DE 2024	18/06/2024	7922807153	$ 912,600.00

REVISION A LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MANO DE OBRA AFECTADOS POR EL FACTOR PRESTACIONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2622 DE 2022 REALIZADA POR LA INTERVENTORIA SEGUN CONTRATO 2622-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

MARZO DE 2024							SALUD			PENSION			RIESGOS LABORALES - ARL		SENA		ICBF		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CEDULA	PERSONAL	CARGO	SUELDO MES PROPUESTO	DIAS	PLANILLA No	IBC	PROPUESTO 12,5%		PAGADO	PROPUESTO 16%		PAGADO	PROPUESTO	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO
							EMPLEADOR	TRABAJADOR		EMPLEADOR	TRABAJADOR									
							8.5%	4.0%		12.0%	4.0%	16.0%	6.96%		2%		3%		4%	4%
1,118,537,706	Largo Cataño Magalis	Secretaria	1,300,000.00	30	7922800663	1,300,000.00	110,500.00	52,000.00	162,500.00	156,000.00	52,000.00	208,000.00	90,480.00	90,500.00	26,000.00	26,000.00	39,000.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00
TOTALES			1,300,000.00			1,300,000.00	110,500.00	52,000.00	162,500.00	156,000.00	52,000.00	208,000.00	90,480.00	90,500.00	26,000.00	26,000.00	39,000.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00

GILBERTO GALINDO ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
MP. 011930214 CPITVC
C.c. 6.773.569

MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO
60658-T
C.c. 23.810.112

SEGURIDAD SOCIAL MARZO. INTERLOCUTORIA 2024.

9045

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 N 17-59	TELÉFONO:	6332721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - YOPAL 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7922800663	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			612567192

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 208.000	$ 3.000	$ 211.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 3.000**	**$ 211.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 162.500	$ 2.400	$ 0	$ 164.900
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 2.400**	**$ 0**	**$ 164.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 1.300	$ 0	$ 91.800
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 91.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 52.000	$ 800	$ 52.800
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 800**	**$ 52.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 39.000	$ 600	$ 39.600
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 26.000	$ 400	$ 26.400
SUBTOTALES:			**$ 65.000**	**$ 1.000**	**$ 66.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD					ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118537706	LARGO CATAÑO MAGALIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 586.500**

2024/06/13 9:00 AM USUARIO: SOI CC33625481

PÁGINA 1 DE 1

9046

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 N 17-59	TELÉFONO:	6332721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - YOPAL 1
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7922800663**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	abril
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	17				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		612567192	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 211.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 211.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 164.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 164.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 52.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 52.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 91.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 91.800**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 26.400
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 39.600
		SUBTOTAL:		**$ 66.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 578.000**
VALOR MORA:	**$ 8.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 586.500**

SIN MORA OK.

OK

9047

REVISION A LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MANO DE OBRA AFECTADOS POR EL FACTOR PRESTACIONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2622 DE 2022 REALIZADA POR LA INTERVENTORIA SEGUN CONTRATO 2622-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÈCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MARZO DE 2024							SALUD			PENSION			RIESGOS LABORALES -ARL		SENA		ICBF		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CEDULA	PERSONAL	CARGO	SUELDO MES PROPUESTO	DIAS	PLANILLA No	IBC	PROPUESTO 12,5% EMPLEADOR	TRABAJADOR	PAGADO	PROPUESTO 16% EMPLEADOR	TRABAJADOR	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO
							8.5%	4.0%		12.0%	4.0%	16.0%	6.96%		0%		0%		4%	4%
6,773,569	Gilberto Galindo Alvarado	Representante Legal	1,300,000.00	30	7922796437	1,300,000.00	110,500.00	52,000.00	162,500.00	156,000.00	52,000.00	208,000.00	90,480.00	31,700.00	-	-	-	-	52,000.00	7,800.00
TOTALES			**1,300,000.00**			**1,300,000.00**	**110,500.00**	**52,000.00**	**162,500.00**	**156,000.00**	**52,000.00**	**208,000.00**	**90,480.00**	**31,700.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52,000.00**	**7,800.00**

GILBERTO GALINDO ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
MP: 011930214 CPIT VC
C.c. 6,773,569

MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO
90656-T
C.c. 23,810,112

9048

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 Nº 17-69	TELÉFONO:	6347018
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7922796437			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	673611073

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 7.800	$ 0	$ 7.800
SUBTOTALES:			**$ 7.800**	**$ 0**	**$ 7.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 6773569	GALINDO ALVARADO GILBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 6773569	$ 31.700	30	$ 1.300.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 410.000**

9049

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 Nº 17-59	TELÉFONO:	6247018
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7922796437**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		573511073	

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 7.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 31.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 31.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 410.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 410.000**

OK.

2

9050

REVISION A LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MANO DE OBRA AFECTADOS POR EL FACTOR PRESTACIONAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2622 DE 2022 REALIZADA POR LA INTERVENTORIA SEGUN CONTRATO 2622-2022 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MARZO DE 2024							SALUD			PENSION			RIESGOS LABORALES -ARL		SENA		ICBF		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CEDULA	PERSONAL	CARGO	SUELDO MES PROPUESTO	DIAS	PLANILLA No	IBC	PROPUESTO 12,5%		PAGADO	PROPUESTO 16%		PAGADO	PROPUESTO	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO	PROPUESTO	PAGADO
							EMPLEADOR	TRABAJADOR		EMPLEADOR	TRABAJADOR									
							8.5%	4.0%		12.0%	4.0%	16.0%	5.96%		2%		3%		4%	4%
1,052,407,847	David Fonseca Prieto	INSPECTOR 1	1.300.000.00	30	7922807153	1,300,000.00	110,500.00	52,000.00	162,500.00	156,000.00	52,000.00	208,000.00	90,480.00	90,500.00	26,000.00	26,000.00	39,000.00	39,000.00	52,000.00	52,000.00
52,390,351	Carol Nayibe Riveros Barrera	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1,300,000.00	15	7922807153	650,000.00	55,250.00	26,000.00	81,300.00	78,000.00	26,000.00	104,000.00	45,240.00	45,300.00	13,000.00	13,000.00	19,500.00	19,500.00	26,000.00	26,000.00
TOTALES			**1,300,000.00**			**1,950,000.00**	**165,750.00**	**78,000.00**	**243,800.00**	**234,000.00**	**78,000.00**	**312,000.00**	**135,720.00**	**135,800.00**	**39,000.00**	**39,000.00**	**58,500.00**	**58,500.00**	**78,000.00**	**78,000.00**

GILBERTO GALINDO ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
MP. 611930214 CPITVC
C.c. 6,773,569

MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO
60656-T
C.c. 23,810,112

9051

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 N 17-59	TELÉFONO:	8332721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	020 - YOPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	79228071 83			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			84				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			712123579

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300	$ 0	$ 312.000	$ 16.300	$ 328.300
SUBTOTALES:										**$ 312.000**	**$ 16.300**	**$ 328.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 8.500	$ 0	$ 162.500	$ 8.500	$ 0	$ 171.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 81.300	$ 4.300	$ 0	$ 85.600
SUBTOTALES:													**$ 243.800**	**$ 12.800**	**$ 0**	**$ 256.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 135.800	$ 135.800	$ 7.100	$ 0	$ 142.900
SUBTOTALES:									**$ 135.800**	**$ 7.100**	**$ 0**	**$ 142.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	$ 78.000	$ 4.100	$ 82.100
SUBTOTALES:			**$ 78.000**	**$ 4.100**	**$ 82.100**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 58.500	$ 3.100	$ 61.600
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 39.000	$ 2.100	$ 41.100
SUBTOTALES:			**$ 97.500**	**$ 5.200**	**$ 102.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1052407847	FONSECA PRIETO DAVID FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
2	CC 52390351	RIVEROS BARRERA CAROL NAYIBE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	01	15																230301-PORVENIR	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS017-FAMISANAR	15	$ 650.000	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 650.000		$ 45.300	15	$ 650.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 912.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6773569
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GILBERTO GALINDO ALVARADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 N 17-59	TELÉFONO:	6332721
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	020 - YOPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7922807153**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		64			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		712123579

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 328.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 328.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 85.600
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 171.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 256.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
844003392	CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	$ 82.100
		SUBTOTAL:	2	**$ 82.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 142.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 142.900**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 41.100
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 61.600
		SUBTOTAL:		**$ 102.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 867.100**
VALOR MORA:	**$ 45.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 912.600**

9.3.2 NÓMINA CONTRATO DE CONSULTORÍA 2622 DE 2022 - INTERVENTORÍA.

9054

GILBERTO GALINDO ALVARADO	NIT 6.773.569-7	NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS	PERIDO DE PAGO: AÑO 2024	1-30 MARZO DE 2024

R/L GILBERTO GALINDO C.C. 6773569
CONTRATO 2622 DE 2022

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	SALARIO BASE COTIZACION	SALARIO BASICO	FECHA INGRESO Y RETIRO	DIAS LAB.	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR	FIRMA	NOVEDAD
							BASICO	EXTRAS Y REC.	COMISIONES	AUX. TRANSP.		SALUD	PENSION	FONDO SOLIDAR	RTE. FUENTE	OTROS				
1	CAROL NAYIBE RIVEROS BARRERA C.C 52.390.351 DE BOGOTÁ	INGENIERA DIRECTORA	1.300.000	43.333	1/03/2024 15/03/2024	15	650.000			81.000	731.000	26.000	26.000				52.000	679.000		ING-RET
2	GILBERTO GALINDO ALVARADO C.C 6.773.569 DE TUNJA	INGENIERO RESIDENTE	1.300.000	43.333		30	1.300.000			162.000	1.462.000	52.000	52.000				104.000	1.358.000		
4	DAVID FERNANDO FONSECA PRIETO C.C 1.052.407.847 DE DUITAMA	INSPECTOR	1.300.000	43.333		30	1.300.000			162.000	1.462.000	52.000	52.000				104.000	1.358.000		
5	MAGALIS LARGO CATAÑO C.C 1.118.537.706 DE YOPAL	SECRETARIA	1.300.000	43.333		30	1.300.000			162.000	1.462.000	52.000	52.000				104.000	1.358.000	Magalis Largo	
	TOTALES			173.333			4.550.000			567.000	5.117.000	182.000	182.000	-	-	-	364.000	4.753.000		

DEVENGADO							DEDUCIDO	
BASICO			4.550.000				SALUD	182.000
EXTRAS Y REC.			-				PENSIONES	182.000
COMISIONES			-				FONDO SOL.	-
AUX. TRANSP.			567.000				RTE FTE	-
							OTROS	-
TOTAL DEVENGADO			5.117.000				TOTAL DEDUCIDO	364.000
NETO PAGADO						4.753.000,00		

Autorizó:

APORTES PARAFISCALES	%	VALOR	PROVISIONES	%	
Salud	12	386.750	Cesantías	1/12	426.416,67
Pensión 75%	16	546.000	Int/cesantías	1%	51.170,00
Riesgos profesionales	6,96	316.680	Prima de servicios	1/12	426.416,67
SENA	2	91.000	Vacaciones	1/24	189.583,33
Comcaja	4	182.000			
ICBF	3	136.500			
SUBTOTAL		1.658.930	SUBTOTAL		$ 1.093.586,67

TOTAL $ 2.022.930

GILBERTO GALINDO ALVARADO
C.C 6.773.569 DE TUNJA

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

10. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACCIONES REALIZADAS
i. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma que el departamento intervenga oportunamente frente a las solicitudes presentadas.	Esta interventoría ha notificado mediante oficios, a la supervisión "Gobernación de Casanare" la solicitud de prórroga N°5 al contrato de obra 2627 de 2022; solicitud de prórroga N°6 al contrato de consultoría 2622 de 2022. De igual manera, se informo la entrega del acta parcial N°5 del contrato de obra 2627 de 2022; entrega de informes mensuales N°8, N°9 y N°10 de interventoría. En el item 3.7 " Correspondencias" se evidencia los soportes de lo mencionado.
ii. Verificar que existan los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual.	Esta interventoria ha verificado y corroborado que el contratista de obra cuenta con los permisos y autorizaciones "PMT" para la ejecución de las actividades de obra programadas. Para el presente periodo se realizaron la actualización de la vigencia del plan de manejo de transito PMT de acuerdo a resolución 04686 del 18 de marzo de 2024, con fecha de terminación el dia 7 de mayo de 2024.
iii. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato.	En el presente periodo, se realizaron reuniones en campo, donde se solucionaron aspectos técnicos relacionados con la ejecución del contrato. Como se evidencia en el anexo 13.2, copia bitacora del periodo en mención.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

10. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

iv. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios con la periocidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control respecto a las obligaciones a su cargo.	la interventoría ah reportado mediante informes semanales e informe mensual, la ejecución y avance de las actividades del contrato de obra 2627 de 2022, de acuerdo a la programación de obra. Se adjunta el informe N°12 correspondiente al mes de marzo de 2024.
v. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.	La interventoría a realizadó seguimiento a cada una de las acciones realizadas por el contratista de obra, para brindar seguridad y bienestar de los trabajadores en los frentes de trabajo. Asi mismo ah verificado el cumplimiento del manejo de los residuos generados, producto de la ejecución de las actividades, asi mitigando el impacto ambiental. Estas acciones realizadas, se pueden evidenciar en el item 6 "informe del componente ambiental" anexo al presente informe mensual N°12.
FUNCIONES TÉCNICAS	
FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA	**ACCIONES REALIZADAS**
i. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estimen necesarias para suscribir el acta de iniciación y las de ejecución del contrato.	En este periodo, la interventoría realizó seguimiento a cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, acorde a los diseños y especificaciones contempladas en el contrato de obra 2627 de 2022. Esta interventoria aprovó y avaló los sitios intervenidos donde se efectuaron la ejecución de las actividades como se evidencia en el item 4.1 " descripción de actividades" anexo al presente informe.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

10. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

ii. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y que requiera el contrato.	la inteventoría ha verificado en los frentes de trabajo la entrega de dotaciones y puntos de hidratación por parte del contratsita de obra al personal contratado. De igual forma, se ah hecho seguimiento al personal presente en obra de acuerdo a lo solicitado en el contrato, "item 3.1 y 3.1.2". El control del personal se realizó mediante registro de asistencia y capacitaciones diarias echas por el contratista de obra. Estas acciones anteriormente mencionadas, estan en el contenido del componente ambiental del presente periodo.
iii. Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que haya lugar.	Esta interventoría realizó seguimiento riguroso al porcentaje de avence de ejecución de acuerdo a la programación de la prórroga N°5 del contrato de obra 2627 de 2022 , lo cual se le ah notificacdo al contratista el atraso por medio de correspondencia.
iv. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos.	La interventoría a hecho control de calidad de las obras y materiales utilizados en la ejecución de las actividades, en los cuales, se ha verificado y corroborado que el contratista cumpla con las especificaciones, normas vigentes y fichas técnicas de las pinturas utilizadas para la demarcación vial.
v. Abrir y llevar si a ello hay lugar el libro de bitácora para registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato.	Conjuntamente la interventoría y contratista de obra, se dejó plasmado las modificaciones y acciones realizadas en la obra diariamente. Item 13.2 copia libro de Bitacora.
vi. Velar por el cumplimiento preventivo y correctivo en materia de seguridad con la adecuada señalización de las vias, de acuerdo, a la reglamentación vigente.	La interventoria a hecho seguimiento y verificado en los frentes de trabajo, el correcto funcionamiento, delimitación de zonas de trabajo e isntalación de señalización acorde al plan de manejo de transito "PMT", aprovado por la secretaria de movilidad de Yopal Casanare.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

10. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

FUNCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACCIONES REALIZADAS
Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.	La interventoría ha dado tramite a las solicitudes presentadas por parte del contratista de obra. De igual manera, en el item 1.3 del presente informe, se evidencia el registro cronológico de los pagos efectuados a la fecha.
Exigir al contratista el pago de estampilla Pro desarrollo Departamental, Estampilla Pro Cultura y Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor de que trata la ordenanza No 016 de 2017. ademas exigir el pago del Gravemen Especial de que trata el parágrafo 3 del articulo 6 de la ley 1106 de 2006, adicionado por el articulo 39 de la ley 1430 de 2010.	La interventoria a verificado el cumplimiento del pago de las estampillas por parte del contratista; exigidas por la supervisión "Gobernación de Casanare". En el item 5.2 "información presupuestal" se evidencia la distribución efectuada del pago de estampillas.
El dinero del anticipo sólo será invertido de acuerdo al programa de inversión de anticipo debidamente aprobado por la interventoría, quien ademas debe aprobar las cuentas de inversión y la relación de gastos.	La interventoría vigiló y controló los recursos destinados al anticipo de obra, ademas, realizó seguimiento del buen manejo de inversión del anticipo por parte del contratista, acorde a los parametros y pautas exigidas por la supervisión. Dicha información se evidencia en el informe del buen manejo del anticipo.
Los rendimientos obtenidos del anticipo se deben liquidar a favor del departamento de Casanare.	Esta interventoría ha verificado y confirmado los rendimientos del anticipo se han liquidado a favor del Departamento de Casanare, como se evidencia en la copia de la consignación del reintegro de los rendimientos financieros, adjunta en el informe del buen manejo del anticipo.
El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos básicos para el desarrollo del proyecto que representen e mayor porcentaje del valor del contrato.	La interventoría ha vigilado que el contratista de obra destinó los recursos del anticipo exclusivamente para el desarrollo del proyecto. En el formato FO-AB-38, V.02 25/04/2018, adjunto al informe del buen manejo del anticipo, se verifica los soportes de dicha inversión.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

10. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

FUNCIONES AMBIENTALES

FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA	ACCIONES REALIZADAS
i. Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condiciones, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental.	Esta interventoría ha realizado seguimiento a cada una de las actividades de obra ejecutadas por el contartista, donde se verificó la aplicación de las guias ambientales exigidas por la normatividad vigente. Estas acciones estan soportadas y contempladas en el informe ambiental " item 6" del informe N°12 del presente periodo, donde justifica cada acción y recomendacion realizada en aras de la mitigación de los impactos ambientales producto de la ejecución de las actividades de obra.
ii. Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación implantadas.	Durante cada periodo esta interventoria presenta un informe mensual, en el cual se estipula cada una de las acciones, medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales producto de la ejecucion de la actividades de obra. En el item 6 del presente informe N°12, esta descrito lo anteriormente mencionado.
iii. Verificar los permisos ambientales en las canteras, plantas, concreteras y escombreras que el contratista utilizara en la etapa de construcción.	Dentro de las funciones de esta interventoria, afirma y ratifica que el contratista de obra cuenta con todos los permisos ambientales exigidos tanto de los provederoes de las materiales utilizados en el proyecto como de las empresas prestadoras de servicios de recolección de residuos. dichos permisos y soportes estan adjuntos en el informe del componente ambiental del presente informe.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

10. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

FUNCIONES JURÍDICAS

i. Verificación de la vigencia de las garantías exigidas en la CLAUSULA 18 del contrato de obra 2627 de 2022	En cumplimienton de esta función, esta interventoria verificó que las polizas exigidas contractualmente estan vigentes. Item 2.1 control de polizas esta adjunto los soportes de lo anteriromente mecionado.
ii. Emitir concepto sobre la vialidad del suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.	En el presente periodo, se dio tramite a la solicitud de prórroga N°5 al contrato de obra 2627 de 2022; solicitud de prórroga N°6 al contrato de consultoría 2622 de 2022. De igual manera, sedio tramite al acta parcial N°5 del contrato de obra 2627 de 2022.
iii. Se verifica y se certifica que el contratista cumple con la obligaciones laborales y aportes de parafiscales exigidos y generados en el contrato de obra, según la Ley 789 de 2002 y la Ley 797 de 2003 y sus decretos complementarios.	Durante el presente periodo, esta interventoría revisó; y manifiesta que el contratista de obra, ha cumplido con todos los pagos relacionados a las obligaciones laborales y aportes de parafiscales del personal presente en los frentes de trabajo. Item 3.3 esta adjunto los soportes de pagos de planillas de seguridad social.

9061

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	5 DD	4 MM	2024 AA

10.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

TOPOGRAFIA.

- Se realizó la verificación y chequeo de las pendientes longitudinales y transversales de las calzadas intervenidas. Asi mismo se verificó los niveles definitivos para la nivelación de pozos de inspección sobre la calle 24, calle 10, calle 9 y carrera 18 "caño seco", acorde a la cota final de la rasante " capa de rodadura".

ESTUDIOS Y DISEÑOS:

La interventoria, analizó las solicitudes realizadas por el contratista de obra, entre las cuales, se resalta la aprobación de la de prórroga N°5 al contrato de obra 2627 de 2022; y del acta parcial N°5 del contrato de obra 2627 de 2022. Durante este periodo no se realizó ninguna modificación a diseños que infieran en el desarrollo del contrato de obra.

INFORMES

Durante este periodo se ha presentado informes de: solicitud de plazo adicional prórroga N°5 al contrato de obra 2627 de 2022, solicitud de prórroga N°6 al contrato de consultoria 2622 de 2022. De igual manera, se presento el informe del acta parcial N°5 del contrato de obra 2627 de 2022 e informe mensual N°12 correspondiente al mes de marzo de 2024. Es de mencionar, la interventoría ha informado de manera periódica a la entidad contratante a cerca del desarrollo de las obras, en los aspectos Juridicos, técnicos, contables, Administrativos, financieros y ambientales.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.

- Ah coordinado las labores mismas de la consultoría y el cumplimiento de sus compromisos.
- Ah comunicado permanentemente a la supervición sobre el estado de ejecución del contrato de obra 2627 de 2022.
- Atendió y solucionó dentro de los alcances y funciones de la consultoría las sugerencias,reclamaciones y consultas hechas por la entidad.
- Realizó seguimiento de cada una de las acciones ejecutadas por el contratista de obra, durante la ejecución de las actividades de señalización horizontal y nivelación de pozos de inspección.
- Vigiló y controló el avance del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades estipulado.
- Realizó control y seguimientos de los recursos destinados a la ejecución del proyecto.
- Avaló y aprobo la solicitud de prórroga N°5 del contrato de obra 2627 de 2022, solicitud de prórroga N°6 del contrato de consultoría 2622 de 2022 y aprobó acta parcial N°5 del contrato de obra 2627 de 2022.

RESIDENTES DE INTERVENTORIA

Garantiza el óptimo desarrollo del objeto contractual estableciendo los requisitos y reglas de ejecución de la obra en cumplimiento de los lineamientos descritos por la empresa contratante.

Dentro de las actividades del residente de interventoría se destacan:

✓ El residente de interventoría efectúo seguimiento de las actividades constructivas ejecutadas, realizó cuantificación de cantidades de obra ejecutadas y reportadas durante el presente periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo de 2024.

✓ Realizó seguimiento y control de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras, entre ello verificó que el contratista de obra cumpliera con las especificaciones, normas y fichas técnicas de las pinturas utilizadas en la señalización horizontal.

✓ Elaboró reporte diario de las actividades ejecutas por el contratista de obra, tales como señalización horizontal y nivelación de pozos de inspección.

✓ Realizó seguimiento riguroso en los procesos constructivos de las actividades de obra, acorde a las especificaciones técnicas y diseños.

✓ Elaboró informes semanales pertinentes y requeridos, asi mismo proyecta los contenidos del informe mensual N°12.

✓ Elaboró reporte fotográfico de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista de obra en el presente periodo.

✓ Realizó control y seguimiento del avance de ejecución, de acuerdo, a la programación de obra.

✓ Reporto los posibles atrasos presentados en la ejecución de actividades programadas durante el periodo.

PROFESIONAL DE APOYO

✓ El profesional de apoyo cumple las funciones de inspección , control y verificación de todos los procesos constructivos que se llevan a cabo en la ejecución de las obras, en las diferentes areas y actividades que se presenten.

✓ Verificó la superficie que estuviera libre de particulas y humedades para la ejecución de la actividad de señalización horizontal, inspecciono la aplicación de microesferas sobre la pintura instalada.

✓ Verificó e inspeccionó la señalización implementada en la delimitación de zonas de trabajo.

✓ verificó la localización de los sitios intervenidos en la aplicación de la señalización horizontal acorde a los planos aprobados por la secretaria de movilidad de Yopal Casanare.

✓ Inspecciono la calidad de los materiales en obra, y verificó las fichas técnicas de cada uno de los tambores de pintura utilizados en la ejecución de la actividad.

✓ realizó seguimiento a los procesos constructivos,con fines que permitan una excelente ejecución y calidad de la obra.

ESPECIALISTAS

AMBIENTAL.

Realizó actividades de control, vigilancia y seguimiento de las normas generales de protección ambiental, y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, en todas las actividades realizadas por el contratista, como cortes en carpeta asfaltica, demolición de pavimento asfáltico, imprimación, reciclado de pavimento, movilización de maquinaria y equipo.

Informo y reporto acerca del manejo y control de todos los aspectos contemplados en el plan de manejo ambiental, para cada una de las actividades desarrolladas por el contratista. Lo anteriormente mencionado esta adjunto en el informe mensual N°12 en el ítem 6 " informe ambiental".

PAVIMENTOS.

Realizó seguimiento y control de los trabajos realizados en las actividades de señalización horizontal. Ademas, corroboro el cumplimiento de cada unos de los parametros exigidos por las normas y Especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

10.2 PRESUPUESTO CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORÍA.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

10.2.1. PRESUPUESTO CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORÍA.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONDICIONES CONTRACTUALES


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR
1.	**ETAPA PRECONSTRUCCIÓN**		**$ 16,474,615.00**
1.1	Revisión y verificacion en campo de los diseños	UND	$ 7,292,099.33
1.2	Cumplimiento requerimientos ambientales	UND	$ 2,479,180.70
1.3	Revisión predial	UND	$ 3,532,557.87
1.4	Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos	UND	$ 1,517,990.35
1.5	Permisos y/o Disponibilidad fuentes de materiales	UND	$ 1,652,787.13
2.	**ETAPA CONSTRUCTIVA**		**$ 232,742,914.00**
2.1	Interventoría Técnica	UND	$ 69,823,489.76
2.2	Interventoría Ambiental	UND	$ 69,823,489.76
2.3	Interventoría Administrativa	UND	$ 69,823,489.76
2.4	Interventoría Financiera	UND	$ 9,299,966.81
2.5	Interventoría Contable	UND	$ 9,183,966.81
2.6	Interventoría Jurídica	UND	$ 4,788,510.74
	COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS		**$ 249,217,529.00**
	IVA		**$ 47,351,331.00**
	COSTO FINAL AJUSTADO AL PESO		**$ 296,568,860.00**

11 . INFORME FINANCIERO - CONTABLE DEL CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORÍA.

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

11.1 GRAFICOS AVANCE GENERAL CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORÌA.

GRÁFICO - % CONTRATADO VS % EJECUTADO

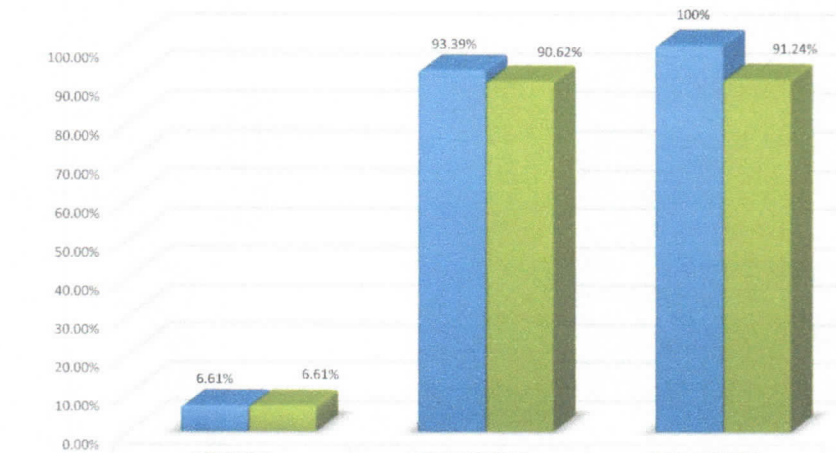

	ACTIVIDADES ETAPA PRECONSTRUCCIÓN	ACTIVIDADES ETAPA CONSTRUCTIVA	TOTAL EJECUTADO
CONTRATADO	6.61%	93.39%	100%
EJECUTADO	6.61%	90.62%	91.24%

GRÁFICO - % CONTRATADO VS % EJECUTADO




	ACTIVIDADES ETAPA PRECONSTRUCCIÓN	ACTIVIDADES ETAPA CONSTRUCTIVA	TOTAL EJECUTADO
CONTRATADO	$ 19,604,792.00	$ 276,964,068.00	$ 296,568,860.00
EJECUTADO	$ 19,604,792.00	$ 250,984,838.00	$ 270,589,630.00

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

11.1 GRAFICOS AVANCE GENERAL CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORÍA.

Acorde con el avance de las obras ejecutadas el contrato de interventoría lleva una ejecución del 91.24 %, que en terminos financieros corresponde a la suma de $ 270,589,630.00 M/Cte, quedando por ejecutar el 8.76%, correspondiente a la suma de $ 25,979,230.00 M/CTE.

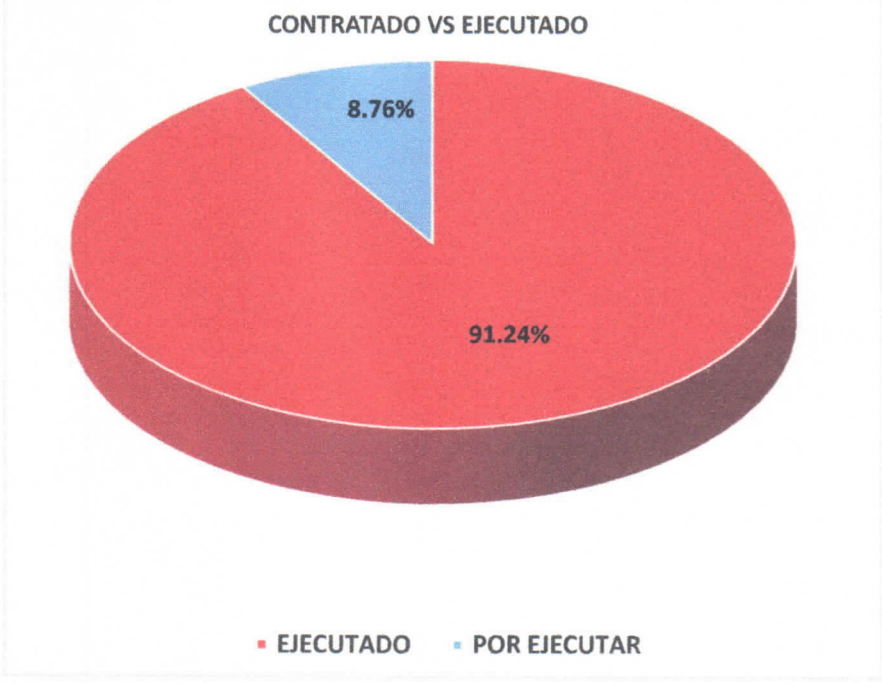

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

11.2 INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORÍA.

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10 Y 24 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1.	**ETAPA PRECONSTRUCCIÓN**		**$ 16,474,615.00**		**$ 16,474,615.38**
1.1	Revisión y verificacion en campo de los diseños	UND	$ 7,292,099.33	1.0	$ 7,292,099.33
1.2	Cumplimiento requerimientos ambientales	UND	$ 2,479,180.70	1.0	$ 2,479,180.70
1.3	Revisión predial	UND	$ 3,532,557.87	1.0	$ 3,532,557.87
1.4	Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos	UND	$ 1,517,990.35	1.0	$ 1,517,990.35
1.5	Permisos y/o Disponibilidad fuentes de materiales	UND	$ 1,652,787.13	1.0	$ 1,652,787.13
2.	**ETAPA CONSTRUCTIVA**		**$ 232,742,914.00**		**$ 210,911,628.34**
2.1	Interventoría Técnica	UND	$ 69,823,489.76	90.62%	$ 63,274,046.42
2.2	Interventoría Ambiental	UND	$ 69,823,489.76	90.62%	$ 63,274,046.42
2.3	Interventoría Administrativa	UND	$ 69,823,489.76	90.62%	$ 63,274,046.42
2.4	Interventoría Financiera	UND	$ 9,299,966.81	90.62%	$ 8,427,629.92
2.5	Interventoría Contable	UND	$ 9,183,966.81	90.62%	$ 8,322,510.72
2.6	Interventoría Jurídica	UND	$ 4,788,510.74	90.62%	$ 4,339,348.43
	COSTO PERSONAL + COSTOS DIRECTOS				**$ 227,386,243.72**
	IVA				**$ 43,203,386.00**
	COSTO FINAL AJUSTADO AL PESO				**$ 270,589,630**

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
		5	4	2024
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	DD	MM	AA

11.3. INFORMACION PRESUPUESTAL CONTRATO 2622 DE 2022 - INTERVENTORÍA.

CONCEPTO	CONTRATO INICIAL	
Certificado de disponibilidad presupuestal	No:	2203976
	Fecha :	23/11/2022
	Valor:	$ 109,730,478.20
Certificado de disponibilidad presupuestal Vigencias Futuras	No:	2300032
	Fecha :	4/01/2023
	Valor:	$ 186,838,381.80
Registro Presupuestal	Registro	2202622
	Fecha	29/12/2022
	Valor	$ 109,730,478.20
Registro Presupuestal Vigendias Futuras	Registro	2302622
	Fecha	4/01/2023
	Valor	$ 186,838,381.80

INFORMACION RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y DERECHOS.

CONCEPTO	CONTRATO INICIAL	
Estampilla Adulto Mayor vigente código 410576002	No:	23000198
	Fecha :	16/01/2023
	Valor:	$ 7,476,500.00
Estampilla prodeporte vigente código 131101005	No:	23000015
	Fecha :	16/01/2023
	Valor:	$ 6,230,438.00
Estampilla prounitropico vigente código 410576005	No:	23000016
	Fecha :	16/01/2023
	Valor:	$ 3,738,263.00
Estampilla prodesarrollo vigente código 410576003	No:	23000196
	Fecha :	16/01/2023
	Valor:	$ 2,492,200.00
Estampilla procultura vigente código 410576001	No:	23000195
	Fecha :	16/01/2023
	Valor:	$ 2,492,200.00

	INFORME MENSUAL No. 12	CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2622 DE 2022		
	1 DE MARZO DE 2024 a 31 DE MARZO DE 2024	5	4	2024
		DD	MM	AA

12. CONCLUSIONES

1.

AVANCE DE LAS OBRAS : El presente informe No. 12 corresponde al mes de Marzo de 2024, el cual, se relaciona el seguimiento y control echo por esta interventoria al contrato de obra 2627 de 2022, donde presenta un avance de obra acumulado del 90.62%, que corresponde a $ 6,808,992,570.99 pesos M/Cte, quedando pendiente por ejecutar el el 9.38% de los recursos actuales, el cual corresponde a $ 704,827,811.01 pesos M/Cte. Para el presente periodo, el contratista de obra ejecutó el 0.62%, que corresponde a 46,404,098,92 M/Cte; derivado de actividades de: Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas en la carrera 18 "caño seco" calzada bajando entre calle 26 y calle 29; Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros) en la calle 24 calzada derecha entre carrera 5 y carrera 50, calle 10, ambas calzadas entre la transversal 18 hasta la diagonal 9 y calle 9 entre transversal 18 y diagonal 9, ambas calzadas.

De igual forma, para el presente informe mensual No. 12 el contrato de consultoría 2622 de 2022, presenta un avance ejecutado acomulado del 91.24% que en terminos financieros corresponde a la suma $ 270,589,630.00 M/Cte, quedando por ejecutar el 8.76%, correspondiente a la suma de $ 25,979,230.00 M/CTE., del valor total del contrato.

2

PLAZO DE EJECUCIÓN : De acuerdo a la aprobación de la prórroga N°5 por parte de la supervisón, el día 7 de marzo de 2024, el contrato de obra publica No. 2627 de 2022, tiene como fecha de terminación el día 7 de mayo de 2024.

Así mismo para el contrato de consultoría 2622 de 2022, tiene como fecha de terminación actual el día 15 de mayo de 2024, de acuerdo a la prorroga No. 6 aprobada el dia 15/03/2024.

3

INCONVENIENTES: En el presente periodo, comprendido entre el 1 de marzo al 31 de marzo de 2024, se evidencia un atraso de 3.29% en la ejecución de la obra, debido a los bajos rendiemientos en la ejecución de actividades programadas como la demolición de pavimento en concreto rígido e intalación de losas de pavimento en concreto MR 41 Kg/cm2, las cuales, no se han iniciado a realizar por parte del contratista. Ademas faltan por ejecutar actividades tales como intalación de sardinel prefabricado, nivelación de pozos, lineas de demarcación y marcas viales. Estos inconvenientes se han venido manifestando por parte de esta interventoría mediante comunicados al contratista de obra.

4

LA INTERVENTORÍA ,ha dado lugar al cumplimiento de todas sus obligaciones y funciones de acuerdo con el desarrollo de actividades realizadas por parte del contratista de obra, llevando seguimiento y riguroso control de cada una de las actividades ejecutadas.

GILBERTO GALINDO ALVARADO
R/L. CONTRATO DE CONSULTORÍA
T.P. 01193-0214 CPITVC
C.c. 6.773.569

13. ANEXOS

13.1. COPIA BITÁCORA DE OBRA.

9072

Viernes 01/03/2024

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografia
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Minicargador
- Volqueta
- Camioneta estacas
- Herramienta menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor
- Esp. Pavimentos

Actividades:

- Implementación PMT y PAGA
- Se realiza demarcación de marcas viales (flechas sencillas y flechas dobles), en la calle 9 calzada derecha entre K10+000 + K10+126.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Sabado 02/03/2024

Clima | Mañana | Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografia
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Minicargador
- Volqueta
- Camioneta estacas
- Herramienta menor
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor
- Esp. Pavimentos

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles), calle 9 calzada derecha entre Rot 126 y Rot 254.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

9074

Domingo 03/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	- Cadenero
	- Director	- Control Vial
	- Residente	- Ayudante
	- Profesional Siso	- Conductor
	- Profesional Apoyo	- Esp. Pavimentos
	- Inspector	
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	
	- Minicargador	
	- Volqueta	
	- Camioneta estacas	
	- Herramienta menor	

Actividades

- Descanso fin de semana

Residente de Obra

Residente de Interventoria

NKB

9075

Lunes 04/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	- Cadenero
	- Director	- Control Vial
	- Residente	- Ayudante
	- Profesional Siso	- Conductor
	- Profesional Apoyo	- Esp. Pavimentos
	- Inspector	
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	
	- Minicargador	
	- Volqueta	
	- Camioneta Estacas	
	- Herramienta menor	

Actividades

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en la calle 9 calzada derecha entre K10+254 y K10+390

Residente de Obra

Residente de Interventoria

9076

Martes 05/03/2024

Clima

Mañana

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta estacas
- Mini cargador

Tarde

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor
- Esp. Pavimentos

Actividades

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en la calle y calzada derecha entre K0+380 y K0+509.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NKA

9077

Lunes 04/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	- Cadenero
	- Director	- Control Vial
	- Residente	- Ayudante
	- Profesional Siso	- Conductor
	- Profesional Apoyo	- Esp. Pavimentos
	- Inspector	
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	
	- Minicargador	
	- Volqueta	
	- Camioneta Estacas	
	- Herramienta menor	

Actividades

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) a la calle y calzada derecha entre K0+254 y K0+300

Residente de Obra

Residente de Interventoria

9078

Martes 05/03/2024

Clima

Mañana

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta estacas
- Mini cargador

Tarde

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor
- Esp. Pavimentos

Actividades

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en la calle y calzada derecha entre K0+380 y K0+507.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NKB

9079

Miercoles 06/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	
	- Director	- Cadenero
	- Residente	- Control Vial
	- Profesional Sso	- Ayudante
	- Profesional Apoyo	- Conductor
	- Inspector	- Esp. Pavimentos
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	
	- Herramienta menor	
	- Volqueta	
	- Camioneta Estacas	
	- Minicargador	

Actividades

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y Flechas dobles) en la calle 9 calzada derecha entre Ico1507 y Ico1634.

Residente del Obra

Residente de Interventoría

9080

Jueves 07/03/2024

Clima

Mañana

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional SISO
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyecto
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta Estacas
- Minicargador

Tarde

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor
- Esp. Pavimentos

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y Flechas dobles) en la calle y calzada derecha entre K0+639 y K0+760.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NKA

Viernes 08/03/2024

Clima

Mañana

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional SISO
- Profesional Apoyo
- Inspector, Topografo
- Esp Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta Estacas
- Mancargadora

Tarde

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor
- Esp. Pavimentos

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y Flechas dobles) en la calle y calzada izquierda entre el K0+000 y K0+780

Residente de Obra

Residente de Interventoría

9082

Sabado 09/03/2024

Clima

Mañana

Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta Estacas
- Minicargador

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor
- Esp. Pavimentos

Actividad:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en la calle y calzada izquierda entre el K0+730 y K0+362.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Domingo 10/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	
	- Director	- Cadenero
	- Residente	- Control Vial
	- Profesional Siso	- Ayudante
	- Profesional Apoyo	- Conductor
	- Inspector	- Esp Pavimentos
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	
	- Herramienta menor	
	- Volqueta	
	- Camioneta cisterna	
	- Minicargador	
	Actividades	
	- Descanso Fin de Semana	

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Lunes 11/03/2024

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta estacas
- Mincargador
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor
- Esp. Pavimentos

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en la calle 9 calzada izquierda entre Km 362 y Km 540

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NKA

Martes 12/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	
	- Director	- Cadenero
	- Residente	- Control Vial
	- Profesional Siso	- Ayudante
	- Profesional Apoyo	- Conductor
	- Inspector	- Esp. Pavimentos
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	
	- Herramienta menor	
	- Volqueta	
	- Camioneta Estacas	
	- Minicargador	

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en la calle 9 calzada izquierda entre el K01+540 y K01+722,43

Residente de Obra

Residente de Interventoría

9086

Miercoles 13/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	- Cadenero
	- Director	- Control Vial
	- Residente	- Ayudante
	- Profesional Siso	- Conductor
	- Profesional Apoyo	- Esp. Pavimentos
	- Inspector	
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	
	- Herramienta menor	
	- Vigueta	
	- Camioneta Estacas	
	- Minicargador	

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Se realiza demarcación de marcas viales (flechas sencillas y flechas dobles) en la calle 10 calzada derecha entre Icotow y Kot 486
- Actividad de nivelación de Pozo de inspección y reposición de tapa basculante en la calle 10.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

9087

Jueves 14/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	
	- Director	- Cadenero
	- Residente	- Control Vial
	- Profesional Siso	- Ayudante
	- Profesional Apoyo	- Conductor
	- Inspector	- Esp. Pavimentos
	- Topografo	
	- Esp Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	
	- Herramienta menor	
	- Volqueta	
	- Camioneta Estacas	
	- Minicargador	

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en calle 70 calzada derecha entre Cra 48 y Cra 25
- Actividad de nivelación y reposición de tapa basculante en la calle 70.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

4088

Viernes 15/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	
	- Director	- Cadenero
	- Residente	- Control Vial
	- Profesional Sso	- Ayudante
	- Profesional Apoyo	- Conductor
	- Inspector	- Esp. Pavimentos
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	
	- Herramienta menor	
	- Volqueta	
	- Camioneta estacas	
	- Minicargador	

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Se realiza demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en la calle 70 calzada izquierda entre K0+000 y K0+445

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NKA

9089

Sabado 16/03/2024

Clima

Mañana

Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional de Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta estacas
- Minicargador
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor
- Esp. Pavimentos

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en la calle 70 calzada izquierda entre Krot 445 y KM7072.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

NKB

9090

Domingo 17/03/2024

Clima

Mañana

Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional de Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta Estacas
- Minicargador
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades

- Descanso Fin de Semana.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

NKB

Lunes 18/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	
	- Director	- Cadenero
	- Residente	- Control Vial
	- Profesional Siso	- Ayudante
	- Profesional de Apoyo	- Conductor
	- Inspector	-
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyecto	
	- Maquinaria	
	- Herramienta menor	
	- Volqueta	
	- Camioneta Estacas	
	- Minicargador	

Actividades

- Implementación de PMT y PAGA
- Se realiza demarcación de marcas viales (Flechas sencillas y flechas dobles) en la carrera 78 calzada bajando entre el K0+000 y K7+576.
- Actividad de nivelación de pozo de inspección y reposición de tapas basculantes en la carrera 78 calzada bajando.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

9092

Martes 19/03/2024

Clima | Mañana | Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional de Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camión Estacas
- Minicargador
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (flechas sencillas y flechas dobles) en la carrera 18 calzada basando entre el IC7+576 y IC2+063.
- Se realiza demarcación de lineas horizontales en la carrera 18 calzada basando entre calle 26 y 29.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

NKA

Viernes 22/03/2024

Clima

Mañana

Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta Estacas
- Minicargad..
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Se realiza demarcación de marcas viales (flechas sencillas) en la calle 24 calzada derecha entre el K0+000 y K2+320.
- Actividad de nivelación de pozo de inspección y reposición de tapas basculantes en la calle 24 calzada derecha.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

9094

Sabado 23/03/2024

Clima

Mañana

Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topograf.
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta Menor
- Volqueta
- Camioneta Estacas
- Minicargador

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (Flechas sencillas) en la calle 24 calzada derecha entre el K2+320 y K4+307.
- Continue la nivelación de pozos de inspección y reposición de tapas basculantes en la calle 24 calzada derecha.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

NKA

Domingo 24/03/2024

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Suso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta Estacas
- Minicargador

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades:

- Descanso fin de semana

Residente de Obra

Residente de Interventoría

9096

Lunes 25/03/2024

Clima

Mañana

Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional SISO
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta Estacas
- Minicargador
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades:

- Descanso Lunes festivo.

Residente de Obra

Residente de Interventoria

NKA

Martes 26/03/2024

Clima | Mañana | Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional SISO
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Camioneta estacas
- Minicargador
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Se realiza demarcación de marcas viales (Flechas sencillas) en la calle 24 calzada izquierda entre el K54+303 y K2+340.
- Continua la nivelación de pozos de inspección y reposición de tapas basculante en la calle 24 calzada derecha.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

9098

Miercoles 27/03/2024

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Herramienta menor
- Volqueta
- Comunicar Estacas
- Minicargador
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades:

- Implementación de PMT y PAGA
- Continua demarcación de marcas viales (flechas reacillas) en la calle 24 calzada izquierda entre el K27+340 y K28+000.
- Continua nivelación de pozo de inspección y reposición de tapa basculante en la calle 24 calzada izquierda

Residente de Obra

Residente de Interventoria

NKB

Jueves 28/03/2024

Clima

Mañana

Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional SISO
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria

- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades

- Cese de Actividades por Semana Santa

Residente de Obra

Residente de Interventoria

9100

Viernes 29/03/2024

Clima | Mañana | Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp. Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades

- Cese de actividades por Semana Santa

Residente de Obra

Residente de Interventoria

Sabado 30/03/2024

Clima Mañana Tarde

- Personal
- Director
- Residente
- Profesional Siso
- Profesional Apoyo
- Inspector
- Topografo
- Esp Gerencia Proyectos
- Maquinaria
- Cadenero
- Control Vial
- Ayudante
- Conductor

Actividades

- Cese de Actividades por Semana Santa

Residente de Obra

Residente de Interventoria

9102

Domingo 31/03/2024

Clima	Mañana	Tarde
	- Personal	
	- Director	- Cadenero
	- Residente	- Control Vial
	- Profesional Siso	- Ayudante
	- Profesional Apoyo	- Conductor
	- Inspector	
	- Topografo	
	- Esp. Gerencia Proyectos	
	- Maquinaria	

Actividades:

- Descanso dominical

Residente de Obra

Residente de Interventoria

13.2. INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA 2627 DE 2022.

9904

CONSORCIO FENIX

Gobernación de Casanare

GILBERTO GALINDO ALVARADO
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS
M.P 01193-0214



INFORME MENSUAL DE OBRA DEL 1 DE MARZO A 31 DE MARZO 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 2627 de 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
CONTRATISTA: CONSORCIO FENIX
INTERVENTORIA: GILBERTO GALINDO ALVARADO
SUPERVISOR: ROBERT ASIS HERNÁNDEZ

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVOS 3
2.1. OBJETIVO GENERAL 3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3.1. INFORMACIÓN GENERAL 4
3.1.1 Localización: 4
4. INFORME JURÍDICO 5
4.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2627 DE 2022 5
4.2. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 2627 DE 2022 6
4.3. PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE OBRA 6
4.4. PÓLIZAS ACTUALIZADAS EN EL ACTO DE INICIO DE OBRA 6
4.5. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No 1 7
4.6. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No 2 7
4.7. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No 3 7
4.8. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRÓRROGA No 4 7
4.9. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRÓRROGA No 5 7
5. INFORME ADMINISTRATIVO 8
5.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL 8
5.2. REGISTRO DE PERSONAL EN OBRA 8
5.3. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES 9
5.4. SOPORTES PAGOS FIC 9
6. INFORME TÉCNICO 10
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERÍODO 10
CAPITULO 1 BACHEO 10
CAPITULO 4 SEÑALIZACIÓN 11
7. AVANCE DE OBRA Y VALOR EJECUTADO 14
8. CONCLUSIONES 14
9. ANEXOS 17

1. INTRODUCCIÓN

La Gobernación de Casanare aunó esfuerzos para ejecutar el proyecto cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL", mediante la suscripción del Contrato de Obra No 2627 del 28 de diciembre de 2022 por la firma constructora Consorcio FENIX.

El desarrollo y ejecución del proyecto generará en la comunidad un impacto positivo, el cual pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, las condiciones de vida y el progreso de infraestructura vial directamente donde se ejecuta el proyecto.

El presente informe mensual de obra entre el periodo del primero (1) de marzo al treinta y uno (31) de marzo del 2024, corresponde a la descripción y el alcance de las actividades contractuales, el cual se ha venido ejecutando desde el inicio de la etapa constructiva del proyecto hasta el 31 de marzo de 2024. Se han desarrollado minuciosamente estudios técnicos, diseños, especificaciones técnicas, procesos constructivos, normatividad vigente y algunas sugerencias o indicaciones por parte de interventoría del proyecto.

El informe en mención describe de forma clara y concisa el cumplimiento de los aspectos jurídicos, administrativos, técnicos, financieros y ambientales, conforme a las obligaciones establecidas en el contrato de obra No. 2627 de 2022.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Presentar informe de avance mensual de las actividades del contrato de obra No. 2627 del 28 de diciembre de 2022 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL", lo anterior, teniendo en cuenta todas las actividades contractuales, el cual son requeridas para dar el cumplimiento al objeto en mención y que corresponden al período ejecutado desde el día primero (1) de marzo de 2024 hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2024.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar informe mensual de obra, de acuerdo con las actividades ejecutadas a la fecha.
- Cumplir con los estudios, diseños, normas técnicas, procesos constructivos establecidos para la ejecución del proyecto
- Presentar e informar a la entidad contratante de los contratiempos que se generen durante la ejecución de la etapa constructiva del proyecto.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL


OBJETO: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL".

CONTRATO: 2627 DE 2022

3.1.1 Localización:

La obra se ejecuta en el área urbana del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare. El Municipio de Yopal se localiza al noroeste del Departamento de Casanare, con una altitud entre 2000 m.s.n.m a 150 m.s.n.m., y una población estimada de 182.000 habitantes, con una extensión aproximada de 2595 Km^2.

Ilustración 1 Localización de la Obra

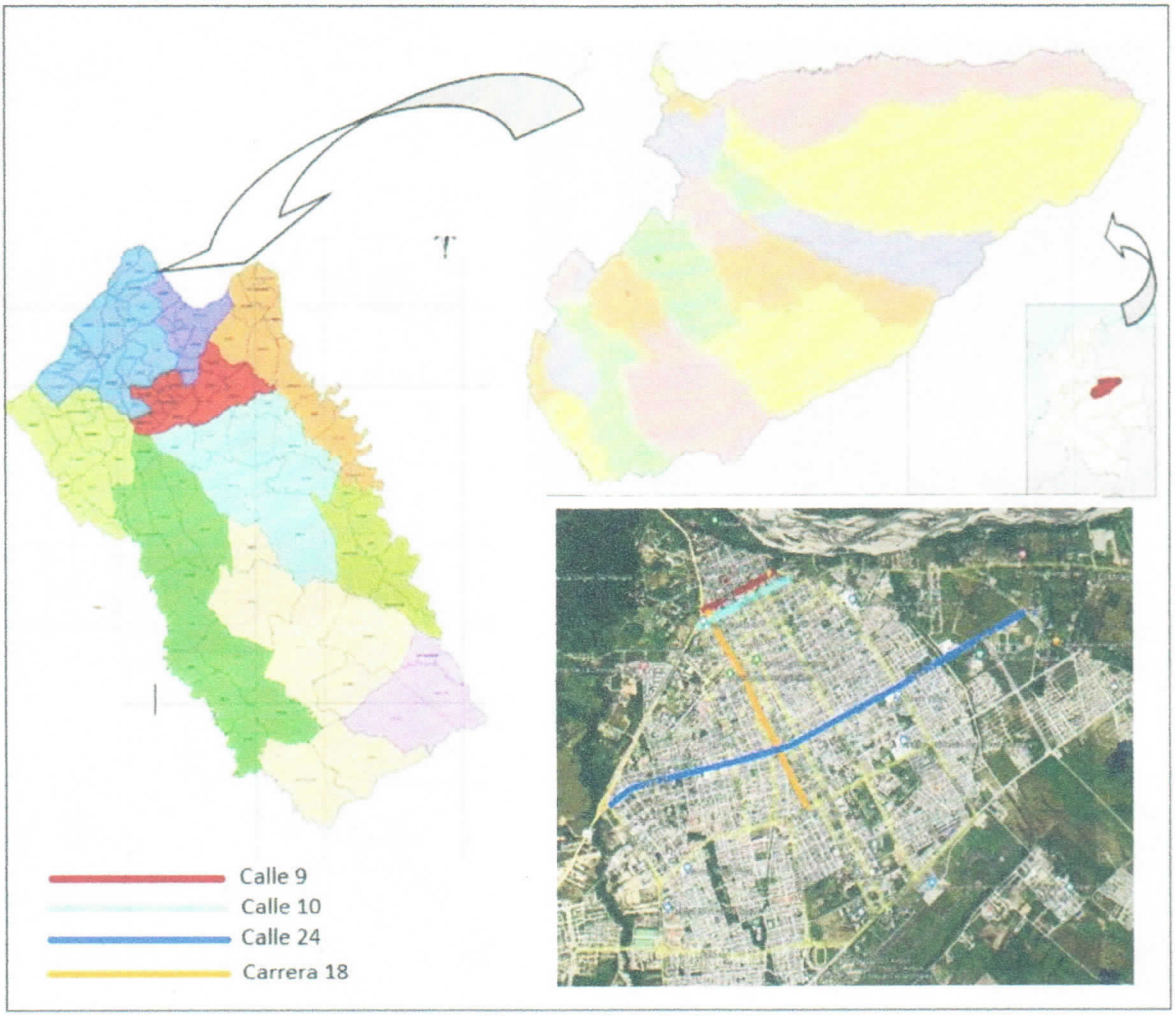

Fuente: Google Earth

Tabla 1 Longitud de las Vías a Intervenir

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.	LONGITUD CALZADA IZQUIERDA (m)	LONGITUD CAZADA DERECHA (m)
CALLE 9 ENTRE MARGINAL DE LA SELVA Y DIAGONAL 9	723.94	774.67
CALLE 10 ENTRE MARGINAL DE LA SELVA Y DIAGONAL 9	1004.13	1026.58
CALLE 24 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 50	4303.86	4301.8
CARRERA 18(CAÑO SECO) CALZADA 1 BAJANDO ENTRE CALLE 9 Y CALLE 29		2047.12
CARRERA 18(CAÑO SECO) CALZADA 2 SUBIENDO ENTRE CALLE 9 Y CALLE 30	2159.64	
LONGITUD	**16.341,74**	

Fuente: Elaboración propia

4. INFORME JURÍDICO

4.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA No. 2627 DE 2022

Contrato No.:	SECOP II CAS-OAJ-LP-023-2022 Y No INTERNO 2627 de 2022-12-28
Contratante:	GOBERNACIÓN DE CASANARE
Contratista:	CONSORCIO FENIX DIAMAN7E SAS: 20% CAMEL INGENIERIA Y SERVICIOS: 30% CONSTRUCCIONES GMI SAS: 45% MURCIA CONSTRUCCIONES SAS: 5% R/L DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
NIT Contratista	901666131-3
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Valor inicial del contrato de obra:	SIETE MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE($7.513.820.382,00)
Valor de adiciones del contrato de obra:	N/A
Plazo inicial de ejecución:	TRES (3) MESES
Plazo final de ejecución	TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Fecha de inicio:	23 de marzo de 2023
Fecha de terminación inicial	22 de junio de 2023
Fecha terminación final	07 de mayo de 2024
Prórroga No 1	21 de junio de 2023
Prórroga No 2	22 de septiembre de 2023

Prórroga No 3	20 de noviembre de 2023
Prórroga No 4	18 de enero de 2024
Prórroga No 5	07 de marzo de 2024
Acta Modificatoria No 1	06 de julio de 2023
Acta Modificatoria No 2	13 de febrero de 2024
Descripción de las actividades realizadas más importantes:	Bacheo Asfalto Reciclado y Lechada Asfáltica Estructuras de Drenaje Señalización
Número de empleos directos generados con la obra:	12
Número de empleos generados en la comunidad de la zona de influencia del proyecto:	12
Contratista de Interventoría:	GILBERTO GALINDO ALVARADO
Contrato de Consultoría No:	SECOP II CAS-OAJ-CMA-022-2022 Y No INTERNO 2622 DE 2022-12-27

Fuente: Elaboración propia

4.2. CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 2627 DE 2022

En el periodo del presente informe se presenta las siguientes actualizaciones de garantías que amparan el contrato de obra, las cuales están a cargo de la HDI SEGUROS.

4.3. PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE OBRA

PÓLIZAS INICIALES CONTRATO DE OBRA				
Poliza No.	Amparos	Valor a Asegurar	Vigencia (desde)	Vigencia (hasta)
4.000.723	Cumplimiento	$ 751.382.039,00	28/12/2022	28/07/2023
4.000.723	Buen manejo anticipo	$ 2.791.579.819,00	28/12/2022	28/07/2023
4.000.723	Salario y Prestaciones	$ 375.691.020,00	28/12/2022	28/03/2026
4.000.723	Estabilidad y Calidad	$ 751.382.039,00	28/12/2022	28/12/2025
4.000.214	Extracontractual (smn	$ 580.000.000,00	28/12/2022	28/03/2023

4.4. PÓLIZAS ACTUALIZADAS EN EL ACTO DE INICIO DE OBRA

PÓLIZAS ACTUALIZADAS CON EL ACTA DE INICIO DE OBRA				
Poliza No.	Amparos	Valor a Asegurar	Vigencia (desde)	Vigencia (hasta)
4.000.723	Cumplimiento	$ 751.382.039,00	23/03/2023	23/10/2023
4.000.723	Buen manejo anticipo	$ 2.791.579.819,00	23/03/2023	23/10/2023
4.000.723	Salario y Prestaciones	$ 375.691.020,00	23/03/2023	23/06/2026
4.000.723	Estabilidad y Calidad	$ 751.382.039,00	28/12/2022	28/12/2025
4.000.214	Extracontractual (smn	$ 580.000.000,00	28/12/2022	23/06/2023

4.5. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No 1.

POLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO A PRORROGA No 1				
Póliza No	Amparos	Valor a asegurar	Vigencia (Desde)	Vigencia (Hasta)
4.000.723	Cumplimiento	$ 751.382.039.00	23/03/2023	23/01/2024
4.000.723	Buen manejo anticipo	$ 2.791.579.819.00	23/03/2023	23/01/2024
4.000.723	Salarios y prestaciones	$ 375.691.020.00	23/03/2023	23/09/2026
4.000.723	Estabilidad y calidad	$ 751.382.039.00	28/12/2022	28/12/2025
4.000.214	Extracontractual	$ 580.000.000.00	28/12/2022	23/09/2023

4.6. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No 2.

POLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO A PRORROGA No 2				
Póliza No	Amparos	Valor a asegurar	Vigencia (Desde)	Vigencia (Hasta)
4.000.723	Cumplimiento	$ 751.382.039.00	23/03/2023	23/03/2024
4.000.723	Buen manejo anticipo	$ 2.791.579.819.00	23/03/2023	23/03/2024
4.000.723	Salarios y prestaciones	$ 375.691.020.00	23/03/2023	22/11/2026
4.000.723	Estabilidad y calidad	$ 751.382.039.00	28/12/2022	28/12/2027
4.000.214	Extracontractual	$ 580.000.000.00	28/12/2022	23/11/2023

4.7. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA No 3.

POLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO A PRORROGA No 3				
Póliza No	Amparos	Valor a asegurar	Vigencia (Desde)	Vigencia (Hasta)
4.000.723	Cumplimiento	$ 751.382.039.00	23/03/2023	24/05/2024
4.000.723	Buen manejo anticipo	$ 2.791.579.819.00	23/03/2023	24/05/2024
4.000.723	Salarios y prestaciones	$ 375.691.020.00	23/03/2023	24/01/2027
4.000.723	Estabilidad y calidad	$ 751.382.039.00	28/12/2022	28/12/2027
4.000.214	Extracontractual	$ 580.000.000.00	28/12/2022	24/01/2024

4.8. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRÓRROGA No 4.

POLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO A PRÓRROGA No 4				
Póliza No	Amparos	Valor a asegurar	Vigencia (Desde)	Vigencia (Hasta)
4.000.723	Cumplimiento	$ 751.382.039.00	23/03/2023	10/07/2024
4.000.723	Buen manejo anticipo	$ 2.791.579.819.00	23/03/2023	10/07/2024
4.000.723	Salarios y prestaciones	$ 375.691.020.00	23/03/2023	10/03/2027
4.000.723	Estabilidad y calidad	$ 751.382.039.00	28/12/2022	28/12/2027
4.000.214	Extracontractual	$ 650.000.000.00	28/12/2022	10/03/2024

4.9. POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRÓRROGA No 5.

POLIZAS ACTUALIZADAS DE ACUERDO A PRÓRROGA No 5				
Póliza No	Amparos	Valor a asegurar	Vigencia (Desde)	Vigencia (Hasta)
4.000.723	Cumplimiento	$ 751.382.039.00	23/03/2023	10/09/2024
4.000.723	Buen manejo anticipo	$ 2.791.579.819.00	23/03/2023	10/09/2024
4.000.723	Salarios y prestaciones	$ 375.691.020.00	23/03/2023	10/05/2027
4.000.723	Estabilidad y calidad	$ 751.382.039.00	28/12/2022	28/12/2027
4.000.214	Extracontractual	$ 650.000.000.00	28/12/2022	10/05/2024

5. INFORME ADMINISTRATIVO

5.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL

En el periodo comprendido entre el primero (1) de marzo de 2024 al treinta y uno (31) de marzo de 2024, Consorcio FENIX contó con el siguiente personal de mano de obra calificada:

Tabla 2 Personal Profesional

No.	PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	CARGO	DEDICACIÓN	VINCULO	FECHA TERMINACIÓN
1	CARLOS WILLIAM DIAZ AGUDELO	DIRECTOR DE OBRA	50%	CONSORCIO FENIX	
2	RAFAEL ALBERTO BARRAGÁN CASTRO	RESIDENTE DE OBRA	100%	CAMEL INGENIERÍA	
3	WILMAR QUINTANA	SUPERVISOR DE OBRA	100%	CONSORCIO FENIX	
4	LUZ AYDA PERILLA SEGURA	PROFESIONAL SISO	100%	CONSORCIO FENIX	
5	MICHEL JANIER SALAZAR RIVERA	TOPOGRAFO	100%	CONSORCIO FENIX	
6	VICTOR ALEJANDRO MUNEVAR PLAZAS	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	100%	CONSORCIO FENIX	

Fuente: Elaboración propia.

5.2. REGISTRO DE PERSONAL EN OBRA

En el periodo comprendido entre el primero (1) de marzo de 2024 al treinta y uno (31) de marzo de 2024, Consorcio FENIX contó con el siguiente personal en obra:

Tabla 3 Personal en Obra del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024

No.	PERSONAL MANO DE OBRA	CARGO	CEDULA	VINCULO	FECHA TERMINACIÓN
1	HERNAN DAZA BARRANTES	CONDUCTOR CAMION MICROPAVIMENTO	80.385.010	CONSORCIO FENIX	
2	IRIS ANDREA BLANCO BERDUGO	CONTROLADOR VIAL	1.118.557.770	CONSORCIO FENIX	
3	MAGDALENA NIÑO CASTRO	CONTROLADOR VIAL	1.024.567.502	CONSORCIO FENIX	
4	OSCAR JAVIER SUELTA BARRERA	PROFESIONAL DE APOYO TECNICO Y ADMON	1.007.703.698	CONSORCIO FENIX	
5	LUIS ANTONIO CASTAÑEDA GARZON	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	4.193.974	CONSORCIO FENIX	

6	WINSTON JAIRSON DAJOME CORTES	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	98.427.898	CONSORCIO FENIX	

Fuente: Elaboración propia

5.3. PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS PROFESIONALES

A continuación, se relaciona el número de planilla y valor pagado por el concepto de seguridad social, salud, pensión, ARL y Caja de compensación durante la ejecución del Contrato de Obra por el Consorcio Fenix y se anexa los soportes de pago de seguridad social correspondientes al periodo del presente informe.

No.	MES	FECHA PAGO	No. PLANILLA	VALOR PAGADO
1	MARZO DE 2024	19/04/2024	9465824825	$4.674.100,00

Se relaciona los números de planilla por concepto de seguridad social para el Ingeniero Residente de Obra.

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO	IBC	PENSIÓN		SALUD		ARL		CAJA DE COMPENSACIÓN	PLANILLA
				Valor	AFP	Valor	EPS	ARL	Valor	Valor	
74.381.373	RAFAEL ALBERTO BARRAGAN CASTRO	mar-24	$6.500.000,00	$ 1.105.000,00	PORVENIR	$ 260.000,00	SANITAS	COLMENA	$ 452.400,00	$ 260.000,00	9464980495

5.4. SOPORTES PAGOS FIC

A continuación, se relaciona el pago FIC efectuado por el contratista en el presente periodo y se anexa el soporte de pago correspondiente.

N°	MES	FECHA PAGO	REFERENCIA	VR PAGADO
1	MARZO DE 2024	22/04/2024	108403609	357.500,00

Con lo anterior se informa el pago a los aportes de la seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, así como los pagos efectuados al FIC; montos contabilizados y pagados por el CONSORCIO FENIX NIT 901666131-3, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024, en desarrollo del contrato de obra pública No. 2627, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL."

CONSORCIO FENIX

REPORTE MENSUAL DE OBRA

CÓDIGO	EJE-FTO-003
VERSIÓN	4
FECHA DE APROBACIÓN	13/9/2013

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Fecha	31/03/2024	Nº Orden de Trabajo	2627 de 2022	PRY N.	3036009025	Cliente	Gobernacion Casanare
						Sector	Vias Urbanas

Resumen

Valor Ejecutado en el Mes:	$ 46.404.098,92	% Programado a la Fecha:	93,91%	Fecha inicio:	23-mar-23	Plazo en Días:	412,00
Valor Total Acumulado:	$ 6.808.992.570,99	% Ejecutado a la Fecha:	90,62%	Fecha Terminación:	7-may-24	Días en Obra:	374,00
Valor total del contrato	$ 7.513.820.382,00	Diferencia:	-3,29%			Días para entregar:	-38,00

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad Acumulada mes Anterior	Cantidad Ejecutada presente Mes	Valor Ejecutado Mes	Cantidad Acumulada	Valor Total Acumulado	Incidencia	% Ejecución Ítem Acumulado Respecto a Incidencia	% Ítem Acumulado
	1.BACHEO												
1,01	Corte en Carpeta Asfaltica	m	2.982,44	$ 11.749,00	$ 35.040.687,56	2.982,44	-	$ -	2982,440	$ 35.040.687,560	0,47%	0,466%	100,00%
1,02	Demolicion de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro) e. prom 0.10 m	m2	2.675,38	$ 30.652,00	$ 82.005.747,76	2.675,38	-	$ -	2675,380	$ 82.005.747,760	1,09%	1,09%	100,00%
1,03	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	2.633,20	$ 10.276,00	$ 27.058.763,20	-	-	$ -	0,000	$ -	0,36%	0,00%	0,00%
1,04	Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m	m2	756,43	$ 153.272,00	$ 115.939.538,96	-	-	$ -	0,000	$ -	1,54%	0,00%	0,00%
1,05	Acero de Transferencia liso de 60000 Psi	Kg	852,37	$ 9.765,00	$ 8.323.393,05	-	-	$ -	0,000	$ -	0,11%	0,00%	0,00%
1,06	Junta de dilatacion de 10 mm x 10 mm (Cortada, inducida y sellada)	m	532,39	$ 45.797,00	$ 24.381.864,83	-	-	$ -	0,000	$ -	0,32%	0,00%	0,00%
1,07	Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente manual con retiro	m3	64,14	$ 96.300,00	$ 6.176.682,00	64,14	-	$ -	64,140	$ 6.176.682,000	0,08%	0,08%	100,00%
1,08	Base granular (INV. 330.1)	m3	64,14	$ 123.954,00	$ 7.950.409,56	64,14	-	$ -	64,140	$ 7.950.409,560	0,11%	0,11%	100,00%
1,09	Imprimación con Emulsión Asfáltica	m2	2.675,38	$ 5.408,00	$ 14.468.455,04	2.675,38	-	$ -	2675,380	$ 14.468.455,040	0,19%	0,19%	100,00%
1,1	Mezcla Asfaltica MDC 2 o 19	m3	252,40	$ 1.089.166,00	$ 274.905.498,40	252,40	-	$ -	252,400	$ 274.905.498,400	3,66%	3,66%	100,00%
1,11	transporte de material Petreo (vía pavimentada)	m3Km	2.962,73	$ 2.065,00	$ 6.118.037,45	2.962,73	-	$ -	2962,730	$ 6.118.037,450	0,08%	0,08%	100,00%
1,12	Demolicion de pavimento en concreto rigido (inc. retiro) e.p=0.15 m	m2	756,43	$ 52.223,00	$ 39.503.043,89	4,33	-	$ -	4,330	$ 226.125,590	0,53%	0,00%	0,57%
1,13	Nivelacion de Pozos de Inspeccion (No incluye: Tapa ni aro)	Und	62,00	$ 233.815,00	$ 14.496.530,00	39,00	13,000	$ 3.039.595,000	52,000	$ 12.158.380,000	0,19%	0,16%	83,87%
1,14	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa)	Und	62,00	$ 1.533.744,00	$ 95.092.128,00	39,00	13,000	$ 19.938.672,000	52,000	$ 79.754.688,000	1,27%	1,06%	83,87%
1,15	Geomalla biaxial para refuerzo capas granulares 50 kn/m. Suministro e instal.	m2	113,70	$ 22.612,00	$ 2.570.984,40	113,70	-	$ -	113,700	$ 2.570.984,400	0,03%	0,03%	100,00%
	2. ASFALTO RECICLADO Y LECHADA ASFALTICA												
2,01	Sello de grietas	m	296,30	$ 5.441,00	$ 1.612.168,30	296,30	-	$ -	296,300	1.612.168,300	0,02%	0,02%	100,00%
2,02	Imprimación con Emulsión Asfáltica	m2	94.447,54	$ 5.408,00	$ 510.772.296,32	94.447,54	-	$ -	94.447,540	510.772.296,320	6,80%	6,80%	100,00%
2,03	Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica.	m3	2.708,32	$ 291.650,00	$ 789.881.528,00	2.708,32	-	$ -	2.708,320	789.881.528,000	10,51%	10,51%	100,00%
2,04	Lechada asfaltica con emulsion CRL-1hm, tipo LA-13 (INV-433/22) e=10.0mm	m2	205.260,36	$ 16.631,00	$ 3.413.685.047,16	203.237,42	-	$ -	203.237,420	3.380.041.532,020	45,43%	44,98%	99,01%
NP 01	Pavimento Reciclado en frío en el lugar con Emulsión asfáltica con adicion de 1% de cemento	m3	3.515,18	$ 319.582,00	$ 1.123.388.254,76	3.515,18	-	$ -	3.515,180	1.123.388.254,760	14,95%	14,95%	100,00%

CONSORCIO FENIX

REPORTE MENSUAL DE OBRA

CÓDIGO	EJE-FTO-003
VERSIÓN	4
FECHA DE APROBACIÓN	13/9/2013

OBJETO DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A NIVEL DE CAPA DE RODADURA CON LECHADA ASFÁLTICA EN LA CARRERA 18 Y LAS CALLES 9, 10, 24, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Fecha	31/03/2024	N° Orden de Trabajo	2627 de 2022	PRY N.	3036009025	Cliente	Gobernacion Casanare
						Sector	Vias Urbanas

Resumen

Valor Ejecutado en el Mes:	$ 46.404.098,92	% Programado a la Fecha:	93,91%	Fecha inicio:	23-mar-23	Plazo en Días:	412,00
Valor Total Acumulado:	$ 6.808.992.570,99	% Ejecutado a la Fecha:	90,62%	Fecha Terminación:	7-may-24	Días en Obra:	374,00
Valor total del contrato	$ 7.513.820.382,00	Diferencia:	-3,29%			Días para entregar:	-38,00

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad Acumulada mes Anterior	Cantidad Ejecutada presente Mes	Valor Ejecutado Mes	Cantidad Acumulada	Valor Total Acumulado	Incidencia	% Ejecución Item Acumulado Respecto a Incidencia	% Item Acumulado
	3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE												
3,01	Demolicion de cunetas (Incl. Retiro)	m3	85,83	$ 80.769,00	$ 6.932.403,27	85,83	-	$ -	85,830	6.932.403,270	0,09%	0,09%	100,00%
NP 02	CUNETA TIPO C-1 CONCRETO 3000 PSI e=0.10 M	m3	85,83	$ 749.711,00	$ 64.347.695,13	85,83	-	$ -	85,830	64.347.695,130	0,86%	0,86%	100,00%
	4. SEÑALIZACION												
4,01	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	40.452,09	$ 4.519,00	$ 182.802.994,71	36.559,29	**3.892,800**	$ 17.591.563,200	40.452,090	182.802.994,710	2,43%	2,43%	100,00%
4,02	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m2	4.012,36	$ 38.802,00	$ 155.687.592,72	3.786,00	**150,360**	$ 5.834.268,720	3.936,360	152.738.640,720	2,07%	2,03%	98,11%
4,03	Estoperol metalico 14 x 4 cm	Und	1.000,00	$ 28.858,00	$ 28.858.000,00	-	-	$ -	0,000	0,000	0,38%	0,00%	0,00%
	ITEM NO PREVISTO												
NP 03	Sardinel Prefabricado A-10 (0,80 x 0,20 x 0,50) incluye mortero de peque y nivelación.	m	300,00	$ 76.411,00	$ 22.923.300,00	-	-	$ -	0,000	0,000	0,31%	0,00%	0,00%
NP 04	Resalto u Ondulación (Reductor de Velocidad) Concreto 4000 psi, 280 Kg/cm2	m	54,00	$ 564.652,00	$ 30.491.208,00	-	-	$ -	0,000	0,000	0,41%	0,00%	0,00%
	PMT	Und	1,00	$ 49.879.069	$ 49.879.069,00	1,00	-	$ -	1,000	49.879.069,000	0,66%	0,66%	100,00%
	PAGA	Und	1,00	$ 25.220.293	$ 25.220.293,00	1,00	-	$ -	1,000	25.220.293,000	0,34%	0,34%	100,00%
RECURSOS PENDIENTES DE INVERSIÓN					$ 353.306.767,53						4,70%		
	Subtotal incluye AIU				**$ 7.513.820.382,00**			**$ 46.404.098,92**		**$ 6.808.992.570,99**			
	Administración	28,00%											
	Imprevistos	1,00%											
	Utilidad	5,00%											
	Total AIU												
	Valor Total				**$ 7.513.820.382,00**	**% Ejec.Mes**	0,62%	**$ 46.404.098,92**		**$ 6.808.992.570,99**	**100%**	**90,62%**	

6. INFORME TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERÍODO

CAPITULO 1 BACHEO


1.13 Nivelación de Pozos de Inspección (No incluye: Tapa ni aro)

Esta actividad consiste en nivelar la tapa del pozo de inspección a nivel con la capa de rodadura. De acuerdo con el procedimiento constructivo esta actividad se realizó en la calle 10, calle 24 y carrera 18.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME MENSUAL	% ACUMULADO
1	1.BACHEO					
1,13	Nivelacion de Pozos de Inspeccion (No incluye: Tapa ni aro)	Und	109,00	62,00	13,00	83,87%

Nivelacion de Pozos de Inspeccion (No incluye: Tapa ni aro)

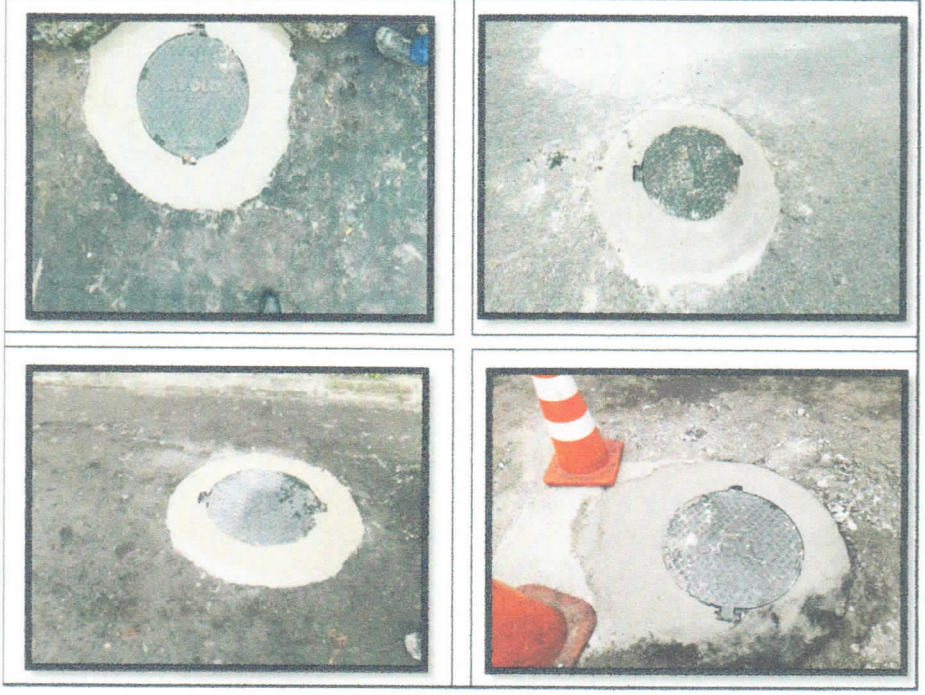


1.14 Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en via (Inc. marco y tapa)

Esta actividad consiste en la reposición de tapa basculante para los pozos de inspección en la vía, con protección contra accesos de personal no autorizados y de alta resistencia al impacto y/o

deformaciones generadas por acción de las cargas de tránsito. De acuerdo con el procedimiento constructivo esta actividad se realizó en la calle 10, calle 24 y carrera 18.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES						
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME MENSUAL	% ACUMULADO
1	1.BACHEO					
1,14	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa)	Und	109,00	62,00	13,00	83,87%

Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa)

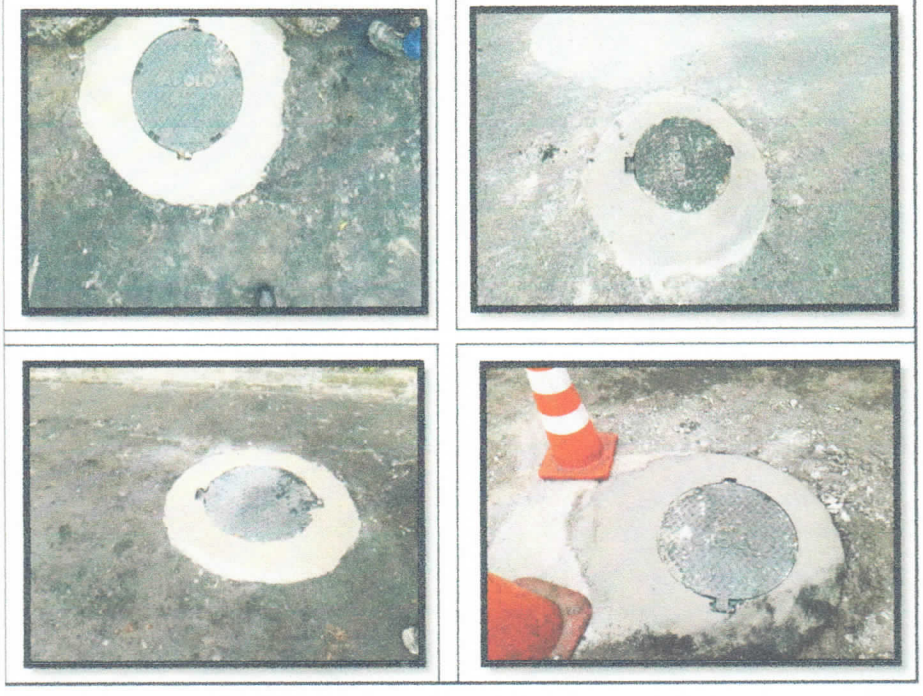

CAPITULO 4 SEÑALIZACIÓN


4.01 Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)

Esta actividad consiste en la aplicación de pintura acrílica, retrorreflectiva con microesferas, es ejecutada teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Invias (INV 700.1), diseños, ensayos de laboratorio y recomendaciones por parte de interventoría, se realizó la demarcación vial en las siguientes vías:

- Carrera 18 calzada bajando entre calle 26 y calle 29.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES						
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME MENSUAL	% ACUMULADO
4	4. SEÑALIZACION					
4.01	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	40.452,09	40.452,09	3.892,80	100,00%

Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)

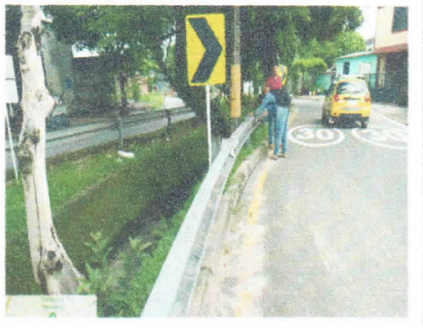




4.02 Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)

Esta actividad consiste en la aplicación de pintura acrílica, retrorreflectiva con microesferas, es ejecutada teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del Invias (INV 700.1), diseños, ensayos de laboratorio y recomendaciones por parte de interventoría, se realizó la demarcación vial de marcas viales (flechas sencillas y flechas dobles) en las siguientes vías:


- Calle 9 calzada derecha entre marginal de la selva y diagonal 9.
- Calle 9 calzada izquierda entre marginal de la selva y diagonal 9.
- Calle 10 calzada derecha entre marginal de la selva y diagonal 9.
- Calle 10 calzada izquierda entre marginal de la selva y diagonal 9.
- Carrera 18 calzada bajando entre calle 9 y calle 30.
- Carrera 18 calzada subiendo entre calle 9 y calle 30.
- Calle 24 calzada derecha entre carrera 5 y carrera 50.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES

CONSORCIO FENIX

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 2	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME MENSUAL	% ACUMULADO
4	4. SEÑALIZACION					
4,02	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m2	4.012,36	4.012,36	150,36	98,11%

Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)

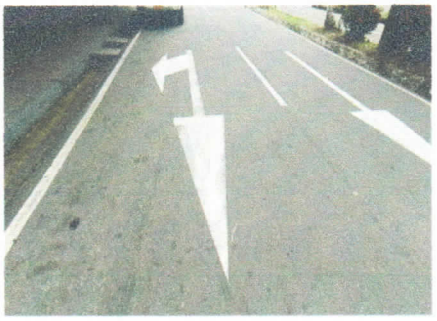

Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)

