INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO FONSECON
CONVENIO No. 1592, CURUMANI - CESAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MAYO** DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI - CESAR		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO CESAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$1.250.000.000,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 20.975.011,72	
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 1.270.975.011,72	
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/09/2021		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/05/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL	**DESDE:** 01/10/2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Ing. Remberto Martínez Polo	26/10/2021	15/01/2022
	Ing. Luis Fernando Pinzón Galindo	16/01/2022	31/01/2022
	Ing. Juan Carlos Montaña	01/02/2022	05/02/2022
	Ing. Remberto Martínez Polo	06/02/2022	20/03/2023
	Arq. Héctor Iván Ayala Dueñas	21/03/2023	30/06/2023
	Ing. Edgar González Patiño	1/07/2023	20/07/2023
	Ing. Hernando de Jesús Pérez P.	21/07/2023	13/09/2024
	Ing. Sergio Sanjuan Santiago	14/09/2024	30/09/2024
	Ing. Viterbo Gómez Carvajal	01/10/2024	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Gina Lorena Cruz Calderón	26/10/2021	31/12/2021
	Gina Lorena Cruz Calderón	18/01/2022	01/03/2022
	Rafael Ortiz	01/04/2022	30/09/2022
	Arq. Edwin Andrés Torres Angel	01/10/2022	31/12/2022
	Favio Rosero	15/02/2023	14/08/2023
	Edinson García Díaz	15/09/2023	31/12/2023
	Edinson García Díaz	30/01/2024	30/09/2024
	Ing. Darío Fernando Córdoba J.	01/10/2024	31/12/2024
	Ing. Maria Alejandra Jiménez	01/01/2025	03/02/2025
	Arq. Edwin Andrés Torres Angel	04/02/2025	Actual
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2021	No.90121	24/09/2021	31/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2022	No. 11922	16/01/2022	31/12/2022
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR 2023	No.9323	19/19/2023	31/12/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. AA058523	26/10/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	26/10/2021		

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 31/10/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: 31/12/2022
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: 30/04/2023
	CUARTA PRORROGA	FECHA: 31/08/2023
	QUINTA PRORROGA	FECHA: 28/02/2024
	SEXTA PRORROGA	FECHA: 20/06/2024
	SEPTIMA PRORROGA (Hasta 31/03/2025) CUARTA MODIFICACIÓN (modificando las clausula quinta y séptima)	FECHA: 20/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: 27/02/2024
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO No1	FECHA: 20/06/2024
	SUSPENSIÓN 02	FECHA: 27/08/2024
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 02	FECHA: 27/11/2024
	SUSPENSIÓN 03 (Hasta 26/05/2025) Plazo final de ejecución 30/05/2025	FECHA: 27/03/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/12/2022 – Inicial	
	FECHA: 01/05/2023 – Primera Prorroga	
	FECHA: 31/07/2023 – Segunda Prorroga y Primera Adición	
	FECHA: 30/11/2023 – Tercera Prorroga	
	FECHA: 31/03/2024 – Cuarta Prorroga	
	FECHA: 31/08/2024 – Quinta Prorroga	
	FECHA: 11/03/2025 – Sexta Prorroga	
	FECHA: 11/03/2025 – Séptima Prorroga	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A	
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 20.975.011,72	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12/11/2021	$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30/11/2021	$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOI equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	40%	30/06/2023	$250.000.000,00

ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	DD/MM/AAAA	$ 250.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.000.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 837.958.843,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGURO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
AA058523	Cumplimiento	$ 254.195.002,34 0,00	31/08/2023	30/09/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		$ 1.124.991.871,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	23/08/2022		$ 20.975.011,72
Nombre contratista	Consorcio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/02/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 3	31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4	15/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 5	30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6	15/06/2023	
	SUSPENSIÓN 1	19/05/2023	
	REINICIO 1	19/07/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/08/2023(CONTRATO VENCIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.145.966.883,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	Cumplimiento: 11-44-101183457 / Responsabilidad Civil: 11-40-101045846		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento: 15/12/2023 / Responsabilidad Civil: 15/06/2023		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE	$ 124.973.282,35

	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio CSC Sacúdete Curumaní Nit: 901.557.688-6		
Fecha de Acta de inicio del contrato	24/02/2022		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022	
	PRÓRROGA 2	31/12/2022	
	PRÓRROGA 3	15/04/2023	
	PRÓRROGA 4	30/04/2023	
	PRÓRROGA 5	15/06/2023	
	SUSPENSIÓN	19/05/2023	
	REINICIO	19/07/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/08/2023 (CONTRATO VENCIDO)		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.973.282,35
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ZURICH SEGURO S.A.**		
PÓLIZA No.	**SGPL-26867290-1**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**08/02/2022**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: ABRIL_25	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA: FINAL DE NOVIEMBRE 2024	X	
INFORME FINANCIERO: ABRIL 2025	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$100.327.728,84 (30/04/2024)	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	CONEXIÓN FINAL ENTREGADA	ACTIVIDADES DE OBRA TERMINADAS
OTROS		

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**100%**
% EJECUTADO DE OBRA	**100%**

COMPONENTE TECNICO

- El convenio se encuentra en ejecución con un 100% de ejecución física de la obra, cuenta con RETIE y RETILAP, y la conexión final del proyecto se encuentra realizada y certificada por AFINIA mediante oficio remitido por el municipio de Curumaní el 26 de mayo de 2025, en la cual se manifiesta que se cuenta con la conexión eléctrica definitiva, con la cual se garantiza la prestación del servicio público de Energía identificado con el contrato NIC 1391762.

COMPONENTE FINANCIERO

- Durante el periodo informado no hubo movimientos financieros. A la fecha el Ministerio ha desembolsado mil millones de pesos ($1.000.000.000), quedando pendiente el ultimo desembolso por valor de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000).

COMPONENTE JURIDICO

- Mediante memorando con Radicado 2025-3-003122-008751 Id: 498410 del 25 de febrero de 2025, se presentó a gestión contractual "SOLICITUD DE TRÁMITE ADMINISTRATIVO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO. Convenio Interadministrativo No.1592 de 2021, Curumaní – Cesar."
- El 20 de mayo de 2025 se continúa con la Audiencia de Presunto Incumplimiento, en dicha diligencia el municipio se compromete a la entrega de la Certificación de la conexión eléctrica definitiva, con la cual se garantiza la prestación del servicio público de energía eléctrica por parte de AFINIA, como prestador del servicio.
- El 26 de mayo de 2025, se aporta por parte del municipio de Curumaní la Certificación de la conexión eléctrica definitiva, con la cual se garantiza la prestación del servicio público de energía eléctrica por parte de AFINIA y la solicitud de reanudación del convenio para la culminación del proceso de entrega y liquidación ante el Ministerio del Interior.
- El 26 de mayo de 2025, se solicita por parte de esta supervisión a la Subdirección de Gestión Contractual la reanudación del convenio 1592-21 suscrito con el municipio de Curumaní-Cesar, conforme a la solicitud recibida por parte del municipio.
- El 28 de mayo de 2025, se solicita por parte del municipio de Curumaní-Cesar el levantamiento de proceso de presunto incumplimiento al convenio 1592-2021.
- El 29 de mayo de 2025, la Subdirección de Gestión Contractual solicita a esta supervisión indicar si con la documentación remitida por el municipio de Curumaní-Cesar se logran superar los hechos que dieron origen al trámite de presunto incumplimiento.
- El 29 de mayo de 2025, el supervisor ing. Viterbo Gómez responde al correo remitido por la Subdirección de Gestión Contractual, argumentando que una vez analizada la información suministrada por el municipio de Curumaní - Cesar, dentro del trámite de presunto incumplimiento y como quiera que se anexa el certificado de conexión eléctrica definitiva, se entienden superados los hechos que dieron origen al mismo.

SEGUIMIENTO:

05/05/2025, Mediante correo electrónico enviado al municipio de Curumaní con asunto: CARACTER PRORITARIO - Citación a reunión virtual No. 4 en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar."

(…)"En atención a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR", la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, convoca a reunión virtual con CARACTER PRIORITARIO con el propósito de realizar el seguimiento frente al avance de los hechos que motivaron la 3a suspensión de convenio. En ese sentido, se alerta sobre la finalización del plazo del convenio está pactado para el 30/05/2025.

Dicho lo anterior, se solicita de la conexión a través de la plataforma Teams por parte de la Entidad Territorial y a su vez, hacer extensiva la presente convocatoria al representante legal de las firmas contratista de obra e interventoría, bajo la siguiente información:

Datos de la reunión:
Fecha: 08/05/2025
Hora: 11:00 a.m." (…)

12/05/2025, se remite correo electrónico al municipio de Curumaní con asunto: "Remisión Acta de Reunión virtual 09-05-2025 convenio 1592-2021 Curumani-Cesar"

(…)" Cordial saludo, por medio del presente remitimos el Acta de Reunión del asunto realizada el 09 de mayo de 2025 por Microsoft Teams, solicitamos dar estricto cumplimiento a los compromisos y devolver firmada en medio digital."(…)

En resumen, los documentos que hacen falta son los que se relacionan en el cuadro anterior, pero los más relevantes son: Certificados y Actas: • Certificado de conexión eléctrica definitiva. • Acta de recibo de satisfacción de interventoría. • Certificado de garantía de los juegos infantiles. Informes y Planos: • Informes mensuales de supervisión publicados en SECOPII. • Planos récord de construcción y registro fotográfico desde el inicio hasta la finalización de la obra. Informe Financiero Final: • Informe financiero final junto con comprobantes de pago, órdenes de egreso, extractos bancarios, y certificación de rendimientos financieros.

Conclusión: El municipio debe entregar la documentación completa para que el Ministerio del Interior programe el recibo del proyecto.

12/05/2025, se remite correo electrónico al municipio de Curumaní con asunto: "Modelos de acta de inventario y manual de operación y mantenimiento."

(…)" Cordial saludo, remito modelos de acta de inventario y manual de operación y mantenimiento. Lo anterior para ser considerado al momento de la elaboración del documento de entrega del proyecto. *"(…)*

14/05/2025, mediante correo electrónico se remite al municipio con asunto: "Revisión Informe Financiero convenio 1592-21 Curumani-Cesar"

(…) "Cordial saludo, por medio del presente y conforme a lo programado con el municipio, solicitamos la presencia de manera virtual a la reunión que se llevará a cabo el ***14 de mayo de 2025 a las 4:30 pm****. Para revisar entre otros, temas financieros:*

1. tema de forma: la forma como están nombrados los informes, no es clara la información.
2. tema, esos revisar los informes financieros con los comprobantes de egreso, órdenes de pago y extractos bancarios.
3. tema es: hemos pagado 1000 millones y uds tienen un valor mayor 1004 millones entre lo pagado por ustedes y el saldo en caja. "(…)

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- El convenio termina el 30 de mayo de 2025 conforme a la Reanudación suscrita el 27 de mayo de 2025, tomando en consideración que la conexión final por la empresa de energía por AFINIA fue certificada mediante oficio remitido por el municipio de Curumaní el 26 de mayo de 2025, en la cual se manifiesta que se cuenta con la conexión eléctrica definitiva, con la cual se garantiza la prestación del servicio público de Energía identificado con el contrato NIC 1391762.

Se programó el recibo por parte del Ministerio del Interior los días 29 y 30 de mayo de 2025, para la suscripción del acta de recibo y entrega del bien (anexo 26), pero desafortunadamente por hechos ajenos a la supervisión (problemas de orden público en la zona y cierre de la vía que conduce al municipio) no se pudo llegar al municipio de Curumaní y por lo tanto, no se pudo realizar el recibo.

Se reprograma la visita de recibo para junio de 2025.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

04/10/2023	22/11/2023	20/03/2024	14/11/2024	12/12/2024	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ING. VITERBO GOMEZ CARVAJAL Supervisor Convénio Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**ARQ. EDWIN ANDRES TORRES ANGEL** Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON

Outlook

CARACTER PRORITARIO - Citación No. 4 a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021...

Organizer	Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Hora de la reunión	Este evento ocurrió el Hace 1 mes (Vie 09/05/2025, 'de' 14:00 a 14:30)
Ubicación	Reunión de Microsoft Teams
Mi respuesta	Aún no respondido
Asistentes necesarios	585_ALC, Jaime Luis Berdugo Perez, planeacion curumani-cesar.gov.co, Viterbo Gomez Carvajal
Asistentes opcionales	Diana Carolina Guerra Urbina, Hermes Mauricio Guarnizo Lopera
Mensaje enviado	Lun 05/05/2025 14:03

Bogotá D.C.

HERMES MARTINEZ URSULA
Alcalde
Municipio de Curumani - Departamento del Cesar
Calle 7 # 15-104
despacho@curumani-cesar.gov.co

JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO
Supervisor del Convenio por el Municipio
Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal
planeacion@curumani-cesar.gov.co

ASUNTO: CARACTER PRORITARIO - Citación a reunión virtual No. 4 en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación- Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.

REF.: Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, Curumani - Cesar.

Cordial saludo,

En atención a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR"*, la supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, convoca a reunión virtual con CARACTER PRIORITARIO con el propósito de realizar el seguimiento frente al avance de los hechos que motivaron la 3a suspensión de convenio. En ese sentido, se alerta sobre la finalización del plazo del convenio está pactado para el 30/05/2025.

Dicho lo anterior, se solicita de la conexión a través de la plataforma Teams por parte de la Entidad Territorial y a su vez, hacer extensiva la presente convocatoria al representante legal de las firmas contratista de obra e interventoría, bajo la siguiente información:

Datos de la reunión:
Fecha: 08/05/2025
Hora: 11:00 a.m.

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?

Unirse a la reunión ahora

Id. de reunión: 249 720 739 341 0

Código de acceso: 76un6Rd2

Para organizadores: Opciones de la reunión

Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR

Privacidad y seguridad

Outlook

Modelos de acta de inventario y manual de operación y mantenimiento.

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 12/05/2025 10:36
Para planeacion curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>
CC Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

2 archivos adjuntos (8 MB)
2. INVENTARIO DEL BIEN OK.pdf; 15. Manual de Operación y Mantenimiento.pdf;

Cordial saludo, remito modelos de acta de inventario y manual de operación y mantenimiento. Lo anterior para ser considerado al momento de la elaboración del documento de entrega del proyecto.

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Edwin Andrés Torres Angel
edwin.torres@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Remisión Acta de Reunión virtual 09-05-2025 convenio 1592-2021 Curumani-Cesar

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 12/05/2025 10:43
Para planeacion curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>
CC juridica@curumani-cesar.gov.co <juridica@curumani-cesar.gov.co>; ID20450 <hacienda@curumani-cesar.gov.co>; Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (738 KB)
anexo-7-acta-de-reunion-de-seguimiento-a-la-ejecucion-contractual-vr04 Curumani 09 mayo 2025.pdf;

Cordial saludo, por medio del presente remitimos el Acta de Reunión del asunto realizada el 09 de mayo de 2025 por Microsoft Teams, solicitamos dar estricto cumplimiento a los compromisos y devolver firmada en medio digital.

Gracias.

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Edwin Andrés Torres Angel
edwin.torres@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

ACTA No.	5
FECHA	09-05-2025
CIUDAD	Virtual Microsoft Teams
No. CONTRATO y/o CONVENIO	1592 de 2021
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	99%
MOTIVO:	**Reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021:** Terminación de los pendientes de obra evidenciados en visita realizada en noviembre 14 de 2024, conexión eléctrica definitiva y último desembolso del convenio.

PARTES

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Nombre: Viterbo Gómez Carvajal Cargo: Grupo de Supervisión Ministerio del Interior	Nombre: Numis Cárcamo Cargo: Apoyo a la Supervisión Municipio de Curumaní
Nombre: Edwin Andrés Torres Angel Cargo: Profesional de Apoyo a la Supervisión Ministerio del Interior	Nombre: Eduardo Manzano Cargo: secretario de Planeación Municipio de Curumaní
N.A.	Nombre: Heráclito Torres Cargo: Asesor Jurídico Municipio de Curumaní

DESARROLLO DE LA REUNION

Contexto: El convenio finaliza el 30 de mayo de 2025. No se ha verificado la terminación de los pendientes de obra evidenciados en la visita del 14 de noviembre de 2024 puesto que no existe el último informe de interventoría. El proyecto Sacúdete al Parque aún no tiene conexión eléctrica definitiva. Se reprogramó el último desembolso del convenio para 2025 a solicitud del municipio.

Desarrollo:

1. **Inicio y Grabación:** Se inició la reunión y se informó que la sesión estaba siendo grabada.
2. **Revisión de Documentación Pendiente:** Se procedió a revisar los documentos pendientes para el recibo del proyecto, recordando que el Convenio finaliza el 30 de mayo de 2025. Se identificaron 9 documentos faltantes.
3. **Listado de Documentos Faltantes:**
   - Acta de recibo del proyecto de satisfacción por parte de la supervisión del municipio a la interventoría.
   - Certificado de conexión eléctrica definitiva.
   - Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles (específico para el proyecto).
   - Acta de inventario por espacio (se acordó enviar un modelo de referencia).
   - Manual de operación y mantenimiento.
   - Planos récord.
   - Publicación de los informes en SECOP II (se verificará la publicación).
   - Informes financieros de los pagos hasta por $1.000.000.000 millones y falta la legalización total de $162.000.000.
4. **Discusión sobre el Convenio y Posible Incumplimiento:** Se discutió sobre las acciones a seguir debido a la falta de documentación y la proximidad de la fecha de finalización del Convenio (30 de mayo). Se mencionó la audiencia de incumplimiento programada para el 21 de mayo.
5. **Compromisos y Acciones:**

- Se solicitará un oficio por parte del municipio con el estado actual de los documentos y el posible incumplimiento para ser presentado a las oficinas de Hacienda y Jurídica del municipio.
- Se acordó realizar una nueva reunión con la presencia del alcalde para buscar compromisos y soluciones.
- Edwin Andres Torres Angel se comprometió a enviar un modelo de acta de inventario y de manual de operación y mantenimiento.
- Numis Alejandra enviará los correos electrónicos de las oficinas de Jurídica y Hacienda para la citación a la próxima reunión.

6. **Cierre:** Se dio por terminada la reunión, quedando pendiente la programación de la próxima reunión y el envío de la documentación acordada.

Compromisos Específicos:

- Edwin Andres Torres Angel: Enviar modelos de acta de inventario y manual de operación y mantenimiento.
- Numis Alejandra Cárcamo: Enviar los correos electrónicos de las oficinas de Jurídica y Hacienda.
- **Municipio de Curumaní:** Enviar la documentación faltante a la mayor brevedad posible y gestionar la participación del alcalde en la próxima reunión.

Cierre:

- Se da por terminada la reunión, agradeciendo a los asistentes por su participación y reiterando la importancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Conforme a la revisión de documentación de recibo en la presente reunión se procede a realizar el listado de chequeo de la documentación pendiente:

DOCUMENTO DE ENTREGA	SI	NO	OBSERVACION
1. Acta final firmada por todos los profesionales, con sus respectivas sábanas de actividades ejecutadas (ACTA FINAL DE OBRA). (Contratista Obra, Contratista Interventoría de obra y supervisión del Municipio).	X		
2. Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la interventoría al contratista de obra, firmada por los siguientes profesionales (Contratista de Interventoría y contratista de obra).	X		
3. Acta de recibo del proyecto a satisfacción por parte de la supervisión del municipio al contratista de interventoría, firmada por los siguientes profesionales (supervisor del Municipio y contratista de interventoría).		X	**FALTA CERTIFICADO.**
4. Certificado de conexión eléctrica definitiva. (empresa de energía).		X	**FALTA CERTIFICADO.**
5. Certificado de la empresa prestadora del servicio de energía en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE.		X	**FALTA CERTIFICADO.**
6. Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del supervisor del convenio.	X		
7. Certificado de que la obra se encuentra ejecutada al 100% del contratista de obra e interventoría de obra.	X		

8. Certificado conexión acueducto y alcantarillado.	X		
9. Certificado de garantía y calidad de los juegos infantiles.		X	**FALTA QUE CERTIFIQUE QUE LOS JUEGOS SON PARA EL PROYECTO SACUDETE CURUMANI (SAN ROQUE)**
10. Certificado de garantía y calidad de los equipos de gimnasio.	X		
11. Certificado grama sintética.	X		
12. Actualización de póliza cargada y aprobada por el Ministerio en SECOP II según última actuación (séptima prórroga).	X		
13. Acta final de cantidades y presupuesto.	X		
14. Acta de Inventario por Espacios del SACUDETE.		X	**NO ANEXARON EL DOCUMENTO REQUERIDO**
15. Manual de Operación y Mantenimiento del SACUDETE y las Llaves de los espacios cerrados.		X	**FALTA EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.**
16. Planos récord en PDF firmados por el supervisor del convenio, el contratista de obra y el interventor de obra.		X	**FALTAN LOS PLANOS RECORD.**
17. Informe final de interventoría y todos los informes semanales de interventoría ordenados cronológicamente.	X		
18. Registro fotográfico en medio magnético.	X		
19. Informe final de la supervisión del Municipio.	X		
a. Informes mensuales de supervisión completos y ordenados cronológicamente debidamente publicados en la plataforma SECOPII.		X	**FALTAN PUBLICACIÓN EN SECOPII.**
20. Certificación RETIE.	X		
21. Certificación RETILAP.	X		
22. Informe financiero Final por parte de tesorero Municipal con sus soportes (comprobantes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).		X	**FALTAN TODOS LOS INFORMES (ordenes de egreso, órdenes de pago, extractos bancarios y certificación de rendimientos financieros).**

En resumen, los documentos que hacen falta son los que se relacionan en el cuadro anterior, pero los más relevantes son:

Certificados y Actas:

- Certificado de conexión eléctrica definitiva.
- Acta de recibo de satisfacción de interventoría.

- Certificado de garantía de los juegos infantiles.

Informes y Planos:

- Informes mensuales de supervisión publicados en SECOPII.
- Planos récord de construcción y registro fotográfico desde el inicio hasta la finalización de la obra.

Informe Financiero Final:

- Informe financiero final junto con comprobantes de pago, órdenes de egreso, extractos bancarios, y certificación de rendimientos financieros.

Conclusión: El municipio debe entregar la documentación completa para que el Ministerio del Interior programe el recibo del proyecto.

Fecha de nueva reunión: a convenir para que se cumpla la asistencia del alcalde.


COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
Municipio de Curumaní	Entrega de la documentación pendiente para recibo del proyecto	Posible fecha 19/05/2025
Supervisión Ministerio del Interior	Enviar modelos de acta de inventario y manual de operación y mantenimiento.	09/05/2025

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Ministerio del Interior	Contratista/Convenido
Firma Nombre: Viterbo Gómez Carvajal Cargo: Grupo de Supervisión Ministerio del Interior	Firma Nombre: Eduardo Manzano Cargo: secretario de Planeación - Municipio de Curumaní
Firma Nombre: Edwin Andrés Torres Angel Cargo: Profesional de Apoyo a la Supervisión Mininterior	Firma Nombre: Numis Cárcamo Cargo: Apoyo a la Supervisión - Municipio de Curumaní
N.A.	**NO SE PRESENTA** Firma Nombre: Heráclito Torres Cargo: Asesor Jurídico - Municipio de Curumani

Anexos: Listado de asistencia a través de Microsoft Teams.

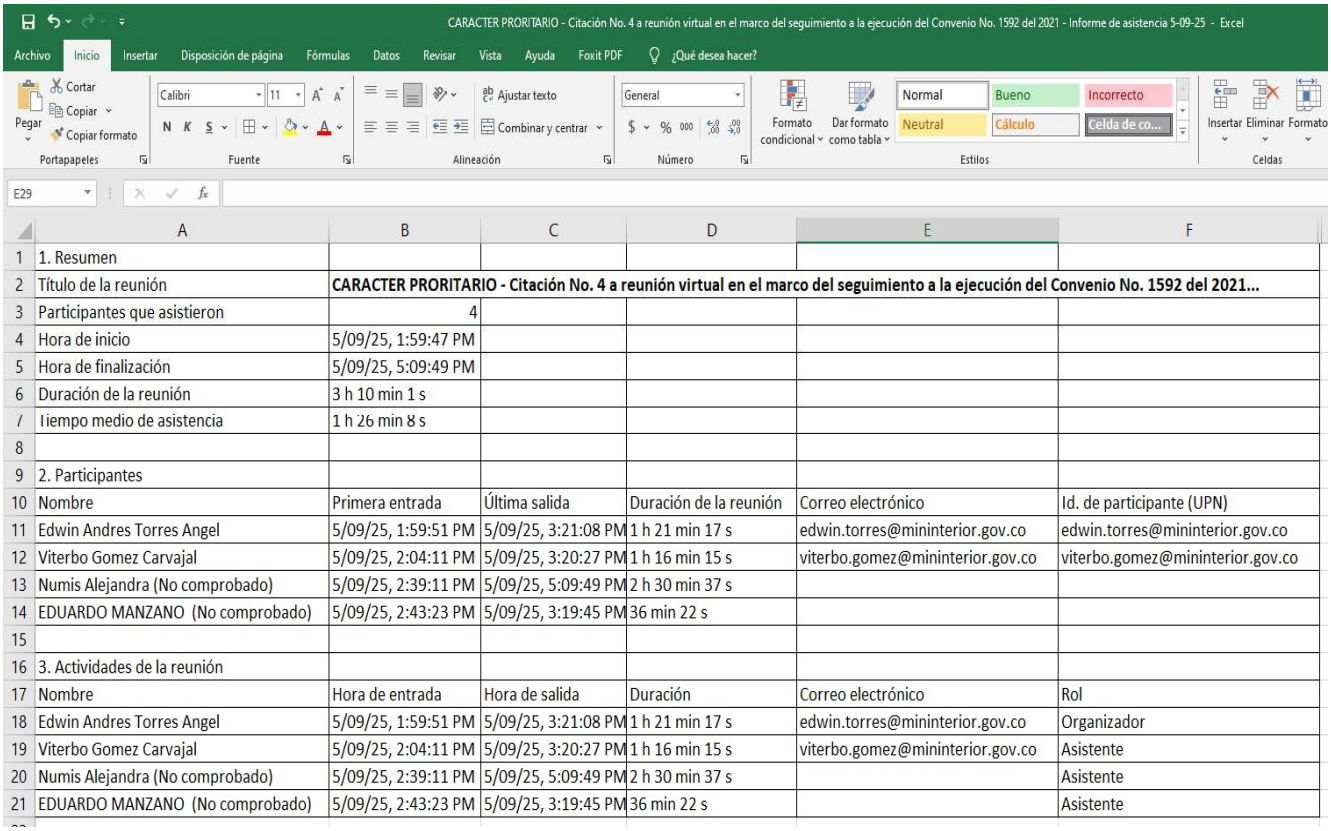

CARACTER PRORITARIO - Citación No. 4 a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021 - Informe de asistencia 5-09-25 - Excel

	A	B	C	D	E	F
1	1. Resumen					
2	Título de la reunión	**CARACTER PRORITARIO - Citación No. 4 a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución del Convenio No. 1592 del 2021...**				
3	Participantes que asistieron	4				
4	Hora de inicio	5/09/25, 1:59:47 PM				
5	Hora de finalización	5/09/25, 5:09:49 PM				
6	Duración de la reunión	3 h 10 min 1 s				
7	Tiempo medio de asistencia	1 h 26 min 8 s				
8						
9	2. Participantes					
10	Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)
11	Edwin Andres Torres Angel	5/09/25, 1:59:51 PM	5/09/25, 3:21:08 PM	1 h 21 min 17 s	edwin.torres@mininterior.gov.co	edwin.torres@mininterior.gov.co
12	Viterbo Gomez Carvajal	5/09/25, 2:04:11 PM	5/09/25, 3:20:27 PM	1 h 16 min 15 s	viterbo.gomez@mininterior.gov.co	viterbo.gomez@mininterior.gov.co
13	Numis Alejandra (No comprobado)	5/09/25, 2:39:11 PM	5/09/25, 5:09:49 PM	2 h 30 min 37 s		
14	EDUARDO MANZANO (No comprobado)	5/09/25, 2:43:23 PM	5/09/25, 3:19:45 PM	36 min 22 s		
15						
16	3. Actividades de la reunión					
17	Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
18	Edwin Andres Torres Angel	5/09/25, 1:59:51 PM	5/09/25, 3:21:08 PM	1 h 21 min 17 s	edwin.torres@mininterior.gov.co	Organizador
19	Viterbo Gomez Carvajal	5/09/25, 2:04:11 PM	5/09/25, 3:20:27 PM	1 h 16 min 15 s	viterbo.gomez@mininterior.gov.co	Asistente
20	Numis Alejandra (No comprobado)	5/09/25, 2:39:11 PM	5/09/25, 5:09:49 PM	2 h 30 min 37 s		Asistente
21	EDUARDO MANZANO (No comprobado)	5/09/25, 2:43:23 PM	5/09/25, 3:19:45 PM	36 min 22 s		Asistente

Copia: Subdirección de Gestión Contractual

Outlook

Remisión Acta de Reunión virtual 09-05-2025 convenio 1592-2021 Curumani-Cesar

Desde Edwin Andres Torres Angel <edwin.torres@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 12/05/2025 10:43
Para planeacion curumani-cesar.gov.co <planeacion@curumani-cesar.gov.co>
CC juridica@curumani-cesar.gov.co <juridica@curumani-cesar.gov.co>; ID20450 <hacienda@curumani-cesar.gov.co>; Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (738 KB)
anexo-7-acta-de-reunion-de-seguimiento-a-la-ejecucion-contractual-vr04 Curumani 09 mayo 2025.pdf;

Cordial saludo, por medio del presente remitimos el Acta de Reunión del asunto realizada el 09 de mayo de 2025 por Microsoft Teams, solicitamos dar estricto cumplimiento a los compromisos y devolver firmada en medio digital.

Gracias.

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Edwin Andrés Torres Angel
edwin.torres@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 21557448
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **1391762**

Total a Pagar: **$ 1.853.420**
Total Mes: **$485.510**
Fecha de pago oportuno: **23/04/2025**

No. Facturas vencidas: **3**
Saldo anterior: **$ 1.367.910**
Fecha emisión: **09/04/2025**
Documento equivalente No.: **77322504003423**
ID. de Cobros: **1391762006 - 79**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
MUNICIPIO DE CURUMAN

Usuario o suscriptor
MUNICIPIO DE CURUMAN

Estrato/Clasificación
Ofi (Sencilla Niv.1) Caribe

Dirección de suministro
CL 4 CR 9–51
SAN JOSE (LOS PIOJITOS)
CURUMANI
SACUDETE

Dirección de Envío
CL 7 15–104
CENTRO
CURUMANI
CURUMANI

Resumen facturación mes

Periodo facturado 06/03/2025 - 04/04/2025

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 443.860		$ 0,00	$ 41.650,00	$ 0,00		$ 485.510

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **24/04/2025**


El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



0	0	0	355	396	430	413

Promedio Consumo Diario (kWh): 13,12

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



317

Documento equivalente electrónico

N. factura: 77322504003423
Fecha: 2025-04-10
Hora: 01:50:36-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 6a80b155c89c509d2e11683528eec243bc642752c723539538144884dd10f12a39cf9e64e0e9baacb552298360d02a435

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **1391762**

ID de Cobro: 1391762006 - 79 / Titular: MUNICIPIO DE CURUMAN

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
3	$ 1.853.420

(415)7709998169074(8020)139176200607 20(3900)0001853420(96)20250423

00000000000003561 - 7732 - 0002 - 1030 - 010437

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **3** Monto: **$1.367.910** Fecha Ultimo Pago: **31/12/2999** Monto: **$0**

No. Financiaciones pendientes: **1** Monto: **$492.001** Tasa por mora vigente: **1,92%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **1391762**

Total a Pagar: **$ 1.853.420**

Total Mes: **$485.510**

Fecha de pago oportuno: **23/04/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: SAN ROQUE (CESAR) **CODIGO: 65774905** **GRUPO CALIDAD: 32**

DIUG.: 0360,00 **FIUG.: 0** **DIU.: 0014,13** **FIU.: 19**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **06/03/2025** Fecha Lectura Actual: **04/04/2025** Días Facturados **29**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
23158300	Activa BT	1594	1181	1	413

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	329,11
T:	56,28
PR:	147,85
R:	32,78
D:	222,01
C:	220,51
CU:	1.008,54

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	1.008,54	x	413	416.527,02
			Total	416.527

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	416.527,02
Aproximacion a decenas	2,98
Cuota Acuerdo Energia	27.334,00
Aproximacion a decenas	-4,00
Subtotal Energía	$ 443.860

Otras Entidades

Impuesto Alumbrado Público.	41.652,70
Redondeo Facturaciones Ante	-4,29
Aproximación a decenas	1,59
Valor Total Alumbrado	,00

Subtotal otras entidades $ 41.650

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Los tacos o breakers protegen toda tu vivienda.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- Aleja instalaciones y aparatos eléctricos del agua.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago CESAR

Pagos en línea PSE : https://www.afinia.com.co/

Opción pago en línea

Efecty
Supergiros
Coofinep Winred
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
DELTEC

INTEGRALES
DELTEC Cesar Norte
FSCR Cesar Sur – Magdalena

Municipios Magdalena: Nueva granda, Algarrobo, Sabanas de san ángel, Ariguani (el difícil)

F_11881_PDF_12:28:13:319_12APR2025

El suscrito Gerente Territorial Cesar CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP

CERTIFICA:

Que el predio identificado con No. Catastral No. 02-01-0095-0005-000, con dirección **Calle 4 No. 9-51**, en donde funciona el proyecto **SACUDETE AL PARQUE del Corregimiento de San Roque** cuenta con la conexión eléctrica definitiva con la cual se garantiza la prestación del servicio Publicos de Energia identificado en nuestro Sistema de Gestion Comercial con el contrato **NIC 1391762**

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Valledupar a los veintiséis días (26) días del mes de mayo del año Dos Mil Veinticinco (2025).

Cordialmente,

JORGE ALBERTO RIVERO CUADRO
Gerente Territorial Cesar

Consecutivo No.20241227074400045890
27/12/2024

Señor (a):

Email:

ASUNTO: Petición No. 00045890

Estimado señor (a):
En atención a su escrito presentado en nuestro centro de atención presencial el 13 de JUNE de 2024, en el que solicita un nuevo servicio, al respecto le informamos lo siguiente:

Se procedió a generar el expediente P77322024120001 y orden de servicio No. 71067355, la cual fue ejecutada el día 11 de DECEMBER de 2024, se instaló medidor No. 23158300 quedando el servicio normalizado. De igual manera, se le asignó como identificación de contrato para el predio ubicado en la calle 4 n 9 51 NIC 1391762 y el cual debe citar para cualquier tipo de petición, queja o reclamo.

Le recordamos que el objeto del presente Contrato de Condiciones Uniformes que se inicia entre las partes es el de la distribución y comercialización de energía eléctrica, por la cual Caribe Mar De La Costa S.A.S., prestará sus servicios a sus clientes, en condiciones de calidad y eficiencia, a cambio de una remuneración monetaria, de acuerdo con el régimen tarifario vigente.

En consecuencia, el cliente, con la solicitud del servicio, acepta las normas, derechos, obligaciones, tarifas y condiciones uniformes que regulan la prestación del servicio de energía eléctrica o que hayan sido fijadas por Caribe Mar De La Costa S.A.S. para regular la relación con sus clientes y, por lo tanto, se obliga al cumplimiento de todas y cada una de ellas.

Es importante agregar que el Artículo 144 de la Ley 142 de 1994, indica que el costo de la reposición e instalación de la acometida, medidores y accesorios será por cuenta del usuario o suscriptor.

Por lo anterior, le informamos que se accede a su petición.

Esperamos con lo anterior haber atendido de la mejor manera su petición.

Para mayor información acerca de esta respuesta usted puede comunicarse con nuestro Call Center marcando el No ☎ **115** de una línea fija o (605) 3500444 desde cualquier operador móvil, Oficina virtual accediendo desde la página www.energíacaribemar.co

Cordialmente,



Kelly Yaneth Valera Cotes

Responsable Provisión de Servicio

Una filial del
Grupo EPM
Tu nuevo prestador del servicio de energía
Nit: 901.380.949-1
CARIBEMAR S.A.S E.S.P.

ACTA DE REVISION E INSTALACION ELECTRICA
MEDIDA DIRECTA

CIUDAD	CGTO SAN ROQUE	Acta No.	71067355

No. ORDEN	CODIGO O/S	TIPO O/S	NIC	TIPO CLIENTE
71067355	TO154	INSPECCI?N NORMALIZACI?N	0000003	

USUARIO / CLIENTE	DIRECCION	BARRIO	GEOLOCALIZACION
MUNICIPIO DE CURUMANI	CL 4 NO. CR 9 51	SAN JOSE (LOS PIOJITOS)	9.2934423,-73.51727

M.T.	C.T.	CARGA CONTRATADA	TECNICO	FECHA	HORA INIC	HORA FIN
00000	00000	3000 VA	Cesar Andres Barcinilla Martinez	2024-12-11	09:36:23	09:49:00

DATOS DEL MEDIDOR ENCONTRADO EN EL INMUEBLE

NUMERO	MARCA	T. MEDIDOR	No. FASES	DIGITOS	Kd	Kh	RANGO CTE.	LECTURA
				0			0	0

SELLOS

ENCONTRADOS		INSTALADOS		
UBICACION	SERIE	SERIE	TIPO	OBSERVACION
OBSERVACIONES:		202263739	SELLO ROTOSEAL TRANSPAREN	bornera
		202263740	SELLO ROTOSEAL TRANSPAREN	caja
		100629874		En Nuevo Medidor
		100629875		En Nuevo Medidor

A los 11 del mes de Diciembre del año 2024 siendo las 09:36:23 se hacen presentes en el inmueble identificado comercialmente con el NIC 0000003 la siguiente persona Cesar Andres Barcinilla Martinez del asociado comercial FSCR INTEGRAL - CESAS en representación de CARIBEMAR S.A.S E.S.P. y en presencia del Sr. (de la Sra.) SE NIEGA A FIRMAR, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. no en calidad de cliente / usuario con el fin de efectuar una revisión de los equipos de medida e instalaciones eléctricas del inmueble con el NIC indicado. Habiéndose identificado los empleados / contratistas informan al usuario de su derecho a solicitar asesoría y/o participación de un técnico particular. Si el usuario/cliente no hace uso de este derecho se procederá por Ley a adelantar la revisión técnica programada.

El cliente/usuario solicita la asesoria y/o participacion de un tecnico particular? Si / No **NO**

PRUEBAS REALIZADAS AL MEDIDOR INICIALMENTE ENCONTRADO EN EL INMUEBLE

CUADRO DE CALCULO DEL FACTOR DE PRUEBA POR ALTA								CUADRO DE CALCULO DEL FACTOR DE PRUEBA POR BAJA				
FASE	VOLTAJE F-N (V)	VOLTAJE F-F (V)	VOLTAJE N-T (V)	CTE FASE (A)	CTE F+N (A)	TIEMPO (>60 Seg)	VUELTAS (>4)	VOLTAJE (V)	CORRIENTE (A)	TIEMPO (120s)	VUELTAS	TOTAL
R												
S								GIRO NORMAL				
T								HAY ROZAMIENTO				
TOTAL								MEDIDOR SE FRENA				
FAC. DE PRUEBA		R		S		T						

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MEDIDOR

CONEXIONES	PRUEBAS PUENTES	CONTINUIDAD	DISPLAY	ESTADO DEL INTEGRADOR	REQUIERE. REV. DE LABORATORIO

CENSO DE CARGA

EQUIPO CONECTADO	W / Un	CANTIDAD	TOTAL (W)
OTROS EQUIPOS			

TOTAL CENSO	0.0 Kilovatios

MEDIDOR ENVIADO A LABORATORIO	NO

NOTA: En caso de detectarse una(s) irregularidad(es) en terreno y/o laboratorio, esta acta se constituye en una prueba documental de lo encontrado en el inmueble identificado en este formato.

En caso de que la Empresa recomiende la revisión del medidor en laboratorio, se procederá a retirarlo temporalmente y lo enviara a un laboratorio acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Una vez el laboratorio realice la revisión, se le informará el resultado de las pruebas. Si el medidor es NO CONFORME, para la conexión y/o el registro de la medida, Usted dispone de un periodo de facturación (30 dias calendario) a partir de la fecha de este reporte para adquirir con el proveedor que Usted elija los equipos y materiales indicados en esta acta; para lo cual deberá cumplir con las normas técnicas exigidas por la Empresa. Pasado este periodo sin que Usted haya tomado los correctivos, la Empresa podrá hacerlo por cuenta del usuario y se cargara en su factura de energía (Ver Articulo 144 de la Ley 142 de 1994).

NORMALIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

SE CAMBIO MEDIDOR	NUMERO(SERIE)	MARCA	LABORATORIO	PROTOCOLO
SI	23158300	CDM N13U01	onac	3264890
TIPO	**LECTURA**	**DIGITOS**	**NUMERO FASES**	**RANGO CORRIENTE**
ACTIVA	2	6	BIF?SICO 6	1 A

TRABAJOS EJECUTADOS

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION

1	AV094	X VERIF. DATOS SUMINISTROTPOS
2	AV398	FACTIBILIDAD PEQUENA OBRA CON MEDIDOR
3	AV097	X VERIF. DATOS AMARRETPOS
4	AV292	TOMA DE DATOS TIPO DE CONEXION Y TRANSFORMADOR (OBLIGATORIO)
5	AV043	INST. COMPLETA SUMINISTRO MD
6	AV344	SIN IRREGULARIDAD VISBLE MEDIDOR NO ENVIADO A LABORATORIO

MATERIAL INSTALADO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COBRABLE
1	1465070	ANCLAJE ACOMETIDA BT C/GANCHO ACERO	2	SI
2	1916209	CABLE AL CONCENTRICO 2X6+6 600V	9	SI
3	1464735	CAJA POLICARBONATO MED TIPO 3 Y 4	1	SI
4	1475368	CINTA DE 3/4MM ACERO INOXIDABLE	4	SI
5	1465067	HEBILLA ACERO INOX. PARA CINTA 3/4MM	2	SI
6	1692450	MEDIDOR E2DD 220V 100A 60HZ A10R20.ST.B	1	SI
7	2000017	SELLO ROTOSEAL TRANSPARENTE	2	NO
8	1465077	OJO DE ALUMINIO P/ANCLAJE DE ACOMETIDA	2	SI

CONTROL OPERACIONAL

OBSERVACIONES

VS: FECHA: 11/12/2024 09:36:23 ACTA: 71067355 TECNICO: Cesar Andres Barcinilla Martinez ; PREDIO: Ocupado - Con energía; ATENDIÓ: se niega a firmar ; ; VM: MEDIDOR # LECTURA: 0 , CT: 00000 MT: 00000, ; DA: se normaliza servicio instalando medidor 23158300 sellos 202263739. 740 acometida de 220v 9 metros 2 anclaje 2 ojos de aluminio 4 metros de cinta bandi 2 hebillas 1 caja 3y4 ; RD1: ; CMX: ; RI: ;

¿Usuario firma? **NO**

¿La orden es anómala? **NO**

¿Se entrego carta de visita posterior? **NO**

OBSERVACIONES FIRMAS


Motivo: Usuario no quiso firmar

SOPORTE FOTOGRAFICO


1_1733927771480




VS_TRAFO

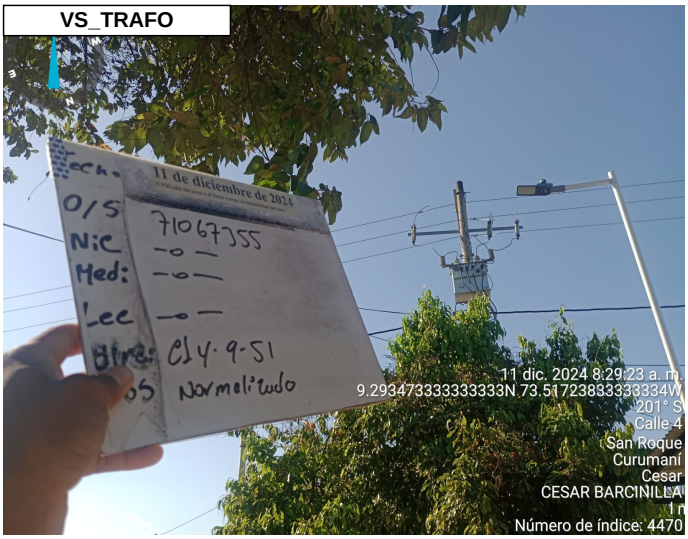


VS_

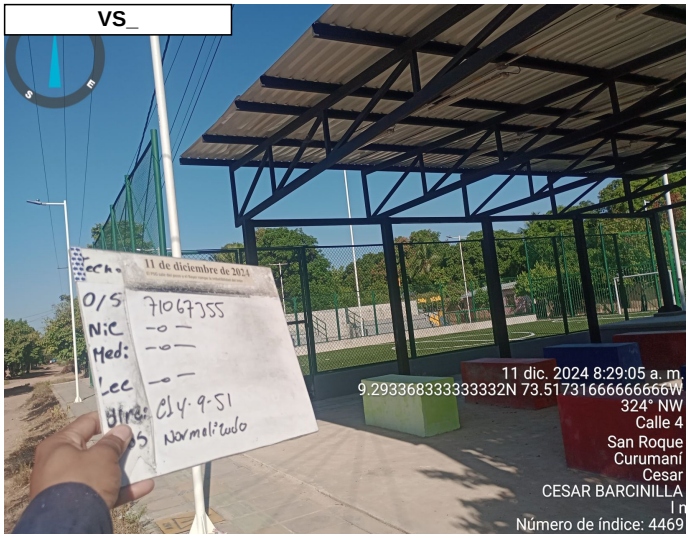


VM_

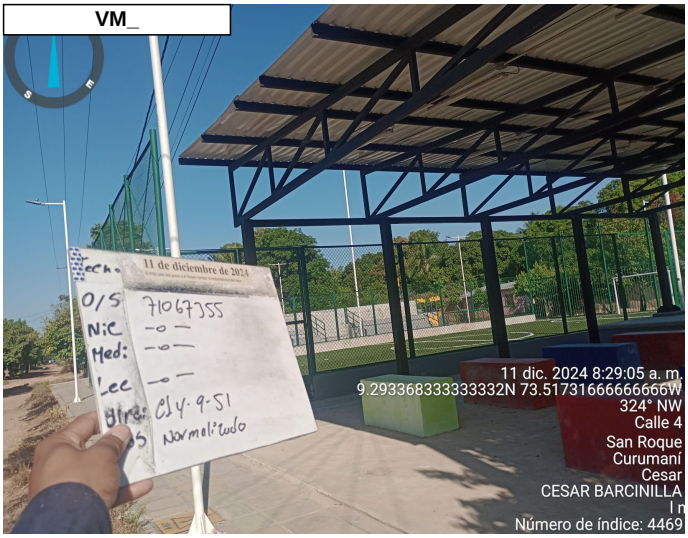

DA_

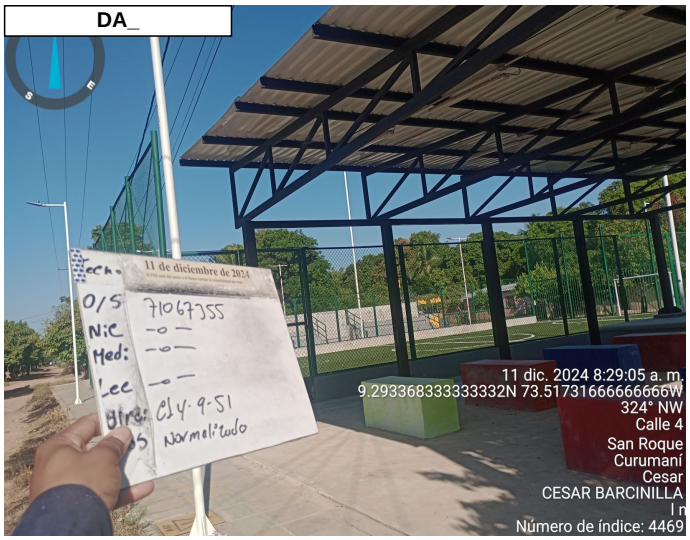


RD1_

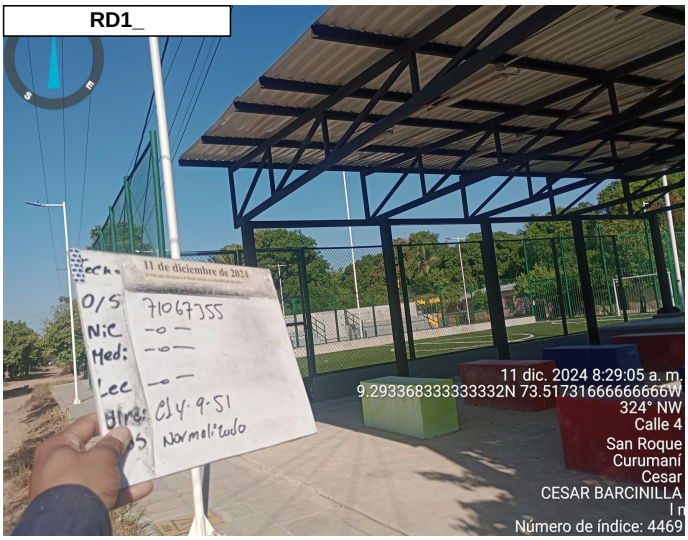


CMX_1733928255383



6_RESGUARDO

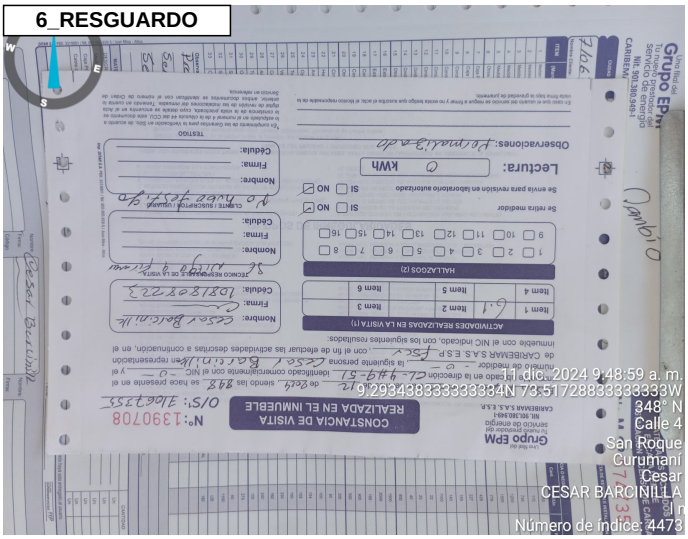

6_RESGUARDO

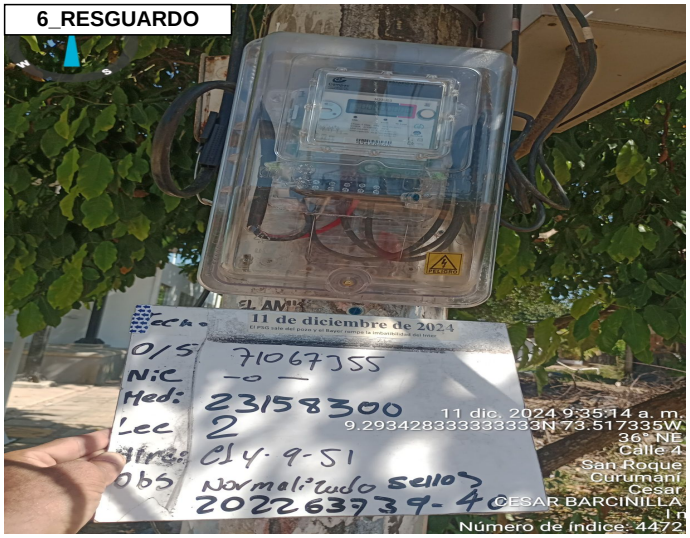

FIRMAS

NOMBRE:	se niega a firmar
FIRMA:	
C.C. No:	no

CLIENTE / SUSCRIPTOR / USUARIO

NOMBRE:	Cesar Andres Barcinilla Martinez
FIRMA:	
C.C. No:	1081808223
CODIGO	13

TECNICO

FIRMA BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO

NOMBRE:	no hubo testigos
FIRMA:	
C.C. No:	no

TESTIGO

Generado con SIPREM

ACTA DE REANUDACION No.	3
FECHA DEL ACTA	27/05/2025
CIUDAD	Bogotá, D.C.
CONTRATO/CONVENIO No.	1592 de 2021

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

FECHA DE SUSPENSION	27/03/2025
TIEMPO DE SUSPENSION	Dos (2) meses
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO/CONVENIO	Cuatro (4) días
FECHA DE REANUDACIÓN	27/05/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30/05/2025

MOTIVOS DE REINICIO DEL CONTRATO/CONVENIO

El 27 de mayo de 2025 se suscribe el acta de reanudación del convenio No.1592 de 2021 entre el Municipio de Curumaní - Cesar y el Ministerio del Interior- FONSECON, cumpliendo así con los términos de tiempo establecidos en la suspensión No.3.

Previamente, el 30 de abril de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior verificó la instalación del medidor de energía No. 23158300, basándose en la información proporcionada por el municipio de Curumaní-Cesar, dicha información incluía el Acta de Revisión e Instalación Eléctrica del 12 de noviembre de 2024 y un comunicado de AFINIA S.A.S. (No. 20241227074400045890 del 27 de diciembre de 2024) que confirmaba la normalización del servicio.

Finalmente, el municipio de Curumaní-Cesar aportó el Certificado de Conexión Eléctrica con NIC No. 1391762 del 26 de mayo de 2025, el cual se adjunta a la presente acta para su corroboración. Esto indica que los motivos que originaron la suspensión No.3 se han superado, debido a que AFINIA S.A.S. completó la conexión eléctrica definitiva y la instalación del medidor de energía eléctrica.

Con la suscripción de la presente acta de reanudación, el contratista/convenido se compromete a la modificación de la garantía correspondiente, de acuerdo con la nueva vigencia de los amparos respectivos, de acuerdo con lo previsto en el Manual de Contratación del Ministerio.

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales.

Firma Supervisor
VITERBO GOMEZ CARVAJAL
Supervisor del Convenio
Ministerio del Interior
C.C. 91.494.257

Firma alcalde
HERMES FERNANDO MARTÍNEZ URSULA
Alcalde municipal
Municipio de Curumaní - Cesar
C.C. 1.064.714.000

ALCALDÍA DE CURUMANÍ	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **1592**, MUNICIPIO DE **CURUMANI**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **ABRIL DE 2025**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TÉCNICO, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Corregimiento de San Roque Municipio de Curumaní-Cesar.		
BENEFICIARIO:	Municipio de Curumaní-Cesar		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.250.000.000)
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		Para la ejecución del proyecto, aporta un lote de su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado proyecto.
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 1.250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-09-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31/05/2021	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30/08/2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA	**DESDE:** 5 de diciembre de 2024	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO	18-12-2023	4-12-2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	Arq. NUMIS CARCAMO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 42021	2021-08-19	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.		
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	AA058523	26-10-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	11-06-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	1 PRÓRROGA	**FECHA:** 31/10/2022	
	2 PRÓRROGA	**FECHA:** 31/12/2022	
	3 PRÓRROGA	**FECHA:** 30/04/2023	
	4 PRÓRROGA	**FECHA:** 31/08/2023	
	5 PRÓRROGA	**FECHA:** 28/02/2024	
	SUSPENSION (solicitud el 23 de febrero de 2024)	**FECHA:** 27/02/2024 (114 días)	

	REINICIO (Acta No. 1)	**FECHA:** 20/06/2024
6 PRÓRROGA	Solicitud de ampliación o prórroga (solicitud el 5 de junio de 2024)	**FECHA:** 30/08/2024
7 PRÓRROGA	Solicitud de ampliación o prórroga (solicitud el 5 de diciembre de 2024)	**FECHA:** 30/03/2025
PRÓRROGA REPROGRAMACION DE RECURSOS		**FECHA:** 30/03/2025
SOLICITUD DE SUSPENSION	El día 19 de marzo se solicita suspensión por 60 días.	**FECHA: Hasta el 31 de mayo**
PÓLIZA No. AA058523 SEGÚN ACTUACIÓN	**FECHA:** 11/05/2022 – 1/05/2023	
	FECHA: 1/10/2022 – 31/07/2023	
(Vigencia nueva del amparo) **EQUIDAD SEGUROS**	**FECHA:** 13/10/2022 – 30/11/2023	
	FECHA: 30/04/2023 – 31/03/2024	
	FECHA: 31/08/2023 – 31/08/2024	
	FECHA: 20/12/2024 – 30/09/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.332.872,42	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.666.436,21	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$ 0.	
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.306,83	
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.384,55	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 0	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	12-11-2021	$375.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito.	NO APLICA	30-11-2021	$375.000.000,00
TERCER DESEMBOLSO	Del 20% del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIOl equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance	20%	30-06-2023	$250.000.000

	C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP			
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	%	DD/MM/AAAA	$
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 1.000.000.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
AA058523	Cumplimiento	$ 254.195.002,34	31/08/2023	31/08/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: LPMC 004-2021	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR		$ 1.124.991.871,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28337&g-recaptcha-response=03AGdBq25TAwMVwL0OT-JytFybeOj8CltYOps-iUIaRI-oI4y6fT8mDbaUf6H9HOc9FbMwKnWawdVYnccP1QEbEoV9trJYOdQT5LTUmdEOXDgeR0kbK4pzpFHrH1h9Q-UOMSADX2OJKnYuaD3_7Krz18e6Vc6zvRJKQqlVaRsAGYApWr2vqgNWrkpMdh9fK8O_148Wahg8ll6YRRLfO87bnKMhOcZz9K07YAl8r96qlySJQ2GMu7pby5Vpmaz9IQ1FcavQl4BGLHUFVMuqM5EcsUn7ujRkrg_Y5iWhXj6Urd-REN6YJeLx8uyRhFRJSE7hv2TeL0vgERhthzlZtj_yMKvk3g9CTOGKliMSV6zMI7DB2JAVC7KXCu6V6lGqPl4jaQl-9zzsvp0PIVIMXHUgyi56tLSaBVrdEPrzg8Glo4xayOLkl2vLDzjBnjFCPb0nI7W7ITYUVF-ER3N_ZdqR_oaTm7tcpjp5bw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	**OTRO –SI MODIFICATORIO No.001** **Para adicionar en valor:** VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS		**$ 20.975.011,72 (valor adicional)**
	23/08/2022		$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio Sacúdete San Roque Nit: 901.557.178-1		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**24 de febrero de 2022**		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI MODIFICATORIO 1	MODIFICANDO LA FORMA DE PAGO	
	OTROSI MODIFICATORIO 2	31/10/2022	

	OTROSI MODIFICATORIO 3		31/12/2022	
	OTROSI MODIFICATORIO 4		15/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 5		30/04/2023	
	OTROSI MODIFICATORIO 6		15/06/2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	**20-08-2022**	**Fecha Actual de terminación del contrato**		**15-08-2023**
SUSPENSION 1	19 de mayo de 2023			Ver anexo
REINICIO 1	19 de julio de 2023			Ver anexo
VALOR TOTAL CONTRATADO:				**$ 1.145.966.883,00**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No.	**11-44-101183457**
Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 31 de mayo de 2023
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No.	**11-40-101045846**

Ciudad y fecha de expedición	Bogotá, 29 de junio de 2023		
TIPO DE AMPARO	**COBERTURA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 229.193.376,60	20/01/2022 – 15/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 16.665.022,00	20/07/2022 – 20/07/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	20%	$ 229.193.376,60	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 57.298.344,15	20/01/2022 – 15/06/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 343.790.064,90	Ampara 5 años a partir del acta de entrega a satisfacción de la obra
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	$ 337.497.561,30	20/01/2022 – 15/06/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	300 SMMLV	$ 300.000.000	20/01/2022 – 15/06/2023

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
No. del contrato: CMA 002-2021	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ - CESAR	$ 124.973.282,35
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12524021&g-recaptcha-response=03AGdBq26MGM-gvX23l2AlqhALu7L3suCHFkX4zbsY4y2wVxxoGUk9ubtKCFf0YplhDOlcRvq9HgdEzFvwiBQuvrji9UMPE4ZL88z0FJfD_8UFu_uUY6V56wdMdhv4SZombKQ6K6cfXU6AqZzpTDeTMknak9d61-xNVzy4xPxndQKlZIoVkTavnBQX-OpxwMArdxNyuC1wDtfJzPPwvu2DkgZ98gzurhOmXUp_bNZlVeVR0AZiF9C9ppPj0n97V4bU3aeiOJyLbolorflnju1p_MHVY8fj3CWh5	

	kybSvJwwvsMM5OISpwsNBNS6NRg3PBDF_TiRjewA6huvUwzqGCKE8TC2opT4nnPWWdT9sEVZDpSu63WdtDMkp-QlNuqUYpXF1cNF0oV0KPgsWbKTxKwXmPaTSsE54kWVvvTtDy7Yn6MdZWzI_eR-1sOhTOy9ePe4cRMo3x1ds4A10s8sJo5YGR3kmPJuyBTMw		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A		$ 0,00
	N/A		$ 0,00
Nombre contratista	Consorcio CSC Sacúdete Curumaní Nit: 901.557.688-6		
Fecha de Acta de inicio del contrato	**24 de febrero de 2022**		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA 1	31/10/2022	
	PRÓRROGA 2	31/12/2022	
	PRÓRROGA 3	15/04/2023	
	PRÓRROGA 4	30/04/2023	
	PRÓRROGA 5	15/06/2023	
SUSPENSION 1	19 DE MAYO	**REINICIO:** 19 DE JULIO DE 2023	
Fecha Inicial de terminación del contrato	21/08/2022	**Fecha Actual de terminación del contrato**	15/08/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 124.973.282,35
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**ZURICH SEGURO S.A**		
PÓLIZA No.	**SGPL-26867290-1**		
FECHA DE LA PÓLIZA	8 de febrero de 2022		
	Barranquilla - Atlántico		

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra***

CONTRATO DE OBRA No. 092 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	**100%**
AVANCE FISICO EJECUTADO:	**100%**
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	**$ 1.062.641.773,96** (COMPONENTE OBRA)
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	**$ 1.145.966.882,72** (ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA)
OBSERVACIONES:	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 093 de 2022	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100 %
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 124.973.282,35
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$ 41.657.590,03 (pago estudios y diseños)
OBSERVACIONES:	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
8 de ABRIL	Citación a reunión virtual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021, suscrito entre la Nación-Ministerio del Interior – FONSECON con el municipio de Curumaní / Cesar.	
24 de ABRIL	Citación a reunión virtual en el marco del seguimiento a la ejecución contractual del Convenio Interadministrativo No. 1592 del 2021.	

FECHA OFICIO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE

- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO
HERMES F. MARTINEZ U.	Alcalde municipal

- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	FECHA	VALOR	AMORTIZADO
1	Estudios y diseños	341	4 de abril de 2022	$ 83.325.108,96	
2	Anticipo 30%	828	15 de junio de 2022	$337.497.561.30	
3	Acta parcial de pago No. 1	1840	Diciembre de 2022	$ 432.208.914,01	$129.314.971,65
4	Acta parcial de pago No. 2		Julio de 2023	$ 198.500.592,04	$ 59.204.061,56

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	Durante este mes de abril se hacen todas las gestiones necesarias para obtener el certificado de conexión eléctrica definitiva por parte de AFINIA y así mismo el certificado de la empresa prestadora del servicio de energía (AFINIA) en la cual garantiza la prestación del servicio definitivo de energía al SACUDETE. **El 24 de abril del 2025 por correo electrónico la empresa de energía AFINIA remite documentación de conexión final sobre el predio NIC 1391762 ubicado en la calle 4 No 9-51 del Corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní.** **El 24 de abril durante la reunión, se acordó que para el día 30 del mismo mes se enviaría una segunda parte de la documentación requerida por parte de la supervisión del convenio; por lo cual el día 30 de abril se envía por correo electrónico al ministerio del interior:** **- Informes semanales de interventoría (2022,2023)** **- Acta final con actividades ejecutadas** **- Garantía de la grama sintética de san roque** **- Registro fotográfico del proyecto** **- Certificado de conexión eléctrica definitiva**	**EJECUTADO**	**100%**
	OBSERVACIONES:		

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	Se ha tenido demoras en la entrega de la certificación de conexión eléctrica final por parte de la empresa de energía – **Afinia** y la terminación de los planos récord y manual de operación y mantenimiento por parte del contratista.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

16/04/2025	16/04/2025				

8. SUPERVISOR

HERMES FERNANDO MARTINEZ URSULA SUPERVISOR	**JESUS EDUARDO MANZANO PORTILLO** APOYO A LA SUPERVISION **NUMIS ALEJANDRA CARCAMO CAMACHO** APOYO A LA SUPERVISION

Se Anexan ( ) Folios

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1592 DEL 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE ENERO DE 2025
MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

PROYECTO (S): Estudios diseño y construcción del proyecto Sacudete al parque Tipo 1, opción 1 en el corregimiento de San Roque, del municipio de Curumaní – Cesar

CUENTA (AHORROS) No.: 29725056093 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 0,00**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	12/11/2021	GIRO 1	$ 375.000.000,00
	30/11/2021	GIRO 2	$ 375.000.000,00
	30/06/2023	GIRO 3	$ 250.000.000,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.000.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 29725056093 A LA FECHA 31 DE ENERO DE 2025			**$ 1.000.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
092	CONSORCIO SACUDETE SAN ROQUE	$ 1,124,991,871.00	$ 0.00	$ 1,124,991,871.00
093	CONSORCIO CSC SACUDETE CURUMANI	$ 124,973,282.35	$ 0.00	$ 124,973,282.35
	TOTAL CONTRATADO			**$ 1,249,965,153.35**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
092	ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	369	341	4/04/2022	$ 69.495.942,96		$ 69.495.942,96
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO DE DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 092-2022 PARA REMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	875	828	15/06/2022	$ 337.497.561,30		$ 337.497.561,30
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/10/2022	$ 13.829.166,00		$ 13.829.166,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/11/2022	$ 8.208.966,00		$ 8.208.966,00
092	DEVOLUCION TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/12/2022	-$ 8.208.966,00		-$ 8.208.966,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	1958	1840		$ 229.536.537,79		$ 229.536.537,79
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			27/02/2023	$ 73.009.702,00		$ 73.009.702,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	928	956	27/07/2023	$ 105.422.234,43		$ 105.422.234,43
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/08/2023	$ 33.528.180,00		$ 33.528.180,00
092	PASIVO EXIGIBLE DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: *REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUN	1243	1282	8/08/2024	$ 34.463.778,00		$ 34.463.778,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			5/11/2024	$ 7.193.812,00		$ 7.193.812,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 903.976.914,48**	**$ 0,00**	**$ 903.976.914,48**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
20/11/2021	$ 73.794,42
30/11/2021	$ 10.254,43
31/12/2021	$ 317.956,79
31/01/2022	$ 318.091,62
28/02/2022	$ 287.424,45
31/03/2022	$ 318.348,28
30/04/2022	$ 282.550,35
31/05/2022	$ 289.144,01
30/06/2022	$ 224.334,97
31/07/2022	$ 116.974,99
31/08/2022	$ 117.014,64
30/09/2022	$ 1.047.403,66
31/10/2022	$ 113.478,28
30/11/2022	$ 108.943,12
31/12/2022	$ 103.979,97
31/01/2023	$ 26.341,33
28/02/2023	$ 22.264,52
31/03/2023	$ 2.582,63
30/04/2023	$ 2.499,60
31/05/2023	$ 2.583,11
30/06/2023	$ 5.482,01
31/07/2023	$ 88.534,75
31/08/2023	$ 43.790,30
30/09/2023	$ 34.920,20
31/10/2023	$ 36.093,21
30/11/2023	$ 34.937,69
31/12/2023	$ 36.111,36
31/01/2024	$ 36.120,51
29/02/2024	$ 33.798,50
31/03/2024	$ 18.067,97
30/04/2024	$ 17.487,34
31/05/2024	$ 18.072,52
30/06/2024	$ 17.491,72
31/07/2024	$ 18.077,04
31/08/2024	$ 14.680,02
30/09/2024	$ 13.248,71
31/10/2024	$ 13.692,05
30/11/2024	$ 12.512,91
31/12/2024	$ 12.778,85
31/01/2025	$ 12.780,49
TOTAL (3)	**$ 4.304.643,32**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1592 DEL 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 28 DE FEBRERO DE 2025
MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

PROYECTO (S): Estudios diseño y construcción del proyecto Sacudete al parque Tipo 1, opción 1 en el corregimiento de San Roque, del municipio de Curumani – Cesar

CUENTA (AHORROS) No.: 29725056093 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 1.250.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
12/11/2021	GIRO 1	$ 375.000.000,00
30/11/2021	GIRO 2	$ 375.000.000,00
30/06/2023	GIRO 3	$ 250.000.000,00
	GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.000.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 29725056093 A LA FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 **$ 1.000.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
092	CONSORCIO SACUDETE SAN ROQUE	$ 1.124.991.871,00	$ 0,00	$ 1.124.991.871,00
093	CONSORCIO CSC SACUDETE CURUMANI	$ 124.973.282,35	$ 0,00	$ 124.973.282,35
	TOTAL CONTRATADO			**$ 1.249.965.153,35**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
092	ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	369	341	4/04/2022	$ 69.495.942,96		$ 69.495.942,96
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO DE DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 092-2022 PARA REMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	875	828	15/06/2022	$ 337.497.561,30		$ 337.497.561,30
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/10/2022	$ 13.829.166,00		$ 13.829.166,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/11/2022	$ 8.208.966,00		$ 8.208.966,00
092	DEVOLUCION TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/12/2022	-$ 8.208.966,00		-$ 8.208.966,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NUMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	1958	1840		$ 229.536.537,79		$ 229.536.537,79
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			27/02/2023	$ 73.009.702,00		$ 73.009.702,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NUMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	928	956	27/07/2023	$ 105.422.234,43		$ 105.422.234,43
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/08/2023	$ 33.528.180,00		$ 33.528.180,00
092	PASIVO EXIGIBLE DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUN	1243	1282	8/08/2024	$ 34.463.778,00		$ 34.463.778,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			5/11/2024	$ 7.193.812,00		$ 7.193.812,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 903.976.914,48**	**$ 0,00**	**$ 903.976.914,48**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
20/11/2021	$ 73.794,42
30/11/2021	$ 10.254,43
31/12/2021	$ 317.956,79
31/01/2022	$ 318.091,62
28/02/2022	$ 287.424,45
31/03/2022	$ 318.348,28
30/04/2022	$ 282.550,35
31/05/2022	$ 289.144,01
30/06/2022	$ 224.334,97
31/07/2022	$ 116.974,99
31/08/2022	$ 117.014,64
30/09/2022	$ 1.047.403,66
31/10/2022	$ 113.478,28
30/11/2022	$ 108.943,12
31/12/2022	$ 103.979,97
31/01/2023	$ 26.341,33
28/02/2023	$ 22.264,52
31/03/2023	$ 2.582,63
30/04/2023	$ 2.499,60
31/05/2023	$ 2.583,11
30/06/2023	$ 5.482,01
31/07/2023	$ 88.534,75
31/08/2023	$ 43.790,30
30/09/2023	$ 34.920,20
31/10/2023	$ 36.093,21
30/11/2023	$ 34.937,69
31/12/2023	$ 36.111,36
31/01/2024	$ 36.120,51
29/02/2024	$ 33.798,50
31/03/2024	$ 18.067,97
30/04/2024	$ 17.487,34
31/05/2024	$ 18.072,52
30/06/2024	$ 17.491,72
31/07/2024	$ 18.077,04
31/08/2024	$ 14.680,02
30/09/2024	$ 13.248,71
31/10/2024	$ 13.692,05
30/11/2024	$ 12.512,91
31/12/2024	$ 12.778,85
31/01/2025	$ 12.780,49
28/02/2025	$ 11.545,05
TOTAL (3)	$ 4.316.188,37

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.000.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 903.976.914,48**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 4.316.188,37

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 4.316.188,37**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 100.339.273,89**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

JANIS LEONOR DAZA TORRES
Secretaria de Hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1592 DEL 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO DE 2025
MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

PROYECTO (S): Estudios diseño y construcción del proyecto Sacudete al parque Tipo 1, opción 1 en el corregimiento de San Roque, del municipio de Curumaní – Cesar

CUENTA (AHORROS) No.: 29725056093 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 1.250.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.250.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
12/11/2021	GIRO 1	$ 375.000.000,00
30/11/2021	GIRO 2	$ 375.000.000,00
30/06/2023	GIRO 3	$ 250.000.000,00
	GIRO 4	$ 0.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.000.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 29725056093 A LA FECHA 31 DE MARZO DE 2025 **$ 1.000.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
092	CONSORCIO SACUDETE SAN ROQUE	$ 1.124.991.871,00	$ 0,00	$ 1.124.991.871,00
093	CONSORCIO CSC SACUDETE CURUMANI	$ 124.973.282,35	$ 0,00	$ 124.973.282,35
	TOTAL CONTRATADO			**$ 1.249.965.153,35**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
092	ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	369	341	4/04/2022	$ 69.495.942,96		$ 69.495.942,96
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO DE DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 092-2022 PARA REMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	875	828	15/06/2022	$ 337.497.561,30		$ 337.497.561,30
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/10/2022	$ 13.829.166,00		$ 13.829.166,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/11/2022	$ 8.208.966,00		$ 8.208.966,00
092	DEVOLUCION TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/12/2022	-$ 8.208.966,00		-$ 8.208.966,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	1958	1840		$ 229.536.537,79		$ 229.536.537,79
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			27/02/2023	$ 73.009.702,00		$ 73.009.702,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	928	956	27/07/2023	$ 105.422.234,43		$ 105.422.234,43
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/08/2023	$ 33.528.180,00		$ 33.528.180,00
092	PASIVO EXIGIBLE DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUN	1243	1282	8/08/2024	$ 34.463.778,00		$ 34.463.778,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			5/11/2024	$ 7.193.812,00		$ 7.193.812,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 903.976.914,48**	**$ 0,00**	**$ 903.976.914,48**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
20/11/2021	$ 73.794,42
30/11/2021	$ 10.254,43
31/12/2021	$ 317.956,79
31/01/2022	$ 318.091,62
28/02/2022	$ 287.424,45
31/03/2022	$ 318.348,28
30/04/2022	$ 282.550,35
31/05/2022	$ 289.144,01
30/06/2022	$ 224.334,97
31/07/2022	$ 116.974,99
31/08/2022	$ 117.014,64
30/09/2022	$ 1.047.403,66
31/10/2022	$ 113.478,28
30/11/2022	$ 108.943,12
31/12/2022	$ 103.979,97
31/01/2023	$ 26.341,33
28/02/2023	$ 22.264,52
31/03/2023	$ 2.582,63
30/04/2023	$ 2.499,60
31/05/2023	$ 2.583,11
30/06/2023	$ 5.482,01
31/07/2023	$ 88.534,75
31/08/2023	$ 43.790,30
30/09/2023	$ 34.920,20
31/10/2023	$ 36.093,21
30/11/2023	$ 34.937,89
31/12/2023	$ 36.111,36
31/01/2024	$ 36.120,51
29/02/2024	$ 33.798,50
31/03/2024	$ 18.067,97
30/04/2024	$ 17.487,34
31/05/2024	$ 18.072,52
30/06/2024	$ 17.491,72
31/07/2024	$ 18.077,04
31/08/2024	$ 14.680,02
30/09/2024	$ 13.248,71
31/10/2024	$ 13.692,05
30/11/2024	$ 12.512,91
31/12/2024	$ 12.778,85
31/01/2025	$ 12.780,49
28/02/2025	$ 11.545,05
31/03/2025	$ 12.783,59
TOTAL (3)	**$ 4.328.971,96**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1592 DEL 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE ABRIL DE 2025
MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

PROYECTO (S): Estudios diseño y construcción del proyecto Sacudete al parque Tipo 1, opción 1 en el corregimiento de San Roque, del municipio de Curumani – Cesar

CUENTA (AHORROS) No.: 29725056093

DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO $ 1.250.000.000,00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
12/11/2021	GIRO 1	$ 375.000.000,00
30/11/2021	GIRO 2	$ 375.000.000,00
30/06/2023	GIRO 3	$ 250.000.000,00
	GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 1.000.000.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 29725056093 A LA FECHA 30 DE ABRIL DE 2025 $ 1.000.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
092	CONSORCIO SACUDETE SAN ROQUE	$ 1.124.991.871,00	$ 0,00	$ 1.124.991.871,00
093	CONSORCIO CSC SACUDETE CURUMANI	$ 124.973.282,35	$ 0,00	$ 124.973.282,35
	TOTAL CONTRATADO			$ 1.249.965.153,35

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
092	ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	369	341	4/04/2022	$ 69.495.942,96		$ 69.495.942,96
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO DE DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 092-2022 PARA REMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	875	828	15/06/2022	$ 337.497.561,30		$ 337.497.561,30
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/10/2022	$ 13.829.166,00		$ 13.829.166,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/11/2022	$ 8.208.966,00		$ 8.208.966,00
092	DEVOLUCION TRASLADO DE ESTAMPILLAS			6/12/2022	-$ 8.208.966,00		-$ 8.208.966,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NUMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	1958	1840		$ 229.536.537,79		$ 229.536.537,79
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			27/02/2023	$ 73.009.702,00		$ 73.009.702,00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NUMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	928	956	27/07/2023	$ 105.422.234,43		$ 105.422.234,43
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/08/2023	$ 33.528.180,00		$ 33.528.180,00
092	PASIVO EXIGIBLE DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUN	1243	1282	8/08/2024	$ 34.463.778,00		$ 34.463.778,00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			5/11/2024	$ 7.193.812,00		$ 7.193.812,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 903.976.914,48	$ 0,00	$ 903.976.914,48

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
20/11/2021	$ 73.794,42
30/11/2021	$ 10.254,43
31/12/2021	$ 317.956,79
31/01/2022	$ 318.091,62
28/02/2022	$ 287.424,45
31/03/2022	$ 318.348,28
30/04/2022	$ 282.550,35
31/05/2022	$ 289.144,01
30/06/2022	$ 224.334,97
31/07/2022	$ 116.974,99
31/08/2022	$ 117.014,64
30/09/2022	$ 1.047.403,66
31/10/2022	$ 113.478,28
30/11/2022	$ 108.943,12
31/12/2022	$ 103.979,97
31/01/2023	$ 26.341,33
28/02/2023	$ 22.264,52
31/03/2023	$ 2.582,63
30/04/2023	$ 2.499,60
31/05/2023	$ 2.583,11
30/06/2023	$ 5.482,01
31/07/2023	$ 88.534,75
31/08/2023	$ 43.790,30
30/09/2023	$ 34.920,20
31/10/2023	$ 36.093,21
30/11/2023	$ 34.937,69
31/12/2023	$ 36.111,36
31/01/2024	$ 36.120,51
29/02/2024	$ 33.796,50
31/03/2024	$ 18.067,97
30/04/2024	$ 17.487,34
31/05/2024	$ 18.072,52
30/06/2024	$ 17.491,72
31/07/2024	$ 18.077,04
31/08/2024	$ 14.680,02
30/09/2024	$ 13.248,71
31/10/2024	$ 13.692,05
30/11/2024	$ 12.512,91
31/12/2024	$ 12.778,85
31/01/2025	$ 12.780,49
28/02/2025	$ 11.545,05
31/03/2025	$ 12.783,59
30/04/2025	$ 12.372,75
TOTAL (3)	$ 4.341.344,71

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) $ 1.000.000.000,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 903.976.914,48

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 4.341.344,71

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 4.341.344,71

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) $ 100.364.430,23

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

JANIS LEONOR DAZA TORRES
Secretaria de Hacienda

*SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/03/31 HASTA: 2025/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 15 104

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	100,352,057.48	*SALDO PROMEDIO*	$	100,352,469
TOTAL ABONOS	$	12,372.75	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,372.75
SALDO ACTUAL	$	100,364,430.23	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			12,372.75	100,364,430.23

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 15 104

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	100,339,273.89	*SALDO PROMEDIO*	$	100,339,685
TOTAL ABONOS	$	12,783.59	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,783.59
SALDO ACTUAL	$	100,352,057.48	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			12,783.59	100,352,057.48

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 15 104

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	100,327,728.84	*SALDO PROMEDIO*	$	100,328,140
TOTAL ABONOS	$	11,545.05	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	11,545.05
SALDO ACTUAL	$	100,339,273.89	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			11,545.05	100,339,273.89

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 15 104

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	100,314,948.35	*SALDO PROMEDIO*	$	100,315,360
TOTAL ABONOS	$	12,780.49	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,780.49
SALDO ACTUAL	$	100,327,728.84	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			12,780.49	100,327,728.84

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/11/30 HASTA: 2024/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 15 104

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	100,302,169.50	*SALDO PROMEDIO*	$	100,302,581
TOTAL ABONOS	$	12,778.85	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,778.85
SALDO ACTUAL	$	100,314,948.35	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			12,778.85	100,314,948.35

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/10/31 HASTA: 2024/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 15 104

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	107,483,468.59	*SALDO PROMEDIO*	$	101,490,883
TOTAL ABONOS	$	12,512.91	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	7,193,812.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	12,512.91
SALDO ACTUAL	$	100,302,169.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,208.56	107,485,677.15
6/11	PAGO A PROV MUNICIPIO CURUMANI			-7,193,812.00	100,291,865.15
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			10,304.35	100,302,169.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/09/30 HASTA: 2024/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	107,469,776.54	*SALDO PROMEDIO*	$	107,470,218
TOTAL ABONOS	$	13,692.05	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13,692.05
SALDO ACTUAL	$	107,483,468.59	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			13,692.05	107,483,468.59

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/08/31 HASTA: 2024/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	107,456,527.83	*SALDO PROMEDIO*	$	107,456,969
TOTAL ABONOS	$	13,248.71	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13,248.71
SALDO ACTUAL	$	107,469,776.54	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			13,248.71	107,469,776.54

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,905,625.81	*SALDO PROMEDIO*	$	115,227,625
TOTAL ABONOS	$	14,680.02	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	34,463,778.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14,680.02
SALDO ACTUAL	$	107,456,527.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,082.23	141,909,708.04
8/08	PAGO A PROV CONSORCIO CSC SACU			-34,463,778.00	107,445,930.04
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			10,597.79	107,456,527.83
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,887,548.77	*SALDO PROMEDIO*	$	141,888,131
TOTAL ABONOS	$	18,077.04	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,077.04
SALDO ACTUAL	$	141,905,625.81	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			18,077.04	141,905,625.81

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,870,057.05	*SALDO PROMEDIO*	$	141,870,640
TOTAL ABONOS	$	17,491.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	17,491.72
SALDO ACTUAL	$	141,887,548.77	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			17,491.72	141,887,548.77

ok

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,851,984.53	*SALDO PROMEDIO*	$	141,852,567
TOTAL ABONOS	$	18,072.52	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,072.52
SALDO ACTUAL	$	141,870,057.05	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			18,072.52	141,870,057.05

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/03/31 HASTA: 2024/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 0000202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,834,497.19	*SALDO PROMEDIO*	$	141,835,080
TOTAL ABONOS	$	17,487.34	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	17,487.34
SALDO ACTUAL	$	141,851,984.53	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			17,487.34	141,851,984.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,816,429.22	*SALDO PROMEDIO*	$	141,817,012
TOTAL ABONOS	$	18,067.97	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	18,067.97
SALDO ACTUAL	$	141,834,497.19	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			18,067.97	141,834,497.19

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,782,630.72	*SALDO PROMEDIO*	$	141,783,795
TOTAL ABONOS	$	33,798.50	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	33,798.50
SALDO ACTUAL	$	141,816,429.22	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			33,798.50	141,816,429.22

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,746,510.21	*SALDO PROMEDIO*	$	141,747,675
TOTAL ABONOS	$	36,120.51	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	36,120.51
SALDO ACTUAL	$	141,782,630.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			36,120.51	141,782,630.72

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR 202280

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,710,398.85	*SALDO PROMEDIO*	$	141,711,563
TOTAL ABONOS	$	36,111.36	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	36,111.36
SALDO ACTUAL	$	141,746,510.21	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			36,111.36	141,746,510.21

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/10/31 HASTA: 2023/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,675,461.16	*SALDO PROMEDIO*	$	141,676,626
TOTAL ABONOS	$	34,937.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	34,937.69
SALDO ACTUAL	$	141,710,398.85	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			34,937.69	141,710,398.85

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,639,367.95	*SALDO PROMEDIO*	$	141,640,531
TOTAL ABONOS	$	36,093.21	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	36,093.21
SALDO ACTUAL	$	141,675,461.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			36,093.21	141,675,461.16

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	141,604,447.75	*SALDO PROMEDIO*	$	141,605,611
TOTAL ABONOS	$	34,920.20	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	34,920.20
SALDO ACTUAL	$	141,639,367.95	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			34,920.20	141,639,367.95

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	175,088,837.45	*SALDO PROMEDIO*	$	171,849,487
TOTAL ABONOS	$	43,790.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	33,528,180.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	43,790.30
SALDO ACTUAL	$	141,604,447.75	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			40,298.75	175,129,136.20
29/08	PAGO A PROV MUNICIPIO CURUMANI			-33,528,180.00	141,600,956.20
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			3,491.55	141,604,447.75
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	280,422,537.13	*SALDO PROMEDIO*	$	266,833,205
TOTAL ABONOS	$	88,534.75	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	105,422,234.43	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	88,534.75
SALDO ACTUAL	$	175,088,837.45	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			82,778.54	280,505,315.67
28/07	PAGO A PROV consorcio sacudete			-105,422,234.43	175,083,081.24
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			5,756.21	175,088,837.45
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	30,417,055.12	*SALDO PROMEDIO*	$	38,750,652
TOTAL ABONOS	$	250,005,482.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,482.01
SALDO ACTUAL	$	280,422,537.13	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,416.61	30,419,471.73
30/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			250,000,000.00	280,419,471.73
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,065.40	280,422,537.13
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	30,414,472.01	*SALDO PROMEDIO*	$	30,414,555
TOTAL ABONOS	$	2,583.11	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,583.11
SALDO ACTUAL	$	30,417,055.12	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			2,583.11	30,417,055.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ANULADO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	30,411,972.41	*SALDO PROMEDIO*	$	30,412,055
TOTAL ABONOS	$	2,499.60	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,499.60
SALDO ACTUAL	$	30,414,472.01	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,499.60	30,414,472.01

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	30,409,389.78	*SALDO PROMEDIO*	$	30,409,472
TOTAL ABONOS	$	2,582.63	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,582.63
SALDO ACTUAL	$	30,411,972.41	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2,582.63	30,411,972.41

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	103,396,827.26	*SALDO PROMEDIO*	$	98,184,222
TOTAL ABONOS	$	22,264.52	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	73,009,702.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	22,264.52
SALDO ACTUAL	$	30,409,389.78	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			22,097.90	103,418,925.16
27/02	PAGO A PROV MUNICIPIO CURUMANI			-73,009,702.00	30,409,223.16
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			166.62	30,409,389.78
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	103,370,485.93	*SALDO PROMEDIO*	$	103,371,335
TOTAL ABONOS	$	26,341.33	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	26,341.33
SALDO ACTUAL	$	103,396,827.26	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			26,341.33	103,396,827.26

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero


Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SACUDETE AL PARQUE
CL 7 14 105
CURUMANI CESAR

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 29725056093
SUCURSAL AGUACHICA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	324,594,077.75	*SALDO PROMEDIO*	$	309,292,136
TOTAL ABONOS	$	8,312,945.97	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	229,536,537.79	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	103,979.97
SALDO ACTUAL	$	103,370,485.93	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			17,741.87	324,611,819.62
6/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			8,208,966.00	332,820,785.62
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			83,689.30	332,904,474.92
29/12	PAGO A PROV consorcio sacudete			-229,536,537.79	103,367,937.13
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,548.80	103,370,485.93
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	332,694,100.63	*SALDO PROMEDIO*	$	332,157,257
TOTAL ABONOS	$	108,943.12	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	8,208,966.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	108,943.12
SALDO ACTUAL	$	324,594,077.75	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			101,846.64	332,795,947.27
29/11	PAGO A PROV MUNICIPIO CURUMANI			-8,208,966.00	324,586,981.27
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			7,096.48	324,594,077.75
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	346,409,788.35	*SALDO PROMEDIO*	$	334,830,673
TOTAL ABONOS	$	113,478.28	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,829,166.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	113,478.28
SALDO ACTUAL	$	332,694,100.63	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			18,934.30	346,428,722.65
6/10	PAGO A PROV MUNICIPIO CURUMANI			-13,829,166.00	332,599,556.65
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			94,543.98	332,694,100.63
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

SALDO ANTERIOR	$	345,362,384.69	*SALDO PROMEDIO*	$	345,702,676
TOTAL ABONOS	$	1,047,403.66	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	113,379.85
SALDO ACTUAL	$	346,409,788.35	*RETEFUENTE*	$	.00

20/09	ABONO INTERESES AHORROS			75,514.38	345,437,899.07
21/09	PAGO DE PROV CCA ALIANZA FIDU			934,023.81	346,371,922.88
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			37,865.47	346,409,788.35
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

SALDO ANTERIOR	$	345,245,370.05	*SALDO PROMEDIO*	$	345,249,145
TOTAL ABONOS	$	117,014.64	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	117,014.64
SALDO ACTUAL	$	345,362,384.69	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN				
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			117,014.64	345,362,384.69

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	345,128,395.06	*SALDO PROMEDIO*	$	345,132,168
TOTAL ABONOS	$	116,974.99	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	116,974.99
SALDO ACTUAL	$	345,245,370.05	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	MOTIVO	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			116,974.99	345,245,370.05

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

SALDO ANTERIOR	$	682,401,621.39	*SALDO PROMEDIO*	$	569,972,115
TOTAL ABONOS	$	224,334.97	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	337,497,561.30	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	224,334.97
SALDO ACTUAL	$	345,128,395.06	*RETEFUENTE*	$	.00

20/06	ABONO INTERESES AHORROS			186,609.55	682,588,230.9
21/06	PAGO A PROV fondo abierto alia			-337,497,561.30	345,090,669.6
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			37,725.42	345,128,395.0
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

SALDO ANTERIOR	$	682,112,477.38	*SALDO PROMEDIO*	$	682,121,804
TOTAL ABONOS	$	289,144.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	289,144.01
SALDO ACTUAL	$	682,401,621.39	*RETEFUENTE*	$	.00

31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			✓289,144.01	682,401,621.39

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

SALDO ANTERIOR	$	751,325,869.99	*SALDO PROMEDIO*	$	688,816,673
TOTAL ABONOS	$	282,550.35	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	69,495,942.96	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	282,550.35
SALDO ACTUAL	$	682,112,477.38	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN			VALOR	SALDO
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			30,815.07	751,356,685.06
4/04	PAGO A PROV consorcio sacudete			-69,495,942.96	681,860,742.10
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			251,735.28	682,112,477.38
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	751,007,521.71	*SALDO PROMEDIO*	$	751,017,790
TOTAL ABONOS	$	318,348.28	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	318,348.28
SALDO ACTUAL	$	751,325,869.99	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			318,348.28	751,325,869.99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	750,720,097.26	*SALDO PROMEDIO*	$	750,730,362
TOTAL ABONOS	$	287,424.45	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	287,424.45
SALDO ACTUAL	$	751,007,521.71	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			287,424.45	751,007,521.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/12/31 HASTA: 2022/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093

SUCURSAL AGUACHICA

[redacted]

Evolucionamos nuestra imagen



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

[redacted]	$	[redacted]	SALDO PROMEDIO	$	750,412,266
[redacted]	$	[redacted]	CUENTAS X COBRAR	$	.00
[redacted]	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	318,091.62
[redacted]	$	[redacted]	RETENCIÓN	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
[redacted]	ABONO INTERESES AHORROS EXTRACTO DE CUENTA			✓318,091.62	750,720,697.[redacted]

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	750,084,048.85	*SALDO PROMEDIO*	$	750,094,305
TOTAL ABONOS	$	317,956.79	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	317,956.79
SALDO ACTUAL	$	750,402,005.64	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			317,956.79	750,402,005.64

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	250,005,261
TOTAL ABONOS	$	750,084,048.85	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	84,048.85
SALDO ACTUAL	$	750,084,048.85	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			375,000,000.00	375,000,000.00
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			73,794.42	375,073,794.42
30/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			375,000,000.00	750,073,794.42
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			10,254.43	750,084,048.85
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 29725056093


SUCURSAL AGUACHICA

SACUDETE AL PARQUE

CL 7 14 105

CURUMANI CESAR

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

AGRESSAN

29 de mayo
Hora: 5:50 am

REPORTE

CESAR

1. **Bloqueo Vía Nacional San Roque - La Paz, km 72**

Vía Nacional, perímetro Rural del corregimiento de Casacara, sector Cementerio Central.

2. **Rió de oro: Vía Nacional San Alberto - La Mata.**

- **Ubicación:** km 44 + 400, sector los Alpes, finca la Pola.
- **Estado:** Cierre total de la vía.
- **Motivo:** Campesinos de la Zona," quienes bloquean la Vía atravesando ramas en este punto, al apoyo a la consulta popular y reformas sociales del Gobierno*

CIERRE TOTAL

Red Integral de Seguridad en el Transporte

CIERRE TOTAL								
DEPARTAMENTO	VÍA	KM	MEDIDA	MOTIVO	FECHA		VIA ALTERNA	ACTO ADMINISTRATIVO
					INICIAL	FINAL		
Antioquia	Transversal Tribuga - Arauca, sector La Mansa - Peñalisa	PR37+0500 y PR30+0700	Cierre total con apertura de lunes a sabado en el horario de 6:00 a 7:15 sentido Quibdó – Medellín, y de 7:15 a 8:30 horas en el sentido Medellín – Quibdó, días domingo, habilitación en ambos sentidos de manera alternada, entre las 6:00 y las 12:00 horas	Pérdida de la banca	9/05/2025	Indefinido	Medellín – La Pintada – Apía – Las Ánimas – Quibdó.	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19668-resolucion-01671-del-16-de-mayo-de-2025/file
Boyaca	Duitama – La Palmera	PR26+0763 y el PR27+0000	Cierre total calzada izquierda de la vía	Obras en lavía	12/11/2024	Indefinido	Contraflujo en la calzada derecha de la vía Duitama – La Palmera, Ruta Nacional 5503, entre el PR26+0763 y el PR27+0000	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/18619-resolucion-5349-del-12-de-noviembre-de-2024/file
	Sogamoso - Aguazul	PR81 y el PR82	Cierre total	Fallas puente "Chorro Blanco	07/01/2025 07:00 14:00 21:00	Indefinido 12:00 18:00 05:00 del dia suiguiente	Para vehículos con peso bruto vehicular inferior a 52 toneladas, y vehículos con configuraciones superiores a C2 cuyo peso bruto vehicular sea inferior al peso definido en la Resolución 4100 de 2004 y vehículos con ancho inferior a 3.6 metros, la vía Bogotá – Villavicencio – Yopal	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/18915-resolucion-5993-del-18-de-diciembre-de-2024-1/file
Caquetá	Florencia – Puerto Rico	PR38+0200 y el PR38+0350	Cierre total	Obras puente	26/06/2022	Indefinido	Variante sentido Montañita-Paujil	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/13177-resolucion-2156-del-26-de-junio-de-2022
Choco	Transversal Tribuga - Arauca, sector Quipdo - La Mansa	PR13+0000 y PR98+0000	Cierre total	Deslizamientos progresivos de tierra	14/05/2025 18:00 - 06:00 del dia siguiente	Indefinido	Medellín – La Pintada – Apía – Las Ánimas – Quibdó.	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19709-resolucion-01629-del-14-de-mayo-2025/file
Cundinamarca	Tocancipá - Chocontá	PR51+0310 y el PR51+0650	Cierre total de la calzada izquierda de la vía	Llevar a cabo actividades de mantenimiento del puente el Sisga	1/05/2025	28/06/2025	Se realizará flujo Bidireccional por la calzada derecha,	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19636-resolucion-01448-del-01-de-mayo-de-2025/file
Norte de santander	Rio Oro - Ocaña	PR49+0200 al PR50+0700	Cierre total	obra en vias sobre empalme en la red del alcantarillado	3/07/2025	3/08/2025	carrera 38 las palmeras - calle 11 barrio aires - carrera 18 la primavera carrera 38 las palmeras - calle 11 barrio aires - calle 11 el dorado - carrera 29 cañaveral carrera 33 la primavera - calle 11 el dorado - carrera 28C - via barrio bolivar	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/-resolucion-00528-del-28-de-febrero-de-2025/file

CIERRE TOTAL

Red Integral de Seguridad en el Transporte

DEPARTAMENTO	VÍA	KM	MEDIDA	MOTIVO	FECHA		VIA ALTERNA	ACTO ADMINISTRATIVO
					INICIAL	FINAL		
Norte de santander	Rio Oro - Ocaña	PR49+0200 al PR50+0700	Cierre total	obra en vias sobre empalme en la red del alcantarillado	18/08/2025	17/09/2025	carrera 38 las palmeras - calle 11 barrio aires - carrera 18 la primavera carrera 38 las palmeras - calle 11 barrio aires - calle 11 el dorado - carrera 29 cañaveral carrera 33 la primavera - calle 11 el dorado - carrera 28C - via barrio bolivar	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/-resolucion-00528-del-28-de-febrero-de-2025/file
	Rio Oro - Ocaña	PR49+0200 al PR50+0700	Cierre total	obra en vias sobre empalme en la red del alcantarillado	19/10/2025	03/11/2025		
Nariño	Via troncal de occidente -cano-mojarras	Ruta nacional 2502 al PR41+0050	Cierre total	Deslizamiento sobre el sector	25/03/2025 17:00 - 06:00 del dia siguiente	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19436-resolucion-00860-de-25-de-marzo-de-2025/file
	Variante Oriental Pasto	PR18+0430 al PR20+0140	Cierre total	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento	25/02/2025 19:00 - 06:00 del dia siguiente	31/05/2025	Catambuco – Pasto – Mapachico.	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19319-resolucion-00469-de-25-de-febrero-de-2025/file Resolución 00469
SUCRE	Via troncal del caribe ruta nacional paso por TOLU	PR45+0350 y el PR47+0350	Cierre total	Ampliacion del aeropuerto	05/04/2025	01/10/2025	troncal del caribe - variante de santiago de tolu - cruce ruta tolu viejo - calle 16 - carrera 11 casco urbano de tolu	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19498-resolucion-01053-de-4-de-abril-de-2025/file RESOL 1053
Santander	vía Málaga – Los Curos	PR51+0175 y el PR51+0217	Cierre total	obra en vias	03/12/2024	Indefinido	Málaga - Pamplona – Bucaramanga para vehiculos maximo 30 toneladas y categoria C3	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/18747-resolucion-5668-del-03-de-diciembre-de-2024/file Resol 5668
	vía Málaga – Los Curos	PR88+000 y el PR89+000	Cierre total	Pérdida total de banca	26/04/2025	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19603-resolucion-01386-de-26-de-abril-de-2025/file Resol 5668
	Sector Cruce Ruta 45A (San Gil) – Onzaga	PR25+0430 y el PR28+0450	Cierre total	Desestabilización presentada por el puente "Roldan"	30/04/2025	Indefinido	Vía veredal Pitiguao – Tubuga para vehículo con configuración máxima C2	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19634-resolucion-01442-del-30-de-abril-de-2025/file

CIERRE PARCIALES

Red Integral de Seguridad en el Transporte

CIERRE PARCIALES								
DEPARTAMENTO	VÍA	KM	MEDIDA	MOTIVO	FECHA		VIA ALTERNA	ACTO ADMINISTRATIVO
					INICIO	FINAL		
Casanare	Yopal - Paz de Ariporo	PR30+0930 y el PR37+0400 Sentido Santuario - Medellin	Cierre total con apertura intermitente cada 3 dias desde las 06:00 hasta las 10:00 con paso uno a uno de vehiculos con peso bruto superior a 3.5 toneladas	Daños detectados puente Ramón Nonato Pérez	12/11/2020	Indefinido	Belén – Sacama – La Cabuya – Hato Corozal	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/16664-resolucion-29-del-10-de-enero-de-2024
Cundinamarca	Villeta- Bogotá	PR145+0000	Cierre parcial de la via (Cierre total calzada puente El Cortijo)	Obras que permitan mejorar las afectaciones y patologías encontradas en el puente	8/03/2024	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/16947-resolucion-762-del-18-de-marzo-de-2024
Boyaca / Cundinamarca	Variante Portachuelo - Casablanca	PR0+0250 y el PR 7+0000.	Cierre parcial	Mantenimiento y mejoramiento de carpeta asfáltica	7/03/2025 5:00 - 19:00 horas	6/03/2026	La calzada contraria al cierre estará habilitada para circulación en ambos sentidos en el tramo cerrado.	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19361-resolucion-00623-de-7-de-marzo-de-2025/file
	Zipaquirá - Ubaté	PR 28+0500 y el PR 67+1134.						
	Ubaté - Puente Nacional	PR 1+0000 y el PR 42+0300.						
Meta	Villavicencio - Barranca de Upia	PR37+0300	Cierre parcial	Emergencia	8/05/2014	Indefinido	No aplica	N/A Resolución 05701
	Pipiral - Villavicencio vía antigua	PR80+0000 y el PR94+0583	Cierre parcial de la vía	Obras en la vía	3/11/2022	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/14106-resolucion-4156-de-04-de-noviembre-de-2022
Nariño	Tumaco - Junín	PR 6+0672 al PR 6+0870	Cierre parcial de la vía	Obras en la vía	9/02/2025	12/06/2025	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19204-resolucion-00246-de-9-feb-2025-cierre-via-tumaco-junin-pte-pindo/file
Norte de Santander	Alto El Pozo - Sardinata	PR92+0100 PR92+0300	Cierre parcial de la vía	Obras en la vía	11/03/2022	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/12660-resolucion-827-del-11-de-marzo-de-2022

CIERRE PARCIALES

Red Integral de Seguridad en el Transporte

DEPARTAMENTO	VÍA	KM	MEDIDA	MOTIVO	FECHA		VIA ALTERNA	ACTO ADMINISTRATIVO
					INICIO	FINAL		
Norte de Santander	Variante Sardinata, Ruta Nacional 70NSA	PR1+0940 y el PR1+0956	Cierre parcial con paso uno a uno, a 10 km/h, Restringir el paso de vehículos de carga superior a 52 toneladas	Obras en la vía	26/11/2024	Indefinido	Alto El Pozo – Sardinata – El Zulia, Ruta Nacional 7009	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/00747-resolucion--del-18-de-marzo-de-2025/file
	Rio Oro - Ocaña	PR49+0155 al PR49+0400 y el PR49+0415 al PR49+0612	Cierre calzada izquierda sentido Ocaña - Rio oro	Obra en vias sobre empalme en la red del alcantarillado	18/052025	2/07/2025	carrera 38 las palmeras - calle 11 barrio aires - carrera 18 la primavera carrera 38 las palmeras - calle 11 barrio aires - calle 11 el dorado - carrera 29 cañaveral carrera 33 la primavera - calle 11 el dorado - carrera 28C - via barrio bolivar	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/-resolucion-00528-del-28-de-febrero-de-2025/file
	Rio Oro - Ocaña	PR49+0625 y el PR49+0833	Cierre calzada izquierda sentido Ocaña - Rio Oro	Obra en vias sobre empalme en la red del alcantarillado	18/09/2025	18/10/2025		
	Via alterna Troncal Central del Norte	PR7+0386 al PR 18+0160	Cierre parcial de la via	obra en vias sobre mantenimiento en la red Electrica	28/04/2025 06:30 - 17:30	30/08/2025	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19610-resolucion-01392-de-27-de-abril-de-2025/file Resolución 01392
	Via Troncal Central del Norte	PR0+0000 al PR 1+0030						
Norte de Santander/ Arauca	La Lejía - Saravena	PR83+0000 PR107+0000	Cierre parcial de la via	Obras en la vía	14/06/2022	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/13100-resolucion-2018-del-14-de-junio-de-2022

CIERRE PARCIALES

Red Integral de Seguridad en el Transporte

DEPARTAMENTO	VÍA	KM	MEDIDA	MOTIVO	FECHA		VIA ALTERNA	ACTO ADMINISTRATIVO
					INICIO	FINAL		
Putumayo	Mocoa - San Juan de Villalobos	PR5+0200 y el PR5+0320,	Cierre parcial de la vía, Restringir el paso de vehículos de carga superior a 52 toneladas	Obras en la vía	7/10/2024	Indefinido	- Pasto – Mojarras – Popayán – San José de Isnos – Pitalito. - Pasto – Mojarras – Popayán – La Plata – Tesalia – Iquirá – Palermo - Neiva	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19007-resolucion-restriccion-por-emergencia-linea-ferreaneiva-espinal/file
San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Circunvalar de San Andrés	PR20+0385 PR20+0625	Cierre calzada derecha	Obras en la vía	15/02/2024	Indefinido	Tom Hooker - Sound Bay Road- Four Corner - Paralela a la circunvalar	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/16774-resolucion-372-del-15-de-febrero-de-2024

RESTRICCIÓN AL TRÁNSITO

Red Integral de Seguridad en el Transporte

RESTRICCIÓN AL TRÁNSITO								
DEPARTAMENTO	VÍA	KM	MEDIDA	MOTIVO	FECHA		VIA ALTERNA	ACTO ADMINISTRATIVO
					INICIO	FINAL		
Arauca	Corocoro - Arauca	PR44+0284	Restricción vehículos con peso bruto vehicular superior a 32 toneladas	Escobar	28/07/2023	Indefinido	· Bolombolo – Santa Fé de Antioquia – Medellín.	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/15634-resolucion-2571-del-28-de-julio-de-2023
Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre	Puerta de Hierro – Magangué – Yati – La Bodega, La Bodega – Mompós, Mompós – Guamal, Guamal – El Banco, El Banco – El Burro, El Banco – Arjona,	PR0+0000 y el 34+0332	Restricción vehículos de carga con PBV superior a 20 toneladas	obras que permitan mejorar las condiciones de transitabilidad de los vehículos de carga de más de 20 toneladas.	12/04/2023	Indefinida	El Burro – Bosconia – Plato – Carmen de Bolívar – Puerta de Hierro	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/15090-resolucion-1203-del-12-de-abril-de-2023
Boyacá	Belen - sacama	PR30+0300	Restringir le paso de vehiculos de todo tipo en el PR30+0300 en la ruta nacional 6404	Obras en la via, hasta que se realice la prolongacion del puente metalico modular	17/03/2025	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/-resolucion-00723-del-17-de-marzo-de-2025
	Guateque-El Secreto	PR30+0930 y el PR37+0400	Restricción Vehículos que superen la configuración C3, peso bruto vehicular mayor a 30 toneladas y/o ancho mayor a 2,6 metros	Emergencia	28/07/2014	Indefinido	Cabuya (Vehículos con peso inferior a 25 Toneladas) Sogamoso- Vado Hondo Labranzagrande- Yopal Bogotá – Villavicencio – Yopal para vehículos con peso bruto vehicular inferior a 52 toneladas.	https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=+Resoluci%C3%B3n+No.+4223+del+28+julio+2014.
	Vado Hondo – Labranzagrande	PR41+350 y el PR41+500	Restricción e vehículos de carga con categoría superior a C2. Restricción vehículos con peso bruto vehicular superior a 25 toneladas.	Obras puente colgante	23/04/2024	Indefinido	Sogamoso – El Crucero – Aguazul – Yopal para vehiculos con peso bruto inferior a 32 toneladas.	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/17134-resolucion-1322-del-23-de-abril-de-2024/file
Boyaca y Casanare	El crucero - Aguazul	PR16+0000 y el PR107+200 PR81+0000 y el PR82+0000	Restricción vehículos con peso bruto vehicular superior a 32 toneladas Restricción vehículos con peso bruto vehicular superior a 28 toneladas	Emergencia	26/12/2024	Indefinido	Para vehículos con peso bruto vehicular inferior a 52 toneladas, y vehículos con configuraciones superiores a C2 cuyo peso bruto vehicular sea inferior al peso definido en la Resolución 4100 de 2004 y vehículos con ancho inferior a 3.6 metros, la vía Bogotá – Villavicencio – Yopal	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/18965-resolucion-6114-del-26-de-diciembre-de-2024/file

RESTRICCIÓN AL TRÁNSITO *Red Integral de Seguridad en el Transporte*

DEPARTAMENTO	VÍA	KM	MEDIDA	MOTIVO	FECHA		VIA ALTERNA	ACTO ADMINISTRATIVO
					INICIO	FINAL		
Casanare	Monterrey - Aguazul	PR0+0007	Un solo vehículo a la vez sobre el puente, carga máxima 52 toneladas	Emergencia	21/04/2014	Indefinido	Secreto Sisga Tunja - Sogamoso - Yopal - Monterrey	N/A
	Paz de Ariporo – La Cabuya	PR3+0523	Restricción para Vehículos de carga que superen las 52 toneladas	Conservación puente provisional metálico	18/11/2022	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/14213-resolucion-4355-de-18-de-noviembre-de-2022/file
	Sácama – La Cabuya	PR0+0000 y el PR32+0080	Restricción vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 52 toneladas	Varios sitios en condición crítica de inestabilidad por deslizamientos de material	16/06/2022	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/13126-resolucion-2057-del-16-de-junio-de-2022/file
	Yopal - Paz de Ariporo	KM 92+100 al 92+300	Restricción vehículos peso bruto vehicular superior a 52 toneladas; ancho mayor de 3,75 metros; altura máxima de 4,3	Mantenimiento puente Cravo Sur (La Cabuya)	16/05/2022	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/12922-resolucion-1605-del-16-de-mayo-de-2022/file
	Monterrey - Yopal Barranca de Upia - Monterrey	PR0+0000 y el PR123+0287 PR0+0000 y el PR49+0550	Restricción para vehículos con peso bruto vehicular superior a 52 toneladas, en todo el corredor	Emergencia	7/10/2016	Indefinido	No aplica	N/A
Cauca	Rionegro – Tacueyó Puente Río Negro - El Palo	PR1+0100 78+0900	Restricción vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 3.4 toneladas	Pérdida parcial de la banca	5/05/2022	Indefinido	Tacueyo – Toribio – Vereda Río Negro, Corinto – Boquerón – Soto – La Luz.	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/00747-resolucion--del-18-de-marzo-de-2025/file
Choco	Certegui - Quibdó	PR71+0040 y el PR71+0070	Restringir el paso de vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 5 toneladas	mantenimiento de la via	6/12/2024	Indefinido	Quibdó – Ciudad Bolivar – La Pintada – La Felisa - Anserma – Viterbo -Apia – Pueblo Rico – Tadó	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/18836-resolucion-5803-del-06-de-diciembre-de-2024/file
Cordoba	vía Paso Nacional por Lorica	PR49+0408 y el PR49+0443	Restricción vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 32 toneladas	problemas estructurales del puente Chimalito	21/10/2024	Indefinido	San Pelayo – Montitos – San Bernardo del Viento – Lorica. San Pelayo – Cereté – Ciénaga de Oro – Sahagún – Chinú – Purisima – Lorica	N/A
Cundinamarca	Mondoñedo - Soacha, Ramal a Soacha	KM 9+00	Restricción vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 5.3 toneladas	mantenimiento Puente La Balsa	21/02/2025	21/02/2026	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/19007-resolucion-restriccion-por-emergencia-linea-ferreaneiva-espinal/file
Huila	Garzón - Neiva	PR87+0311	Restricción vehículos con peso bruto vehicular superior a 52 toneladas	Daño estructural en vigas y la losa del puente en Campoalegre	7/10/2024	Indefinido	Tesalia – Teruel – Palermo – Neiva Campo Alegre – Hobo – Betania – El Juncal – Neiva	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/18422-resolucion-4688-del-7-de-octubre-de-2024

RESTRICCIÓN AL TRÁNSITO *Red Integral de Seguridad en el Transporte*

DEPARTAMENTO	VÍA	KM	MEDIDA	MOTIVO	FECHA		VIA ALTERNA	ACTO ADMINISTRATIVO
					INICIO	FINAL		
Meta	Villavicencio - Barranca de Upia	PR0+0000 y el PR107+0600	Restricción vehículos con peso bruto vehicular superior a 52 toneladas	Emergencia	07/10/2016	Indefinido	No aplica	N/A
Santander	Landázuri - Barbosa	PR0+0000 y el PR53+0000	Restricción vehículos con configuración 2S1 y superiores	Emergencia	29/10/2015	Indefinido	No aplica	N/A
	Cruce Puerto Araujo – Landázuri	PR37+0500 y el PR61+1247	Restricción al paso de vehículos de carga categoría C2S1 y superiores	Obras en lavía	17/09/2024	Indefinido	Puerto Araujo – Puerto Nare – Puerto Boyacá – Chiquinquirá – Barbosa	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/18323-resolucion-4313-del-17-de-septiembre-de-2024/file
Sucre, Bolivar y Magdalena	Pte Santa Lucia: Puerta de Hierro - Magangué - Yatí	PR71+0200	Restringir el paso de vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 20 toneladas	Los citados puentes presentan patologías complejas en sus estructuras.	16/09/2024	Indefinido	1. Palmitos – Carmen de Bolívar – Plato – Nueva Granada - Puerto Nuevo – Santa Ana. 2. Carmen de Bolívar – Plato – Bosconia – Cuatro Vientos – Curumaní -Pailitas – Pelaya. 3. Guamal – Astrea – Arjona – Chimichagua- El Banco.	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/18299-resolucion-4285-del-16-de-septiembre-de-2024/file
	Pte Roncador: Puerta de Hierro - Magangué - Yatí	PR75+0300						
	Pte Guataca, ubicado en la vía Mompós – Guamal	PR8+0942						
	Pte Caño Guamal	PR3+0000						
Sucre	Coveñas - San Onofre	PR36+0853	Restricción vehículos con peso bruto vehicular superior a 28 toneladas, categoría superior a C3	Fallas puente Boca de la Ciénaga	23/04/2024	Indefinido	Montería – Cerete – Sahagún – Sincelejo – Tolú	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/17133-resolucion-1319-del-23-de-abril-de-2024
	Guayepo – Achí	KM0+0000 PR43+0000	Restricción vehículos de carga con peso bruto vehicular superior a 20 toneladas	Puntos críticos con pasos de agua y daños en la estructura del pavimento	24/08/2022	Indefinido	No aplica	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/13632-resolucion-3109-del-24-de-agosto-de-2022
Norte de Santander	La Lejía - Saravena	PR0+0000	Restricción de tránsito en la vía La Lejía - Saravena de tracto camiones, categoría C2S1 y/o superiores	Emergencia	06/09/2016	Indefinido	Cúcuta - Málaga - Pajarito - Aguazul - Yopal - Saravena	N/A
Tolima	Honda – Río Hermitaño	PR33+0353 y el PR34+0000	Restricción al paso de vehículos de carga categorías C2, C3, C4, C2S1, C2S2, C3S1, C3S2, C3S3 y superiores y/o peso bruto vehicular superior a 5,5 toneladas	Fisuras y grietas de tipo estructural en la viga cabezal en concreto reforzado del puente	10/01/2024	Indefinido	Variante La Dorada - Puerto Salgar, Puerto Salgar - Río Ermitaño, Variante La Dorada - Puerto Salgar, Variante Purino – Koran	https://www.invias.gov.co/index.php/cierres-viales/16664-resolucion-29-del-10-de-enero-de-2024

Red Integral de Seguridad en el Transporte

Nuestra Misión

Creada con el fin de **Fortalecer los canales de comunicación** con el sector transporte, construyendo una **cultura de seguridad y prevención** al interior de las empresas y gremios que intervienen en la cadena de suministro, logrando **minimizar riesgos potenciales** que afectan al sector y mejorando la competencia institucional como aliado estratégico en seguridad.

Entrenamientos o asesorías dirigidas a nuestros afiliados:

Verificación requerimientos judiciales

- Planes Integrales de disuasión e intervención en las empresas.

Riesgos Transporte Carga

- ✓ Antes de iniciar la operación de transporte de carga, las empresas validaran en los canales de comunicación habilitados por la Policía Nacional (#767 y Línea de Atención Empresarial 3213941684) verificando el estado de las vías y situaciones de movilidad con el fin de evitar complicaciones y riesgos de seguridad en cada operación, de acuerdo a las afectaciones que se están presentando en varias vías de nuestro país en el desarrollo de la protesta social.

Riesgos Transporte Pasajeros

- ✓ El personal de conductores y auxiliares de viaje deben estar pendientes a los comportamientos sospechosos de los usuarios de la vía e informar a la Policía Nacional la situación, con el fin de prevenir el hurto a pasajeros y su equipaje con motivo de la protesta social. De igual forma estar atentos a la información de manifestaciones, concentraciones y bloqueos de vía en los principales corredores viales, para planear la operación y no ser victima de actos vandálicos a los vehículos y sus conductores.



Línea 24/7 para reporte preventivos:

3213941684

Línea 24/7 estado de vías:

#767 – opción 2

Novedades de seguridad en las vías primarias del país:

#767 – opción 4

Si requiere asesorías o entrenamientos en los riesgos que afectan al sector transporte contáctenos a través del correo:

ditra.ristra@policía.gov.co

Líneas de emergencia

123	165	166	155	#767	167
Atención y Emergencia	Antisecuestro y Antiextorsión	Transparencia Institucional	Atención a Mujeres	Seguridad Vial	Antinarcóticos

SEGUIMIENTO A JORNADA PROTESTA NACIONAL - CENTRALES OBRERAS

BOLETÍN N°9

www.agressan.com

29/05/2025
10:15 A.M.

JORNADA DE MANIFESTACIÓN A NIVEL SANTANDER

#AESTA HORA

SITUACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON OCASIÓN DE LA CONVOCATORIA AL PARO NACIONAL REALIZADA POR LA CUT Y FECODE, EN EL MARCO DE LA CONSULTA POPULAR Y LA REFORMA LABORAL.







Movilización en el área metropolitana

A esta hora Inicia la movilización hacia la carrera 27, hasta la calle 36

Movilización Santander

Cerrada la vía en ambos sentidos en el Cruze para Ocaña y Aguachica sector Aguas Claras

⚠ **Recomención:** tomar vías alternas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Contáctenos

3173720053
3158209486
direccionejecutiva@agressan.com

ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDADA EMPRESARIAL DE SANTANDER

AGRESSAN

SEGUIMIENTO A JORNADA PROTESTA NACIONAL - CENTRALES OBRERAS

BOLETÍN N°8

www.agressan.com

29/05/2025
9:20 A.M.

JORNADA DE MANIFESTACIÓN A NIVEL SANTANDER

#AESTA HORA
SITUACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON OCASIÓN DE LA CONVOCATORIA AL PARO NACIONAL REALIZADA POR LA CUT Y FECODE, EN EL MARCO DE LA CONSULTA POPULAR Y LA REFORMA LABORAL.



Movilización en el área metropolitana

A parti de las 8:00 a.m se da inicio a las actividades de muralismo, aproximadamente 200 personas concentradas en la Puerta del Sol.

A la hora bloqueo en los dos sentidos por manifestantes que marcharán sobre la cra. 27, bajarán por la calle 36 hasta la cra. 15.

Las autoridades ya iniciaron a desviar el flujo vehícular.

⚠ **Recomención:** tomar vías alternas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Contáctenos
3173720053
3158209486
direccionejecutiva@agressan.com

ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDADA EMPRESARIAL DE SANTANDER
AGRESSAN
