| |
|---|
| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. **2001 DE 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN DEL MES DE **MAYO** DE 2025 |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | VEREDA TAMBORES – CONTIGUO AL COLISEO | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $1.250.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 73.000.000 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $1.323.000.000 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 12-NOVIEMBRE-2021 | | |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31-MAYO-2022 | **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO** | Ing. YENIER HENAO MEJIA | | **DESDE:** 17-11-2021 |
| | Ing. NORMAN ORTIZ TOVAR | | **DESDE:** 21-04-2023 |
| | Ing. SERGIO ANDRES VEGA NOVOA | | **DESDE:** 28-04-2023 |
| | Ing. EDGAR GONZÁLEZ PATIÑO | | **DESDE:** 26-09-2023 |
| | Ing. SERGIO SANJUAN SANTIAGO | | **DESDE:** 28-08-2023 |
| | Ing. VITERBO GOMEZ | | **DESDE:** 11-09-2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISORES ANTERIORES** (adjuntar casillas si es necesario) | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Ing. YENIER HENAO MEJIA | 17-11-2021 | 20-04-2023 |
| | Arq. NORMAN ORTIZ TOVAR | 21-04-2023 | 27-04-2023 |
| | Ing. SERGIO VEGA NOVOA | 28-04-2023 | 25-09-2023 |
| | Ing. EDGAR GONZÁLEZ PATIÑO | 26-09-2023 | 18/10/2023 |
| | Ing. SERGIO VEGA NOVOA | 19/10/2023 | 27/08/2024 |
| | Ing. SERGIO SANJUAN SANTIAGO | 28/08/2024 | 10/09/2024 |
| | Ing. VITERBO GOMEZ CARVAJAL | 11/09/2024 | Actual |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | Arq. DANIEL SUAREZ | 17-11-2021 | 31-03-2022 |
| | Ing. KELLY PETRO | 01-04-2022 | 30-09-2022 |
| | Ing. KELLY PETRO | 11-11-2022 | 31-12-2022 |
| | Ing. KELLY PETRO | 27-01-2023 | 25-06-2023 |
| | Ing. KELLY PETRO | 14-07-2023 | 23/10/21023 |
| | Ing. LAURA MURILLO V. | 23/10/2023 | 30/12/2023 |
| | Ing. LAURA MURILLO V. | 22/01/2024 | 22/09/2024 |
| | Arq. MAURICIO GUARNIZO | 23/09/2024 | 10/10/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ing. LAURA LORENA MURILLO | 11/10/2024 | 31/12/2024 |
| | Ing. VITERBO GOMEZ CARVAJAL | 01/01/2025 | 06/02/2025 |
| | Ing. LAURA LORENA MURILLO VALLES | 07/02/2025 | Actual. |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO** | No. 58821<br>No.35222 | 4-11-2021<br>19-01-2022 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO** | N/A | DD-MES-AAAA | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | N/A | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2021** | No. 116021 | 12-11-2021 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2022** | No. 26522 | 19-01-2022 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2023** | No. 1923 | 14-01-2023 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2024** | No. 10524 | 16-01-2024 | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No. 5803807931 | 17-NOVIEMBRE-2021 | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | 17-NOVIEMBRE-2021 | | |
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | PRIMERA PRÓRROGA | **FECHA:** 26/05/2022 | |
| | SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN | **FECHA:** 30/11/2022 | |
| | TERCERA PRÓRROGA | **FECHA:** 26/06/2023 | |
| | CUARTA PRORROGA Y SEGUNDA MODIFICACION | **FECHA**: 04/09/2023 | |
| | QUINTA PRORROGA | **FECHA:** 30/10/2024 | |
| | SEXTA PRORROGA Y TERCERA MODIFICACION | **FECHA:** 30/09/2025 | |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | SUSPENSION I | **FECHA:** 23/04/2024 | |
| | AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN I | **FECHA:** 22/06/2024 | |
| | AMPLIACIÓN II A LA SUSPENSIÓN I | **FECHA:** 22/08/2024 | |
| | REANUDACION DEL CONVENIO | **FECHA:** 23/10/2024 | |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | **FECHA:** 29/04/2025 | | |
| | **FECHA:** 30/06/2025 | | |
| | **FECHA:** 30/03/2026 | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $83.333.000 | | |
| **VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $41.667.000 | | |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | $0 | | |
| **VALOR DE OBRA** | $1.107.911.892,00 | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 88.687.437,00 | | |
| **VALOR ADICIONAL DE OBRA** | $73.000.000 | | |

## 2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | 1) UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de $225.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. | NO APLICA | 07/12/2021 | $225.000.000,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | 2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. | 40% | 25/10/2023 | $820.000.000,00 |
| TERCER DESEMBOLSO | 3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de $205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. | 100% | DD/MM/AAAA | $205.000.000,00 |
| **TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | $1.045.000.000,00 |
| **TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | $125.000.000,00 |

### 3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 580 47 994000069129 | Cumplimiento | $ 264.600.000,00 | 12/11/2021 | 29/04/2025 |
| 580 47 994000069129 | Cumplimiento | $ 264.600.000,00 | 12/11/2021 | 30/06/2025 |
| 580 47 994000069129 | Cumplimiento | $264.600.000,00 | 12/11/2021 | 30/03/2026 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.***
-

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA | | $ 1.124.000.000 |
| **Link de Consulta:** LICITACION PÚBLICA NUMERO BLP-OP-002-2021 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28797&g-recaptcha-response=03AGdBq27OjsGZB842-CKB02ugTv2Z3f38dlphd1lf4dcxv0qtdLiy9qclg-fPAz0lIFKupM2ac3le37hyRVxEsFFqoOUy0pyiUGUA9uSr1ptZaW-UE_EeASNSyWcP52mivqeXAdJI4SDcRAiynMPAVItzBB6ejRxq8_FL0AeqAAxk5QfDwdAgODEJfNjpnLIKzfKoYrJoh4EQlYoyYX3bTN_yZi0j-EKlZgcZ8VDzKnEfj05Gr0s9bFF5DRt8jLLYy16pgfruTZ1A5U8-UdsfCwugVR4AXPdHDwAiQquuM5P5WEBl0bf1Ya_UvR6En1fk9TQLbMN4I3JATxTQhFAcU_PcFWghBKewA7BusKYUGV0In8WJXAvHdBMKM5kIR80JvJ8E_JE1KfB2hxZ3dfUjMhfauXFzEY3E3RlY9CysvIWASrl_wz62EblrfwjBNyoRV0veycKlzNr1Dlv2dmHn0tFzjKbdE8sUfoQ | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | 30/09/ 2022 | | $ 67.244.892 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | CONSORCIO SACÚDETE BALBOA<br>RL/ Eduardo Cifuentes | | NIT 901574342<br>C.C. 5.055.765 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 18/06/2022 | | Duración 5 meses |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario) | SUSPENSIÓN I | 12/11/2022 | |
| | REINÍCIO I | 13/12/2022 | |
| | ADICIÓN Y PRÓRROGA I | 16/12/2022 | |
| | PRÓRROGA II | 10/05/2023 | |
| | PRÓRROGA III | 21/06/2023 | |
| | SUSPENSIÓN II | 21/10/2023 | |
| | PRORROGA I RES | 02/11/2023 | |
| | PRORROGA II RES | 10/11/2023 | |
| | REANUDACIÓN | 30/10/2024 | |
| | PRORROGA IV | 31/12/2024 | |
| | SUSPENSION III | 24/04/2024 | |
| | PRORROGA I SUSPENSION III | 22/06/2024 | |
| | PRORROGA II A LA SUSPENSION III | 21/08/2024 | |
| | REINICIO III | 23/10/2024 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PRORROGA V | 30/12/2024 | |
| | PRORROGA VI | 15/06/2025 | |
| | SUSPENSION III | 14/02/2025 | |
| | REINICIO | 25/02/2025 | |
| | PRORROGA VII | 25/02/2025 | |
| | PRORROGA 8 | 25/05/2025 | |
| | SUSPENSION 5 | 23/05/2025 | |
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | 17/11/2022 | **Fecha Actual de terminación del contrato** | 25/05/2025 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 1.191.244.892 |
| **ESTADO DEL CONTRATO:** | | | **EN EJECUCION** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | |
| **PÓLIZA No.** | No. 75-44-101121093 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | Cumplimiento del Contrato: 03/04/2023 | | |
| | Calidad del Servicio: 03/10/2027 | | |

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría al Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.***

| **DESCRIPCIÓN** | **OBJETO** | | **VALOR** |
|---|---|---|---|
| **No. del contrato** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA | | $ 124.971.539 |
| **Link de Consulta:** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955 | | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | 30/09/ 2022 | | $ 5.382.898 |
| | DD/MM/AAAA | | $ 0,00 |
| **Nombre contratista** | Consorcio interventoria Balboa 2022<br>RL/ Carlos Rambal Buendia | | NIT.901.598.981-5<br>C.C. 50.901.550 |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | 17/06/2022 | | Duración __5__ meses |
| | SUSPENSIÓN I | 12/11/2022 | |
| | REINÍCIO I | 13/12/2022 | |
| | PRÓRROGA I | 16/05/2023 | |
| | PRÓRROGA II | 21/06/2023 | |
| | SISPENSION II | 21/10/2023 | |
| | REINICIO II | 09/04/2024 | |
| | PRÓRROGA III | 11/04/2024 | |
| | SUSPENSIÓN III | 24/04/2024 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** (adjuntar celdas si es necesario)<br>**Fecha Inicial de terminación del contrato** | APLIACION I SUSPENSION III | 22/06/2024 | |
| | REINICIO III | 23/10/2024 | |
| | PRORROGA IV | 30/12/2024 | |
| | SUSPENSION III | 24/04/2024 | |
| | PRORROGA I SUSPENSION III | 22/06/2024 | |
| | PRORROGA II A LA SUSPENSION III | 21/08/2024 | |
| | REINICIO III | 23/10/2024 | |
| | PRORROGA V | 30/12/2024 | |
| | PRORROGA VI | 15/06/2025 | |
| | SUSPENSION III | 14/02/2025 | |
| | REINICIO | 25/02/2025 | |
| | PRORROGA VII | 25/02/2025 | |
| | PRORROGA 8 | 25/05/2025 | |
| | SUSPENSION 5 | 23/05/2025 | |
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | 17/11/2022 | **Fecha Actual de terminación del contrato** | 25/05/2025 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | | | $ 130.354.528 |
| **ESTADO DEL CONTRATO** | | | **EN EJECUCIÓN** |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** | | |
| **PÓLIZA No.** | No. 440-47-994000026471 | | |
| **FECHA DE LA PÓLIZA** | Cumplimiento del Contrato: 10/01/2023 | | |
| | Calidad del Servicio: 10/11/2027 | | |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | DICIEMBRE 2024 | PENDIENTE NOVIEMBRE 2024 – ENERO 2025, FEBRERO 2025, MARZO 2025, ABRIL 2025, Y MAYO 2025. |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | NO | **Corte:** 15 de Enero – 2025. |
| INFORME FINANCIERO | SI | **Corte:** Mayo – 2025 |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | $230.086.808,74 | **Corte:** Mayo - 2025 |
| ACTIVIDADES DEL PROYECTO | | SI |
| OTROS | | NO |

## 6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:** | |
|---|---|
| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |

| % PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA | 100% |
|---|---|
| % EJECUTADO DE OBRA | 63,28% |

**PERIODO:** INFORME DE SEGUIMIENTO A MAYO DE 2025
**VIGENCIA:** Hasta el 31 de mayo de 2025.

**ACTUACIONES AL MES DE ABRIL DE 2025:**

**El 04 de abril de 2025:** El director de Proyectos del municipio de Balboa – Risaralda, ingeniero Sebastián Rojas, remitió mediante correo electrónico al equipo de apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior la relación de informes semanales, los cuales se describen a continuación:

Relación de informes general:

- Informe semanal del 23/10/2024 al 30/10/2024.
- Informe semanal del 30/10/2024 al 06/11/2024.
- Informe semanal del 06/11/2024 al 13/11/2024.
- Informe semanal del 13/11/2024 al 20/11/2024.
- Informe semanal del 20/11/2024 al 27/11/2024.
- Informe semanal del 27/11/2024 al 04/12/2024.
- Informe semanal del 04/12/2024 al 11/12/2024.
- Informe semanal del 11/12/2024 al 18/12/2024.
- Informe semanal del 18/12/2024 al 25/12/2024.
- Informe semanal del 25/12/2024 al 01/01/2025.
- Informe semanal del 01/01/2025 al 08/01/2025.
- Informe semanal del 08/01/2025 al 15/01/2025.
- Informe semanal del 15/01/2025 al 22/01/2025.
- Informe semanal del 22/01/2025 al 29/01/2025.
- Informe semanal del 29/01/2025 al 05/02/2025.
- Informe semanal del 05/02/2025 al 12/02/2025.
- Informe semanal del 12/02/2025 al 19/02/2025.
- Informe semanal del 19/02/2025 al 26/02/2025.
- Informe semanal del 26/02/2025 al 05/03/2025.
- Informe semanal del 05/03/2025 al 12/03/2025.
- Informe semanal del 12/03/2025 al 19/03/2025.
- Informe semanal del 19/03/2025 al 26/03/2025.
- Informe semanal del 26/03/2025 al 02/04/2025.

*Anexos: Se adjunta la relación de informes entregados por el Consorcio interventoría Balboa 2022 cto. 001 de 2021.*

**El 07 de abril de 2025:** El Arq. Víctor Eduardo Burgos, en representación de la unidad de reacción inmediata de la Contraloría General de la República solicito mediante correo electrónico, el cumplimiento a los compromisos pactados en la mesa de trabajo virtual que se llevo a cabo el día 3 de abril de 2025 los cuales se relacionan a continuación:

| No | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior-Municipio de Balboa | 8/04/2025 |
| 2 | Cargue informe técnico de incumplimiento de la interventoría. | Min-Interior-Municipio de Balboa -Interventoría | 8/04/2025 |
| 3 | Remitir correo al Min-Interior con el pantallazo de la subsanación del error de la póliza del convenio. | Min-Interior – Municipio de Balboa | 8/04/2025 |
| 4 | informes de supervisión del municipio a marzo de 2025 | Min- Interior – Municipio de Balboa | 8/04/2025 |
| 5 | **RELACIÓN**, remisión y cargue de los informes mensuales y semanales de interventoría a marzo de 2025 | Min-Interior – Municipio de Balboa – Interventoría | 8/04/2025 |
| 6 | Respuesta del municipio al Min-Interior sobre el tema de las modificaciones de ítems contractuales. | Min-Interior – Municipio de Balboa | 8/04/2025 |

**Imagen 5:** Compromisos a las mesas de seguimiento – tomado de los correos emitidos por el equipo de seguimiento de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, los compromisos pactados en cada una de las mesas de trabajo deben ser cumplidos en las fechas estipuladas por el equipo de seguimiento permanente de la Contraloría General de la República. Una vez analizados, dichos compromisos deberán ser remitidos por la administración municipal, considerando que hacen parte de las condiciones contractuales establecidas en el convenio y que, a la fecha, continúan pendientes de cumplimiento.

**El 11 de abril de 2025:** El Arq. Víctor Eduardo Burgos, en representación de la unidad de reacción inmediata de la Contraloría General de la República solicito mediante correo electrónico, el cumplimiento a los compromisos pactados en la mesa de trabajo virtual que se llevó a cabo el día 10 de abril de 2025 los cuales se relacionan a continuación:

| | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior-Municipio de Balboa | 15-abr-2024 |
| 2 | Relación de informes mensuales producidos hasta la fecha por la interventoría | Min-Interior – Interventoría | 15-abr-2024 |
| 3 | Informes mensuales de interventoría de enero, febrero y marzo. | Min-Interior – Interventoría | 15-abr-2024 |
| 4 | Informe de supervisión de marzo de 2024 | Min-Interior-Municipio de Balboa | 15-abr-2024 |
| 5 | Remisión del estudio de la interventoría sobre el balance presupuestal o relación de precios de ítems a modificar. | Min-Interior - Interventoría | 11-abr-2024 |
| 6 | Enviar fotos del avance de la fabricación de la cubierta | Min- Interior – contratista de obra | 15-abr-2024 |
| 7 | Enviar certificaciones de calidad de los ítems a modificar, a la interventoría y copia al Ministerio | Contratista de obra | 15-abr-2024 |
| 8 | Acta de visita de interventoría a taller de inspección a la fabricación cubierta | Min-Interior contratistas de obra e interventoría | 15-abr-2024 |

**Imagen 6:** Compromisos a las mesas de seguimiento – tomado de los correos emitidos por el equipo de seguimiento de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, los compromisos pactados en cada una de las mesas de trabajo del 3 y 10 de abril de 2025 deben ser cumplidos en las fechas estipuladas por el equipo de seguimiento permanente de la Contraloría General de la República. Una vez analizados, dichos compromisos deberán ser remitidos por la administración municipal, considerando que hacen parte de las condiciones contractuales establecidas en el convenio y que, a la fecha, continúan pendientes de cumplimiento.

**El 15 de abril de 2025:** La Administración Municipal de Balboa – Risaralda informa que se ha efectuado la actualización de la póliza correspondiente a la más reciente modificación del convenio, la cual corresponde a la sexta prórroga y tercera modificación del mismo.

La actualización se realizó bajo las siguientes características:

- Póliza No.: 580-47-994000069129
- Anexo: 10
- Vigencia desde: 12 de noviembre de 2021
- Vigencia hasta: 30 de marzo de 2026.
- Valor asegurado: $264.600.000,00

Cabe destacar que esta póliza ha sido debidamente cargada y aceptada en la plataforma SECOP, y se anexa al presente informe.

**El 25 de abril de 2025:** El Arq. Víctor Eduardo Burgos, en representación de la unidad de reacción inmediata de la Contraloría General de la República solicito mediante correo electrónico, el cumplimiento a los compromisos pactados en la mesa de trabajo virtual que se llevó a cabo el día 24 de abril de 2025 los cuales se relacionan a continuación:

| No | COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior-Municipio de Balboa | 30-abr-2025 |
| 2 | Acta de visita a taller del 26 de abril de 2025, donde se construye la cubierta. | Min-Interior – Interventoría | 30-abr-2025 |
| 3 | Copia oficio de remisión de las certificaciones de calidad a interventoría | Min-Interior – Contratista Obra | 30-abr-2025 |
| 4 | Copia oficio de pronunciamiento de la interventoría frente a la solicitud de modificaciones por parte del contratista de obra. | Min-Interior-Interventoría. | 30-abr-2025 |
| 5 | Copia oficio del municipio al ministerio, solicitando el pronunciamiento del ministerio, frente a la solicitud de modificaciones de ítem. | Min-Interior – Municipio de Balboa | 30-abr-2025 |
| 6 | Informe de avance de los tramites de RETIE y RETILAP | Min- Interior – contratista de obra | 30-abr-2025 |

**Imagen 7:** Compromisos a las mesas de seguimiento – tomado de los correos emitidos por el equipo de seguimiento de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, los compromisos pactados en cada una de las mesas de trabajo del 3, 10 y 24 de abril de 2025 deben ser cumplidos en las fechas estipuladas por el equipo de seguimiento permanente de la Contraloría General de la República. Una vez analizados, dichos compromisos deberán ser remitidos por la administración municipal, considerando que hacen parte de las condiciones contractuales establecidas en el convenio y que, a la fecha, continúan pendientes de cumplimiento.

**JUSTIFICACION DEL AVANCE:**

**El 06 de mayo de 2025:** El arquitecto Victor Eduardo Burgos, profesional asignado al seguimiento permanente al convenio 2001 – 2021 de Balboa – Risaralda por parte de la Unidad de reacción inmediata de la Contraloria General de la República, mediante correo electrónico, solicito de manera reiterativa el cumplimiento de los compromisos pactados en las mesas de trabajo junto con la supervisión del Ministerio del Interior en el que menciona lo siguiente:
(…) "*Atentamente nos permitimos reiterar el suministro de los compromisos acordados en las últimas mesas de seguimiento al proyecto Sacúdete de Balboa; aunque se han generado acuerdos posteriores para él envió de los mismos, a la fecha, varios no se han cumplido como se evidencia seguidamente en "fondo amarillo" en cada uno de los cuadros de las reuniones realizadas:*

| MESA DE TRABAJO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Presentación proyectada por el municipio. | Min-Interior<br>14/03/2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Relación de todos los informes de interventoría mensuales y semanales producidos hasta la fecha desde el inicio del contrato hasta la fecha. | Min-Interior – Interventoría<br>14/03/2025 | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Correo enviado por Ministerio del Interior al municipio de Balboa indicando los lineamientos o requisitos para la solicitud de modificación de ítems contractuales. | Min-Interior<br>14/03/2025 | **CUMPLIDO** |
| 4 | Acta de reunión suscrita entre la Alcaldía de Balboa-Risaralda, supervisión y contratistas de obra e interventoría, para estudio y definición de la propuesta de modificación de ítems contractuales. | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>14/03/2025 | **En la carpeta del 20 de marzo se cargaron dos actas de reunión de mesas técnicas** |
| 5 | Envío **oficial** por parte del municipio de Balboa-Risaralda de la solicitud o propuesta de modificaciones de ítems contractuales realizada por el contratista de obra, con los avales de interventoría y supervisión y demás SOPORTES COMPLETOS que justifican dicha solicitud. | Min-Interior – Municipio y Contratista de obra e interventoría<br>14/03/2025 | **INCUMPLIDO** |

| MESA DE TRABAJO DEL 20 DE MARZO DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Evidencias o soportes del inicio de presunto incumplimiento contra la interventoría de obra e informe correspondiente del municipio de Balboa | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>26-Mar-2025 | **Informe de incumplimiento del 19 de marzo de 2025** |
| 2 | Solicitud acta de prórroga de la contratación derivada. | Min-Interior – Interventoría | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Envío de la última solicitud de prórroga del contrato de obra | Min-Interior – Municipio de Balboa<br>26-Mar-2025 | **INCUMPLIDO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Envío oficial parte del municipio de Balboa-Risaralda de la solicitud o propuesta de modificaciones de ítems contractuales realizada por el contratista de obra con los avales de interventoría y supervisión y demás SOPORTES COMPLETOS que justifican dicha solicitud. | Min- Interior – Municipio de Balboa<br>26-Mar-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | Respuesta del Ministerio del Interior a solicitud de modificación de Ítems. | Min-Interior<br>26-Mar-2025 | **CUMPLIDO** |
| 6 | Cargue y envío al Ministerio del Interior de la evidencia de la actualización de la póliza de la sexta prórroga y tercera modificación del convenio al 30/09/2025 | Min-Interior – Municipio<br>26-Mar-2025 | **Se cumplió hasta el 2 de mayo de 2025** |

| **MESA DE TRABAJO DEL 03 DE ABRIL DE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>8/04/2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Cargue informe técnico de incumplimiento de la interventoría. | Min-Interior- Municipio de Balboa -Interventoría<br>8/04/2025 | **CUMPLIDO** |
| 3 | Remitir correo al Min-Interior con el pantallazo de la subsanación del error de la póliza del convenio. | Min-Interior – Municipio de Balboa<br>8/04/2025 | **CUMPLIDO** |
| 4 | Informes de supervisión del municipio a marzo de 2025. | Min- Interior – Municipio de Balboa<br>8/04/2025 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | RELACIÓN, remisión y cargue de los informes mensuales y semanales de interventoría a marzo de 2025. | Min-Interior – Municipio de Balboa – Interventoría<br>8/04/2025 | **Contamos con 23 informes semanales del 23 de octubre de 2024 al 2 de abril de 2025.**<br><br>**Sobre los informes mensuales, solo contamos con 3 informes, así:**<br>**1) del 23 al 29 de octubre de 2024.**<br>**2) del 23 de octubre al 13 de noviembre de 2024.**<br>**3) del 30 de octubre 2024 al** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **25 de enero de 2025.<br><br>INCUMPLIDO** |
| 6 | Respuesta del municipio al Min-Interior sobre el tema de las modificaciones de ítems contractuales. | Min-Interior – Municipio de Balboa<br>8/04/2025 | **INCUMPLIDO** |

| **MESA DE TRABAJO DEL 10 DE ABRIL DE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Presentación del estado del proyecto. | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>15-abr-2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Relación de informes mensuales producidos hasta la fecha por la interventoría. | Min-Interior – Interventoría<br>15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Informes mensuales de interventoría de enero, febrero y marzo. | Min-Interior – Interventoría<br>15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 4 | Informe de supervisión de marzo de 2024. | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>15-abr-2024 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | Remisión del estudio de la interventoría sobre el balance presupuestal o relación de precios de ítems a modificar. | Min-Interior – Interventoría<br>15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 6 | Enviar fotos del avance de la fabricación de la cubierta. | Min- Interior – contratista de obra<br>15-abr-2024. | **CUMPLIDO** |
| 7 | Enviar certificaciones de calidad de los ítems a modificar, a la interventoría y copia al Ministerio del Interior. | Contratista de obra<br>15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 8 | Acta de visita de interventoría a taller de inspección a la fabricación cubierta. | Min-Interior contratistas de obra e interventoría<br>15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |

| **MESA DE TRABAJO DEL 24 DE ABRIL DE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>30-abr-2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Acta de visita a taller del 26 de abril de 2025, donde se construye la cubierta. | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Copia oficio de remisión de las certificaciones de calidad a interventoría | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 4 | Copia oficio de pronunciamiento de la interventoría frente a la solicitud de modificaciones por parte del contratista de obra. | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Copia oficio del municipio al ministerio, solicitando el pronunciamiento del ministerio, frente a la solicitud de modificaciones de ítem. | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 6 | Informe de avance de los tramites de RETIE y RETILAP | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>30-abr-2025. | **INCUMPLIDO** |

**El 16 de mayo de 2025:** Mediante el oficio con No. de radicado 2025-2-003122-016781 Id: 540226 con asunto: *"**Alerta No.3 -** Reiteración al requerimiento No.2, con radicado 2025-2-003122-005582 Id: 500729, respecto a la solicitud de cumplimiento de obligaciones contractuales en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2001-2021 suscrito entre el Ministerio del Interior FONSECON y el Municipio de Balboa – Risaralda",* la supervisión del Ministerio del Interior, en atención a los reiterados incumplimientos por parte del Municipio de Balboa – Risaralda en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2001-2021, el Ministerio del Interior solicita de manera inmediata la remisión de información contractual relacionada con la suspensión de los contratos de obra e interventoría, la entrega de informes de supervisión e interventoría pendientes desde noviembre de 2024, y el cumplimiento de compromisos adquiridos en mesas de trabajo con la Contraloría General de la República, advirtiendo el riesgo de inconclusión del proyecto si no se adoptan medidas correctivas oportunas.

*Anexo: Se adjunta oficio* con *No. de radicado 2025-2-003122-016781 Id: 540226.*

**El 22 y 23 de mayo de 2025:** El apoyo a la supervisión del Ministerio del Interior realizó una visita técnica al proyecto del Convenio No. 2001-2021 en Balboa – Risaralda, con el fin de verificar avances y recopilar la información pendiente solicitada mediante el oficio radicado No. 2025-2-003122-016781. Se evidenció atraso en el cronograma, riesgo de incumplimiento del plazo contractual, ausencia de la interventoría en reuniones, falta de informes técnicos y posibles inconsistencias en cantidades y especificaciones. Se reiteró la obligación de cumplir con normas técnicas, especialmente en la instalación de juegos infantiles.

Se pactan compromisos los cuales se describen a continuación:

1) Entregar los informes semanales y mensuales de interventoría conforme al avance real.
2) Remitir los informes de supervisión de noviembre 2024 a abril 2025 y los resultados de laboratorio de materiales instalados.
3) Culminar las obras de reparación según el Dictamen Pericial.
4) Informar las acciones administrativas frente a la contratación derivada.
5) Cumplir con los compromisos de las mesas de seguimiento de la Contraloría General de la República.
6) Dar cumplimiento a lo pactado con la Gerencia Departamental de Risaralda y la veeduría ciudadana.

Adicionalmente, el municipio allegó mediante correo electrónico los informes financieros, extractos bancarios, comprobantes de egreso y órdenes de pago correspondientes al período de noviembre de 2024 a mayo de 2025 para su revisión y trámites pertinentes ante la supervisión del Ministerio del Interior. Adicionalmente, se hace entrega de las actas sobre las cuales se han realizado pagos a la contratación derivada.

*Anexo: Anexo 20 Acta de reunión e informe de visita de seguimiento a la ejecución contractual de proyectos de obra del 22 y 23 de mayo de 2025.*

**El 22 de mayo de 2025:** La Personería Municipal de Balboa – Risaralda, mediante el Oficio No. PMB 247-2025 del 22 de mayo de 2025, presentó un derecho de petición dirigido al alcalde municipal, al director de Infraestructura y Obras Públicas, y a la supervisión del Ministerio del Interior, solicitando el inicio de un proceso sancionatorio contra el Consorcio Sacúdete Balboa, contratista del Convenio 2001-2021. La solicitud se fundamenta en el incumplimiento del pago de salarios y prestaciones sociales a varios trabajadores vinculados al proyecto, hecho evidenciado mediante múltiples solicitudes de conciliación extrajudicial en materia laboral tramitadas por la Personería. Como parte de la petición, la Personería solicita:

(i) el inicio formal del proceso sancionatorio en el marco del Contrato de Obra No. 001 de 2022;
(ii) la orden de pago de los valores adeudados al personal afectado
(iii) la imposición de sanciones legales correspondientes.

La petición se sustenta en el incumplimiento de acuerdos conciliatorios ya firmados y en la responsabilidad solidaria del consorcio consagrada en la *cláusula 19* del contrato, así como en la normatividad laboral vigente. Se adjuntan como soporte actas de conciliación, constancias secretariales y comunicaciones de los trabajadores afectados.

*Anexo: Se adjunta derecho de petición remitido a través de los correos de atención del Ministerio del Interior.*

**El 27 de mayo de 2025:** En respuesta al Oficio No. PMB 247-2025 presentado por la Personería Municipal de Balboa – Risaralda, mediante el cual se solicitó a la supervisión del Ministerio del Interior el inicio de un proceso sancionatorio contra el Consorcio Sacúdete Balboa por el presunto incumplimiento en el pago de obligaciones laborales, la supervisión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana emitió el Oficio con radicado No. **2025-2-003122-018944 Id: 546911** del 27 de mayo de 2025, en el cual se da respuesta formal aclarando que dicha supervisión no es competente para resolver sobre las pretensiones planteadas, dado que el Ministerio del Interior no hace parte de la relación contractual directa con el consorcio. En consecuencia, se procedió a realizar el traslado por competencia al Municipio de Balboa – Risaralda, como entidad contratante, mediante el Oficio No. **2025-2-003122-018920 Id: 546871** del 27 de mayo de 2025, con el fin de que sea esta administración quien evalúe y responda de fondo a las solicitudes formuladas, en el marco de sus competencias legales y contractuales. Ambos oficios fueron remitidos con copia a la Personería Municipal, garantizando el adecuado trámite administrativo de la petición.

*Anexo: Se adjunta respuesta al derecho de petición por parte de la supervisión del convenio del Ministerio del interior y traslado por competencia emitido por la supervisión del Ministerio del Interior.*

**El 16 de mayo de 2025:** Mediante correo electrónico, el municipio de Balboa – Risaralda remitió a la supervisión del Ministerio del Interior las actas de suspensión No. 05 correspondientes a los contratos derivados de obra e interventoría del Convenio 2001-2021. En dichas actas, se acuerda suspender temporalmente ambos contratos hasta el 28 de mayo de 2025, debido al desarrollo de un procedimiento administrativo en curso contra el consorcio interventor. La suspensión fue firmada por los representantes legales del contratista de obra (Consorcio Sacúdete Balboa), de la interventoría (Consorcio Interventoría Balboa 2022) y el supervisor del municipio, con el compromiso de evaluar, una vez concluida la audiencia, la posibilidad de otorgar una prórroga adicional o gestionar el cierre definitivo de los contratos.

*Anexo: Suspensiones No. 5 a la contratación derivada – Balboa – Risaralda.*

**CONCLUSIONES TÉCNICAS**

Con base en las visitas técnicas realizadas los días 22 y 23 de mayo de 2025, la documentación allegada por el municipio, y el análisis del estado actual del Convenio Interadministrativo No. 2001-2021 suscrito entre el Ministerio del Interior – FONSECON y el municipio de Balboa – Risaralda, se concluye que el proyecto presenta un avance físico inferior al esperado, lo cual genera un riesgo alto de incumplimiento frente al plazo establecido en la sexta prórroga (30 de septiembre de 2025). Pese a los reiterados requerimientos por parte de la supervisión, persiste la falta de entrega oportuna y completa de los informes de interventoría y supervisión del municipio, así como deficiencias en el seguimiento técnico y administrativo de la obra.

Se identificó la inasistencia constante del contratista de interventoría a las reuniones convocadas por el Ministerio del Interior, lo cual afecta el control y trazabilidad del proyecto. Adicionalmente, se observaron posibles variaciones en las especificaciones técnicas y cantidades de obra sin sustento documental aprobado, situación que podría derivar en afectaciones a la calidad de la infraestructura y posibles detrimentos patrimoniales.

Como medida preventiva, el municipio notificó mediante correo electrónico la suspensión temporal de los contratos de obra e interventoría hasta el 28 de mayo de 2025, en el marco de un procedimiento administrativo en curso por presunto incumplimiento. Paralelamente, se recibieron los informes financieros del proyecto desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2025, los cuales serán objeto de revisión.

Se insiste en la necesidad urgente de que el municipio adopte medidas correctivas inmediatas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la calidad técnica de la obra, y el cierre exitoso del proyecto dentro del plazo vigente, dando respuesta oportuna y verificable a los compromisos adquiridos ante los entes de control y la supervisión del Ministerio del Interior.

**Nota 1:** La supervisión por parte del municipio aporto informe técnico de supervisión correspondiente al mes de mayo de 2025, junto con informe financiero, extracto bancario y sus respectivos soportes.

**Nota 2:** Continua pendiente la información requerida por la Contraloría General de la Republica.

**COMPONENTE FINANCIERO**

- Se ha tramitado el PRIMER DESEMBOLSO por valor de $225.000.000,00.ML
- Se ha tramitado el SEGUNDO DESEMBOLSO por valor de $820.000.000 ,00 ML contra el 40% de avance en obra.
- El municipio, mediante la audiencia del 16 de abril de 2024, se comprometió a no realizar ningún tipo de pago a los contratistas hasta no constatar el cumplimiento de las acciones que formule el dictamen pericial. Lo anterior, debido a que la supervisión del convenio por parte del Ministerio manifiesta no está de acuerdo con las resoluciones que surgieron del proceso sancionatorio: Resolución número 138 del 20 de marzo de 2024 y Resolución número 084 del 21 de febrero de 2024.
- Está pendiente de tramitar el ULTIMO DESEMBOLSO por valor de $205.000.000 ,00 ML contra el 100% de avance de obra, entrega de certificaciones Retie/Retilap/ Conexión Eléctrica Definitiva y Recibo de obra.
- Se reporta un saldo en la cuenta anterior (abril 2025) de $237.513.049,74 y un saldo actual al mes de mayo de 2025 un valor igual a $230.086.808,74 con unos rendimientos generados al mes de mayo de 2025 un valor de $361.929,83.
- Se evidencian pagos en el informe del mes de mayo 2025 y se relacionan a continuación:

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 6.440,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 1.224,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 272 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 5.022.956,00 | N/A | $ 5.022.956,00 |
| | OBRA ACTA 6 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 33.731.130,24 | N/A | $ 33.731.130,24 |
| | DESCUENTOS DE OP 679 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 7.788.170,00 | N/A | $ 7.788.170,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 6.440,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 1.224,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL PAGADO (2) | | | | $ 866.728.243,85 | $ 56.100.050,00 | $ 922.828.293,85 |

**COMPONENTE JURIDICO**

- Se suscribió cuarta prorroga y segunda modificación al convenio.
- La póliza correspondiente a la última actuación del convenio se encuentra cargada y aprobada por área gestión contractual.
- Se inicia el trámite administrativo por posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No 2001 de 2021, suscrito entre el Ministerio del Interior y Municipio de Balboa - Risaralda.
- El 23 de abril de 2024 se tramita la suspensión del convenio 2001-2021 – Balboa Risaralda por un tiempo no mayor a (2) dos meses, finalizando el día 22 de junio de 2024.
- Se realiza la revisión de la publicación en Cámara Y Comercio y en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) y se evidencia que los asociados al CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 los cuales son: COVILCO S.A.S, el cual contiene la publicación en cámara y comercio y PONCE DE LEON CONSULTORIAS S.A.S. no registra la publicación a la fecha, el cual iría en contra de las obligaciones legales de las Entidades Públicas de reportar mensualmente a Cámara de Comercio las sanciones impuestas.
- Se realiza la ampliación No.1 a la Suspensión No. 1 tramitada y radicada el día 21 de junio de 2024 y cargada al SECOP I.
- Se realizo la ampliación No. 2 a la Suspensión No. 1 tramitada y radicada el día 21 de agosto de 2024 y cargada al SECOP I.
- Se realizo la reanudación del convenio a partir del 23 de octubre de 2024 con fecha de terminación al 30 de octubre de 2024.
- Se realizo la quinta prorroga al convenio, con un nuevo plazo de ejecución del 31 de diciembre de 2024. Tramitado el 30 de octubre de 2024.

- Archivo del trámite por presunto incumplimiento del convenio el día 28 de octubre de 2024, y solicitud de desistimiento al incumplimiento por parte del municipio enviado el 19 de octubre de 2024.
- Se realiza la reanudación al convenio 2001-2021 el 23 de octubre de 2024 con fecha de terminación del 30 de octubre de 2024.
- Se realizo la quinta prorroga al convenio tramitada el 30 de octubre de 2024 con fecha de terminación del 31 de diciembre de 2024.
- El 05 de diciembre de 2024 mediante el memorando con No. 2024-3-003122-036567 Id: 459101 se realiza la remisión de documentación para solicitud de trámite de Prorroga y Reprogramación de recursos del Convenio No. 2001 de 2021, ante la Subdirección de Gestión Contractual adjuntando el Anexo 17 (modificación de contrato o convenio) y toda la documentación correspondiente (ver adjuntos).
- El 27 de diciembre de 2024: Se realiza la respectiva publicación al SECOP de la última modificación al convenio (sexta prorroga y tercera modificación).
- El 26 de marzo de 2025: Se radicó a la Subdirección de Gestión Contractual el inicio de trámite por presunto incumplimiento al convenio interadministrativo 2001-2021 por medio del radicado No. 2025-3-003122-010483 Id: 512457.

**PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO:**

1. **Informar el estado del proceso contractual adelantado al Contrato de Interventoría No. 001 de 2022:** En el marco de las reuniones lideradas por el equipo de seguimiento y control de la Contraloría General de la República, en las cuales participaron la supervisión del municipio de Balboa -Risaralda y la supervisión del Ministerio del Interior, en dichas reuniones fue informado por parte de la supervisión del municipio de Balboa – Risaralda de suspender los contratos de obra e interventoría por un término de quince (15) días, contados a partir del 15 de febrero de 2025;sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido la documentación formal que sustente dichas modificaciones contractuales, por lo que se solicita informar detalladamente el estado actual del proceso contractual en mención.

2. **Remitir informes de supervisión por parte del Municipio:** De acuerdo con los requerimientos No. 2025- 2-003122-000642 Id: 475022 y 2025-2-003122-001365 Id: 480468 con fecha del 14 de enero de 2025 y 23 de enero de 2025 respectivamente, esta supervisión reitera al municipio de Balboa - Risaralda que, a la fecha la Entidad Territorial no ha presentado la documentación correspondiente a la ejecución del convenio; por consiguiente, se requiere la entrega de la información que se relaciona a continuación:

    - Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de noviembre de 2024.
    - Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de enero de 2025.
    - Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de febrero de 2025.
    - Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de marzo de 2025.
    - Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de abril de 2025.
    - Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de enero de 2025.
    - Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de febrero de 2025.
    - Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de marzo de 2025.
    - Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de abril de 2025.
    - Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de abril de 2025.
    - Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de mayo de 2025.

**3. Cumplimiento a los compromisos adquiridos a las reuniones de seguimiento permanente convocadas por la unidad de reacción inmediata de la Contraloría General de la República.** Se solicita a la Entidad Territorial aportar a esta supervisión un informe detallado sobre el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos durante las mesas de trabajo virtuales, realizadas en el marco de las reuniones de seguimiento coordinadas por la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República; cabe resaltar que, si bien en distintas oportunidades, durante dichas mesas, se otorgaron plazos adicionales a los inicialmente establecidos, a la fecha no se ha recibido la documentación ni las evidencias requeridas que respalden su cumplimiento; sin embargo, varios compromisos continúan pendientes por cumplir. La situación anteriormente descrita ha sido consignada en los cuadros de seguimiento elaborados durante el desarrollo de cada reunión, los cuales se relacionan a continuación:

a) Compromisos de las mesas de seguimiento permanente de la CGR entregados el 12 de marzo de 2025.
b) Compromisos de las mesas de seguimiento permanente de la CGR entregados el 20 de marzo de 2025.
c) Compromisos de las mesas de seguimiento permanente de la CGR entregados el 10 de abril de 2025.
d) Compromisos de las mesas de seguimiento permanente de la CGR entregados el 24 de abril de 2025.

Por otra parte, se evidencia que el municipio no ha remitido a la supervisión del Ministerio del Interior los informes de supervisión del municipio e interventoría, los cuales se detallan a continuación:

- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de noviembre de 2024.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de enero de 2025.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de febrero de 2025.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de abril de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de enero de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de febrero de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de abril de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de abril de 2025.
- Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de abril de 2025.
- Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de mayo de 2025.

El presente informe deja constancia de que aún existen compromisos pendientes por parte del municipio en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Convenio No. 2001-2021. Estos compromisos son de estricto cumplimiento y han sido requeridos en reiteradas ocasiones por esta supervisión.
Se advierte que la **NO** entrega de los mismos, podría constituir un presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas con el Ministerio del Interior.

1. **FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO** (orden cronológico).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 15/06/2023 | 27/07/2023 | 20/09/2023 | 22/02/2024 | 03/07/2024 |
| 28/11/2024 | 22/05/2025 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA |

2. **SUPERVISOR.**

| | |
|---|---|
| **Ing. Viterbo Gómez Carvajal**<br>Supervisor del Convenio.<br>Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON. | **Ing. Laura L. Murillo Valles**<br>Elaboró - Apoyo a la Supervisión del convenio.<br>Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON. |

| INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON |
|---|
| Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. **2001 de 2021**, MUNICIPIO DE BALBOA **-** RISARALDA |
| INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **MAYO DE 2025** |

## 1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA. | | |
| **UBICACIÓN DEL PROYECTO:**<br>(**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio<br>**Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar) | VEREDA TAMBORES - CONTIGUO AL COLISEO | | |
| **BENEFICIARIO:** | MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA | | |
| **VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO** | **APORTES MIN – FONSECON** | | $1.250.000.000 |
| | **APORTES ENTIDADES PÚBLICAS** | | $ 0,00 |
| | **TOTAL, APORTES DEL CONVENIO** | | $1.250.000.000 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 17-NOV-2021 | | |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 31-MAYO-2022 | **FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO** | 30-SEPT-2025 |
| **SUPERVISORES DEL CONVENIO/ CONTRATO** | **NOMBRE** | **DESDE** | **HASTA** |
| | ING. YENIER HENAO MEJÍA | 17/11/2021 | 20/04/2023 |
| | ARQ. NORMAN ORTIZ TOVAR | 21/04/2023 | 02/04/2023 |
| | ING. SERGIO VEGA NOVOA | 28/04/2023 | 25/09/2023 |
| | ING. EDGAR GONZÁLEZ PATIÑO | 26/09/2023 | 18/10/2023 |
| | ING. SERGIO VEGA NOVOA | 19/10/2023 | 27/08/2024 |
| | ING. SERGIO SANJUAN SANTIAGO | 28/08/2024 | 10/09/2024 |
| | ***ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL*** | ***11-09-2024*** | ***ACTUAL*** |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **DESDE:** | **HASTA:** |
| | ARQ. DANIEL SUAREZ | 17/11/2021 | 31/03/2022 |
| | ING. KELLY PETRO | 01/04/2022 | 30/09/2022 |
| | ING. KELLY PETRO | 11/11/2022 | 31/12/2022 |
| | ING. KELLY PETRO | 27/01/2023 | 25/06/2023 |
| | ING. KELLY PETRO | 14/0/2023 | 23/10/2023 |
| | ING. LAURA MURILLO V. | 23/10/2023 | 30/12/2023 |
| | ING. LAURA MURILLO V. | 22/01/2024 | 22/09/2024 |
| | ARQ. MAURICIO GUARNIZO. | 23/09/2024 | 10/10/2024 |
| | ING. LAURA MURILLO V. | 11/10/2024 | 31/12/2024 |
| | ING. VITERBO GÓMEZ CARVAJAL | 01/01/2025 | 06/02/2025 |
| | ***ING. LAURA MURILLO VALLES*** | ***07/02/2025*** | ***ACTUAL*** |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO** | **No. Nº 58821<br>35222** | **04-NOV-2021<br>19-01-20222** | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO** | **N/A** | **DD-MES-AAAA** | |
| **COMPROMISO VIGENCIA FUTURA** (si aplica) | **2-2021-058100** | **03-NOV-2021** | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL** | **A-03-03-01-032** | **12-NOV-2021** | |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | **No.580-47-994000069129** | **12-NOV-2021 ANEXO 0** | |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO** | **17-NOV-2021** | | |
| | **PRÓRROGA** | **FECHA: 26/05/2022** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | **PRÓRROGA** | | | **FECHA: 30/11/2022** |
| | **PRÓRROGA** | | | **FECHA: 26/06/2023** |
| | **PRÓRROGA** | | | **FECHA: 04/09/2023** |
| **FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO** (adjuntar casillas si es necesario) | **SUSPENSIÓN** | | | **FECHA: 23/04/2024** |
| | **AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 1** | | | **FECHA: 23/06/2024** |
| | **AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 2** | | | **FECHA: 23/08/2024** |
| | **REANUDACIÓN** | | | **FECHA: 23/10/2024** |
| **FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL** | No.580-47-994000069129 | | 12-NOV-2021 ANEXO 0 | |
| **PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN** (Vigencia nueva del amparo) | ***Actuación*** | ***Monto*** | ***Vigencia*** | |
| | | | ***Desde*** | ***Hasta*** |
| **Modificación / Anexo N° 10** | ***Prórroga*** | ***$ 264.600.000*** | ***12/11/2021*** | ***30/03/2026*** |
| **CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)** | $0.00 | | | |
| **VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ 83.333.000,00 | | | |
| **VALOR DE OBRA** | $ 1.041.000.000,00 | | | |
| **VALOR INTERVENTORÍA** | $ 124.971.539,00 | | | |
| **VALOR INVERSION RECURSOS DEL CONVENIO** | ***$ 1.249.306.539,00*** | | | |

**2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO**

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

| CONCEPTO | REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| **PRIMER DESEMBOLSO** | 1. SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO<br>2. DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO.<br>3. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONVENIO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO | NO APLICA | 07/12/2021 | $ 225.000.000,00 |
| **SEGUNDO DESEMBOLSO** | 1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 40% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.<br>2. EL CORRESPONDIENTE INFORME DE INTERVENTORÍA CON REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE.<br>3. LA RESPECTIVA ACTA PARCIAL DE OBRA AVALADA POR EL INTERVENTOR<br>4. EVIDENCIA DEL INICIO EN LA EJECUCIÓN DEL TRÁMITE ANTE LA EMPRESA COMPETENTE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y/O RETILAP | 40% | 25/10/2023 | $ 820.000.000,00 |
| **ÚLTIMO DESEMBOLSO** | 1. LA CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO DESIGNADO POR EL MUNICIPIO QUE ACREDITE EL AVANCE DEL 100% DE EJECUCIÓN DE OBRA, LA CUAL DEBE INCLUIR:<br>a. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance<br>b. La respectiva acta final de obra avalada por el interventor<br>2. ENTREGA DE LA CERTIFICACIÓN RETIE Y/O RETILAP. | 100% | | 205.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3. ENTREGA AL MINISTERIO DEL INTERIOR DE "ACTA DE RECIBO Y ENTREGA DE BIENES PROYECTOS FONSECON" (ANEXO 26), DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. | | | |
| **TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME** | | | | **$1.045.000.000 (83,60%)** |
| **TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME** (según información de contratación derivada) | | | | **$ 999.508.768,61 (80,03)** |

## 3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

**Nombre Aseguradora:** Aseguradora solidaria de Colombia

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | *FECHA INICIO* | *FECHA FINAL* |
| 580 47 994000069129 | Cumplimiento anexo 0 | $ 250.000.000 | 12/11/2021 | 30/11/2022 |
| | Cumplimiento anexo 1 | $ 250.000.000 | 12/11/2021 | 28/05/2023 |
| | Cumplimiento anexo 2 | $ 250.000.000 | 12/11/2021 | 01/06/2023 |
| | Cumplimiento anexo 3 | $ 264.600.000 | 12/11/2021 | 30/12/2023 |
| | Cumplimiento anexo 4 | $ 264.600.000 | 12/11/2021 | 30/04/2024 |
| | Cumplimiento anexo 5 | $ 264.600.000 | 12/11/2021 | 29/04/2025 |
| | Cumplimiento anexo 6 | -$ 264.600.000 | 12/11/2021 | 29/04/2025 |
| | Cumplimiento anexo 7 | $ 264.600.000 | 12/11/2021 | 29/04/2025 |
| | Cumplimiento anexo 8 | $ 264.600.000 | 12/11/2021 | 29/04/2025 |
| | Cumplimiento anexo 9 | $ 264.600.000 | 12/11/2021 | 29/04/2025 |
| | Cumplimiento anexo 10 | $ 264.600.000 | 12/11/2021 | 30/03/2026 |

## 4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato: 001 DE 2022** | **REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA** | ***$ 1.124.000.000*** |
| **Link de Consulta: SECOP** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28797&g-recaptcha-response=03AFcWeA6rZE0XQJ2lQnNx8MLnaDPxHXMMG68SVdFw8mSPJ8zjWGRb9tctYvomTPRpQili0cAvor4kCWuohqqhB1ExuuufCibFnH2j79ju7HWfWoDl2jJ_fjogPv0SnDM6cx94YU6n5B44j6beTTA4_EElmyaArQWiMhtn754kcbMtx-UbnUcVjbkgPOvZ-z0cK5jcuXeo-zHiC9f6H-5Nr39wNkl7bpT5zjAOTBwuOzwvl9d28qbG8O2qkJLoSNyjXpH5tWDyciaY-UmyrNvhxb33xZWoGr5rUZv9ZuDFTmcze2NfUc1nExX2NCMpAsgaeGl4AlkpqSRlxI7LZalRieZWrzMrJas6BsqULDV9Fw6QcMcH3IssM5uM6EjZ5mzADaKdrCjonR76vVsh2FH1ZQsRHD6sBDeRlqXEzUSAJdwG09xbljTq4TQjE0lUNp4yp-7XlYFFV5pb_NcipOWhhSCLJy009fmyoSRDg7Gmo9VJ29S0vkmHzO9UjTTGspltbjZn3VgVDvERznla904Sz7MSiW6EHkvrdLedBq7s2weJiv1nNY-jHYmQS93gUwtXkhP1KHpVckjdhTSpKksDyvf4i7ky1EsEbbTPz4xP0xQuFsKNO4-9RieGK8Rm_WaGnNjjJjmleOMG03NBts6pfSdHuxJwTlm7NdxMiyQHfLzudYBt6Xj1gZZ36t6sJdBMx284d0lxvmwg39PuDvK4_xPFEWHSgAW8LBPBUN9bfg821NZgnn56W1eKPlkHlZzU_oorCFtdDWZ2CghxZj-mZy8e4zN48sqToF5wDmvNQZJE3kl0hxj2LE4uSrovqJJZHvY5siEAxT_bGLsDDykBrVIliW_k89xltyQ91SkbsVY5F810SU9eCbU0e_8il9k8ttY3Tr-eEwOSEbS2l1Y31xYNkmyyOmNxdXXpHzqoi8zwGpBnplulxYvBgyWOWdfvAgZo9gYrpXJK | |

| | | |
|---|---|---|
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | **ADICIÓN N° 01** | ***$ 67.244.892,00*** |
| | **MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO** | ***$ 1.191.244.892,00*** |
| **Nombre contratista** | Empresa<br>**CONSORCIO SACÚDETE BALBOABALBOA**<br>Representante Legal<br>**EDUARDO CIFUENTES** | NIT: **901.574.342-5** |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | **18/06/2022** | Duración<br>Cinco (5) meses<br>**17/11/2022** |

| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tipo de Acta** | **Días** | **Desde** | **Hasta** |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)** | **SUSPENSIÓN N° 01** | **31 DÍAS** | **12/11/2022** | **13/12/2022** |
| | **REINICIO N° 01** | **03 DÍAS** | **13/12/2022** | **16/12/2022** |
| | **PRÓRROGA 00** | **5 MESES** | **16/12/2022** | **15/05/2023** |
| | **PRORROGA 01** | **37 DÍAS** | **16/05/2023** | **22/06/2023** |
| | **PRORROGA 02** | **4 MESES** | **21/06/2023** | **21/10/2023** |
| | **SUSPENSION 02** | **171 DÍAS** | **21/10/2023** | **09/04/2024** |
| | **REINICIO 02** | **02 DÍAS** | **09/04/2024** | **11/04/2024** |
| | **PRÓRROGA 03** | **18 DÍAS** | **12/04/2024** | **30/04/2024** |
| | **SUSPENSION 03** | **2 MESES** | **24/04/2024** | **22/06/2024** |
| | **PRÓRROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN 03** | **2 MESES** | **22/06/2024** | **21/08/2024** |
| | **PRÓRROGA N° 02 A LA SUSPENSIÓN 03** | **2 MESES** | **21/08/2024** | **23/10/2024** |
| | **REINICIO 03** | **06 DIAS** | **23/10/2024** | **29/10/2024** |
| | **PRÓRROGA 05** | **2 MESES** | **30/10/2024** | **30/12/2024** |
| | **PRÓRROGA 06** | **47 DÍAS** | **30/12/2024** | **15/02/2025** |
| | **SUSPENSION 04** | **07 DÍAS** | **14/02/2025** | **21/02/2025** |
| | **REINICIO 04** | **01 DIAS** | **24/02/2025** | **25/02/2025** |
| | **PRÓRROGA 07** | **28 DÍAS** | **25/02/2025** | **25/03/2025** |
| | **PRÓRROGA 08** | **2 MESES** | **25/03/2025** | **25/05/2025** |
| | **SUSPENSION 05** | **05 DÍAS** | **23/05/2025** | **28/05/2025** |
| | ***PRORROGA 01 SUSPENSION 05*** | ***15 DÍAS*** | ***28/05/2025*** | ***11/06/2025*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | **17/11/2022** | **Fecha Actual de terminación del contrato** | **13/06/2025** |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | ***$ 1.191.244.892,00*** |
| **ESTADO DEL CONTRATO: *CONTRATO SUSPENDIDO*** | |
| **Otros Sí** | |
| **13/12/2022** | Modificación de Anticipo (15%) y Modificación de AIU (25%). |
| **16/12/2022** | Adición $ 67.244.892,00 y prorroga por cinco (05) meses |

| ***COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO***<br>***N° 75-44-101121093 APROBADA RESOLUCIÓN 093 DE FECHA 04/05/2022*** | | ***Monto*** | ***Vigencias*** | |
| | | | ***Desde*** | ***Hasta*** |
| ***EMISIÓN ORIGINAL 04/05/2022 Anexo 0*** | ***Cumplimiento del Contrato*** | **$224.800.000.00** | ***03/05/2022*** | ***03/04/2023*** |
| | ***Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo*** | **$312,200,100.00** | ***03/05/2022*** | ***03/04/2023*** |
| | ***Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones*** | **$56.200.000,00** | ***03/05/2022*** | ***03/10/2025*** |
| | ***Estabilidad y Calidad de la Obra*** | **$337.200.000,00** | ***CINCO (5) AÑOS*** | |
| | ***Calidad del Servicio*** | **$16,666,600.00** | ***03/10/2022*** | ***03/10/2025*** |
| ***MODIFICACIÓN 16/12/2022*** | ***Cumplimiento del Contrato*** | **$224.800.000.00** | ***03/05/2022*** | |
| | ***Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo*** | **$312,200,100.00** | ***03/05/2022*** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Anexo 1* | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $56.200.000,00 | *03/05/2022* | |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $337.200.000,00 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $16,666,600.00 | *03/10/2022* | |
| *MODIFICACIÓN 16/12/2022 Anexo 2* | *Cumplimiento del Contrato* | $224.800.000.00 | *18/06/2022* | *19/05/2023* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $312,200,100.00 | *18/06/2022* | *19/05/2023* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $56.200.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2025* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $337.200.000,00 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $16,666,600.00 | *18/11/2022* | *18/11/2027* |
| *MODIFICACIÓN 20/12/2022 Anexo 3* | *Cumplimiento del Contrato* | $224.800.000.00 | *18/06/2022* | *19/06/2023* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $312,200,100.00 | *18/06/2022* | *19/06/2023* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $56.200.000,00 | *18/06/2022* | *19/12/2025* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $337.200.000,00 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $16,666,600.00 | *18/11/2022* | *18/11/2027* |
| *MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 4* | *Cumplimiento del Contrato* | $238,248,978.40 | *18/06/2022* | *19/06/2023* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $312,200,100.00 | *18/06/2022* | *19/06/2023* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $59,562,244.60 | *18/06/2022* | *19/12/2025* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $357,373,467.60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $16,666,600.00 | *18/11/2022* | *18/11/2027* |
| *MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 5* | *Cumplimiento del Contrato* | $238,248,978.40 | *18/06/2022* | *19/11/2023* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $312,200,100.00 | *18/06/2022* | *19/11/2023* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $59,562,244.60 | *18/06/2022* | *19/05/2026* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $357,373,467.60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $16,666,600.00 | *18/11/2022* | *18/11/2027* |
| *MODIFICACIÓN 30/05/2023 Anexo 6* | *Cumplimiento del Contrato* | $238,248,978.40 | *18/06/2022* | *25/12/2023* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $312,200,100.00 | *18/06/2022* | *25/12/2023* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $59,562,244.60 | *18/06/2022* | *25/06/2026* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $357,373,467.60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $16,666,600.00 | *18/11/2022* | *18/11/2027* |
| *MODIFICACIÓN 25/07/2023 Anexo 7* | *Cumplimiento del Contrato* | $238,248,978.40 | *18/06/2022* | *25/04/2024* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $312,200,100.00 | *18/06/2022* | *25/04/2024* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $59,562,244.60 | *18/06/2022* | *25/10/2026* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $357,373,467.60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $16,666,600.00 | *18/11/2022* | *18/11/2027* |
| MODIFICACIÓN 09/04/2024 Anexo 8 | *Cumplimiento del Contrato* | $ 238.248.978,40 | *18/06/2022* | *13/10/2024* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $ 312.200.100,00 | *18/06/2022* | *13/10/2024* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $ 357.373.467,60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $ 16.666.600,00 | *18/06/2022* | *18/11/2027* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $ 59.562.244,60 | *18/06/2022* | *13/04/2027* |
| MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 9 | *Cumplimiento del Contrato* | $ 238.248.978,40 | *18/06/2022* | *13/10/2024* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $ 312.200.100,00 | *18/06/2022* | *13/10/2024* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $ 357.373.467,60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $ 16.666.600,00 | *18/06/2022* | *18/11/2027* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $ 59.562.244,60 | *18/06/2022* | *13/04/2027* |
| MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 10 | *Cumplimiento del Contrato* | $ 238.248.978,40 | *18/06/2022* | *13/10/2024* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $ 312.200.100,00 | *18/06/2022* | *13/10/2024* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $ 357.373.467,60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $ 16.666.600,00 | *18/06/2022* | *13/04/2029* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $ 59.562.244,60 | *18/06/2022* | *13/04/2027* |
| MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 11 Aprobada según Resolución 033 del 16/04/2024 | *Cumplimiento del Contrato* | $ 238.248.978,40 | *18/06/2022* | *29/10/2024* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $ 312.200.100,00 | *18/06/2022* | *13/10/2024* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $ 357.373.467,60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $ 16.666.600,00 | *18/06/2022* | *29/04/2029* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $ 59.562.244,60 | *18/06/2022* | *29/04/2027* |
| | *Cumplimiento del Contrato* | $ 238.248.978,40 | *18/06/2022* | *29/04/2025* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MODIFICACIÓN 24/10/2024 Anexo 13** | *Anticipo* | $ 312.200.100,00 | *18/06/2022* | *13/10/2024* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $ 357.373.467,60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $ 16.666.600,00 | *18/06/2022* | *29/10/2029* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $ 59.562.244,60 | *18/06/2022* | *29/10/2027* |
| **MODIFICACIÓN 06/11/2024 Anexo 14** | *Cumplimiento del Contrato* | $238,248,978.40 | *18/06/2022* | *30/06/2025* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $312,200,100.00 | *18/06/2022* | *30/06/2025* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $59,562,244.60 | *18/06/2022* | *30/12/2027* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $357,373,467.60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $16,666,600.00 | *18/06/2022* | *30/12/2029* |
| **MODIFICACIÓN 14/01/2025 Anexo 15** | *Cumplimiento del Contrato* | $238,248,978.40 | *18/06/2022* | *15/08/2025* |
| | *Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo* | $312,200,100.00 | *18/06/2022* | *15/08/2025* |
| | *Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones* | $59,562,244.60 | *18/06/2022* | *15/02/2028* |
| | *Estabilidad y Calidad de la Obra* | $357,373,467.60 | *CINCO (5) AÑOS* | |
| | *Calidad del Servicio* | $16,666,600.00 | *18/06/2022* | *15/02/2030* |

| *COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO* | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Responsabilidad Civil Extracontractual.*<br>*No. 75-40-101044699 Aprobada Resolución 093 de fecha 04/05/2022* | | *Monto* | *Vigencias* | |
| | | | *Desde* | *Hasta* |
| ***EMISIÓN ORIGINAL 04/05/2022*** | *Predios Labores y Operaciones* | $ 300.000.000,00 | *03/05/2022* | *03/10/2022* |
| | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | $ 300.000.000,00 | *03/05/2022* | *03/10/2022* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | $ 300.000.000,00 | *03/05/2022* | *03/10/2022* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | $ 300.000.000,00 | *03/05/2022* | *03/10/2022* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | $ 300.000.000,00 | *03/05/2022* | *03/10/2022* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | $ 300.000.000,00 | *03/05/2022* | *03/10/2022* |
| **MODIFICACIÓN DE 16/12/2022 Anexo 01** | *Predios Labores y Operaciones* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| **MODIFICACIÓN DE 16/12/2022 Anexo 02** | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *18/11/2022* |
| **MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 3** | *Predios Labores y Operaciones* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/12/2022* |
| | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/12/2022* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/12/2022* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/12/2022* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/12/2022* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/12/2022* |
| **MODIFICACIÓN 22/12/2022 Anexo 4** | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/05/2023* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/05/2023* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/05/2023* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/05/2023* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *19/05/2023* |
| **MODIFICACIÓN 30/05/2023 Anexo 5** | *Predios Labores y Operaciones* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *25/06/2023* |
| | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *25/06/2023* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *25/06/2023* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *25/06/2023* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *25/06/2023* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *25/06/2023* |
| **MODIFICACIÓN 25/07/2023 Anexo 6** | *Predios Labores y Operaciones* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *25/10/2023* |
| | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *25/10/2023* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | $ 300.000.000,00 | *18/06/2022* | *25/10/2023* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Contratistas y Subcontratistas* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *25/10/2023* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *25/10/2023* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *25/10/2023* |
| *MODIFICACIÓN 10/04/2024 Anexo 7* | *Predios Labores y Operaciones* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *13/04/2024* |
| | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *13/04/2024* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *13/04/2024* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *13/04/2024* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *13/04/2024* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *13/04/2024* |
| **MODIFICACIÓN 15/04/2024 Anexo 8** | *Predios Labores y Operaciones* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/04/2024* |
| | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/04/2024* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/04/2024* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/04/2024* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/04/2024* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/04/2024* |
| **MODIFICACIÓN 24/10/2024 Anexo 9** | *Predios Labores y Operaciones* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/10/2024* |
| | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/10/2024* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/10/2024* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/10/2024* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/10/2024* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *29/10/2024* |
| **MODIFICACIÓN 13/01/2025 Anexo 12** | *Predios Labores y Operaciones* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *15/02/2025* |
| | *Daño Emergente y Lucro Cesante* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *15/02/2025* |
| | *Perjuicios Extrapatrimoniales* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *15/02/2025* |
| | *Contratistas y Subcontratistas* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *15/02/2025* |
| | *Responsabilidad Civil Patronal* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *15/02/2025* |
| | *Vehículos Propios y No Propios* | *$ 300.000.000,00* | *18/06/2022* | *15/02/2025* |

- ***Contrato de Ejecución Interventoría***

| DESCRIPCIÓN | OBJETO | VALOR |
|---|---|---|
| **No. del contrato: 001 DE 2022** | **OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA** | ***$124.971.539.00*** |
| **Link de Consulta: SECOP** | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955&g-recaptcha-response=03AFcWeA7LBapopn_7yFtq6hbsPtbhvJHGZDWfEoLbfV-qOea4n67i6olo_qkOg5w9DSACUxLrafrdd3YOn7pqGQgvDRcplCygUecKMevag4C08me-mzuhspd9s2OfHrLf3C-6RFTl3b-SYnvwLP4YSmEcAgEg7YxAxuPWxeHuFhjdaCtvxWvQmeG-DrdZYys5EJ-ZrH6XRLb_FO2WKMj8GpFbjcy430ui2JPb-SMRGvXBHj9vdQXryl5kuY5mm1WdpZXivjrMy1UGBPKNnaCnRlcQDYwkuYd5TpjRaPzCp13yXE0_deTSKYxDczKC8flV17V2ukMtl_vQALOaQfSAyUh2xqmrZ5N-mBuSWfNgiAcFhaAvIzec76Rt4oG9Fxh7dVN2pm3_nAEHAOpO2UV7h21K07iYX4T37RsT0Qea03_UVnL2ZO35ZQO6RvlNu0BziH5gdGqstvgHJvoWEuGauDQm2KRsccCjcLTd6J-7lFYRlHwsVJQ-DMFjch0DpKK4h8Lwm5he6TQxgNWLCanKgyLiyVyG2ZbnrDw-0vrTeebigGRuS4xl51QpOBnFnaUECOKvMd7L5T07J7NLLVHfj16_UltULP8LU1KIVQDYizQVJTCg6Q_W1s-Wxi5EGpFwbbgZJqQ0mQGeU6VP-jRl2NHhJpdJw5Slwr0F9q4e51gU16dUB2pgbgC7OeLAjidata9br2K9ssnurfGTGdXCu74JCod7NJkjcjE-q_F8HnVyM7h5HOjKkc_k8LdxG1Hi5VkAvXw1eJe2N8fmFHTsuxFCSeJU3Xnxbi6_7uuqln42lJL9lGoULL7siepo-hzfTDTsQ7glQVnRB1bM4oLw8MJUO7OuAtl2Z4v-zndMOUrZ- | |

| | | |
|---|---|---|
| | 5MSB73X1lo3TqaLwZJNxKOJNGKKthNql1NJEM_aNwiOhzyDPuQ7E37n7jaSxqEJGasbD4vayey0yhnj8sXlWV0RLEU9c40V | |
| **Adicional en valor** (adjuntar celdas si es necesario) | **ADICIÓN N° 01** | ***$ 5.382.898,00*** |
| | **MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO** | ***$ 130.354.437,00*** |
| **Nombre contratista** | Empresa<br>**CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022**<br>Representante Legal<br>**CARLOS RAMBAL BUENDIA** | NIT: **NIT.901598981-5**<br>C.C. **72.002.179** |
| **Fecha de Acta de inicio del contrato** | **18/06/2022** | Duración cinco (5) meses<br>17/11/2022 |

| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tipo de Acta** | **Días** | **Desde** | **Hasta** |
| **Prórrogas, Suspensiones y Reinicios.** | **SUSPENSIÓN N° 01** | **31 DÍAS** | **12/11/2022** | **13/12/2022** |
| | **REINICIO N° 01** | **03 DÍAS** | **13/12/2022** | **16/12/2022** |
| | **PRÓRROGA 00** | **5 MESES** | **16/12/2022** | **15/05/2023** |
| | **PRORROGA 01** | **37 DÍAS** | **16/05/2023** | **22/06/2023** |
| | **PRORROGA 02** | **4 MESES** | **21/06/2023** | **21/10/2023** |
| | **SUSPENSIÓN 02** | **171 DÍAS** | **21/10/2023** | **09/04/2024** |
| | **REINICIO 02** | **02 DÍAS** | **09/04/2024** | **11/04/2024** |
| | **PRÓRROGA 03** | **18 DÍAS** | **12/04/2024** | **30/04/2024** |
| | **SUSPENSIÓN 03** | **2 MESES** | **24/04/2024** | **22/06/2024** |
| | **PRÓRROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN 03** | **2 MESES** | **22/06/2024** | **21/08/2024** |
| | **PRÓRROGA N° 02 A LA SUSPENSIÓN 03** | **2 MESES** | **21/08/2024** | **23/10/2024** |
| | **REINICIO 03** | **06 DIAS** | **23/10/2024** | **29/10/2024** |
| | **PRÓRROGA 05** | **2 MESES** | **30/10/2024** | **30/12/2024** |
| | **PRÓRROGA 06** | **47 DÍAS** | **30/12/2024** | **15/02/2025** |
| | **SUSPENSIÓN 04** | **07 DÍAS** | **14/02/2025** | **21/02/2025** |
| | **REINICIO 04** | **01 DIAS** | **24/02/2025** | **25/02/2025** |
| | **PRÓRROGA 07** | **28 DÍAS** | **25/02/2025** | **25/03/2025** |
| | **PRÓRROGA 08** | **2 MESES** | **25/03/2025** | **25/05/2025** |
| | **SUSPENSIÓN 05** | **05 DÍAS** | **23/05/2025** | **28/05/2025** |
| | ***PRORROGA 01 SUSPENSIÓN 05*** | ***15 DÍAS*** | ***28/05/2025*** | ***11/06/2025*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Inicial de terminación del contrato** | **17/11/2022** | **Fecha Actual de terminación del contrato** | **13/06/2025** |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL CONTRATADO:** | ***$ 130.354.437,00*** |
| **ESTADO DEL CONTRATO: *CONTRATO SUSPENDIDO*** | |
| **Otros Sí** | |
| **16/12/2022** | Adición $ 5.382.898,00 y prorroga por cinco (05) meses |

| ***COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA*** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***PÓLIZA N°*** <u>440-47-994000026471</u> **APROBADA N/A** | | ***Monto*** | ***Vigencias*** | |
| | | | ***Desde*** | ***Hasta*** |
| ***17/06/2022*** | ***Cumplimiento*** | **$ 12.497.153,90** | ***10/06//2022*** | ***10/01/2023*** |
| | ***Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones*** | **$ 6.248.576,95** | ***10/06/2022*** | ***10/11/2025*** |
| | ***Calidad del Servicio*** | **$ 24.994.307,80** | ***10/11/2022*** | ***10/11/2027*** |
| ***14/12/2022*** | ***Cumplimiento*** | **$ 12.497.153,90** | ***10/06//2022*** | ***17/02/2023*** |
| | ***Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones*** | **$ 6.248.576,95** | ***10/06/2022*** | ***17/12/2025*** |
| | ***Calidad del Servicio*** | **$ 24.994.307,80** | ***17/12/2022*** | ***17/12/2027*** |
| ***29/05/2023*** | ***Cumplimiento*** | **$ 13.035.443,70** | ***10/06//2022*** | ***23/08/2023*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones*** | **$ 6.517.721,85** | ***10/06/2022*** | ***23/06/2026*** |
| | ***Calidad del Servicio*** | **$ 26.070.887,40** | ***23/06/2023*** | ***23/06/2028*** |
| ***14/12/2023*** | ***Cumplimiento*** | **$ 13.035.443,70** | ***10/06//2022*** | ***24/04/2024*** |
| | ***Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones*** | **$ 6.517.721,85** | ***10/06/2022*** | ***22/02/2027*** |
| | ***Calidad del Servicio*** | **$ 26.070.887,40** | ***23/06/2023*** | ***22/02/2029*** |
| ***ANEXO 9*** | ***Cumplimiento*** | **13,035,443.70** | ***10/06//2022*** | ***29/12/2024*** |
| | ***Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones*** | **6,517,721.85** | ***10/06/2022*** | ***29/10/2027*** |
| | ***Calidad del Servicio*** | **26,070,887.40** | ***29/10/2024*** | ***29/10/2029*** |
| ***ANEXO 10*** | ***Cumplimiento*** | **13,035,443.70** | ***10/06//2022*** | ***29/12/2024*** |
| | ***Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones*** | **6,517,721.85** | ***10/06/2022*** | ***29/10/2027*** |
| | ***Calidad del Servicio*** | **26,070,887.40** | ***29/10/2024*** | ***29/10/2029*** |

## 5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

| | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: | ***Abril 2025*** | |
| INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | | ***X*** |
| INFORME FINANCIERO | ***X*** | |
| SALDO DE LA CUENTA BANCARIA | ***X*** | |
| OTROS | | ***X*** |

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:**

| *La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:* | **PORCENTAJE (%)** |
|---|---|
| **% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA** | **100,00%** |
| **% EJECUTADO DE OBRA PMC CONSULTORÍA No 001-2024** | **63,28 %** |

***02 de Mayo de 2025***

- Se realiza recorrido en el lugar de la obra para conocer el estado actual de la obra.
- Se hace entrega de lista de verificación de documentos para la presentación de actas de cobro.
- Se procedió a la verificación de los valores amortizados al anticipo acumulados a la fecha abarcando desde el acta 01 hasta el acta 06, siendo esta última la que reposa en el expediente de contratación presentando el siguiente resumen:

| ***MONTO INICIAL DEL ANTICIPO*** | ***AMORTIZADO A LA FECHA*** | ***SALDO POR AMORTIZAR*** |
|---|---|---|
| ***$ 156.100.050,00*** | ***$ 76.695.772,76 (49,13%)*** | ***$ 79.404.277,24 (50,87%)*** |

- Teniendo en cuenta la situación actual del anticipo y con la finalidad de lograr la devolución total del mismo con las actividades que aún se encuentran pendientes de ejecución dentro del contrato, se acordó realizar un descuento del 25% de los montos que arrojen las próximas actas hasta el reintegro total de los 156.100.050,00 otorgados inicialmente.
- La ingeniera **Adriana Uribe** manifestó la importancia de realizar los comités en campo con presencia de la interventoría, dado que en la visita anterior no se encontró personal de interventoría y hoy presentaron excusas por su ausencia.

Adicionalmente y como resultado del recorrido realizado en obra se hicieron las siguientes observaciones:

- Solicitud de demolición y corrección de banca torcida.
- Ausencia de SISO en obra, señalización y demarcación deficiente.
- Riesgos evidentes: cajas sin tapa, tablas y herramientas en el piso, cables sueltos, formaletas con puntillas expuestas, falta de punto de acopio para escombros y camilla de primeros auxilios mal ubicada.
- Detalles constructivos por mejorar: cerámica en baños, columna de soporte de mesón fuera de nivel, viga con hormigón deficiente.
- Se verificó la existencia en obra de ventanas para baños, sanitarios y orinales.
- Se aclaró instalación de 50 metros de baranda en el área más alta y riesgosa junto a la vía
- El Representante Legal Eduardo Cifuentes presentará a la interventoría:
  - Acta No. 7 para revisión y validación.
  - Balance de obra con incrementos y ajustes de precios.
  - Relación de presupuesto inicial ejecutado, actividades y cantidades pendientes.
  - Actas y pre actas anteriores para actualización y organización del expediente físico.

***06 de Mayo de 2025***

El Representante Legal de la Interventoría del Proyecto, hace llegar vía correo electrónico Poder Autenticado en el que presenta los nombres e identificaciones de los abogados que le acompañaran en el proceso que, sobre un posible incumplimiento del contrato, se lleva en contra de su representada.

***09 de Mayo de 2025***

Verificación de Avances en obra y compromisos de entregables

- 7 bancas construidas, pendiente demolición de una.
- Bases vaciadas para tres bancas.
- Instalados baños, lavamanos, orinales, dispensadores de jabón, dispensadores de toallas de papel, rejillas en ventanas de baños y pasamanos.
- Cocina con lavaplatos y llave instalada.

**Compromisos pendientes:**

- No se ha entregado el balance de obra ni el Acta No. 7.
- No se cumplió con la demolición y corrección de banca torcida.
- Cajas sin tapa.
- No se observa avance significativo.
- No se observa personal de la interventoría

**Observaciones de la visita de obra**

Se reportaron las siguientes novedades el 09 de mayo de 2025:

- Ausencia de SISO en obra.
- Señalización y demarcación deficiente.
- Riesgos evidentes: cajas sin tapa.
- Detalles constructivos por mejorar:
    - Cerámica en baños.
    - Columna de soporte de mesón fuera de nivel.
    - Viga con hormigón deficiente.
- Solicitud de mejora en la llave de un orinal (Ingeniero Eduardo se compromete a resolverlo al día siguiente).
- Ajuste requerido en dispensadores de papel higiénico.
- Mejoras en la pega de cerámica.
- No se encuentra la bitácora oficial; el representante legal informa que se está transcribiendo, sólo hay un cuaderno con registros del 25 de abril al 2 de mayo de 2025.
- El lugar se encuentra limpio.

**Compromisos y recomendaciones no cumplidas a la fecha**

El Ingeniero Eduardo Cifuentes deberá presentar a la interventoría:

- Acta No. 7 para revisión y validación.
- Balance de obra con incrementos y ajustes de precios.
- Relación de presupuesto inicial ejecutado, actividades y cantidades pendientes.
- Actas y pre actas anteriores para actualización y organización del expediente físico.

***14 de Mayo de 2025***

Se programa la: **CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO INTERVENTORÍA para el día viernes 16 de mayo de 2025 3pm - 4pm**.

***15 de Mayo de 2025***

Habiendo recibido documento para revisión correspondiente al Acta 07, se procede a realizar visita a la obra con la finalidad de comprobar en sitio las cantidades y ubicación de los ítems presentados en el documento y realizar visita.

- Durante la Visita Técnica no se observó la presencia de profesionales en el lugar de la obra, ni del Contratista ni de la Interventoría, por lo que no fue posible el intercambio de información pertinente.
- Se observa la presencia únicamente de dos (2) trabajadores, quienes al momento de la visita estaban abocados a la construcción de bancas de concreto, siendo esta la única actividad en ejecución, al menos en momento de la Visita Técnica.
- Todas las obras relacionadas con la Carpintería Metálica objeto del Contrato, deberán ser debidamente selladas y/o curadas para proceder a la recepción definitiva de los trabajos.
- Todas las piezas sanitarias, deberán estar debidamente conectadas a los respectivos sistemas, tanto a los de alimentación de agua potable como a los de aguas servidas para proceder a la recepción definitiva de las mismas.
- Todas las piezas sanitarias deberán estar plenamente operativas y se deben realizar las respectivas pruebas de presión y/o estanqueidad según sea el caso al momento de la recepción de estas.
- Las Divisiones de Baños deberán ser corregidas por cuanto no están debidamente alineadas y/o aplomadas, por lo que deberán realizar las correcciones y ajustes correspondientes para la recepción de estas.
- Adicionalmente se evidenciaron diferencias entre las cantidades presentadas en el Acta y las reflejadas en las Preactas por lo que las cantidades fueron ajustadas a las realmente instaladas o construidas en obra.

***23 de Mayo de 2025***

El día de hoy 23 de mayo de 2025, se realiza visita conjunta a la obra en compañía de la Ing. Laura Murillo, Apoyo de la Supervisión del Ministerio del Interior, Eduardo Cifuentes Hurtado representante legal del Consorcio Sacúdete Balboa y contratista de la obra, Ing. Mick Báez Director de Infraestructura, Adriana Uribe apoyo a la supervisión del municipio.

- Se destaca la ausencia de la interventoría en esta visita.
- Se verifican las áreas de baños, cocina, gimnasio, juegos infantiles y auditorio, basándonos en los planos firmados presentados por la Ing. Laura Murillo.

- La ingeniera Laura pregunta cómo queda el tema de la baranda perimetral y se le informa que solo tiene contratados 50 metros que alcanza para la parte externa de cara hacia a la vía.
- Se le aclara al contratista, representada en esta acto por el señor Eduardo Cifuentes que el castillo (juegos infantiles) deben, al menos; cumplir con las especificaciones plasmadas en el plano correspondiente, el contratista manifiesta que este ítem requiere un ajuste presupuestal ya que está pactado en $67.623.000 y según las cotizaciones tiene un costo directo en el mercado de $79.968.000 , lo que le genera un desequilibrio presupuestal y que esto se lo ha manifestado a la interventoría pero desde el municipio no tenemos conocimiento de esto y la interventoría no se ha pronunciado al respecto, por lo que se le solicita como ya es costumbre que envíe al correo del ingeniero Mick, el soporte de dicha información, a lo que manifiesta que las buscará y las enviará, ya que la interventoría no ha acompañado en ningún comité y tampoco la hemos encontrado en las diferentes visitas que hemos realizado a la obra, es importante que el municipio genere sanciones a la interventoría porque la falta de respuesta al contratista genera retrasos en la obra.
- Se verifica el área de los baños: 4,94m x 13,68m, altura 3,33m
- Área de cocina: 6,43m x 3,56m , altura 3,51m
- Área de Gradas:

| Ancho de las gradas | Acceso 1(lado cocina) | Acceso 2 (lado salón comunitario |
|---|---|---|
| 0,93m | 0,41m x 0,96m | 0,40m x 0,96m |
| 0,90m | 0,40m x 0,97.5 m | 0,38.5m x 1,01m |
| 0,80m | 0,36.5m x 0,99m | 0,38m x 1,01m |

- Área de la cancha: 27m x 16,90m
- Área del gimnasio: 4,6m x 16,90m
  Acá se debe tener en cuenta la figura obligada que se tuvo que hacer por el ingreso a las viviendas aledañas
- Área parque infantil: 9,90m x 15,40m
- Ancho de la circulación baños: 1,80m
- Área del auditorio:
  Parte interna de la tarima de columna a columna 8,93m
  Parte externa de la tarima de columna a columna 9,73m
  Medida de la columna hasta la última silla parte derecha 7,45m
  Medida de la columna hasta la última silla parte centro 10,70m
  Medida de la columna hasta la última silla parte izquierda 11,25m

**Reunión con el alcalde y la secretaria de planeación**

Posteriormente, a las 4:14 pm, se inicia la reunión en la Alcaldía Municipal, despacho del alcalde donde participan el Alcalde, la Secretaria de planeación, contratista de obra, director de obra del municipio y apoyo a la supervisión por el municipio

El alcalde José Ernesto da la bienvenida y agradece a todos por la asistencia en especial a la ingeniera Laura Murillo apoyo a la supervisión por el Ministerio del Interior y manifiesta su preocupación ya que la interventoría no asistió tampoco el día de hoy.

La ingeniera Laura socializó lo que se hizo en campo el día de hoy (medidas de áreas). Además, manifiesta que se deben verificar el área en campo de la zona de auditorio, la ubicación de las bancas y sus dimensiones; ya que según el plano deben tener espacio para el ingreso de las sillas de ruedas y en campo esto no se evidencio.

También se cuenta con la dificultad de la cubierta ya que no se puede instalar pronto porque presenta dificultades con la dirección de la misma, ósea que se debe ajustar la cubierta para proteger la zona de las bancas, pues el viento puede levantar la cubierta y las bancas quedarían expuestas a la lluvia o a las altas temperaturas del sol, he informa que se requiere un reforzamiento adicional ya que no se tuvo en cuenta la dirección de los vientos y es necesario el concepto del estructural y el certificado de un profesional ya que en el momento sería un riesgo y es posible que requiera de una adición o un contrato adicional para atender esta necesidad.

Revisando el tema del incumplimiento de la interventoría, se evidencia la voluntad del contratista de obra, pero persiste la dificultad con la interventoría ya que no asistieron a la visita del ministerio, se requiere iniciar de forma urgente con las acciones pertinentes

También le solicita al contratista que si requiere solicitar alguna modificación esta solicitud debe ir acompañada de un estudio de mercado, por ejemplo, el tema del adoquín del formato contratado ya no se consigue en el mercado, el contratista manifiesta que esta solicitud se la hizo a la interventoría pero que a la fecha no tiene una respuesta al igual que la parte eléctrica ya que él sugiere que se instalen paneles solares y tampoco tiene respuesta de la interventoría.

Por parte de la supervisión del municipio se manifiesta que en la obra nunca está la bitácora y que esto es de gran importancia.

Se da la bienvenida al ingeniero Paulo Roberto Alfonso Romero a las 4:41pm , representante por parte de la interventoría y se le explica todo lo hablado en la reunión y la visita en campo el día de hoy, también se le pregunta si él tiene algún informe o respuesta a las solicitudes manifestadas por el contratista de obra a lo que él responde que no, el ingeniero Mick director de obra y supervisor por parte del municipio le pregunta si el solo se limita a temas de obra y el ingeniero Paulo le dice que sí que en temas de aprobaciones o decisiones solo el arquitecto Carlos Rambal puede hacerlo. Pero que él como residente de interventoría le ha pasado los informes a Rambal pero que no tenía conocimiento que él no los entregará a la supervisión de la alcaldía, la doctora Eliana secretaria de planeación manifiesta que la información que les había brindado el ingeniero Paulo era que había renunciado a lo que el ingeniero le contesta que sí pero que había vuelto hace pocos días, la doctora Eliana también manifiesta que esto no es tan fácil ya que para cualquier modificación se debe realizar la pactación de precios a lo que el señor Eduardo contesta que le acepten la suspensión por quince (15) días para definir estos temas.

A lo que contestamos por parte de la alcaldía que no estamos de acuerdo con los quince días, es mucho tiempo y cuál sería la justificación teniendo en cuenta varios temas, por ejemplo que la obra tiene como posible fecha de terminación el 25 de mayo de 2025 y que según informa el jurídico del municipio doctor Alfonso Figueredo se va a realizar el proceso de incumplimiento a la interventoría, además preguntan el alcalde Ernesto Miranda y la ingeniera Adriana quien se va a responsabilizar de la obra al estar suspendida a lo que responde el señor Eduardo que el contratista asumirá ese compromiso y que su mayor dificultad es el alto costo para el traslado de los materiales a la obra a lo que el alcalde le responde que él se encargará personalmente de conseguirle el transporte con precios más favorables.

El señor Eduardo envió una solicitud de suspensión o prórroga el día de ayer donde manifiesta principalmente que su mayor dificultad es la vía pero todos los presentes no lo aceptamos ya que la vía alterna Cruces está en perfecto estado y el arreglo de la vía principal se puede demorar años, el señor Eduardo dice que hoy envió otra solicitud sólo de suspensión a lo que el jurídico y el ingeniero Mick manifiestan que apenas llegó y tampoco se acepta la totalidad de la solicitud solo se acepta por la justificación del silencio o falta de respuesta de la interventoría ya que sin esto no se puede avanzar en la obra y solo se aceptan cinco (5) días, hasta que culmine el proceso de incumplimiento con la interventoría o que ésta se pronuncie con las peticiones.

El representante por la interventoría manifiesta que se encontraron inconsistencias entre los planos y el presupuesto contratado a lo que se le pregunta si en algún momento lo manifestaron por escrito y dice que no.

**5. Compromisos y recomendaciones**

Las partes acuerdan suspender por cinco (5) días a partir de hoy tanto el contrato de obras como el de interventoría.

Sabiendo que el Ingeniero Paulo Roberto Alfonso no está facultado para la toma de decisiones se le solicitó socializar vía telefónica con el Arq. Carlos Rambal para que autorice el uso de su firma digital. Habiendo testigos de esta llamada el Ingeniero Paulo no manifiesta objeción sobre este asunto.

El municipio se compromete a gestionar transporte más económico desde la Virginia hasta la obra.

El municipio se compromete a redactar las actas de suspensión correspondientes.

El Representante Legal del Consorcio Sacúdete, Eduardo Cifuentes se compromete a entregar las solicitudes a interventoría con copia de los radicados a la supervisión del municipio.

Todas las partes coinciden en la sugerencia de tomar fotos de los planos firmados y aprobados con lo que cuenta el ministerio.

***28 de Mayo de 2025***

Se realiza visita a la obra en compañía del señor Eduardo Cifuentes Hurtado Representante Legal del Consorcio Sacúdete Balboa / Contratista, Mick Báez Director de Infraestructura, Adriana Uribe apoyo a la supervisión del municipio y se destaca la ausencia de la interventoría en esta visita.

Se verifican nuevamente las áreas de juegos infantiles y auditorio, basándonos en los planos del diseño, ya que en la pasada revisión se generaron algunas dudas, además quedó como compromiso ante la representación de la Supervisión del Ministerio.

**Observaciones**

Durante la visita se evidenció que las bancas del auditorio fueron removidas de sus ubicaciones y actualmente no se encuentran ancladas al suelo, situación que se debe corregir de acuerdo con los planos aprobados, garantizando su debida sujeción.

Adicionalmente, el señor Eduardo Cifuentes manifestó algunas dudas con respecto a las distancias para la instalación de las sillas. Se procedió a mostrarle el plano correspondiente, y él se comprometió a realizar la instalación de acuerdo con lo establecido en dicho plano directamente en campo.

Se reprograma la audiencia prevista para el día de hoy 28/05 hasta el 30/05 debido a dificultades administrativas presentadas por la Secretaria de Planeación del Municipio.

***30 de Mayo de 2025***

Se convoca a la CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO SACÚDETE para el día viernes 6 de jun de 2025 2pm - 3pm, con la finalidad de

## - Estado del convenio

La condición actual del convenio al mes de mayo de 2025 es: se encuentra ***ACTIVO.***

***Aspectos Financieros:***

A continuación, se presenta un resumen de los pagos efectuados a la Contratación Derivada / Contratista de Obras a la fecha:

| AVANCES FINANCIEROS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y OBRAS | | | | Monto del Convenio para Obras | | $ 1.040.667.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Monto del Convenio para Diseños | | $ 83.333.000,00 |
| | | | | Monto del Convenio para Obras | | $ 1.124.000.000,00 |
| **Concepto** | **Monto del Acta** | **Amortizacion Anticipo** | **%** | **Pago Neto (A)** | **Descuentos Municipales** | **Pagos Neto (B)** |
| Anticipo | $ 156.100.050,00 | $ 0,00 | 0,00% | $ 156.100.050,00 | $ 0,00 | $ 156.100.050,00 |
| Acta Nº 01 | $ 83.333.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | $ 83.333.000,00 | $ 16.624.934,00 | $ 66.708.066,00 |
| Acta Nº 02 | $ 152.066.901,00 | $ 22.810.035,00 | 15,00% | $ 129.256.866,00 | $ 48.150.252,00 | $ 81.106.614,00 |
| Acta Nº 03 | $ 263.949.468,00 | $ 19.993.502,00 | 7,57% | $ 243.955.966,00 | $ 42.084.786,00 | $ 201.871.180,00 |
| Acta Nº 04 | $ 174.151.677,00 | $ 23.414.978,00 | 13,45% | $ 150.736.699,00 | $ 27.767.195,00 | $ 122.969.504,00 |
| Acta Nº 05 | $ 31.503.221,00 | $ 3.150.322,00 | 10,00% | $ 28.352.899,00 | $ 5.022.956,00 | $ 23.329.943,00 |
| Acta Nº 06 | $ 48.846.236,00 | $ 7.326.935,76 | 15,00% | $ 41.519.300,24 | $ 7.788.170,00 | $ 33.731.130,24 |
| ***Subtotal*** | ***$ 909.950.553,00*** | ***$ 76.695.772,76*** | | ***$ 833.254.780,24*** | ***$ 147.438.293,00*** | ***$ 685.816.487,24*** |
| ***%*** | ***72,86%*** | ***6,14%*** | | ***66,72%*** | ***11,80%*** | ***54,91%*** |

De igual manera, se presenta un resumen de los pagos efectuados a la Contratación Derivada / Interventoría a la fecha.

| AVANCES DE INTERVENTORIA | | | | Monto del Convenio para Interventoría | | $ 124.971.539,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Monto del Acta** | **Amortizacion Anticipo** | **%** | **Pago Neto (A)** | **Descuentos Municipales** | **Pagos Neto (B)** |
| Acta Nº 01 | $ 41.667.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | $ 41.667.000,00 | $ 7.983.256,00 | $ 33.683.744,00 |
| Acta Nº 02 | $ 47.891.215,61 | $ 0,00 | 0,00% | $ 47.891.215,61 | $ 9.175.796,00 | $ 38.715.419,61 |
| ***Subtotal*** | ***$ 89.558.215,61*** | ***$ 0,00*** | | ***$ 89.558.215,61*** | ***$ 17.159.052,00*** | ***$ 72.399.163,61*** |
| ***%*** | ***7,17%*** | ***0,00%*** | | ***7,17%*** | ***1,37%*** | ***5,80%*** |

Finalmente, se presenta un RESUMEN FINANCIERO DEL CONVENIO, a partir de los pagos realizados en las contrataciones derivadas.

| RESUMEN FINANCIERO DEL CONVENIO | | | | Monto General del Convenio | | $ 1.248.971.539,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Actas Pagadas** | **Amortizacion Anticipo** | **%** | **Pago Neto (A)** | **Descuentos Municipales** | **Pagos Neto (B)** |
| ***TOTALES CONVENIO*** | ***$ 999.508.768,61*** | ***$ 76.695.772,76*** | | ***$ 922.812.995,85*** | ***$ 164.597.345,00*** | ***$ 758.215.650,85*** |
| ***%*** | ***80,03%*** | ***6,14%*** | | ***73,89%*** | ***13,18%*** | ***60,71%*** |

## *6. RESUMEN*

Actualmente los contratos relacionados con la Contratación Derivada se encuentran suspendidos con la finalidad de que sea revisada la Solicitud de inclusión de nuevos ítems y ajustes técnicos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a los requerimientos actualizados del proyecto.

Estas actividades inciden directamente en la ejecución de los trabajos y se requiere de una respuesta formal tanto de la Interventoría como de la Supervisión Municipal que permitan formalizar, si fuera el caso, un otro sí y proceder a la suscripción del Acta correspondiente.

Adicionalmente, de ser aprobada esta inclusión de nuevos ítems deberán presentar un cronograma de ejecución integral, debidamente concertado entre las partes que garantice la viabilidad logística, financiera y operativa del proyecto, procurando la culminación de los trabajos en un lapso prudente y razonable.

La fecha límite para la presentación de esta documentación; incluyendo entre otros, solicitudes, justificaciones, presupuestos, análisis de precios unitarios, balances financieros, especificaciones técnicas, cotizaciones y cualquier otra que sirva de soporte y/o sustento de estas solicitudes, será el miércoles 11 de junio de 2025.

Adicionalmente, una vez reiniciados los trabajos, se realizará control previo conjunto entre las partes, de las condiciones actuales de la obra en cuanto a cantidades ejecutadas y por ejecutar en concordancia con el Cronograma de Obras actualizado.

## 7. SUPERVISIÓN POR LA ALCALDÍA DE BALBOA

**ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS**
Director de Obras e Infraestructura
Municipio de Balboa

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BALBOA<br>LABOR PAZ | **REPÚBLICA DE COLOMBIA**<br>**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**<br>**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA** | Código:<br>Versión: 1 |
| | **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS / CONTRATOS** | Fecha:<br>Página **1** de **1** |

***REGISTRO FOTOGRÁFICO***











































**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO MAYO DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 6.440,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 1.224,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 272 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 5.022.956,00 | N/A | $ 5.022.956,00 |
| | OBRA ACTA 6 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 33.731.130,24 | N/A | $ 33.731.130,24 |
| | DESCUENTOS DE OP 679 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 7.788.170,00 | N/A | $ 7.788.170,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 6.440,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 1.224,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 866.728.243,85** | **$ 56.100.050,00** | **$ 922.828.293,85** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 02/05/2025 | $ 34.829,00 |
| 05/05/2025 | $ 11.611,00 |
| 06/05/2025 | $ 11.611,00 |
| 07/05/2025 | $ 11.612,00 |
| 08/05/2025 | $ 11.291,00 |
| 09/05/2025 | $ 33.699,00 |
| 12/05/2025 | $ 11.234,00 |
| 13/05/2025 | $ 11.235,00 |
| 14/05/2025 | $ 11.235,00 |
| 15/05/2025 | $ 11.236,00 |
| 16/05/2025 | $ 33.710,00 |
| 19/05/2025 | $ 11.238,00 |
| 20/05/2025 | $ 11.238,00 |
| 21/05/2025 | $ 11.239,00 |
| 22/05/2025 | $ 11.240,00 |
| 23/05/2025 | $ 33.722,00 |
| 26/05/2025 | $ 11.242,00 |
| 27/05/2025 | $ 11.242,00 |
| 28/05/2025 | $ 11.243,00 |
| 29/05/2025 | $ 11.243,00 |
| 30/05/2025 | $ 44.979,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 361.929,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No.32030000026-3**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| 04/04/2025 | $ 30.914.911,00 | 1387874903 |
| **TOTAL (4)** | **$ 30.914.911,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 866.728.243,85** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 22.691.267,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2025** | $ 515.111,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2025** | $ 402.988,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2025** | $ 384.143,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2025** | $ 382.673,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 22.329.338,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 361.929,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 206.261.910,74** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de Mayo $1.072.990,154.59, menos los pagos $866.728.243,85 para un saldo a mayo de $206.261,910,74**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | MAYO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 237.513.049,74 | SALDO ACTUAL | 230.086.808,74 |
| TOTAL ABONOS | 21 | 361.929,00 | PROMEDIO MES | 231.699.432,83 |
| TOTAL CARGOS | 6 | 7.788.170,00 | INTERESES | 361.929,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 34.829,00 | 237.547.878,74 |
| 05/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.611,00 | 237.559.489,74 |
| 06/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.611,00 | 237.571.100,74 |
| 07/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.612,00 | 237.582.712,74 |
| 08/05 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -1.942.042,00 | 235.640.670,74 |
| 08/05 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -461.235,00 | 235.179.435,74 |
| 08/05 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -2.427.552,00 | 232.751.883,74 |
| 08/05 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -1.015.299,00 | 231.736.584,74 |
| 08/05 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -728.266,00 | 231.008.318,74 |
| 08/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.291,00 | 231.019.609,74 |
| 09/05 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -1.213.776,00 | 229.805.833,74 |
| 09/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 33.699,00 | 229.839.532,74 |
| 12/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.234,00 | 229.850.766,74 |
| 13/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.235,00 | 229.862.001,74 |
| 14/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.235,00 | 229.873.236,74 |
| 15/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.236,00 | 229.884.472,74 |
| 16/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 33.710,00 | 229.918.182,74 |
| 19/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.238,00 | 229.929.420,74 |
| 20/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.238,00 | 229.940.658,74 |
| 21/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.239,00 | 229.951.897,74 |
| 22/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.240,00 | 229.963.137,74 |
| 23/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 33.722,00 | 229.996.859,74 |
| 26/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.242,00 | 230.008.101,74 |
| 27/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.242,00 | 230.019.343,74 |
| 28/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.243,00 | 230.030.586,74 |
| 29/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.243,00 | 230.041.829,74 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 44.979,00 | 230.086.808,74 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 G418

# Poder Especial

Por medio del presente documento, yo **CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 77002179 de Barranquilla, correo electrónico, arqcarlosrambal@gmail.com en pleno uso de mis facultades legales, confiero **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente al abogado **FRANCISCO JAVIER POSADA GIRALDO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16071744 de Manizales, portador de la Tarjeta Profesional No. **409492** del Consejo Superior de la Judicatura, correo electrónico, franciscoabogadoscolombia3@gmail.com para que me represente en la audiencia programada para el día 6 de mayo de 2025, relacionada con el posible incumplimiento del contrato de obra pública número 001 de 2022. CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 identificado con NIT número 901.598.981-5.

El apoderado queda facultado para conciliar, transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, interponer recursos, presentar y solicitar pruebas, y en general realizar todas las actuaciones necesarias para la defensa de mis intereses dentro del proceso mencionado.

Para constancia se firma en Barranquilla, a los 06 días del mes de Mayo de 2025.

Otorga,

**CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDIA**
**C.C. 77002179 de Barranquilla**

**Acepto,**

**FRANCISCO JAVIER POSADA GIRALDO**
**C.C, 16071744**
**T.P. 409492 DEL C.S.J.**

# Notaría 1
Barranquilla

CARLOS JOSE PUCHE MOGOLLON
primerabarranquilla@supernotariado.gov.co

**PODER ESPECIAL**
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Compareció **RAMBALBUENDIA CARLOS ALBERTO** Con Doc. No. C.C. 72002179

Y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se deja constancia que a petición, ruego e insistencia del firmante se realizó la presente autenticación biométrica. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento

Cod. up21a

**Barranquilla, 2025-05-06 13:31:15**

OTORGADO AL DR. FRANCISCO JAVIER POLANIA GIRALDO, PRESENTADO EN AUDIENCIA PROGRAMADA

X _____
FIRMA

**JOSÉ VICENTE PACHECO AROCA**
NOTARIO PRIMERO (E) DEL CÍRCULO DE BARRAQUILLA

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 1 BARRANQUILLA
JOSE VICENTE PACHECO AROCA
NOTARIO ENCARGADO
www.notaria1barranquilla.com

Gmail obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>

# Invitación: CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO INTERVENTO... vie 16 de may de 2025 3pm - 4pm (COT) (obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co)

1 mensaje

**Planeacion @balboa-risaralda.gov.co** <planeacion@balboa-risaralda.gov.co> 14 de mayo de 2025, 15:36
Responder a: "Planeacion @balboa-risaralda.gov.co" <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>
Para: "obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co" <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>, figueredo2@hotmail.com, alcalde alcalde <alcalde@balboa-risaralda.gov.co>, vramirez@solidaria.com.co, arqcarlosrambal@gmail.co

Unirme con Google Meet

**Enlace de la reunión**

meet.google.com/eeg-jkpo-ppk

**Unirse por teléfono**

(CO) +57 601 8956766
PIN: 510182599

Más números de teléfono

**Cuándo**

viernes 16 de may de 2025 · 3pm – 4pm (Hora estándar de Colombia)

**Invitados**

Planeacion @balboa-risaralda.gov.co- organizador
obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co
figueredo2@hotmail.com
alcalde alcalde
vramirez@solidaria.com.co
arqcarlosrambal@gmail.co

**Ver toda la información de los invitados**

**Responder** a obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co

Sí | No | Quizás | Más opciones

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

**invite.ics**
3K

Gmail **obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>**

# Invitación actualizada: CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO INTERVENTO... mar 20 de may de 2025 4pm - 5pm (COT) (obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co)

1 mensaje

**Planeacion @balboa-risaralda.gov.co** <planeacion@balboa-risaralda.gov.co> 16 de mayo de 2025, 13:48
Responder a: "Planeacion @balboa-risaralda.gov.co" <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>
Para: "obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co" <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>, figueredo2@hotmail.com, alcalde alcalde <alcalde@balboa-risaralda.gov.co>, arqcarlosrambal@gmail.com, vramirez@solidaria.com.co, arqcarlosrambal@gmail.co

**Este evento se ha actualizado**
**Se ha cambiado:** hora

Unirme con Google Meet

**Enlace de la reunión**

meet.google.com/eeg-jkpo-ppk

**Unirse por teléfono**

(CO) +57 601 8956766
PIN: 510182599

Más números de teléfono

**Cuándo** CAMBIADO

martes 20 de may de 2025 · 4pm – 5pm (Hora estándar de Colombia)
~~viernes 16 de may de 2025 · 3pm – 4pm (Hora estándar de Colombia)~~

**Invitados**

Planeacion @balboa-risaralda.gov.co- organizador
obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co
figueredo2@hotmail.com
alcalde alcalde
arqcarlosrambal@gmail.com
vramirez@solidaria.com.co
arqcarlosrambal@gmail.co

**Ver toda la información de los invitados**

**Responder** a obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co

Sí | No | Quizás | Más opciones

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

**invite.ics**
3K

Gmail obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>

# Invitación: CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO INTERVENTO... mié 28 de may de 2025 1pm - 2pm (COT) (obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co)

1 mensaje

**Planeacion @balboa-risaralda.gov.co** <planeacion@balboa-risaralda.gov.co> 23 de mayo de 2025, 19:05
Responder a: "Planeacion @balboa-risaralda.gov.co" <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>
Para: "obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co" <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>, arqcarlosrambal@gmail.com, figueredo2@hotmail.com, vramirez@solidaria.com.co

Unirme con Google Meet

**Enlace de la reunión**

meet.google.com/pmj-myoe-rin

**Unirse por teléfono**

(CO) +57 601 8957436
PIN: 162783383

Más números de teléfono

**Cuándo**

miércoles 28 de may de 2025 · 1pm – 2pm (Hora estándar de Colombia)

**Invitados**

Planeacion @balboa-risaralda.gov.co- organizador
arqcarlosrambal@gmail.com
obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co
figueredo2@hotmail.com
vramirez@solidaria.com.co

**Ver toda la información de los invitados**

**Responder** a obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co

Sí | No | Quizás | Más opciones

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

---

**invite.ics**
3K

Gmail **obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>**

# REPROGRAMACIÓN AUDIENCIA

1 mensaje

**Planeacion @balboa-risaralda.gov.co** <planeacion@balboa-risaralda.gov.co> 28 de mayo de 2025, 12:46
Para: CARLOS ALBERTO RAMBALBUENDIA <arqcarlosrambal@gmail.com>, Alfonso Figueredo Cañas <figueredo2@hotmail.com>, "obraspublicas @balboa-risaralda.gov. co" <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>, vramirez@solidaria.com.co
Cc: ventanilla ventanilla <ventanilla@balboa-risaralda.gov.co>

Balboa Risaralda, Mayo 28 de 2025

Señores

**CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDÍA**

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022

Interventoría

Coninterventoriabalboa2022@gmail.com pdlconsultoria2020@gmail.com

**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** S.A.

notificaciones@solidaria.com.co

Cordial saludo,

Mediante le presente me permito informarles que dificultades administrativas se ha reprogramado para el día 30 de mayo de 2025, a las 11:00 am, la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en contra del CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022, por el posible incumplimiento parcial del Contrato de interventoria Nro. 001-2022, cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"**.

--
***FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZÁLEZ***
*Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial*
*Municipio de Balboa, Risaralda.*

**560-2025.pdf**
177K

Gmail **obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>**

# Invitación: CONTINUACIÓN AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO SACÚDETE vie 6 de jun de 2025 2pm - 3pm (COT) (obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co)

1 mensaje

**Planeacion @balboa-risaralda.gov.co** <planeacion@balboa-risaralda.gov.co> 30 de mayo de 2025, 11:59
Responder a: "Planeacion @balboa-risaralda.gov.co" <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>
Para: "obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co" <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>, arqcarlosrambal@gmail.com, figueredo2@hotmail.com, vramirez@solidaria.com.co

Unirme con Google Meet

**Enlace de la reunión**

meet.google.com/frp-oxxc-tvq

**Unirse por teléfono**

(CO) +57 601 8957479
PIN: 433002030

Más números de teléfono

**Cuándo**

viernes 6 de jun de 2025 · 2pm – 3pm (Hora estándar de Colombia)

**Invitados**

Planeacion @balboa-risaralda.gov.co- organizador
arqcarlosrambal@gmail.com
obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co
figueredo2@hotmail.com
vramirez@solidaria.com.co

**Ver toda la información de los invitados**

**Responder** a obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co

Sí | No | Quizás | Más opciones

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

**invite.ics**
3K

Gmail **obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>**

# Invitación: REPROGRAMACIÓN AUDIENCIA PRESUNTO INCUMPLIMIENTO INTERVEN... mar 17 de jun de 2025 11am - 12pm (COT) (obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co)

1 mensaje

**Planeacion @balboa-risaralda.gov.co** <planeacion@balboa-risaralda.gov.co> 6 de junio de 2025, 10:53
Responder a: "Planeacion @balboa-risaralda.gov.co" <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>
Para: "obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co" <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>, arqcarlosrambal@gmail.com, figueredo2@hotmail.com, SECRETARIA EJECUTIVA <despacho@balboa-risaralda.gov.co>, vramirez@solidaria.com.co, linaquintero155@hotmail.com

Unirme con Google Meet

**Enlace de la reunión**

meet.google.com/nsy-jvkz-aof

**Unirse por teléfono**

(CO) +57 602 3896635
PIN: 196998741

Más números de teléfono

**Cuándo**

martes 17 de jun de 2025 · 11am – 12pm (Hora estándar de Colombia)

**Invitados**

Planeacion @balboa-risaralda.gov.co- organizador
arqcarlosrambal@gmail.com
obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co
figueredo2@hotmail.com
SECRETARIA EJECUTIVA
vramirez@solidaria.com.co
linaquintero155@hotmail.com

**Ver toda la información de los invitados**

**Responder** a obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co

Sí | No | Quizás | Más opciones

Invitación de Google Calendar

Te hemos enviado este correo porque te has suscrito a las notificaciones del calendario. Si quieres dejar de recibir estos correos, ve a la configuración de Calendar, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de confirmación de asistencia. Más información

---

**invite.ics**
3K

Señores
Municipio de Balboa
**FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZÁLEZ**
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
Alcaldía Municipal

**LINA MARIA QUINTERO GARTNER**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.162.341 expedida en Pereira y TP No. 158388 del C.S.J, y **MARTIN FERNANDO MONTOYA GARCÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.022.679 y TP No. 105634, en calidad de apoderados del arquitecto **CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDÍA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.002.179 expedida en Barranquilla, representante legal del Consorcio Interventoría Balboa 2022, me dirijo a usted con todo respeto con el fin de solicitar aplazamiento de la audiencia por presunto incumplimiento adelantado en contra de mi prohijado, y que tiene como fehca de realización el día 06 de junio de 2025 a las 2:00 pm, teniendo en cuenta que, el plazo otrogado por su honorable despacho ha sido insuficiente para llevar a cabo el estudio de los documentos allegados por el municipio el pasado domingo 1 de junio (día no hábil), resultando insufiente el término de tres (3) días (martes a jueves) para el análisis del caso y poder ejercer en debida forma el derecho de defensa de nuestro representado.

Ruego señora Secretaria que la audiencia sea reprograma después del 12 junio. considerando que es un término prudente para el estudio del expediente.

Los apoderados recibirán notificaciones a través del correo electrónico: linaquintero155@hotmail.com

El representante legal del Consorcio Interventoría Balboa recibirá notificaciones a través del correo electrónico: arqcarlosrambal@gmail.com

Atentamente,



**LINA MARIA QUINTERO GARTNER**
C.C. No. 42.162.341 de Pereira
T.P No 158388



**MARTIN FERNANDO MONTOYA GARCÍA**
C.C. No. 10.022.679 de Pereira
T.P No. 105634

## ACTA DE SUSPENSIÓN N°5

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | **001-2022 DEL 03 DE MAYO DE 2022** |
| OBJETO | **REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA** |
| VALOR DEL CONTRATO | **MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($1.124.000.000,00)** |
| COMPONENTE ESTUDIOS: Y DISEÑOS | Ochenta y tres millones trescientos treinta y tres mil pesos ($83.333.000,00) |
| COMPONENTE OBRA: | Mil cuarenta millones seiscientos sesenta y siete pesos ($1.040.667.000,00) |
| ANTICIPO COMPONENTE OBRA 15% | Ciento cincuenta y seis millones, cien mil cincuenta pesos ($156.100.050,00) |
| FECHA DE INICIACIÓN | **18 DE JUNIO DE 2022** |
| FECHA DE TERMINACIÓN | **17 DE NOVIEMBRE DE 2022** |
| PLAZO INICIAL | **CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO** |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 1 | **12 DE NOVIEMBRE DE 2022** |
| FECHA DE REINICIO 1 | **13 DE DICIEMBRE DE 2022** |
| FECHA DE TERMINACIÓN 2 | **18 DE DICIEMBRE DE 2023** |
| PRORROGA 1 Y ADICIÓN | **$67.244.892 (05 MESES)** |
| FECHA DE TERMINACIÓN 3 | **18 DE MAYO DE 2023** |
| PRORROGA 2 | **36 DÍAS** |
| FECHA DE TERMINACIÓN 4 | **24 DE JUNIO DE 2023** |
| PRORROGA 3 | **04 MESES** |

| | |
|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN 5 | **24 DE OCTUBRE DE 2023** |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 2 | **21 DE OCTUBRE DE 2023** |
| FECHA DE REINICIO 2 | **09 DE ABRIL DE 2024** |
| PRORROGA 4 | **18 DÍAS** |
| FECHA DE TERMINACIÓN | **29 DE ABRIL DE 2024** |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 3 | **24 DE ABRIL DE 2024** |
| PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 3 | **22 DE JUNIO DE 2024** |
| PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN 3 | **21 DE AGOSTO DE 2024** |
| FECHA DE REINICIO **3** | **23 DE OCTUBRE DE 2024** |
| FECHA DE TERMINACIÓN | **29 DE OCTUBRE DE 2024** |
| PRORROGA 5 | **02 MESES** |
| FECHA DE TERMINACIÓN | **30 DE DICIEMBRE DE 2024** |
| PRORROGA 6 | **45 DIAS** |
| FECHA DE TERMINACION | **15 DE FEBRERO DE 2025** |
| SUSPENSION 3 | 14 DE FEBRERO DE 2025 |
| FECHA DE REINICIO Y PRORROGA 7 | 25 DE FEBRERO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION | 25 DE MARZO DE 2025 |
| PRORROGA 8 | 60 DIAS |
| FECHA DE TERMINACION | 25 DE MAYO DE 2025 |

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Balboa Risaralda, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año 2025, se reunieron **EDUARDO CIFUENTES HURTADO,** en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SACÚDETE BALBOA** (contratista), **CARLOS RAMBAL BUENDIA** en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022** (Interventoría) e **ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS,** director de Obras e Infraestructura (supervisor)**,** con el fin de suscribir el acta de suspensión N° 04 del contrato de obra pública 001 de 2022.

**CONSIDERACIONES:**

**Hecho 1:** Actualmente se encuentra en desarrollo un procedimiento administrativo contra el **CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022** quienes actualmente son los responsables de la OBRA: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA
**Hecho 2:** Para el día miércoles 28 de mayo de 2025 se tiene prevista la continuación de la Audiencia Definitoria por Presunto Incumplimiento que se lleva a cabo en contra del **CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022**.
**Hecho 3:** Una vez concluido este Acto y queden manifiestas la acciones a seguir, el Municipio estudiara la posibilidad de otorgar una prórroga a la presente suspensión o gestionar una prórroga de terminación.
En mérito de lo anterior, las partes.

**ACUERDAN**

**PRIMERO**: suspender el contrato de obra pública **Nro. 001-2022**, con objeto de **"REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA."** por termino de cinco días (5) días calendario; es decir hasta el día 28 de mayo de 2025.

Para constancia de lo anterior, se anexa oficio de solicitud por parte del contratista y se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en el municipio de Balboa a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2025.

**EDUARDO CIFUENTES HURTADO**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**

**CARLOS RAMBAL BUENDIA**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022**

**ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS**
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ACTA PRORROGA 01 DE LA SUSPENSION N° 05

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| NRO. DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 DE 2022 | | |
| OBJETO CONTRACTUAL | "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA" | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE BALBOA<br>R/L: JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ | | |
| SUPERVISOR | ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS | | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO SACÚDETE BALBOA<br>R/L EDUARDO CIFUENTES HURTADO | | |
| INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022<br>R/L CARLOS RAMBAL BUENDIA | | |
| ESTADO ACTUAL | SUSPENDIDO | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 | | |
| VALOR INICIAL | $1.124.000.000,00 | | |
| VALOR ADICIÓN | $ 67.244.892,00 | | |
| VALOR TOTAL | $ 1.191.244.892,00 | | |
| ANTICIPO | $ 156.100.050,00 | | |
| FECHA DE INICIO | 17 de junio de 2022 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 16 de noviembre de 2022 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 5 meses | | |
| **ACTAS A LA FECHA** | **Plazos** | **Desde** | **Hasta** |
| SUSPENSION 01 | 31 DIAS | 12 Noviembre 2022 | 13 Diciembre 2022 |
| REINICIO 01 | 3 DIAS | 13 Diciembre 2022 | 16 Diciembre 2022 |
| PRORROGA + ADICION | 5 MESES | 16 Diciembre 2022 | 15 Mayo 2023 |
| PRORROGA 01 | 37 DIAS | 16 Mayo 2023 | 22 Junio 2023 |
| PRORROGA 02 | 4 MESES | 21 Junio 2023 | 21 Octubre 2023 |
| SUSPENSION 02 | 171 DIAS | 21 Octubre 2023 | 09 Abril 2024 |
| REINICIO 02 | 2 DIAS | 09 Abril 2024 | 11 Abril 2024 |
| PRORROGA 03 | 18 DIAS | 12 Abril 2024 | 30 Abril 2024 |
| SUSPENSION 3 | 2 MESES | 24 Abril 2024 | 22 Junio 2024 |
| PRORROGA 01 SUSPENSION 03 | 2 MESES | 22 Junio 2024 | 21 Agosto 2024 |
| PRORROGA 02 SUSPENSION 03 | 2 MESES | 21 Agosto 2024 | 23 Octubre 2024 |
| REINICIO 03 | 6 DIAS | 23 Octubre 2024 | 29 Octubre 2024 |
| PRORROGA 05 | 2 MESES | 30 Octubre 2024 | 30 Diciembre 2024 |
| PRORROGA 06 | 47 DIAS | 30 Diciembre 2024 | 15 Febrero 2025 |
| SUSPENSION 04 | 7 DIAS | 14 Febrero 2025 | 21 Febrero 2025 |
| REINICIO 04 | 1 DIA | 24 Febrero 2025 | 25 Febrero 2025 |
| PRORROGA 07 | 28 DIAS | 25 Febrero 2025 | 25 Marzo 2025 |
| PRORROGA 08 | 2 MESES | 25 Marzo 2025 | 25 Mayo 2025 |
| SUSPENSION 05 | 5 DIAS | 23 Mayo 2025 | 28 Mayo 2025 |
| *PRORROGA 01 SUSPENSION 05* | *15 DIAS* | *28 Mayo 2025* | *11 Junio 2025* |




Powered by CamScanner

## ACTA PRORROGA 01 DE LA SUSPENSION N° 05

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Balboa Risaralda, a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2025, se reunieron **EDUARDO CIFUENTES HURTADO**, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SACUDETE BALBOA**, el **ARQ. CARLOS RAMBAL BUENDIA**, en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022** , y el **ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS** Director de Obras e Infraestructura del municipio de Balboa, Risaralda en calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de suscribir el acta de prorroga No. 01 de la suspensión No. 05 del contrato, dada la justificación de los contratistas que se manifiesta a continuación:

### CONSIDERACIONES:

**A- Manifestadas por el Contratista de Obras:**

*"(…) 1. Causal de fuerza mayor – Ola invernal*

*Durante las últimas semanas, el municipio de Balboa y la región han sido afectados por una intensa ola invernal, que ha generado condiciones climáticas adversas, interrupciones viales, anegamientos y riesgos de seguridad para la ejecución de actividades en campo. Lo anterior ha sido ampliamente documentado por medios oficiales y reportes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.*

*En aplicación del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, que contempla la fuerza mayor como causal justificada para la suspensión de la ejecución contractual, solicitamos que se reconozca este evento como tal.*

*2. Espera de aprobación de modificación de ítems*

*Tal como se formalizó mediante radicado presentado el día 19 de mayo de 2025, se encuentra en trámite la solicitud de inclusión de nuevos ítems y ajustes técnicos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a las condiciones del terreno y requerimientos actualizados del proyecto.*

*Dado que estas actividades inciden directamente en la continuidad de la obra, se hace necesario esperar la respuesta formal por parte de la interventoría y la supervisión municipal, así como la suscripción del correspondiente otrosí al contrato.*

*3. Reprogramación del cronograma de obra*

*Una vez sean aprobados los ítems solicitados, será necesario proceder a la reprogramación integral del cronograma de ejecución, lo cual deberá realizarse de manera concertada con la entidad contratante y la interventoría, para garantizar la viabilidad técnica, operativa y financiera del proyecto.*

*4. Solicitudes puntuales (…)"*

**B- Manifestadas por el Contratista de Interventoría:**

*"(…) 1. Análisis técnico*

*Tras la revisión de los argumentos presentados y la verificación en campo de las condiciones actuales, esta interventoría confirma que la región ha sido efectivamente afectada por una fuerte ola invernal, lo cual ha generado complicaciones en el acceso, ejecución de actividades preliminares y riesgos para el personal de obra. Adicionalmente, se encuentra en trámite la solicitud de modificación de ítems y reprogramación del cronograma, situaciones que inciden directamente en la continuidad técnica del proyecto.*

*2. Fundamento legal*



Powered by CamScanner

## ACTA PRORROGA 01 DE LA SUSPENSION N° 05

*La solicitud de suspensión encuentra respaldo en los siguientes fundamentos normativos:*

*- Artículo 5 de la Ley 80 de 1993: Permite la suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito.*

*- Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007: Permite modificaciones contractuales cuando existan causas que afecten la normal ejecución del contrato.*

*- Decreto 1082 de 2015: En su artículo 2.2.1.2.1.4.1 contempla la posibilidad de suspender la ejecución del contrato de común acuerdo, dejando constancia por medio de acta.*

*3. Concepto de la interventoría*

*Con base en lo anterior, esta interventoría emite concepto favorable a la suspensión temporal del contrato por el término de quince (15) días calendario, contados a partir del 28 de mayo de 2025 y hasta el 11 de junio de 2025 inclusive. Esta decisión se justifica por las condiciones climáticas adversas, la necesidad de aprobación de la modificación de ítems solicitada por el contratista y la posterior reprogramación del cronograma de obra. (...)"*

Por otra parte, esta supervisión habiendo revisado los argumentos presentados por ambos Contratistas en sus solicitudes, considera procedente aprobar esta Prorroga 01 a la Suspensión 05 y coincide en prorrogar la suspensión de actividades hasta que se realicen las gestiones pertinentes que garanticen la culminación de los trabajos y así proceder al reinicio del contrato.

En mérito de lo anterior, las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO**: prorrogar la suspensión 05 del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 001 DE 2022** cuyo objeto es **"REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"**, por un plazo de quince (15) días, hasta el 11 de Junio de 2025.

Para constancia de lo anterior, se anexan oficios emitidos por los contratistas y avalados por la supervisión y se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en el municipio de Balboa a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.

**EDUARDO CIFUENTES HURTADO**
Representante Legal
**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**

**ARQ. CARLOS RAMBAL BUENDIA**
Representante Legal
**CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022**

**ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS**
Directos de Obras e Infraestructura
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**



Powered by CamScanner

Balboa, Risaralda, 28 de mayo de 2025

**SEÑORES:**
**CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBO 2022**
**ARQ. CARLOS RAMBAL B.**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS**
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**
**MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA**
**E.S.D.**

Asunto: Solicitud de suspensión temporal del Contrato de Obra No. 001 de 2022 por término de 15 días calendario

Respetados señores:

Me permito, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO SACÚDETE BALBOA, presentar ante ustedes la solicitud formal de suspensión temporal del Contrato de Obra No. 001 de 2022, cuyo objeto es la realización de los estudios, diseños y construcción del proyecto "Sacúdete al Parque Tipo 1", por el término de quince (15) días calendario contados a partir del 28 de mayo de 2025, conforme a los siguientes fundamentos:

1. Causal de fuerza mayor – Ola invernal

Durante las últimas semanas, el municipio de Balboa y la región han sido afectados por una intensa ola invernal, que ha generado condiciones climáticas adversas, interrupciones viales, anegamientos y riesgos de seguridad para la ejecución de actividades en campo. Lo anterior ha sido ampliamente documentado por medios oficiales y reportes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo.

En aplicación del artículo 5 de la Ley 80 de 1993, que contempla la fuerza mayor como causal justificada para la suspensión de la ejecución contractual, solicitamos que se reconozca este evento como tal.

2. Espera de aprobación de modificación de ítems

Tal como se formalizó mediante radicado presentado el día 19 de mayo de 2025, se encuentra en trámite la solicitud de inclusión de nuevos ítems y ajustes técnicos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual, conforme a las condiciones del terreno y requerimientos actualizados del proyecto.

Dado que estas actividades inciden directamente en la continuidad de la obra, se hace necesario esperar la respuesta formal por parte de la interventoría y la supervisión municipal, así como la suscripción del correspondiente otrosí al contrato.

3. Reprogramación del cronograma de obra

Una vez sean aprobados los ítems solicitados, será necesario proceder a la reprogramación integral del cronograma de ejecución, lo cual deberá realizarse de manera concertada con la entidad contratante y la interventoría, para garantizar la viabilidad técnica, operativa y financiera del proyecto.

4. Solicitudes puntuales

En mérito de lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que:

4.1 Se autorice la suspensión temporal del contrato a partir del 28 de mayo de 2025 y hasta el 11 de junio de 2025 (inclusive), por un término de 15 días calendario.

4.2 Se suscriba el acta de suspensión respectiva, conforme al procedimiento contractual.

4.3 Se reconozca la justificación técnica, climática y jurídica aquí expuesta, sin que ello implique incumplimiento por parte del contratista.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a la formalización de la suspensión solicitada, reiterando la disposición del consorcio para continuar la ejecución del proyecto en cuanto las condiciones lo permitan y los trámites contractuales pendientes se hayan definido.

Cordialmente,



**EDUARDO CIFUENTES HURTADO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO SACÚDETE BALBOA**

**BALBOA, RISARALDA, 28 DE MAYO DE 2025**

**ING. MICK BÁEZ**
**DIRECTOR DE**
**INFRAESTRUCTURA**
**MUNICIPIO DE BALBOA –**
**RISARALDA E. S. D.**

**CONSORCIO SACÚDETE**
**BALBOA**
**ATT: ING. EDUARDO**
**CIFUENTES HURTADO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**E.S.D.**

**ASUNTO: RESPUESTA AFIRMATIVA A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2022**

En atención a su comunicación fechada el 30 de mayo de 2025, mediante la cual solicita la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 001 de 2022, cuyo objeto es la realización de los estudios, diseños y construcción del proyecto "Sacúdete al Parque Tipo 1" en el municipio de Balboa, Risaralda, nos permitimos manifestar lo siguiente en calidad de interventoría del contrato.

1. Análisis técnico

Tras la revisión de los argumentos presentados y la verificación en campo de las condiciones actuales, esta interventoría confirma que la región ha sido efectivamente afectada por una fuerte ola invernal, lo cual ha generado complicaciones en el acceso, ejecución de actividades preliminares y riesgos para el personal de obra. Adicionalmente, se encuentra en trámite la solicitud de modificación de ítems y reprogramación del cronograma, situaciones que inciden directamente en la continuidad técnica del proyecto.

2. Fundamento legal

La solicitud de suspensión encuentra respaldo en los siguientes fundamentos normativos:

- Artículo 5 de la Ley 80 de 1993: Permite la suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito.
- Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007: Permite modificaciones contractuales cuando existan causas que afecten la normal ejecución del contrato.
- Decreto 1082 de 2015: En su artículo 2.2.1.2.1.4.1 contempla la posibilidad de suspender la ejecución del contrato de común acuerdo, dejando constancia por medio de acta.

3. Concepto de la interventoría

Con base en lo anterior, esta interventoría emite concepto favorable a la suspensión temporal del contrato por el término de quince (15) días calendario, contados a partir del 28 de mayo de 2025 y hasta el 11 de junio de 2025 inclusive. Esta decisión se justifica por las condiciones climáticas adversas, la necesidad de aprobación de la modificación de ítems solicitada por el contratista y la posterior reprogramación del cronograma de obra.

4. Recomendaciones

Se recomienda a la entidad contratante proceder con la suscripción del acta de suspensión respectiva conforme a lo dispuesto en el marco normativo aplicable, garantizando la formalización de la suspensión y dejando registro claro de las causas y fechas involucradas.

Cordialmente,



**CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDIA**
**CC. 72002179 DE BARRANQUILLA**
**CEL:3013868589**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022**

## ACTA DE SUSPENSIÓN N°5

| | |
|---|---|
| **NRO. DEL CONTRATO** | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2022 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.<br>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE BALBOA<br>R/L: JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022<br>R/L CARLOS RAMBAL BUENDIA |
| **ESTADO** | EN EJECUCION |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO** | 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
| **VALOR INICIAL** | $124.971.539 |
| **VALOR ADICIÓN** | N/A |
| **VALOR TOTAL** | $124.971.539 |
| **ANTICIPO** | $0 |
| **PÓLIZAS** | $43.470.039 |
| **FECHA DE INICIO** | 17 de junio de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 16 de noviembre de 2022 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | 5 meses |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | 5 meses |
| **SUSPENSION 1** | 31 DIAS |
| **PRORROGA 1** | 5 MESES |
| **PRORROGA 2** | 4 MESES |
| **SUSPENSION 2** | 8 DIAS |
| **SUSPENSION 3** | 2 MESES |
| **PRORROGA 1 SUSPENSION 3** | 2 MESES |
| **REINICIO** | 30 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **PRORROGA 1** | 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| REINICIO Y PRORROGA 7 | 25 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PRORROGA 8** | 25 DE MARZODE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 25 DE MAYO 2025 |

| **SUSPENSION 4** | 23 DE MAYO DE 2025 |
|---|---|

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Balboa Risaralda, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año 2025, se reunieron **CARLOS RAMBAL BUENDIA,** en calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022** (contratista) e **ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS,** director de Obras e Infraestructura (supervisor)**,** con el fin de suscribir el acta de suspensión N° 04 del contrato de obra pública 001 de 2022

**CONSIDERACIONES:**

**Hecho 1:** Actualmente se encuentra en desarrollo un procedimiento administrativo contra el **CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022** quienes actualmente son los responsables de la OBRA: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.

**Hecho 2:** Para el día miércoles 28 de mayo de 2025 se tiene prevista la continuación de la Audiencia Definitoria por Presunto Incumplimiento que se lleva a cabo en contra del **CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022**.

**Hecho 3:** Una vez concluido este Acto y queden manifiestas la acciones a seguir, el Municipio estudiara la posibilidad de otorgar una prórroga a la presente suspensión o gestionar una prórroga de terminación En mérito de lo anterior, las partes.

**ACUERDAN**

**PRIMERO**: suspender el contrato de interventoría **Nro. 001-2022**, con objeto de **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA."**; hasta el día 28 de mayo de 2025.

Para constancia de lo anterior, se anexa oficio de solicitud por parte del contratista y se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en el municipio de Balboa a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2025.

**CARLOS RAMBAL BUENDIA**
REPRESENTANTE LEGAL
**CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022**

**ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS**
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
**SUPERVISOR**

## ACTA PRORROGA 01 DE LA SUSPENSION N° 05

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| NRO. DEL CONTRATO | **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2022** | | |
| OBJETO CONTRACTUAL | **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"** | | |
| CONTRATANTE | **MUNICIPIO DE BALBOA**<br>**R/L: JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ** | | |
| SUPERVISOR | **ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS** | | |
| CONTRATISTA | **CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022**<br>**R/L CARLOS RAMBAL BUENDIA** | | |
| ESTADO ACTUAL | **SUSPENDIDO** | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO | **17 DE NOVIEMBRE DE 2021** | | |
| VALOR INICIAL | **$124.971.539,00** | | |
| VALOR ADICIÓN | **$ 5.382.898,00** | | |
| VALOR TOTAL | **$130.354.437,00** | | |
| VALOR TOTAL | **0,00** | | |
| FECHA DE INICIO | **17 de junio de 2022** | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | **16 de noviembre de 2022** | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | **5 meses** | | |
| **ACTAS A LA FECHA** | **Plazos** | ***Desde*** | ***Hasta*** |
| SUSPENSION 01 | **31 DIAS** | ***12 Noviembre 2022*** | ***13 Diciembre 2022*** |
| REINICIO 01 | **3 DIAS** | ***13 Diciembre 2022*** | ***16 Diciembre 2022*** |
| PRORROGA + ADICION | **5 MESES** | ***16 Diciembre 2022*** | ***15 Mayo 2023*** |
| PRORROGA 01 | **37 DIAS** | ***16 Mayo 2023*** | ***22 Junio 2023*** |
| PRORROGA 02 | **4 MESES** | ***21 Junio 2023*** | ***21 Octubre 2023*** |
| SUSPENSION 02 | **171 DIAS** | ***21 Octubre 2023*** | ***09 Abril 2024*** |
| REINICIO 02 | **2 DIAS** | ***09 Abril 2024*** | ***11 Abril 2024*** |
| PRORROGA 03 | **18 DIAS** | ***12 Abril 2024*** | ***30 Abril 2024*** |
| SUSPENSION 3 | **2 MESES** | ***24 Abril 2024*** | ***22 Junio 2024*** |
| PRORROGA 01 SUSPENSION 03 | **2 MESES** | ***22 Junio 2024*** | ***21 Agosto 2024*** |
| PRORROGA 02 SUSPENSION 03 | **2 MESES** | ***21 Agosto 2024*** | ***23 Octubre 2024*** |
| REINICIO 03 | **6 DIAS** | ***23 Octubre 2024*** | ***29 Octubre 2024*** |
| PRORROGA 05 | **2 MESES** | ***30 Octubre 2024*** | ***30 Diciembre 2024*** |
| PRORROGA 06 | **47 DIAS** | ***30 Diciembre 2024*** | ***15 Febrero 2025*** |
| SUSPENSION 04 | **7 DIAS** | ***14 Febrero 2025*** | ***21 Febrero 2025*** |
| REINICIO 04 | **1 DIA** | ***24 Febrero 2025*** | ***25 Febrero 2025*** |
| PRORROGA 07 | **28 DIAS** | ***25 Febrero 2025*** | ***25 Marzo 2025*** |
| PRORROGA 08 | **2 MESES** | ***25 Marzo 2025*** | ***25 Mayo 2025*** |
| SUSPENSION 05 | **5 DIAS** | ***23 Mayo 2025*** | ***28 Mayo 2025*** |
| PRORROGA 01 SUSPENSION 05 | **15 DIAS** | ***28 Mayo 2025*** | ***11 Junio 2025*** |

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Balboa Risaralda, a los treinta (30) días del mes de mayo del año 2025, se reunieron el **ARQ. CARLOS RAMBAL BUENDIA,** en calidad de Representante

## ACTA PRORROGA 01 DE LA SUSPENSION N° 05

Legal del **CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022** , y el **ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS** Director de Obras e Infraestructura del municipio de Balboa, Risaralda en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de prorroga No. 01 de la suspensión No. 05 del contrato, dada la justificación del contratista el cual manifiesta que:

### CONSIDERACIONES:

*"(…) 1. Fundamento técnico y climático*
*Durante las últimas semanas, el desarrollo de la obra se ha visto afectado por la ola invernal que ha azotado al municipio y la región, generando condiciones de riesgo, restricciones de acceso y alteración en la programación de las actividades constructivas como de labor de interventoría.*

*2. Situación contractual actual*
*El contratista ha radicado una solicitud de inclusión de nuevos ítems técnicos necesarios para la ejecución adecuada del objeto contractual, los cuales están actualmente en proceso de análisis y aprobación. En paralelo, se requiere una reprogramación del cronograma de obra que permita adaptar los tiempos a las condiciones técnicas reales y a las modificaciones solicitadas.*

*3. Solicitud formal de prórroga*
*Con base en lo anterior, y en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, recomendamos y solicitamos de manera respetuosa la aprobación de una prórroga del plazo de ejecución contractual por un término de 15 días calendario, a partir del 28 de mayo del 2025, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni alteración de las condiciones contractuales esenciales, y con el fin de garantizar el cumplimiento técnico, funcional y social del proyecto. (…)"*


Por otra parte, esta supervisión habiendo revisado los argumentos presentados por el Contratista en su solicitud, considera procedente aprobar esta Prorroga 01 a la Suspensión 05 y coincide en prorrogar la suspensión de actividades hasta que se realicen las gestiones pertinentes que garanticen la culminación de los trabajos y así proceder al reinicio del contrato.

En mérito de lo anterior, las partes:

### ACUERDAN

**PRIMERO**: prorrogar la suspensión 05 del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 001 DE 2022** cuyo objeto es **"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"**, por un plazo de quince (15) días, hasta el 11 de Junio de 2025.

Para constancia de lo anterior, se anexa oficio emitido por el contratista y avalado por la supervisión y se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en el municipio de Balboa a los treinta (30) días del mes de mayo de 2025.



**ARQ. CARLOS RAMBAL BUENDIA**
Representante Legal
**CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022**



**ING. MICK MAEL BAEZ ROJAS**
Director de Obras e Infraestructura
**SUPERVISOR**

Balboa, Risaralda, 28 de mayo de 2025

**SEÑORES:**
**ING. MICK MAEL BÁEZ ROJAS**
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS**
**MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA**
**E.S.D.**

Asunto: Solicitud de prórroga del Contrato de interventoria No. 001 de 2022

Respetado ingeniero:

En calidad de representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022, y en ejercicio de nuestras funciones de seguimiento y verificación técnica, me permito presentar la solicitud formal de prórroga del Contrato de interventoria No. 001 de 2022, celebrado entre el Municipio de Balboa y el CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022, en el marco del proyecto "Sacúdete al Parque Tipo 1", teniendo en cuenta los siguientes fundamentos técnicos, administrativos y climáticos:

1. Fundamento técnico y climático
Durante las últimas semanas, el desarrollo de la obra se ha visto afectado por la ola invernal que ha azotado al municipio y la región, generando condiciones de riesgo, restricciones de acceso y alteración en la programación de las actividades constructivas como de labor de interventoria.

2. Situación contractual actual
El contratista ha radicado una solicitud de inclusión de nuevos ítems técnicos necesarios para la ejecución adecuada del objeto contractual, los cuales están actualmente en proceso de análisis y aprobación. En paralelo, se requiere una reprogramación del cronograma de obra que permita adaptar los tiempos a las condiciones técnicas reales y a las modificaciones solicitadas.

3. Solicitud formal de prórroga
Con base en lo anterior, y en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, recomendamos y solicitamos de manera respetuosa la aprobación de una prórroga del plazo de ejecución contractual por un término de 15 días calendario, a partir del 28 de mayo del 2025, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni alteración de las condiciones contractuales esenciales, y con el fin de garantizar el cumplimiento técnico, funcional y social del proyecto.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su aprobación.

Cordialmente,

Sin otro particular,

Atentamente,



ARQ. CARLOS RAMBAL B.
Representante Legal
CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022
MOVIL:3013868589
EMAIL:ARQCARLOSRAMBAL@GMAIL.COM

| Fecha: 23 de mayo de 2025 | Acta No: 3 | Hora de Inicio:<br>09:11 a.m | Hora Fin:<br>07:47 p.m |
|---|---|---|---|
| **Tema: VISITA TECNICA CONJUNTA** | | | |
| **Responsable**: Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | | **Elaborado por:**<br>Adriana Patricia Uribe Gallego | |
| **Dependencia:** Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | | | |
| **Lugar:** Despacho del alcalde y vereda Tambores | | | |

| ORDEN DEL DÍA | | |
|---|---|---|
| | 1 | Visita en obra en compañía |
| | 2 | Lectura del acta anterior |
| | 3 | Verificación de área en obra |
| | 4 | Reunion con el alcalde y la secretaria de planeación |
| | 5 | Compromisos y recomendaciones. |

**ASISTENTES:**

| Nombre | Cargo | Entidad |
|---|---|---|
| Jose Ernesto Miranda | Alcalde | Alcaldía Municipio de Balboa |
| Francy Eliana Muñoz | Secretaria de Planeación | Alcaldía Municipal de Balboa |
| Laura murillo | Apoyo a la Supervision | Ministerio del interior |
| Mick Báez | Director de Infraestructura | Alcaldía Municipio de Balboa |
| Adriana Uribe | Contratista de Apoyo a la Supervisión | Alcaldía Municipio de Balboa |
| Eduardo Cifuentes | Representante Legal | Contratista |
| Paulo Romero | Residente de Interventoría | Interventoría |




Powered by CamScanner

DESARROLLO

**1. visita en obra**

El día de hoy 23 de mayo de 2025, se realiza visita a la obra en compañía de la Ingeniera Laura Murillo, Apoyo de la Supervisión del Ministerio del Interior, Eduardo Cifuentes Hurtado representante legal del Consorcio Sacúdete y contratista de la obra, Ing. Mick Báez Director de Infraestructura, Adriana Uribe apoyo a la supervisión del municipio y Se destaca la ausencia de la interventoría en esta visita.

**2. se da lectura al acta anterior**

Se procedió con la lectura del acta anterior, la cual fue aprobada sin observaciones por el señor Eduardo Cifuentes, en representación del contratista de obra.

**3. Verificación de área en obra**

Se verifican las áreas de baños, cocina, gimnasio, juegos infantiles y auditorio, basándonos en los planos firmados presentados por la Ing. Laura Murillo.

La ingeniera Laura pregunta como queda el tema de la baranda perimetral y se le informa que solo tiene contratados 50 metros que alcalza para la parte externa de cara hacia a la vìa.

Se le aclara al contratista, representada en esta acto por el señor Eduardo Cifuentes que el castillo (juegos infantiles) deben, al menos; cumplir con las especificaciones plasmadas en el plano correspondiente, el contratista manifiesta que este item requiere un ajuste presupuestal ya que esta pactado en $67.623.000 y según las cotizaciones tiene un costo directo en el mercado de $79.968.000 , lo que le genera un desequilibrio presupuestal y que esto se lo ha manifestado a la interventoria pero desde el municipio no tenemos conocimiento de esto y la interventoria no se ha pronunciado al respecto, por lo que se le solicita como ya es costrumbre que envie al correo del ingeniero Mick, el soporte de dicha información, a lo que manifiesta que las buscará y las enviará, ya que la interventoria no ha acompañado en ningún comité y tampoco la hemos encontrado en las diferentes visitas que hemos realizado a la obra, es importante que el municipio genere sanciones a la interventoria porque la falta de respuesta al contratista genera retrasos en la obra.

**Se verifica el área de los baños**
4,94m x 13,68m, altura 3,33m

**Area de cocina**
6,43m x 3,56m , altura 3,51m

**Area de Gradas**

| Ancho de las gradas | Acceso 1(lado cocina) | Acceso 2 (lado salon comunitario |
|---|---|---|
| 0,93m | 0,41m x 0,96m | 0,40m x 0,96m |



Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 0,90m | 0,40m x 0,97.5 m | 0,38.5m x 1,01m |
| 0,80m | 0,36.5m x 0,99m | 0,38m x 1,01m |

**Área de la cancha**
27m x 16,90m

**Área del gimnasio**
4,6m x 16,90m
Acá se debe tener en cuenta la figura obligada que se tuvo que hacer por el ingreso a las viviendas aledañas

**Área paque infantil**
9,90m x 15,40m

**Ancho de la circulación baños**
1,80m

**Área del auditorio**
Parte interna de la tarima de columna a columna 8,93m
Parte externa de la tarima de columna a columna 9,73m
Medida de la columna hasta la ultima silla parte derecha 7,45m
Medida de la columna hasta la ultima silla parte centro 10,70m
Medida de la columna hasta la ultima silla parte izquierda 11,25m

**4. Reunion con el alcalde y la secretaria de planeación**

Posteriormente, a las 4:14 pm, se da inicio a la reunión en la Alcaldía Municipal, despacho del alcalde donde participan el alcalde, la Secretaria de planeación, contratista de obra, director de obra del municipio y apoyo a la supervisión por el municipio

El alcalde Jose Ernesto da la bienvenida y agradece a todos por la asistencia en especial a la ingeniera Laura Murillo apoyo a la supervisión por el Ministerio del Interior y manifiesta su preocupación ya que la interventoria no asistió tampoco el día de hoy.

La ingeniera Laura, socializó lo que se hizo en campo el día de hoy (medidas de áreas). Además manifiesta que se deben verificar el área en campo de la zona de auditorio, la ubicación de las bancas y sus dimensiones; ya que según el plano deben tener espacio para el ingreso de las sillas de ruedas y en campo esto no se evidencio.

También se cuenta con la dificultad de la cubierta ya que no se puede instalar pronto porque presenta dificultades con la dirección de la misma, ósea que se debe ajustar la cubierta para proteger la zona de las bancas, pues el viento



Powered by CamScanner

puede levantar la cubierta y las bancas quedarían expuestas a la lluvia o a las altas temperaturas del sol, he informa que se requiere un reforzamiento adicional ya que no se tuvo en cuenta la dirección de los vientos y es necesario el concepto del estructural y el certificado de un profesional ya que en el momento seria un riesgo y es posible que requiera de una adición o un contrato adicional para atender esta necesidad.

Revisando el tema del incumplimiento de la interventoria, se evidencia la voluntad del contratista de obra pero persiste la dificultad con la interventoria ya que no asistieron a la visita del ministerio, se requiere iniciar de forma urgente con las acciones pertinentes

También le solicita al contratista que si requiere solicitar alguna modificación esta solicitud debe ir acompañada de un estudio de mercado, por ejemplo el tema del adoquín del formato contratado ya no se consigue en el mercado, el contratista manifiesta que esta solicitud se la hio a la interventoria pero que a la fecha no tiene una respuesta al igual que la parte eléctrica ya que el sugiere que se instalen paneles solares y tampoco tiene respuesta de la interentoria.

Por parte de la supervisión del municipio se manifiesta que en la obra nunca esta la bitácora y que esto es de gran importancia.

Se da la bienvenida al ingeniero Paulo Roberto Alfonso Romero a las 4:41pm , representante por parte de la interventoria y se le explica todo lo hablado en la reunión y la visita en campo el día de hoy, también se le pregunta si el tiene algún informe o respuesta a las solicitudes manifestadas por el contratista de obra a lo que el responde que no, el ingeniero Mick director de obra y supervisor por parte del municipio le pregunta si el solo se limita a temas de obra y el ingeniero Paulo le dice que si que en temas de aprobaciones o decisiones solo el arquitecto Carlos Rambal puede hacerlo. Pero que él como residente de interventoria le ha pasado los informes a Rambal pero que no tenia conocimiento que el no los entregara a la supervisión de la alcaldía, la doctora Eliana secretaria de planeación manifiesta que la información que les había brindado el ingeniero Paulo era que habia renunciado a lo que el ingeniero le contesta que sí pero que había vuelto hace pocos días, la doctora Eliana también manifiesta que esto no es tan fácil ya que para cualquier modificación se debe realizar la pactacion de precios a lo que el señor Eduardo contesta que le acepten la suspension por quince (15) dias para definir estos temas.

A lo que contestamos por parte de la alcaldía que no estamos de acuerdo con los quince días, es mucho tiempo y cual seria la justificacion teniendo en cuenta varios temas, por ejemplo que la obra tiene como posible fecha de terminación el 25 de mayo de 2025 y que según informa el jurídico del municipio doctor



Powered by CamScanner

Alfonso Figueredo se va a realizar el proceso de incumplimiento a la interventoria, ademas preguntan el alcalde Ernesto Miranda y la ingeniera Adriana quien se va a responsabilizar de la obra al estar suspendida a lo que responde el señor Eduardo que el contratista asumirá ese compromiso y que su mayor dificultad es el alto costo para el traslado de los materiales a la obra a lo que el alcalde le responde que él se encargará personalmente de conseguirle el transporte con precios más favorables.

El señor Eduardo envio una solicitud de suspesion o prorrora el día de ayer donde manifiesta principalmente que su mayor dificultad es la via pero todos los presentes no lo aceptamos ya que la via altena Cruces esta en perfecto estado y el arreglo de la via principal se puede demorar años, el señor Eduardo dice que hoy envio otra solicitud solo de suspension a lo que el jurídico y el ingeniero Mick manifiestan que apenas llego y tampoco se acepta la totalidad de la solicitud solo se acepta por la justificación del silencio o falta de respuesta de la interventoria ya que sin esto no se puede avanzar en la obra y solo se aceptan cinco (5) dias, hasta que culmine el proceso de incumplimiento con la interventoría o que esta se pronuncie con las peticiones.

El representante por la interventoria manifiesta que se encontraron inconsistencias entre los planos y el presupuesto contratado a lo que se le pregunta si en algun momento lo manifestaron por escrito y dice que no.

**5. Compromisos y recomendaciones**

Las partes acuerdan suspender por cinco (5) dias a partir de hoy tanto en contrato de obras como el de interventoría.

Sabiendo que el Ingeniero Paulo no está facultado para la toma de decisiones se le solicita socializar vía telefónica con el Arq. Carlos Rambal para que autorice el uso de su firma digital, el ingeniero Paulo no manifiesta objeción sobre este asunto.

El municipio se compromete a gestionar transporte mas economico desde la virginia hasta la obra.

El municipio se compromete a redactar las actas de suspensión correspondientes.

El Representante Legal del Consorcio Sacudete, Eduardo Cifuentes se compromete a entregar las solicitudes a interventoria con copia de los radicados a la supervisión del municipio.




Powered by CamScanner

| | |
|---|---|
| | Todas las partes coinciden en la sugerencia de tomar fotos de los planos firmados y aprobados con lo que cuenta el ministerio.<br><br>**6. Cierre del comité**<br><br>No habiendo más asuntos por tratar, se dio por finalizada la reunión a las 07:47 pm, dejando constancia en la presente acta. |

**Anexos**

Se adjuntan las siguientes evidencias:

1. Registro fotográfico en obra.
2. Asistencia.

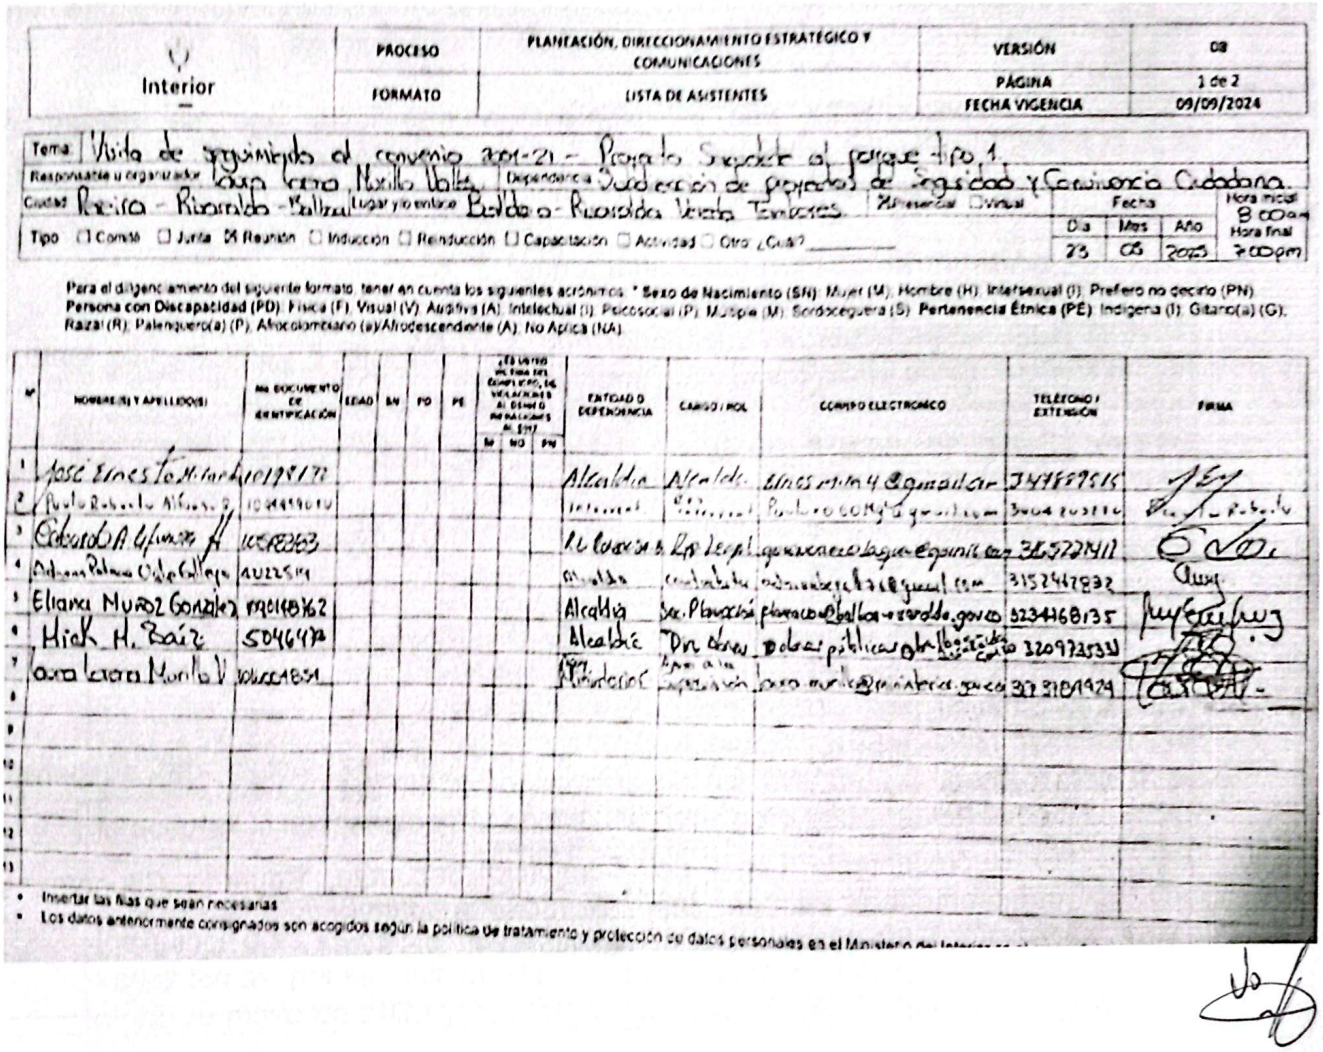

| Interior | PROCESO | PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES | VERSIÓN | 08 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO | LISTA DE ASISTENTES | PÁGINA | 1 de 2 |
| | | | FECHA VIGENCIA | 09/09/2024 |

Tema: Visita de seguimiento al convenio 301-21 - Proyecto Sendero al parque tipo 1.
Responsable u organizador: Laura Lorena Murillo Valle. Dependencia: Subdirección de proyectos de seguridad y Convivencia Ciudadana.
Ciudad: Pereira - Risaralda - Balboa. Lugar y/o enlace: Balboa - Risaralda Vereda Tambores. Presencial ☐ Virtual
Tipo: ☐ Comité ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro ¿Cuál? _____
Fecha: Día 23 Mes 05 Año 2025. Hora inicial 8:00 am. Hora final 2:00 pm

Para el diligenciamiento del siguiente formato tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN)**: Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD)**: Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S). **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

| Nº | NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | EDAD | SN | PD | PE | ¿ES USTED UNA PERSONA QUE HA SIDO VÍCTIMA DE VIOLACIONES AL DIH O INFRACCIONES AL DIH? SI | NO | PNR | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO / POL | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Ernesto Muñoz | 10198178 | | | | | | | | Alcaldía | Alcalde | | 3147859516 | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Eliana Muñoz González | 1061168362 | | | | | | | | Alcaldía | Sec. Planeación | | 3234168135 | |
| 6 | Hiark H. Baiz | 5046478 | | | | | | | | Alcaldía | Dir. obras | | 3209725331 | |
| 7 | Laura Lorena Murillo V | 1061168351 | | | | | | | | | | | 3218161974 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |


- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en [illegible]




Powered by CamScanner

## Registro fotográfico obra




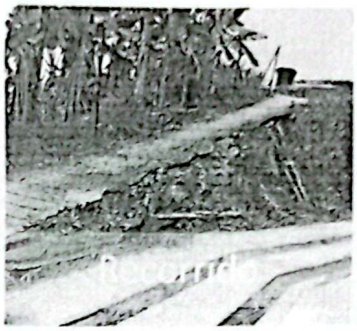










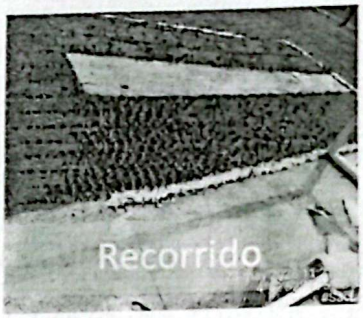

Firman quienes elaboran:

**Ing. Mick Mael Baez Rojas**
Director de infraestructura
Municipio de Balboa

**Adriana Patricia Uribe Gallego**
Contratista de apoyo a supervisión
Municipio de Balboa



Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** 28 de mayo de 2025 | **Acta No: 4** | **Hora Inicio**: 09:03 a.m | **Hora Fin: 10:00 a.m** |
| **Tema:** visita "obra Sacúdete" | | | |
| **Responsable**: Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | | **Elaborado por:** Adriana Patricia Uribe Gallego | |
| **Dependencia:** Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial | | | |
| **Lugar:** Vereda Tambores obra Sacúdete | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DEL DÍA** | 1 | Visita en obra |
| | **2** | Lectura del acta anterior |
| | 3 | Verificación de area de obra según planos y medidas de las cajas |

**ASISTENTES:**

| Nombre | Cargo | Entidad |
|---|---|---|
| Mick Báez | Director de Infraestructura | Alcaldía Municipio de Balboa |
| Adriana Uribe | Contratista de Apoyo a la Supervisión | Alcaldía Municipio de Balboa |
| Eduardo Cifuentes | Representante Legal. | Contratista |




Powered by CamScanner

DESARROLLO

**1. visita en obra**

El día de hoy 28 de mayo de 2025, se realiza visita a la obra en compañía del señor Eduardo Cifuentes Hurtado contratita de obra, Mick Báez Director de Infraestructura, Adriana Uribe apoyo a la supervisión del municipio y se destaca la ausencia de la interventoría en esta visita.


**2. se da lectura al acta anterior**

El acta anterior, fue aprobada sin observaciones el día de la reunión.

**3. Verificación de área en obra**

Se verifican nuevamente las áreas de juegos infantiles y auditorio, basándonos en los planos firmados que nos envio la ingeniera Laura Murillo, ya que al hacer el acta quedamos con algunas dudas y este fue un compromiso con la ingeniera Laura.

**Área paque infantil**
9,90m x 15,40m

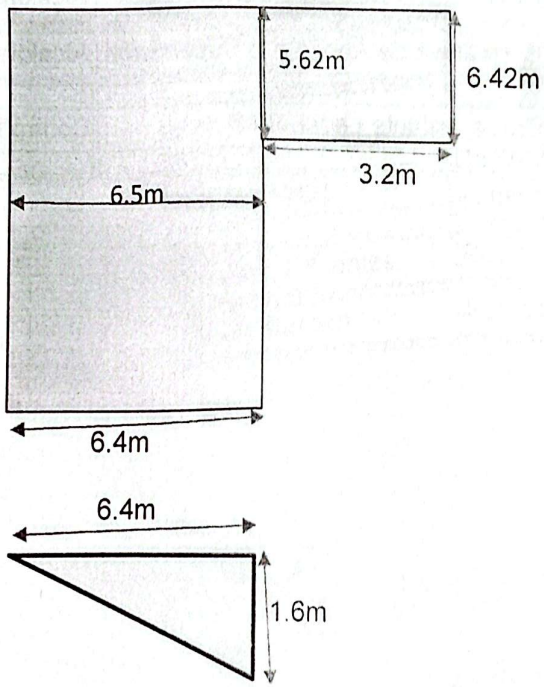






Powered by CamScanner

**Área del auditorio**

Parte externa de la zona del auditorio (área desde el anden perimetral del lado de la tarima 10.30m
Parte interna de la tarima de columna a columna 8,93m
Parte externa de la tarima de columna a columna 9,73m
Medida de la columna hasta la ultima silla parte derecha 7,46m
Medida de la columna hasta la ultima silla parte centro 10,70m
Medida de la columna hasta la ultima silla parte izquierda 11,25m

Medidas de las sillas 1.60m x 0.58m x 0.55 alto





Ademas se toma medidas de las cajas construidas en la obra y se toman medidas de los andenes perimetrales y las medidas de la malla y el piso sintético de la cancha.

**Medidas de los andenes**

Los andenes tiene diversas medidas o anchos

Primer carril: 0,79 m
Separación para adoquín guía a personas con movilidad reducida: 0,225 m
Segundo carril: 0,69 m




**Medidas de las cajas**

| cm | Alto cm | Marco cm |
|---|---|---|
| 65x67 | 72 | 84x84 |
| 72x76.5 | 64 | 84x84 |
| 75.5x73 | 62 | 81x81 |
| 63x64 | 71 | 69.6x69.6 |
| 75.5x69 | 63.5 | 80x80 |
| 63.5x58 | 66 | 59x59 |
| 71x76 | 65 | 79.5x80 |
| 75x74 | 80 | 80x78 |
| 76x72 | 79 | 79x80 |



Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 82x80 | 60 | 79x79.5 |
| 65x72 | 70 | 84x84 |
| 42x39 | 15 | Sin marco |
| 77x70 | 70 | 84x84.5 |
| 60x59 | 38 | Sin marco |
| 85x85 | 70 | 73x78 |
| 49x50 | 80 | Sin marco |
| 80x80 | 69 | 84x84 |
| 49x53.5 | 80 | Esta en tierra solo la excavación |
| 75x75 | 72 | 84x84 |
| 75x75 | 80 | 84x84 |
| 77x73 | 75 | 79x79 |

**Medidas de las mallas de la cancha**
**Malla parte alta**

Medidas de las Mallas de la Cancha

**Parte alta:**

- 5 cuadros de 2,35 m x 2,40 m
- 7 cuadros de 2,32 m x 2,00 m

**Parte baja (lado de las gradas):**

- 2,55 m x 2,60 m
- 3,06 m x 2,60 m
- 3,11 m x 2,60 m
- 3,25 m x 2,60 m
- 2,24 m x 2,60 m
- 2,53 m x 2,60 m (x4)

**Parte baja (lado del CIC):**

- 2,55 m x 2,60 m (x2)
- 2,65 m x 2,60 m (x2)
- 2,54 m x 2,60 m (x2)
- 2,55 m x 2,60 m (x5)



Powered by CamScanner

- 2,965 m x 2,60 m

**Medidas de la Grama Sintética**

**Área total:** 26,8 m x 17 m

**Espacios sin grama ,ósea lo que se le debe restar al área total:**

- 1,00 m x 2,00 m (x2)
- 3,95 m x 0,60 m
- 1,00 m x 5,05 m
- 0,50 m x 2,85 m

**Nota:** La cancha se encuentra sin puerta.

**4. Observaciones**

Durante la visita se evidenció que las sillas del auditorio se encuentran sueltas del piso, situación que se debe corregir de acuerdo con los planos aprobados, garantizando su debida sujeción.

Adicionalmente, el señor Eduardo Cifuentes manifestó algunas dudas con respecto a las distancias para la instalación de las sillas. Se procedió a mostrarle el plano correspondiente, y él se comprometió a realizar la instalación de acuerdo con lo establecido en dicho plano directamente en campo.

**5. Cierre de la Visita**

No habiendo más asuntos por tratar, se dio por finalizada la visita a las 10:00 a.m., dejando constancia de lo ocurrido en la presente acta.

**Anexos**


**Registro Fotográfico**



Powered by CamScanner

## Registro fotográfico obra

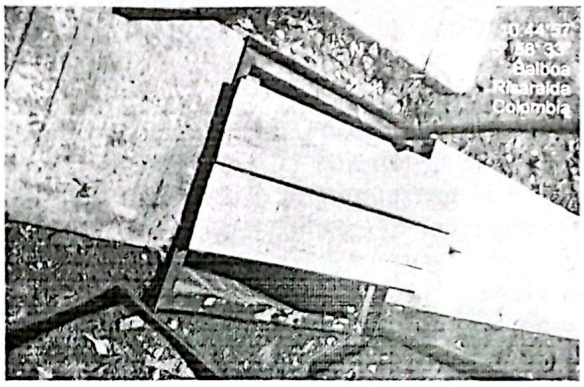


Firman quienes elaboran:

**Mick Baez**
Director de infraestructura
Municipio de Balboa

**Adriana Patricia Uribe Gallego**
Contratista de apoyo a supervisión
Municipio de Balboa




Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MUNICIPIO:** | BALBOA - RISARALDA | **No. CONVENIO:** | 2001-2021 |
| **FECHA DE ACTA INICIO:** | 17-11-2021 | **FECHA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO:** | 30-09-2025 |
| **ELABORÓ:** | ING. LAURA LORENA MURILLO VALLES | **FECHA DE VISITA:** | 22-23 MAYO 2025 |
| **TIPO DE PROYECTO:** (CIC, Sacúdete CAMs, Estaciones de Policía) | CONVENIO 2001-2021: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA. | | |

| **ASISTENTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE** | **CARGO** | **REPRESENTA A** |
| 1. | LAURA LORENA MURILLO VALLES | SUPERVISORA DE APOYO | MINISTERIO DEL INTERIOR |
| 2. | JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ | ALCALDE DEL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE BALBOA |
| 3. | EDUARDO CIFUENTES | R/L CONSORCIO SACU. BALBOA | MUNICIPIO DE BALBOA |
| 4. | MICK MAEL BAEZ ROJAS | SUPERVISOR DEL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE BALBOA |
| 5. | FRANCY ELIANA MUÑOZ GONZALEZ | SECRETARIA DE PLANEACIÓN | MUNICIPIO DE BALBOA |
| 6. | ADRIANA PATRICIA URIBE GALLEGO | APOYO A LASUPERVISION DEL MUNICIPIO | MUNICIPIO DE BALBOA |

**DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:** Vereda Tambores – Zona Rural Municipio de Balboa – Risaralda.

**INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS**

| No. contrato | Nombre del contratista | Fecha de inicio | Fecha de terminación |
|---|---|---|---|
| **Obra:** 001 de 2022 / ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION. | CONSORCIO/ SACUDETE BALBOA / JAIME PEDRAZA PEREZ | 17/06/2022 | SUSPENDIDO HASTA EL 28 DE MAYO DE 2025. |
| **Interventoría:** INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA 001 DE 2022 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022/ CARLOS RAMBAL | 17/06/2022 | SUSPENDIDO HASTA EL 28 DE MAYO DE 2025. |

**CUADRO FINANCIERO**

| **CONCEPTO** (adjuntar celdas si es necesario) | **VALOR** | **No. COMPROBANTE DE EGRESO** | **FECHA PAGO** |
|---|---|---|---|
| Pago anticipo del 15% al Contrato de obra Pública No. 001 de 2022. | $156.100.050,00 | **02575** | 31/10/2024 |
| Acta de pago No. 1 al Contrato de obra Pública No. 001 de 2022. | $81.106.614,00 | **02574** | 08/11/2024 |
| Acta de pago No. 2 al Contrato de obra Pública No. 001 de 2022. | $201.871.180,00 | **02757** | 27/11/2024 |
| Acta de pago No. 3 al Contrato de obra Pública No. 001 de 2022. | $122.969.474.00 | **03102** | 19/12/2024 |
| Acta de pago No. 5 al Contrato de obra Pública No. 001 de 2022. | $ 23.329.943,00 | **00269** | 26/02/2025 |
| Acta de pago parcial No. 2 Contrato de interventoría No. 001 de 2022 | $38.715.419,61 | **03336** | 30/12/2024 |
| Acta de pago No. 6 al Contrato de obra Pública No. 001 de 2022. | $33.731.130,24 | **00678** | 15/04/2025 |

**CUADRO FINANCIERO**

## Cifras con corte al 30 de ABRIL 2025

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO ABRIL DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 272 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 5.022.956,00 | N/A | $ 5.022.956,00 |
| | OBRA ACTA 6 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 33.731.130,24 | N/A | $ 33.731.130,24 |
| | DESCUENTOS DE OP 679 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 7.788.170,00 | N/A | $ 7.788.170,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 866.728.243,85** | **$ 56.100.050,00** | **$ 922.828.293,85** |

| RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO | |
|---|---|
| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
| 01/04/2025 | $ 13.239,00 |
| 02/04/2025 | $ 13.240,00 |
| 03/04/2025 | $ 13.240,00 |
| 04/04/2025 | $ 39.725,00 |
| 07/04/2025 | $ 13.243,00 |
| 08/04/2025 | $ 13.244,00 |
| 09/04/2025 | $ 13.244,00 |
| 10/04/2025 | $ 13.245,00 |
| 11/04/2025 | $ 39.739,00 |
| 14/04/2025 | $ 13.247,00 |
| 15/04/2025 | $ 11.599,00 |
| 16/04/2025 | $ 58.006,00 |
| 21/04/2025 | $ 11.603,00 |
| 22/04/2025 | $ 11.603,00 |
| 23/04/2025 | $ 11.604,00 |
| 24/04/2025 | $ 11.605,00 |
| 25/04/2025 | $ 34.817,00 |
| 28/04/2025 | $ 11.607,00 |
| 29/04/2025 | $ 11.607,00 |
| 30/04/2025 | $ 23.216,00 |
| | |
| TOTAL (3) | $ 382.673,00 |

| DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No.32030000026-3 | | |
|---|---|---|
| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
| 04/04/2025 | $ 30.914.911,00 | 1387874903 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL (4) | $ 30.914.911,00 | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) | $ 1.050.298.887,59 |
| TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) | $ 866.728.243,85 |
| TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) | $ 22.329.338,00 |
| Rendimientos financieros noviembre 2021 | $ 0,00 |
| Rendimientos financieros diciembre 2021 | $ 66.450,00 |
| Rendimientos financieros enero 2022 | $ 71.398,00 |
| Rendimientos financieros febrero 2022 | $ 93.827,00 |
| Rendimientos financieros marzo 2022 | $ 109.244,00 |
| Rendimientos financieros abril 2022 | $ 114.517,00 |
| Rendimientos financieros mayo 2022 | $ 110.878,00 |
| Rendimientos financieros junio 2022 | $ 110.933,00 |
| Rendimientos financieros julio 2022 | $ 122.680,00 |
| Rendimientos financieros agosto 2022 | $ 141.496,00 |
| Rendimientos financieros septiembre 2022 | $ 180.002,00 |
| Rendimientos financieros octubre 2022 | $ 186.664,00 |
| Rendimientos financieros noviembre 2022 | $ 117.501,00 |
| Rendimientos financieros Diciembre 2022 | $ 114.898,00 |
| Rendimientos financieros enero 2023 | $ 107.839,00 |
| Rendimientos financieros febrero 2023 | $ 137.812,00 |
| Rendimientos financieros marzo 2023 | $ 2.074,00 |
| Rendimientos financieros abril 2023 | $ 1.823,00 |
| Rendimientos financieros mayo 2023 | $ 1.887,00 |
| Rendimientos financieros Junio 2023 | $ 6.674,00 |
| Rendimientos financieros Julio 2023 | $ 6.950,00 |
| Rendimientos financieros Agosto 2023 | $ 7.746,00 |
| Rendimientos financieros Septiembre 2023 | $ 7.775,00 |
| Rendimientos financieros Octubre 2023 | $ 319.955,00 |
| Rendimientos financieros Noviembre 2023 | $ 1.347.825,00 |
| Rendimientos financieros Diciembre 2023 | $ 1.440.100,00 |
| Rendimientos financieros Enero 2024 | $ 1.352.364,00 |
| Rendimientos financieros Febrero 2024 | $ 1.309.380,00 |
| Rendimientos financieros Marzo 2024 | $ 1.401.962,00 |
| Rendimientos financieros Abril 2024 | $ 1.404.322,00 |
| Rendimientos financieros Mayo 2024 | $ 1.497.523,00 |
| Rendimientos financieros Junio 2024 | $ 1.272.729,00 |
| Rendimientos financieros Julio 2024 | $ 1.365.785,00 |
| Rendimientos financieros Agosto 2024 | $ 1.459.288,00 |
| Rendimientos financieros Septiembre 2024 | $ 1.324.671,00 |
| Rendimientos financieros Octubre 2024 | $ 1.418.333,00 |
| Rendimientos financieros Noviembre 2024 | $ 1.227.261,00 |
| Rendimientos financieros Diciembre 2024 | $ 681.857,00 |
| Rendimientos financieros Enero 2025 | $ 515.111,00 |
| Rendimientos financieros febrero 2025 | $ 402.988,00 |
| Rendimientos financieros Marzo 2025 | $ 384.143,00 |
| TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) | $ 21.946.665,00 |
| SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) | $ 382.673,00 |
| SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3) | $ 205.899.981,74 |

OBSERVACIONES

El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de ABRIL $1.072.628.225,59, menos los pagos $866.728.243,85 para un saldo a ABRIL de $205.899.981,74

**NOTA:** SE DEBEN ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS SOPORTES, ES DECIR, COMPROBANTES DE EGRESO, ORDENES DE PAGO Y EXTRACTOS BANCARIOS.

**CUENTAS RECÍPROCAS**

| | |
|---|---|
| **SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE** | $ 0,00 |

**DESARROLLO DE LA VISITA**

**GENERALIDADES:**

- El convenio 2001 de 2021 se encuentra en ejecución conforme a la SEXTA PRORROGA Y TERCERA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
- La fecha de terminación actual del convenio corresponde al día 30 de SEPTIEMBRE de 2025.
- La Póliza expedida por la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA con No. 580-47-994000069129 Anexo 10 tiene vigencia hasta el 30/03/2026 de acuerdo con la última modificación fue cargada y aprobada en el SECOP.
- El valor total del convenio es: $ 1.323.000.000
- El valor aportado por el Ministerio del Interior es de: $ 1.250.000.000
- El valor aportado por el municipio de Balboa - Risaralda es de: $ 72.627.790 (Adición obra: $67.244.891 / Interventoría: $5.382.898)
- El valor desembolsado por el Ministerio del Interior es la suma de: $ 1.045.000.000, correspondientes al primer y segundo desembolso.

**DESARROLLO DE LA VISITA:**

La visita del proyecto SACUDETE del municipio de Balboa - Risaralda, tiene los siguientes objetivos:

1. Recopilar la documentación pendiente que debe ser entregada por parte del municipio, la cual fue solicitada conforme al requerimiento con radicado No. 2025-2-003122-016781 Id: 540226, cuyo asunto es: " Reiteración al requerimiento No.2, con radicado 2025-2-003122-005582 Id: 500729, respecto a la solicitud cumplimiento de obligaciones contractuales en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2001-2021 suscrito entre el Ministerio del Interior FONSECON y el Municipio de Balboa - Risaralda", en el que se solicita lo siguiente:

   **Informar el estado del proceso contractual adelantado al Contrato de Interventoría No. 001 de 2022:** con sustento en las reuniones lideradas por el equipo de seguimiento y control de la Contraloría General de la República, en dichos espacios, la supervisión del municipio de Balboa-Risaralda informó a esta supervisión del Ministerio del Interior que se adelantaría la suspensión de los contratos de obra e interventoría por un término de quince (15) días, contados a partir del 15 de febrero de 2025.

   En ese sentido, la entidad territorial informó al equipo de apoyo a la supervisión que, el 23 de mayo de 2025, se suscribió la suspensión de la contratación derivada por un término de cinco (5) días, hasta el 28 de mayo de 2025. Dicha suspensión se fundamenta en el desarrollo de las acciones administrativas sancionatorias que adelanta la administración municipal en relación con el contrato de interventoría suscrito con el CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022, conforme a lo tratado en la audiencia llevada a cabo el día jueves 22 de mayo de 2025.

   En consecuencia, la administración municipal se comprometió a informar a la supervisión del Ministerio del Interior, durante la semana comprendida entre el 26 y el 30 de mayo de 2025, sobre todas las actuaciones realizadas y las decisiones adoptadas en el marco del referido proceso administrativo.

   Se anexan al presente informe las actuaciones adelantadas por la administración municipal en relación con la suspensión de la contratación derivada.

**Remitir informes de supervisión por parte del Municipio:** De acuerdo con los requerimientos No. 2025-2-003122-000642 Id: 475022 y 2025-2-003122-001365 Id: 480468 con fecha del 14 de enero de 2025 y 23 de enero de 2025 respectivamente, esta supervisión reitera al municipio de Balboa – Risaralda que, a la fecha la Entidad Territorial no ha presentado la documentación correspondiente a la ejecución del convenio; por consiguiente, se requiere la entrega de la información que se relaciona a continuación:

- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de noviembre de 2024, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de enero de 2025, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de febrero de 2025, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de marzo de 2025, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de abril de 2025, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de enero de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de febrero de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de abril de 2025.
- Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de abril de 2025.
- Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de mayo de 2025.

Una vez solicitada la documentación, la supervisión del municipio remitió, a través de correo electrónico, los informes financieros correspondientes a los siguientes meses:

- Informe financiero correspondiente al mes de noviembre de 2024, junto con el extracto bancario, comprobantes de egreso y ordenes de pago correspondientes.
- Informe financiero correspondiente al mes de enero 2025, junto con el extracto bancario, comprobantes de egreso y órdenes de pago correspondientes.
- Informe financiero correspondiente al mes de febrero 2025, junto con el extracto bancario, comprobantes de egreso y órdenes de pago correspondientes.
- Informe financiero correspondiente al mes de marzo 2025, junto con el extracto bancario, comprobantes de egreso y órdenes de pago correspondientes.
- Informe financiero correspondiente al mes de abril 2025, junto con el extracto bancario, comprobantes de egreso y órdenes de pago correspondientes.

Sin embargo, una vez recibida esta información, aun queda pendiente por entrega de los informes de supervisión del municipio que han sido requeridos a través de los comunicados del 23 de enero 2025 – No. 2025-2-003122-001365 Id: 480468; 27 de enero 2025 – No. 2025-2-003122-001478 Id: 481427; 14 de febrero 2025 – No. 2025-2-003122-000642 Id: 475022; 21 de febrero 2025 – No. 2025-2-003122-004449 Id: 496566; 28 de febrero 2025 – No. 2025-2-003122-005582, y el 16 de mayo de 2025 – No. 2025-2-003122-016781 Id: 540226 y que se describen a continuación:

- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de enero de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de febrero de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de abril de 2025.
- Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de abril de 2025.
- Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de mayo de 2025.

**Cumplimiento a los compromisos adquiridos a las reuniones de seguimiento permanente convocadas por la unidad de reacción inmediata de la Contraloría General de la República.** Se solicita a la entidad territorial informar detalladamente sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de trabajo realizadas de manera virtual, en el marco de las reuniones de seguimiento lideradas por la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República.

A pesar de que, en varias mesas de trabajo, se han otorgado plazos adicionales a los establecidos inicialmente para su cumplimiento, a la fecha no se ha recibido la correspondiente documentación o evidencias requeridas y varios de los compromisos permanecen incumplidos. Esta situación se encuentra registrada en los cuadros de seguimiento elaborados en el desarrollo de cada una de las reuniones, los cuales se describen a continuación:

| MESA DE TRABAJO DEL 12 DE MARZO DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Presentación proyectada por el municipio. | Min-Interior 14/03/2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Relación de todos los informes de interventoría mensuales y semanales producidos hasta la fecha desde el inicio del contrato hasta la fecha. | Min-Interior – Interventoría 14/03/2025 | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Correo enviado por Ministerio del Interior al municipio de Balboa indicando los lineamientos o requisitos para la solicitud de modificación de ítems contractuales. | Min-Interior 14/03/2025 | **CUMPLIDO** |
| 4 | Acta de reunión suscrita entre la Alcaldía de Balboa-Risaralda, supervisión y contratistas de obra e interventoría, para estudio y definición de la propuesta de modificación de ítems contractuales. | Min-Interior- Municipio de Balboa 14/03/2025 | **En la carpeta del 20 de marzo se cargaron dos actas de reunión de mesas técnicas** |
| 5 | Envío **oficial** por parte del municipio de Balboa-Risaralda de la solicitud o propuesta de modificaciones de ítems contractuales realizada por el contratista de obra, con los avales de interventoría y supervisión y demás SOPORTES COMPLETOS que justifican dicha solicitud. | Min-Interior – Municipio y Contratista de obra e interventoría 14/03/2025 | **INCUMPLIDO** |

| MESA DE TRABAJO DEL 20 DE MARZO DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Evidencias o soportes del inicio de presunto incumplimiento contra la interventoría de obra e informe correspondiente del municipio de Balboa | Min-Interior- Municipio de Balboa 26-Mar-2025 | **Informe de incumplimiento del 19 de marzo de 2025** |
| 2 | Solicitud acta de prórroga de la contratación derivada. | Min-Interior – Interventoría | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Envío de la última solicitud de prórroga del contrato de obra | Min-Interior – Municipio de Balboa 26-Mar-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 4 | Envío oficial parte del municipio de Balboa-Risaralda de la solicitud o propuesta de modificaciones de ítems contractuales realizada por el contratista de obra con los avales de interventoría y supervisión y demás SOPORTES COMPLETOS que justifican dicha solicitud. | Min- Interior – Municipio de Balboa 26-Mar-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | Respuesta del Ministerio del Interior a solicitud de modificación de Ítems. | Min-Interior 26-Mar-2025 | **CUMPLIDO** |
| 6 | Cargue y envío al Ministerio del Interior de la evidencia de la actualización de la póliza de la sexta prórroga y tercera modificación del convenio al 30/09/2025 | Min-Interior – Municipio 26-Mar-2025 | **Se cumplió hasta el 2 de mayo de 2025** |

| MESA DE TRABAJO DEL 03 DE ABRIL DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior- Municipio de Balboa 8/04/2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Cargue informe técnico de incumplimiento de la interventoría. | Min-Interior- Municipio de Balboa -Interventoría 8/04/2025 | **CUMPLIDO** |
| 3 | Remitir correo al Min-Interior con el pantallazo de la subsanación del error de la póliza del convenio. | Min-Interior – Municipio de Balboa 8/04/2025 | **CUMPLIDO** |
| 4 | Informes de supervisión del municipio a marzo de 2025. | Min- Interior – Municipio de Balboa 8/04/2025 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | RELACIÓN, remisión y cargue de los informes mensuales y semanales de interventoría a marzo de 2025. | Min-Interior – Municipio de Balboa – Interventoría 8/04/2025 | **Contamos con 23 informes semanales del 23 de octubre de 2024 al 2 de abril de 2025.**<br><br>**Sobre los informes mensuales, solo contamos con 3 informes, así:**<br>**1) del 23 al 29 de octubre de 2024.**<br>**2) del 23 de octubre al 13 de noviembre de 2024.**<br>**3) del 30 de octubre 2024 al 25 de enero de 2025.**<br><br>**INCUMPLIDO** |
| 6 | Respuesta del municipio al Min-Interior sobre el tema de las modificaciones de ítems contractuales. | Min-Interior – Municipio de Balboa 8/04/2025 | **INCUMPLIDO** |

| MESA DE TRABAJO DEL 10 DE ABRIL DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Presentación del estado del proyecto. | Min-Interior- Municipio de Balboa 15-abr-2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Relación de informes mensuales producidos hasta la fecha por la interventoría. | Min-Interior – Interventoría 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Informes mensuales de interventoría de enero, febrero y marzo. | Min-Interior – Interventoría 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 4 | Informe de supervisión de marzo de 2024. | Min-Interior- Municipio de Balboa 15-abr-2024 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | Remisión del estudio de la interventoría sobre el balance presupuestal o relación de precios de ítems a modificar. | Min-Interior – Interventoría 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 6 | Enviar fotos del avance de la fabricación de la cubierta. | Min- Interior – contratista de obra 15-abr-2024. | **CUMPLIDO** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Enviar certificaciones de calidad de los ítems a modificar, a la interventoría y copia al Ministerio del Interior. | Contratista de obra 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 8 | Acta de visita de interventoría a taller de inspección a la fabricación cubierta. | Min-Interior contratistas de obra e interventoría 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |

| **MESA DE TRABAJO DEL 24 DE ABRIL DE 2025** | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Acta de visita a taller del 26 de abril de 2025, donde se construye la cubierta. | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Copia oficio de remisión de las certificaciones de calidad a interventoría | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 4 | Copia oficio de pronunciamiento de la interventoría frente a la solicitud de modificaciones por parte del contratista de obra. | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | Copia oficio del municipio al ministerio, solicitando el pronunciamiento del ministerio, frente a la solicitud de modificaciones de ítem. | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 6 | Informe de avance de los tramites de RETIE y RETILAP | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025. | **INCUMPLIDO** |

Una vez, solicitada la información por el apoyo a la supervisión del ministerio del interior, el municipio informa que no se han dado cumplimiento a los compromisos pactados en las mesas de trabajo con la Contraloría General de la Republica por varios factores:

1. El proceso administrativo que se está adelantando respecto al contrato de interventoría suscrito con el CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022 y el municipio de Balboa - Risaralda será debidamente informado a la supervisión del Ministerio del Interior. Una vez concluyan las audiencias correspondientes y se profiera la respectiva resolución, se comunicarán las acciones que se deriven de dicho proceso.
2. El proceso de empalme y verificación que adelanta el supervisor del municipio el cual se encuentra enfocado en la revisión integral de la ejecución del convenio, incluyendo la evaluación de la calidad de los entregables y el cumplimiento de la normativa aplicable, teniendo en cuenta que la designación a la supervisión del municipio se encuentra ejerciendo sus funciones a partir del 16 de abril de 2024.
3. **Cambio de designación de supervisor de contratos y convenios.** Se informa que, mediante la Resolución No. 0000211 del 22 de abril de 2025, se efectuó el cambio de designación del funcionario encargado de la supervisión de contratos y convenios en el municipio de Balboa – Risaralda. En dicha resolución se designó al I**ngeniero Mick Mael Báez Rojas**, quien tomó posesión del cargo conforme al Acta de Posesión No. 009 del 16 de abril de 2025.

Es importante señalar que, si bien en la relación de compromisos establecidos por la Contraloría en las mesas de trabajo mencionadas se asigna al Ministerio del Interior la responsabilidad sobre algunos de ellos, es necesario precisar que el cumplimiento de dichos compromisos depende estrictamente de la gestión del municipio de Balboa – Risaralda. Esto se debe a que, en su calidad de ejecutor del convenio, es el municipio quien debe garantizar la adecuada ejecución de las actividades. En cuanto a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, esta se limita exclusivamente al cargue de información en la carpeta de Drive dispuesta por el órgano de control, con el fin de facilitar el conocimiento y la publicación de la documentación correspondiente.

**Verificación del porcentaje de avance de obra:**

En atención al cronograma presentado por la entidad territorial en el marco de la suscripción de la sexta prórroga del Convenio No. 2001-2021, se verifica que, según el último informe mensual presentado por la interventoría, se registra un avance del 23% con corte al 13 de noviembre de 2024. Por su parte, el informe más reciente aportado por la

supervisión del municipio de Balboa – Risaralda, reporta un avance del 55% con corte al mes de diciembre de 2024, el cual fue remitido a la supervisión del Ministerio del Interior.
No obstante, ambas cifras presentan incongruencias con respecto a lo evidenciado en sitio, dado que ninguno de los dos informes refleja información veraz o debidamente soportada frente a las actas de obra relacionadas previamente. Adicionalmente, se observa la falta de entrega oportuna de informes actualizados, lo cual limita la capacidad de seguimiento técnico y financiero del proyecto.

En este sentido, la supervisión del Ministerio del Interior solicita a la supervisión del municipio que, en el marco de las obligaciones contractuales del convenio, dé estricto cumplimiento a los compromisos adquiridos, remitiendo la información necesaria que permita subsanar los vacíos identificados en el presente documento dentro de las cuales se particularizan:

> ***(…) "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:*** *En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones:* ***I. ESPECÍFICAS:***
>
> *(…)**4)** Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo. (…)*
>
> *(…)**30)** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. (…)*
>
> *(…) **34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría" (…).*

Asimismo, en caso de que se haya formalizado la suspensión de los contratos derivados por parte de la entidad territorial, deberá informarse con claridad dicha situación y presentarse un plan emergente de acción, orientado a garantizar la ejecución del 100% del objeto contractual, dentro de los plazos establecidos en la Prórroga No. 6 del convenio, cuyo término final fue fijado para el 30 de septiembre de 2025.

Adicionalmente, el municipio no ha remitido evidencia que acredite el cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la supervisión del Ministerio del Interior y los entes de control, lo que ha generado un retraso injustificado en la ejecución del proyecto.

En concordancia frente a los procesos administrativos que se están llevando a cabo sobre la contratación derivada del proyecto, y una vez concluidas dichas actuaciones, se solicita al municipio de Balboa – Risaralda informar a la supervisión del Ministerio del Interior el plan de contingencia que se formulará y ejecutará, con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos previamente pactados. Este plan deberá garantizar la ejecución total del objeto contractual en los términos establecidos.

**Componente financiero**:

El municipio de Balboa manifiesta que, si bien recibió por parte del Ministerio del Interior, el 25 de octubre de 2023, el segundo desembolso correspondiente al 40% del valor total del proyecto, por un monto de $820.000.000, dichos recursos han sido ejecutados parcialmente en atención a las obligaciones contractuales vigentes.

Los pagos realizados se encuentran directamente relacionados con los avances evidenciados en el sitio de la obra, los cuales están siendo verificados por la supervisión municipal. A continuación, se relacionan los pagos efectuados basado en el informe financiero emitido por el área de Hacienda del municipio con corte al mes de Abril de 2025:

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 272 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 5.022.956,00 | N/A | $ 5.022.956,00 |
| | OBRA ACTA 6 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 33.731.130,24 | N/A | $ 33.731.130,24 |
| | DESCUENTOS DE OP 679 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 7.788.170,00 | N/A | $ 7.788.170,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| VALOR TOTAL PAGADO (2) | | | | | $ 866.728.243,85 | $ 56.100.050,00 | $ 922.828.293,85 |

**Gráfico 1:** Tomado del informe financiero al mes de abril de 2025

De acuerdo con el *Grafico 1*, se registra una ejecución a los recursos transferidos por el Ministerio del Interior por un valor total de *ochocientos sesenta y seis millones setecientos veintiocho mil doscientos cuarenta y tres pesos con ochenta y cinco centavos* **($866.728.243,85 M/L).** Asimismo, conforme al extracto bancario emitido por la entidad financiera correspondiente, se reporta un saldo disponible de doscientos treinta y siete millones quinientos trece mil cuarenta y nueve pesos con setenta y cuatro centavos ($237.513.049,74 M/L), con rendimientos generados durante el mes por un valor de trescientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y tres pesos **($382.673,00 M/L).**

En este contexto, la supervisión del Municipio se encuentra adelantando la verificación en sitio de las cifras reportadas por la contratación derivada, teniendo en cuenta que, a partir del 16 de abril de 2025, el municipio realizó un cambio en la designación del funcionario responsable de la supervisión de contratos y convenios, hecho formalizado mediante el acta de posesión correspondiente.

En virtud de lo anterior, se procedió a efectuar el recorrido y revisión técnica del proyecto frente a los estudios y diseños aprobados por la supervisión del ministerio del interior, teniendo en cuenta igualmente las observaciones producto de la denuncia ciudadana allegada al Ministerio, por parte de la Contraloría Colegiada Departamental, así como el objetivo de tomar registro si las obras de reparación fueron subsanadas en su totalidad y cuáles son los respectivos avances dentro de la última actuación de la sexta prórroga y tercera modificación del convenio.

El objetivo principal de la visita fue verificar si las obras de reparación han sido subsanadas en su totalidad y establecer el estado actual de avance del proyecto, en el marco de la más reciente actuación correspondiente a la **sexta prórroga** y **tercera modificación del convenio**.

Del recorrido de obra, surgieron las siguientes observaciones:

**CANCHA SINTETICA:**

Se evidencia que la grama sintética continúa presentando deficiencias en el proceso de instalación, así como en el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la norma FIFA. Esta situación se presenta debido a que aún se encuentran zonas del tapete en proceso de instalación.
Según lo informado por el contratista de obra y confirmado por la supervisión técnica del municipio, parte del material ya instalado fue objeto de hurto, lo que ha afectado el desarrollo normal de la ejecución y contribuye a las inconsistencias observadas en el terreno.

Respecto al cerramiento contra impacto no se encuentra desmontado para reparación ni terminado y no se ejecuta el cambio de la malla eslabonada, tal y como lo indica el Perito.

**GRADERIAS:**

Se continúa presentando irregularidad en las longitudes de las huellas, así como en las alturas de las contrahuellas; adicionalmente no se encuentran completamente terminadas.

No se atienden las observaciones realizadas por el perito en la zona.

**ZONA DE SERVICIOS (Cafetería; Sala Comunitaria; Baterías Sanitarias):**

De acuerdo con el dictamen pericial presentado por el ingeniero Óscar Alonso Agudelo, en el marco del **Contrato PMC Consultoría No. 001 de 2024**, se logró evidenciar la intervención en los elementos estructurales que fueron objeto de observaciones señaladas previamente por el perito.

En particular, se constató que los muros internos y externos fueron construidos con bloques de cemento, reforzados verticalmente mediante dovelas y rellenos con mortero tipo grouting. Asimismo, se observó que se ha levantado en su totalidad la estructura de los muros correspondientes a esta zona.

En este sentido, la supervisión del municipio deberá remitir la documentación técnica que respalde la calidad del material utilizado en la intervención, incluyendo certificaciones, resultados de ensayos de laboratorio, entre otros, que permitan garantizar la idoneidad de los trabajos realizados, especialmente en las columnas que presentaban una sobre fundición de concreto a una altura aproximada de 2,00 metros. Hasta la fecha, no se ha evidenciado la reparación de dicho elemento estructural conforme a las observaciones emitidas por el perito.

**Avance de obra e implementación de servicios:**

Por otra parte, se evidencian avances en la instalación de ventanería en el área correspondiente a la sala comunitaria. De igual manera, se ha dado inicio a la construcción del mesón, la instalación del platero con grifería, y se observa progreso en las actividades de enchape.

En lo que respecta al área de baños, se ha verificado la instalación de divisiones, lavamanos, muebles sanitarios y accesorios. No obstante, permanecen pendientes los remates del enchape, tales como la aplicación de boquilla y algunos detalles de pintura. Adicionalmente, la supervisión del municipio informó que se encuentra en trámite la adquisición del contador de agua ante la entidad prestadora del servicio de acueducto, con el fin de habilitar el suministro de agua potable en las zonas intervenidas.

En cuanto a las obras eléctricas, no se evidencian avances a la fecha. Según lo manifestado por el representante legal del contrato de obra (Consorcio Sacúdete Balboa 2022), se ha presentado un informe solicitando la modificación de algunos ítems del proyecto, incluyendo el correspondiente a la conexión eléctrica. Sin embargo, hasta el momento, no se ha recibido una respuesta oficial por parte de la interventoría del proyecto (Consorcio Interventoría Balboa 2022).
En este contexto, la administración municipal adelanta las gestiones pertinentes con el propósito de garantizar una articulación oportuna entre las partes involucradas y así asegurar la continuidad y cumplimiento de las actividades proyectadas.

**AUDITORIO:**

Se evidencia que se encuentran restaurados los elementos estructurales que fueron objeto de demolición en el Dictamen Pericial. En cuanto a la cubierta, aun no se encuentra instalada, sin embargo, el contratista de obra y representante legal del consorcio, Eduardo Cifuentes, afirma que la cubierta está en proceso de fabricación.

Por otra parte, se deberán realizar las correcciones correspondientes a las bancas construidas en la zona del auditorio, toda vez que, se han identificado incongruencias con respecto a los diseños iniciales, tanto en su disposición como en los detalles de su elaboración (bancas tipo M-31). En tal sentido, será necesario ajustar la ejecución de estos elementos conforme a las especificaciones técnicas aprobadas.

**Zonas de Urbanismo y paisajismo:**

**GYM Vital:**

Se verifica la instalación de cuatro módulos debidamente anclados a la placa de contrapiso. No obstante, permanece pendiente la instalación del adoquín perimetral correspondiente a esta zona.

**Juegos infantiles:**

El contratista de obra y representante legal del consorcio, señor Eduardo Cifuentes, informó que los juegos infantiles aún no han sido despachados, debido a que la interventoría del proyecto no ha emitido un pronunciamiento frente al informe técnico previamente remitido por el contratista. Dicho informe detalla las especificaciones y características de los juegos disponibles en el mercado, y requiere ser revisado, aprobado o desaprobado tanto por la interventoría como por la supervisión del municipio, con el fin de garantizar su conformidad con los requerimientos establecidos en el proyecto.

**Áreas de circulación:**

Se evidencia la instalación de material para dar inicio a la instalación del adoquinado en las áreas referenciadas; sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por el representante legal del consorcio sacúdete Balboa 2022, el señor Eduardo Cifuentes, el formato del adoquín es objeto de revisión, aprobación o desaprobación tanto por la interventoría como por la supervisión del municipio, con el fin de garantizar su conformidad con los requerimientos establecidos en el proyecto.

En términos generales, el proyecto presenta un atraso técnico en la ejecución de las actividades, así como en el ajuste de los informes de interventoría y el acta parcial. No se logra establecer con precisión el porcentaje de ejecución, debido a la falta de claridad sobre el avance de las obras de reparación y las obras de ejecución general del proyecto. Se recomienda realizar una inspección detallada, tanto documental como técnica, del proyecto. En caso de no encontrar justificados y soportados los avances reportados, o de identificar menores cantidades ejecutadas frente a las indicadas en la última Acta de Cobro, **se deberá tomar las debidas acciones correspondientes en materia contractual y sancionatoria, solicitando el acompañamiento de los órganos de control como medida preventiva.**

Así las cosas, durante el recorrido de la obra, la supervisión por parte del Ministerio del Interior observó que continúan las deficiencias reportadas en el Dictamen Pericial. Se recomienda que la supervisión del municipio realice un seguimiento y revisión detallada con el propósito de obtener un concepto sobre el cumplimiento de la norma NSR-10, al momento de ejecutar las respectivas obras de reparación entregadas por la interventoría de obra (se adjunta registro fotográfico).

2. Estado contractual del convenio:

Como se mencionó previamente, el convenio cuenta con un plazo de ejecución hasta el **30 de septiembre de 2025**. No obstante, el municipio ha presentado, a la fecha, un informe mensual de interventoría en el cual se avala un **23% de avance** al **16 de noviembre de 2024**, así como informes semanales hasta el **15 de enero de 2025**, en los que se reporta un avance del **57%**. Este último porcentaje no resulta claro para esta supervisión, dado que no se encuentra debidamente sustentado con evidencia física ni documental suficiente.
En consecuencia, se recomienda a la supervisión del municipio realizar una revisión exhaustiva de la información remitida al Ministerio del Interior, contrastando los reportes con el producto físico entregado y las actas correspondientes a la contratación derivada.
Cabe señalar que el último porcentaje oficial reportado por el municipio, correspondiente al mes de **diciembre de 2024**, fue del **55%**. Este valor, no tiene congruencia con el reportado por la interventoría en los informes semanales. Así mismo, al compararse con el cronograma del convenio al mes de **mayo de 2025** se debería contar con un porcentaje de ejecución del 73.64% **lo que representa una desviación negativa del 18.64%, lo cual evidencia un retraso significativo en la ejecución del convenio.**

En consecuencia, la Entidad Territorial manifiesta que los retrasos presentados en la ejecución de la obra obedecen, principalmente, a las condiciones climáticas adversas, las cuales han generado afectaciones en la malla vial, así como a las acciones administrativas de carácter sancionatorio que actualmente se adelantan por parte de la administración municipal. Estas circunstancias han limitado significativamente la continuidad y normal desarrollo de los trabajos programados.

El avance del proyecto y la superación de los retrasos estarán sujetos al cumplimiento de los compromisos pactados entre las partes, según lo establecido en la presente acta.

**Conclusiones**

- A la fecha el convenio presenta un atraso al cronograma, teniendo en cuenta que la fecha de finalización es el próximo 30 de septiembre de 2025 y a la fecha se deberían estar adelantando actividades de estructura (cubierta) juegos infantiles y finalización de obra y certificaciones. No obstante, el avance físico de la obra es inferior a lo contemplado, por lo que se puede presentar un riesgo de vencimiento del plazo contractual sin el cumplimiento del 100% por parte del Municipio de Balboa – Risaralda, de las obligaciones contractuales del convenio en el marco de la sexta prórroga del convenio.

- El contratista de interventoría no asiste a las reuniones de seguimiento programadas por la supervisión por parte del Ministerio del Interior, asumiendo así los compromisos que aquí se pacten en la presente visita.

- De acuerdo con los compromisos establecidos en las mesas de seguimiento y control por parte de los respectivos entes de control, la interventoría del proyecto deberá entregar los respectivos informes mensuales y semanales de la ejecución del proyecto en aras de poder entregar un porcentaje de ejecución física y financiera real de acuerdo a lo ejecutado en obra.

- Se evidencian para algunos ítems del proyecto, posible cambio en las especificaciones técnicas del presupuesto, menor cantidad ejecutada o variaciones por actas de mayores y mejores cantidades. Estos ítems deberán ser revisados por la supervisión por parte del municipio y en caso de encontrar inconsistencias frente a lo ejecutado, se deberá informar al Ministerio del Interior las acciones a tomar para subsanar dichas observaciones y garantizar que, cualquier pago injustificado al contratista pueda comprometer un daño al patrimonio o comprometer la calidad técnica de la obra, especialmente por temas de posventa y estabilidad de esta.

- Se recomienda al municipio no aceptar modificatorios en obra hasta la finalización del proyecto, especialmente en materia de especificaciones técnicas y cantidades, ya que, de acuerdo con la naturaleza del contrato, el constructor es quien realizó los estudios y diseños del proyecto, y es responsabilidad de la administración municipal en su calidad de supervisor, garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cantidades de obra pactadas.

- Se le recuerda al municipio de Balboa – Risaralda que, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, se debe realizar la instalación de los juegos infantiles en el área prevista, utilizando grama sintética paisajística en la zona de juegos. Se deben garantizar los parámetros establecidos, incluyendo la garantía de los juegos infantiles conforme a la NORMA UNE 1176 (SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO), ISO 901 (REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD), NTC 5600 (EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS DE JUEGO) y la NTC-5176 (ATENUACIÓN DEL IMPACTO DE SISTEMAS DE SUPERFICIES POR DEBAJO Y ALREDEDOR DE EQUIPOS PARA PARQUES INFANTILES).

**Documentos entregados en la visita** (En caso de recibir documentación en la visita)

| | |
|---|---|
| 1. | Informes financieros del mes de noviembre 2024, enero 2025, febrero 2025, marzo 2025, abril 2025 con sus correspondientes extractos bancarios, comprobantes de egreso y órdenes de pago. |
| 2. | Actas de suspensión a la Contratación Derivada. |
| 3. | Entrega de estudios y diseños aprobados por el Ministerio del Interior de manera digital (detalles estructurales) |
| 4. | Designación a la supervisión del municipio del Ing. Mick Mael Baez |

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE** | **ACCIONES** | **FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO** |
| Municipio de Balboa – Risaralda – Consorcio interventoría Balboa 2022 | Se deberán entregar los informes semanales y mensuales de interventoría acuerdo a la ejecución real del proyecto, dado que se deberá dar claridad sobre el porcentaje de ejecución real del proyecto. | 30/05/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| Municipio de Balboa - Risaralda | Entrega de los informes de supervision del municipio correspondientes a los mese de noviembre de 2024, enero 2025, febrero 2025, marzo 2025, abril 2025.<br>El consorcio interventoría Balboa 2022 entregara junto con los informes los resultados de laboratorio para los materiales instalados en el proyecto y garantizar la calidad de los materiales instalados. | 30/05/2025 |
| Municipio de Balboa - Risaralda | Culminación obras de reparación de acuerdo a lo entregado en el Dictamen Pericial. | 30/05/2025 |
| Municipio de Balboa - Risaralda | Informar a la supervisión del ministerio del interior las acciones administrativas que se lleven a cabo frente a la contratación derivada de acuerdo a lo informado en la visita técnica. | 30/05/2025 |
| Municipio de Balboa - Risaralda | Dar estricto cumplimiento a los compromisos pactados en las mesas de seguimiento permanente a la Contraloria General de la Republica. | INMEDIATO |
| Municipio de Balboa - Risaralda | Dar estricto cumplimiento a los compromisos pactados en las mesas de seguimiento permanente convocados por el Grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental Colegiada Risaralda de la Contraloría General de la República, **en acompañamiento a la veeduría ciudadana.** | INMEDIATO |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO (Ver anexo 1- parte integral de esta acta)**

| **FIRMA DE ASISTENTES** | |
|---|---|
| *Por parte de:* ***MINISTERIO DEL INTERIOR***<br><br>**Nombre y firma: Laura Lorena Murillo Valles**<br>Cargo: Apoyo a la supervisión de convenios - SPS<br>Email: laura.murillo@mininterior.gov.co<br>Celular: 3173784424 | *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA***<br><br>**Nombre y firma: José Ernesto Miranda Márquez**<br>Cargo: Alcalde municipio de Balboa - Risaralda<br>Email: alcalde@balboa-risaralda.gov.co<br>despacho@balboa-risaralda.gov.co<br>Celular:314 7889515 |
| | *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA***<br><br>**Nombre y firma: Mick Mael Báez Rojas**<br>Cargo: director de obras de infraestructura municipio de Balboa - Risaralda<br>Email: obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co<br>Celular: 320 9735331 |
| | *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA***<br><br>**Nombre y firma: Francy Eliana Muñoz González**<br>Cargo: secretaria de planeación municipio de Balboa - Risaralda<br>Email: obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co<br>Celular: 320 9735331 |

| | |
|---|---|
| | *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA***<br><br>**Nombre y firma: Adriana Patricia Uribe Gallego**<br>Cargo: apoyo a la supervisión municipio de Balboa - Risaralda<br>Email: adriuribegalle76@gmail.com<br>Celular: 315 2962832 |
| | *Por parte de:* ***MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA***<br><br>**Nombre y firma: Eduardo Cifuentes Hurtado**<br>Cargo: R/L Consorcio sacúdete Balboa 2022 CO 001 de 2022<br>Email: gerenciaecolaqua@gmail.com<br>consorciosacudetebalboa@gmail.com<br>Celular: 316 5221411 |

**Bajo la gravedad del juramento, el MUNICIPIO certificaque los documentos en medio físico y magnético anexos son auténticos y la información es veraz y asume todas las responsabilidades de índole fiscal, penal y disciplinaria, en el evento de demostrarse que la información o parte de ella o de los estudios, no corresponden a la realidad.**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO Anexo 1.**
Mínimo 6 fotos(Fotos de: Avance total de la obra)


















23 may 2025 11:21:32 a. m.
#Sacudete


23 may 2025 11:21:22 a. m.
4°52'52"N 75°58'33"W
#Sacudete


23 may 2025 11:21:40 a. m.
4°52'52"N 75°58'33"W
#Sacudete







| | |
|---|---|
|  |  |

**FIRMAS DE LAS PARTES (Ver anexo 2- parte integral de esta acta, se adjunta listado de assistência).**

| Interior | PROCESO | PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES | VERSIÓN | 08 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO | LISTA DE ASISTENTES | PÁGINA | 1 de 2 |
| | | | FECHA VIGENCIA | 09/09/2024 |

Tema: Visita de seguimiento al convenio 2001-21 - Proyecto Sacudete al parque tipo 1.

Responsable u organizador: Laura Lorena Murillo Valles. Dependencia: Subdirección de proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Ciudad: Pereira - Risaralda - Balboa Lugar y/o enlace: Balboa - Risaralda Vereda Tambores. ☒ Presencial ☐ Virtual

Tipo ☐ Comité ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál? _____

| Fecha | | | Hora inicial | |
|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | | 8:00 am |
| 23 | 05 | 2025 | Hora final | 7:00 pm |

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S). **Pertenencia Étnica (PE):** Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

| Nº | NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) | No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | EDAD | SN | PD | PE | ¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI | NO | PN | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO / ROL | CORREO ELECTRONICO | TELÉFONO / EXTENSIÓN | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Ernesto Miranda | 10198172 | | | | | | | | Alcaldia | Alcalde. | Ernesmira4@gmail.com | 3147889515 | |
| 2 | Paulo Roberto Alfonso R. | 1094959010 | | | | | | | | Interv. | Rep. Interv. | Paulo roGORY@gmail.com | 3004203210 | |
| 3 | Eduardo A. Ufuente A | 10588353 | | | | | | | | RL Lonja | Rep. Legal | gerencia.ecologia@gmail.com | 3165221411 | |
| 4 | Adriana Patricia Ortiz Gallego | 42122519 | | | | | | | | Alcaldia | contratista | adrianagallego716@gmail.com | 3152962932 | |
| 5 | Eliana Muñoz Gonzalez | 1090148762 | | | | | | | | Alcaldia | Sec. Planación | planacion@balboa-risaralda.gov.co | 3234168135 | |
| 6 | Mick H. Baez | 5046478 | | | | | | | | Alcaldía | Dir obras | obras públicas@balboa-risaralda.gov.co | 3209735331 | |
| 7 | Laura Lorena Murillo V. | 1061691854 | | | | | | | | Apoy Mininterior | Apoyo a la Supervisión | laura.murillo@mininterior.gov.co | 317 3784924 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Interior | PROCESO | PLANEACION, DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y COMUNICACIONES | VERSION | 1 |
| | | | PAGINA | 1 de 1 |
| | FORMATO | LISTA DE ASISTENTES | FECHA VIGENCIA | 30/07/2021 |

**1. RESUMEN DE LA REUNION:** *(Aspectos relevantes)*

Se realiza reunión de seguimiento al Parque [illegible] se verifica [illegible]
Ingresa al Parque [illegible] se encuentra [illegible]
Area total 4.89 m x 15.39 = 3.21 m
Area total 2.94 m x 11.78
Cocina: 6.45 m x 3.64 m
Cabaña: 4 x 3.93
Evidencia Inhalacion de mesa 60 x 50 [illegible]
Cocina 2 ax 16.10 m
Gym Vida 4 ax 11.10
Area Lavadero 12 x 0.80 m
Vestidor 9.15 x 1.20 m
Se debe verificar medidas en area de Lavadero [illegible]
Se debe verificar se encuentra en [illegible]
Cargar detalles en graficos

**2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES**

1. Se debe aperturar a la supervision del interventor [illegible]
2. Los informes de supervision se deben entregar el dia 28 de Mayo de 2021
3. El apoyo a la supervision sugiere el cumplimiento general a detalle de proceso
4.

- *En el item 2 Observaciones y/o conclusiones generales", se sugiere incluir el listado de compromisos, sus responsables y fechas de cumplimiento*
-

**Elaboró resumen y conclusiones**

Firma
Nombres Laura Teresa Nieto Ibañez
Cargo o Rol Apoyo a la supervision
Area Supervision de Proyecto para la Seguridad y convivencia Ciudadana

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE DE 2024**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | | |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 598.228.160,00** | **$ 56.100.050,00** | **$ 654.328.210,00** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 01/11/2024 | $ 183.185,00 |
| 05/11/2024 | $ 45.802,00 |
| 06/11/2024 | $ 45.805,00 |
| 07/11/2024 | $ 44.488,00 |
| 08/11/2024 | $ 160.371,00 |
| 12/11/2024 | $ 40.098,00 |
| 13/11/2024 | $ 40.100,00 |
| 14/11/2024 | $ 40.103,00 |
| 15/11/2024 | $ 120.321,00 |
| 18/11/2024 | $ 40.111,00 |
| 19/11/2024 | $ 40.113,00 |
| 20/11/2024 | $ 40.116,00 |
| 21/11/2024 | $ 40.118,00 |
| 22/11/2024 | $ 120.367,00 |
| 25/11/2024 | $ 40.127,00 |
| 26/11/2024 | $ 40.129,00 |
| 27/11/2024 | $ 29.178,00 |
| 28/11/2024 | $ 29.180,00 |
| 29/11/2024 | $ 87.549,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 1.227.261,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 654.328.210,00** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 18.544.233,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 19.962.566,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 1.227.261,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 414.514.910,59** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #22"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de octubre $1.067.615.859,59, menos los pagos $225.015.328 para un saldo a septiembre de $842.600.531,59**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO DICIEMBRE DE 2024**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | | | | | | | |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | N/A | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 796.856.044,61** | **$ 56.100.050,00** | **$ 852.956.094,61** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 02/12/2024 | $ 29.186,00 |
| 03/12/2024 | $ 29.188,00 |
| 04/12/2024 | $ 29.189,00 |
| 05/12/2024 | $ 29.191,00 |
| 06/12/2024 | $ 72.730,00 |
| 09/12/2024 | $ 24.246,00 |
| 10/12/2024 | $ 24.247,00 |
| 11/12/2024 | $ 24.248,00 |
| 12/12/2024 | $ 24.249,00 |
| 13/12/2024 | $ 72.755,00 |
| 16/12/2024 | $ 24.254,00 |
| 17/12/2024 | $ 24.255,00 |
| 18/12/2024 | $ 24.256,00 |
| 19/12/2024 | $ 18.247,00 |
| 20/12/2024 | $ 54.747,00 |
| 23/12/2024 | $ 18.251,00 |
| 24/12/2024 | $ 36.504,00 |
| 26/12/2024 | $ 18.253,00 |
| 27/12/2024 | $ 54.765,00 |
| 30/12/2024 | $ 49.096,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 681.857,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 796.856.044,61** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 20.644.423,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 20.644.423,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 681.857,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 274.087.265,98** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de Diciembre $1.070.943.310,59, menos los pagos $796,856,044,61 para un saldo a Diciembre de $274,087,265,98**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO ABRIL DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 272 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 5.022.956,00 | N/A | $ 5.022.956,00 |
| | OBRA ACTA 6 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 33.731.130,24 | N/A | $ 33.731.130,24 |
| | DESCUENTOS DE OP 679 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 7.788.170,00 | N/A | $ 7.788.170,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 866.728.243,85** | **$ 56.100.050,00** | **$ 922.828.293,85** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 01/04/2025 | $ 13.239,00 |
| 02/04/2025 | $ 13.240,00 |
| 03/04/2025 | $ 13.240,00 |
| 04/04/2025 | $ 39.725,00 |
| 07/04/2025 | $ 13.243,00 |
| 08/04/2025 | $ 13.244,00 |
| 09/04/2025 | $ 13.244,00 |
| 10/04/2025 | $ 13.245,00 |
| 11/04/2025 | $ 39.739,00 |
| 14/04/2025 | $ 13.247,00 |
| 15/04/2025 | $ 11.599,00 |
| 16/04/2025 | $ 58.006,00 |
| 21/04/2025 | $ 11.603,00 |
| 22/04/2025 | $ 11.603,00 |
| 23/04/2025 | $ 11.604,00 |
| 24/04/2025 | $ 11.605,00 |
| 25/04/2025 | $ 34.817,00 |
| 28/04/2025 | $ 11.607,00 |
| 29/04/2025 | $ 11.607,00 |
| 30/04/2025 | $ 23.216,00 |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 382.673,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 866.728.243,85** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 22.329.338,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2025** | $ 515.111,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2025** | $ 402.988,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2025** | $ 384.143,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 21.946.665,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 382.673,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 205.899.981,74** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de ABRIL $1.072.628.225.59, menos los pagos $866.728.243,85 para un saldo a ABRIL de $205.899.981,74**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO ABRIL DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 272 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 5.022.956,00 | N/A | $ 5.022.956,00 |
| | OBRA ACTA 6 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 33.731.130,24 | N/A | $ 33.731.130,24 |
| | DESCUENTOS DE OP 679 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 7.788.170,00 | N/A | $ 7.788.170,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 866.728.243,85** | **$ 56.100.050,00** | **$ 922.828.293,85** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 01/04/2025 | $ 13.239,00 |
| 02/04/2025 | $ 13.240,00 |
| 03/04/2025 | $ 13.240,00 |
| 04/04/2025 | $ 39.725,00 |
| 07/04/2025 | $ 13.243,00 |
| 08/04/2025 | $ 13.244,00 |
| 09/04/2025 | $ 13.244,00 |
| 10/04/2025 | $ 13.245,00 |
| 11/04/2025 | $ 39.739,00 |
| 14/04/2025 | $ 13.247,00 |
| 15/04/2025 | $ 11.599,00 |
| 16/04/2025 | $ 58.006,00 |
| 21/04/2025 | $ 11.603,00 |
| 22/04/2025 | $ 11.603,00 |
| 23/04/2025 | $ 11.604,00 |
| 24/04/2025 | $ 11.605,00 |
| 25/04/2025 | $ 34.817,00 |
| 28/04/2025 | $ 11.607,00 |
| 29/04/2025 | $ 11.607,00 |
| 30/04/2025 | $ 23.216,00 |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 382.673,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No.32030000026-3**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| 04/04/2025 | $ 30.914.911,00 | 1387874903 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 30.914.911,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 866.728.243,85** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 22.329.338,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2025** | $ 515.111,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2025** | $ 402.988,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2025** | $ 384.143,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 21.946.665,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 382.673,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 205.899.981,74** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de ABRIL $1.072.628.225.59, menos los pagos $866.728.243,85 para un saldo a ABRIL de $205.899.981,74**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO ENERO DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | | | | | | | |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | N/A | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 796.856.044,61** | **$ 56.100.050,00** | **$ 852.956.094,61** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 02/01/2025 | $ 16.367,00 |
| 03/01/2025 | $ 65.476,00 |
| 07/01/2025 | $ 16.371,00 |
| 08/01/2025 | $ 16.372,00 |
| 09/01/2025 | $ 16.373,00 |
| 10/01/2025 | $ 49.122,00 |
| 13/01/2025 | $ 16.376,00 |
| 14/01/2025 | $ 16.377,00 |
| 15/01/2025 | $ 16.377,00 |
| 16/01/2025 | $ 16.378,00 |
| 17/01/2025 | $ 49.139,00 |
| 20/01/2025 | $ 16.381,00 |
| 21/01/2025 | $ 16.382,00 |
| 22/01/2025 | $ 16.383,00 |
| 23/01/2025 | $ 16.384,00 |
| 24/01/2025 | $ 49.156,00 |
| 27/01/2025 | $ 16.387,00 |
| 28/01/2025 | $ 16.388,00 |
| 29/01/2025 | $ 14.583,00 |
| 30/01/2025 | $ 14.584,00 |
| 31/01/2025 | $ 43.755,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 515.111,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 796.856.044,61** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 21.159.534,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 20.644.423,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 515.111,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 274.602.376,98** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de Enero $1.071.291,675,59, menos los pagos $796,856,044,61 para un saldo a enero de $274,435,630,98**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO FEBRERO DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | | | | | | | |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | N/A | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 820.185.987,61** | **$ 56.100.050,00** | **$ 876.286.037,61** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 03/02/2025 | $ 14.586,00 |
| 04/02/2025 | $ 14.587,00 |
| 05/02/2025 | $ 14.588,00 |
| 06/02/2025 | $ 14.589,00 |
| 07/02/2025 | $ 43.770,00 |
| 10/02/2025 | $ 14.591,00 |
| 11/02/2025 | $ 14.592,00 |
| 12/02/2025 | $ 14.593,00 |
| 13/02/2025 | $ 14.594,00 |
| 14/02/2025 | $ 43.785,00 |
| 17/02/2025 | $ 14.596,00 |
| 18/02/2025 | $ 14.597,00 |
| 19/02/2025 | $ 14.598,00 |
| 20/02/2025 | $ 14.599,00 |
| 21/02/2025 | $ 43.800,00 |
| 24/02/2025 | $ 14.601,00 |
| 25/02/2025 | $ 14.602,00 |
| 26/02/2025 | $ 13.463,00 |
| 27/02/2025 | $ 13.463,00 |
| 28/02/2025 | $ 40.394,00 |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 402.988,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 820.185.987,61** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 21.562.522,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2025** | $ 515.111,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 21.159.534,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 402.988,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 251.675.421,98** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de Febrero $1.071.861.409,59, menos los pagos $820.185.987,61 para un saldo a Febrero de $251.675.421,98**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO DICIEMBRE DE 2024**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 | | |
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | | | | | | | |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | N/A | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 796.856.044,61** | **$ 56.100.050,00** | **$ 852.956.094,61** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 02/12/2024 | $ 29.186,00 |
| 03/12/2024 | $ 29.188,00 |
| 04/12/2024 | $ 29.189,00 |
| 05/12/2024 | $ 29.191,00 |
| 06/12/2024 | $ 72.730,00 |
| 09/12/2024 | $ 24.246,00 |
| 10/12/2024 | $ 24.247,00 |
| 11/12/2024 | $ 24.248,00 |
| 12/12/2024 | $ 24.249,00 |
| 13/12/2024 | $ 72.755,00 |
| 16/12/2024 | $ 24.254,00 |
| 17/12/2024 | $ 24.255,00 |
| 18/12/2024 | $ 24.256,00 |
| 19/12/2024 | $ 18.247,00 |
| 20/12/2024 | $ 54.747,00 |
| 23/12/2024 | $ 18.251,00 |
| 24/12/2024 | $ 36.504,00 |
| 26/12/2024 | $ 18.253,00 |
| 27/12/2024 | $ 54.765,00 |
| 30/12/2024 | $ 49.096,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 681.857,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 796.856.044,61** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 20.644.423,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 20.644.423,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 681.857,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 274.087.265,98** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de Diciembre $1.070.943.310,59, menos los pagos $796,856,044,61 para un saldo a Diciembre de $274,087,265,98**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado
Depósito seguro de Fogafin
www.fogafin.gov.co

| | |
|---|---|
| NOMBRE | MUNICIPIO DE BALBOA , |
| DIRECCIÓN | CL 8 6 44 |
| CIUDAD | RISARALDA, BALBOA |

| MES | FEBRERO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 298.427.274,98 | SALDO ACTUAL | 275.500.319,98 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 402.988,00 | PROMEDIO MES | 296.115.973,23 |
| TOTAL CARGOS | 1 | 23.329.943,00 | INTERESES | 402.988,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.586,00 | 298.441.860,98 |
| 04/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.587,00 | 298.456.447,98 |
| 05/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.588,00 | 298.471.035,98 |
| 06/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.589,00 | 298.485.624,98 |
| 07/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.770,00 | 298.529.394,98 |
| 10/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.591,00 | 298.543.985,98 |
| 11/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.592,00 | 298.558.577,98 |
| 12/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.593,00 | 298.573.170,98 |
| 13/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.594,00 | 298.587.764,98 |
| 14/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.785,00 | 298.631.549,98 |
| 17/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.596,00 | 298.646.145,98 |
| 18/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.597,00 | 298.660.742,98 |
| 19/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.598,00 | 298.675.340,98 |
| 20/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.599,00 | 298.689.939,98 |
| 21/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.800,00 | 298.733.739,98 |
| 24/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.601,00 | 298.748.340,98 |
| 25/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.602,00 | 298.762.942,98 |
| 26/02 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -23.329.943,00 | 275.432.999,98 |
| 26/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.463,00 | 275.446.462,98 |
| 27/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.463,00 | 275.459.925,98 |
| 28/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.394,00 | 275.500.319,98 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | ABRIL | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 270.861.506,98 | SALDO ACTUAL | 237.513.049,74 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 382.673,00 | PROMEDIO MES | 253.077.462,85 |
| TOTAL CARGOS | 1 | 33.731.130,24 | INTERESES | 382.673,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.239,00 | 270.874.745,98 |
| 02/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.240,00 | 270.887.985,98 |
| 03/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.240,00 | 270.901.225,98 |
| 04/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.725,00 | 270.940.950,98 |
| 07/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.243,00 | 270.954.193,98 |
| 08/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.244,00 | 270.967.437,98 |
| 09/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.244,00 | 270.980.681,98 |
| 10/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.245,00 | 270.993.926,98 |
| 11/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.739,00 | 271.033.665,98 |
| 14/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.247,00 | 271.046.912,98 |
| 15/04 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -33.731.130,24 | 237.315.782,74 |
| 15/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.599,00 | 237.327.381,74 |
| 16/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 58.006,00 | 237.385.387,74 |
| 21/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.603,00 | 237.396.990,74 |
| 22/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.603,00 | 237.408.593,74 |
| 23/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.604,00 | 237.420.197,74 |
| 24/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.605,00 | 237.431.802,74 |
| 25/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 34.817,00 | 237.466.619,74 |
| 28/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.607,00 | 237.478.226,74 |
| 29/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.607,00 | 237.489.833,74 |
| 30/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 23.216,00 | 237.513.049,74 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | NOVIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 844.018.864,59 | SALDO ACTUAL | 537.942.977,59 |
| TOTAL ABONOS | 19 | 1.227.261,00 | PROMEDIO MES | 736.141.605,66 |
| TOTAL CARGOS | 8 | 307.303.148,00 | INTERESES | 1.227.261,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 183.185,00 | 844.202.049,59 |
| 05/11 | NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 45.802,00 | 844.247.851,59 |
| 06/11 | NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 45.805,00 | 844.293.656,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -6.061.272,00 | 838.232.384,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -1.515.318,00 | 836.717.066,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -7.576.590,00 | 829.140.476,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.110.902,00 | 826.029.574,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -2.272.977,00 | 823.756.597,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.788.295,00 | 819.968.302,59 |
| 07/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 44.488,00 | 820.012.790,59 |
| 08/11 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -81.106.614,00 | 738.906.176,59 |
| 08/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 160.371,00 | 739.066.547,59 |
| 12/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.098,00 | 739.106.645,59 |
| 13/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.100,00 | 739.146.745,59 |
| 14/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.103,00 | 739.186.848,59 |
| 15/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 120.321,00 | 739.307.169,59 |
| 18/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.111,00 | 739.347.280,59 |
| 19/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.113,00 | 739.387.393,59 |
| 20/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.116,00 | 739.427.509,59 |
| 21/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.118,00 | 739.467.627,59 |
| 22/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 120.367,00 | 739.587.994,59 |
| 25/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.127,00 | 739.628.121,59 |
| 26/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.129,00 | 739.668.250,59 |
| 27/11 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -201.871.180,00 | 537.797.070,59 |
| 27/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.178,00 | 537.826.248,59 |
| 28/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.180,00 | 537.855.428,59 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 87.549,00 | 537.942.977,59 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | ENERO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 334.855.154,98 | SALDO ACTUAL | 298.427.274,98 |
| TOTAL ABONOS | 21 | 515.111,00 | PROMEDIO MES | 331.534.162,82 |
| TOTAL CARGOS | 6 | 36.942.991,00 | INTERESES | 515.111,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.367,00 | 334.871.521,98 |
| 03/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 65.476,00 | 334.936.997,98 |
| 07/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.371,00 | 334.953.368,98 |
| 08/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.372,00 | 334.969.740,98 |
| 09/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.373,00 | 334.986.113,98 |
| 10/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.122,00 | 335.035.235,98 |
| 13/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.376,00 | 335.051.611,98 |
| 14/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.377,00 | 335.067.988,98 |
| 15/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.377,00 | 335.084.365,98 |
| 16/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.378,00 | 335.100.743,98 |
| 17/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.139,00 | 335.149.882,98 |
| 20/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.381,00 | 335.166.263,98 |
| 21/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.382,00 | 335.182.645,98 |
| 22/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.383,00 | 335.199.028,98 |
| 23/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.384,00 | 335.215.412,98 |
| 24/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.156,00 | 335.264.568,98 |
| 27/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.387,00 | 335.280.955,98 |
| 28/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.388,00 | 335.297.343,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -8.533.758,00 | 326.763.585,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -2.026.768,00 | 324.736.817,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -9.193.744,00 | 315.543.073,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -8.654.962,00 | 306.888.111,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.200.160,00 | 303.687.951,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -5.333.599,00 | 298.354.352,98 |
| 29/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.583,00 | 298.368.935,98 |
| 30/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.584,00 | 298.383.519,98 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.755,00 | 298.427.274,98 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | MARZO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 275.500.319,98 | SALDO ACTUAL | 270.861.506,98 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 384.143,00 | PROMEDIO MES | 271.317.937,33 |
| TOTAL CARGOS | 6 | 5.022.956,00 | INTERESES | 384.143,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.466,00 | 275.513.785,98 |
| 04/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.466,00 | 275.527.251,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -1.252.514,00 | 274.274.737,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -297.472,00 | 273.977.265,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -1.565.642,00 | 272.411.623,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -654.814,00 | 271.756.809,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -469.693,00 | 271.287.116,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -782.821,00 | 270.504.295,98 |
| 05/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.222,00 | 270.517.517,98 |
| 06/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.222,00 | 270.530.739,98 |
| 07/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.671,00 | 270.570.410,98 |
| 10/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.225,00 | 270.583.635,98 |
| 11/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.226,00 | 270.596.861,98 |
| 12/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.226,00 | 270.610.087,98 |
| 13/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.227,00 | 270.623.314,98 |
| 14/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.684,00 | 270.662.998,98 |
| 17/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.229,00 | 270.676.227,98 |
| 18/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.230,00 | 270.689.457,98 |
| 19/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.231,00 | 270.702.688,98 |
| 20/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.231,00 | 270.715.919,98 |
| 21/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 52.932,00 | 270.768.851,98 |
| 25/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.235,00 | 270.782.086,98 |
| 26/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.235,00 | 270.795.321,98 |
| 27/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.236,00 | 270.808.557,98 |
| 28/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.711,00 | 270.848.268,98 |
| 31/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.238,00 | 270.861.506,98 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 537.942.977,59 | SALDO ACTUAL | 334.855.154,98 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 681.857,00 | PROMEDIO MES | 448.954.948,37 |
| TOTAL CARGOS | 8 | 203.769.679,61 | INTERESES | 681.857,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.186,00 | 537.972.163,59 |
| 03/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.188,00 | 538.001.351,59 |
| 04/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.189,00 | 538.030.540,59 |
| 05/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.191,00 | 538.059.731,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -10.494.174,00 | 527.565.557,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -2.492.366,00 | 525.073.191,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -13.117.718,00 | 511.955.473,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -5.486.354,00 | 506.469.119,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.935.315,00 | 502.533.804,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -6.558.859,00 | 495.974.945,59 |
| 06/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 72.730,00 | 496.047.675,59 |
| 09/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.246,00 | 496.071.921,59 |
| 10/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.247,00 | 496.096.168,59 |
| 11/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.248,00 | 496.120.416,59 |
| 12/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.249,00 | 496.144.665,59 |
| 13/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 72.755,00 | 496.217.420,59 |
| 16/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.254,00 | 496.241.674,59 |
| 17/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.255,00 | 496.265.929,59 |
| 18/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.256,00 | 496.290.185,59 |
| 19/12 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -122.969.474,00 | 373.320.711,59 |
| 19/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 18.247,00 | 373.338.958,59 |
| 20/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 54.747,00 | 373.393.705,59 |
| 23/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 18.251,00 | 373.411.956,59 |
| 24/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 36.504,00 | 373.448.460,59 |
| 26/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 18.253,00 | 373.466.713,59 |
| 27/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 54.765,00 | 373.521.478,59 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -38.715.419,61 | 334.806.058,98 |
| 30/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.096,00 | 334.855.154,98 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 G418

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## 890801143-1

## OP 3.117 COMPROBANTE DE EGRESO No. 03102

FECHA jueves, 19 diciembre, 2024 VALOR OP **150.736.669,0(** **VALOR NETO** **122.969.474,00**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 3 ANEXA.

LA SUMA DE CIENTO VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y (

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 122.969.474,00 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 122.969.474,00 | 0,00 | | | |
| | **122.969.474,00** | **122.969.474,00** | | | |

RECIBÍ

Reinel Castañeda M.

TESORERÍA

C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 03117

FECHA 2024/12/19

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE. $150.736.669,00

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 3 ANEXA.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO | | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingenieria civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 2254 | 3536 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 150.736.669,00 |

**TOTAL 150.736.669,00**

**CONTABILIDAD**

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 1.644.443,00 |
| 13058504 | 0,00 | 8.654.962,00 |
| 13058801 | 0,00 | 6.923.969,00 |
| 13058802 | 0,00 | 2.596.489,00 |
| 13110101 | 0,00 | 4.327.481,00 |
| 17100501 | 150.736.669,00 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 122.969.474,00 |
| 24362502 | 0,00 | 157.866,00 |
| 24362601 | 0,00 | 3.461.985,00 |
| **TOTAL** | **150.736.669,00** | **150.736.669,00** |

**DESCUENTOS**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TASA CULTURAL 1.5% | 2.596.489,00 |
| LEY 418/97 CONTRATO VIAS 5%_ | 8.654.962,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 157.866,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.644.443,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 6.923.969,00 |
| RETFTE CONTRATOS DE OBRA 2% | 3.461.985,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 4.327.481,00 |
| **TOTAL** | **27.767.195,00** |

**ANEXOS**

| DESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| VALOR ORDEN | **150.736.669,00** |
| DESCUENTOS | **27.767.195,00** |
| NETO A PAGAR | **122.969.474,00** |

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

MUNICIPIO DE RAUBOA RISARALDA

**VERIFICACIÓN ACTA DE COBRO No. 4** — **CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ **1.124.000.000** 10 JUNIO DE 2022

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITA | V/TOTAL | DISEÑO CANT | DISEÑO V/TOTAL | ACUMULADO CANT | ACUMULADO V/TOTAL | PRESENTE ACTA #4 CANT. EJE | PRESENTE ACTA #4 V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEM CONTRATADOS INICIALMENTE | | | | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINAR | | | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 1.200 | $ 2.769 | $ 3.322.800 | 1229,68 | $ 3.404.450 | 1.229,48 | $ 3.404.432,12 | | |
| 1.2 | CONFIGURACIÓN NIVELACIÓN TERRENO | M2 | 1.200 | $ 2.943 | $ 3.531.600 | 1229,68 | $ 3.618.450 | 1.229,48 | $ 3.618.355,64 | | |
| 2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS | | | | | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 161,0625 | $ 25.700 | $ 4.139.651 | 90,22 | $ 2.317.437 | 161,06 | $ 4.139.282,86 | | |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECANICA CAJEO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 142,3576 | $ 8.654 | $ 797.597 | 0,00 | $ - | | | | |
| 2.3 | RELLENO CON RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 44,46764 | $ 49.797 | $ 2.213.855 | 37,70 | $ 1.876.993 | 44,46 | $ 2.213.274,62 | | |
| 2.4 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO MANUALMENTE | M3 | 24,838 | $ 21.044 | $ 522.645 | 24,24 | $ 510.009 | 26,24 | $ 552.134,56 | | |
| 2.5 | BASE GRANULAR E= 10CM | M3 | 46,0788 | $ 169.733 | $ 7.821.084 | 46,08 | $ 7.824.045 | 46,1 | $ 7.832.553,77 | | |
| 3 | CONCRETOS | | | | | | | | | | |
| 3.1 | CIMENTACIONES | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SOLADO DE NIVELACION DE 2500 PSI | M2 | 84,6085 | $ 32.441 | $ 2.744.784 | 68,41 | $ 2.219.240 | 84,78 | $ 2.750.342,08 | | |
| 3.1.2 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 25,99625 | $ 513.631 | $ 13.503.495 | 15,01 | $ 7.711.381 | 26,01 | $ 13.406.979,63 | | |
| 3.1.3 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 27,587725 | $ 806.764 | $ 14.190.830 | 17,35 | $ 8.004.287 | 17,64 | $ 14.216.980,71 | | |
| 3.1.4 | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 48,935 | $ 268.570 | $ 13.142.473 | 0,00 | $ - | 49,03 | $ 13.170.304,71 | | |
| 3.2 | ESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 6,38175 | $ 210.171 | $ 1.341.552 | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - |
| 3.2.4 | VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE DE MURO (0,20x0,14m) | ML | 77,14 | $ 46.867 | $ 3.615.320 | 77,14 | $ 3.615.320 | 27,10 | $ 1.270.095,70 | 27,10 | $ 1.270.095 |
| 3.2.5 | ALFAJIAS EN CONCRETO DE 2500 PSI A= 0.25 M | ML | 15 | $ 34.398 | $ 515.947 | 1,56 | $ 53.647 | | $ - | | |
| 3.2.6 | GRADERIA CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 10CM | M2 | 22,896 | $ 55.609 | $ 1.273.224 | 0,00 | $ - | 22,90 | $ 1.273.448,10 | | |
| 3.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO | UND | 14 | $ 679.822 | $ 9.517.508 | 14,00 | $ 9.517.508 | | $ - | | |
| 3.2.8 | PLACA CUBIERTA MACIZA e=0.15m. CONCRETO 3000 PSI (Incluye impermeabilizante) | M2 | 7,488 | $ 160.797 | $ 1.203.973 | 7,49 | $ 1.203.973 | | $ - | | |
| 3.3 | ESTRUCTURA METALICA | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 4.126,93779 | $ 6.799 | $ 28.070.261 | 6.126,93 | $ 41.671.292 | 6.126,93 | $ 48.639.260,32 | 881,93 | $ 5.998.449 |
| 3.3.2 | PLATINAS PARA CUBIERTA DE TARIMA Y CERRAMIENTO EN ACERO ASTM A36 (0.6 E) | UND | 46 | $ 98.120 | $ 4.513.504 | 46,00 | $ 4.513.504 | | $ - | | $ - |
| 3.3.4 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO PARA CANCHA SINTETICA EN ESTRUCTURA METALICA INCLUYE VARILLA LISA DE 3/4 SOLDADURA E70XX Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA SEGÚN DISEÑO | M2 | 312,0 | $ 264.474 | $ 29.832.867 | 137,44 | $ 36.353.662 | 112,80 | $ 29.832.867,20 | 112,80 | $ 29.832.867 |
| 3.3.5 | CERRAMIENTO LATERAL PARA CANCHA SINTETICA EN ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE MALLA ESLABONADA SOLDADURA E70 XX Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO. | M2 | 220,05 | $ 203.229 | $ 44.719.441 | 170,33 | $ 44.719.441 | 220,05 | $ 44.719.441,45 | 220,05 | $ 44.719.441 |
| 4 | MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS | | | | | | | | | | |
| 4.1 | MURO EN BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL e=19.5 CM INCLUYE HIERRO DE 1/2 PIL CADA 1M | M2 | 259,3 | $ 169.227 | $ 43.891.616 | | | 207,44 | $ 35.101.371,09 | 207,44 | $ 35.101.371 |
| 4.2 | MURO BLOQUE ARCILLA No 5 E=0.12m | M2 | 6,712 | $ 66.120 | $ 443.737 | 2,77 | $ 183.247 | | $ - | | $ - |
| 4.3 | MEDIOS EN CONCRETO A= 60 CM H=80 M | ML | 10,95 | $ 167.247 | $ 1.831.351 | 4,50 | $ 752.511 | | $ - | | $ - |
| 4.4 | PAÑETE MUROS MORTERO 1:3 | M2 | 64,0122 | $ 24.597 | $ 1.574.468 | 51,22 | $ 1.259.618 | 51,21 | $ 1.259.624,37 | 51,21 | $ 1.259.624 |
| 4.5 | PAÑETE BAJO PLACA MORTERO 1:3 | M2 | 7,488 | $ 27.121 | $ 203.077 | 7,49 | $ 203.077 | | $ - | | $ - |
| 5 | CUBIERTA | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE BARBOSA RISARALDA

**VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 4**

**CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 1.124.000.000 10 JUNIO DE 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO PANNOT REF A- 20 DE 0.20 X0.20 COLOR GRIS INCLUYE BASE DE 3cm Y SELLO JUNTAS EN ARENA | M2 | 261.16 | $ 81.979 | $ 21.409.536 | 261.16 | $ 21.409.536 | | $ - | | |
| 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO LOSETA ALERTA DE 0.20 X0.20 COLOR COLOR ROJO, INCLUYE BASE EN ARENA Y SELLO JUNTAS | M2 | 20 | $ 97.854 | $ 1.956.880 | 20.00 | $ 1.956.880 | | $ - | | |
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO LOSETA TACTIL GUIA DE 0.20 X0.20 COLOR AMARILLO INCLUYE BASE EN ARENA Y SELLO JUNTAS | M2 | 40 | $ 87.759 | $ 3.510.360 | 40.00 | $ 3.510.360 | | $ - | | |
| 8.7 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PAISAJISMO NEW GOLDEN ALTURA DE 20MM 70 100/0.09/M2 | M2 | 3R6044 | $ 90.998 | $ 5.397.721 | 58.80 | $ 5.397.721 | | $ - | | |
| 8.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PLASTICA PARA CESPED ARTIFICIAL (SHOCK PAD) e=15mm | M2 | 0 | $ 66.622 | $ - | 0.00 | $ - | | $ - | | |
| 8.9 | GRAMA SINTETICA 1x10mm MONOFILAMENTO, CON ESPESOR MAYOR A 260 MICRONES CON NERVIO REF. | M2 | 668.788 | $ 145.750 | $ 97.459.851 | 0.00 | $ - | 668.79 | $ 97.459.851,00 | | |
| 9 | ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES | | | | | | | | | | |
| 9,1 | ESTUCO PLASTICO MURO | M2 | 5,84 | $ 31.447 | $ 183.330 | 5.84 | $ 183.330 | | $ - | | |
| 9,2 | ESTUCO PLASTICO BAJO PLACA | M2 | 7,488 | $ 31.140 | $ 233.193 | 7.49 | $ 233.193 | | $ - | | |
| 9,3 | PINTURA SOBRE MURO 2 MANOS | M2 | 5,84 | $ 28.811 | $ 168.256 | 5.84 | $ 168.256 | | $ - | | |
| 9,4 | PINTURA BAJO PLACA 2 MANOS | M2 | 7,488 | $ 38.838 | $ 290.777 | 7.49 | $ 290.777 | | $ - | | |
| 9,5 | PINTURA DE ALTO TRAFICO | M2 | 75,9336 | $ 29.150 | $ 2.213.586 | 75.94 | $ 2.213.586 | | $ - | | |
| 9,6 | PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 PESADO | M2 | 96,3008 | $ 86.018 | $ 8.283.675 | 96.30 | $ 8.283.675 | | $ - | | |
| 9,7 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA | ML | 25,6 | $ 20.677 | $ 529.331 | 25.60 | $ 529.331 | | $ - | | |
| 9,8 | ENCHAPE CERAMICA 25x35, O SIMILAR | M2 | 64,0122 | $ 78.734 | $ 5.040.612 | 64.01 | $ 5.040.612 | | $ - | | |
| 10 | MOBILIARIO | | | | | | | | | | |
| 10,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO M - 121 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | UN | 3 | $ 945.808 | $ 2.837.424 | 3.00 | $ 2.837.424 | | $ - | | |
| 10,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M-300 | UN | 1 | $ 925.808 | $ 925.808 | 1.00 | $ 925.808 | | $ - | | |
| 11 | GIMNASIO BIOSALUDABLE | | | | | | | | | | |
| 11,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO DE 0.45 X 1.20 X 1.30 M, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 4.262.802 | $ 4.262.802 | 1.00 | $ 4.262.802 | 1.00 | $ 4.262.802,00 | 1.00 | $ - |
| 11,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE PONY REMO DE 1.10 X 0.75 X 1.34 M INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 1.961.517 | $ 1.961.517 | 1.00 | $ 1.961.517 | 1.00 | $ 1.961.517,00 | 1.00 | $ - |
| 11,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE BARRAS PARALELAS DE 2.00 X 0.70 X 1.32 M INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 1.510.012 | $ 1.510.012 | 1.00 | $ 1.510.012 | 1.00 | $ 1.510.012,00 | 1.00 | $ - |
| 11,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE TWISTER DE 1.40 DE DIAMETRO X 1.10 DE ALTO INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 4.071.348 | $ 4.071.348 | 1.00 | $ 4.071.348 | 1.00 | $ 4.071.348,00 | 1.00 | $ - |
| 12 | JUEGOS INFANTILES | | | | | | | | | | |
| 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PARQUE CIO IDRD 106049 - COLUMPIO CANASTA BITOMOLDEADORA INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 17.893.200 | $ 17.893.200 | 1.00 | $ 17.893.200 | | $ - | | |
| 12,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PARQUE CIO IDRD 106052 - CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 57.623.200 | $ 57.623.200 | 1.00 | $ 57.623.200 | | $ - | | |
| 12,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PARQUE CIO IDRD 106052 - MUELLE SILLAS DOBLES INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 17.893.200 | $ 17.893.200 | 1.00 | $ 17.893.200 | | $ - | | |
| 13 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | |
| 13,1 | RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN | | | | | | | | | | |
| 13,1,1 | Instalación y cableado de red de media y baja tensión | UN | 1 | $ 786.218 | $ 786.218 | 1.00 | $ 786.218 | | $ - | | |
| 13,1,2 | Montaje de transformador monofasico de 10 kva, 7.6/13.2 kV, 120 V | UN | 1 | $ 7.726.116 | $ 7.726.116 | 1.00 | $ 7.726.116 | | $ - | | |
| 13,1,3 | Suministro e instalación de medidor bidireccional para cabecera | UN | 1 | $ 987.134 | $ 987.134 | 1.00 | $ 987.134 | | $ - | | |
| 13,1,4 | Suministro e instalación de medidor bidireccional para alumbrado público | UN | 1 | $ 894.962 | $ 894.962 | 1.00 | $ 894.962 | | $ - | | |
| 13,1,5 | Suministro e instalación de medidor trifasico para alumbrado público | UN | 1 | $ 936.914 | $ 936.914 | 1.00 | $ 936.914 | | $ - | | |

VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 4

CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.124.000.000 10 JUNIO DE 2022

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL (COSTOS directos) | | | | $ | 786.196.502 | | $ | 589.959.268 | | | | | $ - |
| | Administración (20%) | | | | $ | 57.039.700 | | $ | 216.359.854 | | | | | $ - |
| | Imprevistos (1%) | | | | $ | 7.862.885 | | $ | 5.849.593 | | | | | $ - |
| | Utilidad(4%) (Costos | | | | $ | 31.447.540 | | $ | 23.559.071 | | | | | $ - |
| | COSTOS DIRECTOS + AU (1) | | | | $ | 882.748.227 | | $ | 721.249.065 | | | | | $ - |
| | RETE | UND | 1,00 | $ 3.437.500 | $ | 3.437.500 | 1,00 | $ | 3.437.500 | | | | | |
| | RETEICA | UND | 1,00 | $ 2.437.500 | $ | 3.437.500 | 1,00 | $ | 3.437.500 | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | UND | 1,00 | $ 3.351.472 | $ | 3.351.472 | 1,00 | $ | 3.351.472 | | | | | |
| | **TOTAL COMPLEMENTARIOS** | | | | $ | 10.226.472 | | $ | 10.226.472 | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO (1) +Complementarios | | | | $ | 892.974.699 | | $ | 741.475.538 | | | | | $ - |

| ITEM | ITEM ADICIONALES DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITA | V/TOTAL | POR EJECUTAR CANT | POR EJECUTAR V/TOTAL | ACUMULADO CANT | ACUMULADO V/TOTAL | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **MURO** | | | | | | | | | | |
| 14.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MEDIA DE 1 KM) | M3 | 153,578218 | $ 25.381 | $ 3.898.466 | 0,00 | $ - | 94,04 | $ 2.379.134,1 | | $ - |
| 14.2 | RELLENO CON SUELO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 30 | $ 49.792 | $ 1.493.760 | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 1.493.760,00 | | $ - |
| 14.3 | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 191 | $ 268.570 | $ 51.311.320 | 0,00 | $ - | 20,00 | $ 48.140.600,00 | | $ - |
| | SUBTOTAL(COSTOS directos) | | | | $ 55.795.914 | | $ 8 | | $ 459.015.649 | | $ 138.479.387 |
| | Administración (20%) | | | | $ 10.759.383 | | $ 2.814 | | $ 93.803.230 | | $ 27.695.877 |
| | Imprevistos (1%) | | | | $ 537.959 | | $ 0 | | $ 9.590.356 | | $ 2.384.794 |
| | Utilidad(4%) (costo directo + ad | | | | $ 2.151.837 | | $ 493 | | $ 18.360.526 | | $ 5.539.175 |
| | ne sobre la utilidad (9%) | | | | | | | | | | $ 1.052.443 |
| | COSTOS DIRECTOS + AU (10) | | | | $ 67.244.892 | | $ 2.784 | | $ 579.769.561 | | $ 174.151.677 |
| | TOTAL CONTRATO (1) (OBRA) | | | | $ 67.244.892 | | | | $ 579.769.561 | | $ 174.151.677 |
| | TOTAL CONTRATO +1 (OBRA) | | | | $ 1.067.219.951 | | $ 741.478.342 | 54,13% | $ 579.769.561 | 16,44% | $ 174.151.677 |
| | | | | | | | | | AMORTIZACION ACTA #4 | | 23.415.008 |
| | | | | | | | | | VALOR ACTA #4 | | 150.736.669 |
| | PORCENTAJE V/DCC ACUMULADO | 54,13% | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE PRESENTE ACTA | 16,44% | | | | | | | | | |

EDUARDO CIFUENTES HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SAGUDET 24.70%

CARLOS ALBERTO RAMBAL BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA BALBOA 2022

SEBASTIAN OVIEDA ARCILAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**
NIT 901.574.342-5
CR 15 # 148-75 TORRE 4 304
Tel: (604) 3235686
Monteria - Colombia
gerenciaecolegua@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 7**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BALBOA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 890.801.143-1 | **Teléfono** | (606) 3146208880 - Ext. 000 - (606) 3146382479 - Ext. 000 | **Generación** | 18/12/2024, 15:03 |
| **Dirección** | CLL 8 NO 6-44 | **Ciudad** | Risaralda - Colombia | **Expedición** | 18/12/2024, 15:03 |
| | | | | **Vencimiento** | 18/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA 03 del contrato REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 15% (23,415,008) | 1.00 | 139,531,830.34 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento setenta y cuatro millones ciento cincuenta y un mil seiscientos setenta y siete pesos m/cte con nueve cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 174,151,677.09

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 138,479,387.00 |
| Administración 20.00% | 27,695,877.40 |
| Imprevistos 1.00% | 1,384,793.87 |
| Utilidad 4.00% | 5,539,175.48 |
| IVA 19% | 1,052,443.34 |
| **Total a Pagar** | 174,151,677.09 |

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR CUENTA BANCO CAJA SOCIAL CONSORCIO SACUDETE BALBOA
CUENTA DE AHORROS NUMERO 24140453560

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082536407 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 3 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0

**CUFE:** 634a5a39b964469e74c4940271 3ffb44cdb65e40aab747f29abd358064a04e0eaafe841226e09b08684443453216936 1

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Numero Software Siigo Nube. Firma electrónica versión 10.10.6

| | COMUNICACIONES OFICIALES<br>DEPARTAMENTO DE RISARALDA<br>MUNICIPIO DE BALBOA<br>NIT 890801143-1 | Código: GDFO-03<br>Versión: 02 |
|---|---|---|

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| **Cuenta a Debitar** | **Valor** | **Cuenta Destino** |
|---|---|---|
| 457253005106 | 122.969.474 | 24140453560 Cuenta de Ahorros De Banco Caja social a nombre de Consorcio sacudete Balboa Nit 901.574.342 |
| **TOTAL** | **122.969.474** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**REINEL CASTAÑEDA MARQUEZ**
Tesorero General

**Proyectó:** Reinel Castañeda Márquez – Tesorero General.
**Revisó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.
**Aprobó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar $ 122.969.474,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

CONSORCIO SACUDETE BALBOA

******3560**

Monto a acreditar $ 122.969.474,00

**Monto $**
**122.969.474,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

19/12/2024 - 03:46:43 p. m. | IP actual: 192.168.205.17

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## 890801143-1

## OP 2.574 COMPROBANTE DE EGRESO No. 02574

FECHA viernes, 8 noviembre, 2024 VALOR OP **129.256.866,0(** **VALOR NETO** **81.106.614,00**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 1 ANEXA.

LA SUMA DE **OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS**

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 81.106.614,00 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 81.106.614,00 | 0,00 | | | |
| | **81.106.614,00** | **81.106.614,00** | | | |

RECIBÍ

Reinel Castañeda M.

TESORERÍA C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

890801143-1

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO 02574

FECHA 2024/10/31

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. $129.256.866,00

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 1 ANEXA.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| | RUBRO | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 2254 | 3536 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 129.256.866,00 |

**TOTAL 129.256.866,00**

### CONTABILIDAD

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 1.515.318,00 |
| 13058504 | 0,00 | 7.576.590,00 |
| 13058801 | 0,00 | 6.061.272,00 |
| 13058802 | 0,00 | 2.272.977,00 |
| 13110101 | 0,00 | 3.788.295,00 |
| 13110204 | 0,00 | 23.824.898,00 |
| 17100501 | 129.256.866,00 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 81.106.614,00 |
| 24362502 | 0,00 | 80.266,00 |
| 24362601 | 0,00 | 3.030.636,00 |
| **TOTAL** | **129.256.866,00** | **129.256.866,00** |

### DESCUENTOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TASA CULTURAL 1.5% | 2.272.977,00 |
| LEY 418/97 CONTRATO VIAS 5%_ | 7.576.590,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 80.266,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.515.318,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 6.061.272,00 |
| RETFTE CONTRATOS DE OBRA 2% | 3.030.636,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 3.788.295,00 |
| MULTAS Y SANCIONES | 23.824.898,00 |
| **TOTAL** | **48.150.252,00** |

### ANEXOS

| DESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| VALOR ORDEN | **129.256.866,00** |
| DESCUENTOS | **48.150.252,00** |
| NETO A PAGAR | **81.106.614,00** |

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## 890801143-1

**OP 2.573** **COMPROBANTE DE EGRESO No. 02575**

FECHA viernes, 8 noviembre, 2024 VALOR OP **156.100.050,0(** **VALOR NETO 0,00**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO PARA LEGALIZAR ANTICIPO DEL 15% DEL COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.

LA SUMA DE

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24010201 | 156.100.050,00 | 0,00 | | | |
| | **156.100.050,00** | **0,00** | | | |

RECIBÍ

Reinel Castañeda M.

TESORERÍA

C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO 02573

FECHA 2024/10/31

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL CINCUENTA PESOS MCTE. $156.100.050,00

CONCEPTO PAGO PARA LEGALIZAR ANTICIPO DEL 15% DEL COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 2254 | 3536 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 100.000.000,00 |
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_151.0 Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | RESERVAS | RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | 2254 | 3537 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 56.100.050,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **156.100.050,00** |

**CONTABILIDAD**

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| TOTAL | | |

**DESCUENTOS**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TOTAL | |

**ANEXOS**

| DESCRIPCIÓN | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| VALOR ORDEN | **156.100.050,00** |
| DESCUENTOS | **0,00** |
| NETO A PAGAR | **156.100.050,00** |

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO REGISTROS PRESUPUESTALES

PAG. 1

NRO. 2254

FECHA 31/10/2024

SOLICITADO DIRECCIÓN OBRAS E INFRAESTR | ENVIADO SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINAN

CONTRATANTE ALCALDE MUNICIPAL | CON CARGO AL CDP NRO. 1271 | DE 31/10/2024

NIT 901574342 DV 5 | BENEFICIARIO CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Un mil Ciento Siete Millones Novecientos Once mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos MCte. $1.107.911.892,00

La suscrita Auxiliar Administrativa, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | RUBRO/RE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit 13 RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | 1.040.667.000,00 |
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_151.0 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores 15 RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | RESERVAS | 67.244.892,00 |
| | | TOTAL | **1.107.911.892,00** |

**REINTEGROS CRP** **2254**

| Codigo | Valor Rubro |
|---|---|

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA

PAG. 1

NRO. 1271

FECHA 2024/10/31

SOLICITADO DIRECCIÓN OBRAS E INFRAESTR | ENVIADO SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINAN

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Un mil Ciento Siete Millones Novecientos Once mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos MCte. $1.107.911.892,00

La suscrita Auxiliar Administrativa , CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del compromiso, hay disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| DISPO | CÓDIGO | VALOR | RUBRO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 4029 | 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_151.0 | 67.244.892,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | RESERVAS |
| 4030 | 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_133.4 | 1.040.667.000,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS |

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

MUNICIPIO DE SALBOA RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA 001-2024
CONTRATISTA REVISIÓN PROYECTO:
OSCAR ALONSO OSPINA AGUDELO

"REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE LINEAL EN EL MUNICIPIO DE SALBOA RISARALDA"

CONTRATISTA: CONSORCIO SACUDETE SALBOA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SALBOA-RISARALDA

SUPERVISOR:

## VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 1

CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2022

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ | 1.124.000.000 |
| COMPONENTE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: | $ | 83.333.000 |
| VALOR INICIAL OBRA | $ | 1.040.667.000 |
| OTROS! | $ | 67.244.892 |
| VALOR COMPONENTE 2 OBRA: | $ | 1.009.588.735 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO COMPONENTE 2 | $ | 315.764.337 |
| VALOR ANTICIPO COMPONENTE 2 OBRA: | $ | 156.100.050 |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ | 22.816.035 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 1.124.000.000 |
| SALDO DEL CONTRATO | | |

| | |
|---|---|
| FECHA INICIO | 16 JUNIO DE 2022 |
| PLAZO INICIAL | 152 DIAS |
| FECHA TERMINACIÓN 1 | 17 NOVIEMBRE DE 2022 |
| SUSPENSIÓN 1 | 12 NOVIEMBRE DE 2022 |
| REINICIO 1 | 13 DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA TERMINACIÓN | 28 DICIEMBRE DE 2022 |
| PRÓRROGA 1 | |
| FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA 2 | |
| FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA 3 | |
| FECHA TERMINACIÓN | |

| ITEM CONTRATADOS INICIALMENTE | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | CAMPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLV | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNTA | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL | CANT. EJE | V/TOTAL | OBSERVACIONES |
| 1,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 5200 | $ 2.369 | $ 3.327.800 | | | 1.200,00 | $ 1.327.800 | 1.229,48 | $ 2.494.453 | |
| 1,2 | CONFIGURACION NIVELACION TERRENO | M2 | 1200 | $ 2.943 | $ 3.531.600 | | | 1.200,00 | $ 3.531.600 | 1.229,48 | $ 3.618.900 | |
| 2,1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 A 2 M. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 161,0625 | $ 25.701 | $ 4.152.332 | | | 161,06 | $ 4.152.388 | 92,02 | $ 2.372.504 | |
| 2,2 | EXCAVACIÓN MECANICA CAJEO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 92,1575 | $ 8.654 | $ 797.532 | | | 92,16 | $ 797.553 | 92,82 | $ 803.264 | |
| 2,3 | RELLENO CON SUELO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 44,47767 | $ 49.797 | $ 2.213.860 | | | 44,46 | $ 2.213.975 | 32,26 | $ 1.606.461 | |
| 2,4 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO MANUALMENTE | M3 | 24,839 | $ 21.044 | $ 522.629 | | | 24,84 | $ 522.733 | 26,24 | $ 552.195 | |
| 2,5 | BASE GRANULAR E= 10CM | M3 | 44,0788 | $ 169.797 | $ 7.824.042 | | | 46,08 | $ 7.824.246 | 46,41 | $ 7.880.229 | |
| 3,1,1 | SOLADO DE NIVELACION DE 2500 PSI | M2 | 84,4085 | $ 32.443 | $ 2.744.784 | | | 84,81 | $ 2.744.833 | 68,58 | $ 2.224.604 | |
| 3,1,2 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 25,99425 | $ 515.633 | $ 13.403.495 | | | 25,99 | $ 13.403.302 | 15,02 | $ 7.745.223 | |
| 3,1,3 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 23,38773 | $ 606.761 | $ 14.190.850 | | | 23,48 | $ 14.246.810 | 13,40 | $ 8.130.658 | |
| 3,2,1 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 9,0372 | $ 709.080 | $ 6.408.048 | | | 9,11 | $ 6.477.959 | 5,30 | $ 3.758.124 | |
| 3,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 61269,18 | $ 6.589 | $ 40.370.261 | | | 7.360,50 | $ 48.432.445 | 5.243,85 | $ 34.547.596 | |
| 8,1 | PLACA CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3000PSI (Malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm) | M2 | 840,0446 | $ 93.378 | $ 78.441.832 | | | 840,01 | $ 78.440.386 | 453,26 | $ 42.324.512 | |

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA 001-2024
CONTRATISTA REVISIÓN PROYECTO:
OSCAR ALONSO OSPINA ACUDELO

"REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL MAQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"

CONTRATISTA: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONTRANTANTE: MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

SUPERVISOR:

# VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 1

CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ | 1.124.000.000 | |
| COMPONENTE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: | $ | 83.333.000 | |
| VALOR INICIAL OBRA | $ | 1.040.667.000 | |
| OTROS! | $ | 67.244.892 | |
| VALOR COMPONENTE 2 OBRA: | $ | 1.009.588.735 | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO COMPONENTE 2 : | $ | 315.764.337 | |
| VALOR ANTICIPO COMPONENTE 2 OBRA: | $ | 156.100.050 | |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ | 22.810.035 | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 1.124.000.000 | |
| SALDO DEL CONTRATO | | | |

| | |
|---|---|
| FECHA INICIO | 10 JUNIO DE 2022 |
| PLAZO INICIAL | 150 DIAS |
| FECHA TERMINACIÓN 1 | 17 NOVIEMBRE DE 2022 |
| SUSPENSIÓN 1 | 17 NOVIEMBRE DE 2022 |
| REINICIO 1 | 11 DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA TERMINACIÓN | 19 DICIEMBRE DE 2022 |
| PRÓRROGA 1: | |
| FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA 2 | |
| FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA 3 | |
| FECHA TERMINACIÓN | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL(Costo directo) | | | | $ 745.659.807 | | | | $ 190.145.578 | | $ | 128.972.348 |
| | Administración( 20%) | | | | $ 149.138.770 | | | | $ 39.729.388 | | $ | 23.794.469 |
| | Imprevistos (1%) | | | | $ 7.486.938 | | | | $ 1.961.460 | | $ | 1.389.725 |
| | Utilidad(4%) | | | | $ 29.827.756 | | | | $ 7.846.836 | | $ | 4.758.934 |
| | COSTOS DIRECTOS + AU (I) | | | | $ 932.117.371 | | | | $ 240.182.422 | | $ | 158.915.476 |
| | RETIE | UND | 1,00 | $ 3.417.500 | $ 3.417.500 | | | | | | | |
| | RETILAP | UND | 1,00 | $ 3.417.500 | $ 3.417.500 | | | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | UND | 1,00 | $ 3.391.472 | $ 3.391.472 | | | 1,00 | $ 3.391.472 | 1,00 | $ | 3.391.472 |
| | TOTAL COMPLEMENTARIOS | | | | $ 10.226.472 | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO (I) +Complementarios | | | | $ 942.343.843 | | | | $ 248.533.894 | | $ | 162.066.901 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITA | V/TOTAL | ACTAS ANTERIORES CANT | ACTAS ANTERIORES V/TOTAL | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA V/TOTAL | ACUMULADO ACTUAL CANT. (U) | ACUMULADO ACTUAL V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL(C.directos) | | | | $ 53.795.914 | | | | $ 53.784.365 | | $ - |
| | Administración( 20%) | | | | $ 10.759.183 | | | | $ 10.756.873 | | $ - |
| | Imprevistos (1%) | | | | $ 537.959 | | | | $ 537.844 | | $ - |
| | Utilidad(4%) | | | | $ 2.151.837 | - | | | $ 2.151.374 | | $ - |
| | COSTOS DIRECTOS + AU ( II) | | | | $ 67.244.892 | - | | | $ 67.230.443 | | $ - |
| | TOTAL CONTRATO (I)+( II) [OBRA] | | | | $ 67.244.892 | - | | | $ 67.230.443 | | $ - |
| | TOTAL CONTRATO (+) [OBRA] | | | | $ 1.009.588.735 | | | | $ 315.764.337 | | $ 162.066.901 |

SALDO POR AMORTIZAR 22.810.035
TOTAL CONTRATO 139.256.866

EDUARDO CIFUENTES HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SACUDETE BALBOA

SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

**Balboa, 26 de octubre de 2024**

Señores
Alcaldía de Balboa
Secretaría de Hacienda
Municipio Balboa, Risaralda

ALCALDÍA [illegible]
DESPACHO [illegible]
Fecha: 29-10-24 5:03
Rad. Nº: RR-1665-2024
Recibido por: Camila Galu

**OBJETO REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

**Referencia:** Pago sanción resolución 570 de 2024

Yo, **Eduardo Cifuentes Hurtado**, identificado con cédula de ciudadanía número 10.548.383, en calidad de representante legal del **Consorcio Sacúdete Balboa**, con contrato de obra 001 del 03 de mayo de 2022 me dirijo a ustedes respetuosamente con el fin de solicitar el pago de la sanción impuesta al consorcio por parte del municipio de Balboa, según la resolución 570 del 10 de octubre de 2024, por un valor de $23.824.898.

Solicito respetuosamente que este valor sea deducido del acta de avance número 01, presentada el día 26 de octubre de 2024 por este consorcio.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

**Eduardo Cifuentes Hurtado**
Representante Legal
Consorcio Sacúdete Balboa

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**
NIT 901.574 342-5
CR 15 # 146-75 TORRE 4 304
Tel: (604) 3235586
Monteria - Colombia
gerenciaecolaqua@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 4**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BALBOA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 890.801.143-1 | **Teléfono** | (606) 3146208880 - Ext. 000 - (606) 3146382479 - Ext. 000 | **Generación** | 31/10/2024, 11:24 |
| **Dirección** | CLL 8 NO 6-44 | **Ciudad** | Risaralda - Colombia | **Expedición** | 31/10/2024, 11:24 |
| | | | | **Vencimiento** | 31/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA 01 del contrato REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 15% ($22.810.035) | 1.00 | 118,972,343.00 |
| 2 | PLAN DE MENEJO AMBIENTAL | 1.00 | 3,351,472.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y dos millones sesenta y seis mil novecientos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 152,066,900.75

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 121,788,706.03 |
| Administración 20.00% | 23,794,468.60 |
| Imprevistos 1.00% | 1,189,723.43 |
| Utilidad 4.00% | 4,758,893.72 |
| IVA 19% | 535,108.97 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 152,066,900.75 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Número Autorización Electrónica** 18764082301407 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 3 al 100 **Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0
**CUFE:** 5fe67a75be922288c67a0293ea6fc4a9e8ab094f63239b4c84c4f807c40a255dd8307b744974b50f61192259cfec6a

Banco Caja Social
Su banco amigo

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO SACUDETE BALBOA Identificado con NI 9015743425

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA 30 DE AGOSTO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

| | |
|---|---|
| **Número:** | 24140453560 |
| **Fecha de apertura:** | 31 de Octubre de 2024 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0094 AVENIDA 30 DE AGOSTO de la ciudad de PEREIRA, el dia Jueves, 31 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| **Cuenta a Debitar** | **Valor** | **Cuenta Destino** |
|---|---|---|
| 457253005106 | 81.106.614 | 24140453560 Cuenta de Ahorros De Banco Caja social a nombre de Consorcio sacudete Balboa Nit 901.574.342 |
| **TOTAL** | **81.106.614** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**REINEL CASTAÑEDA MARQUEZ**
Tesorero General

**Proyectó:** Reinel Castañeda Márquez – Tesorero General.
**Revisó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.
**Aprobó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.

MUNICIPIO DE BALBOA MPIO : REINEL CASTAÑEDA MARQUEZ

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar $ 81.106.614,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONSORCIO SACUDETE BALBOA

******3560**

Monto a acreditar $ 81.106.614,00

**Monto $**
**81.106.614,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

08/11/2024 - 01:09:16 p. m. | IP actual: 200.10.28.164

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp



# La operación solicitada se realizó correctamente

| | |
|---|---|
| Número de Cuenta Origen: | *****5106 |
| Número de Cuenta Destino: | BANCO CAJA SOCIAL - *****3560 |
| Valor Transferencia: | $ 81.106.614,00 |
| Fecha y Hora: | 08/11/2024 2:21:02 p. m. |
| Dirección IP: | 200.10.28.165 |
| Costo de la transacción: | $ 0,00 + IVA |
| Número de aprobación: | 1869230041 |
| Tipo transacción: | Transferencia Interbancaria |

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## 890801143-1

## OP 2.574 COMPROBANTE DE EGRESO No. 02574

FECHA viernes, 8 noviembre, 2024 VALOR OP **129.256.866,0(** **VALOR NETO** **81.106.614,00**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 1 ANEXA.

LA SUMA DE OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 81.106.614,00 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 81.106.614,00 | 0,00 | | | |
| | **81.106.614,00** | **81.106.614,00** | | | |

RECIBÍ

Reinel Castañeda M.

TESORERÍA C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

890801143-1

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 02574

FECHA 2024/10/31

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR CIENTO VEINTI NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. $129.256.866,00

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 1 ANEXA.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_1334 Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 2254 | 3536 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 129.256.866,00 |
| | | | | | **TOTAL** | **129.256.866,00** |

**CONTABILIDAD**

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 1.515.318,00 |
| 13058504 | 0,00 | 7.576.590,00 |
| 13058801 | 0,00 | 6.061.272,00 |
| 13058802 | 0,00 | 2.272.977,00 |
| 13110101 | 0,00 | 3.788.295,00 |
| 13110204 | 0,00 | 23.824.898,00 |
| 17100501 | 129.256.866,00 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 81.106.614,00 |
| 24362502 | 0,00 | 80.266,00 |
| 24362601 | 0,00 | 3.030.636,00 |
| **TOTAL** | **129.256.866,00** | **129.256.866,00** |

**DESCUENTOS**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TASA CULTURAL 1.5% | 2.272.977,00 |
| LEY 418/97 CONTRATO VIAS 5%_ | 7.576.590,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 80.266,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.515.318,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 6.061.272,00 |
| RETFTE CONTRATOS DE OBRA 2% | 3.030.636,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 3.788.295,00 |
| MULTAS Y SANCIONES | 23.824.898,00 |
| **TOTAL** | **48.150.252,00** |

**ANEXOS**

| ESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| VALOR ORDEN | **129.256.866,00** |
| DESCUENTOS | **48.150.252,00** |
| NETO A PAGAR | **81.106.614,00** |

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA 001-2024
CONTRATISTA REVISIÓN PROYECTO:
OSCAR ALONSO OSPINA AGUDELO

REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO CENTRAL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONTRANTANTE: MUNICIPIO DE BALBOA-RISARALDA

SUPERVISOR:

## VERIFICACION - ACTA DE COBRO No. 1

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ | 1.124.000.000 |
| COMPONENTE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: | $ | 83.333.000 |
| VALOR INICIAL OBRA | $ | 1.040.667.000 |
| OTROS! | $ | 67.244.892 |
| VALOR COMPONENTE 2 OBRA | $ | 1.009.580.735 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO COMPONENTE 2 : | $ | 315.764.237 |
| VALOR ANTICIPO COMPONENTE 2 OBRA | $ | 156.100.050 |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ | 22.810.035 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 1.124.000.000 |
| SALDO DEL CONTRATO | | |

## CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022

| | |
|---|---|
| FECHA INICIO | 18 JUNIO DE 2022 |
| PLAZO INICIAL | 132 DIAS |
| FECHA TERMINACIÓN 1 | 17 NOVIEMBRE DE 2022 |
| SUSPENSIÓN 1 | 17 NOVIEMBRE DE 2022 |
| REINICIO 1 | 13 DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA TERMINACION | 18 DICIEMBRE DE 2022 |
| PRÓRROGA 1 | |
| FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA 2 | |
| FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA 3 | |
| FECHA TERMINACION | |

| ITEM CONTRATADOS INICIALMENTE | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | CAMPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V/UNITA | V/TOTAL | | CANT | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL | CANT. TH | V/TOTAL | OBSERVACIONES |
| 1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LINDEROS CON ELEMENTOS DE PRECISION | M2 | 1200 | $ 2.769 | $ 3.322.800 | | | | 1.200,00 | $ 3.322.800 | 1.229,48 | $ 3.404.481 | |
| 1,2 | DESCAPOTE-LIMPIEZA-NIVELACION TERRENO | M2 | 1200 | $ 2.947 | $ 3.536.400 | | | | 1.200,00 | $ 3.536.400 | 1.229,48 | $ 3.623.360 | |
| 2,1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 A 2 M. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 161,0625 | $ 25.781 | $ 4.152.352 | | | | 161,06 | $ 4.152.288 | 92,02 | $ 2.372.764 | |
| 2,2 | EXCAVACION MECANICA CAJEO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 92,0578 | $ 8.654 | $ 797.532 | | | | 92,06 | $ 797.552 | 92,02 | $ 796.264 | |
| 2,3 | RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 44,47767 | $ 49.797 | $ 2.213.897 | | | | 44,48 | $ 2.213.845 | 32,26 | $ 1.606.451 | |
| 2,4 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO, MANUALMENTE | M3 | 24,816 | $ 21.044 | $ 522.130 | | | | 24,82 | $ 522.733 | 26,24 | $ 552.395 | |
| 2,5 | BASE GRANULAR E= 10CM | M3 | 46,0788 | $ 169.797 | $ 7.824.067 | | | | 46,08 | $ 7.824.246 | 46,41 | $ 7.881.279 | |
| 3,1,1 | SOLADO DE NIVELACION DE 2500 PSI | M2 | 84,6085 | $ 32.441 | $ 2.744.784 | | | | 84,61 | $ 2.744.833 | 68,58 | $ 2.224.804 | |
| 3,1,2 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 25,99425 | $ 515.633 | $ 13.401.403 | | | | 25,99 | $ 13.401.302 | 15,02 | $ 7.745.103 | |
| 3,1,3 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 23,38771 | $ 606.764 | $ 14.190.430 | | | | 23,39 | $ 14.246.815 | 13,40 | $ 8.130.658 | |
| 3,2,1 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 9,0372 | $ 709.080 | $ 6.408.208 | | | | 9,61 | $ 7.972.979 | 5,30 | $ 3.758.124 | |
| 3,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 6126,936 | $ 6.589 | $ 40.370.067 | | | | 7.350,50 | $ 48.432.445 | 3.243,83 | $ 21.371.196 | |
| 6,1 | PLACA CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000PSI (Malla electrosoldada 15 x 15, 6 mm) | M2 | 948,0464 | $ 93.378 | $ 88.511.673 | | | | 760,88 | $ 71.060.366 | 463,26 | $ 43.264.512 | |

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

CONTRATO DE CONSULTORIA 001 2026
CONTRATISTA REVISIÓN PROYECTO
OSCAR ALONSO OSPINA AGUDELO

"REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE A, PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"

CONTRATISTA: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALBOA-RISARALDA

SUPERVISOR:

# VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 1

CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ | 1.124.000.000 | FECHA INICIO | 18 JUNIO DE 2022 | |
| COMPONENTE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: | $ | 83.333.000 | PLAZO INICIAL | 152 DIAS | |
| VALOR INICIAL OBRA | $ | 1.040.667.000 | FECHA TERMINACIÓN 1 | 17 NOVIEMBRE DE 2022 | |
| OTROSI | $ | 67.244.892 | SUSPENSIÓN 1 | 12 NOVIEMBRE DE 2022 | |
| VALOR COMPONENTE 2 OBRA: | $ | 1.009.588.735 | REINICIO 1 | 13 DICIEMBRE DE 2022 | |
| VALOR TOTAL EJECUTADO COMPONENTE 2: | $ | 315.764.337 | FECHA TERMINACION | 18 DICIEMBRE DE 2022 | |
| VALOR ANTICIPO COMPONENTE 2 OBRA: | $ | 156.100.050 | PRÓRROGA 1 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ | 22.810.035 | FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA 2 | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 1.124.000.000 | FECHA TERMINACIÓN PRORROGA 3 | | |
| SALDO DEL CONTRATO | | | FECHA TERMINACIÓN | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL(Costo directo) | | | | $ 745.693.897 | | | | $ 196.145.558 | | $ 138.672.343 | | |
| | Administración( 20%) | | | | $ 149.138.779 | | | | $ 39.229.188 | | $ 27.734.469 | | |
| | Imprevistos (1%) | | | | $ 7.456.939 | | | | $ 1.961.459 | | $ 1.386.723 | | |
| | Utilidad(4%) | | | | $ 29.827.756 | | | | $ 7.845.838 | | $ 5.546.894 | | |
| | COSTOS DIRECTOS + AU (1) | | | | $ 932.117.371 | | | | $ 245.182.422 | | $ 173.340.429 | | |
| | RETIE | UND | 1,00 | $ 3.437.500 | $ 3.437.500 | | | | | | | | |
| | RETILAP | UND | 1,00 | $ 3.437.500 | $ 3.437.500 | | | | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | UND | 1,00 | $ 3.351.472 | $ 3.351.472 | 1,00 | $ 3.351.472 | 1,00 | $ 3.351.472 | | | | |
| | TOTAL COMPLEMENTARIOS | | | | $ 10.226.472 | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO (1) +Complementarios | | | | $ 942.343.843 | | | | $ 248.533.894 | | $ 152.066.901 | | |

| | ITEM ADICIONALES | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNTA | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL | CANT. EJE | V/TOTAL |
| | SUBTOTAL(C.directos) | | | | $ 53.795.916 | | - | | $ 53.784.355 | | $ - |
| | Administración( 20%) | | | | $ 10.759.183 | | - | | $ 10.756.871 | | $ - |
| | Imprevistos (1%) | | | | $ 537.959 | | - | | $ 537.844 | | $ - |
| | Utilidad(4%) | | | | $ 2.151.837 | | - | | $ 2.151.374 | | $ - |
| | COSTOS DIRECTOS + AU (1) | | | | $ 67.244.892 | | - | | $ 67.230.443 | | $ - |
| | TOTAL CONTRATO (2) (OBRA) | | | | $ 67.244.892 | | - | | $ 67.230.443 | | $ - |
| | TOTAL CONTRATO (1+2) (OBRA) | | | | $ 1.009.588.735 | | - | | $ 315.764.337 | | $ 152.066.901 |
| | | | | | | | | | SALDO POR AMORTIZAR | | 22.810.035 |
| | | | | | | | | | TOTAL CONTRATO | | 129.256.866 |

EDUARDO CIFUENTES HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SACUDETE BALBOA

SEBASTIAN GAVIRIA ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

**Balboa, 26 de octubre de 2024**

ALCALDÍA
DESPACHO
Fecha: 29-10-24 5:03
Rad. Nº: RR-1665-2024
Recibido por: Camila Galu

Señores
Alcaldía de Balboa
Secretaría de Hacienda
Municipio Balboa, Risaralda

**OBJETO REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

**Referencia:** Pago sanción resolución 570 de 2024

Yo, **Eduardo Cifuentes Hurtado**, identificado con cédula de ciudadanía número 10.548.383, en calidad de representante legal del **Consorcio Sacúdete Balboa**, con contrato de obra 001 del 03 de mayo de 2022 me dirijo a ustedes respetuosamente con el fin de solicitar el pago de la sanción impuesta al consorcio por parte del municipio de Balboa, según la resolución 570 del 10 de octubre de 2024, por un valor de $23.824.898.

Solicito respetuosamente que este valor sea deducido del acta de avance número 01, presentada el día 26 de octubre de 2024 por este consorcio.

Agradezco de antemano la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

**Eduardo Cifuentes Hurtado**
Representante Legal
Consorcio Sacúdete Balboa

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**
NIT 901.574.342-5
CR 15 # 146-75 TORRE 4 304
Tel: (604) 3235686
Monteria - Colombia
gerenciaecolaqua@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 4**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BALBOA | | | **Generación** | 31/10/2024 11:24 |
| **NIT** | 890.801.143-1 | **Teléfono** | (606) 3146208880 - Ext. 000 - (606) 3146382479 - Ext. 000 | **Expedición** | 31/10/2024 11:24 |
| **Dirección** | CLL 8 NO 6-44 | **Ciudad** | Risaralda - Colombia | **Vencimiento** | 31/10/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA 01 del contrato REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 15% ($22.810.035) | 1.00 | 118,972,343.00 |
| 2 | PLAN DE MENEJO AMBIENTAL | 1.00 | 3,351,472.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y dos millones sesenta y seis mil novecientos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 152,066,900.75

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 121,788,706.03 |
| Administración 20.00% | 23,794,468.60 |
| Improvistos 1.00% | 1,189,723.43 |
| Utilidad 4.00% | 4,758,893.72 |
| IVA 19% | 535,108.97 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 152,066,900.75 |

**Observaciones:**

Impreso: Software y Procesos Empresariales Siigo NUBE | NIT 830.145.435-9 | Nombre Software: Siigo Nube | Fecha y hora de impresión: 31/10/24 11:25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica** 18764082526407 **aprobado en** 20241030 **prefijo** FE **desde el numero** 3 **al** 100 **Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0
**CUFE:** 5fe87a75ae922298cb7e02938e6fc4a8e8ab0941f832d5a4c94c4d607c40a255add8307b744974b5016119025 9cfec5e

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO REGISTROS PRESUPUESTALES

PAG 1

NRO 2254

FECHA 31/10/2024

SOLICITADO DIRECCIÓN OBRAS E INFRAESTR | ENVIADO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINAN

CONTRATANTE ALCALDE MUNICIPAL | CON CARGO AL CDP NRO 1271 | DE 31/10/2024

NIT 901574342 DV 5 | BENEFICIARIO CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Un mil Ciento Siete Millones Novecientos Once mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos MCte. $1.107.911.892,00

La suscrita Auxiliar Administrativa, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | RUBRO/RE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit 13 RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | 1.040.667.000,00 |
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_151.0 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores 15 RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | RESERVAS | 67.244.892,00 |
| | | TOTAL | **1.107.911.892,00** |

**REINTEGROS CRP** **2254**

| Codigo | Valor Rubro |
|---|---|
| | |

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA

PAG. 1

NRO. 1271

FECHA 2024/10/31

SOLICITADO DIRECCIÓN OBRAS E INFRAESTR | ENVIADO SECRETARÌA DE HACIENDA Y FINAN

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Un mil Ciento Siete Millones Novecientos Once mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos MCte. $1.107.911.892,00

La suscrita Auxiliar Administrativa , CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del compromiso, hay disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| DISPO | CÓDIGO | VALOR | RUBRO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 4029 | 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_151.0 | 67.244.892,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | RESERVAS |
| 4030 | 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | 1.040.667.000,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS |

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| Cuenta a Debitar | Valor | Cuenta Destino |
|---|---|---|
| 457253005106 | 81.106.614 | 24140453560 Cuenta de Ahorros De Banco Caja social a nombre de Consorcio sacudete Balboa Nit 901.574.342 |
| **TOTAL** | **81.106.614** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**REINEL CASTAÑEDA MARQUEZ**
Tesorero General

**Proyectó:** Reinel Castañeda Márquez – Tesorero General.
**Revisó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.
**Aprobó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.

MUNICIPIO DE BALBOA MPIO : REINEL CASTAÑEDA MARQUEZ

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar $ 81.106.614,00

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONSORCIO SACUDETE BALBOA

******3560**

Monto a acreditar $ 81.106.614,00

**Monto $**
**81.106.614,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

08/11/2024 - 01:09:16 p. m. | IP actual: 200.10.28.164

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

Banco Caja Social
Su banco amigo.

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO SACUDETE BALBOA Identificado con NI 9015743425

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA 30 DE AGOSTO, con las siguientes características:


Cuenta de Ahorros

| | |
|---|---|
| **Número:** | 24140453560 |
| **Fecha de apertura:** | 31 de Octubre de 2024 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0094 AVENIDA 30 DE AGOSTO de la ciudad de PEREIRA, el día Jueves, 31 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



# La operación solicitada se realizó correctamente

| | |
|---|---|
| Número de Cuenta Origen: | ****5106 |
| Número de Cuenta Destino: | BANCO CAJA SOCIAL - ****3560 |
| Valor Transferencia: | $ 81.106.614,00 |
| Fecha y Hora: | 08/11/2024 2:21:02 p. m. |
| Dirección IP: | 200.10.28.165 |
| Costo de la transacción: | $ 0,00 + IVA |
| Número de aprobación: | 1869230041 |
| Tipo transacción: | Transferencia Interbancaria |

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## 890801143-1

## OP 2.778 COMPROBANTE DE EGRESO No. 02757

FECHA miércoles, 27 noviembre, 2024 VALOR OP **243.955.966,0(** **VALOR NETO** **201.871.180,00**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 2 ANEXA.

LA SUMA DE DOSCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 201.871.180,00 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 201.871.180,00 | 0,00 | | | |
| | **201.871.180,00** | **201.871.180,00** | | | |

RECIBÍ

Reinel Castañeda M.

TESORERÍA

C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

# ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 02778

FECHA 2024/11/27

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. $243.955.966,00

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 2 ANEXA.

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| RUBRO | | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingenieria civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 2254 | 3536 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 243.955.966,00 |

**TOTAL 243.955.966,00**

## CONTABILIDAD

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 2.492.366,00 |
| 13058504 | 0,00 | 13.117.718,00 |
| 13058801 | 0,00 | 10.494.174,00 |
| 13058802 | 0,00 | 3.935.315,00 |
| 13110101 | 0,00 | 6.558.859,00 |
| 17100501 | 243.955.966,00 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 201.871.180,00 |
| 24362502 | 0,00 | 239.267,00 |
| 24362601 | 0,00 | 5.247.087,00 |
| **TOTAL** | **243.955.966,00** | **243.955.966,00** |

## DESCUENTOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TASA CULTURAL 1.5% | 3.935.315,00 |
| LEY 418/97 CONTRATO VIAS 5%_ | 13.117.718,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 239.267,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 2.492.366,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 10.494.174,00 |
| RETFTE CONTRATOS DE OBRA 2% | 5.247.087,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 6.558.859,00 |
| **TOTAL** | **42.084.786,00** |

## ANEXOS

| DESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

VALOR ORDEN **243.955.966,00**

DESCUENTOS **42.084.786,00**

NETO A PAGAR **201.871.180,00**

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

"FINALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SALUDETE AL PARQUE" EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"

CONTRATISTA: CONSORCIO SALUDETE BALBOA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

SUPERVISOR:

# VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 2

CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ | 1.124.000.000 |
| COMPONENTE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ | 83.333.000 |
| VALOR INICIAL OBRA | $ | 1.040.667.000 |
| OTROS | $ | 67.244.892 |
| VALOR COMPONENTE 2 OBRA | $ | 1.009.588.735 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO COMPONENTE 2: | $ | 67.244.881 |
| VALOR ANTICIPO COMPONENTE 2 OBRA: | $ | 156.100.050 |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ | 114.196.513 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 1.124.000.000 |
| SALDO DEL CONTRATO | $ | 951.811.842 |
| VALOR A AMORTIZAR | $ | 19.093.502 |

| | |
|---|---|
| FECHA INICIO | 10 JUNIO DE 2022 |
| PLAZO INICIAL | 152 DIAS |
| FECHA TERMINACIÓN 1 | 17 NOVIEMBRE De 2022 |
| SUSPENSIÓN 1 | 12 NOVIEMBRE DE 2022 |
| REINICIO 1 | 11 DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA TERMINACIÓN | 18 DICIEMBRE De 2022 |
| PRORROGA 1 | |
| FECHA TERMINACIÓN | 28 de noviembre |
| PRORROGA 2 | 28 días |
| FECHA TERMINACION PRÓRROGA 3 | |
| FECHA TERMINACIÓN | |

| ITEM CONTRATADOS INICIALMENTE | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | | | PRESENTE ACTA CAMPO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V/UNITA | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL |
| 2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS | | | | | | | | | | |
| 2,1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 A 2 M INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | M3 | 161.063 | $ 25.781 | $ 4.152.371 | 91.07 | 2.372.356 | | | 16,04 | $ 413.500 |
| 2,3 | RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 44,9577 | $ 45.797 | $ 2.059.859 | 22.26 | 1.626.431 | | | 12,26 | $ 602.564 |
| 3 | CONCRETOS | | | | | | | | | | |
| 3,1 | CIMENTACIONES | | | | | | | | | | |
| 3,1,1 | SOLADO DE NIVELACION DE 2500 PSI | M2 | 84,6805 | $ 32.441 | $ 2.744.764 | 68.38 | 2.224.804 | | | 16,30 | $ 519.960 |
| 3,1,2 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 25,9943 | $ 515.631 | $ 13.403.490 | 13.02 | 7.195.320 | | | 10,98 | $ 5.663.674 |
| 3,1,3 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 23,3877 | $ 636.764 | $ 14.889.662 | 13.42 | 8.539.618 | | | 10,01 | $ 6.089.843 |
| 3,1,4 | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 48,975 | $ 268.520 | $ 13.151.478 | | | | | 49,05 | $ 13.174.164 |
| 3,2 | ESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| 3,2,6 | GRADERIA EN CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 15 CM | M2 | 22,896 | $ 57.409 | $ 1.314.317 | | | | | 22,90 | $ 1.314.396 |
| 6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS AGUAS LLUVIAS | | | | | | | | | | |
| 6,2 | REDES SANITARIAS | | | | | | | | | | |
| 6,2,1 | TUBERIA SANITARIA | | | | | | | | | | |
| 6,2,1,1 | TUBERIA PVC 6 a 4" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 29,15 | $ 34.764 | $ 789.677 | | | | | 29,15 | $ 498.670 |
| 6,2,1,2 | TUBERIA PVC 4 a 4" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 18,25 | $ 23.559 | $ 430.402 | | | | | 18,25 | $ 390.960 |
| 6,2,1,3 | TUBERIA PVC 6 a 6" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 2 | $ 23.756 | $ 47.512 | | | | | 2,30 | $ 47.104 |
| 6,2,1,4 | TUBERIA PVC 6 a 2" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 8,63 | $ 71.680 | $ 618.400 | | | | | 8,63 | $ 547.000 |
| 6,2,2 | SALIDAS SANITARIAS | | | | | | | | | 12,00 | $ 206.112 |
| 6,2,2,1 | BAJANTES PVC 4" A 2" | UN | 12 | $ 17.176 | $ 206.112 | | | | | 19,00 | $ 517.017 |
| 6,2,2,2 | CODO PVC 90 4 | UN | 19 | $ 27.211 | $ 517.017 | | | | | 16,00 | $ 309.963 |
| 6,2,2,3 | CODO PVC 90 2" | UN | 16 | $ 19.373 | $ 309.963 | | | | | | |

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

"REALIZAR LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"

CONTRATISTA: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

SUPERVISOR

# VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 2

CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ | 1.124.000.000 |
| COMPONENTE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: | $ | 83.333.000 |
| VALOR INICIAL OBRA | $ | 1.040.667.000 |
| OTROSI | $ | 67.244.892 |
| VALOR COMPONENTE 2 OBRA | $ | 1.009.588.735 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO COMPONENTE 2 : | $ | 67.244.881 |
| VALOR ANTICIPO COMPONENTE 2 OBRA: | $ | 156.100.050 |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ | 114.196.513 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ | 1.124.000.000 |
| SALDO DEL CONTRATO | $ | 951.811.847 |
| VALOR A AMORTIZAR | $ | 19.093.502 |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA INICIO | 18 JUNIO De 2022 | |
| PLAZO INICIAL | 152 DIAS | |
| FECHA TERMINACIÓN 1 | 17 NOVIEMBRE De 2022 | |
| SUSPENSIÓN 1 | 12 NOVIEMBRE De 2022 | |
| REINICIO 1 | 13 DICIEMBRE De 2022 | |
| FECHA TERMINACIÓN | 18 DICIEMBRE DE 2022 | |
| PRÓRROGA 1 | | |
| FECHA TERMINACIÓN | 28 de octubre | |
| PRÓRROGA 2 | 28 nov | |
| FECHA TERMINACIÓN | | $ 19.093.502 |
| PRORROGA 3 | | |
| FECHA TERMINACIÓN | | |

| ITEM | ITEM ADICIONALES DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V/UNICA | V/TOTAL | ACTAS ANTERIORES CANT | ACTAS ANTERIORES V/TOTAL | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA V/TOTAL | ACUMULADO ACTUAL CANT. EJE | ACUMULADO ACTUAL V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MURO | | | | | | | | | | |
| 14,1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 153,578 | $ 45.781 | $ 7.030.293 | | | 183,58 | $ 8.404.306 | 337,16 | $ 15.434.599 |
| 14,2 | RELLENO CON RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 30 | $ 49.793 | $ 1.493.790 | | | 30,00 | $ 1.493.790 | 67,4 | $ 3.357.510 |
| 14,3 | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 180 | $ 268.570 | $ 48.342.600 | | | 180,00 | $ 48.342.600 | 180,00 | $ 48.342.600 |
| | SUBTOTAL(C.directos) | | | | $ 53.795.904 | | | | $ 53.795.904 | | $ 53.795.904 |
| | Admin (ingresos) 20% | | | | $ 10.759.181 | | | | $ 10.759.181 | | $ 10.759.181 |
| | Imprevistos (1%) | | | | $ 537.959 | | | | $ 537.959 | | $ 537.959 |
| | Utilidad(4%) | | | | $ 2.151.838 | | | | $ 2.151.838 | | $ 2.151.838 |
| | IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% | | | | | | | | $ 408.849 | | $ 408.849 |
| | COSTOS DIRECTOS + AU (II) | | | | $ 67.244.892 | | | | $ 67.244.881 | | $ 67.244.881 |
| | TOTAL CONTRATO (II) OBRAS | | | | $ 67.244.892 | | | | $ 67.244.881 | | $ 67.244.881 |
| | TOTAL CONTRATO (+) (OBRA) | | | | $ 1.009.588.735 | | | | $ 67.244.881 | | $ 263.949.468 |
| | | | | | | | | | SALDO POR AMORTIZAR TOTAL CONTRATO | | 263.949.468 |

EDUARDO ORTIZ [illegible]

SEBASTIAN GAVIRIA OCAS

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**
NIT 901.574.342-5
CR 15 # 148-75 TORRE 4 304
Tel: (604) 3235686
Vontaria - Colombia
gerenciaecolaqua@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 6**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| Señores | MUNICIPIO DE BALBOA | | | Generación | 27/11/2024, 15:58 |
| NIT | 890.801.143-1 | Teléfono | (606) 3146208880 - Ext. 000 - (606) 3146382479 - Ext. 000 | Expedición | 27/11/2024, 15:58 |
| Dirección | CLL 6 NO 6-44 | Ciudad | Risaralda - Colombia | Vencimiento | 27/11/2024 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA 03 OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA AMORTIZACION ANTICIPO DEL 15% DEL SALDO (19.993.502,00) | 1.00 | 211,476,597.47 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Doscientos sesenta y tres millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con veintidos cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 263,949,468.22

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 209,883,483.00 |
| Administración 20.00% | 41,976,696.60 |
| Imprevistos 1.00% | 2,098,834.83 |
| Utilidad 4.00% | 8,395,339.32 |
| IVA 19% | 1,595,114.47 |
| **Total a Pagar** | 263,949,468.22 |

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR CUENTA BANCO CAJA SOCIAL CONSORCIO SACUDETE BALBOA NUMERO 24140453560

A esta factura de venta se le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los productos o prestación de servicios descritos en este título valor. **Número Autorización Electrónica 18764082536407 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 3 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica [711] Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (tarifa 8
CUFE: 0a2fa8f0ce651a92ec79a7a3f0a3845223ceb7fa8f7d8d31ae33eca774717bea37ea28a713ba71bd1a1023

Factura de Software y Tecnología Desarrollada por Siigo S.A. Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica generada en el SIIGO

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| **Cuenta a Debitar** | **Valor** | **Cuenta Destino** |
|---|---|---|
| 457253005106 | 201.871.180 | 24140453560 Cuenta de Ahorros De Banco Caja social a nombre de Consorcio sacudete Balboa Nit 901.574.342 |
| **TOTAL** | **201.871.180** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**REINEL CASTAÑEDA MARQUEZ**
Tesorero General

**Proyectó:** Reinel Castañeda Márquez – Tesorero General.
**Revisó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.
**Aprobó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.



# La operación solicitada se realizó correctamente

| | |
|---|---|
| Número de Cuenta Origen: | *****5106 |
| Número de Cuenta Destino: | BANCO CAJA SOCIAL - *****3560 |
| Valor Transferencia: | $ 201.871.180,00 |
| Fecha y Hora: | 27/11/2024 5:31:37 p. m. |
| Dirección IP: | 200.10.28.164 |
| Costo de la transacción: | $ 0,00 + IVA |
| Número de aprobación: | 1453532444 |
| Tipo transacción: | Transferencia Interbancaria |

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

**CONCILIACION BANCARIA**
**CUENTA No 45725300510 - 6**
**BANCO AGRARIO - PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE**
**ABRIL DE 2025**

| FECHA | | VALOR |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | SALDO LIBROS | 237.513.049,74 |
| 30/04/2025 | SALDO SEGÚN EXTRACTO | 237.513.049,74 |
| | **DIFERENCIA EN LIBROS** | **0,00** |

## MENOS

| FECHA | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | CHEQUE No. | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | **TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO** | | **0,00** |

| FECHA | CONSIGNACIONES O TRANSF EN TRANSITO | VALOR |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | **TOTAL CONSIGNACIONES EN TRANSITO** | **0,00** |

## MÁS

| FECHA | TRANSFERENCIAS DE COMUNES A OTROS | VALOR |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | **TOTAL TRANSFERENCIAS DE COMUNES A OTROS** | **0,00** |

| TOTAL DIFERENCIA | 0,00 |
|---|---|

**JANETH MILENA HERRERA MARTÍNEZ.**
Auxiliar Administrativo

**VoBo Secretaria de Hacienda**

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones tu dinero está asegurado

| | |
|---|---|
| NOMBRE | MUNICIPIO DE BALBOA , |
| DIRECCIÓN | CL 8 6 44 |
| CIUDAD | RISARALDA, BALBOA |

| MES | ABRIL | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 270.861.506,98 | SALDO ACTUAL | 237.513.049,74 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 382.673,00 | PROMEDIO MES | 253.077.462,85 |
| TOTAL CARGOS | 1 | 33.731.130,24 | INTERESES | 382.673,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.239,00 | 270.874.745,98 |
| 02/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.240,00 | 270.887.985,98 |
| 03/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.240,00 | 270.901.225,98 |
| 04/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.725,00 | 270.940.950,98 |
| 07/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.243,00 | 270.954.193,98 |
| 08/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.244,00 | 270.967.437,98 |
| 09/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.244,00 | 270.980.681,98 |
| 10/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.245,00 | 270.993.926,98 |
| 11/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.739,00 | 271.033.665,98 |
| 14/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.247,00 | 271.046.912,98 |
| 15/04 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -33.731.130,24 | 237.315.782,74 |
| 15/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.599,00 | 237.327.381,74 |
| 16/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 58.006,00 | 237.385.387,74 |
| 21/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.603,00 | 237.396.990,74 |
| 22/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.603,00 | 237.408.593,74 |
| 23/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.604,00 | 237.420.197,74 |
| 24/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.605,00 | 237.431.802,74 |
| 25/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 34.817,00 | 237.466.619,74 |
| 28/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.607,00 | 237.478.226,74 |
| 29/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.607,00 | 237.489.833,74 |
| 30/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 23.216,00 | 237.513.049,74 |

NIT 800 037 800 8
VIGILADO
Autorregulado por amv
Consejo Solucionador de Controversias S.A.S. NIT 900.896.812-9 Sol 01



Cualquier reclamo por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Director: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 324 674 96 50 Fax: +57 (1) 218 86 44 | Oficina: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6, Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez. Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales. Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o el e-mail: Raquel.rivera@pwc.com Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Conozca Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. Jose Guillermo Peña González: (1) 2121270 - Fax: (1) 2130495. Correo electrónico: defensorfinanciero@pgabogados.com Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA
# 890801143-1
# MOVIMIENTO AUXILIAR

**Desde:** 0401 **Hasta:** 0430 **Vigencia:** 2025



| Fecha | Documento | Concepto | Tercero | No Cheque | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11100631** | | **BANCO AGRARIO 45725300510 - 6 PROYECTO** | **270.861.506,98** | | **382.673,00** | **33.731.130,24** | **237.513.049,74** |
| 15/04/2025 | CE 678 | PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DI | 901574342 CONSORCIO SACUDETE BALI | | 0,00 | 33.731.130,24 | |
| 30/04/2025 | NC 449 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE | 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMI | | 382.673,00 | 0,00 | |

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## 890801143-1

## OP 679 COMPROBANTE DE EGRESO No. 00678

FECHA martes, 15 abril, 2025 VALOR OP **41.519.300,24** **VALOR NETO** **33.731.130,24**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 6 ANEXA.

LA SUMA DE TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS VEINTI CUATR

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 33.731.130,24 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 33.731.130,24 | 0,00 | | | |
| | **33.731.130,24** | **33.731.130,24** | | | |

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 00679

FECHA 2025/04/12

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS VEINTI CUATRO CENTAVOS MCTE. $41.519.300,24

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 6 ANEXA.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| RUBRO | | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 342 | 551 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 41.519.300,24 |
| | | | | | | **TOTAL** | **41.519.300,24** |

### CONTABILIDAD

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 461.235,00 |
| 13058504 | 0,00 | 2.427.552,00 |
| 13058801 | 0,00 | 1.942.042,00 |
| 13058802 | 0,00 | 728.266,00 |
| 13110101 | 0,00 | 1.213.776,00 |
| 17100501 | 41.519.300,24 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 33.731.130,24 |
| 24362502 | 0,00 | 44.278,00 |
| 24362601 | 0,00 | 971.021,00 |
| **TOTAL** | **41.519.300,24** | **41.519.300,24** |

### DESCUENTOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TASA CULTURAL 1.5% | 728.266,00 |
| LEY 418/97 CONTRATO VIAS 5%_ | 2.427.552,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 44.278,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 461.235,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 1.942.042,00 |
| RETFTE CONTRATOS DE OBRA 2% | 971.021,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 1.213.776,00 |
| **TOTAL** | **7.788.170,00** |

### ANEXOS

| DESCRIPCIÓN | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

VALOR ORDEN **41.519.300,24**


DESCUENTOS **7.788.170,00**

NETO A PAGAR **33.731.130,24**

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas


Elaboró CONTA

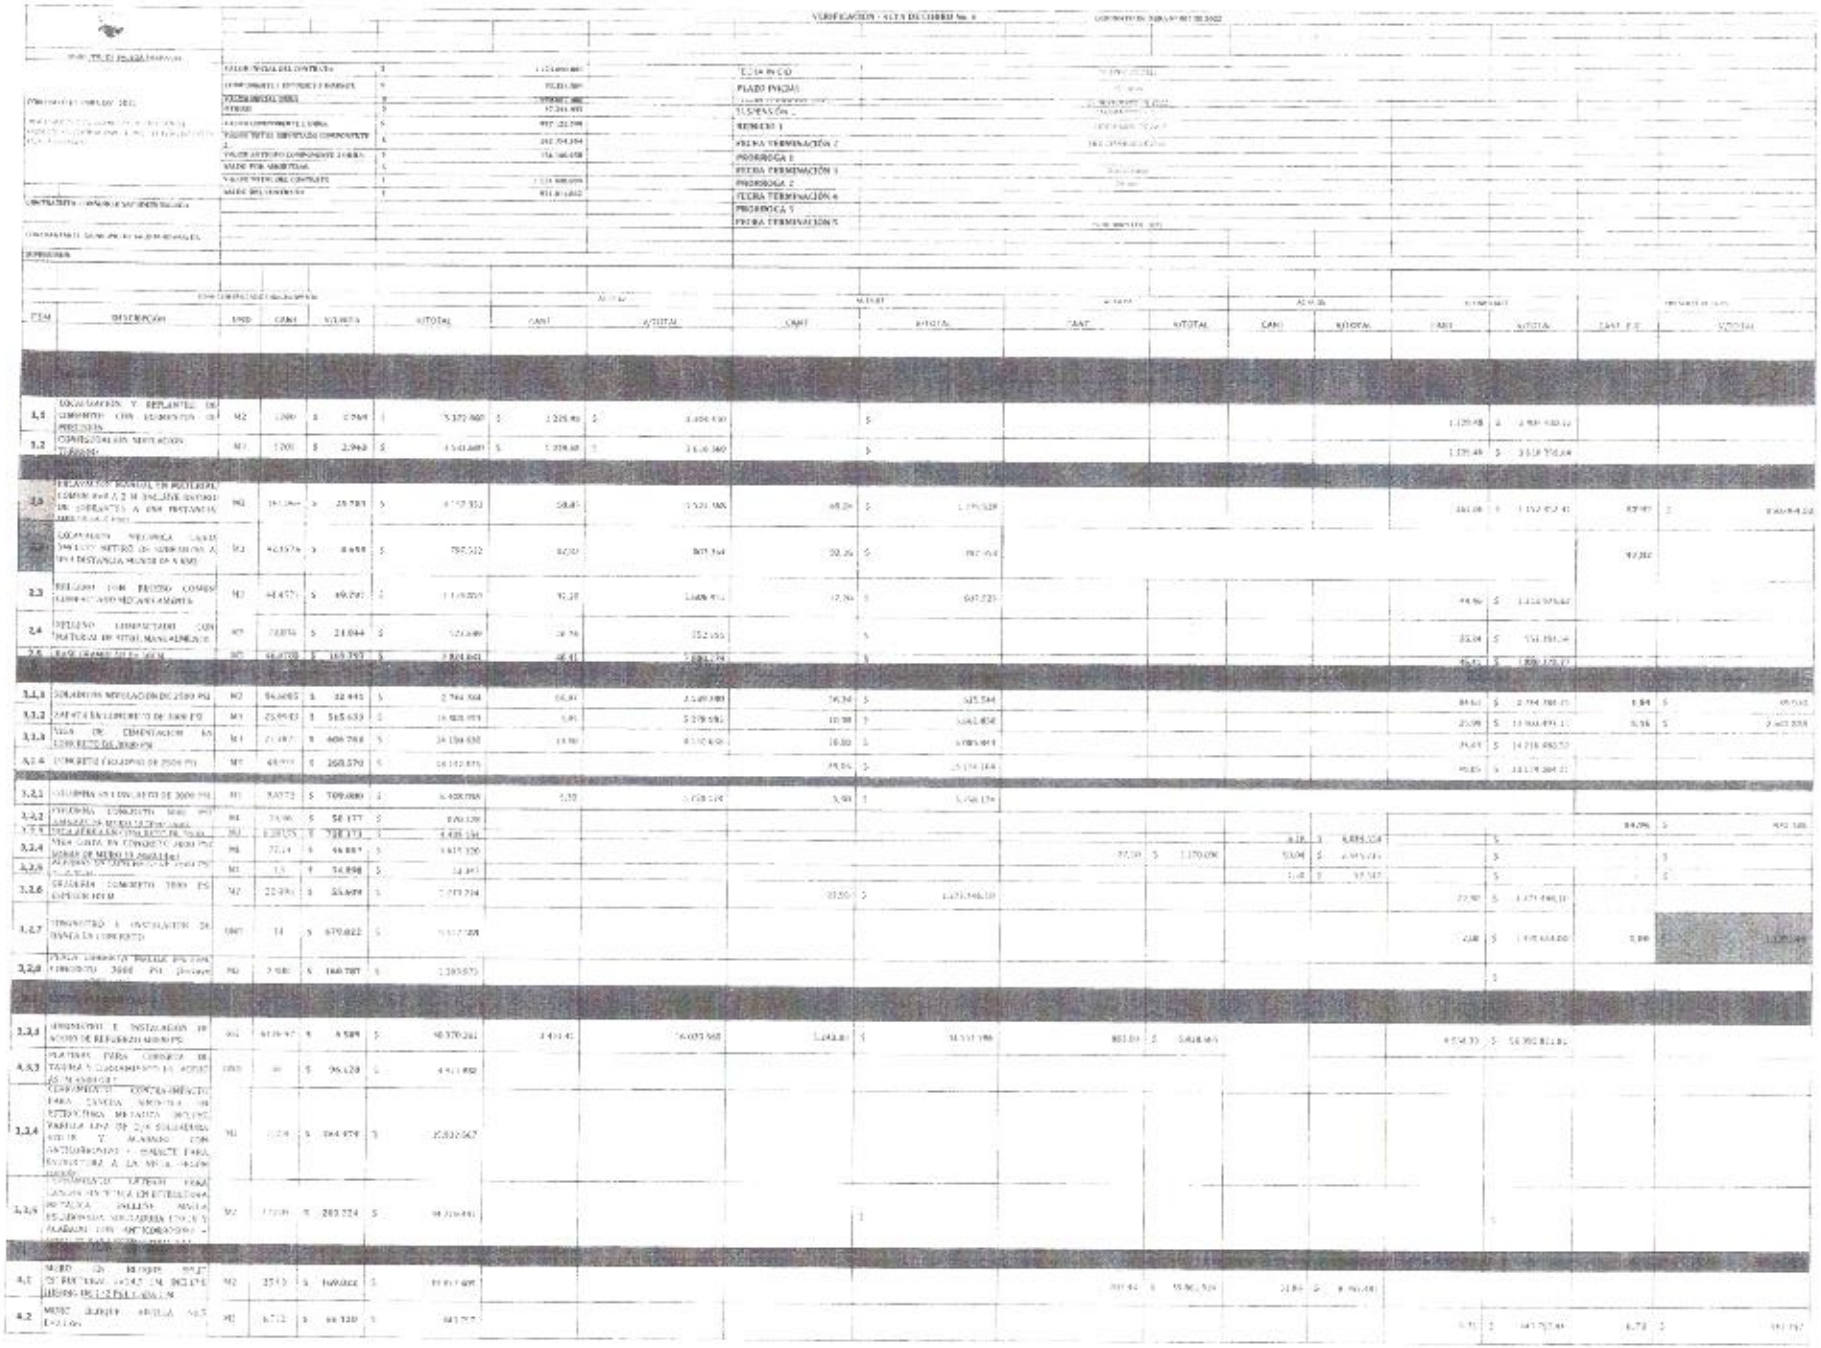






VERIFICACIÓN - ACTA DE CORTE No. 6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

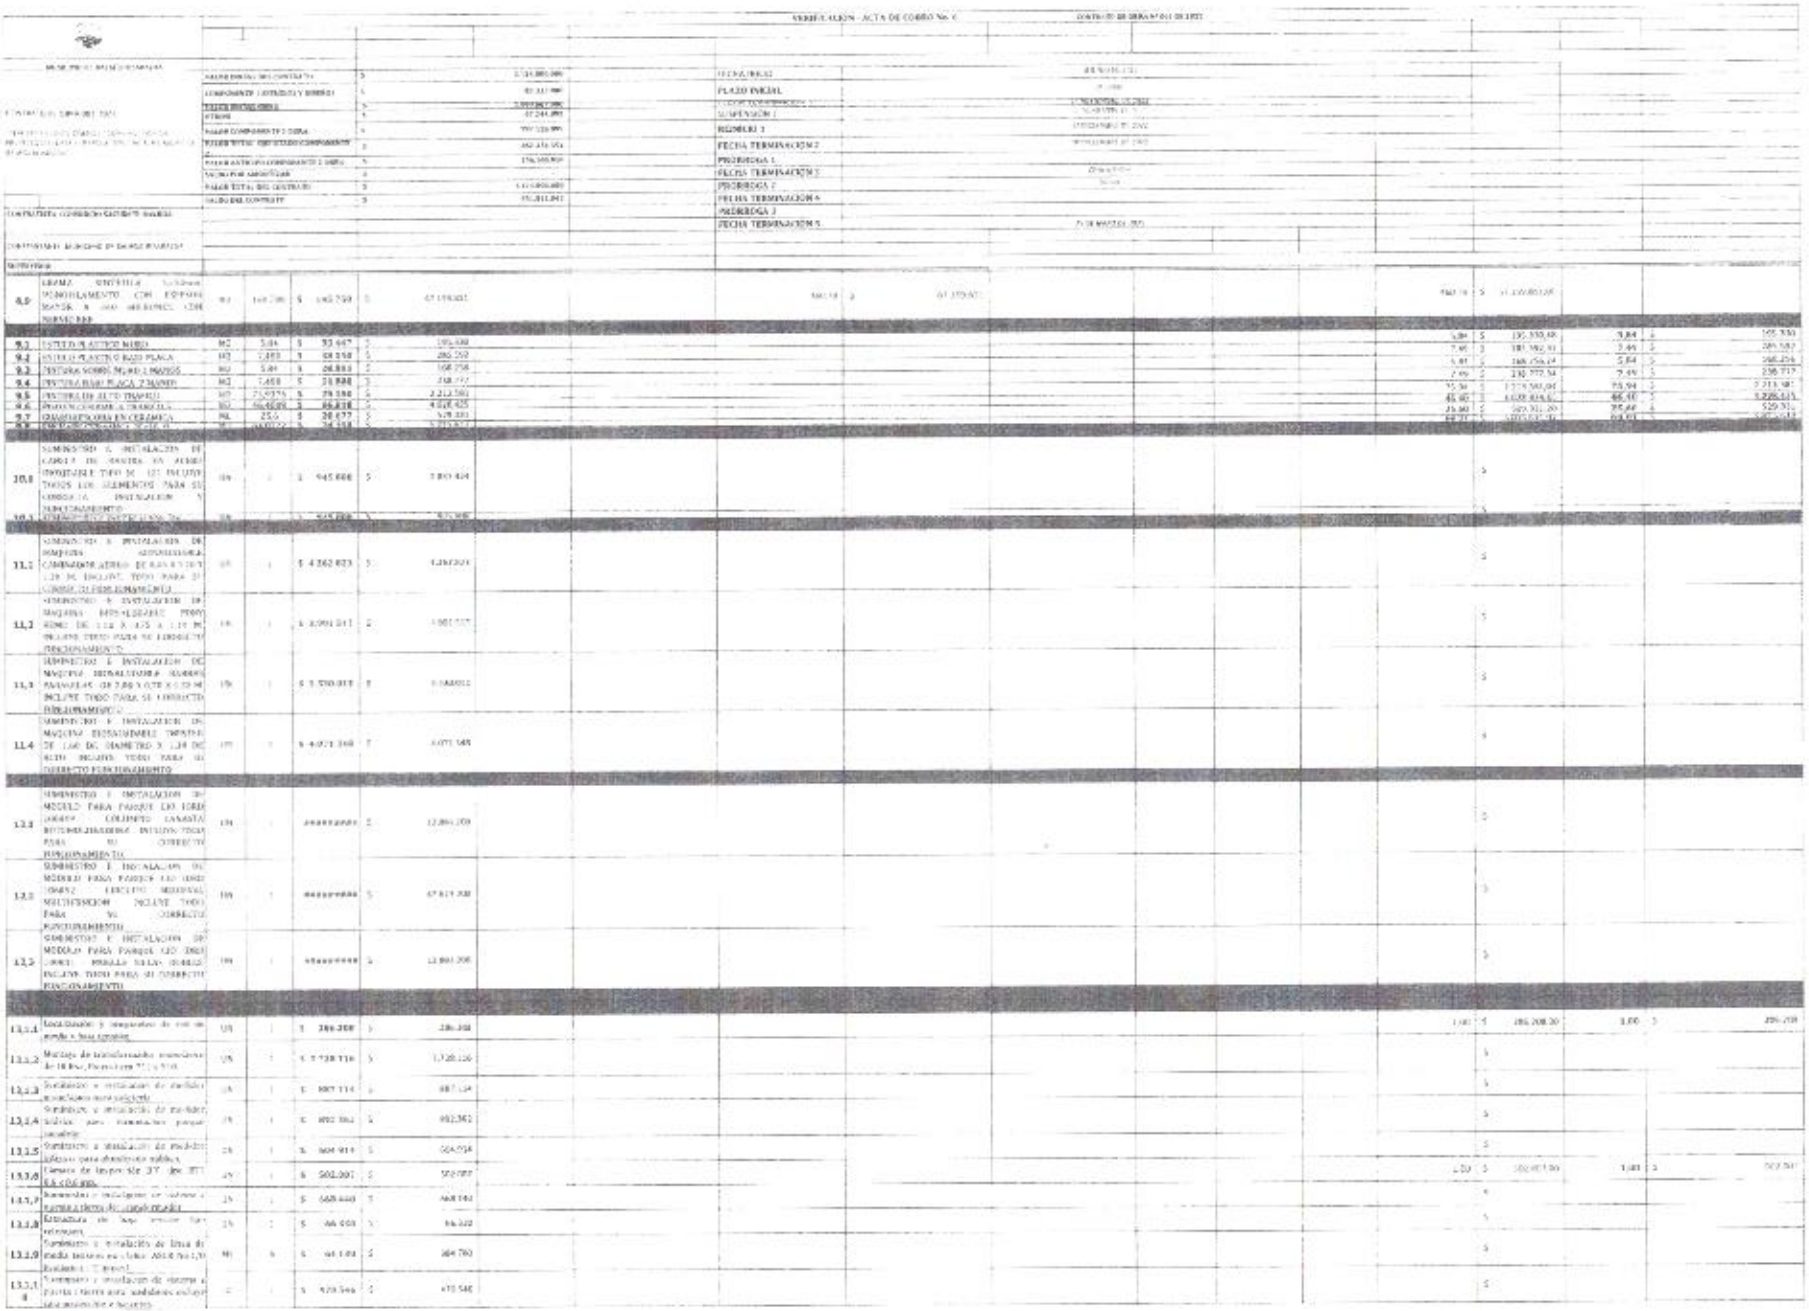

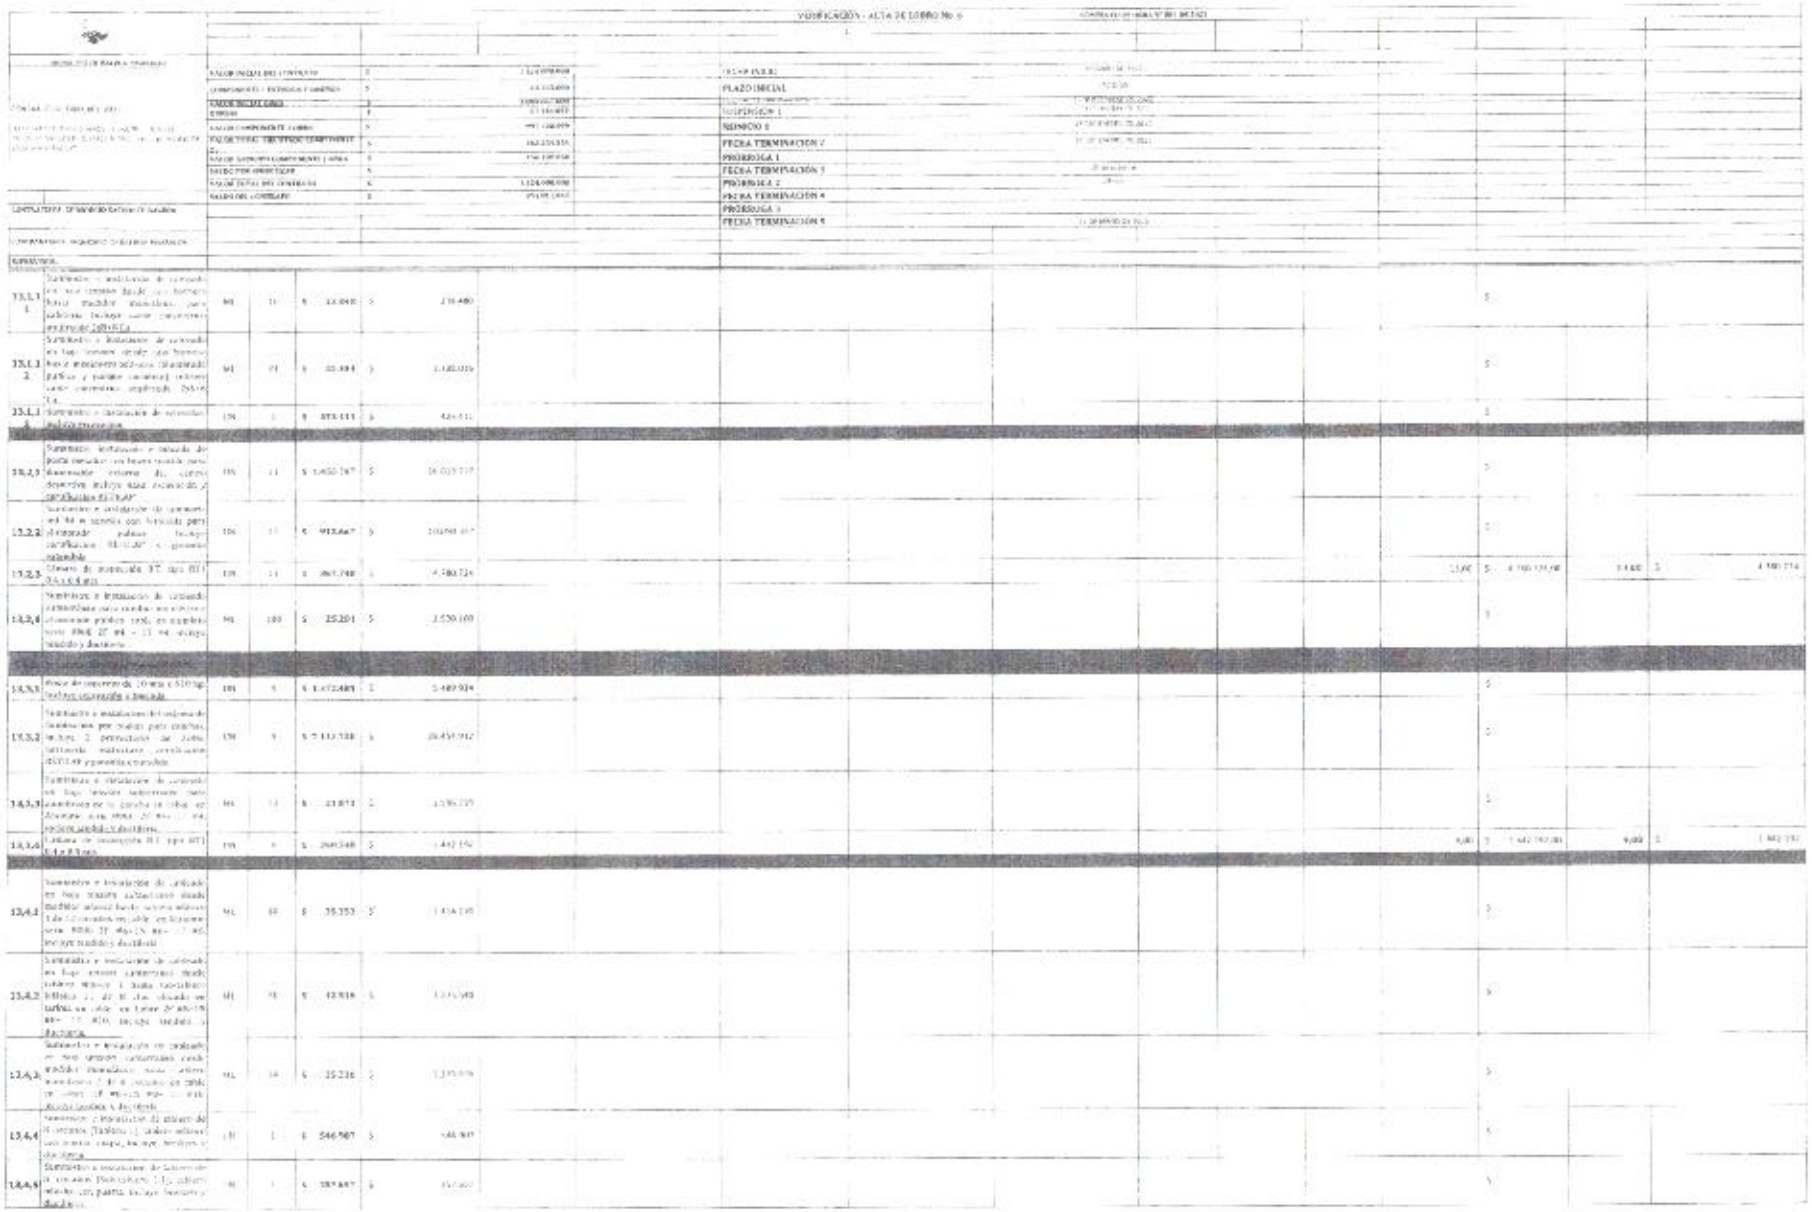

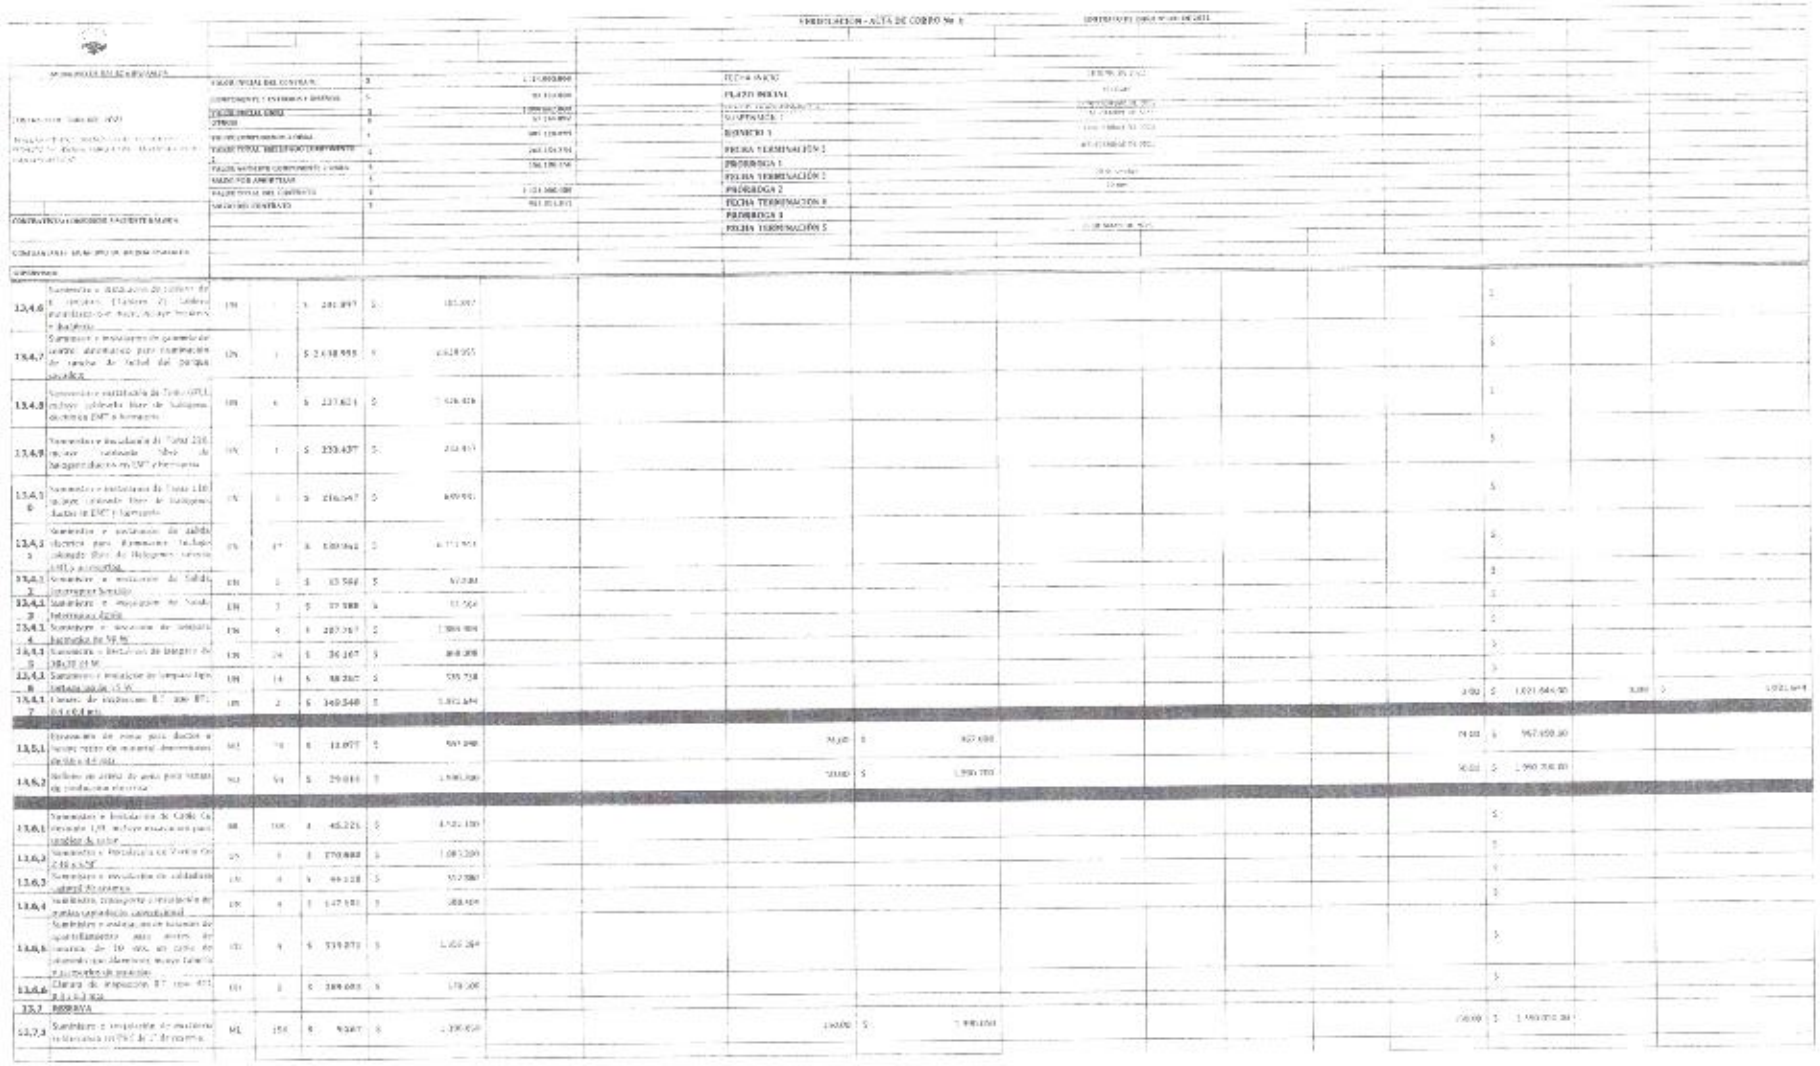

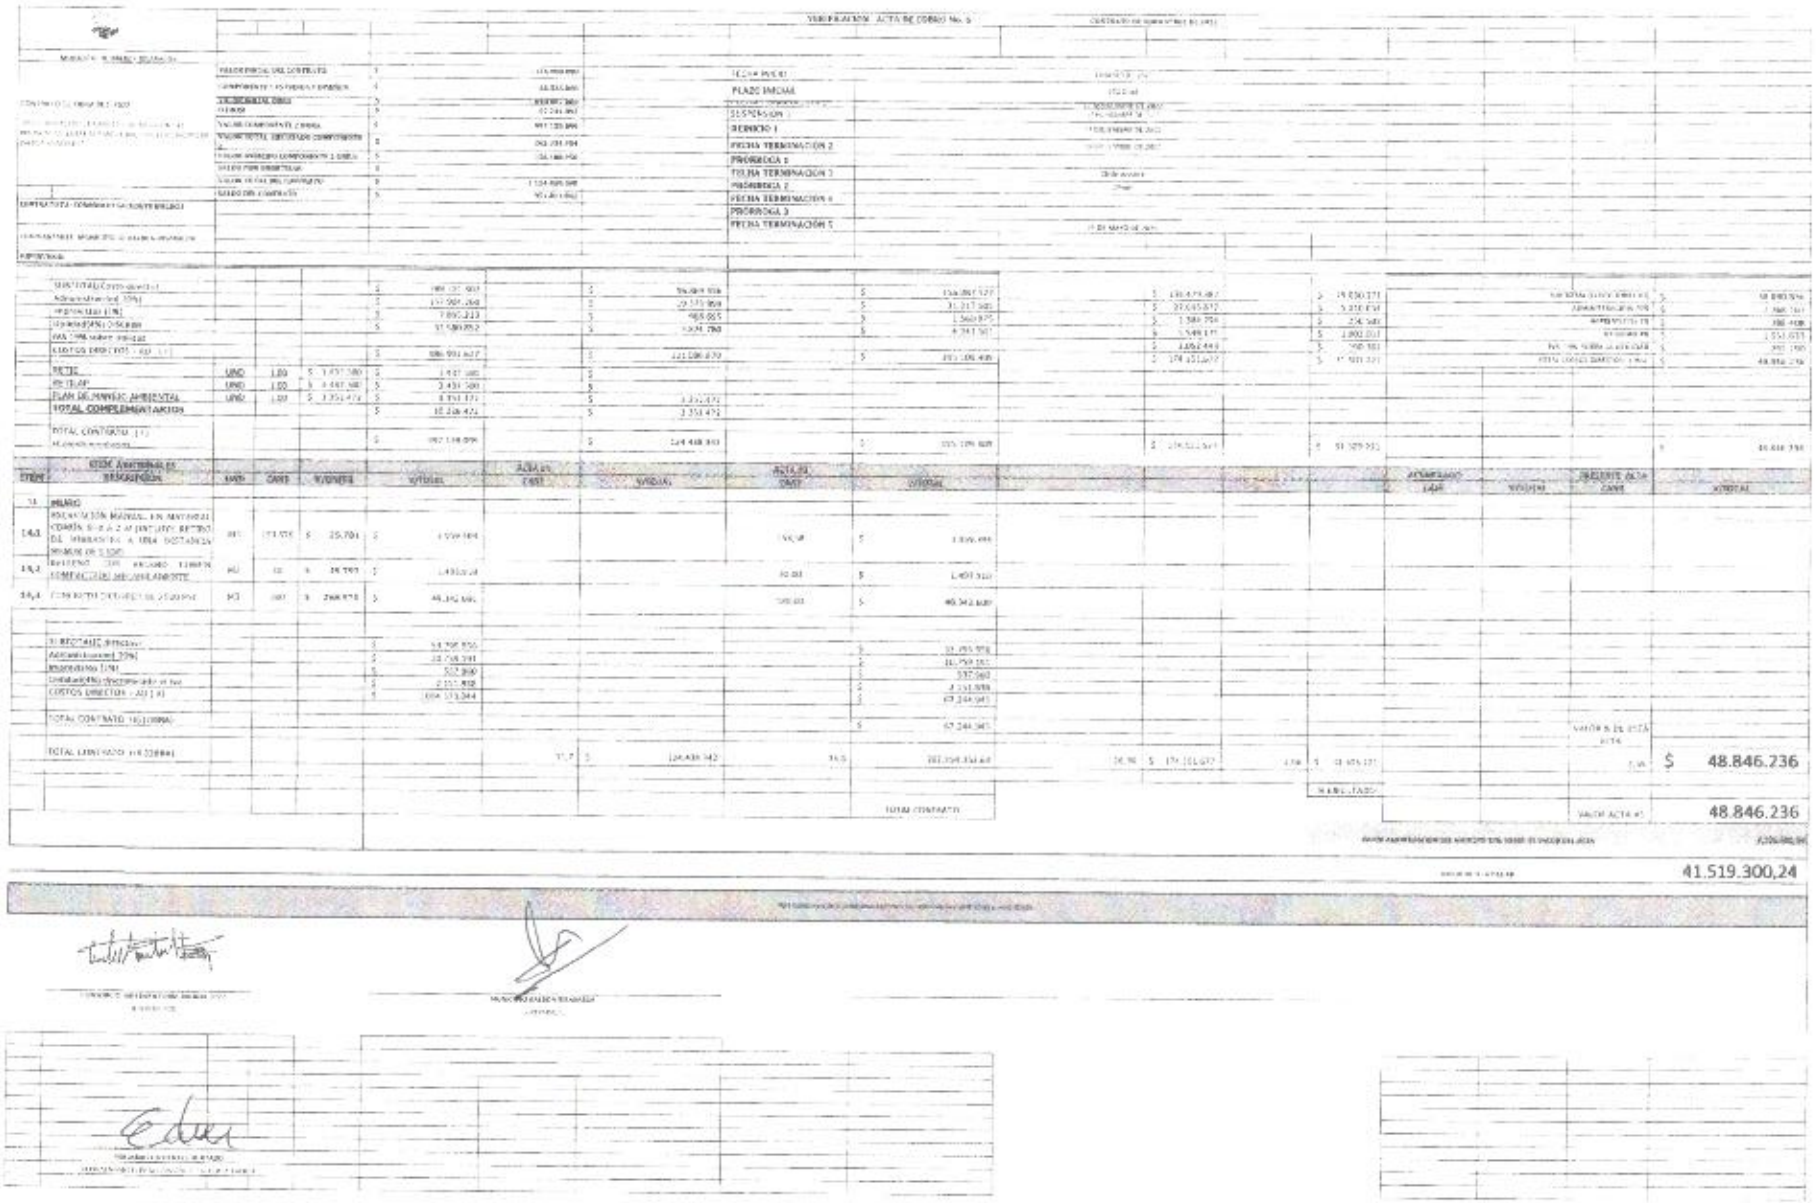

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL | ACTA #1 CANT | ACTA #1 V/PARCIAL | ACTA #2 CANT | ACTA #2 V/PARCIAL | | | | | ACUMULADO | | PRESENTE ACTA | |
| | | | | | | | | | | | | | | CANT | V/PARCIAL | CANT | V/PARCIAL |
| 14 | MURO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, H = 0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM) | M3 | 173,970 | $ 25.701 | $ 4.599.184 | | | 56,08 | $ 1.599.999 | | | | | | | | |
| 14,2 | RELLENO CON RECIBO Y BOTON COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 50 | $ 28.999 | $ 1.450.000 | | | 50,00 | $ 1.451.500 | | | | | | | | |
| 14,4 | CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 180 | $ 268.979 | $ 48.416.586 | | | 180,00 | $ 48.342.600 | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL (Costo directo) | | | | $ 54.466.770 | | | | $ 51.394.099 | | | | | | | | |
| | Administración (5%) | | | | $ 2.723.339 | | | | $ 2.569.705 | | | | | | | | |
| | IMPREVISTOS (1%) | | | | $ 544.668 | | | | $ 513.941 | | | | | | | | |
| | Utilidad (5%) O BONIFICACIÓN | | | | $ 2.723.339 | | | | $ 2.569.705 | | | | | | | | |
| | IVA (19% sobre utilidad) | | | | $ 517.434 | | | | $ 488.244 | | | | | | | | |
| | COSTOS DIRECTOS + AIU (14) | | | | $ 61.975.550 | | | | $ 58.465.694 | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO (14) | | | | $ 61.975.550 | | | | $ 58.465.694 | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | | | | | 37,7 | $ 124.439.342 | 34,5 | $ 113.704.134,64 | 28,96 | $ 171.161.077 | 2,86 | $ 16.904.171 | | | 2,86 | $ 48.846.236 |
| | | | | | | | | | TOTAL CONTRATO | | | | | VALOR ACTA #1 | | | 48.846.236 |

41.519.300,24

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**
NIT 901.574.342-5
CR 15 # 148-75 TORRE 4 304
Tel (604) 3735686
Montería - Colombia
gerenciaecolaqua@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 12**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BALBOA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 890.801.143-1 | **Teléfono** | (606) 3146208880 - Ext. 000 - (606) 3146382479 - Ext. 000 | **Generación** | 10/04/2025, 18:54 |
| | | | | **Expedición** | 10/04/2025, 18:54 |
| **Dirección** | CLL 8 NO 6-44 | **Ciudad** | Risaralda - Colombia | **Vencimiento** | 10/04/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA 06 CONTRATO DE OBRA 001-2022 OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SOBRE ESTA ACTA DEL 15% $7326935,34 | 1.00 | 39,136,026.35 |

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**
Cuarenta y ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos m/cte con treinta y cinco cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+I) - Transferencia $ 48,846,235.35

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 38,840,836.00 |
| Administración 20.00% | 7,768,167.20 |
| Imprevistos 1.00% | 388,408.36 |
| Utilidad 4.00% | 1,553,633.44 |
| IVA 19% | 295,190.35 |
| **Total a Pagar** | **48,846,235.35** |

**Observaciones:**
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL CONSORCIO SACUDETE BALBOA
CUENTA BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS NUMERO 24140453560

Soporte, software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 - Número interno Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.10

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082536407 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 3 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0
**CUFE:** f179ba2b353158cd4d7e6a43a9ff5f322634acb64bb105af301c440fac66195fb1a44d75defef43dc7a03B3c539e0fcb4

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| Cuenta a Debitar | Valor | Cuenta Destino |
|---|---|---|
| 457253005106 | 33.731.130,24 | 24140453560 Cuenta de Ahorros De Banco Caja social a nombre de Consorcio sacudete Balboa Nit 901.574.342 |
| **TOTAL** | **33.731.130,24** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**KELLY LEANDRA CANDAMIL F.**
Tesorera General

Proyectó: Kelly Leandra Candamil Foronda – Tesorera General
Revisó: Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda.
Aprobó: Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda.

MUNICIPIO DE BALBOA MPIO : KELLY LEANDRA CANDAMIL FORONDA

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar $ 33.731.130,24

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONSORCIO SACUDETE BALBOA

******3560**

Monto a acreditar $ 33.731.130,24

**Monto $**
**33.731.130,24**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 001

Descripción: pago contrato

15/04/2025 - 01:58:48 p. m. | IP actual: 200.10.28.164

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp



# La operación solicitada se realizó correctamente

| | |
|---|---|
| Número de Cuenta Origen: | *****5106 |
| Número de Cuenta Destino: | BANCO CAJA SOCIAL - ****3560 |
| Valor Transferencia: | $ 33.731.130,24 |
| Fecha y Hora: | 15/04/2025 2:16:48 p. m. |
| Dirección IP: | 200.10.28.164 |
| Costo de la transacción: | $ 0,00 + IVA |
| Número de aprobación: | 97132777 |
| Tipo transacción: | Transferencia Interbancaria |

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

**OP 605** **COMPROBANTE DE EGRESO No. 00618**

FECHA martes, 8 abril, 2025 VALOR OP **30.914.911,00** **VALOR NETO** **30.914.911,00**

PAGADO A: MINISTERIO DEL INTERIOR 830114475

CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE TRANSFDERENCIA DE RECURSOS DEL FONSECON CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2001 DE 2021 - EJECUCIÓN PROYECTO SACÚEDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN RESOLUCION ANEXA.

LA SUMA DE TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS

PÁGUESE A: MINISTERIO DEL INTERIOR

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100521 | 0,00 | 30.914.911,00 | | 357250000605 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 31090101 | 30.914.911,00 | 0,00 | | | |
| | **30.914.911,00** | **30.914.911,00** | | | |

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

25 AÑOS

## Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Valor de la transacción | $30,914,911.00 |
| IVA | $0.00 |
| Nombre del comercio | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Descripción del pago | Obra Pública 5% |
| Número de recibo | 14509 |
| Número de transacción (CUS) | 1387874903 |
| Estado | APROBADO |
| Cuenta origen | ********0605 |
| Tipo operación | Débito a cuenta por internet |
| Fecha | 04/04/2025 1:50:16 PM |
| IP | 10.40.4.37 |
| Referencia 1 | 200.10.28.164 |
| Referencia 2 | 2001-2021 |
| Referencia 3 | 1250000000 |
| Pago recurrente | NO |

# RESOLUCION NÚMERO 000169

04 ABR. 2025

**"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DEL INTERIOR"**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BALBOA RISARALDA, en uso de las atribuciones legales y constitucionales, ley 1106 de 2006, Ley 1738 de 2014 y,

**CONSIDERANDO:**

A. Que el Municipio de Balboa firmó Convenio Interadministrativo No.2001 de 2021 con la Nación-Ministerio del Interior-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSECON, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

B. Que cuando las Entidades Territoriales celebran contratos de obra pública cuyos recursos provienen de convenios con Entidades del Orden Nacional, en este caso Ministerio del Interior, la contribución al FONSECON debe ser proporcional a la participación de los recursos del Ministerio, con el fin de dar cumplimiento al parágrafo 3° del Artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, prorrogada mediante la Ley 1738 de 2014 y en cumplimiento de la Circular Externa No.24 de 2024 expedida por el Ministerio del Interior.

C. Que de acuerdo a las órdenes de pago canceladas al Consorcio Sacúdete Balboa Nit 901574342-5, en ejecución del Contrato de Obra Pública No.001 de 2022, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo No.2001/2021, los descuentos realizados por concepto del 5% de Contribución de Contratos de Obra Pública registran un valor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MCTE ($30.914.911).

D. Que los recursos antes mencionados por concepto de descuentos del 5% de Contribución de Contratos de Obra Pública, deben ser devueltos al Ministerio del Interior.

E. Que por lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda y Finanzas del municipio de Balboa para que transfiera al Ministerio del Interior la suma de TREINTA MILLONES NVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MCTE ($30.914.911,00), a la cuenta corriente No. 30230000026-2 Dirección Tesoro Nacional, por concepto de descuentos del 5% de Contribución de Contratos de Obra Pública en cumplimiento al parágrafo 3° del Artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, prorrogada mediante la Ley 1738 de 2014.

**ARTICULO SEGUNDO:** La suma autorizada se transferirá al Ministerio del Interior, como un giro de tesorería sin afectación del presupuesto, dado que los recursos no fueron adicionados al presupuesto de la vigencia 2025.

**ARTICULO TERCERO:** - La presente rige a partir de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Balboa - Risaralda, a los 04 Abr. 2025

**JOSE ERNESTO MIRANDA MÁRQUEZ**
Alcalde Municipal

Proyectó y Elaboró: Carlos Augusto Villada (Asesor Externo)
Revisó: Yurley Arias Duque- Secretaria de Hacienda y Finanzas

Archivado en: Serie: 10000.47.01 Resoluciones

Interior

# Formato de Registro Recaudo Contribución - FONSECON

Fonsecon

**Entidad Retenedora del Nivel Nacional:** MUNICIPIO DE BALBOA **Nit de la Entidad Retenedora** 890801143-1

| A | B | C | D | E | F | G | | H | I | J | K | L | | | M | N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | No. Contrato | Fecha de Inicio Contrato D/M/A | Fecha de Terminación Contrato D/M/A | Nombre o Razón Social del Contratista | NIT o CC | Tipo de Contrato | | Valor del Contrato | Valor de las Adiciones (Si las Hay) | Valor TOTAL de la Contribución según Contrato | Valor Retenido | Fecha de la Retención | | | Valor Consignado | Fecha de Consignación | | |
| | | | | | | Obra Pública | Concesión | | | | | D | M | A | | D | M | A |
| 2024 | 001 del 3 mayo 2022 | 22/06/2022 | vigente | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | 901574342-5 | X | | 1.024.000.000 | 67.244.892 | 1.091.244.892 | 151.531.791 | 31 | 10 | 24 | 7.576.590 | 4 | 4 | 25 |
| | | | | | | | | | | | 262.354.354 | 27 | 11 | 24 | 13.117.718 | 4 | 4 | 25 |
| | | | | | | | | | | | 173.099.234 | 19 | 12 | 24 | 8.654.962 | 4 | 4 | 25 |
| | | | | | | | | | | | 31.312.839 | 26 | 2 | 24 | 1.565.642 | 4 | 4 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pagador de la Entidad responsable de la Retención y Consignación**

**Nombre y Apellidos:** JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ

**Correo Electrónico:** hacienda@balboa-risaralda.gov.co

**Teléfono:** 3147559064

**Dirección Entidad** calle 8 No.6-44 Balboa Risaralda

**Certificado por el CONTADOR**

**CARLOS ALBEIRO GUEVARA MONTES**

**Tarjeta No. 93481-T**

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

25 AÑOS

# Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Valor de la transacción | $30,914,911.00 |
| IVA | $0.00 |
| Nombre del comercio | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Descripción del pago | Obra Pública 5% |
| Número de recibo | 14509 |
| Número de transacción (CUS) | 1387874903 |
| Estado | APROBADO |
| Cuenta origen | ********0605 |
| Tipo operación | Débito a cuenta por internet |
| Fecha | 04/04/2025 1:50:16 PM |
| IP | 10.40.4.37 |
| Referencia 1 | 200.10.28.164 |
| Referencia 2 | 2001-2021 |
| Referencia 3 | 1250000000 |
| Pago recurrente | NO |

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado
Depósito seguro de Fogafin
www.fogafin.gov.co

| | |
|---|---|
| NOMBRE | MUNICIPIO DE BALBOA , |
| DIRECCIÓN | CL 8 6 44 |
| CIUDAD | RISARALDA, BALBOA |

| MES | FEBRERO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 298.427.274,98 | SALDO ACTUAL | 275.500.319,98 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 402.988,00 | PROMEDIO MES | 296.115.973,23 |
| TOTAL CARGOS | 1 | 23.329.943,00 | INTERESES | 402.988,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.586,00 | 298.441.860,98 |
| 04/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.587,00 | 298.456.447,98 |
| 05/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.588,00 | 298.471.035,98 |
| 06/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.589,00 | 298.485.624,98 |
| 07/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.770,00 | 298.529.394,98 |
| 10/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.591,00 | 298.543.985,98 |
| 11/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.592,00 | 298.558.577,98 |
| 12/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.593,00 | 298.573.170,98 |
| 13/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.594,00 | 298.587.764,98 |
| 14/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.785,00 | 298.631.549,98 |
| 17/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.596,00 | 298.646.145,98 |
| 18/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.597,00 | 298.660.742,98 |
| 19/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.598,00 | 298.675.340,98 |
| 20/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.599,00 | 298.689.939,98 |
| 21/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.800,00 | 298.733.739,98 |
| 24/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.601,00 | 298.748.340,98 |
| 25/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.602,00 | 298.762.942,98 |
| 26/02 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -23.329.943,00 | 275.432.999,98 |
| 26/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.463,00 | 275.446.462,98 |
| 27/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.463,00 | 275.459.925,98 |
| 28/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.394,00 | 275.500.319,98 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | ENERO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 334.855.154,98 | SALDO ACTUAL | 298.427.274,98 |
| TOTAL ABONOS | 21 | 515.111,00 | PROMEDIO MES | 331.534.162,82 |
| TOTAL CARGOS | 6 | 36.942.991,00 | INTERESES | 515.111,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.367,00 | 334.871.521,98 |
| 03/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 65.476,00 | 334.936.997,98 |
| 07/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.371,00 | 334.953.368,98 |
| 08/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.372,00 | 334.969.740,98 |
| 09/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.373,00 | 334.986.113,98 |
| 10/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.122,00 | 335.035.235,98 |
| 13/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.376,00 | 335.051.611,98 |
| 14/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.377,00 | 335.067.988,98 |
| 15/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.377,00 | 335.084.365,98 |
| 16/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.378,00 | 335.100.743,98 |
| 17/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.139,00 | 335.149.882,98 |
| 20/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.381,00 | 335.166.263,98 |
| 21/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.382,00 | 335.182.645,98 |
| 22/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.383,00 | 335.199.028,98 |
| 23/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.384,00 | 335.215.412,98 |
| 24/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.156,00 | 335.264.568,98 |
| 27/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.387,00 | 335.280.955,98 |
| 28/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.388,00 | 335.297.343,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -8.533.758,00 | 326.763.585,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -2.026.768,00 | 324.736.817,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -9.193.744,00 | 315.543.073,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -8.654.962,00 | 306.888.111,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.200.160,00 | 303.687.951,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -5.333.599,00 | 298.354.352,98 |
| 29/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.583,00 | 298.368.935,98 |
| 30/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.584,00 | 298.383.519,98 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.755,00 | 298.427.274,98 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA
## 890801143-1

**OP 272** **COMPROBANTE DE EGRESO No. 00269**

FECHA miércoles, 26 febrero, 2025 VALOR OP **28.352.899,00** **VALOR NETO** **23.329.943,00**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 5 ANEXA.

LA SUMA DE VEINTI TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 23.329.943,00 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 23.329.943,00 | 0,00 | | | |
| | **23.329.943,00** | **23.329.943,00** | | | |

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

## ORDEN DE PAGO

PAG 1

NRO 00272

FECHA 2025/02/26

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR VEINTI OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. $28.352.899,00

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 5 ANEXA.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| RUBRO | | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 342 | 551 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 28.352.899,00 |
| | | | | | | **TOTAL** | **28.352.899,00** |

### CONTABILIDAD

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 297.472,00 |
| 13058504 | 0,00 | 1.565.642,00 |
| 13058801 | 0,00 | 1.252.514,00 |
| 13058802 | 0,00 | 469.693,00 |
| 13110101 | 0,00 | 782.821,00 |
| 17100501 | 28.352.899,00 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 23.329.943,00 |
| 24362502 | 0,00 | 28.557,00 |
| 24362601 | 0,00 | 626.257,00 |
| **TOTAL** | **28.352.899,00** | **28.352.899,00** |

### DESCUENTOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TASA CULTURAL 1.5% | 469.693,00 |
| LEY 418/97 CONTRATO VIAS 5% | 1.565.642,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 28.557,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 297.472,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 1.252.514,00 |
| RETFTE CONTRATOS DE OBRA 2% | 626.257,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 782.821,00 |
| **TOTAL** | **5.022.956,00** |

### ANEXOS

| DESCRIPCIÓN | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

VALOR ORDEN **28.352.899,00**

DESCUENTOS **5.022.956,00**

NETO A PAGAR **23.329.943,00**

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO REGISTROS PRESUPUESTALES

PAG. 1

NRO 0342

FECHA 25/02/2025

SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS E INFRAE | ENVIADO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINAN

CONTRATANTE ALCALDE MUNICIPAL | CON CARGO AL CDP NRO 0247 | DE 25/02/2025

NIT 901574342 DV 5 | BENEFICIARIO CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Cuatrocientos Veinti Siete Millones Ochocientos Sesenta y Dos mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos MCte. $427.862.341,00

La suscrita Auxiliar Administrativa, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | RUBRO/RE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit 13 RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | 416.717.499,00 |
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_151.0 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores 15 RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | RESERVAS | 11.144.842,00 |

Elaboró: CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO REGISTROS PRESUPUESTALES

PAG. 2

NRO 0342

FECHA 25/02/2025

SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS E INFRAE | ENVIADO SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINAN

CONTRATANTE ALCALDE MUNICIPAL | CON CARGO AL CDP NRO 0247 | DE 25/02/2025

NIT 901574342 DV 5 | BENEFICIARIO CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Cuatrocientos Veinti Siete Millones Ochocientos Sesenta y Dos mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos MCte. $427.862.341,00

La suscrita Auxiliar Administrativa, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| CÓDIGO | RUBRO/RE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL | **427.862.341,00** |

**REINTEGROS CRP** 342

| Codigo | Valor Rubro |
|---|---|

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA

PAG. 1

NRO 0247

FECHA 2025/02/25

SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS E INFRAE | ENVIADO SECRETARÌA DE HACIENDA Y FINAN

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Cuatrocientos Veinti Siete Millones Ochocientos Sesenta y Dos mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos MCte. $427.862.341,00

La suscrita Auxiliar Administrativa , CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del compromiso, hay disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| DISPO | CÓDIGO | VALOR | RUBRO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_151.0 | 11.144.842,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | RESERVAS |
| 582 | 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | 416.717.499,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS |


AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

| SUPERVISOR: | VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 5 | CONTRATO DE OBRA Nº 003 DE 2022 |
|---|---|---|

| ITEM CONTRATADO INICIALMENTE | | | | | | ACUMULADO | | PRESENTE ACTA (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITA | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL | CANT. 5 N | V/TOTAL |
| 1 | PRELIMINAR | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CONJUNTO CON ELEMENTOS DE PROYECCIÓN | M2 | 1220 | $ 2.759 | $ 3.413.800 | 1.259.68 | $ 3.484.439.11 | | |
| 1.2 | CONFRONTACIÓN NIVELACIÓN TERRENO | M2 | 1258 | $ 2.843 | $ 3.577.694 | 1.259.68 | $ 3.608.329.84 | | |
| 2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS | | | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 0-3 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 191,0691 | $ 33.781 | $ 6.455.492 | 191.09 | $ 6.455.067.86 | | |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA CAFO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 93,0976 | $ 8.958 | $ 769.532 | | | | |
| 2.3 | RELLENO CON RECEBO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 44,49767 | $ 69.747 | $ 3.116.858 | 44.44 | $ 3.098.974.81 | | |
| 2.4 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO MANUALMENTE | M3 | 24.849 | $ 21.044 | $ 522.969 | 26.74 | $ 562.384.56 | | |
| 2.5 | CAOS GRANULAR E=10CM | M3 | 45,07048 | $ 169.730 | $ 7.651.043 | 46.43 | $ 7.881.278.37 | | |
| 3 | CIMENTACIÓN | | | | | | | | |
| 3.1 | CIMENTACIONES | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SOLADO DE NIVELACIÓN DE 1500 PSI | M2 | 108,0695 | $ 20.461 | $ 2.190.794 | 94.58 | $ 2.760.047.38 | | |
| 3.1.2 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 35,89329 | $ 317.633 | $ 11.401.384 | 28.03 | $ 13.406.671.93 | | |
| 3.1.3 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 23,907325 | $ 636.764 | $ 15.180.843 | 29.44 | $ 20.116.480.52 | | |
| 3.1.4 | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 98,835 | $ 168.571 | $ 16.142.473 | 99.03 | $ 15.174.564.21 | | |
| 3.2 | SUPERESTRUCTURA | | | | | | | | |
| 3.2.2 | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 6,181175 | $ 716.871 | $ 4.430.554 | 6.18 | $ 4.430.554.50 | 6.34 | $ 4.499.954 |
| 3.2.4 | VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE DE MURO DE 20X0.15MT | ML | 37.59 | $ 46.667 | $ 1.815.810 | 37.59 | $ 2.345.224.68 | 30.64 | $ 3.465.224.7 |
| 3.2.5 | ALEJADO EN CONCRETO DE 2500 PSI A= 0.25 M | ML | 1.5 | $ 34.898 | $ 52.347 | 1.50 | $ 52.347.00 | 1.50 | $ 52.347 |
| 3.2.6 | GRAMPERA CONCRETO 3000 PSI EMPOTRADA 10CM | M2 | 22.899 | $ 53.669 | $ 1.229.214 | 22.90 | $ 1.229.496.30 | | |
| 3.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PVC CONCRETO | UNC | 14 | $ 679.813 | $ 9.517.388 | - | $ - | 1 | |
| 3.2.8 | PLACA CONTRAPISO MALLA e=8.25cm, CONCRETO 3000 PSI (Incluye impermeabilizante) | M2 | 7.980 | $ 168.797 | $ 1.347.473 | 7.98 | $ 1.283.673.06 | 7.980 | $ 1.206.870 |
| 3.3 | ESTRUCTURA METÁLICA | | | | | | | | |
| 3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 617,639179 | $ 0.599 | $ 98.470.281 | 5.144.61 | $ 34.551.995.87 | | $ - |
| 3.3.3 | PLATINAS PARA COLOCACIÓN DE TARIMA Y CERRAMIENTO EN ACERO ASTM A36 0.6 E.C. | UNC | 16 | $ 96.138 | $ 1.537.888 | - | $ - | - | $ - |
| 3.3.4 | CERRAMIENTO CONTRA-INCENDIO PARA FACHADA SINTÉTICA EN ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE VARILLA LISA DE 3/8 ASTM A572 GR 50 Y ANCLADO CON ADHESIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA SELEX 1950-50 | M2 | 132.3 | $ 166.458 | $ 22.532.967 | - | $ - | | $ - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.6 | Suministro y instalación de cableado subterráneo para conducción eléctrica alumbrado público cable en aluminio serie 8000 2# 8+ 1T #4, incluye tendido y distribuir. | ML | 230 | $ 33.071 | $ 13.20.330 | | $ - | | |
| 13.5 | CUARTO ACOPIO CANCHA DE FUTBOL | | | | | | | | |
| 13.5.1 | Punto de concreto de 20 mts a 570 kg, incluye conexión a tierra. | UN | 4 | $ 1.872.481 | $ 7.489.924 | - | $ - | | |
| 13.5.2 | Suministro e instalación del sistema de iluminación por poste para canchas, incluye 2 proyectores de 324w, herrajería, subestructura, certificación RETILAP y garantía estándar. | UN | 4 | $ 7.113.728 | $ 28.454.912 | - | $ - | | |
| 13.5.3 | Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterráneo para alumbrado de la cancha en cable en Aluminio serie 8000 2T #4+ 1T #4, incluye tendido y distribuir. | ML | 72 | $ 21.073 | $ 1.516.728 | - | $ - | | |
| 13.5.4 | Cámara de inspección 8 E tipo 853 0,6 x 0,6 mts. | UN | 4 | $ 360.548 | $ 1.442.192 | - | $ - | | |
| 13.6 | CASETA ACOPIO DEPORTIVO | | | | | | | | |
| 13.6.1 | Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterráneo desde medidor bifásico hasta tablero bifásico 1 de 12 circuitos en cable en Aluminio serie 8000 2T #6+1N #6+ 1T #6, incluye tendido y distribuir. | ML | 60 | $ 35.855 | $ 1.414.320 | | $ - | | |
| 13.6.2 | Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterráneo desde tablero bifásico 1 hasta sub-tablero bifásico 1.1 de 8 cto circuitos en tubería en cable en Cobre 2T #6+1N #6+ 1T #10, incluye tendido y distribuir. | ML | 39 | $ 40.224 | $ 1.575.543 | | $ - | | |
| 13.6.3 | Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterráneo desde medidor trifásico hasta tablero acometidas 2 de 6 circuitos en cable en cobre 3T #6+1N #6+ 1T #10, incluye tendido y distribuir. | ML | 39 | $ 35.231 | $ 1.379.913 | - | $ - | | |
| 13.6.4 | Suministro e instalación de tablero de 8 circuitos (Tablero 1); tablero bifásico con puerta, cinges, incluye herrajes y distribuir. | UN | 1 | $ 540.907 | $ 540.907 | | $ - | | |
| 13.6.5 | Suministro e instalación de tablero de 8 circuitos (Sub tablero 1.1); tablero bifásico con puerta, incluye herrajes y distribuir. | UN | 1 | $ 457.657 | $ 457.657 | | $ - | | |

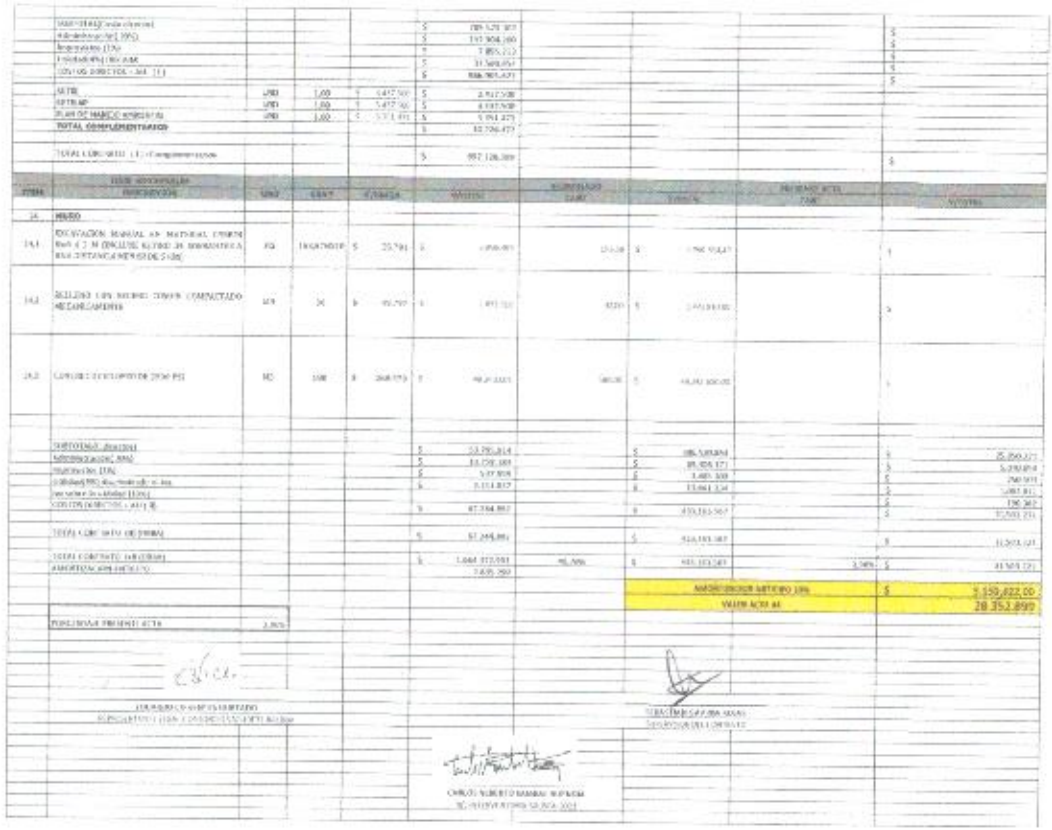

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.6 | Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos (Tablero 2), tablero monofasico con puerta, incluye frontales y canaleta. | UN | 1 | $ 231,890 | $ 231,890 | - | $ - | | |
| 13.4.7 | Suministro e instalación de gabinete de cuarto de medidores para desmontaje de cuchilla de Ambos Apartamentos secundario | UN | 1 | $ 2,618,995 | $ 2,618,995 | - | $ - | | |
| 13.4.8 | Suministro e instalación de Tuvos 4"CL incluye cableado libre de halogeno, cuchos en EMT y herramienta. | UN | 5 | $ 237,821 | $ 1,189,105 | - | $ - | | |
| 13.4.9 | Suministro e instalación de Tuvos 2"C incluye cableado libre de halogeno,cuchos en EMT y herramienta. | UN | 1 | $ 223,637 | $ 223,637 | - | $ - | | |
| 13.4.10 | Suministro e instalación de Tuvos 1"C incluye cableado libre de halogeno, cuchos en EMT y herramienta. | UN | 3 | $ 216,613 | $ 649,841 | - | $ - | | |
| 13.4.11 | Suministro e instalación de salida electrica para Alumbrado incluye cableado libre de Halogenos, tuberia EMT y accesorios. | UN | 67 | $ 120,062 | $ 8,044,154 | - | $ - | | |
| 13.4.12 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo | UN | 5 | $ 12,568 | $ 62,840 | - | $ - | | |
| 13.4.13 | Suministro e instalación de Salida Interruptor doble | UN | 3 | $ 17,188 | $ 51,564 | - | $ - | | |
| 13.4.14 | Suministro e instalación de lampara luminaria de 54 W | UN | 8 | $ 247,737 | $ 1,981,903 | - | $ - | | |
| 13.4.15 | Suministro e instalación de lampara de 2x9x18 24 W | UN | 24 | $ 36,167 | $ 868,008 | - | $ - | | |
| 13.4.16 | Suministro e instalación de lampara tipo aletaga led de 15 W | UN | 14 | $ 36,767 | $ 515,748 | - | $ - | | |
| 13.4.17 | Camara de inspección B.T tipo BT1 0.4 x 0.4 mts. | UN | 3 | $ 340,544 | $ 1,021,644 | - | $ - | | |
| 13.5 | EXCAVACION Y RELLENO | | | | | | | | |
| 13.5.1 | Excavación de zanja para ductos e incluye relleno de material, dimensiones de 0.6 x 0.4 mts | MT | 14 | $ 13,877 | $ 867,666 | 72.00 | $ 907,586.00 | | |
| 13.5.2 | Retiros un area de pella para tendido de conductor/cable electrico | MT | 52 | $ 29,814 | $ 1,990,930 | 50.00 | $ 1,990,930.00 | | |
| 13.6 | AFUSTES LAMPARAS | | | | | | | | |
| 13.6.1 | Suministro e instalación de Cable Cu de calibre 3/0, incluye conectores para tendido de cable | ML | 100 | $ 45,251 | $ 4,511,100 | - | $ - | | |
| 13.6.2 | Suministro e instalación de Varilla Cu 2.40 x 5/8" | UN | 4 | $ 270,000 | $ 1,080,205 | - | $ - | | |
| 13.6.3 | Suministro e instalación de soldadura cadweld 90 gramos | UN | 10 | $ 44,110 | $ 432,860 | - | $ - | | |
| 13.6.4 | Suministro, transporte e instalación de puntas cadweld (conexiones) | UN | 4 | $ 147,101 | $ 588,404 | - | $ - | | |
| 13.6.5 | Suministro e instalación de bajantes de apantallamiento para postes de concreto de 10 mts, en cable de aluminio tipo autoforce, incluye tuberia y accesorios de soportes. | UD | 4 | $ 339,071 | $ 1,356,284 | - | $ - | | |
| 13.6.6 | Camara de inspección B.T tipo BT1 0.3 x 0.3 mts. | UD | 2 | $ 259,053 | $ 518,105 | - | $ - | | |
| 13.7 | SERVICIOS | | | | | | | | |
| 13.7.1 | Suministro e instalacion de Bachilleta subterranea en PVC de 4" de diametro. | ML | 153 | $ 9,251 | $ 1,380,020 | 153.00 | $ 1,380,020.00 | | |
| | | | | | | | | | |

Espacio para Logo Corporativo

**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**
NIT 901.574.342-5
CR 15 # 148-75 TORRE 4 304
Tel: (604) 3235686
Monteria - Colombia
gerenciaecolaqua@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 9**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BALBOA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 890.801.143-1 | **Teléfono** | (606) 3146208880 - Ext. 000 - (606) 3146382479 - Ext. 000 | **Generación** | 25/02/2025, 15:14 |
| **Dirección** | CLL 6 NO 6-44 | **Ciudad** | Risaralda - Colombia | **Expedición** | 25/02/2025, 15:14 |
| | | | | **Vencimiento** | 25/02/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA 05 DEL CONTRATOREALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL 10% TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS MLC ($3.150.322) | 1.00 | 25,240,853.06 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Treinta y un millones quinientos tres mil doscientos veinte pesos m/cte con ochenta y uno cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 31,503,220.81

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 25,050,271.00 |
| Administración 20.00% | 5,010,054.20 |
| Imprevistos 1.00% | 250,502.71 |
| Utilidad 4.00% | 1,002,010.84 |
| IVA 19% | 190,382.06 |
| **Total a Pagar** | 31,503,220.81 |

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DEL BANCO CAJA SOCIAL CONSORCIO SACUDETE BALBOA NUMERO 24140453560

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082536407 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 3 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0
**CUFE:** 93021c0450c430bfa775d01cae8b09a398204c6e240316c0ff537f9476583b681634bcc758f2ab29442ae3d6d13171e2

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.141-8 Nombre Software: Siigo Nube. Prima electrónica en el 4%

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| **Cuenta a Debitar** | **Valor** | **Cuenta Destino** |
|---|---|---|
| 457253005106 | 23.329.943 | 24140453560 Cuenta de Ahorros De Banco Caja social a nombre de Consorcio sacudete Balboa Nit 901.574.342 |
| **TOTAL** | **23.329.943** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**KELLY LEANDRA CANDAMIL F.**
Tesorera General

**Proyectó:** Kelly Leandra Candamil Foronda – Tesorera General.
**Revisó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda.
**Aprobó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda

MUNICIPIO DE BALBOA MPIO : KELLY LEANDRA CANDAMIL FORONDA

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar $ 23.329.943,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

CONSORCIO SACUDETE BALBOA

******3560**

Monto a acreditar $ 23.329.943,00

**Monto $**
**23.329.943,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | 0058 |
| Descripción: | PAGO CONTRATO |

26/02/2025 - 03:28:00 p. m. | IP actual: 200.10.28.165

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp



# La operación solicitada se realizó correctamente

| | |
|---|---|
| Número de Cuenta Origen: | ****5106 |
| Número de Cuenta Destino: | BANCO CAJA SOCIAL - ****3560 |
| Valor Transferencia: | $ 23.329.943,00 |
| Fecha y Hora: | 26/02/2025 3:29:47 p. m. |
| Dirección IP: | 200.10.28.164 |
| Costo de la transacción: | $ 0,00 + IVA |
| Número de aprobación: | 179648996 |
| Tipo transacción: | Transferencia Interbancaria |

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 537.942.977,59 | SALDO ACTUAL | 334.855.154,98 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 681.857,00 | PROMEDIO MES | 448.954.948,37 |
| TOTAL CARGOS | 8 | 203.769.679,61 | INTERESES | 681.857,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.186,00 | 537.972.163,59 |
| 03/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.188,00 | 538.001.351,59 |
| 04/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.189,00 | 538.030.540,59 |
| 05/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.191,00 | 538.059.731,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -10.494.174,00 | 527.565.557,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -2.492.366,00 | 525.073.191,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -13.117.718,00 | 511.955.473,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -5.486.354,00 | 506.469.119,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.935.315,00 | 502.533.804,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -6.558.859,00 | 495.974.945,59 |
| 06/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 72.730,00 | 496.047.675,59 |
| 09/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.246,00 | 496.071.921,59 |
| 10/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.247,00 | 496.096.168,59 |
| 11/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.248,00 | 496.120.416,59 |
| 12/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.249,00 | 496.144.665,59 |
| 13/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 72.755,00 | 496.217.420,59 |
| 16/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.254,00 | 496.241.674,59 |
| 17/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.255,00 | 496.265.929,59 |
| 18/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.256,00 | 496.290.185,59 |
| 19/12 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -122.969.474,00 | 373.320.711,59 |
| 19/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 18.247,00 | 373.338.958,59 |
| 20/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 54.747,00 | 373.393.705,59 |
| 23/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 18.251,00 | 373.411.956,59 |
| 24/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 36.504,00 | 373.448.460,59 |
| 26/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 18.253,00 | 373.466.713,59 |
| 27/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 54.765,00 | 373.521.478,59 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -38.715.419,61 | 334.806.058,98 |
| 30/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.096,00 | 334.855.154,98 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 G418

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## 890801143-1

## OP 3.302 COMPROBANTE DE EGRESO No. 03336

FECHA lunes, 30 diciembre, 2024 VALOR OP **47.891.215,61** **VALOR NETO** **38.715.419,61**

PAGADO A: CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 901598981

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 001 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIAN CIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE I UBICAD

LA SUMA DE TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS SES

PÁGUESE A: CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 38.715.419,61 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 38.715.419,61 | 0,00 | | | |
| | **38.715.419,61** | **38.715.419,61** | | | |

RECIBÍ

Raquel Castañeda M.

TESORERÍA

C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 03302

FECHA 2024/12/27

BENEFICIARIO **CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022** NIT **901598981** DV **5**

VALOR CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS SESENTA Y UN CENTAVOS MCTE. $47.891.215,61

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 001 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIAN CIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA PAGO PARCIAL No 2 ANEXA.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| | RUBRO | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 2833 | 4342 | CONTRA DE INTERVENTORIA No.001 DE 2022 | 47.891.215,61 |

**TOTAL 47.891.215,61**

**CONTABILIDAD**

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 382.325,00 |
| 13058801 | 0,00 | 1.609.789,00 |
| 13058802 | 0,00 | 603.671,00 |
| 13110101 | 0,00 | 1.006.118,00 |
| 17100501 | 47.891.215,61 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 38.715.419,61 |
| 24360302 | 0,00 | 4.426.919,00 |
| 24362502 | 0,00 | 1.146.974,00 |
| **TOTAL** | **47.891.215,61** | **47.891.215,61** |

**DESCUENTOS**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| RETFTE HONORARIOS 11% | 4.426.919,00 |
| TASA CULTURAL 1.5% | 603.671,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 1.146.974,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 382.325,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 1.609.789,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 1.006.118,00 |
| **TOTAL** | **9.175.796,00** |

**ANEXOS**

| DESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| VALOR ORDEN | **47.891.215,61** |
| DESCUENTOS | **9.175.796,00** |
| NETO A PAGAR | **38.715.419,61** |

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

CONSORCIO INTERVENTORIA L
NIT 901 598 981-5
TV 4 ESTE 61 05 TO 3 AP 1303 CONJ
Tel (605) 3023565755
Bogota - Colombia
javier01523@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 3**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BALBOA | | |
| **NIT** | 890.801.143-1 | Teléfono | (601) 3104518143 |
| **Dirección** | CL 8 6 44 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 20-12-2024 12:56 |
| **Expedición** | 20-12-2024 12:57 |
| **Vencimiento** | 20-12-2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA | 1.00 | 47,891,215.61 |

**Total items**: 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 40,244,719.01 |
| **IVA 19%** | 7,646,496.60 |
| **Total a Pagar** | **47,891,215.61** |

**Valor en Letras**:
Cuarenta y siete millones ochocientos noventa y un mil doscientos quince pesos m/cte con sesenta y uno cent.

**Forma de pago**:
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Credito plus (CCD+) - Transferencia $ 47,891,215.61

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DAVIVIENDA AHORROS NUMERO 027200099094
CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085737028 aprobado en 20241219 prefijo FE desde el número 2 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica Tarifa 0

**CUFE:**

10ef1ce0650b34a52abaa501e921f0103babdd306e91f756696141eb796a25a866bfeb1d4a3446518c109250655f435

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO REGISTROS PRESUPUESTALES

PAG. 1

NRO. 2833

FECHA 26/12/2024

SOLICITADO DIRECTOR OBRAS PUBLICAS E I | ENVIADO SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINAN

CONTRATANTE ALCALDE MUNICIPAL | CON CARGO AL CDP NRO. 1514 | DE 26/12/2024

NIT 901598981 DV 5 | BENEFICIARIO CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 001 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIAN CIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Ochenta y Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Siete mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos MCte. $88.687.437,00

La suscrita Auxiliar Administrativa, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | RUBRO/RE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit 13 RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | 83.304.539,00 |
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_98.0 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción Recursos del Balance de Libre Destinación 98 Recursos del Balance de Libre Destinación | RESERVAS | 5.382.898,00 |
| | | TOTAL | **88.687.437,00** |

**REINTEGROS CRP** **2833**

| Codigo | Valor Rubro |
|---|---|

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA

PAG. 1

NRO. 1514

FECHA 2024/12/26

SOLICITADO DIRECTOR OBRAS PUBLICAS E I | ENVIADO SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINAN

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 001 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIAN CIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Ochenta y Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Siete mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos MCte. $88.687.437,00

La suscrita Auxiliar Administrativa , CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del compromiso, hay disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| DISPO | CÓDIGO | VALOR | RUBRO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 6277 | 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_98.0 | 5.382.898,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción Recursos del Balance de Libre Destinación | RESERVAS |
| 6278 | 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | 83.304.539,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS |

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

DAVIVIENDA

## A QUIEN INTERESE

BARRANQUILLA 2022/10/06
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022
con Nit número 9015989815
de BARRANQUILLA-ATLANTICO
posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA AHORROS (DAMAS)**

| | |
|---|---|
| Número | 027200099094 |
| Fecha Apertura | 2022/08/24 |

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0202 - OFICINA 11 DE NOVIEMBRE

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034.313-7
AH 170 1 REV. IV 06

Scanned with CamScanner

| | COMUNICACIONES OFICIALES<br>DEPARTAMENTO DE RISARALDA<br>MUNICIPIO DE BALBOA<br>NIT 890801143-1 | Código: GDFO-03<br>Versión: 02 |
|---|---|---|

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| Cuenta a Debitar | Valor | Cuenta Destino |
|---|---|---|
| 457253005106 Proyecto sacudete | 38.715.419,61 | 027200099094 Cuenta ahorros Banco Davivienda a nombre de Consorcio interventoria Balboa 2022 Nit. 901598981 – 5 |
| | **38.715.419,61** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**REINEL CASTAÑEDA MARQUEZ**
Tesorero General

**Proyectó:** Reinel Castañeda Márquez – Tesorero General.
**Revisó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.
**Aprobó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.

MUNICIPIO DE BALBOA MPIO : REINEL CASTAÑEDA MARQUEZ

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar $ 38.715.419,61

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA

******9094**

Monto a acreditar $ 38.715.419,61

**Monto $**
**38.715.419,61**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

**MUNICIPIO DE BALBOA**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| CANT. [1] | CARGO/OFICIO | COSTOS DE PERSONAL [2] | PRIMA REGIONAL [3] | PARTICIPACIÓN (H.M/Mes) [4] | VALOR PARCIAL ($) [1]*[2]+[3]*[4] = [5] | ACTA PARCIAL N° 2 [7] | [5]*[7]=[13] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERSONAL PROFFESIONAL** | | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | % DE EJECUCION | VALOR |
| 1 | Director de interventoria | $ 4.000.000,00 | | 2,30 | $ 1.200.000,00 | 54,00% | $ 648.000,00 |
| 1 | Residente de interventoria | $ 2.500.000,00 | | 1,00 | $ 2.500.000,00 | 54,00% | $ 1.350.000,00 |
| 1 | Especialista Estructuras | $ 3.000.000,00 | | 0,30 | $ 900.000,00 | 54,00% | $ 486.000,00 |
| 1 | Especialista Suelos | $ 3.000.000,00 | | 0,30 | $ 900.000,00 | 54,00% | $ 486.000,00 |
| 1 | Profesional A. Electric | $ 2.500.000,00 | | 1,00 | $ 2.500.000,00 | 54,00% | $ 1.350.000,00 |
| 1 | Profesional Ambiental | $ 2.000.000,00 | | 0,50 | $ 1.000.000,00 | 54,00% | $ 540.000,00 |
| 1 | Profesional SISOMA | $ 2.000.000,00 | | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 54,00% | $ 1.080.000,00 |
| 1 | Contador | $ 2.000.000,00 | | 1,00 | $ 2.000.000,00 | 54,00% | $ 1.080.000,00 |
| **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | |
| 1 | Topografo | $ 2.100.000,00 | | 1,00 | $ 2.100.000,00 | 54,00% | $ 1.134.000,00 |
| **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | |
| 1 | Secretaria | $ 1.200.000,00 | | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 54,00% | $ 648.000,00 |
| 1 | Ayudante y/o mensajero | $ 1.200.000,00 | | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 54,00% | $ 648.000,00 |
| **PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO** | | | | | | | |
| 1 | Cadenero | $ 1.200.000,00 | | 1,00 | $ 1.200.000,00 | 54,00% | $ 648.000,00 |
| **OTROS COSTOS DE PERSONAL** | | | | | | | |
| | N/A | | | | | 54,00% | $ - |
| | | | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | $ 18.700.000,00 | 54,00% | $ 10.098.000,00 |
| | | | | FACTOR MULTIPLICADOR = (7) | 2,20 | 54,00% | $ 1,19 |
| | | | | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | $ 41.140.000,00 | 54,00% | $ 22.215.600,00 |

| CANT. [8] | CONCEPTO | UNIDAD | COSTO ($) [9] | [10] | [8]*[9]*[10] = [11] | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VIÁTICOS** | | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | |
| 1 | Alquiler de equipo de topografia incluye transporte x 3 cuadrillas | Und | $ 2.950.000,00 | 0,00 | $ - | 54,00% | $ - |
| **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | |
| 1 | Mantenimientos, Equipos, Herramientas | Mes | $ 200.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 54,00% | $ 108.000,00 |
| 1 | Costo proporcional a oficina central | Mes | $ 200.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 54,00% | $ 108.000,00 |
| 1 | Registro Fotografico, Videos, Informes | Mes | $ 200.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 54,00% | $ 108.000,00 |
| 1 | Registro y elaboracion planos record | Mes | $ 200.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 54,00% | $ 108.000,00 |
| 1 | Gastos de mobiliario, papeleria, fotocopias, etc | Mes | $ 200.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 54,00% | $ 108.000,00 |
| 1 | Software/Hardware para obra | Mes | $ 200.000,00 | 1,00 | $ 200.000,00 | 54,00% | $ 108.000,00 |
| 2 | Comunicaciones (Telefono, e-mail, etc) | Mes | $ 66.510,66 | 1,00 | $ 133.021,32 | 54,00% | $ 71.831,51 |
| **COSTO DE MUESTREO, ANÁLISIS DE LABORATORIO - ENSAYOS** | | | | | | | |
| 1 | Muestreo, analisis de laboratorio y ensayos | Und | $ 1.300.000,00 | 1,00 | $ 1.300.000,00 | 54,00% | $ 810.000,00 |
| | | | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) | $ 2.833.021,32 | 54,00% | $ 1.529.831,51 |
| | | | | SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) | $ 43.973.021,32 | 54,00% | $ 23.745.431,51 |
| | | | | PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) | | 54,00% | $ - |
| | | | | VALOR TOTAL BASICO = (D) + (C) = (E) | $ 43.973.021,32 | 54,00% | $ 23.745.431,51 |
| | **DESCRIPCIÓN** | | % | VALOR ((%) * (E)) = 12 | | 54,00% | |
| | Poliza Responsabilidad Civil y Cumplimiento | | 0,365% | $ 160.508,27 | | 54,00% | $ 80.734,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estampilla pro cultura | 2,00% | $ | 879.460,43 | 54,00% | $ 474.908,63 |
| Estampilla pro universidad de cordoba | 2,00% | $ | 879.460,43 | 54,00% | $ 474.908,63 |
| Estampilla pro ancianato | 4,00% | $ | 1.758.920,85 | 54,00% | $ 949.817,26 |
| Tasa de Deporte y Recreacion | 2,00% | $ | 879.460,43 | 54,00% | $ 474.908,63 |
| Rete fuente si aplica + factor multiplicador | 2,00% | $ | 879.460,43 | 54,00% | $ 474.908,63 |
| Rete ica | 1,00% | $ | 439.730,21 | 54,00% | $ 237.454,32 |
| TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS = SUMATORIA DE [12] = (F) | | $ | 5.866.001,04 | 54,00% | $ 3.167.640,56 |
| IVA = 15% * (E) = (F) | | $ | 6.595.953,20 | 54,00% | $ 3.561.814,73 |
| COSTO TOTAL = (E) + (F) + (G) | | $ | 88.687.437,00 | 54,00% | $ 47.891.215,98 |
| COSTO TOTAL BRUTO = (E) + (F)) | | | | | $ 26.913.072,08 |

| No. | DESCRIPCIÓN | FECHA DE ACTA | VALOR FACTURADO | % A PAGAR | RETENCIÓN GARANTIA | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2 | 19/12/2024 | $ 47.891.215,98 | 54,00% | $0,00 | $0,00 | $ |
| | | | | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | VALOR PAGADO ACUMULADO | % PAGADO ACUMULADO |
| | | | | $47.891.215,98 | $ 40.796.221,02 | $47.891.215,98 | $ 0,54 |

Carlos Alberto Rambal Buendia.
Rep. Legal Interventoria Balboa 2022

SEBASTIAN GAVIRIA RAMOS
SUPERVISOR DE OBRA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## 890801143-1

## OP 3.117 COMPROBANTE DE EGRESO No. 03102

FECHA jueves, 19 diciembre, 2024 VALOR OP **150.736.669,0(** **VALOR NETO** **122.969.474,00**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 3 ANEXA.

LA SUMA DE CIENTO VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y (

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 122.969.474,00 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 122.969.474,00 | 0,00 | | | |
| | **122.969.474,00** | **122.969.474,00** | | | |

RECIBÍ

Reinel Castañeda M.

TESORERÍA

C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 03117

FECHA 2024/12/19

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE. $150.736.669,00

CONCEPTO PAGO COMPONENTE No 2 DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 3 ANEXA.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| RUBRO | | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingenieria civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 2254 | 3536 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 150.736.669,00 |

**TOTAL 150.736.669,00**

**CONTABILIDAD**

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 1.644.443,00 |
| 13058504 | 0,00 | 8.654.962,00 |
| 13058801 | 0,00 | 6.923.969,00 |
| 13058802 | 0,00 | 2.596.489,00 |
| 13110101 | 0,00 | 4.327.481,00 |
| 17100501 | 150.736.669,00 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 122.969.474,00 |
| 24362502 | 0,00 | 157.866,00 |
| 24362601 | 0,00 | 3.461.985,00 |
| **TOTAL** | **150.736.669,00** | **150.736.669,00** |

**DESCUENTOS**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TASA CULTURAL 1.5% | 2.596.489,00 |
| LEY 418/97 CONTRATO VIAS 5%_ | 8.654.962,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 157.866,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 1.644.443,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 6.923.969,00 |
| RETFTE CONTRATOS DE OBRA 2% | 3.461.985,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 4.327.481,00 |
| **TOTAL** | **27.767.195,00** |

**ANEXOS**

| DESCRIPCION | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| VALOR ORDEN | **150.736.669,00** |
| DESCUENTOS | **27.767.195,00** |
| NETO A PAGAR | **122.969.474,00** |

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

MUNICIPIO DE RAUBOA RISARALDA

**VERIFICACIÓN ACTA DE COBRO No. 4** — **CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ **1.124.000.000** 10 JUNIO DE 2022

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITA | V/TOTAL | DISEÑO CANT | DISEÑO V/TOTAL | ACUMULADO CANT | ACUMULADO V/TOTAL | PRESENTE ACTA #4 CANT. EJE | PRESENTE ACTA #4 V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ITEM CONTRATADOS INICIALMENTE | | | | | | | | | | |
| 1 | PRELIMINAR | | | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN | M2 | 1.200 | $ 2.769 | $ 3.322.800 | 1229,68 | $ 3.404.450 | 1.229,48 | $ 3.404.432,12 | | |
| 1.2 | CONFIGURACIÓN NIVELACIÓN TERRENO | M2 | 1.200 | $ 2.943 | $ 3.531.600 | 1229,68 | $ 3.618.450 | 1.229,48 | $ 3.618.355,64 | | |
| 2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS | | | | | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 161,0625 | $ 25.700 | $ 4.139.651 | 90,22 | $ 2.317.437 | 161,06 | $ 4.139.282,86 | | |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECANICA CAJEO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 142,3576 | $ 8.654 | $ 797.597 | 0,00 | $ - | | | | |
| 2.3 | RELLENO CON RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 44,46764 | $ 49.797 | $ 2.213.855 | 37,70 | $ 1.876.993 | 44,46 | $ 2.213.274,62 | | |
| 2.4 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO MANUALMENTE | M3 | 24,838 | $ 21.044 | $ 522.645 | 24,24 | $ 510.009 | 26,24 | $ 552.134,56 | | |
| 2.5 | BASE GRANULAR E= 10CM | M3 | 46,0788 | $ 169.733 | $ 7.821.084 | 46,08 | $ 7.824.045 | 46,1 | $ 7.832.553,77 | | |
| 3 | CONCRETOS | | | | | | | | | | |
| 3.1 | CIMENTACIONES | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SOLADO DE NIVELACION DE 2500 PSI | M2 | 84,6085 | $ 32.441 | $ 2.744.784 | 68,41 | $ 2.219.240 | 84,78 | $ 2.750.342,08 | | |
| 3.1.2 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 25,99625 | $ 513.631 | $ 13.503.495 | 15,01 | $ 7.711.381 | 26,01 | $ 13.406.979,63 | | |
| 3.1.3 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 27,587725 | $ 806.764 | $ 14.190.830 | 17,35 | $ 8.004.287 | 17,64 | $ 14.216.980,71 | | |
| 3.1.4 | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 48,935 | $ 268.570 | $ 13.142.473 | 0,00 | $ - | 49,03 | $ 13.170.304,71 | | |
| 3.2 | ESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 6,38175 | $ 210.171 | $ 1.341.552 | 0,00 | $ - | | $ - | | $ - |
| 3.2.4 | VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE DE MURO (0,20x0,14m) | ML | 77,14 | $ 46.867 | $ 3.615.320 | 77,14 | $ 3.615.320 | 27,10 | $ 1.270.095,70 | 27,10 | $ 1.270.095 |
| 3.2.5 | ALFAJIAS EN CONCRETO DE 2500 PSI A= 0.25 M | ML | 15 | $ 34.398 | $ 515.947 | 1,56 | $ 53.647 | | $ - | | |
| 3.2.6 | GRADERIA CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 10CM | M2 | 22,896 | $ 55.609 | $ 1.273.224 | 0,00 | $ - | 22,90 | $ 1.273.448,10 | | |
| 3.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO | UND | 14 | $ 679.822 | $ 9.517.508 | 14,00 | $ 9.517.508 | | $ - | | |
| 3.2.8 | PLACA CUBIERTA MACIZA e=0.15m. CONCRETO 3000 PSI (Incluye impermeabilizante) | M2 | 7,488 | $ 160.797 | $ 1.203.973 | 7,49 | $ 1.203.973 | | $ - | | |
| 3.3 | ESTRUCTURA METALICA | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 4.126,93779 | $ 6.799 | $ 28.070.261 | 6.126,93 | $ 41.671.292 | 6.126,93 | $ 48.639.260,32 | 881,93 | $ 5.998.449 |
| 3.3.2 | PLATINAS PARA CUBIERTA DE TARIMA Y CERRAMIENTO EN ACERO ASTM A36 (0.6 E) | UND | 46 | $ 98.120 | $ 4.513.504 | 46,00 | $ 4.513.504 | | $ - | | $ - |
| 3.3.4 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO PARA CANCHA SINTETICA EN ESTRUCTURA METALICA INCLUYE VARILLA LISA DE 3/4 SOLDADURA E70XX Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA SEGÚN DISEÑO | M2 | 312,0 | $ 264.474 | $ 29.832.867 | 137,44 | $ 36.353.662 | 112,80 | $ 29.832.867,20 | 112,80 | $ 29.832.867 |
| 3.3.5 | CERRAMIENTO LATERAL PARA CANCHA SINTETICA EN ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE MALLA ESLABONADA SOLDADURA E70 XX Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA, SEGÚN DISEÑO. | M2 | 220,05 | $ 203.229 | $ 44.719.441 | 170,33 | $ 44.719.441 | 220,05 | $ 44.719.441,45 | 220,05 | $ 44.719.441 |
| 4 | MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ACABADOS | | | | | | | | | | |
| 4.1 | MURO EN BLOQUE SPLIT ESTRUCTURAL e=19.5 CM INCLUYE HIERRO DE 1/2 PIL CADA 1M | M2 | 259,3 | $ 169.227 | $ 43.891.616 | | | 207,44 | $ 35.101.371,09 | 207,44 | $ 35.101.371 |
| 4.2 | MURO BLOQUE ARCILLA No 5 E=0.12m | M2 | 6,712 | $ 66.120 | $ 443.737 | 2,77 | $ 183.247 | | $ - | | $ - |
| 4.3 | MEDIOS EN CONCRETO A= 60 CM H=80 M | ML | 10,95 | $ 167.247 | $ 1.831.351 | 4,50 | $ 752.511 | | $ - | | $ - |
| 4.4 | PAÑETE MUROS MORTERO 1:3 | M2 | 64,0122 | $ 24.597 | $ 1.574.468 | 51,22 | $ 1.259.618 | 51,21 | $ 1.259.624,37 | 51,21 | $ 1.259.624 |
| 4.5 | PAÑETE BAJO PLACA MORTERO 1:3 | M2 | 7,488 | $ 27.121 | $ 203.077 | 7,49 | $ 203.077 | | $ - | | $ - |
| 5 | CUBIERTA | | | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE BARBOSA RISARALDA

**VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 4**

**CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 1.124.000.000 10 JUNIO DE 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO PANNOT REF A- 20 DE 0.20 X0.20 COLOR GRIS INCLUYE BASE DE 3 CM Y SELLO JUNTAS EN ARENA | M2 | 261.16 | $ 81.979 | $ 21.409.536 | 261.16 | $ 21.409.536 | | $ - | | | |
| 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO LOSETA ALERTA DE 0.20 X0.20 COLOR COLOR ROJO, INCLUYE BASE EN ARENA Y SELLO JUNTAS | M2 | 20 | $ 97.854 | $ 1.956.880 | 20.00 | $ 1.956.880 | | $ - | | | |
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA EN CONCRETO LOSETA TACTIL GUIA DE 0.20 X0.20 COLOR AMARILLO INCLUYE BASE EN ARENA Y SELLO JUNTAS | M2 | 40 | $ 87.759 | $ 3.510.360 | 40.00 | $ 3.510.360 | | $ - | | | |
| 8.7 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTETICA PAISAJISMO NEW GOLDEN ALTURA DE 20MM 70 100/0.09/M2 | M2 | 3R6044 | $ 90.998 | $ 5.397.721 | 58.80 | $ 5.397.721 | | $ - | | | |
| 8.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PLASTICA PARA CESPED ARTIFICIAL (SHOCK PAD) e=15mm | M2 | 0 | $ 66.622 | $ - | 0.00 | $ - | | $ - | | | |
| 8.9 | GRAMA SINTETICA b=16mm MONOFILAMENTO, CON ESPESOR MAYOR A 360 MICRONES CON NERVIO REF. | M2 | 466.788 | $ 145.750 | $ 67.159.851 | 0.00 | $ - | 460.79 | $ 67.159.851,00 | | | |
| 9 | ESTUCO, PINTURA Y ENCHAPES | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | ESTUCO PLASTICO MURO | M2 | 5,84 | $ 31.447 | $ 183.330 | 5.84 | $ 183.330 | | $ - | | | |
| 9,2 | ESTUCO PLASTICO BAJO PLACA | M2 | 7,488 | $ 31.140 | $ 233.193 | 7.49 | $ 233.193 | | $ - | | | |
| 9,3 | PINTURA SOBRE MURO 2 MANOS | M2 | 5,84 | $ 28.011 | $ 163.584 | 5.84 | $ 163.584 | | $ - | | | |
| 9,4 | PINTURA BAJO PLACA 2 MANOS | M2 | 7,488 | $ 38.838 | $ 290.777 | 7.49 | $ 290.777 | | $ - | | | |
| 9,5 | PINTURA DE ALTO TRAFICO | M2 | 75,9336 | $ 29.150 | $ 2.213.586 | 75.94 | $ 2.213.586 | | $ - | | | |
| 9,6 | PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 PESADO | M2 | 96,3008 | $ 86.018 | $ 4.658.475 | 46.40 | $ 4.658.475 | | $ - | | | |
| 9,7 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA | ML | 25,6 | $ 20.677 | $ 529.331 | 25.60 | $ 529.331 | | $ - | | | |
| 9,8 | ENCHAPE CERAMICA 25x35, O SIMILAR | M2 | 64,0122 | $ 78.734 | $ 5.041.612 | 64.01 | $ 5.041.612 | | $ - | | | |
| 10 | MOBILIARIO | | | | | | | | | | | |
| 10,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE TIPO M - 121 INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO | UN | 3 | $ 945.808 | $ 2.837.424 | 3.00 | $ 2.837.424 | | $ - | | | |
| 10,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CICLOPARQUEADERO TIPO 1 M-300 | UN | 1 | $ 925.808 | $ 925.808 | 1.00 | $ 925.808 | | $ - | | | |
| 11 | GIMNASIO BIOSALUDABLE | | | | | | | | | | | |
| 11,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO DE 0.45 X 1.20 X 1.30 M, INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 4.262.802 | $ 4.262.802 | 1.00 | $ 4.262.802 | 1.00 | $ 4.262.802,00 | 1.00 | $ - | |
| 11,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE PONY REMO DE 1.10 X 0.75 X 1.34 M INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 1.961.517 | $ 1.961.517 | 1.00 | $ 1.961.517 | 1.00 | $ 1.961.517,00 | 1.00 | $ - | |
| 11,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE BARRAS PARALELAS DE 2.00 X 0.70 X 1.32 M INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 1.510.012 | $ 1.510.012 | 1.00 | $ 1.510.012 | 1.00 | $ 1.510.012,00 | 1.00 | $ - | |
| 11,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAQUINA BIOSALUDABLE TWISTER DE 1.40 DE DIAMETRO X 1.10 DE ALTO INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 4.071.348 | $ 4.071.348 | 1.00 | $ 4.071.348 | 1.00 | $ 4.071.348,00 | 1.00 | $ - | |
| 12 | JUEGOS INFANTILES | | | | | | | | | | | |
| 12,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PARQUE CIO IDRD 106049 - COLUMPIO CANASTA BITOMOLDEADORA INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 17.893.200 | $ 17.893.200 | 1.00 | $ 17.893.200 | | $ - | | | |
| 12,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PARQUE CIO IDRD 106052 - CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 57.623.200 | $ 57.623.200 | 1.00 | $ 57.623.200 | | $ - | | | |
| 12,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PARA PARQUE CIO IDRD 106052 - MUELLE SILLAS DOBLES INCLUYE TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | $ 17.893.200 | $ 17.893.200 | 1.00 | $ 17.893.200 | | $ - | | | |
| 13 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | |
| 13,1 | RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN | | | | | | | | | | | |
| 13,1,1 | Instalación y cableado de red de media y baja tensión | UN | 1 | $ 786.218 | $ 786.218 | 1.00 | $ 786.218 | | $ - | | | |
| 13,1,2 | Montaje de transformador monofasico de 10 kva Primario 13.2 y 34.5 | UN | 1 | $ 7.726.116 | $ 7.726.116 | 1.00 | $ 7.726.116 | | $ - | | | |
| 13,1,3 | Suministro e instalación de medidor bidireccional para cabecera | UN | 1 | $ 987.134 | $ 987.134 | 1.00 | $ 987.134 | | $ - | | | |
| 13,1,4 | Suministro e instalación de medidor bidireccional para alumbrado público | UN | 1 | $ 890.362 | $ 890.362 | 1.00 | $ 890.362 | | $ - | | | |
| 13,1,5 | Suministro e instalación de medidor trifasico para alumbrado público | UN | 1 | $ 936.914 | $ 936.914 | 1.00 | $ 936.914 | | $ - | | | |

VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 4

CONTRATO DE OBRA Nº 001 DE 2022

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.124.000.000 10 JUNIO DE 2022

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL (COSTOS directos) | | | | $ | 786.196.502 | | $ | 589.959.268 | | | | | $ - |
| | Administración (20%) | | | | $ | 57.039.700 | | $ | 216.359.854 | | | | | $ - |
| | Imprevistos (1%) | | | | $ | 7.862.885 | | $ | 5.849.593 | | | | | $ - |
| | Utilidad(4%) (Costos | | | | $ | 31.447.540 | | $ | 23.559.071 | | | | | $ - |
| | COSTOS DIRECTOS + AU (1) | | | | $ | 882.748.227 | | $ | 721.249.065 | | | | | $ - |
| | RETE | UND | 1,00 | $ 3.437.500 | $ | 3.437.500 | 1,00 | $ | 3.437.500 | | | | | |
| | RETEICA | UND | 1,00 | $ 2.437.500 | $ | 3.437.500 | 1,00 | $ | 3.437.500 | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | UND | 1,00 | $ 3.351.472 | $ | 3.351.472 | 1,00 | $ | 3.351.472 | | | | | |
| | **TOTAL COMPLEMENTARIOS** | | | | $ | 10.226.472 | | $ | 10.226.472 | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO (1) +Complementarios | | | | $ | 892.974.699 | | $ | 741.475.538 | | | | | $ - |

| ITEM | ITEM ADICIONALES DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITA | V/TOTAL | POR EJECUTAR CANT | POR EJECUTAR V/TOTAL | ACUMULADO CANT | ACUMULADO V/TOTAL | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **MURO** | | | | | | | | | | |
| 14.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MEDIA DE 1 KM) | M3 | 153,578218 | $ 25.381 | $ 3.898.466 | 0,00 | $ - | 94,04 | $ 2.379.134,1 | | $ - |
| 14.2 | RELLENO CON SUELO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 30 | $ 49.792 | $ 1.493.760 | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 1.493.760,00 | | $ - |
| 14.3 | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 191 | $ 268.570 | $ 51.311.320 | 0,00 | $ - | 20,00 | $ 48.140.600,00 | | $ - |
| | SUBTOTAL(COSTOS directos) | | | | $ 55.795.914 | | $ 8 | | $ 459.015.649 | | $ 138.479.387 |
| | Administración (20%) | | | | $ 10.759.383 | | $ 2.814 | | $ 93.803.230 | | $ 27.695.877 |
| | Imprevistos (1%) | | | | $ 537.959 | | $ 0 | | $ 9.590.356 | | $ 2.384.794 |
| | Utilidad(4%) (costo directo + ad | | | | $ 2.151.837 | | $ 493 | | $ 18.360.526 | | $ 5.539.175 |
| | ne sobre la utilidad (9%) | | | | | | | | | | $ 1.052.443 |
| | COSTOS DIRECTOS + AU (10) | | | | $ 67.244.892 | | $ 2.784 | | $ 579.769.561 | | $ 174.151.677 |
| | TOTAL CONTRATO (1) (OBRA) | | | | $ 67.244.892 | | | | $ 579.769.561 | | $ 174.151.677 |
| | TOTAL CONTRATO +1 (OBRA) | | | | $ 1.067.219.951 | | $ 741.478.342 | 54,13% | $ 579.769.561 | 16,44% | $ 174.151.677 |
| | | | | | | | | | AMORTIZACION ACTA #4 | | 23.415.008 |
| | | | | | | | | | VALOR ACTA #4 | | 150.736.669 |
| | PORCENTAJE V/DCC ACUMULADO | 54,13% | | | | | | | | | |
| | PORCENTAJE PRESENTE ACTA | 16,44% | | | | | | | | | |

EDUARDO CIFUENTES HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SAGUDET 24.70%

CARLOS ALBERTO RAMBAL BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA BALBOA 2022

SEBASTIAN OVIEDA ARCILAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**
NIT 901.574.342-5
CR 15 # 148-75 TORRE 4 304
Tel: (604) 3235686
Monteria - Colombia
gerenciaecolegua@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 7**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BALBOA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 890.801.143-1 | **Teléfono** | (606) 3146208880 - Ext. 000 - (606) 3146382479 - Ext. 000 | **Generación** | 18/12/2024, 15:03 |
| **Dirección** | CLL 8 NO 6-44 | **Ciudad** | Risaralda - Colombia | **Expedición** | 18/12/2024, 15:03 |
| | | | | **Vencimiento** | 18/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA 03 del contrato REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA AMORTIZACION DEL ANTICIPO 15% (23,415,008) | 1.00 | 139,531,830.34 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Ciento setenta y cuatro millones ciento cincuenta y un mil seiscientos setenta y siete pesos m/cte con nueve cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 174,151,677.09

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 138,479,387.00 |
| Administración 20.00% | 27,695,877.40 |
| Imprevistos 1.00% | 1,384,793.87 |
| Utilidad 4.00% | 5,539,175.48 |
| IVA 19% | 1,052,443.34 |
| **Total a Pagar** | 174,151,677.09 |

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR CUENTA BANCO CAJA SOCIAL CONSORCIO SACUDETE BALBOA
CUENTA DE AHORROS NUMERO 24140453560

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082536407 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 3 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0

**CUFE:** 634a5a39b964469e74c4940271 3ffb44cdb65e40aab747f29abd358064a04e0eaafe841226e09b08684443453216936 1

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Numero Software Siigo Nube. Firma electrónica versión 10.10.6

| | COMUNICACIONES OFICIALES<br>DEPARTAMENTO DE RISARALDA<br>MUNICIPIO DE BALBOA<br>NIT 890801143-1 | Código: GDFO-03<br>Versión: 02 |
|---|---|---|

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| **Cuenta a Debitar** | **Valor** | **Cuenta Destino** |
|---|---|---|
| 457253005106 | 122.969.474 | 24140453560 Cuenta de Ahorros De Banco Caja social a nombre de Consorcio sacudete Balboa Nit 901.574.342 |
| **TOTAL** | **122.969.474** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**REINEL CASTAÑEDA MARQUEZ**
Tesorero General

**Proyectó:** Reinel Castañeda Márquez – Tesorero General.
**Revisó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas.
**Aprobó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda y finanzas

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar $ 122.969.474,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

CONSORCIO SACUDETE BALBOA

******3560**

Monto a acreditar $ 122.969.474,00

**Monto $**
**122.969.474,00**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: --

Descripción:

19/12/2024 - 03:46:43 p. m. | IP actual: 192.168.205.17

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE RISARALDA**
**MUNICIPIO DE BALBOA**
**NIT 890801143-1**

## ACTA DE POSESIÓN NÚMERO 009

En el Despacho del Alcalde del Municipio de Balboa Risaralda, se hizo presente hoy 16 de abril de 2025, dentro del horario de trabajo, el señor **MICK MAEL BAEZ ROJAS,** con permiso por protección temporal No. 5046473, con el fin de tomar posesión legal del cargo de **DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, Código 009, Grado 01,** nombrado mediante Resolución del de la Alcaldía municipal.

El interesado presentó los siguientes documentos.

Fotocopia Permiso por Pprotección Temporal
Formato único, hoja de vida persona natural (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)
Declaración juramentada de bienes y actividad económica privada
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la contraloría
Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría
Certificado de antecedentes judiciales
Medidas correctivas
Certificado Delitos sexuales
Certificados de estudios
Certificados de experiencia laboral

Correo electrónico: ingmickbaez2022@gmail.com
Dirección: Mz H Casa 8 Mirador de Panorama 3, Cuba Pereira Risaralda
Numero Teléfono: 3209735331

El señor Alcalde procedió a tomarle el juramento de conformidad con las normas consagradas en la Constitución Nacional y la Ley, quien manifestó bajo la gravedad de juramento no estar incurso (a) en causal alguna de inhabilidad general y especial, de incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley 4 de 1992 y demás disposiciones vigentes para el desempeño de empleos Públicos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 2.2.5.1.8 del decreto 1083 de 2015 declaró bajo la gravedad de juramento no tener conocimiento de proceso pendientes de carácter alimentario o que cumplirá con sus obligaciones de familia.

No siendo otro el objeto de la presente, se termina y firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MÁRQUEZ**
Alcalde Municipal

**MICK MAEL BAEZ ROJAS**
Posesionado

Archivado en Serie: 10000.17 Decretos

**RESOLUCIÓN NUMERO** 0000211
( 22 ABR. 2025 )

**"POR LA CUAL SE ORDENA EL CAMBIO DE DESIGNACION DE FUNCIONARIO PARA LA SUPERVISIÓN DE ALGUNOS CONTRATOS Y CONVENIOS EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA"**

**EL ALCALDE MUNICIPAL DE BALBOA - RISARALDA,**

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, atendiendo a los lineamientos y postulados del Estatuto de Contratación Administrativa – Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y las demás normas vigentes que las reglamentan, modifican o adicionan y,

**CONSIDERANDO**

**A.** Que el **MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA**, es una entidad territorial de conformidad con el artículo 286 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual se rige para los efectos de la contratación, por el Estatuto General de la Administración Pública.

**B.** Que el proceso de contratación estatal, constituye uno de los mecanismos de cumplimiento de los fines constitucionales del Estado, sirviendo a la comunidad, promoviendo la prosperidad general, garantizando los principios, derechos y deberes, estando al servicio del interés general y bien común, con fundamento en la igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, eficiencia, imparcialidad, responsabilidad, sana administración, economía y publicidad, mediante la descentralización y desconcentración de funciones.

**C.** Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Asimismo, las autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, acorde con el artículo 209 de la Constitución Política.

**D.** Que el **MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA** suscribió los siguientes Contratos y Convenios, los cuales se encuentran en ejecución:

Vigencia 2021:

1- Convenio interadministrativo número 2001 de 2021 suscrito entre ministerio del interior y municipio de Balboa Risaralda, objeto "Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo uno en el municipio de Balboa Risaralda".

Vigencia 2022:

1- Contrato de Obra Pública N° 001 de 2022, cuyo objeto es "Realizar estudios, diseños y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa Risaralda".

2- Contrato de Interventoría N° 001 de 2022, cuyo objeto es "Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa Risaralda".

Vigencia 2023:

1- Contrato interadministrativo Nº 004 de 2023, cuyo objeto es "Llevar a cabo la construcción y remodelación de una plaza parque en el municipio de Balboa Risaralda".

2- Contrato interadministrativo N° 006 de 2023, cuyo objeto es "Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a la construcción y remodelación de una plaza parque en el municipio de Balboa Risaralda".

3- Convenio interadministrativo N° C01 PCCNTR 5134415, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la realización de las obras de refuerzo y adecuación para la edificación del antiguo Telecom como parte del proyecto del museo del cacao y café del municipio de Balboa Risaralda".

   - Contrato de obra N° 001 de 2023 cuyo objeto es "Llevar a cabo obras de refuerzo y adecuación para la edificación del antiguo Telecom como parte del proyecto del museo del cacao y café del municipio de Balboa Risaralda".

   - Contrato de interventoría N°001 de 2023 cuyo objeto es "Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica obras de refuerzo y adecuación para la edificación del antiguo Telecom como parte del proyecto del museo del cacao y café del municipio de Balboa Risaralda".

4- Resolución No. 309 del 26 de junio de 2023, mediante la cual se designa la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE RISARALDA, como ejecutora del proyecto mejoramiento urbanístico y vial de la vía principal de Balboa Risaralda.

Vigencia 2025

1- Contrato Interadministrativo N° 002 De 2025, cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento rutinario, periódico y reparaciones menores en los sectores de infraestructura educativa, equipamiento municipal, vías, limpieza de cunetas, transversales, zonas verdes y rocería, en el municipio de Balboa Risaralda".

2- Contrato Interadministrativo N°004 de 2025, cuyo objeto es "Llevar a cabo las obras para el mejoramiento de vivienda, incluye mano de obra, herramientas, equipos y transporte en la zona rural y urbana del municipio de Balboa Risaralda".

**E.** Que para los contratos y convenios anteriores quedo contemplada la supervisión por parte de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, y la persona que se desempeñaba en el cargo presentó su renuncia; ya no hace parte de la planta de personal, y en la actualidad por orden legal está a cargo del Alcalde Municipal como máxima autoridad administrativa municipal.

**F.** Que es necesario designar a un funcionario idóneo que realice las supervisiones, para el normal desarrollo de los contratos.

**G.** Que el artículo 9 de la ley 489 de 1998 dicta las reglas sobre la delegación de funciones de autoridades administrativas a sus colaboradores con funciones afines o complementarias.

**H.** Que, en el tránsito de las labores de supervisión, este deberá efectuarlas en un marco de total imparcialidad, honrando los postulados de la moralidad, y propendiendo por la marcada trazabilidad de su accionar, siendo responsable de mantener informado en todo momento al Municipio de Balboa, de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

**I.** Que en atención a los principios que rigen la contratación estatal y función administrativa se designará al Ingeniero Mick Mael Baez Rojas, con permiso de protección temporal No. 5046473, Director de Infraestructura y Obras Públicas, Código 009, Grado 01, nombrado mediante Resolución No. 205 del 15 de abril de 2025 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 009 del 16 de abril del mismo año; asignado a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, conforme a lo establecido en los literales de la precedencia.

Que, en mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º:** Designar al Ingeniero **MICK MAEL BAEZ ROJAS**, con permiso de protección temporal No. 5046473, Director de Infraestructura y Obras Públicas, Código 009, Grado 01, nombrado mediante Resolución No. 205 del 15 de abril de 2025 y posesionado mediante Acta de Posesión No. 009 del 16 de abril del mismo año; la supervisión de los siguientes contratos y convenios:

1. Convenio interadministrativo número 2001 de 2021 suscrito entre ministerio del interior y municipio de Balboa Risaralda, objeto "Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo uno en el municipio de Balboa Risaralda".

2. Contrato de Obra Pública N° 001 de 2022, cuyo objeto es "Realizar estudios, diseños y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de balboa Risaralda".

3. Contrato de Interventoría N° 001 de 2022, cuyo objeto es "Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a los estudios y diseños y las obras de construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa Risaralda".

4. Contrato interadministrativo Nº 004 de 2023, cuyo objeto es "llevar a cabo la construcción y remodelación de una plaza parque en el municipio de Balboa Risaralda".

5. Contrato interadministrativo N° 006 de 2023, cuyo objeto es "Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica a la construcción y remodelación de una plaza parque en el municipio de Balboa Risaralda".

6. Convenio interadministrativo N° C01 PCCNTR 5134415, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la realización de las obras de refuerzo y adecuación para la edificación del antiguo Telecom como parte del proyecto del museo del cacao y café del municipio de Balboa Risaralda".

   - Contrato de obra N° 001 de 2023 cuyo objeto es "Llevar a cabo obras de refuerzo y adecuación para la edificación del antiguo Telecom como parte del proyecto del museo del cacao y café del municipio de Balboa Risaralda".

   - Contrato de interventoría N°001 de 2023 cuyo objeto es "Realizar la interventoría, técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica obras de refuerzo y adecuación para la edificación del antiguo Telecom como parte del proyecto del museo del cacao y café del municipio de Balboa Risaralda".

7. Resolución No. 309 del 26 de junio de 2023, mediante la cual se designa la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE RISARALDA, como ejecutora del proyecto mejoramiento urbanístico y vial de la vía principal de Balboa Risaralda.

8. Contrato Interadministrativo N° 002 De 2025, cuyo objeto es "Realizar el mantenimiento rutinario, periódico y reparaciones menores en los sectores de infraestructura educativa, equipamiento municipal, vías, limpieza de cunetas, transversales, zonas verdes y rocería, en el municipio de Balboa Risaralda".

9. Contrato Interadministrativo N°004 de 2025, cuyo objeto es "Llevar a cabo las obras para el mejoramiento de vivienda, incluye mano de obra, herramientas, equipos y transporte en la zona rural y urbana del municipio de Balboa Risaralda".

**ARTÍCULO 2º:** Notificar la presente Resolución al funcionario designado y colocar a disposición la carpeta contractual para los fines pertinentes.

**ARTÍCULO 3º:** La presente resolución rige a partir de su comunicación y contra la misma no procede recurso alguno.

**ARTÍCULO 4°:** El presente acto administrativo, hace parte integral del expediente contentivo de los documentos de los contratos y convenios enunciados.

Dada en el municipio de Balboa 22 ABR. 2025

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MÁRQUEZ**
Alcalde Municipal

Proyectó: Maria Fernanda Pulgarín Velásquez – Abogada Contratista CPS 021-2024
Revisó: Alfonso Figueredo Cañas - Asesor Jurídico Externo
Aprobó: Francy Eliana Muñoz González - Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial

Outlook

## CAT_899_2024 - ENVIO COMPROMISOS

**Desde** Victor Eduardo Burgos (CGR) <victor.burgos@contraloria.gov.co>

**Fecha** Mar 06/05/2025 11:49

**Para** notificacionjudicial@balboa-risaralda.gov.co / <figueredo2@hotmail.com>; Viterbo Gomez Carvajal <viterbo.gomez@mininterior.gov.co>; notificacionjudicial@balboa-risaralda.gov.co <notificacionjudicial@balboa-risaralda.gov.co>; obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>; Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>; Maria del Rosario Arbelaez Lozano <maria.arbelaez@mininterior.gov.co>; Laura Lorena murillo Valles <laura.murillo@mininterior.gov.co>; consorciosacudetebalboa@gmail.com <consorciosacudetebalboa@gmail.com>; coninterventoriabalboa2022@gmail.com <coninterventoriabalboa2022@gmail.com>

Respetad@s, buenos días

Atentamente nos permitimos reiterar el suministro de los compromisos acordados en las últimas mesas de seguimiento al proyecto Sacúdete de Balboa; aunque se han generado acuerdos posteriores para el envió de los mismos, a la fecha, varios no se han cumplido como se evidencia seguidamente en “fondo amarillo” en cada uno de los cuadros de las reuniones realizadas:

**MESA DEL 24 DE ABRIL DE 2025**

| No | COMPROMISO | RESPONSABLE – FECHA | CUMPLIDO SI / NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior-Municipio de Balboa 30-abr-2025 | SI |
| 2 | Acta de visita a taller del 26 de abril de 2025, donde se construye la cubierta. | Min-Interior – Interventoría 30-abr-2025 | INCUMPLIDO |
| 3 | Copia oficio de remisión de las certificaciones de calidad a interventoría | Min-Interior – Contratista Obra 30-abr-2025 | INCUMPLIDO |
| 4 | Copia oficio de pronunciamiento de la interventoría frente a la solicitud de modificaciones por parte del contratista de obra. | Min-Interior-Interventoría. 30-abr-2025 | INCUMPLIDO |
| 5 | Copia oficio del municipio al ministerio, solicitando el pronunciamiento del ministerio, frente a la solicitud de modificaciones de ítem. | Min-Interior – Municipio de Balboa 30-abr-2025 | INCUMPLIDO |
| 6 | Informe de avance de los tramites de RETIE y RETILAP | Min- Interior – contratista de obra 30-abr-2025 | INCUMPLIDO |

**MESA DEL 10 DE ABRIL DE 2025**

| No | COMPROMISO | RESPONSABLE | CUMPLIDO |
|---|---|---|---|

| | | | SI / NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior-<br>Municipio de Balboa<br>15-abr-2024 | CUMPLIDO |
| 2 | Relación de informes mensuales producidos hasta la fecha por la interventoría | Min-Interior –<br>Interventoría<br>15-abr-2024 | INCUMPLIDO |
| 3 | Informes mensuales de interventoría de enero, febrero y marzo. | Min-Interior –<br>Interventoría<br>15-abr-2024 | INCUMPLIDO |
| 4 | Informe de supervisión de marzo de 2024 | Min-Interior-<br>Municipio de Balboa<br>15-abr-2024 | INCUMPLIDO |
| 5 | Remisión del estudio de la interventoría sobre el balance presupuestal o relación de precios de ítems a modificar. | Min-Interior –<br>Interventoría<br>15-abr-2024 | INCUMPLIDO |
| 6 | Enviar fotos del avance de la fabricación de la cubierta | Min- Interior –<br>contratista de obra<br>15-abr-2024 | CUMPLIDO |
| 7 | Enviar certificaciones de calidad de los ítems a modificar, a la interventoría y copia al Ministerio | Contratista de obra<br>15-abr-2024 | INCUMPLIDO |
| 8 | Acta de visita de interventoría a taller de inspección a la fabricación cubierta | Min-Interior<br>contratistas de obra e<br>interventoría<br>15-abr-2024 | INCUMPLIDO |

**MESA DEL 03 DE ABRIL DE 2025**

| No | COMPROMISO | RESPONSABLE | CUMPLIDO<br>SI / NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior-<br>Municipio de Balboa<br>8/04/2025 | CUMPLIDO |
| 2 | Cargue informe técnico de incumplimiento de la interventoría. | Min-Interior-<br>Municipio de Balboa -<br>Interventoría<br>8/04/2025 | CUMPLIDO |
| 3 | Remitir correo al Min-Interior con el pantallazo de la subsanación del error de la póliza del convenio. | Min-Interior –<br>Municipio de Balboa<br>8/04/2025 | CUMPLIDO |
| 4 | informes de supervisión del municipio a marzo de 2025 | Min- Interior –<br>Municipio de Balboa<br>8/04/2025 | INCUMPLIDO |
| 5 | **RELACIÓN**, remisión y cargue de los informes mensuales y semanales de interventoría a marzo de 2025 | Min-Interior –<br>Municipio de Balboa –<br>Interventoría<br>8/04/2025 | Contamos con 23 informes semanales del 23 de octubre de 2024 al 2 de abril de 2025. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Sobre los informes mensuales, solo contamos con 3 informes, así:<br>1) del 23 al 29 de octubre de 2024.<br>2) del 23 de octubre al 13 de noviembre de 2024.<br>3) del 30 de octubre 2024 al 25 de enero de 2025 |
| 6 | Respuesta del municipio al Min-Interior sobre el tema de las modificaciones de ítems contractuales. | Min-Interior – Municipio de Balboa<br>8/04/2025 | INCUMPLIDO |

**MESA DEL 20 DE MARZO DE 2025**

| No | COMPROMISO | RESPONSABLE | CUMPLIDO SI / NO |
|---|---|---|---|
| **1** | Evidencias o soportes del inicio de presunto incumplimiento contra la interventoría de obra e informe correspondiente del municipio de Balboa | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>26-Mar-2025 | Informe de incumplimiento del 19 de marzo de 2025 |
| 1 | Solicitud acta de prórroga de la contratación derivada. | Min-Interior – Interventoría | |
| 2 | Envío de la última solicitud de prórroga del contrato de obra | Min-Interior<br>26-Mar-2025 | |
| 3 | Envío oficial parte del municipio de Balboa, de la solicitud o propuesta de modificaciones de ítems contractuales realizada por el contratista de obra, con los avales de interventoría y supervisión y demás SOPORTES COMPLETOS que justifican dicha solicitud. | Min- Interior – Municipio de Balboa<br>26-Mar-2025 | INCUMPLIDO |
| 5 | Respuesta del Ministerio a solicitud de modificación de Ítems. | Min-Interior<br>26-Mar-2025 | CUMPLIDO |
| 6 | Cargue y envío al Ministerio de la evidencia de la actualización de la póliza de la sexta prorroga y tercera modificación del convenio al 30/09/2025. | Min-Interior – Municipio<br>26-Mar-2025 | Se cumplió hasta el 2 de mayo de 2025 |

**MESA DEL 12 DE MARZO DE 2025**

| No | COMPROMISO | RESPONSABLE | CUMPLIDO SI / NO |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación proyectada por el municipio | Min-Interior<br>14/03/2025 | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Relación de todos los informes de interventoría mensuales y semanales producidos hasta la fecha desde el inicio del contrato hasta la fecha. | Min-Interior – Interventoría 14/03/2025 | INCUMPLIDO |
| 3 | Correo del ministerio al municipio de Balboa indicando los lineamientos o requisitos para la solicitud de modificación de ítems contractuales. | Min-Interior 14/03/2025 | CUMPLIDO |
| 4 | Acta de reunión realizada en entre la Alcaldía, supervisión y contratistas de obra e interventoría, para estudio y definición de la propuesta de modificación de ítems contractuales. | Min- Interior – Municipio de Balboa 14/03/2025 | En la carpeta del 20 de marzo se cargaron dos actas de reunión de mesas técnicas |
| 5 | Envío **oficial** parte del municipio de Balboa, de la solicitud o propuesta de modificaciones de ítems contractuales realizada por el contratista de obra, con los avales de interventoría y supervisión y demás SOPORTES COMPLETOS que justifican dicha solicitud. | Min-Interior – Municipio y Contratista de obra e interventoría 14/03/2025 | INCUMPLIDO |

Quedamos atentos al pronto y oportuno envío de estos compromisos

Cordialmente,

Víctor Eduardo Burgos
**Profesional UG - 02 (E)**
**Unidad de Reaccion Inmediata**
**Dirección de Información, Análisis y Racción Inmediata DIARI**
**Contraloria Gerneral de la República**
**Cra 69 No 44 - 35 Pisos 1 - Código postal 111321 - PBX 647 7000**
veburgos@contraloria.gov.co
**Bogota D.C. - Colombia**

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la

Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-016781 Id: 540226
Folios: 7 Fecha: 16-05-2025 14:37:26
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

Bogotá D.C.

Señor:
**JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ**
Alcalde Municipal
Municipio de Balboa – Risaralda
Cra. 8 #89, Palacio Municipal
alcaldia@balboa-risaralda.gov.co

Señor:
**MICK MAEL BAEZ ROJAS**
Director Técnico de la Dirección de Obras e Infraestrutura
Municipio de Balboa – Risaralda
Cra. 8 #89, Palacio Municipal
obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co
planeacion@balboa-risaralda.gov.co

**Asunto:** **Alerta No.3 -** Reiteración al requerimiento No.2, con radicado 2025-2-003122-005582 Id: 500729, respecto a la solicitud de cumplimiento de obligaciones contractuales en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2001-2021 suscrito entre el Ministerio del Interior FONSECON y el Municipio de Balboa - Risaralda.

Respetados Señores:

En atención al Convenio No.2001-2021 suscrito entre la Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Balboa - Risaralda, cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el Municipio de Balboa - Risaralda"* la supervisión del Ministerio del Interior emite la alerta No.3 de manera preventiva con ocasión a un presunto de las obligaciones contractuales establecida dentro del anexo de condiciones del mencionado convenio, razón por la cual, se requiere a la Entidad Territorial para que se sirva remitir de manera inmediata información relacionada sobre los siguientes aspectos:

1. **Informar el estado del proceso contractual adelantado al Contrato de Interventoría No. 001 de 2022:** con sustento en las reuniones lideradas por el equipo de seguimiento y control de la Contraloría General de la República, en dichos espacios, la supervisión del municipio de Balboa-Risaralda informó a esta supervisión del Ministerio del Interior que se adelantaría la suspensión de los contratos de obra e interventoría por un término de quince (15) días, contados a partir del 15 de febrero de 2025. No obstante, la correspondiente información de modificaciones contractuales a estos contratos no han sido enviadas a la supervisión de este ministerio.

2. **Remitir informes de supervisión por parte del Municipio:** De acuerdo con los requerimientos No. 2025-2-003122-000642 Id: 475022 y 2025-2-003122-001365 Id: 480468 con fecha del 14 de enero de 2025 y 23 de enero de 2025 respectivamente, esta supervisión reitera al municipio de Balboa - Risaralda que, a la fecha la Entidad Territorial no ha presentado la documentación correspondiente a la ejecución

del convenio; por consiguiente, se requiere la entrega de la información que se relaciona a continuación:

- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de noviembre de 2024, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de enero de 2025, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de febrero de 2025, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de marzo de 2025, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de supervisión del Municipio correspondiente al mes de abril de 2025, junto con el respectivo informe financiero y extracto bancario.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de enero de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de febrero de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de marzo de 2025.
- Informe mensual de interventoría correspondiente al mes de abril de 2025.
- Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de abril de 2025.
- Informes semanales de interventoría correspondientes al mes de mayo de 2025.

3. **Cumplimiento a los compromisos adquiridos a las reuniones de seguimiento permanente convocadas por la unidad de reacción inmediata de la Contraloría General de la República.** Se solicita a la entidad territorial informar detalladamente sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de trabajo realizadas de manera virtual, en el marco de las reuniones de seguimiento lideradas por la Unidad de Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República.

A pesar de que, en varias mesas de trabajo, se han otorgado plazos adicionales a los establecidos inicialmente para su cumplimiento, a la fecha no se ha recibido la correspondiente documentación o evidencias requeridas y varios de los compromisos permanecen incumplidos. Esta situación se encuentra registrada en los cuadros de seguimiento elaborados en el desarrollo de cada una de las reuniones, los cuales se describen a continuación:

| MESA DE TRABAJO DEL 12 DE MARZO DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | COMPROMISO | RESPONSABLE – FECHA | ESTADO |
| 1 | Presentación proyectada por el municipio. | Min-Interior 14/03/2025 | CUMPLIDO |
| 2 | Relación de todos los informes de interventoría mensuales y semanales producidos hasta la fecha desde el inicio del contrato hasta la fecha. | Min-Interior – Interventoría 14/03/2025 | INCUMPLIDO |
| 3 | Correo enviado por Ministerio del Interior al municipio de Balboa indicando los lineamientos o requisitos para la solicitud de modificación de ítems contractuales. | Min-Interior 14/03/2025 | CUMPLIDO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Acta de reunión suscrita entre la Alcaldía de Balboa-Risaralda, supervisión y contratistas de obra e interventoría, para estudio y definición de la propuesta de modificación de ítems contractuales. | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>14/03/2025 | **En la carpeta del 20 de marzo se cargaron dos actas de reunión de mesas técnicas** |
| 5 | Envío **oficial** por parte del municipio de Balboa-Risaralda de la solicitud o propuesta de modificaciones de ítems contractuales realizada por el contratista de obra, con los avales de interventoría y supervisión y demás SOPORTES COMPLETOS que justifican dicha solicitud. | Min-Interior – Municipio y Contratista de obra e interventoría<br>14/03/2025 | **INCUMPLIDO** |

| MESA DE TRABAJO DEL 20 DE MARZO DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Evidencias o soportes del inicio de presunto incumplimiento contra la interventoría de obra e informe correspondiente del municipio de Balboa | Min-Interior- Municipio de Balboa<br>26-Mar-2025 | **Informe de incumplimiento del 19 de marzo de 2025** |
| 2 | Solicitud acta de prórroga de la contratación derivada. | Min-Interior – Interventoría | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Envío de la última solicitud de prórroga del contrato de obra | Min-Interior – Municipio de Balboa<br>26-Mar-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 4 | Envío oficial parte del municipio de Balboa-Risaralda de la solicitud o propuesta de modificaciones de ítems contractuales realizada por el contratista de obra con los avales de interventoría y supervisión y demás SOPORTES COMPLETOS que justifican dicha solicitud. | Min- Interior – Municipio de Balboa<br>26-Mar-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | Respuesta del Ministerio del Interior a solicitud de modificación de Ítems. | Min-Interior<br>26-Mar-2025 | **CUMPLIDO** |
| 6 | Cargue y envío al Ministerio del Interior de la evidencia de la actualización de la póliza de la | Min-Interior – Municipio<br>26-Mar-2025 | **Se cumplió hasta el 2 de mayo de 2025** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | sexta prórroga y tercera modificación del convenio al 30/09/2025 | | |

| MESA DE TRABAJO DEL 03 DE ABRIL DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | COMPROMISO | RESPONSABLE – FECHA | ESTADO |
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior- Municipio de Balboa 8/04/2025 | CUMPLIDO |
| 2 | Cargue informe técnico de incumplimiento de la interventoría. | Min-Interior- Municipio de Balboa -Interventoría 8/04/2025 | CUMPLIDO |
| 3 | Remitir correo al Min-Interior con el pantallazo de la subsanación del error de la póliza del convenio. | Min-Interior – Municipio de Balboa 8/04/2025 | CUMPLIDO |
| 4 | Informes de supervisión del municipio a marzo de 2025. | Min- Interior – Municipio de Balboa 8/04/2025 | INCUMPLIDO |
| 5 | RELACIÓN, remisión y cargue de los informes mensuales y semanales de interventoría a marzo de 2025. | Min-Interior – Municipio de Balboa – Interventoría 8/04/2025 | Contamos con 23 informes semanales del 23 de octubre de 2024 al 2 de abril de 2025.<br><br>Sobre los informes mensuales, solo contamos con 3 informes, así:<br>1) del 23 al 29 de octubre de 2024.<br>2) del 23 de octubre al 13 de noviembre de 2024.<br>3) del 30 de octubre 2024 al 25 de enero de 2025.<br><br>INCUMPLIDO |
| 6 | Respuesta del municipio al Min-Interior sobre el tema de las modificaciones de ítems contractuales. | Min-Interior – Municipio de Balboa 8/04/2025 | INCUMPLIDO |

| MESA DE TRABAJO DEL 10 DE ABRIL DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| ITE | COMPROMISO | RESPONSABLE – FECHA | ESTADO |

| M | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Presentación del estado del proyecto. | Min-Interior- Municipio de Balboa 15-abr-2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Relación de informes mensuales producidos hasta la fecha por la interventoría. | Min-Interior – Interventoría 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Informes mensuales de interventoría de enero, febrero y marzo. | Min-Interior – Interventoría 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 4 | Informe de supervisión de marzo de 2024. | Min-Interior- Municipio de Balboa 15-abr-2024 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | Remisión del estudio de la interventoría sobre el balance presupuestal o relación de precios de ítems a modificar. | Min-Interior – Interventoría 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 6 | Enviar fotos del avance de la fabricación de la cubierta. | Min- Interior – contratista de obra 15-abr-2024. | **CUMPLIDO** |
| 7 | Enviar certificaciones de calidad de los ítems a modificar, a la interventoría y copia al Ministerio del Interior. | Contratista de obra 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |
| 8 | Acta de visita de interventoría a taller de inspección a la fabricación cubierta. | Min-Interior contratistas de obra e interventoría 15-abr-2024. | **INCUMPLIDO** |

| MESA DE TRABAJO DEL 24 DE ABRIL DE 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **ITEM** | **COMPROMISO** | **RESPONSABLE – FECHA** | **ESTADO** |
| 1 | Presentación del estado del proyecto | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **CUMPLIDO** |
| 2 | Acta de visita a taller del 26 de abril de 2025, donde se construye la cubierta. | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 3 | Copia oficio de remisión de las certificaciones de calidad a interventoría | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 4 | Copia oficio de pronunciamiento de la interventoría frente a la solicitud de modificaciones por parte del contratista de obra. | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 5 | Copia oficio del municipio al ministerio, solicitando el pronunciamiento del ministerio, frente a la solicitud de modificaciones de ítem. | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025 | **INCUMPLIDO** |
| 6 | Informe de avance de los tramites de RETIE y RETILAP | Min-Interior- Municipio de Balboa 30-abr-2025. | **INCUMPLIDO** |

**Nota:** Es importante señalar que, si bien en la relación de compromisos establecidos por la Contraloría en las mesas de trabajo mencionadas se asigna al Ministerio del Interior la responsabilidad sobre algunos de ellos, es necesario precisar que el cumplimiento de dichos compromisos depende estrictamente de la gestión del municipio de Balboa – Risaralda. Esto se debe a que, en su calidad de ejecutor del convenio, es el municipio quien debe garantizar la adecuada ejecución de las actividades. En cuanto a la supervisión por parte del Ministerio del Interior, esta se limita exclusivamente al cargue de información en la carpeta de Drive dispuesta por el órgano de control, con el fin de facilitar el conocimiento y la publicación de la documentación correspondiente.

Bajo las circunstancias mencionadas anteriormente, el Municipio de Balboa – Risaralda, se enfrenta a un escenario con alto riesgo de inconclusión del proyecto y posible incumplimiento de las obligaciones contractuales indicadas en el Convenio Interadministrativo No.2001-2021, dentro de las cuales se particularizan:

> *(...) "**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: **I. ESPECÍFICAS:***
>
> *(…)**4)** Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo. (…)*
>
> *(…)**30)** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. (…)*
>
> *(…) **34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría" (…).*

En virtud de lo expuesto anteriormente y reiterando lo señalado en el requerimiento No.2 bajo el radicado No. 2025-2-003122-005582 Id: 500729, se solicita nuevamente que, el Municipio de Balboa - Risaralda, en el marco del cumplimiento de las obligaciones contractuales del Convenio No. 2001-2021, de estricto cumplimiento a las mismas y emita respuesta a este oficio de manera **INMEDIATA**, remitiendo la información necesaria que permita subsanar los hechos descritos en los numerales 1,y 3;resaltando que, en el caso de que la suspensión a los contratos derivados haya sido perfeccionada por parte de la Entidad, se deberá indicar el plan emergente de acción tendiente a garantizar la ejecución del 100% del objeto contractual, dentro de los términos establecidos en la Prórroga No.6 del convenio, en la cual se determinó el plazo final de ejecución para el **próximo treinta (30) de septiembre de 2025.**

Atentamente,

**VITERBO GOMEZ CARVAJAL**
**Supervisor del Convenio No.2001-2021**
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

C.C. ASEGURADORA SOLIDARIA POLIZA No. 580-47-994000069129

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-016781 Id: 540226
Folios: 7 Fecha: 16-05-2025 14:37:26
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

Elaboró: Ing. Laura L. Murillo Valles – Apoyo a la supervisión SPS
Revisó: Abg Diana Carolina Guerra Urbina Guerra / Apoyo jurídico SPS
Revisó: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera - Apoyo a la supervisión SPS

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE DE 2024**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | | |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 598.228.160,00** | **$ 56.100.050,00** | **$ 654.328.210,00** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 01/11/2024 | $ 183.185,00 |
| 05/11/2024 | $ 45.802,00 |
| 06/11/2024 | $ 45.805,00 |
| 07/11/2024 | $ 44.488,00 |
| 08/11/2024 | $ 160.371,00 |
| 12/11/2024 | $ 40.098,00 |
| 13/11/2024 | $ 40.100,00 |
| 14/11/2024 | $ 40.103,00 |
| 15/11/2024 | $ 120.321,00 |
| 18/11/2024 | $ 40.111,00 |
| 19/11/2024 | $ 40.113,00 |
| 20/11/2024 | $ 40.116,00 |
| 21/11/2024 | $ 40.118,00 |
| 22/11/2024 | $ 120.367,00 |
| 25/11/2024 | $ 40.127,00 |
| 26/11/2024 | $ 40.129,00 |
| 27/11/2024 | $ 29.178,00 |
| 28/11/2024 | $ 29.180,00 |
| 29/11/2024 | $ 87.549,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 1.227.261,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 654.328.210,00** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 18.544.233,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 19.962.566,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 1.227.261,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 414.514.910,59** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #22"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de octubre $1.067.615.859,59, menos los pagos $225.015.328 para un saldo a septiembre de $842.600.531,59**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO DICIEMBRE DE 2024**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 | | |
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | | | | | | | |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | N/A | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 796.856.044,61** | **$ 56.100.050,00** | **$ 852.956.094,61** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 02/12/2024 | $ 29.186,00 |
| 03/12/2024 | $ 29.188,00 |
| 04/12/2024 | $ 29.189,00 |
| 05/12/2024 | $ 29.191,00 |
| 06/12/2024 | $ 72.730,00 |
| 09/12/2024 | $ 24.246,00 |
| 10/12/2024 | $ 24.247,00 |
| 11/12/2024 | $ 24.248,00 |
| 12/12/2024 | $ 24.249,00 |
| 13/12/2024 | $ 72.755,00 |
| 16/12/2024 | $ 24.254,00 |
| 17/12/2024 | $ 24.255,00 |
| 18/12/2024 | $ 24.256,00 |
| 19/12/2024 | $ 18.247,00 |
| 20/12/2024 | $ 54.747,00 |
| 23/12/2024 | $ 18.251,00 |
| 24/12/2024 | $ 36.504,00 |
| 26/12/2024 | $ 18.253,00 |
| 27/12/2024 | $ 54.765,00 |
| 30/12/2024 | $ 49.096,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 681.857,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 796.856.044,61** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 20.644.423,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 20.644.423,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 681.857,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 274.087.265,98** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de Diciembre $1.070.943.310,59, menos los pagos $796,856,044,61 para un saldo a Diciembre de $274,087,265,98**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO ENERO DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | | | | | | | |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | N/A | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 796.856.044,61** | **$ 56.100.050,00** | **$ 852.956.094,61** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 02/01/2025 | $ 16.367,00 |
| 03/01/2025 | $ 65.476,00 |
| 07/01/2025 | $ 16.371,00 |
| 08/01/2025 | $ 16.372,00 |
| 09/01/2025 | $ 16.373,00 |
| 10/01/2025 | $ 49.122,00 |
| 13/01/2025 | $ 16.376,00 |
| 14/01/2025 | $ 16.377,00 |
| 15/01/2025 | $ 16.377,00 |
| 16/01/2025 | $ 16.378,00 |
| 17/01/2025 | $ 49.139,00 |
| 20/01/2025 | $ 16.381,00 |
| 21/01/2025 | $ 16.382,00 |
| 22/01/2025 | $ 16.383,00 |
| 23/01/2025 | $ 16.384,00 |
| 24/01/2025 | $ 49.156,00 |
| 27/01/2025 | $ 16.387,00 |
| 28/01/2025 | $ 16.388,00 |
| 29/01/2025 | $ 14.583,00 |
| 30/01/2025 | $ 14.584,00 |
| 31/01/2025 | $ 43.755,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 515.111,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 796.856.044,61** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 21.159.534,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 20.644.423,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 515.111,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 274.602.376,98** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de Enero $1.071.291,675,59, menos los pagos $796,856,044,61 para un saldo a enero de $274,435,630,98**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO MARZO DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 272 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 5.022.956,00 | N/A | $ 5.022.956,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 825.208.943,61** | **$ 56.100.050,00** | **$ 881.308.993,61** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 03/03/2025 | $ 13.466,00 |
| 04/03/2025 | $ 13.466,00 |
| 05/03/2025 | $ 13.222,00 |
| 06/03/2025 | $ 13.222,00 |
| 07/03/2025 | $ 39.671,00 |
| 10/03/2025 | $ 13.225,00 |
| 11/03/2025 | $ 13.226,00 |
| 12/03/2025 | $ 13.226,00 |
| 13/03/2025 | $ 13.227,00 |
| 14/03/2025 | $ 39.684,00 |
| 17/03/2025 | $ 13.229,00 |
| 18/03/2025 | $ 13.230,00 |
| 19/03/2025 | $ 13.231,00 |
| 20/03/2025 | $ 13.231,00 |
| 21/03/2025 | $ 52.932,00 |
| 25/03/2025 | $ 13.235,00 |
| 26/03/2025 | $ 13.235,00 |
| 27/03/2025 | $ 13.236,00 |
| 28/03/2025 | $ 39.711,00 |
| 31/03/2025 | $ 13.238,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 384.143,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 825.208.943,61** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 21.946.665,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2025** | $ 515.111,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2025** | $ 402.988,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 21.562.522,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 384.143,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 247.036.608,98** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de Marzo $1.072.245.552,59, menos los pagos $825.208.943,61 para un saldo a Marzo de $247,036,608,98**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO FEBRERO DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | | | | | | | |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | N/A | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 820.185.987,61** | **$ 56.100.050,00** | **$ 876.286.037,61** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 03/02/2025 | $ 14.586,00 |
| 04/02/2025 | $ 14.587,00 |
| 05/02/2025 | $ 14.588,00 |
| 06/02/2025 | $ 14.589,00 |
| 07/02/2025 | $ 43.770,00 |
| 10/02/2025 | $ 14.591,00 |
| 11/02/2025 | $ 14.592,00 |
| 12/02/2025 | $ 14.593,00 |
| 13/02/2025 | $ 14.594,00 |
| 14/02/2025 | $ 43.785,00 |
| 17/02/2025 | $ 14.596,00 |
| 18/02/2025 | $ 14.597,00 |
| 19/02/2025 | $ 14.598,00 |
| 20/02/2025 | $ 14.599,00 |
| 21/02/2025 | $ 43.800,00 |
| 24/02/2025 | $ 14.601,00 |
| 25/02/2025 | $ 14.602,00 |
| 26/02/2025 | $ 13.463,00 |
| 27/02/2025 | $ 13.463,00 |
| 28/02/2025 | $ 40.394,00 |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 402.988,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 820.185.987,61** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 21.562.522,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2025** | $ 515.111,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 21.159.534,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 402.988,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 251.675.421,98** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de Febrero $1.071.861.409,59, menos los pagos $820.185.987,61 para un saldo a Febrero de $251.675.421,98**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONVENIO 2001 DE 2021**

**OBJETO:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

**INFORME FINANCIERO ABRIL DE 2025**
**MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**

| | |
|---|---|
| **PROYECTO (S):** | SACUDETE TIPO 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA ( AHORROS) No.457253005106** | | **DEL BANCO:** | **AGRARIO DE COLOMBIA** |
| **VALOR CONVENIO** | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR | | | **$ 1.250.000.000,00** |
| VALOR APORTE MUNICIPIO | | | |
| | **FECHA DE GIRO** | | |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 07/12/2021 | GIRO 1 | $ 225.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/06/2023 | GIRO 2 | $ 4.640.003,06 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 05/07/2023 | GIRO 3 | $ 611.357,67 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 02/08/2023 | GIRO 4 | $ 13.283,37 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 06/08/2023 | GIRO 5 | $ 22.272,65 |
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | 25/10/2023 | GIRO 6 | $ 820.000.000,00 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 04/10/2023 | GIRO 7 | $ 9.373,15 |
| VALOR GIRADO POR IDENTIFICAR | 27/10/2023 | GIRO 8 | $ 2.597,69 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | | **$ 1.050.298.887,59** |
| **VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** | | | **$ 1.050.298.887,59** |

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO | VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | $ 1.124.000.000,00 | $ 67.244.892,00 | $ 1.191.244.892,00 | $ 1.124.000.000,00 |
| CI No.001 | CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 | $ 124.971.539,00 | $ 5.382.898,00 | $ 130.354.437,00 | $ 124.971.539,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 1.321.599.329,00** | **$ 1.248.971.539,00** |

**VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:**

| CONTRATO No. | OBJETO DEL PAGO | No. DE ORDEN DE PAGO | No. DE COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA DE PAGO | AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR | AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO | VALOR DEL PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO No.001 | ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 66.708.066,00 | N/A | $ 66.708.066,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | $ 12.880,00 |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | $ 2.448,00 |
| | | | | | | N/A | $ - |
| CO No.001 | OBRA ACTA 1 | 2574 | 2574 | 08/11/2024 | $ 129.256.866,00 | N/A | $ 129.256.866,00 |
| | OBRA ACTA 2 | 2778 | 2757 | 27/11/2024 | $ 243.955.966,00 | N/A | $ 243.955.966,00 |
| | OBRA ACTA 3 | 3117 | 3102 | 19/12/2024 | $ 150.736.669,00 | N/A | $ 150.736.669,00 |
| | OBRA ACTA 5 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 23.329.943,00 | N/A | $ 23.329.943,00 |
| | DESCUENTOS DE OP 272 | 272 | 269 | 26/02/2025 | $ 5.022.956,00 | N/A | $ 5.022.956,00 |
| | OBRA ACTA 6 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 33.731.130,24 | N/A | $ 33.731.130,24 |
| | DESCUENTOS DE OP 679 | 679 | 678 | 15/04/2025 | $ 7.788.170,00 | N/A | $ 7.788.170,00 |
| CI No.001 | INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS | 2247 | 2327 | 02/11/2022 | $ 33.683.744,00 | N/A | $ 33.683.744,00 |
| | COMISION CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 6.440,00 | N/A | |
| | IVA CUENTA BANCARIA | N/A | N/A | 20/10/2022 | $ 1.224,00 | N/A | |
| | DESCUENTOS DE OP 2247 Y 2171 | 2171 | 2198 | 20/10/2022 | $ 24.608.190,00 | N/A | $ 24.608.190,00 |
| | ACTA 2 | 3302 | 3336 | 30/12/2024 | $ 47.891.215,61 | N/A | $ 47.891.215,61 |
| | | | | | | | |
| CO No.001 | ANTICIPO | 266 | 295 | 01/03/2023 | $ 100.000.000,00 | $ 56.100.050,00 | $ 156.100.050,00 |
| | | | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | | | **$ 866.728.243,85** | **$ 56.100.050,00** | **$ 922.828.293,85** |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 01/04/2025 | $ 13.239,00 |
| 02/04/2025 | $ 13.240,00 |
| 03/04/2025 | $ 13.240,00 |
| 04/04/2025 | $ 39.725,00 |
| 07/04/2025 | $ 13.243,00 |
| 08/04/2025 | $ 13.244,00 |
| 09/04/2025 | $ 13.244,00 |
| 10/04/2025 | $ 13.245,00 |
| 11/04/2025 | $ 39.739,00 |
| 14/04/2025 | $ 13.247,00 |
| 15/04/2025 | $ 11.599,00 |
| 16/04/2025 | $ 58.006,00 |
| 21/04/2025 | $ 11.603,00 |
| 22/04/2025 | $ 11.603,00 |
| 23/04/2025 | $ 11.604,00 |
| 24/04/2025 | $ 11.605,00 |
| 25/04/2025 | $ 34.817,00 |
| 28/04/2025 | $ 11.607,00 |
| 29/04/2025 | $ 11.607,00 |
| 30/04/2025 | $ 23.216,00 |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 382.673,00** |

**DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No.32030000026-3**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS | No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS |
|---|---|---|
| 04/04/2025 | $ 30.914.911,00 | 1387874903 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 30.914.911,00** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** | **$ 1.050.298.887,59** |
| **TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** | **$ 866.728.243,85** |
| **TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** | **$ 22.329.338,00** |
| **Rendimientos financieros noviembre 2021** | $ 0,00 |
| **Rendimientos financieros diciembre 2021** | $ 66.450,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2022** | $ 71.398,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2022** | $ 93.827,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2022** | $ 109.244,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2022** | $ 114.517,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2022** | $ 110.878,00 |
| **Rendimientos financieros junio 2022** | $ 110.933,00 |
| **Rendimientos financieros julio 2022** | $ 122.680,00 |
| **Rendimientos financieros agosto 2022** | $ 141.496,00 |
| **Rendimientos financieros septiembre 2022** | $ 180.002,00 |
| **Rendimientos financieros octubre 2022** | $ 186.664,00 |
| **Rendimientos financieros noviembre 2022** | $ 117.501,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2022** | $ 114.898,00 |
| **Rendimientos financieros enero 2023** | $ 107.839,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2023** | $ 137.812,00 |
| **Rendimientos financieros marzo 2023** | $ 2.074,00 |
| **Rendimientos financieros abril 2023** | $ 1.823,00 |
| **Rendimientos financieros mayo 2023** | $ 1.887,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2023** | $ 6.674,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2023** | $ 6.950,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2023** | $ 7.746,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2023** | $ 7.775,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2023** | $ 319.955,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2023** | $ 1.347.825,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2023** | $ 1.440.100,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2024** | $ 1.352.364,00 |
| **Rendimientos financieros Febrero 2024** | $ 1.309.380,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2024** | $ 1.401.962,00 |
| **Rendimientos financieros Abril 2024** | $ 1.404.322,00 |
| **Rendimientos financieros Mayo 2024** | $ 1.497.523,00 |
| **Rendimientos financieros Junio 2024** | $ 1.272.729,00 |
| **Rendimientos financieros Julio 2024** | $ 1.365.785,00 |
| **Rendimientos financieros Agosto 2024** | $ 1.459.288,00 |
| **Rendimientos financieros Septiembre 2024** | $ 1.324.671,00 |
| **Rendimientos financieros Octubre 2024** | $ 1.418.333,00 |
| **Rendimientos financieros Noviembre 2024** | $ 1.227.261,00 |
| **Rendimientos financieros Diciembre 2024** | $ 681.857,00 |
| **Rendimientos financieros Enero 2025** | $ 515.111,00 |
| **Rendimientos financieros febrero 2025** | $ 402.988,00 |
| **Rendimientos financieros Marzo 2025** | $ 384.143,00 |
| **TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** | **$ 21.946.665,00** |
| **SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** | **$ 382.673,00** |
| **SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (3)** | **$ 205.899.981,74** |

**OBSERVACIONES**

**El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #25"corresponde a GIRO 1 y GIRO 2 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de ABRIL $1.072.628.225.59, menos los pagos $866.728.243,85 para un saldo a ABRIL de $205.899.981,74**

**FIRMA**

**YURLEY ARIAS DUQUE**
Secretaria de Hacienda y Finanzas

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS.

**CONCILIACION BANCARIA**
**CUENTA No 45725300510 - 6**
**BANCO AGRARIO - PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE**
**ABRIL DE 2025**

| FECHA | | VALOR |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | SALDO LIBROS | 237.513.049,74 |
| 30/04/2025 | SALDO SEGÚN EXTRACTO | 237.513.049,74 |
| | **DIFERENCIA EN LIBROS** | **0,00** |

## MENOS

| FECHA | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | CHEQUE No. | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | **TOTAL CHEQUES PENDIENTES DE COBRO** | | **0,00** |

| FECHA | CONSIGNACIONES O TRANSF EN TRANSITO | VALOR |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | **TOTAL CONSIGNACIONES EN TRANSITO** | **0,00** |

## MÁS

| FECHA | TRANSFERENCIAS DE COMUNES A OTROS | VALOR |
|---|---|---|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | **TOTAL TRANSFERENCIAS DE COMUNES A OTROS** | **0,00** |

| TOTAL DIFERENCIA | 0,00 |
|---|---|

**JANETH MILENA HERRERA MARTÍNEZ.**
Auxiliar Administrativo

**VoBo Secretaria de Hacienda**

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones tu dinero está asegurado

| | |
|---|---|
| NOMBRE | MUNICIPIO DE BALBOA , |
| DIRECCIÓN | CL 8 6 44 |
| CIUDAD | RISARALDA, BALBOA |

| MES | ABRIL | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 270.861.506,98 | SALDO ACTUAL | 237.513.049,74 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 382.673,00 | PROMEDIO MES | 253.077.462,85 |
| TOTAL CARGOS | 1 | 33.731.130,24 | INTERESES | 382.673,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.239,00 | 270.874.745,98 |
| 02/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.240,00 | 270.887.985,98 |
| 03/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.240,00 | 270.901.225,98 |
| 04/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.725,00 | 270.940.950,98 |
| 07/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.243,00 | 270.954.193,98 |
| 08/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.244,00 | 270.967.437,98 |
| 09/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.244,00 | 270.980.681,98 |
| 10/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.245,00 | 270.993.926,98 |
| 11/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.739,00 | 271.033.665,98 |
| 14/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.247,00 | 271.046.912,98 |
| 15/04 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -33.731.130,24 | 237.315.782,74 |
| 15/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.599,00 | 237.327.381,74 |
| 16/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 58.006,00 | 237.385.387,74 |
| 21/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.603,00 | 237.396.990,74 |
| 22/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.603,00 | 237.408.593,74 |
| 23/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.604,00 | 237.420.197,74 |
| 24/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.605,00 | 237.431.802,74 |
| 25/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 34.817,00 | 237.466.619,74 |
| 28/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.607,00 | 237.478.226,74 |
| 29/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 11.607,00 | 237.489.833,74 |
| 30/04 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 23.216,00 | 237.513.049,74 |

NIT 800 037 800 8
VIGILADO
Autorregulado por amv
Consejo Solucionador de Controversias S.A.S. NIT 900.896.812-9 Sol 01



Cualquier reclamo por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Director: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 324 674 96 50 Fax: +57 (1) 218 86 44 | Oficina: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6, Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez. Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales. Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o el e-mail: Raquel.rivera@pwc.com Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Conozca Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. Jose Guillermo Peña González: (1) 2121270 - Fax: (1) 2130495. Correo electrónico: defensorfinanciero@pgabogados.com Avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA
# 890801143-1
# MOVIMIENTO AUXILIAR

**Desde:** 0401 **Hasta:** 0430 **Vigencia:** 2025



| Fecha | Documento | Concepto | Tercero | No Cheque | Débitos | Créditos | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11100631** | | **BANCO AGRARIO 45725300510 - 6 PROYECTO** | **270.861.506,98** | | **382.673,00** | **33.731.130,24** | **237.513.049,74** |
| 15/04/2025 | CE 678 | PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DI | 901574342 CONSORCIO SACUDETE BALI | | 0,00 | 33.731.130,24 | |
| 30/04/2025 | NC 449 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE | 800037800 BANCO AGRARIO DE COLOMI | | 382.673,00 | 0,00 | |

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## 890801143-1

## OP 679 COMPROBANTE DE EGRESO No. 00678

FECHA martes, 15 abril, 2025 VALOR OP **41.519.300,24** **VALOR NETO** **33.731.130,24**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 6 ANEXA.

LA SUMA DE TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS VEINTI CUATR

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 33.731.130,24 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 33.731.130,24 | 0,00 | | | |
| | **33.731.130,24** | **33.731.130,24** | | | |

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

## ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 00679

FECHA 2025/04/12

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS VEINTI CUATRO CENTAVOS MCTE. $41.519.300,24

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 6 ANEXA.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| RUBRO | | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 342 | 551 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 41.519.300,24 |
| | | | | | | **TOTAL** | **41.519.300,24** |

### CONTABILIDAD

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 461.235,00 |
| 13058504 | 0,00 | 2.427.552,00 |
| 13058801 | 0,00 | 1.942.042,00 |
| 13058802 | 0,00 | 728.266,00 |
| 13110101 | 0,00 | 1.213.776,00 |
| 17100501 | 41.519.300,24 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 33.731.130,24 |
| 24362502 | 0,00 | 44.278,00 |
| 24362601 | 0,00 | 971.021,00 |
| **TOTAL** | **41.519.300,24** | **41.519.300,24** |

### DESCUENTOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TASA CULTURAL 1.5% | 728.266,00 |
| LEY 418/97 CONTRATO VIAS 5%_ | 2.427.552,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 44.278,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 461.235,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 1.942.042,00 |
| RETFTE CONTRATOS DE OBRA 2% | 971.021,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 1.213.776,00 |
| **TOTAL** | **7.788.170,00** |

### ANEXOS

| DESCRIPCIÓN | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

VALOR ORDEN **41.519.300,24**


DESCUENTOS **7.788.170,00**

NETO A PAGAR **33.731.130,24**

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas


Elaboró CONTA

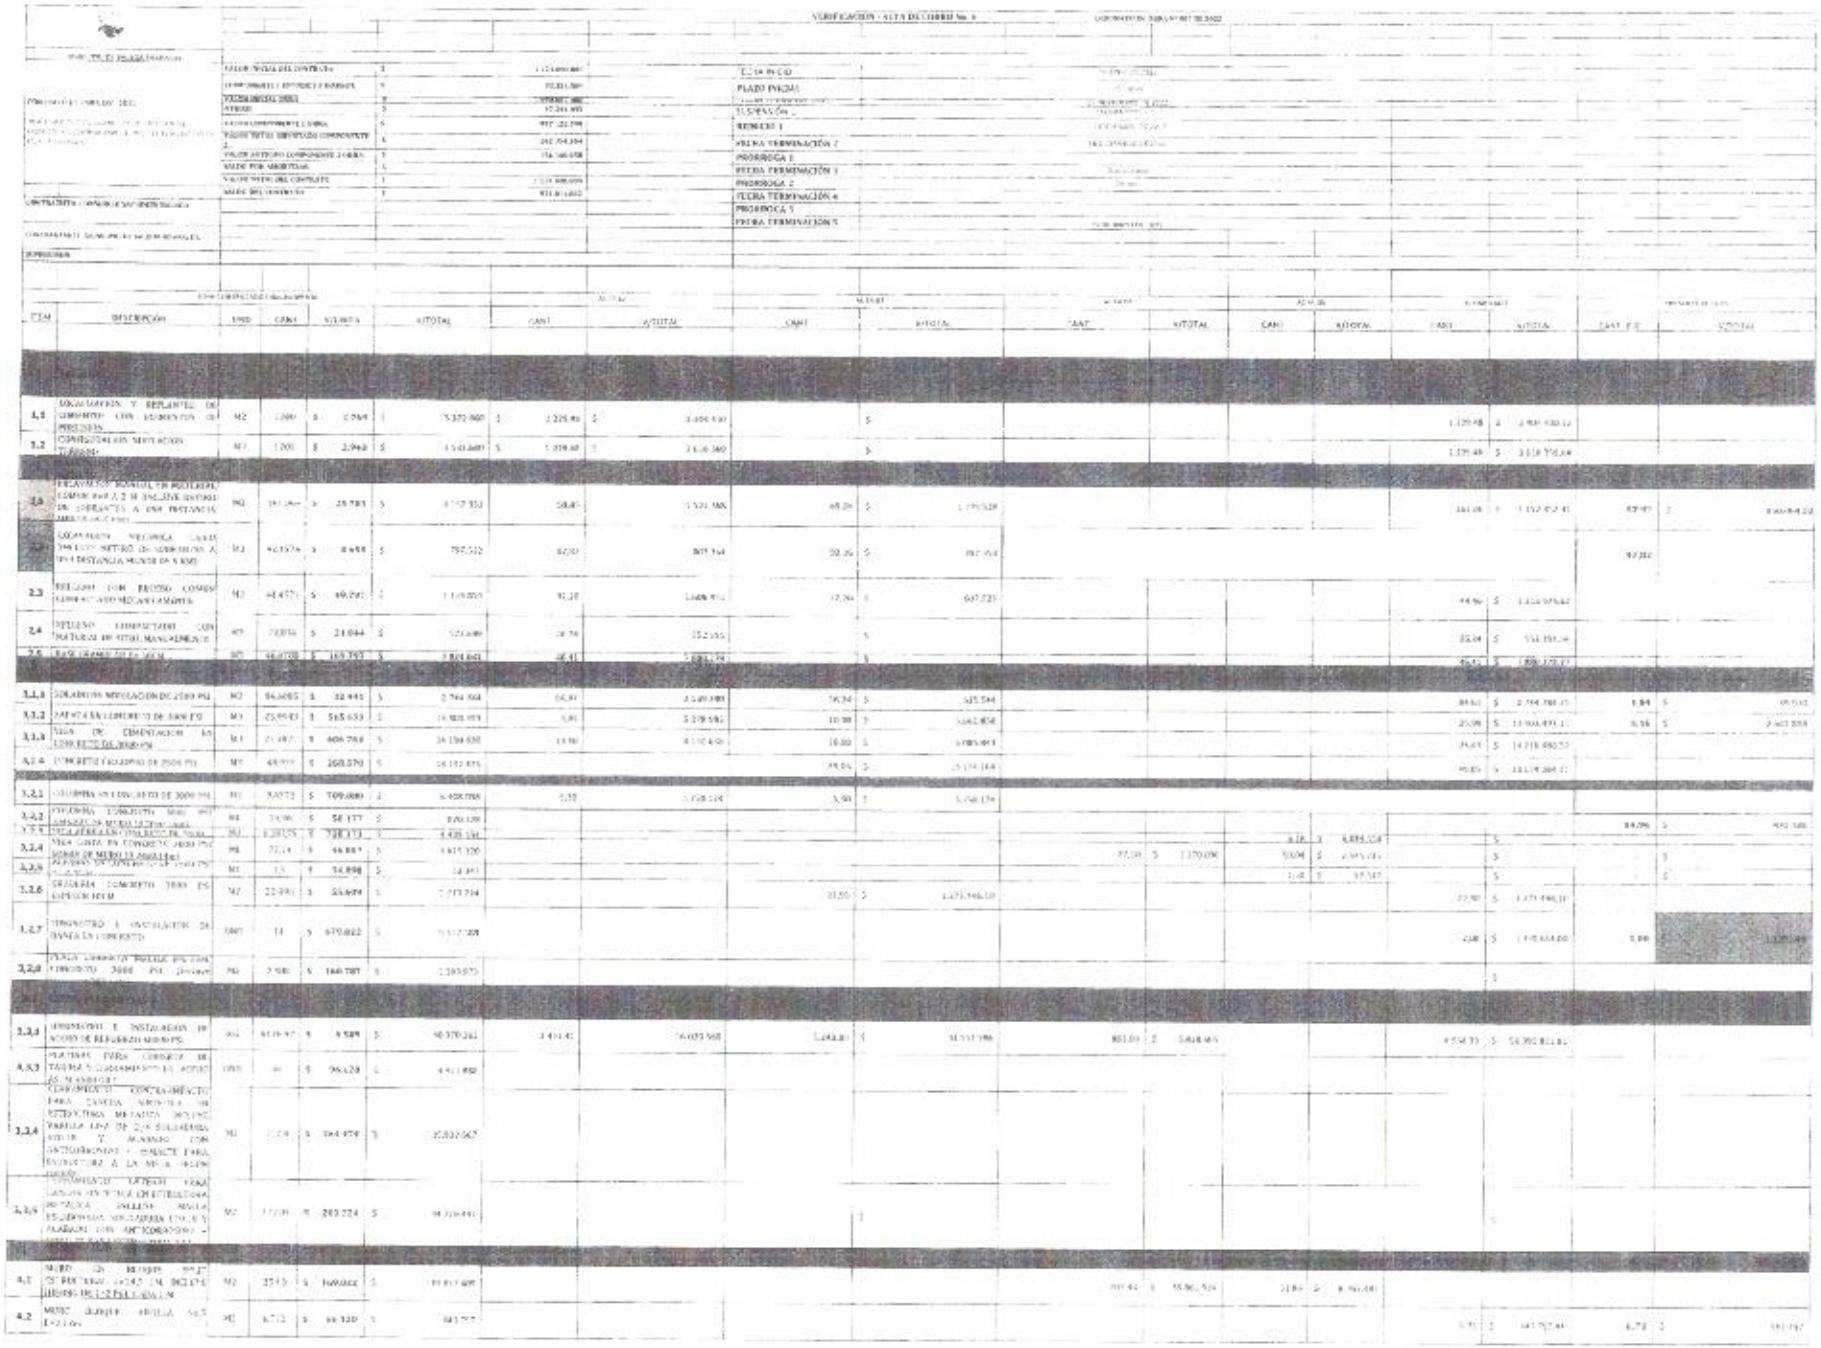






VERIFICACIÓN - ACTA DE CORTE No. 6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

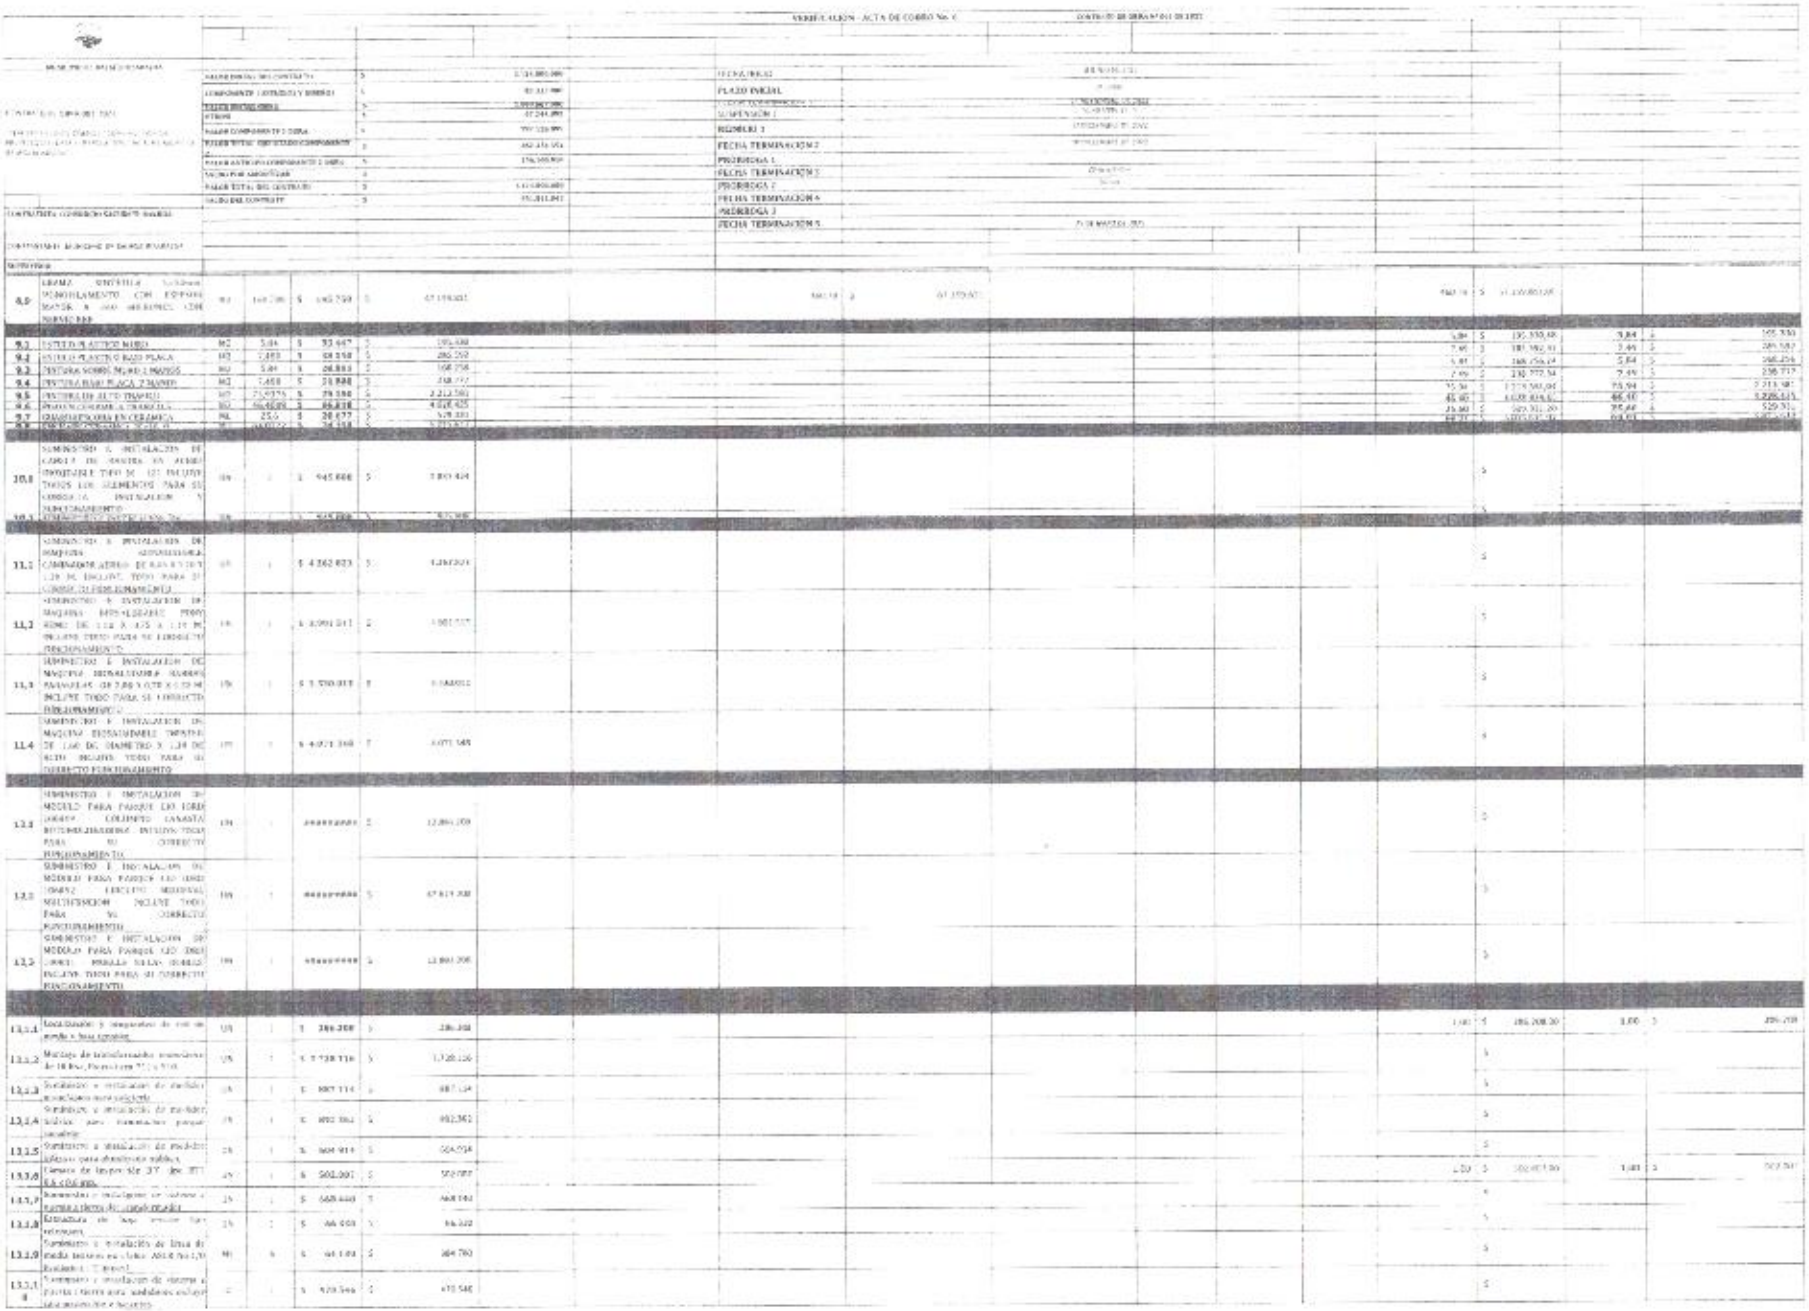

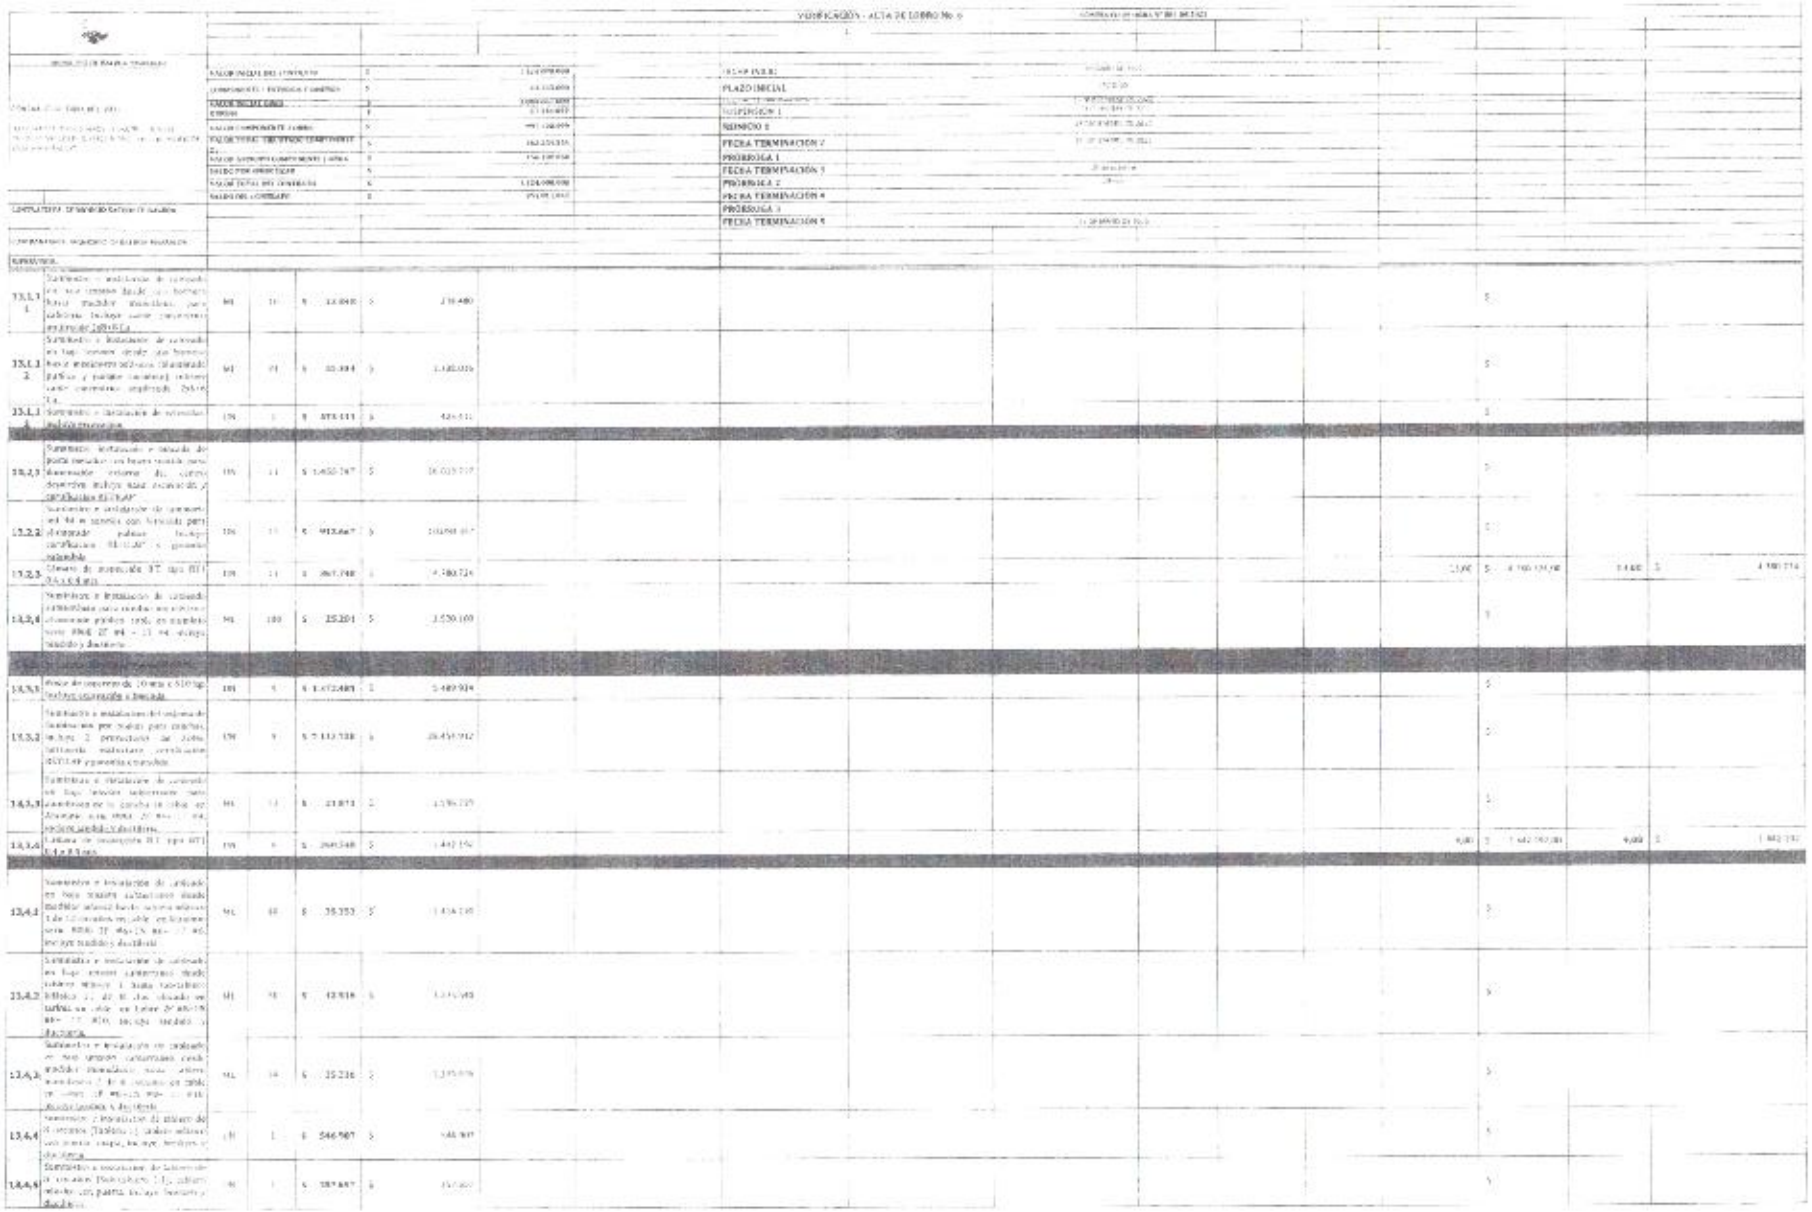

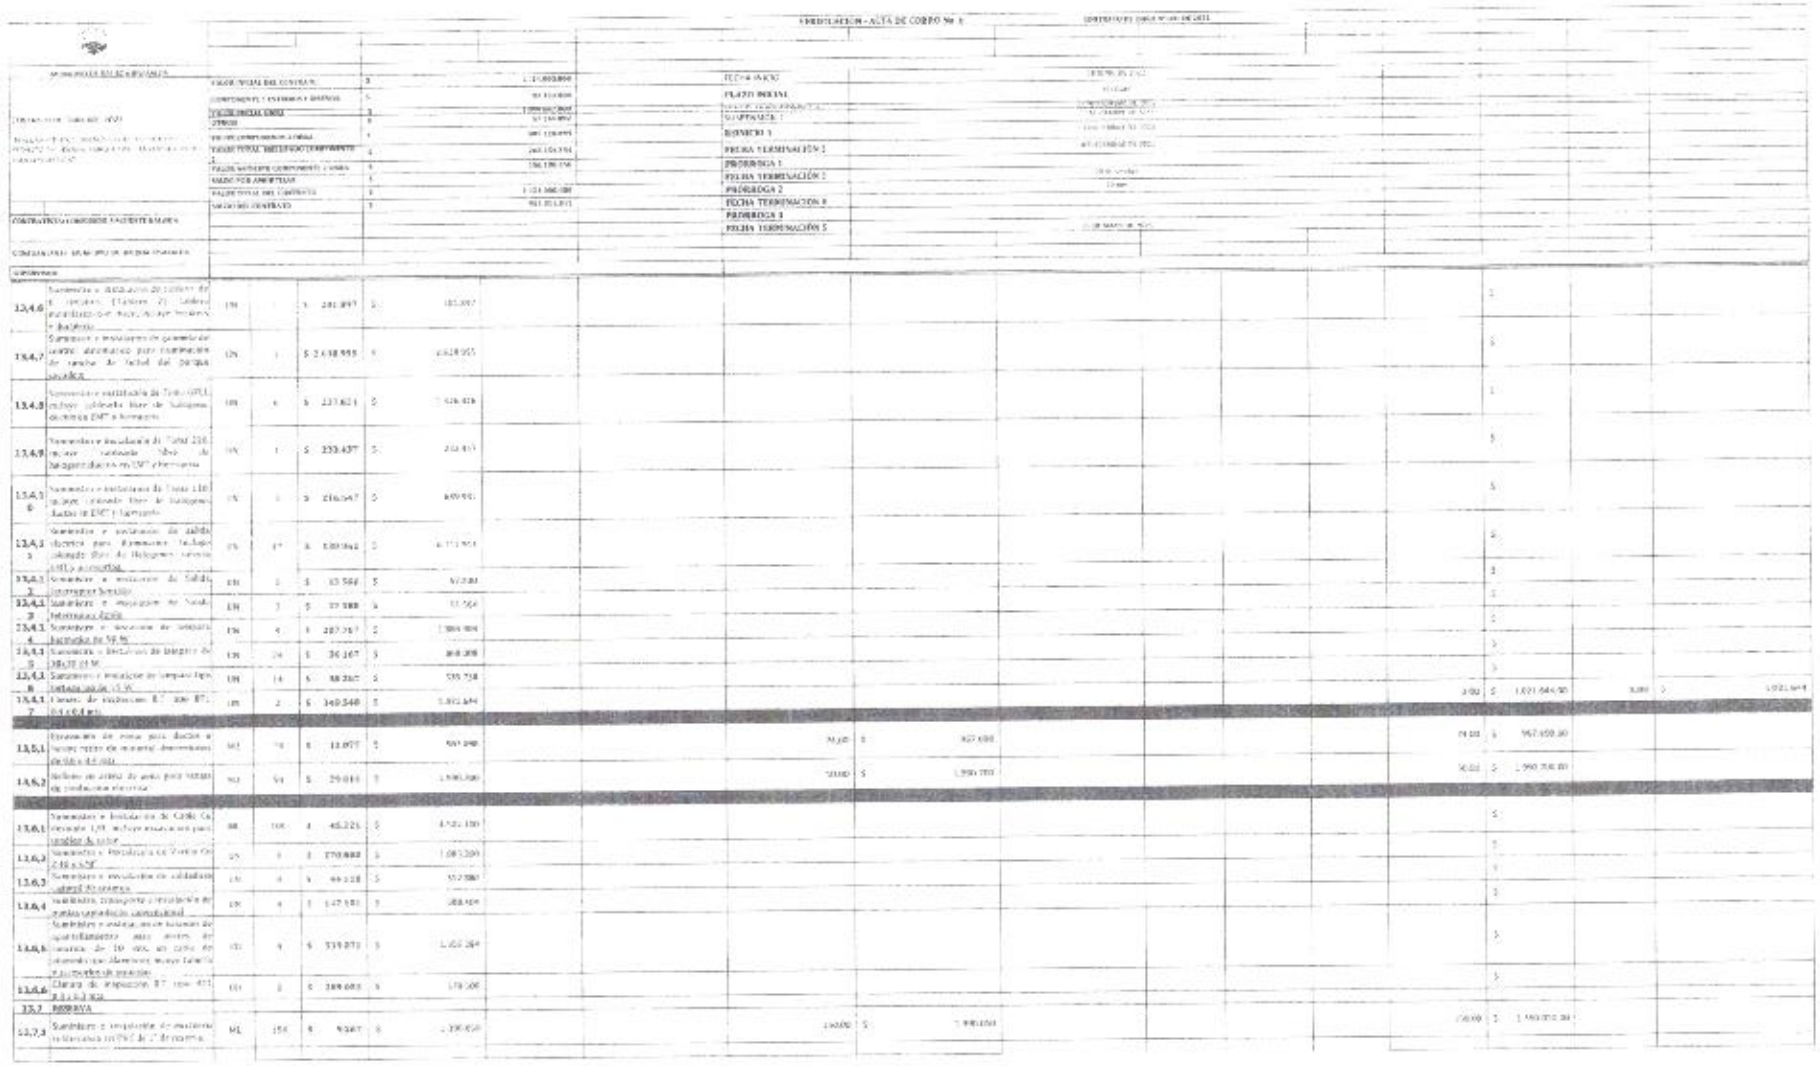

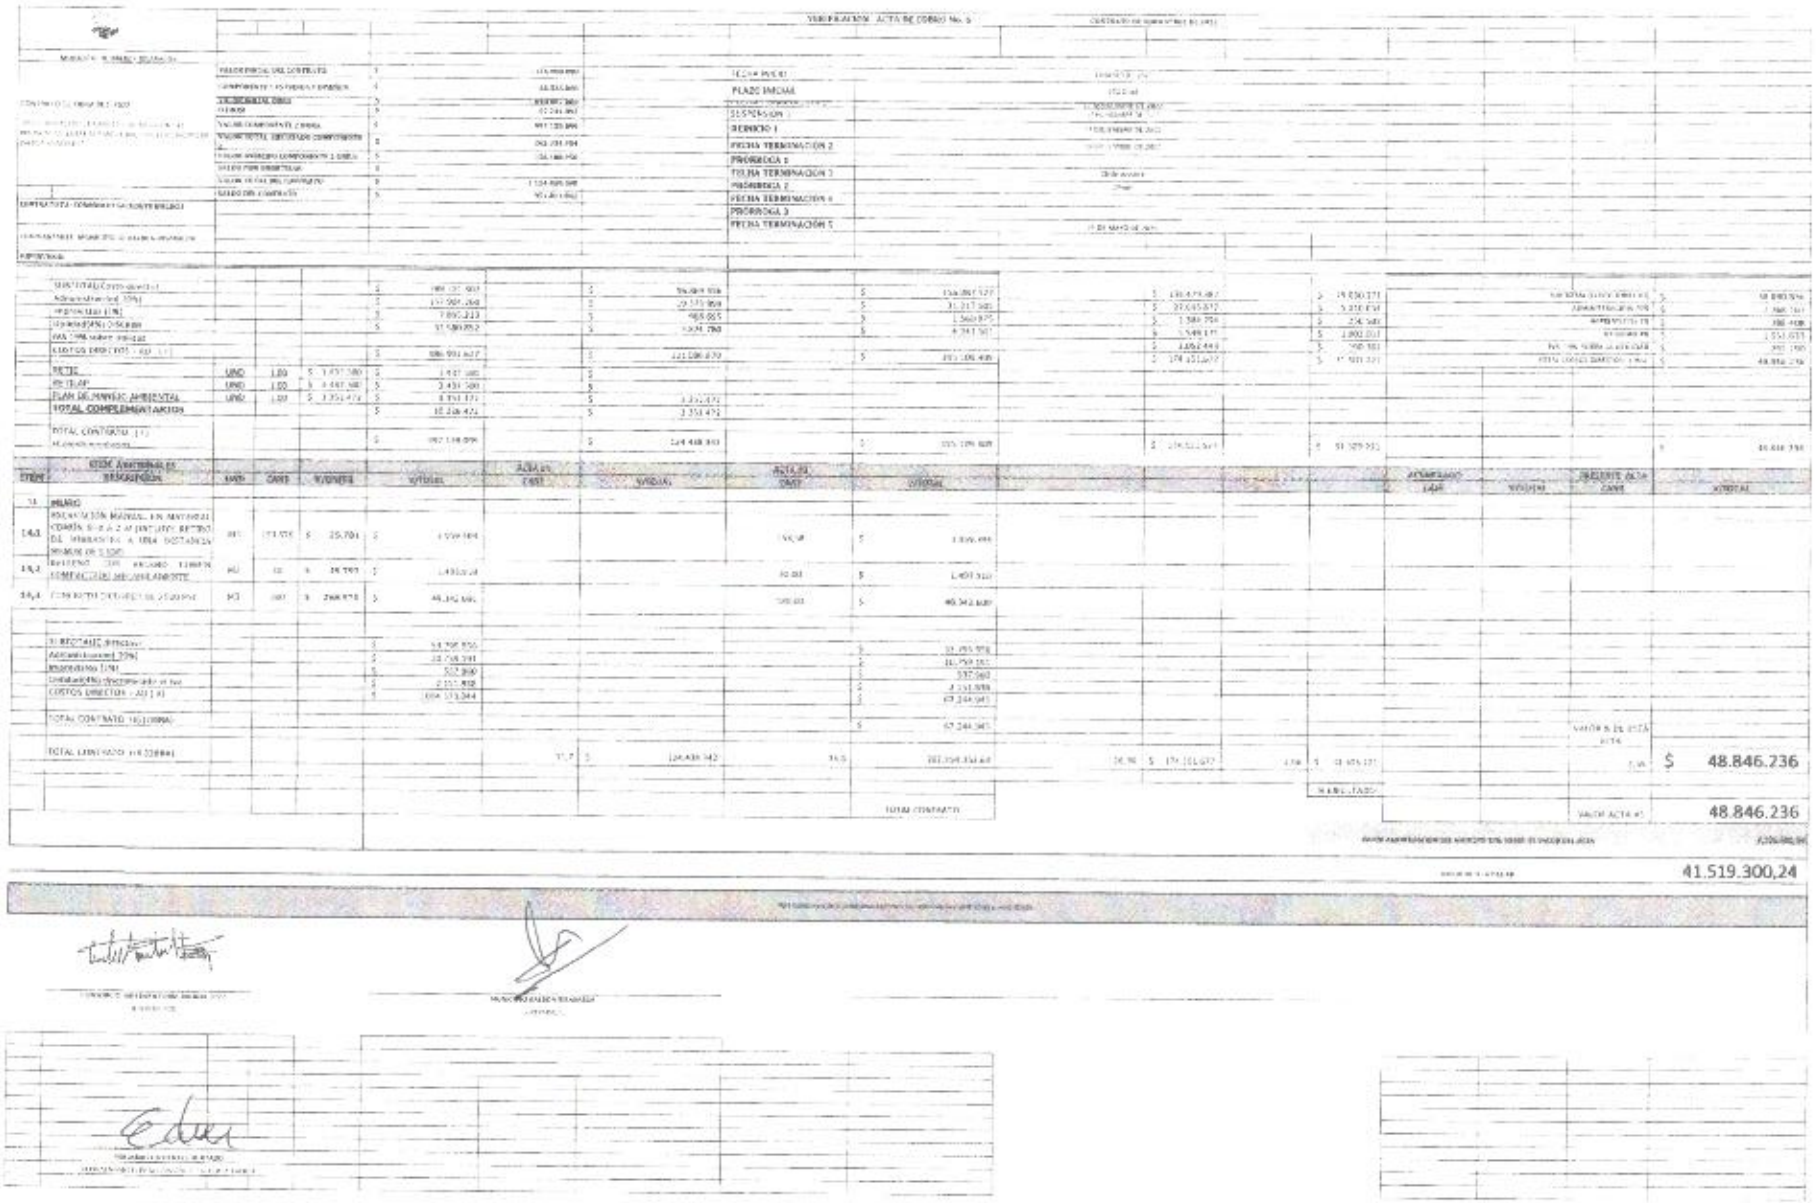

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL | ACTA #1 CANT | ACTA #1 V/PARCIAL | ACTA #2 CANT | ACTA #2 V/PARCIAL | | | | | ACUMULADO | | PRESENTE ACTA | |
| | | | | | | | | | | | | | | CANT | V/PARCIAL | CANT | V/PARCIAL |
| 14 | MURO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, H = 0 A 2 M (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM) | M3 | 173,970 | $ 25.701 | $ 4.599.184 | | | 56,08 | $ 1.599.999 | | | | | | | | |
| 14,2 | RELLENO CON RECIBO Y BOTON COMPACTADO MECANICAMENTE | M3 | 50 | $ 28.999 | $ 1.450.000 | | | 50,00 | $ 1.451.500 | | | | | | | | |
| 14,4 | CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 180 | $ 268.979 | $ 48.416.586 | | | 180,00 | $ 48.342.600 | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL (Costo directo) | | | | $ 54.466.770 | | | | $ 51.394.099 | | | | | | | | |
| | Administración (5%) | | | | $ 2.723.339 | | | | $ 2.569.705 | | | | | | | | |
| | IMPREVISTOS (1%) | | | | $ 544.668 | | | | $ 513.941 | | | | | | | | |
| | Utilidad (5%) O BONIFICACIÓN | | | | $ 2.723.339 | | | | $ 2.569.705 | | | | | | | | |
| | IVA (19% sobre utilidad) | | | | $ 517.434 | | | | $ 488.244 | | | | | | | | |
| | COSTOS DIRECTOS + AIU (14) | | | | $ 61.975.550 | | | | $ 58.465.694 | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO (14) | | | | $ 61.975.550 | | | | $ 58.465.694 | | | | | | | | |
| | TOTAL CONTRATO (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | | | | | 37,7 | $ 124.439.342 | 34,5 | $ 113.704.134,64 | 28,96 | $ 171.161.077 | 2,86 | $ 16.904.171 | | | 2,86 | $ 48.846.236 |
| | | | | | | | | | TOTAL CONTRATO | | | | | VALOR ACTA #1 | | | 48.846.236 |

41.519.300,24

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**
NIT 901.574.342-5
CR 15 # 148-75 TORRE 4 304
Tel (604) 3735686
Montería - Colombia
gerenciaecolaqua@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 12**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BALBOA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 890.801.143-1 | **Teléfono** | (606) 3146208880 - Ext. 000 - (606) 3146382479 - Ext. 000 | **Generación** | 10/04/2025, 18:54 |
| | | | | **Expedición** | 10/04/2025, 18:54 |
| **Dirección** | CLL 8 NO 6-44 | **Ciudad** | Risaralda - Colombia | **Vencimiento** | 10/04/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA 06 CONTRATO DE OBRA 001-2022 OBJETO DEL CONTRATO REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA AMORTIZACION DEL ANTICIPO SOBRE ESTA ACTA DEL 15% $7326935,34 | 1.00 | 39,136,026.35 |

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**
Cuarenta y ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos m/cte con treinta y cinco cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+I) - Transferencia $ 48,846,235.35

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 38,840,836.00 |
| Administración 20.00% | 7,768,167.20 |
| Imprevistos 1.00% | 388,408.36 |
| Utilidad 4.00% | 1,553,633.44 |
| IVA 19% | 295,190.35 |
| **Total a Pagar** | **48,846,235.35** |

**Observaciones:**
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS DEL CONSORCIO SACUDETE BALBOA
CUENTA BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS NUMERO 24140453560

Soporte, software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 - Número interno Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.10

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082536407 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 3 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0
**CUFE:** f179ba2b353158cd4d7e6a43a9ff5f322634acb64bb105af301c440fac66195fb1a44d75defef43dc7a03B3c539e0fcb4

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| Cuenta a Debitar | Valor | Cuenta Destino |
|---|---|---|
| 457253005106 | 33.731.130,24 | 24140453560 Cuenta de Ahorros De Banco Caja social a nombre de Consorcio sacudete Balboa Nit 901.574.342 |
| **TOTAL** | **33.731.130,24** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**KELLY LEANDRA CANDAMIL F.**
Tesorera General

Proyectó: Kelly Leandra Candamil Foronda – Tesorera General
Revisó: Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda.
Aprobó: Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda.

MUNICIPIO DE BALBOA MPIO : KELLY LEANDRA CANDAMIL FORONDA

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

## Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar $ 33.731.130,24

## Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONSORCIO SACUDETE BALBOA

******3560**

Monto a acreditar $ 33.731.130,24

**Monto $**
**33.731.130,24**

## Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 001

Descripción: pago contrato

15/04/2025 - 01:58:48 p. m. | IP actual: 200.10.28.164

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp



# La operación solicitada se realizó correctamente

| | |
|---|---|
| Número de Cuenta Origen: | *****5106 |
| Número de Cuenta Destino: | BANCO CAJA SOCIAL - ****3560 |
| Valor Transferencia: | $ 33.731.130,24 |
| Fecha y Hora: | 15/04/2025 2:16:48 p. m. |
| Dirección IP: | 200.10.28.164 |
| Costo de la transacción: | $ 0,00 + IVA |
| Número de aprobación: | 97132777 |
| Tipo transacción: | Transferencia Interbancaria |

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

**OP 605** **COMPROBANTE DE EGRESO No. 00618**

FECHA martes, 8 abril, 2025 VALOR OP **30.914.911,00** **VALOR NETO** **30.914.911,00**

PAGADO A: MINISTERIO DEL INTERIOR 830114475

CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO DE TRANSFDERENCIA DE RECURSOS DEL FONSECON CORRESPONDIENTES AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2001 DE 2021 - EJECUCIÓN PROYECTO SACÚEDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN RESOLUCION ANEXA.

LA SUMA DE TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS

PÁGUESE A: MINISTERIO DEL INTERIOR

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100521 | 0,00 | 30.914.911,00 | | 357250000605 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 31090101 | 30.914.911,00 | 0,00 | | | |
| | **30.914.911,00** | **30.914.911,00** | | | |

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

25 AÑOS

## Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

**Datos del pago**

| | |
|---|---|
| Valor de la transacción | $30,914,911.00 |
| IVA | $0.00 |
| Nombre del comercio | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Descripción del pago | Obra Pública 5% |
| Número de recibo | 14509 |
| Número de transacción (CUS) | 1387874903 |
| Estado | APROBADO |
| Cuenta origen | ********0605 |
| Tipo operación | Débito a cuenta por internet |
| Fecha | 04/04/2025 1:50:16 PM |
| IP | 10.40.4.37 |
| Referencia 1 | 200.10.28.164 |
| Referencia 2 | 2001-2021 |
| Referencia 3 | 1250000000 |
| Pago recurrente | NO |

# RESOLUCION NÚMERO 000169

04 ABR. 2025

**"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DEL INTERIOR"**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BALBOA RISARALDA, en uso de las atribuciones legales y constitucionales, ley 1106 de 2006, Ley 1738 de 2014 y,

**CONSIDERANDO:**

A. Que el Municipio de Balboa firmó Convenio Interadministrativo No.2001 de 2021 con la Nación-Ministerio del Interior-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-FONSECON, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

B. Que cuando las Entidades Territoriales celebran contratos de obra pública cuyos recursos provienen de convenios con Entidades del Orden Nacional, en este caso Ministerio del Interior, la contribución al FONSECON debe ser proporcional a la participación de los recursos del Ministerio, con el fin de dar cumplimiento al parágrafo 3° del Artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, prorrogada mediante la Ley 1738 de 2014 y en cumplimiento de la Circular Externa No.24 de 2024 expedida por el Ministerio del Interior.

C. Que de acuerdo a las órdenes de pago canceladas al Consorcio Sacúdete Balboa Nit 901574342-5, en ejecución del Contrato de Obra Pública No.001 de 2022, en cumplimiento del Convenio Interadministrativo No.2001/2021, los descuentos realizados por concepto del 5% de Contribución de Contratos de Obra Pública registran un valor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MCTE ($30.914.911).

D. Que los recursos antes mencionados por concepto de descuentos del 5% de Contribución de Contratos de Obra Pública, deben ser devueltos al Ministerio del Interior.

E. Que por lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Autorizar a la Secretaria de Hacienda y Finanzas del municipio de Balboa para que transfiera al Ministerio del Interior la suma de TREINTA MILLONES NVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MCTE ($30.914.911,00), a la cuenta corriente No. 30230000026-2 Dirección Tesoro Nacional, por concepto de descuentos del 5% de Contribución de Contratos de Obra Pública en cumplimiento al parágrafo 3° del Artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, prorrogada mediante la Ley 1738 de 2014.

**ARTICULO SEGUNDO:** La suma autorizada se transferirá al Ministerio del Interior, como un giro de tesorería sin afectación del presupuesto, dado que los recursos no fueron adicionados al presupuesto de la vigencia 2025.

**ARTICULO TERCERO:** - La presente rige a partir de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en Balboa - Risaralda, a los 04 Abr. 2025

**JOSE ERNESTO MIRANDA MÁRQUEZ**
Alcalde Municipal

Proyectó y Elaboró: Carlos Augusto Villada (Asesor Externo)
Revisó: Yurley Arias Duque- Secretaria de Hacienda y Finanzas

Archivado en: Serie: 10000.47.01 Resoluciones

Interior

# Formato de Registro Recaudo Contribución - FONSECON

Fonsecon

**Entidad Retenedora del Nivel Nacional:** MUNICIPIO DE BALBOA **Nit de la Entidad Retenedora** 890801143-1

| A | B | C | D | E | F | G | | H | I | J | K | L | | | M | N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | No. Contrato | Fecha de Inicio Contrato D/M/A | Fecha de Terminación Contrato D/M/A | Nombre o Razón Social del Contratista | NIT o CC | Tipo de Contrato | | Valor del Contrato | Valor de las Adiciones (Si las Hay) | Valor TOTAL de la Contribución según Contrato | Valor Retenido | Fecha de la Retención | | | Valor Consignado | Fecha de Consignación | | |
| | | | | | | Obra Pública | Concesión | | | | | D | M | A | | D | M | A |
| 2024 | 001 del 3 mayo 2022 | 22/06/2022 | vigente | CONSORCIO SACUDETE BALBOA | 901574342-5 | X | | 1.024.000.000 | 67.244.892 | 1.091.244.892 | 151.531.791 | 31 | 10 | 24 | 7.576.590 | 4 | 4 | 25 |
| | | | | | | | | | | | 262.354.354 | 27 | 11 | 24 | 13.117.718 | 4 | 4 | 25 |
| | | | | | | | | | | | 173.099.234 | 19 | 12 | 24 | 8.654.962 | 4 | 4 | 25 |
| | | | | | | | | | | | 31.312.839 | 26 | 2 | 24 | 1.565.642 | 4 | 4 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Pagador de la Entidad responsable de la Retención y Consignación**

**Nombre y Apellidos:** JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ

**Correo Electrónico:** hacienda@balboa-risaralda.gov.co

**Teléfono:** 3147559064

**Dirección Entidad** calle 8 No.6-44 Balboa Risaralda

**Certificado por el CONTADOR**

**CARLOS ALBEIRO GUEVARA MONTES**

**Tarjeta No. 93481-T**

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

25 AÑOS

# Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Valor de la transacción | $30,914,911.00 |
| IVA | $0.00 |
| Nombre del comercio | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Descripción del pago | Obra Pública 5% |
| Número de recibo | 14509 |
| Número de transacción (CUS) | 1387874903 |
| Estado | APROBADO |
| Cuenta origen | ********0605 |
| Tipo operación | Débito a cuenta por internet |
| Fecha | 04/04/2025 1:50:16 PM |
| IP | 10.40.4.37 |
| Referencia 1 | 200.10.28.164 |
| Referencia 2 | 2001-2021 |
| Referencia 3 | 1250000000 |
| Pago recurrente | NO |

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | NOVIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 844.018.864,59 | SALDO ACTUAL | 537.942.977,59 |
| TOTAL ABONOS | 19 | 1.227.261,00 | PROMEDIO MES | 736.141.605,66 |
| TOTAL CARGOS | 8 | 307.303.148,00 | INTERESES | 1.227.261,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 183.185,00 | 844.202.049,59 |
| 05/11 | NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 45.802,00 | 844.247.851,59 |
| 06/11 | NOTA CREDITO POR INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 45.805,00 | 844.293.656,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -6.061.272,00 | 838.232.384,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -1.515.318,00 | 836.717.066,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -7.576.590,00 | 829.140.476,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.110.902,00 | 826.029.574,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -2.272.977,00 | 823.756.597,59 |
| 07/11 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.788.295,00 | 819.968.302,59 |
| 07/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 44.488,00 | 820.012.790,59 |
| 08/11 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -81.106.614,00 | 738.906.176,59 |
| 08/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 160.371,00 | 739.066.547,59 |
| 12/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.098,00 | 739.106.645,59 |
| 13/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.100,00 | 739.146.745,59 |
| 14/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.103,00 | 739.186.848,59 |
| 15/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 120.321,00 | 739.307.169,59 |
| 18/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.111,00 | 739.347.280,59 |
| 19/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.113,00 | 739.387.393,59 |
| 20/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.116,00 | 739.427.509,59 |
| 21/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.118,00 | 739.467.627,59 |
| 22/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 120.367,00 | 739.587.994,59 |
| 25/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.127,00 | 739.628.121,59 |
| 26/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.129,00 | 739.668.250,59 |
| 27/11 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -201.871.180,00 | 537.797.070,59 |
| 27/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.178,00 | 537.826.248,59 |
| 28/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.180,00 | 537.855.428,59 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 87.549,00 | 537.942.977,59 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 537.942.977,59 | SALDO ACTUAL | 334.855.154,98 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 681.857,00 | PROMEDIO MES | 448.954.948,37 |
| TOTAL CARGOS | 8 | 203.769.679,61 | INTERESES | 681.857,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.186,00 | 537.972.163,59 |
| 03/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.188,00 | 538.001.351,59 |
| 04/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.189,00 | 538.030.540,59 |
| 05/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 29.191,00 | 538.059.731,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -10.494.174,00 | 527.565.557,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -2.492.366,00 | 525.073.191,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -13.117.718,00 | 511.955.473,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -5.486.354,00 | 506.469.119,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.935.315,00 | 502.533.804,59 |
| 06/12 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -6.558.859,00 | 495.974.945,59 |
| 06/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 72.730,00 | 496.047.675,59 |
| 09/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.246,00 | 496.071.921,59 |
| 10/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.247,00 | 496.096.168,59 |
| 11/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.248,00 | 496.120.416,59 |
| 12/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.249,00 | 496.144.665,59 |
| 13/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 72.755,00 | 496.217.420,59 |
| 16/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.254,00 | 496.241.674,59 |
| 17/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.255,00 | 496.265.929,59 |
| 18/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 24.256,00 | 496.290.185,59 |
| 19/12 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -122.969.474,00 | 373.320.711,59 |
| 19/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 18.247,00 | 373.338.958,59 |
| 20/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 54.747,00 | 373.393.705,59 |
| 23/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 18.251,00 | 373.411.956,59 |
| 24/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 36.504,00 | 373.448.460,59 |
| 26/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 18.253,00 | 373.466.713,59 |
| 27/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 54.765,00 | 373.521.478,59 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -38.715.419,61 | 334.806.058,98 |
| 30/12 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.096,00 | 334.855.154,98 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 G418

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | ENERO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 334.855.154,98 | SALDO ACTUAL | 298.427.274,98 |
| TOTAL ABONOS | 21 | 515.111,00 | PROMEDIO MES | 331.534.162,82 |
| TOTAL CARGOS | 6 | 36.942.991,00 | INTERESES | 515.111,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.367,00 | 334.871.521,98 |
| 03/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 65.476,00 | 334.936.997,98 |
| 07/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.371,00 | 334.953.368,98 |
| 08/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.372,00 | 334.969.740,98 |
| 09/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.373,00 | 334.986.113,98 |
| 10/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.122,00 | 335.035.235,98 |
| 13/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.376,00 | 335.051.611,98 |
| 14/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.377,00 | 335.067.988,98 |
| 15/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.377,00 | 335.084.365,98 |
| 16/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.378,00 | 335.100.743,98 |
| 17/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.139,00 | 335.149.882,98 |
| 20/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.381,00 | 335.166.263,98 |
| 21/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.382,00 | 335.182.645,98 |
| 22/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.383,00 | 335.199.028,98 |
| 23/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.384,00 | 335.215.412,98 |
| 24/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 49.156,00 | 335.264.568,98 |
| 27/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.387,00 | 335.280.955,98 |
| 28/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 16.388,00 | 335.297.343,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -8.533.758,00 | 326.763.585,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -2.026.768,00 | 324.736.817,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -9.193.744,00 | 315.543.073,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -8.654.962,00 | 306.888.111,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -3.200.160,00 | 303.687.951,98 |
| 29/01 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -5.333.599,00 | 298.354.352,98 |
| 29/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.583,00 | 298.368.935,98 |
| 30/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.584,00 | 298.383.519,98 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.755,00 | 298.427.274,98 |

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado
Depósito seguro de Fogafin
www.fogafin.gov.co

| | |
|---|---|
| NOMBRE | MUNICIPIO DE BALBOA , |
| DIRECCIÓN | CL 8 6 44 |
| CIUDAD | RISARALDA, BALBOA |

| MES | FEBRERO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 298.427.274,98 | SALDO ACTUAL | 275.500.319,98 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 402.988,00 | PROMEDIO MES | 296.115.973,23 |
| TOTAL CARGOS | 1 | 23.329.943,00 | INTERESES | 402.988,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.586,00 | 298.441.860,98 |
| 04/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.587,00 | 298.456.447,98 |
| 05/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.588,00 | 298.471.035,98 |
| 06/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.589,00 | 298.485.624,98 |
| 07/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.770,00 | 298.529.394,98 |
| 10/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.591,00 | 298.543.985,98 |
| 11/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.592,00 | 298.558.577,98 |
| 12/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.593,00 | 298.573.170,98 |
| 13/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.594,00 | 298.587.764,98 |
| 14/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.785,00 | 298.631.549,98 |
| 17/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.596,00 | 298.646.145,98 |
| 18/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.597,00 | 298.660.742,98 |
| 19/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.598,00 | 298.675.340,98 |
| 20/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.599,00 | 298.689.939,98 |
| 21/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 43.800,00 | 298.733.739,98 |
| 24/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.601,00 | 298.748.340,98 |
| 25/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 14.602,00 | 298.762.942,98 |
| 26/02 | TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO | INTERNET BANCA | | -23.329.943,00 | 275.432.999,98 |
| 26/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.463,00 | 275.446.462,98 |
| 27/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.463,00 | 275.459.925,98 |
| 28/02 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 40.394,00 | 275.500.319,98 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

Banco Agrario de Colombia

# ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin — www.fogafin.gov.co

**NOMBRE** MUNICIPIO DE BALBOA ,

**DIRECCIÓN** CL 8 6 44

**CIUDAD** RISARALDA, BALBOA

| MES | MARZO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|

**NÚMERO DE CUENTA:**
**457253005106**


**OFICINA:** 5725 BALBOA

## RESUMEN DE MOVIMIENTO

| | No. Transacciones | Valor | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 275.500.319,98 | SALDO ACTUAL | 270.861.506,98 |
| TOTAL ABONOS | 20 | 384.143,00 | PROMEDIO MES | 271.317.937,33 |
| TOTAL CARGOS | 6 | 5.022.956,00 | INTERESES | 384.143,00 |

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



**www.bancoagrario.gov.co**
**· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas**

| DIA | DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN | OFICINA | No. DCTO | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.466,00 | 275.513.785,98 |
| 04/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.466,00 | 275.527.251,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -1.252.514,00 | 274.274.737,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -297.472,00 | 273.977.265,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -1.565.642,00 | 272.411.623,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -654.814,00 | 271.756.809,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -469.693,00 | 271.287.116,98 |
| 05/03 | INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET | INTERNET BANCA | | -782.821,00 | 270.504.295,98 |
| 05/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.222,00 | 270.517.517,98 |
| 06/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.222,00 | 270.530.739,98 |
| 07/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.671,00 | 270.570.410,98 |
| 10/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.225,00 | 270.583.635,98 |
| 11/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.226,00 | 270.596.861,98 |
| 12/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.226,00 | 270.610.087,98 |
| 13/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.227,00 | 270.623.314,98 |
| 14/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.684,00 | 270.662.998,98 |
| 17/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.229,00 | 270.676.227,98 |
| 18/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.230,00 | 270.689.457,98 |
| 19/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.231,00 | 270.702.688,98 |
| 20/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.231,00 | 270.715.919,98 |
| 21/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 52.932,00 | 270.768.851,98 |
| 25/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.235,00 | 270.782.086,98 |
| 26/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.235,00 | 270.795.321,98 |
| 27/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.236,00 | 270.808.557,98 |
| 28/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 39.711,00 | 270.848.268,98 |
| 31/03 | INTERESES DE AHORROS | BALBOA (RISARAL | | 13.238,00 | 270.861.506,98 |

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418



Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA
## 890801143-1

**OP 272** **COMPROBANTE DE EGRESO No. 00269**

FECHA miércoles, 26 febrero, 2025 VALOR OP **28.352.899,00** **VALOR NETO** **23.329.943,00**

PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 5 ANEXA.

LA SUMA DE VEINTI TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTI NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

**CONTABILIDAD**

| CODIGO | DÉBITOS | CRÉDITOS | CHEQUE | CUENTA | BANCO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100631 | 0,00 | 23.329.943,00 | | 45725300510 - 6 | BANCO AGRARIO BALBOA |
| 24010201 | 23.329.943,00 | 0,00 | | | |
| | **23.329.943,00** | **23.329.943,00** | | | |

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

**890801143-1**

## ORDEN DE PAGO

PAG 1

NRO 00272

FECHA 2025/02/26

BENEFICIARIO **CONSORCIO SACUDETE BALBOA** NIT **901574342** DV **5**

VALOR VEINTI OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. $28.352.899,00

CONCEPTO PAGO DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN ACTA DE PAGO No 5 ANEXA.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| RUBRO | | DEPEND | RECURSO | RP | REG | Doc | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | 342 | 551 | OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 | 28.352.899,00 |
| | | | | | | **TOTAL** | **28.352.899,00** |

### CONTABILIDAD

| CÓDIGO | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| 13050801 | 0,00 | 297.472,00 |
| 13058504 | 0,00 | 1.565.642,00 |
| 13058801 | 0,00 | 1.252.514,00 |
| 13058802 | 0,00 | 469.693,00 |
| 13110101 | 0,00 | 782.821,00 |
| 17100501 | 28.352.899,00 | 0,00 |
| 24010201 | 0,00 | 23.329.943,00 |
| 24362502 | 0,00 | 28.557,00 |
| 24362601 | 0,00 | 626.257,00 |
| **TOTAL** | **28.352.899,00** | **28.352.899,00** |

### DESCUENTOS

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| TASA CULTURAL 1.5% | 469.693,00 |
| LEY 418/97 CONTRATO VIAS 5% | 1.565.642,00 |
| RETFTE IVA SERVICIOS 15% | 28.557,00 |
| INDUSTRIA Y COMERCIO | 297.472,00 |
| ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4% | 1.252.514,00 |
| RETFTE CONTRATOS DE OBRA 2% | 626.257,00 |
| TASA PRODEPORTE Y REC 2,5% | 782.821,00 |
| **TOTAL** | **5.022.956,00** |

### ANEXOS

| DESCRIPCIÓN | NUMERO | FOLIOS |
|---|---|---|

VALOR ORDEN **28.352.899,00**

DESCUENTOS **5.022.956,00**

NETO A PAGAR **23.329.943,00**

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO REGISTROS PRESUPUESTALES

PAG. 1

NRO 0342

FECHA 25/02/2025

SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS E INFRAE | ENVIADO SECRETARIA DE HACIENDA Y FINAN

CONTRATANTE ALCALDE MUNICIPAL | CON CARGO AL CDP NRO 0247 | DE 25/02/2025

NIT 901574342 DV 5 | BENEFICIARIO CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Cuatrocientos Veinti Siete Millones Ochocientos Sesenta y Dos mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos MCte. $427.862.341,00

La suscrita Auxiliar Administrativa, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| CÓDIGO | RUBRO/RE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_133.4 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit 13 RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS | 416.717.499,00 |
| 2.3.2.02.02.005.4501040.20 21660750022.53290_151.0 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores 15 RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | RESERVAS | 11.144.842,00 |

Elaboró: CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO REGISTROS PRESUPUESTALES

PAG. 2

NRO 0342

FECHA 25/02/2025

SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS E INFRAE | ENVIADO SECRETARÍA DE HACIENDA Y FINAN

CONTRATANTE ALCALDE MUNICIPAL | CON CARGO AL CDP NRO 0247 | DE 25/02/2025

NIT 901574342 DV 5 | BENEFICIARIO CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Cuatrocientos Veinti Siete Millones Ochocientos Sesenta y Dos mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos MCte. $427.862.341,00

La suscrita Auxiliar Administrativa, CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del contrato y/o orden de trabajo, ha registrado la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| CÓDIGO | RUBRO/RE | DEPENDENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL | **427.862.341,00** |

**REINTEGROS CRP** 342

| Codigo | Valor Rubro |
|---|---|

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

# MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA

PAG. 1

NRO 0247

FECHA 2025/02/25

SOLICITADO DIRECCION DE OBRAS E INFRAE | ENVIADO SECRETARÌA DE HACIENDA Y FINAN

CONCEPTO RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

VALOR Cuatrocientos Veinti Siete Millones Ochocientos Sesenta y Dos mil Trescientos Cuarenta y Un Pesos MCte. $427.862.341,00

La suscrita Auxiliar Administrativa , CERTIFICA que para atender el gasto, objeto del compromiso, hay disponibilidad hasta por la suma que se indica, con cargo al presupuesto VIGENTE su registro se ha efectuado contra la Apropiación siguiente.

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| DISPO | CÓDIGO | VALOR | RUBRO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_151.0 | 11.144.842,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - SGP Propósito General Forzosa Inversión Libre Inversión - Saldos no ejecutados vigencias anteriores | RESERVAS |
| 582 | 2.3.2.02.02.005.4501040.2021660750022.53290_133.4 | 416.717.499,00 | Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo1 Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Pasivo Exigible - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit | RESERVAS |


AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Elaboró: CONTA

| SUPERVISOR: | VERIFICACIÓN - ACTA DE COBRO No. 5 | CONTRATO DE OBRA Nº 003 DE 2022 |
|---|---|---|

| ITEM CONTRATADO INICIALMENTE | | | | | | ACUMULADO | | PRESENTE ACTA (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITA | V/TOTAL | CANT | V/TOTAL | CANT. 5 N | V/TOTAL |
| 1 | PRELIMINAR | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CONJUNTO CON ELEMENTOS DE PROYECCIÓN | M2 | 1220 | $ 2.759 | $ 3.413.800 | 1.259.68 | $ 3.484.439.11 | | |
| 1.2 | CONFRONTACIÓN NIVELACIÓN TERRENO | M2 | 1258 | $ 2.843 | $ 3.577.694 | 1.259.68 | $ 3.608.329.84 | | |
| 2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS | | | | | | | | |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 0-3 A 2 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 191,0691 | $ 33.781 | $ 6.455.492 | 191.09 | $ 6.455.067.86 | | |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MECÁNICA CAFO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 93,0976 | $ 8.958 | $ 769.532 | | | | |
| 2.3 | RELLENO CON RECEBO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 44,49767 | $ 69.747 | $ 3.116.858 | 44.44 | $ 3.098.974.81 | | |
| 2.4 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO MANUALMENTE | M3 | 24.849 | $ 21.044 | $ 522.969 | 26.74 | $ 562.384.56 | | |
| 2.5 | CAOS GRANULAR E=10CM | M3 | 45,07048 | $ 169.730 | $ 7.651.043 | 46.43 | $ 7.881.278.37 | | |
| 3 | CIMENTACIÓN | | | | | | | | |
| 3.1 | CIMENTACIONES | | | | | | | | |
| 3.1.1 | SOLADO DE NIVELACIÓN DE 1500 PSI | M2 | 108,0695 | $ 20.461 | $ 2.190.794 | 94.58 | $ 2.760.047.38 | | |
| 3.1.2 | ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 35,89329 | $ 317.633 | $ 11.401.384 | 28.03 | $ 13.406.671.93 | | |
| 3.1.3 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 23,907325 | $ 636.764 | $ 15.180.843 | 29.44 | $ 20.116.480.52 | | |
| 3.1.4 | CONCRETO CICLOPEO DE 2500 PSI | M3 | 98,835 | $ 168.571 | $ 16.142.473 | 99.03 | $ 15.174.564.21 | | |
| 3.2 | SUPERESTRUCTURA | | | | | | | | |
| 3.2.2 | VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 6,181175 | $ 716.871 | $ 4.430.554 | 6.18 | $ 4.430.554.50 | 6.34 | $ 4.499.954 |
| 3.2.4 | VIGA CINTA EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE DE MURO DE 20X0.15MT | ML | 37.59 | $ 46.667 | $ 1.815.810 | 37.59 | $ 2.345.224.68 | 30.64 | $ 3.465.224.7 |
| 3.2.5 | ALEJADO EN CONCRETO DE 2500 PSI A= 0.25 M | ML | 1.5 | $ 34.898 | $ 52.347 | 1.50 | $ 52.347.00 | 1.50 | $ 52.347 |
| 3.2.6 | GRAMPERA CONCRETO 3000 PSI EMPOTRADA 10CM | M2 | 22.899 | $ 53.669 | $ 1.229.214 | 22.90 | $ 1.229.496.30 | | |
| 3.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PVC CONCRETO | UNC | 14 | $ 679.813 | $ 9.517.388 | - | $ - | 1 | |
| 3.2.8 | PLACA CONTRAPISO MALLA e=8.25cm, CONCRETO 3000 PSI (Incluye impermeabilizante) | M2 | 7.980 | $ 168.797 | $ 1.347.473 | 7.98 | $ 1.283.673.06 | 7.980 | $ 1.206.870 |
| 3.3 | ESTRUCTURA METÁLICA | | | | | | | | |
| 3.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 617,639179 | $ 0.599 | $ 98.470.281 | 5.144.61 | $ 34.551.995.87 | | $ - |
| 3.3.3 | PLATINAS PARA COLOCACIÓN DE TARIMA Y CERRAMIENTO EN ACERO ASTM A36 0.6 E.C. | UNC | 16 | $ 96.138 | $ 1.537.888 | - | $ - | - | $ - |
| 3.3.4 | CERRAMIENTO CONTRAINCENDIO PARA FACHADA SINTÉTICA EN ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE VARILLA LISA DE 3/4 ASTM A572 GR 50 Y ANCLADO CON ADHESIVO + ESMALTE PARA ESTRUCTURA A LA VISTA SELEX 1950-50 | M2 | 132.3 | $ 166.458 | $ 22.532.967 | - | $ - | | $ - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.6 | Suministro y instalación de cableado subterráneo para conducción eléctrica alumbrado público cable en aluminio serie 8000 2# 8+ 1T #4, incluye tendido y distribuir. | ML | 230 | $ 33.071 | $ 13.20.330 | | $ - | | |
| 13.5 | CUARTO ACOPIO CANCHA DE FUTBOL | | | | | | | | |
| 13.5.1 | Punto de concreto de 20 mts a 570 kg, incluye conexión a tierra. | UN | 4 | $ 1.872.481 | $ 7.489.924 | - | $ - | | |
| 13.5.2 | Suministro e instalación del sistema de iluminación por poste para canchas, incluye 2 proyectores de 324w, herrajería, subestructura, certificación RETILAP y garantía estándar. | UN | 4 | $ 7.113.728 | $ 28.454.912 | - | $ - | | |
| 13.5.3 | Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterráneo para alumbrado de la cancha en cable en Aluminio serie 8000 2T #4+ 1T #4, incluye tendido y distribuir. | ML | 72 | $ 21.073 | $ 1.516.728 | - | $ - | | |
| 13.5.4 | Cámara de inspección 8 E tipo 853 0,6 x 0,6 mts. | UN | 4 | $ 360.548 | $ 1.442.192 | - | $ - | | |
| 13.6 | CASETA ACOPIO DEPORTIVO | | | | | | | | |
| 13.6.1 | Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterráneo desde medidor bifásico hasta tablero bifásico 1 de 12 circuitos en cable en Aluminio serie 8000 2T #6+1N #6+ 1T #6, incluye tendido y distribuir. | ML | 60 | $ 35.855 | $ 1.414.320 | | $ - | | |
| 13.6.2 | Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterráneo desde tablero bifásico 1 hasta sub-tablero bifásico 1.1 de 8 cto circuitos en tubería en cable en Cobre 2T #6+1N #6+ 1T #10, incluye tendido y distribuir. | ML | 39 | $ 40.224 | $ 1.575.543 | | $ - | | |
| 13.6.3 | Suministro e instalación de cableado en baja tensión subterráneo desde medidor trifásico hasta tablero acometidas 2 de 6 circuitos en cable en cobre 3T #6+1N #6+ 1T #10, incluye tendido y distribuir. | ML | 39 | $ 35.231 | $ 1.379.913 | - | $ - | | |
| 13.6.4 | Suministro e instalación de tablero de 8 circuitos (Tablero 1); tablero bifásico con puerta, cinges, incluye herrajes y distribuir. | UN | 1 | $ 540.907 | $ 540.907 | | $ - | | |
| 13.6.5 | Suministro e instalación de tablero de 8 circuitos (Sub tablero 1.1); tablero bifásico con puerta, incluye herrajes y distribuir. | UN | 1 | $ 457.657 | $ 457.657 | | $ - | | |

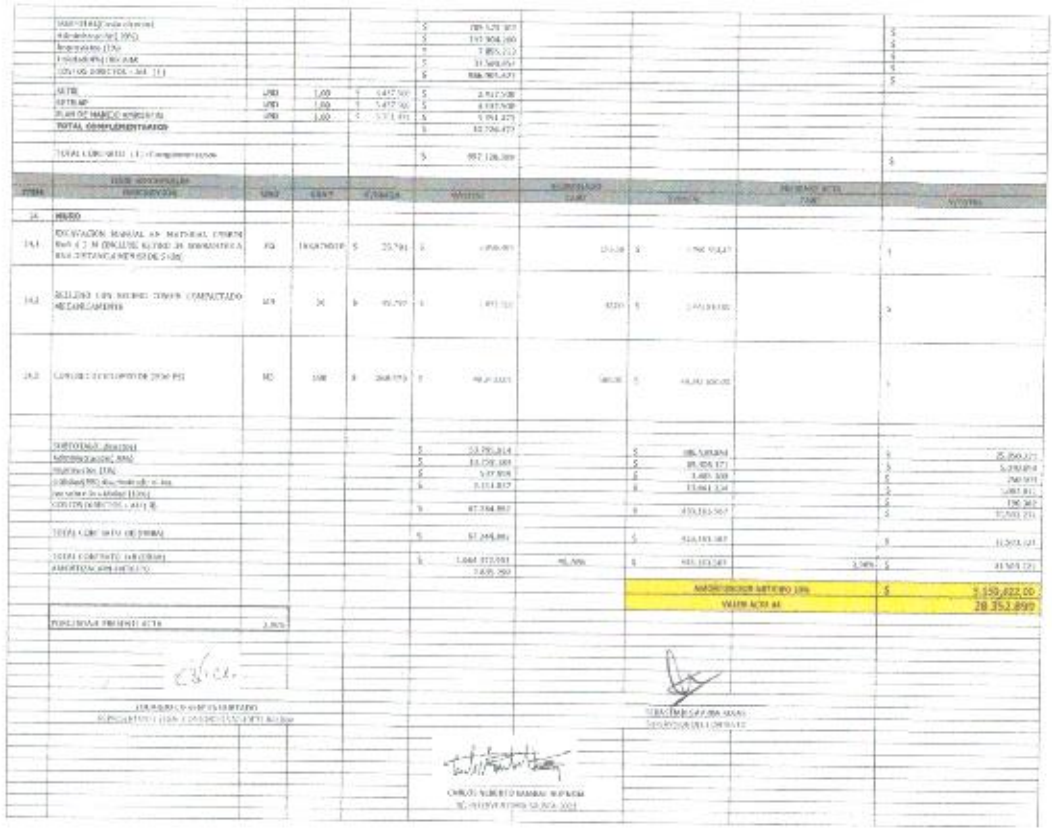

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.6 | Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos (Tablero 2), tablero monofasico con puerta, incluye frontales y canaleta. | UN | 1 | $ 231,890 | $ 231,890 | - | $ - | | |
| 13.4.7 | Suministro e instalación de gabinete de cuarto de medidores para desmontaje de cuchilla de Ambos Apartamentos secundario | UN | 1 | $ 2,618,995 | $ 2,618,995 | - | $ - | | |
| 13.4.8 | Suministro e instalación de Tuvos 4"CL incluye cableado libre de halogeno, cuchos en EMT y herramienta. | UN | 5 | $ 237,821 | $ 1,189,105 | - | $ - | | |
| 13.4.9 | Suministro e instalación de Tuvos 2"C incluye cableado libre de halogeno,cuchos en EMT y herramienta. | UN | 1 | $ 223,637 | $ 223,637 | - | $ - | | |
| 13.4.10 | Suministro e instalación de Tuvos 1"C incluye cableado libre de halogeno, cuchos en EMT y herramienta. | UN | 3 | $ 216,613 | $ 649,841 | - | $ - | | |
| 13.4.11 | Suministro e instalación de salida electrica para Alumbrado incluye cableado libre de Halogenos, tuberia EMT y accesorios. | UN | 67 | $ 120,062 | $ 8,044,154 | - | $ - | | |
| 13.4.12 | Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo | UN | 5 | $ 12,568 | $ 62,840 | - | $ - | | |
| 13.4.13 | Suministro e instalación de Salida Interruptor doble | UN | 3 | $ 17,188 | $ 51,564 | - | $ - | | |
| 13.4.14 | Suministro e instalación de lampara luminaria de 54 W | UN | 8 | $ 247,737 | $ 1,981,903 | - | $ - | | |
| 13.4.15 | Suministro e instalación de lampara de 2x9x18 24 W | UN | 24 | $ 36,167 | $ 868,008 | - | $ - | | |
| 13.4.16 | Suministro e instalación de lampara tipo aletaga led de 15 W | UN | 14 | $ 36,767 | $ 515,748 | - | $ - | | |
| 13.4.17 | Camara de inspección B.T tipo BT1 0.4 x 0.4 mts. | UN | 3 | $ 340,544 | $ 1,021,644 | - | $ - | | |
| 13.5 | EXCAVACION Y RELLENO | | | | | | | | |
| 13.5.1 | Excavación de zanja para ductos e incluye relleno de material, dimensiones de 0.6 x 0.4 mts | MT | 14 | $ 13,877 | $ 867,666 | 72.00 | $ 907,586.00 | | |
| 13.5.2 | Retiros un area de pella para tendido de conductor/cable electrico | MT | 52 | $ 29,814 | $ 1,990,930 | 50.00 | $ 1,990,930.00 | | |
| 13.6 | AFUSTES LAMPARAS | | | | | | | | |
| 13.6.1 | Suministro e instalación de Cable Cu de calibre 3/0, incluye conectores para tendido de cable | ML | 100 | $ 45,251 | $ 4,511,100 | - | $ - | | |
| 13.6.2 | Suministro e instalación de Varilla Cu 2.40 x 5/8" | UN | 4 | $ 270,000 | $ 1,080,205 | - | $ - | | |
| 13.6.3 | Suministro e instalación de soldadura cadweld 90 gramos | UN | 10 | $ 44,110 | $ 432,860 | - | $ - | | |
| 13.6.4 | Suministro, transporte e instalación de puntas cadweld (conexiones) | UN | 4 | $ 147,101 | $ 588,404 | - | $ - | | |
| 13.6.5 | Suministro e instalación de bajantes de apantallamiento para postes de concreto de 10 mts, en cable de aluminio tipo autoforce, incluye tuberia y accesorios de soportes. | UD | 4 | $ 339,071 | $ 1,356,284 | - | $ - | | |
| 13.6.6 | Camara de inspección B.T tipo BT1 0.3 x 0.3 mts. | UD | 2 | $ 259,053 | $ 518,105 | - | $ - | | |
| 13.7 | SERVICIOS | | | | | | | | |
| 13.7.1 | Suministro e instalacion de Bachilleta subterranea en PVC de 4" de diametro. | ML | 153 | $ 9,251 | $ 1,380,020 | 153.00 | $ 1,380,020.00 | | |
| | | | | | | | | | |

Espacio para Logo Corporativo

**CONSORCIO SACUDETE BALBOA**
NIT 901.574.342-5
CR 15 # 148-75 TORRE 4 304
Tel: (604) 3235686
Monteria - Colombia
gerenciaecolaqua@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 9**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | MUNICIPIO DE BALBOA | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 890.801.143-1 | **Teléfono** | (606) 3146208880 - Ext. 000 - (606) 3146382479 - Ext. 000 | **Generación** | 25/02/2025, 15:14 |
| **Dirección** | CLL 6 NO 6-44 | **Ciudad** | Risaralda - Colombia | **Expedición** | 25/02/2025, 15:14 |
| | | | | **Vencimiento** | 25/02/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA 05 DEL CONTRATOREALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEL 10% TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS MLC ($3.150.322) | 1.00 | 25,240,853.06 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Treinta y un millones quinientos tres mil doscientos veinte pesos m/cte con ochenta y uno cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 31,503,220.81

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 25,050,271.00 |
| Administración 20.00% | 5,010,054.20 |
| Imprevistos 1.00% | 250,502.71 |
| Utilidad 4.00% | 1,002,010.84 |
| IVA 19% | 190,382.06 |
| **Total a Pagar** | 31,503,220.81 |

**Observaciones:**
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DEL BANCO CAJA SOCIAL CONSORCIO SACUDETE BALBOA NUMERO 24140453560

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082536407 aprobado en 20241030 prefijo FE desde el número 3 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0
**CUFE:** 93021c0450c430bfa775d01cae8b09a398204c6e240316c0ff537f9476583b681634bcc758f2ab29442ae3d6d13171e2

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.085.141-8 Nombre Software: Siigo Nube. Prima electrónica en el 4%

Balboa Risaralda,

Doctora:
**YURLEY ARIAS DUQUE.**
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

| **Cuenta a Debitar** | **Valor** | **Cuenta Destino** |
|---|---|---|
| 457253005106 | 23.329.943 | 24140453560 Cuenta de Ahorros De Banco Caja social a nombre de Consorcio sacudete Balboa Nit 901.574.342 |
| **TOTAL** | **23.329.943** | |

Agradezco su colaboración,

Atentamente,

**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ.**
Alcalde Municipal

**KELLY LEANDRA CANDAMIL F.**
Tesorera General

**Proyectó:** Kelly Leandra Candamil Foronda – Tesorera General.
**Revisó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda.
**Aprobó:** Yurley Arias Duque. – Secretaria de Hacienda

MUNICIPIO DE BALBOA MPIO : KELLY LEANDRA CANDAMIL FORONDA

# Transferencia

Confirmación de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros

PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar $ 23.329.943,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

CONSORCIO SACUDETE BALBOA

******3560**

Monto a acreditar $ 23.329.943,00

**Monto $**
**23.329.943,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | 0058 |
| Descripción: | PAGO CONTRATO |

26/02/2025 - 03:28:00 p. m. | IP actual: 200.10.28.165

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp



# La operación solicitada se realizó correctamente

| | |
|---|---|
| Número de Cuenta Origen: | ****5106 |
| Número de Cuenta Destino: | BANCO CAJA SOCIAL - ****3560 |
| Valor Transferencia: | $ 23.329.943,00 |
| Fecha y Hora: | 26/02/2025 3:29:47 p. m. |
| Dirección IP: | 200.10.28.164 |
| Costo de la transacción: | $ 0,00 + IVA |
| Número de aprobación: | 179648996 |
| Tipo transacción: | Transferencia Interbancaria |

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Interior

Al responder cite Radicado 2025-1-003100-039227 Id: 544235

Folios: 2 Fecha: 23/05/2025 8:57:34

Anexos: 3 ARCHIVOS INFORMÁTICOS

Remitente: PERSONERIA BALBOA-RISARALDA

Destinatario: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y GOBIERNO

FECH4

PARA: DIRECCION DE SEGURIDAD CONVIVIENCIA MESA DE ENTRADA

CARGO_DESTINATARIO

DE: PERSONERIA BALBOA-RISARALDA

ASUNTO: OFICIO NO. PMB 247-2025 SOLICITUD PARA INICIAR PROCESO SANCIONATORIO

DETALLE:

*AL CONTESTAR FAVOR CITAR *

*Oficio No. PMB  247-2025*

Balboa, Risaralda, 22 de mayo de 2025

Señor:

*JOSÉ ERNESTO MIRANDA MÁRQUEZ*

Alcalde de Balboa

Señor:

*MICK MAEL BAEZ ROJAS*

Director de Infraestructura y Obras Públicas

Municipio de Balboa

Señora:

*LAURA MURILLO*

Supervisora de Convenios o quien corresponda

Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana

Ministerio del Interior

Cordial saludo,

Me permito adjuntar el asunto de la referencia, junto con los anexos enunciados.

Respetuosamente,

*JULIETA SERNA HOYOS*

**MINISTERIO PÚBLICO**
**PERSONERÍA DE BALBOA**

**LA SECRETARIA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE BALBOA, RISARALDA**

**CERTIFICA**

Que, el Despacho de la personería Municipal realizó audiencia extrajudicial en derecho laboral, donde se citó al Consorcio Sacúdete al Parque Tipo 1, y a pesar que hubo conciliación y se llegaron compromisos de pago de los cuales al parecer se ha incumplido, para lo cual, en el día de hoy se llamó de manera personalizada a los siguientes señores, quienes indicaron que aún se les adeuda el dinero, así:

| **Nombre completo** | **Teléfono** | **Valor adeudado** |
|---|---|---|
| Yoel Edinson Guanipa González | 3136811852 | 8 quincenas y liquidación de prestaciones sociales y |
| Alonso de Jesús Urbana Mejía | 3113671811 | 8 quincenas y liquidación de prestaciones sociales y |
| Leonardo de Jesús López Álvarez | 3127184821 | $2.045.000.00 |

De igual manera el Despacho se comunica con el señor Yovany de Jesús Garcés Arango y e indicó que se cumplió con la conciliación; sin embargo, que continuó laborando con el Consorcio y en este momento le adeudan 5 semanas a el y a cinco personas más-

Para constancia se expide en el Municipio de Balboa Risaralda, hoy veintiún (21) días del mes de mayo de 2025.

**CRUZ ELENA GARCÍA RENDÓN**
Secretaria

PERSONERIA MUNICIPAL DE BALBOA
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Fecha: 23 08 2024 Hora:
Rad. N°: 359 Fol:
Recibido por:

144

Balboa, Risaralda, 23 de agosto de 2024

Señores:
**Personería Municipal De Balboa, Risaralda**
E. S. D.

**SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO LABORAL**
Convocante: Yoel Edinson Guanipa González
Convocado: Consorcio Sácudete Balboa

Yoel Edinson Guanipa González, mayor de edad, identificado con el documento P.P.T 4494484, respetuosamente acudo ante su Despacho, con el fin de Solicitar Audiencia de Conciliación Extrajudicial en Derecho en materia Laboral, contra el Consorcio Sacúdete Balboa, representado legalmente por Jaime Pedraza Pérez, para que de conformidad con el trámite establecido en la Artículo 13 de la Ley 2220 de 2022, se resuelva el conflicto suscitado por el Reconocimiento y pago de mis salario, horas extras y prestaciones sociales.

**HECHOS**

**PRIMERO:** Entre el Municipio de Balboa, Risaralda y el consorcio Sacúdete Balboa, suscribieron el contrato de obra N° 001 de 2022, cuyo objeto radica en "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA".

**SEGUNDO:** Trabajé como ayudante de la obra y celador en la construcción del proyecto denominado Sacúdete al Parque tipo 1, en el Municipio de Balboa, Risaralda, desde el 20 de febrero hasta el 25 de noviembre de 2023, siendo contratado por el señor Guillermo Martínez Niño.

**TERCERO:** Se me adeudan 8 quincenas y la liquidación de mis prestaciones, así mismo, solicitó el pago de la indemnización por el no pagó de las prestaciones contempladas en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

**PRETENSIONES**

Solicito citar a Audiencia de Conciliación Extrajudicial, para obtener el reconocimiento y pago de mis salarios, liquidación de prestaciones sociales, e indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOTIFICACIONES**

**SOLICITANTE:** Recibiré notificaciones a través del correo electrónico yoeledinsonguanipa@gmail.com en el Celular 313 6811852

**CONVOCANDO:** Recibira notificaciones a través del correo electronico consorciosacudetebalboa@gmail.com

**YOEL EDINSON GUANIPA GONZÁLEZ**
PPT.4494484

**MINISTERIO PÚBLICO**
**PERSONERÍA MUNICIPAL DE BALBOA**

## CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL
## PERSONERÍA MUNICIPAL DE BALBOA, RISARALDA

En Balboa, Risaralda, hoy cinco (5) de septiembre de (2024), siendo las una 09:00 am, procede el despacho de la Personería Municipal de Balboa, a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL, sesión que se realiza de forma virtual de conformidad con el artículo 6 de la Ley 2220 de 2020.

Comparece a la diligencia el señor Yoel Edison Guanipa González, identificado con la PPT 4494484, obrando en nombre propio en su condición de convocante.

Comparece por la parte convocada, el CONSORCIO SACUDETE BALBOA, representado legalmente por el señor Eduardo Cifuentes Hurtado, quien dice actuar con poder para actuar, pero una vez verificado el mismo, se observa que no cumple con los requisitos para representar a dicho sociedad comercial.

Por lo anterior, se procede a reprogramar la misma para el día 10 de septiembre a las 9:00 am de forma virtual, ya no que no fue posible que el representante legal le otorgara poder para actual.

No siendo otro el objeto del encuentro, se dio por terminada la audiencia, siendo las 9:22 am.

**JULIETA SERNA HOYOS**
**CONCILIADORA**

## ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL PERSONERÍA MUNICIPAL DE BALBOA, RISARALDA

En Balboa, Risaralda, hoy cinco (5) de septiembre de (2024), siendo las una 09:00 am, procede el despacho de la Personería Municipal de Balboa, a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL, sesión que se realiza de forma virtual de conformidad con el artículo 6 de la Ley 2220 de 2020.

Comparece a la diligencia el señor Yoel Edison Guanipa González, identificado con la PPT 4494484, obrando en nombre propio en su condición de convocante.

Comparece por la parte convocada, el CONSORCIO SACUDETE BALBOA, representado legalmente por el señor Jaime Pedraza Pérez, quien otorgo poder especial al señor Eduardo Cifuentes Hurtado, identificado con la Cédula de ciudadanía 105.483.838, quien allego poder a través de un correo electrónico.

Acto seguido la personera municipal, con fundamento en el artículo 13 de la Ley 2220 de 2020, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia civil como mecanismo de resolución de conflictos.

En este estado de la diligencia, la Personera hace una presentación de la controversia objeto de la convocatoria a conciliación y, seguidamente, se concede el uso de la palabra a las partes para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual las partes manifiesta: desean conciliar de la siguiente manera: sí.

El señor Yoel Edison Guanipa González, presenta formula de arreglo, para que le cancelen la suma del salario adeudado, más la liquidación de prestaciones sociales, e indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

El señor Eduardo Cifuentes Hurtado, actuando como apoderado del Consorcio sacúdete Balboa, propone una fórmula de arreglo de pagar la suma de ($3.000.000) moneda corriente, el día 10 de octubre de 2024.

Por lo anterior, se llega al siguiente acuerdo de conciliación:

El Consorcio Sacúdete Balboa, con Nit 901574342-5 le pagara la suma de ($3.000.000) moneda corriente, el día 10 de octubre de 2024 al señor Yoel Edison Guanipa González, identificado con la PPT 4494484, libre de descuentos.

Estando las partes de acuerdo, la conciliadora le dio su aprobación al presente arreglo.

La conciliadora manifestó que la presente acta hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo establecido por la Ley 2220 de 2020.

No siendo otro el objeto del encuentro, se dio por terminada la audiencia, siendo las 9:20 am. y se firmó el acta por todos los que allí intervinieron.

**JULIETA SERNA HOYOS**
**CONCILIADORA**

PERSONERIA MUNICIPAL DE BALBOA
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Fecha: 10 SEPT Hora:
Rad. N°: 478 Fol:
Recibido por:

180

Balboa, Risaralda, 5 de septiembre de 2024

Señores:
**Personería Municipal De Balboa, Risaralda**
E. S. D.

**SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO LABORAL**
Convocante: Alonso de Jesús Urbana Mejía
Convocado: Consorcio Sácudete Balboa

Alonso de Jesús Urbana Mejía, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, respetuosamente acudo ante su Despacho, con el fin de Solicitar Audiencia de Conciliación Extrajudicial en Derecho en materia Laboral, contra el Consorcio Sácudete Balboa, representado legalmente por Jaime Pedraza Pérez, para que de conformidad con el trámite establecido en la Artículo 13 de la Ley 2220 de 2022, se resuelva el conflicto suscitado por el Reconocimiento y pago de mis salario, horas extras y prestaciones sociales.

**HECHOS**

**PRIMERO:** Entre el Municipio de Balboa y el Consorcio Sácudete Balboa, suscribieron el contrato de obra N° 001 de 2022.

**SEGUNDO:** Trabajo como maestro de obra, celador y otros oficios en la construcción del proyecto denominado sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa, desde el 20 de febrero de 2023 a la fecha, siendo contratado por el señor Guillermo Martínez Niño.

**TERCERO:** A la fecha me adeuda ocho quincenas y la liquidación de mis prestaciones sociales.

**PRETENSIONES**

Solicito citar a Audiencia de Conciliación Extrajudicial, para obtener el reconocimiento y pago de mis salarios, liquidación de prestaciones sociales, e indemnización de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

**NOTIFICACIONES**

**SOLICITANTE:** Recibiré notificaciones a través del correo electrónico alonso4326888@gmail.com con copia a la personeria@balboa-risaralda.gov.co teléfono 311-367-1811.

**CONVOCANDO:** Recibirá notificaciones a través del correo electrónico consorciosacudetebalboa@gmail.com

Alonso JESUS URBANA MEJIA
**ALONSO DE JESÚS URBANA MEJÍA**
C.C. 85.200.983 de Santa Ana

**MINISTERIO PÚBLICO**
**PERSONERÍA MUNICIPAL DE BALBOA**

183

**AL CONTESTAR FAVOR CITAR**
**Oficio No. PMB-520-2024**
Balboa, Risaralda, 11 de septiembre de 2024

Señor:
**Alonso De Jesús Urbana Mejía**
alonso4326888@gmail.com
Teléfono: 311-367-1811

Asunto: Citación Audiencia de Conciliación Extrajudicial en Derecho Laboral

De conformidad con el Auto del 11 de septiembre del año en curso, la Personera Municipal de Balboa Risaralda, admitió la solicitud de Conciliación Extrajudicial Derecho Laboral presentada por Usted, por lo anterior, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 2220 de 2022, es necesario su comparecencia a la Audiencia la cual se llevará a cabo el jueves diecinueve (19) de septiembre de 2024 a la 1:30 p.m. en las instalaciones de la Personería Municipal de Balboa, de manera virtual, lo anterior de conformidad con el artículo 7 de la Ley 2213 de 2022.

En caso de no poder asistir a la audiencia, deberá informar las causas de la inasistencia en un término de tres días (3) hábiles al correo personeria@balboa-risaralda.gov.co.

Atentamente,

**CRUZ ELENA GARCIA RENDON**
Secretaria

Proyectó y elaboró: Cruz Elena García Rendón
Revisó: Julieta Serna Hoyos

**MINISTERIO PÚBLICO**
**PERSONERÍA DE BALBOA**

## CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL

**CONVOCANTES:** Leonardo De Jesús López Álvarez
Gilma Rosa Reyes Chavarro
Yurany Grisales Castaño
**CONVOCADO:** Consorcio Sacúdete Balboa

Balboa Risaralda, 5 de marzo de 2025

El señor Leonardo de Jesús López Álvarez, el 4 de marzo de 2025, presentó solicitud de Conciliación Extrajudicial en Materia Laboral contra Consorcio Sacúdete Balboa, con el fin obtener el reconocimiento y pago del salario y liquidación de prestaciones sociales.

Posteriormente, la señora Yurany Grisales Castaño y Gilma Rosa Reyes Chavarro, radicaron solicitud de Conciliación Extrajudicial en Materia Laboral el 5 de marzo de 2025, contra el Consorcio Sacúdete Balboa, con el fin obtener el reconocimiento y pago del salario y liquidación de prestaciones sociales.

Que, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 2220 de 2022, se establece que los personeros son operadora autorizados para adelantar conciliaciones extrajudiciales en materia laboral.

Que, la suscrita Personara de Balboa, cuenta con el curço como conciliadora en derecho, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 2220 de 2022.

Que, una vez revisados los requisitos formales y sustanciales de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en materia Laboral, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2220 de 2022, se procede a admitir y acumular, ya que va dirigida contra el mismo convocado.

En virtud de lo anterior, este Despacho,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Admitir y acumular la solicitud de Conciliación Extrajudicial En Materia Laboral presentada por Leonardo de Jesús López Álvarez, Yurany Grisales Castaño y Gilma Rosa Reyes Chavarro, con el fin de solicitar el pago de sus salarios y la liquidación de prestaciones sociales, contra el Consorcio Sacúdete Balboa bajo el nit 901574342-5. Representado legal por el señor Eduardo Cifuentes Hurtado.

**SEGUNDO:** Señalar el día martes (18) de marzo a partir de las 9:00 am para la celebración de la audiencia de Conciliación Extrajudicial en Derecho Laboral de forma presencial.

**TERCERO:** Comunicar el presente auto a las partes.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**JULIETA SERNA HOYOS**
Personera de Balboa

Proyectó y revisó: Julieta Serna Hoyos

**MINISTERIO PÚBLICO**
**PERSONERÍA DE BALBOA**

**AL CONTESTAR FAVOR CITAR**
**Oficio No. PMB-138-2025**
Balboa, Risaralda, 06 de marzo de 2025

Señor:
**LEONARDO DE JESÚS LÓPEZ ÁLVAREZ**
Celular: 3127184821

Asunto: Citación a la Audiencia de Conciliación Extrajudicial en Derecho Laboral

Cordial saludo López.

De conformidad con el Auto del 5 de marzo del año en curso, la Personera Municipal de Balboa Risaralda, admitió la solicitud de Conciliación Extrajudicial Derecho Laboral contra el Consorcio Sacúdete Balboa de conformidad con el artículo 13 de la Ley 2220 de 2022.

Por lo anterior, es necesaria su comparecencia a la Audiencia la cual se llevará a cabo el día martes dieciocho (18) de marzo de 2025 a las 9:00 am en las instalaciones de la Personería Municipal de Balboa, ubicada en la calle 8 N° 7- 11 piso 11, teléfono: 3116999776.

En caso de no poder asistir a la audiencia, deberá informar las causas de la inasistencia en un término de tres días (3) hábiles al correo personeria@balboa-risaralda.gov.co.

Atentamente,

**CRUZ ELENA GARCÍA RENDÓN**
Secretaria

Proyectó: Cruz Elena García Rendón
Aprobó: Julieta Serna Hoyos

**MINISTERIO PÚBLICO**
**PERSONERÍA DE BALBOA**

**AL CONTESTAR FAVOR CITAR**
**Oficio No. PMB-141-2025**
Balboa, Risaralda, 6 de marzo

Señor:
**EDUARDO CIFUENTES HURTADO**
Representante Legal
Consorcio Sacúdete Balboa
Email: consorciosacudetebalboa@gmail.com y gerenciaecolaqua@gmail.com

Asunto: Citación a la Audiencia de Conciliación Extrajudicial en Derecho Laboral

Cordial saludo señor Cifuenes.

Me permio informarle que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 2022 de 2022., la Personera de Balboa, admitió y acumuló las solicitudes de conciliación en material Laboral elevada por los señores Leonardo De Jesús López Álvarez, Gilma Rosa Reyes Chavarro y Yurany Grisales Castaño.

Por lo anterior, es necesaria su comparecencia a la Audiencia de Conciliación Extrajudicial Derecho Laboral **EL DÍA MARTES 18 DE MARZO DE 2025 A LAS 9:00 A.M** en las instalaciones de la Personería Municipal de Balboa, ubicada en la calle 8 n° 7- 11 piso 11, teléfono: 3116999776.

El motivo por el cual se lleva a cabo dicha conciliación, es obtener el reconocimiento del pago del salario y la liquidación de las prestaciones sociales a favor de cada uno de los solicitantes indicados anteriormente.

En caso de no poder asistir a la audiencia, deberá informar las causas de la inasistencia en un término de tres días (3) hábiles al correo personeria@balboa-risaralda.gov.co

Respetuosamente,

**CRUZ ELENA GARCÍA RENDÓN**
Secretaria

Proyectó: Cruz Elena García Rendón
Aprobó: Julieta Serna Hoyos

**MINISTERIO PÚBLICO**
**PERSONERÍA DE BALBOA**

# ACTA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL

**CONVOCANTES:** Leonardo De Jesús López Álvarez
Gilma Rosa Reyes Chavarro
Yurany Grisales Castaño
**CONVOCADO:** Consorcio Sacúdete Balboa

Balboa Risaralda, 18 de marzo de 2025, siendo las 9:11 am, procede el despacho de la Personería Municipal de Balboa, a celebrar audiencia de conciliación extrajudicial en material laboral, sesión que se realiza de forma virtual, de conformidad con la Ley 2220 de 2020.

Comparece a la diligencia el señor Eduardo Cifuentes Hurtado, mayor de edad, identificado con la cédula 10.548.383, obrando en su condición de representante legal del Consorcio Sacúdete Balboa.

Comparece por la parte convocantes las siguientes personas:

Yurany Grisales Castaño, identificada con la cédula de ciudadanía 1.133.099.058.

Gilma Rosa Reyes Chavarro, identificado con la cédula de ciudadanía 1.006.513.805.

El señor Leonardo de Jesús López Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía 6.282.102.

Acto seguido la personera municipal, con fundamento en el artículo 13 de la Ley 2220 de 2020, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia civil como mecanismo de resolución de conflictos.

En este estado de la diligencia, la Personera hace una presentación de la controversia objeto de la convocatoria a conciliación y, seguidamente, se concede el uso de la palabra a las partes para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual las partes manifiesta: desean conciliar de la siguiente manera:

El señor Eduardo Cifuentes Hurtado, en su condición de representante legal, indica que adeuda adeuda un total de $3.000.000 de pesos para las Yurany Grisales Castaño y Gilma Rosa Reyes Chavarro, se cancelaran el valor total el 29 de marzo de 2025.

**MINISTERIO PÚBLICO**
**PERSONERÍA DE BALBOA**

Al señor Leonardo de Jesús López Álvarez, se le adeuda un total de ($2.045.000.000) le cancelaria el día 20 de marzo de 2025 la mitad, y el restante se cancela el día 29 de marzo de 2025.

Estando las partes de acuerdo, la conciliadora le dio su aprobación al presente arreglo.

La conciliadora manifestó que la presente acta hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo de acuerdo con lo establecido por la Ley 2220 de 2020.

No siendo otro el objeto del encuentro, se dio por terminada la audiencia, siendo las 9:19 a.m. y se firmó el acta por todos los que allí intervinieron.

Debido a que el señor Eduardo Cifuentes Hurtado, se conecto de forma virtual a la audiencia, se compromete a firmar la respectiva acta el 20 de marzo de 2025.

Conciliador
Julieta Serna Hoyos
Conciliador

Leonardo de Jesús López Álvarez
CC 6.282.102

Eduardo Cifuentes Hurtado
CC 10.548.383

Yurany Grisales Castaño
CC 1.133.099.058.

Gilma Rosa Reyes Chavarro
CC. 1.006.513.805.

**MINISTERIO PÚBLICO**
**PERSONERÍA DE BALBOA**

**AL CONTESTAR FAVOR CITAR**
**Oficio No. PMB-211-2025**
Balboa, Risaralda, 6 de abril de 2025

Señor:
**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MÁRQUEZ**
Alcalde de Balboa

ALCALDÍA DE BALBOA
DESPACHO DEL ALCALDE
Fecha: 6-05-25 Hora: 9:24
Rad. Nº: PP-0671-2025
Recibido por: Camila Galvis

Asunto: Remisión por competencia – petición verbal sobre presunto incumplimiento de acuerdo de pago

Cordial Saludo señor Márquez.

A esta Agencia del Ministerio Público, fue allegada información por parte del del ciudadano Leonardo de Jesús López Álvarez identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.282.102, a través del teléfono 3127184821, quien informó que el ingeniero Eduardo Cifuentes Hurtado, identificado con la cédula 10.548.383, obrando en su condición de representante legal del Consorcio Sacúdete Balboa, no ha cumplido con el acta de conciliación extrajudicial en materia laboral de fecha 18 de marzo de 2025 suscrita en este despacho, a través de la cual, el Consorcio Sacúdete Balboa reconoció que adeudaba la suma de ($2.045.000.000) los cuales serían canceladores en partes iguales el día 20 y 29 de marzo de 2025, sin que a la fecha haya cumplido con su obligación laboral.

Considerando que el asunto en cuestión se encuentra bajo su competencia según lo dispuesto en la normativa vigente y el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, por lo que procedo a remitirle el escrito para lo de su competencia.

Respetuosamente,

**JULIETA SERNA HOYOS**
Personera Municipal

Anexo: (2) copias que contiene el acta de conciliación extrajudicial en materia laboral

Proyectó y Revisó: Julieta Serna Hoyos

Con copia: Leonardo de Jesús López Álvarez

**AL CONTESTAR FAVOR CITAR**
**Oficio No. PMB 247-2025**
Balboa, Risaralda, 22 de mayo de 2025

Señor:
**JOSÉ ERNESTO MIRANDA MARQUEZ**
Alcalde de Balboa

**MICK MAEL BAEZ ROJAS**
Director de Infraestructura y Obras Públicas
Municipio de Balboa

Señora:
**LAURA MURILLO**
Supervisora de Convenios
Subdirección de Proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana
Ministerio del Interior

Asunto: Solicitud para iniciar proceso sancionatorio contra el CONSORCIO SACÚDETE BALBOA. NIT: 901574342-5.

Cordial saludo.

La suscrita personera municipal de Balboa, Risaralda, en uso de la Ley 1775 de 2015, me permito presentar derecho de petición de interés general, con fundamento en los siguientes:

## I. HECHOS

**PRIMERO:** Que el 12 de noviembre de 2021, El MINISTERIO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2001 de 2021, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa Risaralda., el cual inició el 17 de noviembre de 2021.

**SEGUNDO:** Dicho convenio ha presentado varias prorrogas al convenio, las cuales se encuentran justificados.

**TERCERO:** Que el Municipio de Balboa, suscribió contrato de obra N° 001 de 2022 el d3 de mayo de 2022, cuyo objeto es "realizar estudios, diseños y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de balboa, Risaralda", el cual se encuentra vigente.

**CUARTO:** Durante la relación laboral varias personas, han solicitado a la Personería de Balboa Audiencia de Conciliación Extrajudicial en Derecho en materia Laboral, contra el Consorcio Sacúdete Balboa, de conformidad con el trámite establecido en la Artículo 13 de la Ley 2220 de 2022, ya que al parecer el consorcio incurrió en el no pago de salarios y prestaciones sociales.

**QUINTO:** Que este despacho ha dado tramite a los mismos y como consecuencia se ha elevado los respectivos acuerdos respectivos; sin embargo,

al parecer no se ha dado cumplimiento, de acuerdo a lo manifestado por los ciudadanos y constancia secretarial adjunta.

**SEXTO:** Esta situación constituye una vulneración de los derechos laborales reconocidos en Código Sustantivo del Trabajo y en la jurisprudencia vigente, que establece la responsabilidad directa y solidaria del consorcio y sus integrantes frente a las obligaciones laborales, así como de la cláusula 19 del contrato de obra, donde obliga al Contratista mantendrá indemne al Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.


## II. PRETENSIÓN

**PRIMERO:** Se inicie un proceso sancionatorio en el marco del contrato de obra No. 001 de 2022, suscrito entre el Municipio de Balboa, Risaralda y el consorcio Sacúdete Balboa.

**SEGUNDO:** Se ordene el pago de las sumas adeudadas por concepto de salarios y prestaciones sociales.

**TERCERO:** Se impongan las sanciones a que haya lugar conforme a la ley.

La anterior petición, pretende la protección de los derechos e interés de los beneficiarios.



**JULIETA SERNA HOYOS**
Personera

Proyectó: Julieta Serna Hoyos
Elaboró: Julieta Serna Hoyos

Con copia: consorciosacudetebalboa@gmail.com

Anexos:
Copia de las conciliaciones en materia laboral y constancia secretaria donde se indica las personas a quien se les adeuda.

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-018944 Id: 546911
Folios: 2 Fecha: 27-05-2025 17:24:25
Anexos: 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: PERSONERIA BALBOA-RISARALDA

Bogotá D.C.

Señora:
**JULIETA SERNA HOYOS**
Personera Municipal
Municipio de Balboa – Risaralda
Cra. 8 #89, Palacio Municipal.
Teléfono: 3116999776 Código Postal 662010
personeria@balboa-risaralda.gov.co

**Asunto:** Respuesta al oficio No. PMB 247-2025 relacionado con la solicitud para iniciar proceso sancionatorio contra el CONSORCIO SACÚDETE BALBOA. NIT: 901574342-5.

Cordial saludo:

En atención al derecho de petición remitido relacionado con el convenio No.2001-2021 suscrito entre la Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Balboa - Risaralda, cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al Parque Tipo 1 en el Municipio de Balboa - Risaralda"* convenio 2001 – 2021 en el cual presentó las siguientes pretensiones:

> ***"PRIMERO:*** *Se inicie un proceso sancionatorio en el marco del contrato de obra No. 001 de 2022, suscrito entre el Municipio de Balboa, Risaralda y el consorcio Sacúdete Balboa.*
>
> ***SEGUNDO:*** *Se ordene el pago de las sumas adeudadas por concepto de salarios y prestaciones sociales.*
>
> ***TERCERO:*** *Se impongan las sanciones a que haya lugar conforme a la ley."*

La supervisión del Ministerio del Interior se permite indicar que, no es competente para revisar y posteriormente conceder las pretensiones solicitadas por la peticionaria; toda vez que, las partes del convenio interadministrativo No. 2001- 2021 son La Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Balboa – Risaralda esto, conforme a lo consagrado en el anexo de condiciones del convenio en mención.

Es pertinente indicar que, esta supervisión trasladó su derecho de petición al Municipio de Balboa – Risaralda mediante el oficio No.2025-2-003122-018920 Id: 546871 del 27 de mayo de 2025, debido que es la entidad competente para referirse a las tres (3) pretensiones solicitadas por la personería de Balboa – Risaralda. Es de resaltar que, el municipio de Balboa – Risaralda emitirá respuesta directamente a su despacho con copia a esta supervisión.

Sin otro particular,

VITERBO GOMEZ CARVAJAL

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-018944 Id: 546911
Folios: 2 Fecha: 27-05-2025 17:24:25
Anexos: 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: PERSONERIA BALBOA-RISARALDA

**Supervisor del Convenio No.2001 - 2021**
Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Elaboró: Ing. Laura L. Murillo Valles – Apoyo a la supervisión SPS
Revisó: Abg Diana Carolina Guerra Urbina Guerra / Apoyo jurídico SPS
Revisó: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera - Apoyo a la supervisión SPS

Anexos:

1. Traslado a Municipio de Balboa – Risaralda ID: 2025-2-003122-018920 Id: 546871

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-018920 Id: 546871
Folios: 2 Fecha: 27-05-2025 17:03:44
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: PERSONERIA BALBOA-RISARALDA

Bogotá D.C.

Señor:
**JOSE ERNESTO MIRANDA MARQUEZ**
Alcalde Municipal
Municipio de Balboa – Risaralda
Cra. 8 #89, Palacio Municipal
alcaldia@balboa-risaralda.gov.co

**Asunto:** Traslado del derecho de petición por factor competencia relacionado con las pretensiones realizadas por la personera del municipio de Balboa - Risaralda mediante el oficio No. PMB 247-2025 en relación con la solicitud para iniciar proceso sancionatorio contra el CONSORCIO SACÚDETE BALBOA. NIT: 901574342-5.

Cordial saludo,

En atención al derecho de petición remitido por la personera municipal de Balboa- Risaralda relacionado con el convenio No.2001-2021 suscrito entre la Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Balboa - Risaralda, cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA"*,en el cual presentó las siguientes pretensiones:

> ***" PRIMERO:*** *Se inicie un proceso sancionatorio en el marco del contrato de obra No. 001 de 2022, suscrito entre el Municipio de Balboa, Risaralda y el consorcio Sacúdete Balboa.*
>
> ***SEGUNDO:*** *Se ordene el pago de las sumas adeudadas por concepto de salarios y prestaciones sociales.*
>
> ***TERCERO:*** *Se impongan las sanciones a que haya lugar conforme a la ley."*

La supervisión del Ministerio del Interior se permite indicar que, no es competente para revisar y posteriormente conceder las pretensiones solicitadas por la peticionaria; toda vez que, las partes del convenio interadministrativo No. 2001- 2021 son La Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y el Municipio de Balboa – Risaralda esto, conforme a lo consagrado en el anexo de condiciones del convenio en mención; por consiguiente, se traslada el derecho de petición para que se emita respuesta a la peticionaria en los términos establecidos por la Constitución Política de Colombia con copia a esta supervisión a los correos viterbo.gomez@mininterior.gov.co, diana.guerra@mininterior.gov.co y laura.murillo@mininterior.gov.co

Sin otro particular,

**VITERBO GOMEZ CARVAJAL**
**Supervisor del Convenio No.2001-2021**

Interior

Profesional Especializado 2028 grado 19
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Al contestar cite Radicado 2025-2-003122-018920 Id: 546871
Folios: 2 Fecha: 27-05-2025 17:03:44
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: PERSONERIA BALBOA-RISARALDA

Elaboró: Ing. Laura L. Murillo Valles – Apoyo a la supervisión SPS
Revisó: Abg Diana Carolina Guerra Urbina Guerra / Apoyo jurídico SPS
Revisó: Arq. Mauricio Guarnizo Lopera - Apoyo a la supervisión SPS
