ENERGY GUILD S.A.S
Nit. 901384307-1

VALPARAÍSO CAQUETÁ
COMUNICACIONES RECIBIDAS
NIT. 800.050.407-1
RADICADO No. 419
FECHA: 18-06-2025 HORA: 9:58
FOLIOS: 2 ANEXOS: 7
FIRE: Yeimi Velasco

Valparaíso Caquetá, 17 de junio del 2025.

Ingeniera:

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO

Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura

Alcaldía Municipal de Valparaíso

Calle 11 No. 3-50

s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co

Asunto: Informe de interrupciones por temporada de lluvias y solicitud de prórroga – Contrato de Obra No. 02-2025

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito informar a usted que durante la ejecución del Contrato de Obra No. 02-2025, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSIÓN DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA celebrado entre ENERGY GUILD S.A.S Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALPARAISO - CAQUETA, se han presentado interrupciones significativas en el desarrollo normal de las actividades debido a las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos meses, en particular por la intensificación de la temporada de lluvias.

Dichas precipitaciones han generado dificultades en el acceso a la zona de intervención, inestabilidad del terreno, retraso en el transporte de materiales y riesgos en la seguridad del personal, lo cual ha imposibilitado el cumplimiento del cronograma establecido inicialmente.

Adjunto a este oficio encontrará un informe técnico detallado que incluye:

Fechas de las interrupciones.

Registro fotográfico del estado de la vía/obra afectada.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la naturaleza imprevisible y ajena al contratista de los eventos descritos, solicito de manera formal la autorización de una prórroga en los términos del contrato, con el fin de garantizar la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Agradezco su comprensión y quedo atento a su pronta respuesta para proceder conforme a lo estipulado en el marco contractual.

Atentamente,

CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN

Gerente general ENERGY GUILD S.A.S

INFORME No 001 INTERRUPCIONES POR TEMPORADA DE LLUVIAS

CONTRATO DE OBRA NO. 002-2025

OBJETO:

"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA."

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATISTA

ENERGY GUILD S.A.S

NIT. 901384307-1

1. Introducción

Durante la ejecución del contrato de obra No. 002-2025, se presentaron interrupciones en las actividades programadas debido a las intensas precipitaciones registradas en el municipio de Valparaíso, Caquetá. Estas condiciones climáticas adversas generaron demoras y reprogramaciones que afectaron el normal desarrollo de las labores de mantenimiento, construcción y expansión de redes eléctricas y alumbrado público.

Este informe tiene como propósito detallar dichas interrupciones, sus causas, duración, impactos en la obra y las medidas adoptadas para mitigar los efectos sobre el cronograma general del proyecto.

2. Registro de Interrupciones

ESTADO DEL CLIMA									
CONTRATISTA DE OBRA: ENERGY GUILD S.A.S				SUPERVICION:SECRETARIA DE PLANEACION					
CONTRATO DE OBRA No.002-2025									
PERIODOS DEL 23 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025									
MAYO									
DIAS	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HORAS									
4:45-6:00									
7:00-8:00									
8:00-9:00									
9:00-10:00									
10:00-11:00									
13:00-14:00									
14:00-15:00									
15:00-16:00									
16:00-17:00									
17:00-18.00									
HORAS NO LABORADAS		8	8			4		2	8

En el mes de mayo se presentaron 2 interrupciones por días lluviosos, a su vez hubo 3 días que no se laboraron debido a que 3 de estos días fueron días no laborales en oficina, por lo tanto, se inició el 26 y 27 de mayo con los procesos administrativos, como lo fue la socialización del contrato de obra.

Por lo tanto, los trabajos en campo iniciaron el 28 día en el que hubo interrupciones por lluvia y el día 30 también se presentó este inconveniente.

Mas sin embargo el día 31 se realizaron trabajos de perforación en los nodos para la correcta instalación de los electrodos.

ESTADO DEL CLIMA

CONTRATISTA DE OBRA: ENERGY GUILD S.A.S | SUPERVICION:SECRETARIA DE PLANEACION

CONTRATO DE OBRA No.002-2025

PERIODOS DEL 01 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO DEL 2025

JUNIO

DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
HORAS																	
4:45-6:00																	
7:00-8:00																	
8:00-9:00																	
9:00-10:00																	
10:00-11:00																	
13:00-14:00																	
14:00-15:00																	
15:00-16:00																	
16:00-17:00																	
17:00-18.00																	
HORAS NO LABORADAS		8	8	8		6		8	4		1	5		2			6


DIAS	
HORAS	
TIEMPO SECO	
LLUVIOSO	
NO LABORADOS	
TODAL DIAS NO LABORADOS	10
TOTAL HORAS NO LABORADAS	86


Las labores correspondientes a la obra no pudieron iniciarse los días 2, 3 y 4 de junio debido a que el camión grúa con taladro hidráulico y los trabajadores no lograron acceder al departamento, no se pudo transitar por la vía Suaza–Florencia Dicha vía se encontraba totalmente taponada a causa de un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias. Tampoco de Florencia Valparaíso debido a la creciente del rio y su desbordamiento en la vega., lo cual impidió el ingreso del equipo y del personal al sitio de trabajo.

Además, también se presentaron días lluviosos en los días siguientes del ingreso del personal como se evidencia en el cuadro anterior y teniendo en cuenta que el día 12 de junio no se pudo laborar en la mañana por el trasporte de materiales de Florencia, Valparaíso.

Evidencia fotográfica taponamiento vía suaza- Florencia:



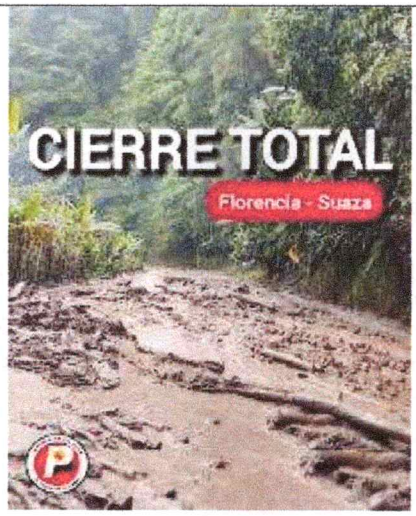








Evidencia fotográfica días de lluvia.

06 de Junio del 2025



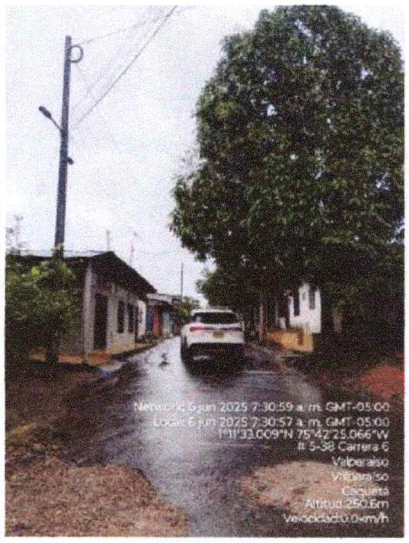


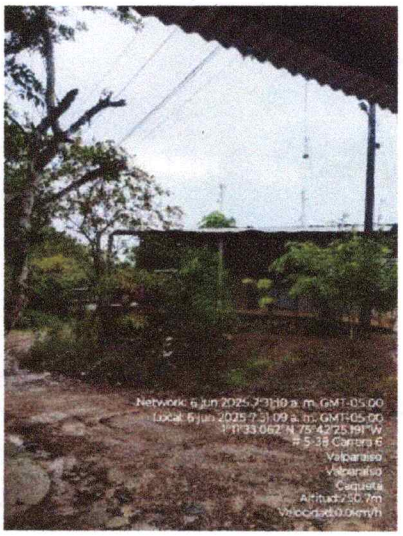


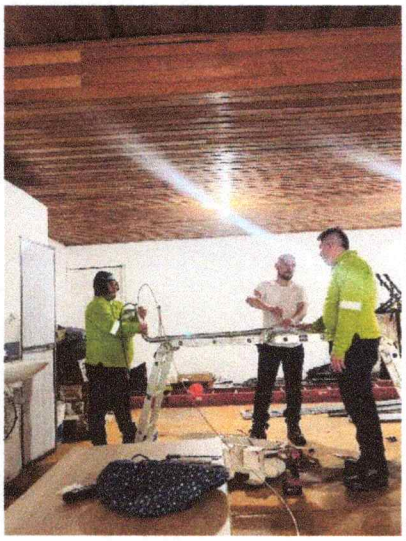09 DE JUNIO DEL 2025	11 DE JUNIO DEL 2025
	

12 DE JUNIO DEL 2025	14 DE JUNIO DEL 2025
	

17 DE JUNIO DEL 2025

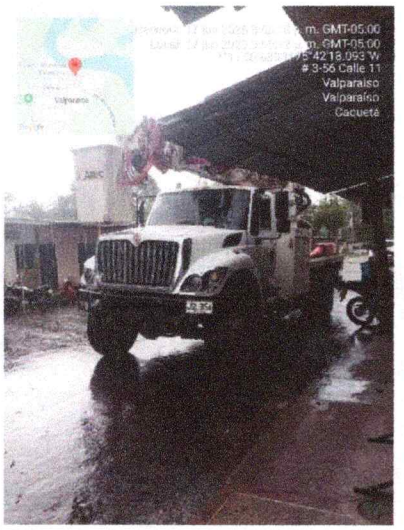

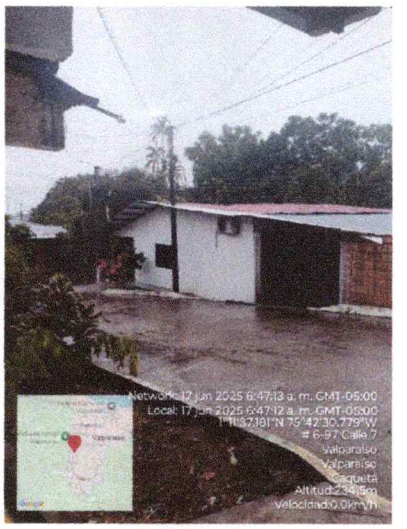

Las interrupciones ocasionaron un desfase acumulado de 10 días en el cronograma general. Aunque las lluvias fueron recurrentes, se reprogramaron actividades de manera estratégica realizando preparación del terreno realizando excavaciones para las varillas puesta tierra para minimizar el impacto en las temporadas de lluvia y se priorizó la ejecución de tareas bajo techo o en zonas no afectadas por las precipitaciones.

Agradecemos sinceramente su comprensión, atención y paciencia durante este período. Somos conscientes de que la ejecución de la obra ha sufrido retrasos debido a las intensas lluvias, una situación ajena a nuestra voluntad. Valoramos profundamente su disposición y confianza mientras trabajamos para reanudar y culminar los trabajos en el menor tiempo posible, manteniendo siempre nuestro compromiso con la calidad y la seguridad.

Atentamente

CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN

Gerente general ENERGY GUILD S.A.S

Valparaíso, Caquetá 19 de junio 2025

Señor:
CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN
R.L. **ENERGY GUILD S.A.S.**
energyguildsas@gmail.com

Referencia: Contrato de Obra No. 002-2025 del 21 de mayo de 2025 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA."**

Asunto: Respuesta a solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

Por medio del presente, y considerando la solicitud de asunto de referencia, en el cual usted en calidad de representante legal de la empresa **ENERGY GUILD S.A.S.**, con Número de Identificación Tributaria 901.384.307-1, solicitó a esta Secretaría de Planeación, Desarrollo e Infraestructura una prórroga para la ejecución del Contrato de Obra No. 002-2025 del 21 de mayo de 2025 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA."** me permito comunicarle que su solicitud ha sido evaluada y debidamente considerada.

Comprendiendo lo manifestado en su solicitud: "*se han presentado interrupciones significativas en el desarrollo normal de las actividades debido a las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos meses, en particular por la intensificación de la temporada de lluvias*" que han generado retrasos en la correcta y oportuna ejecución de las actividades, se otorga una prórroga para la ejecución del contrato de quince (15) días a partir del 23 de junio de 2025. Por tanto, el nuevo plazo de ejecución será hasta el siete (07) de julio del 2025.

La decisión de conceder esta prórroga se fundamenta en la justificación proporcionada, la cual respalda adecuadamente la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato.

Atentamente,

YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura

Gmail

s-planeacioneinfraestructura @valparaiso-caqueta.gov.co <s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co>

Respuesta a solicitud de prórroga.

1 mensaje

PLANEACIÓN VALPARAÍSO <s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co> 19 de junio de 2025, 16:47

Para: energyguildsas@gmail.com

Valparaíso, Caquetá 19 de junio 2025
Señor:
CARLOS FERLEY RAMIREZ USAQUEN
R.L. **ENERGY GUILD S.A.S.**
energyguildsas@gmail.com
Referencia: Contrato de Obra No. 002-2025 del 21 de mayo de 2025 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA."**
Cordial saludo,
Por medio del presente, y considerando la solicitud de asunto de referencia, en el cual usted en calidad de representante legal de la empresa **ENERGY GUILD S.A.S.**, con Número de Identificación Tributaria 901.384.307-1, solicitó a esta Secretaría de Planeación, Desarrollo e Infraestructura una prórroga para la ejecución del Contrato de Obra No. 002-2025 del 21 de mayo de 2025 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y EXPANSION DE REDES ELECTRICAS Y/O ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALPARAISO, CAQUETA."** me permito comunicarle que su solicitud ha sido evaluada y debidamente considerada.

.
ANEXO OFICIO REMISORIO
Cordialmente,

ING. YESSIKA ADRIANA JIMENEZ FORERO
Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura
Alcaldía Municipal de Valparaíso
Calle 11 No. 3-50
s-planeacioneinfraestructura@valparaiso-caqueta.gov.co

Contribuyamos al cuidado del planeta: por favor, no imprima este correo si no es necesario.

Elaborado por: Yessika Adriana Jimenez Forero- Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura
Aprobado por: Yessika Adriana Jimenez Forero- Secretaria de Planeación, Desarrollo e Infraestructura

40-5-1-118.pdf
460K
