AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	50
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022** **MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA: EL CASTILLO: PUERTO LLERAS: PUERTO LÓPEZ: RESTREPO, EL CALVARIO: CABUYARO: VISTA HERMOSA: PUERTO RICO: CUBARRAL: SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META** **CONTRATO N° 774 22 PY 304-21 PARCIAL Nª2 C1-5 C50**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
1.	Hoja de control documental	7946-7947
2.	Acta de pago de obra	7948-7951
3.	Memoria de calculo obra	7952-7993
4.	Acta pago del PMT	7994-7996
5.	Memoria de cálculo del PMT	7997-8004
6.	Informe para plan de manejo de tránsito (PMT)	8005-8026
7.	Informe de obra	8027-8106
8.	Bitácora de obra (copia)	8107-8146

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	774 22 PY 304-21 PARCIAL Nª2 C1-5 C50

Firma		Firma	
Nombre:	**ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS**	Nombre:	**RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	N/A
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	SI
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7946

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
PAGO PARCIAL		**CODIGO FORMATO**	**CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A**
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)		-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO			SI

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 25202- 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 25202-100820 CND

Firma
Nombre: VIVIANA DEL PILAR VALDES DIAZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
25202-204625 CND

Firma
Nombre: OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 143 DE 2023 BPIN 2021005500304
M.P. 25202-78801 CND

Firma
Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL ARCHIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Firma
Nombre: NO APLICA
REVISO
M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3997

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

ACTA PAGO DE OBRA

112-ECP-FR-029

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

2940

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500304
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	002	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	30/08/2024 a 15/05/2025
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 37.096.897.423,16	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 1.026.101.330,91
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	VIVIANA DEL PILAR VALDES DIAZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	252/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	6/09/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	jueves, 15 de mayo de 2025

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	CAPA ASFALTICA													
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,180	$ 5.972.192,00	$ 1.074.995,00	0,170	$ 1.015.272,64	0,170	$ 1.015.272,64	0,000	$ 0,00	0,170	$ 1.015.272,64	100,00%
1,2	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0.15M)	M3	155,00	$ 427.976,00	$ 66.336.280,00	362,00	$ 154.927.312,00	154,62	$ 66.173.649,12	184,04	$ 78.764.703,04	338,66	$ 144.938.352,16	93,55%
1,3	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	M3	1.275,27	$ 55.603,00	$ 70.908.838,00	1.631,85	$ 90.735.755,55	1.521,77	$ 84.614.977,31	110,08	$ 6.120.778,24	1.631,85	$ 90.735.755,55	100,00%
1,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	204,32	$ 262.000,00	$ 53.531.840,00	368,00	$ 96.416.000,00	237,86	$ 62.319.320,00	126,14	$ 33.048.680,00	364,00	$ 95.368.000,00	98,91%
1,5	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	1.802,50	$ 4.851,00	$ 8.743.928,00	1.761,54	$ 8.545.230,54	0,00	$ 0,00	1.736,93	$ 8.425.847,43	1.736,93	$ 8.425.847,43	98,60%
1,6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	144,20	$ 994.015,00	$ 143.336.963,00	176,16	$ 175.105.682,40	0,00	$ 0,00	173,70	$ 172.660.405,50	173,70	$ 172.660.405,50	98,60%
1,7	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO,	M3	391,73	$ 45.008,00	$ 17.630.984,00	312,17	$ 14.050.147,36	227,34	$ 10.232.118,72	84,83	$ 3.818.028,64	312,17	$ 14.050.147,36	100,00%
1,8	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	303,41	$ 154.959,00	$ 47.016.110,00	352,30	$ 54.592.055,70	0,00	$ 0,00	351,99	$ 54.544.018,41	351,99	$ 54.544.018,41	99,91%
1,9	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	379,26	$ 146.057,00	$ 55.393.578,00	644,58	$ 94.145.421,06	373,32	$ 54.525.999,24	269,93	$ 39.425.166,01	643,25	$ 93.951.165,25	99,79%
1.10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	350,00	$ 104.659,00	$ 36.630.650,00	25,50	$ 2.668.804,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 160.196,94	$ 0,00	404,42	$ 64.786.846,47	0,00	$ 0,00	270,72	$ 43.368.515,60	270,72	$ 43.368.515,60	66,94%
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 115.628,61	$ 0,00	10,20	$ 1.179.411,82	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.156.286,10	10,00	$ 1.156.286,10	98,04%
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 130.582,36	$ 0,00	10,20	$ 1.331.940,07	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.305.823,60	10,00	$ 1.305.823,60	98,04%
1.11	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	7.498,40	$ 2.358,00	$ 17.681.227,00	10.657,68	$ 25.130.809,44	0,00	$ 0,00	10.508,85	$ 24.779.868,30	10.508,85	$ 24.779.868,30	98,60%
1.12	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	55.868,80	$ 2.031,00	$ 113.469.533,00	53.409,24	$ 108.474.166,44	24.506,93	$ 49.773.574,83	28.835,39	$ 58.564.677,09	53.342,32	$ 108.338.251,92	99,87%
NP 4	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	0,00	$ 4.405.289,75	$ 0,00	4,00	$ 17.621.159,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 17.621.159,00	4,00	$ 17.621.159,00	100,00%
NP 5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	0,00	$ 2.422.031,54	$ 0,00	3,00	$ 7.266.094,62	0,00	$ 0,00	3,00	$ 7.266.094,62	3,00	$ 7.266.094,62	100,00%
NP 6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	0,00	$ 34.916,34	$ 0,00	64,76	$ 2.261.182,18	0,00	$ 0,00	59,96	$ 2.093.583,75	59,96	$ 2.093.583,75	92,59%
NP 7	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,00	$ 21.861,94	$ 0,00	470,60	$ 10.288.228,96	0,00	$ 0,00	440,26	$ 9.624.937,70	440,26	$ 9.624.937,70	93,55%
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 184.002,56	$ 0,00	14,00	$ 2.576.035,84	0,00	$ 0,00	10,30	$ 1.895.226,37	10,30	$ 1.895.226,37	73,57%
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 378.630,53	$ 0,00	6,89	$ 2.608.764,35	0,00	$ 0,00	5,24	$ 1.984.023,98	5,24	$ 1.984.023,98	76,05%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 109.406,05	$ 0,00	40,65	$ 4.447.355,93	0,00	$ 0,00	39,15	$ 4.283.246,86	39,15	$ 4.283.246,86	96,31%
NP 11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 75.849,79	$ 0,00	27,83	$ 2.110.899,66	0,00	$ 0,00	27,66	$ 2.098.005,19	27,66	$ 2.098.005,19	99,39%
NP 12	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	0,00	$ 314.659,55	$ 0,00	17,12	$ 5.386.971,50	0,00	$ 0,00	15,20	$ 4.782.825,16	15,20	$ 4.782.825,16	88,79%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	002	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	30/08/2024 a 15/05/2025
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 37.096.897.423,16	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 1.026.101.330,91
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	APOYO A LA SUPERVISION:	VIVIANA DEL PILAR VALDES DIAZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	252/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	6/09/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	jueves, 15 de mayo de 2025

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 13	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	M3	0,00	$ 140.525,57	$ 0,00	24,73	$ 3.475.197,35	0,00	$ 0,00	9,81	$ 1.378.555,84	9,81	$ 1.378.555,84	39,67%
NP 14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	0,00	$ 711.372,51	$ 0,00	3,00	$ 2.134.117,53	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 631.754.926,00		$ 953.280.862,91		$ 328.654.911,86		$ 579.010.456,43		$ 907.665.368,29	
2	SEÑALIZACIÓN VIAL													
5.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	700,00	$ 5.189,00	$ 3.632.300,00	700,00	$ 3.632.300,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	414,00	$ 34.918,00	$ 14.456.052,00	414,00	$ 14.456.052,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	9,00	$ 386.161,00	$ 3.475.449,00	9,00	$ 3.475.449,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 21.563.801,00		$ 21.563.801,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	COSTO TOTAL PROYECTO				$ 653.318.727,00		$ 974.844.663,91		$ 328.654.911,86		$ 579.010.456,43		$ 907.665.368,29	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 498.716.585,50		$ 744.156.231,99		$ 250.881.612,11		$ 441.992.714,83		$ 692.874.326,94	
	ADMINISTRACIÓN 26,00%				$ 129.666.312,23		$ 193.480.620,32		$ 65.229.219,15		$ 114.918.105,86		$ 180.147.325,00	
	IMPREVISTOS 1,00%				$ 4.987.165,85		$ 7.441.562,32		$ 2.508.816,12		$ 4.419.927,15		$ 6.928.743,27	
	UTILIDAD 4,00%				$ 19.948.663,42		$ 29.766.249,28		$ 10.035.264,48	32,03%	$ 17.679.708,59	57,43%	$ 27.714.973,08	89,46%
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 154.602.141,50		$ 230.688.431,92		$ 77.773.299,75		$ 137.017.741,60		$ 214.791.041,35	
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				$ 30.754.000,00		$ 51.256.667,00		$ -		$ 10.251.333,33		$ 10.251.333,33	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 684.072.727,00		$ 1.026.101.330,91		$ 328.654.911,86		$ 589.261.789,76		$ 917.916.701,62	

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL		$ 342.028.603,91
VALOR TOTAL		$ 1.026.101.330,91
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 1.026.101.330,91
ANTICIPO	20%	$ 136.814.545,40
ANTICIPO ADICION	20%	$ 68.405.720,78
PRESENTE ACTA		$ 589.261.789,76
ACUMULADO		$ 917.916.701,62

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$ 328.654.911,86	$ 65.730.982,37	$ 262.923.929,49
PRESENTE ACTA	$ 589.261.789,76	$ 117.852.357,95	$ 471.409.431,81
TOTALES	$ 917.916.701,62	$ 183.583.340,32	$ 734.333.361,30

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 917.916.701,62	89,46
POR EJECUTAR	$ 108.184.629,29	15,81
POR AMORTIZAR	$ 21.636.925,86	15,81
TOTALES	$ 1.026.101.330,91	100,00

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500304 (Registro Presupuestal No. 1239 de 29 de Diciembre de 2022)					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 136.814.545,40			$ 136.814.545,40
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ 328.654.911,86	$ 65.730.982,37	$ 262.923.929,49	$ 399.738.474,89

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500304 (Registro Presupuestal No. 1038 y 1039 de 2024)					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO ADICION	$ 68.405.720,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.405.720,78
2	PRESENTE ACTA	$ 589.261.789,76	$ 117.852.357,95	$ 471.409.431,81	$ 539.815.152,59

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500304 (Registro Presupuestal No. 1239 de 2022, No 1038 y 1039 de 2024)					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 136.814.545,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.814.545,40
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ 328.654.911,86	$ 65.730.982,37	$ 262.923.929,49	$ 399.738.474,89

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500304
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	002	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	30/08/2024 a 15/05/2025
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 37.096.897.423,16	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 1.026.101.330,91
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	VIVIANA DEL PILAR VALDES DIAZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	252/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	6/09/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	Jueves, 15 de mayo de 2025

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024			OBRA EJECUTADA					
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR %
							ANTICIPO ADICION		$ 68.405.720,78		$ 0,00		$ 0,00 $ 468.144.195,67
						2	PRESENTE ACTA		$ 589.261.789,76		$ 117.852.357,95		$ 471.409.431,81 $ 939.553.627,48
						3	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		$ 108.184.629,29		$ 21.636.925,86		$ 86.547.703,43 $ 1.026.101.330,91

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVO M/CTE

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 identificado con el NIT 901.665.253-9 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N° 774 de 2022 representado legalmente por el CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha ____ NO X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: Jueves, 15 de mayo de 2025

Firma:
Nombre: YECID MAURICO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202 - 096145 CDN

Firma:
Nombre: DELIA LISETH TRIANA AVILA
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 283729-T

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-100820 CND

Firma:
Nombre: SANDRA VIVIANA CALDERON NARANJO
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 188009-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

2952

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2	**DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0.15M)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+050 AL K0+150	10,70	0,20	86,00		184,04
PASAN:				**SUBTOTAL**	184,04
				TOTAL	**184,04**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2953

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,3	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	VOLUMEN DEMOLICION	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 COSTADO DERECHO E IZQUIERDA K0+000 AL K0+170	SEGÚN CARTERA TOPOGRAFICA		72,13	46,88	25,25
FALLOS	**ANCHO**	**ALTO**	**LONGITUD**		
FALLO CALLE 5 ENTRE CARRERA 17 Y 18	4,70	0,80	22,56		84,83
PASAN:				**SUBTOTAL**	110,08
				TOTAL	**110,08**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2954

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
	RELACION CARTERA TOPOGRAFICA	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	VOLUMEN DEMOLICION	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 COSTADO DERECHO E IZQUIERDA K0+000 AL K0+170	SEGÚN CARTERA TOPOGRAFICA MDF N° 2		1.698,80	-379,12	1.319,68
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 COSTADO DERECHO E IZQUIERDA K0+000 AL K0+170	SEGÚN CARTERA TOPOGRAFICA ACTA PARCIAL N° 1		1626,67	-332,24	1.294,43
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 COSTADO DERECHO E IZQUIERDA K0+000 AL K0+171	SEGÚN CARTERA TOPOGRAFICA ACTA PARCIAL N° 2		72,13	-46,88	25,25

Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CDN

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2955

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META

ACTA DE MODIFICACION N° 2

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE RELLENO Y MATERIALES **CALLE5 ENTRE CRA 17 Y 18 COSTADO DERE**

ABSCISA	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
0				
	CORTE	5,11	0	0
5				
	CORTE	6,54	29,11	29,11
8,6				
	CORTE	6,39	23,28	52,4
10				
	CORTE	5,23	8,13	60,52
15				
	CORTE	4,89	25,3	85,82
20				
	CORTE	4,94	24,57	110,39
25				
	CORTE	5,02	24,9	135,29
30				
	CORTE	5,1	25,32	160,61
35				
	CORTE	5,17	25,69	186,29
40				
	CORTE	4,92	25,23	211,53
45				
	CORTE	4,32	23,1	234,63
49,97				
	CORTE	4,72	22,44	257,07
50				
	CORTE	4,62	0,15	257,22
55				
	CORTE	4,67	23,23	280,45
60				
	CORTE	4,64	23,28	303,72
65				
	CORTE	4,6	23,09	326,82
70				
	CORTE	4,58	22,95	349,77
75				
	CORTE	4,59	22,93	372,7
80				
	CORTE	4,53	22,8	395,5
85				
	CORTE	5,06	23,98	419,48
89,857				
	CORTE	6,12	27,16	446,64
90				
	CORTE	6,09	0,9	447,53
95				
	CORTE	4,58	26,67	474,2

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META

ACTA DE MODIFICACION N° 2

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE RELLENO Y MATERIALES **CALLE5 ENTRE CRA 17 Y 18 COSTADO DERE**

ABSCISA	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
100				
	CORTE	4,4	22,45	496,66
105				
	CORTE	4,5	22,24	518,9
110				
	CORTE	4,65	22,86	541,76
115				
	CORTE	4,58	23,08	564,85
120				
	CORTE	4,68	23,15	587,99
125				
	CORTE	4,83	23,77	611,76
130				
	CORTE	4,71	23,86	635,63
135				
	CORTE	4,68	23,48	659,11
140				
	CORTE	4,6	23,20	682,31
145				
	CORTE	4,78	23,45	705,76
150				
	CORTE	4,69	23,68	729,43
155				
	CORTE	4,92	24,03	753,46
160				
	CORTE	4,86	24,45	777,91
165				
	CORTE	4,75	24,03	801,93
170				
	CORTE	4,85	24,00	849,39

JADER FRANDEY ENCISO REYES
M.P. 01-13410 CPNT
TOPOGRAFO

DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN
M.P. 01-13350 CPNT
TOPOGRAFO INTERVENTORIA

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2957

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META

ACTA DE MODIFICACION N° 2

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE RELLENO Y MATERIALES — **CALLE5 ENTRE CRA 17 Y 18 COSTADO IZQ**

ABSCISA	Area Type	Area Sq.m.	Inc.Vol. Cu.m.	Cum.Vol. Cu.m.
0				
	CORTE	4,86	0	0
5				
	CORTE	5,07	24,81	24,81
10				
	CORTE	4,99	25,15	49,96
15				
	CORTE	5,03	25,05	75,01
20				
	CORTE	4,79	24,54	99,55
25				
	CORTE	4,77	23,89	123,43
30				
	CORTE	4,89	24,13	147,56
35				
	CORTE	4,69	23,94	171,5
40				
	CORTE	4,59	23,19	194,69
45				
	CORTE	4,39	22,44	217,14
49,88				
	CORTE	4,67	22,12	239,26
50				
	CORTE	4,67	0,52	239,78
55				
	CORTE	4,68	23,38	263,17
60				
	CORTE	4,81	23,74	286,9
65				
	CORTE	4,94	24,38	311,28
70				
	CORTE	4,89	24,59	335,87
75				
	CORTE	4,73	24,06	359,93
80				
	CORTE	4,6	23,32	383,25
85				
	CORTE	5,03	24,07	407,32
89,72				
	CORTE	5,8	25,58	432,9
90				
	CORTE	5,74	1,58	434,48
95				
	CORTE	5,08	27,06	461,55

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2080

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META

ACTA DE MODIFICACION N° 2

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE RELLENO Y MATERIALES **CALLE5 ENTRE CRA 17 Y 18 COSTADO IZQ**

ABSCISA	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
100				
	CORTE	4,69	24,44	485,98
105				
	CORTE	4,71	23,5	509,48
110				
	CORTE	4,73	23,61	533,09
115				
	CORTE	4,84	23,93	557,03
120				
	CORTE	4,8	24,1	581,13
125				
	CORTE	4,63	23,58	604,71
130				
	CORTE	4,72	23,39	628,09
135				
	CORTE	4,7	23,55	651,64
140				
	CORTE	4,65	23,36	675
145				
	CORTE	4,69	23,35	698,34
150				
	CORTE	4,75	23,61	721,96
155				
	CORTE	4,85	24	745,96
160				
	CORTE	4,64	23,73	769,69
165				
	CORTE	5,48	25,30	794,99
170				
	CORTE	5,45	27,33	849,41

JADER FRANDEY ENCISO REYES
M.P. 01-13410 CPNT
TOPOGRAFO

DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN
M.P. 01-13350 CPNT
TOPOGRAFO INTERVENTORIA

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META

ACTA PARCIAL 1

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE — **CALLE5 ENTRE CRA 17 Y 18 COSTADO DERE**

ABSCISA	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
0				
	CORTE	5.11	0	0
5				
	CORTE	6.54	29.11	29.11
8.6				
	CORTE	6.39	23.28	52.4
10				
	CORTE	5.23	8.13	60.52
15				
	CORTE	4.89	25.3	85.82
20				
	CORTE	4.94	24.57	110.39
25				
	CORTE	5.02	24.9	135.29
30				
	CORTE	5.1	25.32	160.61
35				
	CORTE	5.17	25.69	186.29
40				
	CORTE	4.92	25.23	211.53
45				
	CORTE	4.32	23.1	234.63
49.97				
	CORTE	4.72	22.44	257.07
50				
	CORTE	4.62	0.15	257.22
55				
	CORTE	4.67	23.23	280.45
60				
	CORTE	4.64	23.28	303.72
65				
	CORTE	4.6	23.09	326.82
70				
	CORTE	4.58	22.95	349.77
75				
	CORTE	4.59	22.93	372.7
80				
	CORTE	4.53	22.8	395.5
85				
	CORTE	5.06	23.98	419.48
89.857				
	CORTE	6.12	27.16	446.64
90				
	CORTE	6.09	0.9	447.53
95				
	CORTE	4.58	26.67	474.2

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META

ACTA PARCIAL 1

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE — CALLES ENTRE CRA 17 Y 18 COSTADO DERE

ABSCISA	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
100				
	CORTE	4.4	22.45	496.66
105				
	CORTE	4.5	22.24	518.9
110				
	CORTE	4.65	22.86	541.76
115				
	CORTE	4.58	23.08	564.85
120				
	CORTE	4.68	23.15	587.99
125				
	CORTE	4.83	23.77	611.76
130				
	CORTE	4.71	23.86	635.63
135				
	CORTE	4.68	23.48	659.11
140				
	CORTE	4.6	23.20	682.31
145				
	CORTE	4.78	23.45	705.76
150				
	CORTE	4.69	23.68	729.43
155				
	CORTE	4.92	24.03	753.46
160				
	CORTE	3.86	21.95	775.41
165				
	CORTE	3.75	19.03	794.43
170				
	CORTE	3.81	18.90	813.33

JADER FRANDEY ENCISO REYES
M.P. 01-13410 CPNT
TOPOGRAFO

DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN
M.P. 01-13350 CPNT
TOPOGRAFO INTERVENTORIA

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

4460

2961

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META

ACTA DE MODIFICACION

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE RELLENO Y MATERIALES — CALLE5 ENTRE CRA 17 Y 18 COSTADO IZQ

ABSCISA	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
0				
	CORTE	4.86	0	0
5				
	CORTE	5.07	24.81	24.81
10				
	CORTE	4.99	25.15	49.96
15				
	CORTE	5.03	25.05	75.01
20				
	CORTE	4.79	24.54	99.55
25				
	CORTE	4.77	23.89	123.43
30				
	CORTE	4.89	24.13	147.56
35				
	CORTE	4.69	23.94	171.5
40				
	CORTE	4.59	23.19	194.69
45				
	CORTE	4.39	22.44	217.14
49.88				
	CORTE	4.67	22.12	239.26
50				
	CORTE	4.67	0.52	239.78
55				
	CORTE	4.68	23.38	263.17
60				
	CORTE	4.81	23.74	286.9
65				
	CORTE	4.94	24.38	311.28
70				
	CORTE	4.89	24.59	335.87
75				
	CORTE	4.73	24.06	359.93
80				
	CORTE	4.6	23.32	383.25
85				
	CORTE	5.03	24.07	407.32
89.72				
	CORTE	5.8	25.58	432.9
90				
	CORTE	5.74	1.58	434.48
95				
	CORTE	5.08	27.06	461.55

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

4457

2962

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA - META

ACTA DE MODIFICACION

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE RELLENO Y MATERIALES — CALLES ENTRE CRA 17 Y 18 COSTADO IZQ

ABSCISA	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
100				
	CORTE	4.69	24.44	485.98
105				
	CORTE	4.71	23.5	509.48
110				
	CORTE	4.73	23.61	533.09
115				
	CORTE	4.84	23.93	557.03
120				
	CORTE	4.8	24.1	581.13
125				
	CORTE	4.63	23.58	604.71
130				
	CORTE	4.72	23.39	628.09
135				
	CORTE	4.78	23.55	651.64
140				
	CORTE	4.79	23.93	675.57
145				
	CORTE	4.79	23.95	699.52
150				
	CORTE	4.75	23.85	723.37
155				
	CORTE	4.85	24.00	747.37
160				
	CORTE	4.84	24.23	771.59
165				
	CORTE	3.96	22.00	793.59
170				
	CORTE	3.94	19.75	813.34

JADER FRANDEY ENCISO REYES
M.P. 01-13410 CPNT
TOPOGRAFO

DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN
M.P. 01-13350 CPNT
TOPOGRAFO INTERVENTORIA

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

458

7963

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA



Nombre: JADER FRANDEY ENCISO REYES

Cédula: **1.121.835.109**

Licencia Profesional No: **01-13410**

De fecha: **28/10/2011**

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA

R 02-3411 Presidente

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía

Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694

http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: Info@cpnt.gov.co

2968

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 536160/2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JADER FRANDEY ENCISO REYES** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1121835109** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-13410** con fecha de expedición del **28 de Octubre de 2011.**

Que el(la) Señor(a) **JADER FRANDEY ENCISO REYES**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-13410** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **3 días del mes de Abril de 2025.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

2963

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981.

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía
Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694
http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: info@cpnt.gov.co

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Nombre: DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN

Cédula: 1.022.926.959



Licencia Profesional No: 01-13350

Resolución: 02-3351 - 30/09/2011

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA

Presidente

2966

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 536166/2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1022926959** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-13350** con fecha de expedición del **30 de Septiembre de 2011.**

Que el(la) Señor(a) **DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN,** tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-13350** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **3 días del mes de Abril de 2025.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**		
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,4	**TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**	**VJ**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	VIAJE M3	**EXPANSION**	**VOLUMEN**	**VOLUMEN TOTAL**	**TOTAL**
EXCAVACIÓN MECANICA (1,3)	7,00	1,30	351,05	456,37	65,20
DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (NP 9)	7,00	1,30	5,24	6,81	0,97
DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (1,2)	7,00	1,30	338,66	440,26	62,89
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (NP 12)	7,00	1,30	15,20	19,76	2,82
EXCAVACIÓN MANUAL (NP 11)	7,00	1,30	27,66	35,96	5,14
DESCUENTO EXCAVACIÓN MANUAL	7,00	1,30	-58,61	-76,19	-10,88
PASAN:				**SUBTOTAL**	126,14
				TOTAL	**126,14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2960

	OFICIO	CÓDIGO: IF-IC-F-01 VERSIÓN: 01 FECHA: OCTUBRE DE 2019 PÁGINA: 1 DE 1

ASCG. 100.12.01.196
San Carlos de Guaroa, 21 febrero de 2024.

SEÑOR
YECID MAURICIO REINA BRAVO
Represente Legal
CONSORCIO INTERVIAS URBANAS 2022
ingeviasurbanas2022@gmail.com

REF: Respuesta solicitud de disposición final del material sobrante proveniente de la excavación.

En consideración al asunto en referencia, le indicamos que el predio habilitado para disposición es el denominado **Villa Aurora**, predio propiedad del municipio.



Cordialmente,

JEFFERSON GABRIEL CORTES PIÑEROS
Secretario de Planeación.

Proyectó:
Nombre: José Gabriel Collazos

Aprobó:
Nombre: Jefferson Gabriel Cortes.

Powered by CamScanner

2969

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,5	**RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	LARGO	AREA VIA	AERA SEPARADOR	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQUIERDA) K0+000 AL K0+050			262,10		262,10
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (DERECHA) K0+000 AL K0+050			252,70		252,70
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+050 AL K0+170	10,30	120,00	1236,00		1236,00
			CANTIDAD	AREA	
DESCUENTO POZOS (NP 5)			-3,00	2,01	-6,03
DESCUENTO SUMIDEROS (NP 4)			-4,00	1,96	-7,84
PASAN:				**SUBTOTAL**	1.736,93
				TOTAL	**1.736,93**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2400

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
ACTA:	PAGO PARCIAL N° 2		
CAPITULO:	CAPA ASFALTICA		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
1,6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.		M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO	ALTO	AREA VIA	AERA SEPARADOR	TOTAL	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQUIERDA) K0+000 AL K0+050		0,10	262,10		262,10	26,21
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (DERECHA) K0+000 AL K0+050		0,10	252,70		252,70	25,27
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+050 AL K0+170		0,10	1236,00		1236,00	123,60
			CANTIDAD	AREA		
DESCUENTO POZOS (NP 5)		0,10	-3,00	2,01	-6,03	-0,60
DESCUENTO SUMIDEROS (NP 4)		0,10	-4,00	1,96	-7,84	-0,78
PASAN:					SUBTOTAL	173,70
					TOTAL	173,70

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2921

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,7	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO,**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**VOLUMEN**	**VOLUMEN DEMOLICION**	**TOTAL**
FALLO CALLE 5 ENTRE CARRERA 17 Y 18	4,70	0,80	22,56		84,83
PASAN:				**SUBTOTAL**	84,83
				TOTAL	**84,83**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7972

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
ACTA:	PAGO PARCIAL N° 2		
CAPITULO:	CAPA ASFALTICA		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,8	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					
	ANCHO	ALTO	AREA VIA	CANTIDAD	AREA	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQUIERDA) K0+000 AL K0+050		0,20	262,10			52,42
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (DERECHA) K0+000 AL K0+050		0,20	252,70			50,54
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+050 AL K0+170		0,20	1236,00			247,20
INTERSECCION		0,20	23,06			4,61
DESCUENTO POZOS (NP 5)		0,20		-3,00	2,01	-1,21
DESCUENTO SUMIDEROS (NP 4)		0,20		-4,00	1,96	-1,57
PASAN:					SUBTOTAL	351,99
					TOTAL	351,99

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3913

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
ACTA:	PAGO PARCIAL N° 2		
CAPITULO:	CAPA ASFALTICA		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,9	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
NTERSECCION K0+008	8,70	0,15	2,58		3,36
K0+00 A K0+50 IZQ	50,00	0,15	5,49		41,17
K0+00 A K0+50 DER	50,00	0,15	5,02		37,65
K0+050 A K0+170	120,00	0,15	10,70		192,60
			AREA		
DESCUENTO POZOS (NP 5)		0,35	2,01	-3,00	-2,11
DESCUENTO SUMIDEROS (NP 4)		0,35	1,96	-4,00	-2,74
PASAN:				SUBTOTAL	269,93
				TOTAL	269,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2024

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 1	**SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**	**ML**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	PARIMETRO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+000 AL K0+170			185,88		185,88
SEPARADOR		84,84			84,84
PASAN:				**SUBTOTAL**	270,72
				TOTAL	**270,72**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2025

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 2	**BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**	**ML**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	PARIMETRO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+000 AL K0+170			10,00		10,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10,00
				TOTAL	**10,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2026

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3	**BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO**	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	PARIMETRO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+000 AL K0+170			10,00		10,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10,00
				TOTAL	**10,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

9122

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.11	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DISTANCIA	ALTO	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+000 AL K0+170	60,50		173,70		10.508,85
PASAN:				**SUBTOTAL**	10.508,85
				TOTAL	**10.508,85**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2930

Villavicencio, Mayo 15 de 2025

CERTIFICADO

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTERVIAL META**, en virtud del contrato No.**143 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**. Bajo el contrato No. **774 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto **"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META",** con código BPIN **2021005500304**:

Que el asfalto a utilizar en las actividades del proyecto corresponde específicamente de la **PLANTA TRITURADOS & TRITURADOS LTDA**, situada en el municipio de Castilla La Nueva. Esta Planta es la más cercana al proyecto mencionado aprobada por contar con el material con las características técnicas para este suministro.

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la Planta.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los quince (15) días del mes de Mayo de 2025.

Atentamente,

Ing. **DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B.**
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL META 2022
Contrato de Interventoría No. 143 de 2023

Arq. **YECID MAURICIO REINA BRAVO**
Representante Legal
CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Contrato de Obra No. 774 de 2022



CALLE 19 # 41 – 39, VILLAVICENCIO - Meta

+(57) 608 663 27 59 +(57) 313 243 93 32 / cintervialmeta@gmail.com

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.12	**TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR**	**M3/KM**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DISTANCIA	**ALTO**	**VOLUMEN**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MATERIAL 3" PARA FALLOS	40,80		84,83		3.461,06
MATERIAL SUB BASE GRANULAR	40,80		269,93		11.013,14
MATERIAL BASE GRANULAR	40,80		351,99		14.361,19
PASAN:				**SUBTOTAL**	28835,39
				TOTAL	**28.835,39**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2021

Villavicencio, Mayo 15 de 2024

CERTIFICADO

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTERVIAL META**, en virtud del contrato No.**143 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**. Bajo el contrato No. **774 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto **"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META",** con código BPIN **2021005500304**:

Que la fuente de material utilizada en las actividades del proyecto corresponde al Rio Guayuriba, específicamente de la cantera **Arrecife,** situada en el municipio de Villavicencio. Esta fuente es la más cercana al proyecto mencionado aprobada por contar con el material con las características técnicas para este suministro de material pétreo.


Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la fuente de material.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los quince (15) días del mes de Mayo de 2025.

Atentamente,

Ing. **DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B.**
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL META 2022
Contrato de Interventoría No. 143 de 2023

Arq. **YECID MAURICIO REINA BRAVO**
Representante Legal
CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Contrato de Obra No. 774 de 2022

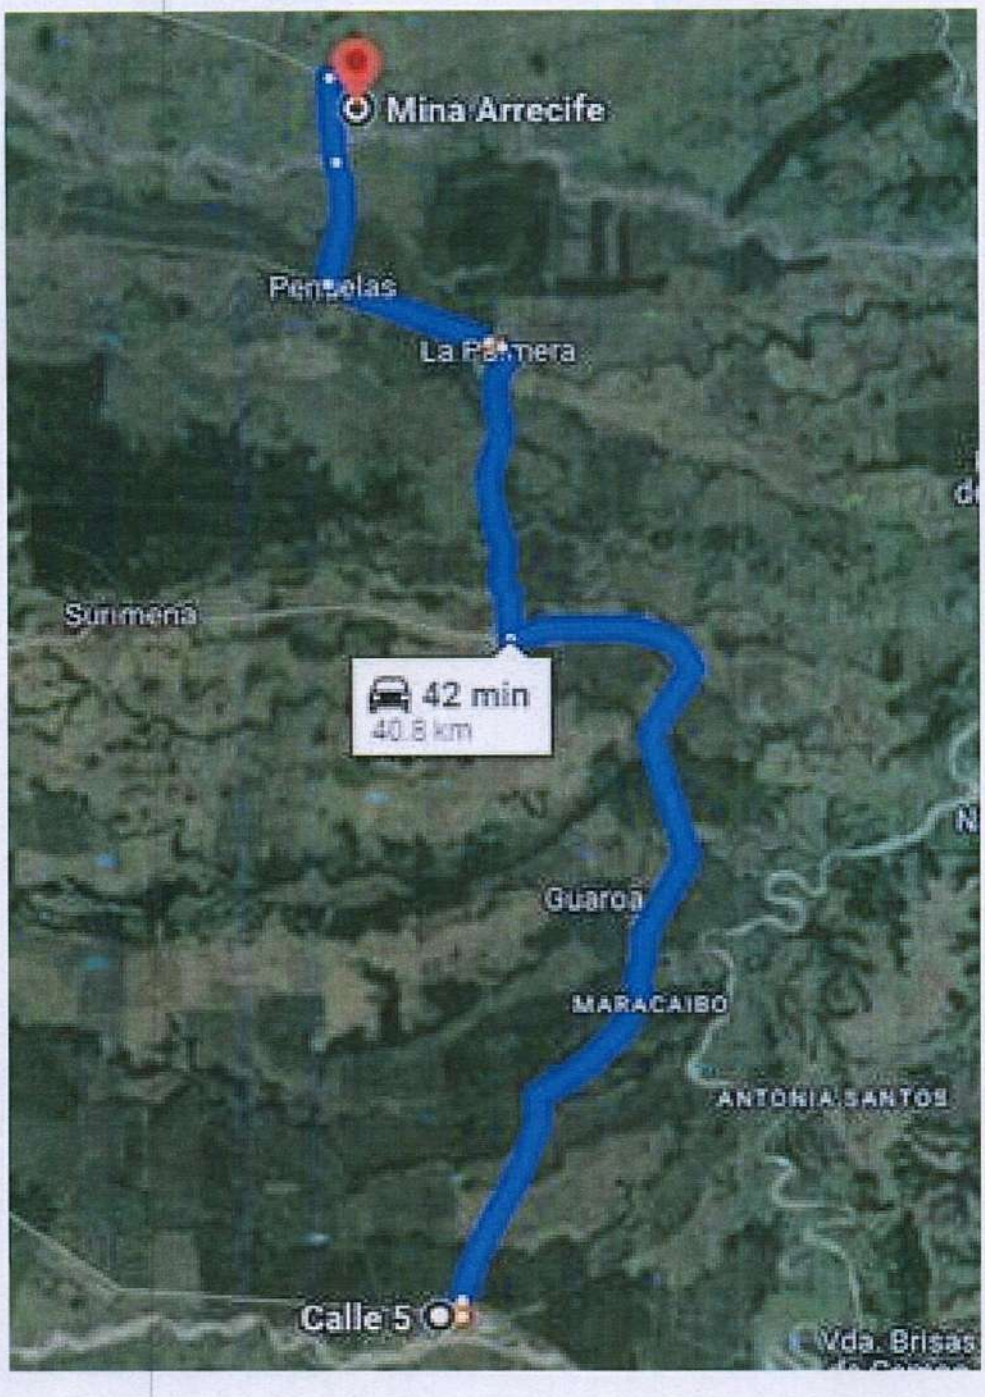

CALLE 19 # 41 – 39, VILLAVICENCIO - Meta

+(57) 608 663 27 59 +(57) 313 243 93 32 / cintervialmeta@gmail.com

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 4	**SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"**	**ML**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQUIERDA) K0+000 AL K0+170			2,00		2,00
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (DERECHA) K0+000 AL K0+170			2,00		2,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	4,00
				TOTAL	**4,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+000 AL K0+170			3,00		3,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3,00
				TOTAL	**3,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 6	**RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD PERIMETRO**	**AREA**	**TOTAL**
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+000 AL K0+170	0,20	0,50	292,00		29,20
SEPARADOR		0,50		61,52	30,76
PASAN:				**SUBTOTAL**	59,96
				TOTAL	**59,96**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 7	**CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**EXPANSION**	**VOLUMEN**	**AREA**	**TOTAL**
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+050 AL K0+150		1,30	338,66		440,26
PASAN:				**SUBTOTAL**	440,26
				TOTAL	**440,26**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3983

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		
ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**		
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**		
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
NP 8	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE**		**ML**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	EXPANSION	LONGITUD	AREA	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQUIERDA) K0+000 AL K0+170			7,30	1,00	7,30
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (DERECHA) K0+000 AL K0+170			3,00	1,00	3,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	10,30
				TOTAL	**10,30**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

3900

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	AREA EXTERNA	AREA AINTERNA	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL
PLACAS CUBIERTAS AVERIDAS	1,60	0,63	0,20	3,00	1,02
SUMIDEROS DERECHA IZQUIERA	1,96	1,00	1,00	2,00	1,92
PLACA SUMIDERO	1,96		0,20	2,00	0,78
CAJA DE INSPECCION	1,00	0,49	0,80	3,00	1,22
PLACA CAJA DE INSPECCION	1,00		0,10	3,00	0,30
PASAN:				SUBTOTAL	5,24
				TOTAL	5,24

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CDN

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2429

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 10	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE**	**ML**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	AREA EXTERNA	**AREA AINTERNA**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DOMICILIARIA COSTADO DERECHO ABCISA 5 - 10 - 30			11,05	1,00	11,05
			11,10	1,00	11,10
			10,60	1,00	10,60
DOMICILIARIA COSTADO IZQIERDO			3,00	1,00	3,00
			3,40	1,00	3,40
PASAN:				**SUBTOTAL**	39,15
				TOTAL	**39,15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 11	**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TUBERIA DE 6" COSTADO IZQUIERDO (NP 10)	0,45	1,20	32,75		17,69
TUBERIA 10"	0,55	1,10	10,30	1,00	6,23
SUMIDEROS EXISTENTE	0,25	0,65	7,00	2,00	2,28
SUMIDEROS NUEVOS	1,50	0,65	1,50	1,00	1,46
PASAN:				**SUBTOTAL**	27,66
				TOTAL	**27,66**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2991

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 12	**DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18 (IZQ - DER) K0+150 AL K0+170	9,50	0,08	20,00		15,20
PASAN:				**SUBTOTAL**	15,20
				TOTAL	**15,20**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0992

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N° 2**
CAPITULO:	**CAPA ASFALTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 13	**CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
TUBERIA 6" (NP 10)	0,45	0,45	39,15		7,93
DESCUENTO TUBERIA 6"			39,15	-0,0182	-0,71
TUBERIA 10" (NP 8)	0,55	0,55	10,30		3,12
DESCUENTO TUBERIA 10"			10,30	-0,0510	-0,53
PASAN:				**SUBTOTAL**	9,81
				TOTAL	**9,81**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 096145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037 - 0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2193

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

ACTA PAGO DEL PMT

112-ECP-FR-029

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

2994

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

ACTA PAGO DE OBRA
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)
112-ECP-FR-029-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021065500304
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	2	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	30/08/2024 a 15/05/2025
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 37.096.897.423,16	**VALOR TOTAL DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO:**	$ 51.256.667,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	interviametal@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	VIVIANA DEL PILAR VALDES DIAZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	interviametal@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	252/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	5/09/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	jueves, 15 de mayo de 2025

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024			OBRA EJECUTADA						
												ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
A	PERSONAL PROFESIONAL																	
	PERFIL	CATEGORIA	CARGO	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACIÓN (hombre - mes)	TIEMPO (MESES)	SALARIOS	VALOR TOTAL	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO (MESES)	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
C	PERSONAL AUXILIAR																	
1,0	AYUDANTE	1,00	AUXILIAR DE TRANSITO	2,00	100,00%	3,00	1.578.000,00	$ 9.468.000,00	1,00	5,00	$ 7.890.000,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.578.000,00	1,00	$ 1.578.000,00	20,00%
D	SUBTOTAL PERSONAL (A + B+ C)							$ 9.468.000,00			$ 7.890.000,00		$ 0,00		$ 1.578.000,00		$ 1.578.000,00	
E	FACTOR MULTIPLICADOR							2,40			2,40		2,4		2,4		2,4	
F	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (D * E)							$ 22.723.200,00			$ 18.936.000,00		$ 0,00		$ 3.787.200,00		$ 3.787.200,00	
G	COSTOS DIRECTOS																	
N° ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMPO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	VALOR TOTAL	TIEMPO (MESES)	VALOR TOTAL	TIEMPO (MESES)	VALOR TOTAL	TIEMPO (MESES)	VALOR TOTAL	%
1	SEÑALIZACIÓN	Señal Informativa Obra SIO-02	UN	2,00	100%		$ 253.272,00	$ 506.544,00	2,00	5	$ 2.532.720,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 506.544,00	1,00	$ 506.544,00	20,00%
2	SEÑALIZACIÓN	Señal Informativa Obra SIO-03	UN	2,00	100%		$ 253.272,00	$ 506.544,00	2,00	5	$ 2.532.720,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 506.544,00	1,00	$ 506.544,00	20,00%
3	SEÑALIZACIÓN	Señal preventiva Obra SPO-02	UN	2,00	100%		$ 253.272,00	$ 506.544,00	2,00	5	$ 2.532.720,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 506.544,00	1,00	$ 506.544,00	20,00%
	SEÑALIZACIÓN	Hito de 75 cm de altura y 7,05 cm de diametro con reflectivos. Base de 19 cm de diametro	UN	10,00	100%		$ 42.397,73	$ 423.977,30										
4	SEÑALIZACIÓN	Cinta señalización	ML				$ 1.900,00		121,19	5	$ 1.151.315,80	0,00	$ 0,00	1,00	$ 230.263,16	1,00	$ 230.263,16	20,00%
5	SEÑALIZACIÓN	Barrera plastica de aproximación (Maletines)	UN	2,00	100%		$ 588.812,67	$ 1.177.625,33	4,00	5	$ 11.776.253,30	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.355.250,66	1,00	$ 2.355.250,66	20,00%
6	SEÑALIZACIÓN	Colombinas - delineadores viales	UN				$ 48.148,00		15,00	5	$ 3.611.100,00		$ 0,00	1,00	$ 722.220,00	1,00	$ 722.220,00	20,00%
H	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							$ 3.121.234,63			$ 24.136.829,10	0,00%	$ 0,00	20,00%	$ 4.827.365,82		$ 4.827.365,82	20,00%
I	VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (F + H)							$ 25.844.434,63			$ 43.072.829,10		$ 0,00		$ 8.614.565,82		$ 8.614.565,82	
J	IVA SOBRE (I)							$ 4.910.442,58			$ 8.183.837,53		$ 0,00		$ 1.636.767,51		$ 1.636.767,51	
	VALOR TOTAL PMT MES							$ 30.754.877,21			$ 51.256.667,00		$ 0,00		$ 10.251.333,33		$ 10.251.333,33	

1905

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500304
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	2	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	30/08/2024 a 15/05/2025
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 37.096.897.423,16	**VALOR TOTAL DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO:**	$ 51.256.667,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	gerencia@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	VIVIANA DEL PILAR VALDES DIAZ
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	gerencia@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	252/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	6/09/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	jueves, 15 de mayo de 2025

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 10.251.333,33	20,00
POR EJECUTAR	$ 41.005.333,67	80,00
TOTALES	$ 51.256.667,00	100,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: **jueves, 15 de mayo de 2025**

Firma:
Nombre: YECID MAURICO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020 96145 CND

Firma:
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

MEMORIA DE CALCULO DEL PMT

112-ECP-FR-027

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

2997

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N°2**
CAPITULO:	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,0	AUXILIAR DE TRANSITO	mes

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	TIEMPO (MESES)	CANTIDAD	TOTAL
Mes de marzo 2024			1,00		1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020 96145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2498

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N°2**
CAPITULO:	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	**Señal Informativa Obra SIO-02**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	TIEMPO (MESES)	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18			1,00	2,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020 96145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N°2**
CAPITULO:	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2	**Señal Informativa Obra SIO-03**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	TIEMPO (MESES)	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18			1,00	2,00	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,00
				TOTAL	**1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020 96145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DESDE LA CALLE 9, 9A Y 10 ENTRE CRA 5 Y CRA 6A; CRA 5A ENTRE CALLE 9A Y 10, CRA 6 Y 6A ENTRE CALLE 9 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N°2**
CAPITULO:	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3	**Señal preventiva Obra SPO-02**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	TIEMPO (MESES)	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18			1,00	2,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020 96145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8001

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N°2**

CAPITULO:	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4	**Cinta señalización**	**ML**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	LONGITUD	**ALTO**	**TIEMPO (MESES)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18			1,00	121,19	1,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,00
				TOTAL	**1,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020 96145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0002

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N°2**
CAPITULO:	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5	**Barrera plastica de aproximación (Maletines)**	UN

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ALTO	TIEMPO (MESES)	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18			1,00	4,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020 96145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2003

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/06/2025
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**PAGO PARCIAL N°2**
CAPITULO:	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6	**Colombinas - delineadores viales**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ALTO	TIEMPO (MESES)	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 5 DESDE CRA 17 HASTA CRA 18			1,00	15,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 252020 96145 CND

Firma
Nombre: RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-100820 CND

Firma
Nombre: CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 091037-0593526 CND

Firma
Nombre: EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNANDEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202 - 119786 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8004

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

INFORME PARA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)

GOBERNACIÓN DEL **META**

AGENCIA PARA LA **INFRAESTRUCTURA** DEL **META**
NIT. 900220547-5

8005

INFORME DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT PARA PARCIAL No 2

PROYECTO No. 2021005500304

MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA



CONTRATO DE OBRA No. 774 de 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. *INFORMACION GENERAL* ____ 3
2. *LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO* ____ 5
3. *CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO* ____ 6
4. *ANTECEDENTES* ____ 8
5. *PRESUPUESTO* ____ 10
6. *SEÑALIZACION:* ____ 11
7. *REGISTRO FOTOGRAFICO* ____ 13
8. *RESUMEN FINANCIERO* ____ 16
9. *RELACION DE PERSONAL (AUXILIAR DE TRANSITO)* ____ 17
10. *CONCLUSIONES* ____ 17

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2007

1. INFORMACION GENERAL

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATO DE OBRA N°	774 DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL:	$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUALIZADO:	$37.096.897.423,16
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
CORREO ELECTRONICO:	ingeviasurbanas2022@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO:	cintervialmeta@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/08/2024
PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No.2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No.3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1:	2 MESES 1 DIA
FECHA DE REINICIO SUSPENSION N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06/06/2025
19 meses	23 días

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
FECHA DE PRORROGA No.1:	04/12/2023
TIEMPO DE PRORROGA No.1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	05/03/2024
FECHA DE PRORROGA No. 2:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
FECHA DE PRORROGA No. 3:	05/08/2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 3	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	30/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSION No.1:	3 MESES
FECHA DE REINICIO No.1:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA No. 4:	30/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 4	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
FECHA DE PRORROGA No. 5:	4/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

8609

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	5/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	6/06/2025
18 MESES	1 DIA

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El área donde se desarrollará el proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", se encuentra ubicado en el Departamento del Meta- Municipio de San Carlos de Guaroa, el cual hace parte de los Llanos orientales y se ubica a 89 kilómetros de la capital departamental

MUNICIPIO:	SAN CARLOS DE GUAROA	**VEREDA:**	-
CORREGIMIENTO:	-	**BARRIO:**	CABECERA MUNICIPAL
COMUNA:	-	**DEPARTAMENTO:**	META
COORDENADAS:	**3°42'40" Norte, 73°14'33" Oeste**		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO



Ilustración 1. Ubicación Municipio de San Carlos de Guaroa.

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2010

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

El proyecto consiste en mejorar vías urbanas con una longitud de 0.18 km que corresponde a la calle 5 Entre Carreras 17 Y 18 de la cabecera del municipio de San Carlos de Guaroa mediante la implementación técnica de una estructura definitiva corresponde a una convencional conformada por una capa de Mezcla asfáltica MDC-19, Base granular, Subbase granular con espesores de (8, 20 y 35) respectivamente, con elementos de señalización, que garanticen un tránsito cómodo para todos los usuarios del sector que se dirijan a través del casco urbano del municipio, garantizando un impacto positivo socioeconómico permitiendo el tránsito de cualquier tipo de vehículos. El proyecto contempla en sus actividades construir estructura de pavimento, instalar la capa de rodadura, interventoría y apoyo a la Supervisión.

El proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.", contempla en sus actividades a ejecutar obras preliminares, excavaciones, construcción de estructuras de pavimento, instalación la capa de rodadura y señalización.

Para el desarrollo del plan de manejo del tránsito en la zona de influencia de las obras se realizan las siguientes etapas:

- Conocimiento de las características de las obras.
- Identificación de las características generales de la zona de influencia de la obra.
- Toma de información básica requerida para elaborar el plan de manejo del tránsito.
- Diseño del plan de manejo del tránsito.
- Puesta en marcha del plan de manejo del tránsito.
- Supervisión del plan de manejo del tránsito

Los diferentes tipos de actividades que se requieren adelantar en la ejecución de las obras como son:

- ✓ Preliminares: Localización, trazado y replanteo topográfico vías.
- ✓ Excavaciones: Excavaciones mecánica para cajas vías, transporte retiro de material de demolición.
- ✓ Rellenos: Sub-Base granular y Base Granular, Relleno con material mixto de rio sin procesar tamaño Max. 3.
- ✓ Pavimentos: Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.
- ✓ Obras complementarias: Línea de demarcación vial con pintura acrílica en frio.
- ✓ Demarcación vial con pintura acrílica en frio, Señal vertical preventiva e Instalación de bordillo de pieza prefabricada de concreto tipo A-10 80X50X20 cm.

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

804

Para la ejecución del proyecto se empleará la siguiente maquinaria y equipos los cuales tendrán inspecciones permanentes para verificar el cumplimiento de la señalización, transporte de maquinaria pesada, transporte de materiales etc., dando cumplimiento al código nacional de tránsito.

- ✓ Retroexcavadora
- ✓ Volquetas
- ✓ Compactador
- ✓ Terminadora de pavimento
- ✓ Compactador Manual
- ✓ Herramienta menor
- ✓ Cargador ligero (Bobcats)

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

4. ANTECEDENTES

El Plan de manejo de tránsito, PMT es una herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causados por la ejecución de una obra vial, de manera que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la vía, de los ciudadanos en general y de quienes participan en la construcción de la obra

Para el desarrollo del plan de manejo del tránsito en la zona de influencia de las obras se realizan las siguientes etapas:

- Conocimiento de las características de las obras.
- Identificación de las características generales de la zona de influencia de la obra.
- Toma de información básica requerida para elaborar el plan de manejo del tránsito.
- Diseño del plan de manejo del tránsito.
- Puesta en marcha del plan de manejo del tránsito.
- Supervisión del plan de manejo del tránsito.

El plan de manejo de tránsito es el planteamiento para mitigar el impacto en la movilidad ocasionado por la ejecución de las actividades de una obra en la vía en un lugar determinado, razón por la cual, la parte contratista hizo la formulación del respectivo documento, bajos los parámetros que se citan:

1. Tipo de intervenciones a realizar en la obra
2. Horario de las intervenciones
3. Zona de influencia directa (lugar mismo de las obras) e indirecta (zonas aledañas)
4. Necesidades de ocupación vial.
5. Características de infraestructura del sector a intervenir
6. Tipo de vías impactadas

Dentro del plan de manejo de tránsito, se tiene en cuenta la función de la señalización, ésta es la manera de informar al tránsito y peatones lo que ocurre en las calles y vías. Es de tener en cuenta que va a interrumpir el flujo continuo de vehículos, el cual hay que orientarlo de manera adecuada de tal forma que se prevengan riesgos, tanto para los usuarios como para el personal que trabaja en la vía.

La señalización a utilizar es temporal, su instalación será anterior a la iniciación de los procesos constructivos, permanecerá el tiempo que duren los trabajos y se retirará cuando la vía intervenida esté en condiciones de recibir tránsito.

El manejo del tránsito en los frentes de trabajo del proyecto se realiza con:

- Señalización vertical de tipo preventiva

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2013

- Señalización reglamentaria
- Señalización informativa
- auxiliares de tránsito

Dentro del plan de manejo de tránsito presentado, sobre el proceso de señalización vial para el estrechamiento o cierre parcial o total de una vía debe dividirse en tres sectores:

- ➢ Señalización anterior a la obra: previene al usuario sobre las obras que se realizan y que encontrará más adelante. Se subdivide en tres zonas:
  - ✓ Acceso al área de precaución.
  - ✓ Área de transición.
  - ✓ Área de protección o zona restringida.

- ➢ Señalización en el sitio de la obra: Área de trabajo.

- ➢ Señalización en parte final de los trabajos: En este sector el tránsito retorna a la circulación normal.

El tipo, número de señales, ubicación de las mismas, así como los dispositivos de señalización que se deben ubicar en cada una de las zonas descritas anteriormente, se encuentran definidos en el Manual de señalización del Ministerio de transporte, de donde se ha extractado la señalización que se ha considerado aplicable para el presente proyecto, la cual se describe en detalle en los siguientes numerales.

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

5. PRESUPUESTO

Condiciones actualizadas según acta modificatoria de fecha 30/12/24:

A	PERSONAL PROFESIONAL							
N° ITEM	PERFIL	CATEGORIA	CARGO	NUMERO DE PERSONAS	DEDICACIÓN (hombre - mes)	TIEMPO (MESES)	SALARIOS	VALOR TOTAL
1								
C	PERSONAL AUXILIAR							
1	AYUDANTE	1,00	AUXILIAR DE TRANSITO	1,00	100%	1,00	$ 1.578.000	$ 1.578.000,00
D	SUBTOTAL PERSONAL (A + B+ C)							$ 1.578.000,00
E	FACTOR MULTIPLICADOR							2,40
F	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (D * E)							$ 3.787.200,00
G	COSTOS DIRECTOS							

N° ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDA	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	TIEMPO (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SEÑALIZACIÓN	Señal Informativa Obra SIO-02	UN	2	100%		$ 253.272,00	$ 506.544,00
2	SEÑALIZACIÓN	Señal Informativa Obra SIO-03	UN	2	100%		$ 253.272,00	$ 506.544,00
3	SEÑALIZACIÓN	Señal preventiva Obra SPO-02	UN	2	100%		$ 253.272,00	$ 506.544,00
4	SEÑALIZACIÓN	Cinta señalización	ML	121,19114	100%		$ 1.900,00	$ 230.263,16
5	SEÑALIZACIÓN	Barrera plastica de aproximación (Maletines)	UN	4	100%		$588.812,665	$ 2.355.250,66
6	SEÑALIZACIÓN	Colombinas - delineadores viales	UN	15	100%		$ 48.148,00	$ 722.220,00
H	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS							**$ 4.827.365,82**

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

201S


I	VALOR TOTAL COSTOS PROYECTO (F + H)				$ 8.614.565,82
J	IVA SOBRE (I)				$1.636.767,51
K	VALOR TOTAL (I + J)				$10.251.333,33
	VALOR TOTAL PMT MES				$10.251.333,33
	PLAZO INICIAL	3,00	MESES		$30.754.000,0
	PLAZO ADICION	2,00	MESES		$ 20.502.667,00
	VALOR TOTAL PMT				$51.256.667,0
SON :	CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE				

6. SEÑALIZACION:

Señal Informativa Obra SIO-02: Esta señal indicará el inicio de los trabajos en la vía o zona adyacente a ella, con el mensaje "INICIO DE OBRA".	
Señal Informativa Obra SIO-03 Esta señal indicará el fin de los trabajos en la vía o zona adyacente a ella, con el mensaje "FIN DE OBRA".	

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2016

Señal preventiva Obra SPO-02 SP ó Señalamiento Preventivo es la que tiene por objeto prevenir al usuario sobre la existencia de algún riesgo potencial en la carretera y su naturaleza. Generalmente son señales verticales bajas, que se fijan en postes y marcos. Son señales de tránsito que alertan a los conductores sobre condiciones peligrosas o inusuales en la carretera. Su objetivo es prevenir accidentes proporcionando información anticipada sobre situaciones que pueden requerir precaución adicional	
Cinta señalización Las cintas de seguridad se utilizan para delimitar áreas de trabajo peligrosas, como zonas de construcción, áreas de maquinaria pesada o lugares donde se realizan tareas de mantenimiento	
Barrera plástica de aproximación (Maletines) Las Barreras son elementos o productos que se colocan en obras viales, avenidas o carreteras, con la finalidad de dividir, delimitar o separar carriles, su estructura debe ser resistente a impactos y con sistema de ensamble. La Barrera Plástica o Maletín Plástico es un dispositivo de canalización o delimitación de tráfico de gran tamaño.	
(Colombinas) delineadores viales) Se denominan delineadores verticales a los elementos que indican la alineación horizontal y vertical de la vía, contribuyendo de esta manera a que los conductores y conductoras puedan maniobrar adecuadamente en la sección de la vía a orillas de la cual se ubican los dispositivos. Es un dispositivo plástico compuesto por una base rellenable con manija y tapón. Poste tubular color naranja con 3 bandas reflectivas y 3 ganchos para sujetar la cinta de precaución, malla naranja o cadena plástica.	

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

7. REGISTRO FOTOGRAFICO


ÍTEMS	ACTIVIDAD	EJECUTADO
	PERSONAL AUXILIAR	**UNIDAD DE TIEMPO**
	AUXILIAR DE TRANSITO	1 MES
1,0		
	OBSERVACIONES: El personal auxiliar de tránsito hace apoyo en organización con directrices a conductores de maquinaria y vehículos de transporte de obra	


ÍTEMS	ACTIVIDAD	EJECUTADO
	SEÑALIZACIÓN	**UNIDAD DE TIEMPO**
	Señal Informativa Obra SIO-02	1 MES
1		
	OBSERVACIONES: Se muestra la colocación de señal en la vía que se encuentra intervenida y que da aviso de una zona de *inicio de obra*, con la finalidad de informar a los peatones y conductores de la ejecución de la obra.	

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2018

	SEÑALIZACIÓN	UNIDAD DE TIEMPO
2	Señal Informativa Obra SIO-03	1 MES

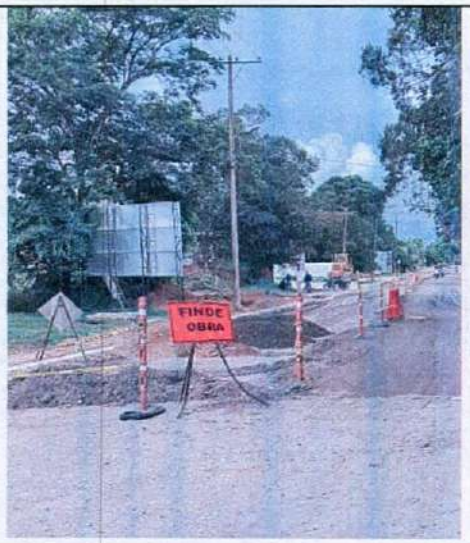


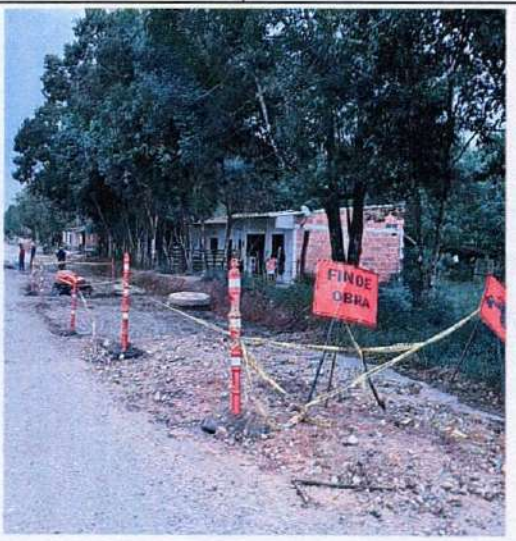

OBSERVACIONES: Se muestra la colocación de señal de: fin de obra, acompañada de delineadores y cinta, al sector de la vía intervenida.

ÍTEMS	ACTIVIDAD	EJECUTADO
	SEÑALIZACIÓN	UNIDAD DE TIEMPO
3	Señal preventiva Obra SPO-02	1 MES



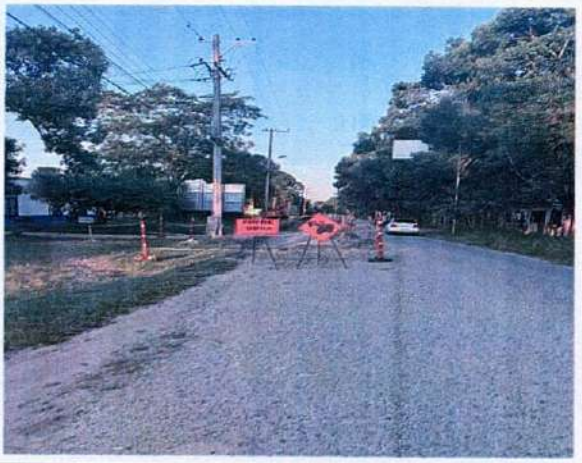

OBSERVACIONES: Se muestra la disposición de señales, que hacen prevención a peatones y conductores, colocando la señal preventiva que indica maquinaria en la vía, por la intervención que se desarrolla, la vía se encuentra cerrada, por tanto, no se puede acceder a esa área.


Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2019

ÍTEMS	ACTIVIDAD	EJECUTADO
4	SEÑALIZACIÓN	UNIDAD DE TIEMPO
	Cinta señalización	1 MESES
	 	
	OBSERVACIONES: Se muestra la colocación de la cinta amarilla, esto con el propósito de delimitar la zona de trabajo de obra.	

ÍTEMS	ACTIVIDAD	EJECUTADO
5	SEÑALIZACIÓN	UNIDAD DE TIEMPO
	Barrera plástica de aproximación (Maletines)	1 MES
	 	
	OBSERVACIONES: Colocación maletín plástico como barrera, para impedir el paso de vehículos en el área de intervención de vías en ejecución de la obra.	

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

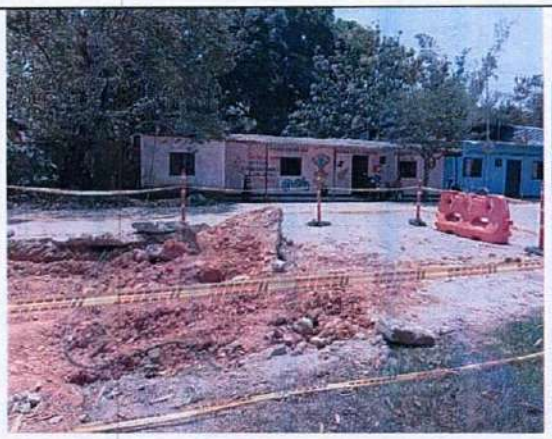ÍTEMS	ACTIVIDAD	EJECUTADO
6	SEÑALIZACIÓN	UNIDAD DE TIEMPO
	(Colombinas) delineadores viales	1 MES
	 	
	OBSERVACIONES: Disposición de los delineadores con cinta de peligro para indicar precaución en el área para paso, por ser zona de intervención de la obra	

8. RESUMEN FINANCIERO

RESUMEN		%
VALOR INICIAL	$ 30.754.877,21	
VALOR ADICIONAL	$20.501.789,79	
VALOR ACTUALIZADO	$ 51.256.667,00	
VALOR EJECUTADO	$ 10.251.333,33	20,00
PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 41.005.333,67	80,00
TOTALES	$ 51.256.667,00	100,00

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

e021

9. RELACION DE PERSONAL (AUXILIAR DE TRANSITO)

A continuación, se relaciona el personal como auxiliar de tránsito durante un (1) mes:

MES /AÑO	NOMBRE	CEDULA	No. PLANILLA
marzo de 2024	WENDY KARINA CERA ATEHORTUA	1123115317	76069127

10. CONCLUSIONES

Se continuará haciendo la implementación del plan de manejo de tránsito presentado, con el personal y señalización propuesta, según las condiciones estimadas en el presupuesto para el municipio de San Carlos de Guaroa.

La señalización que se ha considerado en el PMT contempla señales informativas, preventivas y reglamentarias, además de dispositivos especiales como son delineadores tubulares, cinta, maletines, recomendados en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte, la cual se continuara haciendo uso, durante el proceso de desarrollo del proyecto.

Nombre: **ASTRID C PARRADO ROJAS**
Director de obra
N° Matrícula Profesional: 25202096145 CND

Nombre: **CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE**
Residente de obra
N° Matrícula Profesional: 091037-0593526 CND

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2022

ANEXO:
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE AUXILIAR DE TRANSITO

Calle 15 No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901665253-9	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	CALLE 15 No 40-01	6784738	ingeviasurbanas2022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN CARLOS DE / 9	META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	29/04/2024	76069127	$4.456.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	33.000	0		0		0	18	600	0	33.600	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	304.400	0		0		0	18	4.700	0	309.100	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	130.000	0		0		0	18	2.000	0	132.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	72.000	0		0		0	18	1.200	0	73.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.800	0		0		0	18	800	0	47.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	52.000	0		0		0	18	800	0	52.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.566.400	0	0	0	0	18	24.000	0	1.590.400	6
231001	Colfondos	800227940-6	131.800	0	0	0	0	18	2.100	0	133.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	334.100	0	0	0	0	18	5.200	0	339.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.091.000				1.091.000	18	16.700	1.107.700			10.910	1.107.700	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	627.000	18	9.600	636.600	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901665253-9	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		CALLE 15 No 40-01	6784738	ingeviasurbanas2022@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN CARLOS DE	9	META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	29/04/2024	76069127	$4.456.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	638.200	648.300
Pensión	3	2.032.300	2.063.600
Riesgos Laborales	1	1.091.000	1.107.700
CCF	1	627.000	636.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.388.500	4.456.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901665253-9	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		CALLE 15 No 40-01	6784738	ingeviasurbanas2022@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SAN CARLOS DE	9	META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	29/04/2024	76069127	$4.456.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolívar	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	SNO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1123115317	CERA ATEHORTUA WENDY KARINA	1	0			S	X																230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS041	1.170.000	46.800	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF34	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
2	CC	17156858	ROJAS VELANDIA JULIO EDUARDO	1	5			S																		0	0	0	0	0	EPS005	3.248.000	130.000	14-11	3.248.000	5	226.100	CCF34	3.248.000	130.000	0	0	0	0	0
3	CC	72180542	GARCIA GARCIA CARLOS FERNANDO	1	0			S																	25-14	2.088.000	334.100	0	0	0	0	EPS002	2.088.000	83.600	14-11	2.088.000	5	145.400	CCF34	2.088.000	83.600	0	0	0	0	0
4	CC	1122137396	OLARTE CASTAÑEDA JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.440.000	230.400	0	0	0	0	EPS002	1.440.000	57.600	14-11	1.440.000	5	100.300	CCF34	1.440.000	57.600	0	0	0	0	0
5	CC	1122137396	OLARTE CASTAÑEDA JUAN SEBASTIAN	1	0			S											X						230301	279.840	44.800	0	0	0	0	EPS002	279.840	11.200	14-11	279.840	5	0	CCF34	279.840	0	0	0	0	0	0
6	CC	1006780089	PINZON ROJAS WILMER ALEJANDRO	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF34	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
7	CC	5832624	GUZMAN CASALLAS LEONARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	1006838433	FORERO PINZON KAREN TATIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC34	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1120501940	REY NIÑO LEYDI ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF34	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
10	CC	91440690	MIRA GOMEZ JESUS MARIA	1	0			S	X	X															231001	823.334	131.800	0	0	0	0	CCFC55	823.334	33.000	14-11	823.334	5	57.400	CCF34	823.334	33.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013

GOBERNACIÓN DEL **META**

AGENCIA PARA LA **INFRAESTRUCTURA** DEL **META**
NIT. 900220547-5

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

INFORME PARCIAL No. 02

PROYECTO No. 2021005500304



CONTRATO DE OBRA No. 774 de 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META."

MAYO DE 2025

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

INFORME PARCIAL No. 02

Periodo de 30/08/2024 a 15/05/2025
Fecha de Presentación: 15/05/2025

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR DEL CONTRATO:	$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL:	$ 9.280.219.314,16
VALOR ACTUALIZADO:	$37.096.897.423,16
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL PROYECTO:	$ 684.072.727,00
VALOR ADICIONAL:	$ 342.028.603,91
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.026.101.330,91
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
CORREO ELECTRONICO:	ingeviasurbanas2022@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO:	cintervialmeta@gmail.com

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/08/2024
PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No.2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No.3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1:	2 MESES 1 DIA
FECHA DE REINICIO SUSPENSION N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	06/06/2025
19 meses	23 días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2030

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
FECHA DE PRORROGA No.1:	04/12/2023
TIEMPO DE PRORROGA No.1:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	05/03/2024
FECHA DE PRORROGA No. 2:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2:	05/08/2024
FECHA DE PRORROGA No. 3:	05/08/2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 3	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	30/09/2024
TIEMPO DE SUSPENSION No.1:	3 MESES
FECHA DE REINICIO No.1:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA No. 4:	30/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 4	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 4:	05/03/2025
FECHA DE PRORROGA No. 5:	4/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 5:	5/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	1 MES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	6/06/2025
18 MESES	1 DIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El área donde se desarrollará el proyecto "MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META", se encuentra ubicado en el Departamento del Meta- Municipio de San Carlos de Guaroa, el cual hace parte de los Llanos orientales y se ubica a 89 kilómetros de la capital departamental

MUNICIPIO:	SAN CARLOS DE GUAROA	**VEREDA:**	-
CORREGIMIENTO:	-	**BARRIO:**	CABECERA MUNICIPAL
COMUNA:	-	**DEPARTAMENTO:**	META
COORDENADAS:	**3°42'40" Norte, 73°14'33" Oeste**		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

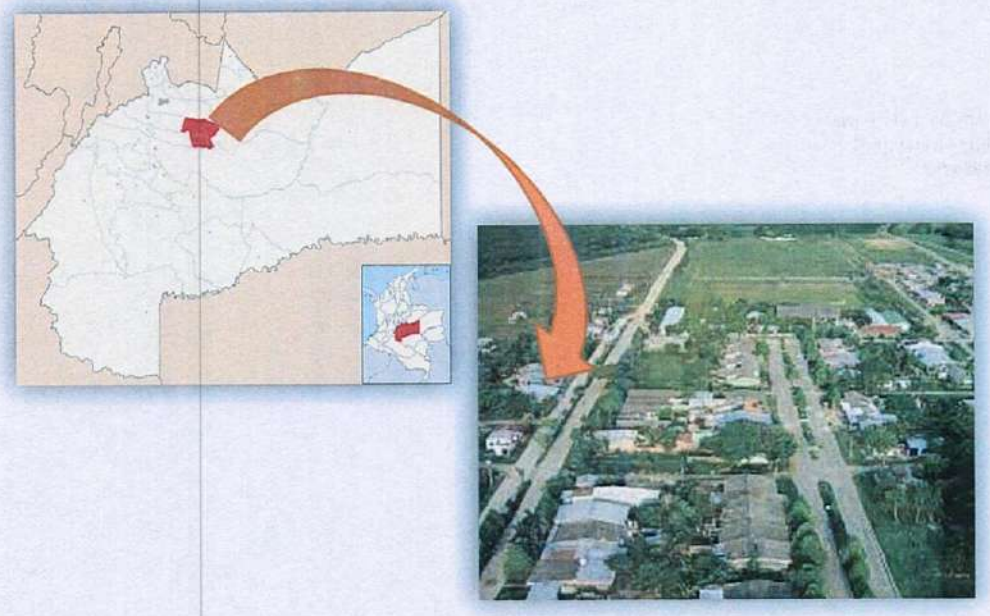


Ilustración 1. Ubicación Municipio de San Carlos de Guaroa.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8032

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

A. INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Condiciones Actualizadas

El 30 de diciembre del 2024, se realizó la Modificación N° 2 de mayores y menores cantidades e ítems no Previstos, con adición en valor y tiempo, la cual tiene las siguientes condiciones actualizadas:

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION N° 2 - 30/12/2024					
9. Mejoramiento De Vías Urbanas Que Comprende La calle 5 Entre Carreras 17 Y 18 De La Cabecera Municipal De San Carlos De Guaroa en el Departamento del Meta					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAPA ASFÁLTICA				
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0.170	$ 5,972,192.00	$ 1,015,272.64
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0.15M)	M3	362.00	$ 427,976.00	$ 154,927,312.00
1.3	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	M3	1,631.85	$ 55,603.00	$ 90,735,755.55
1.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	368.00	$ 262,000.00	$ 96,416,000.00
1.5	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	1,761.54	$ 4,851.00	$ 8,545,230.54
1.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	176.16	$ 994,015.00	$ 175,105,682.40
1.7	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	M3	312.17	$ 45,008.00	$ 14,050,147.36

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8035

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION N° 2 - 30/12/2024					
9. Mejoramiento De Vías Urbanas Que Comprende La calle 5 Entre Carreras 17 Y 18 De La Cabecera Municipal De San Carlos De Guaroa en el Departamento del Meta					
N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**CAPA ASFÁLTICA**				
1.8	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	352.30	$ 154,959.00	$ 54,592,055.70
1.9	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	644.58	$ 146,057.00	$ 94,145,421.06
1.10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	25.50	$ 104,659.00	$ 2,668,804.50
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	404.42	$ 160,196.94	$ 64,786,846.47
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	10.20	$ 115,628.61	$ 1,179,411.82
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	10.20	$ 130,582.36	$ 1,331,940.07
1.11	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	10,657.68	$ 2,358.00	$ 25,130,809.44
1.12	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	53,409.24	$ 2,031.00	$ 108,474,166.44
NP 4	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	4.00	$ 4,405,289.75	$ 17,621,159.00
NP 5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	3.00	$ 2,422,031.54	$ 7,266,094.62

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8034

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION N° 2 - 30/12/2024					
9. Mejoramiento De Vías Urbanas Que Comprende La calle 5 Entre Carreras 17 Y 18 De La Cabecera Municipal De San Carlos De Guaroa en el Departamento del Meta					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAPA ASFÁLTICA				
NP 6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	64.76	$ -	$ 2,261,182.18
NP 7	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	470.60	$ -	$ 10,288,228.96
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	14.00	$ -	$ 2,576,035.84
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	6.89	$ -	$ 2,608,764.35
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	40.65	$ -	$ 4,447,355.93
NP 11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	27.83	$ -	$ 2,110,899.66
NP 12	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	17.12	$ -	$ 5,386,971.50
NP 13	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	M3	24.73	$ -	$ 3,475,197.35
NP 14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	3.00	$ -	$ 2,134,117.53
	SUBTOTAL				**$ 953,280,862.91**
2	SEÑALIZACIÓN VIAL				
2.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	700.00	$ 5,189.00	$ 3,632,300.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION N° 2 - 30/12/2024					
9. Mejoramiento De Vías Urbanas Que Comprende La calle 5 Entre Carreras 17 Y 18 De La Cabecera Municipal De San Carlos De Guaroa en el Departamento del Meta					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAPA ASFÁLTICA				
2.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	414.00	$ 34,918.00	$ 14,456,052.00
2.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	9.00	$ 386,161.00	$ 3,475,449.00
	SUBTOTAL				$ 21,563,801.00
	VALOR COSTOS PROYECTO				$ 974,844,663.91
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 744,156,231.99
	ADMINISTRACIÓN (26 %)				$ 193,480,620.32
	IMPREVISTOS (1 %)				$ 7,441,562.32
	UTILIDAD (4 %)				$ 29,766,249.28
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 230,688,431.92
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				$ 51,256,667.00
	VALOR TOTAL OBRA				$ 1,026,101,330.91

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

9036

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

Avance físico

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 06/09/2023 A 15/05/2025		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
	CAPA ASFÁLTICA			
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	0.170	$ 1,015,272.64	100.00%
1.2	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0.15M)	338.66	$ 144,938,352.16	93.55%
1.3	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	1,631.85	$ 90,735,755.55	100.00%
1.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	364.00	$ 95,368,000.00	98.91%
1.5	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	1,759.99	$ 8,537,711.49	99.91%
1.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	176.16	$ 174,956,580.15	99.91%
1.7	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO,	312.17	$ 14,050,147.36	100.00%
1.8	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	351.99	$ 54,544,018.41	99.91%
1.9	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN,	643.25	$ 93,951,165.25	99.79%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 06/09/2023 A 15/05/2025		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
	HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.			
1.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0.00	$ 0.00	0.00%
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	270.72	$ 43,368,515.60	66.94%
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	10.00	$ 1,156,286.10	98.04%
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	10.00	$ 1,305,823.60	98.04%
1.11	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	10,648.61	$ 25,109,422.38	99.91%
1.12	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR	53,342.32	$ 108,338,251.92	99.87%
NP 4	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	4.00	$ 17,621,159.00	100.00%
NP 5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	3.00	$ 7,266,094.62	100.00%
NP 6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	59.96	$ 2,093,583.75	92.59%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 06/09/2023 A 15/05/2025		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
NP 7	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	440.26	$ 9,624,937.70	93.55%
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	10.30	$ 1,895,226.37	73.57%
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	5.24	$ 1,984,023.98	76.05%
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	39.15	$ 4,283,246.86	96.31%
NP 11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	27.66	$ 2,098,005.19	99.39%
NP 12	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	15.20	$ 4,782,825.16	88.79%
NP 13	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	9.81	$ 1,378,555.84	39.67%
NP 14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	2.00	$ 1,422,745.02	66.67%
		Subtotal	**$ 911,825,706.10**	
2	**SEÑALIZACIÓN**			
2.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	0.00	$ 0.00	0.00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8029

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 06/09/2023 A 15/05/2025		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
2.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	0.00	$ 0.00	0.00%
2.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	0.00	$ 0.00	0.00%
		Subtotal	**$ 0.00**	
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU (31%)		**$ 911,825,706.10**	
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)	0.00	$ 48,699,333.43	95.01%
	VALOR TOTAL		**$ 960,525,039.53**	**93.61%**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

040

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

Avance físico

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
	CAPA ASFÁLTICA								
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 1,015,272.64	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 1,015,272.64
1,2	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0.15M)	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 154,927,312.00	0.00%	$ 0.00	93.55%	$ 144,938,352.16
1,3	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 90,735,755.55	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 90,735,755.55
1,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 96,416,000.00	0.00%	$ 0.00	98.91%	$ 95,368,000.00
1,5	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	50.00%	$ 4,272,615.27	100.00%	$ 8,545,230.54	99.91%	$ 8,537,711.49	99.91%	$ 8,537,711.49
1,6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	50.00%	$ 87,552,841.20	100.00%	$ 175,105,682.40	99.91%	$ 174,956,580.15	99.91%	$ 174,956,580.15
1,7	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, ACTIVIDAD: NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 14,050,147.36	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 14,050,147.36
1,8	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 54,592,055.70	0.00%	$ 0.00	99.91%	$ 54,544,018.41

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2041

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
1,9	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 94,145,421.06	2.61%	$ 2,456,678.74	99.79%	$ 93,951,165.25
1,10	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 2,668,804.50	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 64,786,846.47	0.00%	$ 0.00	66.94%	$ 43,368,515.60
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 1,179,411.82	0.00%	$ 0.00	98.04%	$ 1,156,286.10
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 1,331,940.07	0.00%	$ 0.00	98.04%	$ 1,305,823.60
1,11	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	50.00%	$ 12,565,404.72	100.00%	$ 25,130,809.44	99.91%	$ 25,109,422.38	99.91%	$ 25,109,422.38
1.12	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 108,474,166.44	1.28%	$ 1,393,773.75	99.87%	$ 108,338,251.92
NP 4	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 17,621,159.00	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 17,621,159.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2042

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
NP 5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 7,266,094.62	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 7,266,094.62
NP 6	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 2,261,182.18	0.00%	$ 0.00	92.59%	$ 2,093,583.75
NP 7	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 10,288,228.96	0.00%	$ 0.00	93.55%	$ 9,624,937.70
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 2,576,035.84	0.00%	$ 0.00	73.57%	$ 1,895,226.37
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 2,608,764.35	0.00%	$ 0.00	76.05%	$ 1,984,023.98
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 4,447,355.93	0.00%	$ 0.00	96.31%	$ 4,283,246.86
NP 11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 2,110,899.66	0.00%	$ 0.00	99.39%	$ 2,098,005.19
NP 12	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 5,386,971.50	0.00%	$ 0.00	88.79%	$ 4,782,825.16
NP 13	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 3,475,197.35	0.00%	$ 0.00	39.67%	$ 1,378,555.84

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2043

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
NP 14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	0.00%	$ 0.00	100.00%	$ 2,134,117.53	0.00%	$ 0.00	66.67%	$ 1,422,745.02
	SEÑALIZACIÓN VIAL								
2.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00
2.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00
2.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)	11.25%	$ 5,765,000.06	88.75%	$ 45,491,666.95	0.00%	$ 0.00	95.01%	$ 48,699,333.43
TOTALES		**10.74%**	**$ 110,155,861.25**	**97.34%**	**$ 998,772,529.86**	**20.70%**	**$ 212,454,166.51**	**93.61%**	**$ 960,525,039.53**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2044

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 1 (SEP 2023)	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00
PERIODO 2 (OCT 2023)	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00	0.00%	$ 0.00
PERIODO 3 (NOV 2023)	0.00%	$ 0.00	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
PERIODO 4 (DIC 2023)	0.00%	$ 0.00	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
PERIODO 5 (ENE 2024)	0.00%	$ 0.00	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00	0.00%	$0.00
PERIODO 6 (FEB 2024)	2.79%	$ 28,620,605.36	2.79%	$ 28,620,605.36	2.79%	$ 28,620,605.36	2.79%	$ 28,620,605.36
PERIODO 7 (MARZ 2024)	1.81%	$ 18,609,527.84	4.60%	$ 47,230,133.20	1.81%	$ 18,609,527.84	4.60%	$ 47,230,133.20
PERIODO 8 (ABRIL 2024)	0.00%	$ 0.00	4.60%	$ 47,230,133.20	0.00%	$ 0.00	4.60%	$ 47,230,133.20
PERIODO 9 (MAYO 2024)	0.00%	$ 0.00	4.60%	$ 47,230,133.20	0.00%	$ 0.00	4.60%	$ 47,230,133.20
PERIODO 10 (JUN 2024)	0.00%	$ 0.00	4.60%	$ 47,230,133.20	0.00%	$0.00	4.60%	$47,230,133.20
PERIODO 11 (JUL 2024)	4.42%	$ 45,373,522.85	9.02%	$ 92,603,656.05	4.42%	$45,373,522.85	9.02%	$92,603,656.05
PERIODO 12 (AGOS 2024)	24.63%	$ 252,717,922.47	33.65%	$ 345,321,578.52	24.63%	$252,717,922.47	33.65%	$345,321,578.52

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8045

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 13 (SEP 2024)	0.00%	$ 0.00	33.65%	$ 345,321,578.52	0.00%	$0.00	33.65%	$345,321,578.52
PERIODO 14 (ENER 2025)	0.00%	$ 0.00	33.65%	$ 345,321,578.52	0.00%	$0.00	33.65%	$345,321,578.52
PERIODO 15 (FEBR 2025)	13.93%	$ 142,920,864.25	47.58%	$ 488,242,442.77	13.93%	$142,920,864.25	47.58%	$488,242,442.77
PERIODO 16 (MARZ 2025)	23.11%	$ 237,180,917.92	70.70%	$ 725,423,360.69	16.33%	$167,607,773.62	63.92%	$655,850,216.39
PERIODO 17 (ABRIL 2025)	15.90%	$ 163,193,307.92	86.60%	$ 888,616,668.61	8.99%	$92,220,656.63	72.90%	$748,070,873.02
PERIODO 18 (MAYO 2025)	10.74%	$ 110,155,861.25	97.34%	$ 998,772,529.86	20.70%	$212,454,166.51	93.61%	$960,525,039.53
PERIODO 19 (JUN 2025)	2.66%	$ 27,328,801.05	100.00%	$ 1,026,101,330.91				


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8046

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

Grafica Avance Físico

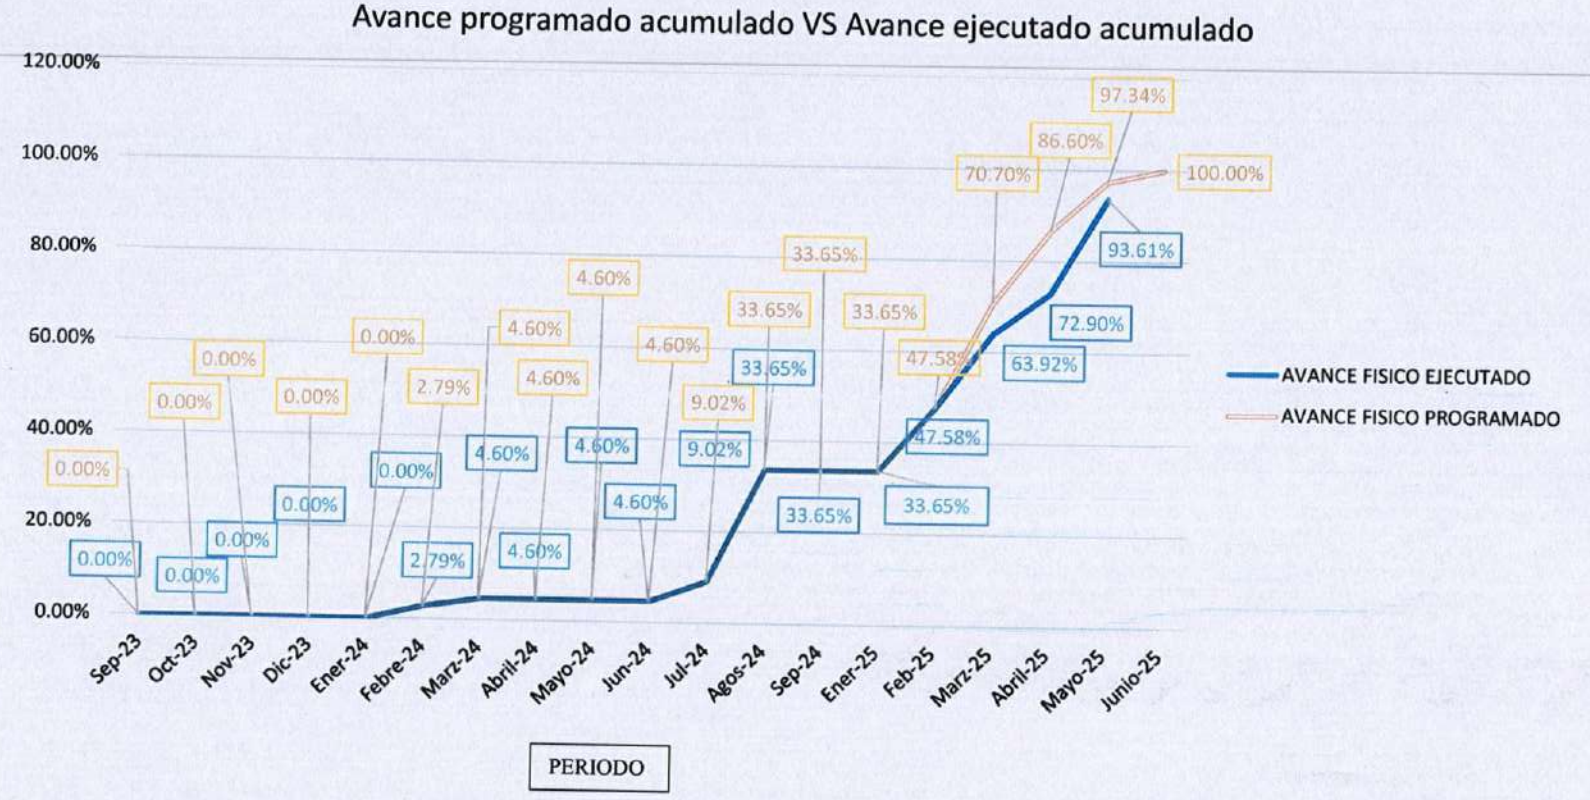

Se tiene un avance programado acumulado del 97,34% y un avance ejecutado acumulado del 93,61%.

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Los oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos, comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e informes presentados.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: La correspondencia enviada, recibida y comités de obra se han adjuntado en los informes mensuales de obra, correspondientes al periodo de la presente parcial.

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

NO APLICA

4. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia.

ESTADO	N° DE DIAS
NUBLADO	N/A
TORMENTA	N/A
LLUVIOSO	N/A
SOLEADO	N/A

Nota: El estado del tiempo se adjuntó en los informes mensuales de obra, correspondientes al periodo de la presente parcial.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2040

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

1.2 DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0.15M). M3

La actividad de demolición de pavimento rígido, consistió en realizar la localización y replanteo de la zona a intervenir, posteriormente se procede a ubicar el martillo y comenzar con la demolición del pavimento. La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

1.3 EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE. M3

Para llevar a cabo esta actividad fue indispensable tener una comisión topográfica, la cual se encargó de direccionar las condiciones según el diseño geométrico definido, adicional a esto se hizo necesario el uso de maquinaria pesada como una retroexcavadora de orugas. La topografía dio inicio marcando el alineamiento que establece el diseño geométrico, se referencio con estacas el eje, los bordes y demás puntos necesarios. Seguido a esto se procedió a la excavación, donde se retiró todo el material que tiene la vía existente hasta llegar a la cota de excavación. Esta actividad fue controlada por la comisión topográfica, la cual se encargó de brindar las instrucciones necesarias al operador teniendo en cuenta los parámetros de ancho de calzada, profundidad y largo de la caja. Durante la ejecución, se tomaron niveles y se verificó las cotas de sub rasante, anchos de vía y abscisado.

1.4 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES. VJ

El material sobrante proveniente de la excavación y la demolición se transportó en volquetas, y se depositó en el lugar de disposición final, autorizado por la alcaldía municipal.

1.5 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1. M2

Previo al inicio de la imprimación, se comprobó que la superficie sobre la cual se efectuó el riego, cumpliera con todos los requisitos especificados en cuanto a conformación, compactación y acabado de la base y que esta, no tuviera exceso de humedad. La superficie que se imprimó, se limpió cuidadosamente de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto que pudiera ser perjudicial. Se corroboró que toda la superficie de la base quedara completamente cubierta por la emulsión asfáltica CRL-1. Esta actividad de riego se realizó con ayuda de la marmita (equipo irrigador).

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2049

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

1.6 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN. M3

Se extendió la mezcla densa en caliente a lo largo de la vía y se compactó adecuadamente hasta la densidad mínima especificada en las normas. La mezcla se extendió con finisher, con el espesor indicado según diseño.
La compactación se realizó con vibro compactador de doble rodillo y se hizo en tres fases: la primera pasada se hizo sobre la carpeta recién colocada, la segunda fase se realizó con vibro, antes de que se enfriara la mezcla para obtener la densidad requerida, la compactación final se usó compactador neumático y se hizo garantizando que la temperatura de la mezcla densa en caliente permitiera la eliminación de cualquier marca de la compactación.

1.7 RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. M3

Después de retirado el material de la excavación, se procedió a la disposición y extensión de material mixto de rio en capas no superiores a 20 cm, realizándose la debida compactación a las capas, hasta llegar al nivel de la sub rasante.

1,8 BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. M3

La base fue extendida en capas de espesor no mayor de 0,15 m, medidos antes de la compactación. Cada capa de base se oreo y humedeció artificialmente y se mezcló sucesivamente hasta que alcanzo la humedad óptima en todo el material y se compacto hasta obtener una densidad mínima del 100% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado como promedio de los ensayos realizados, y ningún valor individual fue inferior al 98% del mismo. Una vez que el material extendido de la base granular tuvo la humedad apropiada, se conformó ajustándose a los lineamientos y secciones típicas del proyecto, y se compacto con el equipo aprobado por la Interventoría, hasta alcanzar la densidad seca especificada en el proyecto. La compactación se efectuó de manera longitudinal, comenzando por los bordes exteriores y aprobado por la interventoría, hasta alcanzar la densidad seca especificada en el proyecto.

1,9 SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR. M3

El material se dispuso en un cordón de sección uniforme donde fue necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de compactación. Después de humedecido, se extendió en todo el ancho previsto en una capa de espesor uniforme que permitió obtener el espesor y el grado de compactación exigidos. En todo caso, la cantidad de material extendido no fue superior

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2050

a los 20 cm de espesor, ni fue menor a 10 cm, por capa. El material extendido mostró una distribución granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes.

Una vez que el material extendido de la sub base granular tuvo la humedad apropiada, se conformó y se compactó con el equipo aprobado por la interventoría, hasta que alcanzo la densidad seca especificada por el ensayo de Proctor modificado tomado en el laboratorio.
La compactación se efectuó longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo compactador

NP 1 SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. ML

La actividad comprendió en el suministro e instalación del sardinel de piezas prefabricadas tipo A-10 80X50X20 cm el cual se realiza inicialmente con la localización y replanteo, teniendo localizada la zona se procede con la excavación siempre teniendo en cuenta la cota rasante del asfalto de la estructura del diseño del pavimento, posterior se alistó la base con mortero de pega, instalado el mortero se instala el sardinel y en los espacios entre los mismos, se aplicó nuevamente mortero de pega. Todos los procedimientos se hicieron con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución, se tuvo en cuenta los alineamientos, cotas, pendientes, secciones y espesores indicados, las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

NP 2 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. ML

La actividad comprendió en el suministro de sardinel en concreto de piezas prefabricadas tipo A-85 80X35X20 cm el cual se realiza inicialmente con la localización y replanteo, teniendo localizada la zona se procede con la excavación siempre teniendo en cuenta la cota rasante del asfalto de la estructura del diseño del pavimento, posterior se alistó la base con mortero de pega, instalado el mortero se instala el bordillo y en los espacios entre los mismos, se aplicó nuevamente mortero de pega. Todos los procedimientos se hicieron con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución, se tuvo en cuenta los alineamientos, cotas, pendientes, secciones y espesores indicados, las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

NP 3 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. ML

La actividad comprendió en el suministro de sardinel en concreto de piezas prefabricadas tipo A-100 60X50X20 cm el cual se realiza inicialmente con la localización y replanteo, teniendo localizada la zona se procede con la excavación siempre teniendo en cuenta la cota rasante del asfalto de la estructura del diseño del pavimento, posterior se alistó la base con mortero de pega, instalado el mortero se instala el bordillo y en los espacios entre los mismos, se aplicó nuevamente

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8051

mortero de pega. Todos los procedimientos se hicieron con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución, se tuvo en cuenta los alineamientos, cotas, pendientes, secciones y espesores indicados, las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

1.11 TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS

La mezcla asfáltica se trasporto en volquetas desde la planta asfáltica hasta el sitio de la obra. Las volquetas iban debidamente carpadas para mantener la temperatura de la mezcla asfáltica.

1.12 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR

El transporte del material granular se realizó desde la mina autorizada, es transportado en volquetas hasta el sitio de la obra, dicho transporte se hace cumpliendo con las especificaciones técnicas y evitando la proliferación de partículas.

NP 4 SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4". ML

Se inicia con la realización de la localización y replanteo, luego con la excavación manual, se realizó el figurado, amarre e instalación del acero de refuerzo, se hizo la instalación de concreto para la placa base del sumidero, posteriormente se instaló la formaleta de los muros y se realizó el concreto de este mismo, dejando instalado el ángulo donde reposara la rejilla del sumidero. La construcción se lleva a cabo de acuerdo a las indicaciones de los diseños y especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para su correcta ejecución.

NP 5 PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD). UN

La actividad consistió en la construcción de la placa cubierta para pozo de inspección de diámetro de 1.20m en concreto de 4000 psi fundida en sitio el cual incluyo el acero de refuerzo y contiene una tapa en HD con un sistema de seguridad para el tráfico pesado. Para la construcción de la misma se lleva a cabo la nivelación del terreno, se realiza el amarre del acero de la tapa cubierta del pozo de inspección en el diámetro de 1.20m dejando instalados los ganchos de izaje, posteriormente se instala la formaleta a la tapa, teniendo presente que se debe instalar el aro tapa de la base de inspección, luego se realiza el vaciado del concreto y se procede a realizar el texturizado. La placa cubierta fue construida de acuerdo a las indicaciones de los diseños y especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para su correcta ejecución.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2052

NP 6 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL. M3

Se procedió con la cuadrilla determinada y con el uso de herramienta menor, a realizar el relleno de las áreas dispuestas con cierta excavación y profundidades variables, en las cuales se colocó el material proveniente de las excavaciones y se compacto de manera manual.

NP 7 CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M). M3

La actividad consistió en el cargue mecánico de las demoliciones realizadas del pavimento rígido, el cual se llevó a cabo el cargue del material sobrante con maquinaria y fue descargado en una volqueta para luego ser depositado en los sitios autorizados por la alcaldía municipal.

NP 8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE. ML

Una vez inspeccionado visualmente las condiciones físicas de la tubería PVC 10", se realizó la colocación de la misma en el fondo de la zanja, sin dejarla caer sobre la cama de arena previamente instalada, luego se realizó la limpieza utilizando estopa y lubricante, en el exterior del espigo y en el interior de la campana de la tubería, para eliminar impurezas y se aplicó la soldadura en ambos puntos, para proceder a acoplar los tubos entre sí hasta la marca de inserción, con lo cual se verificó que, el empaque quedara en su lugar para evitar fugas en la conexión, finalmente, se continuó con el recubrimiento de la tubería con arena para su protección, compactando suavemente para evitar desplazamientos. La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

NP 9 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL. M3

La actividad de demolición de concreto reforzado, consistió en realizar la localización y replanteo de la zona a intervenir, posteriormente se procede a ubicar el martillo y comenzar con la demolición del concreto reforzado, finalizada la actividad se realizó el cargue de las demoliciones realizadas del sumidero, el cual se llevó a cabo el cargue del material sobrante, ubicado en el lugar indicado de recolección. La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

NP 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE. ML

Una vez inspeccionado visualmente las condiciones físicas de la tubería PVC 6", se realizó la colocación de la misma en el fondo de la zanja, sin dejarla caer sobre la cama de arena previamente instalada, luego se realizó la limpieza utilizando estopa y lubricante, en el exterior del

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2053

espigo y en el interior de la campana de la tubería, para eliminar impurezas y se aplicó la soldadura en ambos puntos, para proceder a acoplar los tubos entre sí hasta la marca de inserción, con lo cual se verificó que, el empaque quedara en su lugar para evitar fugas en la conexión, finalmente, se continuó con el recubrimiento de la tubería con arena para su protección, compactando suavemente para evitar desplazamientos. La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

NP 11 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE.

Se procedió con la cuadrilla determinada y con el uso de herramienta menor, a remover del terreno, ciertos volúmenes de material común, con profundidades no mayores a 2,0 metros, conforme a las dimensiones establecidas en los planos para la instalación de tubería y construcción de sumideros, en las vías intervenidas. Durante la actividad de acopió el material a una distancia no menor a 1,0 metro del borde de la excavación, garantizando el área adecuada para el trabajo.

NP 12 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.

La actividad de demolición de pavimento asfaltico, consistió en realizar la localización y replanteo de la zona a intervenir, posteriormente se procedió a ubicar el compresor en el sitio y se comenzó con la demolición del pavimento, finalizada la actividad se realizó el cargue del material sobrante de las demoliciones y se llevó al sitio de recolección indicado. La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

NP 13 CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS.

Finalizada la excavación manual, se procedió a instalar y extender una primera capa de arena en el fondo de las zanjas, con espesor uniforme de acuerdo con la normatividad, sobre la cual fue colocada la tubería correspondiente, posteriormente, se cubrió dicha tubería con el mismo material, tanto lateral como superficialmente, hasta lograr el espesor según el diámetro de la tubería instalada, y se inspeccionó que la tubería quedara totalmente protegida.
La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

2 MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

- **MARZO DE 2025**

Sub Base Granular

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Ensayo Caracterización		
Granulometría	05/03/2025	E-123
Limite liquido	05/03/2025	E-125
Índice de plasticidad	05/03/2025	E-125 y E-126
Equivalente de arena	05/03/2025	E-133
CBR	05/03/2025	E-148
otros (Especificar)	-	-

Sub Base Granular

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Proctor Modificado	17/03/2025	INV–E–142-13
Densidades/Cono de arena	25/03/2025	INV E-161
otros (Especificar)	-	-

Ensayo a compresión en cilindros de concreto

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Ensayo a compresión en cilindros de concreto	18/03/2025	INV-E 410/13 – NTC 673
otros (Especificar)	-	-

Base Granular

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Ensayo Caracterización		
Granulometría	25/03/2025	E-123
Limite liquido	25/03/2025	E-125
Índice de plasticidad	25/03/2025	E-125 y E-126
Desgaste en la máquina de los ángeles	25/03/2025	INV E-218

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Degradación por abrasión en el equipo microdeval	25/03/2025	INV E-238
Evaluación de la resistencia mecánica por método del 10%	25/03/2025	INV E-224
Durabilidad Perdida – (Sulfato de Sodio)	25/03/2025	INV E-220
Durabilidad Perdida – (Sulfato de Magnesio)	25/03/2025	INV E-220
Equivalente de arena	25/03/2025	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	25/03/2025	INV E-211
Índice de alargamiento y aplanamiento	25/03/2025	INV E-230
Caras fracturadas	25/03/2025	INV E-227
CBR	25/03/2025	E-148
Proctor modificado	27/03/2025	INV - E-142-13
Densidades/Cono de arena	31/03/2025	INV-E-161
otros (Especificar)	-	-

- **ABRIL DE 2025**

Base Granular

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Ensayo Caracterización		
Granulometría	10/04/2025	E-123
Limite liquido	10/04/2025	E-125
Índice de plasticidad	10/04/2025	E-125 y E-126
Desgaste en la máquina de los ángeles	10/04/2025	INV E-218
Degradación por abrasión en el equipo microdeval	10/04/2025	INV E-238
Evaluación de la resistencia mecánica por método del 10%	10/04/2025	INV E-224
Durabilidad Perdida – (Sulfato de Sodio)	10/04/2025	INV E-220
Durabilidad Perdida – (Sulfato de Magnesio)	10/04/2025	INV E-220
Equivalente de arena	10/04/2025	INV E-133
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	10/04/2025	INV E-211
Índice de alargamiento y aplanamiento	10/04/2025	INV E-230
Caras fracturadas	10/04/2025	INV E-227
CBR	10/04/2025	E-148
Densidades/Cono de arena	28/04/2025	INV-E-161
otros (Especificar)	-	-

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0056

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

- **MAYO DE 2025**

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Mezcla densa tipo MDC-19		
Contenido de asfalto	12/05/2025 13/05/2025	E-732
Estabilidad E-748	12/05/2025 13/05/2025	E-748
Flujo E-748	12/05/2025 13/05/2025	E-748
Relación estabilidad flujo E-748	12/05/2025 13/05/2025	E-748
Vacíos con aire E-748	12/05/2025 13/05/2025	E-748
Vacíos en el agregado min E-799	12/05/2025 13/05/2025	E-799
Relación llenante ligante E-799	12/05/2025 13/05/2025	E-799
Densidad bulk	12/05/2025 13/05/2025	E-733
otros (Especificar)	-	-

3 SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

4 MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2057

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

- **AGOSTO 2024**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	16,67%
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	50,00%
MARIO LEANDRO SALOMON LEON	INSPECTOR DE OBRA	50,00%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	8,33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	ING. AMBIENTAL	8,33%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPOGRAFO	8,33%
ROJAS HERNANDEZ ZULAY VIVIANA	PROFESIONAL SST	33,33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
PINZON ROJAS WILMER ALEJANDRO	INSPECTOR DE OBRA II	100,00%
NELSON CAMILO LEYTON CAMPIÑO.	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
KAREN TATIANA FORERO PINZON	CONTROLADOR VIAL	100,00%
GUZMAN CASALLAS LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
WENDY KARINA CERA	CONTROLADOR VIAL	100,00%
CRISTIAN ARBEY ROJAS SANABRIA	AYUDANTE DE OBRA	100,00%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACIÓN DE PERSONAL OBRA

- **SEPTIEMBRE 2024**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	16,67%
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	50,00%
MARIO LEANDRO SALOMON LEON	INSPECTOR DE OBRA	50,00%

8058

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	8,33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	ING. AMBIENTAL	8,33%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPOGRAFO	8,33%
ROJAS HERNANDEZ ZULAY VIVIANA	PROFESIONAL SST	33,33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
PINZON ROJAS WILMER ALEJANDRO	INSPECTOR DE OBRA II	100,00%
NELSON CAMILO LEYTON CAMPIÑO.	TOPOGRAFO II	100,00%
KAREN TATIANA FORERO PINZON	CONTROLADOR VIAL	100,00%
GUZMAN CASALLAS LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
WENDY KARINA CERA	CONTROLADOR VIAL	100,00%
CRISTIAN ARBEY ROJAS SANABRIA	AYUDANTE DE OBRA	100,00%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACION DE PERSONAL OBRA

- **30 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	16,67%
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	50,00%
DANIELA ANDREA TRIGOS ROJAS	INSPECTOR DE OBRA	50,00%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	8,33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	ING. AMBIENTAL	8,33%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPOGRAFO	8,33%
LEIDY LILIANA SANTAMARIA OLAYA	PROFESIONAL SST	33,33%

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
LEONARDO GUZMAN CASALLAS	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACIÓN DE PERSONAL OBRA

- **FEBRERO DEL 2025**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	16,67%
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	50,00%
DANIELA ANDREA TRIGOS ROJAS	INSPECTOR DE OBRA	50,00%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	8,33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	ING. AMBIENTAL	8,33%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPOGRAFO	8,33%
LEIDY LILIANA SANTAMARIA OLAYA	PROFESIONAL SST	33,33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
LEONARDO GUZMAN CASALLAS	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
ADRIAN FELIPE TOBAR MORENO	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
ALEX DUVAN VELASQUEZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
RICARDO ANDRES ROBAYO HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	100,00%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACIÓN DE PERSONAL OBRA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8060

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

- **MARZO DEL 2025**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	DIRECTORA DE OBRA	16,67%
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	8,33%
CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE	RESIDENTE DE OBRA	41,67%
DANIELA ANDREA TRIGOS ROJAS	INSPECTOR DE OBRA	50,00%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	8,33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	ING. AMBIENTAL	8,33%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPOGRAFO	8,33%
LEIDY LILIANA SANTAMARIA OLAYA	PROFESIONAL SST	33,33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
KAREN TATIANA PINZON FORERO	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
LEONARDO GUZMAN CASALLAS	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
ADRIAN FELIPE TOBAR MORENO	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
ALEX DUVAN VELASQUEZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
RICARDO ANDRES ROBAYO HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
JUAN DAVID ALZA CASTELLANOS	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
ASNETH DAVID PINTO FRANCO	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
ADA LUZ CASTRO ANDRADE	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
AZUCENA QUIROGA ALVARAN	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
MAKENCY ELIUD ROJAS CAMACHO	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
LEIDYS YOHAN GOMEZ MENDOZA	AYUDANTE DE OBRA	100,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2061

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
ALEJANDRO JESUS CASTELLANOS GUARACHE	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
CARLOS ANDRES CIFUENTES PRECIADO	OFICIAL DE OBRA	100,00%
ANDRES FELIPE LADINO CANTOR	NIVELADOR	100,00%
WENDY KARINA CERA ATEHORTUA	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACIÓN DE PERSONAL OBRA

- **ABRIL DEL 2025**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	DIRECTORA DE OBRA	16,67%
CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE	RESIDENTE DE OBRA	50,00%
DANIELA ANDREA TRIGOS ROJAS	INSPECTOR DE OBRA	50,00%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	8,33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	ING. AMBIENTAL	8,33%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPOGRAFO	8,33%
LEIDY LILIANA SANTAMARIA OLAYA	PROFESIONAL SST	33,33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
KAREN TATIANA PINZON FORERO	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
LEONARDO GUZMAN CASALLAS	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
ADA LUZ CASTRO ANDRADE	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
AZUCENA QUIROGA ALVARAN	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
ALEJANDRO JESUS CASTELLANOS GUARACHE	AYUDANTE DE OBRA	100,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2062

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
ANDRES FELIPE LADINO CANTOR	NIVELADOR	100,00%
WENDY KARINA CERA ATEHORTUA	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACIÓN DE PERSONAL OBRA

- **1 AL 15 DE MAYO DEL 2025**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS	DIRECTORA DE OBRA	16,67%
CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE	RESIDENTE DE OBRA	50,00%
DANIELA ANDREA TRIGOS ROJAS	INSPECTOR DE OBRA	50,00%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	8,33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	ING. AMBIENTAL	8,33%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPOGRAFO	8,33%
LEIDY LILIANA SANTAMARIA OLAYA	PROFESIONAL SST	33,33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
KAREN TATIANA PINZON FORERO	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%
LEONARDO GUZMAN CASALLAS	AYUDANTE DE OBRA	100,00%
ANDRES FELIPE LADINO CANTOR	NIVELADOR	100,00%
WENDY KARINA CERA ATEHORTUA	AUXILIAR DE TRANSITO	100,00%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACIÓN DE PERSONAL OBRA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

- **AGOSTO 2024**

Se presentan las planillas de pago N°: **81333375 - 80991604 - 79847428 - 79847602 - 9471490182**

- **SEPTIEMBRE 2024**

Se presentan las planillas de pago N°: **81334520 - 80877749 - 80877882 - 9473852591**

- **30 DE DICIEMBRE 2024**

Se presentan las planillas de pago N°: **84516940 - 83988467 - 82967840 - 84518299 - 9481278247**

- **ENERO 2025**

Se presentan las planillas de pago N°: **84517580 - 84202072 - 84518441 - 9482421483**

- **FEBRERO 2025**

Se presentan las planillas de pago N°: **84965635 - 85040504 - 84964631 - 9483819138**

- **MARZO 2025**

Se presentan las planillas de pago N°: **85457800 - 85458547 - 85854353 - 85335159 - 9485530906**

Anexo: Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

3. GESTIÓN SOCIAL

- **AGOSTO 2024**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	13
Empleos directos generados:	13
Empleos indirectos generados:	0

- **SEPTIEMBRE 2024**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	13
Empleos directos generados:	13
Empleos indirectos generados:	0

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

- **30 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	8
Empleos directos generados:	8
Empleos indirectos generados:	0

- **FEBRERO 2025**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	11
Empleos directos generados:	11
Empleos indirectos generados:	0

- **MARZO 2025**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	23
Empleos directos generados:	23
Empleos indirectos generados:	0

- **ABRIL 2025**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	14
Empleos directos generados:	14
Empleos indirectos generados:	0

- **1 AL 15 DE MAYO DEL 2025**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	11
Empleos directos generados:	11
Empleos indirectos generados:	0

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2065

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

- **AGOSTO 2024**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (edad)	15 a 19 años	0
Etaria (edad)	20 a 59 años	12
Etaria (edad)	Mayor de 60 años	1
Total		**13**
Grupos étnicos	Población indígena	0
Grupos étnicos	Población afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población raizal	0
Total		**0**
Genero	Femenino	5
Genero	Masculino	8
Total		**13**
Población vulnerable	Desplazados	0
Población vulnerable	Discapacitados	0
Población vulnerable	Victimas	0
Total		**0**

- **SEPTIEMBRE 2024**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	12
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	1
Total		**13**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	5
Género	Femenino	8
Total		**13**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2066

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

- **30 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	8
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Total		**8**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	4
Género	Femenino	4
Total		**8**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

- **FEBRERO DEL 2025**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	11
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Total		**11**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	7
Género	Femenino	4
Total		**11**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2064

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

- **MARZO DEL 2025**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	23
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Total		**23**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	14
Género	Femenino	9
Total		**23**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

- **ABRIL DEL 2025**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	14
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Total		**14**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	6
Género	Femenino	8
Total		**14**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

- **1 AL 15 DEMAYO DEL 2025**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	11
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Total		**11**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	5
Género	Femenino	6
Total		**11**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2069

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

- **CONTRATO 774 DE 2022**

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
PRORROGA No.1 (CONTRATO) **01/03/2024**	5 MESES	Se suscribió la prórroga No. 1 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos No. 20211301012240, 2021005500296, 2021005500294, 2021005500297, 2021005500309, 2021005500293, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303,	N/A
PRORROGA No.2 (CONTRATO) **19/04/2024**	23 DIAS	Teniendo en cuenta los plazos de ejecución de los diferentes proyectos que conforman el contrato de obra No. 774 de 2022, se suscribió la prórroga No. 2 al contrato para garantizar la ejecución y cumplimiento de los plazos establecidos referente al proyecto No. 2021005500293.	N/A
PRORROGA No.3 (CONTRATO) **05/08/2024**	2 MESES	Se suscribió la prórroga No. 3 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos No. 20211301012240, 2021005500296, 2021005500294, 2021005500309, 2021005500293, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303, 2021005500299.	N/A
SUSPENSIÓN No.1 (CONTRATO) **29/10/2024**	2 MESES 1 DIA	En aras que todos los proyectos que conforman el contrato de obra No. 774 de 2022 requieren la inclusión de actividades no contempladas dentro del presupuesto inicial, conforme a las diferentes problemáticas que se han presentado durante el tiempo de ejecución, requiriendo el trámite, viabilidad y suscripción de una modificación, por mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, ocasionando la suspensión de los mismos, se solicitó la viabilidad y aprobación de la Suspensión No. 1 al Contrato de obra No. 774 de 2022 por un término de Dos (2) meses y Un (1) día, tiempo estimado que será suficiente para adelantar ante la entidad contratante la gestión y sean subsanados los hechos que dieron origen a la suspensión.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
REINICIO No.1 (CONTRATO) **30/12/2024**	NO APLICA	Teniendo en cuenta que a la fecha ya se superaron los motivos que llevaron a la suspensión N° 1 del contrato de obra No. 774 de 2022; se realizó aprobación de reinicio a los proyectos de BPIN N° 2021005500302 (SAN LUIS DE CUBARRAL), BPIN N° 2021005500296 (PUERTO LLERAS), BPIN N°20211301012240 (CABUYARO), BPIN N°2021005500303 (PUERTO RICO), BPIN N°2021005500308 (EL CASTILLO), BPIN N° 2021005500304 (SAN CARLOS DE GUAROA), BPIN N° 2021005500294 (PUERTO LÓPEZ), BPIN N° 2021005500293 (RESTREPO), BPIN N°2021005500298 (SAN JUAN DE ARAMA), por lo cual se lleva a cabo el reinicio del contrato de obra No. 774 de 2022.	N/A
PRORROGA No.4 (CONTRATO) **30/12/2024**	5 MESES	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500302 (SAN LUIS DE CUBARRAL), BPIN N° 2021005500296 (PUERTO LLERAS), BPIN N°20211301012240 (CABUYARO), BPIN N°2021005500303 (PUERTO RICO), BPIN N°2021005500308 (EL CASTILLO), BPIN N° 2021005500304 (SAN CARLOS DE GUAROA), BPIN N° 2021005500294 (PUERTO LÓPEZ), BPIN N° 2021005500293 (RESTREPO), BPIN N°2021005500298 (SAN JUAN DE ARAMA), se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal, por lo cual realiza la suscripción de prórroga N° 4 al contrato de obra.	N/A

- **PROYECTO BPIN 2021005500304:**

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
PRORROGA No.1 (PROYECTO) **04/12/2023**	3 MESES	Se presentaron atrasos en la aprobación del Plan de Manejo de Transito – PMT el cual fue radicado el 11 de septiembre del 2023 y aprobado el 08 de febrero del 2024, lo cual genero atraso en el inicio de las actividades y el cronograma inicialmente estipulado. Adicional a lo anterior, en las actividades de localización y replanteo de la vía, se tuvo dificultad con la nomenclatura existente del	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
PRORROGA No.2 (PROYECTO) **01/03/2024**	5 MESES	municipio, dado que, en campo se logró ubicar la carrera 16, pero siguiendo el orden de la nomenclatura, no fue posible ubicar las demás direcciones del proyecto, debiendo realizar la gestión para el respectivo plano de nomenclatura ante la alcaldía municipal, el cual fue suministrado el día 29 de septiembre de 2023, generando dificultades en las actividades preliminares y afectando directamente el cronograma inicialmente estipulado.	
PRORROGA No.3 (PROYECTO) **05/08/2024**	2 MESES	Teniendo en cuenta las necesidades que se evidenciaron en campo, surge la necesidad de suscribir acta de Modificación No. 1 del proyecto, donde se realizó el balance de mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión de actividades No Previstas, las cuales son necesarias para la correcta ejecución y alcance del mismo. Por lo anterior, es necesario prorrogar el plazo de ejecución con el fin de poder culminar las actividades faltantes basados en tiempos necesarios en los diferentes procesos constructivos.	N/A
SUSPENSIÓN No.1 (PROYECTO) **30/09/2024**	3 MESES	A la fecha, el proyecto requiere la inclusión de actividades no contempladas dentro de las actividades iniciales del presupuesto, conforme a las diferentes problemáticas que se han presentado durante el tiempo de ejecución, requiriendo el trámite, viabilidad y suscripción de una modificación, por mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, ocasionando la suspensión del proyecto.	N/A
REINICIO No.1 (PROYECTO) **30/12/2024**	N/A	Teniendo en cuenta que a la fecha ya se superaron los motivos que llevaron a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 774 de 2022; se realizó aprobación de reinicio a los proyectos de BPIN N° 2021005500302 (SAN LUIS DE CUBARRAL), BPIN N° 2021005500296 (PUERTO LLERAS), BPIN N°20211301012240 (CABUYARO), BPIN N°2021005500303 (PUERTO RICO), BPIN N°2021005500308 (EL CASTILLO), BPIN N° 2021005500304 (SAN CARLOS DE GUAROA), BPIN N° 2021005500294 (PUERTO LÓPEZ), BPIN No. 2021005500293 (RESTREPO), BPIN N°2021005500298 (SAN JUAN DE ARAMA), por lo cual se lleva a cabo el reinicio.	N/A
PRORROGA No.4 (PROYECTO) **30/12/2024**	2 MESES	Se suscribe acta de prorroga número 4 al proyecto, debido a que, por los inconvenientes presentados en campo, fue necesario realizar balance de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos en el presupuesto inicial, para lograr el cumplimiento de la ejecución en su totalidad del objeto del proyecto, se aprobó la suscripción de la prórroga al proyecto.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8052

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
PRORROGA No.5 (PROYECTO) **04/03/2025**	2 MESES	Una vez superadas las causales que dieron origen a la suspensión del proyecto, se firmó acta de reinicio el día 30 de diciembre de 2024, con lo cual, se procedió a la socialización del reinicio de la obra con la comunidad, coordinando con las autoridades municipales las actividades necesarias, en cumplimiento de los requisitos correspondientes para el inicio de actividades físicas en campo; lo cual se llevó a cabo el día 20 de febrero del año en curso, acordándose con la comunidad realizar la verificación de las actas de vecindad inicialmente realizadas con los propietarios de los predios circundantes, para de esta manera proceder a la ejecución de las actividades, obligando a la disposición de tiempo adicional a la programación de la obra. Así mismo, después de tres (3) meses de no desarrollo de actividades en obra, por suspensión suscrita, se evidencia en campo que, parte de las labores de estructura de pavimento (sub base granular) en la que se dejó la vía intervenida, presenta algunas condiciones técnicas de deterioro por acción de lluvia y tránsito de vehículos, que deben ser verificadas y atendidas, por lo cual, ha sido necesario proceder al chequeo con la topografía, con el fin de establecer y cuantificar la variación de las condiciones en los niveles de instalación del material de sub-base granular, garantizando las condiciones y especificaciones técnicas según el diseño establecido para la vía. Por lo tanto, estas labores de chequeo y verificación por la topografía y el personal en campo, las cuales son necesarias, tanto para la estabilidad de la obra, como para dar continuidad a las demás actividades requeridas en la ejecución del proyecto, han generado una afectación en la programación de obra, siendo necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes conforme a los procesos constructivos.	N/A
PRORROGA No.6 (PROYECTO) **25/03/2025**	1 MES Y 1 DIA	Teniendo en cuenta las dificultades presentadas para la adquisición de material granular requerido para el proyecto y la disponibilidad de maquinaria, necesarias e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos y el desarrollo de las actividades conforme a la programación de obra, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2073

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

- **CONTRATO 774 DE 2022**

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
ADICIÓN No.1 (CONTRATO) **30/12/2024**	$ 9.280.219.314,16	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500302, BPIN N° 2021005500296, BPIN N°20211301012240, BPIN N°2021005500303, BPIN N°2021005500308, BPIN N° 2021005500304, BPIN N° 2021005500294, BPIN N° 2021005500293, BPIN N°2021005500298, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 9.280.219.314,16, y prórroga en tiempo para cada uno de los proyectos, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°4 y prórroga N° 4 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos.	N/A

- **PROYECTO BPIN 2021005500304**

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	**VALOR ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
ADICIÓN No.1 (PROYECTO) **30/12/2024**	$ 342.028.603,91	Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($342.028.603,91) y una prórroga por dos (02) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500304 del contrato de obra No. 774 de 2022.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

- **CONTRATO 774 DE 2022**

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
MODIFICACIÓN No.1 (CONTRATO) **06/06/2024**	$27.816.678.109,00	Se suscribió la Modificación No. 1 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos de los proyectos BPIN No. 2021005500302, BPIN No. 2021005500303, BPIN No. 2021005500298, BPIN No. 2021005500293.	N/A
MODIFICACIÓN No.2 (CONTRATO) **14/06/2024**	$27.816.678.109,00	Se suscribió la Modificación No. 2 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos de los proyectos BPIN No. 2021005500296, BPIN No. 2021005500294, BPIN No. 20211301012240.	N/A
MODIFICACIÓN No.3 (CONTRATO) **20/06/2024**	$27.816.678.109,00	Se suscribió la Modificación No. 3 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos de los proyectos BPIN No. 2021005500308, BPIN No. 2021005500304.	N/A
MODIFICACIÓN No.4 (CONTRATO) **30/12/2024**	$37.096.897.423,16	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500302 (SAN LUIS DE CUBARRAL), BPIN N° 2021005500296 (PUERTO LLERAS), BPIN N°20211301012240 (CABUYARO), BPIN N°2021005500303 (PUERTO RICO), BPIN N°2021005500308 (EL CASTILLO), BPIN N° 2021005500304 (SAN CARLOS DE GUAROA), BPIN N° 2021005500294 (PUERTO LÓPEZ), BPIN N° 2021005500293 (RESTREPO), BPIN N°2021005500298 (SAN JUAN DE ARAMA), se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 9.280.219.314,16, y prórroga en tiempo para cada uno de los proyectos, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°4 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento a los proyectos del Contrato de Obra 774 de 2022.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2075

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

- **PROYECTO BPIN 2021005500304**

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
MODIFICACION No. 1 (PROYECTO) **20/06/2024**	$ 684.072.727,00	Se suscribió la Modificación No. 1 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos del proyecto BPIN No. 2021005500304, del contrato de obra N° 774 de 2022 con el fin de garantizar el correcto desarrollo y funcionalidad del mismo.	N/A
MODIFICACION No. 2 (PROYECTO) **30/12/2024**	$ 1.026.101.330,91	Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($342.028.603,91) y una prórroga por dos (02) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 2021005500304 del contrato de obra No. 774 de 2022.	N/A

2. GARANTÍAS:

Para la ejecución del contrato de obra No. 774 de 2022 por parte del CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, el cual cuenta con las pólizas de la empresa SEGUROS MUNDIAL, mediante póliza de Cumplimiento No. CV-100030690 y póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. CV-100007789, que garantizan la ejecución del proyecto. A continuación, se describe cada una de las pólizas.

Pólizas Firma del Contrato

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100030690**
ANEXO N°	**0**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100007789**
ANEXO N°	**1**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**10/05/2023**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8076

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500304**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	26/12/2022	26/01/2024	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	26/12/2022	26/01/2024	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	26/12/2022	26/07/2026	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	26/07/2023	26/07/2028	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	26/07/2023	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Acta de Inicio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100030690**
ANEXO N°	**3**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100007789**
ANEXO N°	**3**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**08/09/2023**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/08/2023	13/09/2024	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/08/2023	13/09/2024	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	14/08/2023	14/03/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/03/2024	14/03/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	14/03/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Prorroga 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100030690**
ANEXO N°	**4**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100007789**
ANEXO N°	**4**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**18/03/2024**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8077

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	01/03/2024	13/02/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	01/03/2024	13/02/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	01/03/2024	13/08/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/08/2024	13/08/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	13/08/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Prorroga 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	5
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	5
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	30/04/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	19/04/2024	08/03/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/04/2024	08/03/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2024	08/09/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/09/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Modificación No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	6
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	6
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/07/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2078

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	06/06/2024	08/03/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	06/06/2024	08/03/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2024	08/09/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/09/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Modificación No. 2 y 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100030690**
ANEXO N°	**7**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100007789**
ANEXO N°	**7**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**04/07/2024**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	20/06/2024	08/03/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/06/2024	08/03/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	20/06/2024	08/09/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/09/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Prorroga No. 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100030690**
ANEXO N°	**8**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100007789**
ANEXO N°	**8**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**27/08/2024**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8879

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/08/2024	05/05/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	05/08/2024	05/05/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	05/08/2024	05/11/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/11/2024	05/11/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/11/2024	$ 1.390.833.05,45

Pólizas Según Acta de suspensión N°1 y Acta de Reinicio N° 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	9
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	9
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/02/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	06/07/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30/12/2024	06/07/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	30/12/2024	06/01/2028	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/01/2025	06/01/2030	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	06/01/2025	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Según Acta de modificación N° 4, Adición N°1, Prorroga N°4

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	10,11
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	10,11
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/02/2025

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2020

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	06/12/2025	$ 3.709.689.748,32
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30/12/2024	06/12/2025	$ 7.419.379.496,63
PRESTACIONES SOCIALES	30/12/2024	06/06/2028	$ 1.854.844.874,16
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/06/2025	06/06/2030	$ 3.709.689.748,32
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	06/06/2025	$ 1.854.844.874,16

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha del presente informe se han realizado los siguientes desembolsos:

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR ACTA	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANTICIPO INICIAL	156329823	21/11/2023	-	$136.814.545,40	-	-	-
PARCIAL # 1	185485624	24/10/2024	32,03%	$328.654.911,86	$ 65.730.982,37	-	$262.923.929,49
ANTICIPO ADICIONAL	191216925	13/02/2025	-	$ 68.405.720,78	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES			32,03%	$328.654.911,86	$ 65.730.982,37	-	$262.923.929,49

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *30/08/2024 AL 15/05/2025*

Avance físico ejecutado acumulado 93,61% y avance financiero ejecutado 32,03%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2021

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
1,2	DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (CONCRETO E=0.15M)	184,04 M3	50,84%



OBSERVACIONES
Se realiza la demolición de pavimento rígido en las áreas a intervenidas.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8052

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
1,3	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS INCLUYE CARGUE	110,08 M3	6,75%



OBSERVACIONES
Se realiza excavación mecánica, haciendo control de volúmenes de excavación y en trabajo conjunto con topografía.

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	126,14 VJ	34,28%

1,4



OBSERVACIONES
Se realiza el transporte para la disposición final del material proveniente de las excavaciones y demoliciones, mediante las volquetas para ser transportado al sitio autorizado por la alcaldía municipal.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2024

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
1,5	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	1.736,93 M2	98,60%

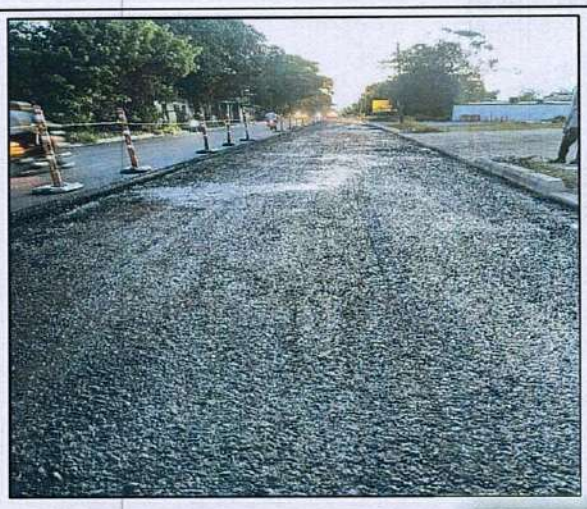



OBSERVACIONES
Se realiza imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento lento.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2025

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
1,6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	173,70 M3	98,60%





OBSERVACIONES
Se instala mezcla densa en caliente tipo MDC-19 según el espesor y ancho del perfil vial.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2026

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
1,7	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO,	84,83 M3	27,17%





OBSERVACIONES
Se realizó la instalación de relleno con material mixto de rio donde se presentaron fallos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

60e7

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	351,99 M3	99,91%

1,8





OBSERVACIONES
Se hace la extensión y compactación de la base granular con motoniveladora garantizando el espesor según diseño del pavimento.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2088

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
1,9	SUB-BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	269,93 M3	41,88%





OBSERVACIONES
Se hace la extensión y compactación de la capa de sub-base con motoniveladora y vibro compactador de 12 Ton con el espesor según diseño del pavimento.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2029

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	270,72 ML	66,94%

NP 1





OBSERVACIONES
Se realiza la instalación de sardinel tipo A-10 para el confinamiento de la vía en los siguientes tramos: Calle 5 desde Carrera 17 Hasta Carrera 18 (Izquierda - Derecha) .

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2090

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	10,00 ML	98,04%

NP 2





OBSERVACIONES
Se realiza la instalación de bordillo tipo A-85 para los accesos vehiculares en los siguientes tramos: Calle 5 desde Carrera 17 hasta Carrera 18 (Izquierdo - Derecho).

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2091

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	10,00 ML	98,04%



NP 3



OBSERVACIONES
Se realiza la instalación de bordillo tipo A-100 para los accesos vehiculares en los siguientes tramos: Calle 5 desde Carrera 17 hasta Carrera 18 (Izquierdo - Derecho).

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2092

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
1.11	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	10.508,85 M3/KM	98,60%





OBSERVACIONES
La mezcla asfáltica se trasporto en volquetas desde la planta asfáltica hasta el sitio de la obra. Las volquetas iban debidamente carpadas para mantener la temperatura de la mezcla asfáltica.

GOBERNACIÓN DEL META


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2093

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
1.12	TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR	28.835,39 M3/KM	53,99%

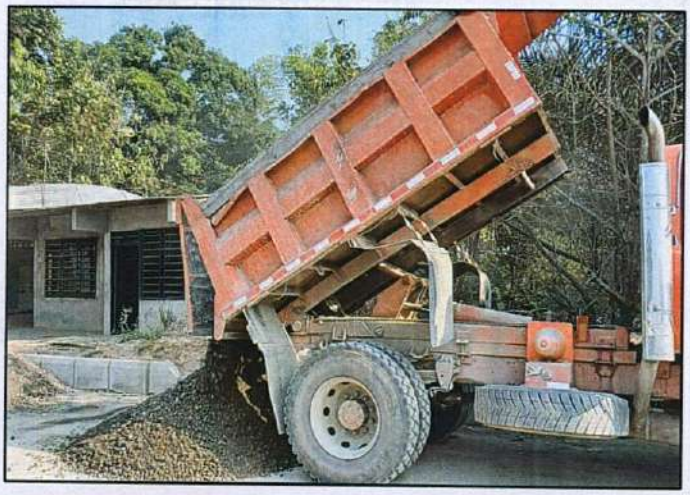



OBSERVACIONES
Se transporta material granular en volquetas hasta el sitio de la obra.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2094

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	4,00 ML	100,00%

NP 4





OBSERVACIONES

Se realizó la construcción del sumidero en concreto con su respectiva rejilla, esto para dar manejo a las aguas lluvias de la vía intervenida.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8095

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	3,00 UN	100,00%

NP 5





OBSERVACIONES
Se instalaron las placas cubiertas de los pozos de las vías intervenidas, las cuales fueron fundidas en concreto reforzado.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2016

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	59,96 M3	92,59%

NP 6





OBSERVACIONES

Se realiza el relleno con material proveniente de la excavación seleccionado y se realiza la compactación de acuerdo a los procesos constructivos para darle estabilidad a los bordillos instalados en las calles intervenidas.

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	CARGUE MECÁNICO PARA DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	440,26 M3	93,55%

NP 7



OBSERVACIONES
Se realizo el cargue mecánico de los escombros generados por las demoliciones en los tramos intervenidos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4048

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
NP 8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	10,30 ML	73,57%





OBSERVACIONES
Se hace suministro e instalación de tubería PVC de 10" con el fin de conectar los sumideros a los pozos de alcantarillado pluvial existentes.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2099

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	5,24 M3	76,05%

NP 9



OBSERVACIONES
Se realizó demolición del concreto reforzado correspondiente a las placas de los pozos y sumideros existentes que se encontraban en mal estado.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	39,15 ML	96,31%

NP 10



OBSERVACIONES
Se realizó instalación de tubería de 6" para las conexiones de las acometidas. Esta tubería se empleó para las domiciliarias del sistema de alcantarillado.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8102

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	27,66 M3	99,39%

NP 11





OBSERVACIONES
Se realiza la excavación manual para llevar a cabo la instalación de tubería de 6" y también las tuberías de 10"para la conexión de los sumideros a pozos de inspección, en las vías intervenidas.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8103

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	15,20 M3	88,79%

NP 12





OBSERVACIONES
Se realiza la demolición de pavimento asfaltico en el área de la vía donde se encontró este material existente.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8104

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	CAPA ASFALTICA	**EJECUTADO**	**%**
	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERÍAS	9,81 M3	39,67%

NP 13





OBSERVACIONES
Se realizó la instalación de la cama de arena para la cimentación y protección de las tuberías.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL No. 02

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- El avance generado en las actividades contractuales acumuladas a la fecha que corresponde al periodo comprendido entre el 06 de septiembre 2023 al 15 de mayo del 2025 es un porcentaje total del 93,61%.
- El presente cobro parcial comprendido entre el periodo 30 de agosto 2024 al 15 de mayo de 2025, corresponde al 32,03% es por un valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 589.261.789,76).
- Las actividades ejecutadas en el presente periodo han sido realizadas de acuerdo a los parámetros y especificaciones establecidas y han sido verificadas en terreno mediante el seguimiento diario en conjunto con la Interventoría.
- Los materiales empleados para la ejecución de las actividades han cumplido con la normatividad vigente, la cual puede ser verificada en los informes de laboratorio anexos al presente tramite.

H. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 15 días del mes de mayo de 2025.

Firmas:

Nombre: **ASTRID CONSTANZA PARRADO ROJAS**
Director de obra
N° Matrícula Profesional: 25202-096145 CND

Nombre: **CRISTIAN ALEXANDER MESA PUENTE**
Residente de obra
N° Matrícula Profesional: 091037-0593526 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

e106

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

BITACORA DE OBRA (Copia)

112-ECP-FR-022

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

BITACORA
AGOSTO DEL 2024

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900220547-5

8108

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	30	8	2024	7:00 AM	5:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				NIVEL	1	
OFICIAL				ESTACION TOTAL	1	
OPERARIO	3	SI				
AYUDANTE	3	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2109

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	30	8	2024	7:00 AM	5:00 PM

OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON DURANTE LA JORNADA LABORAL

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8110

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	31	8	2024	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						
AUXILIAR VIAL						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

211

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	31	8	2024	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE LABORA EN OBRA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8112

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

BITACORA
SEPTIEMBRE DEL 2024

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

2113

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	01	09	2024	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
AUXILIAR VIAL						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

914

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	01	09	2024	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE LABORA, DIA DOMINGO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-78810 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ells

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	02	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500296
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSO.
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR						
AUXILIAR VIAL	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

116

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	02	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA JORNADA CON CHARLA SOBRE EL ASEO EN OBRA.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPO DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-067331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	03	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSO.
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

2118

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	03	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPO DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

SE REALIZA JORNADA DE ASEO EN LA OBRA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	4	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2120

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	4	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA Y CONTROL DOCUMENTAL DEL PROYECTO.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8121

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	5	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8172

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	5	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA JORNADA CON EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO AL PERSONAL DE OBRA

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA, SE HACE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2123

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	6	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			MAÑANA NUBLADA Y TARDE SOLEADA.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

2124

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	6	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.

SE REALIZA RECORRIDO EN LA VIA INTERVENIDA, SE HACE ASEO Y CAMBIO DE CINTA DE SEÑALIZACION DONDE SE ECONTRABA EN MAL ESTADO.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

125

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	07	09	2024	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
AUXILIAR VIAL						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

226

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	07	09	2024	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE LABORA EN OBRA.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 6
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

127

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	08	09	2024	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
AUXILIAR VIAL						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

E12E

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	08	09	2024	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE LABORA, DIA DOMINGO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

8129

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	09	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
hptts://aim-meta.gov.co

2130

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	09	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA JORNADA CON CHARLA SOBRE ¿QUÉ ES EL PELIGRO? SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
hptts://aim-meta.gov.co

2131

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	10	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

E132

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	10	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA Y REVISION DOCUMENTAL DEL PROYECTO.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	11	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
hptts://aim-meta.gov.co

e134

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	11	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA JORNADA CON CHARLA SOBRE EVIDENCIAR RIESGOS PRESENTES, PUESTO DE TRABAJO. CONTINUA ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA Y REVISION DOCUMENTAL DEL PROYECTO. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	12	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			MAÑANA NUBLADO Y TARDE SOLEADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

2136

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	12	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

CONTINUA ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA Y REVISION DOCUMENTAL DEL PROYECTO.

SE REALIZA RECORRIDO POR LA OBRA Y SE REALIZA ASEO Y LIMPIEZA DE LA VIA.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 CND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78510 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	13	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSO.
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	13	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA JORNADA CON CHARLA SOBRE: ¿QUÉ ES EL RIESGO?. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA. NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPO DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	14	09	2024	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
AUXILIAR VIAL						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TECNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	14	09	2024	-	-

OBSERVACIONES GENERALES
NO SE LABORA EN OBRA

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 CND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	15	09	2024	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
AUXILIAR VIAL						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	15	09	2024	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

NO SE LABORA, DIA DOMINGO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 13202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 63202-098436 CND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	16	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSO.
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	16	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA, SE HACE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TECNICA DEL PROYECTO NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CAMPO DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN EL TRAMO INTERVENIDO.

FIRMAS			
NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
ANA MARIA FRUTO NIETO	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 19202-087331 CAU	
JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 63202-096436 QND	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-78610 CND	
RAFAEL ALFREDO VILLAR OSPINA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-100820 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
hptts://aim-meta.gov.co

8145

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN CARLOS DE GUAROA	17	09	2024	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500304
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17 Y 18 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	13 MESES		

ESTADO DEL CLIMA				
ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS						
PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	1	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO						
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR VIAL	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS					
ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA	
IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

8146
