INFORME DE INTERVENTORIA No. 25

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005-2022

CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.05.003-2022

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

INTERVENTOR:CONSORCIO INTERGUACARI

CONTRATISTA: CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

FECHA: MAYO 31 DE 2025

NOMBRE: EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

CARGO : REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA: _____
Representante de la Interventoria

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FECHA:	**MAYO 31 DE 2025**	**PERIODO:**	**01 AL 31 DE MAYO DE 2025**
INFORME No.	**25**		

CONTRATO: 2000.13.12.005-2022

CONTENIDO

ÍTEM	DESCRIPCION	SE REQUIERE S/N	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	ACCIONES A SEGUIR
1	INFORMACION GENERAL	S	S		
1.1	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	S	S		
2	CONTROL DE GARANTIAS	S	S		
2.1	SANCIONES	N	N		
3	CONTROL FINANCIERO	S	S		
4	CONTROL DE EJECUCION	S	S		
4,1	CÁLCULO DE AVANCE FÍSICO	s	S		
5	ANEXOS	S	S		
5.1	ASPECTOS TECNICOS	S	S		
5.2	CONTROL DE CALIDAD	S	S		
5.3	ASPECTOS AMBIENTALES	S	S		
5.4	ASPECTOS SOCIALES	S	S		
5.5	PREDIOS, SERVIDUMBRES Y PERMISOS	S	S		
5.6	RECURSO HUMANO	S	S		
5.7	MAQUINARIA Y EQUIPO	S	S		
5.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	S	S		
5.9	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	S	S		
5.10	INFORME DEL CONTRATISTA	S	S		
6	ASPECTOS CRITICOS DEL CONTRATO	S	S		
7	CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES	S	S		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No 25	PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

1. INFORMACION GENERAL

1.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	1.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA
CONTRATO No. 2000.13.12.005-2022	CONTRATO No. 2000.13.05.003-2022
OBJETO DEL CONTRATO:REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACI6N PUBLICA No. 2000.46.01 .005-)22, CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACI6N, ADUCCI6N, CONDUCCI6N Y OPTIMIZACI6N DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS CUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA	OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUACARI	CONTRATISTA:CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CARDENAS R.	REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
PLAZO INICIAL: 16 MESES	PLAZO INICIAL: 13 MESES
ACTA DE INICIO:01-DICIEMBRE-2022	ACTA DE INICIO:01 DICIEMBRE 2022
VALOR INICIAL: $ 1.502,246.766	VALOR INICIAL: $ 29.432.080.933
CDR INICIAL No. 13041	CDR INICIAL No. 13039 - 13040
FECHA DE TERMINACION: 31-MAR-2024	FECHA DE TERMINACION: 01 ENERO 2024
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): N/A	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (1): 21- FEBRERO-2023
VALOR ADICION (ES): $ 131,126,000	VALOR ADICION (ES): $N/A
DR OTRO SI (1) No.16431	CDR OTRO SI (1) No.N/A
VALOR ACTUAL:$ 1,633,372,766	VALOR ACTUAL: $29.432.080.933
PLAZO ADICIONAL: N/A	PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE TERMINACION: N/A	FECHA DE TERMINACION: N/A
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (2): N/A
VALOR ADICION (ES): $ N/A	VALOR ADICION (ES): $2,571,146,616
CDR OTRO SI (2) No.N/A	CDR OTRO SI (2) No.16430
VALOR ACTUAL: $N/A	VALOR ACTUAL: $32,003,227,549
PLAZO ADICIONAL: N/A	PLAZO ADICIONAL: N/A
FECHA DE TERMINACION: N/A	FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3): N/A	FECHA DE SUSCRIPCION OTRO SI (3):
VALOR ADICION (ES): $ N/A	VALOR ADICION (ES): $
CDR OTRO SI (3) No.N/A	CDR OTRO SI (3) No.
VALOR ACTUAL: $N/A	VALOR ACTUAL: $
PLAZO ADICIONAL: SIETE MESES	PLAZO ADICIONAL: NUEVE MESES

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No 25	PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-SEPTIEMBRE-2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 14-JUNIO-2024
FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023	FECHA DE SUSPENSION: 27-JULIO-2023
FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024	FECHA DE REINICIO: 10-ENERO-2024
PLAZO ADICIONAL: 15-ABRIL-2025	PLAZO ADICIONAL: 14-MARZO-2025
PLAZO ADICIONAL: 22 DE FEBRERO DE 2026	PLAZO ADICIONAL: 22-ENERO-2026
DATOS DE LA SUPERVISIÓN	
Cargo y Nombre del Supervisor designado mediante memorando	DIEGO JOSÉ CALDERÓN V.
Nombre contratista de apoyo a la Supervisión de VALLECAUCANA DE AGUAS SA ESP que conoció de la ejecución del contrato	HOLMES ZUÑIGA GARCIA

VALLE CAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25		PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

1.1 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema de seguridad social y salud en el trabajo. (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido par La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI		
Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoria.	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25		PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

	Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (iii)	Observaciones (iv)
1.	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez per ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje superior que no supere el treinta per ciento (30%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5%, sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el 30%de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	SI		
2.	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación	SI		
3.	Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	SI		
4.	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	SI		
5.	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI		
6.	Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con permisos emitidos per la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	SI		
7.	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selecci6n en los plazos acordados con la Entidad.	SI		
8.	Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	SI		
9.	Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	SI		
10.	Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	SI		
11.	Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	N/A		
12.	Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	SI		
13.	Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativas a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25		PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

14.	Informar periodicamente la composicion del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, sí se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la informacion relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	SI		
15.	Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	SI		
16.	Informar a mas tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	N/A		
17.	El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001 :2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) hábiles siguientes a la suscripcion del contrato.	SI		
18.	El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de obra contratada por la entidad.	SI		
19.	El Contratista se compromete a adquirir las bienes nacionales relevantes definidos par la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir las bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	SI		
20.	Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisicion de las bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
21.	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.	SI		
22.	Estar en permanente comunicaci6n con el interventor del contrato.	SI		
23.	Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	SI		
24.	Disponer del personal idóneo, así coma de las recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	SI		
25.	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido par el contratante.	SI		
26.	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así coma con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PAP - PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25		PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

27.	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la Ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.	SI		
28.	Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	SI		
29.	Reportar la informacion relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida par el contratante.	SI		
30.	Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando par su culpa se produzca daño o perdida, sin que esto excluya indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.	SI		
	Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato (I)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación (III)**	**Observaciones (IV)**
	OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRA TIVO:			
	1. informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o case fortuito, al interventor del contrato y recomendar la actuacion que debe proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecución del contrato.	SI		
	2. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución de los contratos, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	SI		
	3. Elaborar y suscribir las actas de las reuniones que se realicen en ejecución de las obras. Las actas deberán ser entregadas a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, debidamente suscrita por los asistentes.	SI		
	4. Contar con los equipos, materiales, vehículos e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades en el Municipio que hacen parte del objeto contractual.	SI		
	5. Presentar al Interventor del contrato, con un plazo máximo de cinco (5) días calendario de antelacion al inicio de la obra, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepcion de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal propuesto a la entidad.	SI		
	6. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato.	SI		
	7. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les-asignara labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente).	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25		PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:	

8. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidacion del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario.	SI		
9. En case que la obra requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado. En todo caso, el interventor deberá aprobar previamente el remplazo.	SI		
10. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyude su personal o sus subcontratistas con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, por causa o con ocasion del contrato.	N/A		
11. Asumir por su cuenta y riesgo, el page de los salaries, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vinculo laboral de tal personal con la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P, ni responsabilidad en los riesgo que se deriven de la contratacion. El contratista estará obligado a tramitar los documentos necesarios y requeridos por el consorcio para el pago del RETEICA	SI		
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO.			
1. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el cumplimiento del personal mínimo exigido en cada uno de las obras, tal como se presenta en el Anexo técnico. Además, debe garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente.	SI		
2. Tener la disponibilidad de los profesionales presentados en su propuesta, los cuales deben asistir obligatoriamente a las reuniones que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P. considere pertinentes. Los Comités Técnicos de Obra serán convocados por la interventoria y deben contar con la presencia del Director de Obra, el Residente de Obra y de los profesionales que sean necesarios y que hagan parte del personal mínimo presentado en la propuesta por el Contratista.	SI		
3. Convocar para el primer Comité de Obra a todos los profesionales que conforman el personal mínimo requerido aprobado, y garantizara que todos los profesionales de su equipo conozcan al 100% el pliego, el contrato y por ende las obligaciones adquiridas por el Contratista.	SI		
4. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la obra así mismo el personal administrativo y técnico de acuerdo con el análisis detallado del valor porcentual del AIU, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la obra deberá tener todo el personal con las afiliaciones de Ley a la Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales)" y realizar los aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25		PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

5. Deberá también responder por todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de todo el personal vinculado en la ejecución del contrato. Presentar mensualmente a la interventoría un informe en el que se consigne el trabajo ejecutado en el mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad ejecutada, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias.	SI		
6. También debe adjuntar fotografías (fecha y hora) y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados.	N/A		
7. De presentarse atraso en la programaci6n inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma, a estos informes se les deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. El informe deberá contener los avances acompañadas y por novedades gráficos, técnicas, cuadros, fotografías, administrativas, análisis y contables comentarios y financieras.	N/A		
8. Suscribir con la interventor a de obra una bitácora diaria, en la que se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá foliarse y firmarse por el director de obra y por el director de interventoría. Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado.	SI		
9. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluacion de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista de obra, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
10. Revisar, junto con la interventor a, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos, especificaciones de construcción, yen general, toda la información referente al proyecto, con el propósito de evaluar que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el normal desarrollo del proyecto.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
11. Verificar las áreas y cotas topográficas en terreno, comprobando las cantidades de obra y el presupuesto establecido en el contrato, e informar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. sobre aspectos que repercutan en el normal desarrollo y comprometan el objeto del contrato, dentro de los quince (15) das siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. De todas maneras, deberán presentar a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. un informe detallado con registro fotográfico de todo el proceso de revisión del proyecto con sus respectivas observaciones.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

INFORME No. 25		PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

12. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesaria para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su efecto del interventor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado o de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y)o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente.	**SI**		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
13. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante y después de ejecutadas.	**SI**		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
14. Suministrar a la interventoría oportunamente las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnica acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por cuenta del contratista de obra, a la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia del informe mensual y los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos deberán ser hechos a los siguientes materiales: agregados finos y gruesos, concrete (cilindros y núcleos), sub-base o bases compactadas y todos aquellos que la interventoría o la supervisión estime convenientes.	**N/A**		
15. El contratista deberá entregar el certificado de calidad del laboratorio y calibración de los equipos donde cumple con la normativa vigente.	**SI**		
16. Pactar con la interventoría de obra y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., los precios de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El interventor, previa consulta con VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., quien deberá autorizarlo, analizara y validara, los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborara las especificaciones técnicas respectivas. Justificar la necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del contrato de obra. No obstante, lo anterior, los nuevos precios serán los que VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P apruebe a través del interventor. Los valores unitarios de cada ítem durante la ejecución de la obra, serán calculados de acuerdo al formulario de precios elaborados por el Ministerio en principio, sino existe dicho valor descrito, se verificara conforme a la tabla de la Gobernación de precios oficiales Decreto N°1-17-1276 del 10 de noviembre de 2021. Si existe una actividad no incluida en el listado de la Gobernación, se presentara por parte del contratista un APU y se evaluara en conjunto por la INTERVENTORÍA y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	**N/A**		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25		PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

17. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el termino previsto; coordinando con el personal que designe VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., la ejecución del contrato en la medida que el cumplimiento de este lo demande.	SI		
18. Cuando por causas imputables al Contratista, fuere necesario prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra, por ende, del Contrato del Interventor, el contratista deberá responder por los costos de honorarios adicionales originados por la prorroga. Lo anterior una vez se surta el debido proceso al contratista.	N/A		
19. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, en cualquier memento que lo estime conveniente VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		
20. No interferir la interventoría pactada en el contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato.	SI		
21. Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a los planos y diseños propuestos y avalados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.requeridos para la construccion de la obra. Obrar con honradez y lealtad, no solo en la realizacion de la obra, sino también frente a la compra de materiales ante la interventoria, el contratante o sus representantes.	N/A		
22. Colocar la valla y todas las seriales preventivas y de seguridad que se requieran en la obra, de conformidad con los diseños entregados por VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	SI		
23. Realizar por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a las estructuras ya todas las redes de instalaciones, incluida la desinfeccion de redes, y hacer las correcciones, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoría y VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.	N/A		
24. Entregar al contratante los planos record de la obra.	N/A		
25. Entregar las instalaciones construidas y funcionando.	N/A		
26. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, así mismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la interventoria.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
27. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y de Riesgo del sistema, si aplica. Para la contratacion el contratista se obliga a contratar mínimo el 10% del personal de la mano de obra no calificada de la región.	SI		
28. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados a la empresa.	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019
INFORME No. 25	PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025	

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:	

29. Elaborar y ejecutar un Plan de gestión Social que acompañe a la comunidad beneficiada por las obras con un cubrimiento antes, durante y después de la ejecución las obras. Este será orientado, aprobado y supervisado por el Interventor, si aplica. EL CONTRATISTA presentara a VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. todos los documentos exigidos en las consideraciones anteriores y los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:	SI		
PLAN DE TRABAJO DE OBRA			
VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y PLANOS Y ESTADO DEL ÁREA DE TRABAJO	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
PLAN DE INVERSIÓN - DEL ANTICIPO	SI		
PLAN DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI		
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SI		
INFORME DE LABORES	SI		
BITÁCORA	SI		
ÍTEMS NO PREVISTOS	SI		
INFORME FINAL	N/A		
Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución que a continuacion se transcriben: Cumplir en todo sentido con lo dispuesto en el "Manual de Serializacion Vial del Ministerio de Transporte". Cumplir con buenas practicas ambientales.	SI		
Entregar las obras en perfecta estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de las plazas acordados contractualmente.	N/A		
Toda el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, incluido el titular del contrato, deberá estar afiliado, desde el mismo día de inicio de las obras, a las Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) sobre el salario real devengado, teniendo en la normatividad que rige la materia.	SI		
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá coma mínimo estar afiliado a salud y pensión en las porcentajes que establece la ley; la afiliacion y pago del Contratista deberán ser presentados al Interventor del Contrato..	N/A		
Toda personal que labore en la obra deberá estar identificado y llevara impreso nombre del Contratista o la razón social del contratante	SI		
En el evento de tratarse de un consorcio o unión temporal es decir se trate de personas jurídicas, estas deberán acreditar el pago de los aportes de seguridad social de acuerdo a lo previsto en el inciso 3 del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Circular N° 060001 del 6 de diciembre de 2004 del Ministerio de Protección Social y las que modifiquen o reglamenten la materia.	SI		
La zona de trabajo deberá permanecer serializada tanto en horas diurnas como en horas nocturnas.	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25		PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:

El Contratista deberá disponer todos los escombros producto de las respectivas demoliciones en la escombrera municipal autorizada, adicionalmente, los vehiculos utilizados para el transporte de los escombros, deberá estar protegido con una Lona o similar, para evitar la caída de estos escombros en la vía.	SI		
Los vehiculos utilizados por el Contratista, deberán cumplir con las normas legales de transito, por lo cual deberá anexar en el momento de iniciar los trabajos objeto de este contrato el certificado ambiental, y certificado tecnico-mecanico.	SI		
Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construccion así sean de empresas de alquiler, deberá tener la respectiva afiliación a riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa del Contratista.	SI		
Elaborar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por la ley, el interventor hará el seguimiento y control. Implementar el Plan de gestión Social, haciéndole el seguimiento y control que corresponde; así como también el proceso de capacitacion que acompañe y fortalezca a la comunidad beneficiada	SI		ACTIVIDAD EN IMPLEMENTACIÓN
El Contratista debe tener una oficina fija bien dotada donde se lleva a cabo la obra y que logísticamente sea el lugar mas conveniente, durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, en la cual deberán permanecer los profesionales exigidos y demás personal auxiliar que se requiera para la ejecución del proyecto. Dentro de esta oficina se deberá adecuar un espacio para que la interventoría, realice sus labores. De realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan presentar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben serializarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevenci6n. Todas las seriales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo. No se permitirá utilizar mecheros para las señalizaciones nocturnas, las serial luminosas deben ser de luz opaca.	SI		
Apoyar en el tramite y mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la adecuada ejecución del contrato.	SI		
Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal ejecución del contrato; para lo cual deberá tomar las medidas necesarias para asegurar el reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, maternidad, accidentes, calamidad domestica, etc.	SI		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PAP - PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORÍA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25	PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

PROYECTOS INCLUIDOS: EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA."

ESTUDIOS Y DISEÑOS		OBRA	X	OTRO		ESPECIFIQUE:	

El Contratista es responsable de la realizacion de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de la obra, incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregar a la interventoria los resultados de los mismos.	SI		
Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de direccion del contrato. En caso de que la ejecución del proyecto requiera la suspensión temporal del servicio de acueducto, el Contratista deberá informar con minimo 2 días antes al operador del servicio y garantizar la gestión de comunicacion a la comunidad.	SI		
EL CONTRATISTA será responsable de realizar las pruebas técnicas y ensayos a las tuberías, estructuras construidas, equipos suministrados e instalados, y a los sistemas generales que se construyan, de igual manera deberá realizar la puesta en marcha de las PTAP y/o PTAR que se construyan que se encuentran dentro del alcance del proyecto. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion Municipal o a terceros	SI		

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Cláusula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
El supervisor deberá revisar las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

INFORME No. 25 | PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compañia Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
SUSPENSION 1	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	30-Nov-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25
REINICIO	$ 150.224.676,60	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25
ADICIONAL EN VALOR	$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25
[illegible]O ADICIONAL	$ 163.337.276,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15-Oct-25
PLAZO ADICIONAL	$ 163.337.276,60	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Aug-26
Buen Manejo del Anticipo	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Sep-24
SUSPENSION 1	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	30-Nov-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	31-Dec-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jan-25
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Mar-25
REINICIO	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Mar-25
ADICIONAL EN VALOR	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Mar-25
PLAZO ADICIONAL	$ 450.674.030,80	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15-Oct-25
[illegible] ADICIONAL	$ 450.647.029,80	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Aug-26
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-27
SUSPENSION 1	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	31-May-27
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	30-Jun-27
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	31-Jul-27
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Sep-27
REINICIO	$ 75.112.338,30	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-27
ADICIONAL EN VALOR	$ 81.668.638,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	5-Feb-24	14-Sep-27
PLAZO ADICIONAL	$ 81.668.639,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	6-Sep-24	15/94/2028
PLAZO ADICIONAL	$ 81.668.638,30	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	25-Mar-25	22-Feb-29
Calidad del Servicio	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Mar-24	24-Mar-29
SUSPENSION 1	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-May-24	31-May-29

2.2 CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Amparo	Valor Asegurado	No. Poliza	Compania Aseguradora	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Nov-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	$ 5.886.416.186,60	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 6.400.645.515,80	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
PLAZO ADICIONAL	$ 6.400.645.515,80	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Sep-25
PLAZO ADICIONAL	$ 6.400.645.509,80	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	10-Mar-25	22-Jul-26
Buen Manejo del Anticipo	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	31-May-24
SUSPENSION 1	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Oct-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-Nov-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Dec-24
REINICIO	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Dec-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Dec-24
PLAZO ADICIONAL	$ 8.829.624.297,90	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Sep-25
PLAZO ADICIONAL	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	10-Mar-25	22-Jul-26
Salarios y Prestaciones Sociales	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-Nov-26
SUSPENSION 1	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	27-Jul-23	1-Sep-27
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	27-Sep-23	1-Apr-27
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	27-Oct-23	1-May-27
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	27-Nov-23	14-Jun-27
REINICIO	$ 1.471.604.046,65	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Jun-27
ADICIONAL EN VALOR	$ 1.600.161.378,95	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	2-Feb-24	14-Jun-27
PLAZO ADICIONAL	$ 1.600.161.378,95	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Mar-28
PLAZO ADICIONAL	$ 1.600.161.377,45	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	10-Mar-25	22-Jan-29
Estabilidad	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	30-Nov-23	30-Nov-28
SUSPENSION 1	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	1-Mar-24	1-Mar-29

INFORME No. 25 | PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

2. CONTROL DE GARANTIAS

2.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	30-Jun-24	30-Jun-29	AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	1-Apr-24	1-Apr-29
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Jul-24	31-Jul-29	AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	1-May-24	1-May-29
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
REINICIO	$ 450.674.029,80	C-100050628 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	REINICIO	$ 8.829.624.279,90	C-100050102 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
ADICIONAL EN VALOR	$ 490.011.829,00	C-100050628 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	14-Sep-24	14-Sep-29	ADICIONAL EN VALOR	$ 9.600.958.273,70	C-100050102 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	14-Jun-24	14-Jun-29
PLAZO ADICIONAL	$ 490.011.830,00	C-100050628 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	15-Apr-24	15-Apr-30	PLAZO ADICIONAL	$ 9.600.958.273,70	C-100050102 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	14-Mar-25	14-Mar-30
PLAZO ADICIONAL	$ 490.011.829,80	C-100050628 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	22-Feb-26	22-Feb-31	PLAZO ADICIONAL	$ 9.600.968.264,70	C-100050102 ANEXO 9	SEGUROS MUNDIAL	22-Jan-26	22-Jan-31
Responsabilidad Civil extracontractual	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	24-Mar-24	**Responsabilidad Civil extracontractual**	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 0	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	30-N
SUSPENSION 1	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-May-24	SUSPENSION 1	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 1	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Mar-24
AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	30-Jun-24	AMPLIACION 1 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 2	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-Apr-24
AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	31-Jul-24	AMPLIACION 2 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 3	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	1-May-24
AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	AMPLIACION 3 SUSPENSION	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 4	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
REINICIO	$ 348.000.000,00	C-100012719 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	10-Jan-24	14-Sep-24	REINICIO	$ 1.471.604.046,65	C-100012551 ANEXO 5	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 390.000.000,00	C-100012719 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	14-Sep-24	ADICIONAL EN VALOR	$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 6	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Jun-24
ADICIONAL EN VALOR	$ 390.000.000,00	C-100012719 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	15-Apr-25	ADICIONAL EN VALOR	$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 7	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	14-Mar-25
PLAZO ADICIONAL	$ 427.050.000,00	C-100012719 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	24-Nov-22	22-Feb-26	PLAZO ADICIONAL	$ 1.600.161.377,00	C-100012551 ANEXO 8	SEGUROS MUNDIAL	31-Oct-22	22-Jan-26

2.1 SANCIONES

Tipo de Sancion (seleccionar con una x)		Fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	valor de la sanción impuesta
Multa			
Cláusula Penal			
Caducidad			
Ninguna			

INFORME No. 25 | PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

3. CONTROL FINANCIERO

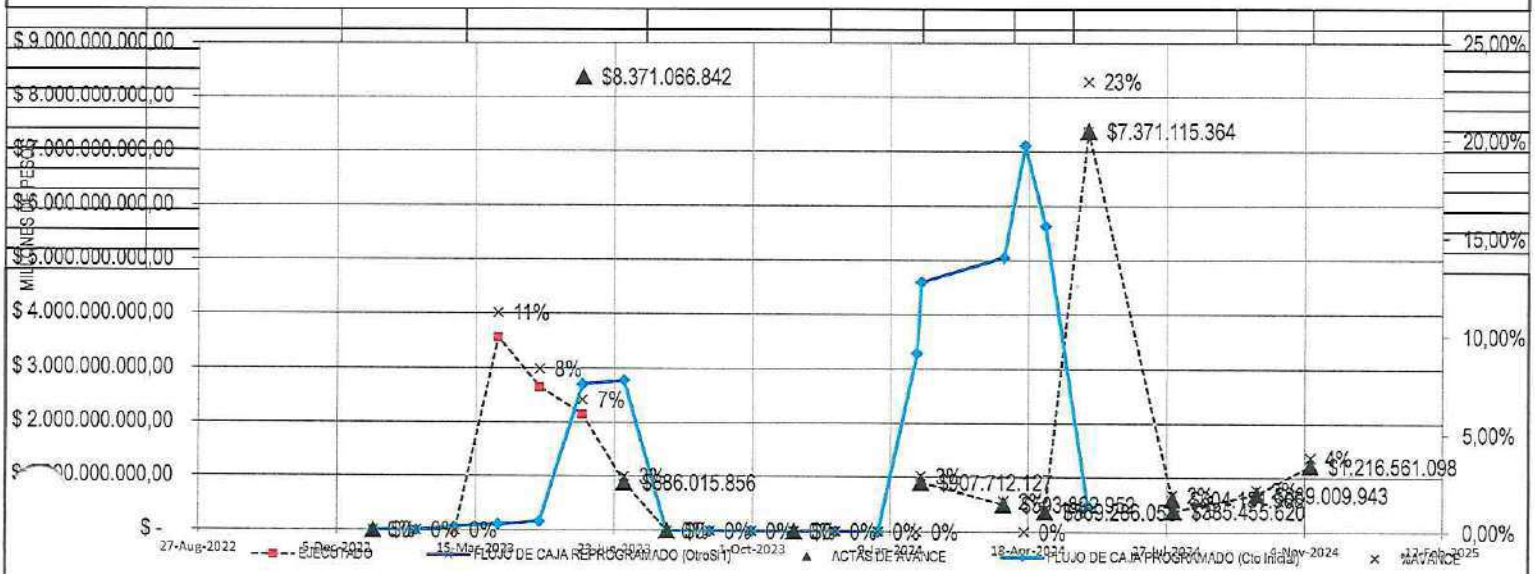
3.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor del Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30%)	26/12/2022		%		$ 450.674.030
Acta No. 1	31-May-23	$ 427.238.980	26,16%	$ 128.171.694	$ 299.067.286
Acta No. 2	30-Jun-23	$ 45.217.628	2,77%	$ 13.565.288	$ 31.652.340
Acta No. 3	30-Mar-24	$ 72.195.076	4,42%	$ 21.658.523	$ 50.536.553
Acta No. 4	14-Jun-24	$ 18.783.787	1,15%	$ 5.635.136	$ 13.148.651
Acta No. 5	20-Jun-24	$ 376.165.748	23,03%	$ 112.849.724	$ 263.316.024
Acta No. 6	16-Aug-24	$ 30.870.745	1,89%	$ 9.261.224	$ 21.609.521
Acta No. 7	13-Sep-24	$ 19.658.237	1,20%	$ 5.897.471	$13.760.766
Acta No. 8	30-Sep-24	$ 35.139.507	2,15%	$ 10.541.852	$24.597.655
Acta No. 9	12-Nov-24	$ 62.044.616	3,80%	$ 18.613.385	$43.431.231
Acta No. 10	2-Dec-24	$ 105.486.042	6,46%	$ 31.645.813	$73.840.229
Acta No. 11	1-Feb-25	$ 35.207.836	2,16%	$ 10.562.351	$24.645.485
Acta No. 12	13-Mar-25	$ 117.987.100	7,22%	$ 35.396.130	$82.590.970
	TOTALES	$ 1.345.995.302	82,41%	$ 403.798.591	$1.392.870.741

3.2 CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

Concepto	Fecha d/m/a Acta	Valor Acta	% Acumulado Acta	Amortización Anticipo	Valor a Pagar
Anticipo (30 %)	23/12/2022	$N/A	%		$8.829.624.298
Acta No. 1	31-May-23	$8.371.066.842	26,16%	$2.511.320.053	$5.859.746.789
Acta No. 2	30-Jun-23	$886.015.856	2,77%	$265.804.757	$620.211.099
Acta No. 3	31-Jan-24	$907.712.127	2,84%	$272.313.639	$635.398.488
Acta No. 4	30-Mar-24	$503.892.952	1,57%	$151.167.886	$352.725.066
Acta No. 5	30-Apr-24	$369.286.058	1,15%	$110.785.818	$258.500.240
Acta No. 6	31-May-24	$7.371.115.364	23,03%	$2.211.334.610	$5.159.780.754
Acta No. 7	31-Jul-24	$604.131.566	1,89%	$181.239.470	$422.892.096
Acta No. 8	31-Aug-24	$385.455.620	1,20%	$115.636.686	$269.818.934
Acta No. 9	30-Sep-24	$689.009.943	2,15%	$206.702.983	$482.306.960
Acta No. 10	8-Nov-24	$1.216.561.098	3,80%	$364.968.330	$851.592.768
Acta No. 11	30-Nov-24	$2.068.353.769	6,46%	$620.506.131	$1.447.847.638
Acta No. 12	28-Feb-25	$690.349.724	2,16%	$207.104.917	$483.244.807
Acta No. 13	10-Mar-25	$2.313.472.543	7,23%	$694.041.763	$1.619.430.780
		$26.376.423.462	**82,42%**	**$7.912.927.043**	**$18.463.496.419**

4. CONTROL DE EJECUCION



FECHA	FLUJO DE CAJA PROGRAMADO (Cto Inicial)	FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO (OtroSi1)	EJECUTADO	ACTAS DE AVANCE	%AVANCE
31-Dec-22	$ -			$ -	0,00%
31-Jan-23	$ -		$ -		0,00%
28-Feb-23	$ 62.322.903,31		$ -		0,00%
31-Mar-23	$ 111.845.778,94		$ 3.568.952.062,00		11,15%
30-Apr-23	$ 161.373.885,25		$ 2.651.489.752,00		8,29%
31-May-23	$ 2.705.571.148,99		$ 2.150.625.028,00	$ 8.371.066.842,00	6,72%
30-Jun-23	$ 2.779.758.170,91		$ 886.015.856,00	$ 886.015.856,00	2,77%
31-Jul-23	$ -		$ -	$ -	0,00%
31-Aug-23	$ -		$ -		0,00%
30-Sep-23	$ -		$ -		0,00%
31-Oct-23	$ -		$ -	$ -	0,00%
30-Nov-23	$ -		$ -		0,00%
31-Dec-23	$ -		$ -		0,00%
28-Jan-24	$ 3.291.610.390,55				0,00%
31-Jan-24	$ 4.602.351.753,97		$ 907.712.127,00	$ 907.712.127,00	2,84%
3[illegible]24	$ 5.056.692.137,71		$ 503.892.952,00	$ 503.892.952,00	1,57%
1[illegible]24	$ 7.113.749.748,65				0,00%
30-Apr-24	$ 5.630.651.827,13		$ 369.286.058,00	$ 369.286.058,00	1,15%
31-May-24	$ 487.299.803,59		$ 7.371.115.364,00	$ 7.371.115.364,00	23,03%
31-Jul-24			$ 604.131.566,00	$ 604.131.566,00	1,89%
1-Aug-24			$ 385.455.620,00	$ 385.455.620,00	1,20%
30-Sep-24			$ 689.009.943,00	$ 689.009.943,00	2,15%
8-Nov-24			$ 1.216.561.098,00	$ 1.216.561.098,00	3,80%
30-Nov-24			$ 2.068.353.769,00	$ 2.068.353.769,00	6,46%
28-Feb-25			$ 690.349.724,00	$ 690.349.724,00	2,16%
31-Mar-25			$ 2.313.472.543,00	$ 2.313.472.543,00	7,23%
	$ 32.003.227.549,00		$ 26.376.423.462,00	$ 26.376.423.462,00	82,42%

ESCALAS TANTO EN VALOR Y TIEMPO

NOTA: EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION ES DEL 82,42 % (CONSTRUCCION TANQUE PTAP GINEBRA, CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ALBANIA , INTERVENCIONES FLOCULADORES , SEDIMENTADORES EN LA PTAP GINEBRA Y SEDIMENTADORES EN LA PTAP DE GUACARÍ, INSTALACION TUBERIA 14")

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-5 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

INFORME No. 25	PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

5. SEGURIDAD SOCIAL

El contratista adjunto en el último pago el certificado del Revisor Fiscal o Contador Diana Sofia Bolaños O., con número de tarjeta profesional 186062-T quien certifica que el contratista CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE pago conforme a la ley lo correspondiente a sus pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) del personal vinculado al contrato o convenio de quienes figuran en la propuesta (Si aplica). Igualmente, el contratista presentó las planillas de pago de seguridad social del personal que se encuentra registrado en la propuesta y la del representante legal.

Firma del Interventor Contrato No. _____

INFORME No 25 | PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

6. ANEXOS

6.1 Aspectos Técnicos: Descripción de actividades realizadas acordes con el objeto del contrato de interventoría en el periodo (Actas, Bitácora).

6.2 Control de Calidad: Según especificaciones técnicas incluir información relacionada con Equipos de Medición, de Inspección y Ensayos.

6.3 Aspectos Ambientales: Relacionar lo relacionado con Licencias Ambientales, Permisos de Vertimientos, Concesión de Aguas, entre otros.

6.4 Aspectos Sociales: Relacionar documentos como actas de reuniones, constancias de visitas, correspondencia enviada y recibida.

6.5 Predios, Servidumbres y Permisos de Intervención: Incluir tramites prediales, servidumbres y permisos requeridos por otras entidades.

6.6 Recurso Humano (interventoría , contratista) : Relacionar personal utilizado para la ejecución del contrato en el periodo (soportes seg. social), plan integral de salud ocupacional

6.7 Maquinaria y Equipo (interventoría , contratista) : Relacionar la maquinaria utilizada durante la ejecución de cada actividad (si aplica).

6.8 Registro Fotográfico: Complementar de manera visual (si aplica) con el seguimiento cronológico con este registro .Anexar CD con fotos en alta resolución

6.9 Informe del Contratista (si aplica).

6. ASPECTOS CRÍTICOS DEL CONTRATO

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Las labores en la obra continúan desarrollándose en tres frentes de trabajo:
  - PTAP de Guacarí: Sedimentación – Floculación - Caseta Eléctrica
  - PTAP de Ginebra: Sedimentación – Filtración - Tanque de Almacenamiento - Caseta Eléctrica
  - Tanque de Almacenamiento La Albania – Ginebra
- El frente del Tramo 3 continúa suspendido, se estará coordinando su reinicio, una vez se apruebe la Reformulación No.02, para Junio 2025.
- Con el Ingenio Pichichi ya se encuentra en tramites notariales para dejar en firme la servidumbre, se puede iniciar para Junio este tramo de tubería PEAD 14" en una L: 500 ml
- Con la Familia Saavedra - Blum ya está en proceso de servidumbre para instalar en su predio la tubería PEAD 10" en una L: 600 ml

Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato

- Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demoliciones de pavimento siguen aún pendientes por parte de las entidades a quien se les ha solicitado.
- Los trabajos de localización y replanteo en la vía del Tramo 1: CADICA a BOCATOMA, continúan sin ningún inconveniente
- Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
- Los acercamientos con los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio han mejorado el dialogo con la comunidad permitiendo que se mejore la aceptación de la obra.
- Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
- Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.
- Se relaciona los avances físicos y financieros hasta el 31 de Mayo de 2025:

AVANCE (%)
FISICO
80.5
FINANCIERO
82.42

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME 25

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - PTAP GINEBRA LA ALBANIA	Largo: 25 mts Ancho: 15 mts Profundidad: 5 mts Actividades ejecutadas: • Fundición de losa superior en concreto premezclado y vigas transversales • Toma de muestras de concreto y slump • Aplicación de antisol • Fraguado continuo con aspersor
	SEDIMENTADOR N° 3 - PTAP GINEBRA	Sedimentador 3 : En servicio
	SEDIMENTADOR N° 2 - PTAP GINEBRA	Sistema de barrelodos Módulos Tipo Colmena Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada , Pasarelas SEDIMENTADOR EN SERVICIO
	SEDIMENTADOR N° 1 - PTAP GINEBRA	Sedimentador 1: La obra civil se termino, ya el Sub contratista Co Ingenieria, culmino la instalación del barrelodos .
	CASETA ELECTRÍCA- PTAP GINEBRA:	Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil Por motivos de lluvias constantes se suspende las labores de: Las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica Rellenos con material de excavación
	CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GINEBRA:	Durante este periodo no se realizaron actividades en esta caseta, debido a que esta no está incluida en la primera reformulación
	MURO DE CONTENCIÓN - PTAP GINEBRA:	En comité de obra se decide que este muro no es necesario construirlo. El terreno es estable y no hay nigún tipo de riesgo en esta zona
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 3	• Las actividades aún se encuentran suspendidas por causa de la comunidad, desde el día 11 de junio del año 2024. El día 18 de diciembre se firma el acuerdo con la Gobernación, Valle caucana de Aguas e presentantes de la comunidad. Se espera que con la firma de este documento se pueda retomar en el frente 3 e iniciar los frentes 1 y 2,
	CASETA ELECTRÍCA - PTAP GUACARÍ:	Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil Se continúan con las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica Se instala ducto eléctrico que va alimentar el Streaming Current Relleno con material de excavación Se instala el sistema Streaming Current
	CASETA SOPLADORES DE FILTRACIÓN - PTAP GUACARÍ:	Caseta de Sopladores de Filtracion - Se inician las excavaciones para la ampliación
	SEDIMENTADOR N° 1 - PTAP GUACARÍ:	EN SERVICIO
	SEDIMENTADOR N° 2 - PTAP GUACARÍ:	EN SERVICIO

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P	PAP - PDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 1 - ASPECTOS TECNICOS INFORME 25

I. RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION
	SEDIMENTADOR N° 3 - PTAP GUACARÍ:	- Escarificación y repello impermeabilizado - Fundición de losa inferior reforzada parcialmente (por los espesores de la losa) - Perforación para la colocación de acero de refuerzo en muro de concreto que divide el floculador delsedimentador
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN - TRAMO 1	En este período se realizan las siguientes actividades en este tramo: • La comisión de topografía realiza levantamiento en la zona de la bocatoma • La comisión de topografía en conjunto con la interventoría, realiza batimetria en la zona donde se va construir la bocatoma y el desarenador. • El contratista continúa realizando chequeos, verificaciones, localizaciones donde se debeb hacer la intervenciones civiles en ester tramo. Tamnien se hacer revisió y se buscas posibles soluciones a los puntos criticos de la vía donde se va a instalar la tuberia.
	FLOCULADOR N° 3 - PTAP GUACARÍ:	- Se continua con la demolición de pasarelas y muros en concreto reforzado - Colocación de acero de refuerzo para elevar muro exterior y pantalla

II. RELACION DE SOPORTES DOCUMENTALES (ACTAS, CORRESPONDENCIA,CONTROL BITACORA)

No.	DESCRIPCION	CONTENIDO
1	INFORME MENSUAL DE CONTRATISTA No. 23	SE ANEXA DOCUMENTO
2	INFORME No 23 DE INTERVENTORIA CON INFORME DE SST Y COMPONENTE SOCIAL	SE ANEXA DOCUMENTO

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 2 - PRUEBAS/ENSAYOS

FECHA:	MAYO 31 DE 2025
MATERIAL:	CONCRETO 3000 PSI / 4000 PSI
CANTIDAD PARA PRUEBA:	
NOMBRE DE LA PRUEBA/ENSAYO:	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN CILINDROS DE CONCRETO
LOCALIZACION:	PTAP GINEBRA Y GUACARI
LABORATORIO:	GEOZAM
NORMA - ESPECIFICACION:	INV E 410 -13 / NTC 673 / NTC 3546

EM	ENSAYO REALIZADO	RESULTADO (Mpa)	ANALISIS RESULTADO	CUMPLE S/N	OBSERVACIONES	DECISIONES
1	PANTALLA CANALETA GINEBRA	27,8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 DIAS	
2	LOSA INFERIOR FILTRO No1 GINEBRA	34	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	21 DIAS	
3	LOSA INFERIOR FILTRO No1 GINEBRA	22,3	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	21 DIAS	
4	SEGUNDA FUNDICION TANQUE LA ALBANIA	37	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 DIAS	
5	SEGUNDA FUNDICION DE MUROS TANQUE LA ALBANIA	33,4	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 DIAS	
6	LOSA SUPERIOR TANQUE LA ALBANIA	15,7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	3 DIAS	
7	LOSA SUPERIOR TANQUE LA ALBANIA	23,9	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 DIAS	
8	LOSA SUPERIOR TANQUE LA ALBANIA	26,4	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
9	LOSA SUPERIOR TANQUE LA ALBANIA	31,5	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 DIAS	
	LOSA SUPERIOR TANQUE LA ALBANIA	24,1	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 DIAS	
	LOSA SUPERIOR TANQUE LA ALBANIA	28,6	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
	LOSA SUPERIOR TANQUE LA ALBANIA	31,8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	28 DIAS	
	PANTALLA FINAL SEDIMENTADOR 3 GUACARI	4,7	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	4 DIAS	
	PANTALLA FINAL SEDIMENTADOR 3 GUACARI	8,4	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	14 DIAS	
	MURO No 4 FLOCULADOR No 3 GUACARI	15,6	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 DIAS	
	MURO No 3 FLOCULADOR No 3 GUACARI	15,8	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	SI	7 DIAS	

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 3 - ASPECTOS AMBIENTALES **PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2025**

I. LICENCIAS AMBIENTALES

ITEM	DESCRIPCION	DETALLE
	INFORME AMBIENTAL	INFORMACION CONSIGNADA DENTRO DE LOS INFORMES DE CONTRATISTA E INTERVENTORIA ANEXOS

II. PERMISOS DE VERTIMIENTOS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	SOLICITANTE:	
2	FUENTE RECEPTORA:	
3	PTAR:	
4	ESTADO:	
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	

III.CONCESION DE AGUAS

No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	SOLICITANTE:	
2	FUENTE DE ABASTECIMIENTO:	
3	PTAP:	
4	ESTADO:	
5	VALOR TOTAL (INVERSION + OPERACIÓN):	

ANEXO 4 - ASPECTOS SOCIALES

I. ASPECTOS SOCIALES

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto	Se evidenció que el contratista realizó el taller de Cartografía social el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Guacarí, contó con la participación de los representantes de las Juntas de Acción Comunal de diferentes barrios, los cuales identificaron las problemáticas más relevantes. Se evidenció que el 13 de mayo de 2025 se realizó el taller de Cartografía social con los representantes de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Ginebra, se explicó los componentes de Calidad de vida, bienestar físico, esperanza de vida, nivel educativo, y producto interno bruto.
2	Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto	En el mes de mayo de 2025 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 77.14% .
3	Programa de Información a la Comunidad	La interventoría evidencia que se ha cumplido con brindar la información a la comunidad por medio de las socializaciones que se han realizado en meses pasados, dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.
4	Programa de divulgación a la comunidad	En el mes de mayo no se programaron actividades de divulgación a la comunidad.
5	Reuniones con la comunidad	La interventoría evidencia que el contratista ha cumplido con esta actividad de reuniones con la comunidad planteada en el Plan de Gestión Social.
6	Programa de atención a la comunidad	Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no se recibió PQRS de la comunidad.
7	Programa de atención al ciudadano	El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos: Martes de 08:00 am a 12m Viernes 1:00 pm a 4:00 pm, Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - corregimiento de Costa Rica, municipio Ginebra, Valle del Cauca. Existen dos buzones de sugerencias: El buzón de Guacarí se encuentra ubicado en Puente Rojo en el restaurante Las Delicias de Luz, frente al balneario Chicuco. El buzón de Ginebra está ubicado en Estanco Tas- Tas, Cra 2 #5-06 en la cabecera municipal.
8	Recorridos por la Obra	En este mes de mayo no se programó recorrido de obra con los veedores.
9	Reunión de Avance de Obra	Se evidenció que el componente social del contratista programó las dos reuniones informativas de avance de obra con los veedores ciudadanos de los municipios de Guacarí y de Ginebra; sin embargo, solo se pudo realizar la reunión de Ginebra, porque la reunión de Guacarí se tuvo que cancelar por el paro nacional. • La interventoría social participó y evidenció la realización del comité de veeduría del municipio de Ginebra de manera virtual con la participación del veedor Sigfredo Pasos y Lina Santa. • En esta reunión se informó de las actividades realizadas de avance de obra, el componente técnico lleva un avance del 82% ejecutado. • En el frente de obra de tuberías de 14 pulgadas lleva un avance de 82%. • En el frente de obra de la planta de tratamiento de Ginebra lleva un avance de 72% • En el frente de obra de la planta de tratamiento de Guacarí lleva un avance de 53% • Y el frente de obra de Villa Jhons tiene un avance del 59%. • Desde el componente social se informó que se tiene conformados los dos comités de veeduría ciudadana, se realizó seguimiento a los buzones de sugerencias y no se han depositado PQRS.
10	Conformación del comité de veeduría ciudadana	Se evidenció que el contratista dio cumplimiento al aspecto N° 10 del Plan de Gestión Social con la conformación de los dos comités de veeduría ciudadana en los dos municipios de Guacarí y Ginebra. La interventoría social participó y evidenció la realización del comité de veeduría del municipio de Ginebra de manera virtual por solicitud de los veedores.
11	Vinculación de mano de obra calificada y no calificada	El contratista está fomentando y fortaleciendo la vinculación laboral del personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo y en generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. El contratista informó que en el mes de mayo vinculó una profesional en ingeniería ambiental residente del municipio de Ginebra. Actualmente tiene contratado 7 personas del corregimiento de Costa Rica, 6 personas de Ginebra y 4 personas de Guacarí.

II. DOCUMENTOS (Adjuntar soportes)

ITEM	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
No.	DESCRIPCION	DETALLE
1	ACTAS	
2	CORRESPONDENCIA	
3	VARIOS	

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFORME 25

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
I. PREDIOS			
	N/A		
II. SERVIDUMBRES			
No.	**LOCALIZACION**	**DESCRIPCION**	**ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)**
	Vía a el Ingenio Pichichi K6+350 a K6+850 Matricula inmobiliaria N° 373-112779	Dentro de las actividades que se realizaron en la obra fue la localización y replanteo del trazado de la tubería y dentro de este se tiene identificado una parte del trazado de la tubería fue planteado por un carreterable localizado dentro del predio identificado con la matricula inmobiliaria N° 373-112779 de propiedad del Ingenio Pichichi. Después de realizar el levantamiento topográfico se obtuvo que para continuar con el desarrollo del proyecto se requiere intervenir una longitud de 500 ml para la instalacion de tuberpia PEAD 350 MM PN 10 a una profundidad promedio de 1.45 mt.	EN TRAMITE
	Vía acceso planta de Ginebra	Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10": para la instalación de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo de servidumbre de la señora Blum, se encuentra pendiente la ejecución de algunos compromisos previamente pactados por Acuavalle, los cuales a la fecha no han sido ejecutados, por lo tanto, la propietaria no autoriza la intervención hasta no sea resuelto este pendiente.	FINALIZADO
III. PERMISOS			
No.	**ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO**	**DESCRIPCION**	**ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)**
1	CVC	• Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma desarenador, macromedidor y aducción.	**Nota 1:** La Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 **OTORGADO** Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en juridiscción del Municipio de Ginebra, Departamento Valle del Cauca" VIGENCIA 23-07-2025
2	CVC	• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, d acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.	**AUN NO SE HA INICIADO LA GESTIÓN**
3	CVC	**PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES** El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación de este acto administrativo. Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvio del mismo. Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A E.S.P radicó el oficio AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 207602024 del 27 de febrero de 2024. Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante cheque el día 12 de abril del 2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año la visita técnica ambiental por parte de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce. (Documento Adjunto)	**AMBIENTAL PARA PRÓRROGA** Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 27 de Febrero de 2024. Otorgado / 7 marzo de 2024 (1 año) Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril de 2024 por evaluación y seguimiento para prórroga. Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de Mayo de 2024
4	CVC	Permiso de Concesión de aguas superficiales	**OTORGADO** **Resolución 0740 No. 0741 0000576** **10-07-2020** "Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca" **VIGENTE**

ANEXO 5 - PREDIOS, SERVIDUMBRES, PERMISOS INFORME 25

ITEM	LOCALIZACION	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
5	CVC	Permiso de Aprovechamiento Forestal - PTAP Ginebra	**OTORGADO** **Resolución 740 No. 0741 0381** **29-04-2024** Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad.
6	Planeación Municipal Ginebra	Licencia de Espacio Público	**OTORGADO** **Resolución No. 004-01 2023** **26-01-2023** "Por medio de la cual se aprueba una licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público" **VIGENCIA 26-01-2025** **VIGENTE**
7	Planeación Municipal Guacarí	Licencia de Espacio Público	**OTORGADO** **Resolución No. 004-01 2023** **26-01-2023** Por la cual se expide una licencia de interven[illegible] del espacio público para desarrollar un proy[illegible] **VIGENCIA 03-02-2025** **VIGENTE**
8	Secretaria de Movilidad de Ginebra	Plan de Manejo de tránsito	**OTORGADO** **Resolución No. 900-50-020** **20-03-2023** "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" **VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP** **VIGENTE**
9	Secretaria de Movilidad y transporte de Guacarí	Plan de Manejo de tránsito	**OTORGADO** "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" **VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP** **VIGENTE**
10	Planeación Municipal Ginebra	Permiso de rotura de pavimento Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos: Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, en el tramo: Puente Amarillo a Puente Rojo.	**PENDIENTE** - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Ginebra el día 14 de agosto, en la y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024 - El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024. - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra el día 22 de octubre de 2024.
11	Planeación Municipal Guacarí	Permiso de rotura de pavimento Se radica solicitud en la Gobernación del Valle, para el tramo: Inicia desde la Abscisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el Placer) hasta la Planta de Guacarí.	PENDIENTE - Se recibe el 22 de mayo 2024 documentación por el Director del Departamento Administrativo de Planeación sobre la solicitud ante la Alcaldía de Guacarí. - "El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Guacarí el día 21 de agosto y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024" - "El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024." - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.
12	CVC	Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA En el mes de julio se realizó visita a predio de la Alcaldía de Ginebra para realizar la compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la PTAP Ginebra. Se está a la espera de comunicado de la CVC para aprobación del nuevo predio y su recomendación para poder realizar esta compensación.	**EN ESPERA DE RESPUESTA .** Es este periodo visitan la obra dos funcionarios de la CVC, la Ingeniera Daniel Castillo y el Técnico Segundo Fiscal para a coordinar lo relacionado con la siembra por compensación en respuesta al requerimiento realizado por ACUVALLE y en cumplimiento al permiso de aprovechamiento forestal de la planta de Ginebra. Pero no se pudo hacer la visita a el predio debido a que no se dio la autorización para la visita, se debe reprogramar

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 25

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	ING. CIVIL	DIR. DE OBRA	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
2	LINA MARCELA BURITICÁ	ING. CIVIL	COORDINADORA DE PROYECTOS	• Planificar la organización de la obra. • Proponer los procedimientos y técnicas más idóneas para el desarrollo del proyecto. • Realizar seguimiento a los recursos designados durante la ejecución. • Planificar y fijar los tiempos de gestión y las fases de la construcción, así como hacer un seguimiento de los avances cumpliendo el cronograma establecido. • Controlar la documentación oficial de la obra. • Formar, dirigir y poner en marcha al eficiente equipo de empleados.
3	GINA LEIDY LÓPEZ	ING. SANITARIA	RESIDENTE DE OBRA HIDRAULICA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos oportunamente. • Elaborar los reportes y avances de obra. • Calcular las cantidades de obra ejecutada.
4	DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS,	ING. AMBIENTAL	ING. AMBIENTAL	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
5	DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.	RESIDENTE DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Velar por el cumplimiento del plazo de ejecución de cada obra. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas. • Evaluar la ejecución de los planes y programas de trabajo. • Solicitar los materiales requeridos oportunamente. • Elaborar los reportes y avances de obra. • Calcular las cantidades de obra ejecutada.
6	MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	TRABAJO SOCIAL, ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL.	• Brindar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia acerca de las actividades técnicas y operativas inherentes al proyecto. • Dar a conocer a la comunidad en general el estado de la infraestructura existente y las obras que se construirán. • Diseñar e implementar campañas informativas de la obra, para los diferentes tipos de población. • Informar oportunamente antes, durante y después de las obras de construcción del proyecto el alcance, actividades, impactos y las correspondientes medidas de manejo o estrategias de intervención para minimizarlos. • Dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad.

ANEXO 6 - RECURSO HUMANO INFORME 25

I. RECURSO HUMANO CONTRATISTA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
7	JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA	TOPOGRAFO	Altimetria - Planimetria- Carteras Topográficas
8	DIANA MARCELA MURIEL FLOR	Ingeniera ambiental	INGENIERO AUX. AMBIENTAL	• Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente. • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guacarí y Ginebra • Implementar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Realizar el seguimiento a la implementación del PMA.
9	FLOR MARÍA MARTÍNEZ	Profesional-SST	PROFESIONAL-SST	• Responsable de la ejecucion del plan de gestión SST
	ANESSA ESTRADA WILSON WHITE	INGENIERA AMBIENTAL	AUXILIAR AMBIENTAL	Apoyo en : • Realizar el plan de manejo ambiental del proyecto. • Tramitar los permisos ambientales requeridos ante la entidad competente • Tramitar los permisos requeridos en las alcaldías municipales de Guaca
10	LILIBETH MORA DUARTE	Tecnóloga en obras civiles	INSPECTORA DE OBRA	• Supervisar la ejecución de las obras de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. • Coordinar las actividades de los diferentes frentes de trabajo, personal directo y/o subcontratistas.

II. RECURSO HUMANO INTERVENTORIA

No.	NOMBRE	FORMACION ACADEMICA	CARGO	FUNCIONES
1	ALEJANDRO ESTRADA	ING SANITARIO	DIR. DE OBRA	COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO
2	JESUS IVAN BASTIDAS	ING SANITARIO	RESIDENTE DE OBRA/ING AMBIENTAL	VERIFICACIÓN REVISION DOCUMENTAL, AJUSTES A DOCUMENTOS, CONTROL DE ACTIVIDADES EN CAMPO. REVISION COMPONENTE AMBIENTAL
4	ANDRES FLECHAS	TOPOGRAFO	TOPÓGRAFO	VERIFICACIÓN CONTROLTOPOGRAFIA, MEDICIONES CONJUNTAS, ALTIMETRICAS Y PLANIMETRICAS
5	NEISLER ABADIA	TRAB. SOCIAL	TRAB. SOCIAL	TRABAJO SOCIAL, SOCIALIZACION CON LAS COMUNIDADES, VERIFICACION DE ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
6	JULIANA IZQUIERDO M.	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD SST, VISITAS EN CAMPO. SEGUIMIENTO EJECUCION PLAN DE SST
7	JULIAN ANDRADE	ING. CIVIL	APOYO A LA DIRECCIÓN	REVISION DOCUMENTAL Y EN CAMPO, VERIFICACIÓN Y CONTROL ACTIVIDADES DE OBRA, REVISIONES CONJUNTAS CON CONTRATISTA PROCEDIMIENTOS DE OBRA

ANEXO 7 - MAQUINARIA/EQUIPOS 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

7.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
PLANTA ELECTRICA	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	ANCLAJES	
PLANTA ELECTRICA	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	ANCLAJES	
PULIDORA	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	MUROS DEL SEDIMENTADOR 2	
TALADRO	SI	SI	SI		PTAP GUACARI	ANCLAJES	
TALADRO	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	ANCLAJES	
VIBRADOR	SI	SI	SI		PTAP GINEBRA	LOSA DE FONDO LOSA SUPERIOR TANQUE	
_TROEXCAVADORA DE ORUGA	SI	SI	NO		PTAP GINEBRA SECTOR ALBANIA	EXCAVACIONES Y LLENOS	
RETROEXCAVADORA DE LLANTA	SI	SI	NO		PTAP GINEBRA SECTOR ALBANIA	EXCAVACIONES Y LLENOS	
VOLQUETAS	SI	SI	NO		PTAP GINEBRA SECTOR ALBANIA	EXCAVACIONES Y LLENOS	

7.2 EQUIPOS DE MEDICION

ITEM	ACTIVIDAD	EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA					EQUIPO UTILIZADO POR INTERVENTOR				
		Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID	Precisión	Equipo	Certificado Calibración No.	Vigencia certi.	No. Serie / ID
1	LOCALIZACION TOPOGRAFICA	ESTACIÓN TOTAL	ESTACION TOTAL	3866	oct-25	025108					
2	LOCALIZACION TOPOGRAFICA	NIVEL AUTOMATICO	NIVEL AUTOMATICO	3830	sep-25	M312467					
3	LOCALIZACION TOPOGRAFICA	NIVEL AUTOMATICO	NIVEL AUTOMATICO	3831	sep-25	QS1667					
4											
5											
6											
7											
8											

PTAP GINEBRA



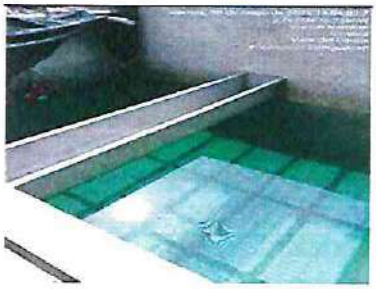
FOTOGRAFÍA No.1: FLOCULADOR GINEBRA CONCLUIDO



FOTOGRAFÍA No.2: SEDIMENTADOR 1 - 2 - 3 CONCLUIDOS



FOTOGRAFÍA No.3:SEDIMENTADOR 1 - 2 - 3 CONCLUIDOS



FOTOGRAFÍA No.4: Instalación de canaleta en acero inoxidable para agua de lavado de filtro - Instalación de niples pasamuros de sedimentador

PTAP GINEBRA - TANQUE DE ALMACENAMIENTO y TANQUE LA ALBANIA



FOTOGRAFÍA No.5: • BASE PARA SOPLADORES



FOTOGRAFÍA No. 6: BASE PARA SOPLADORES



FOTOGRAFÍA No.7: SUMINISTRO DE GRAVAS PARA FILTROS



FOTOGRAFÍA No.8: TANQUE LA ALBANIA

PTAP GUACARI



FOTOGRAFÍA No. 09
Estado Actual Floculador No.03: Fundicion de elementos en concreto-pasarelas



FOTOGRAFÍA No. 10:
Estado Actual Floculador No.03:instalacion pasarelas



FOTOGRAFÍA No. 11: Sedimentador No. 03: - Colocación de acero de refuerzo para pantallas de entrada y salida Fundición de pantallas en concreto de entrada y salida Instalación de barrelodos



FOTOGRAFÍA No. 12: Sedimentadores 1 - 2 en servicio



FOTOGRAFÍA No. 13: Caseta electrica Instalación de ventanas y puerta principal Instalación de cubierta



FOTOGRAFÍA No. 14:
Suministro de material filtrante : Filtralite

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

ANEXO 9 - INFORME INVERSION Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO | **PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2025**

CONTRATO No. :	2000.13.05.003-2022		
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA, MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, ADUCCION, CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI EN EL VALLE DEL CAUCA."		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$		29.432.080.933,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERGUACARI		
PLAZO:	22 MESES		
VALOR ANTICIPO :	30%	$	8.829.624.280,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	ADMINISTRATIVOS				-	-
2	EQUIPOS	$ 1.744.905.661,00	$ -		$ 1.744.905.661,00	$ -
3	TRANSPORTES				$ -	$ -
4	MATERIALES	$ 6.125.300.150,00	$ -		$ 6.125.300.150,00	$ -
5	OTROS	$ 959.418.469,00	$ -		$ 959.418.469,00	$ -
6	OTROS	$ 10.542.663,00		$ 10.542.663,00	$ 10.542.663,00	$ -
	TOTALES	**$ 8.840.166.943,00**	**8.829.624.280,00**	**10.542.663,00**	**8.840.166.943,00**	**-**

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		10
	3	6	2025	HORA DE FINALIZACIÓN :		12
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	GINEBRA-GUACARI	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :		
CONSORCIO :	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)		88%
NOMBRE PROFESIONAL SST:	FLOR MARIA MARTINEZ			NOMPRE PROF. SST INTERVENTORIA:		JULIANA IZQUIERDO M.

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL VIGENTE DE LOS TRABAJADORES, PRINCIPALMENTE DE LOS QUE REALIZAN LABORES PARA LA EVA.	1			Se anexan soportes de pago de seguridad social
REPORTE DE NOVEDADES DEL MES EN SEGURIDAD SOCIAL, CON RELACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE LABORAN PARA LA EVA.	1			
INFORME DE ACCIDENTES DE TRABAJO, INCIDENTES Y/O ENFERMEDADES PROFESIONALES OCURRIDOS DURANTE EL MES CON SU INVESTIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS	1			En el mes de mayo no se presentan accidentes, incidentes, no se reporta incapacidades por enfermedad común
PLAN DE TRABAJO DE SST, EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DEL MES Y % DE AVANCES	1			Se realiza comité del COPASS en el el mes de mayo 28 del 2025 en el que se realiza revision de carga de extintores, quedan vigentes hasta mayo 2026.
POLITICA Y OBJETIVOS DIVULGADOS	1			Se adjunta registro fografico de las inducciones en las que se tratan los temas de politicas y objetivos SST.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DEL RIESGO	1			Se adjuntas formatos AROS para actividades de alto riesgo.
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (PLAN DE EMERGENCIAS Y SU AVANCE EN EL MES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS)	1			designan puntos de encuentro y mantienen en las oficinas lo elementos del plan de emergencias, se realizan inspecciones mensales a
BRIGADA INTEGRAL DE EMERGENCIA	1			
SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE ZONAS	1			Se delimita la zona de excavacion
AMILLA RIGIDA CON SU ARNES - INMOVILIZADOR DE CUELLO	1			se realiaza inspeccion
EXTINTORES	1			se realiaza inspeccion
BOTIQUIN	1			se realiaza inspeccion
KIT DE DERRAMES		1		No hay uso de sustancias toxicas
COMPROBANTE DE ENTREGA EPP (CASCO, GAFAS, RESPIRADOR, PROTECCION AUDITIVA, BOTAS DE SEGURIDAD, CAMISA, CHALECO REFLECTIVO, PANTALON Y OTROS DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP).	1			se adjunta envidencia en el informe
LISTADO DE PUNTOS DE ATENCION (ARL, CLINICAS, HOSPITALES, IPS,POLICIA, BOMBEROS, EJERCITO, ETC)	1			Se encuentra instalado en la cartelera SST
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONES DEL PERSONAL	1			se revisan examenes de los subcontratistas, se adjuntan anexos al informe
ACTAS E INFORME DEL COMITÉ, O VIGIA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1			Se hace seguimiento a los pendientes
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DE 2019 ESTANDARES MINIMOS.		1		Aun no adjunta la certificacion por parte de la ARL y el ministerio de trabajo del porcentaje de cumplimiento del sisteme de gestion.
INFORME DE ASESORIA DE LA ARL		1		

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP - PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI **INFORME DE INTERVENTORIA**	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FICHA VISITA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS

FECHA:	DÍA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		10
	3	6	2025	HORA DE FINALIZACIÓN :		12
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO			MUNICIPIO:	GINEBRA-GUACARI	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :		
CONSORCIO :	CONSRCIO REDES Y PTAPS VALLE			AVANCE DE PLAN DE TRABAJO SST (%)		88%
NOMBRE PROFESIONAL SST:	FLOR MARIA MARTINEZ			NOMPRE PROF. SST INTERVENTORIA:		JULIANA IZQUIERDO M.

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
EVIDENCIA REALIZACIÓN PAUSAS ACTIVAS	1			Se adjunta registro fotografico
EVIDENCIA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓNES Y/O PLAN DE FORMACIÓN	1			se adjunta formatos de capacitaciones sobre temas SST
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS PARA TAREAS RUTINARIAS, NO RUTINARIAS Y DEL ATO RIESGO, ASI COMO LA EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN	1			Se presenta ATS para las actividades de alto riesgo
EVIDENCIA CONTROL CONTRATISTAS	1			Se divulga las politicas SST al personal operativo subcontratista y al personal administrativo
PUNTO ECOLOGICO	1			
TOTAL	21	3	0	
CUMPLIMIENTO		88%		

OTROS:

OBSERVACIONES:

Juliana Martinez

Nombre:	Nombre: JULIANA MARULADANDA
Firma:	Firma:
Cargo:	Cargo: PROFESIONAL SST

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P / PAP-PDA VALLE DEL CAUCA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC - MECI INFORME DE INTERVENTORIA	Código: FO-PDA.2.1-4 Versión: 4 Fecha de Vigencia: 01/02/2019

FICHA VISITA TECNICA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y OBRAS INFORME No. 24 ABRIL DE 2025

FECHA:	DIA	MES	AÑO	HORA DE INICIO:		
	31	5	2025	HORA DE FINALIZACIÓN :		
VEREDA/ CORREGIMIENTO:	PUENTE ROJO, LA MAGDALENA, GUABITAS			MUNICIPIO:	GINEBRA/GUACARI	
TRAMO/FRENTE DE OBRA:				LONGITUD/ÁREA :		
CONSORCIO : REDES Y PTAPS VALLE				AVANCE DE OBRA (%)		82,40%

DESCRIPCIÓN DE VISITA TÉCNICA

COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
AIRE				
EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO		X		
EMISIONES DE RUIDO		X		
EMISIÓN DE OLORES OFENSIVOS				
OTROS:				
SUELO	**SI**	**NO**	**N/A**	
AFECTACIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA		X		
PROCESOS EROSIVOS		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS (DOMÉSTICOS, ESPECIALES, PELIGROSOS)		X		
DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES - RCD		X		
OTROS:				
AGUA	**SI**	**NO**	**N/A**	
DEFICIENCIAS DE ABASTECIMIENTO EN OBRA		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS		X		
VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES		X		
MALAS INSTALACIONES SANITARIAS		X		
OTROS:				
FLORA Y FAUNA	**SI**	**NO**	**N/A**	
DESCAPOTE DE COBERTURA VEGETAL	X			
INTERVENCIÓN A ESPECIES VEGETALES		X		
EXISTENCIA DE ÁREAS PROTEGIDAS		X		
AFECTACIÓN A ECOSISTEMAS		X		
AFECTACIÓN A HÁBITATS		X		
ALTERACIÓN DE CORREDORES BIOLÓGICOS		X		
OTROS:				
PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES	**SI**	**NO**	**N/A**	
CONCESIÓN DE AGUAS (SUPERFICIALES O SUBTERRÁNEAS)	X			
OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROBACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	X			EN IMPLEMENTACION
PERMISO DE VERTIMIENTOS		X		
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	X			PENDIENTE DE AUTORIZAR EN LA ZONA BOCATOMA
PERMISO DE EXPLANACIONES Y/O MOVIMIENTO DE TIERRAS		X		
OTROS:				
SOCIOECONÓMICO	**SI**	**NO**	**N/A**	
PUNTO(S) DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	X			
ACTAS DE VECINDAD	X			
ACTAS DE RECIBO		X		
DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CON COMUNIDADES	X			
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS - PQRS		X		
PREDIOS AFECTADOS		X		
AFECTACIÓN A SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		X		
ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES EN LA ZONA		X		
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	X			
MANO DE OBRA LOCAL	X			
PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS		X		
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL		X		
GESTIÓN SOCIO -PREDIAL	X			
OTROS:				
OBSERVACIONES:				

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.

INFORME No. 25 DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2000.13.12.005- 2022

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 200.46.01.005-2022 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA "EJECUTAR EL PLAN DE OBRA PÚBLICAS BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOSDE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL

INTERVENTOR
CONSORCIO INTERGUACARI
REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

SUPERVISOR
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.
DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA

DISTRITO SANTIAGO DE CALI – MAYO 2025

INFORMACION GENERAL

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933.oo) M/CTE
Valor inicial	$ 29.432.080.933.oo
Valor Adición No.01	$ 2.571.146.616.oo
Valor Total del Contrato	$ 32.003.227.549.oo
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Inicio:	Diciembre 1 de 2022
Plazo de ejecución delproyecto	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Fecha de Terminación:	Enero 1 de 2024
Fecha de suspensión No.01:	Dos meses a partir de Julio 27 de 2023
Prorroga No. 01 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Septiembre del 2023
Prorroga No. 02 a la Suspensión No.01	Un mes a partir del 27 de Octubre del 2023
Prorroga No. 03 a la Suspensión No.01	45 días a partir del 27 de Noviembre del 2023
Fecha de reinicio:	Enero 10 de 2024
Nueva fecha de terminación:	Junio 14 de 2024
Adicional en Tiempo No.01	Nueve (09) meses
Fecha de terminación prorroga	Marzo 14 de 2025
Adicional en Tiempo No.02	Diez (10) meses
Nueva fecha de terminación	Enero 22 de 2026

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En este informe mensual se resume el seguimiento técnico y financiero de los aspectos más relevantes ocurridos durante la ejecución de la obra en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Mayo de 2025.

2.1 COMITÉS DE OBRA

Durante este mes no se realizaron comités de obra, se priorizo la atención a los diferentes requerimientos de Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca, para la Reformulación No. 02, en conjunto con el contratista Consorcio Redes y PTAPS Valle, Ing. Holmes Zúñiga García – Apoyo a la Supervisión de Vallecaucana de Aguas y la interventoría Consorcio Interguacari.

2.2 COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO

A la fecha se han tramitado 13 actas parciales al contratista y el respectivo descuento del anticipo, en este periodo no se tramito ningún acta parcial de obra:

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		$ 29.432.080.933	
Valor adicionado:		$ 2.571.146.616	
Valor total del contrato:		$ 32.003.227.549	
Valor Acta Parcial No. 1:	$ 8.371.066.842		26,16%
Valor Acta Parcial No. 2:	$ 886.015.856		2,77%
Valor Acta Parcial No. 3:	$ 907.712.127		2,84%
Valor Acta Parcial No. 4:	$ 503.892.952		1,57%
Valor Acta Parcial No. 5:	$ 369.286.058		1,15%
Valor Acta Parcial No. 6:	$ 7.371.115.364		23,03%
Valor Acta Parcial No. 7:	$ 604.131.566		1,89%
Valor Acta Parcial No. 8:	$ 385.455.620		1,20%
Valor Acta Parcial No. 9:	$ 689.009.943		2,15%
Valor Acta Parcial No. 10:	$ 1.216.561.098		3,80%
Valor Acta Parcial No. 11:	$ 2.068.353.769		6,46%
Valor Acta Parcial No.12	$ 690.349.724		2,16 %
Valor Acta Parcial No.13	$ 2.313.472.543		7.23 %
Total, cancelado a la fecha:	**$ 26.376.423.462**		82.42%
Saldo por ejecutar:	$ 5.626.804.087		17.58%
Sumas iguales:	$ 32.003.227.549	$ 32.003.227.549	100,00%

Tabla N° 1. Relación pago actas parciales de obra al contratista



Figura N° 1. Gráfico de la relación de pagos de actas parciales contratista

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	% amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			$ 8.829.624.280	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	$ 2.511.320.053		28,44%
Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	$ 265.804.757		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	$ 272.313.639		3,08%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	$ 151.167.886		1,71%
Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	$ 110.785.818		1,25%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	$ 2.211.334.610		25,04%
Amortización acta Parcial N° 7:	31/07/2024	$ 181.239.470		2,05%
Amortización acta Parcial N° 8:	31/08/2024	$ 115.636.686		1,31%
Amortización acta Parcial N° 9:	30/09/2024	$ 206.702.983		2,34%
Amortización acta Parcial N° 10:	08/11/2024	$ 364.968.330		4,13%
Amortización acta Parcial N° 11:	30/11/2024	$ 620.506.131		7,03%
Amortización acta Parcial N° 12:	31/01/2025	$ 207.104.917		2,35%
Amortización Acta Parcial No.13	10/02/2025	$ 694.041.763		
Valor amortizado		**$ 7.912.927.043**		**89.62 %**
Saldo por amortizar:		$ 916.697.237		**10.38%**
Sumas iguales:		**$ 8.829.624.280,00**	**$ 8.829.624.280**	**100,00%**

Tabla N° 2. Relación amortización anticipo

Relación de actas parciales de la interventoría, en este periodo no se tramito ningún acta parcial de interventoría.

Descripción	Valor ejecutado	Valor contrato	Porcentaje % ejecución
Valor inicial del contrato:		$ 1.502.246.766	
Valor adicionado:		$ 131.126.000	
Valor total del contrato:		$ 1.633.372.766	
Valor Acta Parcial No. 1:	$ 427.238.980		26,16%
Valor Acta Parcial No. 2:	$ 45.217.628		2,77%
Valor Acta Parcial No. 3:	$ 72.195.076		4,42%
Valor Acta Parcial No. 4:	$ 18.783.787		1,15%
Valor Acta Parcial No. 5:	$ 376.165.748		23,03%
Valor Acta Parcial No. 6:	$ 30.870.745		1,89%
Valor Acta Parcial No. 7:	$ 19.658.237		1,20%
Valor Acta Parcial No. 8:	$ 35.139.507		2,16%

Valor Acta Parcial No. 9:	$ 62.044.616		3,80 %
Valor Acta Parcial No. 10:	$ 105.486.042		6,46 %
Valor Acta Parcial No. 11	$ 35.207.836		2,16 %
Valor Acta Parcial No. 12	$ 117.987.100		7.22 %
Total, cancelado a la fecha:	**$ 1.345.995.302**		**82.41%**
Saldo por ejecutar:	$ 287.377.464		17.59%
Sumas iguales:	$ 1.633.372.766	$ 1.633.372.766	100,00%

Tabla N° 3. Relación de pagos actas parciales interventoría

Relación de la amortización del anticipo realizados a la interventoría:

Descripción	Fecha	Valor amortizado	Valor anticipo 30%	Porcentaje % amortización
Valor anticipo del contrato (30 %):			$ 450.674.030	
Amortización acta Parcial N° 1:	31/05/2023	$ 128.171.694		28,44%
Amortización acta Parcial N° 2:	30/06/2023	$ 13.565.288		3,01%
Amortización acta Parcial N° 3:	31/01/2024	$ 21.658.523		4,81%
Amortización acta Parcial N° 4:	31/03/2024	$ 5.635.136		1,25%
Amortización acta Parcial N° 5:	30/04/2024	$ 112.849.724		25,04%
Amortización acta Parcial N° 6:	31/05/2024	$ 9.261.224		2,05%
Amortización acta Parcial N° 7:	13/09/2024	$ 5.897.471		1,31%
Amortización acta Parcial N° 8:	30/09/2024	$ 10.541.852		2,33%
Amortización acta Parcial N° 9:	12/11/2024	$ 18.613.385		4,13%
Amortización acta Parcial N° 10:	02/12/2024	$ 31.645.813		7,02%
Amortización acta Parcial N° 11:	01/31/2025	$ 10.562.351		2,34%
Amortización Acta Parcial No. 12	11/03/2025	$ 35.396.130		7,86%
Valor amortizado		**$ 403.798.591**		**89.6%**
Saldo por amortizar:		$ 46.875.439		10.4%
Sumas iguales:		$ 450.674.030	$ 450.674.030	**100,00%**

Tabla No. 4. Relación amortización del anticipo realizados a la interventoría

Se continua en tramite la adición de la Interventoría para la Reformulación No. 02 del proyecto, por un valor de $ 690.624.799.oo

ITEM	DESCRIPCION	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACIÓN CONTRATO BASE				
		UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	Vr.TOTAL O.COMPLE	INTERVENTORIA	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	INTERVENTORIA
	OBRA CONTRATADA									
	PRELIMINARES				$ 25.742.000,00					
	BOCATOMA				$ 953.458.597,00					
	LINEA DE ADUCCION				$ 22.021.249,00					
	DESARENADOR				$ 1.686.035.776,00					
	LINEA DE CONDUCCIÓN				$ 947.030.162,00		635.474.222,00	32.409.185,32		
	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL				$ 53.692.726,00		-			
	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA				$ 268.037.924,00		(12.525.145,00)			
	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ				$ 497.443.188,00		(5.350.247,00)			
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA				$ 1.135.276.765,00		693.144.376,00	35.350.363,18		
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARÍ				$ -		-			
	MANEJO SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTAL				$ 43.882.208,00		-			
	SUMINISTROS				$ 9.452.933.890,00		58.475.572,00	2.371.851,27		
	OBRA ADICIONAL - ITEMS NO PREVISTOS									
	OBRA CIVIL DE TANQUES GINEBRA Y ALBANIA				$ 1.765.302.557,00		1.449.785.077,00	73.939.038,93		
	LINEA DE CONDUCCIÓN				$ -				$ 3.285.353.523	$ 167.553.030
	INTERVENCIONES PTAP GINEBRA				$ 3.189.466.568,00		175.951.120,00	8.973.507,12		
	INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA				$ -				$ 970.937.658	$ 49.517.821
	INTERVENCIONES PTAP GUACARÍ				$ 3.500.891.797,00		360.356.299,00	18.378.171,25		
	INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GUACARÍ				$ -				$ 1.416.590.147,00	$ 72.246.050,50
	CONEXIONES HIDRÁULICAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA				$ -				$ 398.335.232	$ 20.315.097
	CONEXIONES HIDRÁULICAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO ALBANIA				$ -				$ 320.034.420	$ 16.321.756
	ITEMS DESGLOSADOS DE APU'S CONTRACTUALES OBRA CIVIL				$ 799.270.473,00		339.661.880,00	17.323.775,88		
	INTERVENTORIA R2							188.745.892,95		$ 325.877.553
									$ 690.624.799	

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí.

Las obras que se contemplan construir son:

Bocatoma

Línea de Aducción

Desarenador

Cámara de distribución de caudal - CADICA

Viaductos

Líneas de Conducción en tubería PEAD: Tramo 1 en 18" – Tramo 2 en 10 " y Tramo 3 en 14"

Intervenciones en las PTAP de Ginebra y Guacarí'

Ya se viabilizo a la Reformulación No. 02 del proyecto de obra, por un valor de $ 13.531.646.339.oo

ITEM	DESCRIPCION	VALOR CONTRATO BASE				MODIFICACIÓN CONTRATO BASE			VALOR TOTAL CONTRATO CON REFORMULACION N°2
		UN	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	Vr.TOTAL O.COMPLE	Vr.TOTAL O.ADICIONAL	
	OBRA CONTRATADA								
	PRELIMINARES				$ 25.742.000,00				25.742.000
	BOCATOMA				$ 953.458.997,00				953.458.997
	LINEA DE ADUCCION				$ 22.021.249,00				22.021.249
	DESARENADOR				$ 1.686.035.776,00				1.686.035.776
	LINEA DE CONDUCCIÓN				$ 947.030.162,00		635.474.222,00		1.582.504.384
	CÁMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL				$ 53.692.726,00		-		53.692.726
	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA				$ 268.037.924,00		(12.525.145,00)		255.512.779
	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ				$ 497.443.188,00		(5.350.247,00)		492.092.941
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA				$ 1.135.276.765,00		693.144.376,00		1.828.421.141
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GUACARÍ				$ -		-		-
	MANEJO SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD, SEGURIDAD Y AMBIENTAL				$ 43.892.208,00		-		43.892.208
	SUMINISTROS				$ 9.452.933.890,00		58.475.572,00		9.511.409.462
	OBRA ADICIONAL - ITEMS NO PREVISTOS								-
	OBRA CIVIL DE TANQUES GINEBRA Y ALBANIA				$ 1.765.302.557,00		1.449.785.077,00		3.215.087.634
	LINEA DE CONDUCCIÓN				$ -			$ 3.285.353.523	3.285.353.523
	INTERVENCIONES PTAP GINEBRA				$ 3.189.466.588,00		175.951.120,00		3.365.417.708
	INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GINEBRA				$ -			$ 970.937.658	970.937.658
	INTERVENCIONES PTAP GUACARÍ				$ 3.500.891.767,00		360.356.299,00		3.861.248.066
	INTERVENCIONES ELECTRICAS EN LA PTAP DE GUACARÍ				$ -			$ 1.416.590.147,00	1.416.590.147
	CONEXIONES HIDRÁULICAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA				$ -			$ 398.335.232	398.335.232
	CONEXIONES HIDRÁULICAS TANQUE DE ALMACENAMIENTO ALBANIA				$ -			$ 320.034.420	320.034.420
	ITEMS DESGLOSADOS DE APU'S CONTRACTUALES OBRA CIVIL				$ 799.270.473,00		339.681.880,00		1.138.952.353
	TOTAL COSTOS DIRECTOS								
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + SUMINISTROS				$ 24.340.486.529,00		$ 3.694.993.154,00	$ 6.391.250.980,00	$ 34.426.730.663,50
	Mas: Administración	27,2%			$ 6.620.612.336,00		$ 1.005.038.138,00	$ 1.738.420.267,00	$ 9.364.070.740,00
	Mas: Imprevistos	1%			$ 148.575.525,00		$ 36.365.176,00	$ 63.912.510,00	$ 248.153.212,00
	Mas: Utilidad	6%			$ 893.253.158,00		$ 218.191.055,00	$ 383.475.099,00	$ 1.494.919.272,00
	TOTAL COSTOS OBRA CIVIL + SUMINISTROS				$ 32.003.227.549,00		$ 4.954.587.523,00	$ 8.577.058.816,00	$ 45.534.873.887,50

COSTO TOTAL CONTRACTUAL	$ 32.003.227.549	$ 4.954.587.523,00	$ 8.577.058.816	$ 45.534.873.888
COSTO ADICIONAL REFORMULACION N°2	$ 13.531.646.339			
COSTO TOTAL CON ADICIONAL REFORMULACION N°2	$ 45.534.873.888			
PORCENTAJE (%) DE ADICCION	42,28%			

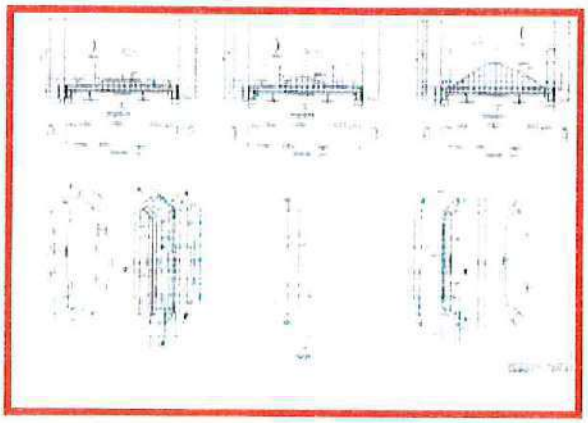
2.3 COMPONENTE TECNICO - ACTIVIDADES DEL CONTRATO

Durante el mes de Mayo de 2025, se desarrollan actividades en:

A. BOCATOMA

1. Tipo de Bocatoma: Lateral sobre el Rio Guabas
2. Caudal de Captación: 233 Lps
3. Caudal de Derivación a Guacari: 164.5 Lps
4. Caudal de Derivación a Ginebra: 68.5 Lps

Estado Actual Bocatoma: **Sin ejecución.**



El Consultor - Ing. Carlos Valencia , envio la propuesta economica y tecnica al Contratista Consorcio Redes y Ptaps Valle, para la implementacion de una nueva tecnica que va a reemplazar la funcion del desarenador por malla **Coanda**, la cual va a estar instalada en la bocatoma.

Ya fue aceptada la propuesta económica por la Entidad contratante.
El contrato entre el Consorcio Redes y Ptaps Valle y el Ing. Carlos Valencia, se encuentra en proceso de legalizacion entre las partes.

B. ADUCCIÓN

1. Línea De Aducción: Tubería PEAD DN 18" L: 6.0 ml
2. Caudal: 233 Lps

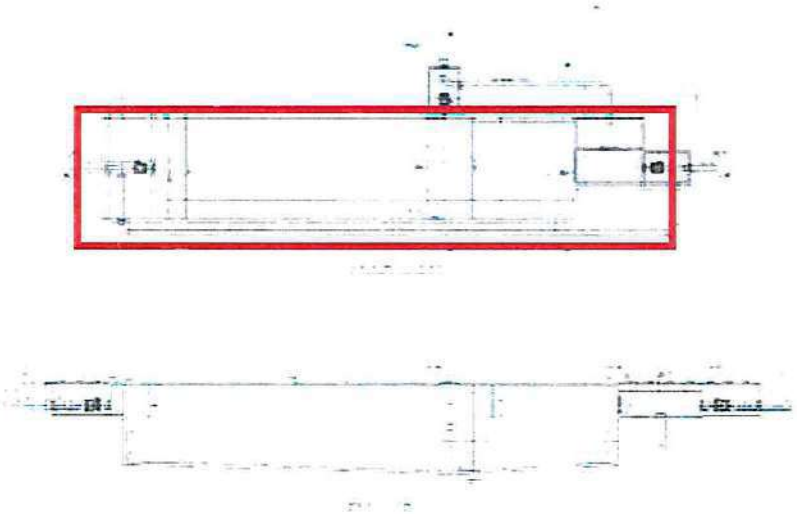
Estado Actual Línea de Aducción: Sin ejecución.

C. DESARENADOR

1. Caudal de diseño: 233 Lps

Estado Actual Desarenador: Sin ejecución.


Se está evaluando la alternativa de reemplazar esta estructura por la implementación de Mallas COANDA la cual va estar instalada en la bocatoma.



1.1 Dimensiones

Largo: 38 mts
Ancho: 8 mts
Profundidad: 5 mts

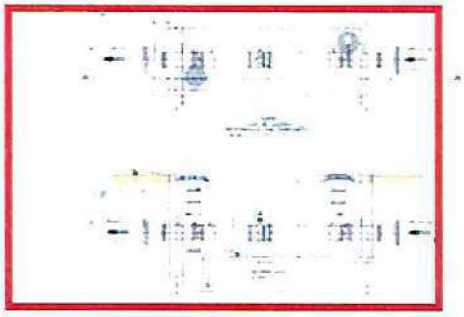D. MACROMEDIDOR




Sin ejecución.


2. CONDUCCIÓN

2.1 Tramo 1 Bocatoma – CADICA en Puente Rojo: Tubería PEAD diámetro 18" – L=3450ml

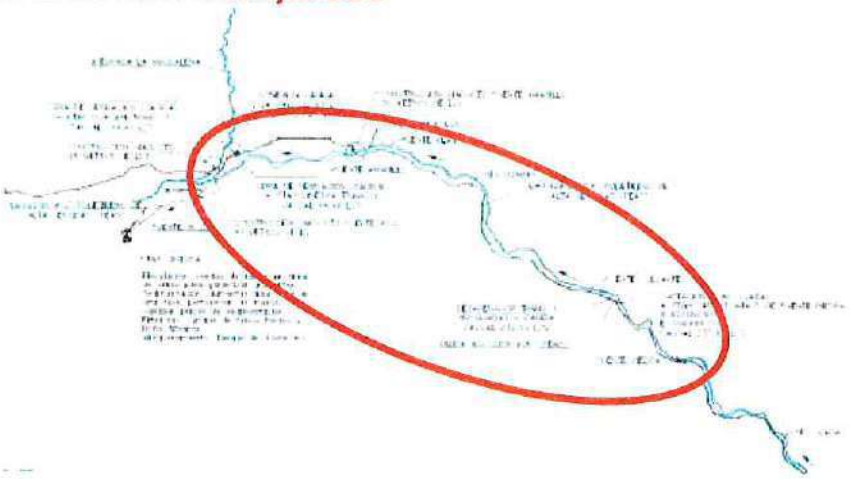Estado Actual Tramo 1: Sin ejecución.



D.2 CADICA: Cámara de Distribución de caudales



D 2.1 Dimensiones
Largo: 5.4 mts
Ancho: 3.4 mts
Profundidad: 3 mts

Estado Actual CADICA: Sin ejecución.

Nota:

Se tiene proyectado cambiar de lugar la CADICA, según la Ing. Gina López – encargada de la revisión hidráulica por parte del Contratista, es posible ubicarla aguas arriba donde está proyectada, al frente del Balneario Chicuco.
La revisión hidráulica donde la propone tiene el concepto favorable.

Además, hay espacio para su construcción.


D.3 Tramo 2 CADICA en Puente Rojo a PTAP Ginebra: Tubería PEAD diámetro 10" – L=1000ml

Estado Actual Tramo 2: **Sin ejecución.**




Está en proceso de legalización la servidumbre con la Familia Saavedra – Blum, para la instalación de la tubería PEAD de 10 ".

D.4 Tramo 3 CADICA en Puente Rojo a PTAP Guacarí: Tubería PEAD diámetro 14"



L total =8000ml



Porcentaje de Ejecución: 72 %

Estado Actual: El Tramo 3, Instalación tubería PEAD diámetro 14" L: 5.738 ml, la Comunidad suspendió las obras el día 11 de Junio de 2024.

La Comunidad representada por Pro-Territorio, firmo el 18 de Diciembre de 2024, un acta de acuerdo pactado entre la Gobernación del Valle y Vallecaucana de Aguas para continuar con las obras.

Continua el proceso de legalización la servidumbre con el Ingenio Pichichi, para la instalación de la tubería PEAD de 14 " en una L: 500 ml

3. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

PTAP GINEBRA

Floculadores: Cambio de placas de AC a Fibra de Vidrio
Concluido



Sedimentadores 1 – 2 – 3 :

Actividades ejecutadas:

Sistema de barrelodos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas



Sedimentador 3 : En servicio



Sedimentador 2 : En servicio






Sedimentador 1: En servicio

Actividades de Filtración: Demolición de canales en concreto
Retiro de material filtrante
Demolición de falso fondo
Ajuste Losa de Fondo
Sistema de sopladores
Reemplazo de material filtrante
Reemplazo de válvulas de lavado
Cambio de canaletas en acero inoxidable
Canal Falso Fondo - Leopold

Estado Actual Filtración:

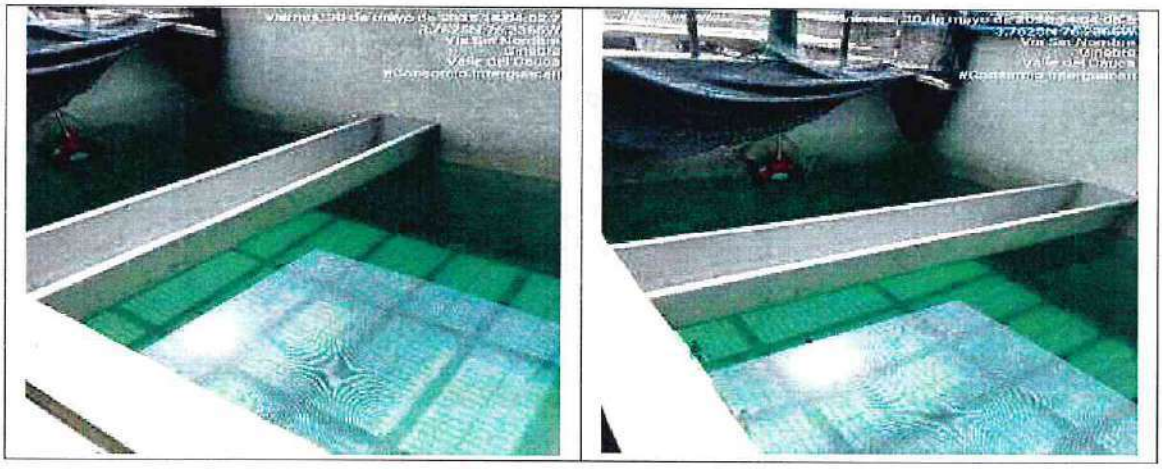- Instalación de canaleta en acero inoxidable para agua de lavado de filtro
- Instalación de niples pasamuros de sedimentador
- Se lleno para verificar filtraciones



Por ejecutar:

- Instalación de sistema de inyección de aire proveniente de los sopladores
- Instalación de lechos de grava
- Instalación del filtralite

Nota: una vez se tenga el sistema de filtración No. 01 en funcionamiento se pondrá en funcionamiento el sedimentador No. 01.

Tanque de Almacenamiento

Con una capacidad de almacenamiento de 470 m3 en dos compartimientos y caja de válvulas que va abastecer a La Floresta y Villa Vanegas

Estado Actual: En ejecución 92 %

Actividades por ejecutar:

- Losa superior de cámaras de entrada y salida
- Instalación de sistema de válvulas
- Instalación de tapas en láminas de alfajor para entrada a tanque
- Rellenos perimetrales: en ejecución
- Instalación tubería de desagüe
- Conexión al sistema existente



Nota: continuas lluvias caídas en el sector han impedido seguir con esta labor.

Caseta eléctrica



Estado Actual: Ejecución 100 % obra civil

Por motivos de lluvias constantes se suspende las labores de:
Las excavaciones para ductos eléctricos del poste de la acometida a la caseta eléctrica
Rellenos con material de excavación



Caseta de Sopladores de Filtración

- Se ejecutaron las siguientes actividades:
- Excavaciones para zapatas y viga de amarre
- Relleno roca muerta para losa
- Fundición zapatas, viga de amarre, pedestales y losa de piso





Suministro de Sopladores



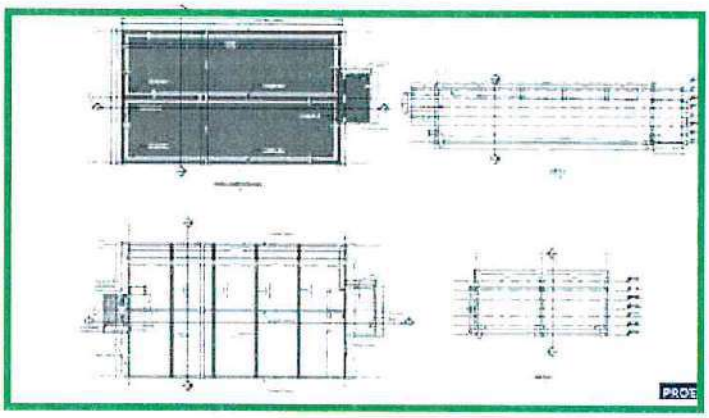
Suministro de Falsos Fondos para los dos filtros



Suministro de gravas para filtros



Tanque de almacenamiento La Albania



Dimensiones exteriores

Largo: 25 mts
Ancho: 15 mts
Profundidad: 5 mts

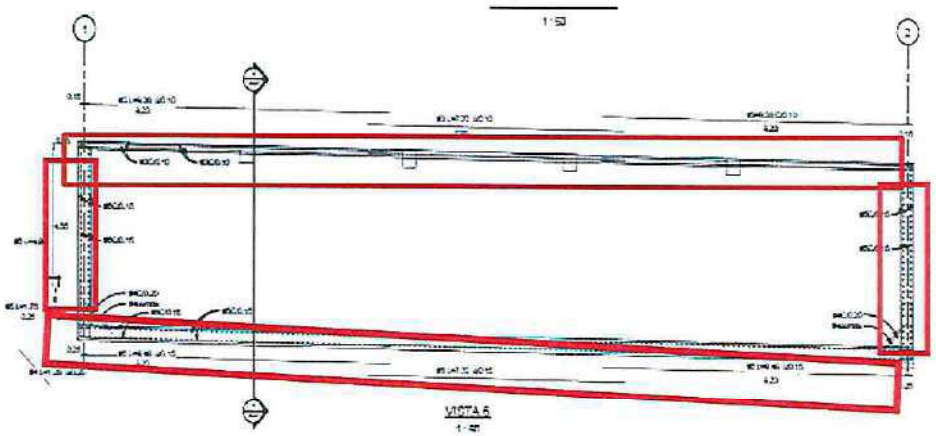
Actividades ejecutadas en este periodo:

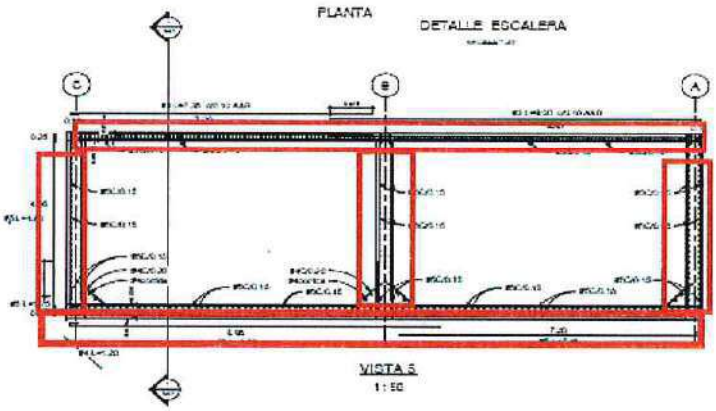
- No se ha ejecutado ninguna actividad





Area resaltada en rojo significa fundicion en concreto





PTAP GUACARI

Floculadores: Sistema nuevo de seis paletas mecánicas para el primer circuito

Estado Actual Floculador:

Floculador No. 03

- Se termina la demolición de pasarelas y muros en concreto reforzado
- Colocación de acero de refuerzo para elevar muro exterior y tres pantallas
- Fundición de tres pantallas en concreto, una de ellas con pases en tubería PVC de 6"
- Fundición de losas de pisos
- Instalación de pasarelas metálicas


















Sedimentador 3:

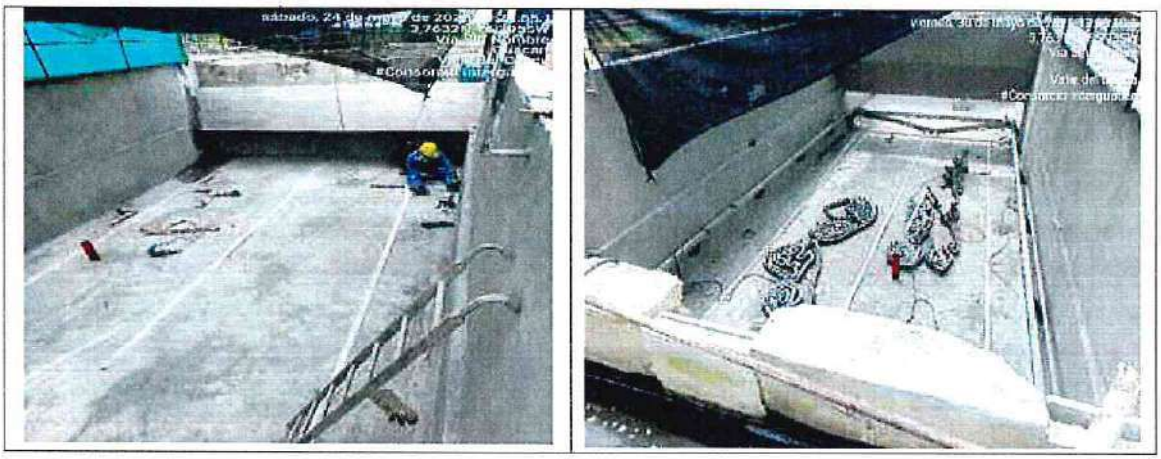- Colocación de acero de refuerzo para pantallas de entrada y salida
- Fundición de pantallas en concreto de entrada y salida
- Instalación de barrelodos







Sedimentadores 1 – 2- 3: Actividades en general:

Sistema de barrelodos
Módulos Tipo Colmena
Canaletas en acero inoxidable Tipo dentada
Pasarelas

Actividades a realizar por Sedimentador:

- Ajustes de losa de fondo en concreto
- Impermeabilización de muros
- Instalación de la estructura metálica y los módulos sedimentadores tipo colmena
- Instalación de las tres cerchas en acero inoxidable que soportaran las canaletas
- Instalación de las canaletas de reparto en acero inoxidable.
- Instalación de la estructura metálica de la pasarela y los pasamanos
- Instalación válvula mariposa de diámetro 4" para evacuar los lodos
- Instalación de las válvulas existentes de diámetro 4"
- Ajustes para iniciar las pruebas y puesta en marcha del barrelodos con personal de Acuavalle

Estado Actual Sedimentador 1: En servicio



Estado Actual Sedimentador 2: En servicio



Filtración: Canal Falso Fondo - Leopold
Ajuste Losa de Fondo
Sistema de sopladores
Reemplazo de material filtrante
Reemplazo de válvulas de lavado
Cambio de canaletas en acero inoxidable

Estado Actual Filtración: Sin ejecución

Suministro de falsos fondos – Son seis unidades (Sistema A – Sistema B)



Suministro de falsos fondos Leopold



Suministro de sopladores -Son dos unidades



Suministro de material filtrante : Filtralite



Caseta eléctrica

Estado Actual: En ejecución 90 %

Actividades ejecutadas

- Instalación de ventanas y puerta principal
- Instalación de cubierta



Otras reuniones

Se llevaron a cabo reunión el día 16 de Mayo de 2025 en Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca para tratar temas relacionados con la Reformulación No.02 con la participación de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P(Ing. Holmes Zúñiga García) , Consorcio Redes y Ptaps y Consorcio Interguacari.



2.3 COMPONENTE AMBIENTAL

Con relación al tema ambiental se tiene:

- Permiso de aprovechamiento Forestal en la Bocatoma Ginebra, se tiene que, la Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024 y se da respuesta: Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 - "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca" - VIGENCIA: 23-07-2025

- Permiso para rotura del pavimento del Tramo N° 3, se radico ante la Secretaria de Planeación de Guacarí, pero a la fecha no se tiene respuesta. El contratista radica nuevamente oficio en las Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.

- Por parte de la Gobernación del Valle, se recibe respuesta del oficio del 5 de agosto, el día 27 de septiembre de 2014, mediante oficio 1.360.129 radicado 2024138117, donde informan que las vías a intervenir son del Municipio de Guacarí.

    - Permiso de rotura
      Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos:

Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.
Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra

- Se radica solicitud por tercera vez, en el Municipio de Guacari, el tramo que corresponde:

– Puente Amarillo a Puente Rojo.

- Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRA

En el siguiente cuadro se registran los permisos, que se han solicitado, los que se han otorgado y los que estan en proceso de ejecución:

ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	DESCRIPCION	ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)
CVC	• Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción de la bocatoma, desarenador, macromedidor y aducción.	**Nota 1: La Alcaldía radicó oficio ante CVC el día 27 de febrero de 2024, No. Radicado 206392024** **OTORGADO** Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024 "Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento Valle del Cauca" **VIGENCIA 23-07-2025**
CVC	• Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.	**AUN NO SE HA INICIADO LA GESTIÓN**
CVC	**PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCES** El día 7 de marzo de 2023 se realiza la notificación del acto administrativo por el cual se prorroga el permiso de ocupación de cauce otorgado en la Resolución 0740 N° 0741 01430 del 9 de diciembre de 2021. El tiempo del permiso de ocupación de cauce se extendió un (01) año a partir de la fecha de notificación de este acto administrativo. Cabe destacar que durante este periodo no se han adelantado actividades de ocupación del cauce ni desvío del mismo. Respecto a la vigencia del permiso, se continúa enfatizando que la entidad Acuavalle S.A E.S.P radicó el oficio AC - 19002024 ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando la prórroga del permiso de Ocupación de Cauce, con número de radicado 207602024 del 27 de febrero de 2024. Después que Acuavalle recibió el 19 de marzo del 2024 por parte de CVC el cobro por EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO a la solicitud de prórroga, realizaron el pago mediante cheque el día 12 de abril del 2024. Se pudo tener hasta el día 14 de mayo del presente año la visita técnica ambiental por parte de CVC con el fin de evaluar la solicitud de prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce. (Documento Adjunto)	**AMBIENTAL PARA PRÓRROGA** Nota 1: Acuavalle radicó oficio ante CVC el día 27 de Febrero de 2024. Otorgado / 7 marzo de 2024 (1 año) Nota 2: Acuavalle realizó pago el 12 de abril de 2024 por evaluación y seguimiento para prórroga. Prórroga Permiso de Ocupación de Cauce RESOLUCIÓN 0740 No. 0741 0502 del 31 de Mayo de 2024

CVC	Permiso de Concesión de aguas superficiales	**OTORGADO Resolución 0740 No. 0741 0000576 10-07-2020**"Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca" **VIGENTE**
CVC	Permiso de Aprovechamiento Forestal - PTAP Ginebra	**OTORGADO** **Resolución 740 No. 0741 0381** **29-04-2024** Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad.
Planeación Municipal Ginebra	Licencia de Espacio Público	**OTORGADO** **Resolución No. 004-01 2023** **26-01-2023** "Por medio de la cual se aprueba una licencia urbanística de intervención y ocupación del espacio público" **VIGENCIA 26-01-2025** **VIGENTE**
ENTIDAD A EMITIR EL PERMISO	**DESCRIPCION**	**ESTADO DE LA GESTION (AVANCE)**
Planeación Municipal Guacarí	Licencia de Espacio Público	**OTORGADO** **Resolución No. 004-01 2023** **26-01-2023** Por la cual se expide una licencia de intervención del espacio público para desarrollar un proyecto" **VIGENCIA 03-02-2025** **VIGENTE**
Secretaria de Movilidad de Ginebra	Plan de Manejo de tránsito	**OTORGADO** **Resolución No. 900-50-020** **20-03-2023** "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" **VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP** **VIGENTE**
Secretaria de Movilidad y transporte de Guacarí	Plan de Manejo de tránsito	**OTORGADO** "Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle" **VIGENCIA DURACIÓN DEL PROYECTP** **VIGENTE**
Planeación Municipal Ginebra	**Permiso de rotura pavimento** Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, para los siguientes tramos: Tramo 1: Inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo. Tramo 2: Inicia en Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra Se radica solicitud por segunda vez, en el Municipio de Ginebra, en el tramo: Puente Amarillo a Puente Rojo.	**PENDIENTE** - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Ginebra el día 14 de agosto, en la y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024 - El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024. - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra el día 22 de octubre de 2024.

Planeación Municipal Guacarí	Se radica solicitud en la Gobernación del Valle, para el tramo: Inicia desde la Abscisa K7+420, (Vía entre los corregimientos de Guabitas y el Placer) hasta la Planta de Guacarí.	**PENDIENTE** - Se recibe el 22 de mayo 2024 documentación por el Director del Departamento Administrativo de Planeación sobre la solicitud ante la Alcaldía de Guacarí. - "El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldía de Guacarí el día 21 de agosto y en la Gobernación del Valle el día 5 de agosto de 2024" - "El contratista recibe comunicado por parte de la Gobernación del Valle el día 27 de septiembre 2024, en respuesta a el oficio enviado el día 5 de agosto de 2024." - El contratista radica nuevamente oficio en la Alcaldías de Ginebra y Guacarí el día 22 de octubre de 2024.
CVC	Aprovechamiento Forestal PTAP GINEBRAEn el mes de julio se realizó visita a predio de la Alcaldía de Ginebra para realizar la compensación forestal de las especies arbóreas que fueron aprovechadas en la PTAP Ginebra. Se está a la espera de comunicado de la CVC para aprobación del nuevo predio y su recomendación para poder realizar esta compensación.	**EN ESPERA DE RESPUESTA** . Es este periodo visitan la obra dos funcionarios de la CVC, la Ingeniera Daniel Castillo y el Técnico Segundo Fiscal para a coordinar lo relacionado con la siembra por compensación en respuesta al requerimiento realizado por ACUVALLE y en cumplimiento al permiso de aprovechamiento forestal de la planta de Ginebra. Pero no se pudo hacer la visita a el predio debido a que no se dio la autorización para la visita, se debe reprogramar

2.4.1 Disposición de residuos sobrantes de obra:

El contratista cuenta con dos sitios autorizados para la disposición de estos residuos:

- El relleno sanitario en el corregimiento de Presidente en el Municipio de San Pedro. Este cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la CVC
- Servi Transportes López y Recuperación Ambiental S.A.S, en el Municipio de Palmira, el cual cuenta con una capacidad de recepción de 85.000 m3 para disposición final de RCD avalado por Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.
- Como el tanque de la PTAP de Ginebra se debe rellenar debido a que el diseño inicial tenía una sección mayor, el material sobrante de las excavaciones del tramo 3 se está llevando a la planta y se está aprovechando este material para hacer el relleno.

2.4 INCONVENIENTES QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Desde que se inició la ejecución del proyecto se ha tenido situaciones que han impedido el correcto desarrollo de los trabajos en la mayoría de los frentes, en este momento solo se está trabajando en las plantas de tratamiento de agua potable de Ginebra y Guacarí, estas plantas se están haciendo adecuaciones en los tanques sedimentadores, en el siguiente cuadro, se resumen las actividades que se encuentran suspendidas:

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN	ESTRUCTURA	ESTADO
Aprovechamiento forestal en la bocatoma	Bocatoma, desarenador, macromedidor	Pendiente visita CVC
Permiso de ocupación de cauce	Bocatoma	Pendiente visita CVC
Servidumbre Ingenio Pichichi K5+350 a K5+850	Tubería de conducción – Tramo 3	Ya el Ingenio Pichichi aprobó. Pendiente legalización de la escritura
Permiso por parte de la señora Blum, para la instalación de tubería PEAD 10" , llegada a la PTAP de Ginebra	Tubería de conducción tramo 2	Ya se adjudicó el contrato para Realizar la instalación de la tubería en el predio de la señora Blum – Pendiente la servidumbre por parte de la Familia Saavedra-Blum para dar inicio a la instalación de la tubería
Rediseño de las estructuras en la zona de los viaductos	Viaductos	Suspendido – Vallecaucana
Actividades del tramo 3 suspendidas, por comunidad, no están de acuerdo con la ejecución del proyecto	Línea de conducción tramo 3	Ya se firmó el acuerdo entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y la comunidad- pendiente que el contratista legalice la reformulación
Inicio a trabajar en la bocatoma, desarenador y CADICA	Bocatoma-desarenador-CADICA	Ya se firmó el acuerdo entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y la comunidad- pendiente que el contratista legalice la reformulación
Por la problemática social que se tiene con los habitantes de la zona rural, no se ha podido dar inicio a las actividades que comprenden el tramo 1. Esto viene desde el año 2023 y hoy no se ha resuelto esta situación	Línea de conducción tramo 1	Ya se firmó el acuerdo entre la Gobernación del Valle del Cauca, Vallecaucana de Aguas y la comunidad- pendiente que el contratista legalice la reformulación

Tabla 7: Inconvenientes presentados que impiden la ejecución de los trabajos

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

1. PLAN DE GESTIÓN

El Plan de Gestión Social (PGS), es el instrumento de Gestión Social con el que cuenta para plantear las directrices que le permitirán mitigar, controlar, corregir y/o compensar los impactos generados por la ejecución de la obra desde el componente social, en el área de influencia del Proyecto.

Las estrategias trazadas en el Plan de Gestión Social se ejecutarán mediante el cumplimiento de 11 aspectos sociales:

Aspecto No. 1: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto
Aspecto No. 2: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto
Aspecto No. 3: Programa de Información a la Comunidad
Aspecto No. 4: Programa de divulgación a la comunidad
Aspecto No. 5: Reuniones con la comunidad
Aspecto No. 6: Programa de atención a la comunidad
Aspecto No. 7: Programa de atención al ciudadano
Aspecto No. 8: Recorridos por la Obra
Aspecto No. 9: Reunión de Avance de Obra

Aspecto No. 10: Conformación del comité de veeduría ciudadana
Aspecto No. 11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada

Objetivo: Realizar las actividades pertinentes de acuerdo al Plan de Gestión Social, que contribuyen al fortalecimiento de la participación social y el acompañamiento de la comunidad en el proceso constructivo que viene ejecutando el Consorcio Redes y PTAPs Valle.

- **Aspecto No. 01: Diagnóstico de la Zona de Influencia del Proyecto.**

Acciones Desarrolladas:

El contratista realizó el taller de Cartografía social el 8 de mayo de 2025 en el auditorio del municipio de Guacarí.

En este taller la Dra. María Fernanda Martínez – Residente social del contratista, expuso en que consiste la cartografía social, se contó con la participación de los representantes de las Juntas de Acción Comunal de los diferentes barrios, los cuales identificaron las problemáticas más relevantes.

Algunas de las problemáticas identificadas por los líderes fueron:

- Las inundaciones de las calles porque los desagües llegan todos a la misma tubería y no fue ampliada cuando se construyeron los barrios nuevos.
- La infraestructura está deficiente, las vías terciarias sin mantenimiento, dañan las vías para instalar el alcantarillado a barrios nuevos y no las arreglan bien, se deterioran.
- Deficiencia en espacios recreativos.
- En educación identificaron que la escuela Justo Domínguez se encuentra muy deteriorada.
- Existe mucha inseguridad, robos y atracos.
- En cuanto al medio ambiente, manifiestan que existe la escombrera y basura en zonas verdes sin mantenimiento.

Se acordó con los participantes que se iniciará con el ejercicio de cartografía social en el barrio Ceibas Azules.



Foto N°1. Taller de cartografía social en Guacarí



Foto N°2. Taller de cartografía social en Guacarí

- El 12 de mayo de 2025 se continuó con la actividad de Cartografía social con los líderes de Guacarí en la identificación de necesidades del Barrio Ceibas Azules en los componentes de Servicios públicos, infraestructura, espacios recreativos, salud pública, educación seguridad y medio ambiente, se realizó recorrido por manzanas para realizar el mapeo.

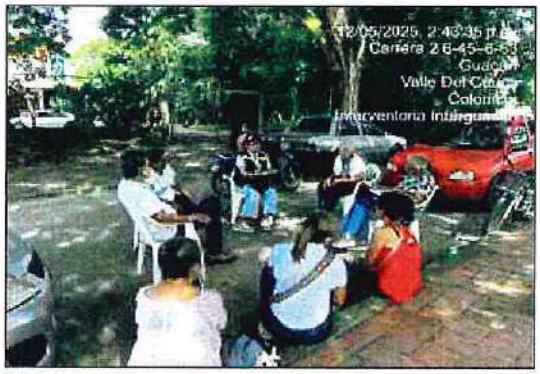


Foto N°3. Cartografia social Guacarí



Foto N°4. Cartografia social Guacarí

- El 13 de mayo de 2025 se realizó el taller de Cartografía social con los representantes de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Ginebra, se explicó los componentes de Calidad de vida, bienestar físico, esperanza de vida, nivel educativo, y producto interno bruto.

- Los participantes de Ginebra identificaron las necesidades de sus barrios, los cuales son: Vías en mal estado, necesidades básicas insatisfechas, no tienen parques y la comunidad campesina necesita vías terciarias para transportar sus productos.

- Se acordó que se iniciará con la cartografía social en la cabecera municipal barrio Alfonso López y en la zona rural con el corregimiento Novillera.



Foto N°5. Cartografia social Ginebra



Foto N°6. Cartografia social Ginebra

- **Aspecto No. 02: Censos de Viviendas Afectadas por el Proyecto**

Objetivo: Garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se

encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Acciones Desarrolladas:

En el mes de mayo de 2025 la gestión social del contratista informó que hasta el momento hay un acumulado del 77.14%

.

Hasta ahora se han realizado las siguientes actas:

Regaderos - Ginebra: 15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo: 6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda: 23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra: 7 actas de inicio
Sector Albania: 2 actas de vecindad
1 acta de entorno

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	54	16	77.14%

Tabla N° 1 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado

- **Aspecto No. 03 : Programa de Información a la Comunidad**

Acciones Desarrolladas:

Se ha cumplido con brindar la información a la comunidad por medio de las socializaciones que se han realizado en meses pasados, dando cumplimiento a esta actividad del Plan de Gestión Social, sin embargo, se continuará brindando la información que se requiera para aclarar las inquietudes de la comunidad.

- **Aspecto No. 04 : Programa de divulgación a la comunidad**

Acciones Desarrolladas:

En el mes de mayo no se programaron actividades de divulgación a la comunidad.

- **Aspecto No. 05: Reuniones con la comunidad**

Acciones Desarrolladas:

El contratista ha cumplido con esta actividad de reuniones con la comunidad planteada en el Plan de Gestión Social.

- **Aspecto No.06: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD**

Objetivo: Informar y divulgar de manera permanente, entre las comunidades del área de influencia directa, contenidos claros y precisos sobre el proyecto, facilitando la generación de un clima de confianza, compresión y cooperación en la ciudadanía, por las actividades inherentes al mismo.

- **Programa de atención a la comunidad**

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

Se continúa con el espacio dispuesto para el PAC con los formatos de PQRS para que la comunidad acceda a ellos si tienen alguna pregunta, queja o solicitud. En este mes no se recibió PQRS de la comunidad.

Se realizó seguimiento a las vallas informativas ubicadas en las vías principales de ingreso de los dos municipios de Ginebra y Guacarí, brindando la información sobre el contrato.



Foto N°7. Punto de Atención a la Comunidad



Foto N°8. Seguimiento Buzón de sugerencias de Ginebra






Foto N°9. Seguimiento Buzón de Puente Rojo



Foto N°10. Cartelera Informativa

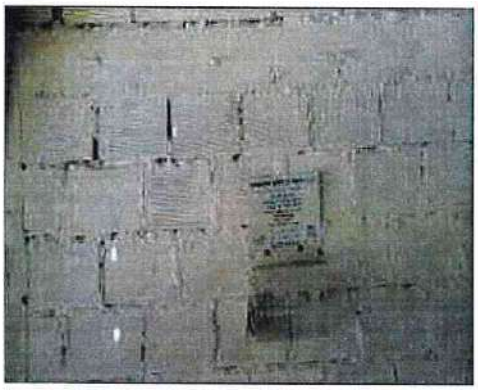

Foto N°11. Valla informativa en Guacarí

Foto N°12. Valla informativa en Ginebra

- **Aspecto No. 07 : Programa de atención al ciudadano**

Objetivo: Crear y mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna y eficaz, recibir, atender y tramitar las quejas, peticiones, reclamos y sugerencias que se presenten, con el fin de contribuir a la satisfacción de los vecinos y usuarios del Proyecto.

Acciones Desarrolladas:

El contratista continúa cumpliendo con el programa de atención al ciudadano, en el punto de atención se cumple con los horarios establecidos:
Martes de 08:00 am a 12m
Viernes 1:00 pm a 4:00 pm,
Lugar: oficina ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio La Piscina barrio El Centro - corregimiento de Costa Rica, municipio Ginebra, Valle del Cauca.

Existen dos buzones de sugerencias: El buzón de Guacarí se encuentra ubicado en Puente Rojo en el restaurante Las Delicias de Luz, frente al balneario Chicuco.
El buzón de Ginebra está ubicado en Estanco Tas- Tas, Cra 2 #5-06 en la cabecera municipal.

NOMBRE PROFESIONAL SOCIAL ENCARGADO	TELÉFONO	CORREO	DIRECCIÓN OFICINA
María Fernanda Martínez	3218673230	redes.pqr@gmail.com	calle 11 # 4-37 tercer piso. edificio La Piscina

			barrio El Centro corregimiento Costa Rica municipio Ginebra.

Tabla N° 2 Información atención a la comunidad

- **Aspecto No.08: Recorridos por la Obra**

Acciones Desarrolladas:

En este mes de mayo no se programó recorrido de obra con los veedores.

- **Aspecto No. 09. Reunión de avances de obra**

El contratista debe realizar las reuniones que sean solicitadas de manera (verbal o escrita) por parte de la ciudadanía, las autoridades municipales y organismos de control. Hasta el momento no se han solicitado.

Acciones Desarrolladas:

En el componente social el contratista programó las dos reuniones informativas de avance de obra con los veedores ciudadanos de los municipios de Guacarí y de Ginebra; sin embargo, solo se pudo realizar la reunión de Ginebra, porque la reunión de Guacarí se tuvo que cancelar por el paro nacional.

- Se participó y evidenció la realización del comité de veeduría del municipio de Ginebra de manera virtual con la participación del veedor Sigfredo Pasos y Lina Santa.
- En esta reunión se informó de las actividades realizadas de avance de obra, el componente técnico lleva un avance del 82% ejecutado.
- En el frente de obra de tubería de 14 pulgadas lleva un avance de 82%.
- En el frente de obra de la planta de tratamiento de Ginebra lleva un avance de 72%
- En el frente de obra de la planta de tratamiento de Guacari lleva un avance de 53%
- Y el frente de obra de Villa Jhons tiene un avance del 59%.
- Desde el componente social se informó que se tiene conformados los dos comités de veeduría ciudadana, se realizó seguimiento a los buzones de sugerencias y no se han depositado PQRS.



Ilustración N°1. Invitación a la reunión de comité de veeduría de Guacarí



Ilustración N°2. Invitación a la reunión de comité de veeduría de Ginebra



Foto N°13. Reunión comité de veeduría Ginebra



Foto N°14. Reunión comité de veeduría Ginebra

- **Aspecto No.10: Conformación del comité de veeduría ciudadana.**

  El contratista dio cumplimiento al aspecto N° 10 del Plan de Gestión Social con la conformación de los dos comités de veeduría ciudadana en los dos municipios de Guacarí y Ginebra.

  Se participó en la realización del comité de veeduría del municipio de Ginebra de manera virtual por solicitud de los veedores.

Reunión de seguimiento de las actividades de Gestión Social

Se realizó reunión de seguimiento de las actividades del área social con la Dra. María Fernanda Martínez – Residente social del contratista y la Dra. Neisler Abadia – profesional social de Interventoría.

Esta reunión se realizó para organizar las actividades de la cartografía social y reuniones de comité de veeduría ciudadana.



Foto N°15. Reunión de seguimiento Gestión Social

COMITÉS TÉCNICOS

- En el mes de mayo se programaron comités de obra que tuvieron que ser aplazados.

- **Aspecto No.11: Vinculación de mano de obra calificada y no calificada**

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los dos municipios de Guacarí y Ginebra, especialmente del área de influencia de la obra.

Acciones Desarrolladas:

El contratista está fomentando y fortaleciendo la vinculación laboral del personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo y en generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra.

El contratista informó que en el mes de mayo vinculó una profesional en ingeniería ambiental residente del municipio de Ginebra.

Actualmente tiene contratado 7 personas del corregimiento de Costa Rica, 6 personas de Ginebra y 4 personas de Guacarí.

CARGO	ZONA		
	COSTA RICA	GINEBRA	GUACARI
Oficial			X
Ayudante			X
Vigilante nocturno	X		
Vigilante nocturno	X		
Vigilante fin de semana			X
Ayudante de obra	X		
Ayudante de obra	X		
Ayudante de obra		X	
Aux administrativa		X	
Conductor	X		
Cadenero		X	
vigilante	X		
Vigilante	X		
Ayudante		X	
vigilante			X
vigilante		X	

Ilustración N°3. Mano de obra contratada

CONCLUSIONES

- La interventoría social realizó seguimiento a las actividades realizadas relacionadas con este componente en el mes de mayo de 2025.
- Durante este mes de mayo de 2025, se continuó evidenciando que el contratista está desarrollando su Plan de Gestión Social.
- El Punto de Atención a la comunidad durante el mes de mayo de 2025 prestó la atención en los horarios establecidos, durante este mes no se recibió PQRS.
- Se evidenció que el componente social del contratista realizó la reunión virtual informativa de avance de obra y comité de veeduría ciudadana con los veedores ciudadanos de Ginebra.
- La reunión del comité de veeduría ciudadana de Guacarí tuvo que ser aplazado por el paro nacional.
- Se ha contado con el acompañamiento de las personerías municipales y funcionarios de las dos alcaldías para la realización de las reuniones informativas de los comités de veeduría ciudadana y de los talleres de Cartografía Social.
- La comunidad se percibe receptiva, han permitido el avance de la obra y visitas al área de Puente Rojo, han mostrado disposición para permitir su libre desarrollo.
- Durante este mes de mayo de 2025, se han desarrollado los talleres de Cartografía Social con la participación de los representantes de las Juntas de Acción Comunal, quienes han participado de manera activa identificando sus necesidades, construyendo una herramienta que les servirá para conocer sus territorios y presentar proyectos basados en datos reales de sus comunidades.

4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. INTRODUCCIÓN

CONSORCIO INTERGUACARI, a través de la gestión de la supervisión en campo, garantizará la seguridad y salud de los trabajadores y contratistas durante la ejecución de sus labores, para lo cual se tendrá en cuenta que:

- Los trabajadores reciban la formación adecuada para el trabajo que se espera de ellos
- Se apliquen las medidas de seguridad en el trabajo.
- Se realicen las afiliaciones al sistema de Riesgos profesionales.

2. OBJETIVO

Presentar el alcance del proyecto y mostrar la gestión de **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**, referente a temas de seguridad y salud en el trabajo de la ejecución de la obra en el mes del **1 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.**

3. ALCANCE

El presente informe verifica las actividades aplicadas por todo el personal que realiza labores en campo, referente a seguridad, salud en el trabajo, considerando las actividades durante el mes, y así y la ejecución en los diferentes puntos de trabajo.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.1 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DIARIAS	OBSERVACIONES GENERALES
Verificación de condiciones de salud	Antes de iniciar la ejecución del proyecto se realiza verificación de condiciones de salud a los ingenieros y personal de apoyo para identificar y/o controlar cualquier anomalía que pueda afectar o poner en riesgo la salud y las actividades a ejecutar. Mantener las zonas de aguas estancadas, fumigadas y con cloro para evitar la propagación del mosquito **Aedes aegypti,** responsable del Dengue, Sika y Chicunguña
Verificación de la zona de trabajo y herramientas	Antes de iniciar las actividades, los trabajadores verifican las condiciones del área de trabajo, al igual que el estado de las herramientas a utilizar.
Uso de Elementos de Protección personal	Antes de iniciar las labores, los trabajadores hacen uso de los EPP, haciéndose responsable de su autocuidado y el de sus compañeros, en este periodo se entrega dotación al personal nuevo.
Delimitación del área de trabajo, Orden y aseo	Antes de iniciar cualquier actividad, se delimita el área de trabajo, se solicitó instalar cinta como barrera de protección, para evitar cualquier caída en las excavaciones.
Diligenciamiento de ATS y permisos de trabajo en alturas	Antes de iniciar cualquier actividad, se realiza un análisis del área y los riesgos a los que están expuestos y que se deben intervenir, por esta razón se solicita como adjunto al informe del contratista ATS de las actividades de alto riesgo y permisos en alturas, para las actividades que lo requieran. **Gestión de actividades de alto riesgo mayo de 2025:** Limpieza de superficie y colocación tapones Fundición muro sedimentador No 3 Desformaletear y formatear pantallas Perforar, brillar y puntear canaletas Fundición de muros 4-3 sedimentador y floculador No 3 Escarificación y repello de muros Repello de muros de floculador Perforación y anclaje de soportes
Exámenes médicos ocupacionales	Durante el mes de MAYO se verifica el cumplimiento del programa de medicina preventiva, con el objetivo de suministrar información clara sobre el estado de salud y procurar el estado integral de todos los colaboradores. En este periodo se verifican exámenes médicos por parte de los contratistas.

Plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias	En el periodo de MAYO se mantienen las condiciones óptimas de los elementos de atención a emergencias, y las señalizaciones en oficina y obra, se implementan rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Política y objetivos del SG-SST.	En este periodo de MAYO se realizan inducción y reinducción sobre las políticas SST, medio ambiente, sustancias psicoactivas, reglamento de higiene y seguridad industrial, definición de accidente y enfermedad laboral, clasificación de residuos sólidos, rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Actualización curso de trabajo en alturas	En este periodo no se realizaron actualizaciones en cursos de alturas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO

VISITAS DEL PROYECTO	
	
Inspeccion locativa	Revision documental

VISITAS DEL PROYECTO	
	
Inspeccion señalizacion, orden y aseo	Inspeccion locativa
	

Las CHARLAS realizadas en el mes de mayo se describen a continuación:

5.1 CUADRO ESTADÍSTICO DE CUMPLIMIENTO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES.

DESCRIPCIÓN	Número de asistentes/ Capacitaciones	Dirigido a
Importancia de mantener orden y aseo en el lugar de trabajo	6	TRABAJADORES
Riesgos asociados a la fundición con trompo	8	TRABAJADORES
Identificación de riesgos en nuestro entorno laboral	8	TRABAJADORES

DESCRIPCIÓN	Número de asistentes/ Capacitaciones	Dirigido a
Autocuidado estilos de vida saludable	10	FORMATOS ATS
Uso adecuado de los epp	8	TRABAJADORES
Trabajo en equipo, comunicación asertiva y liderazgo	15	TRABAJADORES
Efectos que puede causar el ruido en el oído	15	TRABAJADORES

.2 INSPECCIÓN

En el presente mes se han realizado las siguientes inspecciones:

ITEM	INSPECCIÓN	HALLAZGOS	No. INSPECCIONES	
			PROGRAMADAS	REALIZADAS
1	Inspección de EPP	Revisión de las condiciones y el estado de los elementos de protección personal	POR ACTIVAD	05-2025
2	Inspecciones locativas (contenedores, excavaciones campamento y oficina)	Sin hallazgos	POR ACTIVAD	05-2025
3	Inspección de herramientas (Pulidora, taladro de mano, mezclador)	Sin hallazgos	POR ACTIVAD	05-2025
4	Inspecciones de extintores, botiquín y camillas	Sin hallazgos	POR ACTIVAD	05-2025

5.3 INDICADORES DE AUSENTISMO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

INDICADOR	
• Número de atenciones médicas comunes reportadas	0
• Días perdidos	0
• Número de atenciones médicas ocupacionales reportadas	0
• Días perdidos	0
Incidentes	0
Accidentes	0

a. **VERIFICACION PERSONAL Y CONTRATISTA EN OBRA.**

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE								
No.	MBRE	CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		RGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Aldo Gutiérrez	79.699.673	N/A		Consorciado	Sura	Sura	Colpensiones
2	Carlos Andrés Leyva	89.008.184	N/A		irector de la Obra	Sura	Sura	Protección
3	Lina Marcela Buriticá	42.136.662	01/12/22		Coordinadora de proyectos	S.O.S.	Sura	Colpensiones
4	Gina Leidy López	1.144.140.957	17/02/23		Residente Obra	S.O.S.	Sura	Porvenir
5	Ana Fernanda Rosero Cajigas	36.759.739	17/01/24		Ing. Presupuesto	Sanitas	Sura	Colpensiones
6	Lilibeth Mora Duarte	1.083.008.701	22/01/24		nspectora de obra	N.EPS	Sura	Porvenir
7	Flor María Martínez	31.644.927	25/02/23		Profesional SST	S.O.S.	Sura	Colpensiones
8	Darío Enrique Flórez	1.026.277.221	05/02/24		Residente Obra	Sura	Sura	Colfondos
9	Ana Milena Martínez	1.144.081.242	05/02/24		Aux administrativa	Sanitas	Sura	Colpensiones
10	María Camila Gil	31.658.574	02/05/24		Ingeniera Ambiental	N EPS	Sura	Colpensiones
11	María Fernanda Martínez	38.856.496	05/01/23		Profesional social	Sura	Sura	Colpensiones
12	Diana marcela Echavarría	31.658.574	01-02-23		Ing. Ambiental	N. EPS	sura	Colpensiones
13	Rodrigo Preciado	16.550.802	05/03/24		Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir
14	José Hilder López	7.551.673	11/03/24		Almacenista	Sanidad	Sura	N/A
15	Yeison Castellanos	1083008367	11/06/24		Inspector obra	Coosalud	Sura	Porvenir
16	Jorge Aponte	1.112.098.988	02/09/24		Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir
17	Mauricio Fernando Soto	14.652.613	14/11/24		Ayudante obra	SOS	Sura	Porvenir

18	Jorge Hernán Ocampo Cortez	9.858.689	26/11/24		Ayudante obra	Emssanar	Sura	Porvenir

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA								
No.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Jimmy Sinisterra	14.636.383	24/01/23		Topógrafo	S.O.S.	Colmena	Protección
2	Jeiner Andrés Bustos Echeverri	.097.401.400	07/02/24		Topógrafo	Salud total	Positiva	Porvenir
3	laime Ernesto Martínez	.112.970.271	01/11/24		Cadenero	N EPS	positiva	Porvenir

PERSONAL GRUPO 10 LOGISTICA SAS								
	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	GSS		
			Ingreso	tiro		S	L	AFP
1	María Orlenis Campiño	1.112.966.233	02/04/24		Vigilante nocturno	N EPS	Sura	Porvenir
2	Brayan Alexander Navarrete	1.010.151.246	01/08/24		Vigilante nocturno	Emssanar	Sura	Colfondos
3	Mauricio Domínguez Plaza	6.325.625	15/03/25		Vigilante nocturno	smed salud	Sura	Porvenir
4	chael Rodríguez Cobo	1.113.630.799	15/03/25		ilante fin de semana	N EPS	Sura	Porvenir

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRAB ESCOBAR SAS								
.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		RGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP

1	Oscar Ignacio Carabalí	16.277.004	08/04/24		Maestro	Salud Total	Colmena	Colpensiones
2	iego Andrés Cruz	1.090.463.618	01/11/24		Ing. Aux	N EPS	Colmena	Porvenir
3	eins Cortes Domínguez	1.114.832.209	14/02/25		Ayudante		Colmena	Porvenir
4	Daniel Adolfo Arboleda	1.114.451.147	08/04/25		Ayudante	Emssanar	Colmena	Porvenir
5	guel Antonio Cobo	1.112.966.026	12/04/25		Ayudante	Emssanar	Colmena	Porvenir
6	Fredy Martínez	6.312.632	15/04/25		Oficial	N EPS	Colmena	Protección
7	Eider Flórez	1.114.621.7 98	06/06/25		Ayudante	N EPS	Colmena	Porvenir

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS								
No.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	P
1	Carlos Fernando Labrada	16.746.176	0/08/2024		Ingeniero residente	Comfenalco	Sura	Porvenir
2	Luis Miguel Montaño	.114.835.053	30/08/24		Ayudante	SOS	Sura	Porvenir
3	Diego Valor	16.861.728	20/05/25		Armador	N EPS	Sura	Porvenir
4	Juan Diego Castro	1.114.813.332	01/11/24		Ayudante	SOS	Sura	Porvenir
5	Jean Carlos	1.114.832.683	14/05/25		Soldador	SOS	Sura	Porvenir
6	Jhon Fredy Rincón Marín	1.113.629.201	09/12/24		Armador	Comfenalco	Sura	Protección
7	Jonathan Rivera	1.143.952.917	17/01/25		Ayudante	SOS	Sura	Porvenir

ERSONAL WATER APPLICATIONS AND SOLUTIONS WAS SAS

No.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	P
1	Guillermo León González	14.797.442	01/25		supervisor	SURA	Positiva	rvenir
2	Fernando Lara	44.166.667	02/25		Analista ingeniería	SURA	Positiva	pensiones
3	Cristian Quintero	44.179.864	05/25		Analista ingeniería	S.O.S	Positiva	tección

CONTRATISTA CUBIERTA CASETA								
No.	NOMBRE	. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		ARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	P
1	Joan Sebastián Pabón	1.114.829.657	02/04/25		Soldador	Sura	Positiva	Protección

Fuente de elaboración: Informe de contratista, Martínez Flor 04-2025 SST **CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE**

5.5 REALIZACIÓN DE SIMULACROS

El contratista adjunto informe de evacuación.

6. MANEJO AMBIENTAL

6.1 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS RCD

El aprovechamiento de los Residuos De Construcción Y Demolición - RCD se plantea con dos alternativas: reutilizar en obra o transportarlos a centros de acopio temporales o centros de aprovechamiento. Los centros de aprovechamiento planteados como alternativa implican, generalmente, una tercerización de los RCD. Por otro lado, un gran o mediano generador puede pensar en la construcción de centros de acopio temporales, de tal manera que se cuente con una zona de acopio donde se reúnan los RCD aprovechables que no se utilizaron en su totalidad en las obras para ser utilizado.

Las obras civiles, en la mayoría de las etapas constructivas, generan escombros, residuos de materiales de diferentes tamaños (virutas, polvillo de corte, piezas de cerámica, etc.), residuos tóxicos y algunos contaminantes orgánicos que son conocidos como residuos de construcción y demolición (RCD) y han de ser correctamente tratados para minimizar la contaminación y potenciar su aprovechamiento, y así favorecer el entorno social y el posible ecosistema involucrado. Igualmente, la interventoría realiza control a las volquetas y máquinas usadas en obra, verificando los siguientes documentos:

- SOAT.
- Revisión técnico-mecánica
- Póliza daños a terceros

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD	CERTIFICADO
Madera	No reporta	N/A
Chatarra	No reporta	N/A
Material de Excavación RCD		
Residuos Aprovechables y no Aprovechables	No reporta	N/A.
Teja PVC otros	No se genera	N/A

6.2 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR EMISIÓN DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO:

La contaminación atmosférica se produce por el uso de equipos, máquinas y/o vehículos y se mitiga mediante los mantenimientos preventivos.

Actividad que se supervisa por medio de las inspecciones que se realizan periódicamente.

❖ Señalización, cerramientos provisionales y aislamiento en de los sitios de trabajo.

6.3 INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO

TIPO DE MATERIAL	FECHA	CANTIDAD
Inspección de seguridad y ambiente (orden y aseo)	Semanal	

6.4 MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA EQUIPO U/O HERRAMIENTA	CANTIDAD	MARCA SERIE - PLACA
Equipos de topografía	Estación – Nivel	NIKON SNDWAY

Retroexcavadora Llantas	1	CAT
Retroexcavadora orugas	1	HYUNDAI R130SNPRO 2024
Volquetas	1	(UFK231)
Taladro demoledor	3	
Pulidora	2	DELWAT
Sierra circular para corte de madera	1	
Planta Generadora 6.5	2	ELITE- NUEVA
Motobomba 2 pulgadas	1	BARNES
Motobomba 3 pulgadas	1	
Mezcladora de concreto	2	TOOLCRAFT
Vibrador eléctrico	3	BOSCH 2.8 HP-NUEVO
Taladros manuales	3	
Martillo demoledor	1	SIEFKEN
Rotomartillo	1	SIEFKEN
Buggy	7	Herragro- Toolcraft
Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, machete, destornillador, alicate)		

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES AREA SST.

- ✓ Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.
- ✓ Se adjuntan permisos de trabajo para tareas de alto riesgo trabajos en alturas, y trabajos en caliente.
- ✓ Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.
- ✓ Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.
- ✓ No se reporta ausentismo por enfermedad común, accidente o incidente de trabajo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Las labores en la obra continúan desarrollándose en tres frentes de trabajo:

- PTAP de Guacari: Sedimentación – Floculación - Caseta Eléctrica
- PTAP de Ginebra: Sedimentación – Filtración - Tanque de Almacenamiento - Caseta Eléctrica
- Tanque de Almacenamiento La Albania – Ginebra

- El frente del Tramo 3 continúa suspendido, se estará coordinando su reinicio, una vez se apruebe la Reformulación No.02, para Junio 2025.

- Con el Ingenio Pichichi ya se encuentra en tramites notariales para dejar en firme la servidumbre, se puede iniciar para Junio este tramo de tubería PEAD 14" en una L: 500 ml

- Con la Familia Saavedra - Blum ya está en proceso de servidumbre para instalar en su predio la Tubería PEAD 10" en una L: 600 ml

- Los trabajos en las plantas se desarrollan de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato

- Los permisos que se tienen pendientes por la parte ambiental y permisos de demoliciones de pavimento siguen aún pendientes por parte de las entidades a quien se les ha solicitado.

- Los trabajos de localización y replanteo en la vía del Tramo 1: CADICA a BOCATOMA, continúan sin ningún inconveniente

- Se continúan realizando los trabajos bajo las medidas de seguridad acordados con el contratista.

- Los acercamientos con los líderes del sector de Puente Rojo y Proterritorio han mejorado el dialogo con la comunidad permitiendo que se mejore la aceptación de la obra.

- Todo el personal tiene cobertura de seguridad social y riesgos laborales.

- Se siguen los lineamientos de medicina preventiva, realizando los exámenes de ingreso para el personal nuevo.
- Se relaciona los avances físicos y financieros hasta el 31 de Mayo de 2025:

AVANCE	(%)
FISICO	80.5
FINANCIERO	82.42

Atentamente,

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
Representante Legal
Consorcio Interguacarí
Interventoría

ANEXO 1

SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO INTERGUACARI

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-05, 01:51:15 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1072299342

Periodo Cotización: mayo de 2025 Periodo Servicio: mayo de 2025

PAGADO 05/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDUARDO CARDENAS		
Documento	CC16254057	Dirección	CL 0 #0 - 0
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5560163
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16254057	EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ	57	02																0	0	30	30	0	(MN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	6.960	$ 1.500.000	$ 104.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 0	$ 187.500	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.900	$ 0	$ 291.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-05, 03:12:56 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 75498007

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 06/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES		
Documento	CC16257590	**Dirección**	CL 47A #42 C - 78
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6669047
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16257590	JESUS IVAN BASTIDAS BENAVIDES	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2,500,000	$ 400,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,500,000	$ 312,500	6.960	$ 2,500,000	$ 174,000	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ 0	$ 400,000	$ 312,500	$ 174,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 886,500	$ 0	$ 886,500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-06, 10:48:41 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 77670419

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 06/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN FERNANDO ANDRADE HENAO		
Documento	CC94456752	**Dirección**	CL 54 NORTE #2 G - 94 APTO 302 E
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3507682311
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94456752	JULIAN FERNANDO ANDRADE HENAO	57	00																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-08, 11:05:28 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1072309016

Periodo Cotización: mayo de 2025 **Periodo Servicio:** mayo de 2025

PAGADO 05/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RODRIGO OBONAGA GAITAN		
Documento	CC16608775	**Dirección**	CL 13B #66 B - 56
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3163384677
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias ARP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16608775	RODRIGO OBONAGA GAITAN	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	6.960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 0	$ 504.900

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66658922		ABADIA LONDOÑO NEISLER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 8 N 9 - 60	EL CERRITO-VALLE	2589110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1530240757	9486363125	I	2025/06/09	2025/06/04	BANCO DE BOGOTA	0	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Ciudad: EL CERRITO Depto: VALLE (1 Afiliados)					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0
1	CC	66658922	ABADIA NEISLER	Z5-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0

2025/06/04 03:54 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66658922		ABADIA LONDOÑO NEISLER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 8 N 9 - 60	EL CERRITO-VALLE	2589110	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1530240757	9486363125	I	2025/06/09	2025/06/04	BANCO DE BOGOTA	0	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$618,800	$0	$0	$618,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1107071993		IZQUIERDO MARULANDA JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 No 56-15	CALI-VALLE	3701768	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1535243388	9486856227	I	2025/06/24	2025/06/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1107071993	IZQUIERDO JULIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

2025/06/06 10:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1107071993		IZQUIERDO MARULANDA JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 23 No 56-15	CALI-VALLE	3701768	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1535243388	9486856227	I	2025/06/24	2025/06/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

202 /06 10:36 AM

VALLECAUCANA
DE AGUAS S.A. E.S.P.

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación

paraiso de todos

CONSORCIO
REDES Y PTAPS
VALLE

CONTRATO DE OBRA No. 2000.13.05.003- 2022

EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 25

Periodo: mayo 01 a mayo 31 de 2025

JUNIO DE 2025
SANTIAGO DE CALI

TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL	7
2.	ASPECTOS TÉCNICOS	8
2.1	LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS	8
2.2	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	10
2.2.1	CAPÍTULOS DEL CONTRATO	10
2.3	ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL.	10
2.4	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA	11
2.4.1	GESTIÓN DOCUMENTAL	23
2.4.2	GESTIÓN DE PERMISOS	24
2.4.2.1	ALCALDÍAS DE GINEBRA Y GUACARÍ:	24
2.4.2.2	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC:	25
2.4.2.2.1	APROVECHAMIENTO FORESTAL PTAP	25
2.4.2.2.2	APROVECHAMIENTO FORESTAL BOCATOMA	25
2.4.3	REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES.	25
2.5	COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	31
2.5.1	DESEMBOLSOS DE ANTICIPO	31
2.5.2	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	32
2.5.3	FACTURACIÓN	33
2.6	PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA	33
2.7	AVANCE DE OBRA.	35
2.7.1	ACTIVIDADES EJECUTADAS	35
2.7.1.1	ACTIVIDADES VARIAS	35
2.7.2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA	36
2.7.3	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA	36
2.7.4	INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ	38
2.7.5	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ALBANIA - PREDIO ACUAVALLE EN SECTOR VILLA JHONS	39
2.7.6	BOCATOMA	40
2.7.7	DESARENADOR	40
2.7.8	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	40
2.7.9	REGISTRO DE LLUVIAS	40

2.8	PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO	41
2.9	AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA	43
2.10	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	44
3.	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	58
3.1	ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL	58
3.2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	59
3.2.1	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC	59
3.2.2	CARTOGRAFÍA SOCIAL	59
3.2.3	BUZÓN DE SUGERENCIAS	61
3.2.4	ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD	62
3.3	CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES	64
3.3.1	COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.	64
3.4	ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO	66
3.5	REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS	66
3.6	COMITÉ TÉCNICO	67
3.7	VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	67
3.8	CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL	68
4.	PROGRAMA SST	69
4.1	OBJETIVOS	69
4.2	ALCANCE	69
4.3	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	70
4.4	RELACIÓN PERSONAL	70
4.5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	74
4.5.1	INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)	74
4.5.2	VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	74
4.5.3	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	75
4.5.4	PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	76
4.5.5	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	78
4.5.6	PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	79
4.5.7	INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD	82
4.5.8	AUSENTISMO	82
4.5.9	PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS	83
5.	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	85
5.1	PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	85

5.2 PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES 87
5.3 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL 90
5.3.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA 90
5.3.2 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – BOCATOMA 91
5.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE Y RCD 92
5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 93
5.6 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 94
5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y ACEITES 95
5.8 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS 95
6. ANEXOS 102

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 MUNICIPIO DE GINEBRA 9
ILUSTRACIÓN 2 MUNICIPIO DE GUACARÍ 9
ILUSTRACIÓN 3. CHEQUEO DE COTAS Y MEDIDAS PARA MATERIAL DE SOPORTE EN EL FILTRO NO.1 DE LA PTAP GINEBRA. 13
ILUSTRACIÓN 4. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL FRENTE DE OBRA DE LA PTAP GUACARÍ (LÍNEA DE FLOCULACIÓN NO.3 Y SEDIMENTADOR NO.3). 15
ILUSTRACIÓN 5. SE REALIZA REPLANTEO DE LOS VIADUCTOS EN LOS TRES FRENTES (PUENTE AMARILLO, PUENTE ROJO Y PUENTE LA MAGDALENA). 16
ILUSTRACIÓN 6. CHEQUEO DE COTAS PARA SEGUIMIENTO DE ASENTAMIENTO DEL TANQUE. 16
ILUSTRACIÓN 7. CURVA DE COMPACTACIÓN OBTENIDA EN UNO DE LOS MATERIALES A LOS CUALES SE REALIZÓ LA PRUEBA DEL PROCTOR MODIFICADO (MUESTRA NO.8). 18
ILUSTRACIÓN 8. ENSAYO DE COMPRESIÓN DE CILINDROS EN UNA DE LAS MUESTRAS ENVIADAS AL LABORATORIO (LOSA SUPERIOR – TANQUE DE LA ALBANIA) EN DONDE SE EVIDENCIA QUE A LOS 28 DÍAS ESTÁ SUPERANDO UN 100% DE SU RESISTENCIA (RESISTENCIA ESPERADA). 19
ILUSTRACIÓN 9. CHEQUEO DE COTAS PARA SEGUIMIENTO DE ASENTAMIENTO DEL TANQUE DE LA ALBANIA. 23
ILUSTRACIÓN 10. CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025. 24
ILUSTRACIÓN 11. RECORRIDO CON LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD Y VIADUCTOS PARA EVALUAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DEL TRAMO NO.1. 26
ILUSTRACIÓN 12. REUNIÓN CON VENTANILLA ÚNICA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PARA EVALUAR LA REFORMULACIÓN NO.2. 26
ILUSTRACIÓN 13. RECORRIDO EN TRAMO NO.1 DE LA LÍNEA DE CONDICIÓN CON EQUIPO TÉCNICO DEL CONSORCIO. 27
ILUSTRACIÓN 14. SEGUNDO RECORRIDO EN TRAMO NO.1 DE LA LÍNEA DE CONDICIÓN CON EQUIPO INTEGRAL DEL CONSORCIO (SST, SOCIAL, AMBIENTAL Y TÉCNICO). 27
ILUSTRACIÓN 15. REUNIÓN INTERNA Y RECORRIDO TÉCNICO CON EQUIPO DE TRABAJO DEL CONSORCIO. 28

ILUSTRACIÓN 16. REUNIÓN CON VENTANILLA ÚNICA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PARA EVALUAR LA REFORMULACIÓN NO.2. 28
ILUSTRACIÓN 17. REUNIÓN CON PERSONAL SUBCONTRATADO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL PROYECTO (METALMECÁNICA Y OBRA CIVIL), REUNIÓN REALIZADA EN LA PTAP DE GUACARÍ. 29
ILUSTRACIÓN 18. COMITÉ DE VEEDURÍA DEL MUNICIPIO DE GINEBRA CELEBRADO EL 27 DE MAYO DEL 2025. 29
ILUSTRACIÓN 19. RECORRIDO CON COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA PARA CHEQUEAR MEDIDAS EN EL FILTRO NO1 DE LA PTAP GINEBRA. 30
ILUSTRACIÓN 20. REUNIÓN Y RECORRIDO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DONDE SE DEBE REALIZAR LAS PERFORACIONES PARA INSTALACIÓN DE LAS BOQUILLAS DEL FILTRO NO.1 DE LA PTAP GINEBRA. 30
ILUSTRACIÓN 21. LEVANTAMIENTO DE COTAS EN LAS CÁMARAS DEL FLOCULADOR NO.1 DE PTAP GUACARÍ. 31
ILUSTRACIÓN 22. TOMA DE INFORMACIÓN PARA EVALUAR ASENTAMIENTOS EN LOS TANQUES CONSTRUIDOS PARA EL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GINEBRA (PTAP DE GINEBRA Y VILLA JHONS – ALBANIA). 31
ILUSTRACIÓN 23 REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES DE OBRA 42
ILUSTRACIÓN 24 OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 59
ILUSTRACIÓN 25 REUNIONES LIDERES MUNICIPIO DE GUACARÍ MAYO 8,12, 26 DE MAYO. RECORRIDO EN EL BARRIO LAS CEIBAS AZULES. 26 DE MAYO REUNIÓN CARTOGRAFÍA SOCIAL 60
ILUSTRACIÓN 26 REUNIONES LIDERES MUNICIPIO DE GINEBRA MAYO 13 Y 23 61
ILUSTRACIÓN 27 BUZÓN DE SUGERENCIAS GUACARÍ Y GINEBRA 61
ILUSTRACIÓN 28 VALLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO EN LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ Y GINEBRA 62
ILUSTRACIÓN 29 VOLANTES PARA CITACIÓN A REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ 63
ILUSTRACIÓN 30 CARTELERA INFORMATIVA 64
ILUSTRACIÓN 31 REUNIÓN COMITÉ DE VEEDURÍA GINEBRA 27 DE MAYO Y GUACARÍ 29 DE MAYO 65

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 RESUMEN DESEMBOLSOS ANTICIPO 32
TABLA 2 RESUMEN AMORTIZACIÓN ANTICIPO 32
TABLA 3 ACTAS PARCIALES FACTURADAS 33
TABLA 4 PERSONAL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 34
TABLA 5. REGISTRO DE PRECIPITACIONES MES DE MAYO 2025 41
TABLA 6 ACTIVIDADES REALIZADAS GESTIÓN SOCIAL 58
TABLA 7 TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD 64
TABLA 8 TRAZABILIDAD DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO 66
TABLA 9 CONSOLIDADO DE ACTAS DE VECINDAD 66
TABLA 10 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 70
TABLA 11 RELACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 70
TABLA 12 RELACIÓN PERSONAL OPERATIVO CONTRATISTA 71
TABLA 13 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 74
TABLA 14 MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 80
TABLA 15 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 86
TABLA 16 PERMISOS CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE 87
TABLA 17 PERMISOS TERCERIZADOS CONSORCIO REDES Y PTAPS 89
TABLA 18 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL RCD 93

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato No.	2000.13.05.003- 2022
Objeto:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA"
Valor del Contrato:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($29.432.080.933) M/CTE
Valor adición reformulación:	DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($2.571.146.616) M/CTE
Valor total del Contrato:	TREINTA Y DOS MIL TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($32.003.227.549) M/CTE
Contratante:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P
Contratista:	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
Interventor:	CONSORCIO INTERGUACARÍ
Fecha de Iniciación:	1 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación:	1 de enero de 2024
Plazo de ejecución del proyecto:	Trece (13) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio
Suspensión No.1:	Dos (2) meses a partir del 27 julio de 2023.
Prórroga No. 1 Suspensión No. 1:	Un mes a partir del 27 de octubre de 2023
Prórroga No. 2 Suspensión No. 1:	Un mes a partir del 27 de septiembre de 2023
Prórroga No. 3 Suspensión No. 1:	Cuarenta y cinco (45) días a partir del 27 de noviembre de 2023
Fecha de Reinicio:	10 de enero de 2024
Fecha de Terminación:	14 de junio de 2024
Adicional en Tiempo No. 1:	Nueve (9) meses a partir del 14 de junio de 2024
Adicional en Tiempo No. 2:	Diez (10) meses a partir del 14 de marzo de 2025
Nueva fecha de terminación:	22 de enero de 2026

INFORME CON CORTE A:	31 de mayo de 2025

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto del contrato están localizadas en el departamento del Valle del Cauca en los municipios de Ginebra y Guacarí.

- **GINEBRA:**
  El municipio de Ginebra se encuentra ubicado en el piedemonte de la cordillera central, a 60 km de la ciudad de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca (ver ilustración 1).

  La jurisdicción actual del Municipio de Ginebra, de acuerdo con los límites establecidos en la Ordenanza Departamental No. 9 de 1954 "Por medio de la cual se confirma la creación del Municipio de Ginebra" está definida de la siguiente manera.

  Por el Norte: el río Guabas, desde el puente del ferrocarril del Pacífico sobre dicho río hasta encontrarse con el camino nacional antiguo y de este hasta encontrarse con el acequia de Guabitas y de este hasta encontrar su nacimiento con el río Guabas, siguiendo arriba el curso de éste hasta la quebrada de Los Lulos, todo lo anterior limita con el Municipio de Guacarí, de este siguiendo la misma quebrada arriba hasta encontrar el cerro de Pan de Azúcar, límite con el Municipio de Buga y siguiendo la línea oriental por la cordillera límite con el Municipio de Cerrito.
  Por el Oriente: Desde donde termina la línea quebrada hasta encontrar el nacimiento del río Sabaletas, Límite con el Municipio de Cerrito.
  Por el Sur: Desde el nacimiento del río Sabaletas hasta el Puente del Ferrocarril del Pacífico sobre el mismo río, Límite con el Municipio de Cerrito.
  Por el Occidente: La vía férrea desde el río Sabaletas hasta el Río Guabas, límites con el Municipio de Guacarí.
  Ginebra cuenta con diferentes climas en la totalidad de su superficie desde cálido hasta páramo. Se encuentra a una altura promedio de 1.100 m.s.n.m, y tiene una temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado en las coordenadas: 3°45'50" Latitud N 76°16.7'20" Longitud O.

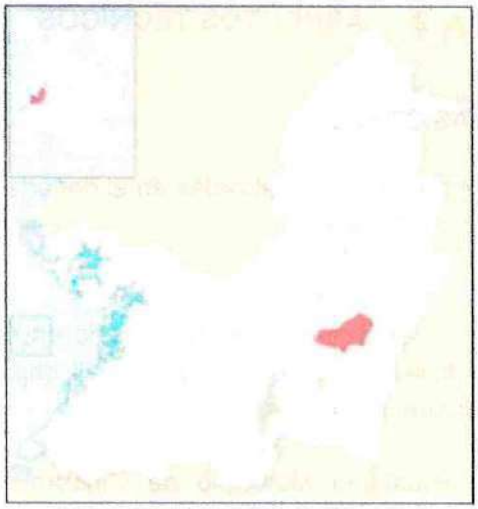


Ilustración 1 Municipio de Ginebra

- **GUACARÍ:**

Ubicado en el centro del Departamento del Valle del Cauca, aproximadamente a cuarentaicinco (45 Km) kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (ver Ilustración 2).

Guacarí se encuentra a una altura promedio de 976 m.s.n.m, y una temperatura media de 23°C. En términos geográficos se encuentra localizado a Coordenadas: 3°45'55" Latitud N 76°20'1" Longitud O.

El municipio de Guacarí limita por el Norte con: Guadalajara de Buga, Sur: Cerrito, por el Oriente con Ginebra; por el Occidente con Yotoco, sirviéndole de límite el río Cauca.

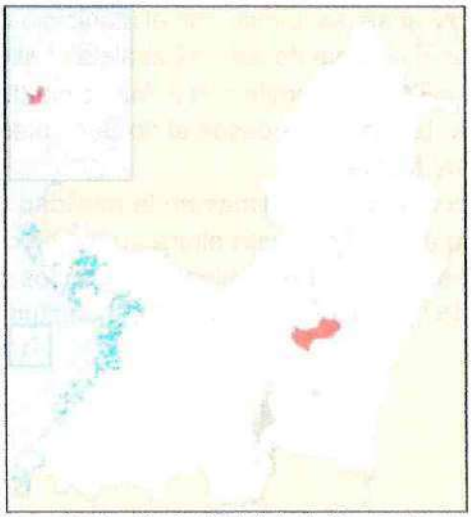


Ilustración 2 Municipio de Guacarí

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El presente proyecto tiene como objetivo la optimización del sistema de abastecimiento (captación-aducción-conducción-PTAP) de los acueductos del casco urbano de los Municipios de Ginebra y Guacarí, que permita brindar un servicio que garantice condiciones óptimas de cantidad, continuidad, cobertura y calidad, mejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.

Para cumplir con este objetivo, se construirán las estructuras requeridas: bocatoma, desarenador, Macromedidor, cámara de distribución de caudal, líneas de aducción y conducción, tanques de almacenamiento e intervenciones en las PTAPS de los Municipios de Ginebra y Guacarí.

2.2.1 CAPÍTULOS DEL CONTRATO

- Preliminares.
- Bocatoma.
- Línea de aducción.
- Desarenador.
- Macromedidor.
- Línea de conducción.
- Cámara de quiebre.
- Cámaras de purga.
- Cámara distribuidora de caudal.
- Intervenciones en la PTAP de Ginebra.
- Intervenciones en la PTAP de Guacarí.
- Tanque de almacenamiento Ginebra.
- Manejo salud ocupacional, calidad, seguridad y ambiental.

2.3 ESTADO LEGAL DE LA POLIZAS Y AVANCES PRESUPUESTAL.

Según las exigencias contractuales el contratista debe amparar la ejecución del proyecto y actividades bajo las siguientes especificaciones.

- Cumplimiento del contrato.
- Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
- Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
- Estabilidad y calidad de la obra.
- Responsabilidad civil extracontractual.

En la siguiente Tabla se muestra el tipo de amparo, las fechas de cobertura y los valores asegurados, expedidas por Seguros Mundial, de las pólizas actualizadas con las últimas modificaciones del contrato.

AMPARO	FECHA DE COBERTURA	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA	ANEXO
Cumplimiento	10/03/2025 - 22/07/2026	$6.400.645.515,80	C-100050102	9
Buen manejo del anticipo	10/03/2025 - 22/07/2026	$8.829.624.297,90	C-100050102	9
Prestaciones sociales	10/03/2025 - 22/01/2029	$1.600.161.378,95	C-100050102	9
Estabilidad de la obra	22/01/2026 - 22/01/2031	$9.600.968.273,70	C-100050102	9
Responsabilidad civil extracontractual	31/10/2022 - 22/01/2026	$1.600.161.377,45	C-100012551	7

2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el período de tiempo correspondiente al presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

- **Topografía:**

  Durante el mes de mayo del 2025 la comisión de topografía ha realizado acompañamiento a todas las labores e intervenciones realizadas en los frentes de obras que se están realizando en el proyecto:

  1. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del Municipio de Ginebra (Obras en los Sedimentadores, filtros y construcción casetas).
  2. Tanque de Almacenamiento en la PTAP Ginebra.
     a. Seguimiento de asentamiento del tanque.
  3. Intervenciones en la Planta de Tratamiento de Agua potable del Municipio de Guacarí (Obras en los Sedimentadores, línea de Floculación y construcción casetas).
  4. Tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el Sector Villa Jhons (la Albania).
     a. Seguimiento de asentamiento del tanque.
  5. Actividades Adicionales.
     a. Levantamiento final del Tramo 1, 2 y 3 (actualización de información).
     b. Levantamiento a predios de para solicitud de Servidumbres.
        i. Levantamiento e Información geográfica de la Servidumbre de Ginebra (Graciela Blum).
        ii. Levantamiento e Información geográfica de la Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo).

iii. Levantamiento e Información geográfica de la Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco).
iv. Levantamiento e Información geográfica de la Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena).
v. Levantamiento e Información geográfica de la Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez).

- En el Frente de obra de **Intervenciones en la Planta Ginebra**, se han realizado todos los levantamientos necesarios para las adecuaciones e intervenciones en las plantas para su optimización.
  - Se acompaña en todo el proceso de optimización e intervenciones civiles del tanque del Filtro No.1 en donde se chequean las medidas para finalizar con las intervenciones de la obra civil.
  - Se acompaña en la instalación de los falsos fondos tipo Leopold del tanque del Filtro No.1 en donde se chequean las medidas y se suministra toda la información necesaria.
  - Se marcan los puntos donde se realizará el anclaje de las cerchas de soporte de las canaletas en acero inoxidable, se verifican las cotas, plomos de las flanches y niveles luego de ser instaladas las cerchas.
  - Se acompaña en la instalación de todas las válvulas, vástagos, torres y volantes de la línea de sedimentación No.1.
    - Válvulas de 8" de entrada al sedimentador.
    - Válvula de 8" de desagüe de lodos del sedimentador.
  - Se acompaña en la instalación de todas las válvulas, vástagos, torres y volantes del tanque del Filtro No.1.
    - Válvula de 6" de entrada al Filtro.
    - Válvula de 8" de desagüe del filtro.
  - Se acompaña en la instalación de la canaleta en acero inoxidable del Filtro No.1.
  - Por otro lado, se acompaña en todas las actividades para revisión de cantidades, chequeo de niveles, verificaciones de cotas y profundidades en el frente de obra.



Ilustración 3. Chequeo de cotas y medidas para material de soporte en el Filtro No.1 de la PTAP Ginebra.

- Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la **construcción de las casetas en la Planta de Ginebra (Caseta Eléctrica y caseta de Sopladores):**
  - **Caseta Eléctrica:** continúan con la actividad de adecuación para instalación de equipos y tableros, se chequean medidas internas para apoyar en la instalación de equipos, construcción de cajas y replanteo de cárcamos.
  - **Caseta de Sopladores:** Se reinicia con la construcción de la caseta de sopladores teniendo en cuenta los cambios realizados por el diseñador y aprobados por la interventoría y operador de las plantas, durante el mes se ha realizado el traslado de los cables a la caja eléctrica nueva para continuar con la construcción de las cimentaciones de la caseta de sopladores.
    - Se suministra la estructura metálica y cubierta por parte del Subcontratista de ornamentación para la construcción de la caseta de sopladores, se programa la instalación de la estructura metálica y cubierta para el siguiente mes.

- En el Frente de obra del **Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de la PTAP Ginebra**:
  - Se ha llevado control en los niveles de los llenos para poder llegar a la cota para instalación de tubería de alimentación del tanque.
  - Continúan con el seguimiento de toma de cotas para evaluar el asentamiento del tanque.

- En el Frente de obra de **Intervenciones en la Planta Guacarí**, se ha realizado acompañamiento en todas las actividades realizadas.
  - Continúan con las obras civiles del Sedimentador no. 3.

- Continúan con las obras civiles de la línea de Floculación No.3.
- Se verifican las medidas reales del sedimentador No. 3 y la línea de Floculación No.3.
- Se chequean las medidas de la línea de floculación No.1 para identificar las cotas y pendientes para trasladar estas medidas a la optimización de la línea de Floculación No.3.
- Se chequean los niveles de realces de los muros y se verifican luego de realizar la fundición.
- Se miden las estructuras internas del sedimentador No.3 para poder realizar la actividad de demolición.
- Se miden las estructuras internas de la línea de floculación No.3 para poder realizar la actividad de demolición.
- Se marcan los plomos y medidas para repellos en el sedimentador No.3.
- Se chequean los niveles y pendiente de la losa inferior para realce de la losa del sedimentador No.3.
- Se chequean las medidas, profundidades y toda la información necesaria para la fabricación de los elementos del sedimentador y línea de Floculación No.3.
- Se realiza el realce de la losa inferior del tanque de sedimentación No.3 (se chequean las pendientes).
- Se chequean las medidas y ubicación de los muros No.3 y No.4 de la línea de Floculación No.3 para realizar la instalación del acero de refuerzo, encofrado y fundición.
- Se realiza el chequeo de plomos y ubicación de las pantallas de entrada y salida del sedimentador No.3.
- Se chequean y verifican plomos y ubicación del muro perforado de la línea de Floculación No.3.
- Por otro lado, se acompaña en todas las actividades para revisión de cantidades, chequeo de niveles, verificaciones de cotas y profundidades en el frente de obra.



Ilustración 4. Seguimiento a las actividades ejecutadas en el frente de obra de la PTAP Guacarí (Línea de Floculación No.3 y Sedimentador No.3).

- Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la **construcción de las casetas en la Planta de Guacarí (Caseta Eléctrica):**
  - **Caseta Eléctrica:** Se ha suministrado toda la información para la construcción de la caseta eléctrica, durante el mes se ha realizado la instalación de la cubierta y puerta de la caseta eléctrica, queda pendiente la instalación de las ventanas que ya fueron suministradas y estarán programadas para instalación el siguiente mes.
  - **Caseta de Sopladores:** Se replantea la nueva ubicación de la de sopladores, se actualiza el plano con las medidas reales del terreno y se marcan los niveles para iniciar con la excavación de la construcción de la caseta (ubicación solicitada por el operador Acuavalle ya que por operatividad y futuras intervenciones a la planta no es conveniente construir la caseta en el punto solicitado inicialmente). Con esta nueva ubicación se aumenta la longitud de tuberías de conexión.
    - Se realiza el replanteo de la nueva ubicación de la caseta de sopladores.
    - Se realiza el descapote para iniciar con las obras de cimentación de la caseta de sopladores.

- **Frente de Obra de instalación de Tubería:**
  - Durante el mes se ha replanteado la información del diseño en los tramos 1, 2 y 3, en donde se ha visto la necesidad de reubicar la CADICA y evaluar algunos cambios de alineamiento para poder generar las menores afectaciones a las estructuras viales existentes.
  - Se ha replanteado la ubicación de los viaductos con respecto al diseño nuevo entregado por el diseñador estructural, se hace verificación de la cota batea y los puntos de apoyos de los viaductos propuestos por el nuevo diseño.



Ilustración 5. se realiza replanteo de los viaductos en los tres frentes (Puente Amarillo, Puente Rojo y Puente la Magdalena).

- Se han encontrado e identificado las dificultades en los tramos como muros de contención en gavión, cimentaciones de puentes, inestabilidades en la vía, entre otras estructuras que no estaban identificadas en el diseño inicial y lo cual generará cambios en el alineamiento u obras no previstas, se toman coordenadas de estos puntos y se tienen en cuenta para el chequeo hidráulico.
- Se realiza acompañamiento en recorrido del tramo 1)Desde la Bocatoma hasta la CADICA) para identificación de los puntos críticos, alcantarillas transversales, estructuras hidráulicas, cantidades adicionales y necesidades para iniciar con este frente de obra.

❖ **Construcción del tanque de Almacenamiento en el predio de Acuavalle en el sector villa Jhons – La Albania:**

- Se hace seguimiento en el asentamiento del tanque.
- Se verifican las cotas y medidas para calcular los rellenos laterales del tanque.



Ilustración 6. Chequeo de cotas para seguimiento de asentamiento del tanque.

- Por último, como **Actividades Varias** se han realizado las siguientes:

  - Levantamiento de información en el sector donde se proyecta la construcción de la Bocatoma por solicitud del Diseñador.
    Ya que se está evaluando la alternativa de construcción de una bocatoma con el sistema de malla coanda para optimizar la captación y suprimir la construcción del desarenador, se requiere de información adicional para tener más detalle del sector donde se tiene proyectada la construcción de la obra de captación y poder evaluar las condiciones reales del sitio para garantizar un diseño adecuado y óptimo, por esta razón se ha realizado una topografía más detallada con modelo 3D para tener mayor claridad en la información.
    - Durante el mes de mayo se han atendido todas las solicitudes por parte del diseñador y la información adicional necesaria para evaluar el funcionamiento de la malla coanda para optimizar la captación.

- **Compras:**

  - Se ha concretado la compra de todos los materiales, insumos y herramientas para realizar las intervenciones en las dos Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra y Guacarí) y el frente de obra de la construcción del tanque de almacenamiento de la Albania.
  - Se compran y suministran todas las herramientas necesarias y de uso diario para la optimización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Ginebra y Guacarí) y el frente de obra de la construcción del tanque de almacenamiento de la Albania.

- **Laboratorios:**
  - Durante el mes no se ha realizado ningún diseño de mezcla nuevo, hasta la fecha se cuenta con 4 diseños de mezclas en donde se evalúan los materiales pétreos (arena y triturado) provenientes de la cantera Bermejal del municipio de Buga, se utilizará cemento Argos y Holcim, y se solicita que la resistencia de diseño sea de 3000 y 4000 PSI. (Anexos del presente Informe).
    - Se tienen a la fecha 4 diseños de mezclas (Anexos).
  - Se cuenta con el ensayo de Proctor modificado de siete materiales (Del tramo 3 y Tanque de la PTAP Ginebra) esto para poder identificar el material y obtener las características y la compactación óptima de estos, ya que el suelo es variable en diferentes tramos.

- Se tienen a la fecha 7 Ensayos de Proctor Modificado (Anexos).

Se realiza el Ensayo de Proctor modificado a material importado para lleno de tanque de almacenamiento de agua potable de la PTAP Ginebra.





Ilustración 7. Curva de Compactación Obtenida en uno de los materiales a los cuales se realizó la prueba del Proctor Modificado (Muestra No.8).

- Se toman muestras de concreto en las estructuras fundidas durante el mes de mayo 2025 para enviar al laboratorio para a realizar el ensayo de compresión y poder determinar la resistencia última de las estructuras realizadas durante el mes, las cuales fueron:
  - Pantalla Canaleta la PTAP Ginebra.
  - Losa Inferior Filtro No.1 PTAP Ginebra (Tramo 1).
  - Losa Inferior Filtro No.1 PTAP Ginebra (Tramo 2).
  - Segunda fundición Muros Tanque de la Albania.
  - Losa superior Tanque de la Albania (Etapa 1).
  - Losa superior Tanque de la Albania (Etapa 2).
  - Pantalla Final Sedimentador No.3 PTAP Guacarí.
  - Muro No.4 del Floculador No.3 de la PTAP Guacarí.
  - Muro No.3 del Floculador No.3 de la PTAP Guacarí.

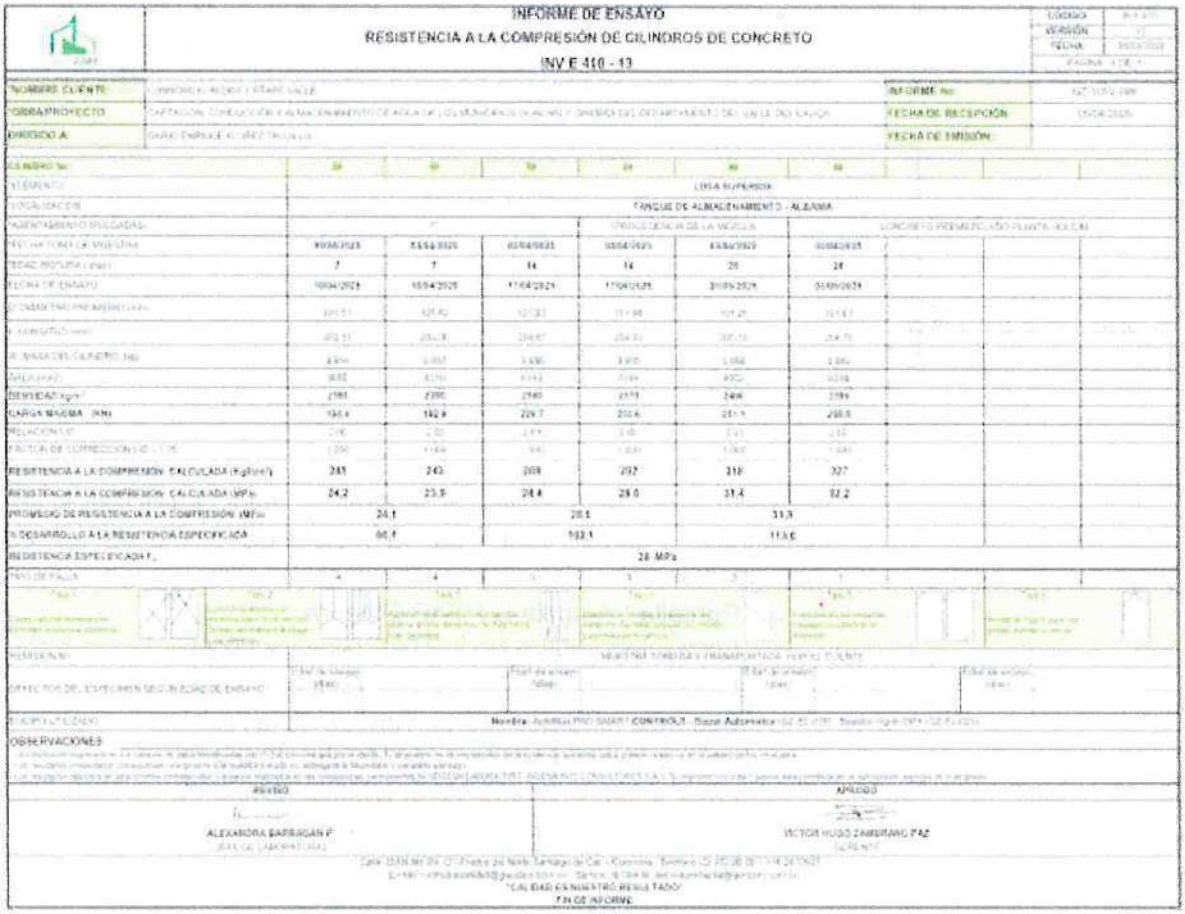  Se chequean que los resultados cumplan con las resistencias solicitadas por el diseño (se anexan las remisiones y los resultados de los ensayos realizados este mes).



INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
INV E 410 - 13

CILINDRO No.	34	35	36	37	38	39
ELEMENTO	LOSA SUPERIOR					
LOCALIZACIÓN	TANQUE DE ALMACENAMIENTO - ALBANIA					
FECHA TOMA DE MUESTRA	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025	09/04/2025
EDAD ROTURA (días)	7	7	14	14	28	28
FECHA DE ENSAYO	16/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	17/04/2025	01/05/2025	01/05/2025
DIAMETRO PROMEDIO (cm)	10.11	10.10	10.07	10.14	10.10	10.11
LONGITUD (cm)	20.11	20.19	20.07	20.11	20.10	20.15
AREA DEL CILINDRO (m2)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
VOLUMEN (m3)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
DENSIDAD (kg/m3)	2385	2395	2340	2379	2404	2394
CARGA MAXIMA (kN)	194.4	192.9	229.7	233.6	251.1	255.5
RELACION L/D	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
FACTOR DE CORRECCION L/D = 1.75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RESISTENCIA A LA COMPRESION CALCULADA (Kg/cm2)	245	243	289	292	316	321
RESISTENCIA A LA COMPRESION CALCULADA (MPa)	24.2	23.9	28.4	28.6	31.0	32.2
PROMEDIO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION (MPa)	24.1		28.5		31.5	
% DESARROLLO A LA RESISTENCIA ESPECIFICADA	86.1		102.1		113.0	
RESISTENCIA ESPECIFICADA f'c	28 MPa					
TIPO DE FALLA	4	4	3	3	3	3

OBSERVACIONES

AVALÓ	APROBÓ
ALEXANDRA BARRAGAN P	VICTOR HUGO ZAMBRANO PAZ

"CALIDAD ES NUESTRO RESULTADO"
FIN DE INFORME

Ilustración 8. Ensayo de compresión de cilindros en una de las muestras enviadas al laboratorio (Losa superior – Tanque de la Albania) en donde se evidencia que a los 28 días está superando un 100% de su resistencia (Resistencia Esperada).

- **Bodegaje:**

  Se cuentan con las bodegas y sitios de acopio temporal para las actividades de instalación de tubería y construcción del tanque, a continuación, se mencionan las bodegas:

  - Bodega No. 1 "Hacienda la Esmeralda" (Tubería y Maquinaria).
  - Bodega No. 2 "Bodega Acuavalle Guacarí" (Tubería y Maquinaria).

- **Socializaciones:**

  Durante el transcurso de este mes no se llevan a cabo actividades de socialización con la comunidad de Ginebra y Guacarí.

  Se realiza comité de veeduría para mostrar los avances de obra en las intervenciones en las plantas de Ginebra y Guacarí y la construcción de los tanques de Almacenamiento (uno en la PTAP Ginebra y el segundo en el predio en la Albania), solo se realiza la reunión con el comité de veeduría del municipio de Ginebra ya que por orden público se cancela la reunión de la veeduría del mes de mayo con el municipio de Guacarí.

- **Actividades Constructivas en Frente Ginebra:**

  - **Tanque PTAP Ginebra.**
    - Continúan con la actividad de lleno con material importado en el perímetro del tanque y en la rampa de acceso al tanque.
    - Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque.

  - **Intervenciones en Planta "PTAP Ginebra":**
    - Puesta en operación del barrelodos del sedimentador No.1.
    - Instalación de los falsos fondos tipo Leopold del tanque del Filtro No.1.
    - Instalación de las canaletas en acero inoxidable del sedimentador No.1.
    - Instalación de boquillas en los falsos fondos del Filtro No.1.
    - Puesta en operación del Sedimentador No.1.

    Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas en sus rendimientos durante su ejecución por las condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender labores de manera parcial y total en los diferentes frentes de obra.

  - **Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Ginebra):**
    - **Caseta de Sopladores:**
      - Figuración de acero de refuerzo.
      - Excavaciones de cimentaciones.
      - Fabricación de estructuras metálica de la caseta.
      - Fabricación de la cubierta.
      - Traslado de caja eléctrica para construcción de cimentación.

- Construcción de cimentación de la caseta.
- Construcción de pedestales con instalación de flanches.
- Construcción de piso para ubicación de sopladores.

- **Actividades Constructivas en Líneas de conducción:**

  - Se realizan recorridos, visitas técnicas y chequeos hidráulicos en el Tramo 1.
  - Se adelanta trámite para instalación de tubería de 10" PEAD en predio de la familia Saavedra Blum.
  - Recorrido para identificación de dificultades en los tramos.
  - Replanteo de la ubicación de los viaductos actuales.

- **Actividades Constructivas en Frente Guacarí:**

  - **Intervenciones en Plantas "PTAP Guacarí":**
    - Obras civiles del sedimentador No. 3.
      - Demolición de todas las estructuras internas del tanque de sedimentador No.3.
      - Realce y construcción de losa del tanque de sedimentador No.3.
      - Escarificación de muros.
      - Repello de muros internos.
      - Construcción de pantallas (pantallas de entrada y salida del sedimentador).
      - Entrega del sedimentador al equipo de metalmecánica para montaje del Barrelodos.
    - Obras civiles en la línea de Floculación No.3.
      - Demolición de todas las estructuras internas de la línea de floculación No.3.
      - Escarificación de muros.
      - Repello de muros internos.
      - Construcción de muros (Muro No.3, Muro No.4 y Muro perforado).
      - Entrega de línea de Floculación a equipo de metalmecánica para inicio de instalación de pasarelas metálicas.

    Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas en sus rendimientos por las condiciones climáticas, las cuales han obligado a

suspender actividades de manera parcial y total en los diferentes frentes de obra.

- ❖ **Caseta Eléctrica y Caseta de Sopladores (Guacarí):**
  - **Caseta de Eléctrica:**
    - Instalación de Cubierta.
    - Orden y aseo en la caseta.
  - **Caseta de Sopladores:**
    - Se realizan reunión para reubicación de caseta de sopladores.
    - Se realiza replanteo.
    - Se realiza descapote.
    - Se inicia con las excavaciones para las cimentaciones de la caseta de sopladores.
    - Durante el mes se realizó el suministro de la estructura metálica de columnas y cubierta para ser instaladas el siguiente mes.

- **Actividades Constructivas en Frente Villa Jhons – Tanque de Almacenamiento La Albania:**

  - ❖ **Tanque de almacenamiento de agua potable Predio Acuavalle en sector La Albania:**
    - Orden y aseo.
    - Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque.
    - Se programa para el siguiente mes realizar la prueba de estanqueidad.

  Cabe resaltar que todas las actividades han sido afectadas por el las condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender actividades de manera parcial y total en los diferentes frentes de obra.



Ilustración 9. Chequeo de cotas para seguimiento de asentamiento del tanque de la Albania.

- **Actividades Varias y Adicionales realizadas durante el mes.**
  - ❖ Recolección de Información de Servidumbres para ejecución del proyecto:
    - Servidumbre del Tramo 2 (Predio de Familia Saavedra Blum).

    Se encuentran pendientes las siguientes servidumbres. Estas ya han sido enviadas a la interventoría para iniciar su trámite y poder contar con ellas al momento de reinicio de las actividades en esos frentes de obra:

    - Servidumbre de Ginebra (Predio Danilo Bermúdez).
    - Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Amarillo).
    - Servidumbre de Guacarí (Predio Chicuco).
    - Servidumbre de Guacarí (Predio Puente Rojo).
    - Servidumbre de Guacarí (Predio Puente la Magdalena).

  - ❖ Levantamiento de información en el sector donde se proyecta la construcción de la Bocatoma por solicitud del Diseñador.
    - Ya se realizó la recolección de información y fue enviada al diseñador.

2.4.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

Se realiza entrega de los siguientes documentos para revisión y aprobación de la interventoría:

- Informe mensual abril 2025.
- Bitácoras de obra.
- Oficios:

- Oficio "Solicitud de mejoramiento de vía - sector regaderos"
- Oficio "Entrega informe No. 24 abril 2025".
- Oficio "Convocatoria Reunión Comité De Veeduría mes De Marzo Consorcio Redes Y PTAPS Valle (Municipio de Ginebra)"
- Oficio "Convocatoria Reunión Comité De Veeduría mes De Marzo Consorcio Redes Y PTAPS Valle (Municipio de Guacarí)"
- Oficio "Autorización CELSIA".
- Oficio "Solicitud de recolección derrumbes en la vía entre Puente de Piedra hasta Puente Papas"

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Consecutivo No.	ASUNTO	DESTINATARIO	FECHA	ELABORÓ
Cons159	Invitación comité de veeduría Municipio de Ginebra	ALCALDIA GINEBRA	21 de abril 2025	MFM
Cons160	Entrega de polizas actualizadas	VALLECAUCANA	8 abril 2025	MFM
Cons161	Invitación comité de veeduría Municipio de Guacarí	ALCALDIA GUACARI	21 de abril 2025	MFM
Cons162	Solicitud de apoyo en el proceso de convocatoria para la capacitación en cartografía Ginebra	ALCALDIA GINEBRA	21 de abril 2025	MFM
Cons163	Solicitud de apoyo en el proceso de convocatoria para la capacitación en cartografía Guacarí	ALCALDIA GUACARI	22 de abril 2025	MFM
Cons164	Solicitud de mejoramiento de vía - sector regaderos	ALCALDIA GINEBRA	02 de mayo 2025	DET
Cons165	Entrega informe No. 24 abril 2025	INTERVENTORIA	5 mayo 2025	LMB
Cons166	Invitación comité de veeduría Municipio de Guacarí	ALCALDIA GUACARI		MFM
Cons167	Invitación comité de veeduría Municipio de Ginebra	ALCALDIA GINEBRA		MFM
Cons168	Autorización CELSIA	CELSIA	mayo 20 de 2025	LMB
Cons169	SOLICITUD DE RECOLECCION DERRUMBES EN LA VIA ENTRE PUENTE DE PIEDRA HAS A PUENTE PAPAS	ALCALDIA GINEBRA	23 de mayo 2025	
Cons170				
Cons171				
Cons172				
Cons173				

Ilustración 10. Control de Correspondencia enviada durante el mes de mayo del 2025.

2.4.2 GESTIÓN DE PERMISOS

2.4.2.1 *Alcaldías de Ginebra y Guacarí:*

Se encuentra pendiente por parte de la alcaldía del municipio de Ginebra, dar respuesta a la solicitud del permiso de rotura de vía, necesario para las intervenciones de instalación de tubería en los tramos que se encuentran construidos con pavimento.

1. Tramo 1: inicia desde la Bocatoma y finaliza en Puente Amarillo.
2. Tramo 2: desde Puente Rojo y finaliza en el acceso a la PTAP Ginebra (Finca Índigo).

A la fecha no se tiene respuesta por parte de planeación acerca de este permiso.

2.4.2.2 *Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC:*

2.4.2.2.1 Aprovechamiento Forestal PTAP

Se está a la espera de la respuesta por parte de la CVC para aprobación del predio para realizar la compensación forestal, así como también el cambio de especies solicitado por Acuavalle, quienes son los encargados de realizar este trámite ante la entidad.

- Durante el mes de mayo se sigue realizando seguimiento y consulta a los funcionarios para obtener la respuesta de CVC del plan de compensación forestal entregado en marzo del 2025 y el cual está a la espera de un certificado de tradición del predio del Ingenio Pichichi para autorizar la compensación en el predio La Esmeralda o encontrar otro predio para realizar la composición.

2.4.2.2.2 Aprovechamiento Forestal Bocatoma

Durante el anterior mes se realizó la visita con el ingeniero forestal para nuevamente identificar los individuos arbóreos para actualizar la cotización e iniciar con el trámite para realizar el aprovechamiento forestal de esta zona, cabe resaltar que esta actividad no tiene en este momento ítem de pago, por esta razón no se ha podido realizar la contratación del personal para realizar el aprovechamiento en esta zona.

- Durante el mes de mayo del presente año se ha enviado un oficio a la alcaldía del municipio de Ginebra, con el fin de solicitar la prórroga del permiso de aprovechamiento forestal del área de la bocatoma, ya que este actualmente tiene como fecha de vencimiento el 22 de julio de 2025, por esta razón con dos meses de antelación se solicita la prórroga del mismo.

2.4.3 REUNIONES, RECORRIDOS Y VISITAS DE OBRA CON ENTIDADES.

Durante el mes de mayo de 2025 se realizaron las siguientes reuniones con las partes interesadas:

- **30 de abril del 2025:** Se realiza recorrido con los ingeniero de la empresa Ingeniería y Soluciones Civiles para evaluar los puntos críticos en el tramo 1 de tubería (tramo desde la bocatoma hasta la CADICA) y en donde se tiene proyectado la instalación de tubería de 18" PEAD, los puntos críticos identificados es el tramo del muro en gavión en la abscisa K0+400, el tramo del derrumbe en el sector de regaderos y los tres viaductos, los ingenieros en su experiencia dan su concepto para evaluarlo durante el proceso de ejecución de este tramo.



Ilustración 11. Recorrido con los Ingenieros Especialistas en instalación de tubería PEAD y viaductos para evaluar los puntos críticos del tramo No.1.

- **30 de abril del 2025:** Tercera reunión con Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca, en donde se expone por parte de los ingenieros evaluadores de la ventanilla algunos requerimientos para anexar a los documentos soporte de la Reformulación No.2, esta reunión se realizó en las oficinas de la Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca ubicado en el Edificio Francisco Ospina Bernal en la Ciudad de Santiago de Cali – Valle del Cauca, se contó con la participación de los funcionarios de la Ventanilla Única, Vallecaucana de Aguas, la interventoría y el contratista.



Ilustración 12. Reunión con Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca para evaluar la Reformulación No.2.

- **06 de mayo del 2025:** Se realiza recorrido de obra con la coordinadora del proyecto y el equipo técnico del consorcio sobre todo el tramo 1 (tramo que comprende desde la bocatoma hasta la CADICA), en donde se evalúan la necesidades para iniciar con las actividades de obra en este frente, se identifican los puntos críticos y se socializa las alternativas evaluadas con los ingenieros especialistas, se programa un futuro

recorrido con todo el equipo integral para poder identificar todas las necesidades para el inicio de las obras.



Ilustración 13. Recorrido en tramo No.1 de la línea de condición con equipo técnico del consorcio.

- **08 de mayo del 2025:** Segundo recorrido con equipo integral del consorcio (SST, Social, Ambiental y Técnico) en donde se identifican las necesidades de las diferentes áreas para el inicio de las obras sobre este tramo (tramo que comprende desde la Bocatoma hasta la CADICA), se inicia a cuantificar las cantidades reales a ejecutarse durante la instalación de la tubería, se identifican los derrumbes, alcantarillas transversales colmatadas de material, cunetas existentes y tramos de vía que será necesario realizar demolición y reposición de pavimentos (rígido y flexible) para la instalación de la tubería.



Ilustración 14. Segundo recorrido en tramo No.1 de la línea de condición con equipo integral del consorcio (SST, Social, Ambiental y Técnico).

- **16 de mayo del 2025:** Reunión interna y recorrido técnico con equipo de trabajo integral del consorcio para evaluar actividades pendientes, asignar tareas y compromisos para continuar con la buena ejecución del contrato, esta reunión es

realizada en la oficina del contratista en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra.



Ilustración 15. Reunión interna y recorrido técnico con equipo de trabajo del Consorcio.

- **16 de mayo del 2025:** Cuarta reunión con Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca, en donde se argumenta y soporta las razones por las cuales se está solicitado la Reformulación No.2, esta reunión se realizó en el Edificio Francisco Ospina Bernal donde está ubicada la oficina de la ventanilla única de la Gobernación, se contó con la participación de los funcionarios de la Ventanilla Única, Vallecaucana de Aguas, La interventoría y el contratista.



Ilustración 16. Reunión con Ventanilla Única de la Gobernación del Valle del Cauca para evaluar la Reformulación No.2.

- **22 de mayo del 2025:** Reunión con personal de obra para divulgar información del contrato, capacitarlos en los componentes Integrales del proyecto (SST, Social, Ambiental y Técnico) y se realizan recomendaciones para la correcta ejecución de las actividades en la obra, esta reunión se realizó en la PTAP de Guacarí con el

acompañamiento de los subcontratistas de Coningenieria (Metalmecánica) y Constructora C&C (Obra Civil).



Ilustración 17. Reunión con personal subcontratado para atender las necesidades del proyecto (Metalmecánica y obra Civil), reunión realizada en la PTAP de Guacarí.

- **27 de mayo del 2025:** Se realiza Comité de veeduría del Municipio de Ginebra en la oficina del Consorcio ubicada en el corregimiento de Costa Rica, Municipio de Ginebra, se tuvo acompañamiento de funcionarios de la administración pública del municipio de Ginebra, la interventoría y la comunidad, se evalúa el avance de la etapa del proyecto y se programa la fecha del próximo comité de veeduría.



Ilustración 18. Comité de veeduría del municipio de Ginebra celebrado el 27 de mayo del 2025.

Se han realizado diversas reuniones de manera informal para atender las necesidades del proyecto, también atender las sugerencias, inquietudes y recomendaciones de la interventoría y del operador de las plantas (Acuavalle).

También se realizan reuniones con proveedores y empresas subcontratadas para evaluar los avances y tiempos de entrega, a continuación, el registro fotográfico de algunas de las actividades.

- **15 de mayo del 2025:** se realiza recorrido con la comisión de topografía para chequear, verificar y realizar la marcación de niveles de la grava estratificada, el material filtrante Filtralite y el múltiple de distribución de aire en el filtro No. 1 de la PTAP de Ginebra, También se hace la verificación de la altura para instalación de las boquillas a los falsos fondos.



Ilustración 19. Recorrido con comisión de topografía para chequear medidas en el Filtro No1 de la PTAP Ginebra.

- **16 de mayo del 2025:** Reunión con equipo de metalmecánica (Coningenieria) y delegado asignado para la supervisión de las perforaciones de los falsos fondos (ETEL), en donde se revisan las profundidades y la ubicación de donde se deberá realizar las perforaciones de los falsos fondos para instalación de las boquillas en el Filtro No.1 de la PTAP Ginebra.



Ilustración 20. Reunión y recorrido para identificar los puntos donde se debe realizar las perforaciones para instalación de las boquillas del Filtro No.1 de la PTAP Ginebra.

- **22 de mayo del 2025:** Se realiza reunión con el equipo de Metalmecánica, comisión de topografía, interventoría y operador del servicio "Acuavalle" para realizar el levantamiento de cotas en las cámaras de la línea de floculación No.1 de PTAP Guacarí para identificar las pendientes y la operación de este y así mismo aplicarlo en la línea de floculación No.3 (Optimizada por el proyecto).



Ilustración 21. Levantamiento de cotas en las cámaras del floculador No.1 de PTAP Guacarí.

- **27 de mayo del 2025:** se hace acompañamiento en la toma de cotas para evaluar los asentamientos de los tanques construidos, uno en la PTAP de Ginebra y el segundo en el predio de Acuavalle (Villa Jhons - Albania), se diligencia el formato de asentamientos y se encuentra que los tanques están presentado buen comportamiento tanto en vacío como totalmente llenos. (se anexa el formato de asentamientos).



Ilustración 22. Toma de información para evaluar asentamientos en los tanques construidos para el servicio del municipio de Ginebra (PTAP de Ginebra y Villa Jhons – Albania).

2.5 COSTOS Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2.5.1 DESEMBOLSOS DE ANTICIPO

A continuación, se resumen los desembolsos de anticipo realizados.

Tabla 1 Resumen desembolsos anticipo

DESEMBOLSO	FECHA	NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DESEMBOLSO	CONCEPTO	VR. DESEMBOLSADO
No. 1	ENERO 23 DE 2023	901.378.127-8	CAL SAS	Bocatoma, línea de aducción y macromedidor	$ 1.330.764.263
		900.521.827-4	CONSTRUCTORA NBI SAS	Tanque de almacenamiento Ginebra	$ 825.783.347
		805.030.454-9	CONINGENIERÍA SAS	Sum. e instalación pantallas deflectoras en fibra, canaletas.	$ 1.744.905.660
No. 2	FEBRERO 22 DE 2023	900.618.239-1	INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES SAS	Suministro accesorios y tubería PEAD	$ 2.955.952.978
		900.618.239-1	INGENIERÍA Y SOLUCIONES CIVILES SAS	Obras, instalación tubería conducción	$ 423.162.896
No. 3	MARZO 4 DE 2024	900.521.827-4	CONSTRUCTORA NBI SAS	Sum. e Instalación de Sopladores	$ 237.610.687
		805.030.454-9	CONINGENIERÍA SAS	Sum. e Instalación de Barrelodos plantas Ginebra y Guacarí	$ 752.820.600
		805.030.454-9	CONINGENIERÍA SAS	Suministro e Instalación de Floculadores mecánicos	$ 106.599.963
				TOTAL	$ 8.377.600.394

2.5.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

Teniendo en cuenta las actas parciales facturadas, la amortización del anticipo se encuentra de la siguiente manera:

Tabla 2 Resumen amortización anticipo

ACTA No.	FECHA CORTE	VR. AMORTIZACIÓN
1	31/05/2023	$ 2.511.320.053
2	30/06/2023	$ 265.804.757
3	31/01/2024	$ 272.313.639
4	31/03/2024	$ 151.167.886
5	30/04/2024	$ 110.785.818
6	31/05/2024	$ 2.211.334.610
7	31/07/2024	$ 181.239.470
8	31/08/2024	$ 115.636.686
9	30/09/2024	$ 206.702.983
10	31/10/2024	$ 364.968.330
11	30/11/2024	$ 620.506.131
12	31/01/2025	$ 207.104.917
13	28/02/2025	$ 694.041.763
TOTAL AMORTIZADO A LA FECHA		$ 7.912.927.043
VALOR TOTAL ANTICIPO		$ 8.829.624.279,90
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR		$ 916.697.236,90

2.5.3 FACTURACIÓN

En la siguiente tabla se indican las actas parciales facturadas a Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P.

Tabla 3 Actas parciales facturadas

ACTA No.	FECHA CORTE	VR. FACTURADO	% AVANCE
1	31/05/2023	$ 8.371.066.842	28,44%
2	30/06/2023	$ 886.015.856	31,45%
3	31/01/2024	$ 907.712.127	31,76%
4	31/03/2024	$ 503.892.952	33,34%
5	30/04/2024	$ 369.286.058	34,49%
6	31/05/2024	$ 7.371.115.364	57,52%
7	31/07/2024	$ 604.131.566	59,41%
8	31/08/2024	$ 385.455.620	60,61%
9	30/09/2024	$ 689.009.943	62,77%
10	31/10/2024	$ 1.216.561.098	66,57%
11	30/11/2024	$ 2.068.353.769	73,03%
12	31/01/2025	$ 690.349.724	75,19%
13	28/02/2025	$ 2.313.472.543	82,42%
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA		**$ 26.376.423.462**	**82,42%**
VALOR CONTRATO		**$ 32.003.227.549**	
PENDIENTE POR FACTURAR		**$ 5.626.804.087**	

2.6 PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN OBRA

Se cuenta con el personal idóneo, cumpliendo con los requisitos solicitados en el ***Capítulo 7. Información sobre el personal Profesional***, en el numeral ***a. Requisitos del personal***, en donde se exigen cumplir y acreditar un mínimo de requisitos de formación y experiencias de los colaboradores, a continuación, se presenta en la Tabla No. 4 Personal del Consorcio.

Tabla 4 Personal CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE

Nombre completo	Identificación	Cargo	Formación
CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	89.008.184	INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO	INGENIERO CIVIL. ESPECIALISTA EN SISTEMAS GERENCIALES DE INGENIERIA.
LINA MARCELA BURITICÁ LONDOÑO	42.136.662	COORDINADORA DE OBRA	INGENIERA CIVIL
DIANA MARCELA ECHAVARRIA CASILIMAS	31.658.574	INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL	INGENIERIA AMBIENTAL
GINA LEIDY LÓPEZ PAREDES	1.144.140.957	INGENIERA RESIDENTE HIDRÁULICA	INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL
DARIO ENRIQUE FLOREZ TRUJILLO	1.026.277.221	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE FUNDACIONES.
FLOR MARÍA MARTÍNEZ CUERVO	31.644.927	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST
MARIA FERNANDA MARTINEZ BRICEÑO	38.856.496	PROFESIONAL EN EL TRABAJO SOCIAL	TRABAJO SOCIAL ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL ESPECIALIZACION EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFASIS EN DESARROLLO EMPRESARIAL.
JIMMY JAVIER SINISTERRA ORTIZ	14.636.383	TOPÓGRAFO	TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA
LILIBETH MORA DUARTE	1.083.008.701	TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES
MARÍA CAMILA GIL GIL	1.112.969.458	AUXILIAR AMBIENTAL	INGENIERA AMBIENTAL

Adicionalmente, se cuenta con otros profesionales y personal de apoyo para aportar su conocimiento, como lo son el ingeniero forestal, la auxiliar administrativa, el ingeniero de costos y presupuestos y algunos especialistas, también se cuenta con algunos ingenieros de apoyo, los asesores de la instalación de la tubería, los asesores eléctricos, personal de apoyo en compra y suministro de equipos, asesores legales, entre otros.

Por último, se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las necesidades que se requieran en la ejecución.

2.7 AVANCE DE OBRA.

2.7.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, se describen todas las actividades realizadas durante este periodo:

2.7.1.1 *ACTIVIDADES VARIAS*

- Se ha realizado seguimiento a los trámites de los permisos y licencias solicitados a las entidades y las administraciones locales, hasta el momento se cuenta con las dos licencias de intervención de espacio público, los permisos de movilidad, el permiso de aprovechamiento forestal de la PTAP de Ginebra y bocatoma y el permiso de ocupación del cauce, con relación a los permisos de rotura de vías, se tiene aprobado el permiso del municipio de Guacarí y se encuentra pendiente el del municipio de Ginebra.

- Se trabaja en el balance de obra en donde se evalúan varias actividades en los tramos 1 y 2 para la instalación de la línea de conducción, obras adicionales del frente de obra de la bocatoma, ítems no previstos y mayores cantidades de obra, por otro lado, se evaluará la posibilidad de realizar perforaciones dirigidas en puntos neurálgicos del proyecto para no realizar afectaciones en las infraestructuras existentes o en algunos puntos de inestabilidad de taludes que ameriten realizar instalación de tubería sin zanja.

- Se cuenta con una comisión de topografía (topógrafo y cadenero) para atender las necesidades que se requieran en la ejecución de la obra en todos los frentes de obra (Intervenciones en la PTAP Ginebra, Construcción Tanque de la Albania, Intervenciones PTAP Guacarí, Línea de Conducción, Bocatoma, y Servidumbres).

- Teniendo en cuenta que los diseños de los viaductos del proyecto no cumplen con la norma, como se informó desde el inicio del contrato, se realiza el rediseño de los tres viaductos necesarios para la correcta ejecución del proyecto, se evalúan las condiciones actuales y áreas necesarias donde quedarán ubicados.

    - Durante el mes pasado han sido entregados los nuevos diseños de los viaductos de los tres puntos que requiere el proyecto, estos diseños han sido actualizados con las normas y chequeados para que cumplan con las cargas muertas y de servicio que corresponden, por otro lado, se ha evaluado las estructuras, áreas y condiciones del terreno existente para poder garantizar que la obra se haga de acuerdo sin ningún tipo de modificación o cambio al diseño propuesto, los viaductos presentados son los siguientes:
        - 1. Viaducto Puente Amarillo. (Tubería de 18 " PEAD).

- 2. Viaducto Puente Magdalena. (Tubería de 14" acero al carbón).
- 3. Viaducto Puente Rojo. 25 (Tubería 10" PEAD).

2.7.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO GINEBRA

- Se rellena la rampa y se realiza un acopio de material importado (Roca Muerta) para el lleno del tanque enterrado, durante el mes se ha iniciado con el lleno perimetral del tanque.
    - Continúan con la actividad de lleno con material importado en el perímetro del tanque y en la rampa de acceso al tanque, esta actividad ha presentado un rendimiento bajo debido a las condiciones climáticas de la época, que en la gran mayoría del tiempo ha sido lluviosa en las noches lo cual ha ocasionado que el material se sature y no tenga la humedad óptima para su compactación, por esta razón se espera que el siguiente mes se finalice con la actividad.

- Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque completamente lleno y luego completamente vacío, esto con el fin de garantizar que el tanque en operación no presente problemas de asentamientos o fisuras por cambios de nivel. A la fecha no se tienen variaciones. (ver Anexos).

2.7.3 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GINEBRA

Durante el mes de mayo de 2025 se han realizado diversas actividades en la PTAP Ginebra:

- Con el equipo de topografía se realizó la verificación y marcación de niveles de la grava estratificada, el material filtrante Filtralite y el múltiple de distribución de aire en el filtro No. 1 de la PTAP de Ginebra. Se verificó la altura para instalación de las boquillas a los falsos fondos.

- Se realizó la instalación de las boquillas de acero inoxidable de 1" y 3/4" en los falsos fondos del filtro No. 1 de la PTAP de Ginebra. Las perforaciones en los falsos fondos para la instalación de las boquillas, se realizaron con la supervisión de un técnico asignado por el fabricante DE NORA y la empresa ETEL y se garantizó que las boquillas quedaran instaladas a 38 mm dentro de las perforaciones, como lo indica el fabricante.

- Se revisó con el operador de la PTAP de Ginebra el proceso de lavado del filtro No. 3 y la cantidad de vueltas que se deben realizar en la válvula de retrolavado, para establecer las velocidades que recomienda el fabricante DE NORA para la realización de la prueba agua-aire en los filtros.

- Intervenciones civiles en el Filtro No. 1.
    - Instalación de todas las válvulas, vástagos, torres y volantes del tanque del Filtro No.1.
        - Finalmente se realiza la instalación de todas las válvulas, vástagos, torres y volantes del Tanque de Filtro No.1, para esta actividad se contó con el apoyo de la comisión de topografía, quienes han dado plomo y verificado la ubicación correcta de estas y el equipo de metalmecánica, quienes han realizado la instalación de estas válvulas completamente nuevas, cabe resaltar que se ha realizado la instalación de los pasamuros para su correcta operación, las válvulas son las siguientes:
            - Válvula de 6" de entrada al Filtro.
            - Válvula de 8" de salida del filtro.
    - Perforación de falsos fondos para instalación de boquilla.
        - Durante el mes de mayo se ha realizado la perforación de los falsos fondos del filtro No.1 para poder realizar la instalación de las boquillas, esta actividad ha sido realizada por el equipo de metalmecánica con supervisión del proveedor de los falsos fondos.

- Se realiza la instalación del sistema de streaming current con sus respectivos ductos para las conexiones eléctricas.

- Se ha realizado acompañamiento en las actividades de la caseta de sopladores en la Planta de Ginebra:

    Durante el mes se ha realizado la construcción de las dos zapatas faltantes y las vigas de cimentación, también se ha realizado la construcción de los pedestales con la instalación de los flanches para conexión de las columnas metálicas, por ultimo se ha realizado la fundición de la losa.
        - Se realiza el suministro de las columnas y estructura metálica para la cubierta, esta pendiente su instalación la cual está programada realizar para el siguiente mes.

Adicional, se llevan a cabo reuniones con los subcontratistas de los suministros de elementos en las estructuras a intervenir en la PTAP, barrelodos, módulos de sedimentación, falsos fondos, con quienes se resuelven dudas y evalúan el estado de avance para su instalación.

Cabe resaltar que los rendimientos de todas las actividades han sido afectados por el las condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender actividades de manera parcial y total en los diferentes frentes de obra.

2.7.4 INTERVENCIONES EN LA PTAP DE GUACARÍ

Durante el mes de mayo de 2025 se han realizado diversas actividades en la PTAP Guacarí:

- Para la construcción de la pantalla perforada del sedimentador No. 3 de Guacarí, se verificaron las medidas entre los orificios de 6" y se ajustaron las medidas de los planos a las dimensiones existentes en el sedimentador, teniendo en cuenta que la estructura no es ortogonal.

- Se replantearon las medidas en el área comprendida entre la pantalla perforada y la válvula de desagüe del sedimentador No. 3 para la construcción del canal de lodos y las pendientes de la losa.

- El equipo de topografía y metalmecánica realizan el levamiento de cotas y alturas de los agitadores mecánicos y pasarelas del floculador No. 1 de la PTAP de Guacarí, ya que es una información necesaria para la instalación de las pasarelas, motorreductores y agitadores en el floculador No. 1 de dicha planta.

- El equipo de topografía realiza el levantamiento de las cotas de la losa de fondo de cada cámara de la línea de floculación No. 1 de la PTAP de Guacarí y las traslada a la línea de floculación No. 3. Al igual que las líneas de floculación No. 1 y No. 2, cada cámara de la línea No. 3, debe contar con las pendientes que garanticen que el agua de lavado llegue hasta la válvula de desagüe ubicada en la primera cámara.

- Se continúa con la elaboración del documento donde se informan los ajustes que se han realizado a los diseños presentados en la reformulación No. 1 y que obedecen a las condiciones encontradas en las estructuras existentes al momento de ejecución de las obras, tales como falta ortogonalidad, muros desplomados, carencia de altura, de pendientes adecuadas, muros en regular estado, entre otros. Con estos ajustes se busca garantizar la funcionalidad de las estructuras optimizadas, integrándolas adecuadamente con el sistema existente.

- Obras civiles del sedimentador no. 3.
    - Se realiza la marcación de las pantallas del sedimentador para poder realizar el anclaje del acero de refuerzo, se encofra las estructuras y se realiza la fundición de las pantallas.
    - Se realiza todo el repello de los muros del tanque de sedimentación, posteriormente se realiza la impermeabilización para poder ser entregado al equipo de metalmecánica que iniciara con el ensamblaje del barrelodos.

- Obras civiles en la línea de Floculación No.3.

- Se realiza la construcción de los muros internos de la línea de floculación, en este caso se construyeron 3 muros (Muro No.3, Muro No.4 y Muro de la pantalla perforada), para esta actividad se contó con la comisión de topográfica para ubicación de los muros y plomo de estos, se realiza la instalación del acero de refuerzo el cual fue anclado a los muros existentes, también se realiza el encofrado y fundición de las estructuras.
- Se realiza todo el repello en los muros internos de la línea de Floculación no.3 para luego ser impermeabilizados, se verifica los plomos y ortogonalidad de los muros.
- Luego se hace entrega de línea de Floculación al equipo de metalmecánica para inicio de instalación de pasarelas metálicas.

Cabe resaltar que los rendimientos de todas las actividades han sido afectados por las condiciones climáticas, las cuales han obligado a suspender actividades de manera parcial y total en los diferentes frentes de obra.

- Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de la caseta eléctrica en la Planta de Guacarí:
  - En la caseta eléctrica durante el mes se realiza la instalación de la cubierta y la puerta de la caseta, se tiene programado para el siguiente mes la instalación de las ventanas.

- Por otro lado, se ha realizado acompañamiento para la construcción de la caseta de sopladores en la Planta de Guacarí:
  - Luego de reubicar la caseta de sopladores por solicitud del operador "Acuavalle" se ha realizado el replanteo en el nuevo sitio asignado para la construcción de esta, se ha realizado la actividad de descapote y se inicia con la actividad de excavación para construcción de la cimentación de esta caseta.

2.7.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ALBANIA - PREDIO ACUAVALLE EN SECTOR VILLA JHONS

Durante el mes de mayo del 2025 se realizó:

- Orden y aseo.
- Relleno y resane en las perforaciones de los pasadores de la formaleta metálica.
- Se realiza seguimiento al asentamiento del tanque.
- Se programa para el siguiente mes realizar la prueba de estanqueidad.

2.7.6 BOCATOMA

Durante el mes de mayo se ha realizado apoyo en la información adicional solicitada por el diseñador para continuar con la evaluación del sistema de Malla tipo Coanda.

2.7.7 DESARENADOR

Durante este mes no se realizan actividades en este capítulo. Se espera la entrega del diseño de la bocatoma con el sistema de malla tipo coanda.

2.7.8 LÍNEA DE CONDUCCIÓN


Durante el mes de mayo se han realizado las siguientes actividades:

- Se realizaron 3 recorridos por el tramo No. 1 (bocatoma-CADICA) y se hizo recopilación de información con el equipo de topografía y personal del consorcio, tal como numero de bateas existentes y nacimientos que requieren manejo de agua, tramos donde se reduce la sección de la vía, tramos con presencia de derrumbes, tramos donde la tubería puede pasar por zona verde, tramos donde la tubería requiere pasar por pavimento o placa huella, pases por drenajes y box culvert, sitios donde se requieren apiques, entre otros.

2.7.9 REGISTRO DE LLUVIAS

Se ha tomado el registro de las precipitaciones presentadas durante el mes de mayo del 2025, las cuales son resumidas en la siguiente tabla.
Ver anexo

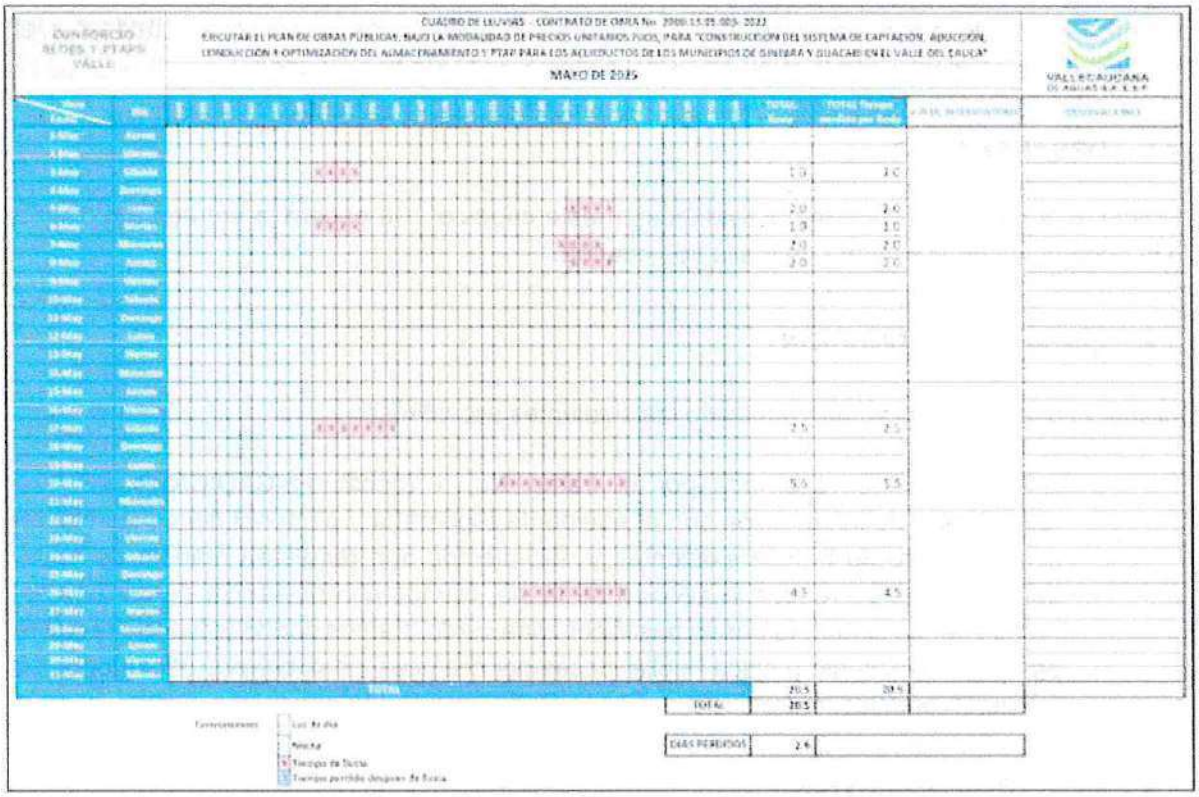Tabla 5. Registro de precipitaciones mes de mayo 2025.



2.8 PROGRAMACIÓN Y FLUJO ECONÓMICO.

Actualmente las actividades en ejecución se concentran en las intervenciones en las plantas de agua potable de los municipios de Ginebra y Guacarí y los tanques de almacenamiento de Ginebra y la Albania, las actividades de algunos capítulos como son la línea de conducción, ya no tienen cantidades de ejecución, por lo tanto, para la ejecución de estas labores y demás actividades identificadas como ítems no previstos o mayores cantidades de obra, se requiere de la aprobación de la reformulación No. 2.

Por otro lado, teniendo en cuenta los recorridos, levantamientos topográficos, visitas técnicas y chequeos hidráulicos realizados en las áreas de construcción de la bocatoma, desarenador, macromedidor, línea de conducción de diámetro 18", válvulas de purga, válvulas ventosas, cámaras de quiebre y cámara de distribución se han identificado todas las condiciones del sitio y obras a ejecutar, siendo necesario incluir ítems no previstos para el proceso constructivo y adecuado funcionamiento de estas estructuras en una reformulación No. 3 pendiente por elaborar.

Actualmente se encuentra en trámite la aprobación de la reformulación No. 2, por un valor adicional de $13.531.646.339. Una vez sea aprobada esta adición al contrato se realizará el nuevo flujo económico del proyecto.

Es importante tener en cuenta que la obra se proyectó ejecutar con varios frentes simultáneamente, sin embargo, esta programación no ha sido posible llevarla a cabo debido a las diferentes situaciones que se han presentado durante la ejecución del contrato, esto ha aumentado considerablemente el tiempo de ejecución del proyecto, generando sobre costos y desequilibrio económico en el contrato.

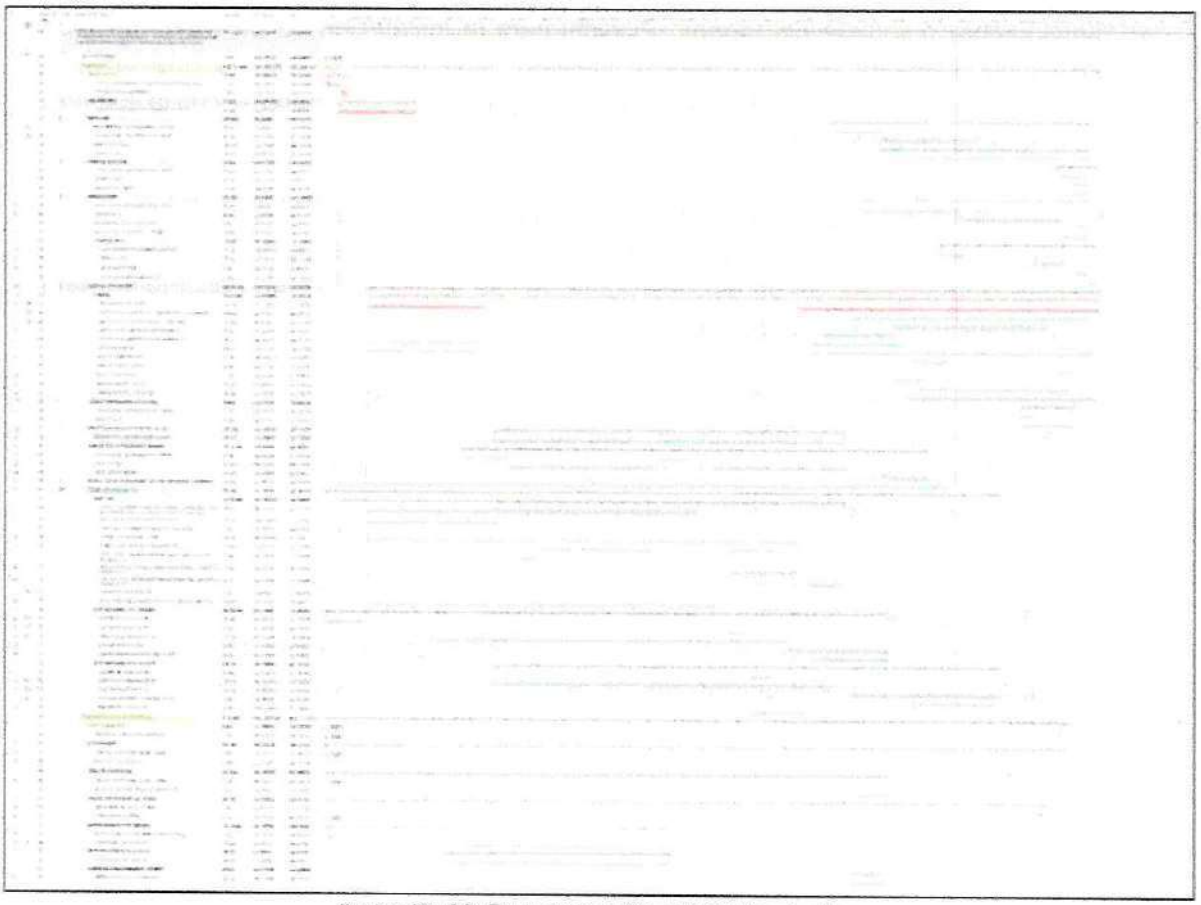


Ilustración 23 Reprogramación actividades de obra

2.9 AFECTACIONES EXTERNAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

A la fecha continúan situaciones pendientes por resolver, ajenas a nuestra gestión, las cuales están afectando la programación de la obra y el flujo económico del proyecto. A continuación, se detallan las condiciones presentadas:

- Estudio de socavación local y general para construcción de la bocatoma, de acuerdo a lo solicitado en las obligaciones de la resolución de ocupación del cauce expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Este estudio es necesario para definir la totalidad de las obras a ejecutar en la bocatoma.

- Servidumbre por parte del Ingenio Pichichi para la instalación de un tramo de tubería PEAD de diámetro 14" (500 metros lineales), a la fecha se espera que la entidad contratante con el ingenio Pichichi tramiten la servidumbre para retomar con la instalación de la tubería en este tramo.

- Permiso de intervención instalación tubería diámetro 10": para la instalación de la tubería de llegada a la PTAP de Ginebra en el tramo del predio de la señora Blum, se encuentra pendiente la legalización de esta servidumbre. Se requiere de este documento para la programación de estas actividades.

- Rediseño de los viaductos sobre la línea de conducción: después de realizar los rediseños de estas estructuras y teniendo en cuenta las condiciones encontradas en sitio, se requiere la legalización de servidumbres para la construcción de estos viaductos, ya que se encuentran en predios con viviendas aledañas.

- Para la construcción de todos los capítulos del contrato se requieren ejecutar ítems no previstos, así como también mayores cantidades de obra, que permitan el adecuado funcionamiento de cada una de las estructuras. Para esto, es necesaria la aprobación de la reformulación No. 2 y adición de los recursos, para dar cumplimiento al objeto del contrato.

2.10 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

- Tanque PTAP Ginebra

	
Fotografía 1. Continúan con la actividad de Llenado con material importado y compactando por capas no superior a 30 centímetros de espesor.	**Fotografía 2.** Acopio material actividad de relleno.
	
Fotografía 3. Estado en que se evidencia el avance del lleno estructural con material importado en el perímetro del tanque.	**Fotografía 4.** Continúan con la actividad de acopio material actividad de relleno.



Fotografía 5. Acopio de material para relleno perimetral tanque.



Fotografía 6. Estado en que se evidencia el avance del lleno estructural con material importado en el perimetro del tanque.

❖ **Tanque Albania (Predio Villa Jhons)**



Fotografía 7. Durante el mes se mantiene hidratada la losa superior con Antisol para poder garantizar el correcto fraguando de la estructura.



Fotografía 8. Se realiza el retiro de toda la formaleta metálica perimetral.



Fotografía 9. Se toma las cotas de los vértices del tanque para evaluar el asentamientos en el Tanque de la Albania.



Fotografía 10. Se ha realizado actividades de resane y relleno en las perforaciones de los pasadores de la formaleta metálica.


❖ **PTAP Ginebra**



Fotografía 11. Continúan con la construcción de cajas para conexiones eléctricas.



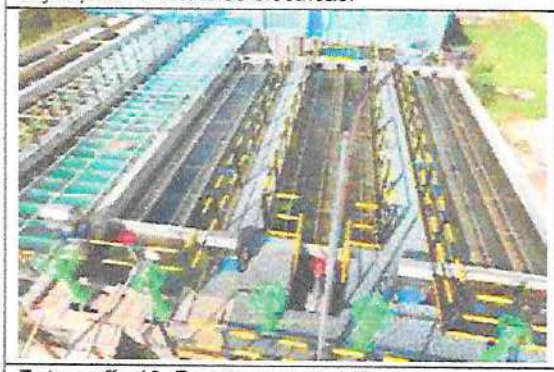Fotografía 12. Instalación de todo el sistema del Streaming Current en la caseta de cloración.



Fotografía 13. Puesta en operación del sedimentador No.1 (ya se optimizan los tres sedimentadores).



Fotografía 14. Retiro de escombro de la PTAP Ginebra a punto de disposición final.



Fotografía 15. Conexiones de tubería para suministro al sistema de Streaming Current.



Fotografía 16. Continúan con las excavaciones para la cimentación de la caseta de Sopladores.



Fotografía 17. Suministro de material de soporte del filtro (Filtralite) para la PTAP Ginebra (Tamaño ½")



Fotografía 18. Foto aérea de las intervenciones realizadas en la PTAP Ginebra.



Fotografía 19. Figuración de acero para cimentación de la caseta de sopladores.



Fotografía 20. Instalación de Bomba del Sistema del Streaming Current.



Fotografía 21. Suministro de material de soporte del filtro (Filtralite) para la PTAP Ginebra (Tamaño 3/8")



Fotografía 22. Lavado y empaquetado de material de soporte de filtro para su correcta instalación.



Fotografía 23. Instalación de boquillas en los falsos fondos del filtro No. 1 de PTAP Ginebra



Fotografía 24. Suministro de Flanches y rieles para intervenciones en la PTAP Ginebra).



Fotografía 25. Perforaciones en Falsos fondos del filtro No. 1 de PTAP Ginebra.



Fotografía 26. Fundición de la cimentación de la caseta de sopladores (Zapata, Pedestal y Viga de cimentación).



Fotografía 27. Instalación de cadena para puesta de operación de Barrelodos No.1.



Fotografía 28. Suministro de estructura metálica y cubierta para caseta de sopladores.



Fotografía 29. Perforaciones en Falsos fondos del filtro No. 1 de PTAP Ginebra.



Fotografía 30. Revisión de alturas para instalación de grava, material filtrante y boquillas de aire de 1" y 3/4"

❖ PTAP Guacarí



Fotografía 31. Replanteo para chequeo de plomos y ortogonalidad del Sedimentador No.3.



Fotografía 32. Instalación de acero de refuerzo para Muro No.3 y N.4 de la Línea de Floculación No.3.



Fotografía 33. Continúan con la instalación de acero de refuerzo para Muro No.3 y N.4 de la Línea de Floculación No.3.



Fotografía 34. Continúan con la actividad de demolición del muro existente en la línea de floculación No.1.



Fotografía 35. Marcación de los puntos donde estará ubicada la pantallas del sedimentador No.3.



Fotografía 36. Continúan con la actividad de demolición del muro existente en la línea de floculación No.1.



Fotografía 37. chequeo de plomos y ortogonalidad del Sedimentador No.3, se marca la ubicación de las dos pantallas para iniciar con anclaje del refuerzo.



Fotografía 38. Foto área donde podemos evidenciar que toda la línea de Floculación y sedimentación No.3 se encuentra intervenida por obra civil.



Fotografía 39. Verificación de medidas para construcción de canal de lodos y pendientes de losa de fondo en el sedimentador No. 3 de PTAP Guacarí.



Fotografía 40. Se encofran los Muro No.3 y N.4 de la Línea de Floculación No.3.



Fotografía 41. Fundición de los Muro No.3 y N.4 de la Línea de Floculación No.3.



Fotografía 42. Fundición de lo realces pendientes en la línea de floculación No.3.



Fotografía 43. Instalación de puerta por parte del equipo de ornamentación en la caseta eléctrica.



Fotografía 44. Instalación de acero de refuerzo de las pantallas del sedimentador No.3.



Fotografía 45. Finalizan con la instalación de acero de refuerzo de las pantallas del sedimentador No.3.



Fotografía 46. Instalación de cubierta de caseta eléctrica.




Fotografía 47. Encofrado de las pantallas del sedimentador No.3.



Fotografía 48. Inician con la actividad de desencofrado de la pantalla perforada de la Línea de Floculación No.1.



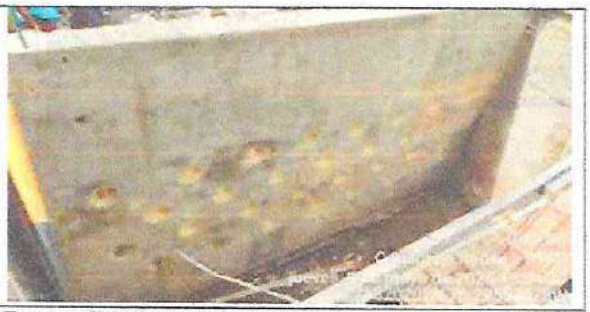Fotografía 49. Finalizan con la Instalación de cubierta de caseta eléctrica.



Fotografía 50. Desencofrado de la pantalla perforada de la Línea de Floculación No.1 de la PTAP Guacarí.



Fotografía 51. Replanteo de la nueva ubicación de la caseta de Sopladores en la PTAP Guacarí.



Fotografía 52. Instalación de acero de refuerzo y encofrado de la pantalla del sedimentador No.3 de la PTAP Guacarí.



Fotografía 53. Se hidrata el muro de la pantalla perforada para garantizar el correcto fraguado de la estructura.



Fotografía 54. Fundición de la pantalla del sedimentador No.3 de la PTAP Guacarí.



Fotografía 55. Transporte de muestras de concreto para evaluar resistencias de las estructuras fundidas en obra.



Fotografía 56. Foto aérea de la PTAP Guacarí en donde se muestra el trabajo realizado en la Línea de Floculación No.3 y el sedimentador No.3.



Fotografía 57. Inician trabajos de ensamblaje de canaletas de para sedimentador No.3 de la PTAP Guacarí.



Fotografía 58. Continúan con los trabajos de satinado y ensamblaje de canaletas de para sedimentador No.3 de la PTAP Guacarí.







Fotografía 61. Escarificación de muros de la línea de Floculación No.1 de la PTAP Guacarí.



Fotografía 62. Repello de muros de la línea de Floculación No.1 de la PTAP Guacarí.

Visitas, reuniones y recorridos de obra



Fotografía 63. Reunión de veeduría Ginebra.



Fotografía 64. Comité de veeduría Ginebra.



Fotografía 65. Chequeo niveles de material de soporte del filtro no.1 de la PTAP Ginebra.



Fotografía 66. Reunión con Equipo técnico y subcontratistas



Fotografía 67. Reunión con personal de obra en la PTAP de Guacarí para capacitación (Tema del área social).



Fotografía 68. Recorrido de obra en tramo 1 de línea de conducción (Tubería de 18" PEAD) para evaluar las condiciones actuales e iniciar a cuantificar cantidades reales.



Fotografía 69. Reunión con personal del frente de obra Guacarí para socializar información técnica y programación de obra.



Fotografía 70. Recorrido sobre el tramo 1 de línea de conducción (Tubería de 18" PEAD) para cuantificar cantidades reales.



Fotografía 71. Comité Interno técnico, social, SST y Ambiental con el equipo de trabajo del consorcio.



Fotografía 72. Revisión de toma de asentamientos en el Tanque de la Albania.



Fotografía 73. Recorrido con Ingenieros especialistas en instalación de tubería y viaductos para revisión de puntos críticos en tramo 1.



Fotografía 74. Recorrido con Ingenieros especialistas en instalación de tubería para evaluar los puntos críticos del tramo 1 (Tubería de 18" PEAD)



Fotografía 75. Acompañamiento a la toma de asentamientos en el Tanque de la Albania.



Fotografía 76. Levantamiento de cotas en las cámaras del floculador No. 1 de PTAP Guacarí .



Fotografía 77. Recorrido sobre el tramo 1 de línea de conducción (Tubería de 18" PEAD) para cuantificar cantidades reales.



Fotografía 78. Revisión del proceso para la toma de asentamientos en el Tanque de la PTAP Ginebra.

		
Fotografía 79. Acompañamiento a la toma de asentamientos en el Tanque de la PTAP Ginebra.		**Fotografía 80**. Recorrido y recopilación de información del tramo 1 (Bocatoma-CADICA).

3. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

3.1 ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL

El siguiente cuadro describe las actividades realizadas por el contratista durante la vigencia del presente informe.

Las actividades se realizaron durante el mes de mayo del 2025 en los municipios de Ginebra y Guacarí, Valle del Cauca

Tabla 6 Actividades realizadas Gestión Social

DESCRIPCIÓN	AVANCES / LOGROS	PERIODICIDAD	CUMPLIMIENTO	REGISTRO /VERIFICACIÓN
Para efectos de que la comunidad participe en la fiscalización del uso de los recursos aportados por el fondo para el desarrollo del objeto contractual, según los lineamientos definidos para tal fin en la Estrategia de Auditorías Visibles.	Durante este periodo se realizó visita con lidere del municipio de ginebra para hacer recorrido el barrio ceibas azules sector que se beneficiara con la ejecución del proyecto.	Se realizaron visitas el día 12 y 26 de mayo	Se ha dado cumplimiento a los compromisos que desde el contrato y el plan de gestión social tiene	fotografía
Se convocó al comité de veeduría del municipio de Ginebra a reunión informativa y de control social	Se realiza contacto por vía WhatsApp con los líderes del comité de veeduría, dos se encuentran fuera del país, define realizar reunión del comité los días 27 y 29 de mayo.		Se da cumplimiento a los compromisos del plan de gestión social	Actas de reunión del comité de veeduría de Ginebra y Guacarí
Reconocimiento del territorio donde se ejecutará el proyecto	se realiza recorrido en el sector ginebra y Guacarí	Se realiza visita a planta de tratamiento de Guacarí y ginebra		
Recorrido para reconocimiento del sitio de construcción de la bocatoma como población aledaña a la obra.	se realiza recorrido en el sector de la planta de Ginebra y Guacarí	Una vez (1) en etapa de Construcción	La actividad solo se realiza totalmente, en las plantas de tratamiento de Ginebra y Guacarí.	
Foro inicial de presentación del proyecto y socialización ante la comunidad y la administración municipal.	La actividad no se realiza	Una vez (1) en etapa de Construcción.	La actividad solo se realiza al inicio de obra.	

3.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

3.2.1 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – SAC

Se continúa prestando el servicio de atención en los horarios establecidos, los días martes de 08:00 am a 12m y jueves 1:00 pm a 4:00 pm. Estos horarios son conocidos por todos los líderes y habitantes del sector de influencia al proyecto, la oficina se encuentra ubicada en la calle 11 # 4-37, tercer piso, edificio la piscina barrio el centro, perteneciente al corregimiento de Costa Rica, municipio Ginebra, Valle del Cauca. Donde se han realizado las reuniones con el comité de veeduría ciudadano del municipio de Ginebra. A la fecha del informe no se presentó ningún habitante del sector.



Ilustración 24 Oficina de atención a la comunidad

En la ilustración se observa el punto de atención a la comunidad ubicado en Costa Rica piso 3°, el cual es el lugar donde la comunidad visita para entrega de hojas de vida.

3.2.2 CARTOGRAFÍA SOCIAL

Durante el mes de mayo las actividades estuvieron dirigidas a realizar reuniones con las con las juntas de Acción Comunal del área rural y urbana de los dos municipios de Ginebra y Guacarí con el fin de realizar el trabajo de Cartografía social que está contemplado en el Plan Social.

Las convocatorias a la comunidad se realizaron a través de las dependencias de la administración municipal encargadas de mantener la comunicación con las organizaciones comunitarias. En

estas reuniones se ha contado con apoyo de funcionarios de la alcaldía que participan en las actividades programadas.

En el proceso de capacitación se identificaron en Guacarí los siguientes barrios donde se hará la cartografía social, siendo el barrio Ceibas Azules la prueba piloto y luego se extenderá a los barrios Limonar y las Américas, y el corregimiento de Guacanda, se ha contado con buena participación de la comunidad.

Se realizó el recorrido de reconocimiento del barrio las Ceibas que colinda con los barrios nuevos Versalles y la Italia, se está en la consecución de los mapas de estos barrios ya que la secretaría de planeación no tiene actualizado los mapas de los barrios desde el año 2000.
Solo se encontró un mapa de salud por el proceso de caracterización que viene realizando la secretaria de salud para hacer atención en casa donde hay personas con discapacidad o adulto mayor que así lo requiere.



Ilustración 25 Reuniones lideres municipio de Guacarí mayo 8,12, 26 de mayo. Recorrido en el barrio las Ceibas Azules. 26 de mayo reunión cartografía social



Ilustración 26 Reuniones líderes municipio de Ginebra mayo 13 y 23

Como se puede observar en las ilustraciones, se cumple con lo definido en el plan de gestión social de realizar la capacitación a los líderes en cartografía social, que permita que la comunidad se capacite en dicha herramienta para mejorar la identificación de las necesidades colectivas de los sectores donde se ejecuta el proyecto. De igual manera este espacio ha permitido la socialización del proyecto en ejecución, lográndose cambios positivos en la manera como veían el proyecto y viéndolo como una oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas .

En el municipio de Ginebra la cartografía se hará en el área rural en el corregimiento de Novilleros que tiene cinco veredas y será el corregimiento piloto para hacer la cartografía, en el área urbana se hará en el barrio Alfonso López.

Se ha definido fecha de próximo encuentro el día 30 de mayo para hacer el reconocimiento del territorio e identificar las necesidades colectivas.

3.2.3 BUZÓN DE SUGERENCIAS



Ilustración 27 Buzón de sugerencias Guacarí Y Ginebra

En las ilustraciones se observan los buzones de sugerencias que hay instalados en el municipio de Ginebra y en el sector de Puente Rojo, no se presentan PQRS.

El día 23 de mayo se inspeccionan los buzones, se encuentra en correcto funcionamiento del buzón de sugerencias del municipio de Guacarí ubicado frente al balneario Chicuco y el buzón de sugerencias del municipio de Ginebra, ubicado en Carrera 5 No. 10-46, primer piso. Con la respectiva identificación, no se ha recibido ningún PQRS en los dos buzones.

Dentro del componente de información y comunicación a la comunidad, se encuentran las vallas informativas que están ubicadas en los municipios de Ginebra y Guacarí. Se encuentran visibles y dan la información del proyecto como se observa en las ilustraciones.



Ilustración 28 Vallas informativas del proyecto en los municipios de Guacarí y Ginebra

3.2.4 ATENCIÓN Y DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Dentro de las actividades que deben dar cumplimiento al plan de Gestion Social está mantener actualizada la cartelera informativa para que las personas que visitan las instalaciones de la oficina de atencion a la comunidad esten informadas de las actividades a ejecutar y realizadas.

Se realizan oficios y se envian por correo electronico institucional con el fin de informar las fechas de reunión de los comités de veeduría en el mes de mayo, el día 27 en Ginebra y el 29 de mayo en Guacarí, los integrantes del comité han sido informados y han confirmado asistencia. Se envían volantes a los integrantes del comité por whastaap.

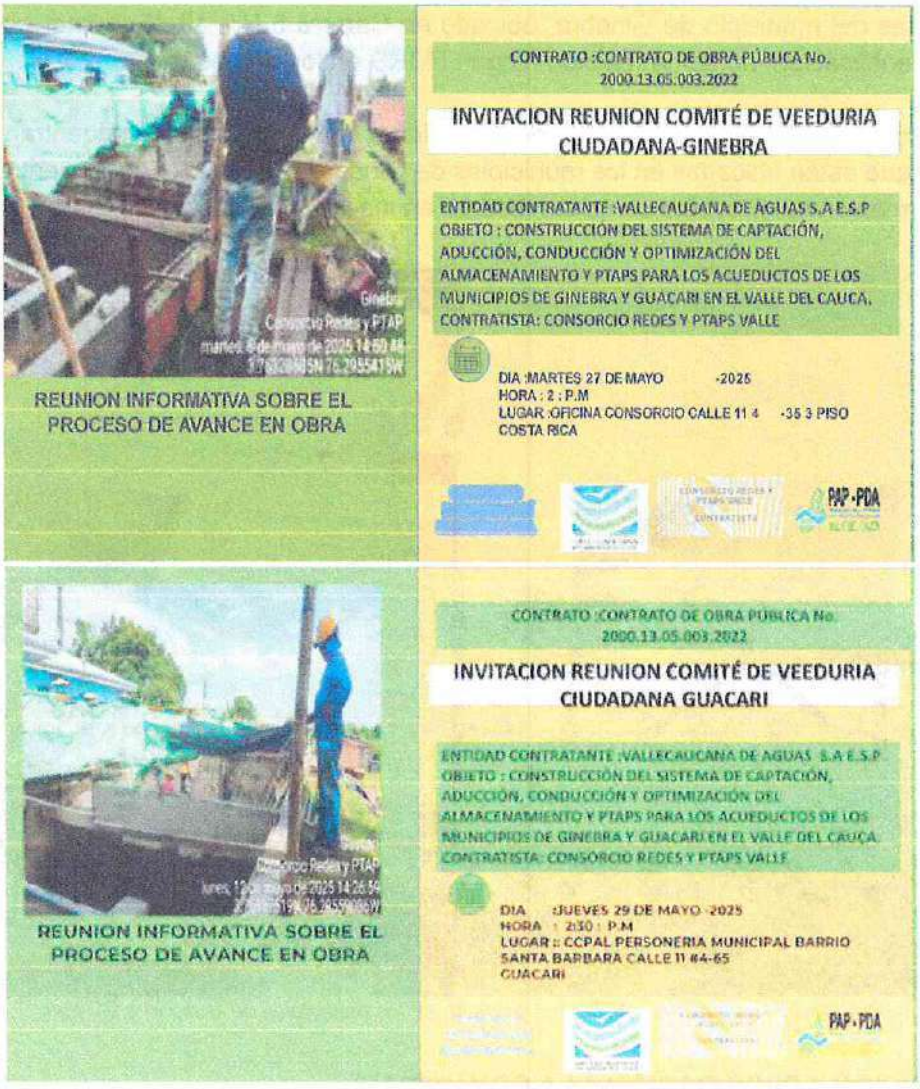


Ilustración 29 Volantes para citación a reunión Comité de veeduría municipios de Ginebra y Guacarí

En las ilustraciones se evidencia que se da cumplimiento con el compromiso de mantener informada a la comunidad sobre las convocatorias a los comités de veeduría. Permitiendo así que tengan información actualizada del proceso constructivo de la obra y se pueda resolver en estos espacios las inquietudes que se presenten por parte de la comunidad o de los integrantes del comité.



Ilustración 30 Cartelera informativa

En la ilustración se evidencia la cartelera informativa con las actividades que se han realizado de información hacia la comunidad, esta cartelera está ubicada en la oficina de atención al público en la cual se publicaron los volantes de convocatoria para las reuniones del comité de veeduría de los municipios de Ginebra y Guacarí.

Table 7 Trazabilidad del programa de información y divulgación a la comunidad

Actividad	Programado	Ejecutado	Pendiente	Porcentaje de Ejecución
Distribución entrega de volantes de Inicio de elaboración de actas		1		100%
Reunión inicial (Socialización del proyecto)	0	0		
Reuniones con la veeduría ciudadana	2		2	100%
Convocatoria conformación comité de veeduría Guacarí				100%

3.3 CONTROL SOCIAL SEGÚN ESTRATEGIA DE AUDITORÍAS VISIBLES

3.3.1 COMITÉ DE VEEDURIA PARA SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO.

Se realizan contactos con los líderes del comité de veeduría de Ginebra y Guacarí con el fin de coordinar las reuniones de seguimiento y control que se realizaron los días 27 y 29 de mayo, la residente social de la interventoría participa en las reuniones de los comités de veeduría de los dos municipios.

De igual manera el control social que debe realizarse por los líderes del territorio donde se ejecutan obras con recurso del estado de cualquier orden nacional, departamental y municipal, permiten que la comunidad ejerza vigilancia, control y evidencie los avances de las obras como las condiciones en que se ejecuta.

El día 27 de mayo se realizó reunion del comité de veeduria ciudadana de Ginebra donde se cumple con el objetivo de informar a la comunidad sobre el avance de obra en dicho municipio.

El día 29 de mayo se realiza reunion del comité de veeduria de Guacari dandose cumplimiento a las actividades planeadas para el comité de veeduria social de los dos municipios.



Ilustración 31 Reunión comité de veeduría Ginebra 27 de mayo y Guacarí 29 de mayo

En las ilustraciones se evidencia la reunión realizada con el comité de veeduría de Guacarí, donde se dio respuesta a las inquietudes y se cumplió con el compromiso de la reunión de informar sobre avance de obra, se informa que las actividades siguen centradas en las dos plantas y se planifican las actividades en el sector de Puente Rojo a Puente Piedra.

3.4 ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD - CONSERVACION DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO PÚBLICO Y PRIVADO

El objetivo de este programa es garantizar la protección al patrimonio (propiedades inmobiliarias) de las personas que se encuentran en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto a ser ejecutado.

Este objetivo se ha ejecutado en un 77,14% por medio de la "ELABORACIÓN DEL ACTA DE VECINDAD O ACTA DE FACHADA" el cual es un instrumento de recolección de información que tiene como objeto conocer el estado de los inmuebles antes del inicio de las obras en cada sector, esta se levanta una a una de las propiedades, se debe tomar registro fotográfico para percibir el deterioro o daño preexistente para que así no sea imputada ninguna responsabilidad a la ejecución del proyecto.

Actualmente se han realizado las siguientes actas:

Tabla 8 Trazabilidad del programa de conservación del patrimonio inmobiliario público y privado

Regaderos Ginebra	15 actas de inicio
Sector Puente Amarillo	6 actas de inicio
Tramo 3 Sector la Esmeralda	23 actas de inicio
Tramo 2 Planta Ginebra	7 actas de inicio
Tanque la Albania	2 actas de vecindad 1 acta de entorno Albania 1 acta de entorno sector la esmeralda 1 acta de entorno sector Puente Rojo hasta Costa Rica

Tabla 9 Consolidado de actas de vecindad

ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO	PENDIENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Levantamiento de Actas de Vecindad y Fachada de apertura	70	54	16	77.14%

3.5 REUNIONES DE SOCIALIZACIÓN Y RECORRIDOS

Este programa se orienta a transferir información a la comunidad de los municipios de Ginebra y Guacarí del sector urbano que son los beneficiarios directos del proyecto, sin embargo, con el fin de mejorar la información se sigue haciendo contacto y llevando información a los líderes del sector rural y urbano de Ginebra que apoyan el proyecto, se mantiene permanente contacto con

los funcionarios de las administraciones municipales de la secretaria de gobierno, personería municipal , bienestar social y planeación de los dos municipios para que contribuyan a fortalecer estrategias que mantengan o aumenten la aceptación del proyecto en sus diferentes sectores, apoyando la labor que viene haciendo el contratista con las diferentes organizaciones comunitarias. El taller de capacitación en cartografía social es un espacio para dar información del proyecto y dar avances de este permitiendo que la comunidad tenga información actualizada del proyecto en el sector rural de Guacarí y Ginebra.

El escenario con el que cuenta hoy el programa de socialización es el siguiente:
Las actividades desde el componente social han estado encaminadas a mantener la información de los miembros del comité de veeduría ciudadano para que sean multiplicadores de las actividades constructivas y avance de la obra que se realizan en las plantas, y así la comunidad permanezca informada.

De igual manera se realizan reuniones o visitas a funcionarios de la administración municipal que tienen como función realizar reuniones con las organizaciones sociales, con el fin de utilizar los canales institucionales que tienen con la comunidad y sirvan al contratista para informar sobre el proyecto a la comunidad.

3.6 COMITÉ TÉCNICO

En el mes de mayo no se participa en los comités técnicos, pues se han centrado en el ajuste a la reformulación 2, sin embargo, en los comités internos se informa sobre las actividades que se vienen realizando con los líderes de los dos municipios a través de la cartografía social y las reuniones de comité de veeduría.

Las actividades pertinentes del componente social que ha realizado el contratista, como es la de visitar la administración municipal y el reconocimiento del territorio, se han ejecutado con el acompañamiento de la residente social de interventoría Neisler Abadía y se realiza comunicación permanente con la residente social de Vallecaucana de aguas Dileth Ríos.

3.7 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

La razón de ser y de existir de este programa es fomentar y fortalecer la vinculación laboral del personal del área de influencia directa del proyecto, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de la región en disminución del desempleo, y en generación de empleos directos e indirectos en el tiempo de ejecución de la obra. En el mes de mayo se encuentra el mismo personal, no se ha contratado nuevo personal y se encuentra la documentación en el informe del componente de seguridad en el trabajo.

3.8 CONCLUSIÓN ÁREA SOCIAL

Las actividades desarrolladas en el mes de mayo han permitido un acercamiento con los funcionarios que tienen dentro de su rol realizar acompañamiento a las organizaciones comunitarias tanto del sector urbano como rural de los dos municipios, el trabajo de capacitación ha generado que los funcionarios participen activamente, pues el desarrollo de la cartografía es un insumo para los líderes construir el plan de desarrollo que deben realizar las juntas de acción comunal de cada corregimiento o vereda. Este trabajo conjunto ha permitido que la comunidad mejore su precepción sobre el proyecto.

4. PROGRAMA SST

En el periodo comprendido entre el 01 de mayo hasta el 31 de mayo del 2025, se evidencia el cumplimiento de las actividades realizadas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, sujetas a la documentación concerniente al desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

4.1 OBJETIVOS

- Informar a la dirección del proyecto **"LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ"** sobre las medidas de prevención para así minimizar los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto.

- Realizar implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), basado en la mejora continua con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

- Evidenciar el uso adecuado de los recursos asignados para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Realizar la entrega de los avances o actividades desarrolladas mes a mes en temas de seguridad y salud en el trabajo que se han implementado en el proyecto.

4.2 ALCANCE

La implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE durante **LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ**, está orientado para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos y peligros para los colaboradores en cada uno de sus procesos constructivos, este debe dar cobertura a todo el personal directo, contratistas y subcontratistas con el fin de controlar los factores de riesgos que pueden generar condiciones subestándar.

4.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tabla 10 Documentos de referencia

DOCUMENTO	NORMA de referencia
Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Decreto 1072/2015
Estándares mínimos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Res. 0312/2019
Guía trabajo Seguro en excavaciones 2014, comisión nacional de salud ocupacional del sector de la construcción	Ministerio de trabajo
Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados	Res. 0491/ 2020
Por la cual se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas	Res. 4272 / 2021

4.4 RELACIÓN PERSONAL

Tabla 11 Relación personal administrativo y operativo

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Aldo Gutiérrez	79.699.673	N/A		Consorciado	Sura	Sura	Colpensiones
2	Carlos Andrés Leyva	89.008.184	N/A		Director de la Obra	Sura	Sura	Protección
3	Lina Marcela Buriticá	42.136.662	01/12/22		Coordinadora de proyectos	S.O.S.	Sura	Colpensiones
4	Gina Leidy López	1.144.140.957	17/02/23		Residente Obra	S.O.S.	Sura	Porvenir
5	Ana Fernanda Rosero Cajigas	36.759.739	17/01/24		Ing. Presupuesto	Sanitas	Sura	Colpensiones
6	Lilibeth Mora Duarte	1.083.008.701	22/01/24		Inspectora de obra	N.EPS	Sura	Porvenir
7	Flor María Martínez	31.644.927	25/02/23		Profesional-SST	S.O.S.	Sura	Colpensiones

8	Darío Enrique Flórez	1.026.277.221	05/02/24		Residente Obra	Sura	Sura	Colfondos
9	Ana Milena Martínez	1.144.081.242	05/02/24		Aux administrativa	Sanitas	Sura	Colpensiones
10	Diana Marcela Echavarría	31.658.574	01/02/23		Ingeniera Ambiental	N EPS	Sura	Colpensiones
11	María Fernanda Martínez	38.856.496	05/01/23		Profesional social	Sura	Sura	Colpensiones
12	María Camila Gil	1.112.969.458	02/05/25		Ing. Ambiental	N EPS	Sura	Porvenir
13	Rodrigo Preciado	16.550.802	05/03/24	31/05/25	Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir
14	José Hilder López	7.551.673	11/03/24		Almacenista	Sanidad ponal	Sura	N/A
15	Yeison Castellanos	1083008367	11/06/24	15/05/25	Inspector obra	Coosalud	Sura	Porvenir
16	Jorge Aponte	1.112.098.988	02/09/24		Ayudante de obra	N EPS	Sura	Porvenir
17	Mauricio Fernando Soto	14.652.613	14/11/24		Ayudante obra	SOS	Sura	Porvenir
18	Jorge Hernán Ocampo Cortez	9.858.689	26/11/24		Ayudante obra	Emssanar	Sura	Porvenir

Tabla 12 Relación personal operativo contratista

PERSONAL OPERATIVO TOPOGRAFÍA								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Jimmy Sinisterra	14.636.383	24/01/23		Topógrafo	S.O.S.	Colmena	Protección
2	Jeiner Andrés Bustos Echeverri	1.097.401.400	07/02/24		Topógrafo	Salud total	Positiva	Porvenir
3	Jaime Ernesto Martínez	1.112.970.271	01/11/24		Cadenero	N EPS	Positiva	Porvenir

PERSONAL GRUPO LOGISTICA INTEGRAL SAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	María Orlenis Campiño	1.112.966.233	02/04/24		Vigilante nocturno	N EPS	Sura	Porvenir
2	Brayan Alexander Navarrete	1.010.151.246	01/08/24		Vigilante nocturno	Emssanar	Sura	Colfondos
3	Mauricio Domínguez Plaza	6.325.625	15/03/25		Vigilante nocturno	Asmet salud	Sura	Colpensiones
4	Michael Rodríguez Cobo	1.112.970.073	15/03/25		Vigilante fin de semana	N EPS	Sura	Porvenir

PERSONAL CONSTRUCTORA CYC PALMIRAB ESCOBAR SAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Oscar Ignacio Carabalí	16.277.004	08/04/24		Maestro	Salud Total	Colmena	Colpensiones
2	Diego Andrés Cruz	1.090.463.618	01/11/24		Ing. Aux	N EPS	Colmena	Porvenir
3	Jeins Cortes Domínguez	1.114.832.209	14/02/25		Oficial	Comfenalco	Colmena	Porvenir
4	Daniel Adolfo Arboleda	1.114.451.147	08/04/25		Ayudante	Emssanar	Colmena	Porvenir
5	Miguel Antonio Cobo	1.112.966.026	12/04/25		Ayudante	Emssanar	Colmena	Porvenir
6	Fredy Martínez	6.312.632	15/04/25		Oficial	N EPS	Colmena	Protección
7	Eider Flórez	1.114.621.798	06/05/25		Ayudante	N EPS	Colmena	Porvenir

PERSONAL METALMECANICA CONINGENIERIA SAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Carlos Fernando Labrada	16.746.176	30/08/24		Ingeniero Residente	Comfenalco	Sura	Porvenir
2	Luis Miguel Montaño	1.114.835.053	30/08/24		Ayudante	SOS	Sura	Porvenir
3	Diego Valor	16.861.728	20/05/25		Armador	N EPS	Sura	Porvenir
4	Juan Diego Castro	1.114.813.332	01/11/24		Ayudante	N EPS	Sura	Porvenir
5	Jean Carlos	1.114.832.683	14/05/25		Soldador	N EPS	Sura	Porvenir
6	Jhon Fredy Rincón Marín	1.113.629.201	09/12/24		Armador	Comfenalco	Sura	Protección
7	Jonathan Rivera	1.143.952.917	17/01/25		Ayudante	SOS	Sura	Porvenir
8	José Elías Murillo	1.114.814.934	09/12/24		Soldador	N EPS	Sura	Porvenir
9	Felipe Rivas López	119.347.428	08/07/24		Ayudante	Sanitas	Sura	Porvenir
10	Juan Carlos Palacios	1.193.487.421	08/07/24		Aux soldadura	SOS	Sura	Porvenir

PERSONAL WATER APPLICATIONS AND SOLUTIONS WAS SAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Guillermo León González	14.797.442	31/01/25		supervisor	SURA	Positiva	Porvenir
2	Fernando Lara	1.144.166.667	06/02/25		Analista ingeniería	SURA	Positiva	Colpensiones
3	Cristian Quintero	1.144.179.864	02/05/25		Analista ingeniería	S.O.S	Positiva	Protección

CONTRATISTA CUBIERTA CASETAS								
No.	NOMBRE	No. CÉDULA	FECHA (dd-mm-aa)		CARGO	SGSS		
			Ingreso	Retiro		EPS	ARL	AFP
1	Joan Sebastián Pabón	1.114.829.657	02/04/25		Soldador	Sura	Positiva	Protección

4.5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.5.1 INFORME DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

El 28 de mayo del 2025, se reúne el comité COPASST, para revisar pendientes y consolidar actividades realizadas durante el mes.

Anexo
Acta de reunión del COPASS

4.5.2 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2025, se realiza verificación del pago oportuno de la seguridad social integral del personal administrativo y operativo.

Tabla 13 Aportes a la Seguridad Social Integral

NIT EMPRESA O DOCUMENTO PERSONA NATURAL	CONTRATISTA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGO	OPERADOR
89.008.184	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL	20/04/25	12/04/25	Enlace
901648319	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE	09/05/25	13/05/25	Enlace
38. 856.496	MARIA FERNANDA MARTINEZ	23/05/25	27/05/25	Aportes en linea
31.658.574	DIANA MARCELA ECHAVARRÍA	18/04/25	25/04/25	Enlace
805030454	CONINGENIERIA S.A.S	13/05/25	07/05/25	Aportes en Línea
14.636.383	JIMMY SINISTERRA	21/05/25	21/05/25	Aportes en linea

901088237	GRUPO LOGISTICA SAS (vigilancia)	07/05/25	07/05/25	Aportes en línea
900833661	HECONSER SAS	15/05/25	19/05/25	Aportes en línea
14.650.512	LUIS HUMBERTO VASQUEZ	06/05/25	07/05/25	Aportes en línea
16.277.004	CONSTRUCTORA CYC PALMIRA	04/04/25	06/04/25	Enlace
1.112.969.458	MARIA CAMILA GIL	15/05/25	15/05/25	Compensar
1.097.401.400	JEINER BUSTOS	05/05/25	09/05/25	SOI
900558924	WAS SAS	07/05/25	06/05/25	Asopagos
901261188	CONSTRUTRANS JYF	13/05/25	13/05/25	Pago simple
1.114.829.657	JOAN SEBASTIAN PABON	16/06/25	05/05/25	Aportes en línea

Ver Anexo SST

Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral.

4.5.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

En el mes de mayo del 2025, se realizó la respectiva Inducción y reinducción en SST, como medida de cumplimiento a la normativa colombiana. Los temas tratados durante la inducción fueron los siguientes:

- Políticas de seguridad y salud en el trabajo y política no al consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaco del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE.
- Reglamentos de higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo.
- Definición de accidente y enfermedad laboral y otras definiciones en SST.
- Clasificación de residuos sólidos.
- Rutas de evacuación y puntos de encuentro.



Fotografías. Inducción - reinducción

Ver Anexo SST
Registros de inducción

4.5.4 PLAN DE CAPACITACIÓN FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

En el mes de mayo del 2025, se realizan las siguientes capacitaciones y charlas de seguridad

- Charlas de seguridad diaria
- Análisis de trabajo seguro (ATS)
- Capacitaciones



Fotografías. Capacitación personal administrativo y operativo

Ver Anexo SST
Registros de charlas – capacitaciones
ATS
Certificaciones TSA

4.5.5 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Durante el mes de mayo del 2025, se verifico el examen médico de ingreso del personal contratista y subcontratista que ingreso durante este mes.

Durante el mes de mayo del 2025, se realizan las pausas activas con el objetivo de Prevenir trastornos osteo -musculares causados por los factores de riesgo de cargas estáticas y dinámicas como las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos y vibraciones mecánicas.

Como también a romper la monotonia laboral, disminuir los niveles de estrés ocupacional y propiciar la integración grupal.







Fotografía. Pausas Activas

Ver Anexo
Registros de pausas activas

4.5.6 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Durante el mes de mayo del 2025, se entrega dotación personal y elementos de protección personal acorde a actividades realizadas, se verifica documentos de maquinaria, equipos y se realiza las siguientes inspecciones:

- Inspección de orden y aseo contenedores, campamentos y oficinas
- Inspección a extintores
- Inspección a botiquín primero auxilios
- Inspección EPP
- Inspección Pulidora - taladro
- Inspección mezclador de concreto

Relación maquinaria, equipos y herramientas empleadas para las actividades durante el mes de mayo del 2025.

Tabla 14 Maquinaria, equipos y herramientas

MAQUINARIA EQUIPO U/O HERRAMIENTA	CANTIDAD	MARCA SERIE - PLACA
Equipos de topografía	Estación – Nivel	NIKON SNDWAY
Retroexcavadora Llantas	1	CAT
Volquetas	1	(UFK231)
Taladro demoledor	3	
Pulidora	2	DELWAT
Sierra circular para corte de madera	1	DELWAT
Planta Generadora 6.5	2	ELITE- NUEVA
Motobomba 2 pulgadas	1	BARNES
Motobomba 3 pulgadas	1	
Mezcladora de concreto	2	TOOLCRAFT
Vibrador eléctrico	3	BOSCH 2.8 HP-NUEVO
Taladros manuales	3	
Martillo demoledor	1	SIEFKEN
Rotomartillo	1	SIEFKEN
Buggy	7	Herragro- Toolcraft
Herramienta menor (palas, picas, martillo, cancel, barra, machete, destornillador, alicate)		

Ver anexos
Formatos Pre operacionales
Formatos entrega de EPP
Permisos de trabajo de alto riesgo



Fotografía. Señalización en obra



Fotografía. Uso adecuado de EPP

4.5.7 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Durante el mes de mayo del 2025, no se presentaron accidentes de trabajo, se tiene en cuenta la siguiente formula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 estándares mínimos del SG SST.

- **Índice de accidentalidad**

Fórmula

$$Frecuencia\ de\ accidentalidad\ = \frac{\#\ de\ accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\#\ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} \times 100$$

4.5.8 AUSENTISMO

Durante el mes de mayo del 2025, no se presentó ausencia por causas médicas, se tiene en cuenta la siguiente formula para medir indicador en caso de presentarse. Res 0312/2019 estándares mínimos del SG SST.

Ausentismo por causa médica

Fórmula

$$Ausentismo\ por\ causa\ médica\ = \frac{\#\ de\ dias\ de\ ausencia\ por\ incapacidad\ laboral\ o\ común\ en\ el\ mes}{\#\ de\ dias\ programados\ de\ trabajo\ en\ el\ mes} \times 100$$

4.5.9 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS

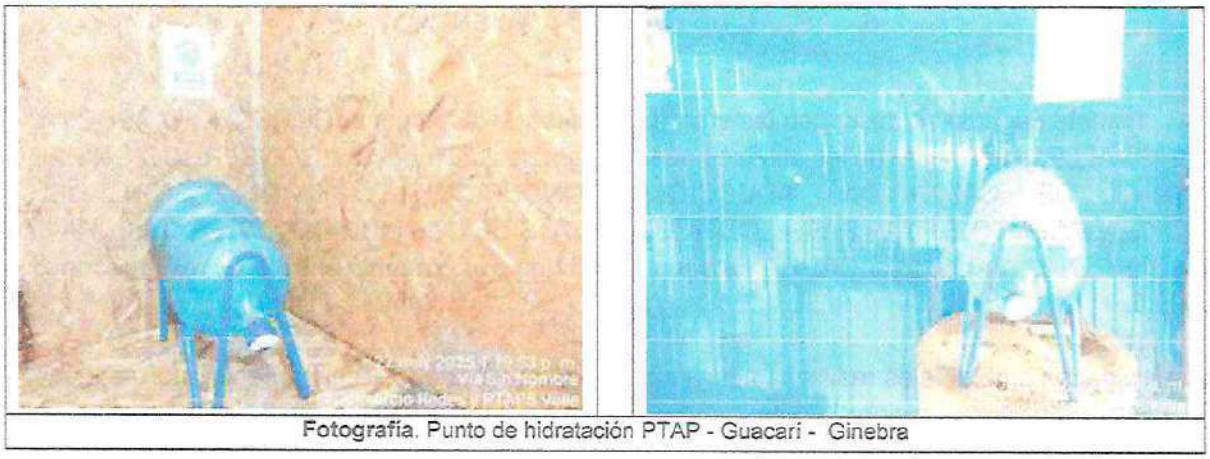
Durante el mes de mayo del 2025, se realiza inspecciones a extintores, botiquines, camillas y rutas de evacuación.



Fotografía. Elementos para atención de emergencias



Fotografía. Punto de encuentro PTAP - Guacarí - Ginebra



Fotografía. Punto de hidratación PTAP - Guacarí - Ginebra

5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En el presente capítulo se describen las actividades desarrolladas por el CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, en el marco de las obligaciones Ambientales del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA", durante el período comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2025.

Las actividades ambientales realizadas durante el periodo reportado en el presente informe están orientadas a prevenir, mitigar, controlar y compensar los principales impactos que podrían presentarse durante el desarrollo de las actividades constructivas en cada una de sus etapas pre construcción (ya culminada), construcción (actualmente en desarrollo) y puesta en marcha (aún sin iniciar).

5.1 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La implementación del Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA del proyecto está a cargo del Residente Ambiental del CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE, dicho profesional es el encargado de adelantar, entre otras, las siguientes actividades:

- Gestionar oportunamente ante la autoridad ambiental competente los permisos necesarios para la ejecución del proyecto.
- Elaborar el Plan de Medidas de Manejo Ambiental – PMMA de acuerdo a las necesidades del proyecto.
- Implementar las medidas de manejo ambiental necesarias de acuerdo al avance del proyecto y a la ejecución de las actividades de obra y hacer seguimiento al alcance de las mismas como parte del desarrollo del PMMA.
- Presentar los informes requeridos por la interventoría, la autoridad ambiental competente y demás entidades encargadas del seguimiento al proyecto.
- Asistir a los comités de obra con el fin de informar el avance en la implementación del PMMA del proyecto.
- Capacitar al personal de obra en temas ambientales.

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida para el periodo del presente informe como parte de la implementación del PMMA y de la gestión ambiental del proyecto:

Tabla 15 Correspondencia Enviada y Recibida

TIPO DE DOCUMENTO	CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO
Correspondencia Enviada	CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons145-2025	27/01/2025	Solicitud de Prórroga De La Licencia Urbanística De Intervención Y Ocupación De Espacio Público – Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 de enero de 2023.
Correspondencia Enviada	CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons146-2025	29/01/2025	Solicitud de Prórroga De La Licencia Urbanística De Intervención Y Ocupación De Espacio Público – Resolución No. PM.300-42.02-001 del 03 de febrero de 2023.
Correspondencia Recibida	Correo Electrónico planeacion@guacari-valle.gov.co	04/02/2025	Notificación Prorroga Licencia de Intervención de Espacio Público - Resolución No. 140-23-3-002 de fecha 31 de enero de 2025.
Correspondencia Enviada	CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons147-2025	04/02/2025	Derecho de petición – respuesta solicitud permiso de rotura de vía y/o espacio público (Municipio de Ginebra)
Correspondencia Enviada	AC-15512025 ACUAVALLE	12/02/2025	Solicitud autorización predio para compensación forestal. (Rad. 173412025)
Correspondencia Enviada	AC-18742025 ACUAVALLE	19/02/2025	Solicitud Prorroga – Permiso de Ocupación de Cauce. (Rad. 207222025)
Correspondencia Recibida	0741-173412025 CVC	04/03/2025	Respuesta - Solicitud autorización predio para compensación forestal. (Rad. 173412025)
Correspondencia Recibida	Correo Electrónico planeacion@ginebra-valle.gov.co	10/03/2025	Respuesta - Derecho de petición solicitud permiso de rotura de vía y/o espacio público (Rad. CRI-0092-25)
Correspondencia Recibida	Secretaria de Infraestructura Gobernación del Valle FO-M9-P3-14	25/02/2025	Respuesta a solicitud de información de la secretaria de Planeación del Municipio de Ginebra en relación al permiso de rotura de vía solicitado por el Consorcio.
Correspondencia Enviada	CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons164-2025	02/05/2025	Solicitud de mejoramiento vía – sector regaderos
Correspondencia Enviada	CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons166-2025	19/05/2025	Gestión solicitud de prórroga permiso de aprovechamiento forestal único otorgado mediante resolución 0740 No. 0741-0678 de 2024.

5.2 PROGRAMA DE REQUISITOS LEGALES

Durante la ejecución del proyecto será necesario el uso y aprovechamiento de recursos naturales, para lo cual se han tramitado ante las autoridades ambientales competentes y la Administración Municipal los diferentes permisos necesarios para la ejecución de las actividades de obra. A continuación, se relacionan los permisos otorgados al proyecto y su respectiva vigencia:

Tabla 16 Permisos Consorcio Redes y PTAPS Valle

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
TIPO DE PERMISO	RESOLUCIÓN	AUTORIDAD COMPETENTE	VIGENCIA	ESTADO
Concesión de Aguas Superficiales	Resolución 0740 No. 0741 0000576 10-07-2020	CVC	10-07-2030	"Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT. 890399032-8 para Los acueductos de los municipios de Ginebra y Guacarí, Departamento del Valle del Cauca" VIGENTE
Permiso de Ocupación de Cauce	Resolución 740 No. 0741 0502 31-05-2024	CVC	31-05-2024	Solicitud Prorroga por parte de ACUAVALLE S.A E.S.P – Oficio AC-18742025 de febrero 19 de 2025. (Rad. 207222025).
Aprovechamiento Forestal Planta ACUAVALLE Ginebra	Resolución 740 No. 0741 0381 29-04-2024	CVC	08-06-2026	Entrega del informe de aprovechamiento forestal a la CVC por parte de ACUAVALLE S.A. Se espera asignación de compensación forestal y aprobación del predio propuesto para la siembra por parte de esta entidad. VIGENTE
Aprovechamiento Forestal Sector Bocatoma	Resolución 740 No. 0741 0678 23-07-2024	CVC	23-07-2025	"Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados predio planta PTAP ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca" VIGENTE. Se solicitó a la alcaldía del municipio de Ginebra realizar la solicitud de prórroga de este permiso.
Licencia de Espacio Público	Resolución No. 0004-29-01-2025 29-01-2025	Planeación Municipal Ginebra	29-01-2026	Por medio de la cual se aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio Público con Resolución No. 0004-01-2023 del 26 de enero del 2023.

PERMISOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE				
TIPO DE PERMISO	RESOLUCIÓN	AUTORIDAD COMPETENTE	VIGENCIA	ESTADO
Licencia de Espacio Público	Resolución No. 140-23-3-002 31-01-2025	Planeación Municipal Guacarí	31-01-2026	Por medio de la cual se aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio Público con Resolución.
PMT	Resolución No.	Secretaría de Movilidad Ginebra	Duración del Proyecto	"Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle"
PMT	Resolución No. 900-50-020 20-03-2023	Secretaría de Movilidad y Transporte Guacarí	Duración del Proyecto	"Por medio de la cual se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito – PMT presentado por el Consorcio Redes y PTAPS Valle"
Permiso Rotura de Vías	EN TRAMITE	Planeación Municipal Ginebra	EN TRAMITE	Derecho de petición – solicitud respuesta solicitud permiso de rotura de vía y/o espacio público (Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons147-2025)
Permiso Rotura de Vías	Resolución No. PM.300-42-2-028 18-11-2024	Planeación Municipal Guacarí	18-11-2026	Mediante correo electrónico de fecha 16 dic 2024 se recibe Notificación Licencia de Intervención de Espacio Público (Resolución No. PM.300-42-2-028 de fecha 18 Nov 2024)

Indicador:

$$Cumplimiento\ de\ requerimientos\ legales\ (\%) = \frac{No.\ de\ Permisos\ otorgados\ (del\ proyecto\ o\ de\ terceros)}{No.\ de\ permisos\ requeridos\ (del\ proyecto\ o\ de\ terceros)} * 100$$

Permisos del Proyecto:

$$Cumplimiento\ de\ requerimientos\ legales\ (\%) = \frac{9}{10} * 100$$

$$Cumplimiento\ de\ requerimientos\ legales\ (\%) = 90\%$$

A continuación, se relaciona la información de los proveedores de servicios con los que cuenta el proyecto, sus respectivos permisos, concesiones y/o autorizaciones de las autoridades ambientales competentes.

Tabla 17 Permisos Tercerizados Consorcio Redes y PTAPS

PERMISOS TERCERIZADOS – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE			
PROVEEDOR	**SERVICIO**	**TIPO DE PERMISO**	**AUTORIDAD AMBIENTAL**
CANTERA EL BERMEJAL	Suministro de materiales de construcción.	Licencias ambientales y Títulos Mineros	CVC / Plan de Manejo Ambiental Vigente. Agencia Nacional de Minería/ Titulo Minero Vigente.
VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P.	Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD	Permisos sitios de disposición final escombros y sobrantes de obra	CVC / Inscripción vigente como gestor RCD
SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S.	Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD	Permisos sitios de disposición final escombros y sobrantes de obra	CVC / Inscripción vigente como gestor RCD
Centro de Reciclaje BANCANAIMA	Gestor RCD no pétreos (madera, plástico, metal, vidrio, textiles, cartón y papel)	Inscripción como Gestor de residuos de demolición y construcción - RCD no pétreos	Administración Municipal / Inscripción vigente como gestor RCD no pétreo

Es importante agregar, que se realizó la donación de madera sobrante de trabajos anteriores a dos beneficiarios vinculados al entorno de la PTAP Ginebra:

1. Restaurante PATAOTA, ubicado en la vía hacia Puente Rojo
2. Tanques de almacenamiento (tanque Albania), ubicados en el municipio de Ginebra-vía Costa Rica

Estas donaciones se realizaron de manera transparente, sin comprometer los recursos operativos de las obras y con fines de aprovechamiento del material excedente.

Permisos del Proyecto (Terceros):

$$Cumplimiento\ de\ requerimientos\ legales\ (\%) = \frac{4}{4} * 100$$

$$Cumplimiento\ de\ requerimientos\ legales\ (\%) = 100\%$$

5.3 PROGRAMA DE MANEJO SILVICULTURAL

5.3.1 PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – PTAP GINEBRA

Mediante oficio AC-75722024 de fecha 30 de julio de 2024, la empresa ACUAVALLE radicó ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, el informe de las actividades de aprovechamiento forestal que se ejecutaron en la PTAP de Ginebra en cumplimiento a la Resolución 740 No. 0741 0381 del 29 de abril del 2024 "Por medio de la cual se prorroga un permiso de aprovechamiento forestal único en el predio Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP ubicado en el Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca", permiso que autoriza la erradicación de ocho (8) individuos arbóreos y la poda de un (1) individuos arbóreo. Esta actividad ya fue ejecutada por el Consorcio.

Igualmente, con el fin de dar cumplimiento a la compensación forestal establecida en el permiso mencionado correspondiente a la siembra de 19 individuos arbóreos, la empresa ACUAVALLE solicita mediante la comunicación escrita mencionada, aprobación para realizar dicha siembra en el predio conocido como Barranco Bajo – Alto ubicado en el Corregimiento la Novillera de propiedad del Municipio de Ginebra, predio que presenta afectación a causa de un incendio y requiere de acciones para la restauración ambiental del mismo. Debido a que este de propiedad del Municipio de Ginebra presenta inconvenientes de tipo jurídico por el incumplimiento de la ejecución de contratos para la reforestación del mismo, ACUAVALLE S.A E.S.P. se ve en la obligación de buscar alternativas en lo referente al sitio para llevar a cabo la siembra por concepto de compensación forestal.

El 29 de enero de 2025 se realizó visita a los predios "La Lorena" y "La Esmeralda" ubicados en el Municipio de Guacarí – Valle y administrados por el Ingenio Pichichi, con el fin de determinar el sitio de siembra para la compensación forestal y presentar propuesta para aprobación de este sitio por parte de la autoridad ambiental correspondiente – DAR Centro Sur CVC. Durante la visita se contó con la presencia de dos (2) representantes del Ingenio Pichichi y un (1) funcionario de ACUAVALLE S.A E.S.P. Se decide realizar la siembra en el predio "La Esmeralda" debido a que el área que se destinaria dentro del predio para este fin es mayor a la del predio "La Lorena", lo que permite respetar la distancia de siembra entre los individuos arbóreos para asegurar un porcentaje alto de supervivencia e igualmente por la disponibilidad de agua para el riego que debe ser constante durante los primeros meses después de la siembra.

Se radica solicitud por parte de ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del predio denominado "La Esmeralda" ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle y administrado por el Ingenio Pichichi, mediante oficio AC-15512025 de fecha 12 de febrero de 2025 (Radicado No. 173412025) ante la CVC para llevar a cabo la siembra en compensación forestal por el permiso de aprovechamiento forestal ejecutado.

Mediante comunicación escrita bajo el consecutivo No. 0741-173412025 de fecha 25 de febrero de 2025, la CVC da respuesta la solicitud realizada por ACUAVALLE S.A E.S.P de aprobación del predio denominado "La Esmeralda" ubicado en el Municipio de Guacarí – Valle para llevar a cabo siembra por concepto de compensación forestal. En este comunicado la CVC solicita a empresa ACUAVALLE, la siguiente información:

- Plan de Compensación Forestal
- Documento Técnico que indique la ubicación del predio con las respectivas coordenadas
- Proponer el encierro y la delimitación del área en donde se realizará la actividad de compensación.
- Certificado de Libertad y Tradición del predio propuesto para la compensación.

A la fecha ACUAVALLE S.A E.S.P no ha podido dar respuesta a este requerimiento que ha solicitado la autoridad ambiental, en espera que el Ingenio Pichichi haga entrega de la documentación correspondiente al Certificado de Libertado y Tradición del predio "La Esmeralda".

Indicador:

$$Avance\ de\ Erradicaciones(\%) = \frac{No.\ de individuos forestales erradicados}{No.\ de individuos forestales a erradicar segun permiso ambiental} * 100$$

$$Avance\ de\ Erradicaciones\ (\%) = \frac{8}{8} * 100 = 100\%$$

5.3.2 Permiso de Aprovechamiento Forestal – Bocatoma

Mediante Auto de Iniciación de Tramite o Derecho Ambiental de fecha 11 de marzo de 2024, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, da respuesta a la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal para el sector donde será construida la bocatoma del proyecto, realizada por la Administración Municipal del Municipio de Ginebra mediante comunicación escrita con radicado No. 206392024 de fecha 27 de febrero de 2024.

Mediante comunicación escrita 0740-206392024 de fecha 1 de abril de 2024, la CVC informa a la Administración Municipal del Municipio de Ginebra que se realizará la visita ocular al predio denominado Planta de Tratamiento Agua Potable - PTAP Jurisdicción del Municipio de Ginebra Departamento del Valle del Cauca, el día 9 de abril de 2024, con el fin de verificar la información recibida y determinar la viabilidad o no del derecho solicitado. A la fecha se está en la espera de

que la autoridad ambiental emita la resolución que autorice el permiso de aprovechamiento forestal.

Mediante Resolución 740 No. 0741 0678 de fecha 23 de julio de 2024, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC autoriza un aprovechamiento forestal de árboles aislados en el predio en donde se llevará a cabo la construcción bocatoma ubicado en jurisdicción del Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca. Este permiso tiene una vigencia de **TRES (3) años** contados a partir del auto ejecutorio, dentro de los cuales, en los primeros **DOCE (12) meses** se deberá realizar las actividades de aprovechamiento autorizadas y el cumplimiento de las obligaciones de siembra de compensación. En el tiempo restante se deberá realizar las labores de mantenimiento a fin de asegurar el buen desarrollo de las especies plantadas como compensación.

Se radica solicitud gestión de prórroga (Radicado CRI-0486-25) ante la Alcaldía Municipal de Ginebra-Valle, al permiso de aprovechamiento forestal único otorgado mediante la Resolución 0741-0678 de 2024, mediante oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons166-2025 de fecha 19 de mayo de 2025; para trámites pertinentes ante la autoridad ambiental CVC, y con ello poder llevar a cabo el aprovechamiento forestal. Se espera respuesta por parte de la entidad.

5.4 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE Y RCD

El sitio actual utilizado para la disposición final de RCD, se encuentra ubicado en el barrio Coronado en el municipio de Palmira, el cual es administrado por SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S., gestor de residuos de construcción y demolición inscrito ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC.

Así mismo, se tiene contemplado realizar la disposición final de RCD en el Parque Tecnológico Ambiental Presidente, Vereda Arenales, Corregimiento de Presidente en el Municipio de San Pedro - Valle del Cauca, administrado por VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P. empresa que se encuentra inscrita como Gestor de Residuos de Construcción y Demolición - RCD ante La Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca CVC.

Los residuos RCD no pétreos tales como madera, plástico, metal, vidrio, cartón y papel son entregados al gestor Centro de Reciclaje BANCANAIMA ubicado en el Corregimiento de Costa Rica en el Municipio de Ginebra – Valle del Cauca.

Tabla 18 Programa de Manejo Ambiental RCD

MANEJO AMBIENTAL RCD – CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE					
PERIODO	TIPO DE RESIDUO RCD	VOLUMEN (m^3)	GESTOR RCD	TRATAMIENTO	CERTIFICADO
Enero 2025	RCD susceptibles de aprovechamiento (material sobrante de excavaciones y demoliciones)	198	SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S.	Disposición Final	Anexo Certificado No.13
Febrero 2025	RCD susceptibles de aprovechamiento (material sobrante de excavaciones y demoliciones)	18	SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S.	Disposición Final	Anexo Certificado No.14
Marzo 2025	RCD susceptibles de aprovechamiento (material sobrante de excavaciones y demoliciones)	27	SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S.	Disposición Final	Anexo Certificado No.14
Abril 2025	RCD susceptibles de aprovechamiento (material sobrante de excavaciones y demoliciones)	9	SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S.	Disposición Final	Anexo Certificado No.14
Mayo 2025	RCD susceptibles de aprovechamiento (material sobrante de excavaciones y demoliciones)	9	SERVI TRANSPORTES LÓPEZ Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL S.A.S.	Disposición Final	Anexo Certificado No.

Indicador:

RCD pétreos

$$Disposición\ (\%) = \frac{Volumen\ \ Certificado\ (m3)}{Volumen\ \ despachado\ (m3)} * 100$$

$$Disposición\ (\%) = \frac{9\ (m3)}{9\ (m3)} * 100 = 100\%$$

5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES

Para la recolección de los residuos sólidos convencionales en el proyecto se cuenta con cuatro (4) puntos ecológicos ubicados en la PTAP Ginebra, en la PTAP Guacarí, Tanque Albania y en la Oficina Principal del proyecto en el Corregimiento de Costa Rica, en cada uno de los cuales estarán dispuestos contenedores de colores según el tipo de residuo cumpliendo con el código de colores establecido en la Resolución No. 2184 de 2019, para realizar la separación en la fuente:

Color Verde para depositar residuos orgánicos aprovechables como restos de comida (cáscaras de frutas, verduras y restos de alimentos).

Color Blanco para depositar los residuos aprovechables como Plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
Color Negro para depositar los residuos no aprovechables como como servilletas, papeles metalizados y cartones contaminados con comida, papel higiénico, residuos COVID-19 (tapabocas, guantes, etc.)
Color Rojo para depositar residuos peligrosos.

Los residuos sólidos convencionales que se generan en los diferentes frentes de obra como lo son papel, cartón, empaques de alimentos, envases plásticos y envases de vidrio entre otros, son entregados a VEOLIA, empresa encargada de realizar la recolección, el transporte, el aprovechamiento y la disposición final de los residuos sólidos en los Municipios de Ginebra y Guacarí. La recolección de residuos por esta empresa para el sector donde se encuentra ubicado el proyecto se realiza con una frecuencia de tres (3) veces por semana los días martes, jueves y sábado, dichos residuos son dispuestos de manera adecuada en el relleno sanitario de Presidente, administrado por la empresa VEOLIA ASEO BUGA S.A. E.S.P., gestor autorizado por la CVC. Los residuos peligrosos serán recolectados por un gestor autorizado.

5.6 PROGRAMA DE MANEJO DE CAMPAMENTOS, ALMACENES, ACOPIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El proyecto cuenta con un campamento de obra en ambos frentes de trabajo, PTAP Ginebra y en la PTAP Guacarí, constituido por un contenedor localizado dentro del predio a intervenir. Estos frentes de trabajo cuentan con disponibilidad de servicios públicos correspondiente a energía eléctrica, alcantarillado y agua potable. En lo correspondiente a los baños para el personal en obra se dispone de dos (2) baterías sanitarias fijas con su correspondiente lavamanos en cada frente de trabajo, conectados a la red de servicios públicos. En cada uno de los frentes, la obra cuenta con un cerramiento perimetral existente compuesto por un muro de concreto y malla eslabonada, el cual permite el aislamiento de la zona a intervenir, de manera que no pueda ingresar personal ajeno al proyecto.

El campamento tanto en la PTAP Ginebra como en la PTAP Guacarí, cuenta con un sitio para el almacenamiento de los materiales y equipos debidamente señalizado donde permanecen bajo techo protegidos de los factores ambientales, también con una caseta para el almacenamiento de combustible construida con un techo en zinc, piso en concreto y un cerramiento en malla. Igualmente, se cuenta con una zona de parqueadero para los vehículos particulares. Los acopios de materiales pétreos como la grava y arena, así como los acopios de residuos RCD permanecen cubiertos para evitar la generación de material particulado por acción del viento.

El frente de trabajo del Tanque Albania cuenta con un campamento constituido por dos (2) contenedores donde se localizan las oficinas de los profesionales y el almacén para materiales y

equipos. Igualmente, está dotado de dos (2) baterías sanitarias fijas con lavamanos, disponibilidad de servicios públicos, así como un cerramiento perimetral con malla eslabonada, zona de parqueadero y acopios de materiales.

Los campamentos cuentan con la señalización informativa y preventiva correspondiente para los baños, oficinas, puntos ecológicos, almacén, sitios de acopio, parqueaderos, almacenamiento de combustibles, además de los avisos y cartelera informativa.

Actualmente, las actividades de obra civil a realizar en este frente ya están prácticamente culminadas; a excepción del relleno con material de excavación que debe realizarse alrededor del tanque de almacenamiento de agua potable.

5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, GRASAS Y ACEITES

Dentro de las actividades que generan residuos líquidos se encuentra el uso de baños y lavamanos por parte del personal de la obra, para evitar que se presente contaminación del suelo, de las aguas superficiales y aguas subterráneas a causa de esta actividad, el proyecto cuenta en cada uno de los frentes de trabajo de la PTAP Ginebra, PTAP Guacarí y Tanque Albania, con dos (2) unidades de baños fijos, un (1) lavamanos, los cuales están conectados a la red de servicios públicos.

Para el adecuado manejo de los combustibles se acondicionó un sitio para el almacenamiento de los mismos, el cual consiste en una caseta con techo, piso en concreto y un cerramiento en malla eslabonada. A la fecha no se han presentado derrames de combustible en el proyecto.

Para el lavado de las canaletas de los vehículos mezcladores de concreto se cuenta con una pileta de secado, para la cual se determinó un área donde se realizó una pequeña excavación que se recubrió previamente con un material impermeable para evitar el contacto directo del efluente del lavado con el suelo, a la espera de que el agua se evapore y que el concreto residual fragüe. Una vez terminada la obra, la pileta será demolida y los residuos serán transportados hacia el sitio de disposición final de RCD autorizado.

5.8 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Dentro de las medidas de manejo que se están implementando para el control y la reducción de emisiones de material particulado y ruido en el proyecto, se encuentra que los vehículos de carga cuentan con el respectivo certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes vigente. Sumado a lo anterior, la maquinaria y equipos utilizados cumplen con el mantenimiento mecánico preventivo garantizando la buena sincronización y carburación de los motores. (Informe componente SST)

Se realizan charlas y capacitaciones a los conductores y operadores de maquinaria, enfatizando en la conducción vehicular responsablemente dentro y fuera de la zona del proyecto, evitando ruidos como cornetas, pitos, frenos y motores desajustados. (Informe componente SST)

Los vehículos que transportan materiales sobrantes son cubiertos con lonas resistentes antes de salir de la obra, con el fin de evitar emisiones de material particulado durante el transporte de estos. Igualmente, los sitios de almacenamiento temporal de materiales granulares y de acopio de material sobrante de excavación permanecen cubiertos con lona o plástico con el fin de evitar que se dispersen por efectos del viento. En ningún caso se deberá incinerar los residuos originados, estos se deben manejar según el programa de manejo de residuos sólidos convencionales y especiales.

5.9 REGISTRO FOTOGRÁFICO – COMPONENTE AMBIENTAL


	
Foto 1. Punto ecológico - Tanque de almacenamiento Albania	**Foto 2.** Residuos aprovechables - Tanque de almacenamiento Albania



Foto 3. Limpieza de baños Obra - PTAP Guacarí



Foto 4. Cubrimiento de materiales - PTAP Guacarí

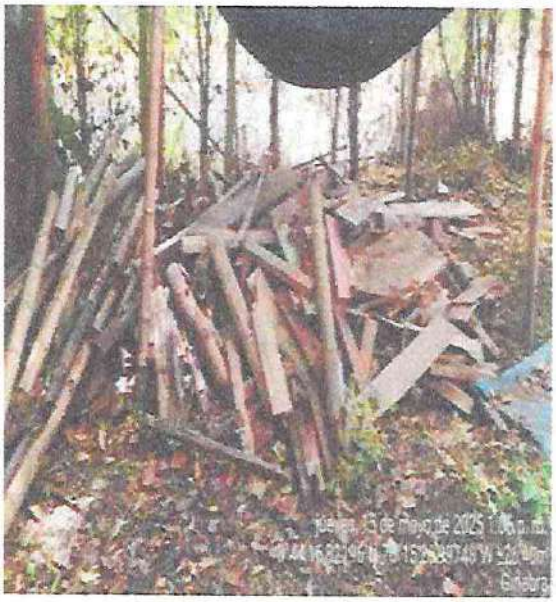

Foto 5. Residuos Aprovechables – PTAP Guacarí



Foto 6. Almacenamiento de combustible – PTAP Guacarí



Foto 7. Punto Ecológico – PTAP Guacarí



Foto 8. Punto Ecológico – PTAP Ginebra



Foto 9. Baños Obra – PTAP Ginebra



Foto 10. Kit Antiderrames – PTAP Ginebra



Foto 11. Almacenamiento de materiales – PTAP Ginebra



Foto 12. Almacenamiento de combustible- PTAP Ginebra



Foto 13. Residuos Aprovechables – PTAP Ginebra



Foto 14. Cercos de Protección – PTAP Ginebra



Foto 15. Ingreso de Material Pétreo – PTAP Ginebra



Foto 16. Retiro de Escombros– PTAP Ginebra



Foto 17. Donación Residuos Aprovechables (Restaurante PATAOTA) – PTAP Ginebra



Foto 18. Donación Residuos Aprovechables tanques de almacenamiento– Tanque Albania



Foto 19. Recarga Extintor – PTAP Ginebra



Foto 20. Recarga Extintor– PTAP Guacarí





Foto 21 y 22. Recarga Extintor Oficina Consorcio Redes y PTAPs – Costa Rica

6. ANEXOS

Se anexan al presente informe los siguientes documentos:

1. Anexo Técnico
    - Calibración de equipos de topografía
    - Fichas de cambio
    - Liberación de actividades
    - Programación de obra
    - Prueba de estanqueidad y control de asentamiento
    - Registro del clima
    - Resultados laboratorio:
        - Pruebas de cilindros
    - Topografía y carteras
2. Anexo Documental:
    - Bitácoras.
    - Oficios:
        - Oficio "Solicitud de mejoramiento de vía - sector regaderos"
        - Oficio "Entrega informe No. 24 abril 2025".
        - Oficio "Convocatoria Reunión Comité De Veeduría mes De Marzo Consorcio Redes Y PTAPS Valle (Municipio de Ginebra)"
        - Oficio "Convocatoria Reunión Comité De Veeduría mes De Marzo Consorcio Redes Y PTAPS Valle (Municipio de Guacarí)"
        - Oficio "Autorización CELSIA".
        - Oficio "Solicitud de recolección derrumbes en la vía entre Puente de Piedra hasta Puente Papas
3. Anexo SST
    - Acta reunión COPASST
    - Planillas de Aportes a la Seguridad Social integral.
    - Registros de inducción.
    - Registros capacitación
    - Certificaciones TSA
    - Pre operacionales.
    - Formatos pausas activas.
    - Registros ATS
    - Formatos permiso tareas alto Riesgo
    - Registros entrega de EPP

4. Anexo Ambiental
    - Certificados RCD
    - Resolución 740 No. 0741 0678 del 23 de julio del 2024, Permiso Aprovechamiento Forestal – Bocatoma.
    - Licencia de Intervención de Espacio Público (Resolución No. PM.300-42-2-028 de fecha 18 Nov 2024)
    - Oficio CRYPV-Cons145-2025 del 27 de enero de 2025 - Ginebra, Solicitud de Prórroga de la Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio Público – Resolución No. 0004-01 2023 Del 26 de enero de 2023.
    - Oficio CRYPV-Cons146-2025 del 29 de enero de 2025 – Guacarí, Solicitud de Prórroga de la Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio Público – Resolución No. PM.300-42.02-001 del 03 de febrero de 2023.
    - Resolución No. 0004-29-01-2025 del 29 de enero de 2025 – "Por medio de la cual se aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio Público con Resolución No. 0004-01-2023 del 26 de enero del 2023".
    - Resolución No. 140-23-3-002 del 31 de enero de 2025 – "Por medio de la cual se aprueba una prórroga a Licencia Urbanística de Intervención y Ocupación de Espacio Público".
    - Oficio AC-15512025 del 12 de febrero de 2025 - Solicitud autorización predio para compensación forestal.
    - Oficio AC-18742025 del 19 de febrero de 2025 - Solicitud Prorroga Permiso de Ocupación de Cauce.
    - Oficio CRYPV-COP2000.13.05.003-2022-Cons166-2025 del 19 de mayo de 2025-Ginebra, Gestión solicitud de prórroga permiso de aprovechamiento forestal único otorgado mediante resolución 0741-0678 de 2024.
    - Oficio donación material aprovechable (madera) Restaurante Pataota-Puente Rojo
    - Oficio donación material aprovechable (madera) Tanques de almacenamiento-Albania

5. Anexo Social
    - Acta de comité veeduría Ginebra
